	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de octubre de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCIÓN**				3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				5
2.1	Localización				6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				14
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				15
2.4	Características técnicas del proyecto				15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULROTÍA**				17
3.1	Información general del contrato				17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**				30
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		34
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	x		53
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		65
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	x		67
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		70
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				80
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		88
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		92
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	x		92
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	x	84	
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	x		94
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			x	
5.3	Informes especialistas y profesionales			x	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			x	
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría			x	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			x	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			x	
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		x	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		x	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		x	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual			x	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1		x	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**			x	
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo			x	
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría			x	
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			x	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			x	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: José Ricardo Acosta Sichaca

DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 4227 - 2024

INFORME MENSUAL – OCTUBRE 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Quibdó, octubre de 2025

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como Nóvita – Curundó – San José del Palmar – Crucero El Cairo, que para el alcance trata específicamente la “CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO”[1].

Con base a lo anterior el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, suscribió el contrato interadministrativo con la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba tendiente a adelantar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA”, que incluye dentro de sus alcances la elaboración de los volúmenes o productos técnicos entregables a nivel de Fase 3 (Estudios y diseños definitivos, a partir del máximo aprovechamiento del resultado de los Estudios y Diseños a nivel de Fase II llevados a cabo por la Entidad en vigencias anteriores).

[1] Tomado del Anexo 1 – Anexo Técnico Consultoría

El objetivo de esta fase es proyectar la materialización en campo del proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción), para el mejoramiento de la conexión existente Curundó - San José del Palmar – Cruce El Cairo, que podrá incluir la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o optimización y/o complementación conteniendo obligatoriamente la interventoría para la elaboración de nuevos estudios y diseños, con sus cálculos respectivos o trabajos similares, para todas aquellas obras requeridas de las especialidades que conservan relación directa con la infraestructura vial sobre el corredor de atención.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato 4227 de 2024, en este documento se presenta el informe correspondiente a las actividades del mes de octubre de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.


2.1. Localización

El corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo presenta una clasificación, según su función, y conforme al Manual de Diseño Geométrico del INVÍAS, de la siguiente manera:

- Sector: Corregimiento de Curundó – San José del Palmar, en el departamento del Chocó, es vía secundaria.
- Sector: San José del Palmar – Cruce El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, es vía secundaria.

El corredor geográfico objeto de estudio, se encuentra ubicado entre las poblaciones del municipio de Curundó – San José del Palmar y el Cruce El Cairo entre los departamentos del Chocó y Valle, cruza la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en jurisdicción del departamento del Chocó y en su tramo final su estribación oriental sobre la cuenca alta del río San Juan.

Figura 1. Localización del proyecto

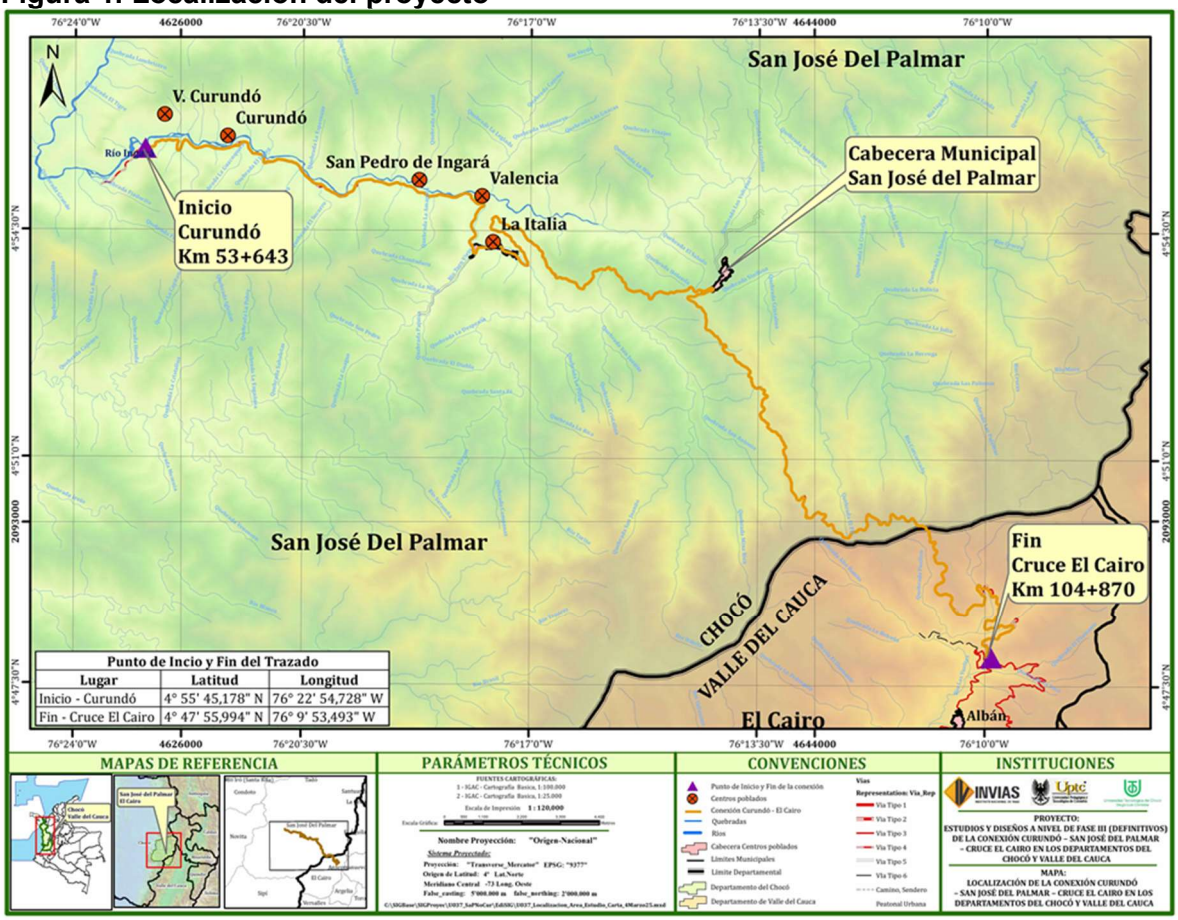


Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

El corredor se encuentra subdividido en 5 tramos conforme a los estudios y diseños realizados en el desarrollo del contrato 1666 de 2015 de la siguiente manera:

- **Tramo 1: K53+643 – K57+235**

  El tramo está comprendido entre el sitio conocido como La Punta en K53+643.016 y el caserío de Curundó en el K57+235, en una longitud aproximada de 3592 m.

Figura 1. Localización del tramo 1. K53+643 – K57+235

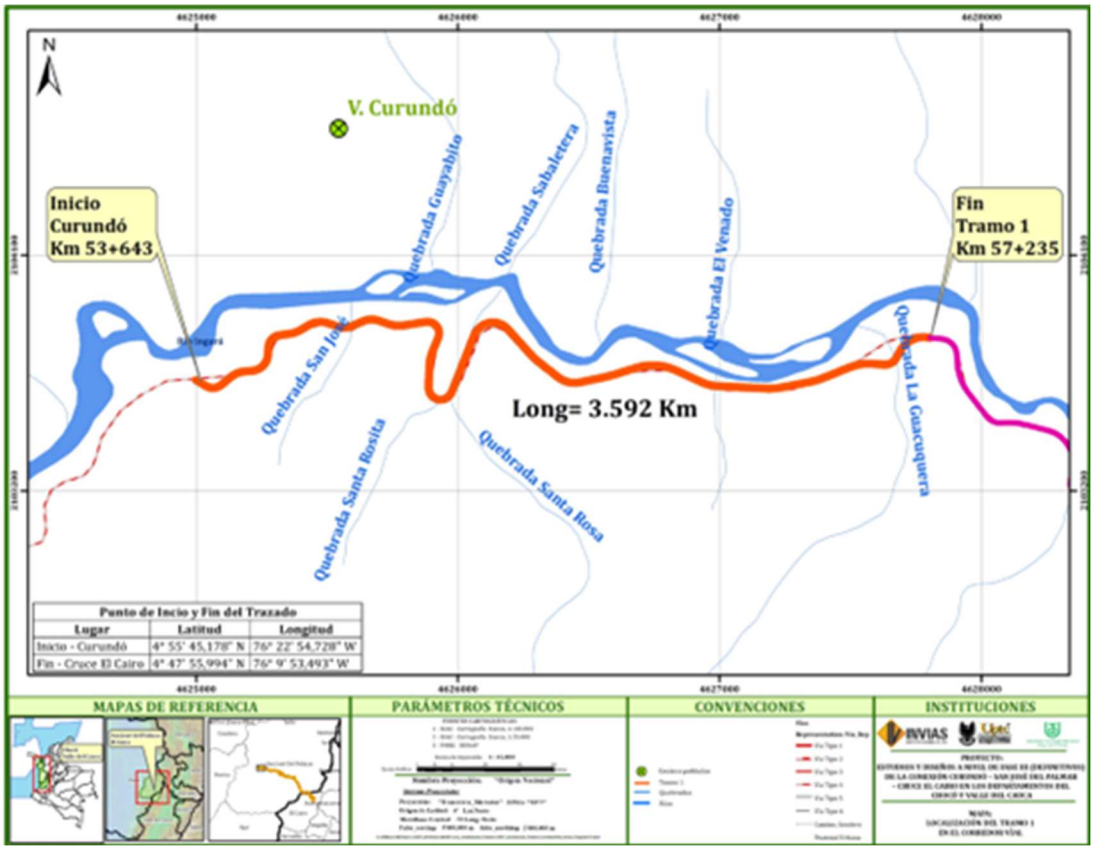


Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

En este tramo el corredor se desarrolla en un terreno entre ondulado y montañoso presentando pendientes longitudinales que varían entre el 2% y el 6.0%. Su recorrido circula mayoritariamente paralelo a la margen izquierda del río Ingará cruzando diferentes afluentes a este río como las quebradas San José, Santa Rosa, y la Guacuquera. En su recorrido alcanza alturas promedio de 300 m s.n.m. (Figura 2).

- **Tramo 2: K57+235 – K68+562**

  El tramo 2, está comprendido entre el sitio conocido como Curundó en el K57+235 hasta el caserío del Corregimiento La Italia en el K68+562, en una longitud de 11327 m.

Figura 2. Localización del tramo 2. K57+235 – K68+562

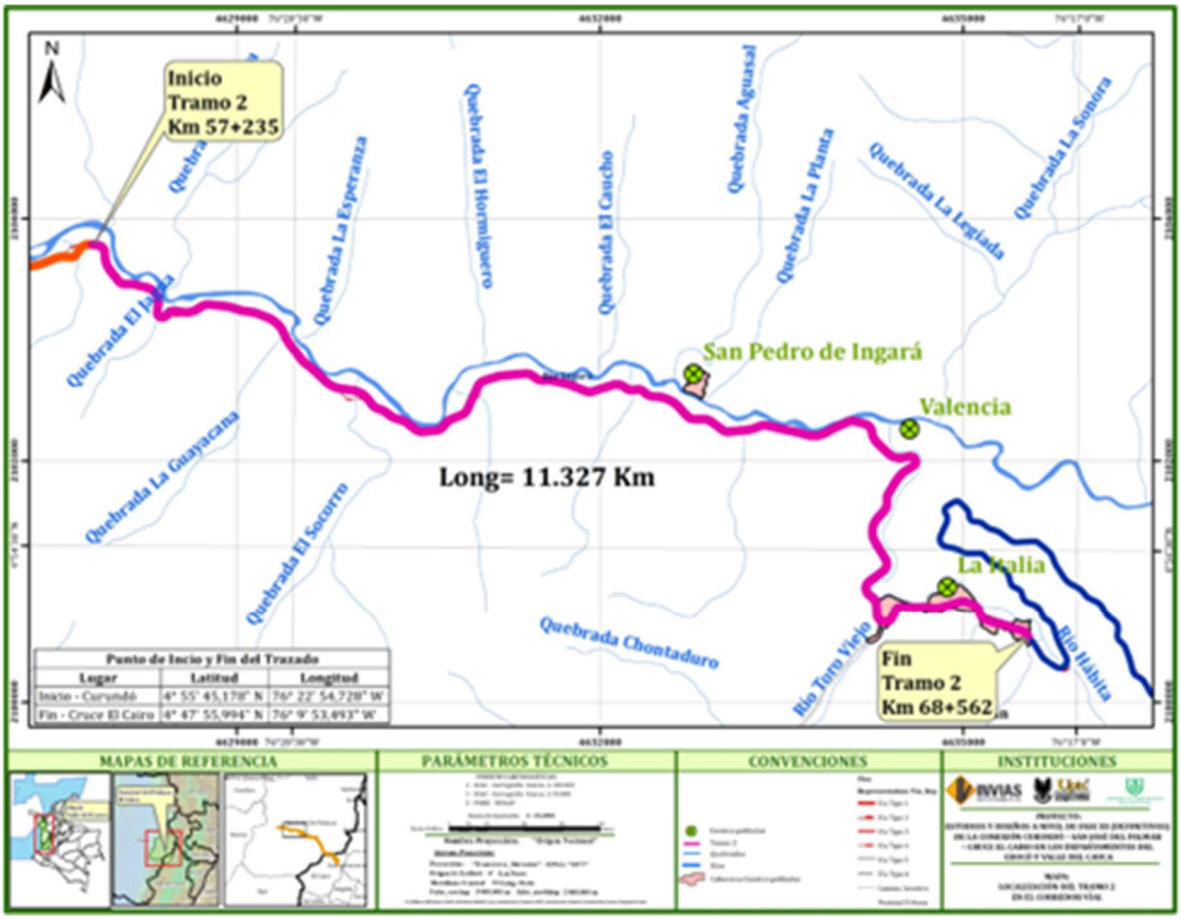

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

En este tramo el corredor continúa su recorrido paralelo al río Ingará, discurriendo sobre terrenos entre montañoso y ondulado. Entre el K57+235 y el K65+400 presenta pendientes longitudinales ascendentes que oscilan entre el 2% y el 8%,


pasando por las quebradas como La Jagua, La Guayacana y el Socorro, afluentes todos del río Ingará. Además, pasa tangencialmente por las veredas de San pedro de Ingará y Valencia.

En el último sector entre las abscisas K65+400 y K68+562 el terreno presenta pendientes longitudinales más bajas que varían entre el 2% y el 4%, pasando por el río Toro viejo y afluentes de menor escala terminando su recorrido en el corregimiento de La Italia, con una altura de 405 m.s.n.m. (Figura 3)

- **Tramo 3: K68+562 – 78+995**

  El tramo 3, está comprendido entre el corregimiento La Italia en el K68+562 y el K78+995 en cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar, en una longitud de 10433 m.

Figura 3. Localización del tramo 3. K68+562 – K78+995

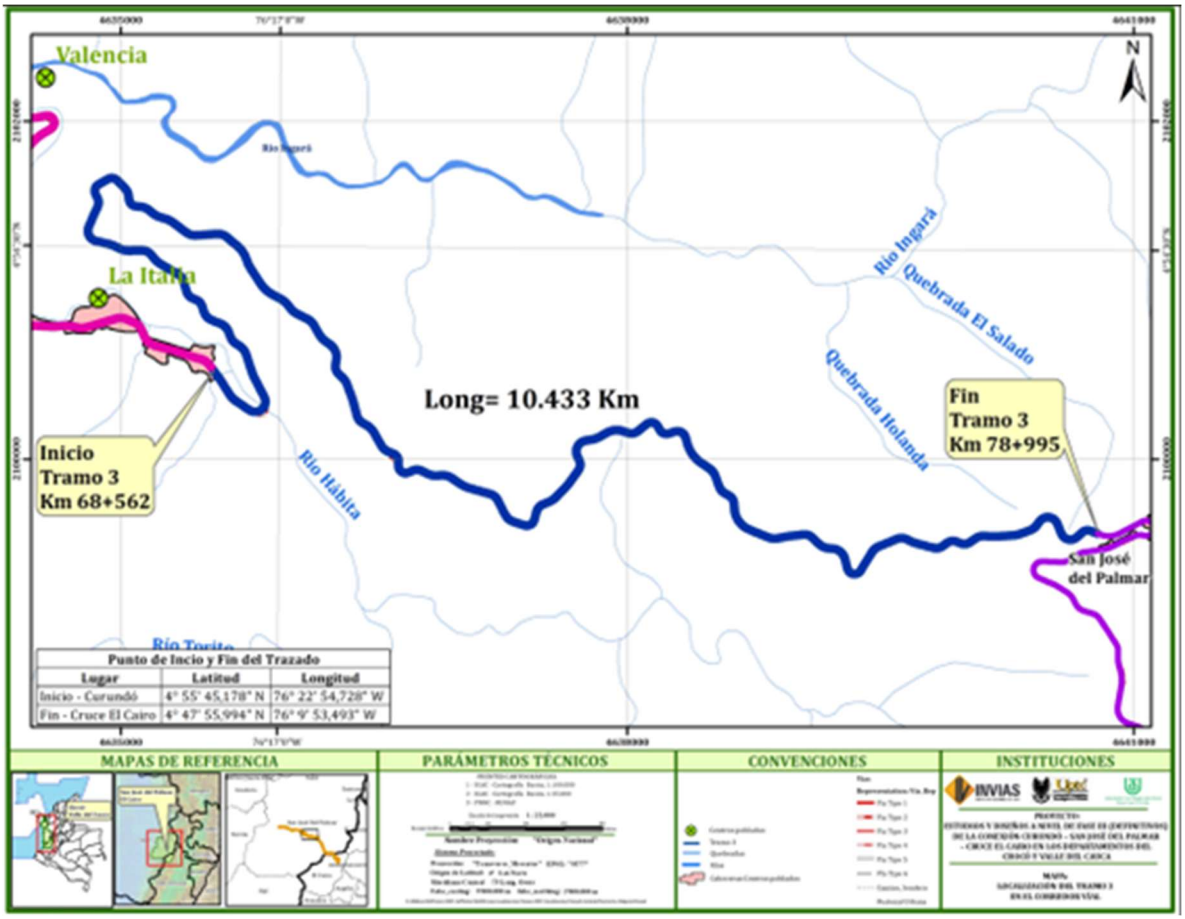

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

En este tramo el corredor deja el valle del río Ingará para ir ascendiendo sobre la cordillera occidental, atravesando terrenos entre montañosos y escarpados presentándose pendientes ascendentes muy fuertes que oscilan entre el 6% y el 10%, alcanzando una altura de 1080 m s.n.m. (Figura 4).


- **Tramo 4: K78+995 – K88+619**

  El tramo 4, está comprendido entre cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar en el K78+995 y el K88+619, en una longitud de 9624 m.

  Al igual que el tramo 3, este tramo continúa en ascenso sobre la cordillera, alcanzando una altura de 1685 m s.n.m.; en su recorrido pasa por la entrada a la cabecera del municipio de San José del Palmar en el K80+370 configurándose en una oportunidad para mejorar el acceso a las comunidades apostadas en el territorio. Se presentan pendientes fuertes entre el 6% y el 9%.

  En su trayectoria el corredor atraviesa por quebradas como Moja Huevos y otra gran cantidad de fuentes de agua de menor escala y que sugieren la construcción de un gran número obras de drenajes de menor tamaño. (Figura 5).

Figura 4. Localización del tramo 4. K78+995 – K88+619

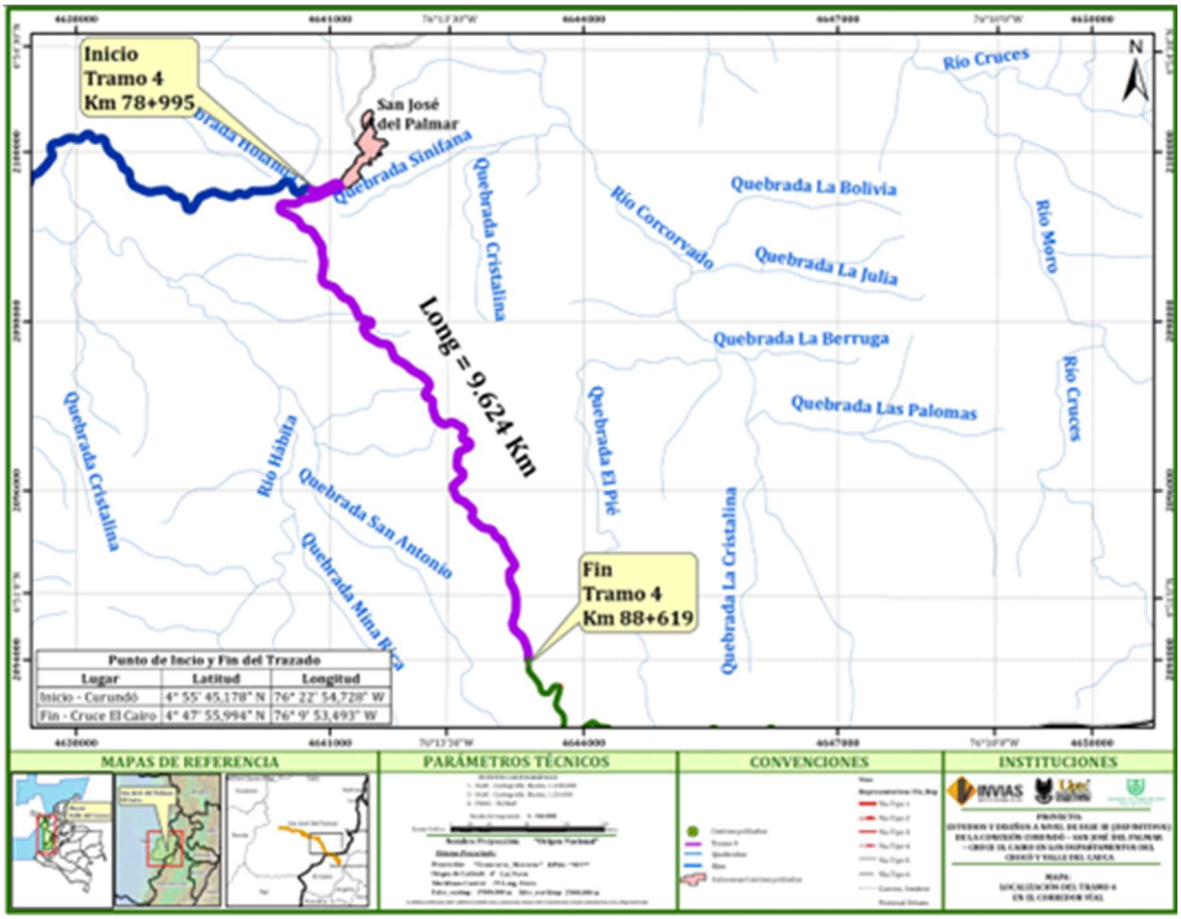

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.


- **Tramo 5: K88+619 – K104+870**

  El tramo 5, está comprendido entre el K88+619 y el K104+870 en el sitio conocido como cruce a El Cairo, en una longitud de 16251 m.

  En este sector el corredor continúa su ascenso sobre la cordillera hasta llegar a la divisoria en el sitio conocido como Altos de Galápagos (K94+200 – K94+400) en los límites entre los dos departamentos, alcanzando una altura de 2050

m.s.n.m.; sitio donde se presentan temperaturas muy bajas en la mayor parte del tiempo y precipitaciones mínimas constantes.

Figura 5. Localización del tramo 5. K88+619 – K104+870

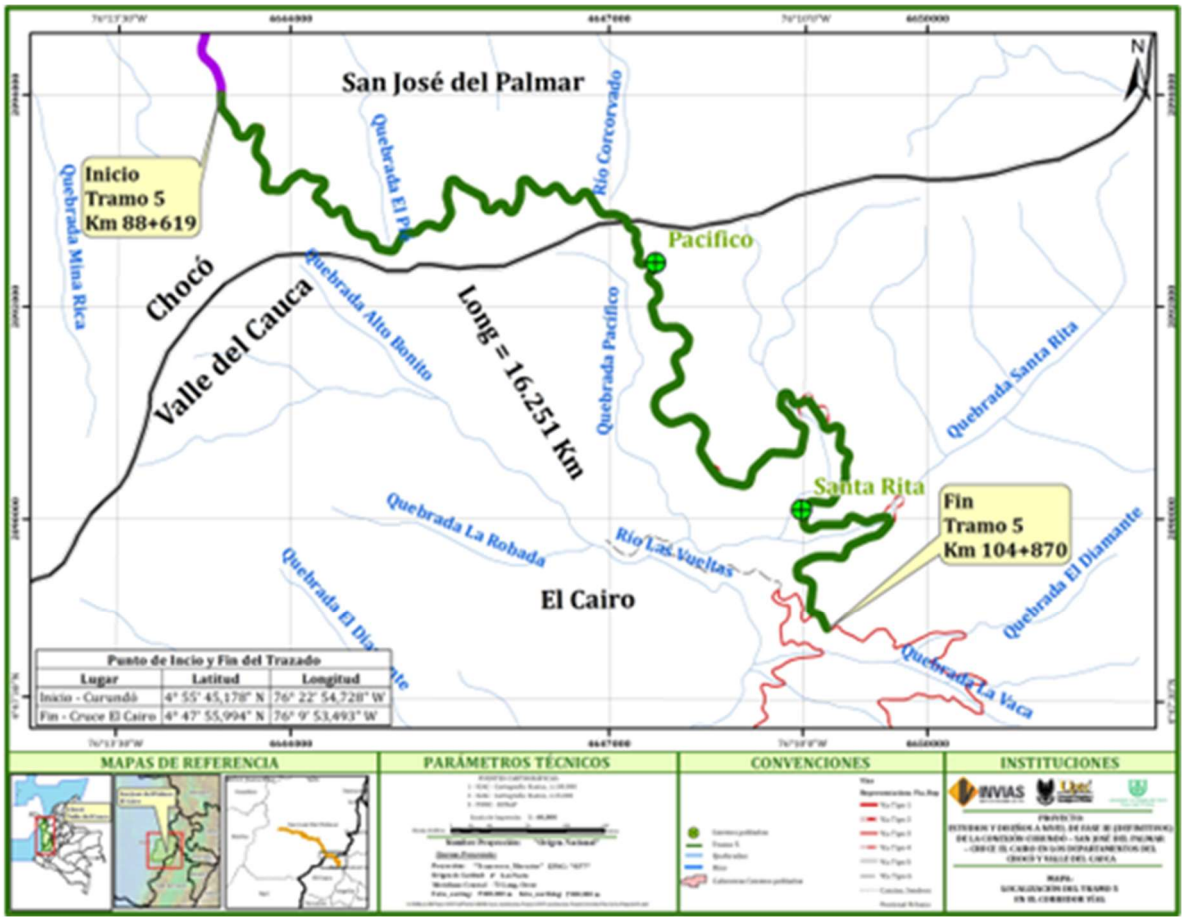

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

A partir del K94+400 el corredor inicia su descenso sobre un terreno montañoso con pendientes longitudinales entre el 4% y el 7% hasta llegar al K102+800, pasando por gran número de fuentes hídricas de menor tamaño. Hacia adelante se presenta un corto ascenso con una pendiente longitudinal promedio del 6.5% hasta llegar al

K103+900. Hacia el final del tramo se presenta un sector en descenso con pendiente promedio del 7% hasta llegar al cruce a El Cairo, a una altura de 1645 m s.n.m. (Figura 6).

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojó y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Características técnicas del proyecto

Realizar los ESTUDIOS y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

Los volúmenes que conforman la **Fase III de mejoramiento y pavimentación** a los cuales se requiere llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños (vía existente) son los siguientes:

Volumen 1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.
Volumen 2 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISIS DE SERVICIO.
Volumen 3 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO.
Volumen 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.

Volumen 5 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL.

Volumen 6 ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE.

Volumen 7 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES.

Volumen 8 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Volumen 9 HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.

Volumen 10 ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS.

Volumen 11 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.

Volumen 12 ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

Volumen 13 ESTUDIO REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.

Volumen 14 ESTUDIO DE RIESGOS.

Volumen 15 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Volumen 16 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

Volumen 17. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.

Volumen 18. VOLUMEN TÉCNICO BIM

Volumen 19. INFORME FINAL EJECUTIVO.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de consultoría se resumen en los siguientes términos:

CONTRATO N°	4227 - 2024
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA
Consultor	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
Valor	$ 8.700.000.000
Plazo	1 mes
Fecha de Inicio	02 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025
Prórroga N°1	12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025
Interventor	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Fuente: Elaboración propia.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se detallan las actividades desarrollas por el equipo consultor en el mes de octubre:

- Durante el mes se llevó a cabo la actualización del mapa de figuras de conservación en el corredor vial, incorporando la información más reciente sobre áreas protegidas, reservas forestales, zonas de manejo especial y demás figuras ambientales presentes en el área de influencia del proyecto, mapa con la localización de puntos críticos.

- **Gestión administrativa** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto.
- **Reunión Coordinación BIM y el volumen de diseño Geométrico de Vías - 01 de octubre de 2025:** Con el propósito de coordinar aspectos entre el equipo BIM y el componente de diseño geométrico de vías. Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados hasta la fecha en el desarrollo del volumen de diseño geométrico, se analizaron los criterios técnicos aplicados y se identificaron ajustes necesarios para asegurar la coherencia entre los diferentes componentes del proyecto. Así mismo, se definieron acciones para fortalecer la articulación entre los equipos y optimizar el proceso de revisión técnica.
- **Comité de seguimiento virtual realizado el 02 de octubre de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS**: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.
- **Revisión de estrategias para aplicación de encuestas socioeconómicas - 02 de octubre de 2025:** Orientada a la definición de estrategias metodológicas, técnicas y operativas que permitan estructurar y coordinar de manera eficiente las reuniones requeridas para la formulación de los lineamientos del proceso de consulta previa.

  Durante la sesión se analizaron los actores involucrados, los escenarios de participación y los mecanismos de articulación institucional y comunitaria,

con el fin de garantizar un proceso concertado, incluyente y conforme a la normativa vigente.

- **Reunión de avances volumen de urbanismo y reunión de estrategias para salida a campo - 02 de octubre de 2025:** Con el objetivo de revisar los avances correspondientes al volumen de urbanismo y definir las estrategias operativas para la próxima salida a campo. Durante la sesión se evaluaron los progresos técnicos del componente urbano, se identificaron aspectos pendientes por ajustar y se establecieron lineamientos logísticos y metodológicos que orientarán el desarrollo de las actividades en terreno, garantizando la articulación entre los equipos técnicos y de campo.

- **Componente de Topografía:**

  Se realizó la implantación física de los vértices en el terreno para la materialización de la poligonal, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados, garantizando su estabilidad, visibilidad y exactitud conforme a los parámetros establecidos para el levantamiento topográfico. De manera complementaria, se está llevando a cabo el proceso de nivelación, con el propósito de determinar las diferencias de altura entre los puntos consecutivos que conforman la poligonal. Este procedimiento permite establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación, tomando como base un punto de referencia conocido, lo que asegura la precisión en la representación altimétrica del terreno.

  Posteriormente, se realizó el levantamiento topográfico de la poligonal para obtener coordenadas mediante métodos de estación total, así como la toma

de datos altimétricos para generar un modelo tridimensional del terreno, tomando como referencia los vértices previamente establecidos en campo. Para ello, se emplearon instrumentos de medición de alta precisión, garantizando la correcta georreferenciación de cada punto. Así mismo se realizó levantamiento topográfico de un tramo de la vía que conduce al corregimiento de El Cairo, comenzando desde el punto conocido como Cruce El Cairo. Esta actividad hace parte de las labores preliminares orientadas a la planificación y ejecución de futuras obras de infraestructura vial.

Adicionalmente, se procedió a establecer físicamente los mojones en el terreno, con el fin de lograr la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o la instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, abarcando el tramo comprendido desde el punto conocido como La Virgen (tramo 5) hasta un punto cercano a los límites entre los tramos 3 y 4.

Finalmente, se llevó a cabo el levantamiento de coordenadas para fines de georreferenciación, utilizando el par de receptores GNSS (GPS 19–19A y GPS 20–20A). El procedimiento se desarrolló mediante técnicas de posicionamiento diferencial, lo que permitió obtener datos confiables en tiempo real y asegurar la consistencia de la información espacial recolectada.

- **Comité de seguimiento virtual realizado el 06 de octubre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones

anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- **Reunión entre la Consultoría, Interventoría y el equipo del volumen de Topografía - 06 de octubre de 2025:** Encuentro realizado con el propósito de hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en campo, revisar el avance de los trabajos topográficos y analizar las recomendaciones y observaciones formuladas por las partes involucradas, con el fin de garantizar la calidad y coherencia de la información levantada.

- **Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025:** La Personería Municipal de San José del Palmar llevó a cabo una reunión con la participación de diferentes entidades oficiales y representantes del proyecto, con el propósito de realizar seguimiento al avance de las actividades en ejecución, revisar los compromisos previamente adquiridos y evaluar los aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con el desarrollo del proyecto.

  Durante el encuentro se presentaron los principales avances obtenidos en campo, se socializaron las observaciones de las entidades asistentes y se definieron acciones de mejora y coordinación interinstitucional para fortalecer la gestión y cumplimiento de los objetivos establecidos.

- **Comité de seguimiento virtual realizado el 09 de octubre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones

anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- **Actividades en campo entre el 06 y el 11 de octubre de 2025**: Entre el 06 y el 11 de octubre de 2025, el equipo profesional del volumen de Topografía desarrolló actividades en campo enfocadas en la recopilación de información técnica necesaria para el avance de los estudios.

  Estas labores incluyeron:

  1. Levantamiento topográfico detallado mediante estación total, orientado a la obtención de datos de alta resolución que permitan representar con precisión las características del terreno y servir como base para los análisis y diseños posteriores

  2. Ubicación precisa mediante georreferenciación de puntos de control previamente monumentados con GNSS RTK, con el fin de garantizar la exactitud espacial requerida para la vinculación del levantamiento topográfico al sistema de coordenadas oficial y asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos en campo.

  3. Construcción e implementación de puntos de control topográfico mediante mojones, asegurando su adecuada materialización, estabilidad y visibilidad en el terreno. Estos puntos sirven como referencia permanente para las mediciones y verificaciones posteriores, garantizando la precisión y continuidad de los trabajos topográficos en la zona de estudio.

4. Construcción de trocha, Se llevo a cabo la apertura de trochas en dirección perpendicular al eje de la vía principal, con el propósito de facilitar el acceso al terreno y obtener información topográfica precisa. Estas trochas servirán para establecer puntos de control, efectuar mediciones detalladas y asegurar una adecuada caracterización del área de influencia del proyecto.

5. Levantamiento topográfico minucioso para la obtención de datos con alta resolución, ejecutado mediante el uso de instrumentos de precisión que permiten representar con exactitud las características físicas del terreno. Esta actividad tiene como objetivo generar información confiable y detallada para la elaboración de planos y el desarrollo de los análisis técnicos requeridos en las etapas posteriores del proyecto.

6. Establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, entre tramo (3) y parte de tramo (2).

7. Se determino a través de la nivelación y contra nivelación, las diferencias de altura entre puntos consecutivos a lo largo de los puntos que determinan la poligonal. Este procedimiento permite establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación.

- **Coordinación logística para el ingreso a campo de los especialistas de la Consultoría:** Se coordinó el desplazamiento e ingreso al área de trabajo

de los especialistas de la consultoría, con el propósito de supervisar las actividades en campo, desarrollar reuniones orientadas a la definición de lineamientos para la consulta previa y adelantar el levantamiento de información.

- **Entrega del informe definitivo del Volumen XIV. Estudio de Riesgos: E**l cual consolida la información recopilada, el análisis de los datos obtenidos en campo y las conclusiones técnicas correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos en los términos de referencia del proyecto.

- **Entrega del informe preliminar del Volumen XIII. Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas:** Esta entrega tiene como objetivo presentar el desarrollo técnico del Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas. Este documento presenta los avances en el diagnóstico, diseño y proyección de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y redes secas

  Asi mismo, presentar los resultados obtenidos hasta la fecha, facilitar la revisión técnica por parte de la interventoría y coordinar los ajustes necesarios para la consolidación del informe final, garantizando la coherencia con los demás componentes del proyecto de estudios y diseños.

- **Reunión sobre el cargue de presupuesto en el software Quercusoft – 10 de octubre de 2025:** Se llevó a cabo una reunión técnica con el objetivo de revisar y coordinar el proceso de cargue del presupuesto en el software Quercusoft. Durante la sesión se verificaron los lineamientos, estructuras y formatos requeridos para la correcta integración de la información

presupuestal en la plataforma, asegurando la coherencia con los componentes técnicos y financieros del proyecto.

- **Revisión de información componente social, volumen 17 Actividad orientada al análisis, verificación y validación del contenido correspondiente al componente social del Volumen 17.** Incluye la revisión de coherencia interna, consistencia de datos, pertinencia de la información frente a los objetivos del estudio, y la identificación de ajustes o complementos necesarios para garantizar la calidad técnica y metodológica del documento.

- **Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de octubre de 2025**, modalidad presencial en la Universidad Tecnológica del Chocó, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se0 socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- **Coordinación logística para el ingreso a campo de los especialistas de la Consultoría:** Se coordinó el desplazamiento e ingreso al área de trabajo de los especialistas de la consultoría, con el propósito de supervisar las actividades en campo y la identificación de sitios estratégicos para desarrollos urbanísticos.

- **Capacitación para la toma de información socioeconómica – 15 de octubre de 2025:** Se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al equipo social y técnico, con el propósito de fortalecer las competencias en la aplicación de herramientas para la recolección y análisis de información socioeconómica en campo.

  Durante la sesión se socializaron los instrumentos metodológicos diseñados para el levantamiento de datos, así como los protocolos de registro, verificación y sistematización de la información. Igualmente, se enfatizó en los lineamientos éticos y en las estrategias de relacionamiento comunitario que deben aplicarse durante las actividades de campo, garantizando la calidad, pertinencia y confiabilidad de los datos obtenidos.

- **Ingreso a campo de los especialistas de Urbanismo y Paisajismo, y de los volúmenes de Estructuras, Hidráulica, Geotecnia, junto con el Coordinador Técnico – 16 de octubre de 2025:** Se llevó a cabo el ingreso al área de estudio por parte de los especialistas de Urbanismo y Paisajismo, así como de los profesionales responsables de los volúmenes de Estructuras, Hidráulica y Geotecnia, en compañía del Coordinador Técnico de la consultoría.
  Durante la jornada, los especialistas de Urbanismo y Paisajismo realizaran la identificación de sitios estratégicos para desarrollos urbanísticos. De manera complementaria, los equipos técnicos verificaran en terreno las condiciones geotécnicas, hidráulicas y estructurales del entorno, con el fin de articular los criterios de diseño y consolidar una visión integral del área de intervención. Esta actividad permitirá fortalecer la articulación interdisciplinaria y avanzar

en la definición de criterios técnicos para el desarrollo de los estudios y diseños.

- **Actividades en campo entre el 13 y el 18 de octubre de 2025: Entre el 13 y el 18 de octubre de 2025,** el equipo profesional del volumen de Topografía desarrolló actividades en campo enfocadas en la recopilación de información técnica necesaria para el avance de los estudios. Estas labores incluyeron:

  1. Determinar las diferencias de altura entre puntos consecutivos que conforman la poligonal, empleando técnicas de nivelación geométrica directa y contra nivelación. Este método permite obtener valores precisos de desnivel entre estaciones, garantizando la confiabilidad del perfil altimétrico del trazado.

  Este proceso es fundamental para garantizar la precisión en el modelado topográfico, el diseño de obras civiles y la integración con sistemas de información geográfica (SIG).

  2. Se llevó a cabo la ubicación estratégica e instalación de mojones o hitos que servirán como vértices de la poligonal, con el fin de establecer puntos de referencia estables y duraderos para el levantamiento topográfico. Estos elementos físicos permiten garantizar la precisión geométrica y la trazabilidad del proyecto en campo.

  El procedimiento incluyó; Materialización de los mojones mediante elementos resistentes (concreto, PVC reforzado, otros), debidamente marcados y

numerados.

3. Apertura de trochas en dirección perpendicular al eje de la vía principal, con el propósito de habilitar accesos estratégicos que permitieran la exploración detallada del terreno y la recopilación precisa de información topográfica. Estas trochas facilitaron el desplazamiento del personal y el posicionamiento de los equipos, optimizando la cobertura espacial del levantamiento.

- **Recorrido en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoría:** Se desplazaron hasta el punto conocido como la quebrada el socorro en tramo 2, con el objetivo de iniciar desde dicho punto un recorrido de reconocimiento del estado de la vía, hasta el punto conocido como cruce el Cairo en tramo 5, entre pares de especialistas de ambas partes. Además, se realizo en el corregimiento de San Pedro de Ingará reunión entre el personal de la consultoría y el personal de la Interventoría,

  En dicha reunión se hizo la presentación ya que había personal nuevo tanto de la consultoría como de la interventoría, luego se procedió con el desarrollo de la reunión que consistió en una serie de preguntas por parte de la interventoría a cerca de los avances del proyecto por parte de la consultoría en cada uno de los volúmenes que conforman el proyecto y las respuestas a satisfacción de los profesionales de la consultoría, ya queo hubo mayores recomendaciones por la contra parte.

Terminada la reunión y mermado el fuerte aguacero que se presentaba, se procedió a seguir el recorrido de reconocimiento de cuatro (4) puntos críticos que se encuentran en la vía, entre tramo (4) y tramo (5).

- **Recorrido y mesa de trabajo en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoría:** Se llevó a cabo un desplazamiento hasta el punto conocido como la quebrada El Socorro, ubicado en el tramo 2, con el propósito de iniciar desde allí un recorrido de reconocimiento y verificación del estado actual de la vía hasta el Cruce El Cairo, correspondiente al tramo 5. Esta actividad se desarrolló de manera conjunta entre los especialistas de la Consultoría y la Interventoría, con el fin de identificar condiciones físicas, avances y posibles afectaciones presentes en el corredor vial.

  Durante el recorrido, se realizó una verificación técnica de los cuatro puntos críticos localizados entre los tramos 4 y 5, observando aspectos relacionados con la estabilidad del terreno, drenaje, estado de la carpeta de rodadura y condiciones de accesibilidad.

  Finalmente, se efectuó una reunión técnica de trabajo en el corregimiento de San Pedro de Ingará, con la participación de representantes de ambas entidades, con el propósito de analizar los avances del proyecto, revisar las observaciones de campo y discutir aspectos específicos de cada uno de los volúmenes técnicos que componen los estudios y diseños del proyecto vial. Reunión BIM – 18 de octubre de 2025: Se realizo mesa de trabajo con el objetivo de crear el usuario en la plataforma Autodesk.

- **Reunión sobre la distribución de comunidades para la aplicación de encuestas del volumen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto – 20 de octubre de 2025:** Se realizó la planificación y asignación de las comunidades a cubrir por parte del equipo de trabajo, con el fin de garantizar una distribución equitativa y eficiente para la aplicación de las encuestas socioeconómicas. La actividad permitió definir los sectores, rutas y responsables por comunidad, asegurando una adecuada cobertura del área de influencia del proyecto y facilitando la recolección de información representativa para el análisis socioeconómico y financiero.

- **Ingreso a campo de los profesionales de la Consultoría para la toma de encuestas de la evaluación socioeconómica – 21 de octubre de 2025:** Se realizó el ingreso al área de estudio por parte de los profesionales de la Consultoría, con el propósito de efectuar la toma de muestras correspondientes a las encuestas de la evaluación socioeconómica.

- **Comité de Seguimiento:** El 23 de octubre de 2025. Se realizó de manera presencial el Comité de Seguimiento mensual, con la participación del equipo de la consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en las instalaciones de esta entidad en la ciudad de Bogotá: Durante la jornada se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría, adicionalmente se estableció la proyección de las actas de costo, disminuir el % de amortización

en las actas de septiembre y octubre y aumentarlo en la de noviembre para así no queden los recurso en vigencia expirada.

- **Elaboración del acta de costos de octubre:** Se elaboró el acta de costo de octubre, registrando los gastos para reflejar de manera precisa la distribución de costos y facilitar el control financiero del proyecto.

  Entrega del Informe Preliminar del Volumen I - Topografía: Se entregó el informe preliminar del volumen I de topografía el cual incluye, el seguimiento de la materialización de los mojones para red de georreferenciación, el trazado de la poligonal, el informe de los mojones base para el proyecto, y nivelación en un 30 % en la poligonal.

- **Actividades en campo entre el 20 y el 25 de octubre de 2025: Entre el 20 y el 25 de octubre de 2025**, los equipos profesionales de los volúmenes de Topografía, Seguridad Vial y Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto realizaron actividades en campo orientadas a la recolección de información técnica necesaria para el avance de los estudios.

  Estas labores incluyeron: **Topografía.**

  ü Se realizó levantamiento y posicionamiento geodésico para la georreferenciación del par de estaciones, empleando técnicas de posicionamiento satelital de alta precisión. Equipo empleado, GNSS RTK.

ü Se realizó la georreferenciación para triangulación con las bases Quibdó y Zarzal en los mojones materializados con placas GPS–18, GPS–18A, GPS–19 y GPS–19A, con el fin de establecer el control geodésico del proyecto y garantizar la precisión en la ubicación de los puntos de referencia.

ü En el tramo cinco (5) se determinaron las diferencias de altura entre puntos consecutivos que conforman la poligonal, empleando técnicas de nivelación geométrica directa y contra nivelación. Este método permite obtener valores precisos de desnivel entre estaciones, garantizando la confiabilidad del perfil altimétrico del trazado.

Las actividades de nivelación y contra nivelación se llevaron a cabo entre las abscisas K95+800 – K93+500

En el tramo tres (3), Se llevo a cabo la ubicación estratégica e instalación de mojones o hitos, que servirán como vértices de la poligonal, con el fin de establecer puntos de referencia estables y duraderos para el levantamiento topográfico.Estos elementos físicos permiten garantizar la precisión geométrica y la trazabilidad del proyecto en campo.

El procedimiento incluyó:

1. Materialización de los mojones mediante elementos resistentes (concreto, PVC reforzado, otros), debidamente marcados y numerados.
2. Materialización de la poligonal en campo del K76+000 – K71+500.

ü Se continuaron las labores de apertura de trochas en dirección perpendicular al eje de la vía principal, con el fin de habilitar accesos estratégicos que permitieran la inspección detallada del terreno y la obtención de información topográfica con mayor precisión.

Volúmen Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto

El 21 de octubre de 2025, en la cabecera municipal de San José del Palmar, se llevó a cabo una breve inducción a cargo del especialista del Volumen, cuyo objetivo fue contextualizar al grupo de apoyo sobre los lineamientos metodológicos y operativos del trabajo de campo.

El 22 de octubre de 2025, se inició el levantamiento premuestral en distintos sectores de la cabecera municipal. Estas encuestas, de carácter exploratorio, sirvieron como muestra piloto para validar el instrumento y ajustar la estrategia de recolección de datos. Posteriormente, se seleccionó la muestra definitiva y se procedió a la toma de muestras, las cuales se desarrollarán en las comunidades del corredor vial y durarán hasta el 29 de octubre de 2025.

Seguridad Vial

Se realizó la inspección del corredor vial para evaluar el estado del pavimento, las señalizaciones verticales y horizontales, y las condiciones generales de seguridad. Durante la revisión se identificaron grietas, baches

y problemas en el drenaje. Los hallazgos permitieron determinar el nivel de deterioro y planificar las acciones de mantenimiento necesarias.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4227 de 2024 en el mes de octubre se generaron 5 informes semanales los cuales se presentan en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes del mes de octubre de 2025.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

Se anexa el informe financiera y presupuestal (Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9).**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** se presenta para este mes.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**.

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

No se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento al plan de inversión del anticipo:** se anexa formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** Plan de inversión de anticipo aprobado por la interventoría.
- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de octubre de 2025 un porcentaje ejecutado de 26.90% y un porcentaje programado de 27.99%.
- **Seguimiento Programa de inversiones:** se anexan formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2.**
- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto
- **Actas de reunión:** Se anexa las actas **MEPI-MN1-IN-14-FR-2.**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de octubre se alcanzaron avances importantes en el desarrollo del proyecto. Se actualizó el mapa de figuras de conservación en el corredor vial, integrando la información más reciente sobre áreas protegidas, reservas forestales y zonas de manejo especial, lo cual permite contar con una base actualizada para la planificación ambiental.

En la parte técnica, se realizaron diferentes labores de campo en los componentes de topografía, seguridad vial y evaluación socioeconómica, logrando recopilar información precisa. Estas actividades incluyeron levantamientos topográficos, instalación de mojones, nivelaciones y apertura de trochas, garantizando la calidad y confiabilidad de los datos.

También se llevaron a cabo varias reuniones técnicas y comités de seguimiento con la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), donde se revisaron los avances, se aclararon observaciones y se definieron nuevas acciones para el cumplimiento contractual.

De igual manera, se entregaron informes clave, como el informe definitivo y preliminares de los siguientes, VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS, VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS, VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD, VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL, VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO,

cumpliendo con los plazos establecidos y asegurando la coherencia técnica con los demás componentes.

En el componente social, se fortaleció la planeación y aplicación de encuestas socioeconómicas, acompañadas de jornadas de capacitación para el personal en campo, lo que permitió un trabajo más ordenado y participativo con las comunidades.

En general, octubre fue un mes de consolidación del trabajo interdisciplinario, donde se evidenció un avance técnico constante, buena articulación institucional y un compromiso firme del equipo por mantener la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Finalmente, es clave mantener la articulación institucional y el trabajo en equipo, ya que estos aspectos han sido fundamentales para avanzar con eficiencia y mantener la calidad técnica en cada una de las etapas del proyecto.

8. ANEXOS

Acta de costos (Formato **MEPI-MN1-IN-8-FR-1**)
Informes mensuales grupo 1 del mes de octubre de 2025.

SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 4/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 44 del 29 al 4 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.191.509.737,54	48,18%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.298.858.683,00	49,41%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ 107.348.945,46	1,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.191.509.737,54	48,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.298.858.683,00	49,41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 107.348.945,46	1,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 149.061.400,00	1,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 268.881.400,00	3,09%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,18%
Meta Física Ejecutada % 49,41%
Avance o Atraso Físico % 1,23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%
					Ejec	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 14.700.000,00	0,17%
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog				$ 37.100.000,00	0,43%
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 141.000.000,00	1,62%
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 43.800.000,00	0,50%
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog				$ 32.400.000,00	0,37%
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ 69.500.000,00	0,80%
						Total Ejec				$ 199.500.000,00	2,29%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 55.070.000,00			$ 55.070.000,00	0,63%
					Ejec	$ 44.890.000,00			$ 44.890.000,00	0,52%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Revisión de información secundaria:** Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

□ **Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Durante la semana se llevó a cabo la actualización del mapa de figuras de conservación en el corredor vial, incorporando la información más reciente sobre áreas protegidas, reservas forestales, zonas de manejo especial y demás figuras ambientales presentes en el área de influencia del proyecto, con el fin de garantizar la coherencia cartográfica y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

□ **Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de septiembre de 2025:** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Reunión Coordinación BIM y el volumen de diseño Geométrico de Vías - 01 de octubre de 2025:** Con el propósito de coordinar aspectos entre el equipo BIM y el componente de diseño geométrico de vías. Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados hasta la fecha en el desarrollo del volumen de diseño geométrico, se analizaron los criterios técnicos aplicados y se identificaron ajustes necesarios para asegurar la coherencia entre los diferentes componentes del proyecto. Así mismo, se definieron acciones para fortalecer la articulación entre los equipos y optimizar el proceso de revisión técnica.

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 02 de octubre de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS**: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Revisión de estrategias para aplicación de encuestas socioeconómicas - 02 de octubre de 2025:** Orientada a la definición de estrategias metodológicas, técnicas y operativas que permitan estructurar y coordinar de manera eficiente las reuniones requeridas para la formulación de los lineamientos del proceso de consulta previa.

Durante la sesión se analizaron los actores involucrados, los escenarios de participación y los mecanismos de articulación institucional y comunitaria, con el fin de garantizar un proceso concertado, incluyente y conforme a la normativa vigente.

□ **Reunión de avances volumen de urbanismo y reunión de estrategias para salida a campo - 02 de octubre de 2025:** Con el objetivo de revisar los avances correspondientes al volumen de urbanismo y definir las estrategias operativas para la próxima salida a campo. Durante la sesión se evaluaron los progresos técnicos del componente urbano, se identificaron aspectos pendientes por ajustar y se establecieron lineamientos logísticos y metodológicos que orientarán el desarrollo de las actividades en terreno, garantizando la articulación entre los equipos técnicos y de campo.

□ **Entrega del informe preliminar correspondiente al Volumen VIII – Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes y Otras Estructuras, y al Volumen X – Estudio de Diseño de Pavimento,** los cuales presentan los resultados iniciales del análisis geotécnico y estructural, así como las recomendaciones técnicas preliminares para el diseño de las obras proyectadas.

□ **Entrega del informe definitivo correspondiente al Volumen II – Estudio de Tránsito, Capacidad y Análisis de Servicio, y al Volumen IV – Estudio de Seguridad Vial,** los cuales consolidan la información recopilada, el análisis de los datos obtenidos en campo y las conclusiones técnicas respectivas, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en los términos de referencia del proyecto.

□ **Actividades en campo entre el 29 de septiembre y el 04 de octubre de 2025:**

Entre el 29 de septiembre y el 04 de octubre de 2025, un equipo de especialistas y profesionales de los componentes de topografía y ambiental (biología y forestales) realizaron actividades en campo orientadas a la recopilación de información técnica. Estas acciones tuvieron como objetivo identificar condiciones actuales, levantar información primaria específica y aportar insumos clave para la caracterización y análisis de cada componente, fortaleciendo la comprensión integral del proyecto y aportando elementos para su adecuada planificación y ejecución.

□ **Componente de Topografía:**

Se realizó la implantación física de los vértices en el terreno para la materialización de la poligonal, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados, garantizando su estabilidad, visibilidad y exactitud conforme a los parámetros establecidos para el levantamiento topográfico.
De manera complementaria, se está llevando a cabo el proceso de nivelación, con el propósito de determinar las diferencias de altura entre los puntos consecutivos que conforman la poligonal. Este procedimiento permite establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación, tomando como base un punto de referencia conocido, lo que asegura la precisión en la representación altimétrica del terreno.

Posteriormente, se realizó el levantamiento topográfico de la poligonal para obtener coordenadas mediante métodos de estación total, así como la toma de datos altimétricos para generar un modelo tridimensional del terreno, tomando como referencia los vértices previamente establecidos en campo. Para ello, se emplearon instrumentos de medición de alta precisión, garantizando la correcta georreferenciación de cada punto. Así mismo se realizó levantamiento topográfico de un tramo de la vía que conduce al corregimiento de El Cairo, comenzando desde el punto conocido como Cruce El Cairo. Esta actividad hace parte de las labores preliminares orientadas a la planificación y ejecución de futuras obras de infraestructura vial.

Adicionalmente, se procedió a establecer físicamente los mojones en el terreno, con el fin de lograr la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o la instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, abarcando el tramo comprendido desde el punto conocido como La Virgen (tramo 5) hasta un punto cercano a los límites entre los tramos 3 y 4.

Finalmente, se llevó a cabo el levantamiento de coordenadas para fines de georreferenciación, utilizando el par de receptores GNSS (GPS 19–19A y GPS 20–20A). El procedimiento se desarrolló mediante técnicas de posicionamiento diferencial, lo que permitió obtener datos confiables en tiempo real y asegurar la consistencia de la información espacial recolectada.

□ **Levantamiento de información del componente biótico y forestal – Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad:** En el marco del componente ambiental se llevaron a cabo actividades de levantamiento, registro y sistematización de información biológica y físico-natural, con el propósito de consolidar la línea base del área de estudio. Estas acciones incluyeron la recopilación de información primaria relacionada con suelos, vegetación forestal, plantas vasculares y no vasculares, aves, mamíferos, herpetofauna, insectos, comunidades hidrobiológicas e ictiología.

El proceso comprendió la identificación taxonómica preliminar, la descripción de características relevantes de cada grupo, la evaluación de su representatividad y patrones de distribución, así como la obtención de insumos necesarios para los análisis posteriores de diversidad, conservación y funcionalidad ecosistémica. La información recolectada fue organizada y consolidada como insumo técnico que servirá de soporte para la interpretación integral del medio biótico y su interacción con los demás componentes ambientales, asegurando un enfoque científico y riguroso en la valoración del territorio.

Entrega del informe definitivo del volumen II. Estudio de Tránsito, capacidad y análisis de Servicio, y Volumen IV. Estudio de Seguridad Vial, el cual consolida la información recopilada, el análisis de los datos obtenidos en campo y las conclusiones técnicas correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos en los términos de referencia del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de septiembre de 2025



Levantamieno de informacion Topografica




Levantamieno de informacion Topografica




Levantamieno de informacion Topografica



Levantamieno de informacion Topografica

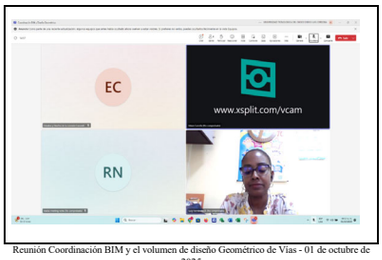

Reunión Coordinación BIM y el volumen de diseño Geométrico de Vías - 01 de octubre de 2025

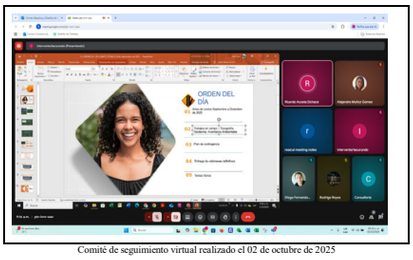

Comité de seguimiento virtual realizado el 02 de octubre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 02 de octubre de 2025



Revisión de estrategias para aplicación de encuestas socioeconómicas - 02 de octubre de 2025



Reunión de avances volumen de urbanismo y reunión de estrategias para salida a campo - 02 de octubre de 2025




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Suelos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Suelos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Suelos

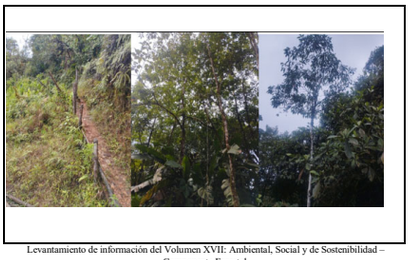

Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente Forestal



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente Forestal



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas No Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Aves




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Aves



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Aves



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Mamíferos




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Mamíferos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Herpetofauna



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Herpetofauna



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Herpetofauna




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Hidrobiológico



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Hidrobiológico



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Hidrobiológico



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Insectos



Levantamieno de informacion Topografica



Levantamieno de informacion Topografica



Levantamieno de informacion Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTORA DE CONSULTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 11/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 45 del 6 al 11 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.952.167.066,16	56,92%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.020.202.011,62	57,70%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ 68.034.945,46	0,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.952.167.066,16	56,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.020.202.011,62	57,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 68.034.945,46	0,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 760.657.328,62	8,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 721.343.328,62	8,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 56,92% Avance o Atraso Físico % 0,78%
Meta Física Ejecutada % 57,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%
					Ejec	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 28.200.000,00	0,32%
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 32.550.000,00	0,37%
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ 60.750.000,00	0,70%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 730.043.078,62			$ 730.043.078,62	8,39%
					Ejec	$ 629.979.078,62			$ 629.979.078,62	7,24%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Durante la semana se llevó a cabo la actualización del mapa de figuras de conservación en el corredor vial, incorporando la información más reciente sobre áreas protegidas, reservas forestales, zonas de manejo especial y demás figuras ambientales presentes en el área de influencia del proyecto, con el fin de garantizar la coherencia cartográfica y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

□**Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□**Comité de seguimiento virtual realizado el 06 de octubre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□**Reunión entre la Consultoría, Interventoría y el equipo del volumen de Topografía - 06 de octubre de 2025:** Encuentro realizado con el propósito de hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en campo, revisar el avance de los trabajos topográficos y analizar las recomendaciones y observaciones formuladas por las partes involucradas, con el fin de garantizar la calidad y coherencia de la información levantada.

□**Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025:** La Personería Municipal de San José del Palmar llevó a cabo una reunión con la participación de diferentes entidades oficiales y representantes del proyecto, con el propósito de realizar seguimiento al avance de las actividades en ejecución, revisar los compromisos previamente adquiridos y evaluar los aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con el desarrollo del proyecto.

Durante el encuentro se presentaron los principales avances obtenidos en campo, se socializaron las observaciones de las entidades asistentes y se definieron acciones de mejora y coordinación interinstitucional para fortalecer la gestión y cumplimiento de los objetivos establecidos.

□**Comité de seguimiento virtual realizado el 09 de octubre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□**Actividades en campo entre el 06 y el 11 de octubre de 2025** : Entre el 06 y el 11 de octubre de 2025, el equipo profesional del volumen de Topografía desarrolló actividades en campo enfocadas en la recopilación de información técnica necesaria para el avance de los estudios.

Estas labores incluyeron:

1.Levantamiento topográfico detallado mediante estación total, orientado a la obtención de datos de alta resolución que permitan representar con precisión las características del terreno y servir como base para los análisis y diseños posteriores

2.Ubicación precisa mediante georreferenciación de puntos de control previamente monumentados con GNSS RTK, con el fin de garantizar la exactitud espacial requerida para la vinculación del levantamiento topográfico al sistema de coordenadas oficial y asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos en campo.

3. Construcción e implementación de puntos de control topográfico mediante mojones, asegurando su adecuada materialización, estabilidad y visibilidad en el terreno. Estos puntos sirven como referencia permanente para las mediciones y verificaciones posteriores, garantizando la precisión y continuidad de l trabajos topográficos en la zona de estudio.

4. Construcción de trocha, Se llevo a cabo la apertura de trochas en dirección perpendicular al eje de la vía principal, con el propósito de facilitar el acceso al terreno y obtener información topográfica precisa. Estas trochas servirán para establecer puntos de control, efectuar mediciones detalladas y asegurar u adecuada caracterización del área de influencia del proyecto.

5. Levantamiento topográfico minucioso para la obtención de datos con alta resolución, ejecutado mediante el uso de instrumentos de precisión que permiten representar con exactitud las características físicas del terreno. Esta actividad tiene como objetivo generar información confiable y detallada para la elaboració de planos y el desarrollo de los análisis técnicos requeridos en las etapas posteriores del proyecto.

6.Establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, entre tramo (3) y parte de tramo (2).

7.Se determino a través de la nivelación y contra nivelación, las diferencias de altura entre puntos consecutivos a lo largo de los puntos que determinan la poligonal. Este procedimiento permite establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación.

□ **Coordinación logística para el ingreso a campo de los especialistas de la Consultoría:** Se coordinó el desplazamiento e ingreso al área de trabajo de los especialistas de la consultoría, con el propósito de supervisar las actividades en campo, desarrollar reuniones orientadas a la definición de lineamientos para la consulta previa y adelantar el levantamiento de información.

□**Entrega del informe definitivo del Volumen XIV. Estudio de Riesgos: E**l cual consolida la información recopilada, el análisis de los datos obtenidos en campo y las conclusiones técnicas correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos en los términos de referencia del proyecto.

□ **Entrega del informe preliminar del Volumen XIII. Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas:** Esta entrega tiene como objetivo presentar el desarrollo técnico del Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas. Este documento presenta los avances en el diagnóstico, diseño y proyección de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y redes secas

Asi mismo, presentar los resultados obtenidos hasta la fecha, facilitar la revisión técnica por parte de la interventoría y coordinar los ajustes necesarios para la consolidación del informe final, garantizando la coherencia con los demás componentes del proyecto de estudios y diseños.

□ **Reunión sobre el cargue de presupuesto en el software Quercusoft – 10 de octubre de 2025:** Se llevó a cabo una reunión técnica con el objetivo de revisar y coordinar el proceso de cargue del presupuesto en el software Quercusoft. Durante la sesión se verificaron los lineamientos, estructuras y formatos requeridos para la correcta integración de la información presupuestal en la plataforma, asegurando la coherencia con los componentes técnicos y financieros del proyecto.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 06 de octubre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 06 de octubre de 2025




Reunión entre la Consultoría, Interventoría y el equipo del volumen de Topografía - 06 de octubre de 2025




Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025




Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025

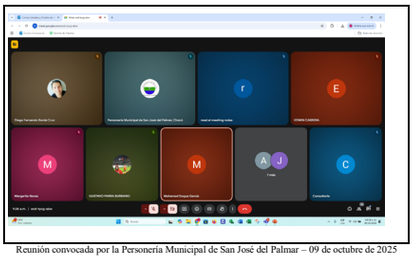

Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025

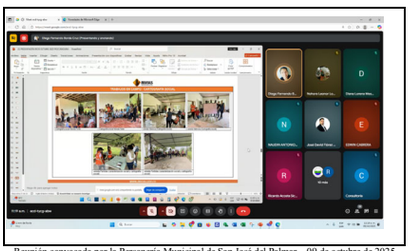

Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025

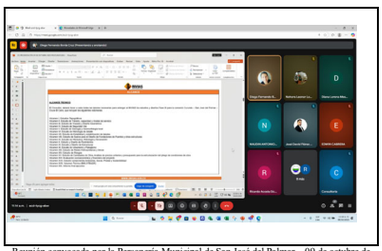

Reunión convocada por la Personería Municipal de San José del Palmar – 09 de octubre de 2025



Levantamiento de Infomacion Topografica




Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica




Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Reunión sobre el cargue de presupuesto en el software Quercusoft – 10 de octubre de 2025



Reunión sobre el cargue de presupuesto en el software Quercusoft – 10 de octubre de 2025

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTORA DE CONSULTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 46 del 13 al 18 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.712.824.394,77	65,66%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.676.255.196,23	65,24%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ (36.569.198,54)	-0,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.712.824.394,77	65,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.676.255.196,23	65,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (36.569.198,54)	-0,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 760.657.328,62	8,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 656.053.184,62	7,54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65,66% Avance o Atraso Físico % -0,42%
Meta Física Ejecutada % 65,24%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%
						Ejec	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoría por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)		Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024		Prog	$ 730.043.078,62			$ 730.043.078,62	8,39%
						Ejec	$ 625.438.934,62			$ 625.438.934,62	7,19%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Gestión administrativa: Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Revisión de información componente social, volumen 17 Actividad orientada al análisis, verificación y validación del contenido correspondiente al componente social del Volumen 17. Incluye la revisión de coherencia interna, consistencia de datos, pertinencia de la información frente a los objetivos del estudio, y la identificación de ajustes o complementos necesarios para garantizar la calidad técnica y metodológica del documento.

6nité de seguimiento virtual realizado el 15 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Universidad Tecnológica del Chocó, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se0 socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Coordinación logística para el ingreso a campo de los especialistas de la Consultoría: Se coordinó el desplazamiento e ingreso al área de trabajo de los especialistas de la consultoría, con el propósito de supervisar las actividades en campo y la identificación de sitios estratégicos para desarrollos urbanísticos.

Capacitación para la toma de información socioeconómica – 15 de octubre de 2025: Se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al equipo social y técnico, con el propósito de fortalecer las competencias en la aplicación de herramientas para la recolección y análisis de información socioeconómica en campo.

Durante la sesión se socializaron los instrumentos metodológicos diseñados para el levantamiento de datos, así como los protocolos de registro, verificación y sistematización de la información. Igualmente, se enfatizó en los lineamientos éticos y en las estrategias de relacionamiento comunitario que deben aplicarse durante las actividades de campo, garantizando la calidad, pertinencia y confiabilidad de los datos obtenidos.

Ingreso a campo de los especialistas de Urbanismo y Paisajismo, y de los volúmenes de Estructuras, Hidráulica, Geotecnia, junto con el Coordinador Técnico – 16 de octubre de 2025: Se llevó a cabo el ingreso al área de estudio por parte de los especialistas de Urbanismo y Paisajismo, así como de los profesionales responsables de los volúmenes de Estructuras, Hidráulica y Geotecnia, en compañía del Coordinador Técnico de la consultoría.
Durante la jornada, los especialistas de Urbanismo y Paisajismo realizaran la identificación de sitios estratégicos para desarrollos urbanísticos. De manera complementaria, los equipos técnicos verificaran en terreno las condiciones geotécnicas, hidráulicas y estructurales del entorno, con el fin de articular los criterios de diseño y consolidar una visión integral del área de intervención. Esta actividad permitirá fortalecer la articulación interdisciplinaria y avanzar en la definición de criterios técnicos para el desarrollo de los estudios y diseños.

Actividades en campo entre el 13 y el 18 de octubre de 2025: Entre el 13 y el 18 de octubre de 2025, el equipo profesional del volumen de Topografía desarrolló actividades en campo enfocadas en la recopilación de información técnica necesaria para el avance de los estudios.
Estas labores incluyeron:
1.Determinar las diferencias de altura entre puntos consecutivos que conforman la poligonal, empleando técnicas de nivelación geométrica directa y contra nivelación. Este método permite obtener valores precisos de desnivel entre estaciones, garantizando la confiabilidad del perfil altimétrico del trazado.

Este proceso es fundamental para garantizar la precisión en el modelado topográfico, el diseño de obras civiles y la integración con sistemas de información geográfica (SIG).

2. Se llevó a cabo la ubicación estratégica e instalación de mojones o hitos que servirán como vértices de la poligonal, con el fin de establecer puntos de referencia estables y duraderos para el levantamiento topográfico. Estos elementos físicos permiten garantizar la precisión geométrica y la trazabilidad del proyecto c campo.

El procedimiento incluyó; Materialización de los mojones mediante elementos resistentes (concreto, PVC reforzado, otros), debidamente marcados y numerados.

3. Apertura de trochas en dirección perpendicular al eje de la vía principal, con el propósito de habilitar accesos estratégicos que permitieran la exploración detallada del terreno y la recopilación precisa de información topográfica. Estas trochas facilitaron el desplazamiento del personal y el posicionamiento de l equipos, optimizando la cobertura espacial del levantamiento.

Recorrido en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoría: Se desplazaron hasta el punto conocido como la quebrada el socorro en tramo 2, con el objetivo de iniciar desde dicho punto un recorrido de reconocimiento del estado de la vía, hasta el punto conocido como cruce el Cairo en tramo 5, entre pares de especialistas de ambas partes. Además, se realizo en el corregimiento de San Pedro de Ingará reunión entre el personal de la consultoría y el personal de la Interventoría,

En dicha reunión se hizo la presentación ya que había personal nuevo tanto de la consultoría como de la interventoría, luego se procedió con el desarrollo de la reunión que consistió en una serie de preguntas por parte de la interventoría a cerca de los avances del proyecto por parte de la consultoría en cada uno de los volúmenes que conforman el proyecto y las respuestas a satisfacción de los profesionales de la consultoría, ya queo hubo mayores recomendaciones por la contra parte.

Terminada la reunión y mermado el fuerte aguacero que se presentaba, se procedió a seguir el recorrido de reconocimiento de cuatro (4) puntos críticos que se encuentran en la vía, entre tramo (4) y tramo (5).

Recorrido y mesa de trabajo en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoría: Se llevó a cabo un desplazamiento hasta el punto conocido como la quebrada El Socorro, ubicado en el tramo 2, con el propósito de iniciar desde allí un recorrido de reconocimiento y verificación del estado actual de la vía hasta el Cruce El Cairo, correspondiente al tramo 5. Esta actividad se desarrolló de manera conjunta entre los especialistas de la Consultoría y la Interventoría, con el fin de identificar condiciones físicas, avances y posibles afectaciones presentes en el corredor vial.

Durante el recorrido, se realizó una verificación técnica de los cuatro puntos críticos localizados entre los tramos 4 y 5, observando aspectos relacionados con la estabilidad del terreno, drenaje, estado de la carpeta de rodadura y condiciones de accesibilidad.

Finalmente, se efectuó una reunión técnica de trabajo en el corregimiento de San Pedro de Ingará, con la participación de representantes de ambas entidades, con el propósito de analizar los avances del proyecto, revisar las observaciones de campo y discutir aspectos específicos de cada uno de los volúmenes técnicos que componen los estudios y diseños del proyecto vial.
Reunión BIM – 18 de octubre de 2025: Se realizo mesa de trabajo con el objetivo de crear el usuario en la plataforma Autodesk


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Universidad Tecnológica del Chocó



Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Universidad Tecnológica del Chocó




Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Universidad Tecnológica del Chocó




Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Universidad Tecnológica del Chocó



Capacitación para la toma de información socioeconómica – 15 de octubre de 2025



Reunión BIM – 18 de octubre de 2025



Reunión BIM – 18 de octubre de 2025



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Recorrido y mesa de trabajo en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoria



Recorrido y mesa de trabajo en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoria



Recorrido y mesa de trabajo en el área de influencia del proyecto por parte de los profesionales de la Consultoría e Interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTORA DE CONSULTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDLY STELLA RENTERIA MENA

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 25/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 47 del 20 al 25 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.477.481.723,39	74,45%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.332.308.380,85	72,79%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ (145.173.342,54)	-1,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.477.481.723,39	74,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.332.308.380,85	72,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (145.173.342,54)	-1,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 764.657.328,62	8,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 693.770.294,62	7,97%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 74,45% Avance o Atraso Físico % -1,67%
Meta Física Ejecutada % 72,79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%
					Ejec	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 41.400.000,00	0,48%
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ 41.400.000,00	0,48%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 734.043.078,62			$ 734.043.078,62	8,44%
					Ejec	$ 621.756.044,62			$ 621.756.044,62	7,15%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□**Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□ **Reunión sobre la distribución de comunidades para la aplicación de encuestas del volumen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto – 20 de octubre de 2025:** Se realizó la planificación y asignación de las comunidades a cubrir por parte del equipo de trabajo, con el fin de garantizar una distribución equitativa y eficiente para la aplicación de las encuestas socioeconómicas. La actividad permitió definir los sectores, rutas y responsables por comunidad, asegurando una adecuada cobertura del área de influencia del proyecto y facilitando la recolección de información representativa para el análisis socioeconómico y financiero.

□ **Ingreso a campo de los profesionales de la Consultoría para la toma de encuestas de la evaluación socioeconómica – 21 de octubre de 2025:** Se realizó el ingreso al área de estudio por parte de los profesionales de la Consultoría, con el propósito de efectuar la toma de muestras correspondientes a las encuestas de la evaluación socioeconómica.

□ **Comite de Seguimiento:** El 23 de octubre de 2025. Se realizó de manera presencial el Comité de Seguimiento mensual, con la participación del equipo de la consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en las instalaciones de esta entidad en la ciudad de Bogotá: Durante la jornada se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría, adicionalmente se establecio la proyección de las actas de costo, disminuir el % de amorttización en las actas de septiembre y octubre y aumentarlo en la de noviembre para así no queden los recurso en vigencia expirada.

□**Elaboración del acta de costos de octubre:** Se elaboró el acta de costo de octubre, registrando los gastos para reflejar de manera precisa la distribución de costos y facilitar el control financiero del proyecto.

Entrega del Informe Preliminar del Volumen I - Topografia: Se entregó el informe preliminar del volumen I de topografia el cual incluye, el seguimiento de la materialización de los mojones para red de georreferenciación, el trazado de la poligonal, el informe de los mojones base para el proyecto, y nivelación en un 30 % en la poligonal.

□**Actividades en campo entre el 20 y el 25 de octubre de 2025: Entre el 20 y el 25 de octubre de 2025**, los equipos profesionales de los volúmenes de Topografia, Seguridad Vial y Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto realizaron actividades en campo orientadas a la recolección de información técnica necesaria para el avance de los estudios.

Estas labores incluyeron:

Topografia.

□Se realizó levantamiento y posicionamiento geodésico para la georreferenciación del par de estaciones, empleando técnicas de posicionamiento satelital de alta precisión. Equipo empleado, GNSS RTK.

□Se realizó la georreferenciación para triangulación con las bases Quibdó y Zarzal en los mojones materializados con placas GPS–18, GPS–18A, GPS–19 y GPS–19A, con el fin de establecer el control geodésico del proyecto y garantizar la precisión en la ubicación de los puntos de referencia.

□ En el tramo cinco (5) se determinaron las diferencias de altura entre puntos consecutivos que conforman la poligonal, empleando técnicas de nivelación geométrica directa y contra nivelación. Este método permite obtener valores precisos de desnivel entre estaciones, garantizando la confiabilidad del perfil altimétrico del trazado.

Las actividades de nivelación y contra nivelación se llevaron a cabo entre las abscisas K95+800 – K93+500

En el tramo tres (3), Se llevo a cabo la ubicación estratégica e instalación de mojones o hitos, que servirán como vértices de la poligonal, con el fin de establecer puntos de referencia estables y duraderos para el levantamiento topográfico.Estos elementos físicos permiten garantizar la precisión geométrica y la trazabilidad del proyecto en campo.

El procedimiento incluyó:

1.Materialización de los mojones mediante elementos resistentes (concreto, PVC reforzado, otros), debidamente marcados y numerados.
2.Materialización de la poligonal en campo del K76+000 – K71+500.

□Se continuaron las labores de apertura de trochas en dirección perpendicular al eje de la vía principal, con el fin de habilitar accesos estratégicos que permitieran la inspección detallada del terreno y la obtención de información topográfica con mayor precisión.

Volúmen Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto

El 21 de octubre de 2025, en la cabecera municipal de San José del Palmar, se llevó a cabo una breve inducción a cargo del especialista del Volumen, cuyo objetivo fue contextualizar al grupo de apoyo sobre los lineamientos metodológicos y operativos del trabajo de campo.

El 22 de octubre de 2025, se inició el levantamiento premuestral en distintos sectores de la cabecera municipal. Estas encuestas, de carácter exploratorio, sirvieron como muestra piloto para validar el instrumento y ajustar la estrategia de recolección de datos.
Posteriormente, se seleccionó la muestra definitiva y se procedió a la toma de muestras, las cuales se desarrollarán en las comunidades del corredor vial y durarán hasta el 29 de octubre de 2025.

Seguridad Vial

Se realizó la inspección del corredor vial para evaluar el estado del pavimento, las señalizaciones verticales y horizontales, y las condiciones generales de seguridad. Durante la revisión se identificaron grietas, baches y problemas en el drenaje. Los hallazgos permitieron determinar el nivel de deterioro y planificar las acciones de mantenimiento necesarias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Distribución de comunidades para la aplicación de encuestas del volumen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto – 20 de octubre de 2025



Distribución de comunidades para la aplicación de encuestas del volumen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto – 20 de octubre de 2025



Comité de seguimiento realizado el 23 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Ciudad de Bogotá



Comité de seguimiento realizado el 23 de octubre de 2025, modalidad presencial en la Ciudad de Bogotá



Inducción sobre encuentas del Volumen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del proyecto



Aplicación de Pre-Encuestas para el Volúmen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del Proyecto



Consolidado para Encuestas definitivas para el Volúmen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del Proyecto



Encuestas para el Volúmen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del Proyecto



Encuestas para el Volúmen de Evaluación Socioeconómica y Financiera del Proyecto



Levantamiento de Información del volumen de SV



Levantamiento de Información del volumen de SV



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA
	FIRMA NOMBRE: EDLA STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 10.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	90723315	$ 768.000	Colpensiones	90723315	$ 1.044.700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 458.100	V	NUEVA EPS	9493270221	$ 822.700	Colpensiones	9493270221	$ 1.119.000	$ 263.300	$ -	$ 197.500	
3	BERTONIS RENTERIA VALENCIA	11.811.142	RESIDENTE DE CAMPO	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9493270221	$ 731.300	Colpensiones	9493270221	$ 994.600	$ 234.000		$ 175.500	
4	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	1010190981	COORDINADOR BIM SIG	$ 7.160.050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 45.000	V	COMPENSAR EPS	90947108 - 90593626	$ 538.100	Colpensiones	90947108 - 90593626	$ 688.700	$ 25.900			
5	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 909.900	V	NUEVA EPS	9493270221	$ 1.634.200	Colpensiones	9493270221	$ 2.222.500	$ 523.000	$ -	$ 392.200	
6	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	90943980	$ 603.400	Colpensiones	90943980	$ 772.400		$ -		
7	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.890.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 304.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9493270221	$ 547.100	Porvenir	9493270221	$ 700.200	$ 175.100	$ -	$ 131.300	
8	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 3.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 128.300	V	NUEVA EPS	9493349247	$ 230.300	Porvenir	9493349247	$ 294.800		$ -		
9																																											
10																																											
11																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	21/10/2025	90723315	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	21/10/2025	90723315	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C54256750	PINO PINO JUANA MARIA	06/04/2011		222Y2391	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C12020854	QUINTO MOSQUERA HARLEY	12/03/2012		A28M7133	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35891192	MOSQUERA MURILLO ZULEYMA	01/10/2012		17618414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11807170	VALOIS CUESTA HAMLETH	18/01/2010		1779X222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C19259580	BARRIOS MATURANA FRANKLIN	01/06/2002		207141DP	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11800408	SANABRIA BOTERO JULIO RICARDO	01/07/2010		29144168	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35851298	RENTERIA MORENO ELSY JOSEFA	05/04/2024		15344302	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	01/01/2015		183Q9126	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	01/04/2019		22319724	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539349

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:55:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1883864313	9493270221	E	2025/11/25	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,516,300						$4,110,300	
																				$480,000						$375,000	
																				$480,000						$375,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
																				$5,036,300						$3,735,300	
																				$5,036,300						$3,735,300	
						$6,581,250	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$6,581,250	16%	SIN RIESGO	$1,053,000	$0	$0	$33,000	$33,000	$0	$1,119,000		NUEVA E.P.S.	30	$6,581,250	12.5%	$822,700	
						$4,376,250	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,376,250	16%	SIN RIESGO	$700,200	$0	$0	$0	$0	$0	$700,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$4,376,250	12.5%	$547,100	
						$13,073,125	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$13,073,125	16%	SIN RIESGO	$2,091,700	$0	$0	$65,400	$65,400	$0	$2,222,500		NUEVA E.P.S.	30	$13,073,125	12.5%	$1,634,200	
						$5,850,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,850,000	16%	SIN RIESGO	$936,000	$0	$0	$29,300	$29,300	$0	$994,600		NUEVA E.P.S.	30	$5,850,000	12.5%	$731,300	
																				$5,516,300						$4,110,300	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,110,300						$1,315,400						$2,111,200				$0		$986,500		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$31,400				$0		$90,000		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$31,400				$0		$90,000		$0		$0	
$0	$375,000		COMFACHOCÓ	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	1.044%	2	$31,400	30	$3,000,000	0%	$0	3%	$90,000	0%	$0	0%	$0	No
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
$0	$822,700		COMFACHOCÓ	30	$6,581,250	4%	$263,300	ARL SURA	30	$6,581,250	6.96%	5	$458,100	30	$6,581,250	0%	$0	3%	$197,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$547,100		COMFACHOCÓ	30	$4,376,250	4%	$175,100	ARL SURA	30	$4,376,250	6.96%	5	$304,600	30	$4,376,250	0%	$0	3%	$131,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$1,634,200		COMFACHOCÓ	30	$13,073,125	4%	$523,000	ARL SURA	30	$13,073,125	6.96%	5	$909,900	30	$13,073,125	0%	$0	3%	$392,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$731,300		COMFACHOCÓ	30	$5,850,000	4%	$234,000	ARL SURA	30	$5,850,000	6.96%	5	$407,200	30	$5,850,000	0%	$0	3%	$175,500	0%	$0	0%	$0	No
	$4,110,300						$1,315,400						$2,111,200				$0		$986,500		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1883864313	9493270221	E	2025/11/25	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$5,516,300	$0	$0	$5,516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,336,100	$0	$0	$4,336,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$700,200	$0	$0	$700,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$4,110,300	$0	$0	$4,110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$3,188,200	$0	$0	$3,188,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$986,500	$0	$0	$986,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				5	$14,039,700	$0	$0	$14,039,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	10/10/2025	90593626	$458.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	243.200	0	0	0	0	0	0		243.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.900				15.900	0	0	15.900			159	15.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.200	0	0	9.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	190.000
Pensión	1	243.200	243.200
Riesgos Laborales	1	15.900	15.900
CCF	1	9.200	9.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	458.300	458.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA		Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	10/10/2025	90593626	$458.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010190981	CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO	57	0			N																	25-14	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS008	1.520.000	190.000	14-23	1.520.000	2	15.900	CCF24	1.520.000	9.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
90593626	10/10/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	N	29/10/2025	90947108	$839.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	348.100	0		0		0	0	0	0	348.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	445.500	0	0	0	0	0	0		445.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.100				29.100	0	0	29.100			291	29.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	16.700	0	0	16.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	348.100	348.100
Pensión	1	445.500	445.500
Riesgos Laborales	1	29.100	29.100
CCF	1	16.700	16.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	839.400	839.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
90593626	10/10/2025	N	29/10/2025	90947108	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10				$839.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010190981	CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO	57	0			N																	25-14	4.304.080	688.700	0	0	0	0	EPS008	4.304.080	538.100	14-23	4.304.080	2	45.000	CCF24	4.304.080	25.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	28/10/2025	90943980	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	28/10/2025	90943980	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	01/06/2002		I1622521	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539471

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1883084705	9493349247	I	2025/11/05	2025/10/28	NEQUI	0	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
1	CC	1112789406	GOMEZ JEISON	230301	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	$128,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1883084705	9493349247	I	2025/11/05	2025/10/28	NEQUI	0	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$0	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$0	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$0	$0	$128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$0**	**$0**	**$653,400**

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3.200.000.000,00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5.500.000.000,00	$ -
							$ -
							$ -
			TOTAL			**$ 8.700.000.000,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.700.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4.350.000.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500,000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.301.889.000,00	$ 8.603.778.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.253.778.000,00	$ 8.507.556.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.161.217.000,00	$ 8.322.434.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	**MARZO 2025**	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.043.433.000,00	$ 8.086.866.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
5	**ABRIL 2025**	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.986.370.000,00	$ 7.972.740.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
6	**MAYO 2025**	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.895.124.000,00	$ 7.790.248.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
7	**JUNIO 2025**	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.817.100.024,00	$ 7.634.200.048,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
8	**JULIO 2025.**	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.683.690.824,00	$ 7.367.381.648,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
9	**AGOSTO 2025**	$ 1.958.563.885,74		$ 3.291.182.237,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.704.408.881,13	$ 5.408.817.762,26		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
10	**SEPTIEMBRE 2025**	$ 873.915.077,01		$ 4.165.097.314,75	$ 349.566.030,81	$ 524.349.046,21	$ 2.354.842.850,32	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.180.059.834,92	$ 4.534.902.685,25		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
11	**OCTUBRE 2025**	$ 3.042.224.041,15		$ 7.207.321.355,90	$ 1.216.889.616,46	$ 1.825.334.424,69	$ 1.137.953.233,86	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 354.725.410,23	$ 1.492.678.644,10		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
TOTALES		**$ 7.207.321.355,90**		**$ 7.207.321.355,90**	**$ 3.212.046.766,14**	**$ 3.995.274.589,77**	**$ 1.137.953.233,86**		**$ 354.725.410,23**	**$ 1.492.678.644,10**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 185.122.000,00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 235.568.000,00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 114.126.000,00
ACTA N°6 MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 182.492.000,00
ACTA N°7 JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 156.047.952,00
ACTA N°8 JULIO 2025	$ 266.818.400,00		$ 266.818.400,00
ACTA N°9 AGOSTO 2025	$ 1.958.563.885,74		$ 1.958.563.885,74
ACTA N°10 SEPTIEMBRE 2025	$ 873.915.077,01		$ 873.915.077,01
ACTA N°11 OCTUBRE 2025	$ 3.042.224.041,15		$ 3.042.224.041,15
	$ -		
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 7.207.321.355,90**		**$ 7.207.321.355,90**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	15	24	22	21	22	18	23	20	22	24	24	24	19	23	20	22	23	24	17	18	22	17	22	24	18	20	24	18	20	658
Lluvias moderadas	0	0	9	0	2	3	2	5	1	3	2	0	0	0	5	1	4	2	1	0	7	2	2	7	2	0	5	4	0	5	4	78
Lluvias intensas								1		1												4					1			1		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Bertonis Renteria V.
Nombre BERTONIS RENTERIA ALENCIA
Residente de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 011037-057907 ANT

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	23	12	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	23	12	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	23	12	2024	1	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/02/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 3002762 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/04/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EDNY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA Nº
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
26	11	2024	EXPEDICIÓN	0			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
MONEDA Pesos														
TIPO CAMBIO 1,00	17	17	26	11	2024	7	11	2024	00:00	31	12	2029	00:00	1880

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1. CONTADO	$9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	07/11/2024	01/05/2025	1.251.369,86
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	07/11/2024	01/05/2025	6.256.849,32
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	07/11/2024	01/01/2028	16.446.575,34
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2024	31/12/2029	39.150.000,00

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***63.104.794,52
GASTOS	$********9.999,99
IVA	$***11.991.810,96
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***75.106.605,47

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/FacturaPrevisora/portaledquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

28/11/2024 16:58:55

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAVÍA DE SEGUROS		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN	0

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

Escaneado con CamScanner

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 3002762 **CERTIFICADO No.** 0

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
CUMPLIMIENTO	QUIBDO

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$63.104.794,52	$11.991.810,96	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
26/11/2024	$*******9.999,99	$***63.104.794,52	$***11.991.810,96				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO:
1. CONTADO

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $75106605,00

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	26/11/2024	$*******9.999,99	$***63.104.794,52	$***11.991.810,96					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3002762	CUMPLIMIENTO	0	$9.570.000.000,00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de QUIBDO a los 26 días del mes de noviembre de 2024

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA Nº
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
26	12	2024	MODIFICACIÓN	4			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
QUIBDO	17	17	26	12	2024	23	12	2024	00:00	31	12	2030	00:00	2199

MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1. CONTADO	$9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	3.923.342,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	19.616.712,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	23/12/2024	01/01/2029	6.960.000,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2025	31/12/2030	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***30.500.054,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$****5.795.010,26
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***36.295.064,26

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://lfacturaseguros.transfiriendo.com/lFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el Estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

26/12/2024 14:40:12

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAVÍA DE SEGUROS		

Powered by CamScanner

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	4

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS, DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024, AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 4227 DE 2024, REALIZA EL AJUSTE Y/O DESPLAZAMIENTO DE LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS.

.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.030.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

Powered by CamScanner

PÓLIZA N°
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
6	6	2025	MODIFICACIÓN	5			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
QUIBDO	17	17	6	6	2025	5	6	2025	00:00	31	12	2030	00:00	2035

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1,00

CARGAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

FORMA DE PAGO: 1. CONTADO

VALOR ASEGURADO TOTAL: $9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	0,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	0,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	23/12/2024	01/01/2029	0,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2025	31/12/2030	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$**********0,00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

06/06/2025 15:34:04

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAYÍA DE SEGUROS		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	5

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS, EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION, PARA HACER CONSTAR QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2025 Y ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2025.

.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.030.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 03/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1- ABRIL	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	300,000,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00			$ 787,390,000.00	18.10%
2	Viaticos personal de consultoria	44,250,000.00	75,700,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00			$ 195,650,000.00	4.50%
3	Adquisición de información secundaria	15,000,000.00	15,000,000.00					$ 30,000,000.00	0.69%
4	Levantamiento topografico	30,000,000.00	30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		$ 210,200,000.00	4.83%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		220,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00		$ 900,000,000.00	20.69%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	440,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	67,569,600.00	$ 1,994,160,000.00	45.84%
7	Toma de información de transito	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				$ 45,000,000.00	1.03%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)	120,000,000.00	50,000,000.00					$ 170,000,000.00	3.91%
9	Campamento	4,400,000.00	8,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			$ 17,600,000.00	0.40%
	TOTAL	**$ 528,650,000.00**	**$ 1,727,220,400.00**	**$ 926,380,000.00**	**$ 720,180,000.00**	**$ 380,000,000.00**	**$ 67,569,600.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Renteria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (In meses según contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 2/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%	10,94%	% P	1,11%		1,11%	1,11%	1,11%	1,11%		1,35%	1,35%	1,35%		1,35%	1,35%	1,35%	1,46%	1,34%	
	$ 1.430.754.000,00	16,45%	$ 951.630.000,00	$ P	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00		$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00		$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.284.000,00	$ 116.590.000,00	
				$ E	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.568.000,00	$ 93.576.000,00		$ 127.284.000,00	$ 122.284.000,00	$ 117.776.000,00		$ 117.776.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1,11%		1,11%	1,11%	1,00%	1,22%		1,46%	1,40%	1,24%		1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																					
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,04%	% P				0,04%									0,48%	0,28%			
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 3.450.000,00	$ P	$ -			$ 3.450.000,00									$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00			
				$ E	$ -			$ 3.450.000,00									$ -	$ -			
				% E				0,04%									0,00%	0,00%			
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,03%	% P				0,03%					0,41%				0,24%				
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 3.000.000,00	$ P	$ -			$ 3.000.000,00					$ 36.000.000,00				$ 21.000.000,00				
				$ E	$ -			$ 3.000.000,00					$ 36.000.000,00				$ -				
				% E				0,03%					0,41%				0,00%				
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	1,23%	% P				0,09%	1,14%									0,66%			
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ 107.250.000,00	$ P	$ -			$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00									$ 57.750.000,00			
				$ E	$ -			$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00									$ -			
				% E				0,09%	1,14%									0,00%			
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,02%	% P				0,02%						0,29%				0,17%			
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 2.100.000,00	$ P	$ -			$ 2.100.000,00						$ 25.200.000,00				$ 14.700.000,00			
				$ E	$ -			$ 2.100.000,00						$ 25.200.000,00				$ -			
				% E				0,02%						0,29%				0,00%			
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	0,06%	% P					0,06%					0,73%			0,43%				
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ 5.300.000,00	$ P	$ -				$ 5.300.000,00					$ 63.600.000,00			$ 37.100.000,00				
				$ E	$ -				$ 5.300.000,00	$ -				$ 63.600.000,00			$ -				
				% E					0,06%					0,73%			0,00%				
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,07%	% P					0,07%							0,86%		0,50%			
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ 6.250.000,00	$ P	$ -				$ 6.250.000,00							$ 75.000.000,00		$ 43.750.000,00			
				$ E	$ -				$ 6.250.000,00							$ 75.000.000,00		$ -			
				% E					0,07%							0,86%		0,00%			
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	0,21%	% P				0,21%								2,54%		1,46%			
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ 18.400.000,00	$ P	$ -			$ 18.400.000,00								$ 220.800.000,00		$ 128.800.000,00			
				$ E	$ -			$ 18.400.000,00								$ 220.800.000,00		$ -			
				% E				0,21%								2,54%		0,00%			
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	0,14%	% P				0,14%									1,62%	0,93%			
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 11.750.000,00	$ P	$ -			$ 11.750.000,00									$ 141.000.000,00	$ 82.250.000,00			
				$ E	$ -			$ 11.750.000,00									$ -	$ -			
				% E				0,14%									0,00%	0,00%			
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	0,11%	% P				0,11%								1,31%		0,76%			
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 9.500.000,00	$ P	$ -			$ 9.500.000,00								$ 114.000.000,00		$ 66.500.000,00			
				$ E	$ -			$ 9.500.000,00								$ 114.000.000,00		$ -			
				% E				0,11%								1,31%		0,00%			
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,04%	% P					0,04%								0,50%	0,29%			
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ 3.650.000,00	$ P	$ -				$ 3.650.000,00								$ 43.800.000,00	$ 25.550.000,00			
				$ E	$ -				$ 3.650.000,00								$ -	$ -			
				% E					0,04%								0,00%	0,00%			
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	0,28%	% P				0,28%								3,32%		1,94%			
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ 24.050.000,00	$ P	$ -			$ 24.050.000,00								$ 288.600.000,00		$ 168.350.000,00			
				$ E	$ -			$ 24.050.000,00								$ 288.600.000,00		$ -			
				% E				0,28%								3,32%		0,00%			
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,03%	% P					0,03%							0,39%		0,23%			
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ 2.850.000,00	$ P	$ -				$ 2.850.000,00							$ 34.200.000,00		$ 19.950.000,00			
				$ E	$ -				$ 2.850.000,00							$ 34.200.000,00		$ -			
				% E					0,03%							0,39%		0,00%			
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,03%	% P					0,03%								0,32%	0,19%			
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 2.350.000,00	$ P	$ -				$ 2.350.000,00								$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00			
				$ E	$ -				$ 2.350.000,00								$ -	$ -			
				% E					0,03%								0,00%	0,00%			
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	0,05%	% P					0,05%							0,64%		0,37%			
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ 4.650.000,00	$ P	$ -				$ 4.650.000,00							$ 55.800.000,00		$ 32.550.000,00			
				$ E	$ -				$ 4.650.000,00							$ 55.800.000,00		$ -			
				% E					0,05%							0,64%		0,00%			
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,03%	% P				0,03%								0,39%		0,23%			
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 2.800.000,00	$ P	$ -			$ 2.800.000,00								$ 33.600.000,00		$ 19.600.000,00			
				$ E	$ -			$ 2.800.000,00								$ 33.600.000,00		$ -			
				% E				0,03%								0,39%		0,00%			
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,03%	% P					0,03%								0,37%	0,22%			
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 2.700.000,00	$ P	$ -				$ 2.700.000,00								$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00			
				$ E	$ -				$ 2.700.000,00				$ -				$ -	$ -			
				% E					0,03%								0,00%	0,00%			
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	0,24%	% P				0,00%	0,24%							2,92%		1,70%			
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ 21.150.000,00	$ P	$ -				$ 21.150.000,00							$ 253.800.000,00		$ 148.050.000,00			
				$ E	$ -				$ 21.150.000,00				$ -			$ 253.800.000,00		$ -		$ -	
				% E				0,00%	0,24%							2,92%		0,00%			
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,00%	% P				0,03%								0,32%		0,19%			
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ 2.300.000,00								$ 27.600.000,00		$ 16.100.000,00			
				$ E	$ -		$ -	$ 2.300.000,00								$ 27.600.000,00		$ -			
				% E				0,03%								0,32%		0,00%			
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.755.432.000,00	66,15%	0,00%	% P	0,01%		0,01%	0,01%	0,01%	0,09%		0,65%	0,32%	0,39%		8,50%	5,01%	33,81%	2,83%	1,33%	
	$ 4.579.246.000,00	52,64%	$ -	$ P	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00		$ 56.408.000,00	$ 27.863.952,00	$ 34.042.400,00		$ 743.912.785,54	$ 436.245.600,00	$ 2.924.172.314,46	$ 228.417.448,00	$ 115.833.500,00	
				$ E	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00		$ 56.408.000,00	$ 27.863.952,00	$ 34.042.400,00		$ 743.912.785,54	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,02%		0,02%	0,04%	0,01%	0,09%		0,65%	0,32%	0,39%		8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**13,60%**																		
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**$ 1.182.830.000,00**																		

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1,12%		1,12%	2,10%	2,82%	1,20%		2,00%	3,10%	1,74%		22,59%	10,33%	45,12%	4,09%	2,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00		$ 97.322.000,00	$ 182.922.000,00	$ 245.222.000,00	$ 104.472.000,00		$ 174.038.000,00	$ 269.993.952,00	$ 151.672.400,00		$ 1.964.942.785,54	$ 898.775.600,00	$ 3.926.202.314,46	$ 355.701.448,00	$ 232.413.500,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,12%		2,24%	4,34%	7,16%	8,36%		10,36%	13,46%	15,21%		37,79%	48,12%	93,34%	97,35%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00		$ 194.644.000,00	$ 377.566.000,00	$ 622.788.000,00	$ 727.260.000,00		$ 901.298.000,00	$ 1.171.291.952,00	$ 1.322.964.352,00		$ 3.287.907.137,54	$ 4.186.682.737,54	$ 8.111.885.052,00	$ 8.467.586.500,00	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,11%		1,11%	2,13%	2,71%	1,31%		2,10%	3,23%	0,00%		22,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 183.122.000,00	$ 235.568.000,00	$ 114.128.000,00		$ 182.492.000,00	$ 280.847.952,00	$ 142.618.400,00		$ 3.208.534.949,10	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%		2,21%	4,34%	7,05%	8,36%		10,46%	13,69%	15,32%		37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00		$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 613.134.000,00	$ 727.260.000,00		$ 909.752.000,00	$ 1.190.599.952,00	$ 1.332.618.352,00		$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de consultoría oroarmada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de consultoría.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: EDLY STELLA BENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: [illegible] SANCHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 91193 - 0234 CPITVC

Revisó Firma:
Nombre: JANNER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Nombre: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.: 1106-0841 CPITV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA de la OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1 de 1 | CÓDIGO: MEPI-MNV-IN-6-FR-2 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 11 **DE** ____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA: $ 1.958.564.949,10

SEGUIMIENTO No. 11
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIDO) DE LA CONEXION CURUNDO - SAN JOSE DEL PALMAR - CRUCERO EL CARO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/2/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA / VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%	13,69%	% P	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,46%	1,34%	
	$ 1.430.754.000,00	16,45%	$ 1.190.944.680,00	$ P	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.284.000,00	$ 116.560.000,00	
				$ E	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	$ 104.472.000,00	
				% E	1,11%	1,11%	1,11%	1,00%	1,22%	1,46%	1,46%	1,24%	1,24%	1,31%	1,44%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 – COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,52%	% P			0,04%							0,49%	0,28%			
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 44.850.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 3.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 3.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00	$ -	$ -	
				% E			0,04%							0,48%	0,28%			
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,69%	% P			0,03%				0,41%			0,24%				
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 60.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.000.000,00	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.000.000,00	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%				0,41%			0,24%				
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	1,23%	% P			0,09%	1,14%							0,68%			
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ 107.250.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.100.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,09%	1,14%							0,77%			
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,48%	% P			0,02%				0,29%				0,17%			
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 42.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 25.200.000,00	$ -	$ -	$ 14.700.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 25.200.000,00	$ -	$ -	$ 14.700.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,02%				0,29%			0,17%				
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	1,22%	% P				0,06%			0,73%			0,43%				
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ 106.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 5.300.000,00	$ -	$ -	$ 63.600.000,00	$ -	$ -	$ 37.100.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 5.300.000,00	$ -	$ -	$ 63.600.000,00	$ -	$ -	$ 37.100.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,06%			0,73%			0,43%				
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,93%	% P				0,07%					0,86%	0,00%	0,00%			
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ 81.250.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ 43.750.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,07%					0,86%					
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	4,23%	% P			0,21%						2,54%		1,48%			
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ 368.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.800.000,00	$ -	$ 129.800.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.800.000,00	$ -	$ 129.800.000,00	$ -	$ -	
				% E			0,21%						2,54%		1,48%			
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	1,76%	% P			0,14%							1,62%	0,85%			
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 152.750.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.000.000,00	$ 82.250.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.000.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,14%							1,62%				
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	1,42%	% P			0,11%						1,31%		0,76%			
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 123.500.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 9.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.000.000,00	$ -	$ 66.500.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 9.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,11%						1,31%					
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,84%	% P				0,04%						0,00%	0,00%			
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ 73.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 3.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.800.000,00	$ 25.550.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 3.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,04%						0,50%	0,29%			
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	3,59%	% P			0,28%						3,32%		1,94%			
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ 312.650.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.600.000,00	$ -	$ 168.350.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,28%						3,32%					
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,66%	% P				0,03%					0,39%		0,23%			
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ 57.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.200.000,00	$ -	$ 19.950.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.200.000,00	$ -	$ 19.950.000,00	$ -	$ -	
				% E				0,03%					0,39%		0,23%			
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,35%	% P				0,03%						0,32%	0,19%			
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 30.550.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00	$ -	$ -	
				% E				0,03%						0,32%	0,19%			
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	1,07%	% P				0,05%					0,66%	0,00%	0,32%			
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ 93.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.800.000,00	$ -	$ 32.550.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.800.000,00	$ -	$ 32.550.000,00	$ -	$ -	
				% E				0,05%					0,64%		0,37%			
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,42%	% P			0,03%						0,39%		0,23%			
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 36.400.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.600.000,00	$ -	$ 19.600.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%						0,39%					
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,40%	% P				0,03%						0,32%	0,19%			
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 35.100.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00	$ -	$ -	
				% E				0,03%						0,37%				
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	4,86%	% P				0,24%					2,92%		1,70%			
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ 423.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ 148.050.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ 148.050.000,00	$ -	$ -	
				% E				0,24%					2,92%		1,70%			
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,34%	% P			0,03%						0,32%		0,18%			
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ 29.900.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.600.000,00	$ -	$ 16.100.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%						0,32%					
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.735.432.000,00	65,15%	44,14%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	0,09%	0,65%	0,32%	0,39%	8,59%	5,83%	33,81%	2,63%	1,35%	
	$ 4.579.246.000,00	52,04%	$ 3.940.176.675,90	$ P	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00	$ 56.409.000,00	$ 27.503.952,00	$ 34.042.400,00	$ 743.912.785,54	$ 436.245.600,00	$ 2.924.172.314,46	$ 228.417.448,00	$ 116.833.590,00	
				$ E	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00	$ 56.409.000,00	$ 27.503.952,00	$ 34.042.400,00	$ 747.118.346,76	$ 504.805.647,09	$ 2.924.172.314,46	$ -	$ -	
				% E	0,04%	0,04%	0,01%	0,09%	0,09%	0,63%	0,33%	0,39%	8,59%	5,83%	28,29%			
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**82,84%**															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**$ 7.207.321.355,90**															

INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA MES	%	1,12%	1,12%	2,10%	2,82%	1,20%	2,09%	3,19%	1,74%	22,59%	10,33%	45,12%	4,69%	2,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00	$ 97.322.000,00	$ 182.922.000,00	$ 245.222.000,00	$ 104.472.000,00	$ 174.636.000,00	$ 269.993.952,00	$ 151.672.400,00	$ 1.964.942.785,54	$ 899.775.600,00	$ 3.923.202.314,46	$ 355.701.448,00	$ 232.413.590,00	
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,12%	2,24%	4,34%	7,16%	8,36%	10,36%	13,46%	15,21%	37,79%	48,12%	93,24%	97,93%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00	$ 194.644.000,00	$ 377.566.000,00	$ 622.788.000,00	$ 727.260.000,00	$ 901.256.000,00	$ 1.171.291.952,00	$ 1.322.964.352,00	$ 3.287.907.137,54	$ 4.187.682.737,54	$ 8.111.885.052,00	$ 8.467.586.500,00	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA MES	%	1,11%	1,11%	2,13%	2,71%	1,31%	3,23%	1,63%	22,51%	10,56%	34,97%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 185.122.000,00	$ 235.368.000,00	$ 114.126.000,00	$ 282.882.000,00	$ 142.018.400,00	$ 1.960.564.946,10	$ 919.015.597,91	$ 3.047.524.041,10	$ -	$ -		
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%	2,21%	4,34%	7,05%	8,36%	10,46%	13,69%	15,32%	37,83%	47,87%	82,84%	82,84%	82,84%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 613.134.000,00	$ 727.260.000,00	$ 1.010.142.000,00	$ 1.152.160.400,00	$ 3.112.725.346,10	$ 4.031.740.944,01	$ 7.079.264.985,10	$ 7.079.264.985,10	$ 7.079.264.985,10	$ 7.079.264.985,10	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe aunar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL: VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Valor	Valor Ejecutado
CURVAS		

$ 28.762.888,64

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: GRACY STELLA RENTERIA MENA
Director de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202517304TL

Aprueba Firma:
Nombre: [illegible]
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPTVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 1/10/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 32
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Coordinación BIM y el volumen de diseño geométrico.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Estado del volumen del diseño geométrico en el proyecto. 2. Flujo de trabajo y centralización de información.

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
		VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	

FECHA	1/10/2025

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Se dio inicio a reunión convocada por el BIM Edwin Carreño, con el propósito de abordar temas relacionados con la Coordinación BIM y el volumen de diseño geométrico.

El BIM Edwin Carreño y la especialista de diseño Geométrico Lucy Hernández Domínguez. abordaron la reactivación de labores en el proyecto de la metodología BIM, destacando la importancia de la información topográfica para realizar correcciones. La especialista de diseño Geométrico Lucy mencionó que el diseño preliminar ya está en Civil 3D y que se está a la espera de datos de campo para continuar con el proceso.

Se realizo una revisión de los avances realizados por el volumen de diseño geométrico.

Lucy Hernández y Edwin Carreño propusieron programar una reunión para revisar diseños preliminares. Se discutió la importancia de definir correctamente los puntos de inicio y fin de los tramos, y se mencionó que el diseño hidráulico debe estar alineado con los cambios en el diseño geométrico. Además, se acordó que la información se centralizará en un entorno común de datos para facilitar la revisión por parte de la interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO

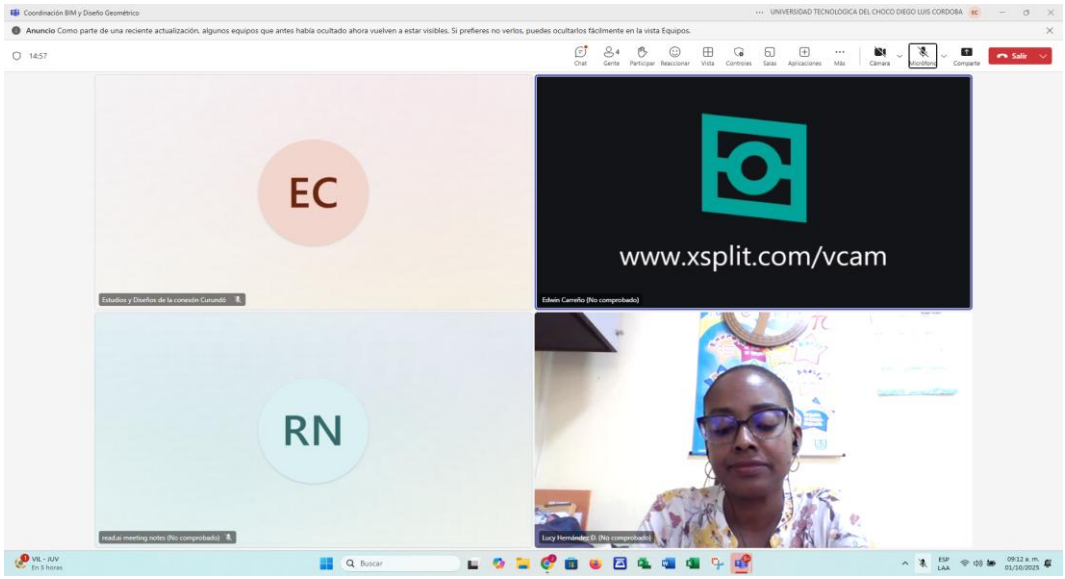

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	1/10/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 2/10/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 33
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión para la definición de estrategias de los lineamientos de consulta previa

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Definición de la metodología para el desarrollo de las reuniones de lineamientos de consulta previa. 2. Identificación de actores comunitarios e institucionales participantes en el proceso. 3. Proyección de cronogramas, lugares y logística para las reuniones de socialización y concertación. 4. Diseño de estrategias de comunicación y socialización con los Consejos Comunitarios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión convocada por la directora de la Consultoría dio inicio a las 9:30 a.m., con la participación de los siguientes profesionales del equipo: la coordinadora, Edly Stella Rentería Mena; el coordinador técnico, Eulogio Palacios Chaverra; la ingeniera de estudios, Jhoana Marcela Mosquera Palacios; la coordinadora ambiental y social, Luz Yaneth Ocoró; la ingeniera auxiliar, Lleceli Mosquera Tello; y la especialista en gestión ambiental, Elsy Josefa Rentería Moreno.

El propósito principal del encuentro fue definir las estrategias y mecanismos necesarios para la planificación y desarrollo de las reuniones que respaldarán los lineamientos del proceso de consulta previa del proyecto, conforme a las disposiciones legales vigentes y a los principios de participación, buena fe y concertación con las comunidades étnicas del área de influencia.


Durante la sesión, se acordaron las fechas tentativas para las visitas a las comunidades identificadas en el área de influencia del proyecto:
•Municipio de Nóvita: del 21 al 24 de octubre de 2025.
•Comunidades de San Pedro de Ingará: del 5 al 8 de noviembre de 2025.

Estas visitas tendrán como objetivo avanzar en la socialización del proyecto, fortalecer la coordinación con los Consejos Comunitarios y definir de manera conjunta los lineamientos para el desarrollo del proceso de consulta previa.

Así mismo, se estableció que las actividades contarán con el acompañamiento del equipo técnico, conformado por la directora de la Consultoría, el coordinador técnico, la coordinadora ambiental y social, los especialistas biólogos, el abogado, el profesional ambiental, la especialista social y los delegados comunitarios, garantizando la logística y el soporte técnico necesario para su adecuada ejecución.

La especialista Elsy Josefa Rentería Moreno presentó la proyección de los documentos que serán tratados durante las reuniones, los cuales incluyen el contexto normativo y la contextualización técnica del proyecto. Finalmente, se le designó como responsable de coordinar con los representantes del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita – COCOMAN, la logística relacionada con el desplazamiento, alojamiento y el lugar de realización de las reuniones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

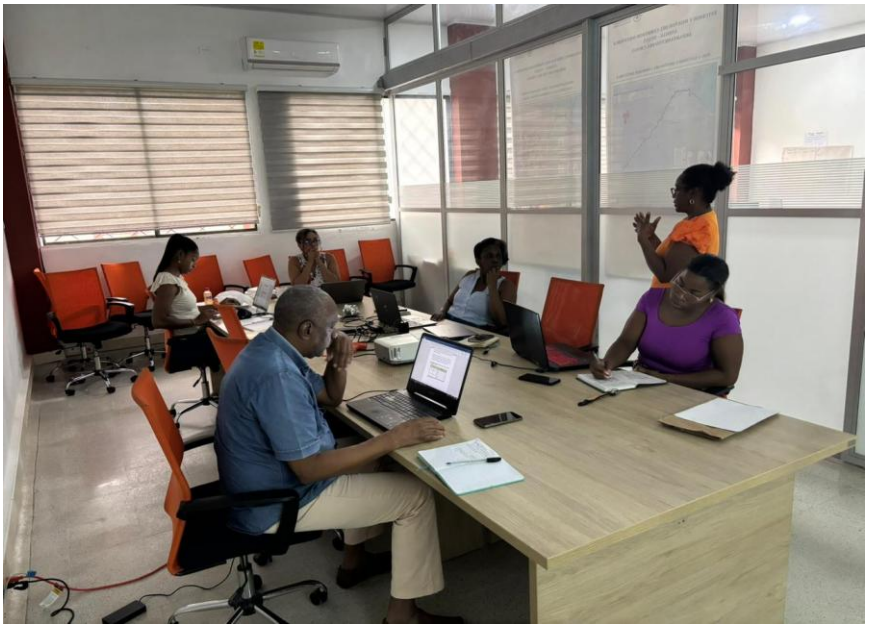

FECHA 2/10/2025

(Día / Mes / Año)



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba / INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	PÁGINA	
	FECHA	2/10/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES**


.....

.....

.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

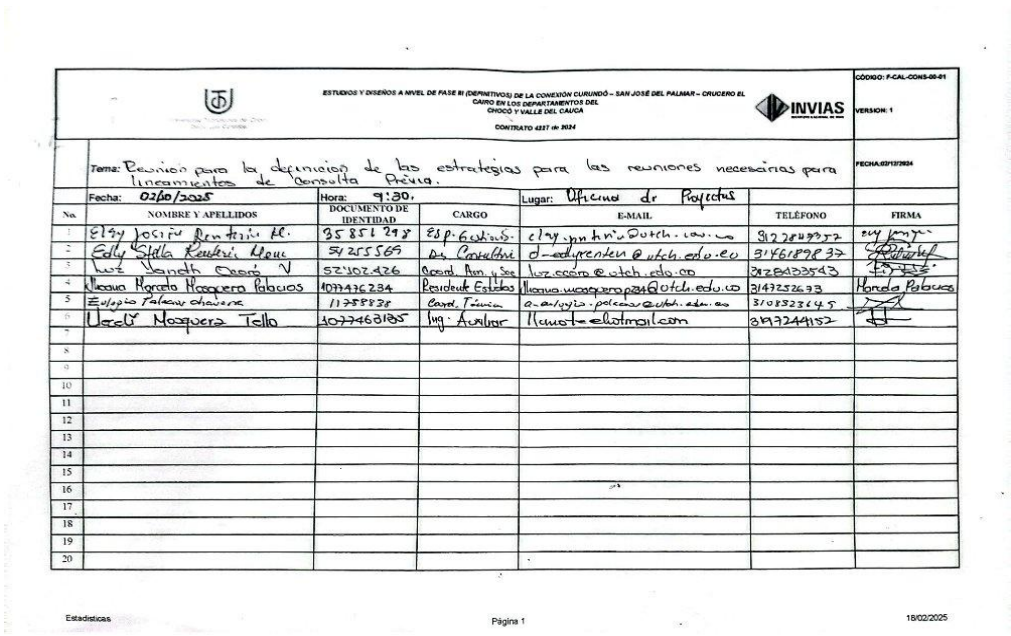

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
CONTRATO 4227 de 2024

INVIAS

CÓDIGO: F-CAL-CONS-00-01
VERSION: 1
FECHA:02/12/2024

Tema: Reunión para la definición de las estrategias para las reuniones necesarias para lineamientos de Consulta Previa.

Fecha: 02/10/2025 Hora: 9:30. Lugar: Oficina de Proyectos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Elay Joshin Rentería M.	35 851 298	Esp. Gestión.	elay.rentheria@utch.edu.co	3122849357	
2	Edly Stella Renteria Moreno	54 255 569	Apoyo Contractual	d-edlyrenteria@utch.edu.co	3146189837	
3	Luz Yaneth Cano V	52'402.426	Coord. Amb. y Soc.	luz.ccano@utch.edu.co	3128433543	
4	Nancy Marcela Mosquera Palacios	1077436234	Presidente Estudios	Nancy.mosqueraps34@utch.edu.co	3147252633	
5	Eulogio Palacios Chaverra	11758838	Coord. Técnico	a-analysis.palacios@utch.edu.co	3108323645	
6	Uriel Mosquera Tello	1077463185	Ing. Auxiliar	Mamot-ello@hotmail.com	3197249152	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Estadisticas Página 1 18/02/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 6/10/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 34
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Seguimiento de actividades de la topografia en campo

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Organización y entrega de la información de topografía. 2. Avance en la topografía y plan de contingencia. 3. Coordinación de visitas y seguimiento a los trabajos en campo. 4. Dificultades en el terreno y su impacto en el trabajo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión convocada por la consultoría inicio a las 7:30 p.m., con la participación de los profesionales del equipo: La coordinadora, Edly Stella Rentería Mena; el coordinador técnico, Eulogio Palacios Chaverra; la ingeniera de estudios, Jhoana Marcela Mosquera Palacios; la coordinadora ambiental y social, Luz Yaneth Ocoró; la ingeniera auxiliar, Lleceli Mosquera Tello, el Ingeniero Residente de campo, Bertonis Rentería; equipo de la Topografía y equipo de la interventoría.

Edly Stella Rentería Mena destacó la importancia de la reunión para abordar el avance de la topografía y pidió a los Topógrafos Blanca Nieves y Silvio que informaran sobre su progreso. Silvio Palacios Rentería proporcionó detalles sobre la materialización de los puntos de control y el avance en la poligonal, mencionando que se han completado 8.7 kilómetros en el tramo correspondiente.

Silvio Palacios Rentería destacó que las comisiones de levantamiento están trabajando en conjunto para cumplir con el plan de contingencia, a pesar de las dificultades en la contratación de personal. El Coordinador de la Interventoría, Diego Borda recomendó tener más de un equipo RTK y aseguró que solo un topógrafo debe operar los equipos para evitar errores en la topografía. El director de la interventoría, Ricardo Acosta apoyó esta recomendación y enfatizó la importancia de cumplir con los requisitos contractuales.


La Topógrafa Blanca Nieves Valencia, propuso que la instalación de mojones a dos kilómetros de distancia podría aumentar la precisión del trabajo, a lo que el coordinador Técnico Eulogio Palacios, estuvo de acuerdo. Diego, por su parte, manifestó su inquietud sobre el lento avance de los trabajos y pidió una programación clara para el desarrollo de la topografía. Se discutió la importancia de la georreferenciación y la necesidad de evitar reprocesos en la información recogida.

Carlos Lozano Naranjo enfatizó que el uso de RTK podría acelerar la nivelación. Blanca Valencia explicó que el RTK no es efectivo en áreas con vegetación densa, donde se requiere mayor precisión, y sugirió que se priorice el levantamiento con estaciones totales. El Topógrafo Silvio Palacios Rentería apoyó esta idea, señalando que la estación total es más precisa y adecuada para el trabajo en terrenos complicados.

El coordinador técnico de la interventoría Diego Borda, subraya que todos deben trabajar hacia el mismo objetivo y recalca la importancia de finalizar la georreferenciación y la monumentación para avanzar en la poligonal de amarres. Silvio Palacios Rentería confirma que se están considerando las recomendaciones de Diego. Eulogio Palacios menciona la necesidad de evaluar el progreso en una visita programada y destaca la colaboración entre los participantes.

El coordinador técnico de la interventoría Diego Borda, comunicó que el recorrido en San José del Palmar se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre con especialistas en diversas áreas. Ricardo Acosta sugirió que la reunión de seguimiento se realice el 15 de octubre para poder asistir a ambos eventos. Eulogio Palacios propuso incluir a un profesional de urbanismo y paisajismo en el recorrido.

REGISTRO FOTOGRAFICO

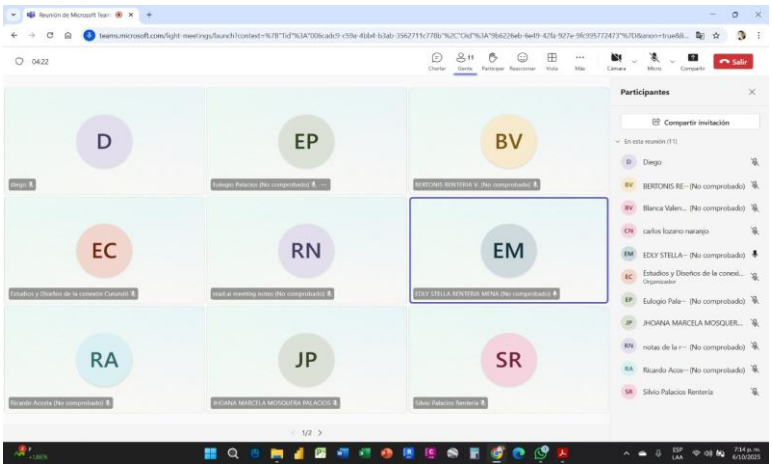

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	6/10/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 15/10/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 35
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Brindar orientación técnica y metodológica al personal encargado de la recolección de información socioeconómica en campo, en el marco del desarrollo de los estudios y diseños del proyecto de infraestructura vial.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Presentación del formato y estructura del instrumento de encuesta. 2.Indicaciones sobre la caracterización de hogares, unidades productivas y actores comunitarios. 3.Criterios para la aplicación ética y culturalmente adecuada de las encuestas. 4.Procedimientos para el registro, sistematización y envío de la información. 5.Recomendaciones de seguridad y comportamiento en campo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión dio inicio a las 14:30 p.m., bajo la dirección del especialista en Evaluación Económica, Julio Ricardo Sanabria, quien presentó el objetivo principal del encuentro: brindar orientación técnica y metodológica al personal responsable de la recolección de información socioeconómica en campo, en el marco del desarrollo de los estudios y diseños del proyecto de infraestructura vial.

El encuentro contó con la participación del especialista en Evaluación Económica, Julio Ricardo Sanabria; la ingeniera de estudios, Jhoana Marcela Mosquera Palacios; la ingeniera auxiliar, Lleceli Mosquera Tello; el estudiante de pasantías, Deivis Fabián Cano Durango; y la profesional social, Kelly Yohana Andrade Mena.

Durante la sesión, el especialista realizó una explicación detallada de los diferentes formatos a emplear en el proceso, entre ellos el formato de encuesta de pre-muestreo y los materiales de apoyo para la toma de información. En su exposición, recomendó aplicar las encuestas mediante visitas domiciliarias y selección aleatoria, con el fin de garantizar la representatividad de las comunidades y el cumplimiento del cronograma establecido por la consultoría.

Así mismo, se definieron los insumos requeridos para el desarrollo de la actividad, tales como formatos impresos, tablas de apoyo, lápices, lapiceros y bolsas impermeables, necesarios para la adecuada diligencia y conservación de la información recolectada.

Finalmente, se abordó el tema relacionado con los medios de transporte y la logística de desplazamiento hacia las comunidades a encuestar, con el propósito de asegurar la eficiencia y cobertura del trabajo de campo.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
		VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	

FECHA 15/10/2025
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

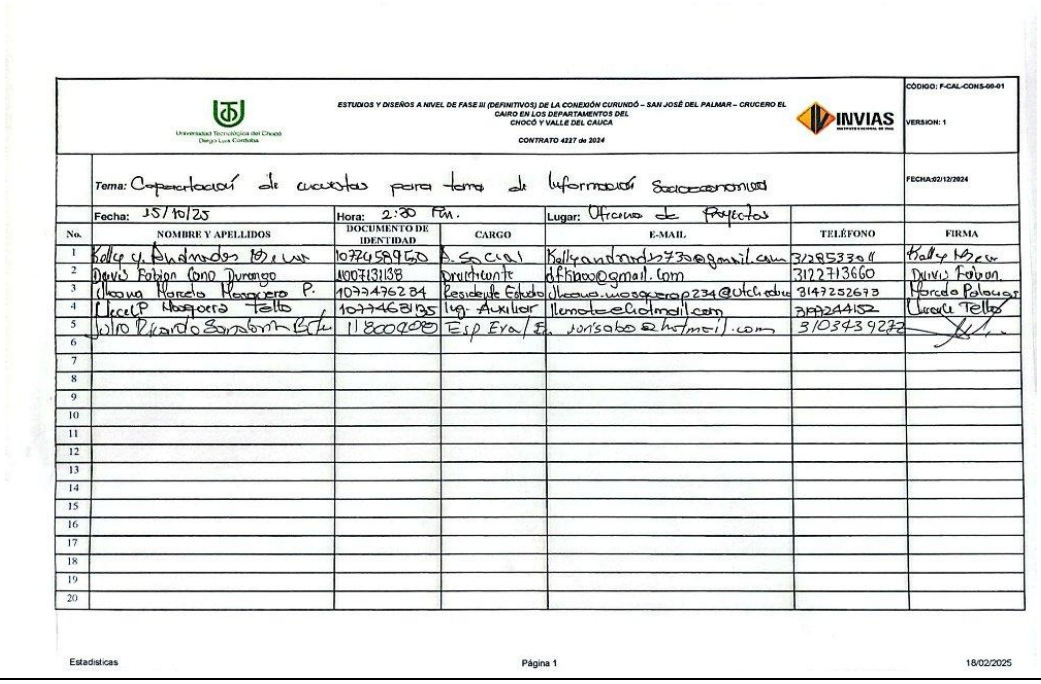

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
CONTRATO 4227 de 2024

CÓDIGO: F-CAL-CONS-00-01 | VERSION: 1 | FECHA:02/12/2024

Tema: Capacitación de encuestas para toma de información socioeconomica

Fecha: 15/10/25 | Hora: 2:30 Pm. | Lugar: Oficina de Proyectos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Kelly Y. Andrades Bolaños	1077458950	S. Social	Kellyandrades2273@gmail.com	3128533011	Kelly Andrades
2	Davis Fabian Cano Durango	1007131138	Practicante	dfcano@gmail.com	3122713660	Davis Fabian.
3	Yeimy Marcela Mosquera P.	1077476284	Residente Estudio	yeimy.mosquera2234@utch.edu.co	3147252673	Marcela Palacios
4	Cecilia Mosquera Tello	1077468135	Ing. Auxiliar	llenateleo@hotmail.com	3117241152	Cecilia Tello
5	Julio Ricardo Sandoval Ruiz	11800908	Esp Eva/Es	jorisabo@hotmail.com	3103439232	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Estadisticas | Página 1 | 18/02/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
