CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM228 de 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5

MENSUAL [x] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: **GUADALUPE.**

DEPARTAMENTO: **HUILA.**

CONTRATO DE (INTERVENTORÍA) No. CIHCM228 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS MIGUEL CAQUIMBO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORÍA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CIHCM228 DE 2024		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**PERIODO DEL INFORME**	**01 AL 31 DE MARZO DE 2025**
CONTRATISTA	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	**NIT:**	900.116.571-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA	**C.C:**	1.007.750.886

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	16/10/2024
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12/11/2024
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será TRES (03) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	02 (Dos) meses (31/01/2025)
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será cinco (05) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
VALOR INICIAL:	Ciento siete millones trescientos once mil setecientos un peso ($107.311.701,00)
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A
VALOR TOTAL:	Ciento siete millones trescientos once mil setecientos un peso ($107.311.701,00)


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLOPIH221 DE 2024		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	V&M INGENIERÍA S.A.S	**NIT:**	900.062.688-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO ALDINO	**C.C:**	7.713.933 de Neiva

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27/09/2024
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12/11/20224
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será TRES (03) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Dos (02) meses (31/01/2025)

PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será cinco (05) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
VALOR INICIAL:	Mil cuatrocientos cincuenta y tres millones treinta y ocho mil novecientos veintinueve pesos ($1.453.038.929,00)
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA" se encuentra ubicado en el municipio de Guadalupe, departamento del Huila. Esta localidad, situada en la región andina de Colombia, es conocida por su belleza natural y su rica herencia cultural. Guadalupe está rodeada de paisajes montañosos y ríos, lo que la convierte en un lugar atractivo tanto para residentes como para visitantes. La cancha sintética se pretende construir dentro de las instalaciones del proyecto macro de la Villa Olímpica, un área designada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas que busca beneficiar a la comunidad local. La construcción de la cancha sintética es parte de un esfuerzo por mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer a los jóvenes y habitantes del municipio un espacio adecuado para la práctica de deportes.

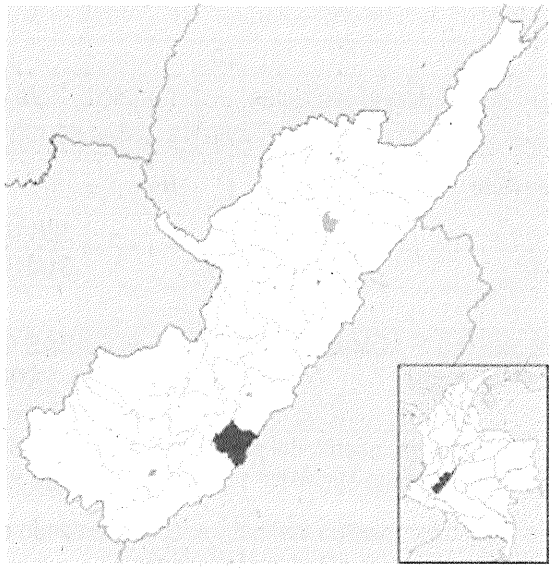

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto abarca un área de 1924 m² e incluye la construcción de una cancha sintética de fútbol ocho, con dimensiones de 30x50 metros, destinada a usos recreativos, deportivos y culturales. La cancha sintética tendrá una superficie total de 1750 m² e incluirá una red de aguas lluvias que consistirá en una cuneta perimetral de concreto de 3000 psi, cajas de inspección y la construcción de filtros laterales. Además, contará con una placa de piso de 3000 psi, la instalación de césped, la demarcación de la cancha y cerramiento perimetral, así como iluminación.

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En el mes de marzo de 2025 se realizaron entre otras actividades de obra las siguientes:

- Excavación manual para cárcamo.

- Placa de cancha en 3000 PSI.
- Concreto de 3000 PSI viga de cimentación del cerramiento.
- Muro de cerramiento.
- Acero de refuerzo.
- Suministro e instalación de tubería galvanizada 2" para cerramiento perimetral.

Adicional, esta interventoría verificó y supervisó cada una de las actividades realizadas, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y garantizando la calidad de los trabajos ejecutados.

6. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
Iniciación	**12/11/2024**			**13/04/2025**
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.				
TOTAL DIAS		**0**	**0**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de inicio	**1**	**12/11/2024**
Acta de justificación No. 1	**2**	**31/01/2025**

8. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	**1.** Debido al vencimiento del plazo contractual se solicita una prórroga para la ejecución de obra, legalizada mediante otro si N° 1 del 31 de enero de 2025. **2.** Se realizó excavación manual y evacuan teniendo en cuenta las medidas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo requeridas. **3.** El contratista presenta las planillas de pago de seguridad social del personal del proyecto. **4.** No se han presentado reclamaciones y se mantiene a INDERHUILA indemne de cualquier situación. **5.** El contrato se desarrolla cumpliendo las obligaciones inherentes. **6.** En el periodo reportado no se causaron daños a terceros y/o al personal debido a la ejecución del contrato. **7.** Se generó el pago de impuesto y estampillas, conforme a lo establecido en el contrato. **8.** Se realizó instalación y valla conforme al formato de INDER-HUILA.

	9. V&M INGENIERÍA presentó para aprobación de interventoría y está a su vez a supervisión el desglose de AIU y análisis de precios unitarios. **10.** Cada una de las actividades que se ejecutan en la obra se desarrollan teniendo en cuenta los reglamentos que las rigen, cumpliendo así la normativa vigente. **11.** Se constituyó fiducia para manejo de anticipo, la cual a corte del 31 de marzo de 2025 se encuentra terminada y liquidada.
b). **Actividades Administrativas.**	**1.** Se cumple durante el desarrollo del contrato de la interventoría los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así mismo se exige la afiliación a la EPS, AFP y ARL de la totalidad del personal que intervenga en la obra. Se verifica el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato. **2.** Se programa y coordina mensualmente mínimo una reunión con el contratista y con el INDERHUILA, para evaluar el desarrollo del contrato y se lleva un estricto control de las actas de reuniones, las cuales son entregadas en los informes periódicos que se entreguen. **3.** Se elaboran, revisan y suscriben las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato. **4.** Se revisan las solicitud de adición y/o prórroga del plazo de ejecución del contrato, que requiere el contratista y se emite un concepto técnico al respecto a la entidad. Así mismo, se elaboran los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el representante legal, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. *El 31 de enero de 2025 se suscribió modificatorio 1.* **5.** Se revisan las vigencias de las pólizas del contrato y cuando sea necesario se amplían en plazo, requiriéndose al contratista en efecto antes del vencimiento. **6.** Se asiste a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los trabajos y elaborar las respectivas actas a que haya lugar. **7.** Se exige y controla la permanencia en los frentes de obra, del residente de obra y demás profesionales del contratista. **8.** Permanecer en la obra en horas nocturnas, festivos y domingos programados o en horas no laborales comúnmente, y se exigirá la presencia del residente del contratista, así como de todos los profesionales que se requieran en la ejecución de dichos trabajos. *No se ha requerido.* **9.** Se exige al contratista el estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de las obras. **10.** Se realizan evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos parciales o definitivos del contrato. Se efectúan los requerimientos a que haya lugar al contratista.

	11. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitirlo a la entidad para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes. *No aplica sino hasta la fase de liquidación del contrato.* **12.** Se revisan y aprueban las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que intervienen en el contrato y/o cuando se requiera nuevo personal. **13.** En los casos en que amerite, ordenar la suspensión temporal de la respectiva ejecución hasta tanto no se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción de la interventoría y/o del INDERHUILA, cuando el contratista utilice procedimiento inaceptables u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para el contratista o para la entidad o terceros. *No se ha presentado el caso.* **14.** Se exige al contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. **15.** Se exigen verificadas e implementadas las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista las realice correctamente sin derecho a remuneración adicional, las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato. **16.** Se verifica que el contratista mantenga a tiempo, durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos. **17.** Se imparte por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieren para el correcto desarrollo de los trabajos; todas las instrucciones que se imparten al contratista son por escrito y con copia al INDERHUILA.
c). **Actividades Técnicas.**	**1.** Se vigila que las obras se ejecuten técnicamente y se verifica el cumplimiento de las condiciones generales y específicas técnicas para la correcta ejecución de las obras, se evita entrabamientos con el contratista de obra y se colabora en la solución de problemas surgidos en el desarrollo del mismo a fin de cumplir a satisfacción la ejecución del contrato. **2.** Se verifica y aprueba la localización de los trabajos y la implantación del proyecto realizada por el contratista. **3.** Se verifican las cantidades de obra establecidas en el contrato y a partir de la información suministrada, se presenta un informe a la entidad sobre los aspectos que repercuten en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones del mismo. **4.** Se consolida, verifica y aprueban las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las mediciones de los cortes de obra. **5.** Se verifica que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En caso de identificación de cambio de especificaciones se coordina reunión extraordinaria con el contratista y la entidad, a fin de evaluar y aprobar los cambios, de los cual se realizará la respectiva acta.

	6. Se verifica y garantiza que, en la ejecución de las obras, el contratista cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. **7.** Se realizar los controles de las actividades programadas, así como se recomiendan ajustes a los que haya lugar de forma oportuna. **8.** Cuando ha habido modificaciones de carácter técnico el contratista de obra remite a la interventoría para su aprobación y posteriormente a INDERHUILA, no sin antes contar con el visto bueno del interventor. **9.** Se exige que la totalidad del personal del contratista, mantenga durante el tiempo de ejecución de los trabajos la dotación adecuada para la labor desempeñada, esto es, botas, casco, overol monogafas y todos los elementos de seguridad industrial necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar. **10.** La interventoría garantiza a satisfacción la entrega por parte del contratista de obra. **11.** Se entrega un producto que cumpla con las normativas vigentes para RETIE y RETILAP.
d). **Actividades Logísticos.**	**1.** Bitácora de obra: Se lleva con el contratista una bitácora de obra (firmada por las partes involucradas), en donde se registran diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. **2.** Mediciones de obra: Se efectúan mediciones de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con las unidades de medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo planos de referencia. La interventoría revisa el formato diligenciado por el contratista donde se registra diariamente la ejecución de la obra. Aprueba las actividades ejecutadas y el contenido del formato elaborando acta de corte de obra. **3.** Comité de obra: Se programan reuniones periódicas con el contratista, el supervisor del contrato y demás personal que intervenga en la ejecución de los trabajos. Se levantan actas de comité de los puntos tratados, los problemas que se hayan presentado y las soluciones adoptadas. **4.** Inspección de obra: Se evalúan e inspeccionan los trabajos ejecutados por el contratista con la programación presentada por el mismo. Se controla y vigila la correcta construcción de cada una de las actividades que componen el contrato. **5.** Suministros: Se ejerce control permanente en los suministros de los diferentes materiales de construcción que se requieran para ejecutar las obras; y se exige el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se vigila, controla y rechazan los suministros y/o obra ejecutada por el contratista, que no cumpla con las especificaciones técnicas y los planos, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos adecuados. **6.** Control de calidad de los materiales: Se exige al contratista el suministro de las muestras de los materiales que se utilizan antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas. Así mismo se solicita los ensayos y pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y las necesarias y convenientes de acuerdo al desarrollo de la obra.

	7. Informes a presentar: Se realizan los informes mensuales de interventoría donde se consigna el avance de obra de acuerdo a la programación y ejecución del contrato, atrasos en tiempo, costos, observaciones generales, cuadros comparativos, gráficos, fotografías, anexos, etc.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	El interventor vela por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. El interventor realiza los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental y de disposición de residuos se implementen para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices que dicten las entidades competentes.
f). **Actividades Financieras.**	**1.** Presentar un balance económico de ejecución del contrato, así como la concertación de cantidades para la liquidación final para efectos de la liquidación del contrato. *No aplica sino hasta la fase de liquidación del contrato.* **2.** Se efectúa el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial, vinculación del personal contratista a los sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación, en los términos de Ley, si a ello hay lugar. **3.** Se efectúa un control detallado de la inversión en el contrato. **4.** Se realiza mensualmente, en el respectivo informe, un análisis del avance financiero de las obras, a fin de prever con anticipación eventuales modificaciones de reserva, de disponibilidad presupuestal o cualquier otra medida que INDERHUILA tome para asegurar el flujo de fondos del contrato. **5.** Los pagos de la interventoría estarán dadas por las actas parciales de la interventoría y serán realizados de acuerdo a los porcentajes de ejecución de obra. *No se han realizado cobros parciales por parte de la interventoría.*
g). **Actividades Jurídicos.**	**1.** Se constata de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y se exige el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. **2.** Se asesora, apoya y se mantiene informado a INDERHUILA, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del contrato, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en primera instancia, y luego sometiéndose a aprobación del INDERHUILA que hace el seguimiento al contrato de interventoría. **3.** En caso o en un eventual incumplimiento por parte del contratista de la obra el interventor deberá apoyar jurídicamente el proceso investigativo y sancionatorio que la administración adelante en contra de este.

	Responder cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyube el personal o los subcontratistas contra EL INDERHUILA, por causa o con ocasión del contrato. *No se ha presentado ningún incumplimiento por parte del contratista ni ha sido necesario responder alguna reclamación.*

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	LLUVIAS FUERTES	LLUVIAS SUAVES	DÍA NUBLADO	DÍA SOLEADO
1/03/2025	x			
2/03/2025			x	
3/03/2025			x	
4/03/2025	x			
5/03/2025	x			
6/03/2025		x		
7/03/2025			x	
8/03/2025			x	
9/03/2025				x
10/03/2025				x
11/03/2025			x	
12/03/2025			x	
13/03/2025	x			
14/03/2025	x			
15/03/2025			x	
16/03/2025			x	
17/03/2025		x		
18/03/2025			x	
19/03/2025	x			
20/03/2025			x	
21/03/2025		x		
22/03/2025				x
23/03/2025				x
24/03/2025	x			
25/03/2025	x			
26/03/2025	x			
27/03/2025				x
28/03/2025			x	
29/03/2025	x			
30/03/2025			x	
31/03/2025	x			

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI	Cemento = 0,206 Agregado mixto = 0,76 Agua = 0,175 1:5,9
Diseños de mezcla para los concretos.	3000 PSI	Cemento = 0,227 Agregado mixto = 0,75 Agua = 0,175 1:5,3
Ensayo Proctor compactación modificada material de relleno.		Densidad seca máxima (g./cm^3) = 2.145 Humedad óptima (%) = 6.00 Gravedad específica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm^3) = 2.56
Compresión simple al concreto.		
Ensayo de compactación de campo		

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
Placa de piso polideportivo	04/03/2025	11/03/2025	x			2100 PSI	2399 PSI	CUMPLE
		11/03/2025	x			2100 PSI	2290 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	05/03/2025	12/03/2025	x			2100 PSI	2460 PSI	CUMPLE
		12/03/2025	x			2100 PSI	2499 PSI	CUMPLE

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA					
No. ENSAYO	**ABSCISA/EJE**	**PROFUNDIDAD/ALTURA – DEL ENSAYO EN CM.**	**MATERIAL**	**PORCENTAJE COMPACTACIÓN (%)**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
D-0001	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.26%	CUMPLE
D-0002	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.37%	CUMPLE
D-0003	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.80%	CUMPLE
D-0004	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.17%	CUMPLE
D-0005	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.95%	CUMPLE
D-0006	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.14%	CUMPLE

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	**FECHA TOMA DE MUESTRA** (dd/mm/aaaa)	**FECHA ROTURA** (dd/mm/aaaa)	**EDAD DEL ENSAYO**			**RESISTENCIA REQUERIDA**	**RESISTENCIA FINAL OBTENIDA**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
			7	**14**	**28**			
Concreto ciclópeo cerramiento	28/02/2025	14/03/2025		x		2500 PSI	2438.02 PSI	NO CUMPLE
		14/03/2025		x		2500 PSI	2370.43 PSI	NO CUMPLE
		28/03/2025			x	2500 PSI	3031.89 PSI	CUMPLE
		28/03/2025			x	2500 PSI	2937.53 PSI	CUMPLE

Viga de cimentación cerramiento	11/03/2025	18/03/2025	x			2100 PSI	2568.95 PSI	CUMPLE
		18/03/2025	x			2100 PSI	2603.43 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	15/03/2025	22/03/2025	x			2100 PSI	2029.94 PSI	NO CUMPLE
		22/03/2025	x			2100 PSI	1950.58 PSI	NO CUMPLE
Placa de piso polideportivo	18/03/2025	25/03/2025	x			2100 PSI	2123.86 PSI	CUMPLE
		25/03/2025	x			2100 PSI	2031.63 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	20/03/2025	27/03/2025	x			2100 PSI	1857.42 PSI	NO CUMPLE
		27/03/2025	x			2100 PSI	1842.53 PSI	NO CUMPLE
Placa de piso polideportivo	22/03/2025	29/03/2025	x			2100 PSI	2215.39 PSI	CUMPLE
		29/03/2025	x			2100 PSI	2221.70 PSI	CUMPLE

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (20%)	**04/03/2025**	$290.607.785,80		$290.607.785,80
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$1.453.038.929,00	$0,00	$1.453.038.929,00	$	$

12. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
19/11/2024	**INDER**	En el municipio de Guadalupe se desarrolló socialización del contrato de obra e interventoría y se realizó constitución de veeduría ciudadana.

26/11/2024	**INDER**	En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para atender inquietudes y monitorear avance del contrato.
23/12/2024	**INDER**	En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para atender inquietudes, socializar respuesta de Municipio ante ubicación de cancha sintética y observaciones a los diseños, y monitorear avance del contrato.
23/01/2025		En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para socializar el avance de la obra hasta la fecha, que abarca actividades de localización, replanteo y descapote de la zona.
26/02/2025	**INDER**	En el municipio de Guadalupe en las instalaciones de la secretaria de planeación municipal de Guadalupe se realizó comité técnico para revisión de alcance de diseños red eléctrica y aguas lluvias y aclaración de puntos de conexión dados según proyecto Contrato de obra pública 382 de 2023.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copia de Bitácora de Obra periodo del (12/11/2024) al (31/03/2025)			
Informe HSEQ periodo del (01/03/2025) al (31/03/2025)			
Actas de socialización e inicio de obra			
Actas de conformación de veeduría ciudadana			
Acta de vecindad			
Actas de comités (periodo del (12/11/2024) al (31/03/2025)			
Rregistros de ensayos de laboratorio periodo del (12/11/2024) al (31/03/2025)			

Registros de ensayos de calidad periodo del (12/11/2024) al (31/03/2025)			
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) periodo del (12/11/2024) al (31/03/2025)			
Registro fotográfico de valla			
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO) Periodo del (12/11/2024) al (31/03/2025).			

14. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Felipe Stand Villarreal	79.533.915	Director de interventoría	NÓMINA
William Ramírez Salinas	12.137.865	Residente de interventoría	NÓMINA
Nelson Muñoz Losada	1.075.255.228	Profesional HSEQ	NÓMINA

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Felipe Stand Villarreal	$480.000	$120.000	$208.800	$120.000	$0	**33164199**
William Ramírez Salinas	$512.000	$128.000	$222.800	$128.000	$0	**32956143**
Nelson Muñoz Losada	$480.000	$120.000	$208.800	$120.000	$0	**32956143**

17. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA	AMPARO	VIGENCIA

			DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	100032369	0	17/10/2024	Cumplimiento del contrato	16/10/2024	16/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/10/2024	16/01/2028
				Calidad del servicio	16/01/2025	16/01/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	100005879	0	17/10/2024	16/10/2024	16/01/2025

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	100032369	1-2	13/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028
				Calidad del servicio	12/02/2025	12/02/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	100005879	1-2	13/11/2024	12/11/2024	12/02/2025

Póliza actualizada x Otrosí No. 1 y Acta de Justificación No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	100032369	3	06/02/2025	Cumplimiento del contrato	31/01/2025	12/10/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/01/2025	12/04/2028
				Calidad del servicio	12/04/2025	12/01/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	100005879	3	06/02/2025	12/11/2024	12/04/2025

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)



CARCAMO

Figura 1. Excavación manual de cárcamo.

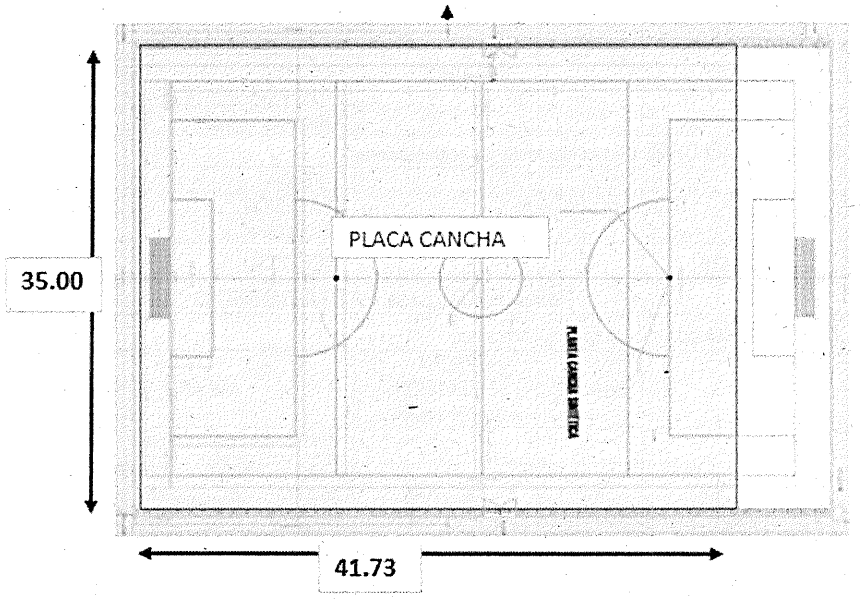


Figura 2. Placa de piso cancha.

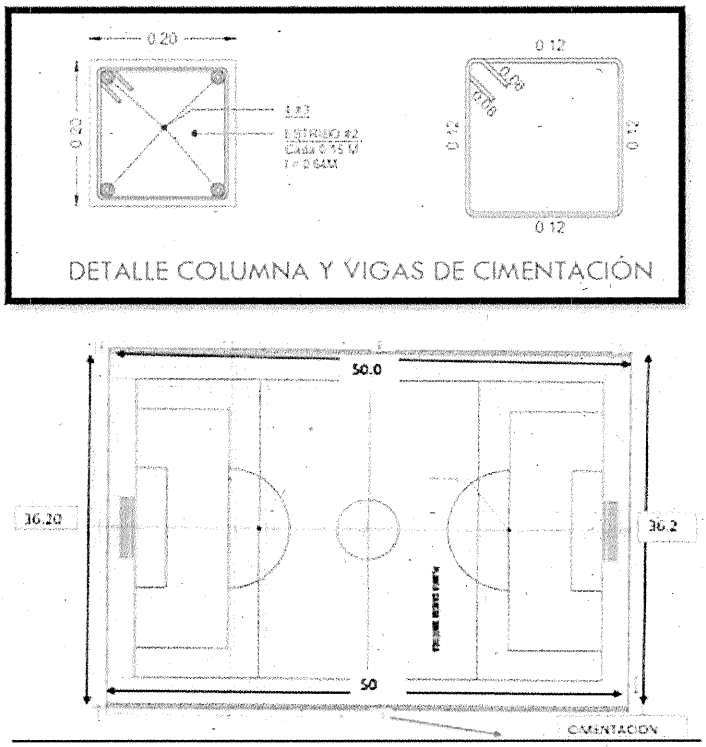


Figura 3. Acero de refuerzo estructura muro de cerramiento.

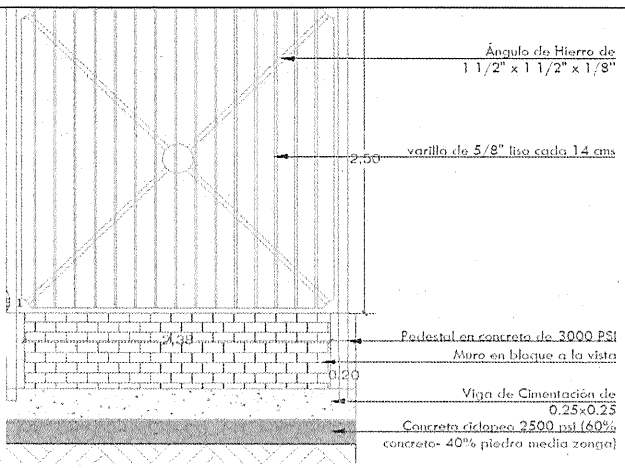


Figura 4. Construcción de muro de cerramiento a la vista.

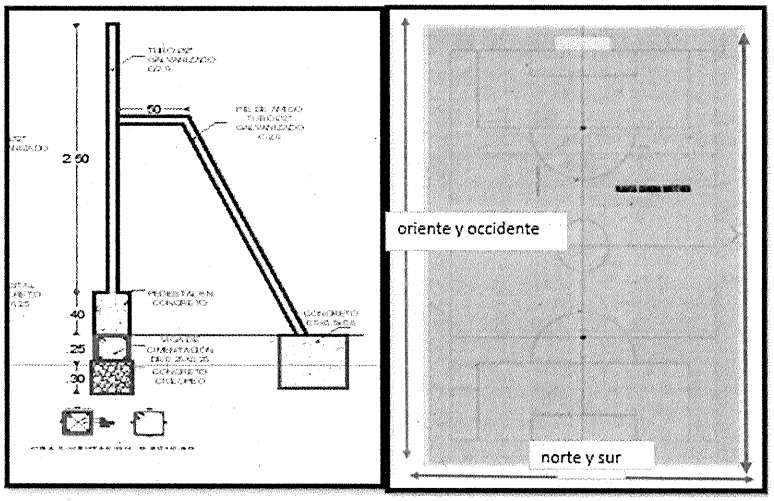


Figura 5. Tubería galvanizada pedestales módulos cerramiento (NORTE - SUR - ORIENTE - OCCIDENTE)

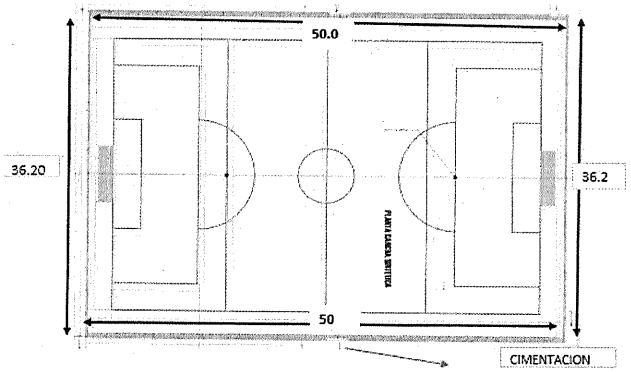


Figura 6. Concreto 3000 PSI viga de cimentación de cerramiento.

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA												
Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MARZO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1	1.1	Localización y replanteo manual	m²	1.924,00	$ 2.226	$ 4.282.824	1924,00	$ 4.282.824	0,00	$ 0	1924,00	$ 4.282.824
2	1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m²	1.924,00	$ 4.770	$ 9.177.480	1924,00	$ 9.177.480	0,00	$ 0	1924,00	$ 9.177.480
Subtotal						**$ 13.460.304**		**$ 13.460.304**		**$ 0**		**$ 13.460.304**
2	MOVIMIENTO DE TIERRA											
3	2.1	Excavación manual incluye retiro	m³	119,94	$ 31.545	$ 3.783.507	28,84	$ 909.758	26,00	$ 820.170	54,84	$ 1.729.928
4	2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 km	m³	384,80	$ 19.793	$ 7.616.346	384,80	$ 7.616.346	0,00	$ 0	384,80	$ 7.616.346
5	2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m³	384,80	$ 190.829	$ 73.430.999	384,80	$ 73.430.999	0,00	$ 0	384,80	$ 73.430.999
Subtotal						**$ 84.830.852**		**$ 81.957.103**		**$ 820.170**		**$ 82.777.273**
3	RED AGUAS LLUVIAS											
6	3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104,00	$ 137.428	$ 14.292.512	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7	3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4,00	$ 657.029	$ 2.628.116	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8	3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón	ml	30,00	$ 79.488	$ 2.384.640	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA												
Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MARZO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALÓR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9	3.4	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"	ml	178,00	$ 99.727	$ 17.751.406	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
10	3.5	Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2,00	$ 713.327	$ 1.426.654	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Subtotal						**$ 38.483.328**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
4	PLACA CANCHA											
11	4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m^2	1.750,00	$ 87.325	$ 152.818.750	0,00	$ 0	1680,00	$ 146.706.000	1680,00	$ 146.706.000
12	4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 2.344.832	$ 4.689.664	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA												
Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MARZO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13	4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m^2	1.750,00	$ 181.076	$ 316.883.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
14	4.4	Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m^2	1.750,00	$ 146.659	$ 256.653.250	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
15	4.5	Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186,00	$ 55.658	$ 10.352.388	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Subtotal						**$ 741.397.052**		**$ 0**		**$ 146.706.000**		**$ 146.706.000**
5	CERRAMIENTO											
16	5.1	Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga)para cimentación cerramiento	m^3	16,74	$ 376.028	$ 6.294.709	15,52	$ 5.835.955	0,00	$ 0	15,52	$ 5.835.955
17	5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m	m^3	37,40	$ 659.191	$ 24.653.743	0,00	$ 0	10,78	$ 7.106.079	10,78	$ 7.106.079
18	5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112,50	$ 105.765	$ 11.898.563	0,00	$ 0	93,28	$ 9.865.759	93,28	$ 9.865.759
19	5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación	kg	1.057,11	$ 6.647	$ 7.026.597	0,00	$ 0	832,48	$ 5.533.495	832,48	$ 5.533.495
20	5.5	Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220,40	$ 44.432	$ 9.792.813	0,00	$ 0	220,40	$ 9.792.813	220,40	$ 9.792.813

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA												
Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MARZO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
21	5.6	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200,00	$ 109.070	$ 21.814.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
22	5.7	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m^2	268,75	$ 54.091	$ 14.536.956	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
23	5.8	Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1,00	$ 802.805	$ 802.805	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
24	5.9	Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m^2	148,80	$ 80.868	$ 12.033.158	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
25	5.10	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m^2	3.031,00	$ 37.545	$ 113.798.895	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
26	5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32,00	$ 263.483	$ 8.431.456	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA												
Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MARZO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Subtotal						$ 231.083.695		$ 5.835.955		$ 32.298.146,00		$ 38.134.101,00
6	ILUMINACIÓN											
27	6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6,00	$ 1.718.814	$ 10.312.884	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
28	6.2	Suministro e Instalación de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1,00	$ 511.864	$ 511.864	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
29	6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"	ml	50,00	$ 45.333	$ 2.266.650	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
30	6.4	Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50,00	$ 42.110	$ 2.105.500	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
31	6.5	Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada	und	6,00	$ 2.884.636	$ 17.307.816	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
32	6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1,00	$ 513.186	$ 513.186	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
33	6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1,00	$ 377.230	$ 377.230	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
34	6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6,00	$ 266.806	$ 1.600.836	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
35	6.9	Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)	und	8,00	$ 336.951	$ 2.695.608	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA												
Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MARZO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
36	6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1,00	$ 15.484.338	$ 15.484.338	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
Subtotal						$ 53.175.912		$ 0		$ 0		$ 0
					SUBTOTAL OBRAS	$ 1.162.431.143		$ 101.253.362		$ 179.824.316		$ 281.077.678

SUBTOTAL OBRAS		$ 1.162.431.143	$ 101.253.362	$ 179.824.316	$ 281.077.678
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 232.486.229	$ 20.250.672	$ 35.964.863	$ 56.215.536
IMPREVISTO	1%	$ 11.624.311	$ 1.012.534	$ 1.798.243	$ 2.810.777
UTILIDAD	4%	$ 46.497.246	$ 4.050.134	$ 7.192.973	$ 11.243.107
VALOR TOTAL		$ 1.453.038.929	$ 126.566.702	$ 224.780.395	$ 351.347.098

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO		8,71%	15,47%	24,18%
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO		10,57%	40,97%	51,54%
PORCENTAJE DE RETRASO Y/O AVANCE		-1,86%	-25,51%	-27,36%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **YERSON FERNANDO CAMACHO**
DIRECTOR DE OBRA


ING. **FELIPE STAND VILLARREAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

El cronograma de obra presentado por el contratista cumple con los requisitos establecidos por la entidad contratante, lo que permite un adecuado seguimiento del desarrollo del proyecto.

El cronograma de obra presentado por V&M INGENIERÍA S.A.S, aprobado por la interventoría, cumple con los requisitos de la entidad contratante, permitiendo un adecuado seguimiento del proyecto. Sin embargo, se reporta un avance acumulado de $351.347.098 (24,18%), frente al 51,54% programado para marzo de 2025, según la reprogramación del Otrosí N°1, lo que indica un retraso del 27,36%.

% avance mensual programado	40.97%	**% avance acumulado programado**	51.54%
	$ 595.379.705,34		$ 748.958.463,76
% avance mensual ejecutado	15.47%	**% avance acumulado ejecutado**	24.13%
	$ 224.780.395		**$ 350.575.170**
Atraso (-) y/o Avance (+) Mensual	-25.51%	**Atraso (-) y/o Avance (+) Acumulado**	-27.36%
	-$ 370.599.310		-$ 397.611.366


20. REGISTRO FOTOGRÁFICO

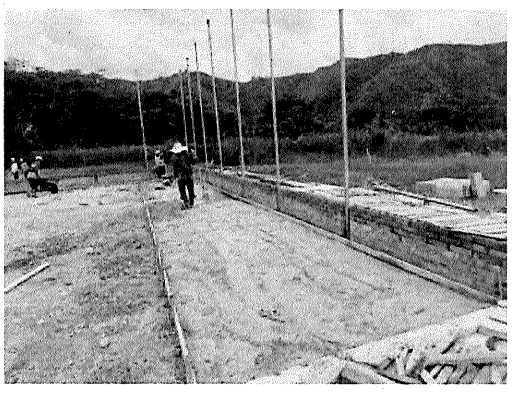


Alistamiento de terreno para fundición de placa en concreto.




Fundición de placa en concreto de 3000 PSI.

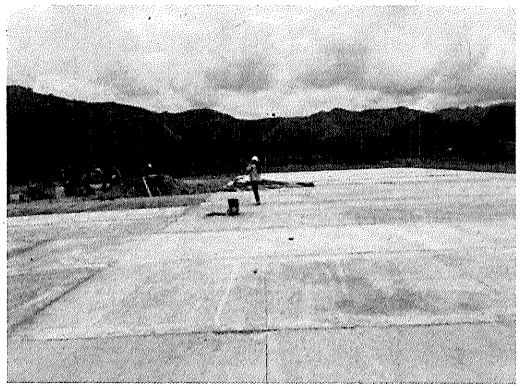


Avance de fundición de placa en concreto.

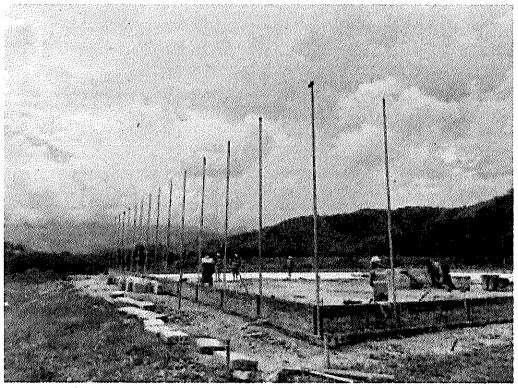


Instalación de tubería galvanizada de 2".

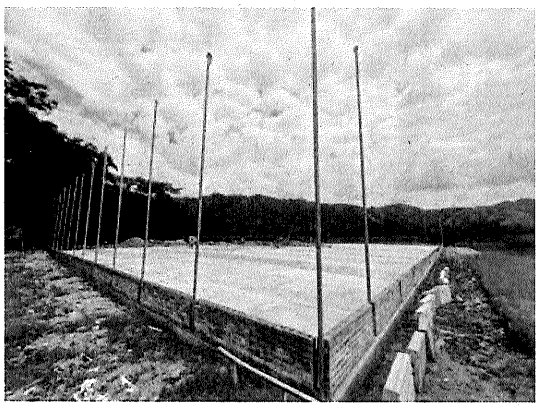

Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI.

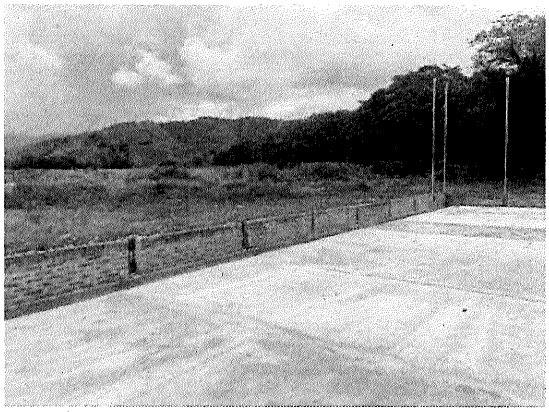

Instalación de muro de cerramiento en ladrillo.

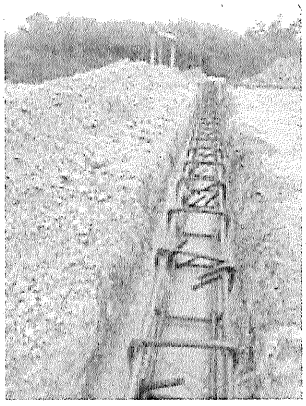 *Instalación acero de refuerzo.*	 *Excavación manual.*

21. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- En marzo se logró un avance mensual del 15,47%, con un acumulado del 24,18% en la ejecución física, frente a un avance programado del 51,54%, lo que representa un retraso acumulado del 27,36%.
- Esta diferencia refleja una baja capacidad de ejecución por parte del contratista en relación con la programación ajustada por el Otrosí N.º 1, lo que podría comprometer la entrega en los tiempos establecidos si no se adoptan correctivos inmediatos.
- Durante el periodo se desarrollaron actividades importantes como:
  - Fundición de la placa de la cancha en concreto 3000 PSI.
  - Instalación de acero de refuerzo.
  - Construcción de muros de cerramiento en ladrillo.
  - Instalación de tubería galvanizada para cerramiento.
  - Excavación para cárcamo y ejecución de concreto de 3000 PSI para viga de cimentación de cerramiento.
- La interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas y a los ensayos de laboratorio.
- La compactación de rellenos cumple con los estándares exigidos.
- Durante el mes se presentaron varios días con lluvias fuertes y suaves, lo cual pudo incidir en el ritmo de ejecución de actividades en obra abierta, aunque no se reportan afectaciones críticas.
- El contrato se desarrolla con cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad laboral, sin reportes de afectaciones a terceros ni accidentes.

- Se mantiene actualizada la documentación exigida, incluyendo bitácoras, actas, pagos de seguridad social, ensayos de calidad y seguimiento a pólizas.
- El avance financiero refleja un valor ejecutado acumulado de $351.347.098, frente a un programado de $748.958.463, lo que acentúa el rezago y demanda acciones de reprogramación o refuerzo de frentes de trabajo.
- Es fundamental que el contratista adopte medidas correctivas que permitan recuperar el ritmo del proyecto en los meses restantes del plazo contractual.

22. ANEXOS

- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA Y D ELA INTERVENTORÍA.
- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.
- BITÁCORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORÍA.

ING. FELIPE STAND VILLARREAL	(31/03/2025)	ING. LUIS MIGUEL CAQUIMBO
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISIÓN**

28-02-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am. Fin jornada 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Dia Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudantes de obra (4).

Actividades Realizadas

→ El dia 28 de febrero de 2025 se inicia fundición de concreto ciclopeo de 2000 PSI (60% concreto - 40% piedra media Zonga) para cimentación cerramiento 0.70 x 0.20. m

Por otra parte se realiza toma de muestras de concreto para resistencia en la compresora - ensayo de laboratorio.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

01-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Scanned with CamScanner

Actividades realizadas

→ El personal de mano de obra se dispone a realizar figuración amarre e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación para el cerramiento perimetral.

Por otra parte se deja por escrito que las condiciones climaticas adversas han dificultado la ejecución de las actividades segun la programación y Cronograma Contractual del proyecto.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

03-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Dia nublado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de figuración amarre e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

04-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe. - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de figuración armare e instalación del acero de refuerzo para viga de Cimentación - cerramiento perimetral.

Una vez mas las condiciones climaticas afectan la ejecucion de las actividades, generando atrasos en la programacion establecida para cada actividad.

Firma:

Residente de obra. Residente de interventoria

05-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe-Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudante (3).

Scanned with CamScanner

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de figuración armare e instalación del acero de refuerzo para viga de cimentación - Cerramiento perimetral.

Por otra parte continuan las condiciones climaticas adversas, fuertes lluvias que dificultan la ejecución de las actividades.

Firma:

Residente de obra. Residente de interventoria

06-03-25 Lugar: Municipio Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Dia nublado, con presencia de lluvia.
Personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de figuración armare e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación - Cerramiento perimetral.

Firma:

Residente de obra. Residente de interventoria.

Scanned with CamScanner

07-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con la actividad de figuracion, armado e instalacion de acero de refuerzo para viga de cimentacion - Cerramiento perimetral.

Por otra parte se inicia instalacion de formaleta para fundicion de viga de cimentacion. ademas Replanteo manual y toma de niveles para modulacion de placa.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

08-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Dia Nublado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Scanned with CamScanner

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de instalacion de formaleta para fundicion de viga de cimentacion y toma de niveles y replanteo manual de tenaro para placa en concreto de 3000 psi.

Por otra parte se realiza instalacion de tuberia galvanizada de 2" en costados Norte y Sur con modulacion variable entre 1.90 - 2,58 metros segun diseño.

con ello se da por finalizada la jornada laboral.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se inicia fundicion de viga de cimentacion para cerramiento perimetral, Se culmina la instalacion de tuberia galvanizada de 2" en costados norte - Sur.

Se realiza toma de muestras de concreto de los elementos estructurales, para ensayos de resistencia a la compresion.

Scanned with CamScanner

Con ello se finaliza la jornada laboral, para constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

11-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones Climaticas: Dia Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de fundicion de concreto de 3000 psi para viga de cimentacion necesaria para el cerramiento perimetral, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto de los elementos estructurales para ensayos de resistencia a la compresión.

→ por otra parte se realiza visita de campo por parte del laboratorista para tomar densidades de la estructura de la placa.

Con ello se finaliza la jornada laboral, para constancia de lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

12-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5.00 pm.
Condiciones climaticas: Dia Nublado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con la actividad de fundicion de concreto de 3000 psi para viga de cimentacion necesaria para el cerramiento perimetral, por otra parte se realiza instalacion de tuberia galvanizada de 2" con modulacion variable de 1.90 - 2.58 metros segun diseño para dar por terminada esta actividad.

Por constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

13-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5:00pm
Condiciones Climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

Scanned with CamScanner

→ El personal de mano de obra no calificada se dispone a realizar actividades de mampostería - Muro cerramiento en ladrillo a la vista.

Por otra parte una vez culminado la actividad de replanteo y toma de niveles manuales se realiza modulación de la placa de piso e: 7cm con secciones de 2.80*2.50 metros, posteriormente se realiza instalación de formaleta para fundición de placa de piso de 3000 psi.

En constancia a lo anterior firma:

Residente de obra. Residente de interventoría.

14-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climáticas: Día lluvioso
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas según el cronograma de ejecución de actividades de obra en las cuales se destacan

-Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo a la vista.
-Modulación de placa de piso con secciones de 2.80 * 2.50m.
e instalacion de formaleta.

15-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am - Fin jornada: 5:00 Pm.
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas. Según el cronograma de ejecución, el personal de mano de obra no calificada se dispone a realizar actividades de mampostería - Muro cerramiento en ladrillo a la vista.

→ Se realiza alistamiento de materiales, herramientas y equipos para dar inicio a la fundición de dos secciones de la placa de piso en concreto de 3000 psi E: 7cm.

→ Se realiza conformación y compactacion de la estructura de la placa, instalacion de malla electrosoldada posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto de los elementos para ensayos de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma:

Residente de obra. Residente de interventoría.

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

17-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones Climaticas: parcialmente Nublado con presencia de lluvia.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

- Mamposteria - Muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.
- Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalacion de la malla electrosoldada posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi.

Por otra parte debido al atraso presentado en la ejecucion de las actividades el contratista implemento plan de contingencia para mitigar la eventualidad y atraso de obra por medio de un cronograma interno para ejecucion de los mismos con el fin de garantizar los altos estandares de calidad segun los lineamientos tecnicos del contrato.

En constancia a lo anterior, firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

18-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (1)
Ayudante I (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

- Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.

- Conformacion y compactacion de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posterior vaciado de concreto de 3000 psi, de igual modo, se realiza toma de muestras de concreto de los elementos para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

19-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am - Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficial (1).
Ayudante I (3).

Scanned with CamScanner


Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.


• Mampostería - muro cerramiento en ladrillo santafesado a la vista.

• Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi, de igual modo, se realiza toma de muestras de concreto.

En constancia a lo anterior, firma:



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

21-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones Climaticas: Parcialmente Nublado con presencia de lluvia.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mampostería - muro cerramiento en ladrillo Santafesado a la vista.


Scanned with CamScanner

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi E: 07cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto, para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma:



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA


22-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).


Actividades Realizadas

→ Se continuan las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mampostería - muro cerramiento en ladrillo Santafesado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi E: 09 cm de igual modo se realiza toma de muestras de concreto.





Scanned with CamScanner

23-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am — Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: favorablemente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo Semiprensado a la vista

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi.

En constancia a lo anterior, firma.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

24-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Scanned with CamScanner

Actividades Realizadas:

→ Se continuan las actividades programadas segun el Cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo Semiprensado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi.

En constancia a lo anterior, firma

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

25-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada. 7:am. — Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo Semiprensado a la vista.

Scanned with CamScanner

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 07 cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

26-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (4)
Ayudantes (3).

Actividades realizadas.

→ Se realiza excavación manual para construccion de cerramiento - Cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI.

Scanned with CamScanner

27-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia soleado.
Personal de obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1).
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades realizadas.

→ Se continua con la actividad de excavación manual para construccion de Cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

Por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 07 cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

28-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades realizadas:

→ Se continua con la actividad de excavacion manual para construcción de cuneta perimetral - dimensiones 20 cm de ancho y altura variable.

Por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.

Se realiza conformación y compactacion de la estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi e: 10 cm.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior, firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

29-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra: (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con la actividad de excavación manual para construcción de cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.

Se realiza conformación y compactación de la estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi E: 10 cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior, firma.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

31-03-25.

Lugar: Municipio de Guadalupe - Nuevo León.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climáticas: Día lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

→ El personal de mano de obra no calificada culmina las actividades de mampostería - muro cerramiento perimetral en ladrillo Semiencerado a la vista. y excavación manual para construcción de cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

por otra parte se continua con la actividad de conformación y compactación de estructura de piso de losa, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi f'c: 0.07, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior se firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

CONSTRUMAC
INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

RESULTADOS LABORATORIOS INTERVENTORIA

Calle 18 A 6-37 Oficina 204 – Barrio Quirinal – Neiva Huila
Email: *construmacingenierossas@gmail.com*
***Teléfonos**: 3203546767- 3123218077*

	MECANICA DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS SAS OSCAR FERNANDO AREVALO	INFORME ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO E-410 I.N.V.-22	CÓDIGO:	CC-F-040
			VERSIÓN:	2
			FECHA:	28-04-2025

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA: 2025-05-02

EMPRESA: CONSTRUMAC INGENIEROS SAS

NORMA: ART. 630-22 E-410 INVIAS/NTC 673

AGREGADOS: NO SUMINISTRADO

CÓDIGO DE OBRA:

CILINDRO NO.	CÓD. CLIENTE	ELEMENTO FUNDIDO	ABSCISA ELEMENTO	FECHA FUNDIDA	EDAD	FECHA ROTURA	DIAMETRO ESPÉCIMEN (pulg)	ALTURA ESPÉCIMEN (pulg)	ÁREA ESPÉCIMEN (pulg)	PESO (g)	DENSIDAD (kg/cm³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	RESISTENCIA (Kg/cm²)	% OBTENIDO	RESISTENCIA % ESPERADO	RESISTENCIA ESPECÍFICADA (PSI)	SLUMP	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
232-1		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO	CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA	04-03-2025	7	11-03-2025	5,94	12,04	27,71	12.476	2,28	295,80	16,47	2.399	167,96	79,98	70	3.000,00		5	
232-1				04-03-2025	7	11-03-2025	6,06	12,08	28,83	12.685	2,22	293,60	15,72	2.290	160,28	76,32	70	3.000,00		5	
232-1				04-03-2025	28	01-04-2025	6,10	12,16	29,20	12.910	2,21	401,00	21,19	3.087	216,09	102,90	100	3.000,00		6	
232-1				04-03-2025	28	01-04-2025	6,02	12,12	28,45	12.842	2,27	399,80	21,68	3.159	221,11	105,29	56	3.000,00		5	
232-2		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO	CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA	05-03-2025	7	12-03-2025	6,10	12,20	29,20	12.888	2,20	319,50	16,88	2.460	172,17	81,99	70	3.000,00		5	
232-2				05-03-2025	7	12-03-2025	5,94	12,08	27,71	12.505	2,27	308,10	17,16	2.499	174,94	83,31	70	3.000,00		5	
232-2				05-03-2025	28	02-04-2025	6,10	12,27	29,20	12.924	2,20	458,70	24,24	3.531	247,18	117,71	100	3.000,00		4	
232-2				05-03-2025	28	02-04-2025	6,02	12,20	28,45	12.739	2,24	458,10	24,85	3.619	253,36	120,65	100	3.000,00		3	

OBSERVACIONES

RESISTENCIA % ESPERADA (3 DÍAS 40% - 7 DÍAS 70% - 14 DÍAS 90% - 28 DÍAS 100%) SEGÚN NORMA TÉCNICA 500/630-22 (INVÍAS-22 / NTC 321)

LAS MUESTRAS DE CONCRETOS DE NOMENCLATURA PERTENECEN AL CÓDIGO INTERNO DEL LABORATORIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

SE TIENE EN CUENTA PARA DETERMINAR EL TIPO DE FALLA, EL NUMERAL 7.6 DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 673 EN LA FIGURA 2. ESQUEMA DE LOS MODELOS DE FRACTURAS TÍPICOS

MUESTRAS TOMADAS EN SITIO Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE DEL SERVICIO

Gráficos

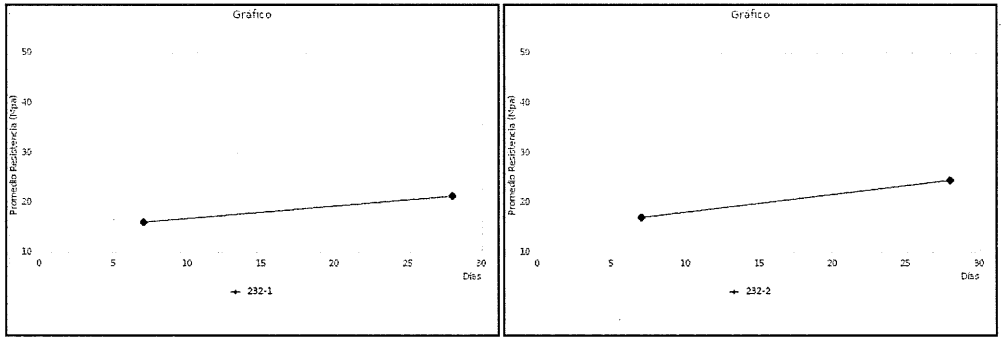

Gráfico
Promedio Resistencia (Mpa)
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
Días
232-1

Gráfico
Promedio Resistencia (Mpa)
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
Días
232-2

CONSTRUMAC
INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.116.571 - 8

93

SS INTERVENTORÍA

Calle 18 A 6-37 Oficina 204 – Barrio Quirinal – Neiva Huila
Email: *construmacingenierossas@gmail.com*
Teléfonos: *3203546767- 3123218077*

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33164199
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900116571	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 13 4 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	8741735
FAX	8735493	SUCURSAL	NOMINA 2	NOMBRE SUCURSAL	ADMINISTRATIVOS CONSTRUMAC
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1007750886	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	TAVERA
PRIMER NOMBRE	DANIELA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.333.334		33164199

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-79533915	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	STAND VILLARREAL FELIPE	$4.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 79533915	X	2025-03-21																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79533915	COLPENSIONES	10	$1.333.334	0.1600000	$213.400	$0	$0	$213.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79533915	COMPENSAR-EPS	10	$1.333.334	0.0400000	$53.400	$0	0	$0	0	$0	10	$1.333.334	5	0.0696000	$92.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79533915	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$1.333.334	0.0400000	$53.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$213.400	$0	$0	$0	$0	5	$700	$0	$0	$214.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$53.400	$0	0	$0	0	$0	$53.400	5	$200	$0	$53.600	$0	0	$0	$0	$53.600	$0	$0	$53.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$92.900	0	$0	$0	$92.900	5	$300	$93.200	0	$0	$932	$93.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$53.400	5	$200	$53.600
SENA	0	$0	5	$0	$0
ICBF	0	$0	5	$0	$0
ESAP	0	$0	5	$0	$0
MinEdu	0	$0	5	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$53.600
PENSIONES	1	$214.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$93.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$53.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$414.500

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32956143
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900116571	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 12 A SUR 10 29 ZN INDUSTRIAL	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUMACINGENIEROSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	8741735
FAX	8741735	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	INGENIEROS CONTRATOS VARIOS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1007750886	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	TAVERA
PRIMER NOMBRE	DANIELA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$10.750.334		32956143

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83229437	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	DIAZ CASTRO ALEJANDRO	$3.100.000
CC-1016049229	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	GONZALEZ RODRIGUEZ JEIMMY PAOLA	$1.700.000
CC-1075600275	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONTERO PADILLA YERSON DAMIAN	$1.423.500
CC-1075255228	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MUÑOZ LOSADA NELSON	$3.000.000
CC-12137865	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	RAMIREZ SALINAS WILLIAM AUGUSTO	$3.200.000
CC-1075304846	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	REYES SUAREZ LUISA MARIA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83229437	X	2025-03-03	X	2025-03-13																									0		
CC - 1016049229	X	2025-03-03	X	2025-03-12																									0		
CC - 1075600275																													0		
CC - 1075255228																													0		
CC - 12137865																													0		
CC - 1075304846																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83229437	COLPENSIONES	11	$1.136.667	0.1600000	$181.900	$0	$0	$181.900	$0	$0	$0
CC - 1016049229	PORVENIR	10	$566.667	0.1600000	$90.700	$0	$0	$90.700	$0	$0	$0
CC - 1075600275	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075255228	COLFONDOS	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 12137865	COLPENSIONES	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0
CC - 1075304846	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83229437	SANITAS	11	$1.136.667	0.0400000	$45.500	$0	0	$0	0	$0	11	$1.136.667	5	0.0696000	$79.200
CC - 1016049229	COMPENSAR-EPS	10	$566.667	0.0400000	$22.700	$0	0	$0	0	$0	10	$566.667	5	0.0696000	$39.500
CC - 1075600275	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075255228	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	5	0.0696000	$208.800
CC - 12137865	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	5	0.0696000	$222.800
CC - 1075304846	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83229437	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$1.136.667	0.0400000	$45.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1016049229	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$566.667	0.0400000	$22.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075600275	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075255228	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12137865	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075304846	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$480.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$480.000
COLPENSIONES	4	$1.149.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.149.500
PORVENIR	1	$90.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$90.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$102.500	$0	0	$0	0	$0	$102.500	0	$0	$0	$102.500	$0	0	$0	$0	$102.500	$0	$0	$102.500
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$305.000	$0	0	$0	0	$0	$305.000	0	$0	$0	$305.000	$0	0	$0	$0	$305.000	$0	$0	$305.000
COMPENSAR-EPS	1	$22.700	$0	0	$0	0	$0	$22.700	0	$0	$0	$22.700	$0	0	$0	$0	$22.700	$0	$0	$22.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$748.500	0	$0	$0	$748.500	0	$0	$748.500	0	$0	$0	$748.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$430.200	0	$0	$430.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$430.200
PENSIONES	3	$1.720.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$748.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$430.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.329.100
