REPÚBLICA DE COLOMBIA

LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO No. 1052 DE 2022

CONSORCIO VIASCOL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01

CONTRATO DE OBRA DE 1544-2022

CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

ABRIL DEL 2023

Versión 0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1544 de 2022 **Contratista:** UNION TEMPORAL SAN ANDRES

Contrato de Interventoría No. 1052 DE 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIASCOL

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL (LA VIA RURAL UNION PENEYA – SAN ISIDRO - MIRAMAR – LA ESPERANZA"

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** abr-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		14
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	14
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	21
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	23
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	25
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	27
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	37
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		40
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	40
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		41
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	42
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	42
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	43
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		53
5.1	Información general del contrato		53
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		54
5.3	Informes especialistas y profesionales		55
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		63
5.5	Informe matriz de riesgos.		64
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		64
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		64
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		65
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	65
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	67
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	77
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	79
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	85
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		87
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	87
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	90
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	90
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		92
8	**Anexos**		93
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		93
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		97
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		97
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		97

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONFINACION DEL AMAZONAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ
PERIODO MES: ABRIL DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 001544 - 2022

OBJETO:
"REHABILITACION DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA".

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANDRES

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIO: 12/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACION: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/11/2023
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 18.373.634.172,61
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 18.373.634.172,61
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1052 - 2022
INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ML	1195.85
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Revision estudios y diseños			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
EXPLANACION	$ 3.677.346.641,79	$ 698.695.861,94	$ 4.376.042.503,73
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ 1.794.511.689,58	$ 340.957.221,02	$ 2.135.468.910,60
PAVIMENTACION ASFALTICA	$ 4.952.970.900,30	$ 941.064.471,06	$ 5.894.035.371,36
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 2.770.706.530,17	$ 526.434.240,73	$ 3.297.140.770,90
SEÑALIZACION VIAL	$ 90.775.055,73	$ 17.247.260,59	$ 108.022.316,32
OBRAS DE URBANISMO	$ 1.863.398.038,40	$ 354.045.627,30	$ 2.217.443.665,70
OTROS	$ 290.319.860,50	$ 55.160.773,50	$ 345.480.634,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.440.028.716,48	$ 2.933.605.456,13	$ 18.373.634.172,61

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
EXPLANACION	$ -	$ -	$ -	$ -
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTACION ASFALTICA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ -	$ -	$ -	$ -
SEÑALIZACION VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS DE URBANISMO	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunón de socialización



Reunón de socialización



Inspección Visual del tramo a intervenir

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Marly Sarria González
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
2.1 LOCALIZACION 6
2.2 ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
2.4.1 Parámetros de diseño 9
2.4.2 Sección típica de la vía y estructura del pavimento 9
2.4.3 Descripción de actividades 11
3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.1 Información general 12
3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes 13
3.3 Seguimiento de Ítems No previstos 13
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 13
4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14
4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3 14
4.2 Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 17
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 19
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. Formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-8. 21
4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 23
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 25
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12. 27
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14. 37
4.9 Otros documentos de seguimiento mensual 40
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. MEPI-MN-IN-2-FR-1 40
4.9.2 Seguimiento Programa de Obra. 41
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones realizado por la Interventoría (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2). 42
4.9.4 Copia de las Actas de comité de obra (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1) y Acta de reunión (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2) 43
5 NFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 53
5.1 Información General del contrato 53

5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor en el mes. ...54
5.3 Informes de Especialistas y profesionales ...55
5.3.1 Informe especialista en geotecnia. ...55
5.3.2 informe especialista en pavimientos ...59
5.4 Informe del Programa Anual de Caja ...63
5.5 Informe de matriz del riesgo ...64
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría ...64
5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. ...64
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ...65
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. ...65
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. ...67
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 ...77
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría -Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. ...79
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría – Formato MEPI- MN1-IN-15-FR-15. ...85
6.6 Otros Documentos de Seguimiento Mensual ...87
6.6.1 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del interventor – Formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 / MEPI-MN-IN-3-FR-2. ...87
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 ...90
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...92
8 ANEXOS ...93
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. ...93
8.1.1 Correspondencia enviada ...93
8.1.2 Correspondencia recibida ...95
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras ...97
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas ...97
8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente ...97

1 NTRODUCCIÓN

El instituto nacional de vías (INVIAS) suscribió convenios interadmistrativos con municipios del Departamento de CAQUETA cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, AMAZONAS Y VAUPÉS “COLOMBIA RURAL”, los municipios adelantarán los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, AMAZONAS Y VAUPÉS.

En consideración con lo anterior la gobernación del Amazonas suscribió el contrato No. 001544 - 2022 derivado del convenio interadministrativo No.1899 – 2021 el cual tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.”, el cual fue adjudicado contratista Consorcio Internacional WOC.

El instituto nacional de vías mediante - INVIAS, mediante resolución Número 1715 del 24 de mayo del 2022, previo concurso de méritos CMA-DTE-SEP-197-2021 y luego de surtidos todos los procesos, ordenó la adjudicación del contrato de interventoría No. 1052 de 2022 al CONSORCIO VIASCOL cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1. Mediante documento SVR-69600 se dio orden de inicio del contrato de interventoría 1052 – 2022 el día 11 de noviembre del 2022, dentro del mismo documento se informa el supervisor del contrato al director de la territorial Caquetá Ingeniero Carlos Alberto Zambrano y el gestor técnico al Ingeniero Iván Darío Gamboa. (Ver anexo 1 “Designación de gestor técnico”).

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

Los entes Territoriales se encuentran adelantando los procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos con el fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 para la cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR CONVENIO	CONVENIO NO.
CAQUETA	ALBANIA	3.870.000.000	1790-2021
CAQUETA	SAN JOSE FRAGUA	2.700.000.000	1762-2021
CAQUETA	LA MONTAÑITA	16.200.000.000	1809-2021
AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	7.200.000.000	1901-2021
AMAZONAS	AMAZONAS	30.700.000.000	1899-2021

El convenio 1899 – 2021 dio como resultado el contrato de obra 001544 – 2022 con el propósito de llevar a cabo el REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

El proyecto consta de 1.19 km de pavimentación en concreto hidráulico en la actualidad la infraestructura correspondiente a la malla vial urbana y el espacio público asociado a esta, ubicados en la carrera 6 entre calles 3 y calle 12, llamada Avenida Internacional del municipio de Leticia se encuentra completamente deteriorada, por lo que no presta los niveles de servicio esperados en las vías principales o arterias de la capital del Amazonas.

De esta manera, es indispensable intervenir dicha infraestructura realizando su reconstrucción total, con el propósito de mejorar significativamente los niveles de servicio

de las vías y el espacio público para que los ciudadanos y turistas del municipio de Leticia puedan gozar de una movilidad óptima que les brinde la seguridad y comodidad necesarias para transitar una de las principales calles de la capital amazónica.


Por su parte, La red existente de alcantarillado pluvial, tan solo recolecta aguas lluvias sobre las calles 12, 10, 9 y 8, entregando sus aguas al río Amazonas, en la zona de intervención de la Avenida internacional no existe redes de alcantarillado pluvial, las aguas se llevan por escorrentía a los caños cercanos de la zona de intervención.
El sistema de Alcantarillado Sanitario consta con cámaras de inspección de diámetro 1,20m construidas en ladrillo, en su mayoría llenas de sedimento en las cañuelas, y otras se encuentran inundadas o colmatadas, con fisuras y filtraciones, lo cual es evidencia de la falta de mantenimiento del sistema, generándose también malos olores (FINDETER - HC Ingenieros Leticia S.A.S., 2015).

El sistema de recolección también cuenta con sumideros, la mayoría de ellos no cuenta con las condiciones adecuadas para su operación, ya que se encuentran en alto grado de deterioro, debido a la falta de mantenimiento y/o mala construcción; a esto se le suma la falta de cultura ciudadana ya que en algunos sumideros se arrojan cantidades considerables de basura que con el tiempo han ocasionado el taponamiento de las tuberías y consecuentemente la inundación de las vías. Este último hecho, debido también a la falta de capacidad hidráulica de la red para funcionar como alcantarillado combinado (FINDETER - HC Ingenieros Leticia S.A.S., 2015).


2.1 LOCALIZACION

El proyecto del presente informe se encuentra localizado al sur del país en el departamento del AMAZONAS, en el municipio de LETICIA, denominada vial internacional.

Ilustración 1 Localización Geográfica del municipio de LETICIA

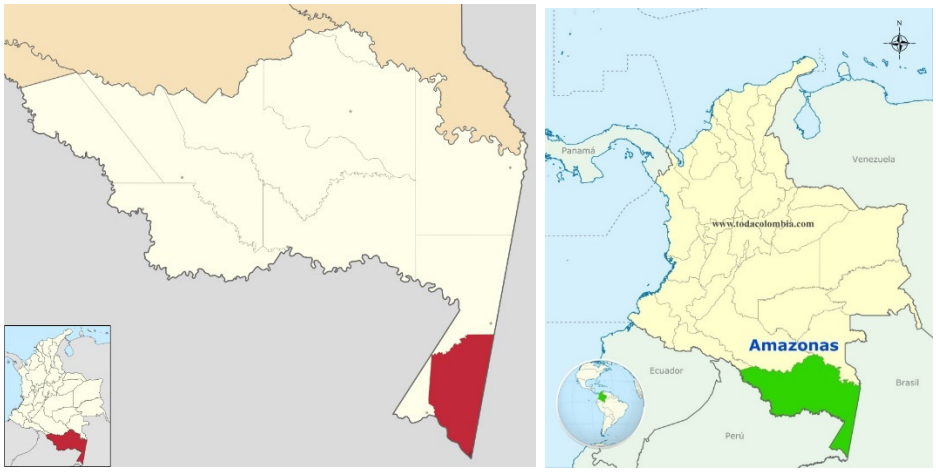



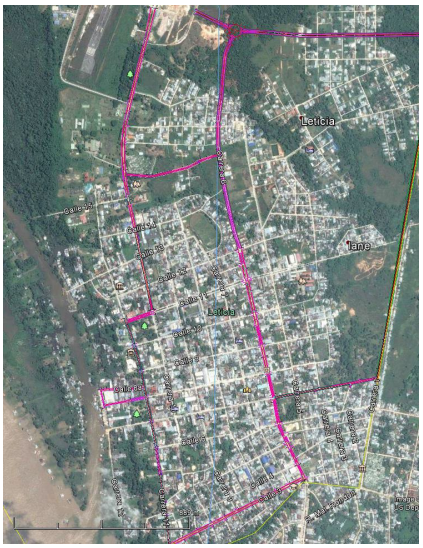

El tramo a intervenir se encuentra situado en la doble calzada vía internacional entre calle 3 y calle 12, se intervendrá un total de 1.19 km de esta vía con el fin de mejorar la movilidad de los usuarios.

Ilustración 2 Tramo a intervenir



2.2 ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto beneficia la llamada triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú; ubicada específicamente en el municipio de Leticia Amazonas Colombia, La cual se encuentra a borde del rio amazonas y comparten esta avenida principal con el municipio de Tabatinga, lo que conecta ambos municipios, de igual manera toda la zona urbana de este sector se verá beneficiada toda vez que al tener mejores vías de acceso, se les permitirá comercializar los productos de manera más fácil.

- Leticia Amazonas, Colombia
- Tabatinga Amazonas, Brasil

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía actual no cuenta con un mantenimiento continuo y presenta diferentes imperfecciones por desgate ocasionado por el tráfico en la zona, lo cual en las condiciones actuales es un costo elevado de mantenimiento y reparación para el municipio, por tal razón se va a realizar una rehabilitación de la doble calzada y urbanismo.

De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como las fuertes lluvias que causan daños en la capa de rodadura; incrementado los costos del mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del municipio.

Fotografía No. 1 Estado inicial de la vía



Fotografía No. 2 Estado inicial de la vía



2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.4.1 Parámetros de diseño


Vía La Unión Peneya - San Isidro – Miramar – La Esperanza

Clasificación Jerárquica:	Urbana existente
Número de calzadas:	2
Número de carriles:	4
Topografía:	Plana
Tipo de pavimento:	Concreto Hidráulico
Superficie actual:	Concreto en mal estado
Clima:	Ecuatorial lluvioso temperatura media de 27°C
Capacidad de la subrasante:	CBR de diseño 1.70%
Velocidad de diseño:	30 km/h
Ancho de calzada:	5.90 metros
Ancho de bermas:	N/A
Ancho de cunetas:	0.65 metros
Peralte máximo:	6%
Pendiente longitudinal máxima:	2.59%

2.4.2 Sección típica de la vía y estructura del pavimento

La vía tiene dos secciones típicas tal y como se muestra en las ilustraciones No. 3 y 4.

Ilustración 3 Sección de típica no.1, sin filtros

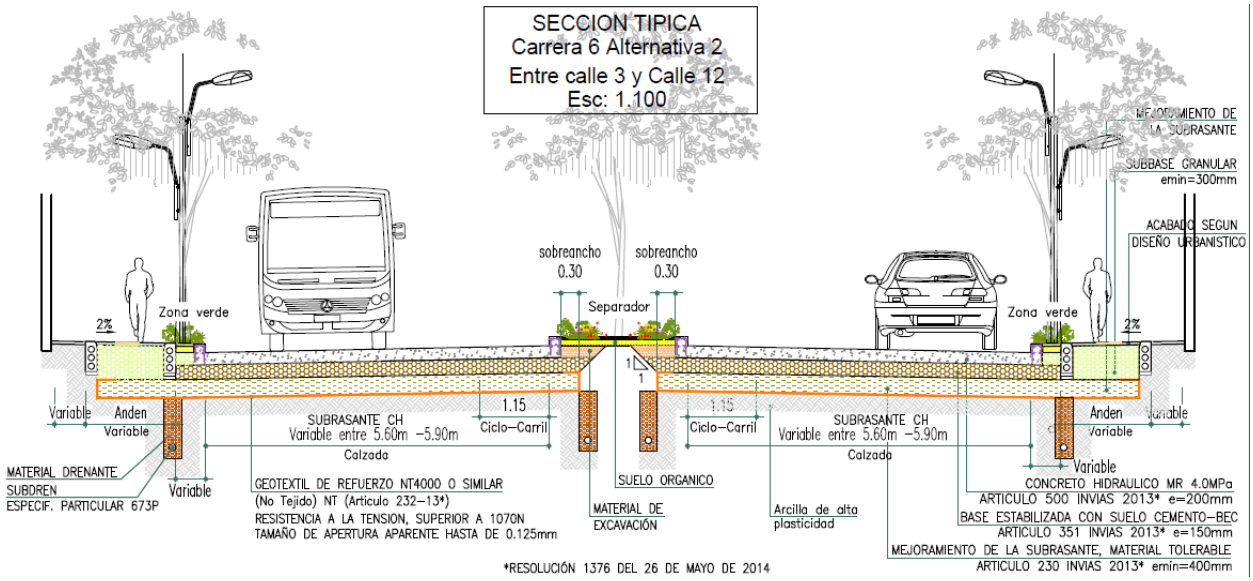

2.4.3 Descripción de actividades

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

a. Ítems de pago:

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1. EXPLANACIONES				
1,1	201,8	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	15366.78
1,2	210,2,2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	10953.58
1,3	221,1	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	7070.20
1,4	230,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	13385.06
1,5	231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION 06 SUELOS DE SUBRASANTE V CAPAS GRANULARES	m2	13385.06
2. BASES SUBBASES Y AFIRMADOS				
2,1	351,1	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUVE SIJMINISTRO DE CEMENTO)	m3	2944.40
3. PAVIMENTOS DE CONCRETO				
3,1	500.1	PAVIMENTO 06 CONCRETO HIORAULICO - NT2	m3	3134.27
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
1,1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4897.47
1,2	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	1147.87
1,3	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (0)- MEZCLA IN SITU	m3	143.28
1,4	640.1	ACERO DE REFIJERZO Fy 4200 MPa	kg	21014.40
1,5	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N m2 APROXIMADAMENTE	m2	20059.20
1,6		TUBERIA PERFORADA 064" PARA FILTROS	m	5731.20
1,7	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	3438.72
5. SEÑALIZACION				
1,1	700.1	LINEA 06 DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	m	5203.21
1,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	318.18
1,3	701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPOXICO	Un	2260.00
1,4	710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR. SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM)	Un	82.00
6. OBRAS PARA URBANISMO				
		Excavaciones y Rellenos		
6,1	210.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR EXPLANACION Y CANALES	m3	2974.93
6,2	201.1	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	2654.20
6,3	201.8	DEMOLICION DEPAVIMENTOS RIGIDOS	m2	3830.54

		Sandenes, Sardineles y Pisos		
6,4	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	4200.20
6,5	330.2.1	BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	m3	1260.06
6,6	231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	4200.30
6,7	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	3242.24
6,8	672.3	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUVE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	6785.89
6,9	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)- MEZCLA IN SITU	m3	20.85
6,10	500.1.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - NT2	m3	23.16
		Paisajismo		
6,11	810.1	PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	m2	1921.33

3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general

ID del SECOP	002 - 2022
CONTRATO	001544 - 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
Conformado por	CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S (20%) NIT 90026835-2
	XIE S.A. (75%) NIT:83006168-4
	CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR (5%) ID:7.167.398
NIT	901615824-0
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
CC	7.167.398 de Tunja Boyaca
Dirección	CR 6 4 50 P 2 Leticia Amazonas
Celular	3217541512
Email	cagisue@gmail.com
CONTRATANTE	Gobernación del amazonas - INVIAS
OBJETO	“REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA”.
VALOR	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

	|CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/Cte. ($18.373.634.172,61).
FECHA DE ORDEN DE INICIO	05 DE AGOSTO DEL 2022
PLAZO INICIAL	7 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIAL DE TERMINANCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes

Durante lo transcurrido del mes de abril esta interventoría, el contratista y la supervisión realizaron el acta de inicio con fecha del 12/04/2023 y dos comités de obra con fecha del 20/04/2023 y 26/04/2023 respectivamente.

En el comité de obra No.1, se adquirió el compromiso de realizar la revisión de estudios y diseños, por parte de los especialistas de interventoría y contratista.

Entrega de formato de acta de vecindad para aprobación, toda la documentación técnica requerida por parte del contratista, y realizar ajuste del contrato de obra mediante otro si no.3.

Revisión de los diseños iniciales entregados por la entidad contratante.

En el Comité de obra No.2, se pactaron compromisos como inicio de actas de socialización, entrega de documento PAGA, solicitudes a la gobernación por tramites ambientales e información detallada de los diseños, ajuste al plan de inversión de anticipo y caracterización de materiales.

Entrega de documentación como PMT, hojas de vida, equipo mínimo requerido, programa de obra, plan de inversión del anticipo, desglose del AIU, Análisis de precios unitarios.

3.3 Seguimiento de Ítems No previstos

A la fecha no se ha tramita ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha del presente informe, no se presenta inicio de actividades de obras físicas debido a que la aprobación de los estudios y diseños y del documento PAGA el cual falta el concepto para los permisos ambientales por parte de la corporación.

Revisión de los documentos presentados por el contratista, con su respectiva devolución y/o aprobación.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Los informes semanales que se contempla dentro de este mes corresponden los informes semanales No. 1, 2. A la fecha tiene un porcentaje programado 0.17 % ($34.620.412)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21/4/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 1 (Numeración consecutiva) del 12/4/2023 al 20/4/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: IVAN DARIO GAMBOA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA SAS XIE S.A CARLOS SUAREZ ESCOBAR		
CONTRATO No.	1544 - 2022	VALOR INICIAL:	$ 20.800.000.000,00
FECHA DE INICIO:	12/4/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	12/11/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIASCOL		
INTEGRANTES:	INGEOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS CIAF LTDA INGENIERIA PROCIVING SAS		
CONTRATO No.	1052 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 6,810,230,532.00
FECHA DE INICIO:	16/11/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 6,810,230,532.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 386,791,000.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 20,800,000,000	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 400,000,000	$ 3,400,000,000	$ 3,010,230,532	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 400,000,000	$ 3,400,000,000	$ 3,010,230,532	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 20,800,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6,666,666.67	0.03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6,666,666.67)	-0.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,666,666.67	0.03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,666,666.67	0.03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,810,230,532.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 328,804,735.00	4.83%
	$ 130,910,566.00	1.92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 51,546,635.00	0.76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,787,500.00	0.17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 10,400,000,000
Amortizado $	
Saldo $	$ 10,400,000,000

INDICADOR I/C	
En el mes:	-
Acumulado:	-

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 386,791,000.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 386,791,000.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0.03% — Avance o Atraso Físico %: -0.03%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
EXPLANACION	m3	7070.2	7070.2		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Unidad	170	170		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
RED DE ACUEDUCTO	ml	748.71	748.71		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	3	3		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	m3	245.1	245.1		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
BASES,SUBBASE Y AFIRMADOS	m3	2944.404	2944.404		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	3134.25	3134.25		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
ESTRUCTURAS DE DRENAJE	m3	3438.72	3438.72		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Unidad	2260.00	2260.00		Prog					-
					Ejec	-			-	-
OBRAS PARA URBANISMO	m3	1260.07	1260.07		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
OBRAS INTALACIÓNES ELECTRICAS	Unidad	77.00	77.00		Prog	-			-	-
					Ejec					-
SUMINISTRO DE TUBERIAS	ml	317	317		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

TRAMO Y/O SECTOR 1: Carrera 6 entre calle 3 y calle 12
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
N/A	N/A	N/A
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El documento PAGA esta en proceso de elaboración por parte del contratista

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El documento PAGA esta en proceso de elaboración por parte del contratista

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: En proceso de elaboración por parte del contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

-El contratista dio inicio a actividades desde el 12 de abril de 2023, realizando contratación de personal técnico para la revisión de los diseños entregados por la gobernación, adquisición de materiales .
-Se hizo la entrega del PMA Y Plan de inversión del anticipo. Se entregaron hojas de vida de personal a ingresar para revisión y aprobación de esta Interventoria de los siguientes profesionales.: Director de obra, Residente de obra, topografo, residentge siso, residente social.
-Se recibio Plan de calidad y se realizó observaciones al Plan y la falta de anexos como plan de inspeccion y ensayo del contratista para el control y ejecución de los ensayos en cada item y sus frecuencias de realizacion.
-Se solicito subsanar observaciones al Plan de Manejo de Transito . El contratista solicito copia del informe inventario forestal pero este lo debe suministrar la Gobernación o que la misma entidad envíe a la entidad ambiental para su aprobación

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha no se ha entregado el programa de actividades

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



CONVENCIONES

Programado												
Ejecutado												
EXPLANACIÓN	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	RED DE ACUEDUCTO	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	BASES,SUBBASE Y AFIRMADOS	PAVIMENTO DE CONCRETO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	OBRAS PARA URBANISMO	OBRAS INTALACIÓNES ELECTRICAS	SUMINISTRO DE TUBERIAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

SE ESTA REALIZANDO POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA TALES COMO: PLAN DE CALIDAD, PMA Y HOJAS DE VIDA PERSONAL TECNICO PROFESIONAL, PROGRAMA DE INVERSIÓN, PROGRAMA DE OBRA, DESGLOCE DEL A.I.U.Y APU'S Y PMT. SE REVISO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y CONTRATO DE OBRA Y SE DIO APROBACIÓN DEL SIGUIENTE PERSONAL PROFESIONAL: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFO FALTA PROFESIONAL SST.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: MARLY MILENE SARRIA
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	28/4/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 21/4/2023 al 27/4/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: IVAN DARIO GAMBOA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA SAS; XIE S.A; CARLOS SUAREZ ESCOBAR
CONTRATO No. 1544 - 2022 — VALOR INICIAL: $ 20,800,000,000.00
FECHA DE INICIO: 12/4/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/11/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/11/2023
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
INTEGRANTES: INGEOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS; CIAF LTDA INGENIERIA; PROCIVING SAS
CONTRATO No. 1052 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 6,810,230,532.00
FECHA DE INICIO: 16/11/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 6,810,230,532.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 386,791,000.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 20,800,000,000	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 400,000,000	$ 3,400,000,000	$ 3,010,230,532	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 400,000,000	$ 3,400,000,000	$ 3,010,230,532	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 20,800,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12,500,000.00	0.06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12,500,000.00)	-0.06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12,500,000.00	0.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,666,666.67	0.032%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,810,230,532.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,351,370.00	5.98%
	$ 130,910,566.00	1.92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 51,546,635.00	0.76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,787,500.00	0.17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 10,400,000,000
Amortizado $	
Saldo $	$ 11,036,846,485

INDICADOR I/C	
En el mes:	-
Acumulado:	-

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 386,791,000.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 386,791,000.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0.06% — Avance o Atraso Físico %: -0.06%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
EXPLANACION	m3	7070.2	7070.2		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Unidad	170	170		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
RED DE ACUEDUCTO	ml	748.71	748.71		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	3	3		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	m3	245.1	245.1		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
BASES,SUBBASE Y AFIRMADOS	m3	2944.404	2944.404		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	3134.25	3134.25		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
ESTRUCTURAS DE DRENAJE	m3	3438.72	3438.72		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Unidad	2260.00	2260.00		Prog					-
					Ejec	-			-	-
OBRAS PARA URBANISMO	m3	1260.07	1260.07		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-
OBRAS INTALACIÓNES ELECTRICAS	Unidad	77.00	77.00		Prog	-			-	-
					Ejec					-
SUMINISTRO DE TUBERIAS	ml	317	317		Prog	-			-	-
					Ejec	-			-	-

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

TRAMO Y/O SECTOR 1: Carrera 6 entre calle 3 y calle 12 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
N/A	N/A	N/A
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: El documento PAGA esta en proceso de elaboración por parte del contratista

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ..... NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ..... NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ..... NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ..... NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ..... NO	N/A	
EMISIONES:	SI ..... NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ..... NO	N/A	

OBSERVACIONES: El documento PAGA esta en proceso de elaboración por parte del contratista

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: En proceso de elaboración por parte del contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


-El contratista esta realizando la contratación de personal técnico para la revisión de los diseños entregados por la gobernación, adquisición de materiales .
-Se hizo la entrega del PMA Y Plan de inversión del anticipo.
-Se esta corrigiendo el plan de calidad y sus anexos como plan de inspeccion y ensayo del contratista para el control y ejecución de los ensayos en cada item y sus frecuencias de realizacion.
-Se esta corriengodo el Plan de Manejo de Transito.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha no se ha entregado el programa de actividades

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

-SE ESTA REALIZANDO LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
-ELABORACIÓN DE COMITÉS DE OBRA PARA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARLY MILENE SARRIA
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

A la fecha el contratista reporta la siguiente maquinaria la cual fue verificada en campo:

Nota: No aplica, teniendo en cuenta que no presenta información por el contratista, toda vez que esta en etapa de estudios y diseños.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DEL 2023

PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

CONTRATO No. 001544 - 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIASCOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	N/A																																	
VOLQUETA	N/A																																	
VOLQUETA	N/A																																	
VOLQUETA	N/A																																	
VIBROCOMPACTADOR	N/A																																	
RETROCARGADOR	N/A																																	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Estamos en la Etapa de Revision de Estudios y diseños por lo tanto este Formato N/A

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el Interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Fabian Pinedo Waldron
Residente de Obra
Matricula Profesional No.: 1320241301 BLV

Firma

FIRMADO POR: MARLY MILENE SARRIA - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Nombre:
Residente de Interventoria
Matricula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Se reporta el siguiente personal a la fecha:

- Director de obra
- Residente de obra

Sin embargo, el formato se entrega con firmas, pero este no está completamente diligenciado, toda vez que el contratista no ha entregado la información correspondiente al mes de abril.

Adicional se desconoce los profesionales que formaran parte del equipo de trabajo de los especialistas.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/03/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 001544 - 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DEL 2023

PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1052 - 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAFAMAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Ferney Meneses Carreño	1100964718	Residente de obra							Sanitas			proteccion				$ -	$ -	
2	Fabian Pinedo Waldron	73111190	Director de obra							Nueva EPS			Colpensiones				$ -	$ -	
3																	$ -	$ -	
4																	$ -	$ -	
5																	$ -	$ -	
6																	$ -	$ -	
7																		$ -	
8																	$ -	$ -	
9																	$ -	$ -	
10																	$ -	$ -	
11																	$ -	$ -	
12																	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adiunta la certificación de fecha 4/04/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Fabian Pinedo Waldron
Director de obra
Matrícula Profesional No.:: 1320241301 BLV

Firma
Nombre: Marly Sarria González
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. Formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

No se diligencia dicho formato dado que no se ha realizado ningún pago al contratista y esta en proceso de revisión el plan de inversión del anticipo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 001544 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DEL 2023 **PROYECTO:** "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
AÑO						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


Firma
Nombre: FABIAN PINEDO WALDRON
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 1320241301 BLV

Firma
Nombre: Marly Sarria González
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

A la fecha no se presentado el ingreso del residente de interventoría, así mismo no se anexa registro pluviométrico del IDEAM, la información más reciente es del año 2022.

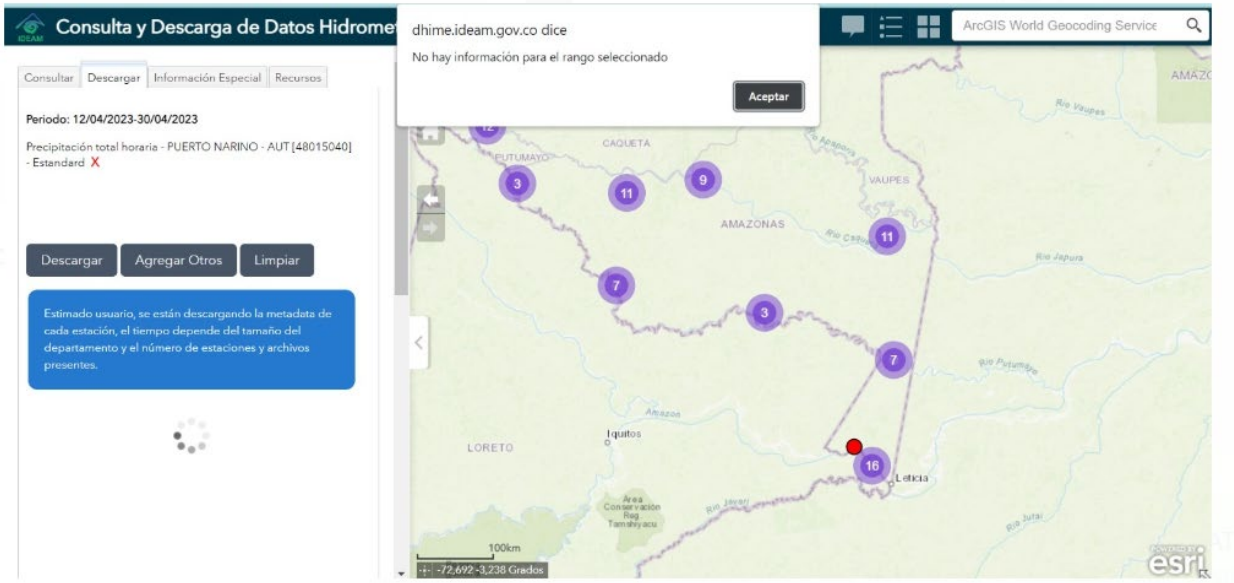

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 001544 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DEL 2023 **PROYECTO:** "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1052 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas												4	5	5	4	5	4	4	4	5	3	4	5	3	4	3	4	5	3	4	3	81
Lluvias intensas												1	2	3	2	4	3	2	3	2	4	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	52
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	6	9	7	6	7	7	7	7	8	6	6	5	7	7	6	6	6	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Fabian Pinedo Waldron
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1320241301 BLV

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

FIRMADO POR: MARLY MILENE SARRIA - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

A la fecha no se ha entregado el informe de los ensayos de laboratorio y/o caracterización de materiales por parte del contratista, toda vez que esta en etapa de estudios y diseños (No aplica este formato).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No.: 001544 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DEL 2023 **PROYECTO:** "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: Fabian Pinedo Waldron
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 1320241301 BLV



Firma

Nombre: Marly Sarria González
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

El contratista envía los documentos de las pólizas actualizadas según acta de inicio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 001544 - 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

OBJETO DEL CONTRATO:

"REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

FECHA DE INICIO: 14/4/2023

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 18,373,634,172.61

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 50,000,000.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	13%	$ 2,393,239,502.00	5	8	2022	6	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	65%	$ 11,966,197,510.00	5	8	2022	5	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26%	$ 4,786,479,004.00	5	8	2022	5	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	39%	$ 7,179,718,506.00	31	12	2023	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101190468

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros del estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10%	$ 1,196,619,751.00	5	8	2022	5	3	2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10%	$ 1,196,619,751.00	5	8	2022	5	3	2023
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10%	$ 1,196,619,751.00	5	8	2022	5	3	2023
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10%	$ 1,196,619,751.00	5	8	2022	5	3	2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10%	$ 1,196,619,751.00	5	8	2022	5	3	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101048874 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: seguros del estado

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

A LA ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO ENVIE LAS POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE LA OBRA

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Marly Sarria González
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101190468	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	05	08	2022	00:00	05	03	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	NIT: 901.615.824-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 50 PISO 2	LETICIA, AMAZONAS	3217541512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 10 - 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA
AMPARAR EL PAGO DE LAS MULTAS, LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA CONVENIDAS DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO No 001544 DE FECHA 05 AGOSTO DE 2022, CUTO OBJETO ES REHABILITACION DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

-EL AMPARO DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ASEGURADO/BENEFICIARIO:
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS NIT 899.999.336-9 / INVIAS NIT 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/08/2022	05/09/2023	$2,393,239,502.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/08/2022	05/03/2026	$4,786,479,004.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$7,179,718,506.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	05/08/2022	05/09/2023	$11,966,197,510.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
XIE S.A.	830061684-1	75.00
SUAREZ ESCOBAR CARLOS GUILLERMO	7167398	5.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *137,339,163.00	$ ******25,000.00	$ **********0.00	$ *******137,364,163.00	$ ***26,325,634,522.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101190468

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101190468**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**08**	**2022**	**05**	**08**	**2022**	**00:00**	**05**	**03**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	**NIT: 901.615.824-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 NRO. 4 - 50 PISO 2	LETICIA, AMAZONAS	3217541512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**NIT: 899.999.336-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 10 NRO. 10 - 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Efecty · Copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *137,339,163.00	$ ******25,000.00	$ **********0.00	$ *******137,364,163.00	$ ***26,325,634,522.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000622046199(3900)000137364163(96)20230805

REFERENCIA PAGO:

1100062204619-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PAGARÉ CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL No. CCUT-904491-11-22

_ , MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON _ _ _ _ _ NO._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERNACIONAL WOC , NIT N°. 901615824 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, Y SUS INTEGRANTES:

(1) _, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA _ _ _ N°. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE XIE S.A. , NIT NO. 830061684 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO,

(2) _, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA _ _ _ N°. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SUAREZ ESCOBAR CARLOS GUILLERMO , NIT NO. 7167398 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO,

(3) _, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA _ _ _ N°. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S , NIT NO. 900268352 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO, A TRAVÉS DEL PRESENTE DOCUMENTO, NOS DECLARAMOS DEUDORE DE SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN LA SUMA DE _ MONEDA CORRIENTE ($_). EN TAL VIRTUD, PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A SEGUROS DEL ESTADO S.A., A SU ORDEN, O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, LA CANTIDAD QUE SE DECLARA ADEUDAR ARRIBA, EL DÍA _ _ _ _ _ _ _ DE _ _ _ _ _ _ _ DE _ _ _ _ _ _ _ _. EN CASO DE MORA, SE RECONOCERÁN Y PAGARÁN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DE ESTE PAGARE

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUTORIZAMOS EN FORMA IRREVOCABLE A SEGUROS DEL ESTADO S.A., EXPRESAMENTE PARA LLENAR SIN PREVIO AVISO, LOS ESPACIOS QUE FIGURAN EN BLANCO EN EL PRESENTE PAGARÉ, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. EL VALOR QUE DE ANTEMANO TIENE NUESTRA ACEPTACIÓN Y POR EL CUAL SE DEBERÁ LLENAR EL PAGARÉ, SERÁ IGUAL AL MONTO QUE SEGUROS DEL ESTADO S.A., PAGUE POR RAZÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 101190468 CUYO TOMADOR ES CONSORCIO INTERNACIONAL WOC, EN LA QUE SE DEMUESTRE COMO RESPONSABLE POR EL SINIESTRO QUE AFECTE LA CITADA POLIZA, AL TOMADOR MENCIONADO, ASÍ COMO DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE LA MODIFIQUEN, RENUEVEN O PRORROGUEN.
2. LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE TÍTULO SERÁ LA DEL DÍA EN QUE SE DILIGENCIEN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PRESENTE PAGARÉ.
3. CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZO DE MANERA PERMANENTE E IRREVOCABLE A SEGUROS DEL ESTADO S.A. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS PARA QUE CON FINES ESTADÍSTICOS, DE CONTROL O SUPERVISIÓN PROCESE, REPORTE, CONSERVE, CONSULTE, SUMINISTRE O ACTUALICE CUALQUIER INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO, COMERCIAL, CREDITICIO O DE SERVICIOS DERIVADAS DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO, A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN O BASES DE DATOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS PARA TAL FIN, QUE ESTIME CONVENIENTE, EN LOS TÉRMINOS Y DURANTE EL TIEMPO QUE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS, LAS NORMAS Y LAS AUTORIDADES LO ESTABLEZCAN. LA CONSECUENCIA DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ LA INCLUSIÓN DE MI INFORMACIÓN Y/O DE LA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO EN LAS MENCIONADAS BASES DE DATOS Y POR TANTO LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO, ASEGURADOR O DE CUALQUIER OTRO SECTOR AFILIADAS A DICHAS CENTRALES CONOCERÁN MI (NUESTRO) COMPORTAMIENTO PRESENTE Y PASADO RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, COMERCIALES, CREDITICIAS O DE SERVICIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 25 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL DE:CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

NIT NO.:901615824

DIRECCIÓN:CR 6 NRO. 4 - 50 PISO 2

TELÉFONO:3217541512

CIUDAD:LETICIA

INTEGRANTES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:7167398

REPRESENTANTE LEGAL DE: SUAREZ ESCOBAR CARLOS GUILLERMO

NIT NO.:

DIRECCIÓN:CR 67 NRO. 94 A - 75

TELÉFONO:3174281119

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL DE: XIE S.A.

NIT NO.:830061684

DIRECCIÓN:CR 11 NRO. 134 B - 33 BRR LISBOA

TELÉFONO:6270081

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL DE: CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S

NIT NO.:900268352

DIRECCIÓN:CL 10 NRO. 9 - 101 OF 2

TELÉFONO:3507849094

CIUDAD:LETICIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101190468, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de AGOSTO de 2022



11-44-101190468

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101048874	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	05	08	2022	00:00	05	03	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	NIT: 901.615.824-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 50 PISO 2	LETICIA, AMAZONAS	3217541512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 10 - 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:
INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FISICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 001544 DE FECHA 05 AGOSTO DE 2022, CUTO OBJETO ES REHABILITACION DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

SE ACLARA QUE LOS BENEFICIARIOS ADICIONALES DE LA PRESENTE POLIZA SON LOS TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADO/BENEFICIARIO:
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS NIT 899.999.336-9 / INVIAS NIT 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
XIE S.A.	830061684-1	75.00
SUAREZ ESCOBAR CARLOS GUILLERMO	7167398	5.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,737,557.00	$ ******20,000.00	$ **********0.00	$ *********1,757,557.00	$ ****1,196,619,751.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101048874

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101048874	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	05	08	2022	00:00	05	03	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERNACIONAL WOC — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.615.824-0**

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 50 PISO 2 — **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS — **TEL FONO:** 3217541512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.336-9**

DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 10 - 77 — **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS — **TEL FONO:** 5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/08/2022	05/03/2023	$1,196,619,751.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101048874

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NANCYOVALLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101048874	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	05	08	2022	00:00	05	03	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	NIT: 901.615.824-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 NRO. 4 - 50 PISO 2	LETICIA, AMAZONAS	3217541512

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 10 NRO. 10 - 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,737,557.00	$ ******20,000.00	$ **********0.00	$ *********1,757,557.00	$ ****1,196,619,751.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000622046207(3900)000001757557(96)20230805

REFERENCIA PAGO:

1100062204620-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

No aplica, el contratista a la fecha no ha entregado el plan de calidad, manifestando que lo entregaran una vez se entreguen los ajustes de los estudios y diseños.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL AMAZONAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 001544 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

FECHA DE INICIO: 12/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 11/11/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1052 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

NO SE HA PRESENTADO PLAN DE CALIDAD

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

N/A

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

N/A No Aplica

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

N/A

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

N/A

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2023
(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

N/A

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NO SE PRESENTAN LAS FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DE CALIDAD YA QUE A LA FECHA NO SE HA DADO INGRESO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE


NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: Fabian Pinedo Waldron
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1320241301 BLV

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Marly Sarria González
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos de seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. MEPI-MN-IN-2-FR-1

No aplica, en proceso de ajuste por parte del contratista de obra.

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra.

Se presenta seguimiento al programa de obra a fecha de corte del presente informe estaba en proceso de ajuste el programa de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/4/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 1544 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 -2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MINIMA REQUERIDA ANTES DEL INICIO DE OBRA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

RESPUESTA A DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EL 12 Y 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN REVISIÓN REALIZADA.
REQUISITOS MINIMOS QUE SOLICITA EL PLIEGO DE CONDICIONES.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10: 00 a.m se inicia la reunión con las siguientes partes del contrato de obra: Gobernación del Amazonas, consorcio internacional WOC e interventoria.
-La interventoria manfiesta que revisó la documentación recibida por parte del contratista el día 12 y 14 de abril, y que se darán respuesta el día 20 de abril de 2023 por escrito de las observaciones encontradas.
- El contratista manfiesta que mediante el oficio WOC-014-2023 hizo entrega de Hojas de vida del personal, maquinaria, Plan de Inversion del Anticipo, PMT, programación de obra
- La interventoria manifiesta que se dió aprobación al personal: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFO. No se aprobó el Profesional SST debido a que no cumplia con la acreditación en la experiencia según el anexo tecnico.
.

- La interventoría manifiesta que la documentación de la maquinaria o equipo minimo está en revisión, porque dentro de los soportes de cada maquinria solo anexaron tarjeta de propiedad y en en algunos casos declaración de importación. Se dará respuesta el 21 de abril de 2023, de acuerdo a lo minimo requerido en PLIEGOS DE CONDICIONES.

- La interventoría manifiesta que en el Plan de Inversiones presenta observaciones y que se requiere ajuste al tema de distribución de maquinaria , este debe ser máximo 15% en compra de maquinaria y se refleja un 20% se debe corregir.Sobre estas observaciones se emitirá una respuesta de cada documentación para el día 21 de abril de 2023.

-La interventoría menciona que el día 21 de abril enviará a todas las partes el acta de tecnico inicial con temas tratados en la reunion de 12 de abril de 2023, para que sea revisada por todas las partes y se firme para dejar el precedente de la reunión, por alineamientos al diligenciamiento del acta inicial segun sistema de gestión del INVIAS.

- Se hace la observacion que en el acta inicial quedó estipulado que la Gobernacion del Amazonas entrego la documentación de estudios y diseños para revisión del contratista .El contratista menciona que toda la documentación no se le ha entregado, que emitirán un oficio mencionando los documentos faltantes y las necesidades faltantes o adicionales que vayan encontrando en el transcurso de la obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20/4/2023 (Día / Mes / Año)

- La entidad contratante, la gobernación del amazonas menciona que envio tanto al contratista e Interventoria 16 carpetas las cuales contienes: Estudios de transito, estudio geologico, estudios geometricos, estudio geotecnica, estudio de taludes, estudio de pavimentos, fundición de suelos), que dentro del estudio de pavimentos se encuentran las redes electricas, redes de acueducto, alcantarillado. Existe una carpeta Ambiental con el PAGA , aunque no se ha aprobado por diferencias en actividades a incorporar por Interventoria segun alineamientos INVIAS, y PLIEGOS DE CONDICIONES, falta el inventario forestal que segun menciona la Ing Camila se hará un oficio el dia 20 de abril de 2023, a CORPOAMAZONIA donde se enviará el inventario para su revisión y aprobación . Una vez se tenga definido se les hará conocer a todas las partes
-La interventoría menciona que otro parámetro a entregar son los registros sociales, como las actas de vecindad , el cual solicita la entrega del levantamiento de las actas de vecindad a esta interventoria. El contratista menciona que el día 20 y 21 de abril hará la debido socialización del diligenciamiento de las actas de vecindad y se enviará a revisión y aprobación del formato a la Interventoria. Se tiene pensado dar inicio a realizar las actas en la semana de 24 al 29 de abril de 2023 .Pero en primera instancia se enviará el formato para aprobación de la Interventoria y asi empezar su diligenciamiento en campo.
- La interventoría solicita al contratista entregar el flujo de caja , sobre le manejo de los recursos sobre cada actividad a ejecutar. La Interventoria manifiesta que se trabaja bajo los alineamientos del INVIAS en el programa de COLOMBIA RURAL, por tal razón se requierela entrega del programa de Incorporación , Plan de calidad, Programa de Inversiones, Flujo de caja, Programa de Gerencia, Instalaciones Provisionales, APU´S , laboratorio a emplear para el control de los ensayos, desgloce del A.I.U, programa de obra.
- La interventoría pregunta al contratista de revisar su contrato de obra , acta modificatorio N °002 y PLIEGO DE CONDICIONES, donde se manifiesta la entrega de esta documentación como requisitos minimos obligatorios a entregar . Debido a que el contratista manifiesta que no esta obligado a dar la información solicitada por esta Interventoria ya que no lo menciona el contrato de obra ni sus modjficatorios. Por tal razón solicita la revision especifica de los documentos contractuales ya que son requisitos minimos contractuales
- La interventoría pregunta acerca de como van con la revisión de estudios y diseños sobre los volumenes geotecnicos, dice que recibio de parte de las empresas de servicios el tema de interferencias a realizar, el contratista menciona que en el desarrollo de la via urbana , se va a verificar si existe interfenrencias y programas a desarrrolar durante el tranccurso del proyecto. Si se harán obras por parte de la Alcaldia o Gobernación en zonas donde se intervendra la obra. Para que no halla retraso de la obra.El contratista menciona que hicieron apiques con el laboratorio CONCRELAB y se esta adelantando un estudio a las losas existentes para identificar el tipo de material que se tiene para poder reutilizar el material y minimar impactos ambientales.Menciona que se esta revisando el tema de los descoles en las obras hidraulicas en las zonas urbanas.
- El contratista informa que enviaron pruebas del suelo encontrado mediante apiques realizados para deteminación de los suelos.
-El contratista menciona que esta revisando las canteras o zonas de donde se puede extraer el material a utilizar en la obra dando cumplimiento a la parte ambiental.
-El contratista manifiesta que una vez revisada la zona en cuanto interferencias a realizar o realizadas por alcaldia o Gobernación emitirá concepto sobre lo revisado y que incidencia tiene para la construcción de las obras
-La interventoría menciona que revisará la documentación remitida por la Gobernación y dará su concepto de cada estudio recibido.Como el contratista hará su revisión y se emitirá respuesta a las carpetas que envio por parte de la Gobernación de los estudios y diseños.El contratista menciona que el tiempo esta limitado en la revisión de estudios y diseños .Ellos requieren establecer mesas de trabajo para socializar lo revisado pues el tiempo esta limitado en esta etapa .Se discrimine las actividades a revisar , planificación para progamar el plan de trabajo, que van hacer, fecha de inicio en obra. Se verán afectaciones que va a tener en el presupuesto en caso de modificaciones o necesidades , adiciones .
-La interventoría manifiesta que hará envío del acta de comité tecnico inicial para revisión de todos para su posterior aprobación de lo descrito y colocación de las firmas una vez acepten lo mencionado en dicho comité. La interventoria mediante oficio solicito al contratista incluir en el contrato de obra una clausula o adicionar como modificatorio N 003 , en numeral (FORMA DE PAGO) anexar en los analisis de previos unitarios la formula de reajustes a los mismos, el cual deberá quedar en el otro SÍ del contrato de obra. Compromiso a realizar el contratista a la Gobernación.
-El contratista menciona que se hará un staff sobre la revision de estudios de estructural,hidraulica y conexión de los descoles para el manejo de las aguas, El Ing menciona que se harán mesas de trabajo con los diferentes especialista.El contratista hará su primer mesa de trabajo con los especialistas en especial con el de diseño geometrico debido a las interferencias de urbanismo, redes en general.La Ing camila menciona que es importante la intervencion o citar al ing de suministros (acueducto y alcantarillado).
-La interventoría solicita al contratista la entrega del PAGA , como los demas documentos técnicos mencionados anteriormente , pues se les recuerda que estos documentos solicitados minimos requeridos se deben entregar en un plazo de tres días a partir de acta de inicio de obra para revisión de esta Interventoria.
-La interventoría solicita al contratista hacer una mesa de trabajo el dia 21 de abril con los especialistas(contratista) e Interventoria (especialistas) para realizar un debate o dar las observaciones encontradas de la primera revision de los estudios y diseños.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20/4/2023
	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS (ESPECIALISTAS INTERVENTORIA-CONTRATISTA)	viernes, 21 de abril de 2023	CONTRATISTA-INTERVENTORIA
ENTREGA FORMATO ACTA DE VECINDAD A APROBACION	viernes, 21 de abril de 2023	CONTRATISTA
ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA MINIMA CONTRACTUAL	viernes, 28 de abril de 2023	CONTRATISTA
REALIZAR AJUSTE AL CONTRATO DE OBRA CON OTRO SI N° 003 DESGLOZANDO EL REAJUSTE A FORMULA DE APU´S	viernes, 28 de abril de 2023	CONTRATISTA-GOBERNACION
ENVIO DEL ACTA DE COMITÉ INICIAL PARA APROBACION Y FIRMA DE LOS INTERESADOS	viernes, 21 de abril de 2023	CONTRATISTA-GOBERNACION Y INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIAN PINEDO WALDRON	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO WOC	ver pantallazo
MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ	DIRECTORA INTERVENTORIA	CONSORCIO VIASCOL	ver pantallazo
MARYORIE C.	REPRESENTACION	CONSORCIO WOC	ver pantallazo
OSCAR DAVID VARGAS	REPRESENTACION	CONSORCIO WOC	ver pantallazo
CAMILA GOENAGA	SECRETARIA PLANEACION	GOBERNACION AMAZONAS	ver pantallazo
JOSE FRANCISCO MORON	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIASCOL	ver pantallazo

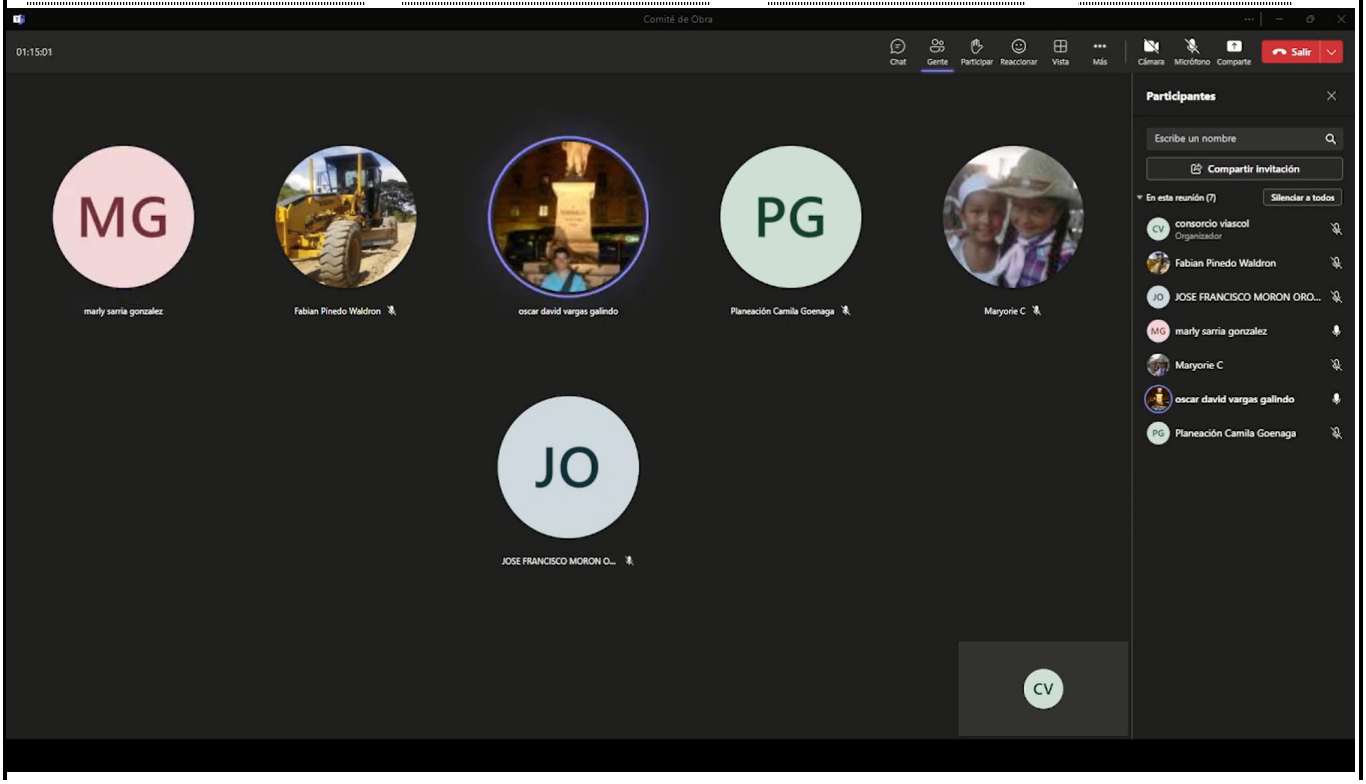

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA 26/04/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 02
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vias Regionales. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caqueta

CONTRATO DE OBRA No. 001544-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL UDC.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REHABILITACION DOBLE CALZADA, ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE HIZO LA RESPECTIVA LECTURA Y SE RECORDO QUE NO SE CUMPLIO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS, REFERENTE A: LA MESA DE TRABAJO ENTRE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORIA. REFERENTE AL ACTA DE REUNION TECNICA INICIAL, NO SE HABIA TRAMITADO TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE NO ESTA DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- AFECTACIONES CONTRATISTA FRENTE A LAS OBRAS QUE NO SON COMPETENCIA DEL INVIAS, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ADELANTO LA RESPECTIVA GESTION, ENVIANDO MEDIANTE COMUNICADOS A CADA UNA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA QUE NOTIFICARAN AL CONTRATISTA DE LAS AFECTACIONES, PLANOS RECORD Y/O PROYECTOS EN DESARROLLO QUE PUDIERAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE OBRAS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

DEL PROYECTO CONTRATO, A LA FECHA NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA (A)

✓PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: LA INTERVENTORIA SOLICITO AJUSTES ATRAVES DEL OFICIO CI-VIASCOL-066 del 25 abril de 2023, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE PROCEDERA A REALIZAR EL AJUSTE SEGÚN LO INDICADO Y LOS LINEAMIENTOS DEL INVIAS.

EL GESTOR DE INVIAS → SOLICITA REALIZAR UN ACERCAMIENTO SOCIAL PARA PODER AVANZAR EN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACION REQUERIDA

✓ACTAS DE VECINDAD: EL CONTRATISTA MANIFIESTA. QUE DENTRO DEL DESGLOSE DEL AIU NO TIENE PROFESIONAL SOCIAL, SIN EMBARGO EN ARAS DE PODER SOLUCIONAR EL DILIGENCIAMIENTO DE DICHAS ACTAS, EL CONTRATISTA ENVIARA LA HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL QUE UTILIZARA EN EL PROYECTO, POR LO ANTERIOR LAS ACTAS DE VECINDAD EL DIA MARTES 02 DE MAYO DE 2023.

✓ESTUDIOS Y DISEÑOS:
El contratista manifiesta que recibieron el LINK con los estudios y diseños, en el cual se encuentran en proceso de revisión y manifiesta que con su equipo profesional y especialistas realizara el chequeo de la información entregada

y enviaron oficio notificando las fechas de mesas de trabajo entre los especialistas del contratista y los especialistas de la interventoría de igual manera se solicitar ajustar la programación de los estudios y diseños.

✓ la interventoría solicitara a la gobernación que envie detalle de la información detalla del contenido del drive mediante OFICIO el dia 26 de abril de 2023

✓ AFECTACIÓN AMBIENTAL ✓

⊗ Solicitar a la gobernación de los tramites de los regenimentos ambientales, 26/abr/2023 frente a la corporación -

⊗ ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA ⊗

El contratista manifiesta que va dinicar la elaboración del documento PAGA. y se entregara el dia 19 de mayo de 2023.

✓ EL CONTRATISTA MANIFESTO, QUE SE TOMARON LAS MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES EN LA ZONA. PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA.

✓ SE REALIZARON EXPLORACIONES GEOTECNICAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CON EL OBJETIVO DE

BUSCAR LA POSIBILIDAD DE DEJAR LA RECOMENDACIÓN DE LOS DISEÑOS EN CUANTO A LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES RECICLADOS, LA CARACTERIZACIÓN DE ESTE MATERIAL SE ENTREGARA EL DIA 19/Mayo/2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5
		FECHA	26/04/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INICIO ACTAS DE SOCIALIZACION	02/Mayo/2023	Consorcio WOC.
ENTREGA DOCUMENTO PARA VO	19/Mayo/2023	consorcio WOC
NOTIFICACION MOD DE TRAZADO	28/Abril/2023	Consorcio WOC.
OFICIO GOBERNACION INF DETALLADO DE LOS DISEÑOS DEL LINK	28/Abril/2023	INTERVENTORIA.
SOLICITUD GOBERNACION TRAMITO AMBIENTALES	28/Abril/2023	INTERVENTORIA.
PROGRAMACION ETAPA DE CONSTRUCTIVA	28/Abril/2023	Consorcio WOC.
AJUSTE DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO	26 abril/2023	Consorcio WOC.
CARACTERIZACION MATERIALES	19/Mayo/2023	Consorcio WOC.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 03/05/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jhonny Forney Orrego Ortiz	Rep. Legal (S)	Consorcio Viacol	
Oscar Naranjo.	Ing. SST	Consorcio WOC.	
CARLOS SANCHEZ F.	CSE - WOC R/L	CONSORCIO WOC	
Daniela Castillo H	Coordinadora Grupo	INVIAS SUR	
Iván D Gaviria	Gestor	INVIAS / SUR	
MARLEN SARRIA	Directora Interventoría	VIASCOL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5 NFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información General del contrato

CONTRATO	1052 - 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO VIASCOL
Conformado por	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS S.A.S (50%) NIT 824.004.441-2
	CIAF LTDA INGENIERIA (45%) NIT 800.130.967-6
	PROCIVING S.A.S (5%) NIT 900.905.675-0
NIT	901.598.877-7
REPRESENTANTE LEGAL	Jose Francisco Morón
CC	79.787.849
Dirección	Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar.
Email	jfmoron@gmail.com interventoriaviascol@gmail.com
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 1”
VALOR	SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 6.810.230.532) M/cte.
ORDEN DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor en el mes.

Elaboración de informes semanales de interventoría en el cual se reflejan los porcentajes de obra programada y ejecutada, las actividades ejecutadas en la semana, se relaciona el personal de obra y el equipo.

Se realizó seguimiento de actualización del SECOP, evidenciando que la plataforma no está actualizada teniendo en cuenta el acta de inicio de obra.

Revisión de los estudios y diseños iniciales entregados por la entidad contratante (geotecnia, pavimentos).

Elaboración del informe mensual No-1, correspondiente al contrato 001544 de 2022, Gobernación de Leticia.

Revisión de la documentación entregada por el contratista para nuestra respectiva aprobación y observaciones, la cual se relaciona a continuación:

- Plan de manejo de trafico
- Cronograma de obra
- Apu’s
- Desglose de AIU
- Plan de Inversión del Anticipo
- Equipo mínimo requerido
- Hojas de vida

5.3 Informes de Especialistas y profesionales

Se presentan los informes de especialistas de geotecnia y pavimentos de la interventoría en el cual conceptuan y aprueban los estudios y diseños presentados por el contratista.

5.3.1 Informe especialista en geotecnia.

	INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA MES DE ABRIL
	DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA
	ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2	
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Periodo:	Abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1"
Fecha Inicio:	16/11/2022
Fecha Terminación:	31/12/2024
Nombre del contratista:	CONSORCIO VIASCOL

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Descripción de la actividad desarrolladas:

REVISION DISEÑO GEOTECNICO DEL CONTRATO 001544 DE 2022- CONSORCIO INTERNACIONAL WOC- GOBERNACION DE AMAZONAS

Estudio de fundaciones

Se tomaron barrenos manuales, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados en los ensayos realizados:

Tabla 6-12. Resumen de ensayos de clasificación – Carrera 6, Leticia.

BM	MUESTRA			Clasificación				Gradación			USCS
	No	Profundidad (m)		w/c (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Grava (%)	Arena (%)	Finos (%)	
		Desde	Hasta								
BM2	4	4.00	4.50	25.3	N.L.	N.P.	N.IP.	0.0	64.3	35.7	SM
	5	4.50	5.00	23.8	N.L.	N.P.	N.IP.	0.0	67.4	32.6	SM
BM17	1	2.00	30.00	30.8	87	27	60	0.0	53.7	46.3	SC
BM18	2	2.00	2.50	33.3	80	27	53	0.0	36.6	63.4	CH
	3	3.00	3.50	35.6							
	5	5.00	5.50	37.9							

Fuente: Elaboración propia.

FUENTE: VOL. IV - ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES, PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

Con la información de campos e obtuvo la zonificación geotécnica para la carrera 6 , como se puede observar en la tabla siguiente, tomada de la página 54 del VOLUMEN IV

Tabla 6-24. Zonificación Geotécnica

Corredor	Sectorizacion Geologica Geotecnica	Material predominante	Zona Geotecnica
Circunvalar	Depositos y Terrazas Aluviales (Qta - Qal)	Arcilla Media	ZG-C-1
Carrera 6	Depositos y Terrazas Aluviales (Qta - Qal)	Arcilla media con presencia de arenas	ZG-Cr6-1

Obteniendo el siguiente perfil estratigráfico:

A. Profundidad entre 0.00 – 8.00, se encontró una arcilla gris con N=2-17 Golpes/pie de consistencia blanda a rígida (aumentando en profundidad)

Con la información procesada se realizó la estimación del perfil según la NSR-10, arrojando un perfil tipo E y con ello también se determinó que no es un suelo colapsable, pero que según el análisis de potencial de expansión característico es muy alto, es decir arcillas de alta plasticidad.

De lo anterior, podemos deducir que este tipo de suelos requiere tratamiento especial, para evitar contaminación de los materiales a utilizar en el proceso constructivo.

Estudio Geotécnico – Caracterización Geotécnica

Caracterización Geotécnica:
Se realizaron 19 apiques en el tramo, con los cuales se determinaron los respectivos perfiles estratigráficos, de los cuales para el tramo de análisis arrojo lo siguiente:

Capa de concreto de espesor promedio de 0.16m, seguido en algunos casos de un material granular descrito como arena limosa (SM) de espesor promedio de 0.07m y posteriormente un material fino descrito como arcillas de alta plasticidad (CH).

Los valores de expansión reportados oscilan entre 0.04% y 0.02% con un potencial de expansión muy alto, los resultados de índices de consistencia muestran valores altos de límite líquido y plasticidad, evidencia de suelos potencialmente activos.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que la revisión de los documentos elaborados para la caracterización geotécnica del corredor vial, es preciso tener en cuenta el potencial expansivo de los suelos de fundación donde se construirá la estructura de pavimentos y la recomendación de aislar la subrasante con un NT-4000, para los ajustes que se están planteando por parte del contratista.

	INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA MES DE ABRIL
	DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA
	ESPECIALISTA GEOTECNIA

Se recomienda establecer mesas de trabajo para ir analizando la nueva información obtenida en campo y con ello poder dar celeridad al proceso de revisión de los ajustes a presentar.

Como es de conocimiento de la interventoria, el contratista realizara nuevos apiques con el fin de corroborar el perfil estratigráfico y las condiciones actuales de la vio a intervenir, teniendo en cuenta que a la fecha por el deterioro de la estructura existente el suelo de fundación pudo haber deteriorado sus propiedades físicas y con ello cambiaria el tipo de intervención a realizar.

Revisada la información inicial se está a la espera de los ajustes y con ello poder cotejar los dos volúmenes y así emitir concepto del ajuste a presentar, partiendo de la base que ya se tiene un concepto de estado de la vía a intervenir desde el punto de vista geotécnico.



DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA
INGENIERO CIVIL
M.Sc. EN GEOTECNIA
TP 25202-75597 CND

5.3.2 informe especialista en pavimientos

	INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA MES DE ABRIL
	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ
	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Periodo:	Abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1"
Fecha Inicio:	16/11/2022
Fecha Terminación:	31/12/2024
Nombre del contratista:	CONSORCIO VIASCOL

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Descripción de la actividad desarrolladas:

1. REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS INCIALES CONTRATO 001544 DE 2022

Localización: Municipio de Leticia, Carrera 6 Entre Calle 3 y Calle 12 (Av. Internacional)

Alcance: Rehabilitación de la Doble Calzada existente 2.39 km

- Auscultación Visual, por medio de la cual se evidencia que el estado del pavimento es muy malo, teniendo en cuenta que el rango obtenido de PCI para el tramo analizado, esta entre 0-25, como se puede videncia en la pagina 43 del Volumen 6 Estudio Geotécnico para el Diseño de Pavimentos, entregado por la entidad contratante.

- Caracterización Geotécnica: se tomaron 19 apiques en el tramo analizado, con los cuales se determinaron los respectivos perfiles estratigráficos, obteniendo para el tramo de análisis nuestros lo siguiente:

  Capa de concreto de espesor promedio de 0.16m, seguido en algunos casos de un material granular descrito como arena limosa (SM) de espesor promedio de 0.07m y posteriormente un material fino descrito como arcillas de alta plasticidad (CH).

  Los valores de expansión reportados oscilan entre 0.04% y 0.02% (ver página 123 Volumen 6 Estudio Geotécnico para el Diseño de Pavimentos), en el cual se observa que tiene un potencial de expansión muy alto, adicional los resultados de índices de consistencia muestran valores altos de límite líquido y plasticidad, por los cuales se deben realizar tratamientos particulares, ya se evidencia de suelos potencialmente activos.

Estructura propuesta: (Fuente Vol. VII Estudio Geotécnico para el Diseño de Pavimentos)

LOCALIZACIÓN VÍA	CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0MPa (mm)	BASE ESTABILIZADA CON SUELO CEMENTO - BEC (mm)	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, MATERIAL TOLERABLE (mm) (Espesor mínimo de 400mm)
	ARTICULO 500 INVIAS 2013*	ARTICULO 351 INVIAS 2013*	ARTICULO 230 INVIAS 2013*
Carrera 10 entre Calle 21 y Calle 11	200	150	400
Calle 11 entre Carrera 10 y Carrera 11	200	150	400
Calle 8 y 8A entre Carrera 11 y Carrera 12 y carrera 12 entre Calle 8 y 8ª.	200	150	300**
Calle 3 entre Carrera 11 y Carrera 6	200	150	400
Carrera 6 entre Calle 3 y Calle 12	200	150	400
Carrera 11 entre Calle 11 y Calle 3	200	150	400

VOL VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS

Se recomendó por parte del consultor, dos alternativas:

Alternativa 1: MR 4 MPA – Espesor 20cm; Base Estabilizada con suelo cemento (BEC) – Espesor 15cm; Mejoramiento de la subrasante material tolerable – Espesor mínimo de 40cm, separada por un geotextil NT-4000, con el fin de evitar contaminación de la estructura propuesta.

Alternativa 2: MR 4 MPA – Espesor 20cm; Base Estabilizada con suelo cemento (producto de la trituración de placas existentes) – Espesor 15cm; Mejoramiento de la subrasante con material tolerable – Espesor mínimo de 40cm, separada por un geotextil NT-4000, con el fin de evitar contaminación de la estructura propuesta.

Recomendaciones:

Revisado la información contenida en el volumen geotécnico, la interventoria una vez se entreguen los ajusten que presentará el contratista a los volúmenes de geotecnia y pavimentos, deberá tener en cuenta las consideraciones realizadas en el primer volumen en el cual se recomienda un tratamiento particular para los árboles foráneos que están cerca a la vía donde se presentan hundimientos mayores a 20mm, mediante la tala o restitución de las especies existentes.

Teniendo en cuenta que las fuentes de material utilizada para la realización de las alternativas de pavimento, son procedentes del rio putumayo y que por accesibilidad es complejo llevar el material a la zona de influencia, se recomienda que para la revisión que se está realizando se tenga en cuenta los materiales que se consiguen en la zona y que cumplan con las especificaciones particulares de la entidad contratante.

Adicional teniendo en cuenta que los estudios y diseños presentados son del año 2018 y que han transcurrido 4.5 años aproximadamente, se estima prudente que se haga una revisión a estos volúmenes, teniendo en cuenta que, por la operabilidad del tramo, puede haber presentado deterioros por el tráfico y a su vez cambio en la estructura analizada para esa época.

	INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA MES DE ABRIL
	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ
	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

Se continua a la espera de los volúmenes ajustados por parte del contratista para realizar un análisis comparativo entre los diseños iniciales y los propuestos, con el fin de poder avalar los ajustes a los diseños presentados.



HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ
EWSPECIALISTA DE PAVIMENTOS DE INTERVENTORIA

5.4 Informe del Programa Anual de Caja

A continuación, se anexa programa anual de caja.

CONTRATO	SUBTOTAL COSTOS BASICOS	PROVISION PARA AJUSTES	SUBTOTAL COSTOS BASICOS	IVA (19%)	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL VIGENCIAS
INTERVENTORÍA No. 1052 DE 2022	$ 5,316,764,000.00	$ 406,118,800.00	$ 5,722,882,800.00	$ 1,087,347,732.00	$ 6,810,230,532.00	$ 400,000,000.00	$ 3,400,000,000.00	$ 3,010,230,532.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2022

PPTO VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2022	COMPONENTE DE PAGO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2022	SALDOS RECURSOS 2022	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO EN EL AÑOS 2022
		BASICOS	$ -	$ 4,873,470.00	$ -		$ -		
2022	$ 5,799,430.00	AJUSTES	$ -		$ -				
2023	$ 394,200,570.00	IVA	$ -	$ 925,959.30	$ -				
TOTAL	$ 535,789,111.00	VALOR TOTAL	$ -	$ 5,799,429.30	$ -	$ 400,000,000.00	$ -	$ 378,523,821.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2023

PPT VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2023	COMPONENTE DE PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2023	SALDO RECURSOS 2023	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2023	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO EN EL AÑO 2023
		BASICOS	$ 11,454,000.00	$ 7,490,000.00	$ 127,413,000.00	$ 173,266,000.00	$ 316,962,000.00	$ 339,922,000.00	$ 361,472,400.00	$ 368,862,800.00	$ 416,451,000.00	$ 381,381,000.00	$ 354,993,600.00	$ 324,841,600.00					
2022	$ 394,200,570.00	AJUSTES																	
2023	$ 3,400,000,000.00	IVA	$ 2,176,260.00	$ 1,423,100.00	$ 24,208,470.00	$ 32,920,540.00	$ 60,222,780.00	$ 64,585,180.00	$ 68,679,756.00	$ 70,083,932.00	$ 79,125,690.00	$ 72,462,390.00	$ 67,448,784.00	$ 61,719,904.00					
TOTAL	$ 3,794,200,570.00	VALOR TOTAL	$ 13,630,260.00	$ 8,913,100.00	$ 151,621,470.00	$ 206,186,540.00	$ 377,184,780.00	$ 404,507,180.00	$ 430,152,156.00	$ 438,946,732.00	$ 495,576,690.00	$ 453,843,390.00	$ 422,442,384.00	$ 386,561,504.00	$ 3,789,566,186.00	$ 4,634,384.00	$ -	$ 4,634,384.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2024

PPT VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2024	COMPONENTE DE PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2024	SALDO RECURSOS 2024	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2024	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO EN EL AÑO 2024
		BASICOS	$ 266,475,600.00	$ 272,975,600.00	$ 251,091,600.00	$ 209,501,600.00	$ 202,421,600.00	$ 145,477,600.00	$ 139,469,600.00	$ 145,393,600.00	$ 140,313,600.00	$ 117,693,600.00	$ 117,693,600.00	$ 123,747,000.00					
2023	$ 4,634,384.00	AJUSTES												$ 406,118,800.00					
2024	$ 3,010,230,532.00	IVA	$ 50,630,364.00	$ 51,865,364.00	$ 47,707,404.00	$ 39,805,304.00	$ 38,460,104.00	$ 27,640,744.00	$ 26,499,224.00	$ 27,624,784.00	$ 26,659,584.00	$ 22,361,784.00	$ 22,361,784.00	$ 100,674,502.00					
TOTAL	$ 3,014,864,916.00	VALOR TOTAL	$ 317,105,964.00	$ 324,840,964.00	$ 298,799,004.00	$ 249,306,904.00	$ 240,881,704.00	$ 173,118,344.00	$ 165,968,824.00	$ 173,018,384.00	$ 166,973,184.00	$ 140,055,384.00	$ 140,055,384.00	$ 630,540,302.00	$ 6,810,230,532.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,810,230,532.00

5.5 Informe de matriz del riesgo

No se presenta informe a la fecha, toda vez que no ha sido necesario la implementación de acciones para mitigar algún riesgo previsible de los presentados en la matriz de riesgo adjunta a la licitación del proyecto.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

No aplica.

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

No aplica.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

A la fecha, la interventoría cuenta con un vehículo tipo camioneta y dos motocicletas, en el departamento del Caquetá.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-23

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICÁ, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIASCOL

CONTRATO DE OBRA No. 182 - 2022
1544 - 2022
0558 - 2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANDRES
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN				DÍAS DEL MES																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA 2000 CC O MÁS	LUK-093	JAC	2000CM3	2023	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	LXB50G	SUZUKI	DR150	2023				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	TUL06F	SUZUKI	DR150	2023				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: MARLY SARRIA GONZÁLEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firma
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

A la fecha del presente informe se presenta el ingreso del siguiente personal:

- Directora de Interventoria
- Especialista Ambiental
- Especialista en Geotecnia
- Especialista en Pavimentos

Departamento Amazonas

- Profesional social
- Residente de Interventoria

Departamento de Caquetá

- Inspector de obra
- Secretaría
- Conductor
- Ingeniero auxiliar
- Residente de Interventoria
- Profesional ambiental
- Profesional social

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-I-A1:BA58N-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/4/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052- 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL (LA VÍA RURAL UNIÓN PENEYA - SAN ISIDRO - MIRAMAR- LA ESPERANZA)

CONTRATO DE OBRA No.: 182 - 2022; 1544 - 2022; 0558 - 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SAN ANDRES; CONSORCIO INTERNACIONAL WOC; CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFACA - COMPENSAR - CAFAM - CAFAMAZ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARLY MILENE SARRIA	52904700	DIRECTORA DE OBRA	$ 6,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 6,000,000.00	$ 417,600.00	V	SANITAS	9450759889	$ 240,000.00	PORVERNIR	9450759889	$ 1,020,000.00	$ 240,000.00	$ -	$ -	
2	ANDRES CAMILO CHAVES GARCIA	1012386816	INGENIERO AUXILIAR	$ 3,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3,000,000.00	$ 208,800	V	COMPENSAR	9450759889	$ 120,000	PROTECCION	9450759889	$ 480,000.00	$ 120,000	$ -	$ -	
3	LIBER AUGUSTO PARRA SANTAMARIA	16188981	CONDUCTOR	$ 1,217,094.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1,217,094.00	$ 84,800	V	ASMET SALUD	9450759889	$ 48,700	COLFONDOS	9450759889	$ 194,800.00	$ 48,700	$ -	$ -	
4	LEIDY AMAYA PERDOMO	30509941	SECRETARIA	$ 1,160,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1,160,000.00	$ 80,800	V	ASMET SALUD	9450759889	$ 46,400	COLPENSIONES	9450759889	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
5	WANDERLEY CORTES BASTIDAS	1006502465	INSPECTOR	$ 2,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2,000,000.00	$ 139,200	V	SANITAS	9450759889	$ 80,000.00	COLPENSIONES	9450759889	$ 320,000	$ 80,000.00	$ -	$ -	
6	ERIKA LISET PRADA SERRANO	28020577	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	40%	SIMA INGENIERIA SAS	$ 3,000,000.00	$ 208,800	V	SANITAS	67576343	$ 120,000.00	PROTECCION	67576343	$ 480,000	$ 120,000.00	$ -	$ -	
7	RENE ORLANDO SÁNCHEZ CALDERÓN	17684307	INGENIERO RESIDENTE (MONTAÑITA)	$ 4,500,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 4,500,000.00	$ 313,200.00	V	SANITAS	9450759889	$ 180,000.00	COLFONDOS	9450759889	$ 720,000	$ 180,000.00	$ -	$ -	
8	YON FREDY NARVAEZ LOZADA	17648293	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 600,000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CONSORCIO VIASCOL	$ 600,000	$ 41,800	V	SANITAS	9450759889	$ 24,000.00	COLPENSIONES	9450759889	$ 96,000	$ 24,000.00	$ -	$ -	
9	LILIANA PATRICIA BERMUDEZ PARRA	40779362	PROFESIONAL SOCIAL	$ 650,000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CONSORCIO VIASCOL	$ 650,000	$ 45,300	V	SANITAS	9450759889	$ 26,000.00	COLPENSIONES	9450759889	$ 104,000	$ 26,000.00	$ -	$ -	
10	ANDRÉS VALENCIA VARELA	18517103	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	$ 5,000,000	X X X X X X X	15%	INDEPENDIENTE	$ 2,000,000	$ 10,700		CIA SUDAMERICANA DE SALUD	7881671583	$ 250,000.00	COLPENSIONES	7881671583	$ 320,000	$ -	$ -	$ -	
11	JUAN CAMILO JIMENEZ	1064720173	INGENIERO RESIDENTE (PUERTO NARIÑO)	$ 1,050,000	X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1,050,000	$ 73,100	V	NUEVA EPS	9450759889	$ 42,000.00	PORVERNIR	9450759889	$ 168,000	$ 42,000.00	$ -	$ -	
12	CLAUDIA PEREZ	1065906030	INGENIERA AUXILIAR	$ 700,000	X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 700,000	$ 48,800	V	CAJACOPI	9450759889	$ 28,000.00	PORVERNIR	9450759889	$ 112,000	$ 28,000.00	$ -	$ -	
13	INGRID LAMBIS	1047462693	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1,400,000	X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1,400,000	$ 97,500	V	CAJACOPI	9450759889	$ 56,000.00	COLFONDOS	9450759889	$ 224,000	$ 56,000.00	$ -	$ -	
14	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	80268044	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 3,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X	30%	INGENOBRAS	$ 3,000,000.00	$ 208,000	V	NUEVA EPS	9450797582	$ 373,500	COLPENSIONES	9450797582	$ 478,100	$ 119,600	$ -	$ -	
15	DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA	7905711	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 4,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	SOPORTE GEOTECNICO SAS	$ 3,926,579.00	$ 273,300	V	SANITAS	9449261883	$ 157,100	COLPENSIONES	9449261883	$ 628,300	$ 157,100	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 37,277,094																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 2/5/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9C 19 54	FLORENCIA-CAQUETA	5833312	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2071495363	9450759889	E	2023/05/18	2023/05/09	BANCOLOMBIA	0	$6,957,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (8 Afiliados)																							$19,127,094	$3,120,400			$19,127,094	$765,100			$19,127,094	$765,100			$19,127,094		$1,331,500		$0	$0		$5,982,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$19,127,094	$3,120,400			$19,127,094	$765,100			$19,127,094	$765,100			$19,127,094		$1,331,500		$0	$0		$5,982,100
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (8 Afiliados)																							$19,127,094	$3,120,400			$19,127,094	$765,100			$19,127,094	$765,100			$19,127,094		$1,331,500		$0	$0		$5,982,100
1	CC	30509941	AMAYA LEIDY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	40779362	BERMUDEZ LILIANA	X																	25-14	13	$650,000	$104,000	EPS005	13	$650,000	$26,000	CCF13	13	$650,000	$26,000	14-11	13	$650,000	6.960%	$45,300	13	$0	$0	Si	$201,300
3	CC	1012386816	CHAVES ANDRES																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF13	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
4	CC	1006502465	CORTES WANDERLEY																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF13	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	17648293	NARVAEZ YON	X	X																25-14	12	$600,000	$96,000	EPS005	12	$600,000	$24,000	CCF13	12	$600,000	$24,000	14-11	12	$600,000	6.960%	$41,800	12	$0	$0	Si	$185,800
6	CC	16188981	PARRA LIBER									X									231001	30	$1,217,094	$194,800	ESSC62	30	$1,217,094	$48,700	CCF13	30	$1,217,094	$48,700	14-11	30	$1,217,094	6.960%	$84,800	30	$0	$0	Si	$377,000
7	CC	17684307	SANCHEZ RENE	X																	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF13	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	52904700	SARRIA MARLY																		230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF13	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LETICIA -AMAZONAS (3 Afiliados)																							$3,150,000	$504,000			$3,150,000	$126,000			$3,150,000	$126,000			$3,150,000		$219,400		$0	$0		$975,400
Centro de Trabajo: OBRA-LETICIIA (3 Afiliados)																							$3,150,000	$504,000			$3,150,000	$126,000			$3,150,000	$126,000			$3,150,000		$219,400		$0	$0		$975,400
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (3 Afiliados)																							$3,150,000	$504,000			$3,150,000	$126,000			$3,150,000	$126,000			$3,150,000		$219,400		$0	$0		$975,400
9	CC	1064720173	JIMENEZ JUAN	X																	230301	7	$1,050,000	$168,000	EPS037	7	$1,050,000	$42,000	CCF65	7	$1,050,000	$42,000	14-11	7	$1,050,000	6.960%	$73,100	7	$0	$0	Si	$325,100
10	CC	1047462693	LAMBIS INGRID	X																	231001	14	$1,400,000	$224,000	CCFC55	14	$1,400,000	$56,000	CCF65	14	$1,400,000	$56,000	14-11	14	$1,400,000	6.960%	$97,500	14	$0	$0	Si	$433,500
11	CC	1065906030	PEREZ CLAUDIA	X																	230301	7	$700,000	$112,000	CCFC55	7	$700,000	$28,000	CCF65	7	$700,000	$28,000	14-11	7	$700,000	6.960%	$48,800	7	$0	$0	Si	$216,800
Total			**Afiliados(11)**																				$22,277,094	$3,624,400			$22,277,094	$891,100			$22,277,094	$891,100			$22,277,094		$1,550,900		$0	$0		$6,957,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9C 19 54	FLORENCIA-CAQUETA	5833312	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2071495363	9450759889	E	2023/05/18	2023/05/09	BANCOLOMBIA	0	$6,957,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,624,400	$0	$0	$3,624,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,138,800	$0	$0	$1,138,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$705,600	$0	$0	$705,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,300,000	$0	$0	$1,300,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,550,900	$0	$0	$1,550,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,550,900	$0	$0	$1,550,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$891,100	$0	$0	$891,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$126,000	$0	$0	$126,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	8	$765,100	$0	$0	$765,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$891,100	$0	$0	$891,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$95,100	$0	$0	$95,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$84,000	$0	$0	$84,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$120,000	$0	$0	$120,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$550,000	$0	$0	$550,000
TOTAL				**11**	**$6,957,500**	**$0**	**$0**	**$6,957,500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900671273-7	SIMA INGENIERIA S.A.S	Cll. 103 No. 14 A - 53 Of. 403 Ed. Bogot	3153481501	gerencia@simaingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	16/03/2023	65816721	$3.284.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	369.100	0		0		0	0	0	0	369.100	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	74.400	0		0		0	0	0	0	74.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.145.600	0	0	0	0	0	0		1.145.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	228.200	0	0	0	0	0	0		228.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	623.700				623.700	0	0	623.700			6.237	623.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	443.500	0	0	443.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	443.500	443.500
Pensión	3	1.773.800	1.773.800
Riesgos Laborales	1	623.700	623.700
CCF	1	443.500	443.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.284.500	3.284.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900671273-7	SIMA INGENIERIA S.A.S		Cll. 103 No. 14 A - 53 Of. 403 Ed. Bogot	3153481501	gerencia@simaingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	16/03/2023	65816721	$3.284.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010238120	ARIZA RUIZ MARIA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS017	1.860.000	74.400	14-23	1.860.000	5	129.500	CCF24	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
2	CC	1014227238	CARDENAS TRIANA GISEHT LILIANA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1023963944	CASTELLANOS SANCHEZ LIZETH DANIELA	1	0			S	X																231001	1.426.000	228.200	0	0	0	0	EPS005	1.426.000	57.100	14-23	1.426.000	5	99.300	CCF24	1.426.000	57.100	0	0	0	0	0
4	CC	1106739494	PALACIO PAEZ CLAUDIA VICTORIA	1	0			S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
5	CC	28020577	SERRANO PRADA ERIKA LISET	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7875318936**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1994485286	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 7.580.100	$ 0	$ 0	$ 162.000	$ 162.000	$ 0	$ 0	$ 7.904.100	$ 0	$ 7.904.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.000	$ 0	$ 436.000
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 55.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 1.870.000	$ 0	$ 1.870.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 807.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807.400	$ 0	$ 807.400
230301	230301-PORVENIR	10	$ 5.011.200	$ 0	$ 0	$ 59.100	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 5.129.400	$ 0	$ 5.129.400
SUBTOTALES:										**$ 16.146.900**	**$ 0**	**$ 16.146.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 673.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.600	$ 0	$ 0	$ 673.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 598.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.000	$ 0	$ 0	$ 598.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 458.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.100	$ 0	$ 0	$ 458.100
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 64.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.067.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.067.800	$ 0	$ 0	$ 4.067.800
SUBTOTALES:													**$ 6.134.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.134.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.265.600	$ 4.265.600	$ 0	$ 0	$ 4.265.600
SUBTOTALES:									**$ 4.265.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.265.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	9	$ 931.100	$ 0	$ 931.100
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 694.900	$ 0	$ 694.900
CCF24	CCF24-COMPENSAR	11	$ 2.340.800	$ 0	$ 2.340.800
SUBTOTALES:			**$ 3.966.800**	**$ 0**	**$ 3.966.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 765.000	$ 0	$ 765.000
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 510.000	$ 0	$ 510.000
SUBTOTALES:			**$ 1.275.000**	**$ 0**	**$ 1.275.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD								ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7875318936**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1994485286

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.620.000	FIJO		SI																			0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.620.000	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.620.000		$ 112.800	30	$ 1.620.000	CCF24-COMPENSAR	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1152192798	MUNERA URIBE YERALDIN ANDREA	DEPEND		$ 4.587.000	FIJO		SI		21															230201-PROTECCION	21	$ 3.210.900	$ 513.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 513.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	21	$ 3.210.900	$ 128.500	$ 0	$ 128.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 3.210.900		$ 223.500	21	$ 3.210.900	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1152194878	AGUDELO TAMAYO DIEGO HERNANDO	DEPEND		$ 2.621.000	FIJO		SI		21															230201-PROTECCION	21	$ 1.834.700	$ 293.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	21	$ 1.834.700	$ 73.400	$ 0	$ 73.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.834.700		$ 127.700	21	$ 1.834.700	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13845223	RAMIREZ GONZALEZ ALFONSO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.044.000	FIJO		SI		01																	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 68.134	$ 2.800	$ 0	$ 2.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 68.134		$ 4.800	1	$ 68.134	CCF39-CAJASAN	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 22801540	CARDONA RESTREPO GLORIA MILENA	DEPEND		$ 4.587.000	FIJO		SI		21															230301-PORVENIR	21	$ 3.210.900	$ 513.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 513.800	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 3.210.900	$ 128.500	$ 0	$ 128.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 3.210.900		$ 223.500	21	$ 3.210.900	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
13	CC 37333700	DIAZ URIBE LIFETH KARINA	DEPEND		$ 4.587.000	FIJO		SI		21															25-14 COLPENSIONES	21	$ 3.210.900	$ 513.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 513.800	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 3.210.900	$ 128.500	$ 0	$ 128.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 3.210.900		$ 223.500	21	$ 3.210.900	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.550.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.550.000	$ 408.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 102.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.550.000		$ 13.400	30	$ 2.550.000	CCF24-COMPENSAR	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 5796085	GARCIA RINCON LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.626.100	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.626.100	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.626.100	$ 65.100	$ 0	$ 65.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.626.100		$ 113.200	30	$ 1.626.100	CCF39-CAJASAN	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 63347642	GOMEZ MOGOLLON MARIA MARGARITA	DEPEND		$ 5.905.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.905.000	$ 944.800	$ 29.600	$ 29.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.004.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.905.000	$ 236.200	$ 0	$ 236.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.905.000		$ 411.000	30	$ 5.905.000	CCF39-CAJASAN	$ 236.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.400.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.400.000	$ 864.000	$ 27.000	$ 27.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 918.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 216.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.400.000		$ 28.200	30	$ 5.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 11.000.000	FIJO		NO																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 11.000.000	$ 1.760.000	$ 55.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.870.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 11.000.000	$ 1.375.000	$ 0	$ 1.375.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 11.000.000		$ 57.500	30	$ 11.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 440.000	$ 220.000	$ 330.000	$ 0	$ 0
19	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 79723064	CASTELLON VALLEJO JHON JAIRO	DEPEND		$ 4.088.000	FIJO		SI	01	07															230301-PORVENIR	7	$ 953.867	$ 152.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	7	$ 953.867	$ 38.200	$ 0	$ 38.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 953.867		$ 66.400	7	$ 953.867	CCF39-CAJASAN	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 7.500.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.500.000	$ 1.200.000	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.275.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.500.000		$ 39.200	30	$ 7.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 80067157	MONTENEGRO SANTAFE MARCO AURELIO	DEPEND		$ 3.648.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.648.000	$ 583.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 583.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.648.000	$ 146.000	$ 0	$ 146.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.648.000		$ 254.000	30	$ 3.648.000	CCF24-COMPENSAR	$ 146.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 80268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 91531606	ALVAREZ PEREZ RAFAEL FRANCISCO	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.725.000	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.725.000	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.725.000		$ 189.700	30	$ 2.725.000	CCF39-CAJASAN	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 31.788.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18517103
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES VALENCIA VARELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 141 15A -32	TELÉFONO:	3245662
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7881671583**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2077897907

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 320.000	$ 3.500	$ 323.500
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 3.500**	**$ 323.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 250.000	$ 2.700	$ 0	$ 252.700
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 252.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 200	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 10.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 18517103	VALENCIA VARELA ANDRES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.000.000				NO	01							01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	18517103	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 586.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18517103
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES VALENCIA VARELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 141 15A -32	TELÉFONO:	3245662
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881671583**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2077897907

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 323.500
SUBTOTAL:			1	**$ 323.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 252.700
SUBTOTAL:			1	**$ 252.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.700
SUBTOTAL:			1	**$ 10.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 586.900**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

Yo, **JOSE FRANCISCO MORON OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.787.849 de Bogotá, en mi condición de Representante del CONSORCIO VIASCOL identificado con Nit 901.598.877-7 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Valledupar, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2023.



JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
REPRESENTANTE CONSORCIO VIASCOL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002


(PERSONAS JURÍDICAS)

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Yo, JOSE FRANCISCO MORON OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.787.849 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de INGENOBRAS SAS identificada con Nit 824.004.441-2 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **CARLOS HUMBERTO TARAZONA GARCIA**, identificado con C.C No. 90.153.342 de Floridablanca Santander y con Tarjeta Profesional No. 42726-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENOBRAS SAS identificada con Nit 824.004.441-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Valledupar, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2023.





JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENOBRAS SAS

CARLOS TARAZONA GARCIA
REVISOR FISCAL
TP 42726-T

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

MES INFORME MENSUAL: abr-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTANITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL (LA VÍA RURAL UNIÓN PENEYA - SAN ISIDRO - MIRAMAR- LA ESPERANZA)

CONTRATO DE OBRA No: 182 - 2022, 1544 - 2022, 0558 - 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SAN ANDRES, CONSORCIO INTERNACIONAL WOC, CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	918622	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 400,000,000	$ 400,000,000
			TOTAL				$ 400,000,000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 6,810,230,532**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	Noviembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 386,791,000.00	918622 (17/08/2022)	$ 400,000,000.00	$ 6,810,230,532.00		
2	Diciembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 386,791,000.00	918622 (17/08/2022)	$ 400,000,000.00	$ 6,810,230,532.00		
3	Enero	$ 11,454,000.00	$ 2,176,260.00	$ 13,630,260.00	$ 1,145,400.00	$ 12,484,860.00	$ 385,645,600.00	918622 (17/08/2022)	$ 386,369,740.00	$ 6,796,600,272.00		
4	Febrero	$ 7,899,000.00	$ 1,500,810.00	$ 9,399,810.00	$ 789,900.00	$ 8,609,910.00	$ 384,855,700.00	918622 (17/08/2022)	$ 376,969,930.00	$ 6,787,200,462.00		
5	Marzo	$ 51,958,400.00	$ 9,872,096.00	$ 61,830,496.00	$ 5,195,840.00	$ 56,634,656.00	$ 379,659,860.00	918622 (17/08/2022)	$ 315,139,434.00	$ 6,725,369,966.00		
6	Abril	$ 84,903,000.00	$ 16,131,570.00	$ 101,034,570.00	$ 8,490,300.00	$ 92,544,270.00	$ 371,169,560.00	918622 (17/08/2022)	$ 214,104,864.00	$ 6,624,335,396.00		
TOTALES		**$ 156,214,400.00**	**$ 29,680,736.00**	**$ 185,895,136.00**	**$ 15,621,440.00**	**$ 170,273,696.00**	**$ 371,169,560.00**		**$ 214,104,864.00**	**$ 6,624,335,396.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACUMULADO ACTA DE COSTOS	$ 156,214,400	$ 29,680,736	$ 185,895,136
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría -Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONA, CAQUETA Y VAUPES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

FECHA DE INICIO: 16/12/2022

PLAZO INICIAL: 21/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6,810,230,532.00

VALOR ACUMULADO: $ 6,810,230,532.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	681,023,053.20	24	6	2022	30/6/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	31/12/2027		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	30	6	2025
Calidad del servicio	30%	2,043,069,159.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	681,023,053.20	24	6	2022	30/6/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	31/12/2027		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	1,362,046,106.40	24	6	2022	30	6	2025
Calidad del servicio	30%	2,043,069,159.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264567

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	08	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIASCOL		NIT: 901.598.877-7
DIRECCIÓN: CL 61 NRO. 71 A - 18 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3770600
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. 1052 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	30/06/2025	$681,023,054.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	31/12/2027	$1,362,046,107.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	24/06/2022	30/06/2025	$1,362,046,107.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	$2,043,069,160.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL No. 1052 DEL 24 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.
- EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****5,448,164,428.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-25 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	08	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIASCOL	NIT: 901.598.877-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 51 NRO. 71 A - 18 201		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 25 G NRO. 73 B - 90		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
- CALIDAD DEL SERVICIO, TIENE UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.
- CONSORCIO VIASCOL CON NIT. 901.598.877-7 ESTA INTEGRADO POR:
INGENIOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENIOBRAS S.A.S 824004441-2 50%
C I A F LTDA INGENIERIA 800130967-6 45%
PROCIVING SAS 900905675-0 5%

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C I A F LTDA INGENIERIA	800130967-6	45.00
INGENIOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENIOBRAS S.A.S	824004441-2	50.00
PROCIVING SAS	900905675-0	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121608 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante E. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO VIASCOL	NIT: 901.598.877-7	CL 51 NRO. 71 A - 18 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2	CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. 1052 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	30/06/2025	$681,023,054.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	31/12/2027	$1,362,046,107.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/06/2022	30/06/2025	$1,362,046,107.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	$2,043,069,160.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C I A F LTDA INGENIERIA	800130967-6	45.00
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENOBRAS S.A.S	824004441-2	50.00
PROCIVINC SAS	900905675-0	5.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **47,824,610.00	$ ******25,000.00	$ ***9,091,426.00	$ ********56,941,036.00	$ ****5,448,184,428.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264567, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de JULIO de 2022

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

A fecha del presente informe, la interventoría presentó el plan de calidad a la supervisión del contrato de Interventoria el día 19 de abril del 2023, esta en proceso de revisión, aprobación y/u observaciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONA, CAQUETA Y VAUPES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 182 - 2022; 1544 - 2022; 0558 - 2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANDRES; CONSORCIO INTERNACIONAL WOC; CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 20/4/2022

OBSERVACIONES:
A ESPERA DE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____
No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
NO APLICA TODA VEZ QUE NO HA SIDO APROBADO EL PLAN DE CALIDAD

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros Documentos de Seguimiento Mensual

6.6.1 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del interventor – Formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 / MEPI-MN-IN-3-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Salarios del personal de nómina	$ -	$ 4.550.000,00	$ 80.500.000,00	$ 107.600.000,00	$ 192.650.000,00	49,81%
2	Aportes de seguridad social	$ -	$ 1.249.430,00	$ 22.105.300,00	$ 29.546.960,00	$ 52.901.690,00	13,68%
3	Dotación del personal	$ -		$ 7.925.000,00	$ 4.200.000,00	$ 12.125.000,00	3,13%
4	Honorarios Especialistas	$ -		$ 52.650.000,00	$ 8.775.000,00	$ 61.425.000,00	15,88%
7	Alquiler de oficina	$ -		$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,03%
8	Comisión de topografía	$ -		$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00	$ 39.000.000,00	10,08%
9	Ensayos de laboratorio	$ -		$ 2.576.000,00		$ 2.576.000,00	0,67%
10	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías…	$ -		$ 2.050.000,00	$ 1.963.310,00	$ 4.013.310,00	1,04%
11	Comunicaciones	$ -		$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 4.100.000,00	1,06%
12	Viaticos Director y/o Especialistas	$ -		$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00	2,07%
14	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ -		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00	1,55%
	TOTAL	**$ -**	**$ 5.799.430,00**	**$ 201.356.300,00**	**$ 179.635.270,00**	**$ 386.791.000,00**	**100,00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	04/05/2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 de 2022 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 523-000030-91 **BANCO** BANCOLOMBIA **SUCURSAL:** VALLEDUPAR

ANTICIPO OTORGADO: 5,68% **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 386.791.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Documento de Egreso	NR	NA	Pago nómina empleados Consorcio Viascol Enero 2023	$ 9.440.000,00	1	Salarios del personal de nómina
Documento de Egreso	NR	NA	Aportes en linea	$ 3.187.700,00	2	Aportes de seguridad social
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 5.525.000,00	4	Honorarios Especialistas
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 2.000.000,00	5	Alquiler de oficina
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 2.050.000,00	8	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías…
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 171.000,00	9	Comunicaciones
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 600.000,00	10	Viaticos Director y/o Especialistas
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 1.820.000,00	11	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Salarios del personal de nómina	$ 192.650.000,00	$ 7.200.000,00	$ 9.440.000,00	$ 16.640.000,00	$ 176.010.000
2	Aportes de seguridad social	$ 52.901.690,00	$ 3.068.200,00	$ 3.187.700,00	$ 6.255.900,00	$ 46.645.790
3	Dotación del personal	$ 12.125.000,00	$ -		$ -	$ 12.125.000
4	Honorarios Especialistas	$ 61.425.000,00	$ -	$ 5.525.000,00	$ 5.525.000,00	$ 55.900.000
5	Alquiler de oficina	$ 4.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000
6	Comisión de topografía	$ 39.000.000,00	$ -		$ -	$ 39.000.000
7	Ensayos de laboratorio	$ 2.576.000,00	$ -		$ -	$ 2.576.000
8	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,	$ 4.013.310,00	$ -	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 1.963.310
9	Comunicaciones	$ 4.100.000,00	$ 261.000,00	$ 171.000,00	$ 432.000,00	$ 3.668.000
10	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 8.000.000,00	$ 500.000,00	$ 600.000,00	$ 1.100.000,00	$ 6.900.000
11	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 6.000.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.820.000,00	$ 3.420.000,00	$ 2.580.000
	TOTALES	**$ 386.791.000,00**	**$ 12.629.200,00**	**$ 24.793.700,00**	**$ 37.422.900,00**	**$ 349.368.100**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FEBRERO-2023): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/04/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ■

UNIDAD EJECUTORA: SUBIDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ■ **No.** _____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ■

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 182-2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANDRES

PLAZO INICIAL: 25 MESES 14 DIAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (**A**): $ 6,810,230,532.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (**C=A+B**): $ 6,810,230,532.00

PLAZO ACUMULADO: 25 MESES 14 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (**B**): $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha		2022				2023																														2024																								TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El día 12 de abril, se firmó la orden de inicio del contrato de obra 001544 de 2022 y se realizo la respectiva socialización en el Municipio de Leticia.

En los comités de obra realizados, durante los días 20 y 26 de abril del presente, se le reitero al contratista que a la fecha la interventoria desconocía el estado del avance en estudios y diseños, por lo anterior se solcito el ajuste de la programación de obra durante el periodo de ejecución de la revisión de los estudios y diseños de forma más detallada, lo anterior con el fin de poder tener mayor información del desarrollo de esta etapa, adicional se solcito realizar una mesas de trabajo conjunta con el fin de poder llegar al 12 de junio y no tener contratiempo con el inicio de actividades por la falta de la aprobación de los ajustes a los diseños presentados.

Esta interventoria recomendó al contratista ajustar el desglose del AIU, de tal forma que coincidía con el porcentaje contractual según modificatoria 2, presentado, así mismo se solicitó complementar información de la documentación entregada de los equipos mínimos requeridos, los Apu’s entregados por el contratista de obra y el plan de inversión de anticipo.

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Correspondencia enviada

CONSORCIO VIASCOL — **CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**

N°	DOCUMENTO N°	FECHA DEL DOCUMENTO	DIRIGIDA A	ASUNTO
1	CI-VIASCOL-044	04/04/2023	ALIRIO DE JESÚS VASQUEZ Alcalde Municipal Carrera 1 con calle 5 - Esquina Palacio Municipal Puerto Nariño- Amazonas contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co	Cambio de Firmas Conjuntas del Convenio 1901 de 2021
2	CI-VIASCOL-045	05/04/2023	JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ Alcalde Municipal Cll 10 No 10-47 Municipio de Leticia- Amazonas contactenos@leticia-amazonas.gov.co	Cambio de Firmas Conjuntas del Convenio 1900 DE 2021
3	CI-VIASCOL-046	05/04/2023	JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ Alcalde Municipal Cll 10 No 10-47 Municipio de Leticia- Amazonas contactenos@leticia-amazonas.gov.co	Cambio de Firmas Conjuntas del Convenio 1584 de 2021
4	CI-VIASCOL-047	05/04/2023	JESUS GALDINO CEDEÑO Gobernador del Amazonas Cll 10 No 10-77 Leticia- Amazonas contactenos@amazonas.gov.co	Cambio de Firmas Conjuntas del Convenio 1899 del 2021
5	CI-VIASCOL-048	05/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Autorización viáticos
6	CI-VIASCOL-051	14/04/2023	ARGEMIRO PERDOMO SANTOS Supervisor contrato 001544-2022 GOBERNACION DEL AMAZONAS	Contrato de obra 001544 DE 2022, Derivado del Convenio 1899 de 2021/Solicitud modificacion clausula 8 FORMA DE PAGO/incluyendo que los pagos se realizaran por precios unitarios fijos sin formula de ajuste,
7	CI-VIASCOL-052	14/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA SUPERVISOR CONTRATO 1052 DE 2022	Solicitud ingreso personal de Interventoria/Ingrid Lambis/Liliana Bermudez/Yon Narvaez
8	CI-VIASCOL-053	14/04/2023	PATRICIA INES MORALES PADRON GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOS Subdirectora de Vías Regionales	Hojas de vida personal de Interventoría Contrato 1052 de 2022
9	CI-VIASCOL-053b	17/04/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Contrato de obra 001544 de 2022- Derivado el Convenio 1899 de 2021/Solicitud APUS/plan de Gerencia/PAGA/Hojas de vida del personal profesional/Programa de reincorporación./Relación de equipo mínimo obligatorio./Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y magnético)./Programa de obra (en medio físico y magnético).
10	CI-VIASCOL-054	18/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA SUPERVISOR CONTRATO 1052 DE 2022	Ingreso personal de Interventoría/Autorizacion ingreso Claudia Gissel Rincon/Juan Camilo Martinez
11	CI-VIASCOL-055	18/04/2023	RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Respuesta oficio SVR 19980 del 10 de abril de 2023

CONSORCIO VIASCOL

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

N°	DOCUMENTO N°	FECHA DEL DOCUMENTO	DIRIGIDA A	ASUNTO
12	CI-VIASCOL-056	19/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA SUPERVISOR CONTRATO 1052 DE 2022	Plan de Calidad Contrato de Interventoria 1052 de 2022
13	CI-VIASCOL-057	20/04/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta oficio OBRA-CIW-014 del 12 de abril de 2023
14	CI-VIASCOL-058	20/04/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta oficio OBRA-CIW-015 del 14 de abril de 2023
15	CI-VIASCOL-059	20/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA SUPERVISOR CONTRATO 1052 DE 2022	Aprobación de Ingreso de Personal dentro de Contrato de interventoría No. 1052-2022./APROBACION ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO
16	CI-VIASCOL-060	21/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA SUPERVISOR CONTRATO 1052 DE 2022	Autorización viáticos
17	CI-VIASCOL-061	21/04/2023	UNIÓN TEMPORAL SAN ANDRÉS	Solicitud de documentos técnicos/ Montañita
18	CI-VIASCOL-062	22/04/2023	INGEOBRAS Y CONSTRUCCIONES J.E ZOMAC S.A.S	Contrato N.º 078 de 2022 cuyo objeto es el mejoramiento de vías rurales en el municipio de Albania Departamento del Caquetá del programa Colombia Rural Nacional. Concepto PAGA./no aporbacion PAGA Albania
19	CI-VIASCOL-063	22/04/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Respuesta a oficio CKSP-010-558-2022 del 20 de abril de 2023. Observaciones a documentación recibida
20	CI-VIASCOL-064	25/04/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta a oficio OBRA-CIW-014 correspondiente al Contrato de obra N°001544 de 2022, derivado del Convenio 1899 de 2021. Observaciones a subsanar de documentación recibida.
21	CI-VIASCOL-065	28/04/2023	CONSORCIO LA UNIÓN 2022	Respuesta PAGA V00 SAN JOSE DE FRAGUA
22	CI-VIASCOL-066	28/04/2023	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Director Territorial Caquetá INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Florencia	Entrega informe Trimestral N 001 Interventoria

Correspondencia recibida

CONSORCIO VIASCOL

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

RECIBIDA

Nº	FECHA DE RECIBO	DOCUMENTO Nº	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD REMITENTE	ASUNTO
1	4/4/2023	CORREO ELECTRONICO	4/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	PROGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN MODIFICACIÓN N ° 01
2	5/4/2023	UT SA-005	5/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	Entrega informe trimestral N° 1/ LA MONTAÑITA
3	5/4/2023	DT-CAQ 19644	5/4/2023	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 31295 con Fecha 30/03/2023/APROBACION ING RESIDENTE/ COMISION TOPOGRAFIA/ 2 MOTOS Y EL SST
4	5/4/2023	CORREO ELECTRONICO	5/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	INFORME SST SAN ANDRES MONTAÑITA, MES ENERO, FEBRERO Y MARZO
5	11/4/2023	UT SA-008	11/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	SOLICITUD DESEMBOLSO A FIDUCIA DEL ANTICIPO DEL PROYECTO.
6	10/4/2023	SVR 19976	10/4/2023	INVIAS	SOLICITUD COPIA DE LAS PRORROGAS DE LOS CONVENIOS 1901,1584,1899 Y 1900,1981,1762,1790
7	10/4/2023	SVR 19980	10/4/2023	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 8317.- CE-VIASCOL-023. RTA A REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO N 1809 DE 2021. REMITIR DOCUMENTACION DE HV APROBADAS, LABORATORIO, PLAN DE CARGAS ENTRE OTROS DE INTERVENTORIA
8	10/4/2023	SVR 19981	10/4/2023	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 14675/RECIBIDO DE DOCUMENTOS DE GIRO DE KLOS RECUERSO DEL CONVENIO PARA REVISION
9	10/4/2023	SVR 19984	10/4/2023	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 14617.-CE-VIASCOL-026/ORDENES DE INICIO Y DESEMBOLSO DE LS RECURSOS DE ANTICIPÒ A LAS FIDUCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES/ MONTAÑITA Y SAN JOSE
10	11/4/2023	CORREO ELECTRONICO	11/4/2023	SIMA	ENTREGA INFORME ESPECIALISTA MES MARZO
11	12/4/2023		12/4/2023	INGEOBRAS Y CONSTRUCCIONES J.E ZOMAC S.A.S.	Entrega Apertura de Fiducia y solicitud de desembolso del anticipo.
12	12/4/2023		12/4/2023	INGEOBRAS Y CONSTRUCCIONES J.E ZOMAC S.A.S.	Cambio de dirección de notificaciones electrónicas al contrato en referencia.
13	10/4/2023	OBRA-CIW-A14	10/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud de información/RETIRO DEL PERSONAL PITER ANDRES ROBLES POR PROFESIONAL FABIAN PINEDO SE REEMPLAZA JESUS ROBLES POR EDINSON CARREÑO COMO RESIDENTE DE OBRA LE ADICIONA CERTIFICADO LABORAL A LA SST/SE REMITE AJUSTE A LA PROGRAMACION DE OBRA, ENTREGA PLAN INVERSION ANTICIPO, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, PLAN DE CALIDAD DESGLOSE AL AIU
14	13/4/2023	CORREO ELECTRONICO	13/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	REPROGRAMACION DE OBRA
15	14/4/2023	OBRA-CIW-015	14/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud de información./INVENTARIO FORESTAL Y ESTUDIOS Y DISEÑOS
16	12/4/2023	SVR 20586	12/4/2023	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 31623-CE-VIASCOL-042 del 30 de Marzo de 2.023/APROBACIOBN DIRECTOR INTEVENTORIA KARINA MARTINEZ/ SOCIAL INGRID MENDOZA
17	18/4/2023	OBRA-CIW-016	14/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	SOLICITUD DE INFORMACION REFENTE A PROYECTOS O AFECTACIONES GENERADAS POR EJECUION DE OBRAS/SOLICITUD PLANOS REECOD REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANIATATIO FLKUVIAL. ESTADO DE OBRAS QUE INTEFIEREN CON EL PROYERCTO
18	18/4/2023	OBRA-CIW-017	14/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	SOLICITUD PLANOS RECORSD DE LOS SIREMAS DE ACUEDCTOIS Y ALCANTRILLADOS
19	18/4/2023	OBRA-CIW-018	14/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	SOLICITUD PLANOS RECORS REDES SECAS
20	18/4/2023	OBRA-CIW-019	14/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	SOLICITUD DE INFORMACION DE PLANOS RECORDS DE LOS SISTEMAS DE RESDES SECAS EN LOS SECTORES DE LA REFERENCIA
21	18/4/2023	OBRA-CIW-020	14/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	SOLICITUD DE ENTREGA DEL PERFIL VIAL FINAL A EMPLEAR
22	19/4/2023	OBRA-CIW-021	19/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	REVISION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS INICIALES A LA INTERVENTORIA/ACLARACION DE ESTA SOLICITUD YA QUE CONSIDERAN QUE NO ES CONTRACTUAL
23	19/4/2023	CORREO ELECTRONICO	19/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	Entrega informe trimestral N° 1/ LA MONTAÑITA
24	20/4/2023	CORREO ELECTRONICO	20/4/2023	CORPOAMAZONIA	PERMISOS CORPOAMAZONIA PAVIMENTACION VIAL. AUTORIZACION OCUPACION DE CAUCE, PERMISOS DE TALA ARBOLES,
25	20/4/2023	DTC0822	26/2/2023	CORPOAMAZONIA	SOLICITUD VISITA TECNICA AMBIENTAL Y TRAMITES AMBIENTALES/ SAN JOSE DEL FRAGUA/ RES. 0514/ AUTORIZACION DE CAUSE/PERMISO TALA DE ARBOLES
26	20/4/2023	CKSP-007-0558-2022	20/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Entrega del Plan de Inversión del anticipo y plan de calidad
27	20/4/2023	CKSP-008-0558-2022	20/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Entrega de documentos del personal profesional DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE SISO, RESIDENTE AMBIENTAL Y RESIDENTE SOCIAL Y TOPOGRAFO
28	20/4/2023	CKSP-010-0558-2022	20/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO DE 3000 Y BASE ARENA CEMENTO
29	20/4/2023	CKSP-011-0558-2022	20/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Revision y entrega de Diseño Geometrico V1
30	20/4/2023	CORREO ELECTRONICO	20/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	ENTREGA PLAN DE CALIDAD V 1
31	20/4/2023	CORREO ELECTRONICO	20/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	ENTREGA PLANOS DE PMT - PROGRAMACION DE OBRA
32	20/4/2023	CORREO ELECTRONICO	20/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	ENTREGA Y REVISION DE ACTAS DE VECINDAD-FORMATO
33	21/4/2023	DT-CAQ 22588	21/4/2023	INVIAS	APROBACION Ingeniera Auxiliar, CLAUDIA GISSEEL PEREZ RINCON/Ingeniero Residente, JUAN CAMILO JIMENEZ MARTINEZ
34	21/4/2023	CORREO ELECTRONICO	21/4/2023	SIMA	ENTREGA OBSERVACIONES PAGA PROYECTO ALBANIA CONVENIO 1790 PARA OFICIAR AL CONTRATISTA
35	24/4/2023	CKSP-012-0558-2022	24/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Entrega de documentos técnicos pendientes. DESGLOCE A.I.U, A.P.U, PROGRAMA DE INVERSIONES
36	25/4/2023	CKSP-015-0558-2022	25/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Entrega Plan de adaptacion y gestion ambiental PAGA v2
37	26/4/2023	UT SA-009	26/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	ESTADO DE OBRAS TRANSVERSALES RECIEN CONSTRUIDAS POR UN TERCERO.
38	26/4/2023	CKSP-014-0558-2022	25/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	REMISION POLIZAS ACTA DE INICIO DE FECHA 12 ABRIL DE 2023
39	26/4/2023	CORREO ELECTRONICO	26/4/2023	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CKSP-015-0558-2022. Cambio de Hoja de Vida Profesional Residente de Obra

CONSORCIO VIASCOL

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Nº	FECHA DE RECIBO	DOCUMENTO N°	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD REMITENTE	ASUNTO
40	27/4/2023	OBRA-CIW-023	26/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta a comunicado CE-VIASCOL-057/ REVISION HV PROFESIONAL SST LINDA MELISA NIEVES
41	27/04/20213	CORREO ELECTRONICO	27/4/2023	INGEOBRAS Y CONSTRUCCIONES J.E ZOMAC S.A.S.	Solicitud de tiempo adicional para entrega del V01 del PAGA.
42	27/04/20213	CORREO ELECTRONICO	27/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	ENTREGA PARAFISCALES UNION SAN ANDRES
43	27/04/20213	CORREO ELECTRONICO	27/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	REPROGRAMACION DE OBRA 1 Y PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA
44	27/04/20213	CORREO ELECTRONICO	27/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
45	28/4/2023	OBRA-CIW-025	28/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud del inventario Forestal actualizado del proyecto de la referencia.
46	28/4/2023	OBRA-CIW-026	28/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Entrega documentación profesional Trabajadora Social
47	28/4/2023	CORREO ELECTRONICO	28/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	FLUJO DE CAJA -MONTAÑITA
48	28/4/2023	OBRA-CIW-027	28/4/2023	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud comité Técnico.
49	29/4/2023	CORREO ELECTRONICO	29/4/2023	CONSORCIO UNION SAN ANDRES 2022	PROGRAMA DE OBRA

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

No aplica, esta en etapa de revisión de estudios y diseños

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

No aplica, está en etapa de revisión de estudios y diseños

8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente

A continuación, se anexa copia de la bitácora correspondiente al mes de abril de 2023

BITACORA DE OBRA

CONTRATO 1544 DE 2022

OBJETO: Rehabilitación de la doble Calzada, espacios públicos urbanos de la avenida Internacional entre calle 3 y calle 12 del Municipio de Leticia.

CONTRATANTE: Gobernación de Amazonas.

CONTRATISTA: Consorcio Internacional WOC

INTERVENTORIA: Consorcio VIASCOL

Plazo del CONTRATO: 7 meses.

- Residente de Interventoría
  Juan Camilo Jimenez M.
  Juan

Residente de Obra.

- Director de obra
  Fabian Pinedo Waldron
  Fabian Pinedon

NOTA 1 12 de Abril 2023 (Miercoles)

Estado del tiempo: Día lluvioso.
Personal: • Ingeniero Residente Personal Interventoría: • Ingeniero Residente
Obra • Director de Obra. • Director Interventoría.
Equipos: N/A
Actividades:
• Se firmó el acta de Inicio del Contrato.
• El contratista emite el oficio OBRA-CIW-0014, donde se le da respuesta al oficio No CI-VIASCOL-038, sobre el asunto de entrega del Plan de Inversión del anticipo, entega del Plan de Manejo de Tránsito, y el Desgloce del AIU.
• Se realiza la socialización del proyecto, la cual se realizó en el Salón Esmeralda de la escuela Normal Superior Marceline Eduardo Canyes Santacana, en el que asistieron funcionarios de la interventoría, contratista de Obra, Invías, Gobernación del Amazonas y la Comunidad.

P/ Fabian Vinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 2 13 Abril 2023. (Jueves).
Estado del tiempo: Día lluvioso.
Pesonal de Obra: • Ingeniero Residente Pesonal Interventoría: • Ing. Residente
• Director de Obra • Director de Interventoría.

Equipos: N/A.
Actividades: • Se Inicia por parte del Contratista, el Inventario de la revisión de la información técnica parcial entregada por la gobernación del Amazonas para el inicio de la revisión de los diseños del proyecto.

P/ Fabian Vinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 3 14 de Abril 2023 (Viernes).

- Estado del Tiempo: Día Nuvioso
- Personal Obra = • Ingeniero Residente • Director de Obra
  Personal Interventoría = • Ingeniero Residente • Director de Interventoría.
- Equipos: N/A
- Actividades: • Se continuá por parte del contratista, el inventario de la revisión de la información técnica parcial entregada por la gobernación del Amazonas, para el inicio de la revisión de los diseños del poyecto.
  • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-016, el contratista solicita al Municipio de Leticia la información referente al proyecto o afectaciones generadas por la ejecución de Obras.
  • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-015, el contratista de obra solicita el Inventario forestal a la Interventoría, y reitera la entrega de los diseños completos de la gobernación, (Volumenes Completos).
  • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-017, el contratista de Obra solicita a la unidad de Servicios públicos domiciliarios de Leticia, la información de los planos Records, de los sistemas existentes de acueductos y alcantarillados en los Sectores de incidencia del proyecto de la Vía Internacional.
  • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-018, el contratista solicita a la empresa de Servicios Públicos Electricos de Leticia (ENAM S.A. ESP), la información de los planos Records de los sistemas de redes telefónicas en los sectores de incidencia del proyecto.
  • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-019, el Contratista de obra solicita a la empresa de Servicios Telefónicos Movistar de Leticia, la información de los planos Records de los sistemas de Redes Telefonicas en los sectores de Incidencia del proyecto.
  • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-020, El contratista de Obra Solicita a la Interventoría, el perfil definitivo de la vía que se va a emplear en la Construcción de la Via

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por UDS

Internacional.

P/ Fabian Pinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 4 15 de Abril 2023 (Sábado).

- Estado del Tiempo: Dra Lluviosa
- Personal Obra → • Ingeniero Residente • Director de Obra
- Personal Interventoría → • Ingeniero Residente • Director Interventoría.
- Equipos: N/A
- Actividades: • El contratista de Obra inicia la recolección de muestras de materiales pétreos para la realización de la caracterización de Materiales a emplear en el proyecto.

P/ Fabian Pinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 5 16 de Abril 2023 (Domingo).

- Estado del Tiempo: Lluvias Fuertes
- Actividades: No se ejecutan actividades.

P/ Fabian Pinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 6 17 de Abril 2023 (Lunes).

- Estado del Tiempo: Dra Lluviosa
- Personal Obra → • Ingeniero Residente • Director de Obra
- Personal Interventoría → • Ingeniero Residente • Director de O
- Equipos: N/A.
- Actividades: • El contratista de Obra continúa con la recolección de muestras de Materiales pétreos para la realización de la caracterización de los materiales a emplear en el proyecto.

P/ Fabian Pinedo
Residente Obra

Residente Interventoría.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por LEGIS

NOTA 7 18 Abril 2023 (Martes)

* Estado del Tiempo: Lluvias Fuertes
* Personal Obra → • Ingeniero Residente • Director de Obra
* Personal Interventoría → • Ingeniero Residente • Director Interventoría
* Equipos: N/A
* Actividades: • El contratista de Obra realiza el envío a Bogotá de las Muestras de Materiales pétreos para la realización de caracterización de los Materiales a emplear en el proyecto.
• La Interventoría emite el oficio CI-VIASCOT 053, donde solicita información para el control de la ejecución de la Obra.

P/ Fabian Pinedo
Residente de obra

Residente de Interventoría

NOTA 8 19 de Abril 2023 (Miercoles)

* Estado del tiempo: Lluvias Moderadas
* Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
* Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría.
* Equipos: N/A
* Actividades: • El contratista realiza mesas de trabajo con los especialistas de Pavimentos y Suelos, para dar el inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

P/ Fabian Pinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 9 20 de Abril 2023 (Jueves).

* Estado del Tiempo: Lluvias Moderadas.
* Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
* Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría.
* Equipos: N/A.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por UAS

- Actividades. • Mediante el Oficio No. OBRA-CIW-021, el contratista da respuesta al oficio CI-VIASCOL-053 de la Interventoría donde solicita información para el control de ejecución del proyecto, se le da respuesta.
• El contratista continúa de forma virtual y telefónica mesas de trabajo con los especialistas de pavimentos y suelos para dar el inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 21 de Abril 2023 (Viernes).

- Estado del tiempo: lluvias Moderadas
- Personal → Ingeniero Residente Obra, Director de Obra
  Personal → Ingeniero Residente Interventoría, Director Interventoría.
- Equipos: N/A
- Actividades: • Mediante el oficio CI-VIASCOL-057, la interventoría aprueba las hojas de Vida del Director de Obra y Residente de Obra y el Topografo de Obra, más no aprobando a la Residente SST presentada por el contratista. • Mediante el oficio CI-VIASCOL-058, la interventoría da respuesta al contratista de Obra comunicandole que la información solicitada del inventario Forestal del Proyecto debe solicitarsele directamente a la gobernación del Amazonas. • Mediante correo electrónico se envió el formato en blanco para las actas de vecindad del proyecto. • El contratista continúa de forma virtual y telefonica Mesas de Trabajo con los Especialistas de Pavimentos y Suelos para dar el Inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Creado Digitalizado y actualizado según la Ley © por UDES

NOTA 11 22 Abril 2023 (Sábado)

- Estado del Tiempo: lluvias Moderadas
- Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
  Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría
- Equipos: N/A
- Actividades: • El contratista continúa de forma Virtual y telefónica mesas de trabajo con los Especialistas de Pavimentos y Suelos para dar inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

Residente de Obra — Residente de Interventoría.

NOTA 12 23 Abril 2023 (Domingo):

- Estado del Tiempo: lluvias Moderadas
- Actividades: No se labaró.

Residente de Obra — Residente de Interventoría.

NOTA 13 24 Abril 2023 (Lunes)

- Estado del Tiempo: Tiempo Seco.
- Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
  Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría
- Equipos: N/A
- Actividades: • El contratista continúa de forma Virtual y telefónica mesas de trabajo con los Especialistas de Pavimentos y Suelos para dar inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

Residente de Obra — Residente de Interventoría.

minerva Diseñada y actualizada según la Ley © por IICE

NOTA 14 25 Abril 2023 (Martes).

* Estado del tiempo: Día Soleado
* Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
  Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría
* Equipos: N/A
* Actividades: • El contratista continúa de forma Virtual y telefónica Mesas de Trabajo con los Especialistas de Pavimentos y Suelos para dar inicio al revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

P/ Fabian Pinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 15 26 de Abril 2023 (Miercoles).

* Estado del Tiempo: Día Soleado
* Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
  Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría.
* Equipos: N/A
* Actividades: • Mediante el oficio CI-VIASCOL-064, la interventoría da respuesta al contratista de Obra al oficio OBRA-CIW-019, del contratista de Obra, donde entregó la relación de los equipos del proyecto, el plan de inversión del anticipo el desglose del AIU, y la programación de actividades. • Se realiza comité de Obra No 2, en la ciudad de Bogotá con la interventoría y la Subdirección Regional del INVIAS. • Mediante el oficio N. OBRA-CIW-023 se da respuesta al oficio CI-VIASCOL-057 de la interventoría donde Solicitaba información de la hoja de vida de la profesional SISO. • El contratista continúa de forma virtual y telefónica mesas de trabajo con los especialistas de pavimentos y suelos para dar inicio a la revisión de los diseños del Proyecto entregados por gobernación.

Residente de Obra P/ Fabian Pinedo

Residente Interventoría.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por

NOTA 16 27 Abril 2023 (Jueves).

* Estado del Tiempo: Dra Soleado
* Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
  Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría
* Equipos N/A
* Actividades: • El contratista continúa de forma virtual y telefónica mesas de trabajo con los especialistas de pavimentos y suelos para dar el inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

P/ Fabian Vinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

NOTA 17. 28 de Abril 2023 (Viernes).

* Estado del tiempo: Dra Soleado
* Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra
  Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría.
* Equipos: N/A.
* Actividades: • El contratista continúa de forma virtual y telefónicas Mesas de Trabajo con los especialistas de pavimentos y suelos para dar el inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación. • Mediante el Oficio No. OBRA-CAV-025, el contratista solicita a la gobernación el Inventario Forestal del proyecto. • Mediante el Oficio No. OBRA-CAV-026, donde solicita a la interventoría la hoja de Vida de la Profesional Social del Contratista de Obra. • Mediante el Oficio No. OBRA-CAV-027 el contratista solicita a la interventoría del área de Redes Húmedas, un comité técnico para la aclaración de algunos inquietudes por parte del contratista para los diseños y planos de las redes humedas del proyecto.

P/ Fabian Vinedo
Residente Obra

Residente de Interventoría.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © 2021

NOTA 18: 29 Abril 2023 (Sábado).
- Estado del tiempo: lluvias +Moderados.
- Personal Obra → Ingeniero Residente, Director Obra. Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría.
- Equipos: N/A
- Actividades: • El contratista continúa con la revisión de la información de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

Residente de Interventoría

P/ Fabian Vinoda
Residente Obra.

NOTA 19: 30 Abril 2023 (Domingo)
- Estado del tiempo: lluvias +Moderadas.
- Actividades: No se laboró.

P/ Fabian Vinoda
Residente de Obra

Residente Interventoría.

NOTA 20. 01 Mayo 2023 (Lunes).
- Estado del tiempo:
- Personal Obra → Ingeniero Residente, Director de Obra. Personal Interventoría → Ingeniero Residente, Director Interventoría.
- Equipos: N/A.
- Actividades: • El contratista continúa de forma Virtual y telefónica mesas de trabajo con los especialistas de Pavimentos y Suelos para dar el inicio a la revisión de los diseños del proyecto entregados por la gobernación.

P/ Fabian Vinoda
Residente Obra

Residente Interventoría.

NOTA 21: 02 Mayo 2023 (Martes)
- Estado del tiempo:

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley
