La Jagua de Ibirico, Cesar, 14 de septiembre de 2026.

Doctora,
ADALEIDIS ANDREA LEON PEÑUELA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 256-2026
PERIODO No 01
Desde el día 06 de agosto de 2026 al 05 de septiembre de 2026.

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias sobre su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO NO:	256 DEL 24 DE JULIO 2026
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRÍCO, CESAR.
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION:	24 DE JULIO 2026
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$ 412.194.199,00 COP
CONTRATISTA:	NEXO INTEGRA S.A.S.
SUPERVISOR:	MAHER SANTOS SOSA

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA 07 – SUPERVISION fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 01 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo de ejecución fueron las siguientes:

El contratista en el periodo No. 03 comprendido entre el 08 de septiembre de 2025 hasta el 07 de octubre de 2025 realizó las siguientes actividades:

2.1 Actividades Ejecutadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Esta supervisión constató y verificó que el contratista ejecutó las siguientes horas y por cada tipo de maquinaria (periodo No. 01, el cual va desde el día 06 de agosto al 05 de septiembre de 2026), además de certificar cuantas horas quedan pendientes por ejecutar por parte del contratista:

Equipo	Horas asignadas	Horas ejecutadas	Horas restantes
Retroexcavadora – Cargadora sobre llantas (Pajarita), potencia neta mínima 90 HP	820	**488**	332
Motoniveladora, potencia mínima 140 HP	430	**321**	109
TOTAL	**1.250**	**809**	**441**

Actividades que esta supervisión corroboró que fueran ejecutadas por el contratista en cada una de las veredas relacionadas a continuación y que hacen parte de la jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar (horas ejecutadas por el contratista):

Vereda	Pajarita	Motoniv.	Actividades ejecutadas por el contratista
LOS MANANTIALES	120	50	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la apertura y re perfilado de vías; empuje y distribución de material suelto; corrección de rasante y recuperación de la capa de rodadura.
EL PRADO	65	58	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la estabilización de bordes y puntos críticos; relleno controlado; corrección de desniveles; perfilado de calzada, trazado de cunetas y refuerzo de banca; apoyo con volquetas.
LA ESPERANZA	85	0	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la atención de puntos que dificultaban el tránsito; adecuación de sectores afectados; distribución de material y nivelación de la superficie.
MAQUENCAL	45	45	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la limpieza de derrumbes y traslado de material en ladera; nivelación longitudinal; ajustes de calzada en sectores con agua acumulada y deformaciones.
PAVO REAL	38	40	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la ampliación de calzada (corte en parte alta y relleno en zonas bajas); re perfilado de rodadura y redistribución de material; habilitación de vía tras derrumbes menores.
PACHITO	85	58	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la intervención integral: corte en zonas altas y relleno en sectores bajos; remoción de derrumbes; traslado de material; nivelación longitudinal y conformación de banca.
LA CONQUISTA	25	32	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó la conformación bruta de banca; limpieza mecánica de cunetas; perfilado longitudinal; corrección de rasante y trazado de cunetas para drenaje.
LA UNIÓN	25	38	Se constató por parte de esta supervisión que el contratista ejecutó el descapote de material orgánico; extendido y nivelación primaria de material de aporte; perfilado de rodadura y mejora de la pendiente transversal.
TOTAL	**488**	**321**	**809 horas efectivas en el periodo.**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:


Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social Integral (salud y pensión) correspondiente al periodo agosto ejecutado por el contratista:

Planilla correspondiente al mes de AGOSTO de 2026:


NUMERO DE PLANILLA	6035378847

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 33,33%

GRAFICA AVANCE TIEMPO

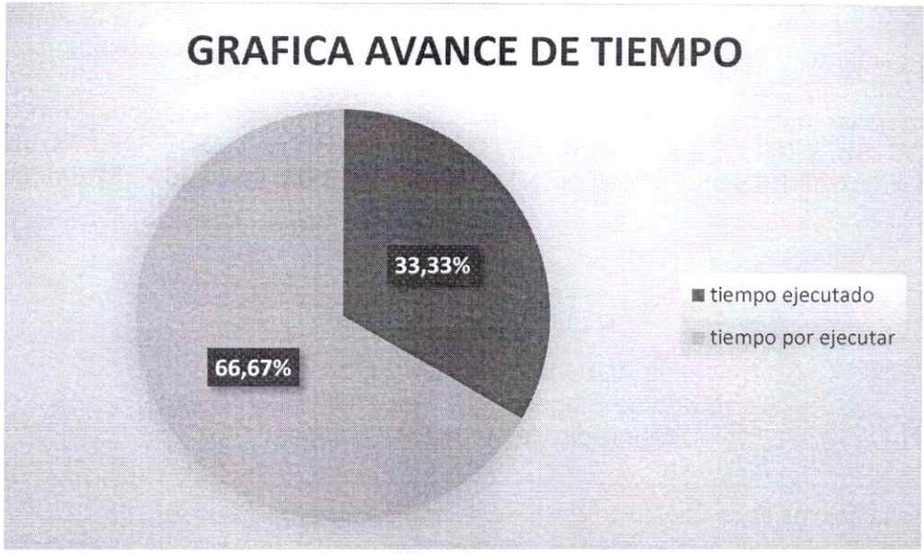

GRAFICA AVANCE FINANCIERO 50,14%

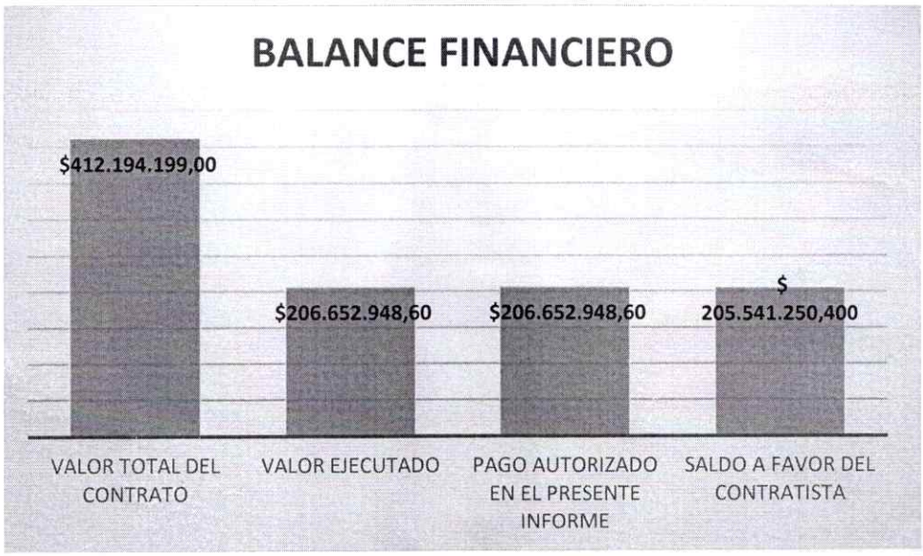

4 AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 412.194.199,00	**N/A.**	100 %
ANTICIPO	N/A	N/A.	N/A
PRIMER PAGO	$ 206.652.948,60	N/A.	50,14 %
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (No. 1)	$ 206.652.948,60	N/A.	50,14 %
SALDO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 206.652.948,60	N/A.	50,14 %
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (lo que falta por ejecutar)	$ 205.541.250.40	N/A.	49,86 %

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente relacionada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO No. 01,** comprendido entre el **06 DE AGOSTO DE 2026 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026,** el contratista cumplió parcialmente las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social integral.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($ 206.652.948,60).**

MAHER SANTOS SOSA
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico
Municipio de La Jagua de Ibirico

Proyectó:	**MAHER SANTOS SOSA** - Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Revisó:	**MAHER SANTOS SOSA** - Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		
