EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO: R-EJ-01-18**
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSION: 06**
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	**FECHA: 05/06/2024**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CON VENI**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	8			FECHA:	**3**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2026**		
PERIODO:	**1**	de	**AGOSTO**	de	**2026**	AL	**31**	de	**AGOSTO**	de	**2026**

No. CONTRATO O CONVENIO	**ECO-CD-010-2026**	DE	**2026**	FECHA:	**16**	de	**ENERO**	de	**2026**

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 18.180.000,00**	RPC	**1601-002**
REGISTRO BP y P No.	**2024150010029**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**OSCAR ANDRÉS ZARATE MENDIVELSO**		

OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA MILENA CORTÉS BONILLA

Teléfono: 3213921294 Dirección: **Carrera 10 N° 21-33**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONV ECO-CD-		
FECHA DE INICIACIÓN:	16	01	2026
PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES			
PLAZO CON ADICIONES: 3 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	15	07	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	10	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	15	01	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 1	2	02	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 2	2	03	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 3	2	04	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 4	6	05	2026	VERIFICADO EN SECOP II

Acta parcial 5	2	06	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 6	3	07	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 7	3	08	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta parcial 8	3	09	2026	VERIFICADO EN SECOP II

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
Modificatorio N° 1	14	07	2026	$ 9.090.000,00	3 meses
				$ 9.090.000,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	SEGUNDA	14	07	2026	Modificar la clausula segunda del contrato de prestación de servicios ECO-CD-010-2026 prorrogado el plazo actual por un termino de tres (3) meses
2	CUARTA	14	07	2026	Modificar la clausula segunda del contrato de prestación de servicios ECO-CD-010-2026 adicionando el valor inciialal kontode nueves millones noventa mil pesos ($9,090,000)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Apoyar integralmente los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda	se realizo una visita diagnostico producto de un derecho de petición solicitado por la vivienda numero 18 con el fin de verificar si la vivienda era susceptible de mejoramiento, de igual forma para el mismo proyecto se realizo una visita diagnostico a fin de realizar el levantamiento planimétrico. Para el proyecto de andenes se realizó una reunión con los contratistas de obra del proyecto y contratistas de la obra de mejoramiento vial a fin de verificar las condiciones actuales y realizar una integración entre ambos proyectos para no generar atrasos en la ejecución de las obras de dichos proyectos. Por un derecho de petición remitido por la secretaria de la mujer se realizo una visita diagnostico a una vivienda en el sector rural de chorro blanco con el objetivo de verificar la habitabilidad, hacinamiento y socializar la posibilidad de acceder a un programa de mejoramiento de vivienda.				Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar la revisión de estudios técnicos, presupuestales y plano de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.	En el marco del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 se realizó la elaboración de 2 planos arquitectónico producto de los levantamientos planimétricos y 2 presupuestos de obra. Para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 se realizó la revisión del acta parcial No 3 radicada por interventoría con el objetivo de verificar la concordancia de la información de dicha acta y generar observaciones	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II

Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recurso y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares d calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-IO, RAS, RETIE etc.).	En el marco del proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural 2025, se realizaron 2 visitas de seguimiento a diferentes viviendas que se encontraban en ejecución, con el propósito de medir las cantidades de obra ejecutadas y verificar su correspondencia con las cantidades consignadas en los presupuestos de obra. Esta actividad se desarrolló como parte de la revisión del Acta Parcial No. 3 radicada por la interventoría del proceso. Para el proyecto de Bellavista se realizo una visita de seguimiento a fin de verificar el avance actual de la obra y detallar hallazgos que se pudieran presentar. Para el proyecto de mejoramiento de andenes se realizó tres visitas de seguimiento a fin de verificar el avance actual de la obra y detallar hallazgos que se pudieran presentar en la ejecución de la misma.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos financieros de los proyectos en ejecución	En el desarrollo de las visitas de seguimiento de obra, se diligenció el formulario de seguimiento con el propósito de consolidar la información recopilada en formato digital, permitiendo la generación de los informes técnicos correspondientes y el adecuado registro del avance de las actividades ejecutadas.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.	Se apoyo en la organización del archivo de la interventoría del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 y adicional se genero el archivo de gestión del mismo proyecto.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar respuestas a solicitudes administrativas de supervisores interventores y otros actores, relacionadas con la ejecución de las obras.	Por solictud d ela dirección técncia, sae desarrollaron las siguientes actividades; laboración del formato de acta de recibo a satisfacción de obra • · Información sobre cuantas unidades sanitaria fueron previstas en el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 y cuantas han sido ejecutadas hasta el momento • · Asistencia a una reunión junto con funcionario de la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Tunja para temas relacionados con el proyecto de mejoramiento de andenes • · Asistencia a una reunión junto con residente d obra e interventoría y un funcionario de veolia para temas relacionados con el proyecto de mejoramiento de andenes Por solicitud de gerencia se envió información sobre el estado de ejecución de las obras del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 para algunas veredas en especifico	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (KEDO), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (KEDO)	Actualización ventana documental de la plataforma	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-EJ-01-18
EcoVivienda	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	VERSION: 06
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 05/06/2024

INFORME TÉCNICO

La Empresa Constructora de Vivienda ECOVIVIENDA celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. ECO CD 010 2026 con el señor Oscar Andrés Zárate Mendivelso, cuyo objeto consiste en la "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer las actividades en el marco de los programas y proyectos que adelante la Dirección Técnica de ECOVIVIENDA", con el fin de apoyar la ejecución de las actividades establecidas en la cláusula tercera del contrato.

El contrato inició su ejecución el 16 de enero de 2026 y tiene como fecha de terminación el 15 de octubre de 2026. Durante su desarrollo, las partes suscribieron el Modificatorio No. 1 (14 de julio de 2026), mediante el cual se ajustaron las cláusulas segunda y tercera del contrato inicial, adecuando las obligaciones y condiciones de ejecución conforme a las necesidades del servicio.

En desarrollo del contrato, el contratista ha brindado apoyo permanente a la Dirección Técnica en la ejecución de actividades relacionadas con los proyectos institucionales de mejoramiento de vivienda urbana y rural, participando en procesos de diagnóstico técnico, revisión de estudios y presupuestos, seguimiento físico a las obras, consolidación de información técnica, gestión documental y apoyo a actuaciones administrativas requeridas por la dependencia. Estas actividades han contribuido al fortalecimiento de los procesos de supervisión, control y seguimiento de los proyectos ejecutados por ECOVIVIENDA.

Situación actual

En términos operativos, el servicio se está prestando de manera continua y adecuada, sin interrupciones significativas. No se registran incumplimientos contractuales a la fecha.

Con corte al 31 de agosto de 2026, el contrato presenta una ejecución satisfactoria, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, de conformidad con el seguimiento y verificación realizados por la supervisión.

Durante el período objeto de evaluación, el contratista ejecutó las actividades programadas de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando acciones de apoyo a la Dirección Técnica relacionadas con:

•Diagnóstico y seguimiento de proyectos de mejoramiento de vivienda.
•Revisión de estudios técnicos y presupuestos.
•Verificación física de obras en ejecución.
•Consolidación de información técnica y generación de informes digitales.
•Organización de archivos de interventoría y gestión documental.
•Acompañamiento a reuniones interinstitucionales y atención de solicitudes administrativas.
•Actualización de la plataforma documental KEDO, manteniendo la ventanilla sin pendientes.

La supervisión verificó que las actividades desarrolladas se encuentran debidamente soportadas mediante informes de actividades, registros documentales y demás evidencias presentadas por el contratista, constatando su correspondencia con las obligaciones contractuales.


En consecuencia, no se evidencian incumplimientos, retrasos o situaciones que comprometan la adecuada ejecución del contrato ni la continuidad del apoyo requerido por la Dirección Técnica.

La supervisión concluye que el contrato mantiene una ejecución técnica y administrativa acorde con las condiciones pactadas, evidenciando un desarrollo satisfactorio de las actividades y un adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales. El apoyo prestado por el contratista ha contribuido al fortalecimiento de la gestión de la Dirección Técnica y al cumplimiento de los objetivos institucionales previstos para el período evaluado, con corte al 31 de agosto de 2026.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	83,3%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	83,3%	% PAGOS AUTORIZADOS	83,3%



Acorde al informe presnetado por la interventoría

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el período correspondiente al Acta Parcial No. 8, el contratista ejecutó las actividades programadas conforme al cronograma aprobado y las obligaciones establecidas en el contrato. La supervisión verificó la ejecución mediante revisión del informe mensual, soportes documentales y evidencias aportadas, constatando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En desarrollo de las obligaciones contractuales, el contratista brindó apoyo a la Dirección Técnica en:

•Visitas técnicas de diagnóstico para viviendas del proyecto de Mejoramiento Urbano 2025.
•Revisión de presupuestos y cantidades del proyecto de Mejoramiento Rural 2025.
•Seguimiento físico a viviendas en ejecución y verificación de correspondencia con actas parciales de interventoría.
•Consolidación de información técnica derivada de visitas de seguimiento.
•Gestión documental mediante organización y foliación de expedientes.
•Acompañamiento a reuniones técnicas y atención de requerimientos de la Dirección Técnica.
•Actualización de la plataforma KEDO, manteniendo la ventanilla documental sin pendientes.

La supervisión evidenció que los productos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y cuentan con soportes que acreditan su ejecución. Las actividades fueron verificadas en campo y documentalmente, estableciendo su conformidad técnica y administrativa, sin observaciones que afectaran la calidad o el normal desarrollo del contrato.

EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO: R-EJ-01-18**
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSION: 06**
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	**FECHA: 05/06/2024**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	8,88	4	02	2026	$ 1.616.000,00
ACTA PARCIAL No. 2	24,44	2	03	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 3	42,22	2	04	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 4	58,33	6	05	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 5	75	2	06	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 6	91,67	3	07	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 7	72,22 (acorde a	3	08	2026	$ 3.030.000,00
ACTA PARCIAL No. 8	83,33 (acorde a	3	09	2026	$ 3.030.000,00
TOTAL					**$ 22.826.000,00**

INFORME JURÍDICO

El Contrato de Prestación de Servicios No. ECO-CD-010-2026 fue celebrado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias y demás disposiciones que regulan la contratación estatal. En atención a la naturaleza del objeto contractual, su ejecución se desarrolla bajo la modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión, sin que ello implique la existencia de vínculo laboral, subordinación o reconocimiento de prestaciones sociales entre ECOVIVIENDA y el contratista.

Durante el período objeto del presente informe, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, constatando que la ejecución se ha desarrollado dentro de las condiciones pactadas, sin evidenciar situaciones que puedan configurar incumplimiento contractual o que requieran la adopción de medidas correctivas. Así mismo, se verificó la presentación oportuna de los informes de actividades y de los soportes requeridos para el trámite de la correspondiente acta parcial, en concordancia con las obligaciones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES:

SANDRA MILENA CORTES BONILLA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

ACTA PARCIAL N° 008

FECHA PRESENTE ACTA	03-09-2026
CONTRATO	ECO-CD-010-2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO	27.270.000
PLAZO	270
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA
NIT.	820.003.259-9
CONTRATISTA	Oscar Andrés Zarate Mendivelso
NIT. y/o C.C	CC 1.007.518.187
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Sandra Milena Cortés Bonilla
FECHA DE INICIO	16-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15-10-2026
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A
PERIODO DE PAGO	DEL 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
ADICIONAL N° 1 EN VALOR	9.090.000
PRORROGA N° 1 EN TIEMPO	90

En la ciudad de Tunja, a los 3 días del mes de Septiembre del año 2026 , el Directivo Sandra Milena Cortés Bonilla, y quien obra como supervisor del Contrato de

Prestación de Servicios Profesionales No. ECO-CD-010-2026 del 16 de Enero de 2026certifica que el ACTA PARCIAL No.008, corresponde al periodo de pago del 1 de Agosto de 2026 al 31 de Agosto de 2026 , en los siguientes términos:


BALANCE DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	27.270.000
VALOR ACTAS PAGADAS	19.796.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	3.030.000
ADICIÓN N° 1	9090000
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$4.444.000

Como Supervisor(a) del Contrato No.ECO-CD-010-2026 del 16 de Enero de 2026, manifiesto que he recibido a satisfacción y dentro de los términos contractuales las actividades pactadas y establecidas dentro las obligaciones y que revisado el informe presentado por el contratista de común acuerdo correspondiente al período de pago mencionado, quien cumplió a satisfacción los términos establecidos; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus Aportes al Régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación 9509043934 de Julio de 2026, de conformidad con la normatividad vigente.

Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al: 83.33%

Para constancia se firma:

Firma: 

Nombre:Sandra Milena Cortés Bonilla

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA	CÓDIGO: RA-J-03-03
	ASESORIA JURIDICA	FECHA: 03/08/2022
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	VERSIÓN: 04
		PÁGINA : 1 de 1

CONTRATO No:ECO-CD-010-2026

PERIODO REPORTE:DEL 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FECHA PRESENTE INFORME:03-09-2026

FECHA INICIO DE CONTRATO:16-01-2026

FECHA TERMINACION CONTRATO:15-10-2026

CONTRATISTA: Oscar Andrés Zarate Mendivelso

SUPERVISOR: Sandra Milena Cortés Bonilla

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

REPORTE DEL CONTRATISTA	REPORTE DEL INTERVENTOR

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	T	P	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Apoyar integralmente los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda	Para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano se realizo una visita diagnostico producto de un derecho de petición solicitado por la vivienda numero 18 con el fin de verificar si la vivienda era susceptible de mejoramiento, de igual forma para el mismo proyecto se realizo una visita diagnostico a fin de realizar el levantamiento	X				Se adjuntan evidencias

		planimétrico. Para el proyecto de andenes se realizó una reunión con los contratistas de obra del proyecto y contratistas de la obra de mejoramiento vial a fin de verificar las condiciones actuales y realizar una integración entre ambos proyectos para no generar atrasos en la ejecución de las obras de dichos proyectos. Por un derecho de petición remitido por la secretaria de la mujer se realizo una visita diagnostico a una vivienda en el sector rural de chorro blanco con el objetivo de verificar la habitabilidad, hacinamiento y socializar la posibilidad de acceder a un programa de mejoramiento de vivienda.					
2	Apoyar la revisión de estudios técnicos, presupuestales y plano de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de	Para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 se realizó la elaboración de 2 planos arquitectónico producto de los levantamientos planimétricos y 2 presupuestos de obra.	X				Se adjuntan evidencias

	Ecovivienda.	Para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 se realizó la revisión del acta parcial No 3 radicada por interventoría con el objetivo de verificar la concordancia de la información de dicha acta y generar observaciones.					
3	Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recurso y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-IO, RAS,	En el proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural 2025, se realizaron 2 visitas de seguimiento a diferentes viviendas que se encontraban en ejecución, con el propósito de medir las cantidades de obra ejecutadas y verificar su correspondencia con las cantidades consignadas en los presupuestos de obra. Esta actividad se desarrolló como parte de la revisión del Acta Parcial No. 3 radicada por la interventoría del proceso. Para el proyecto de Bellavista se realizo una visita de seguimiento a fin de verificar el avance actual de la obra y detallar hallazgos que se pudieran presentar. Para el proyecto de mejoramiento de	X				Se adjuntan evidencias

	RETIE etc.).	andenes se realizó tres visitas de seguimiento a fin de verificar el avance actual de la obra y detallar hallazgos que se pudieran presentar en la ejecución de la misma.					
4	Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos financieros de los proyectos en ejecución	En el desarrollo de las visitas de seguimiento de obra, se diligenció el formulario de seguimiento con el propósito de consolidar la información recopilada en formato digital, permitiendo la generación de los informes técnicos correspondientes y el adecuado registro del avance de las actividades ejecutadas.	X				Se adjuntan evidencias
5	Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.	Se apoyo en la organización del archivo de la interventoría del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 y adicional se genero el archivo de gestión del mismo proyecto.	X				Se adjuntan evidencias
6	Apoyar respuestas a solicitudes administrativas	Por solicitud de la dirección técnica se colaboró en las siguientes actividades:	X				Se adjuntan evidencias

	de supervisores interventores y otros actores, relacionadas con la ejecución de las obras.	• . Elaboración del formato de acta de recibo a satisfacción de obra • . Información sobre cuantas unidades sanitarias fueron previstas en el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 y cuantas han sido ejecutadas hasta el momento • · Asistencia a una reunión junto con funcionarios de la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Tunja para temas relacionados con el proyecto de mejoramiento de andenes • · Asistencia a una reunión junto con residente de obra e interventoría y un funcionario de veolia para					

		temas relacionados con el proyecto de mejoramiento de andenes Por solicitud de gerencia se envió información sobre el estado de ejecución de las obras del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 para algunas veredas en especifico					
7	Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (KEDO), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondient	Se mantuvo actualizado y sin pendientes la ventana documental de la plataforma	X				Se adjuntan evidencias

	e del software documental (KEDO)						



FIRMA CONTRATISTA



FIRMA SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas. N/A: No Aplica

FECHA PRESENTE INFORME	3 de septiembre de 2026
CONTRATO No	ECO-CD-010-2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA
CONTRATISTA	Oscar Andres Zarate Mendivelso
SUPERVISOR	Sandra Milena Cortes Bonilla
PERIODO DE REPORTE	Del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto del 2026

ACTIVIDAD N°1 Apoyar integralmente los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda






13:23
11 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
Coordenadas: 5.49981, -73.394177
Nombre: Matilde Robayo
Proyecto: Derecho de peticion


13:02
11 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
Coordenadas: 5.48683, -73.389105
Nombre: Matilde Robayo
Proyecto: Derecho de peticion


08:39
05 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 239
Coordenadas: 5.501658, -73.364669
Proyecto: Mejoramiento urbano


08:38
05 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 239
Coordenadas: 5.501658, -73.364669
Proyecto: Mejoramiento urbano


08:49
11 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
Coordenadas: 5.546146, -73.358412
Proyecto: Andenes


08:42
11 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
Coordenadas: 5.545488, -73.35803
Proyecto: Andenes


DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano se realizo una visita diagnostico producto de un derecho de petición solicitado por la vivienda numero 18 con el fin de verificar si la vivienda era susceptible de mejoramiento, de igual forma para el mismo proyecto se realizo una visita diagnostico a fin de realizar el levantamiento planimétrico.


Para el proyecto de andenes se realizó una reunión con los contratistas de obra del proyecto y contratistas de la obra de mejoramiento vial a fin de verificar las condiciones actuales y realizar una integración entre ambos proyectos para no generar atrasos en la ejecución de las obras de dichos proyectos.

Por un derecho de petición remitido por la secretaria de la mujer se realizo una visita diagnostico a una vivienda en el sector rural de chorro blanco con el objetivo de verificar la habitabilidad, hacinamiento y socializar la posibilidad de acceder a un programa de mejoramiento de vivienda.

ACTIVIDAD N°2 Apoyar la revisión de estudios técnicos, presupuestales y plano de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.

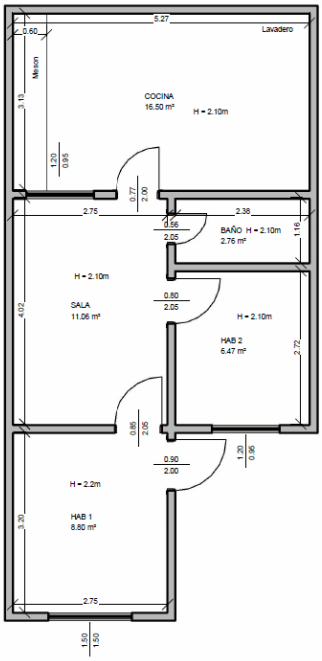

EcoVivienda	TITULAR DEL HOGAR: ROSALBA PAMPLONA JIMENEZ	MATRICULA INMOBILIARIA:	LEVANTO: OSCAR ANDRES ZARATE MENDIVELSO	No CARPETA: 99	FECHA: 25/08/2026
	DIRECCION: CALLE 8 SUR #2-41 MZ 14 CS 7	CEDULA CATASTRAL:	DIBUJO: OSCAR ANDRES ZARATE MENDIVELSO	ESCALA: 1 : 75	PLANO: 1/1

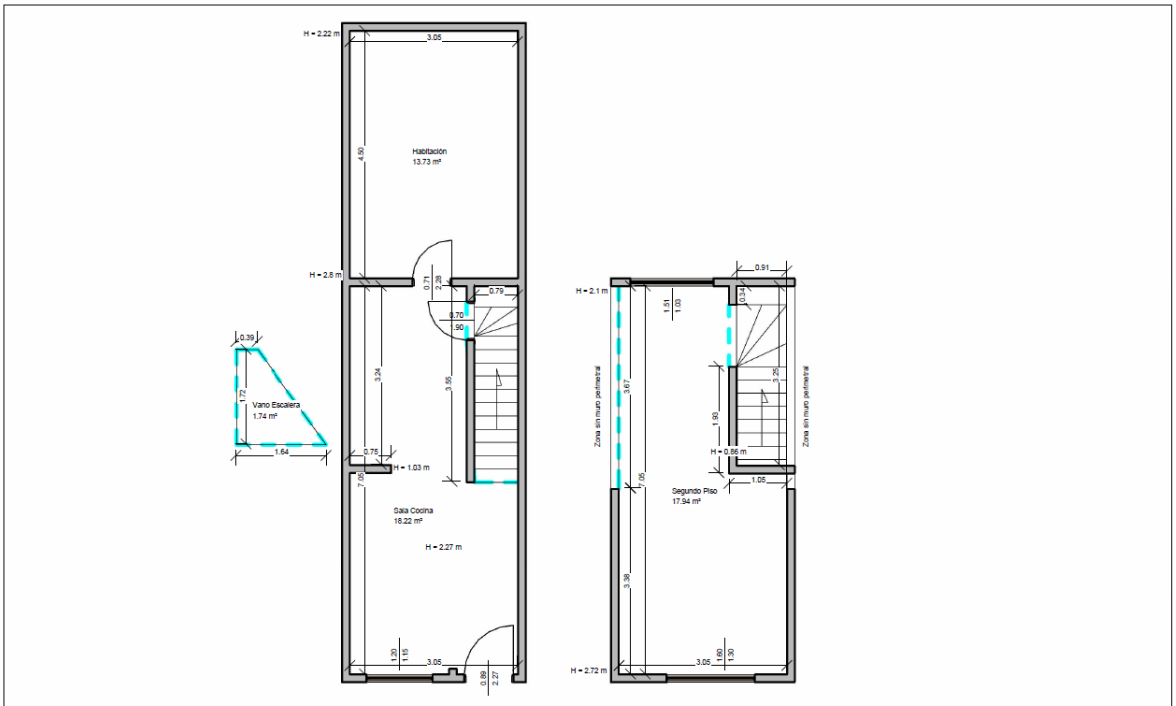

EcoVivienda	**TITULAR DEL HOGAR:** CARMEN ROSA SANCHEZ DE SOSA	**MATRICULA INMOBILIARIA:**	**LEVANTO:** OSCAR ANDRES ZARATE MENDIVELSO	**No CARPETA:** 239	**FECHA:** 5/08/2026
	DIRECCION: CRA 2B ESTE #10-57 SUR	**CEDULA CATASTRAL:**	**DIBUJO:** OSCAR ANDRES ZARATE MENDIVELSO	**ESCALA:** 1 : 75	**PLANO:** 1/1

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	**VERSIÓN:**	
		CÓDIGO:	
		FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		**PRESUPUESTO**	**NOMBRE**		**CEDULA**	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		99	ROSALBA PAMPLONA	JIMENEZ	51675616	
UBICACIÓN	LAT: 5.503536 LONG: -73.362628	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PUBLICA	
		PAÑETES						
1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	GOBER	M2	64.37	$ 34,835.27	$ 2,242,346.33	18.7%
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
2	2.01.49	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	19.79	$ 14,525.67	$ 287,463.01	2.4%
		PISOS - BASES - ACABADOS						
3	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	GOBER	M2	14.62	$ 33,165.57	$ 484,880.63	4.0%
4	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	GOBER	M2	14.62	$ 91,325.60	$ 1,335,180.27	11.1%
		PINTURAS Y ESMALTES						
5	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	GOBER	M2	26.53	$ 9,941.61	$ 263,750.91	2.2%
		CUBIERTAS						
6	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	GOBER	M2	15.4	$ 62,266.02	$ 958,896.71	8.0%
7	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	GOBER	M2	4.39	$ 56,840.99	$ 249,531.95	2.1%
		CIELO RASOS						
8	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	GOBER	M2	18.03	$ 77,510.13	$ 1,397,507.64	11.6%

		SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN						
9	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	GOBER	UND	2	$ 120,305.14	$ 240,610.28	2.0%
10	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	GOBER	UND	3	$ 28,464.79	$ 85,394.37	0.7%
		CARPINTERÍA METÁLICA						
11	2.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS).	GOBER	M2	2.09	$ 280,193.49	$ 585,604.39	4.9%
		CARPINTERÍA DE MADERA						
12	2.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX CON MARCO EN PINO INCLUYE BISAGRAS	GOBER	M2	3.38	$ 236,770.81	$ 800,285.34	6.7%
		VIDRIOS Y CERRADURAS						
13	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	GOBER	UND	2	$ 97,472.38	$ 194,944.76	1.6%
		NO PREVISTOS						
14	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	APU	M2	0.7	$ 83,094.67	$ 58,166.27	0.5%
15	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	APU	ML	12.9	$ 30,479.10	$ 393,180.33	3.3%
16	NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	APU	M2	92.19	$ 26,264.18	$ 2,421,294.63	20.2%
							$ 11,999,037.82	100%

ADMINISTRACIÓN	22%	$ 2,639,788.32
IMPTREVISTOS	3%	$ 359,971.13
UTILIDAD	5%	$ 599,951.89
COSTO INDIRECTO		$ 3,599,711.34
COSTO DIRECTO		$ 11,999,037.82
SUBTOTAL		$ 15,598,749.16
INTERVENTORIA		$ 0.00
TOTAL PRESUPUESTO		$ 15,598,749.16

PROFESIONAL:
PROFESSION:
TP:

PRESUPUESTO 99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	**VERSIÓN:**	
		CÓDIGO:	
		FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		**PRESUPUESTO**	**NOMBRE**		**CEDULA**	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		289	GIOVVANY SALAS	JIMENEZ	1053585299	
UBICACIÓN	LAT: 5.541182 LONG: -73.364423	**BARRIO**	20 DE JULIO			

ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**%**
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PUBLICA	
		PAÑETES						
1	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	GOBER	ML	34.61	$ 12,797.41	$ 442,918.36	3.7%
2	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	GOBER	M2	3.95	$ 38,524.31	$ 152,171.02	1.3%
3	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	GOBER	M2	1.2	$ 35,818.47	$ 42,982.16	0.4%
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
4	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	1.64	$ 9,885.94	$ 16,212.94	0.1%
5	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	3.95	$ 7,159.00	$ 28,278.05	0.2%
6	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	9.52	$ 14,525.67	$ 138,284.38	1.2%
7	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	GOBER	M2	8.14	$ 31,209.12	$ 254,042.24	2.1%
		MAMPOSTERIA						
8	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	GOBER	M2	1.55	$ 187,405.13	$ 290,477.95	2.4%
		PISOS - BASES - ACABADOS						
9	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	GOBER	M2	16.74	$ 33,165.57	$ 555,191.64	4.6%
10	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	GOBER	M2	16.74	$ 91,325.60	$ 1,528,790.54	12.7%


		CUBIERTAS						
11	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	GOBER	M2	9.52	$ 62,266.02	$ 592,772.51	4.9%
		CIELO RASOS						
12	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	GOBER	M2	21.9	$ 77,510.13	$ 1,697,471.85	14.1%
		SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN						
13	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	GOBER	UND	3	$ 28,464.79	$ 85,394.37	0.7%
		APARATOS SANITARIOS						
14	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	GOBER	UND	1	$ 711,261.47	$ 711,261.47	5.9%
		CARPINTERÍA METÁLICA						
15	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	GOBER	M2	1.8	$ 264,906.59	$ 476,831.86	4.0%
16	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	GOBER	M2	4.86	$ 277,796.00	$ 1,350,088.56	11.3%
		CARPINTERÍA DE MADERA						
17	2.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX CON MARCO EN PINO INCLUYE BISAGRAS	GOBER	M2	4.28	$ 236,770.81	$ 1,013,379.07	8.4%
		VIDRIOS Y CERRADURAS						
18	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	GOBER	UND	3	$ 97,472.38	$ 292,417.14	2.4%
19	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	GOBER	UND	1	$ 130,841.14	$ 130,841.14	1.1%
		APU						
20	APU 1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INODORO LAVAMANOS Y DUCHA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	APU	UND	1	$ 70,566.25	$ 70,566.25	0.6%
		NO PREVISTOS						
21	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA	APU	M2	5.18	$ 83,094.67	$ 430,430.39	3.6%
22	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	APU	ML	9.04	$ 30,479.10	$ 275,531.02	2.3%
23	NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	APU	M2	54.12	$ 26,264.18	$ 1,421,417.35	11.8%
							$ 11,997,752.26	100%

ADMINISTRACIÓN	22%	$ 2,639,505.50
IMPTREVISTOS	3%	$ 359,932.57
UTILIDAD	5%	$ 599,887.61
COSTO INDIRECTO		$ 3,599,325.68
COSTO DIRECTO		$ 11,997,752.26
SUBTOTAL		$ 15,597,077.94
INTERVENTORIA		$ 0.00
TOTAL PRESUPUESTO		$ 15,597,077.94

PROFESIONAL:
PROFESSIÓN:
TP:

PRESUPUESTO 289 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

CARPETA	VALOR PACTADO	VALOR ACTA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
149	$ 21,821,780.46	$ 24,637,902.80	$ 2,816,122.34	CORREGIR NUMERO DE ITEMS
144	$ 20,683,373.77	$ 24,714,570.25	$ 4,031,196.48	SE VERIFICO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES FALTANTES, SE AGREGO ASEO GENERAL
13	$ 23,854,582.07	$ 24,418,844.52	$ 564,262.45	CORREGIR NUMEROS DE ITEMS, SE AGREGO ASEO GENERAL
34	$ 23,350,165.70	$ 23,793,103.36	$ 442,937.66	CORREGIR NUMEROS DE ITEMS, UNIDADES, SE AGREGO ASEO GENERAL
36	$ 21,188,439.40	$ 21,638,901.79	$ 450,462.39	SE AGRUEGO ASEO GENERAL
92	$ 15,848,699.00	$ 16,225,864.88	$ 377,165.88	CORREGIR NUMEROS DE ITEMS, SE AGREGO ASEO GENERAL
99	$ 18,104,252.66	$ 21,730,230.49	$ 3,625,977.83	SE VERIFICO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES FALTANTES, CORREGIR NUMEROS DE ITEMS, SE AGREGO ASEO GENERAL
84	$ 24,742,608.13	$ 25,264,791.46	$ 522,183.33	CORREGIR NUMEROS DE ITEMS, SE AGREGO ASEO GENERAL
151	$ 25,488,142.62	$ 25,488,142.62	-$ 0.00	CORREGIR NUMERO DE ITEMS
3	$ 20,213,868.83	$ 21,051,431.53	$ 837,562.70	CAMBIAR LA IMAGEN DE LA PUERTA COLD ROLD PORQUE AHÍ NO SE OBSERVA LA INSTALACION, CORREGIR LOS NUMEROS DE ITEMS
53	$ 24,740,106.39	$ 24,900,863.18	$ 160,756.79	VALOR DE GUARDA ESCOBA MAYOR AL MEDIDO DONDE SE AÑADIO UNA CANTIDAD ADICIONAL DE 3.93M EN LA COCINA
39	$ 25,582,485.51	$ 25,582,517.82	$ 32.31	CORREGIR NUMEROS DE ITEMS
51	$ 23,906,501.17	$ 23,906,501.17	$ -	CORREGIR NUMEROS DE ITEMS
62	$ 21,608,891.44	$ 25,618,378.59	$ 4,009,487.15	SE VERIFICO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES FALTANTES, CORREGIR NUMEROS DE ITEMS
191	$ 3,969,962.31	$ 3,969,974.18	$ 11.87	CORREGIR NUMRO DE ITEMS
278	$ 1,264,100.24	$ 1,264,100.24	$ -	CORREGIR NUMERO DE ITEMS
167	$ 738,535.67	$ 738,535.67	$ -	CORREGIR NUMERO DE ITEMS
121	$ 18,506,544.66	$ 18,659,328.10	$ 152,783.44	SE VERIFICO LA EJECUCION DE UNA ACTIVIDAD, CORREGIR NUMERO DE ITEMS

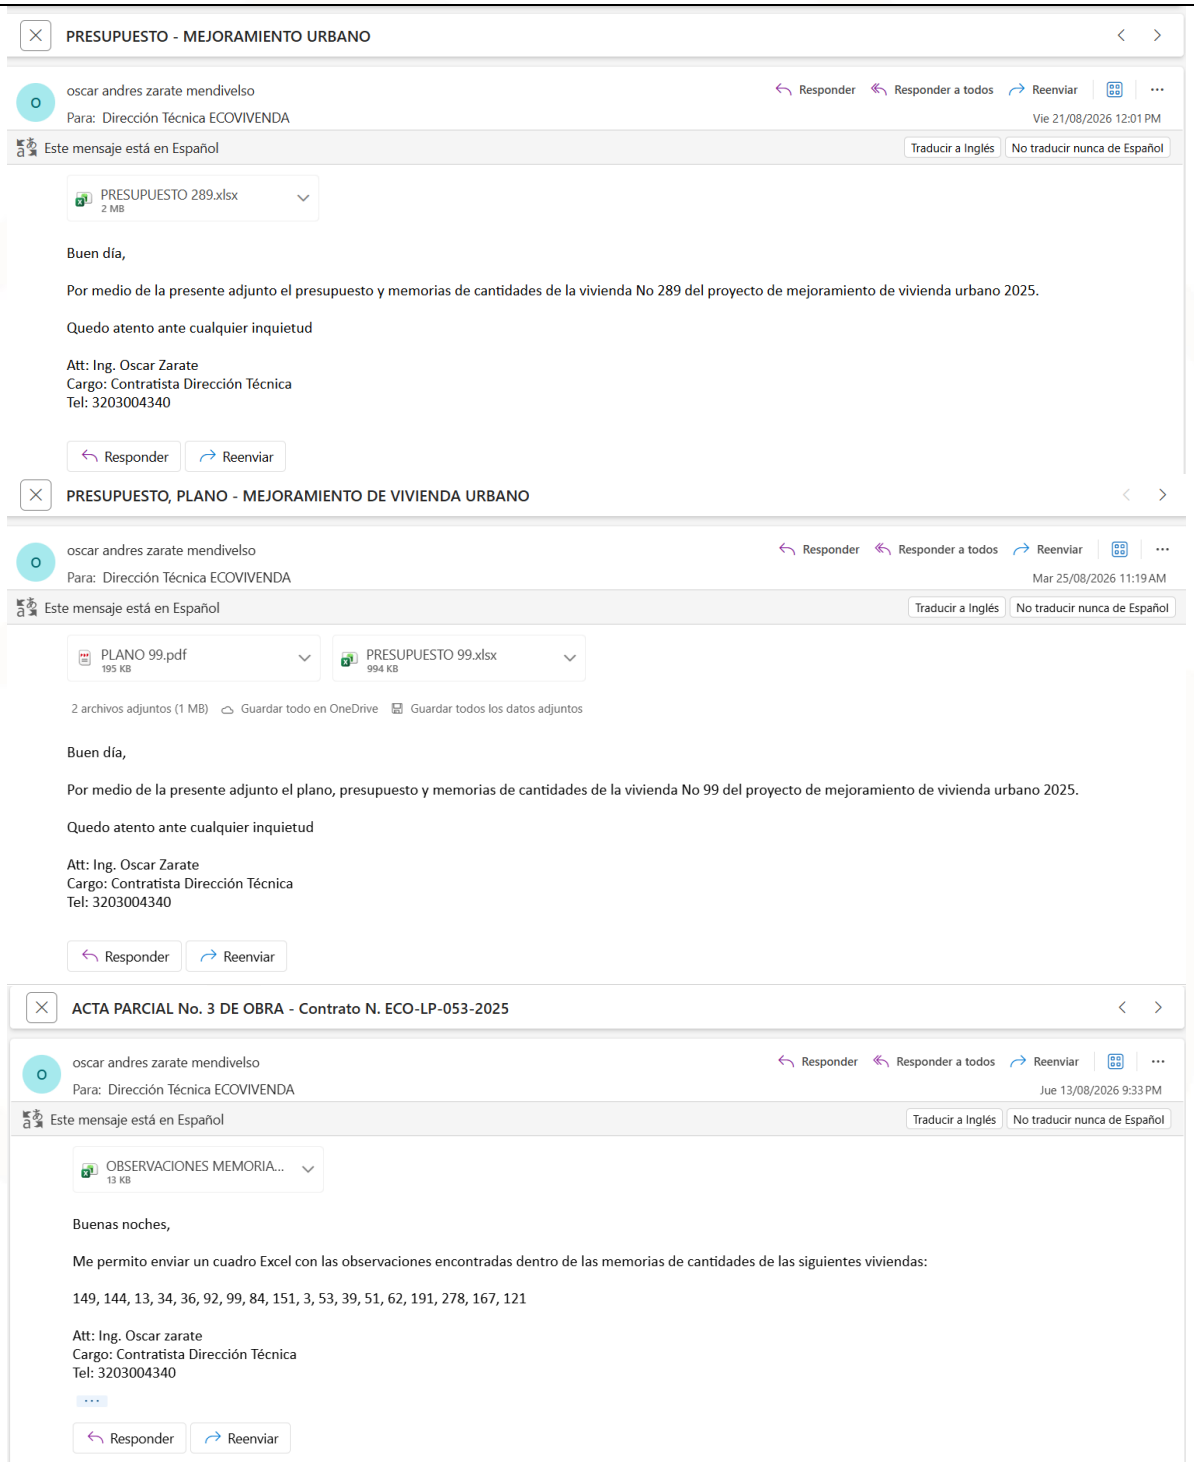

PRESUPUESTO - MEJORAMIENTO URBANO

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Vie 21/08/2026 12:01 PM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

PRESUPUESTO 289.xlsx
2 MB

Buen día,

Por medio de la presente adjunto el presupuesto y memorias de cantidades de la vivienda No 289 del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025.

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

PRESUPUESTO, PLANO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 25/08/2026 11:19 AM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

PLANO 99.pdf
195 KB

PRESUPUESTO 99.xlsx
994 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) | Guardar todo en OneDrive | Guardar todos los datos adjuntos

Buen día,

Por medio de la presente adjunto el plano, presupuesto y memorias de cantidades de la vivienda No 99 del proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025.

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

ACTA PARCIAL No. 3 DE OBRA - Contrato N. ECO-LP-053-2025

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 13/08/2026 9:33 PM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

OBSERVACIONES MEMORIA...
13 KB

Buenas noches,

Me permito enviar un cuadro Excel con las observaciones encontradas dentro de las memorias de cantidades de las siguientes viviendas:

149, 144, 13, 34, 36, 92, 99, 84, 151, 3, 53, 39, 51, 62, 191, 278, 167, 121

Att: Ing. Oscar zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 se realizó la elaboración de 2 planos arquitectónico producto de los levantamientos planimétricos y 2 presupuestos de obra.

Para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 se realizó la revisión del acta parcial No 3 radicada por interventoría con el objetivo de verificar la concordancia de la información de dicha acta y generar observaciones.

ACTIVIDAD N°3 Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recurso y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR-IO, RAS, RETIE etc.).

EL REGISTRO FOTOGRAFICO SE ANEXA JUNTO CON LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO


DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:


En el proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural 2025, se realizaron 2 visitas de seguimiento a diferentes viviendas que se encontraban en ejecución, con el propósito de medir las cantidades de obra ejecutadas y verificar su correspondencia con las cantidades consignadas en los presupuestos de obra. Esta actividad se desarrolló como parte de la revisión del Acta Parcial No. 3 radicada por la interventoría del proceso.

Para el proyecto de Bellavista se realizo una visita de seguimiento a fin de verificar el avance actual de la obra y detallar hallazgos que se pudieran presentar.

Para el proyecto de mejoramiento de andenes se realizó tres visitas de seguimiento a fin de verificar el avance actual de la obra y detallar hallazgos que se pudieran presentar en la ejecución de la misma.

ACTIVIDAD N°4 Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos financieros de los proyectos en ejecución

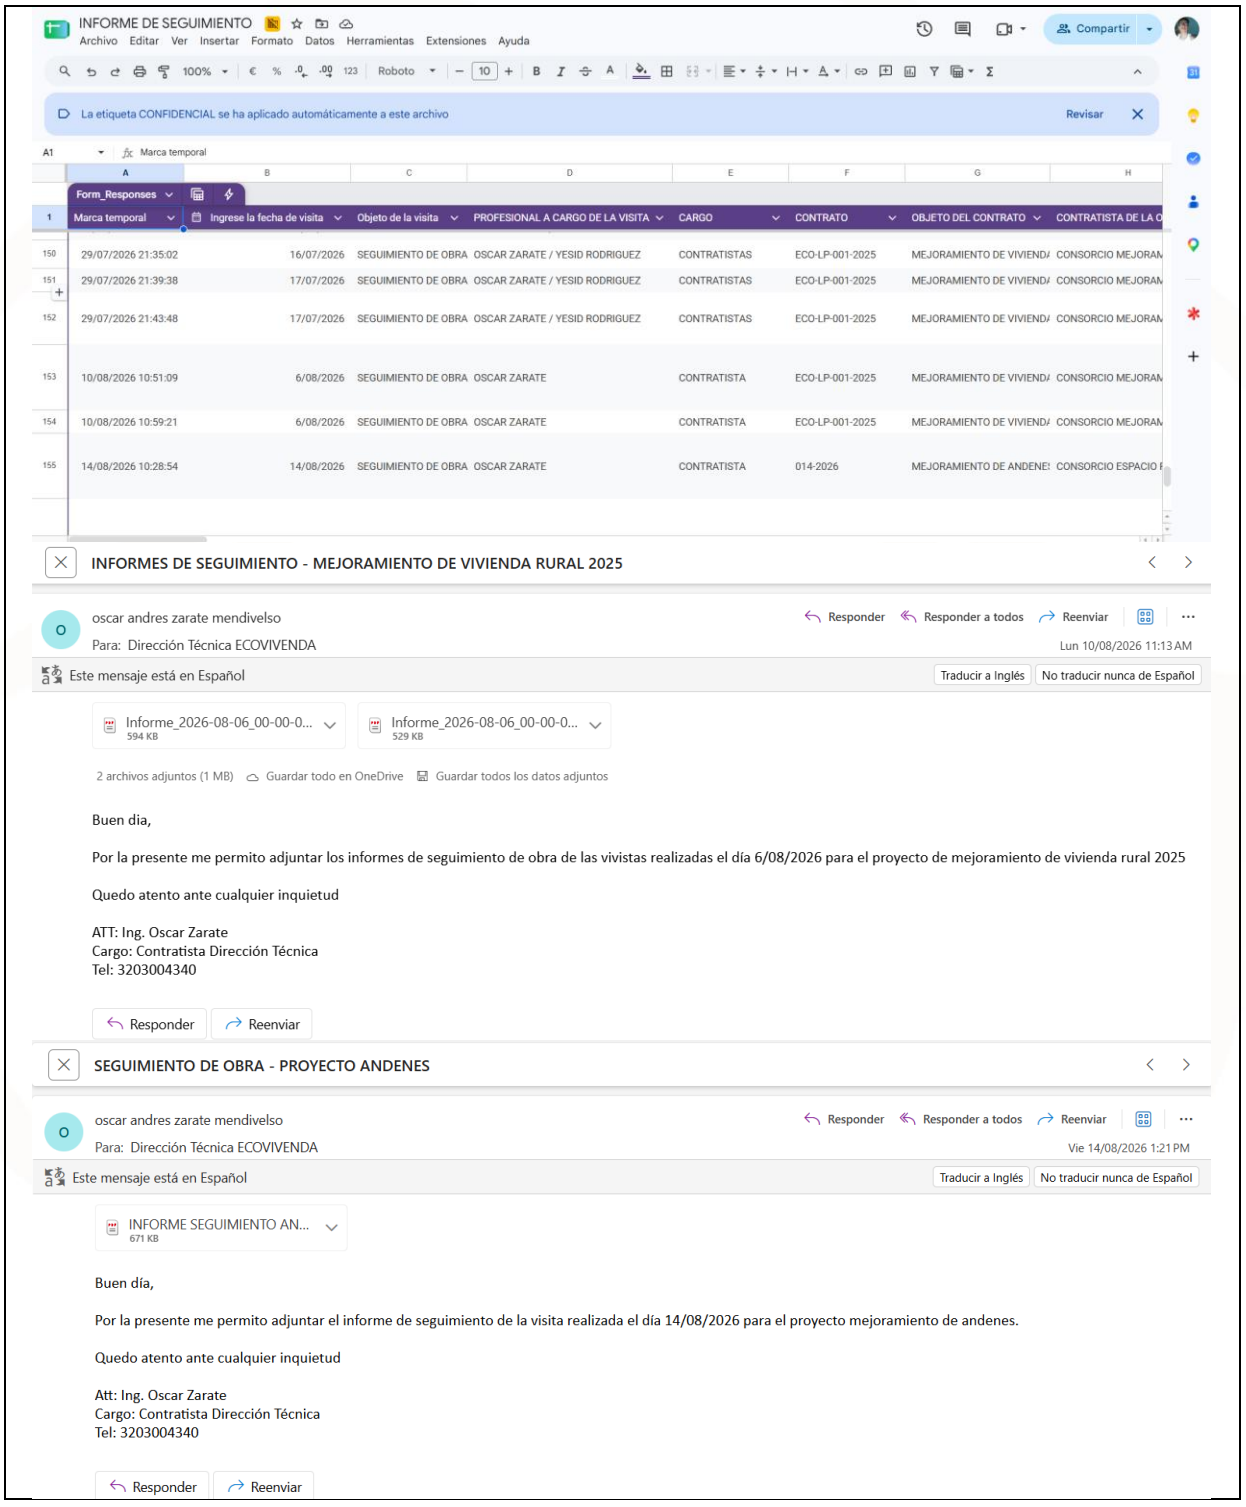
INFORME DE SEGUIMIENTO
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda
Compartir
La etiqueta CONFIDENCIAL se ha aplicado automáticamente a este archivo
Revisar
Marca temporal
Form_Responses
Marca temporal | Ingrese la fecha de visita | Objeto de la visita | PROFESIONAL A CARGO DE LA VISITA | CARGO | CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATISTA DE LA O
29/07/2026 21:35:02 | 16/07/2026 | SEGUIMIENTO DE OBRA | OSCAR ZARATE / YESID RODRIGUEZ | CONTRATISTAS | ECO-LP-001-2025 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSORCIO MEJORAN
29/07/2026 21:39:38 | 17/07/2026 | SEGUIMIENTO DE OBRA | OSCAR ZARATE / YESID RODRIGUEZ | CONTRATISTAS | ECO-LP-001-2025 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSORCIO MEJORAN
29/07/2026 21:43:48 | 17/07/2026 | SEGUIMIENTO DE OBRA | OSCAR ZARATE / YESID RODRIGUEZ | CONTRATISTAS | ECO-LP-001-2025 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSORCIO MEJORAN
10/08/2026 10:51:09 | 6/08/2026 | SEGUIMIENTO DE OBRA | OSCAR ZARATE | CONTRATISTA | ECO-LP-001-2025 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSORCIO MEJORAN
10/08/2026 10:59:21 | 6/08/2026 | SEGUIMIENTO DE OBRA | OSCAR ZARATE | CONTRATISTA | ECO-LP-001-2025 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSORCIO MEJORAN
14/08/2026 10:28:54 | 14/08/2026 | SEGUIMIENTO DE OBRA | OSCAR ZARATE | CONTRATISTA | 014-2026 | MEJORAMIENTO DE ANDENES | CONSORCIO ESPACIO
INFORMES DE SEGUIMIENTO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 2025
oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA
Responder Responder a todos Reenviar
Lun 10/08/2026 11:13 AM
Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés No traducir nunca de Español
Informe_2026-08-06_00-00-0... 594 KB
Informe_2026-08-06_00-00-0... 529 KB
2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive Guardar todos los datos adjuntos
Buen dia,
Por la presente me permito adjuntar los informes de seguimiento de obra de las vivistas realizadas el día 6/08/2026 para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025
Quedo atento ante cualquier inquietud
ATT: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340
Responder Reenviar
SEGUIMIENTO DE OBRA - PROYECTO ANDENES
oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA
Responder Responder a todos Reenviar
Vie 14/08/2026 1:21 PM
Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés No traducir nunca de Español
INFORME SEGUIMIENTO AN... 671 KB
Buen día,
Por la presente me permito adjuntar el informe de seguimiento de la visita realizada el día 14/08/2026 para el proyecto mejoramiento de andenes.
Quedo atento ante cualquier inquietud
Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340
Responder Reenviar

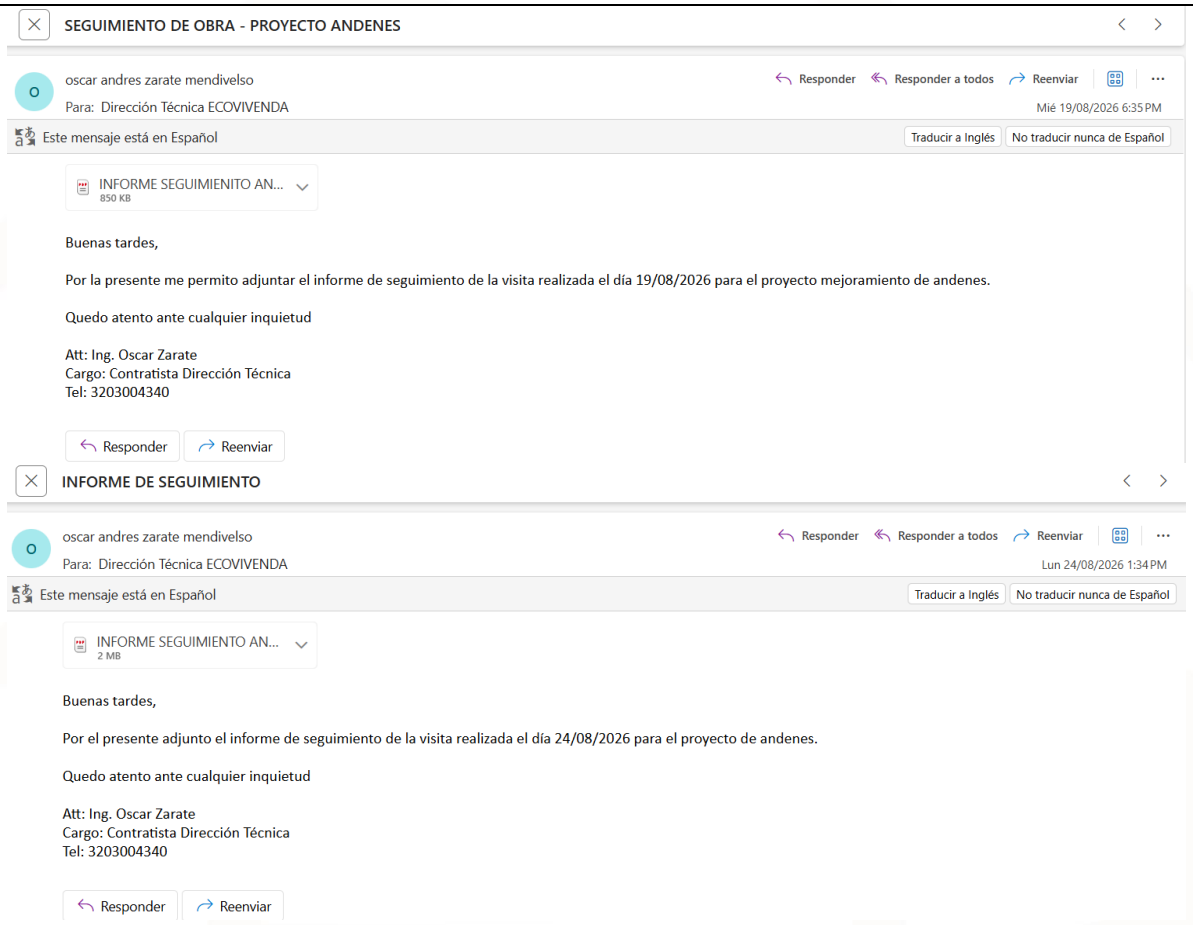

SEGUIMIENTO DE OBRA - PROYECTO ANDENES

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 19/08/2026 6:35 PM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

INFORME SEGUIMIENITO AN... 850 KB

Buenas tardes,

Por la presente me permito adjuntar el informe de seguimiento de la visita realizada el día 19/08/2026 para el proyecto mejoramiento de andenes.

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

INFORME DE SEGUIMIENTO

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 24/08/2026 1:34 PM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

INFORME SEGUIMIENTO AN... 2 MB

Buenas tardes,

Por el presente adjunto el informe de seguimiento de la visita realizada el día 24/08/2026 para el proyecto de andenes.

Quedo atento ante cualquier inquietud


Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340


Responder | Reenviar


LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO SE ADJUNTAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: En el desarrollo de las visitas de seguimiento de obra, se diligenció el formulario de seguimiento con el propósito de consolidar la información recopilada en formato digital, permitiendo la generación de los informes técnicos correspondientes y el adecuado registro del avance de las actividades ejecutadas.

ACTIVIDAD N°5 Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.

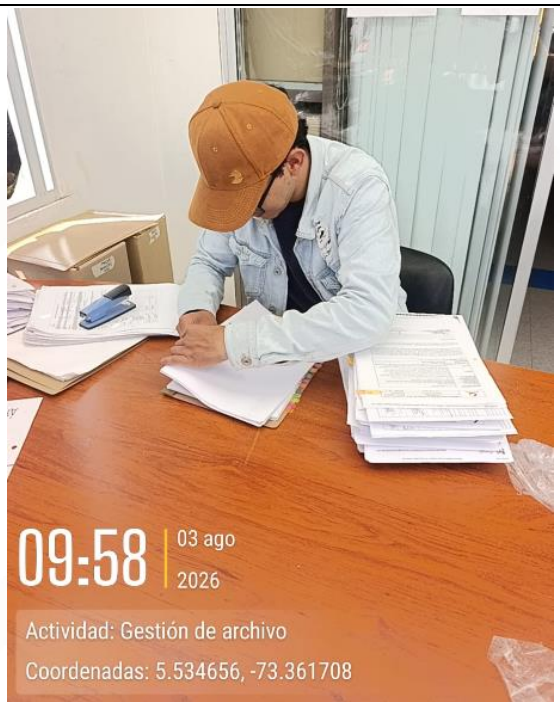

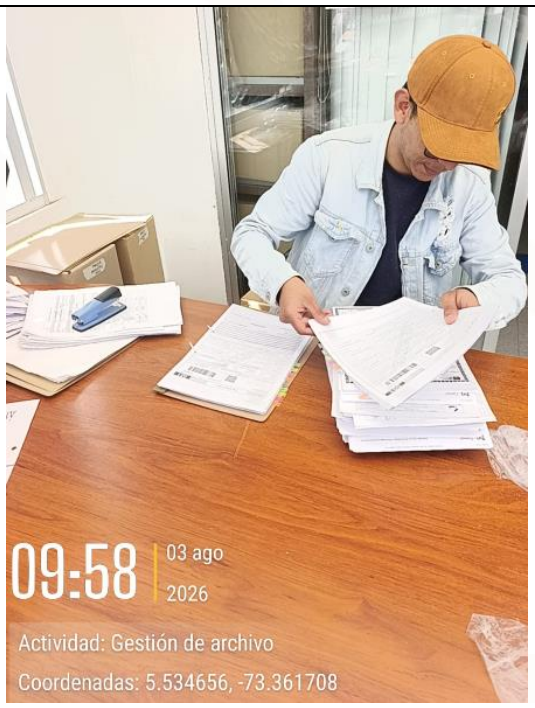

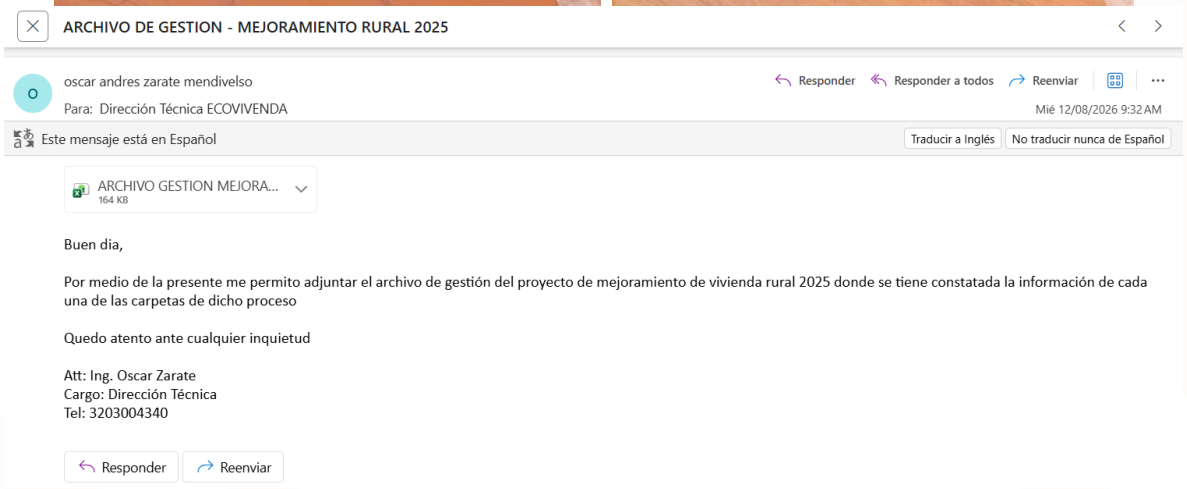

ARCHIVO DE GESTION - MEJORAMIENTO RURAL 2025

oscar andres zarate mendivelso
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 12/08/2026 9:32 AM

Este mensaje está en Español
Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

ARCHIVO GESTION MEJORA...
164 KB

Buen dia,

Por medio de la presente me permito adjuntar el archivo de gestión del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 donde se tiene constatada la información de cada una de las carpetas de dicho proceso

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

EL ARCHIVO DE GESTION SE ANEXA AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se apoyo en la organización del archivo de la interventoría del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 y adicional se genero el archivo de gestión del mismo proyecto.

ACTIVIDAD N°6 Apoyar respuestas a solicitudes administrativas de supervisores interventores y otros actores, relacionadas con la ejecución de las obras.

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION

oscar andres zarate mendivelso

Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 4/08/2026 3:45 PM

ACTA DE RECIBO A SATISFAC... 40 KB

Buenas tardes,

Por la presente me permito adjuntar el formato de recibo a satisfacción con el fin de que sea avalado por calidad para su posterior uso en entregas de viviendas de los proyectos de mejoramiento de vivienda rural y vivienda urbana.

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: Contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

Solicitud de diagnóstico contrato ECO-LP-053-2025

oscar andres zarate mendivelso

Para: Dirección Técnica ECOVIVIENDA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 20/08/2026 10:06 PM

Este mensaje está en Español — Traducir a Inglés | No traducir nunca de Español

UNIDADES SANITARIAS.xlsx 66 KB

Buenas Noches.


En respuesta a la solicitud adjunto un archivo xslx con la información requerida, de igual forma a continuación indico las cantidades totales proyectadas por actividad y las cantidades totales ejecutadas hasta el acta parcial No 3.


ACTIVIDAD	UND	CANT PROYECTADA	CANT EJECUTADA
MESON EN CONCRETO	M2	83.94	65.08
CANAL PVC AGUAS LLUVIAS	ML	47.6	29.02
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	16.39	553.01
CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	480.79	577.09
CABALLETE	ML	72.83	59.89
TEJA TRASLUCIDA	M2	41.18	60.61
LAVAMANOS	UND	1	1
COMBO SANITARIO	UND	84	42
GRIFERIA PARA DUCHA	UND	70	10
LAVAPLATOS	UND	9	4
GRIFERIA TIPO GANSO	UND	N/A	21

Quedo atento ante cualquier inquietud

Att: Ing. Oscar Zarate
Cargo: contratista Dirección Técnica
Tel: 3203004340

Responder | Reenviar

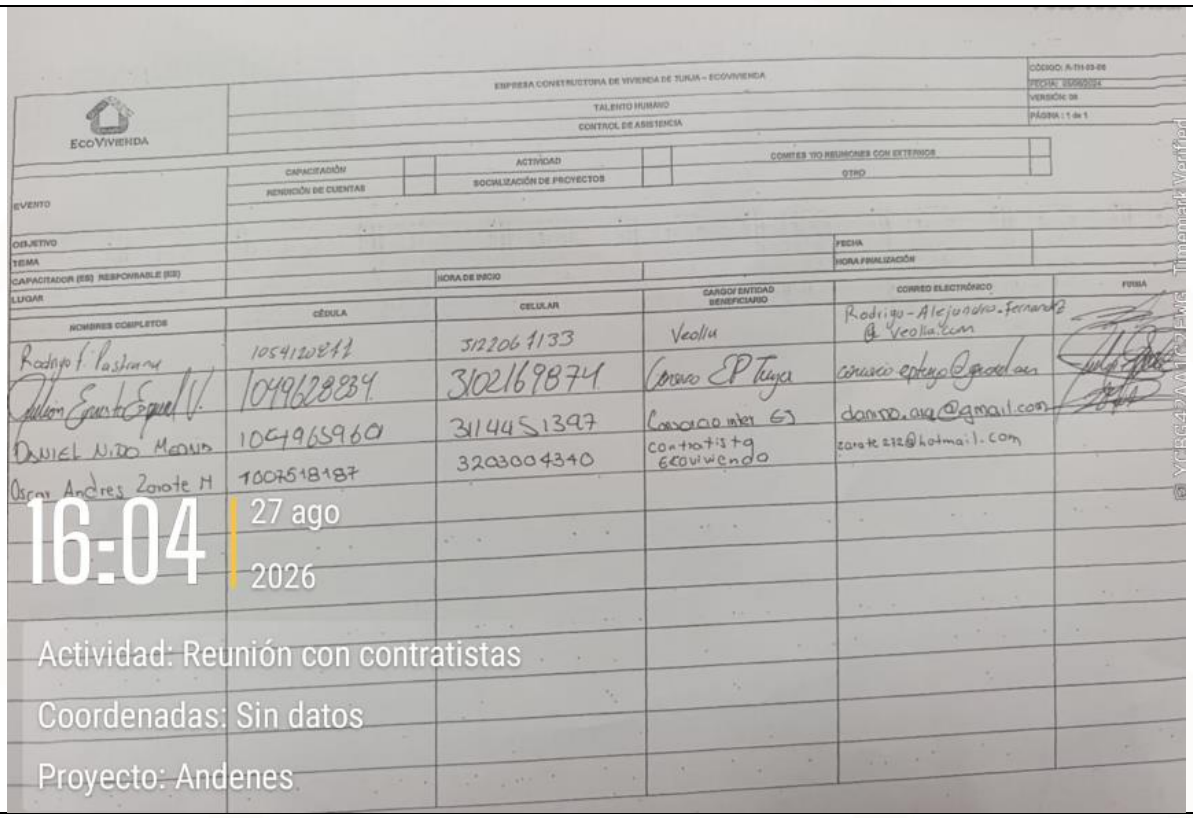
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA
TALENTO HUMANO
CONTROL DE ASISTENCIA
EcoVivienda
CAPACITACIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTIVIDAD
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
COMITES Y/O REUNIONES CON EXTERNOS
OTRO
EVENTO
OBJETIVO
TEMA
CAPACITADOR (ES) RESPONSABLE (S)
LUGAR
HORA DE INICIO
FECHA
HORA FINALIZACIÓN
NOMBRES COMPLETOS
CÉDULA
CELULAR
CARGO/ ENTIDAD BENEFICIARIO
CORREO ELECTRÓNICO
FIRMA
Rodrigo Pastrana
1054120812
3122061133
Veolia
Rodrigo-Alejandro.Fernandez@Veolia.com
Jaider Ernesto Espinel V.
1049628834
3102169874
Consorcio EP Tunja
consorcio.eptunja@gmail.com
DANIEL NIÑO MEDINA
1049659960
3144551397
Consorcio interventoría
dannm.ana@gmail.com
Oscar Andres Zarate M
1007518187
3203004340
contratista ecovivienda
zarate212@hotmail.com
16:04
27 ago
2026
Actividad: Reunión con contratistas
Coordenadas: Sin datos
Proyecto: Andenes

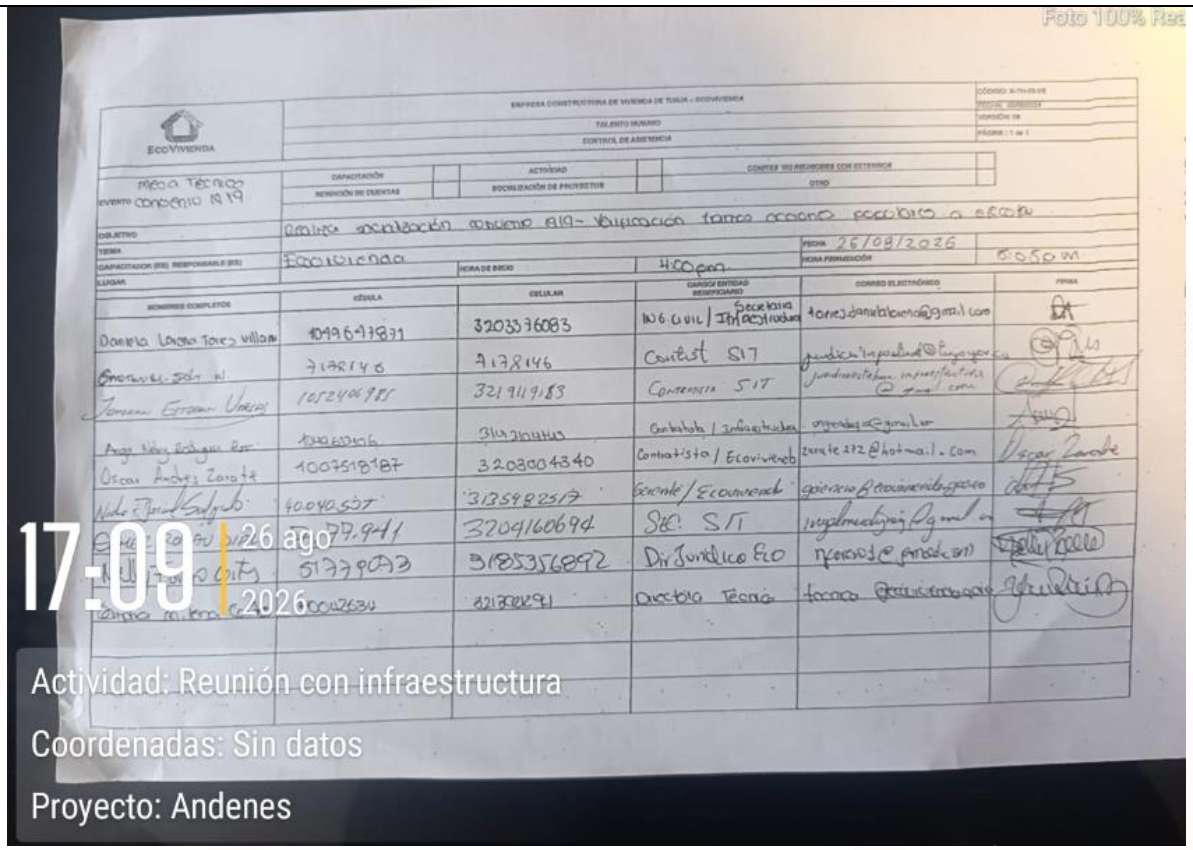

EL DOCUMENTO DEL FORMATO DE ACTA DE RECIBO A SATISFACION, EL DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS Y EL DE LA INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS SE ANEXA AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:


Por solicitud de la dirección técnica se colaboró en las siguientes actividades:


- Elaboración del formato de acta de recibo a satisfacción de obra
- Información sobre cuantas unidades sanitarias fueron previstas en el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 y cuantas han sido ejecutadas hasta el momento
- Asistencia a una reunión junto con funcionarios de la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Tunja para temas relacionados con el proyecto de mejoramiento de andenes
- Asistencia a una reunión junto con residente de obra e interventoría y un funcionario de veolia para temas relacionados con el proyecto de mejoramiento de andenes

Por solicitud de gerencia se envió información sobre el estado de ejecución de las obras del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 para algunas veredas en especifico

ACTIVIDAD N°7 Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (KEDO), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga

actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (KEDO)

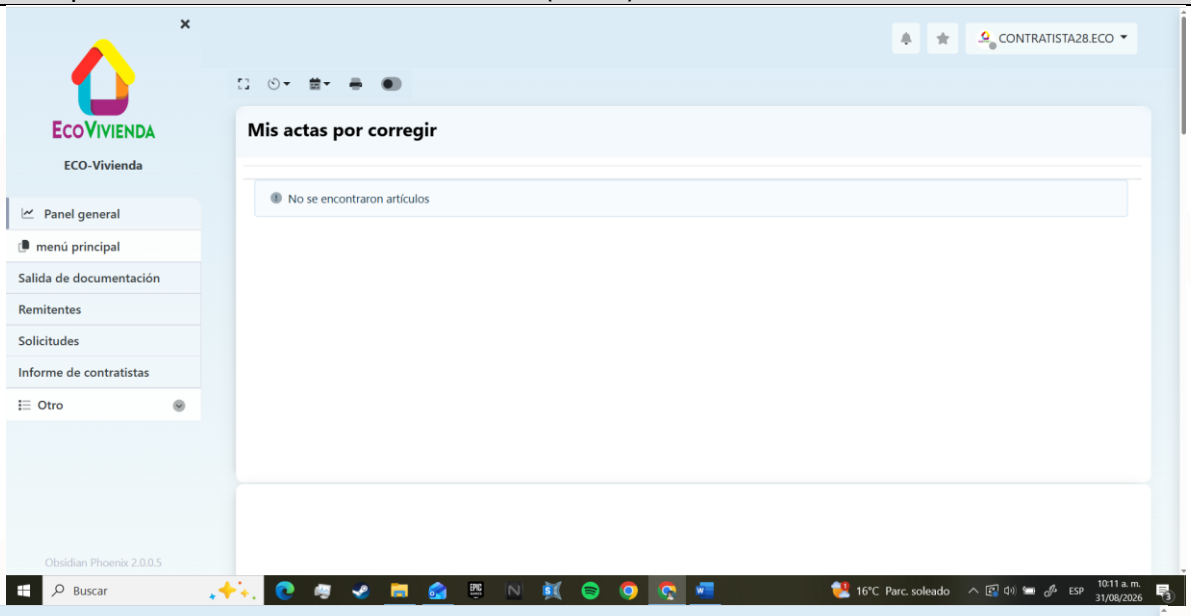

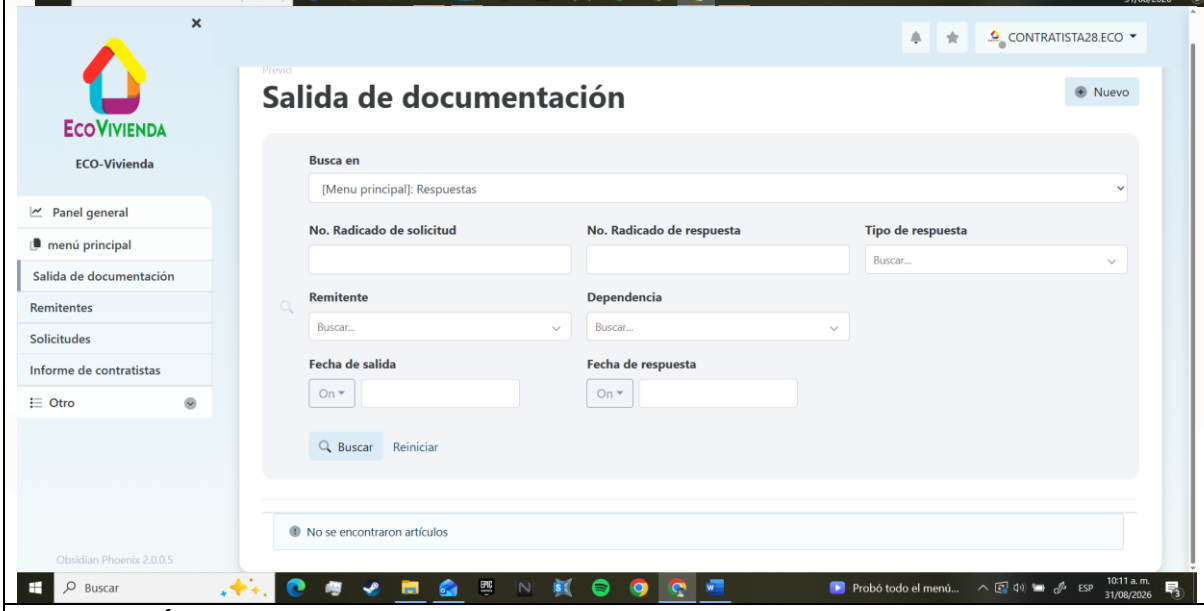

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se mantuvo actualizado y sin pendientes la ventana documental de la plataforma



_____

FIRMA CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007518187		OSCAR ANDRES ZARATE MENDIVELSO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 48 No 8-21	TUNJA-BOYACA	3203004340	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	568765596	9509043934	I	2026/08/24	2026/08/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0			$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0			$0	$0		$499,100
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0			$0	$0		$499,100
1	CC	1007518187 ZARATE OSCAR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0			$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	19/08/2026
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE
CARGO	CONTRATISTAS / ECOVIVIENDA
FECHA DE LA VISITA	19/08/2026

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	014 DEL 2026
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ANDENES
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TUNJA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	TUNJA	
CEDULA	N/A	
DIRECCIÓN	ANDEN GLORIETA NORTE - SEMAFORO UPTC	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	N/A	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**
	-----	------

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO		**CALIDAD DE MATERIALES**	X
SEGUIMIENTO TÉCNICO	X	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	
AVANCE FÍSICO	X	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	
CIERRE TÉCNICO			

3. ALCANCE DE LA OBRA

El alcance de obra es la ejecución de actividades para la rehabilitación del anden comprendido entre la glorieta norte (Terminalito) hasta el semáforo de la entrada de la uptc con actividades que incluyen:

- Cerramiento perimetral
- Excavaciones en material común
- Replanteo
- Instalación de bordillo y sardineles con bordillo A-80
- Relleno y compactación de material granular

- Instalación de capa de arena
- Instalación de adoquín
- Instalación de losetas podo táctiles
- Actividades varias derivadas

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

- Según la ultima visita se verifico la desinstalación de la vaya informativa con los datos del proyecto

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
(Marque con una X en cada aspecto a evaluar)

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	X			
MATERIALES	X			
RITMO DE EJECUCIÓN	X			
SEGURIDAD DE OBRA		X		Se presentan zonas del cerramiento abiertas por el ingreso de material
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	X			

6. HALLAZGOS Y/O AVANCES

- Se han instalado aproximadamente 100 metros lineales de bordillo A-80
- Se han instalado aproximadamente 15 metros lineales de sardinel
- Se ha compactado aproximadamente 30 metros lineales de la totalidad del tramo

Se identifica material para continuar la instalación de sardineles, bordillos y material granular para el afirmado.
Es necesario aclarar el alcance del tramo, es decir hasta donde se debe intervenir dicho tramo.
No se tiene un cronograma de obra por lo que no es posible identificar si se presentan atrasos en la ejecución de la obra, adicional el residente de obra indica que es de importancia

hacer las gestiones necesarias con la secretaria de planeación para identificar cual es el perfil vial del tramo que se está interviniendo.
Se continua con el problema de la señal informativa de destino por la falta de verticalidad de la misma que puede inducir a un accidente en caso de volteo de la misma u ocasionar que una vez ejecutada la obra se presente daños en el adoquín instalado.
Se quito la vaya informativa con los datos erróneos del proceso y se continua a la espera de la instalación de la nueva vaya con la información correcta.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Entrada a la obra	*Instalación de sardinel*



Instalación de bordillo, relleno y compactación de material granular



Instalación de bordillo



Nivelación para instalación de bordillo



Terreno excavado hasta nivel de subrasante para instalación de bordillo, sardinel y afirmado de material granular

8. CONCLUSIONES

- Es necesario realizar una mesa técnica para esclarecer hasta donde se debe realizar la intervención, ver de qué manera se puede agilizar el proceso para obtener la información de los perfiles viales de los tramos a intervenir, establecer que acciones se deben realizar para afrontar el problema del poste de señalización de destino desplomado.

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
OSCAR ZARATE

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-08-24 00:00:00
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	Oscar Zarate
CARGO	Contratista
FECHA DE LA VISITA	2026-08-24 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	014 DEL 2026
OBJETO	ANDENES
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	TUNJA	
CEDULA		
DIRECCIÓN	TRAMO GLORIETA NORTE - SEMAFORO UPTC	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO		
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[X]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[X]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[X]
AVANCE FÍSICO	[ ]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

ACTIVIDAD: 1
DESCRIPCIÓN: BORDILLO Y SARDINEL 90 ml AVANCE: 30-60%

ACTIVIDAD: 2
DESCRIPCIÓN: EXCAVACION 480 m3 AVANCE: 100%

ACTIVIDAD: 3
DESCRIPCIÓN: AFIRMADO Y COMPACTACION 49 m3 AVANCE: 10-30%

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA


ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[ ]	[X]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[ ]	[X]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS

NO SE CUENTA CON PLAN DE MANEJO DE TRANSITO APROBADO SE INTERVINO EN ANDEN QUE NO SE CONTABA CON PERMISO POR PARTE DE PLANEACION SEGUN LA RESOLUCION 114, ESTO SE HA INFORMADO EN VARIAS OCASIONES. HACE FALTA LA LA VAYA INFORMATIVA LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DEL SEMAFORO DE LA UPTC FUE AFECTADA PARA LA INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL.


SE OBSERVA QUE ES NECESARIO HACER UNA REDUCCION DEL ANDEN EN LA ZONA DONDE ESTA EL MURO DE CONTENCION DEBIDO QUE NO ES POSIBLE SEGUIR CON LA MISMA SECCION POR INTERFERENCIAS QUE SE PRESENTARIAN EN LA EJECUCION.
ES NECESARIO SOLCIALIZAR LA SOLUCION DEL SECTOR DE LA ALCANTARILLA VIENDO LA VIABILIDAD DE RODEAR LA MISMA A FIN DE NO INTERVENIR ESTA.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

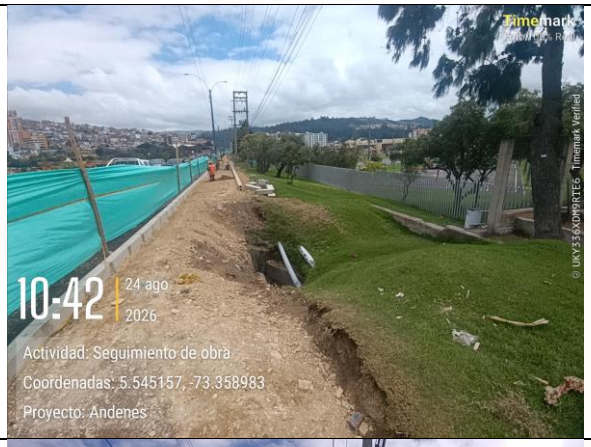





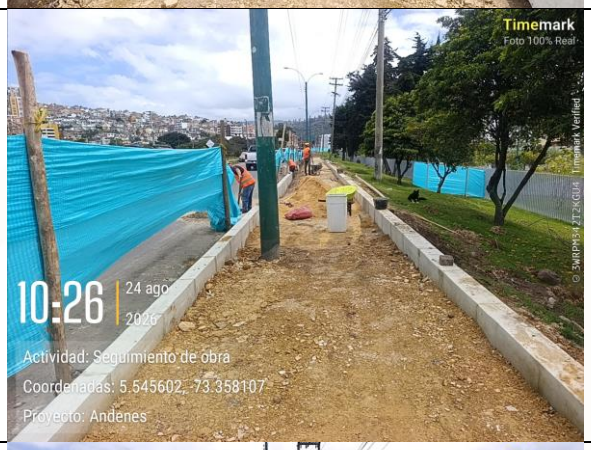

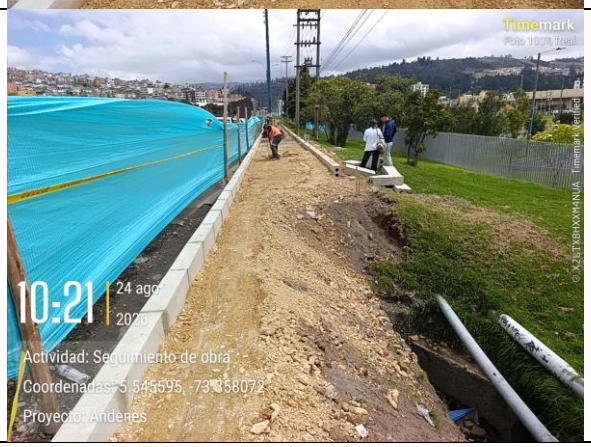

8. CONCLUSIONES

CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS QUE SE ADJUNTAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
Oscar Zarate

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-EJ-01-06
	EJECUCIÓN Y ENTREGA	FECHA: 19/04/2022
	ACTA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD	VERSIÓN: 04
		PÁGINA : 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD N°_____

LUGAR:	Glorieta - Normal Femenina
FECHA:	24-08-2026
CONTRATO No.:	convenio 002-2023 (aplazamiento contrato 014-2026)
OBJETO:	Construccion, rehabilitación, adecuación andenes
CONTRATISTA:	Consorcio Espacio Público
INTERVENTOR:	Consorcio Interventoria EJ

REPRESENTANTES

DEL ECOVIVIENDA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra Milena Cortés	Directora Técnica	
Oscar Andres Zarate	Contratista Dir tecnica	Oscar Zarate

DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA

DE LA INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniel Niño Medina	Apoyo Interventoria	

DE LA COMUNIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-EJ-01-06
	EJECUCIÓN Y ENTREGA	FECHA: 19/04/2022
	ACTA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD	VERSIÓN: 04
		PÁGINA : 2 de 2

AGENDA

1. Visita verificacion y seguimiento ejecución obra tramo glorieta - Normal Femenina en el marco de comité de seguimiento citado el dia

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realizo recorrido al tramo objeto de verificación en donde se identificaron los siguientes aspectos:

1. Avance de obra
   - 90ml bordillo y cabezal
   - excavación: 480m³.
   - Relleno afirmado: 49 m³.
2. Plan de manejo de tránsito
   se deja constancia por parte de la supervisión que no se cuenta con PMT debidamente aprobado por la autoridad competente
3. Permisos de intervención: se deja constancia que a la supervisión de Apoyo se advirtió que el tramo localizado contando semáforo comercio no tenia permiso de intervención acorde a resolución 114 expedida por el DAOT
4. Valla informativa. No hay valla instalada
5. Se realiza observación de la carpeta asfáltica via OPTC, la cual se afecto para instalacion de cerramiento.

COMPROMISOS Y TAREAS	FECHA	RESPONSABLE
Informar por parte del apoyo a la interventoria los temas tratados en la visita	24-08-2026	Apoyo interventoria
- Instalacion valla	Inmediato	Contratista obra
- Verificar con DAOT permiso a seguir por demolición tramo no autorizado	25-08-2026	Contratista obra - Secretaria

* Si el comité requiere mayor información de los asistentes por favor diligenciar el registro "RTH-03-05 Control de Asistencia".

**Si se realiza el acta de reunión debe estar firmada por los asistentes.

→ continuo

6. Se deja constancia que se debe dialogar en comité cual va a ser el procedimiento que se va a realizar en el inicio del tramo Calcantarilla
7. Tener en cuenta señalización (malla de contención)

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-08-06 00:00:00
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE
CARGO	CONTRATISTA
FECHA DE LA VISITA	2026-08-06 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	ECO-LP-001-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTOS
INTERVENTORÍA	DANIEL VELASQUEZ

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	DIANA MARCELA BARGAS ROJAS	
CEDULA		
DIRECCIÓN	LA ESPERANZA	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	3213983552	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[X]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[X]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[X]
AVANCE FÍSICO	[X]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

ACTIVIDAD: 1
DESCRIPCIÓN: Medicion de cantidades AVANCE: 100%

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

SE VERIFICA QUE SE TERMINO DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES FALTANTES SEGUN LA ULTIMA VISITA


5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS

SE PRESENTAN MANCHAS DE PINTURA EN EL PISO Y GUARDA ESCOBAS, ADICIONAL ES NECESARIO MEJORAR LA BOQUILLA EN ALGUNOS SECTORES DE LA COCINA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

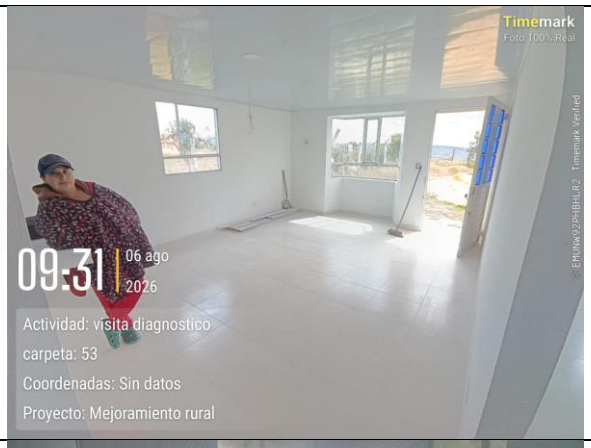
Timemark
Foto 100% Real
09:31
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: Sin datos
Proyecto: Mejoramiento rural



Timemark
Foto 100% Real
09:32
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538315, -73.409448
Proyecto: Mejoramiento rural



Timemark
Foto 100% Real
09:32
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538315, -73.409448
Proyecto: Mejoramiento rural


Timemark
Foto 100% Real
09:32
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538315, -73.409448
Proyecto: Mejoramiento rural


Timemark
Foto 100% Real
09:32
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538315, -73.409448
Proyecto: Mejoramiento rural


Timemark
Foto 100% Real
09:32
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538315, -73.409448
Proyecto: Mejoramiento rural

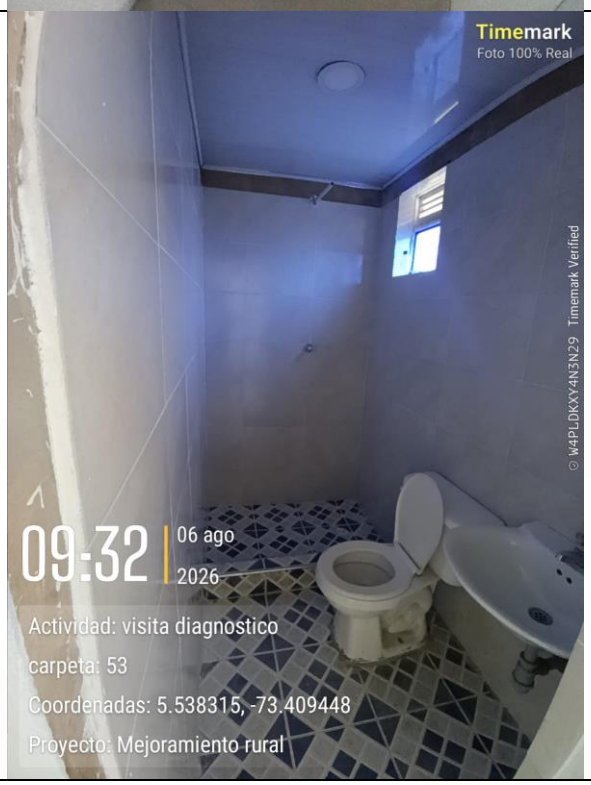
Timemark
Foto 100% Real
09:32
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538315, -73.409448
Proyecto: Mejoramiento rural

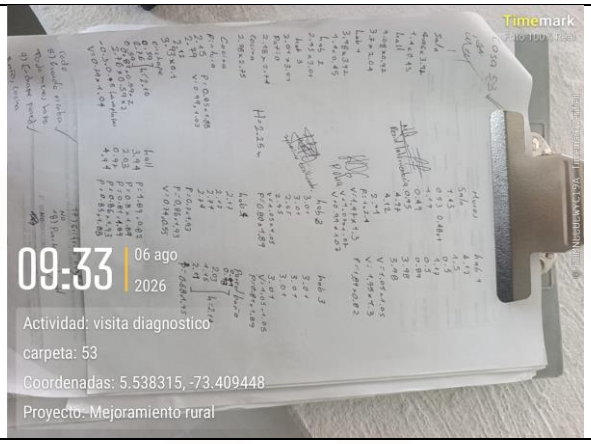

8. CONCLUSIONES

ES NECESARIO REALIZAR LAS SUBSANACIONES NECESARIAS PARA PODER REALIZAR EL ACTA DE RECIBO

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
OSCAR ZARATE

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-08-14 00:00:00
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE
CARGO	CONTRATISTA
FECHA DE LA VISITA	2026-08-14 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	014-2026
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ANDENES
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TUNJA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	TUNJA	
CEDULA		
DIRECCIÓN	ANDEN GLORIETA NORTE - SEMAFORO UPTC	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO		
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[X]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[X]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[X]
AVANCE FÍSICO	[ ]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

ACTIVIDAD: 1
DESCRIPCIÓN: EXCAVACIONES AVANCE: 100%

ACTIVIDAD: 2
DESCRIPCIÓN: AFIRMADO AVANCE: 10-30%

ACTIVIDAD: 3
DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE BORDILLO A80 AVANCE: 10-30%

ACTIVIDAD: 4
DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE CERRAMIENTO AVANCE: 60-90%

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[ ]	[X]	[ ]	FALTA TERMINAR EL CERRAMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS

SE EVIDENCIO QUE LA SEÑAR VERTICAL QUE INDICA HACIA DONDE QUEDA EL MUNICIPIO DE ARCABUCO SE ENCUENTRA DESPLOMADO GENERANDO UN RIESGO POR POSIBLE VOLCAMIENTO DE LA MISMA, EL RESIDENTE DE OBRA INDICA QUE LA SEÑAL YA SE


ENCONTRABA ASI ANTES DE LA INTERVENCION.
SE EVIDENCIA QUE LA TUBERIA ELECTRICA DEL SEMAFORO SE ENCUENTRA EXPUESTA Y ROTA EN ALGUNAS ZONAS.
HACE FALTA LA TERMINACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL.
LA VALLA PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DEL CONTRATO INDICADO QUE EL VALOR DEL CONTRATO ES DE APROXIMADAMENTE 1200 MILLONES SIENDO EL VALOR REAL DE 2200 MILLONES APROXIMADAMENTE.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO







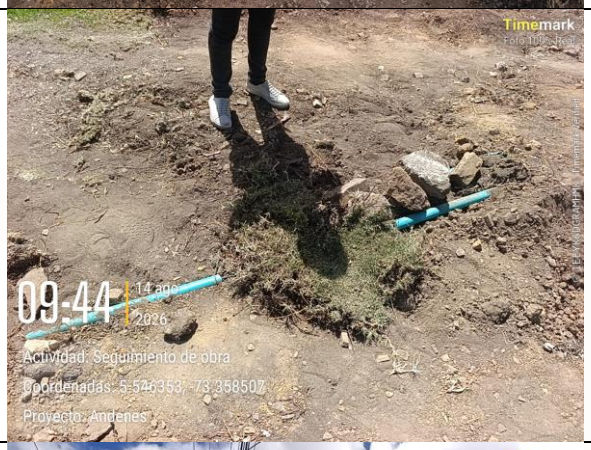



8. CONCLUSIONES

ES NECESARIO ACLARAR SI SE VA A INTERVENIR EL ANDEN DESPUES DEL SEMAFORO DE LA UPTC MEDIANTE ALGUNA MESA TECNICA

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
OSCAR ZARATE 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-08-06 00:00:00
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE
CARGO	CONTRATISTA
FECHA DE LA VISITA	2026-08-06 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	ECO-LP-001-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTOS
INTERVENTORÍA	DANIEL VELAZQUES

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	MARIO PEREZ GARCIA	
CEDULA		
DIRECCIÓN	LA ESPERANZA	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	3213750126	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[X]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[X]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[X]
AVANCE FÍSICO	[X]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

ACTIVIDAD: 1
DESCRIPCIÓN: Verificacion de calidad de trabajos AVANCE: 100%

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

SE VERIFICO QUE SE INSTALO LA PUERTA Y LA VENTANA PERO SE IDENTIFICARON DEFICIENCIAS


5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[ ]	[X]	[ ]	N/A
MATERIALES	[ ]	[X]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[ ]	[X]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[ ]	[X]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS

SE INSTALO LA PUERTA PERO SE PRESENTA ABOLLADURA EN EL MARCO DE LA PUERTA Y DEFICIENCIA EN LA PINTURA DE LA PUERTA, ADICIONAL EL VIDRIO DE LA VENTANA SE OBSERVA MAL INSTALADO, POR ULTIMO SE DAÑO LOS FILOS DE LA PUERTA PRODUCTO DE LA INSTALACION

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

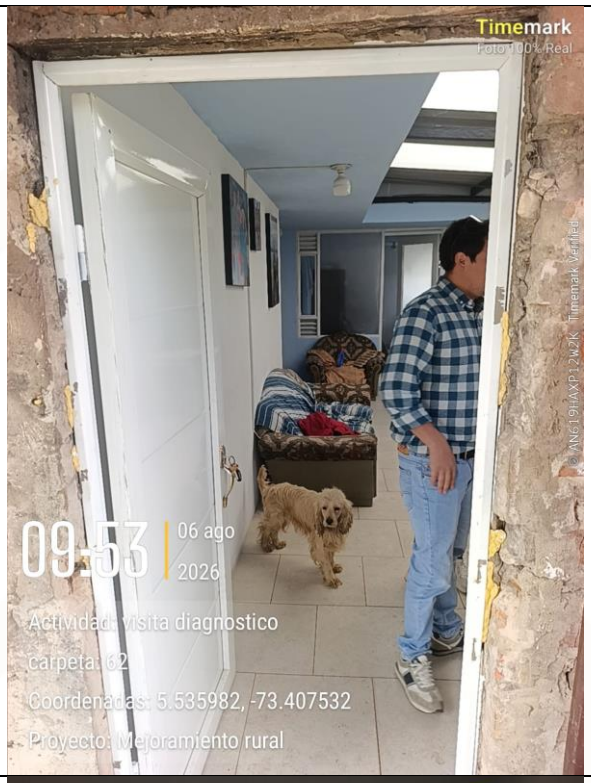
Timemark
Foto 100% Real
09:53
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 62
Coordenadas: 5.535982, -73.407532
Proyecto: Mejoramiento rural


Timemark
Foto 100% Real
09:53
06 ago
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 62
Coordenadas: 5.535982, -73.407532
Proyecto: Mejoramiento rural



8. CONCLUSIONES

ES NECESARIO SE REALICEN LAS RESPECTIVAS SUBSANACIONES PARA PODER RECIBIR A SATISFACCION LA VIVIENDA

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
OSCAR ZARATE

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	12/08/2026
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	OSCAR ZARATE / YESID RODRÍGUEZ
CARGO	CONTRATISTAS / ECOVIVIENDA
FECHA DE LA VISITA	12/08/2026

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE 580 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO Y 100 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DEL PROYECTO BELLAVISTA II DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"
OBJETO	SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIVIENDA VIP TUNJA
INTERVENTORÍA	NO APLICA

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	TUNJA	
CEDULA	N/A	
DIRECCIÓN	CIUDAD JARDIN	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	N/A	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**
	5.50355	-73.362162

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO		**CALIDAD DE MATERIALES**	X
SEGUIMIENTO TÉCNICO	X	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	
AVANCE FÍSICO	X	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	
CIERRE TÉCNICO			

3. ALCANCE DE LA OBRA

- De acuerdo con la información suministrada durante la visita, el avance general del proyecto para las torres es el siguiente:

ETAPA 3:

- Torre 7: 100% torre terminada
- Torre 8: 100% torre terminada
- Torre 9: 100% torre terminada

ETAPA 4:

- Torre 10: 33% Estructura terminada, Se van a iniciar las obras locativas de acabados de la torre

- Torre 12: 5% Excavaciones
- Torre 13: 5% Excavaciones

URBANISMO:

- 36% de ejecución de obras de urbanismo y mejoramiento del terreno

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

- Se esta realizando el armado del acero de refuerzo de un muro de contención

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

- La socialización de los resultados de los análisis de las resistencias de la torre 4 se socializo a satisfacción dentro de las instalaciones de Ecovivienda.
- Se verifico el cumplimiento a satisfacción de los compromisos adquiridos en anteriores reuniones.

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
(Marque con una X en cada aspecto a evaluar)

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA		x		Se presento fisuras en la viga VAUx4 posiblemente por proceso constructivo
MATERIALES	X			
RITMO DE EJECUCIÓN		X		
SEGURIDAD DE OBRA	X			
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN		X		

6. HALLAZGOS

- En la torre 10 en la viga VAUx4 se observo fisuras en la parte central y la parte donde termina el muro, la directora de obra indica que esto fue ocasionado al momento de desencofrar la formaleta.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Recorrido en obra.</td><td>Recorrido en la obra</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Estructura torre 10</td><td>Fisura en viga torre 10 piso 5</td></tr>
</table>

	
Placa de 5 piso	*Armadura muro de contención*

8. CONCLUSIONES


- En conclusión, se recomienda hacer seguimiento técnico por parte del supervisor a las fisuras presentadas en la viga VAUx4 con el fin de descartar cualquier deficiencia estructural de la misma .

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO	SUPERVISOR DELEGADO
OSCAR ZARATE	YESID RODRÍGUEZ

10. ANEXOS

SE ANEXA EL ACTA DE REUNION

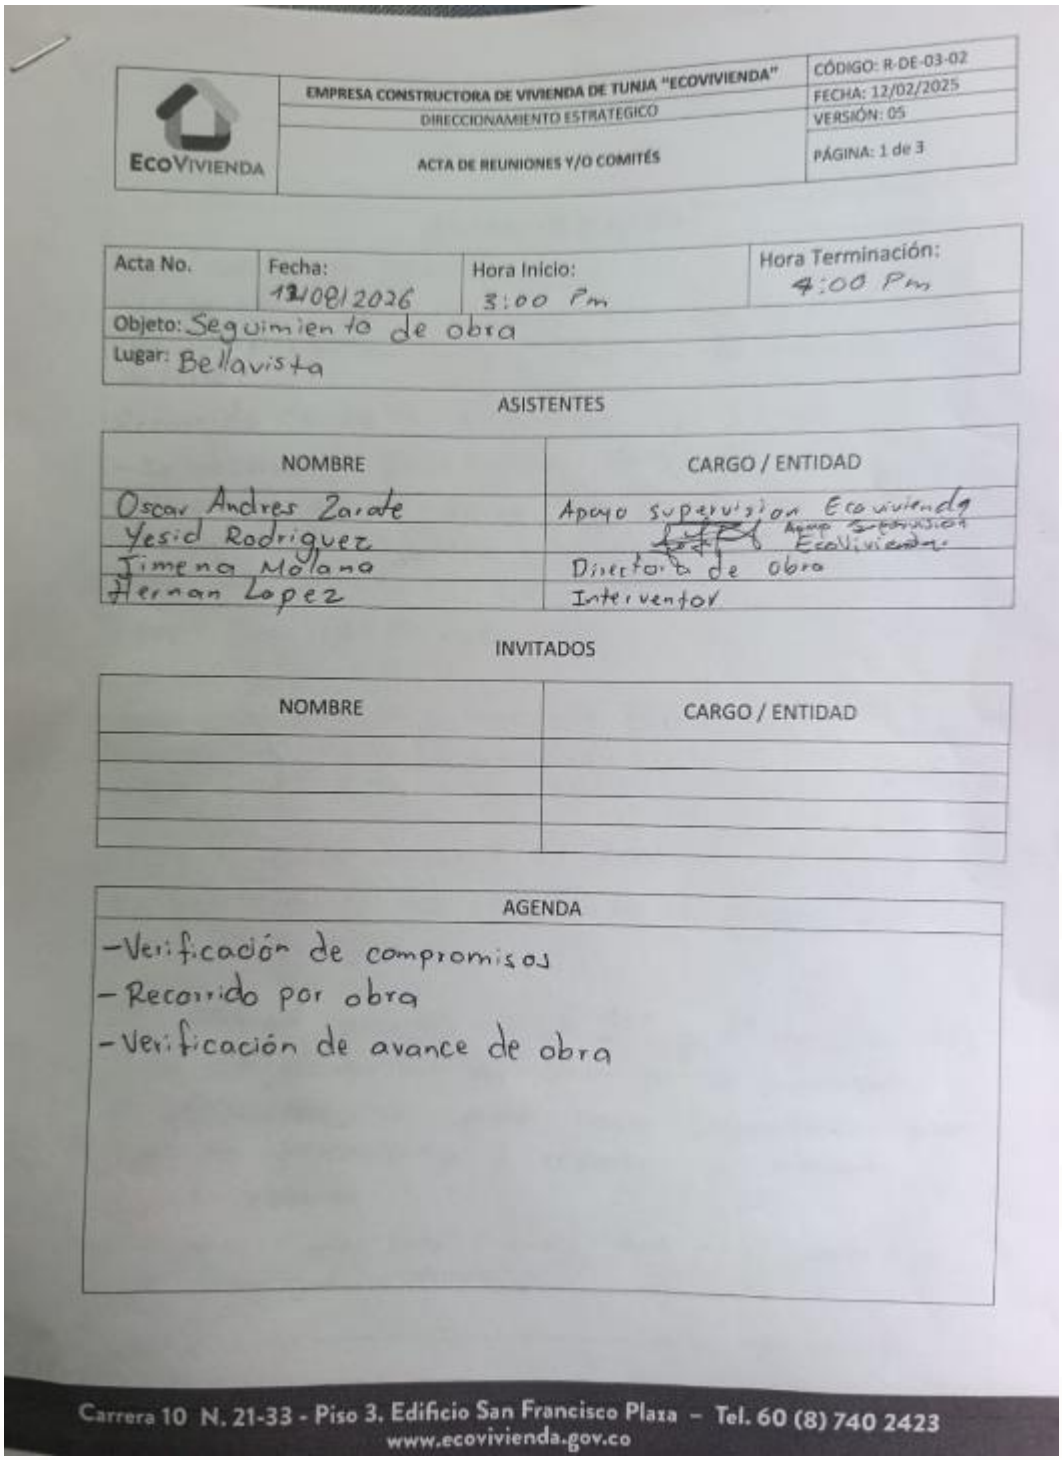

EcoVivienda

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-DE-03-02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA: 12/02/2025
ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS	VERSIÓN: 05
	PÁGINA: 1 de 3

Acta No.	Fecha:	Hora Inicio:	Hora Terminación:
	13/08/2026	3:00 Pm	4:00 Pm

Objeto: Seguimiento de obra

Lugar: Bellavista

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD
Oscar Andres Zarate	Apoyo supervision Ecovivienda
Yesid Rodriguez	Apoyo supervision Ecovivienda
Jimena Molano	Directora de obra
Hernan Lopez	Interventor


INVITADOS

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD

AGENDA

- Verificación de compromisos
- Recorrido por obra
- Verificación de avance de obra

Carrera 10 N. 21-33 - Piso 3. Edificio San Francisco Plaza – Tel. 60 (8) 740 2423
www.ecovivienda.gov.co

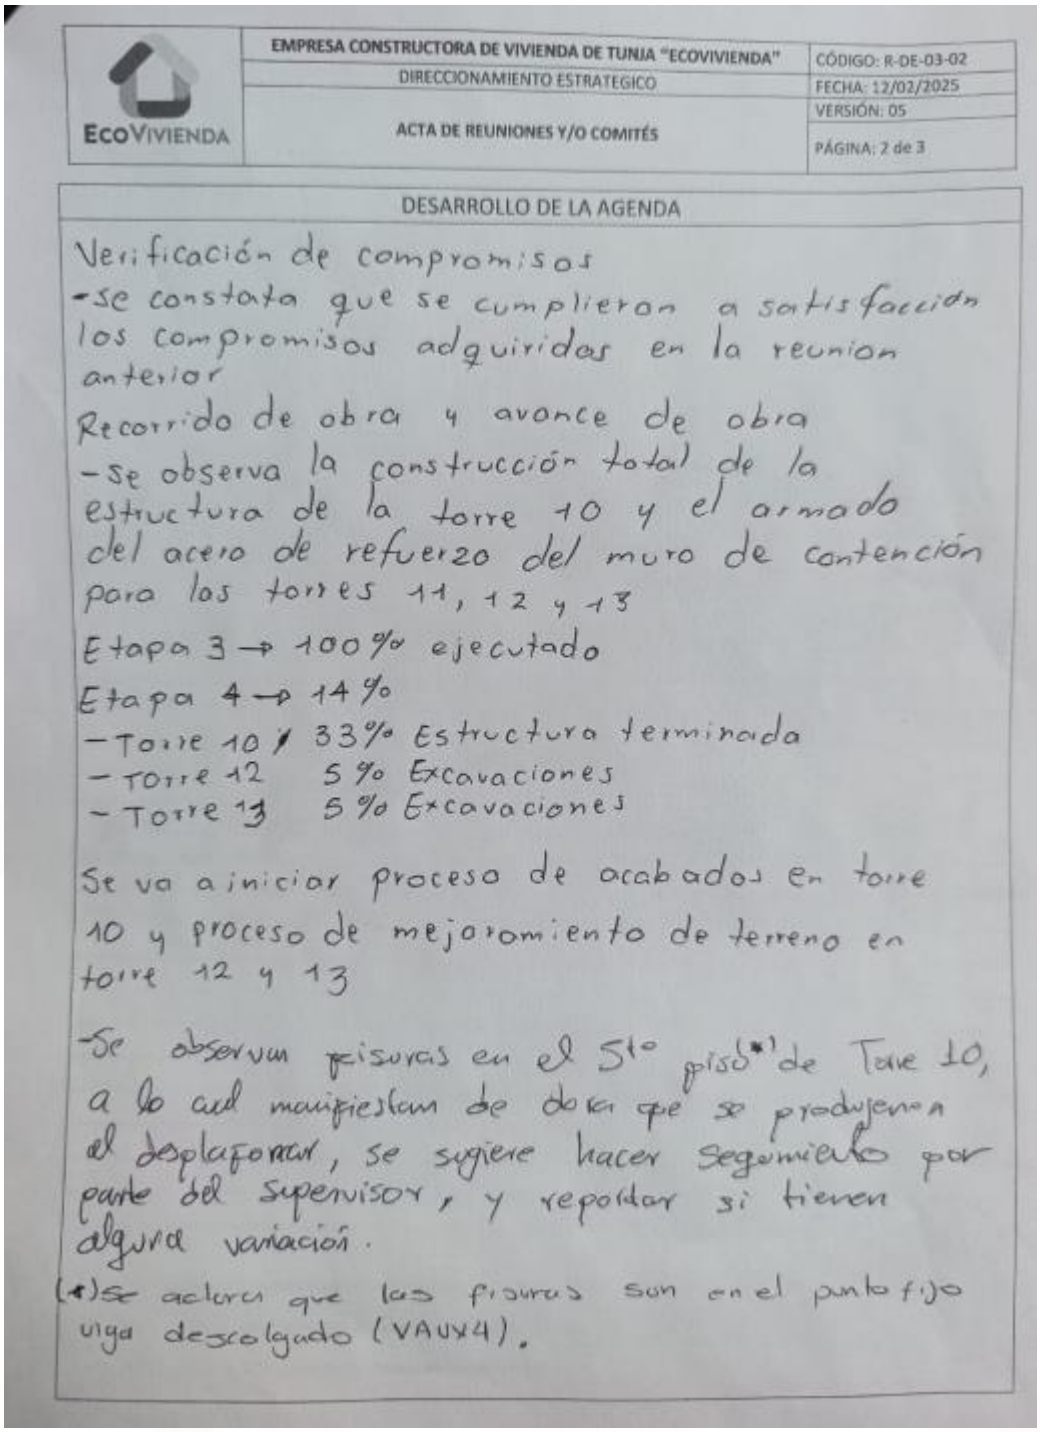


EcoVivienda | EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA" | CÓDIGO: R-DE-03-02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | FECHA: 12/02/2025
ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS | VERSIÓN: 05
PÁGINA: 2 de 3

DESARROLLO DE LA AGENDA

Verificación de compromisos
-se constata que se cumplieron a satisfaccion los compromisos adquiridas en la reunion anterior
Recorrido de obra y avance de obra
-Se observa la construcción total de la estructura de la torre 10 y el armado del acero de refuerzo del muro de contención para los torres 11, 12 y 13
Etapa 3 → 100% ejecutado
Etapa 4 → 14%
- Torre 10 → 33% Estructura terminada
- Torre 12 5% Excavaciones
- Torre 13 5% Excavaciones

Se va a iniciar proceso de acabados en torre 10 y proceso de mejoramiento de terreno en torre 12 y 13

-Se observan fisuras en el 5to piso(*) de Tore 10, a lo cual manifiestan de dora que se produjeron al desplaformar, se sugiere hacer segumiento por parte del supervisor, y reportar si tienen algun variación.
(*)Se aclara que las fisuras son en el punto fijo viga descolgado (VAUX4).

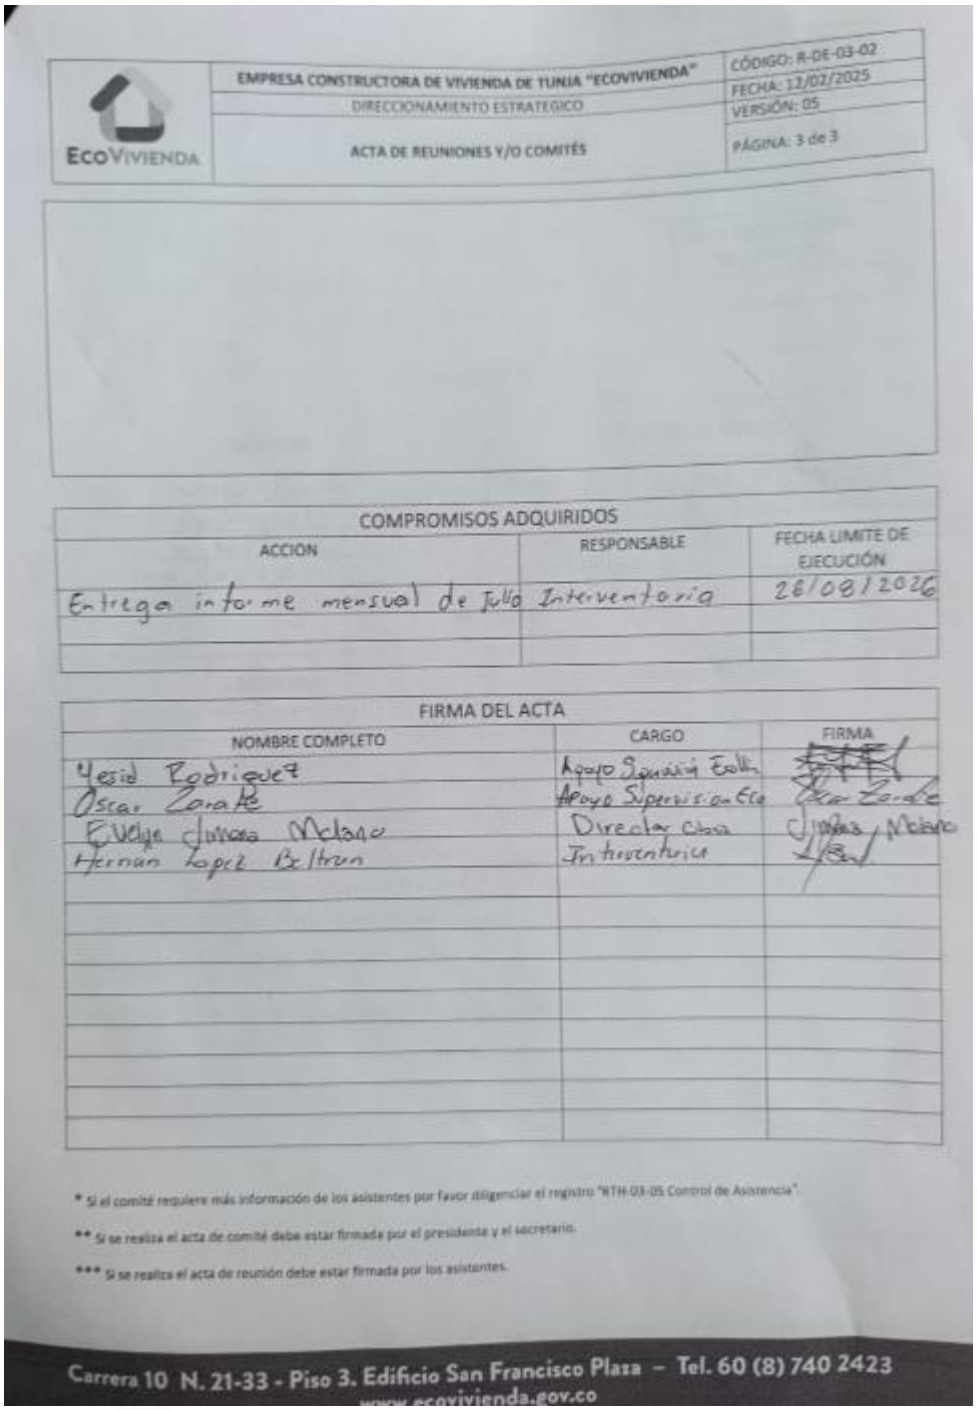

EcoVivienda | EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA" | CÓDIGO: R-DE-03-02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | FECHA: 13/02/2025
ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS | VERSIÓN: 05
PÁGINA: 3 de 3

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Entrega informe mensual de Julio	Interventoria	28/08/2026

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Yesid Rodriguez	Apoyo Supervisión Ecol.	
Oscar Zarate	Apoyo Supervisión Eco	
Eveliz Juliana Molano	Director Obra	
Hernán Lopez Beltran	Interventoria	

* Si el comité requiere más información de los asistentes por favor diligenciar el registro "RTH-03-05 Control de Asistencia".

** Si se realiza el acta de comité debe estar firmada por el presidente y el secretario.

*** Si se realiza el acta de reunión debe estar firmada por los asistentes.

Carrera 10 N. 21-33 - Piso 3. Edificio San Francisco Plaza – Tel. 60 (8) 740 2423
www.ecovivienda.gov.co

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA -ECOVIVIENDA	CÓDIGO:
		FECHA:
	DIRECCION TECNICA	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	PAGINA: 1 DE 1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BENEFICIADO No _____

RURAL		URBANO	

1. INFORMACION GENERAL		
DEPARTAMENTO:	**MUNICIPIO:**	**VEREDA/BARRIO**
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**	**TIPO DE MEJORAMIENTO:**
NOMBRE DEL PROGRAMA:		
ENTIDAD OTORGANTE:	**EJECUTOR ESQUEMA ASOCIATIVO:**	**RESOLUCION DE ASIGNACION DEL CUPO:**
No Y FECHA DE LA RESOLUCION DE ASIGNACION	**EJECUTOR ESQUEMA ASOCIATIVO:**	**CONVENIO No:**
VALOR DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	**EN SMMLV:**	**EN PESOS:**

2. DESCRIPCION DEL MEJORAMIENTO REALIZADO

3. CARACTERIZTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE - MEJORAMIENTO MODULAR		
ELEMENTOS Y ACABADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Ducha		
Sanitario		
Lavamanos		
Lavaplatos		
Lavadero		
Puertas		
Ventanas - Vidrios		
Estufa		
Enchapes		
Mesones		
Componente bioclimatico ¿Cuál?		
Otros ¿Cual?		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Tanque de almacenamiento de agua		
Acceso al agua apta para consumo humano		
Solucion de manejo de excretas y/o aguas residuales domesticas		
Instalaciones electricas interna		
Sistemas alternativos de agua y energia ¿Cuál?		
Otros ¿Cuál?		

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA -ECOVIVIENDA	CÓDIGO:
		FECHA:
	DIRECCION TECNICA	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	PAGINA: 1 DE 1

4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE - MEJORAMIENTO LOCATIVO		
ACCESO INADECUADO A SERVICIOS PUBLICOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Construccion y/o habilitacion de redes hidrosanitarias		
Habilitacion o instalacion de baños		
Habilitacion o instalacion de lavadero		
Habilitacion o instalacion de cocinas		
Construccion y/o habilitacion de redes eléctricas		
Otros ¿Cual?		
HABITABILIDAD	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Construccion de placa de contrapiso que permita la instalacion de acabados permanntes		
Recubrimiento de pisos con materiales que permitan limpieza y mantenimiento		
Reparacion de cubierta		
Otros ¿Cuál?		

5. DECLARATORIA RECIBIDO A SATISFACCION DEL BENEFICIARIO

"Yo, _____ mayor de edad, ciudadano(a) Colombiano(a), identificado(a) con cédula de ciudadanía número_____ expedida en _____, domiciliado en la Vereda/Barrio _____ del Municipio de _____, Departamento de _____, en nombre propio y de los integrantes que conforman mi hogar, y como beneficiario del programa _____ cuya ejecución se financió con recursos del Subsidio de Mejoramiento de Vivienda _____, declaro:

6. Que recibo a entera satisfacción el mejoramiento de vivienda ejecutado por _____.

7. Que acepto hacer la restitución del subsidio en el evento en que incumplamos con las condiciones establecidas en la ley.

*Hace parte integral del presente documento el anexo de REGISTRO FOTOGRÁFICO.

*Todas las páginas que integran este documento deben venir con visto bueno del ejecutor

A través del presente documento se deja constancia de la entrega del mejoramiento de vivienda, el cual constituye en acervo probatorio para todos los efectos legales y reglamentarios que demanda este Programa de Promoción de Vivienda Urbana y Rural; para constancia de lo anterior, firman el presente documento los intervienen a los _____(____) días del mes de _____ de _____.

QUIEN ENTREGA:

Firma del Ejecutor
Profesional responsable de la obra:
C.C No:
No. Matricula Profesional:

Firma del Interventor
Profesional responsable de la obra:
C.C No:
No. Matricula Profesional:

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA -ECOVIVIENDA	CÓDIGO:
		FECHA:
	DIRECCION TECNICA	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	PAGINA: 1 DE 1

QUIEN RECIBE:

Firma del Supervisor
Profesional responsable de la obra:
C.C No:
No. Matricula Profesional:

Firma del Beneficiario
Profesional responsable de la obra:
C.C No:

6. ANEXO FOTOGRAFICO - MEJORAMIENTO LOCATIVO	
Se debe presentar Registro Fotográfico de las intervenciones realizadas (antes y después)	
INTERVENCION 1 - ANTES	**INTERVENCION 1 - DESPUES**
INTERVENCION 2 - ANTES	**INTERVENCION 2 - DESPUES**
INTERVENCION 3 - ANTES	**INTERVENCION 3 - DESPUES**
INTERVENCION 4 - ANTES	**INTERVENCION 4 - DESPUES**

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA -ECOVIVIENDA	CÓDIGO:
		FECHA:
	DIRECCION TECNICA	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	PAGINA: 1 DE 1

INTERVENCION 5 - ANTES	**INTERVENCION 5 - DESPUES**

Vereda	Sectorial	Obra, Proyecto o Gestión	Meta/ alcance	Estado Actual
La Hoya	Salud- ESE Santiago de Tunja	Construcción Puesto de Salud la Hoya	1	Se presento a la Secretaria de Salud de Boyacá, el estudio de Oferta y Demanda, el cual fue aprobado. Actualmente se encuentra incluido en el Programa Territorial de Reorganización Rediseño, de las redes de ESE (PTRRMR) de Boyacá. No se ha podido presentar al Ministerio de Salud y Protección Social el proyecto, debido a que el terreno escogido es de uso educativo y adicionalmente parte del mismo es uso de reserva. Pendiente seleccionar otra área por parte de la Secretaria de Planeación y Catastro Multiproposito.
Chorro Blanco Alto, Chorro Blanco Bajo, Baron Germanía, Baron Gallero y la Lajita	Salud- ESE Santiago de Tunja	Jornadas de Salud Medico Odontologicas a través de la Unidad Movil	A demanda y previa concertación con Presidente de Junta de Accion Comunal	La ESE Santiago de Tunja desarrolla jornadas de atención en Salud a través de la Unidad Movil, con atención en Medicina General, Odontologia, Vacunación y enfermeria, con el apoyo de los profesionales asignados a la Unidad Movil y Equipos Basicos de Salud.
Chorro Blanco Bajo	Educación	Mejoramiento de la infraestructura de instituciones educativas	Culminación obra	100% de ejecución del contrato (COP $82.486.487,07)
Runta Arriba	Educación	Mejoramiento de la infraestructura de instituciones educativas	En ejecución	75% de ejecución del contrato (COP $82.486.487,07)
CHORRO BLANCO ALTO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 187	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO ALTO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 189	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 269	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO ALTO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 4	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO BAJO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 121	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 155	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 167	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 251	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 267	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 100	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
CHORRO BLANCO BAJO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 106	Obra Ejecutada	100% de ejecucicion del mejoramiento
VEREDA CHORRO BLANCO ALTO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 86	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 184	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
CHORRO BLANCO ALTO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 18	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
CHORRO BLANCO SECTOR ARENERA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 45	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
CHORRO BLANCO SECTOR ARENERA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 46	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
CHORRO BLANCO ALTO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 109	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 242	Obra en ejecucion	Actividades faltantes para la terminacion dem mejoramiento
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 29	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 117	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 17	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 26	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 32	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 164	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 28	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 157	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 214	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 27	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA HOYA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 130	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
CHORRO BLANCO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 147	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 57	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 85	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 123	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 181	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 225	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 67	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 77	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 78	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 136	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO LOS PINOS	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 148	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 176	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 193	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 206	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GALLERO	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 68	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
LA LAJITA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 112	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GERMANIA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 101	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion
BARON GERMANIA	Ecovivienda	Mejoramiento de vivienda rural Carpeta 126	Obra sin iniciar	Obra a la espera por inicio de ejecucion

EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA** **ECOVIVIENDA**	CODIGO: R-GD-04-01
		FECHA: 19/04/2022
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION: 05
	FORMATO UNICO DE INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL	PAGINA: ____ DE ____

ENTIDAD PRODUCTORA: ECOVIVIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION TECNICA

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION TECNICA

CODIGO: 110

OBJETO: DOCUMENTOS POSTULACION Y DIAGNOSTICO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 2025

REGISTRO DE ENTRADA

AÑO	MES	DIA	NT.
2026	8	12	

NT: Número de Transferencia

NUMERO DE ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIES, SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
1	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - CONVOCATORIA	20/01/2025	28/05/2025		1			30	FISICO		
2	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	22/01/2025	14/02/2025		2			213	FISICO		
3	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	30/01/2025	17/02/2025		3			189	FISICO		
4	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	3/02/2025	26/02/2025		4			200	FISICO		
5	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	4/02/2025	18/02/205		5			200	FISICO		
6	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	6/02/2025	20/02/2025		6			209	FISICO		
7	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	10/02/2025	26/02/2025		7			208	FISICO		
8	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	10/02/2025	5/03/2025		8			211	FISICO		
9	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	11/02/2025	25/02/2025		9			208	FISICO		
10	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	17/02/2025	18/05/2025		10			202	FISICO		
11	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	19/02/2025	25/02/2025		11			196	FISICO		
12	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	24/02/2025	16/05/2025		12			199	FISICO		
13	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	13/03/2025	16/04/2025		13			192	FISICO		
14	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	4/04/2025	28/04/2025		14			196	FISICO		
15	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	28/04/2025	20/05/2025		15			192	FISICO		
16	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - BENEFICIADOS	2/05/2025	6/05/2025		16			139	FISICO		
17	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	22/01/2025	4/02/2025		17			199	FISICO		
18	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	4/02/2025	7/02/2025		18			201	FISICO		
19	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	7/02/2025	14/022025		19			191	FISICO		
20	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	14/02/2025	20/02/2025		20			209	FISICO		
21	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	20/02/2025	21/03/2025		21			198	FISICO		
22	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	11/04/2025	8/05/2025		22			206	FISICO		
23	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	29/04/2025	5/05/2025		23			200	FISICO		
24	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	21/03/2025	7/04/2025		24			199	FISICO		
25	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	6/03/2025	21/03/2025		25			201	FISICO		
26	110-02-03	MEJORAMIENTO RURAL 2025 - NO BENEFICIADOS	5/05/2025	8/05/2025		26			123	FISICO		

Elaborado por: Oscar Andres Zarate Mendivelso
Cargo: Contratista Direccion Tecnica

Firma: Oscar Zarate

Lugar: Ecovivienda - Tunja Fecha: 12/08/2026

Entregado Por:
Cargo:

Firma: _____

Lugar: Fecha:

Recibido por:
Cargo:

Firma: _____

Lugar: Fecha:

ACTIVIDAD	UNIDAD	78	79	82	83	84	85	86	88	90	92	96	97
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	0	2.24	0	0	0	1.505	1.05	0	0	2.15	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	0	0	0	0	0	0	3.35	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12I	M2	0	0	0	0	0	0	13.75	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	0	0	0	0	0	0	10.0375	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	UND	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0

98	99	100	101	103	106	112	113	116	121	123	124	126	130	132	133	136	138
0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	2.04	0	3.2	0	0	0	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.24	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

140	141	143	144	147	148	149	151	154	155	157	158	162	167	169	176	181	184
0	0	0	2.8	2.64	0	0	1.84	0	0	1.2	1.87	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.26	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.63	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

187	191	192	193	195	205	206	214	220	223	224	225	233	234	235	237	238	239
2.52	3.98	3.68	0	4.24	0	2.3	1.44	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

242	251	256	259	265	269	273	278	280	284	288	289
3.54	0	0	0	0	2.8	1.75	3.5	2.76	1.2	0	0
0	0	0	0	0	2	6.2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	6.6	0
0	0	0	0	0	0	7.68	0	0	34.32	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.52	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD	UNIDAD	TOTAL	CARPETA						
			1	3	10	18	21	31	34
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	65.08	0	0.62	0.78	0	2.01	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	29.02	4.98	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	222.32	0	0	49.59	0	0	0	20.82
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISE	KG	553.01	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	UND	21	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	42	1	1	0	1	1	0	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	10	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.5 X 0.35 M	UND	4	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	59.89	0	0	0	0	0	0	7.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	133.83	28.93	2	0	0	0	0	48.47
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	220.94	0	0	0	0	0	0	35.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	M2	60.61	0	0	0	0	0	0	0

36	39	42	45	46	48	51	53	62	66	69	70	72	79	86	92	93
0	0	0	2.1	0	0	0	1.2	0	0	4.16	0	1.85	1.8	0.61	0	1.26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	38.98	0	0	0	0	0	0	9.32	0	0	5.4	0	0	0	0	0
34.74	23.18	0	0	0	0	0	0	23.16	0	0	0	0	0	32.25	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	38.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.75	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2.7	0	0	0	0	0

99	100	103	106	115	121	132	133	134	138	140	144	149	151	155	184	187
0	2.4	0	0	2.78	0	2.35	3.07	3.08	0	1.97	2.18	0	2.08	0	0	2.33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30.71	4.4504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.56
0	0	0	109.85	90.52	0	0	40.56	0	0	81.55	0	0	77.2	0	0	40
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.04	0	0	6.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.5	0	0	0
0	0	0	14.58	2	0	0	8.88	0	0	2	0	0	14.52	0	0	0

189	191	205	224	227	234	235	236	242	251	256	259	263	265	267	269	278
0	2.13	0	0	3.22	0	2.88	0.76	2.4	0	0	2.98	0.94	3.35	1.12	3.62	1.81
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.44	0
0	0	0	0	0	4.4896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	7.03	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	54.13	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

280	288
1.24	0
0	5.6
0	0
0	0
1	0
0	0
1	1
1	1
1	0
0	7.14
0	0
0	27.13
0	1.93
