Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO INTER CULTURAL 2025,, identificado con **NIT** No. **902018151**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Interventoría No. 2058/2025**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 37.168.606,00 "TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Segundo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
93026	C-3301-1603-40-20302F-3301088-02	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 37.168.606,00
T O T A L			**$ 37.168.606,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 09 días del mes de julio de 2026

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

Culturas	**LISTA DE CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**Página** 1 de 1
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-111 **Versión:** 5 **Fecha:** 29/Dic/2025

No. CONTRATO	2058-2025	OBJETO	ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN, CHOCÓ"
NÚMERO DEL INFORME	2	PERIODO DEL INFORME	09 de abril al 10 de mayo 2026

REGISTRO DE CHEQUEO						
		CUMPLE			OBSERVACIONES	SOPORTE
		SI	NO	N.A.		
1.	**INFORME MENSUAL (formato GICN - 0028)**					
	Estado General del Contrato	x				
	Informe Técnico	x				
	Informe Administrativo	x				
	Informe Financiero	x				
	Programación actualizada firmada por el interventor y contratista.	x				
	Curva S (Estado avance presupuestal y cronograma del proyecto)	x				
	Actividades proyectadas a ejecutarse	x				
	Flujo de Caja programado	x				
	Actas de comités (contrato)	x				
	Copia de resultado de estudios o laboratorios avalados por interventoría	x				
	Formato Plan de Calidad de Intervenroría	x				
	Correspondencia enviada y recibida del periodo	x				
	Recomedaciones y/o sugerencias	x				
2	**COPIA INFORMES SEMANALES DEL PERIODO**					
	Infome Semanal	x				
	Fotografías	x				
3	**ANEXOS**					
	Certificaciones y pruebas de calidad	x				
	Factura en original	x				
	Paz y Salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	x				
	Soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas (revisar vs propuesta presentada)	x				
	Actualización de documentos legales del contrato (pólizas)	x				
	Soporte SECOP II que evidencie que el informe del pago anterior está debidamente registrado y aprobado.	x				

MARTIN RESTREPO ATUESTA **R/L CONSORCIO INTER CULTURAL 2025** **INTERVENTORÍA**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN** **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**	**SUPERVISOR DEL CONTRATO** **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**

Factura Electrónica De Venta No

FVIC No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106751278 que habilita desde FVIC 1 hasta FVIC 100. Vence 2028-03-04

CONSORCIO INTER CULTURAL 2025

Nit 902018151

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABE
NIT	830034348 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 8 55	Bogota D.C.	6013424100

POR CONCEPTO DE

ACTA 2 CONTRATO N° 2058-2025 PERIODO 10 DE MARZO AL 09 DE MAYO 2026 #$33-01-01;contrato2058-2025;jramirez@mincultura.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2026	26/07/2026	MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2058-2025 CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO - Pagos por cargos fijos equivalentes al cincuenta (50%) del valor base, en pagos mensuales iguales previa presentación del informe mensual de interventoría, avalado por la supervisión del Ministerio.	2	Und.	11.706.034	19%	2.224.146	23.412.068

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**31.234.123**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.934.483**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.168.606**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.168.606**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

CONSORCIADOS

GRP INGENIERIA DE PROYECTOS DE INGRAESTRUCTURA S A S	NIT 900.396.810-3	45%	RESPONSABLE
TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S	NIT 901.622.366-8	45%	RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA GLOBAL S A S	NIT 900.614.314-8	10%	RESPONSABLE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE N°174-000124-24 BANCOLOMBIA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 11:39:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 82 G 60 Teléfono 3016383792 Bogota D.C.

Correo Electrónico intercultural2025@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ca6d1c025ebac1e3891f1122cb53ba91653d761a490b966d995d9289de469dbe0882bdb66d5a2f2f5f26dfc47832f5d5 --Fecha y Hora de Expedición : 26/06/2026 15:45:36

Factura Electrónica De Venta No

FVIC No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106751278 que habilita desde FVIC 1 hasta FVIC 100. Vence 2028-03-04

CONSORCIO INTER CULTURAL 2025

Nit 902018151

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABE
NIT	830034348 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 8 55	Bogota D.C.	6013424100

POR CONCEPTO DE

ACTA 2 CONTRATO N° 2058-2025 PERIODO 10 DE MARZO AL 09 DE MAYO 2026 #$33-01-01;contrato2058-2025;jramirez@mincultura.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2026	26/07/2026	MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	2	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO b) Pagos por cargos fijos equivalentes al cincuenta (50%) del valor base, en pagos mensuales iguales previa presentación del informe mensual de interventoría, avalado por la supervisión del Ministerio. c) Pagos mensualizados contra avance de obra, proporcionales al porcentaje de ejecución equivalentes al cuarenta (40%) del valor base, en pagos mensuales iguales previa presentación del informe mensual de interventoría, avalado por la	1	Und.	7.822.055	19%	1.486.190	7.822.055

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**31.234.123**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.934.483**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.168.606**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.168.606**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

CONSORCIADOS

GRP INGENIERIA DE PROYECTOS DE INGRAESTRUCTURA S A S	NIT 900.396.810-3	45%	RESPONSABLE
TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S	NIT 901.622.366-8	45%	RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA GLOBAL S A S	NIT 900.614.314-8	10%	RESPONSABLE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE N°174-000124-24 BANCOLOMBIA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 11:39:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 82 G 60 Teléfono 3016383792 Bogota D.C.

Correo Electrónico intercultural2025@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ca6d1c025ebac1e3891f1122cb53ba91653d761a490b966d995d9289de469dbe0882bdb66d5a2f2f5f26dfc47832f5d5 --Fecha y Hora de Expedición : 26/06/2026 15:45:36



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.730.901
CAÑON CADENA

APELLIDOS
SANDRA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1977
CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

01-MAR-1996 CAQUEZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00113682-F-0039730901-20081028 0004944230A 1 1560016983




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116826-T

SANDRA PATRICIA
CAÑON CADENA
C.C. 39730901
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126631

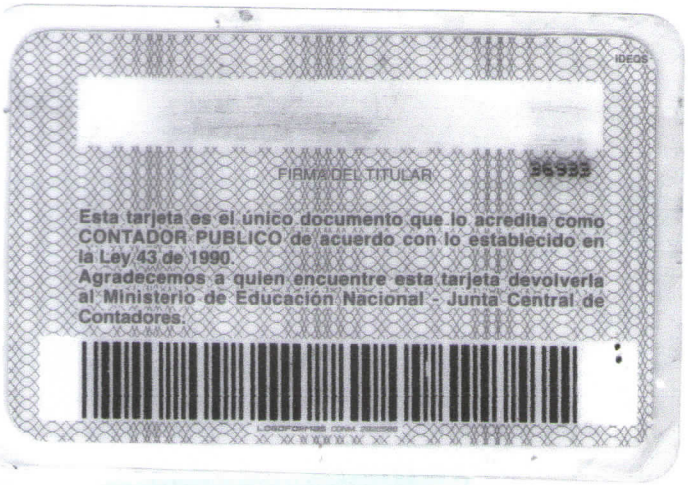

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 26933

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0700FE23E6EEFC078

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA CAÑON CADENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39730901 de CAQUEZA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 116826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.005.111**

RESTREPO ATUESTA

APELLIDOS

MARTIN ALEJANDRO

NOMBRES

Pablo Restrepo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-OCT-1978**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-DIC-1996 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00228770-M-0072005111-20100326 **0021**787145A 1 1160685294

ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141225738269

(415)7707212489984(8020) 000014122573826 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9020181515	5	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO INTER CULTURAL 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 82 # 25 G - 60 TO 1 OFICINA 904

42. Correo electrónico: licitacionesingeproyin@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3016383792	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	20251119							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	48	55																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RESTREPO ATUESTA MARTIN ALEJANDRO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225738269

(415)7707212489984(8020) 000014122573826 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 1 5 1	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 1 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 1 1 1 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225738269

(415)7707212489984(8020) 000014122573826 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 1 5 1	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 0 0 5 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RESTREPO	ATUESTA	MARTIN	ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 1 5 7 3 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ROJAS	MOLANO	GILMA	BIBIANA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225738269

(415)7707212489984(8020) 000014122573826 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 1 5 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 6 8 1 0	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 5 1 1 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 2 2 3 6 6	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 5 1 1 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 1 4 3 1 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 1 1 1 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141162031027

(415)7707212489984(8020) 000014116203102 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 8 1 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEPROYIN

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 82 25 G 60 TO 1 OF 904 ED VIVA 26

42. Correo electrónico ingeproyin@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 1 0 0 7 4 3	3 0 1 6 3 8 3 7 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 0 1 1 2 3	7 1 1 2	2 0 1 0 1 1 2 3		4 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO ATUESTA MARTIN ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162031027

(415)7707212489984(8020) **000014116203102 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 8 1 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 1 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 4 5 9 2 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 1 2 2	
81. Hasta	2 0 3 0 1 1 2 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141162031027

(415)7707212489984(8020) **000014116203102 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 8 1 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 0 0 5 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	ATUESTA	MARTIN	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 4 6 0 8 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	CARRASCAL	RINA	LIZZETTE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162031027

(415)7707212489984(8020) **000014116203102 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 8 1 0	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 2 0 0 5 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RESTREPO	ATUESTA	MARTIN	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 1 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141162031027

(415)7707212489984(8020) **000014116203102 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 8 1 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 3 7 1 2 2 5 3	3	3 0 9 5 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CONTRERAS	LARA	EVA	MARIA ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175195038

(415)7707212489984(8020) 000014117519503 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 4 3 1 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 117 D 135 B 18

42. Correo electrónico as.asesorias.1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 0 5 4 7 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 5 0 2	4 2 1 0	2 0 1 3 0 5 0 2		4 2 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MIOTA ESCAMILLA MARIA JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175195038

(415)7707212489984(8020) **000014117519503 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 4 3 1 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 3 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 5 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 1 8 6 8 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 3 2 2	
81. Hasta	2 0 3 3 0 3 2 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175195038

(415)7707212489984(8020) **000014117519503 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 4 3 1 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 8 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	P A A 1 6 6 5 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MIOTA	ESCAMILLA	MARIA	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 6 8 8 1 8 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	ORREGO	JESSICA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 4 de 4 **Hoja 7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175195038

(415)7707212489984(8020) **000014117519503 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 5 0 3		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141149359359

(415)7707212489984(8020) 000014114935935 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 3 6 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 D # 135 B 18 P 2

42. Correo electrónico AS.ASESORIAS.1@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 0 5 4 7 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 8 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOMAS LLAVADOR JOSE MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141149359359

(415)7707212489984(8020) **000014114935935 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 3 6 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 8 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 8 2 6 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 8 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 8 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149359359

(415)7707212489984(8020) **000014114935935 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 3 6 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 8 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	P A J 5 8 6 7 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TOMAS	LLAVADOR	JOSE	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 2 3 3 1 0 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARAVITO	NARANJO	WILSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO INTER CULTURAL 2025

NIt: 902.018. 151-5

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Yo, **MARTIN ALEJANDRO RETREPO ATUESTA**, identificado con C.C. 72.005.111 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTER CULTURAL 2025**, identificado con **Nit. 902.018.151-5**, manifiesto que la compañía se encuentra al día bajo todo concepto en cuanto a pago de seguridad social Aportes a Riesgos Laborales, Fondos de Pensiones, Entidades Prestadoras de Salud, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera declaro que el **CONSORCIO INTER CULTRAL 2025** no está obligado al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), conforme a lo señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008.

Se expide esta certificación en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de junio de 2026.


MARTIN ALEJANDRO RETREPO ATUESTA
CC. 72.005.111 de Barranquila
Representante legal

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

CERTIFICA

Yo, **JESSICA ALEJANDRA NAVARRO OREGO**, identificada con C.C. 1.136.881.826 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal Suplente de **INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA GLOBAL S.A.S.,** identificada con **Nit. 900.614.314-8,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, luego de, Certifico que la compañía de acuerdo a la normatividad vigente ha dado cumplimiento al pago oportuno de las obligaciones laborales, pago de salarios, honorarios, liquidaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral de sus trabajadores y demás obligaciones laborales y contractuales, encontrándose a paz y salvo por todo concepto en los últimos seis (6) meses a la fecha de radicación.

Dado en Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de junio de 2026.



JESSICA ALEJANDRA NAVARRO OREGO
C.C. 1.136.881.826
Representante Legal Suplente

con **Nit: 900.396.810-3**

CERTIFICACIÓN DE PAGO OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**, identificado con **C.C. 72.005.111** de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S**. identificado con **Nit: 900.396.810-3**, Certifico que la compañía de acuerdo a la normatividad vigente ha dado cumplimiento al pago oportuno de las obligaciones laborales, pago de salarios, honorarios, liquidaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral de sus trabajadores y demás obligaciones laborales y contractuales, encontrándose a paz y salvo por todo concepto en los últimos seis (6) meses a la fecha de radicación.

Se expide en Bogotá a los nueve (09) Días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA
C.C. 72.005.111 de Barranquilla
Representante Legal
GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.

Bogotá, D.C., 09 de junio de 2026

CERTIFICACIÒN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

CERTIFICA

Que **TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S** identificada con **NIT 901.622.366-4,** realizó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis (6) meses, la compañía no tiene la obligación del pago de parafiscales de 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2% al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dado a que es declarante de impuesto de Anticipo de Renta y de la Declaración de Renta y Complementario según la Reforma tributaria del año 2012 ley 1607 y el artículo 19 de la ley 1739, según la ley 789 de 2002 y al mes de enero de 2017 según la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016.

Adicionalmente certificamos estar al día en el pago de las obligaciones laborales.



WISON GARAVITO NARANJO
Representante legal suplente
CC:1.022.331.057

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902018151	5	INTER CULTURAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DEPENDIENTE RIESGO 5	CRA 70 D #48-40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8100743	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	308284304	9504468819	Y	2026/05/14	2026/05/14	BANCOLOMBIA	0	$302,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INDEPENDIENTE RIESGO 5 (2 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,350,905		$302,900		$0	$0		$302,900
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE RIESGO 5 (2 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,350,905		$302,900		$0	$0		$302,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,350,905		$302,900		$0	$0		$302,900
1	CC	1075689674 FLOREZ MICHELL																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	52157611 MENDEZ NIDIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	0	$0	$0	No	$181,000
Total Afiliados(2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,350,905		$302,900		$0	$0		$302,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$302,900	$0	$0	$302,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$302,900	$0	$0	$302,900
TOTAL				2	$302,900	$0	$0	$302,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902018151	5	INTER CULTURAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DEPENDIENTE RIESGO 5	CRA 70 D #48-40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8100743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	229447098	9503136248	Y	2026/04/15	2026/04/16	BANCOLOMBIA	1	$212,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INDEPENDIENTE RIESGO 5 (2 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,045,634		$212,100		$0	$0		$212,100
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE RIESGO 5 (2 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,045,634		$212,100		$0	$0		$212,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,045,634		$212,100		$0	$0		$212,100
1	CC	1075689674	FLOREZ MICHELL	X																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	0	$0	$0	No	$85,400
2	CC	52157611	MENDEZ NIDIA	X																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	21	$1,820,000	6.960%	$126,700	0	$0	$0	No	$126,700
Total			**Afiliados(2)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,045,634		$212,100		$0	$0		$212,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$212,100	$200	$0	$212,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$212,100	$200	$0	$212,300
TOTAL				2	$212,100	$200	$0	$212,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902018151	5	INTER CULTURAL 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DEPENDIENTE RIESGO 5	CRA 70 D #48-40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8100743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	229204396	9503136222	E	2026/04/15	2026/04/16	BANCOLOMBIA	1	$2,557,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: DEPENDIENTE RIESGO 5 (2 Afiliados)																					**$4,703,527**	**$752,600**			**$6,332,049**	**$791,600**			**$6,332,049**	**$253,400**			**$6,332,049**		**$440,800**			**$6,332,049**	**$316,800**		**$2,555,200**
Centro de Trabajo: DEPENDIENTE RIESGO 5 (2 Afiliados)																					**$4,703,527**	**$752,600**			**$6,332,049**	**$791,600**			**$6,332,049**	**$253,400**			**$6,332,049**		**$440,800**			**$6,332,049**	**$316,800**		**$2,555,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					**$4,703,527**	**$752,600**			**$6,332,049**	**$791,600**			**$6,332,049**	**$253,400**			**$6,332,049**		**$440,800**			**$6,332,049**	**$316,800**		**$2,555,200**
1	CC	19256659	PERDOMO CARLOS	X																0	$0	$0	EPS001	21	$1,628,522	$203,600	CCF24	21	$1,628,522	$65,200	14-11	21	$1,628,522	6.960%	$113,400	No	21	$1,628,522	$81,500	No	$463,700
2	CC	52215733	ROJAS GILMA	X															25-14	30	$4,703,527	$752,600	EPS010	30	$4,703,527	$588,000	CCF24	30	$4,703,527	$188,200	14-11	30	$4,703,527	6.960%	$327,400	No	30	$4,703,527	$235,300	No	$2,091,500
Total		**Afiliados(2)**																			$4,703,527	$752,600			$6,332,049	$791,600			$6,332,049	$253,400			$6,332,049		$440,800			$6,332,049	$316,800		$2,555,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$752,600	$600	$0	$753,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$752,600	$600	$0	$753,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$440,800	$300	$0	$441,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$440,800	$300	$0	$441,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$253,400	$200	$0	$253,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$253,400	$200	$0	$253,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$791,600	$600	$0	$792,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$203,600	$200	$0	$203,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$588,000	$400	$0	$588,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$190,100	$200	$0	$190,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$190,100	$200	$0	$190,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,700	$100	$0	$126,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$126,700	$100	$0	$126,800
TOTAL				**2**	**$2,555,200**	**$2,000**	**$0**	**$2,557,200**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075689674	MICHELL DIRLAY FLOREZ SALGADO	TV 27-89 apto 309 torre 3	3155200527	michelleflorezsalg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79326516		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$499.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075689674	MICHELL DIRLAY FLOREZ SALGADO	TV 27-89 apto 309 torre 3	3155200527	michelleflorezsalg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79326516		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$499.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1075689674	FLOREZ SALGADO MICHELL DIRLAY	3	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901797504	9	ARCO INGENIERIA & CO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FRANKLIN GANTIVA	CLLE 7 N 81 40	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3002975252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	181950538	9502487743	E	2026/03/03	2026/03/31	BANCOLOMBIA	28	$1,642,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FRANKLIN GANTIVA (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,925,310	$197,200			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,613,800
Centro de Trabajo: PROYECTOS (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,925,310	$197,200			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,613,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,925,310	$197,200			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,613,800
1	CC	1017131417	GANTIVA FRANKLIN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1017222962	HENAO LUIS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	52157611	MENDEZ NIDIA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
Total		**Afiliados(3)**																				$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,925,310	$197,200			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,613,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$15,300	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$5,100	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$10,200	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$6,600	$0	$365,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$365,700	$6,600	$0	$365,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$197,200	$3,300	$0	$197,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$197,200	$3,300	$0	$197,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$3,900	$0	$210,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$2,600	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$1,300	$0	$70,100
TOTAL				**3**	**$1,613,800**	**$29,100**	**$0**	**$1,642,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901797504	9	ARCO INGENIERIA & CO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FRANKLIN GANTIVA	CLLE 7 N 81 40	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3002975252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51053967	9499467425	E	2026/02/03	2026/02/10	BANCOLOMBIA	7	$1,572,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: FRANKLIN GANTIVA (3 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PROYECTOS (3 Afiliados)																																
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																																
1	CC	1026255493	BELTRAN GIRALDO ALEJANDRA		X																	25-14	28	EPS005	28	CCF04	28	14-11	28	6.960%	28	Si
2	CC	1017131417	GANTIVA MONTOYA FRANKLIN FERNEY							X												230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	6.960%	30	Si
3	CC	52157611	MENDEZ GARCIA NIDIA																			25-14	30	EPS005	30	CCF04	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Total			**Afiliados(3)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$821,900	$3,800	$0	$825,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$541,700	$2,500	$0	$544,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$357,600	$1,600	$0	$359,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$357,600	$1,600	$0	$359,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$180,300	$900	$0	$181,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$180,300	$900	$0	$181,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$205,600	$1,100	$0	$206,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$135,500	$700	$0	$136,200
TOTAL				**3**	**$1,565,400**	**$7,400**	**$0**	**$1,572,800**

Culturas

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-101
Versión: 4
Fecha: 10/Dic/2021

CONTRATO No:	2058-2025	FECHA DE INICIACIÓN:			
		PLAZO:	7 MESES		
OBJETO:	ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1- CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN, CHOCÓ"	PRORROGA:	N/A	ACTA No.	**2**
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ACTA:	**$ 37.168.606**
		FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
		FECHA TERMINACIÓN :		FECHA :	**junio 5-2026**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	VALOR Inicial (incluido IVA) :	**$ 251.528.431,0**	PERIODO PAGO MES:	**10/03/2026 AL 09/05/2026**
		VALOR ADICIÓN:	**$ 0,0**		
ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORÍA		VALOR TOTAL:	**$ 251.528.431,0**		

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO		
FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE PAGADO**
Pago contra Aprobación de productos											
a) Un primer pago equivalente a: Con la entrega de los documentos presentados por el contratista de obra y concepto de la interventoría que incluye: a. Programa de ejecución de obra. b. Flujo de inversión del contrato. c. Organigrama general del proyecto. d. Programa de compras y suministros. e. Programa de equipos. f. Programa de personal. g. Plan de Salud Ocupacional seguridad y salud en el trabajo h. Plan de Manejo Ambiental i. Plan de aseguramiento de la calidad de la obra. j. Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos.	Und.	$ 41.294.117,65	1,00	$ 41.294.118,00	0,00		1,00	$ 41.294.118,00	1,00	$ 41.294.118,00	**100,00%**
Cargos fijos											
Pagos por cargos fijos equivalentes al cincuenta (50%) del valor base, en pagos mensuales iguales previa presentación del informe mensual de interventoría, avalado por la supervisión del Ministerio.	MES	$ 11.706.033,61	7,00	$ 81.942.235,00	2	$ 23.412.068,00	-		2,00	$ 23.412.067,00	**28,57%**
Pagos por avance											
Pagos mensualizados contra avance de obra, proporcionales al porcentaje de ejecución equivalentes al cuarenta (40%) del valor base, en pagos mensuales iguales previa presentación del informe mensual de interventoría, avalado por la supervisión del Ministerio	%	$ 65.553.788,24	100,00%	$ 65.553.788,00	11,93%	$ 7.822.055,00			11,93%	$ 7.822.054,00	**11,93%**
Pago contra recibo a satisfacción											
Un cinco por ciento (5%) del valor base, se pagará contra el recibo a satisfacción de la totalidad de proyectos que hacen parte del contrato por parte de la interventoría, El Ministerio y el ente territorial	Und.	$ 8.194.223,53	1,00	$ 8.194.224,00							
Pago contra liquidación											

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO		
FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE PAGADO**
El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor base, se pagará contra la entrega de los documentos de liquidación de los contratos de obra y de la interventoría al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.	Und.	$ 8.194.223,53	1,00	$ 8.194.224,00							
C.2 _IMPUESTOS	Und.										
			SUBTOTAL	$ 205.178.589,00		$ 31.234.123,00		$ 41.294.118,00		$ 72.528.239,00	
			IVA	**19,00%** $ 38.983.931,00		$ 5.934.483,37		$ 7.845.882,00		$ 13.780.365,00	
			C.2 _IMPUESTOS	$ 7.365.911,00							
			VALOR TOTAL	$ 251.528.431,00		**$ 37.168.606,00**		**$ 49.140.000,00**		**$ 86.308.604,00**	**34,31%**
						14,78%		**19,54%**			

SON TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO INTER CULTURA 2025

Alejandro Noreña Aldana
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Juliana Rodríguez Ramírez
COORDINADORA
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1- CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN, CHOCÓ*"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2058-2025	**CONSORCIO INTER CULTURAL2025**
CONTRATO DE OBRA No. 2036-2025	**CONSORCIO WJ-MINCULTURA**

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 01

PERIODO

DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de Modificación	Folios
01	15-04-2026	Versión original.	26

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



ELABORADO	REVISADO	APROBADO
		
ING. BIBIANA ROJAS	ING. ERNESTO PERDOMO	ING. ERNESTO PERDOMO
Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Director de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 5

1.1. Descripción general. 5
1.2. Alcance e impacto del proyecto. 5
1.3. Localización 5
1.4. Estado de permisos y licencias. 6

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORia 6

2.1. informacion general 6
2.2. garantias del contrato de interventoria 7
2.3. Relación de personal del contrato del interventor. 8
2.4. Estado actual del contrato del interventor. 8
2.5. Estado financiero del contrato del interventor. 8
2.6. Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor 9

3. Generalidades del contrato de obra. 10

3.1. garantias del contrato de obra 10
3.1.1. Estado del tiempo (cuadro): Relación del seguimiento en cuanto al estado del tiempo en el periodo reportado, el cual debe contemplar: 11
3.2. Relación de personal del contrato de obra. 12
3.3. Estado actual del contrato de obra. 12
3.4. Programación 13
3.5. control de obra. 13
3.6. Descripción de actividades desarrolladas en obra 14
3.7. Descripción de actividades proyectadas en obra 14
3.8. Estado financiero del contrato de obra 14
3.9. Flujo de caja programado 14
3.10. Control del plan de calidad 15
3.10.1. RESULTADOS DE LABORATORIOS 15
3.10.2. Calibración de los equipos 16
3.11. Actas generadas en el desarrollo del contrato. 16
3.12. Relación de correspondencia. 17
3.13. Estado de servicios públicos, tramites y licencias. 22
3.14. Informe de topografía. 22
3.15. Cambio de especificaciones o detalles del proyecto. 24
3.16. Libro de obra- Bitácora. 24
3.17. Reseña fotográfica 24

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Población beneficiada. 5
Tabla 2. Información general del contrato de Interventoría. 7
Tabla 3. Pólizas de Interventoría. 8
Tabla 4. Relación de personal de Interventoría. 8
Tabla 5. Estado actual del contrato de Interventoría. 8
Tabla 6. Estado financiero de interventoría. 9
Tabla 8. Información general del contrato de obra. 10
Tabla 9. Pólizas del contrato de obra. 11
Tabla 10. Seguimiento de estado del tiempo. 12
Tabla 11. Personal del contrato de obra. 12
Tabla 12. Estado actual del contrato de obra. 13
Tabla 13. Estado financiero del contrato de obra. 14
Tabla 14. Diseño de mezcla por m3 15
Tabla 15. Diseño de mezcla por saco de cemento. 16
Tabla 15. Relación de actas de comité. 17

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El 8 de septiembre de 2021, el municipio de LITORAL DE SAN JUAN departamento de Chocó, en cabeza del alcalde municipal, solicitó al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, la construcción del Centro Cultural (casa de la cultura), como escenario para la promoción y apropiación de la cultura afro e indígena, así como para la formación y potencialización de los talentos que surjan en las diferentes formas de expresión cultural y artística del municipio, El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, como parte del proceso de viabilización del proyecto del CENTRO CULTURAL (CASA DE CULTURA) DEL LITORAL DE SAN JUAN CHOCÓ, realizó la verificación de la ficha del Sistema de Información de Fomento Regional (SIFO) del municipio, donde se evidenció que el municipio no cuenta con un espacio donde se puedan realizar expresiones culturales, buscando brindar un servicio por medio de la construcción de una casa de la cultura que por ancestralidad se hace indispensable, siendo relevante destacar que desarrollan los procesos de formación cultural en instituciones educativas.

Dado lo anterior, el municipio presentó ante el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES la documentación necesaria, para que surtiera el proceso de viabilización, para lo cual dispuso para el proyecto un el lote de propiedad del municipio localizado en el Barrio los Almendros entre Calles 1 y 2 (Contiguo a Hogar Agrupado), dando como resultado que el 01 de agosto de 2022, mediante comunicación MC22179S2022 se emitió concepto de viabilidad para el proyecto.

1.2. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO.

la población directa a beneficiar con el proyecto corresponde a los programas de formación que pueden ser fortalecidos con la siguiente oferta.

Proceso	Asistencia			
	N° Jóvenes	N° Adultos	N° Días a la semana	N° Horas a la semana
PROCESO DE DANZA Y EXPRE. CORPORAL	400	80	7	28
PROCESO DE MÚSICA	600	200	7	28
PROCESOS ARTES ESCENICAS ± TEATRO	300	100	7	28
PRACTICAS DED OFICIOS	150	20	3	12
COCINA TRADICIONAL	160	70	3	12

Tabla 1. Población beneficiada.

1.3. LOCALIZACIÓN

La construcción del centro cultural se realizará en el lote dispuesto por la alcaldía municipal ubicado en el barrio los Almendros entre Calles 1 y 2 (Contiguo a Hogar Agrupado)

Localización Docordo-Litoral de San Juan



1.4. ESTADO DE PERMISOS Y LICENCIAS.

Actualmente el proyecto cuenta con:

- Salvo conducto expedido por CODECHOCO con No. 119110496630 para la madera de especie chanul aserrado, con fecha.

- Autorización por parte del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) para el aprovechamiento de gravilla y arena (material del río) a cargo de Consejo Comunitario local del Docordó.

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Número del contrato:	No. 2058-2025
Entidad contratante:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
Fecha de suscripción:	24 de diciembre de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Objeto:	OBJETO: "ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1- CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN, CHOCÓ"
Nombre del Interventor:	CONSORCIO INTER CULTURAL2025
NIT:	902.018.151-5
Alcance:	Realizar la interventoría del contrato para la obra del Lote 1- consistente en la Construcción del Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó, desde los componentes técnico, administrativo, financiera, contable, legal, ambiental, aseguramiento de calidad.
Fecha de inicio:	10 de marzo 2026
Plazo contractual inicial:	7 MESES
Fecha de terminación inicial:	9 de octubre de 2026
Acta suspensión 1:	N/A
Tiempo transcurrido:	1 MES
Valor inicial del contrato:	$ 436.645.365,00
Modificaciones	N/A

Tabla 2. Información general del contrato de Interventoría.

2.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIAS:						
AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	%
		DESDE	HASTA			

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (AMPARO)	21-44-101488776	24-12-2025	24-01-2027	$25,152,843.10	Seguros del Estado S.A	10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES (AMPARO)	21-44-101488776	24-12-2025	24-07-2029	$12,576,421.55	Seguros del Estado S.A	5
CALIDAD DEL SERVICIO (AMPARO)	21-44-101488776	24-12-2025	24-07-2031	$50,305,686.20	Seguros del Estado S.A	20

Tabla 3. Pólizas de Interventoría.

*Ver **Anexo** (Información legal del contrato de interventoría) y **Anexo** (Póliza interventoría).*

2.3. RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR.

CAR	NOMBRE	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO	30%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GILMA BIBIANA ROJAS MOLANO	100%
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE	NIDIA MENDEZ GARCIA	50%
ESPECIALISTA GEOTECNIA	EVERARDO PARDO GUIO	30%
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JOSE VICENTE RODRIGUEZ BOLIVAR	30%
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	MONICA JULIANA RAMOS GIL	30%
PROFESIONAL SOCIAL	MICHELL DIRLAY FLOREZ SALGADO	30%
PROFESIONAL JURIDICO	MANUEL ALEJANDRO UMAÑA GRANADOS	15%

Tabla 4. Relación de personal de Interventoría.

Los parafiscales del personal se evidencian en el informe SST.

2.4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR.

PLAZO DEL CTO INTERVENTORÍA (En meses)	FECHA DE ACTA DE INICIO CTO INTERVENTORÍA	FECHA TERMINACIÓN DEL CTO INTERVENTORÍA	% PROGRAMADO CTO INTERVENTORÍA	% REAL EJECUTADO CTO INTERVENTORÍA	% DE ADELANTO O ATRASO (Si aplica) DEL CTO INTERVENTORÍA
7 MESES	10/03/2026	9/10/2026	N/A	N/A	N/A

Tabla 5. Estado actual del contrato de Interventoría.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR.

ACTA PARCIAL	PERIODO	VALOR	ESTADO
N.1	Un primer pago equivalente a la entrega de los documentos presentados por el contratista de obra y concepto de la interventoría	$ 49.140.000,00	Pagado

Tabla 6. Estado financiero de interventoría.

El valor acumulado tramitado ante el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES a la fecha del presente informe es de $ 49.140.000,00 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $ 202.388.431

2.6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR

- La mayor dificultad que se ha presentado en la ejecución del proyecto y que de manera importante a influenciado en el atraso presentado ha sido la dificultad en encontrar el proveedor con los permisos que exige la norma el suministro de pilotes en madera, hasta el 28 de marzo 2026, se llegó al acuerdo comercial con el proveedor y hasta el 09 de abril 2026 fue expedido por CODECHOCO el salvoconducto, después de la visita de inspección realizada por el funcionario de esta entidad el 18 de marzo 2026.

- El 24 de marzo de 2026 en comunicación DPC-20582025-042-2026 se informa al Consorcio WJ-MINCULTURA, se hace un llamado de atención al CONSORCIO WJ-MINCULTURA dado que presenta presunto incumplimiento en las siguientes obligaciones descritas en el anexo 1 anexo técnico:

- **Material y personal operativo:** a la fecha no se cuenta con material (cerramiento y pilotes) ni personal operativo en obra, generando atrasos en la ejecución de las actividades según cronograma de obra entregado el día el 16 de marzo 2026 con comunicado MC-015-2036-2026

- **Cerramiento Provisional:** lo solicitado en el anexo 1 anexo técnico en su numeral *"6.7. Cerramiento Provisional De Obra La zona para intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional*." A la fecha no se ha realizado esta actividad, por lo tanto, se cuenta con 15 días de atraso contados desde la firma del acta de inicio.
- **Actas de vecindad:** solicitadas mediante las comunicaciones DPC-20582025-035-2026 del 11 de marzo de 2026 y DPC-20582025-040-2026 del 19 de marzo de 2026. (…)

- **Dedicación del personal clave:** con la firma del acta de inicio de fecha 10 de marzo de 2026, el contratista de obra debe cumplir con las dedicaciones del personal clave aprobado por la interventoría el 13 de febrero de 2026 mediante comunicación DPC-20582025-018-2026, a la fecha los siguientes profesionales no han cumplido con las funciones ni con la dedicación mínima requerida en el contrato de obra No. 2036-2025. (…)

- **Informe semanal:** a la fecha el Consorcio WJ-MINCULTURA no ha presentado los informes No.1 y No.2 semanales como lo indica el anexo 1 anexo técnico, numeral *"6.11. Actividades e informes durante el plazo de ejecución. (…)*
- **Respuesta a las solicitudes emitidas por la interventoría en las comunicaciones**: a la fecha el Consorcio WJ-MINCULTURA no ha dado respuesta a los comunicados donde se han solicitado los diferentes documentos para el seguimiento de la calidad y gestión en obra. (…)

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.	
Numero de Contrato de Obra N°:	2036-2025.
Entidad contratante:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Fecha de suscripción del contrato:	24-12-2025
Objeto:	Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 1)"
Nombre del contratista:	CONSORCIO WJ-MINCULTURA
NIT:	902.017.826-3
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2026
Plazo contractual inicial:	7 meses
Fecha de terminación inicial:	09 de octubre de 2026
Actas de suspensiones:	N/A
Valor inicial	$2.403.600.747
Valor de anticipo 20%:	$ 438.480.000,00
Modificaciones	N/A

Tabla 7. Información general del contrato de obra.

3.1. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

GARANTIAS:						
AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	%
		DESDE	HASTA			
CUPLIMIENTO DEL CONTRATO (AMPARO)	75-44-101150334	10-03-2026	10-04-2027	480,720,149.40	Seguros del Estado S.A	20
ANTICIPO (AMPARO)	75-44-101150334	10-03-2026	10-04-2027	438,480,000.00	Seguros del Estado S.A	100
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES (AMPARO)	75-44-101150334	10-03-2026	10-10-2029	120,180,037.35	Seguros del Estado S.A	5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (AMPARO)	75-44-101150334	5 AÑOS 0 MESES O DÍAS		480,720,149.40	Seguros del Estado S.A	20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (AMPARO)	75-44-101150334	3 AÑOS 0 MESES O DÍAS		480,720,149.40	Seguros del Estado S.A	20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	100
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (AMPARO)	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	10
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (AMPARO)	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	10
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (AMPARO)	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	10

Tabla 8. Pólizas del contrato de obra.

*Ver **Anexo** (Información legal del contrato de obra) y **Anexo** (Póliza obra).*

3.1.1. ESTADO DEL TIEMPO (CUADRO): RELACIÓN DEL SEGUIMIENTO EN CUANTO AL ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO REPORTADO, EL CUAL DEBE CONTEMPLAR:

ESTADO DEL CLIMA							
SEMANA 1	LUNES 9 DE MARZO DE 2026	MARTES 10 DE MARZO DE 2026	MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026	JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	VIERNES 13 DE MARZO DE 2026	SABADO 14 DE MARZO DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	0	0	0	0	0	0	0
SEMANA 2	LUNES 16 DE MARZO DE 2026	MARTES 17 DE MARZO DE 2026	MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2026	JUEVES 19 DE MARZO DE 2026	VIERNES 20 DE MARZO DE 2026	SABADO 21 DE MARZO DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	0	0	2	3	0	0	5
SEMANA 3	LUNES 23 DE MARZO DE 2026	MARTES 24 DE MARZO DE 2026	MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026	JUEVES 26 DE MARZO DE 2026	VIERNES 27 DE MARZO DE 2026	SABADO 28 DE MARZO DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	0	0	0	0	0	0	0
SEMANA 4	LUNES 30 DE MARZO DE 2026	MARTES 31 DE MARZO DE 2026	MIERCOLES 1 DE ABRIL DE 2026	JUEVES 2 DE ABRIL DE 2026	VIERNES 3 DE ABRIL DE 2026	SABADO 4 DE ABRIL DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	3	0	0	0	0	0	3

SEMANA 5	LUNES 6 DE ABRIL DE 2026	MARTES 7 DE ABRIL DE 2026	MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2026	JUEVES 9 DE ABRIL DE 2026	VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	SABADO 11 DE ABRIL DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	0	3	0	0	2	0	5
TOTAL LLUVIA ACUMULADA	**3**	**3**	**0**	**2**	**5**	**0**	**13**

Tabla 9. Seguimiento de estado del tiempo.

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Una vez revisadas las hojas de vida del personal clave evaluable y personal mínimo requerido, entregadas mediante correo electrónico el 13 de febrero 2026, Se evidencio el cumplimiento al numeral "8.2 Requisitos del personal del Contratista" del ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO del contrato de obra del asunto. Se da aprobación de los siguientes profesionales con comunicación DPC-20582025-018-2026 de fecha 13 de febrero 2026.

El 30 de marzo 2026 con comunicación MC-019-2036-2026 el CONSORCIO WJ-MINCULTURA Solicita el cambio del profesional SSTMA, interventoría realiza la revisión y emite aprobación mediante comunicado DPC-20582025-046-2026.

CARGO	NOMBRE	CUMPLE SI/NO	OBSERVACION	FECHA DE APROBACION
DIRECTOR DE OBRA	FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
RESIDENTE DE OBRA	DILSON JESUS PINEDA MORALES	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
PROFESIONAL SOCIAL	CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ PERILLA	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	WILFRAN DÍAZ LARA	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA GEOTECNICO	YOCIMAR LOZANO URREGO	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CARLOS ALBERTO BULLA SAENZ	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICO	JORGE MARIO TIRADO RODRIGUEZ	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE	ELIANA PAOLA GANTIVAR NIVIA	SI	APROBADO	30 de marzo de 2026

Tabla 10. Personal del contrato de obra.

3.3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.


NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA DE OBRA Plazo Meses	FECHA DE ACTA DE INICIO OBRA	FECHA TERMINACIÓN DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION MESES	% PROGRAM	% REAL EJECUTADO	% DE ADELANTO O ATRASO (Si aplica)
Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 1)" LITORAL DE SAN JUAN	1 mes	10/03/2026	09/10/2026	7 meses	7.07%	0.20%	-6.87%

Tabla 11. Estado actual del contrato de obra.

3.4. PROGRAMACIÓN

En el seguimiento a la programación realizado por la interventoría, desde la firma de acta de inicio se solicito al contratista de obra la actualización de la programación de obra histogramas de personal, material y equipos mediante comunicación DPC-20582025-035-2026 el día 11 de marzo 2026, documentos que fueron entregados el día 16 de marzo 2026 con MC-015-2036-2026, con los cuales se hace el seguimiento a la fecha del presente informe la programación presenta un atraso de 15 días, con los siguientes porcentajes: programado acumulado 7.07% Vs ejecutado 0.20% con un atraso del 6.87%.

Dado el aumento progresivo que se esta presentando se emitió al CONSORCIO WJ-MINCULTURA un presunto incumplimiento en el contrato de obra el 24 de marzo de 2026 con comunicación DPC-20582025-042-2026.

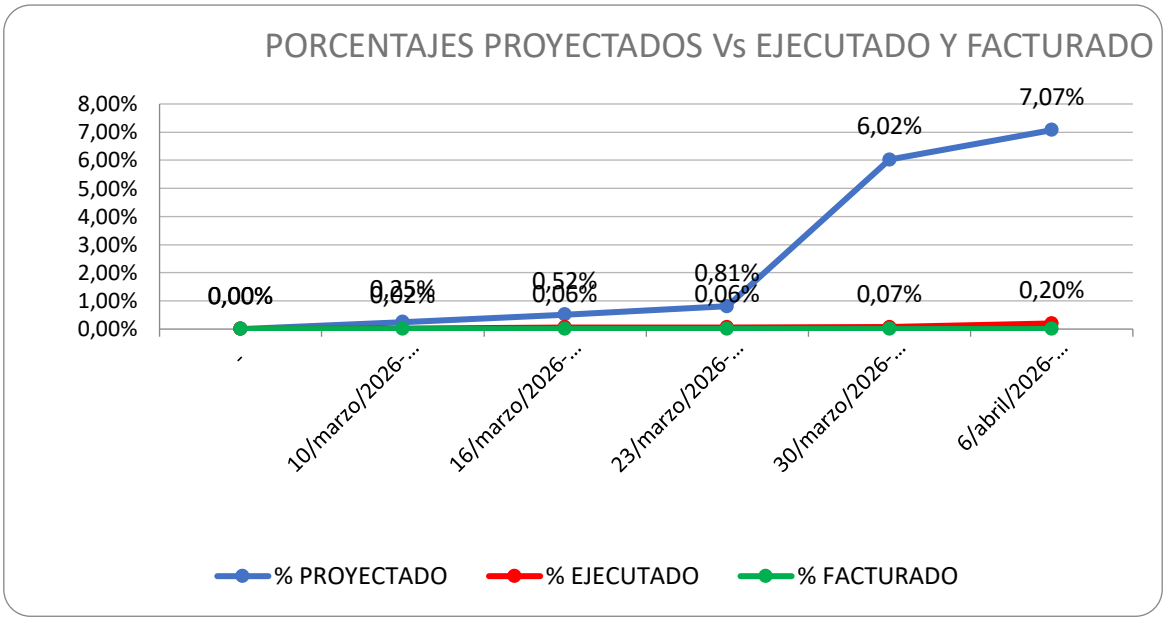

3.5. CONTROL DE OBRA.

Para el control en obra el 06 de marzo 2026 con comunicación DPC-20582025-031-2026 y el 11 de marzo 2026 con DPC-20582025-034-2026 interventoría solicita al contratista de obra, para la actividad de cimentación y estructura en concreto, teniendo en cuenta las características de la zona donde se localiza el proyecto, las especificaciones y recomendaciones dadas en el diseño estructural y estudio de suelos la entrega de:

- Diseño y dosificación de mezcla para los concretos y morteros que se van a utilizar y mezclar en obra
- Procedencia de los materiales y tiempo de suministro

- Equipos a utilizar, soportados con las hojas de vida.
- Procedimientos a realizar para la mezcla, vaciado y curado de los concretos (proceso constructivo)
- Procedimiento a realizar para el hincado de pilotes (proceso constructivo)

3.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA

Durante el periodo del presente informe para la ejecución del contrato, el contratista desarrolla las siguientes actividades:

1. Localización y replanteo con comisión topográfica para localización de ejes y altimetrías.
2. Construcción de cerramiento perimetral provisional en lona verde.
3. Excavaciones para pilotes y zapatas

3.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS EN OBRA

Las actividades que se proyectan para la ejecución de obra son:

1. Continuar con excavaciones para pilotes y zapatas
2. Hincado de Pilotes en madera
3. Solado de limpieza
4. Inicio de armado acero para zapatas y fundida de la mismas

3.8. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha tramitado ante el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes el anticipo por un valor de $ 438.480.000, a la fecha no se han tramitado actas de cobro parcial.

CONCEPTO	VALORES	PORCENTAJES
VALOR TOTAL	$ 2.403.600.747,00	100%
VALOR PROGRAMADO	$ 169.934.572,81	7,07%
VALOR EJECUTADO:	$ 4.807.201,49	0,20%
VALOR ANTICIPO	$ 438.480.000,00	18,24%
VALOR FACTURADO	$ -	0.0%

Tabla 12. Estado financiero del contrato de obra.

3.9. FLUJO DE CAJA PROGRAMADO

Teniendo en cuenta las actividades programadas presentamos el flujo de inversión, es importante aclarar que una vez se reciba el plan de contingencia solicitado en comité de seguimiento del 09 de abril 2026 y en comunicación DPC-20582025-042-2026 del 24 de marzo de 2026, el flujo de caja aquí presentado podría variar.

SEMANA	INVERSIÓN SEMANAL	% INVERSIÓN SEMANAL	INVERSIÓN ACUMULADA	% INVERSIÓN ACUMULADA
Semana 1	$ 5.999.778,07	0,25%	$ 5.999.778,07	0,25%
Semana 2	$ 6.436.671,93	0,27%	$ 12.436.450,00	0,52%
Semana 3	$ 7.079.332,00	0,29%	$ 19.515.782,00	0,81%
Semana 4	$ 125.213.482,00	5,21%	$ 144.729.264,00	6,02%

3.10. CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD.

Para el seguimiento de la calidad de los materiales para la actividad de cimentación y estructura en concreto, teniendo en cuenta las características de la zona donde se localiza el proyecto, las especificaciones y recomendaciones dadas en el diseño estructural y estudio de suelos se reitero la solicitud realizada en la comunicación DPC-20582025-031-2026 de fecha 06 de marzo 2026, con asunto: "SOLICITUD DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETOS – MORTERO – PROCEDIMIENTO EJECUCION":

1. Diseño y dosificación de mezcla para los concretos y morteros que se van a utilizar y mezclar en obra
2. Procedencia de los materiales y tiempo de suministro
3. Equipos a utilizar, soportados con las hojas de vida.
4. Procedimientos a realizar para la mezcla, vaciado y curado de los concretos (proceso constructivo)
5. Procedimiento a realizar para el hincado de pilotes (proceso constructivo)
6. Certificados de calidad y permisos ambientales a que haya lugar.

3.10.1. RESULTADOS DE LABORATORIOS

- **CONCRETO**: El 24 de marzo 2026 El CONSORCIO WJ-MINCULTURA hace entrega del diseño de mezcla para un concreto de 24 Mpa (3500 psi) elaborado en el laboratorio JPC INGENIERO CIVIL-INGENIEROS LTDA, quedando la dosificación de la siguiente manera:

Materiales por m3 de concreto		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Cemento	sacos	9
Grava	cajones 33x33x33cm	14
Arena	cajones 33x33x33cm	14
Agua material seco	Lt	171
Agua material humedo	Lt	161
Asentamiento	Pul	6

Tabla 13. Diseño de mezcla por m3

Materiales por saco de cemento		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Cemento	sacos	1
Grava	cajones 33x33x33cm	1,5
Arena	cajones 33x33x33cm	1,5
Agua material seco	Lt	19
Agua material húmedo	Lt	18
Asentamiento	Pul	6

Tabla 14. Diseño de mezcla por saco de cemento.

3.10.2. CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS

Los equipos utilizados en el presente fueron:

NIVEL AUTOMATICO	Certificado de calibración -007-26 Fecha de expedición: enero 08 de 2026 Fecha de próxima revisión sugerida: julio 08 de 2026 MARCA: TOPCON NÚMERO DE SERIE: WP131297 REFERENCIA: AT-B4A
ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA	Certificado de calibración -007-26 Fecha de expedición: enero 08 de 2026 Fecha de próxima revisión sugerida: julio 08 de 2026 MARCA: CYGNUS REFERENCIA: KS-102 NÚMERO DE SERIE: HV2250

3.11. ACTAS GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Se adelantaron en el mes las siguientes reuniones donde se adjuntan las actas originales:

Descripción	Número	Fecha
Acta de reunión empalme equipo de trabajo y entidad municipal	01	26 - 01-2026
Comité de seguimiento	02	13 - 03 2026
Comité de seguimiento	03	17- 03 2026
Comité de seguimiento	04	24- 03 2026
Comité de seguimiento	05	26- 03 2026

Descripción	Número	Fecha
Comité de seguimiento	06	31- 03 2026
Comité de seguimiento	07	9 - 04 2026

Tabla 15. Relación de actas de comité.

*Ver **Anexo** (Copia de actas de comité).*

3.12. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025				
Fecha	**No. consecutivo**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
23/01/2026	DPC-20582025-001-2026	MINCULTURA	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA Y ORGANIGRAMA GENERAL	https://drive.google.com/file/d/19RO_JIOHHHIL9HoRmAPVf4AnrIfmIySH/view?usp=drive_link
23/01/2026	DPC-20582025-002-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD SUBSANACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	https://drive.google.com/file/d/1UpLpXuo4eOxw8Y0Ef8ZsEB3DShet1BQK/view?usp=drive_link
23/01/2026	DPC-20582025-003-2026	MINCULTURA	TRASLADO COMUNICACIÓN MC-003-2036-2025 – REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA	https://drive.google.com/file/d/1jpTXIVuA4tqLDM_1sDsfJstY4lHkM13e/view?usp=drive_link
26/01/2026	DPC-20582025-004-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD SUBSANACION DOCUMENTOS PARA INICIO	https://drive.google.com/file/d/13_oiVU_Q7JvtfZIy8F7J-E4oNsDFHRW-/view?usp=drive_link
28/01/2026	DPC-20582025-005-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD SUBSANACION DOCUMENTOS PARA INICIO-HISTOGRAMA-MANO DE OBRA-EQUIPOS-MATERIALES.	https://drive.google.com/file/d/1feIIRSAgzMiHRSzhKwJKteRTdXOb26Vl/view?usp=drive_link
28/01/2026	DPC-20582025-006-2026	MINCULTURA	OBSERVACIONES GENERADAS A LOS DISEÑOS	https://drive.google.com/file/d/1UtzscdTPNSIRniAs2jwtIZdA7hFls2W9/view?usp=drive_link
30/01/2026	DPC-20582025-007-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ 01 DEL 26 DE ENERO 2026	https://drive.google.com/file/d/1SsmJfFfS7QgV62DOpnRz5JW3FsU2xCB9/view?usp=drive_link
2/02/2026	DPC-20582025-008-2026	MINCULTURA	TRASLADO COMUNICACIÓN MC-006-2036-2026 - Respuesta solicitud cumplimiento compromisos comité 01 de fecha 26 de enero 2026	https://drive.google.com/file/d/1VdRZC1Eb8E9XLOyz2B7cZFuHXKoB9frj/view?usp=drive_link
3/02/2026	DPC-20582025-009-2026	MINCULTURA	TRASLADO Informe de apropiación de estudios y diseños para la construcción del centro cultural litoral San Juan Choco	https://drive.google.com/file/d/1j4eOpwkjNCqNUiTA3kkA7ikf5HHwboUk/view?usp=drive_link
3/02/2026	DPC-20582025-010-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y PROGRAMACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	https://drive.google.com/file/d/1l-vuVqozx3dov89Fj00tGGrDlgOfbi8m/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025				
Fecha	**No. consecutivo**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
6/02/2026	DPC-20582025-011-2026	MINCULTURA	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA	https://drive.google.com/file/d/18H9AtlywpeWXYdCd1a07UOI9Rwoy6STB/view?usp=drive_link
6/02/2026	DPC-20582025-012-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	APROBACION HOJAS DE VIDA/OBSERVACION SST	https://drive.google.com/file/d/1DP9RoUlTwrFPOV1ZukdBAP-5EAVGwU5J/view?usp=drive_link
6/02/2026	DPC-20582025-013-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ARTE VALLA INFORMATIVA	https://drive.google.com/file/d/1BuzN8-C7Cg06Mlokt_LWkXcRh7FwjSaO/view?usp=drive_link
6/02/2026	DPC-20582025-014-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD SUBSANACION PLAN PMA-SST	https://drive.google.com/file/d/1p6-1OmCCo24r3bJ3PQKJr9VQ_EtfgDFQ/view?usp=drive_link
6/02/2026	DPC-20582025-015-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	APROBACION DOCUMENTOS PARA INICIO	https://drive.google.com/file/d/1QXJyj6H2d3cY8szFeVuCpUutDWNDVF4d/view?usp=drive_link
9/02/2026	DPC-20582025-016-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	RESPUESTA MINCULTURA OBSERVACIONES DISEÑOS	https://drive.google.com/file/d/1H8x2FRa2_l0gda4RSj1j7qRrJBTqwQM-/view?usp=drive_link
9/02/2026	DPC-20582025-017-2026	MINCULTURA	SOLICITUD ACLARACION DISEÑOS PILOTES	https://drive.google.com/file/d/17Mg2-3uqwOoB9ZDO3oXQNt69Yit6ZFe5/view?usp=drive_link
13/02/2026	DPC-20582025-018-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	APROBACION HOJAS DE VIDA	https://drive.google.com/file/d/1lI1GsVG3vGhj2InTny2mSYKfk5oEfOBf/view?usp=drive_link
20/02/2026	DPC-20582025-019-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD SUBSANACION Y/O AJUSTE DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APUs.	https://drive.google.com/file/d/19bRDfWUM_syZb9hPt0ipqlJP7XKPTm81/view?usp=drive_link
20/02/2026	DPC-20582025-020-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO-APROBACION	https://drive.google.com/file/d/1i4VJGigBBErUdPwcxVKglmto2qaDnpuv/view?usp=drive_link
23/02/2026	DPC-20582025-021-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	TRASLADO SUBSANACIÓN DE DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO ELÉCTRICO	https://drive.google.com/file/d/1jjOY2LAJPN4dhrLOVSUC6iMublgNzCv7/view?usp=drive_link
23/02/2026	DPC-20582025-022-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	TRASLADO SUBSANACIÓN ESTUDIO DE SUELOS	https://drive.google.com/file/d/1_8QWEf5Lpb1P9bglXEWOlLk2BmcS2ZAz/view?usp=drive_link
25/02/2026	DPC-20582025-023-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD REVISION DE PRESUPUESTO Vs ESPECIFICACION DE PILOTES ESTUDIO DE SUELOS	https://drive.google.com/file/d/19ez53SVNG22qUNWUK1WRtAlbSGAebHOf/view?usp=drive_link
25/02/2026	DPC-20582025-024-2026	MINCULTURA	ENTREGA HOJA DE VIDA PROFESIONAL ELECTRICO	https://drive.google.com/file/d/1e4N2Rivbtf0PEzzNrAf2ouiS4umzmdle/view?usp=drive_link
26/02/2026	DPC-20582025-025-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	TRASLADO SUBSANACIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO	https://drive.google.com/file/d/1iP-mnTPsrrMfaHFBN3D9G5Q506kcTnz5/view?usp=drive_link
3/03/2026	DPC-20582025-026-2026	MINCULTURA	TRASLADO DOCUMENTOS ANTICIPO CONTRATISTA DE OBRA	https://drive.google.com/file/d/1PdY9r5kva3WgIlmVU-F48OeRoEyVijGJ/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025				
Fecha	**No. consecutivo**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
3/03/2026	DPC-20582025-027-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	APROBACION DOCUMENTOS PARA INICIO	https://drive.google.com/file/d/1XrVVR9iisB-sWzvyfm25t2HH04HphxZY/view?usp=drive_link
3/03/2026	DPC-20582025-028-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	OBSERVACIONES NP-01 PILOTES	https://drive.google.com/file/d/1306E9hruAmIlwPOSFhtglH9h0qZfY9h1/view?usp=drive_link
4/03/2026	DPC-20582025-029-2026	MINCULTURA	ENTREGA DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO No.1	https://drive.google.com/file/d/1JVYZmQlemDGJcM93UBrxCT6yziLkjk1x/view?usp=drive_link
5/03/2026	DPC-20582025-030-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	TRASLADO AJUSTE DISEÑO ESTRUCTURAL	https://drive.google.com/file/d/1UitW52E-T0oH3sdMnug3itx0DHfIe6R7/view?usp=drive_link
6/03/2026	DPC-20582025-031-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD DISEÑO DE MEZCLA	https://drive.google.com/file/d/1UIedGKXGHRqR1PZWIGxZgcSoMPxU1x8c/view?usp=drive_link
6/03/2026	DPC-20582025-032-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ARTE VALLA INFORMATIVA	https://drive.google.com/file/d/13D6rigotZ4WRxXlgAR1jinwM1rMgMg_T/view?usp=drive_link
9/03/2026	DPC-20582025-033-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD FIRMA ACTA DE INICIO y SOLICITUD DE GARANTIAS	https://drive.google.com/file/d/1nItspWdQp1-jZTyRdjz7LA24MeMHAnE6/view?usp=drive_link
11/03/2026	DPC-20582025-034-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETOS – MORTERO – PROCESO CONSTRUCTIVO	https://drive.google.com/file/d/1CxG0hmtB0Uf87xbJCTENYT5Ow_wNVHTZ/view?usp=drive_link
11/03/2026	DPC-20582025-035-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA	https://drive.google.com/file/d/1WWkazif4XuUPZldfdVH-Uu_YPb_yf-Ce/view?usp=drive_link
11/03/2026	DPC-20582025-036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ACTUALIZACION DE GARANTIAS	https://drive.google.com/file/d/1Gv3E0xGeyPdcYmPdaENXU-JN3Iy7Yn4r/view?usp=drive_link
12/03/2026	DPC-20582025-037-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA / MINCULTURA	CAMBIO CORREO ELECTRONICO	https://drive.google.com/file/d/1Nd-Fhn7mfQZX7pTPdU1M-foIl6IqUnzL/view?usp=drive_link
12/03/2026	DPC-20582025-038-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	PROTOCOLO DE INGRESO DEL PERSONAL a OBRA	https://drive.google.com/file/d/1bijrYJ8vqoRKnU1gUZi0pC1mFp9ajoXM/view?usp=drive_link
12/03/2026	DPC-20582025-039-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD PROVEEDOR Y CERTIFICACION DE CALIDAD Y PERMISOS AMBIENTALES	https://drive.google.com/file/d/1dBRCGsFAluaMF9r_wx9OY9t4aqU4e0ju/view?usp=drive_link
19/03/2026	DPC-20582025-040-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD	https://drive.google.com/file/d/1e-GUqRIXnwpiu8G9qgvOxvS2iN70IalD/view?usp=drive_link
20/03/2026	DPC-20582025-041-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ALTIMETRIAS Y PERFILES TOPOGRAFICO	https://drive.google.com/file/d/1lBpX6FuBL6Fmiza_1mMSPRLaKg6ZkAUT/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025				
Fecha	**No. consecutivo**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
25/03/2026	DPC-20582025-042-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	https://drive.google.com/file/d/1IHPzSN44-mCbCkzikxLWbhgC9A-P-m7I/view?usp=drive_link
25/03/2026	DPC-20582025-043-2026	MINCULTURA	SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION	https://drive.google.com/file/d/1cB_PzIpy49XJcpag6aCZtu7X4oOloGeD/view?usp=drive_link
25/03/2026	DPC-20582025-044-2026	MINCULTURA	SOLICITUD ARTE VALLA INFORMATIVA	https://drive.google.com/file/d/1Uri6B7Pk-7K5a4TtOdUk3hM7Bbjjzkqs/view?usp=drive_link
30/03/2026	DPC-20582025-045-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORME SEMANA 1 Y 2	https://drive.google.com/file/d/1ru2Xz7OeyZn9ST-1yt47qKDOVM_dpzQp/view?usp=drive_link
30/03/2026	DPC-20582025-046-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	APROBACION CAMBIO HV SST AMBIENTAL	https://drive.google.com/file/d/1X55SRQ2gIqdTfb8cFb0K_RfoeHPhzKTt/view?usp=drive_link
7/04/2026	DPC-20582025-047-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORME SEMANA 3 y 4	https://drive.google.com/file/d/1Z2HiQtX8NpOdGmRio4fdRTxurwlw7SLO/view?usp=drive_link
8/04/2026	DPC-20582025-048-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	OBSERVACIONES HV SOCIAL DE APOYO	https://drive.google.com/file/d/1y2e991LtBnZ8TxzzyaRB6widvnvq6uFC/view?usp=drive_link
8/04/2026	DPC-20582025-049-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	NO ACEPTACION HV SOCIAL DE APOYO	https://drive.google.com/file/d/13nmrQUPsHQvprZN1kjBZ-DekKEYcI3w6/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025					
Fecha	**No. consecutivo**	**Emitida por:**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
20/01/2026	MC-002-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	ENTREGA INFORMACIÓN INICIAL (PARTE 1)	https://drive.google.com/file/d/1-duF9YSLkJunTrs0cNknKRKnpzcyZRJR/view?usp=drive_link
20/01/2026	MC-003-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA	https://drive.google.com/file/d/1d3EcRzKRBtKZLtuS-1WtSTmTaBUx4c9I/view?usp=drive_link
21/01/2026	MC-004-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	ENTREGA INFORMACIÓN INICIAL (PARTE 2)	https://drive.google.com/file/d/1ol0YKpw9uafUiAF4MLGMttZZtzxqTQCv/view?usp=drive_link
27/01/2026	MC-005-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Respuesta Solicitud subsanación hojas de vida profesionales	https://drive.google.com/file/d/1Yc6ii-h8F8vQwjpwYwl_xaAWOBYONEOe/view?usp=drive_link
30/01/2026	MC-006-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Respuesta solicitud cumplimiento compromisos comité 01 de fecha 26 de enero 2026	https://drive.google.com/file/d/1s64U334YGUaMQKaHvRW7_gkbPEPDROkE/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025					
Fecha	**No. consecutivo**	**Emitida por:**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
4/02/2026	MC-007-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Remisión plan de inversión del anticipo	https://drive.google.com/file/d/17shqJ1bprBNaDH2VEqLO39-XGHaU-ETB/view?usp=drive_link
6/02/2026	sin Codigo	MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Respuesta a "CONTRATO DE OBRA NO 2036-2025 OBSERAVCIONES GENERALES AL DISEÑO"	https://drive.google.com/file/d/1YAtPGyz2H4A8_TItU5AiJp18LKewqWuu/view?usp=drive_link
24/02/2026	MC-008-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Subsanacion de analisis de precios unitarios V3	https://drive.google.com/file/d/1inzkF4Csbt81wRZirYXtjWIl_98Ju9-b/view?usp=drive_link
25/02/2026	Código TRD: 1005	MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Respuesta a comunicado Cod. DPC-20582025-2026 al posterior ajuste con numero DPC-20582025-024-2026 con asunto: Respuesta a Remisión de hojas de vida personal de Interventoría	https://drive.google.com/file/d/1lo0tvprXrhJ6Bn3petiemWU8ew6UQQ0P/view?usp=drive_link
9/03/2026	MC-012-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Citación socialización proyecto construcción del centro cultural de Litoral de San Juan, Chocó	https://drive.google.com/file/d/1R-JnjZMWNp2GStKX3V4UQ6YVFTRySbPE/view?usp=drive_link
9/03/2026	MC-013-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Subsanación No Previsto 01	https://drive.google.com/file/d/1c-QYySZBuCZkfQ6X7_nxqOACB92wIyTG/view?usp=drive_link
16/03/2026	MC-014-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Certificado pilotes de la zona	https://drive.google.com/file/d/1b-0AUL480EZfcGhcv-A_bmmvyoRR6BvV/view?usp=drive_link
16/03/2026	MC-015-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Documentos actualizado acorde acta de inicio	https://drive.google.com/file/d/1vW0__SN1KEp0j5Jm0WEP_8aXPszXQNN2/view?usp=drive_link
20/03/2026	MC-016-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Entrega informe topográfico	https://drive.google.com/file/d/1gTKe0hwpX8GFHNP2rukfbJYrQzdkqVtf/view?usp=drive_link
25/03/2026	MC-017-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Diseño Valla del Proyecto	https://drive.google.com/file/d/18YioS1a-rGLxBTqvNFeRJaRB3Pm2DsOC/view?usp=drive_link
25/03/2026	MC-018-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Diseño de Mezcla	https://drive.google.com/file/d/1ntwzrEORMUMNQy30LRMPBv8oE9LxxWGE/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025					
Fecha	**No. consecutivo**	**Emitida por:**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
30/03/2026	MC-019-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Solicitud cambio profesional SSTMA	https://drive.google.com/file/d/1mpb3_gLjQv0GigPRoWKvMGv_ZPdIzdPq/view?usp=drive_link
6/04/2026	MC-SST-MA-001-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Remisión Documentación personal de Obra	https://drive.google.com/file/d/1hPImRt3ByLqfB6RvwfvZSF9EwCTrvGYh/view?usp=drive_link
8/04/2026	MC-021-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	RESPUESTA COMUNICACIÓN MC-020-2036-2026 – Presentación profesional social de apoyo	https://drive.google.com/file/d/1bm4p-ZDQHwXhB-r4-LvlWpUwrMgTz86d/view?usp=drive_link

Ver **anexo**. (Relación de correspondencia enviada y recibida).

3.13. ESTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITES Y LICENCIAS.

- Licencia de construcción.

El 25 de marzo de 2026 con comunicación DPC-20582025-043-2026 se solicitó al Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes la licencia de construcción del centro cultural de Litoral de San Juan – Choco.

- Servicios públicos.

- El 16 de marzo 2026, se radico ante la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA DEL LITORAL DEL SAN JUAN SAS ESP- ENERLITORL SAS ESP, la solicitud de la provisional de energía.
- El 07 de abril 2026 de radico ante la alcaldía municipal la solicitud de conexión de agua provisional.

- Permisos y/o autorizaciones.

- Salvo conducto expedido por CODECHOCO con No. 119110496630 para la madera de especie chanul aserrado, con fecha 09 de abril 2026.

- Autorización por parte del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) para el aprovechamiento de gravilla y arena (material del río) a cargo de Consejo Comunitario local del Docordó con fecha de expedición 10 de abril 2026.

3.14. INFORME DE TOPOGRAFÍA.

Una vez recibida y revisada la información entregada por el CONSORCIO WJ-MINCULTURA con comunicación MC-016-2036-2026 asunto: “Entrega informe topográfico”, de fecha 20 de marzo 2026, se presentan las siguientes observaciones:

- Falta especificar la altimetría e indicar la altura con respecto al anden

- Falta plano con los cortes y/o perfiles topográficos

- Falta cálculo de excavación y llenos según perfil topográfico

- Falta indicar en el plano y en el informe cual es la cota cero (nivel 0.0) del proyecto

- Falta indicar las cotas claves y cota batea de la tubería de las cajas que se muestran en el plano en caso de que las cajas sean de alcantarillado, y el proyecto se vaya a conectar a esas cajas.

- Falta indicar a que nivel se encuentran las cajas que están en el plano y que tipo de cajas son (caja de aguas residuales, o aguas lluvias, o agua potable o caja eléctrica) y si están en servicio.

- Falta indicar en el informe si las cajas interfieren en el diseño

- Faltan las conclusiones

El día 09 de abril 2026 mediante correo electrónico el CONSORCIO WJ-MINCULTURA hace entrega de la subsanación a las observaciones anteriormente mencionadas, las cuales a su vez son remitidas a la entidad. Dentro del informe se incluye:

- Levantamiento planimétrico: El método planímetro a utilizar en este trabajo fue el de radiaciones. Que consiste en la materialización de una poligonal de soporte abierto amarrado a coordenadas conocidas.

  Este polígono de soporte fue orientado con una norte verdadera amarrada a DETAS REFERENCIADAS con coordenadas MAGNAS SIRGAS

  GPS-1 N963105.819E968021.973-Z=4.002

  GPS-2N963141.194-E968023.959-Z04.508

  GPS-4 N963072.966-E967966.989-Z=4.163,

  El método utilizado en el polígono fue el de azimuts, que consiste en barrer los ángulos horizontales partiendo de un azimut verdadero.

  De este polígono se referenciará al menos dos deltas. Todo esto con el fin de que el trabajo sirva de apoyo a localizaciones, controles posteriores y proyectos venideros.

- Levantamiento altimétrico: Este se realizó por el método de nivelación por líneas confortantes que consiste en determinar las líneas de terreno que constituyen su forma plana, las ondulaciones, las

laderas, su formación cóncava o convexa, sus colectoras, sus taludes, sus partidoras, las líneas de cambio de dirección y de pendiente.

Este trabajo se hizo conjuntamente con la planimetría y se tuvo en cuenta la altura del equipo, la altura del bastón que sostiene el prisma para después de los respectivos cálculos determinar las cotas o alturas del terreno.

- CALCULOS Todos los cálculos planímetros se realizaron con programas de computadores especializados para topografía, el ajuste de la poligonal de soporte se hizo por el método de Crandall. Los softwares empleados son AUTO CAD LAND DEVELOPMENT y hoja de cálculo EXCEL.

3.15. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES O DETALLES DEL PROYECTO.

A la fecha no se ha presentado cambio de especificaciones técnicas del proyecto.

3.16. LIBRO DE OBRA- BITÁCORA.

Ver **Anexo**. (Copia de bitácora).

3.17. RESEÑA FOTOGRÁFICA



Foto 1. Socialización inicio obra

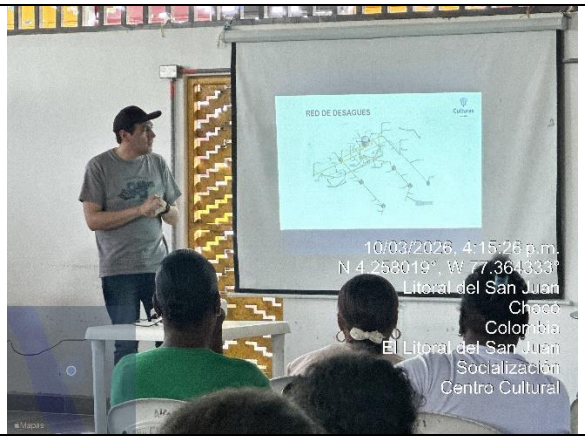


Foto 2. Socialización inicio obra



Foto 3. Entrega del lote



Foto 4. Entrega del lote



Foto 5. Localización y replanteo



Foto 6. Localización y replanteo



Foto 7. Construcción cerramiento provisional

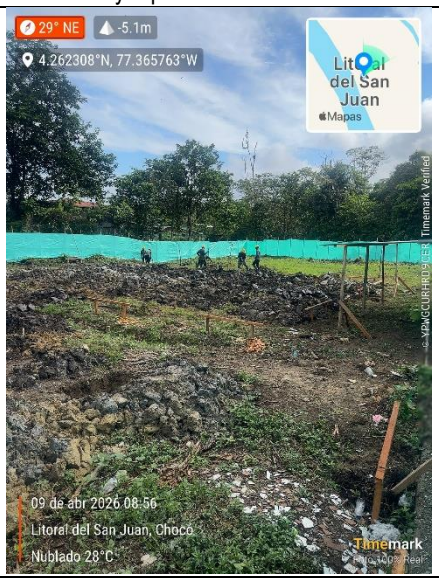


Foto 8. Excavación para zapatas

	
Foto 9. Visita de inspección de Codechoco	Foto 10. Visita de inspección de Codechoco

Ver **Anexo**. (Registro fotográfico).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se realiza firma de acta de inicio de obra e interventoría el 10 de marzo de 2026
- ✓ La alcaldía hace entrega del lote a el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes el 10 de marzo 2026.
- ✓ Se recomienda al Consorcio WJ-MINCULTURA realizar los pedidos de material y equipos con tiempo dada la dificultad y el tiempo en transporte, para evitar atrasos.
- ✓ En cumplimiento a las obligaciones contractuales se hace un llamado de atención al CONSORCIO WJ-MINCULTURA dado que presenta un presunto incumplimiento referente a material, personal operativo, programación de obra, histograma de personal, Cerramiento Provisional, actas de vecindad, Dedicación del personal clave, Informes semanales, respuesta a las solicitudes emitidas por la interventoría, llamado de atención que fue informado mediante comunicación DPC-20582025-042-2026 de fecha 24 de marzo de 2026. Y a la fecha del presente informe el contratista no ha dado respuesta.
- ✓ La interventoría seguirá velando por el cumplimiento de la calidad, y de las buenas prácticas en la ejecución de las actividades, así mismo en el cumplimiento de la normatividad vigente.

ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1- CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN, CHOCÓ*"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2058-2025	**CONSORCIO INTER CULTURAL2025**
CONTRATO DE OBRA No. 2036-2025	**CONSORCIO WJ-MINCULTURA**

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 02

PERIODO

DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de Modificación	Folios
01	20-05-2026	Versión original.	23

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




ELABORADO	REVISADO	APROBADO
		
ING. BIBIANA ROJAS	ING. ERNESTO PERDOMO	ING. ERNESTO PERDOMO
Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Director de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO..... 5

1.1. Descripción general..... 5
1.2. Alcance e impacto del proyecto..... 5
1.3. Localización..... 5
1.4. Estado de permisos y licencias..... 6

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORia..... 6

2.1. informacion general..... 6
2.2. garantias del contrato de interventoria..... 7
2.3. Relación de personal del contrato del interventor..... 8
2.4. Estado actual del contrato del interventor..... 8
2.5. Estado financiero del contrato del interventor. 9
2.6. Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor..... 9

3. Generalidades del contrato de obra. 10

3.1. garantias del contrato de obra 11
3.1.1. Estado del tiempo (cuadro): Relación del seguimiento en cuanto al estado del tiempo en el periodo reportado, el cual debe contemplar: 11
3.2. Relación de personal del contrato de obra..... 12
3.3. Estado actual del contrato de obra..... 13
3.4. Programación..... 13
3.5. control de obra. 14
3.6. Descripción de actividades desarrolladas en obra 15
3.7. Descripción de actividades proyectadas en obra 15
3.8. Estado financiero del contrato de obra 15
3.9. Flujo de caja programado 15
3.10. Control del plan de calidad. 16
3.10.1. RESULTADOS DE LABORATORIOS..... 16
3.10.2. Calibración de los equipos..... 17
3.11. Actas generadas en el desarrollo del contrato. 17
3.12. Relación de correspondencia..... 18
3.13. Estado de servicios públicos, tramites y licencias..... 19
3.14. Cambio de especificaciones o detalles del proyecto. 20
3.15. Libro de obra- Bitácora. 20
3.16. Reseña fotográfica 21

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Población beneficiada. 5

Tabla 2. Información general del contrato de Interventoría. 7
Tabla 3. Pólizas de Interventoría. 8
Tabla 4. Relación de personal de Interventoría. 8
Tabla 5. Estado actual del contrato de Interventoría. 9
Tabla 6. Estado financiero de interventoría. 9
Tabla 8. Información general del contrato de obra. 11
Tabla 9. Pólizas del contrato de obra. 11
Tabla 10. Seguimiento de estado del tiempo. 11
Tabla 11. Personal del contrato de obra. 12
Tabla 12. Estado actual del contrato de obra. 13
Tabla 13. Estado financiero del contrato de obra. 15
Tabla 14. Diseño de mezcla por m3 17
Tabla 15. Diseño de mezcla por saco de cemento. 17
Tabla 15. Relación de actas de comité. 18

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El 8 de septiembre de 2021, el municipio de LITORAL DE SAN JUAN departamento de Chocó, en cabeza del alcalde municipal, solicitó al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, la construcción del Centro Cultural (casa de la cultura), como escenario para la promoción y apropiación de la cultura afro e indígena, así como para la formación y potencialización de los talentos que surjan en las diferentes formas de expresión cultural y artística del municipio, El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, como parte del proceso de viabilización del proyecto del CENTRO CULTURAL (CASA DE CULTURA) DEL LITORAL DE SAN JUAN CHOCÓ, realizó la verificación de la ficha del Sistema de Información de Fomento Regional (SIFO) del municipio, donde se evidenció que el municipio no cuenta con un espacio donde se puedan realizar expresiones culturales, buscando brindar un servicio por medio de la construcción de una casa de la cultura que por ancestralidad se hace indispensable, siendo relevante destacar que desarrollan los procesos de formación cultural en instituciones educativas.

Dado lo anterior, el municipio presentó ante el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES la documentación necesaria, para que surtiera el proceso de viabilización, para lo cual dispuso para el proyecto un el lote de propiedad del municipio localizado en el Barrio los Almendros entre Calles 1 y 2 (Contiguo a Hogar Agrupado), dando como resultado que el 01 de agosto de 2022, mediante comunicación MC22179S2022 se emitió concepto de viabilidad para el proyecto.

1.2. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO.

la población directa a beneficiar con el proyecto corresponde a los programas de formación que pueden ser fortalecidos con la siguiente oferta.

Proceso	Asistencia			
	N° Jóvenes	N° Adultos	N° Días a la semana	N° Horas a la semana
PROCESO DE DANZA Y EXPRE. CORPORAL	400	80	7	28
PROCESO DE MÚSICA	600	200	7	28
PROCESOS ARTES ESCENICAS ± TEATRO	300	100	7	28
PRACTICAS DED OFICIOS	150	20	3	12
COCINA TRADICIONAL	160	70	3	12

Tabla 1. Población beneficiada.

1.3. LOCALIZACIÓN

La construcción del centro cultural se realizará en el lote dispuesto por la alcaldía municipal ubicado en el barrio los Almendros entre Calles 1 y 2 (Contiguo a Hogar Agrupado)

Localización Docordo-Litoral de San Juan



1.4. ESTADO DE PERMISOS Y LICENCIAS.

Actualmente el proyecto cuenta con:

- Licencia urbanística de construcción, resolución No.837 del 02 de abril de 2025, para el predio identificado con matricula inmobiliaria No. 184-25305 del 18 de abril de 2024 con un área de 1.125 m2 en el barrio El Firme

- Salvo conducto expedido por CODECHOCO con No. 119110496630 para la madera de especie chanul aserrado, con fecha.

- Autorización por parte del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) para el aprovechamiento de gravilla y arena (material del río) a cargo de Consejo Comunitario local del Docordó.

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Número del contrato:	No. 2058-2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Entidad contratante:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
Fecha de suscripción:	24 de diciembre de 2025
Objeto:	OBJETO: "ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1- CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN, CHOCÓ"
Nombre del Interventor:	CONSORCIO INTER CULTURAL2025
NIT:	902.018.151-5
Alcance:	Realizar la interventoría del contrato para la obra del Lote 1- consistente en la Construcción del Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó, desde los componentes técnico, administrativo, financiera, contable, legal, ambiental, aseguramiento de calidad.
Fecha de inicio:	10 de marzo 2026
Plazo contractual inicial:	7 MESES
Fecha de terminación inicial:	9 de octubre de 2026
Acta suspensión 1:	N/A
Tiempo transcurrido:	1 MES
Valor inicial del contrato:	$ 436.645.365,00
Modificaciones	N/A

Tabla 2. Información general del contrato de Interventoría.

2.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIAS:

AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	%
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (AMPARO)	21-44-101488776	24-12-2025	24-01-2027	$25,152,843.10	Seguros del Estado S.A	10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES (AMPARO)	21-44-101488776	24-12-2025	24-07-2029	$12,576,421.55	Seguros del Estado S.A	5
CALIDAD DEL SERVICIO (AMPARO)	21-44-101488776	24-12-2025	24-07-2031	$50,305,686.20	Seguros del Estado S.A	20

Tabla 3. Pólizas de Interventoría.

*Ver **Anexo** (Información legal del contrato de interventoría) y **Anexo** (Póliza interventoría).*

2.3. RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR.

CAR	NOMBRE	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO	30%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GILMA BIBIANA ROJAS MOLANO	100%
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE	NIDIA MENDEZ GARCIA	50%
ESPECIALISTA GEOTECNIA	EVERARDO PARDO GUIO	30%
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JOSE VICENTE RODRIGUEZ BOLIVAR	30%
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	MONICA JULIANA RAMOS GIL	30%
ESPECIALISTA ELECTRICO	JOSE LUIS GARNICA TORRES	30%
PROFESIONAL SOCIAL	MICHELL DIRLAY FLOREZ SALGADO	30%
PROFESIONAL JURIDICO	MANUEL ALEJANDRO UMAÑA GRANADOS	15%

Tabla 4. Relación de personal de Interventoría.

Los parafiscales del personal se evidencian en el informe SST.

2.4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR.

PLAZO DEL CTO INTERVENTORÍA (En meses)	FECHA DE ACTA DE INICIO CTO INTERVENTORÍA	FECHA TERMINACIÓN DEL CTO INTERVENTORÍA	% PROGRAMADO CTO INTERVENTORÍA	% REAL EJECUTADO CTO INTERVENTORÍA	% DE ADELANTO O ATRASO (Si aplica) DEL CTO INTERVENTORÍA
7 MESES	10/03/2026	9/10/2026	N/A	N/A	N/A

Tabla 5. Estado actual del contrato de Interventoría.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR.

ACTA PARCIAL	PERIODO	VALOR	ESTADO
N.1	Un primer pago equivalente a la entrega de los documentos presentados por el contratista de obra y concepto de la interventoría	$ 49.140.000,00	Pagado 29-04-2025

Tabla 6. Estado financiero de interventoría.

El valor acumulado tramitado ante el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES a la fecha del presente informe es de $ 49.140.000,00 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $ 202.388.431.

Durante el presente periodo no se tramito acta de cobro.

2.6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR

En el periodo del 10 de abril al 09 de mayo 2026 se presentaron las siguientes dificultades:

- La mayor dificultad que se ha presentado en la ejecución del proyecto y que de manera importante a influenciado en el atraso presentado ha sido la dificultad en encontrar el proveedor con los permisos que exige la norma el suministro de pilotes en madera, hasta el 28 de marzo 2026, se llegó al acuerdo comercial con el proveedor y hasta el 09 de abril 2026 fue expedido por CODECHOCO el salvoconducto, después de la visita de inspección realizada por el funcionario de esta entidad el 18 de marzo 2026.
- El 15 de abril 2026, se inicia el suministro de pilotes en madera, se presentó dificultad en el suministro por el nivel del rio, como fue informado en libro de obra.
- El 10 de abril 2026 se logra obtener la autorización del consejo comunitario mayor y le concede el permiso al consejo comunitario local para realizar el suministro de arena y grava; se inicia el suministro el 22 de abril 2026.
- Las lluvias presentadas durante el periodo afectaron el rendimiento en las actividades de cimentación como fue el hincado de pilotes, excavaciones para dados y solados.
- El 14 de abril 2026, el contratista entrega plan de contingencia solicitado por interventoría mediante comunicado el 11 de abril 2026 con comunicado DPC-20582025-050-2026 con asunto: TRASLADO COMUNICACIÓN MC08640S2026 CON ASUNTO "Subsanación Presunto Incumplimiento". Una vez recibida la comunicación MC08640S2026 de fecha 10 abril 2026 hora 5:49 pm, con asunto "*Subsanación Presunto Incumplimiento",* donde la Entidad está elevando una alerta al cumplimiento de sus obligaciones en el marco del desarrollo del contrato 2036-2025, e invita al

contratista para que se dé cumplimiento de manera inmediata a las actividades y así evitar el inicio de un proceso para imposición de multas.

A su vez MINCULTURA solicita se dé pronta respuesta y respectiva subsanación antes del martes 14 de abril de 2026 a las 9:30 am. previo al comité semanal de obra.

Dentro del plan de contingencia el CONSORCIO WJ-MINCULTURA entrega una reprogramación que esta siendo revisada por la interventoría, evaluando los rendimientos indicados en el documento y lo real en obra, dadas las condiciones climáticas y de suministro de material que no son constantes y dificultan mantener el rendimiento para un avance en la ejecución de las actividades.

- El 07 de mayo 2026, con la comunicación DPC-20582025-060-2026 interventoría solicitamos el ajuste al diseño de la cimentación, dadas las condiciones encontradas en campo respecto a los niveles de los elementos que conforman la cimentación, verificadas con el plano de corte estructural E 006 V1, Tal como se informó en el comité de seguimiento del 05 de mayo 2026, donde los niveles no son acordes a la realidad, y como resultado de esta verificación se propone la posibilidad de eliminar la viga inferior teniendo en cuenta la longitud en la que quedaría la columna (1.32m)

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.	
Numero de Contrato de Obra N°:	2036-2025.
Entidad contratante:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Fecha de suscripción del contrato:	24-12-2025
Objeto:	Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 1)”
Nombre del contratista:	CONSORCIO WJ-MINCULTURA
NIT:	902.017.826-3
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2026
Plazo contractual inicial:	7 meses
Fecha de terminación inicial:	09 de octubre de 2026
Actas de suspensiones:	N/A
Valor inicial	$2.403.600.747

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.	
Valor de anticipo 20%:	$ 438.480.000,00
Modificaciones	N/A

Tabla 7. Información general del contrato de obra.

3.1. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

GARANTIAS:						
AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	%
		DESDE	HASTA			
CUPLIMIENTO DEL CONTRATO (AMPARO)	75-44-101150334	10-03-2026	10-04-2027	480,720,149.40	Seguros del Estado S.A	20
ANTICIPO (AMPARO)	75-44-101150334	10-03-2026	10-04-2027	438,480,000.00	Seguros del Estado S.A	100
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES (AMPARO)	75-44-101150334	10-03-2026	10-10-2029	120,180,037.35	Seguros del Estado S.A	5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (AMPARO)	75-44-101150334	5 AÑOS 0 MESES O DÍAS		480,720,149.40	Seguros del Estado S.A	20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (AMPARO)	75-44-101150334	3 AÑOS 0 MESES O DÍAS		480,720,149.40	Seguros del Estado S.A	20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	100
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (AMPARO)	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	10
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (AMPARO)	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	10
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (AMPARO)	75-40-101057230	10-03-2026	10-10-2026	$427,050,000.00	Seguros del Estado S.A	10

Tabla 8. Pólizas del contrato de obra.

*Ver **Anexo** (Información legal del contrato de obra) y **Anexo** (Póliza obra).*

3.1.1. ESTADO DEL TIEMPO (CUADRO): RELACIÓN DEL SEGUIMIENTO EN CUANTO AL ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO REPORTADO, EL CUAL DEBE CONTEMPLAR:

ESTADO DEL CLIMA							
SEMANA 1				JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	SABADO 14 DE ABRIL DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS				0	0	0	0
SEMANA 2	LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	SABADO 18 DE ABRIL DE 2026	TOTAL

ESTADO DEL CLIMA							
HORAS DE LLUVIAS	4	0	3,5	0	3	0	10,5
SEMANA 3	LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	SABADO 25 DE ABRIL DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	0	2	3	0	3,5	0	8,5
SEMANA 4	LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	VIERNES 01 DE MAYO DE 2026	SABADO 02 DE MAYO DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	0	2	4	5	0	4	15
SEMANA 5	LUNES 04 DE MAYO DE 2026	MARTES 05 DE MAYO DE 2026	MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	VIERNES 08 MAYO DE 2026	SABADO 09 DE MAYO DE 2026	TOTAL
HORAS DE LLUVIAS	6	2	0	3	5	4	20
TOTAL LLUVIA ACUMULADA	**10**	**6**	**10,5**	**8**	**11,5**	**8**	**54**

Tabla 9. Seguimiento de estado del tiempo.

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Una vez revisadas las hojas de vida del personal clave evaluable y personal mínimo requerido, entregadas mediante correo electrónico el 13 de febrero 2026, Se evidencio el cumplimiento al numeral "8.2 Requisitos del personal del Contratista" del ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO del contrato de obra del asunto. Se da aprobación de los siguientes profesionales con comunicación DPC-20582025-018-2026 de fecha 13 de febrero 2026.

El 30 de marzo 2026 con comunicación MC-019-2036-2026 el CONSORCIO WJ-MINCULTURA Solicita el cambio del profesional SSTMA, interventoría realiza la revisión y emite aprobación mediante comunicado DPC-20582025-046-2026.

CARGO	NOMBRE	CUMPLE SI/NO	OBSERVACION	FECHA DE APROBACION
DIRECTOR DE OBRA	FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
RESIDENTE DE OBRA	DILSON JESUS PINEDA MORALES	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
PROFESIONAL SOCIAL	CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ PERILLA	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	WILFRAN DÍAZ LARA	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA GEOTECNICO	YOCIMAR LOZANO URREGO	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	CARLOS ALBERTO BULLA SAENZ	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICO	JORGE MARIO TIRADO RODRIGUEZ	SI	APROBADO	13 de febrero 2026
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE	ELIANA PAOLA GANTIVAR NIVIA	SI	APROBADO	30 de marzo de 2026

Tabla 10. Personal del contrato de obra.

3.3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA DE OBRA Plazo Meses	FECHA DE ACTA DE INICIO OBRA	FECHA TERMINACIÓN DE OBRA	PLAZO DE EJECUCIO N MESES	% PROGRAM	% REAL EJECUTADO	% DE ADELANTO O ATRASO (Si aplica)
Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional - (LOTE 1)" LITORAL DE SAN JUAN	2 mes	10/03/2026	09/10/2026	7 meses	7.09%	6.79%	0.30%

Tabla 11. Estado actual del contrato de obra.


3.4. PROGRAMACIÓN

En el seguimiento a la programación realizado por la interventoría, se solicito en plan de contingencia al contratista de obra, en comités de seguimiento y en comunicación DPC-20582025-042-2026 del 24 de marzo 2026, el 11 de abril 2026 con comunicado DPC-20582025-050-2026 con asunto: *TRASLADO COMUNICACIÓN MC08640S2026* CON ASUNTO "Subsanación Presunto Incumplimiento". Una vez recibida la comunicación MC08640S2026 de fecha 10 abril 2026 hora 5:49 pm, con asunto "Subsanación Presunto Incumplimiento", donde la Entidad está elevando una alerta al cumplimiento de sus obligaciones en el marco del desarrollo del contrato 2036-2025, e invita al contratista para que se dé cumplimiento de manera inmediata a las actividades y así evitar el inicio de un proceso para imposición de multas.

El 14 de abril 2026 con comunicación MC-023-2036-2026 asunto "*Respuesta radicado el MC08640S2026*" el CONSORCIO WJ-MINCULTURA entrega plan de contingencia incluida la reprogramación que garantiza la terminación dentro del plazo contractual.

interventoría está revisado la reprogramación, evaluando los rendimientos indicados en el documento y lo real en obra, dadas las condiciones climáticas y de suministro de material que no son constantes en tiempo y dificultan mantener el rendimiento para el avance en la ejecución de las actividades.

A la fecha del presente informe se presenta un porcentaje ejecutado de 6.79% Vs un programado de 7.09%, presentando un atraso del 0.30%.

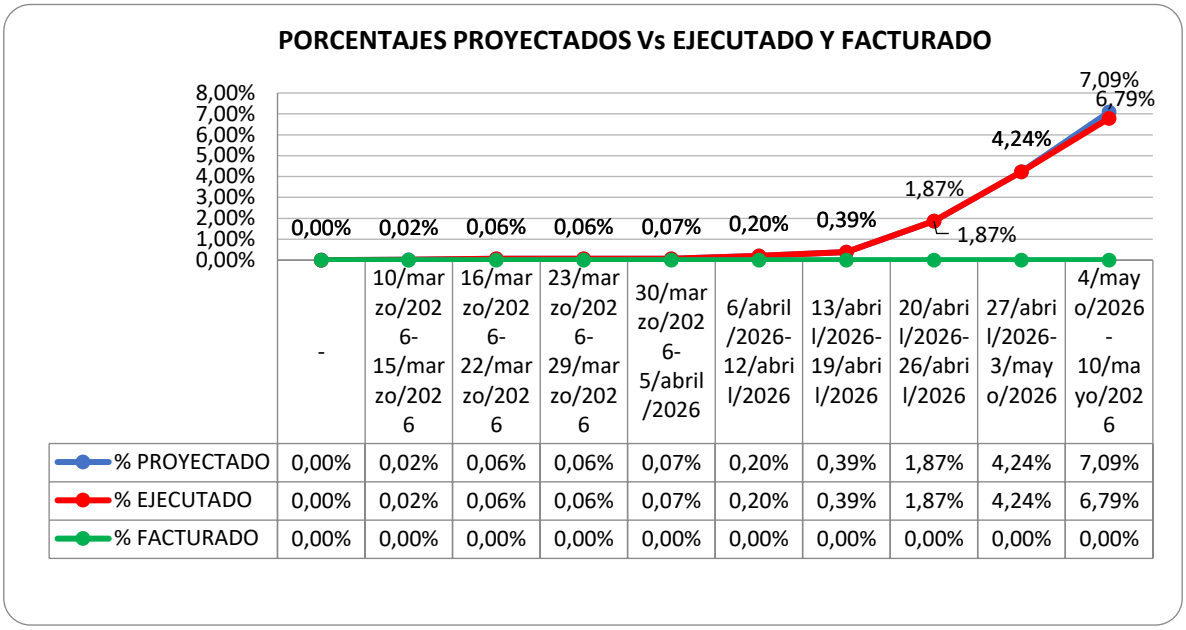

	-	10/marzo/2026-15/marzo/2026	16/marzo/2026-22/marzo/2026	23/marzo/2026-29/marzo/2026	30/marzo/2026-5/abril/2026	6/abril/2026-12/abril/2026	13/abril/2026-19/abril/2026	20/abril/2026-26/abril/2026	27/abril/2026-3/mayo/2026	4/mayo/2026 - 10/mayo/2026
% PROYECTADO	0,00%	0,02%	0,06%	0,06%	0,07%	0,20%	0,39%	1,87%	4,24%	7,09%
% EJECUTADO	0,00%	0,02%	0,06%	0,06%	0,07%	0,20%	0,39%	1,87%	4,24%	6,79%
% FACTURADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.5. CONTROL DE OBRA.

Para el control en obra el 21 de abril 2026 con comunicación DPC-20582025-054-2026 interventoría solicita al contratista de obra, transcurrido el primer mes de inicio del contrato y de inicio de la ejecución de actividades se solicita la actualización del plan de calidad teniendo en cuenta los siguientes factores y entregables:

- Plan de calidad
- Cronograma de actividad - actualizado
- Matriz de gestión de riesgos
- Formato cantidades de obra
- Listado de insumos de obra
- Listado maestro de documentos
- Organigrama
- Plan de compras
- Plan de inspección y ensayos
- Control de cambios de diseño y desarrollo
- Preservación del producto

- Control del producto no conforme
- Seguimiento y medición
- Plan de auditorías (incluidos componentes transversales (Ambiental - Social - SST)
- Gestión de acciones correctivas - preventivas

3.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA

Durante el periodo del presente informe para la ejecución del contrato, el contratista desarrolla las siguientes actividades:

1. Se realiza hincado de pilotes
2. Excavación para dados ejes 1-2 y 3 entre A´ -E
3. Solados en dados ejes 1-2 y 3 entre A´-E
4. Figurado de acero para dados y columnas

3.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS EN OBRA

Las actividades que se proyectan para la ejecución de obra son:

1. Continuar con excavaciones para dados
2. Hincado de pilotes en madera
3. Solado de limpieza
4. Armado acero para dados y fundida de la mismos
5. Figurado de aceros para dados y columnas

3.8. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha tramitado ante el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes el anticipo por un valor de $ 438.480.000, a la fecha no se han tramitado actas de cobro parcial.

CONCEPTO	VALORES	PORCENTAJES
VALOR TOTAL	$ 2.403.600.747,00	100%
VALOR PROGRAMADO	$ 170.415.292,96	7,09%
VALOR EJECUTADO:	$ 163.204.490,72	6.79%
VALOR ANTICIPO	$ 438.480.000,00	18,24%
VALOR FACTURADO	$ -	0.0%

Tabla 12. Estado financiero del contrato de obra.

3.9. FLUJO DE CAJA PROGRAMADO

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas y programadas se presenta el flujo de inversión del periodo de este informe:

INICIO	FIN	INVERSIÓN SEMANAL	% INVERSIÓN SEMANAL	INVERSIÓN ACUMULADA	% INVERSIÓN ACUMULADA
6/04/2026	12/04/2026	$ 3.124.680,97	0,13%	$ 4.807.201,49	0,20%
13/04/2026	19/04/2026	$ 4.566.841,42	0,19%	$ 9.374.042,91	0,39%
20/04/2026	26/04/2026	$ 35.573.291,06	1,48%	$ 44.947.333,97	1,87%
27/04/2026	3/05/2026	$ 56.965.337,70	2,37%	$ 101.912.671,67	4,24%
4/05/2026	10/05/2026	$ 61.291.819,05	2,55%	$ 163.204.490,72	6,79%
11/05/2026	17/05/2026	$ 61.927.418,22	2,58%	$ 225.131.908,94	9,37%

Tabla 13. Flujo de caja

3.10. CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD.

Para el seguimiento de la calidad de los materiales se cuenta con los certificados de calidad y ficha técnica de:

CEMENTO	- Marca: Cementos San Marcos - Norma: técnica colombiana NTC 121: 2014 (Tipo UG). - Certificado INCONTEC ISO 9001 - SC - CER290780
ACERO	- Marca: Ternium Colombia S.A.S. - No. Informe:164198 - Diámetros ½” - No. Informe 165223 - Diámetros 5/8” Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas: - Composición Química: NTC 5192: 2024 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2024 -Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2024 - Doblado: NTC 2289:2020 Num. 10, NTC 3353: 2024, Num. 15, NTC 1:2024 - Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8 - Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11

3.10.1. RESULTADOS DE LABORATORIOS

- **CONCRETO**: El 24 de marzo 2026 El CONSORCIO WJ-MINCULTURA hace entrega del diseño de mezcla para un concreto de 24 Mpa (3500 psi) elaborado en el laboratorio JPC INGENIERO CIVIL-INGENIEROS LTDA, quedando la dosificación de la siguiente manera:

Materiales por m3 de concreto		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Cemento	sacos	9
Grava	cajones 33x33x33cm	14
Arena	cajones 33x33x33cm	14
Agua material seco	Lt	171
Agua material húmedo	Lt	161
Asentamiento	Pul	6

Tabla 14. Diseño de mezcla por m3

Materiales por saco de cemento		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Cemento	sacos	1
Grava	cajones 33x33x33cm	1,5
Arena	cajones 33x33x33cm	1,5
Agua material seco	Lt	19
Agua material húmedo	Lt	18
Asentamiento	Pul	6

Tabla 15. Diseño de mezcla por saco de cemento.

3.10.2. CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS

Los equipos utilizados en el presente fueron:

NIVEL AUTOMATICO	Certificado de calibración -007-26 Fecha de expedición: enero 08 de 2026 Fecha de próxima revisión sugerida: julio 08 de 2026 MARCA: TOPCON NÚMERO DE SERIE: WP131297 REFERENCIA: AT-B4A
ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA	Certificado de calibración -007-26 Fecha de expedición: enero 08 de 2026 Fecha de próxima revisión sugerida: julio 08 de 2026 MARCA: CYGNUS REFERENCIA: KS-102 NÚMERO DE SERIE: HV2250

3.11. ACTAS GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el periodo de este informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento al contrato de obra, con la participación de la supervisión del MINCULTURA, interventoría y contratista de obra.

Descripción	Número	Fecha
Comité de seguimiento	08	15 - 04-2026
Comité de seguimiento	09	22 - 04 2026
Comité de seguimiento	10	28- 04 2026
Comité de seguimiento	11	05- 05 2026

Tabla 16. Relación de actas de comité.

*Ver **Anexo** (Copia de actas de comité).*

3.12. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025				
Fecha	**No. consecutivo**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
11/04/2026	DPC-20582025-050-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	TRASLADO COMUNICACIÓN MC08640S2026 CON ASUNTO “Subsanación Presunto Incumplimiento”.	https://drive.google.com/file/d/1Q7buvTpj7PxLuIX1apWIMRuoRqIGgC1L/view?usp=drive_link
13/04/2026	DPC-20582025-051-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORMES DE INTERVENTORIA SEMANA 5	https://drive.google.com/file/d/1CBZ44qq6mN3xiQWTcT4xcFGV4dB75uL4/view?usp=drive_link
21/04/2026	DPC-20582025-052-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORMES DE INTERVENTORIA SEMANA No.6	https://drive.google.com/file/d/1H0NH5OLZ-4ge66z2olmM55RdzdXJ-a2n/view?usp=drive_link
21/04/2026	DPC-20582025-053-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	APROBACION CAMBIO DIRECTOR DE OBRA	https://drive.google.com/file/d/1esrpNdSdHe7h4S6Ir6yQptQtEQUkN68i/view?usp=drive_link
22/04/2026	DPC-20582025-055-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	SOLICITUD ACTUALIZACION PLAN DE CALIDAD-PROGRAMA SST- AMBIENTAL- SOCIAL	https://drive.google.com/file/d/1pfPmmZ7eT09jXV1vB6Qgl_0t6liaF6j8/view?usp=drive_link
22/04/2026	DPC-20582025-056-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORMES DE INTERVENTORIA MENSUAL No.1	https://drive.google.com/file/d/19fOmpOpr6cVM19DRXYD4852sdILZOxkr/view?usp=drive_link
27/04/2026	DPC-20582025-057-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORMES DE INTERVENTORIA SEMANA No.7	https://drive.google.com/file/d/1i7OIaxPG4SaGUN49F1eDrSvAUWnc_-Ph/view?usp=drive_link
05/05/2026	DPC-20582025-058-2026	MINCULTURA	ENTREGA INFORMES DE INTERVENTORIA SEMANA No.8	https://drive.google.com/file/d/1n6y0I72nO8gxFnuI-7s3jFCs1AciWJ0s/view?usp=drive_link
06/05/2026	DPC-20582025-059-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONTRATO DE OBRA No. 2036-2025 SOLICITUD ACTUALIZACION PLAN DE CONTINGENCIA	https://drive.google.com/file/d/1mCT8nX5ozICk-14rJbdGivSwLUyi4VB7/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025				
Fecha	**No. consecutivo**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
07/05/2026	DPC-20582025-060-2026	MINCULTURA	SOLICITUD AJUSTE AL DISEÑO ESTRUCTURAL-CIMENTACION	https://drive.google.com/file/d/1tgfH2GznOoXjgWyhmjY9ojIqRHjddX_b/view?usp=drive_link

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR EL CONSORCIO INTER CULTURAL 2025					
Fecha	**No. consecutivo**	**Emitida por:**	**Dirigido a:**	**Asunto**	**ENLACE**
10/04/2026	Sin Código	MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Subsanación Presunto Incumplimiento	https://drive.google.com/file/d/1TzcZVWYk8HovxCCEGURAaZMz_xBNFMqv/view?usp=drive_link
13/04/2026	MC-022-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Entrega Diseño de Mezcla	https://drive.google.com/file/d/18zjode1kdafYD5Mc6tfq4A5HDa78J7Gq/view?usp=drive_link
13/04/2026	MC-024-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Solicitud reprogramación comité de seguimiento	https://drive.google.com/file/d/149w6lt9-LPdxP9_ulbnnA7uz8Ze5lX42/view?usp=drive_link
14/04/2026	MC-023-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Respuesta radicado MC08640S2026	https://drive.google.com/file/d/10Jc7AY2G8voUy-iCdQAUiaGMusujtdx9/view?usp=drive_link
20/04/2026	MC-025-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Entrega informes semanales	https://drive.google.com/file/d/1ozNsbscdJN7exn8LtZKnkAaXgZ4Fip3T/view?usp=drive_link
20/04/2026	MC-026-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Entrega primer informe mensual	https://drive.google.com/file/d/1HnxVbsaLO3o_lxSc4vy_oZaDVed39-Mz/view?usp=drive_link
20/04/2026	MC-026-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Solicitud cambio director de obra	https://drive.google.com/file/d/1he-BHhc6lHrZN8pxTqrtC82oPx_5AH24/view?usp=drive_link
30/04/2026	MC-027-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Remisión Documentación personal de Obra	https://drive.google.com/file/d/1d_5UJN4H-OSDuPx4FRadgwjOoFsUiOtL/view?usp=drive_link
06/05/2026	MC-028-2036-2026	CONSORCIO WJ-MINCULTURA	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	Remisión Plan de gestión Social Actualizado	https://drive.google.com/file/d/17mKFdHfLJaX3qsEd3Sxa9TFyOxHhSIwA/view?usp=drive_link

Tabla 17. Relación de correspondencia enviada y recibida

Ver **anexo**. (Relación de correspondencia enviada y recibida).

3.13. ESTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITES Y LICENCIAS.

- Licencia urbanística de construcción, resolución No.837 del 02 de abril de 2025, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 184-25305 del 18 de abril de 2024 con un área de 1.125 m2 en el barrio El Firme.

- Servicios públicos.

- Energía: El 16 de marzo 2026, se radico ante la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA DEL LITORAL DEL SAN JUAN SAS ESP- ENERLITORL SAS ESP, la solicitud de la provisional de energía, el día 7 de mayo la empresa realizo la conexión.

- Agua: El 07 de abril 2026 de radico ante la alcaldía municipal la solicitud de conexión de agua provisional, desde el día 13 de mayo la obra cuenta con la provisional.

- Permisos y/o autorizaciones.


- Salvo conducto expedido por CODECHOCO con No. 119110496630 para la madera de especie chanul aserrado, con fecha 09 de abril 2026.

- Autorización por parte del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) para el aprovechamiento de gravilla y arena (material del río) a cargo de Consejo Comunitario local del Docordó con fecha de expedición 10 de abril 2026.

3.14. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES O DETALLES DEL PROYECTO.

A la fecha no se ha presentado cambio de especificaciones técnicas del proyecto.

El 07 de mayo 2026 con comunicación DPC-20582025-060-2026 se solicita el ajuste al diseño de la cimentación, dadas las condiciones encontradas en campo respecto a los niveles de los elementos que conforman la cimentación, verificadas con el plano de corte estructural E 006 V1, Tal como se informó en el comité de seguimiento del 05 de mayo 2026, donde los niveles no son acordes a la realidad, y como resultado de esta verificación se propone la posibilidad de eliminar la viga inferior teniendo en cuenta la longitud en la que quedaría la columna (1.32m).

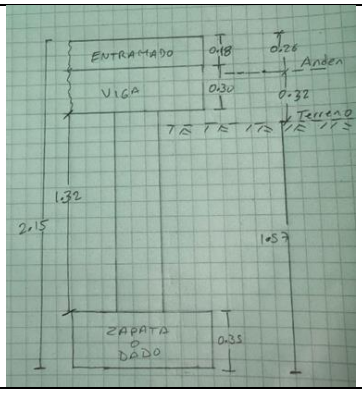

Esquema elaborado con las medidas en campo

3.15. LIBRO DE OBRA- BITÁCORA.

Ver **Anexo**. (Copia de bitácora).

3.16. RESEÑA FOTOGRÁFICA

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 1. Adecuación campamento</td><td>Foto 2. Toma niveles desplante de dado C2</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 3. Excavación para dado C1</td><td>Foto 4. Excavación para dados ejes B1-B2-C1-C2</td></tr>
</table>

	
Foto 5. Revisión de nivel 0.0 con respecto al anden	Foto 6. Toma nivel y solado para dado C2
	
Foto 7. Toma de nivel para descabece de pilotes	Foto 8. Excavación para dados A1 – A'1
	
Foto 9. Excavación para dados E2-E3	Foto 10. Revisión y verificación de ejes entre ejes A1 al A4 y E1 al E4

Ver **Anexo**. (Registro fotográfico).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda al Consorcio WJ-MINCULTURA realizar los pedidos de material y equipos con tiempo dada la dificultad y el tiempo en transporte, para evitar atrasos.

- ✓ El ajuste al diseño de la cimentación es importante, dadas las condiciones encontradas en campo respecto a los niveles de los elementos que conforman la cimentación, verificadas con el plano de corte estructural E 006 V1, Tal como se informó en el comité de seguimiento del 05 de mayo 2026, donde los niveles no son acordes a la realidad, y como resultado de esta verificación se propone la posibilidad de eliminar la viga inferior teniendo en cuenta la longitud en la que quedaría la columna (1.32m).

- ✓ La lluvia y el nivel freático de la zona, han dificultado el rendimiento en la ejecución de las actividades de cimentación.

- ✓ La interventoría seguirá velando por el cumplimiento de la calidad, y de las buenas prácticas en la ejecución de las actividades, así mismo en el cumplimiento de la normatividad vigente.
