NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

INFORME No 6
CONTRATO 2025042

OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

CONTRATISTA
INGNOVATEK SAS

INTERVENTORIA
LAINSCO INGENIERIA S.A.S

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TURMEQUE
Abril 2026

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4
2.1 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No 2025042 4
2.2 ASPECTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA 5
2.2.1 CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 5
3. BALANCE FINANCIERO 12
3.1 CONTROL DE CALIDAD 13
3.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA 13
4. LOCALIZACIÓN 15
5. GENERALIDADES 16
5.1. OBJETO: 16
5.2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 16
5.3. AVANCE EN TIEMPO 16
CONCLUSIONES 21

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

1. INTRODUCCIÓN

En el Municipio de Turmequé (Boyacá), con el fin de garantizar una mejor calidad de vida y unas vías dignas para el fortalecimiento de la economía en el municipio se requiere de la intervención en la sustitución de redes de alcantarillado para así garantizar y proyectar unas redes de alcantarillado que suplan la capacidad de caudal de dicho municipio, así mismo evidenciando el alto tráfico de camiones de carga se es viable crear una vía adecuada para este tipo de tráfico, y así aportar en el desplazamiento de productos del campo para apoyar en la economía de este Municipio, para ello adelantó el proceso contractual No 2025042, cuyo objeto es la "**REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ"**

ASIGNADO A LA EMPRESA **INGNOVATEK SAS**, para construir bajo los parámetros de la viabilidad expedida por la norma NSR-10, con las determinantes para este tipo de obras, al igual que las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas anexas al mismo.

El presente informe resume los avances que presenta el proyecto en el período de abril de 2026.

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

2.1 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No 2025042

CONTRATANTE	EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO
IDENTIFICACIÓN	NIT. No 891.855.130-1
CONTRATO DE OBRA	No. 2025042
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
CONTRATISTA	INGNOVATEK SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.049.606.567
VALOR DEL CONTRATO	($1.310.284.000 M/C)
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
ACTA DE INICIO	VEINTE (20) DE OCTUBRE 2025

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

2.2 ASPECTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

2.2.1 CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

El Contrato tiene las siguientes condiciones originales en ítems, cantidades y valores contratados:

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÓN E IFRAESTRUCUTRA DE SOGAMOSO S.A.S
NIT.901881213-1

NIT: 891.855.130-1	eri s.a.s	FECHA: 2024/11	Sogamoso VERSIÓN 0

				CONDICIONES INICIALES						
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST (%)**	**COSTO DITECTO VR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)**	**VR TOTAL (COSTO DIRECTO)**	**VR TOTAL (INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)**
1.1	**PRELIMINARES VÍAS**						TIPO:		OBRA PÚBLICA	
1.11	**3.13.09**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	ML	594.31	0.00%	$ 48,378.90	$ 63,616.80	$ 28,752,065.10	$ 37,808,098.23
1.12	**3.06.07**	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	M2	1,624.28	0.00%	$ 11,307.24	$ 14,868.68	$ 18,366,123.79	$ 24,150,898.72
1.13	**1.01.11**	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	ML	545.36	0.00%	$ 6,180.50	$ 8,127.17	$ 3,370,597.48	$ 4,432,234.00
							COSTO DIRECTO GRUPO		$ 50,488,786.37	
							A		$ 12,368,229.53	
							I		$ 1,009,775.73	
							U		$ 2,524,439.32	
							VALOR TOTAL A.I.U		$ 15,902,444.57	
							COSTO DIRECTO + AIU		$ 66,391,230.95	$ 66,391,230.95
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)**	**VR TOTAL (COSTO DIRECTO)**	**VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)**

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

1.2	**PRELIMINARES ALCANTARILLADO**						TIPO:		OBRA PÚBLICA	
1.21	**3.02.07**	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Precios Gober.	M3	649.71	0.00%	$ 16,429.53	$ 21,604.34	$ 10,674,429.94	$ 14,036,553.34
1.22	**3.03.10**	EXCAVACION MANUAL EN M		M3	1243.59	0.00%	$ 64,546.54	$ 84,876.75	$ 80,269,431.68	$ 105,551,881.11
							COSTO DIRECTO GRUPO		$ 90,943,861.61	
							A		$ 22,278,502.52	
							I		$ 1,818,877.23	
							U		$ 4,547,193.08	
							VALOR TOTAL A.I.U		$ 28,644,572.84	
							COSTO DIRECTO + AIU		$ 119,588,434.45	$ 119,588,434.45
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)**	**VR TOTAL (COSTO DIRECTO)**	**VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)**
2	**ALCANTARILLADO Y DESAGÜES**						TIPO:		OBRA PÚBLICA	
2.01	**3.13.36**	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	Precios Gober.	M3	236.68	0.00%	$ 115,320.06	$ 151,642.40	$ 27,293,951.80	$ 35,890,723.22
2.02	**3.03.15**	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	Precios Gober.	M3	616.98	0.00%	$ 90,646.13	$ 119,196.93	$ 55,926,849.29	$ 73,542,119.62
2.03	**Ref 2.06.04**	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN TUBERIA	Referencia	UND	105.00	7.00%	$ 487,084.66	$ 674,597.56	$ 54,723,961.55	$ 70,832,743.80
2.04	**2.06.20**	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	Precios Gober.	ML	509.85	0.00%	$ 9,841.03	$ 12,940.66	$ 5,017,449.15	$ 6,597,794.26

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

2.05	**Ref 2.05.53**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Refencia	ML	576.00	7.00%	$ 133,100.45	$ 184,340.11	$ 82,032,469.34	$ 106,179,903.36
2.06	**2.05.04**	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0 < H < 2.5	Precios Gober.	UND	4.00	7.00%	$ 3,275,747.91	$ 4,536,812.03	$ 14,020,201.05	$ 18,147,248.12
2.07	**2.05.05**	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	Precios Gober.	UND	6.00	7.00%	$ 2,451,553.56	$ 3,395,327.72	$ 15,738,973.86	$ 20,371,966.32
2.08	**1.02.04**	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Precios Gober.	UND	105.00	7.00%	$ 308,617.31	$ 427,425.66	$ 34,673,154.78	$ 44,879,694.30
2.09	**2.06.25**	SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EI FORMA, REF Y CONST. INCL. T	[illegible]	UND	5.00	0.00%	$ 4,075,711.13	$ 5,359,437.18	$ 20,378,555.65	$ 26,797,185.90
2.10	**3.12.03**	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-KM	36,195.18	0.00%	$ 2,312.50	$ 3,040.87	$ 83,701,353.75	$ 110,064,755.10
2.11	**Ref 2.05.59**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Referencia	ML	20.95	7.00%	$ 75,539.05	$ 104,619.31	$ 1,693,321.11	$ 2,191,774.54
							COSTO DIRECTO GRUPO		$ 395,200,241.33	
							A		$ 96,812,136.82	
							I		$ 7,904,004.83	
							U		$ 19,760,012.07	
							VALOR TOTAL A.I.U		$ 124,476,153.71	
							COSTO DIRECTO + AIU		$ 519,676,395.04	$ 515,495,908.54

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÓN E IFRAESTRUCUTRA DE SOGAMOSO S.A.S
NIT.901881213-1

NIT: 891.855.130-1	eri s.a.s	FECHA: 2024/11	Sogamoso VERSIÓN 0

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)
3	**PAVIMENTO RIGIDO**						TIPO:		OBRA PÚBLICA	
3.01	**3.08.19**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	Precios Gober.	ML	545.36	7.00%	$ 52,796.51	$ 73,121.57	$ 30,808,622.02	$ 39,877,579.42
3.02	**2.01.11**	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	M3	324.86	0.00%	$ 95,423.56	$ 125,479.10	$ 30,999,297.70	$ 40,763,141.30
3.03	**3.10.12**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gober.	KG	2,959.48	7.00%	$ 7,002.12	$ 9,697.72	$ 22,173,218.48	$ 28,700,208.39
3.04	**3.12.03**	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-KM	13,774.06	0.00%	$ 2,312.50	$ 3,040.87	$ 31,852,513.75	$ 41,885,094.66
3.05	**3.05.01**	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA RIOSTRAS	Precios Gober.	M3	324.86	0.00%	$ 813,308.73	$ 1,069,476.44	$ 264,211,474.03	$ 347,430,117.68
3.06	**3.13.26**	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	M3	4,587.79	7.00%	$ 7,389.45	$ 10,234.17	$ 36,274,331.95	$ 46,952,222.78
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ 416,319,457.94	
								A	$ 101,985,707.77	
								I	$ 8,326,389.16	
								U	$ 20,815,972.90	
								VALOR TOTAL A.I.U	$ 131,128,069.82	

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

							COSTO DIRECTO + AIU		$ 547,447,527.76	$ 545,608,364.23
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST.**	**VR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)**	**VR TOTAL (COSTO DIRECTO)**	**VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y AIU)**
4	**SEÑALIZACIÓN**						TIPO:		OBRA PÚBLICA	
4.01	**3.09.10**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Precios Gober.	UND	4.00	7.00%	$ 394,494.91	$ 546,363.55	$ 1,688,438.21	$ 2,185,454.20
4.02	**3.09.04**	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	Precios Gober.	M2	233.00	0.00%	$ 64,532.77	$ 84,858.65	$ 15,036,135.41	$ 19,772,064.46
4.03	**3.09.17**	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	ML	1,710.00	0.00%	$ 3,187.59	$ 4,191.58	$ 5,450,778.90	$ 7,167,609.82
							COSTO DIRECTO GRUPO		$ 22,175,352.52	
							A		$ 5,432,292.39	
							I		$ 443,507.05	
							U		$ 1,108,767.63	
							VALOR TOTAL A.I.U		$ 6,984,567.06	
							COSTO DIRECTO + AIU		$ 29,159,919.59	$ 29,125,128.48

SUBTOTAL **$ 1,282,263,507.79**

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÓN E IFRAESTRUCUTRA DE SOGAMOSO S.A.S
NIT.901881213-1

NIT: 891.855.130-1	eri s.a.s	FECHA: 2024/11	Sogamoso VERSIÓN 0

COSTO DIRECTO				$ 975,127,699.78
Bienes		$ -		
Servicios		$ -		
Obra Pública		$ 975,127,699.78		
COSTO INDIRECTO				$ 335,156,300.22
Administración	24.5%	$ 238,876,869.02		
Imprevistos	2.00%	$ 19,502,554.00	AIU	$ 307,135,808.01
Utilidad	5.00%	$ 48,756,384.99		
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)		Otro Tipo de Gastos Adicionales		$ 5,900,247.00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL		Otro Tipo de Gastos Adicionales		$ 21,460,245.21
Caracterización vial (0,30 kms)		Otro Tipo de Gastos Adicionales		$ 660,000.00
TOTAL				$ 1,310,284,000.00

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

3. BALANCE FINANCIERO

El contrato No. 2025042 realizado con la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, cuyo objeto es**: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ."** tiene un valor inicial de MIL TRECIENTOS DIEZ MILLONES CON DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS **($1.310.284.000**) MCTE

RESUMEN FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 1,310,284,000.00	100%
VALOR RECIBIDO COMO ANTICIPO	$ 655,142,000.00	50%
ACTA PARCIAL 1	1.015.473.614,70	77.5%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,080,806,832.43	82%
VALOR POR EJECUTAR	$ 276,177,139.00	18%

A la fecha se ha recibido el valor correspondiente al anticipo del 50%, por valor de; ($655.142.000,00) seiscientos cincuenta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil pesos. Mda/Legal, asi mismo se ha recibo un pago por acta parcial 1, por valor de ($ 360.331.614,70) Trecientos sesenta millones, trecientos treinta y un mil, seiscientos catorce pesos con setenta centavos. Mda/Legal.

3.1 CONTROL DE CALIDAD

Todos los materiales que se usen durante el proceso de ejecución de la obra cumplen con especificaciones técnicas descriptas en dicho contrato, para así garantizar el desarrollo y cumplimiento del contrato No 2025042.

3.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

3.2.1 PERSONAL

EL Contratista de Obra mantiene con disponibilidad del Ciento por Ciento (100%), al siguiente personal en campo:

Director de Obra (1)
Residente de Obra (1)
Maestro General de Obra (1)
Ayudantes (2)

3.2.2 CONTROL DE GARANTIAS

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 2025042			
No. Póliza	39-44-101175997		**ANEXO 0**
Compañía de seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición	26/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	24/09/2025	24/08/2026	$ 131.028.400
Buen Manejo del Anticipo	24/09/2025	24/08/2026	$ 655.142.000
Prestaciones Sociales	24/09/2025	25/04/2029	$ 131.028.400
Estabilidad de la obra	24/09/2025	23/09/2030	$ 393.085.200
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 2025042			
No. Póliza	39-44-101175997		**ANEXO 2**
Compañía de seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

Fecha de expedición	21/10/2025		
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	20/10/2025	19/09/2026	$ 131.028.400
Prestaciones Sociales	20/10/2025	21/05/2029	$ 131.028.400
Buen Manejo del Anticipo	20/10/2025	19/09/2026	$ 655.142.000
Estabilidad de la obra	5 años		$ 393.085.200


PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 2025042			
No. Póliza	39-40-101046085		**ANEXO 0**
Compañía de seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición	26/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Predios, Labores y Operaciones. Patronal. Contratistas y Subcontratistas. Vehículos propios y no propios	24/09/2025	25/04/2026	$ 284.700.000

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 2025042			
No. Póliza	39-40-101046085		**ANEXO 2**
Compañía de seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición	21/10/2025		
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Predios, Labores y Operaciones. Patronal. Contratistas y Subcontratistas. Vehículos propios y no propios	20/10/2025	21/05/2026	$ 284.700.000

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

4. LOCALIZACIÓN



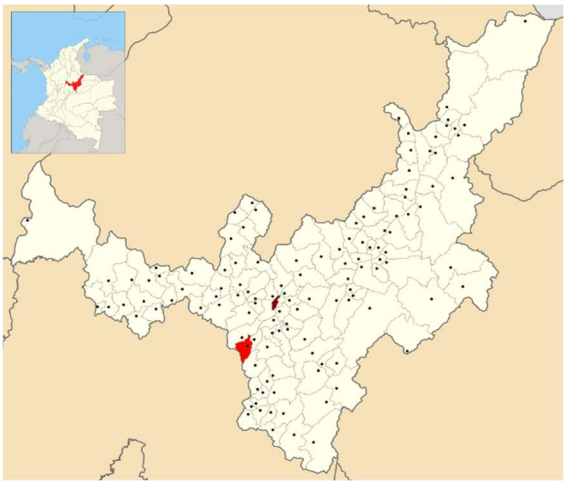

Fotografía 1 Localización Municipio de Turmequé

LOCALIZACION DE OBRA

El municipio de Turmequé se encuentra ubicado en la parte central del departamento de Boyacá, hace parte del altiplano Cundiboyacense y de la vertiente oriental andina, la cual se encuentra dentro de las cartas geológicas K 12 y J -12 e
Está ubicado a una distancia de 45 km al sur de Tunja. Este municipio limita al occidente con Ventaquemada, al oriente Úmbita, al norte con Nuevo Colón y al sur con Villapinzón. Se encuentra junto al cerro de pozo negro y cerca al páramo de Guacheneque donde nace el río Bogotá.

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

5. GENERALIDADES

5.1. OBJETO:

Consolidar la información técnica y de cantidades de avance de obra, desarrollo y ejecución del proyecto, definidas dentro del inventario físico realizado y aceptado por la interventoría y supervisión, conteniendo los siguientes aspectos: Generalidades del Proyecto, descripción del proyecto, Condiciones del Contrato de obra, programación de obra, condiciones de avance del proyecto, estado financiero, entre otros.

Definir el alcance y aspectos generales en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y del alcance en el cumplimiento del objeto contractual, celebrado con la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, cuyo objeto es**: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ."**

5.2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO:

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en la ejecución de la **"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ."**


PAVIMENTO RIGIDO
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo
Concreto para pavimento rígido 24.5 MP

5.3. AVANCE EN TIEMPO

A la fecha del presente informe y de acuerdo con los seis (6) meses transcurridos de ejecución desde la fecha de inicio del contrato, y de acuerdo al plazo final de 7 meses, la obra presento un avance en tiempo del 82%

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

AVANC.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
OBJETIVO	82%	18%	100%

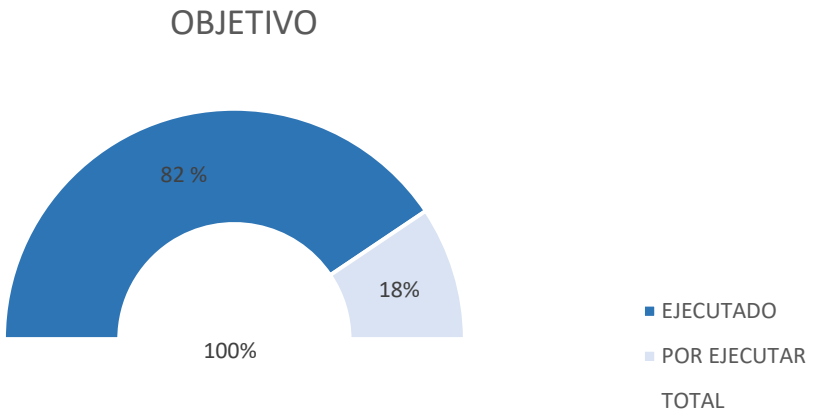

ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.02 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

Se realiza instalación y extendido de material tipo subbase, esta actividad se ejecuta con equipo tipo motoniveladora se realiza el respectivo compactado con vibro compactador todo con el fin de cumplir con lineamientos e indicación es de contrato.

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0









3.03 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

Se realiza suministro e instalación de acero de transferencia y de parrillas en carrera 3 entre calles 2 y 4.

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0









3.05 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA RIOSTRAS

Se realiza vaciado de concreto rígido en la carrera 3 entre calles 2 y 4 , garantizando con especificaciones técnicas de contrato.

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0








NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

CONCLUSIONES

- Durante este periodo se ejecutaron actividades de figurado de acero para aceros de transferencia, así mismo se realiza castas para base de acero del mismo.
- Durante este periodo fue imposible realizar actividades normales ya que, por condiciones climáticas, durante 20 días se trabajó a media macha ya que por fuertes aguaceros era imposible trabajar en actividades.
- Durante este periodo se tiene un avance acumulado del 82%.

Cordialmente



Nombre: ANGEL ALBERTO RIVERA
R/L INGNOVATEK SAS
Documento de Identidad: 1.049.606.567 de Tunja
Dirección: CR 6 #4-53 BARRIO EL RAYO
Teléfono: 3126347261
Correo Electrónico: ingnovatek.sas@gmail.com
