RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901598473	5	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 22 9 27 OF 308		3124116016			FABYRP30@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	38005251	E	2026-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	388.000	17.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38005251	2026-05-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Stdo. Tipo Cot.			
1	CC 73326229	BUITRAGO NEIRA SAMUEL	1.750.905	F	X	X														0			6	6	6	6	PROTECCION -230201	350.181	56.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	350.181	14.100	COMFABOY-CCF10	350.181	14.100	350.181	8.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	92.900	S	4432101
2	CC 1051954341	RIAÑO PIRABAGUE FABIOLA	1.750.905	F	X															0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	1.050.543	168.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.050.543	42.100	COMFABOY-CCF10	1.050.543	42.100	1.050.543	25.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	277.900	S	4432101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901598473	5	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 22 9 27 OF 308		3124116016			FABYRP30@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	38005251	E	2026-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	388.000	17.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38005251	2026-05-20	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.724	1.400.724	1.400.724	1.400.724	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	224.200	0	10.400	0	234.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	56.100	0	2.600	0	58.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	168.100	0	7.800	0	175.900
EPS(Administradoras: 1)				2	56.200	0	2.600	0	58.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	56.200	0	2.600	0	58.800
ARP(Administradoras: 1)				2	34.200	0	1.600	0	35.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	34.200	0	1.600	0	35.800
CCF(Administradoras: 1)				2	56.200	0	2.600	0	58.800
COMFABOY	CCF10	891800213	8	2	56.200	0	2.600	0	58.800

Gran Total		370.800	0	17.200	0	388.000

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901598473	5	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 22 9 27 OF 308		3124116016			FABYRP30@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	38019362	E	2026-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	749.400	18.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	38019362	2026-06-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1053559650	BECERRA CRUZ YERSON DAVID	1.800.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	120.000	19.200	0	0	SANITAS-EPS005	120.000	4.800	COMFABOY-CCF10	120.000	4.800	120.000	3.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	31.800	S	4432101
2	CC 72326229	BUITRAGO NEIRA SAMUEL	1.750.905	F	X															0			5	5	5	5	PROTECCION 230201	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	291.818	11.700	COMFABOY-CCF10	291.818	11.700	291.818	7.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	77.300	S	4432101
3	CC 1051954341	RIAÑO PIRABAGUE FABIOLA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	4432101
4	CC 1007142010	RUIZ MILLAN DIEGO ALEJANDRO	1.800.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	600.000	24.000	COMFABOY-CCF10	600.000	24.000	600.000	14.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	158.700	S	4432101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901598473	5	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 22 9 27 OF 308		3124116016			FABYRP30@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	38019362	E	2026-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	749.400	18.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	38019362	2026-06-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.762.723	2.762.723	2.762.723	2.762.723	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	442.100	0	11.100	0	453.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	46.700	0	1.200	0	47.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	7.000	0	287.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	115.200	0	2.900	0	118.100
EPS(Administradoras: 3)				4	110.600	0	2.900	0	113.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	4.800	0	200	0	5.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	81.800	0	2.100	0	83.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	24.000	0	600	0	24.600
ARP(Administradoras: 1)				4	67.600	0	1.700	0	69.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	67.600	0	1.700	0	69.300
CCF(Administradoras: 1)				4	110.600	0	2.800	0	113.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	110.600	0	2.800	0	113.400
Gran Total					730.900	0	18.500	0	749.400

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901598473	5	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 22 9 27 OF 308		3124116016			FABYRP30@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38006242	E	2026-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	548.100	2.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38006242	2026-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Stb. Tipo Cot.			
1	CC 72326229	BUITRAGO NEIRA SAMUEL	1.750.905	F		X														0			5	5	5	5	PROTECCION 230201	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	291.818	11.700	COMFABOY-CCF10	291.818	11.700	291.818	12.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	82.800	S	4432101
2	CC 1031954341	RIAÑO PIRABAGUE FABIOLA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	4432101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901598473	5	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 22 9 27 OF 308		3124116016			FABYRP30@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38006242	E	2026-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	548.100	2.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38006242	2026-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.042.723	2.042.723	2.042.723	2.042.723	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	326.900	0	1.300	0	328.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	1.100	0	281.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	46.700	0	200	0	46.900
EPS(Administradoras: 1)				2	81.800	0	300	0	82.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	81.800	0	300	0	82.100
ARP(Administradoras: 1)				2	55.400	0	300	0	55.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	55.400	0	300	0	55.700
CCF(Administradoras: 1)				2	81.800	0	300	0	82.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	2	81.800	0	300	0	82.100

Gran Total		545.900	0	2.200	0	548.100

PAGADO

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOYACÁ	CO-FO-35
	NIT: 800023383-7	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 2.0
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL	Fecha: 2026.02.16

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha del presente informe:	viernes, 24 de julio de 2026			
Corresponde al Pago No. :	**Pago 1**	**Acta no.**	**1**	
Comprende al periodo del :	martes, 14 de abril de 2026	**al**	viernes, 24 de julio de 2026	
Numero del contrato:	100.17.4-01-2026 firmado el lunes, 13 de abril de 2026			
Modalidad contractual:	MÍNIMA CUANTÍA			
Tipo de contrato:	OBRA PÚBLICA			
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2026			

	Inicial	Adicional	Liberado	Total
Valor del contrato: (En números)	29,999,966.00	-	-	29,999,966.00
Valor del contrato: (En letras)	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($29999966.000)	0.00%	-	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS


Tipo de razón social:	Persona Jurídica
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOYACÁ Identificada con NIT No. 800023383-7
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS identificado con NIT No. 901598473 y representado legalmente por FABIOLA RIAÑO PIRABAGUE identificado con CÉDULA No. 1051954341
Supervisión del contrato:	ELVIA MARIA ROJAS GARCIA identificado(a) con CÉDULA No. 24202531 expedida en Tuta quien se desempeña como Secretaria de Planeación
Apoyo a la supervisión:	DIANA PAOLA LEGUIZAMON VARGAS identificado(a) con CÉDULA No. 1050170482 expedida en Boyacá quien se desempeña como Profesional de Apoyo
Interventor del contrato:	No Aplica

	Inicial	Prorrogas	Suspensiones	Total
Plazo de ejecución: (En días)	258.00	0.00	0.00	258.00
Plazo de ejecución: (En letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DIAS	0.00	0.00	CIENTO UN DIAS


Disponibilidad Presupuestal:	CDP No. 2026000141 de fecha viernes, 27 de marzo de 2026 por valor de $30000000.000
Registro presupuestal:	No. 2026000200 de fecha lunes, 13 de abril de 2026
Fecha de inicio:	martes, 14 de abril de 2026
Fecha de terminación:	miércoles, 30 de diciembre de 2026

2 AVANCE DEL CONTRATO


Avance financiero



Avance temporal



Avance físico



3 AVANCE FÍSICO CONTRATO

3.1 Contrato inicial

Item	Actividad especifica	Cant. TI	Cant. Acum	Cant. Pres. Acta	% Avance físico	Informe de ejecución	Anexos
1	**MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION**						
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W; EFICACIA 155 LM/W; TENSIÓN NOMINAL 100-277V; TEMP. COLOR 4000K; VIDA ÚTIL 100.000 HRS; TEMP. TRABAJO -25 A 45°C; IP 66; IK 08; INCLUYE FOTOCELDA DE 1000W 460 JOULES	18	0	18	100%	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W; EFICACIA 155 LM/W; TENSIÓN NOMINAL 100-277V; TEMP. COLOR 4000K; VIDA ÚTIL 100.000 HRS; TEMP. TRABAJO -25 A 45°C; IP 66; IK 08; INCLUYENDO FOTOCELDA DE 1000W 460 JOULES	INFORME DE ACTIVIDADES
1.02	SUMINISTRODE INSTALACION DE CONECTORES DP-1	49	0	49	100%	SE REALIZO SUMINISTRODE INSTALACION DE CONECTORES DP-1	INFORME DE ACTIVIDADES
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDAS IP65 460 JOULES 120-277 VAC 50/60 HZ 1000W/1800VA	52	0	52	100%	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDAS IP65 460 JOULES 120-277 VAC 50/60 HZ 1000W/1800VA	INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOYACÁ	CO-FO-35
	NIT: 800023383-7	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 2.0
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL	Fecha: 2026.02.16

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA

1.04	DESPEJE CORREDOR DE LÍNEA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1	0	1	100%	SE REALIZO DESPEJE CORREDOR DE LÍNEA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	INFORME DE ACTIVIDADES
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LED 40W	48	0	48	100%	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LED 40W	INFORME DE ACTIVIDADES
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DRIVERS 50 W	12	0	12	100%	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DRIVERS 50 W	INFORME DE ACTIVIDADES

Promedio Total Fisico Ejecutado: 100%

Convesiones: Cant = Cantidad - **UND**= Unidad de Medida - **ADI**=Cantidades adicionales - **Acum**= Cantidades ejecutadas acumuladas hasta el informe anterior - **Actual**=Cantidades ejecutadas que se reportan en el informe actal - **Evid.** = Numero de la evidencia anexa de ejecución

4 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1 Valor cobrado

Forma de pago:	UN PAGO FINAL SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN 100%

No. Pago	Fecha del acta parcial	Entre el	y el	Valor cobrado
Pago 1	24/07/2026	14/04/2026	24/07/2026	29,999,966
Pago 2	No aplica	No aplica	No aplica	-
			Total cobrado:	**29,999,966**
			Valor aportado por el municipio:	29,999,966
			Valor aportado por el conveniente:	-

Valor a cobrar con el presente informe	**VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 29999966.000**

4.2 Balance financiero

Valor inicial del contrato	29,999,966.00	
Valor adicional del contrato	0.00	
Saldo a favor de la entidad (valor a liberar)		0.00
Valor anticipo		0.00
Valor pago anticipado		0.00
Amortización del anticipo		0.00
Valor pagado del contrato		0.00
Valor presente acta		29,999,966.00
Saldo por pagar contrato		0.00
SUMAS IGUALES (Totales)	**29,999,966.00**	**29,999,966.00**

4.3 Afectación presupuestal del contrato inicial

Rubro	Fuente	Valor	Valor total pagado	Valor a pagar presente acta	Saldo
2,3,2,02,02,005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	29,999,966.00	-	29,999,966.00	-
	TOTAL:	**29,999,966.00**		**29,999,966.00**	**-**

5 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

No. Pago	Fecha Planilla(s)	No Planilla(s)	Salud	Pensiones	ARL	Total	Concepto
Pago 1	22/07/2026 - 22/07/2026 - 22/07/2026	38005251 - 38019362 - 38006242	254,400.00	1,016,000	157,800	1,428,200	CUMPLE
Pago 2							
Pago 3							
		TOTAL	254,400	1,016,000	157,800	1,428,200	CUMPLE

5 FIRMAS

Nombre	Como	Firma
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS R/L: FABIOLA RIAÑO PIRABAGUE	Contratista	
ELVIA MARIA ROJAS GARCIA	Supervisor	
DIANA PAOLA LEGUIZAMON VARGAS	Apoyo a la Supervisor	

	Nombre	*Firma*	*Código TRD*
Proyecto	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS R/L: FABIOLA RIAÑO PIRABAGUE		
Reviso	ELVIA MARIA ROJAS GARCIA		
Aprobó	ELVIA MARIA ROJAS GARCIA		

INFORME FINAL

CONTRATO N°100.17.4-01-2026

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, PARA EL AÑO 2026"

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOYACA- BOYACA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA RIAÑO

JULIO 2026

INTRODUCCION

Para dar cumplimiento a lo requerido para el pago del CONTRATO N°100.17.4-01-2026 OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, PARA EL AÑO 2026" firmado el 13 de abril de 2026 con el municipio de Boyacá, me permito presentar el siguiente informe donde se describen las principales actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

El inicio de los trabajos fue el 14 de abril de 2026, se inicia con el cambio de las luminarias averiadas por luminarias led de 50 W nuevas en el casco urbano del municipio y en la vereda Huerta grande, en los siguientes lugares:

UBICACIÓN	CANTIDAD
Salida Tunja	2
Parque principal	7
Salida Ramiriquí	2
Salida a las cabañas	1
Sector el colegio	3
Vereda Huerta grande	3

Posteriormente, se realiza el despeje del corredor de la línea en la Salida a Tunja, salida Toraba, salida Huerta grande y salida las cabañas.

Se realiza el mantenimiento de luminarias de alumbrado publico realizando el cambio de bombillos de sodio por bombillos led de 40 w, el cambio de fotoceldas que se encontraban en mal estado, también se cambiaron drivers a luminarias led. A continuación se detalla los lugares en donde se realizaron estas actividades:

- Suministro e instalación de fotoceldas: 52 unid

UBICACIÓN	CANTIDAD
Salida Tunja	6
Salida Toraba	8
Salida Huerta Grande	8
Sector el colegio	5
Parque principal	5
Vereda Huerta Grande	4
Salida a las cabañas	10
Iglesia	6

- Suministro e instalación de bombillos led de 40w: 48 unid

UBICACIÓN	CANTIDAD
Parque principal	10
Salida a las cabañas	8
Salida Huerta Grande	9
Salida Toraba	7
Sector el colegio	6
Salida Ramiriquí	6
Iglesia	2

- Suministro e instalación de drivers: 12 unid

UBICACIÓN	CANTIDAD
Parque principal	3
Salida a Toraba	3
Salida Huerta grande	3
Salida las cabañas	3

Luego de finalizados los trabajos se hacen las pruebas de funcionamiento de todos los elementos instalados y se hace la revisión por parte del supervisor del contrato.

Para la ejecución de los trabajos se contrataron técnicos electricistas con sus respectivos cursos de alturas, el INSPECTOR SST estuvo realizando los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para evitar los riesgos durante la ejecución de los trabajos.

EQUIPO UTILIZADO:

- Camioneta doble cabina
- Escaleras en fibra de vidrio
- Pinza de voltaje, herramienta menor
- Elementos de seguridad.

PLAZO DE EJECUCION

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ hasta el treinta (30) de diciembre del 2026 y/o hasta agotar cuantía, previa suscripción del acta de inicio.

INFORMACION FINANCIERA:

VALOR INICIAL CONTRATADO:	$29.999.966
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$29.999.966
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR CANCELADO ACTAS ANTERIORES	$0.00
VALOR PRESENTE ACTA	$29.999.966
VALOR POR EJECUTAR	$0.00

PÓLIZAS

- **POLIZA DE CUMPLIMIENTO**

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. N°51-46-101026650

AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$2.999.996,50	13/04/2026 HASTA 05/07/2027
PRESTACIONES SOCIALES	$5.999.993,20	13/04/2026 HASTA 05/01/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$4.499.994,90	05/12/2025 HASTA 05/07/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$5.999.993,20	30/12/2026 HASTA 30/12/2028

- **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. N°51-54-101004073

AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$350.181.000,00	13/04/2026 HASTA 05/01/2027

Atentamente,

FABIOLA RIAÑO PIRABAGUE
CC 1051954341
R.L CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS
NIT. 901598473-5


SABANA CANTIDADES FINALES

			CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA FINAL		RESIDUO		CANTIDAD TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 50W; EFICACIA ≥ 155 LM/W; TENSIÓN NOMINAL 100 - 277V; TEMP. COLOR 4000K; VIDA ÚTIL 100.000 HRS; TEMP. TRABAJO -25 A 45°C; IP 66; IK 08; INCLUYE FOTOCELDA DE 1000W- 460 JOULES	UND	18	$ 803.583	$ 14.464.494	18	$ 14.464.494,00	0,00	$ -	18,00	$ 14.464.494,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DP-1	UND	49	$ 10.251	$ 502.299	49	$ 502.299,00	0,00	$ -	49,00	$ 502.299,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDAS IP65 460 JOULES 120-277 Vac 50/60 Hz 1000W/1800VA	UND	52	$ 68.421	$ 3.557.892	52	$ 3.557.892,00	0,00	$ -	52,00	$ 3.557.892,00
4	DESPEJE CORREDOR DE LÍNEA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	UND	1	$ 675.528	$ 675.528	1	$ 675.528,00	0,00	$ -	1,00	$ 675.528,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LED 40W	UND	48	$ 64.258	$ 3.084.384	48	$ 3.084.384,00	0,00	$ -	48,00	$ 3.084.384,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DRIVERS 50 W	UND	12	$ 66.025	$ 792.300	12	$ 792.300,00	0,00	$ -	12,00	$ 792.300,00
SUBTOTAL					$ 23.076.897		$ 23.076.897		$ -		$ 23.076.897
ADMINISTRACION			25%		$ 5.769.224		$ 5.076.917		$ -		$ 5.076.917
IMPREVISTOS			2%		$ 461.538		$ 692.307		$ -		$ 692.307
UTILIDAD			3%		$ 692.307		$ 1.153.845		$ -		$ 1.153.845
COSTO TOTAL OBRA					**$ 29.999.966**		**$ 29.999.966**		**$ -**		**$ 29.999.966**

ANEXO FOTOGRAFICO







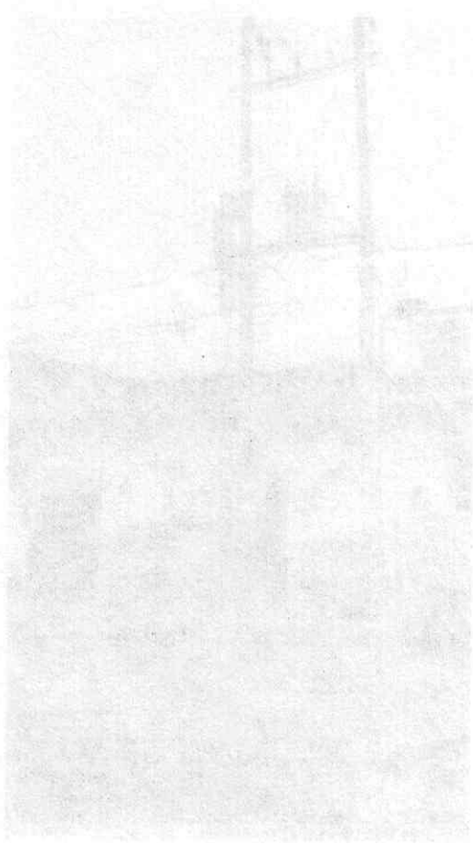


GPS Map Camera
Boyacá, Boyacá, Colombia
Carrera 2, Boyacá, Boyacá, Boyacá 153610, Colombia
Lat 5°26'59.2097"N, Long 73°21'42.3840"W
GMT-05:00
reparación : reparación



GPS Map Camera
Boyacá, Boyacá, Colombia
Calle 6, Boyacá, Boyacá, Boyacá 153610, Colombia
Lat 5°27'18.9686"N, Long 73°21'44.5543"W
GMT-05:00
Reemplazo : Antigua

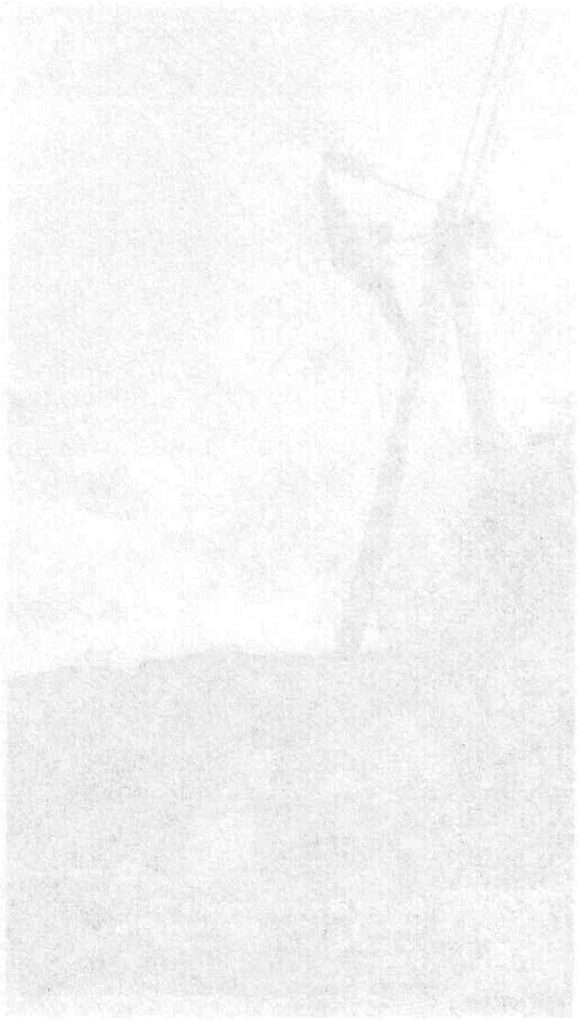


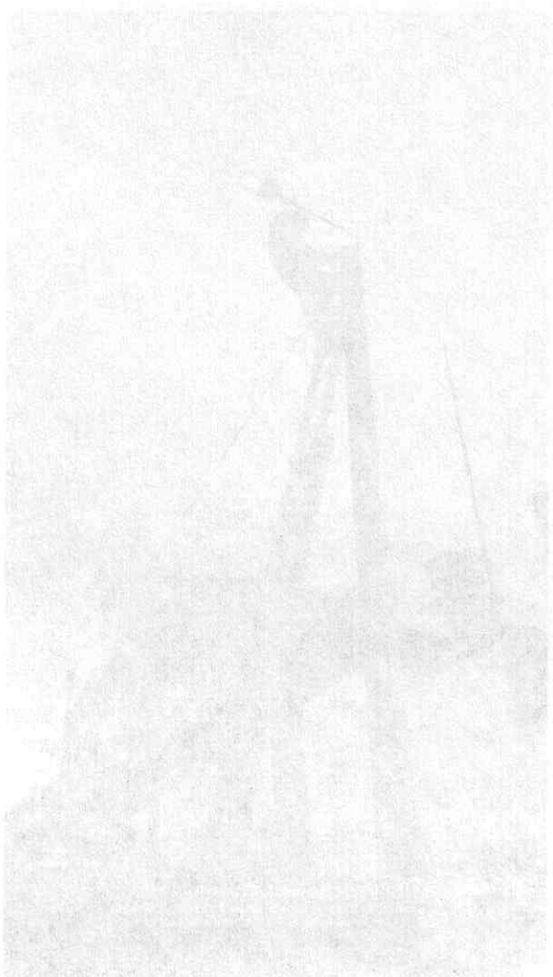



GPS Map Camera
Boyacá, Boyacá, Colombia
Calle 7, Boyacá, Boyacá, Boyacá 153610, Colombia
Lat 5°27'26.1245"N, Long 73°21'41.5940"W
GMT-05:00
Nueva : Salida a Tunja



GPS Map Camera
Boyacá, Boyacá, Colombia
Carrera 2, Boyacá, Boyacá, Boyacá 153610, Colombia
Lat 5°27'14.6306"N, Long 73°21'40.4536"W
GMT-05:00
Reemplazo : Antigua

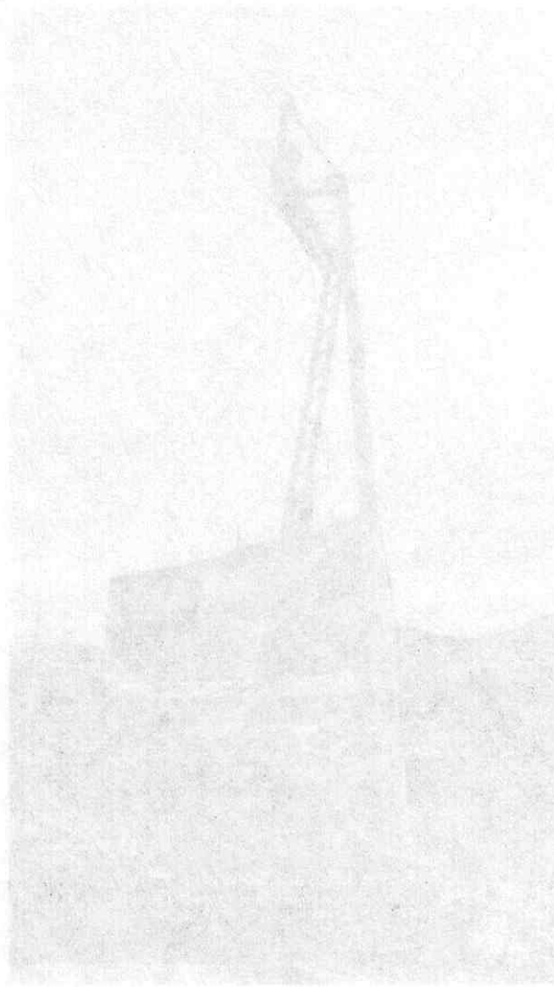


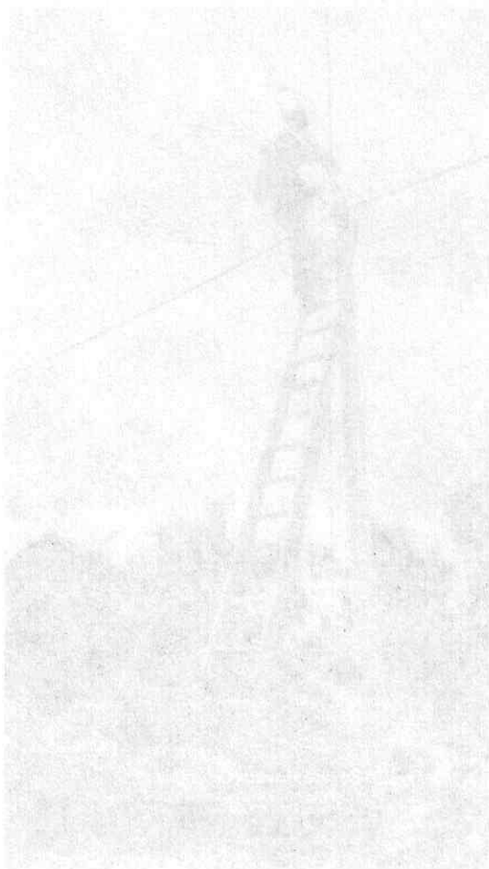


GPS Map Camera
Boyacá,Boyacá,Colombia
Carrera 2, Boyacá, Boyacá, Boyacá 153610, Colombia
Lat 5°27'13.0581"N, Long 73°21'38.0041"W
GMT-05:00
Reemplazo : Antigua

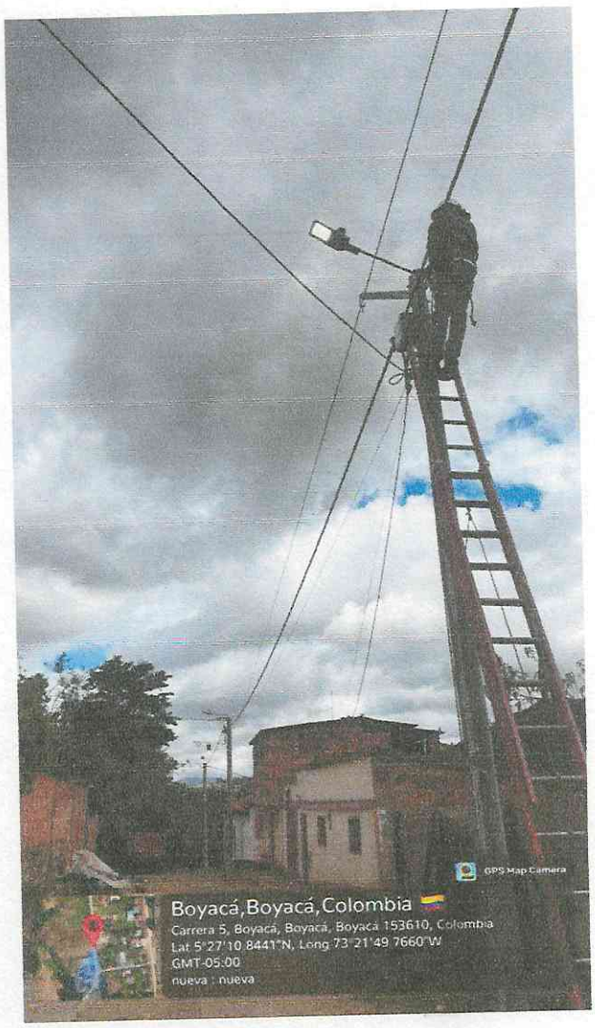
GPS Map Camera
Boyacá,Boyacá,Colombia
Carrera 5, Boyacá, Boyacá, Boyacá 153610, Colombia
Lat 5°27'10.8441"N, Long 73°21'49.7660"W
GMT-05:00
nueva : nueva

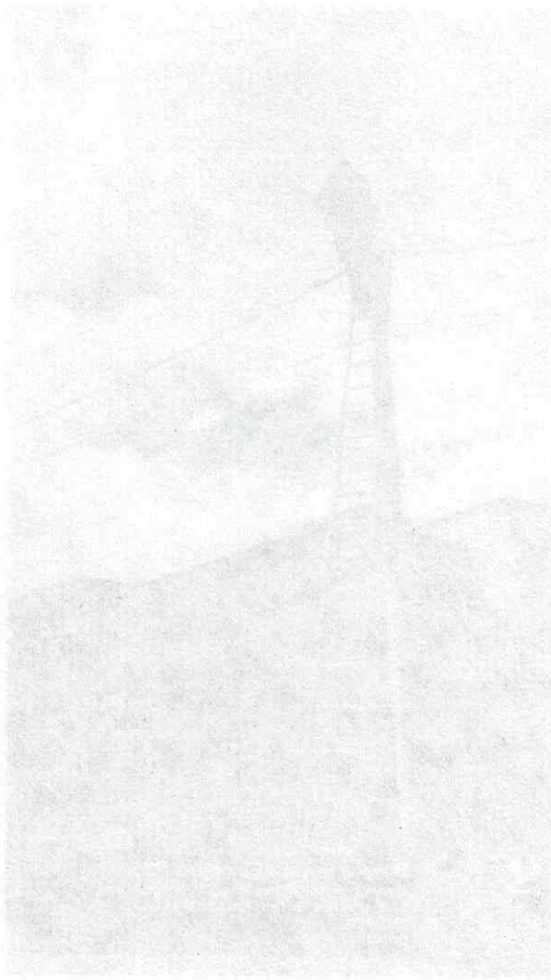

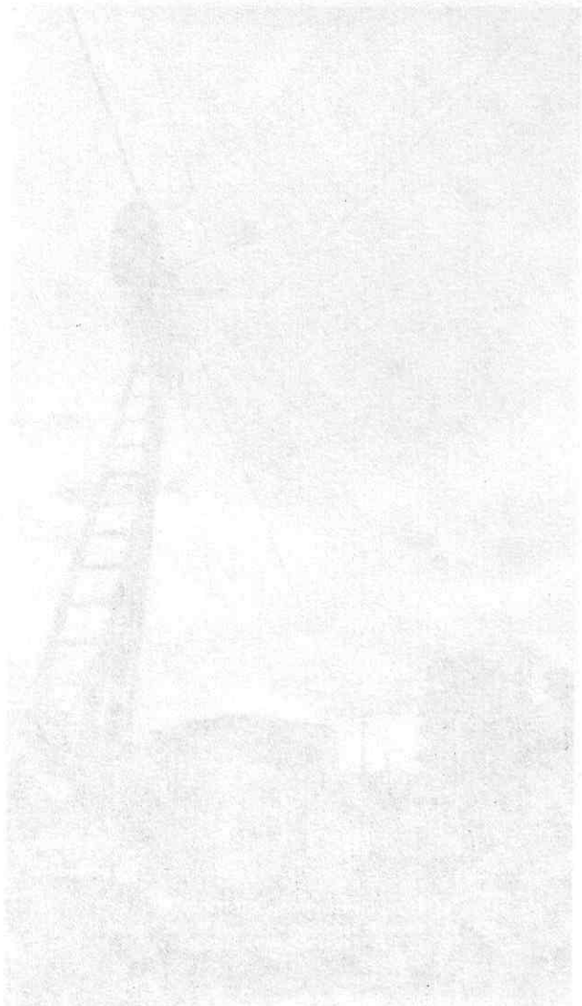

ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.

			CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA FINAL		RESIDUO		CANTIDAD TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W; EFICACIA ≥ 155 LM/W; TENSIÓN NOMINAL 100 - 277V; TEMP. COLOR 4000K; VIDA ÚTIL 100.000 HRS; TEMP. TRABAJO -25 A 45°C; IP 66; IK 08; INCLUYE FOTOCELDA DE 1000W- 460 JOULES	UND	18	$ 803,583	$ 14,464,494	18	$ 14,464,494.00	0.00	$ -	18.00	$ 14,464,494.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DP-1	UND	49	$ 10,251	$ 502,299	49	$ 502,299.00	0.00	$ -	49.00	$ 502,299.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDAS IP65 460 JOULES 120-277 Vac 50/60 Hz 1000W/1800VA	UND	52	$ 68,421	$ 3,557,892	52	$ 3,557,892.00	0.00	$ -	52.00	$ 3,557,892.00
4	DESPEJE CORREDOR DE LÍNEA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	UND	1	$ 675,528	$ 675,528	1	$ 675,528.00	0.00	$ -	1.00	$ 675,528.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LED 40W	UND	48	$ 64,258	$ 3,084,384	48	$ 3,084,384.00	0.00	$ -	48.00	$ 3,084,384.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DRIVERS 50 W	UND	12	$ 66,025	$ 792,300	12	$ 792,300.00	0.00	$ -	12.00	$ 792,300.00
SUBTOTAL					$ 23,076,897		$ 23,076,897		$ -		$ 23,076,897
ADMINISTRACION			25%		$ 5,769,224		$ 5,076,917		$ -		$ 5,076,917
IMPREVISTOS			2%		$ 461,538		$ 692,307		$ -		$ 692,307
UTILIDAD			3%		$ 692,307		$ 1,153,845		$ -		$ 1,153,845
COSTO TOTAL OBRA					**$ 29,999,966**		**$ 29,999,966**		**$ -**		**$ 29,999,966**

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	PRESENTE ACTA FINAL	RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W; EFICACIA ≥ 155 LM/W; TENSIÓN NOMINAL 100 - 277V; TEMP. COLOR 4000K; VIDA ÚTIL 100.000 HRS; TEMP. TRABAJO -25 A 45°C; IP 66; IK 08; INCLUYE FOTOCELDA DE 1000W- 460 JOULES	UND	18	18	0	18


UBICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
Salida Tunja	2	18.00
Parque principal	7	
Salida Ramiriquí	2	
Salida a las cabañas	1	
Sector el colegio	3	
Vereda Huerta grande	3	
	TOTAL	18



TIPO DE PROYECTO	OBRA NUEVA DISEÑO DE (MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN) A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA CONSTRUCTOR Y RESPONSABLE ELECTRICO CAMILO DIAZ	

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD NUEVA PARA	CANTIDAD RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60W SIMILAR A 120 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 220 - 277V, TEMP. COLOR 4000K, VIDA UTIL 100.000 HRS, TIPO TRABAJO -25 A +70°C, IP 66, (CON PROTECTOR DE TORMENTA) INCLUYE FOTOCELDA	UNID	73	72	0	73

UBICACIÓN	CANTIDAD
Salida Tunja	2
Tercera Nacional	7
Salida Nacional	2
Salida a Del Tabaco	1
Barrio Nacional	3
Salida Tunja Puente	3
TOTAL	73

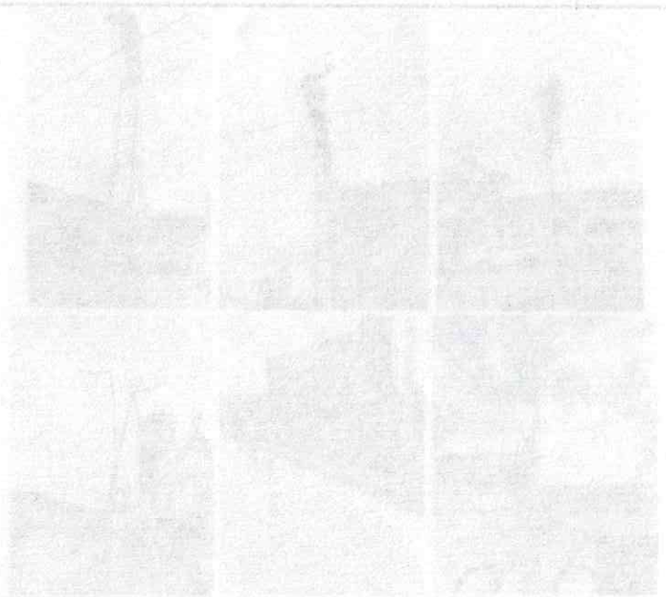

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	PRESENTE ACTA FINAL	RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DP-1	UND	49	49	0	49

UBICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Parque principal	14	49.00	
Salida Tunja	8		
Sector el colegio	8		
Salida Ramiriquí	7		
Vereda Huerta grande	12		
	TOTAL	49	UND

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	PRESENTE ACTA FINAL	RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDAS IP65 460 JOULES 120-277 Vac 50/60 Hz 1000W/1800VA	UND	52	52	0	52

UBICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Salida Tunja	6	52.00	
Salida Toraba	8		
Salida Huerta Grande	8		
Sector el colegio	5		
Parque principal	5		
Vereda Huerta Grande	4		
Salida a las cabañas	10		
Iglesia	6		
	TOTAL	52	UND


MUNICIPIO DE BOYACÁ	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	PRESENTE ACTA FINAL	RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
4	DESPEJE CORREDOR DE LÍNEA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	UND	1	1	0	1

UBICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
Salida a Tunja, salida Toraba, salida Huerta grande y salida las cabañas	1	1.00	
	TOTAL	1	UND


MUNICIPIO DE BOYACÁ	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	PRESENTE ACTA FINAL	RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LED 40W	UND	48	48	0	48

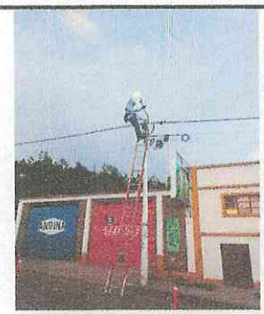UBICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Parque principal	10	48.00	  
Salida a las cabañas	8		
Salida Huerta Grande	9		
Salida Toraba	7		  
Sector el colegio	6		
Salida Ramiriquí	6		
Iglesia	2		
	TOTAL	48	UND

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO N° MC-100.4-01-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	PRESENTE ACTA FINAL	RESIDUO	CANTIDAD TOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DRIVERS 50 W	UND	12	12	0	12

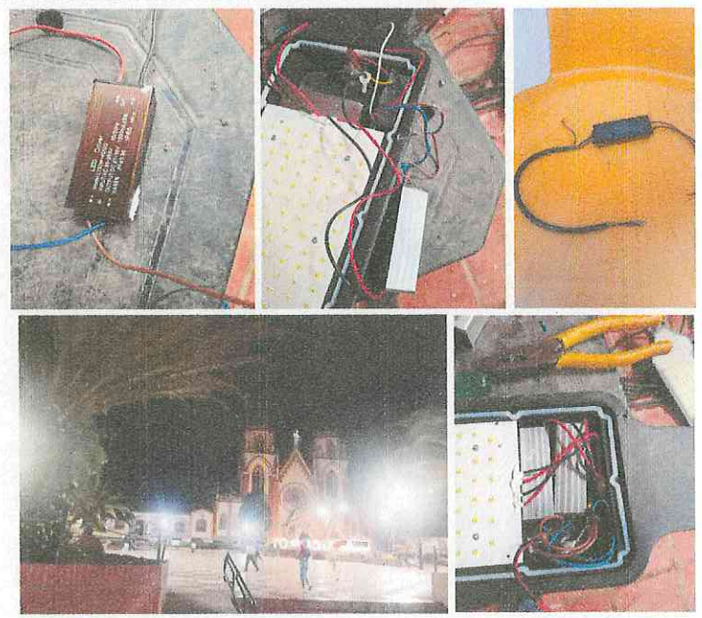UBICACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Parque principal	3	12.00	
Salida a Toraba	3		
Salida Huerta grande	3		
Salida las cabañas	3		
	TOTAL	12	UND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.051.954.341**

RIAÑO PIRABAGUE
APELLIDOS

FABIOLA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-SEP-1988**
COMBITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-OCT-2006 ARCABUCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0701000-00970337-F-1051954341-20180118 0059170507G 1 9902731852

112

113

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOYACA

REFERENCIA: CONTRATO N°100.17.4-01-2026 OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, PARA EL AÑO 2026"

Asunto: **DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS NIT. 901598473-5

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES Y QUE A LA FECHA SE ENCUETRAN A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

En constancia, se firma en Tunja, en el mes de julio de 2026

FABIOLA RIAÑO PIRABAGUE
CC 1051954341
R.L CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMILU SAS
NIT. 901598473-5

SULMA YAMILE RAMIREZ FONSECA
TP.243370-T
CONTADOR PUBLICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.633.462**
RAMIREZ FONSECA

APELLIDOS
SULMA YAMILE

NOMBRES
Sulma Ramirez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1993**
SAMACA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-MAR-2011 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


P-0700100-00304117-F-1049633462-20110527 0027077366A 1 36279659



SULMA RAMIREZ

CONTADORA PUBLICA ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y ASEGURAMIENTO
EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL





CALLE 8 # 35
Conta.syrf@gmail.com
3145851080
