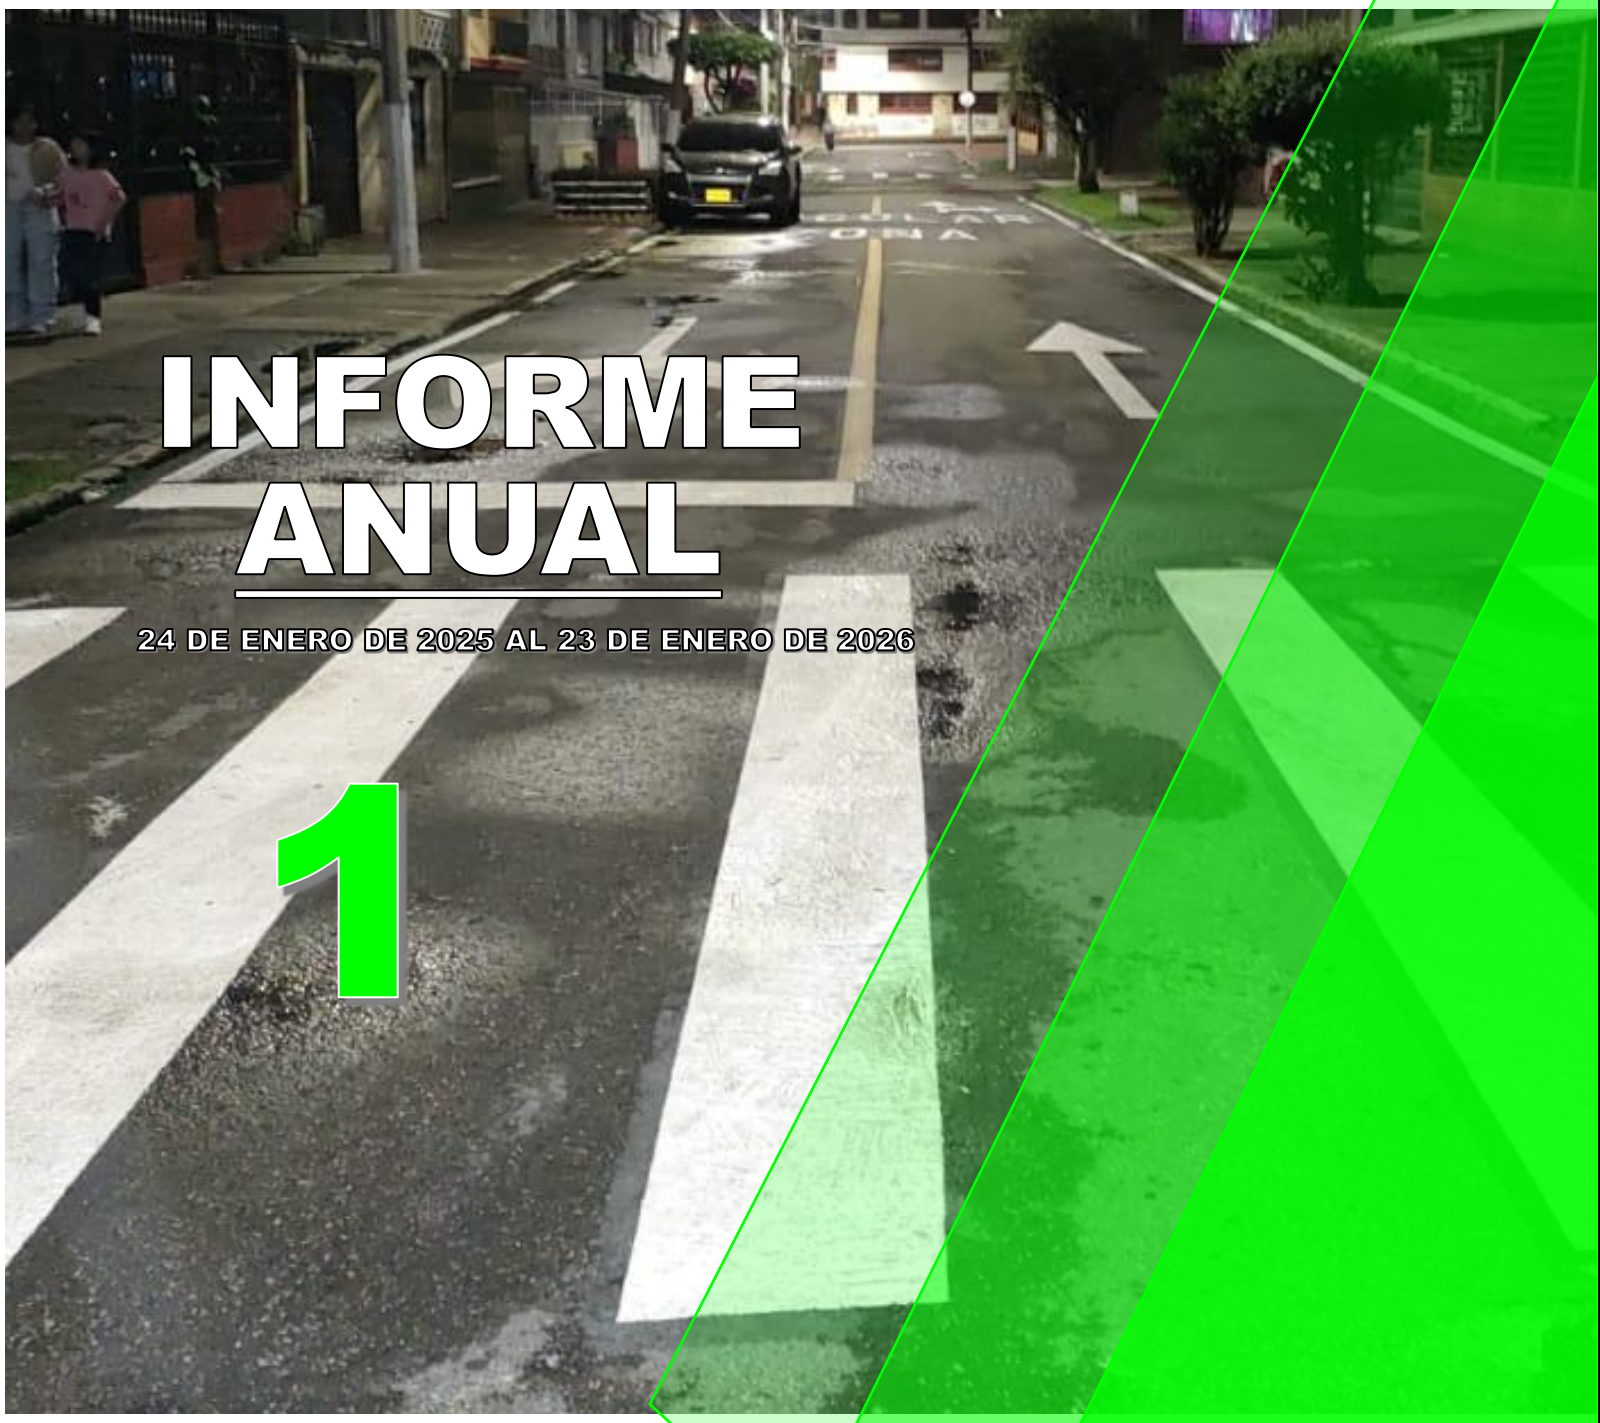
JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad



INFORME ANUAL

24 DE ENERO DE 2025 AL 23 DE ENERO DE 2026

1

CONTRATO INTERVENTORÍA
No 2024-3668

INFORME ANUAL DE INTERVENTORÍA

No. 1

24 DE ENERO DE 2025 AL 23 DE ENERO DE 2026

CONTRATO – 2024-3668

CUADRO DE APROBACIÓN DEL INFORME

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
SERGIO VALDERRAMA CAMARGO	DIRECTOR	
JULIÁN ANDRÉS ÁLVAREZ GAITÁN	RESIDENTE OBRA DÍA	
ANA MARIA POLANCO FRIEDMANN	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
JOHANA ANDREA PUIN TARAZONA	CONTADORA	
CINDY NATHALY TELLEZ GUEVARA	ABOGADA	
VERSIÓN 2		

APROBACIÓN INFORME ANUAL INTERVENTORÍA		
GERMÁN EDUARDO SÁNCHEZ RAMÍREZ	SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	

Nota: Con la suscripción del presente cuadro de aprobación del informe, los aquí firmantes certificamos que la información presentada es veraz y que previo a su entrega esta ha sido revisada y aprobada al verificar que se encuentra acorde con los requisitos establecidos en los Documentos Contractuales del Contrato de Interventoría y los requisitos propios de la organización que ejerce la misma.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN *4*
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA *5*
2.1. RAZÓN SOCIAL 7
2.2. NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO 7
2.3. OBJETO 7
2.3.1 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.3.2 OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 8
2.4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 8
2.5. FECHA DE LEGALIZACIÓN 8
2.6. PLAZO 9
2.7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO 9
2.8. FORMA DE PAGO 10
2.9. ETAPAS DEL CONTRATO 14
2.10. COPIA DE LAS PÓLIZAS APROBADAS POR LA SDM 15
2.11. VIGENCIA Y VALOR DE LOS AMPAROS 16
2.12. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FIRMA, QUE INCLUYA: 17
2.13. DIRECCIÓN DE CORREO 18
2.14. TELÉFONO FIJO DE OFICINA 18
2.15. DIRECCIÓN DE LA OFICINA 18
3.1. FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN. 19
3.2. PLAZO, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN, EN SUS DIFERENTES ETAPAS. 19
3.3. VALOR DEL CONTRATO, ADICIONES Y MODIFICACIONES. 19
4. INFORMACIÓN FINANCIERA *19*
4.1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 19
4.2. RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES DE PAGO MENSUAL. 21
5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA *23*
5.1. REGISTRO MENSUAL DEL PERSONAL 23
5.2. REGISTRO MENSUAL DE CUADRILLAS 26
5.3. REGISTRO MENSUAL DEL EQUIPO USADO 27
5.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 28
5.5. REGISTRO MENSUAL DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y APORTES A LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES. 29
5.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 52
5.7. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OBTUVO PUNTAJE ADICIONAL EN LA OFERTA 53
6. INFORMACIÓN TÉCNICA *55*
6.1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA 55
SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD. *62*
6.2. RELACIÓN DE AVANCE MENSUAL POR ÍTEM 65
6.3. RELACIÓN DE SUMINISTROS POR ÍTEM 72
6.4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 73
6.5. ACTAS DE COMITÉS DEL CONTRATO 74
6.6. REGISTRO MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 76
6.7. LAS IMPLEMENTACIONES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 100
6.8. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 101
6.9. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES (SI APLICAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE) 137
6.10. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 141

6.11. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL 146
6.12. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 151
6.13. PLANOS RECORD APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y CON VISTO BUENO DEL GRUPO SIG DE LA DIT 152
6.14. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ANUAL DE LA INTERVENTORÍA 159
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 160
8. ANEXOS 165

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Localidades según la zona 6
Tabla 2. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas 11
Tabla 3 Pólizas y vigencias de interventoría 17
Tabla 4 Información Contrato Obra 2024-3653 19
Tabla 5 Control presupuestal del contrato de obra 20
Tabla 6 Control presupuestal contrato de interventoría 20
Tabla 7 Cuadro Control de Obra 21
Tabla 8 Cuadro control de interventoría 22
Tabla 9 Personal del contratista 24
Tabla 10 Personal de Interventoría 25
Tabla 11. Ítems de Pago - Suministro e Implementación de elementos de señalización y seguridad vial 71
Tabla 12 Ítems de Pago - Suministro de elementos de señalización y seguridad vial 73
Tabla 13 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 1 153
Tabla 14 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 2 153
Tabla 15 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 3 154
Tabla 16 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 4 154
Tabla 17 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 5 155
Tabla 18 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 6 155
Tabla 19 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 7 156
Tabla 20 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 8 157
Tabla 21 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 9 157
Tabla 22 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 10 158
Tabla 23Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 11 158
Tabla 24 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 12 158

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Mapa de las Localidades de Bogotá Fuente: propia 5
Ilustración 2 Localidades de Suroriente 6
Ilustración 3 Fuente: Elaboración propia mediante datos de https://www.sire.gov.co/web/sab 100

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad- SDM, con el fin de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes y servicios contratados con la UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACION 2024 cuyo objetivo es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." designa a JOYCO como INTERVENTOR.

JOYCO tiene como objetivo "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" Zona 7

La interventoría ha realizado un continuo seguimiento al contratista UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024, encargado de la ejecución del contrato, velando por el fiel cumplimiento y aplicación de las normas vigentes. Para ello, ha ejercido diversas actividades de control en obra, las cuales se presentan en este informe, abarcando la labor integral técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de los contratos de obra relacionados con la implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en Bogotá D.C. De esta manera, se ha asegurado la transparencia en la ejecución, el cumplimiento de los estándares de calidad y la optimización del uso de los recursos públicos, permitiendo evaluar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de interventoría.

A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas por el Contratista de Obra durante el período de corte del mes en la zona 7, que comprende las localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz. La interventoría se constituye como un mecanismo fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proyecto. Este contrato establece una serie de lineamientos y metodologías que permiten una supervisión efectiva en todas las fases de ejecución, desde la planificación hasta la finalización y liquidación del contrato.

Como parte de las obligaciones contractuales, la Interventoría debe presentar informes mensuales con la información requerida en el Anexo Técnico, que forma parte de los Términos de Referencia de la Interventoría.

La interventoría ha llevado a cabo un seguimiento continuo al contratista UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024 para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en la ejecución del contrato. Su labor abarca aspectos

técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos en la implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial en Bogotá D.C., asegurando transparencia, calidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

Dentro de sus funciones, la interventoría verifica la correcta instalación de los elementos de señalización, supervisa el avance del proyecto y controla el cumplimiento de cronogramas y normativas. Además, realiza auditorías financieras para asegurar el uso adecuado de los fondos y revisa los aspectos contables y jurídicos para evitar incumplimientos o sanciones.

El desarrollo de la interventoría contribuye a la ejecución eficiente del contrato, promoviendo la transparencia y la mejora en la seguridad vial. Este documento presenta el alcance de la interventoría, las metodologías de supervisión y control, y los procedimientos para evaluar el cumplimiento contractual.

El informe ha sido elaborado por la empresa JOYCO SAS. BIC, en cumplimiento de sus compromisos contractuales según lo establecido en el anexo técnico SDM-CMA-116-2024.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

El propósito de garantizar una ejecución eficiente de los trabajos de señalización vial en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dividido la ciudad en siete zonas, asignando un contrato de obra a cada una. Para la planificación de las intervenciones, se ha implementado un modelo de priorización basado en solicitudes ciudadanas, historial de intervenciones, índices de accidentalidad y el estado de la malla vial. Esta estrategia permite optimizar la ejecución de las actividades, mejorar la eficiencia logística del proyecto y asegurar una distribución equitativa de los recursos, garantizando así una intervención más efectiva en las zonas priorizadas. Las zonas se distribuyen de la siguiente manera según la Ilustración 1 y la tabla 1:



Ilustración 1 Mapa de las Localidades de Bogotá
Fuente: propia

Lote	Zona	Localidades Incluidas
1	Nor-Oriente	Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Candelaria, Santafé
2	Norte-Centro	Suba, Barrios Unidos
3	Occidente	Engativá, Fontibón
4	Centro-Sur	Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe
5	Occidente-Sur	Bosa, Kennedy
6	Suroccidente	Tunjuelito, Ciudad Bolívar
7	Suroriente	San Cristóbal, Usme, Sumapaz

Tabla 1 Localidades según la zona
Fuente: propia

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), tras completar los trámites de Ley, celebró el Contrato de obra, correspondiente a la Licitación Pública SDM-LP-95-2024, donde se asignaron los contratistas de cada zona. Asimismo, la SDM adjudicó, mediante Concurso de Méritos SDM-CMA-116-2024, el contrato de Interventoría SDM-2024-3668 suscrito por la Secretaría Distrital de Movilidad, con la firma JOYCO S.A.S BIC. el objeto es la implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en el marco del proceso de licitación pública adelantado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El Contrato de Obra SDM-2024-3653 y la Interventoría SDM-2024-3668 tienen a su cargo la Zona 7, que comprende las localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz. Como se muestra en la Ilustración 2

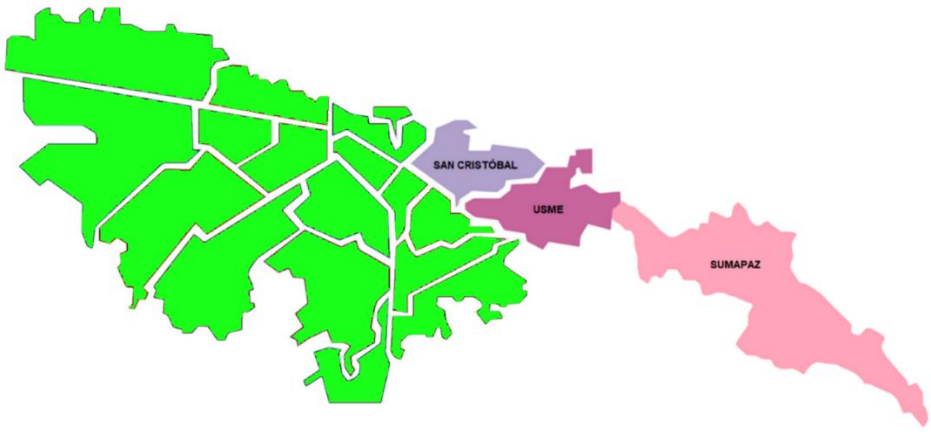


Ilustración 2 Localidades de Suroriente
Fuente: propia

Una vez legalizados los Contratos de interventoría No. SDM-2024-3668 y de obra No. SDM-2024-3653, se firmó el acta de inicio el 24 de enero de 2025, con un plazo de treinta y cuatro (34) meses para el contrato de Interventoría y para el Contratista treinta y cuatro (34) meses, es decir con fecha de terminación prevista para la Interventoría será el veintitrés (23) de noviembre de 2027 y para el contratista el veintitrés (23) de noviembre de 2027, contados a partir de la firma del acta del acta de inicio.

2.1. RAZÓN SOCIAL

La razón social correspondiente al Contrato de Interventoría No. 2024-3668 es JOYCO S.A.S. BIC, sociedad por acciones simplificada, identificada con NIT 860067561. JOYCO S.A.S. BIC, se encuentra constituida en Colombia y tiene su ubicación en el Distrito Capital de Bogotá.

Por otra parte, la razón social correspondiente al Contrato de Obra No. 2024-3653 es UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024, y está conformada por dos integrantes. Se encuentra INGENIEROS CIVILES EN TRÁFICO, TRANSPORTE Y VÍAS S.A.S., con una participación del 50,00 %, mientras que JC INGENIERÍA VIAL S.A.S. participa con el 50,00 % restante.

2.2. NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO

El contrato de interventoría corresponde al No. 2024-3668, suscrito en el año 2024, mientras que el contrato de obra corresponde al No. 2024-3653, igualmente suscrito en el año 2024.

2.3. OBJETO

2.3.1 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del contrato de obra es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." Zona 7.

2.3.2 OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El objeto del contrato de la interventoría es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" Zona 7

2.4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN

La fecha de suscripción del contrato de interventoría No. 2024-3668 fue el 27 de diciembre de 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y JOYCO SAS.

El contrato de obra No. 2024-3653 fue el 27 de diciembre de 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024.

2.5. FECHA DE LEGALIZACIÓN

El Acta de Inicio del contrato de obra No. 2024-3653 y del contrato de interventoría No. 2024-3668 fue suscrita el 24 de enero de 2025, fecha a partir de la cual comenzaron formalmente las actividades contractuales y se dio inicio al plazo de ejecución de treinta y cuatro (34) meses, con terminación prevista para el 23 de noviembre de 2027. Mediante dicha acta se dejó constancia del cumplimiento de los requisitos de ejecución, aprobación de garantías, designación del personal mínimo exigido, disponibilidad de recursos técnicos, administrativos y operativos, así como la presentación de la documentación requerida para el inicio de los contratos. Adicionalmente, el contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024, acreditó la conformación de su equipo de trabajo, cuadrillas operativas, afiliaciones al sistema de seguridad social y disponibilidad de equipos y materiales necesarios para la implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial, mientras que la interventoría, JOYCO SAS BIC, verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales y autorizó el inicio de las actividades.

El Acta de Inicio del contrato de interventoría No. 2024-3668 fue suscrita el 24 de enero de 2025 entre la Secretaría Distrital de Movilidad y JOYCO SAS BIC, una vez verificados y cumplidos los requisitos de ejecución contractual, incluyendo la aprobación de las garantías, designación y aprobación del personal mínimo requerido, acreditación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, disponibilidad de recursos técnicos, administrativos y logísticos, y la designación formal del equipo encargado de ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable

y jurídica al contrato de obra No. 2024-3653. Con la suscripción de esta acta se dio inicio al plazo contractual de treinta y cuatro (34) meses, con fecha prevista de terminación el 23 de noviembre de 2027, iniciándose las actividades de seguimiento, control y supervisión integral de la ejecución del contrato de obra.

2.6. PLAZO

El plazo de ejecución del contrato de obra No. 2024-3653 es de treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. El plazo de ejecución tanto del contrato de interventoría No. 2024-3668 como del contrato de obra No. 2024-3653 es de treinta y cuatro (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con fecha prevista de terminación el 23 de noviembre de 2027.

2.7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO

El valor total del contrato de interventoría No. 2024-3668 es de $5.401.025.748 M/CTE, incluido IVA, impuestos y demás costos derivados de la ejecución contractual. Por su parte, el contrato de obra No. 2024-3653 tiene un valor inicial de $18.771.473.428 y, con la adición No. 1 por valor de $1.482.594.137.

Ítem	Contrato de Obra	Contrato de Interventoría
Proceso de contratación	SDM-LP-95-2024	SDM-CMA-116-2024
Modalidad de contratación	Licitación Pública	Concurso de Méritos Abierto
Número de contrato	SDM-2024-3653	SDM-2024-3668
Contratante	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024	JOYCO S.A.S. BIC
NIT / Identificación	UT ECOSEÑALIZACIÓN 2024 – documento No. 1012342645	NIT 860.067.561
Representante legal	Luis Fernando Rubiano	Diana Lorena Castaño Acevedo
Objeto	Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., Zona 7 Sur Oriente.	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos de obra relacionados con el suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en Bogotá D.C., Lote 7.
Plazo inicial	34 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	34 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de suscripción	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024
Fecha de inicio	24 de enero de 2025	24 de enero de 2025
Fecha de terminación inicial	23 de noviembre de 2027	23 de noviembre de 2027

Valor inicial del contrato	$ 18.771.473.428	$5.401.025.748
Adición No. 1	$1.482.594.137, de fecha 26 de diciembre de 2025	—
Fecha de inicio Adicion	26 de diciembre de 2025	—
Participación del contratista	Ingenieros Civiles en Tráfico, Transporte y Vías S.A.S.: 50 %; JC Ingeniería Vial S.A.S.: 50 %	JOYCO S.A.S. BIC: 100 %

2.8. FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato de obra No. 2024-3653 establece que la Secretaría Distrital de Movilidad realiza pagos parciales mensuales de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y aprobadas por la interventoría. Estos pagos pueden efectuarse hasta por el 95% del valor ejecutado del contrato, mientras que el 5% restante se paga una vez se cumplan los requisitos para el recibo final y la liquidación contractual. Las actas de pago deben estar debidamente soportadas con las cantidades ejecutadas, informes y demás documentos exigidos contractualmente.

Por su parte, el contrato de interventoría No. 2024-3668 contempla pagos parciales mensuales contra la presentación y aprobación de los informes de interventoría, soportes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, así como el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control contractual. Los pagos se realizan conforme al avance de obra, un valor fijo y ejecución de las obligaciones de interventoría, previa aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y acreditación de los requisitos contractuales correspondientes.

2.8.1. FORMA DE PAGO DE OBRA

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE PAGO
Actividades Preliminares a la Implementación e Implementación de los diseños de señalización Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización. Paso 2: Visita de Inspección Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato. Paso 11. Entrega de elementos implementados y retirados al almacén de la SDM	80%
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

Tabla 2. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

Fuente: propia

La forma de pago del contrato de obra establece que los pagos al contratista se realizarán mediante cuentas mensuales, previa verificación y aprobación por parte de la interventoría y de la Secretaría Distrital de Movilidad, con base en las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción. Como requisito indispensable para la aprobación de cada cuenta mensual, el contratista deberá presentar los planos récord y las planillas de obra correspondientes a las actividades facturadas, garantizando que cumplan con los parámetros de dibujo, georreferenciación y ubicación espacial definidos por la Entidad.

La información contenida en estos documentos deberá coincidir plenamente con las cantidades incluidas en la facturación, contar con aprobación de la interventoría y obtener concepto favorable de verificación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Las actividades de georreferenciación que no obtengan concepto favorable no podrán ser reconocidas económicamente en la cuenta presentada, debiendo el contratista subsanar y gestionar dicha aprobación para la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones y plazos establecidos constituye incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contempladas en el Acuerdo de Nivel de Servicio. Para

el pago correspondiente al último período de ejecución será requisito indispensable que el cien por ciento (100%) de las actividades georreferenciadas cuenten con concepto favorable de la Entidad; de lo contrario, no se tramitará el pago final hasta tanto se dé cumplimiento a esta obligación.

Los valores reconocidos en cada corte mensual se calcularán con los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia fiscal correspondiente al período efectivamente ejecutado, razón por la cual las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre de cada año deberán liquidarse con los precios vigentes de esa misma anualidad, aun cuando la factura o cuenta de cobro sea presentada en el mes de enero de la vigencia siguiente.

Debido a que la señalización vial funciona como un sistema integral conformado por señalización horizontal, señalización vertical y demás dispositivos complementarios, la Entidad únicamente reconocerá aquellas actividades que correspondan a diseños completos y funcionales, identificados mediante los respectivos ID de diseño de señalización vial y recibidos a satisfacción por la interventoría. En los casos de expansión de diseños, se realizará previamente una cuantificación de las cantidades de obra para determinar rendimientos y tiempos de implementación.

Cuando el tiempo estimado para ejecutar un diseño supere los treinta (30) días calendario, los pagos parciales se efectuarán de acuerdo con el porcentaje de avance efectivamente implementado dentro del período facturado, siempre que las áreas o tramos intervenidos se encuentren completamente terminados e integren tanto la señalización horizontal como la vertical correspondiente. Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad y se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y al cumplimiento integral de los requisitos exigidos.

Los precios unitarios ofertados incluyen la totalidad de costos directos e indirectos, administración, imprevistos y utilidad (A.I.U.), impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos requeridos para la correcta ejecución del contrato, sin que procedan revisiones, reajustes o reconocimientos adicionales durante su vigencia. Las facturas deberán presentarse de conformidad con las fechas establecidas en el PAC y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Sobre el valor total de cada cuenta mensual se practicará una retención equivalente al cinco por ciento (5%) como garantía de correcta ejecución de los trabajos, valor que será reintegrado al finalizar el contrato una vez se suscriban el acta de recibo final, el acta de liquidación y se obtenga el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. Las actividades ejecutadas fuera de los plazos establecidos podrán ser reconocidas con cargo a dicha retegarantía, de acuerdo con las condiciones definidas contractualmente. Para el trámite de cada pago mensual,

el contratista deberá presentar como mínimo el certificado de supervisión o interventoría debidamente diligenciado, informe de actividades avalado por la interventoría, bitácora de obra, informe mensual de ejecución firmado por el director de obra y avalado por el director de interventoría, certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, soportes contables de entrega al almacén de la señalización implementada y retirada, factura original expedida conforme a las disposiciones tributarias vigentes, acta de pago mensual o acta de recibo parcial de obra con memorias de cálculo y recibo a satisfacción, planos récord aprobados por la interventoría y verificados por la Secretaría Distrital de Movilidad, así como los documentos legales correspondientes según la naturaleza jurídica del contratista.

Toda esta documentación deberá ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cierre del período objeto de facturación. El contrato establece igualmente que las cantidades de obra podrán variar según las necesidades operativas del proyecto y que únicamente se reconocerán los bienes, obras y servicios efectivamente ejecutados a los precios ofertados. La Entidad no reconocerá costos adicionales derivados de errores de estimación, omisiones o subvaloraciones efectuadas por el contratista durante la elaboración de su propuesta económica.

2.8.2. FORMA DE PAGO DE INTERVENTORÍA

La forma de pago del contrato de interventoría está estructurada en dos componentes:

A. PAGO MENSUAL FIJO: El cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato de Interventoría dividido en TREINTA Y CUATRO (34) pagos mensuales de igual valor. Estos pagos se realizarán previa verificación del cumplimiento de la dedicación y disponibilidad de los recursos mínimos establecidos para la ejecución del contrato de Interventoría por parte del interventor, quien aportará en el informe mensual los soportes necesarios.

B. PAGO MENSUAL VARIABLE: Hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría será pagado mensualmente y este valor será proporcional al porcentaje de ejecución de obra recibido por la interventoría y se pagará una vez se cuenten con los siguiente soportes:

CONCEPTO / SOPORTE	PORCENTAJE
Informe mensual de Interventoría en el cual se evidencia el seguimiento, control y recibo a satisfacción a satisfacción de las obras Implementadas por el contratista de obra de acuerdo con lo establecido por la entidad. El informe debe estar aprobado por el supervisor.	85%
Revisión y aprobación de la Georreferenciación con Concepto favorable de verificación por parte de la Entidad	15%

Los porcentajes mencionados en la tabla. Se calcularán sobre el 40% del valor variable facturado por la interventoría.

Para el reconocimiento y pago del componente variable de la interventoría, es indispensable que las actividades ejecutadas por el contratista de obra cuenten con la debida verificación, aprobación y soporte documental. En este sentido, las actividades de georreferenciación que no obtengan concepto favorable por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad no podrán ser incluidas en la cuenta que se encuentre en trámite. No obstante, el contratista deberá gestionar y presentar dicha aprobación como plazo máximo en la cuenta siguiente. El incumplimiento de esta obligación o la entrega extemporánea de la información constituye un incumplimiento contractual y podrá generar la aplicación de las medidas establecidas en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Para autorizar el pago variable, se tendrá en cuenta el acta de corte mensual del contrato de obra, en la cual se registran las cantidades ejecutadas por cada ítem y su respectivo valor. Además, las actividades facturadas deben encontrarse completamente implementadas, incluyendo la señalización y los dispositivos de seguridad vial correspondientes, y contar con aprobación de la interventoría y concepto favorable de la Entidad sobre los planos récord y la georreferenciación. Toda esta información debe estar consignada en un acta firmada tanto por el contratista como por la interventoría y ser entregada dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al corte mensual, como soporte fundamental para la aprobación y pago de la cuenta mensual de interventoría.

2.9. ETAPAS DEL CONTRATO

Los contratos de obra No. 2024-3653 y de interventoría No. 2024-3668 se encuentran actualmente en etapa de ejecución contractual. De acuerdo con el Anexo Técnico, las actividades de ejecución se desarrollan desde el mes 1 hasta el mes 12, El contrato de obra No. 2024-3653 contempla mensualmente las etapas relacionadas con actividades preliminares, verificación y aprobación de diseños, inspección en campo, valoración de costos, programación de actividades, aprobación de PMT, implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial, seguimiento de ejecución, elaboración de planos récord y liquidación contractual. Por su parte, el contrato de interventoría No. 2024-3668 comprende mensualmente las etapas de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, revisión y aprobación de actas, control de calidad, verificación de cantidades ejecutadas, seguimiento presupuestal, revisión de pólizas, recibo a satisfacción y apoyo en la liquidación del contrato de obra.

Para el corte del presente informe, el contrato se encuentra dentro de la etapa de ejecución de las actividades previstas entre los meses 1 y 12. Continúan desarrollándose las actividades asociadas con la implementación de los diseños de señalización, así como la georreferenciación de las intervenciones ejecutadas, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en el Anexo Técnico. La georreferenciación se desarrolla de manera continua durante la ejecución y debe ser entregada oportunamente con las cuentas mensuales, sin que su presentación pueda acumularse para el último mes del contrato.

2.10. COPIA DE LAS PÓLIZAS APROBADAS POR LA SDM

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo.) que cubren los respectivos riesgos

CONSTRUCTOR	UNION TEMPORAL ECOSEÑOALIZACION 2024		
NÚMERO DEL CONTRATO	2024-3653		
TIPO DE PÓLIZA	Póliza de Cumplimiento		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
NÚMERO DE PÓLIZA:	11-44-101245366		
AMPARO	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	27/05/2030	$ 6.076.220.269,5
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2024	27/11/2030	$ 4.050.813.513
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 0 DÍA		$ 6.076.220.269,5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 6.076.220.269,5
TIPO DE PÓLIZA	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del Cumplimiento		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
NÚMERO DE PÓLIZA:	11-40-101072851		
AMPARO DE:	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/01/2025	24/11/2030	$ 938.573.672,00
RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/01/2025	24/11/2027	$ 938.573.671,00

RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/01/2025	24/11/2027	$ 938.573.671,00

De igual manera, el 26 de diciembre de 2025 fue aprobada la Adición No. 1 al contrato, razón por la cual se presentaron y actualizaron las pólizas correspondientes, incorporando las modificaciones derivadas de dicha adición contractual con el fin de ajustar los valores asegurados de acuerdo con el nuevo valor del contrato y garantizar la cobertura de las obligaciones contractuales en los términos establecidos. Las pólizas actualizadas fueron presentadas para la correspondiente revisión y aprobación, incorporando las modificaciones derivadas de la mencionada adición contractual.

2.11. VIGENCIA Y VALOR DE LOS AMPAROS

El contrato de obra No. 2024-3653 como el contrato de interventoría No. 2024-3668 cuentan con pólizas debidamente aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, las cuales garantizan la cobertura de los riesgos asociados a la ejecución contractual.

2.11.1. VIGENCIA Y VALOR DE LOS AMPAROS DE OBRA

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

En el mes de mayo se presentaron observaciones a algunos amparos que cubren estas pólizas, las mismas fueron atendidas y ya cuentan con aprobación por parte de la SDM.

26 de diciembre de 2025 fue aprobada la Adición No. 1 y se entregan las pólizas actualizadas con esta Adición)

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento

Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27/12/2024	27/05/2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(_% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27/12/2024	27/05/2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27/12/2024	27/05/2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$ 4.050.813.513	27/12/2024	27/11/2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27/12/2024	24/11/2030

2.11.2. VIGENCIA Y VALOR DE LOS AMPAROS DE INTERVENTORÍA

La póliza de cumplimiento fue expedida por SEGUROS MUNDIAL, bajo la póliza No. NB-100363770, e incluye los siguientes amparos:

INTERVENTOR	JOYCO S.A.S		
NUMERO DE CONTRATO	2024-3668		
TIPO DE PÓLIZA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	NB-100363770		
NUMERO CERTIFICADO	72345289		
AMPAROS FIRMA DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
	INICIO	VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO	24/01/2025	25/05/2028	$ 1.620.307.724,40
PRESTACIONES SOCIALES	24/01/2025	23/11/2030	$ 1.080.205.149,60
CALIDAD DEL SERVICIO	23/01/2027	23/11/2032	$ 1.620.307.724,40

Tabla 3 *Pólizas y vigencias de interventoría*
Fuente: propia

2.12. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FIRMA, QUE INCLUYA:

La información de contacto del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024 corresponde a la dirección Kr 20 #137-56, Bogotá D.C., teléfono 3208400306 y correo electrónico utecosenalización@gmail.com. Por

su parte, la interventoría JOYCO SAS BIC registra como dirección Calle 44B No. 57A - 49, Bogotá D.C., correo electrónico senalizacion@joyco.com.co y teléfonos 2518125 y 3118125492

2.13. DIRECCIÓN DE CORREO

Dirección de correo para efectos de correspondencia contractual, los correos identificados en la documentación son:

- Obra - Unión Temporal Ecoseñalización 2024
  Correo: utecosenalizacion@gmail.com
- Interventoría - JOYCO S.A.S. BIC
  Correo: senalizacion@joyco.com.co

2.14. TELÉFONO FIJO DE OFICINA

Los teléfonos fijos de oficina de contacto registrados son los siguientes:

- Obra – Unión Temporal Ecoseñalización 2024
  Teléfono celular: 320 840 0306.
- Interventoría – JOYCO S.A.S. BIC
  Teléfono fijo de oficina: (601) 368 7907.

2.15. DIRECCIÓN DE LA OFICINA

- Obra – Unión Temporal Ecoseñalización 2024
  Dirección de oficina: Carrera 20 No. 137-56, Bogotá D.C.
- Interventoría – JOYCO S.A.S. BIC
  Calle 44B No. 57A-49, Bogotá D.C.

3. INFORMACIÓN LEGAL

3.1. FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN.

La fecha de iniciación tanto del contrato de interventoría No. 2024-3668 como del contrato de obra No. 2024-3653 fue el 24 de enero de 2025, y la fecha de terminación prevista para ambos contratos es el 23 de noviembre de 2027.

3.2. PLAZO, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.

Durante el periodo reportado no se realizaron suspensiones, ampliaciones de suspensión, prórrogas ni reiniciaciones en ninguna de las etapas contractuales de obra e interventoría.

3.3. VALOR DEL CONTRATO, ADICIONES Y MODIFICACIONES.

El contrato de obra No. 2024-3653 tuvo un valor inicial de $18.771.473.428 y presentó una adición No. 1 por valor de $1.482.594.137. En cuanto al contrato de interventoría No. 2024-3668, mantiene las condiciones iniciales sin modificaciones reportadas, con un valor total de $5.401.025.748, sin evidenciarse adiciones o prórrogas durante el periodo informado.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El informe financiero y presupuestal del contrato de obra No. 2024-3653 señala que durante el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026 se realizaron doce (12) cobros mensuales aprobados por la interventoría, alcanzando una ejecución acumulada de $9.713.808.594, equivalente al 51,75 % del valor inicial del contrato. Así mismo, el balance presupuestal contempla vigencias

PRESUPUESTO	VALOR
ADICION N° 1	$ 1.482.594.137
VIGENCIA 2024	$ 2.815.721.000
VIDENCIA 2025	$ 6.209.487.857
VIGENCIA 2026	$ 6.423.895.143
VIGENCIA 2027	$ 3.322.369.428

Tabla 4 *Información Contrato Obra 2024-3653*

Fuente: propia

CONTROL FINANCIERO DE OBRA CTO 2024-3653 ZONA 7

Valor Total Obra	$ 18.771.473.428

Acta	Periodo	Costo Directo	AIU (32%)	Total Proyecto (Costo Directo + AIU)	Valor ejecutado (Señalizacion Instalada)	Suministros (ITEM 1 al 129)	Suministros (ITEM 1S al 14S)	Georreferenciación sin concepto favorable	Retegarantia (5%)	Costo Basico (Factura)	Valor Pagado (Cuenta de Cobro)	% Avance obra
1	24-01 a 23-02-2025	$ 609.702.448	$ 195.104.783	$ 804.807.231	$ 804.807.231	$ 0	$ 88.935.514	$ 120.721.085	$ 38.651.083	$ 773.021.660	$ 734.370.577	4,76%
2	24-02 a 23-03-2025	$ 701.449.779	$ 224.463.929	$ 925.913.708	$ 898.184.292	$ 27.729.416	$ 19.953.558	$ 134.727.644	$ 46.593.035	$ 931.860.707	$ 885.267.672	5,04%
3	24-03 a 23-04-2025	$ 979,939,498	$ 313,580,639	$ 1,293,520,137	$ 1,293,520,137	$ 0	$ 0	$ 194,028,021	$ 61,710,988	$ 1,234,219,760	$ 1,172,508,772	6,89%
4	24-04 a 23-05-2025	$ 733,293,078	$ 234,653,785	$ 967,946,863	$ 967,946,863	$ 0	$ 0	$ 145,192,029	$ 50,839,143	$ 1,016,782,855	$ 965,943,712	5,16%
5	24-05 a 23-06-2025	$ 556.744.899	$ 178.158.368	$ 734.903.267	$ 734.903.267	$ 0	$ 0	$ 110.235.490	$ 38.492.990	$ 769.859.806	$ 731.366.815	3,92%
6	24-06 a 23-07-2025	$ 436,387,085	$ 139,643,867	$ 576,030,952	$ 556,055,793	$ 19,975,159	$ 0	$ 83,408,369	$ 30,142,904	$ 602,858,073	$ 572,715,170	3,07%
7	24-07 a 23-08-2025	$ 389.614.020	$ 124.676.486	$ 514.290.506	$ 453.171.066	$ 61.119.440	$ 0	$ 67.975.660	$ 26.486.161	$ 529.723.215	$ 503.237.055	2,74%
8	24-08 a 23-09-2025	$ 617.130.905	$ 197.481.890	$ 814.612.795	$ 780.097.396	$ 34.515.399	$ 87.952.800	$ 117.014.609	$ 42.676.332	$ 853.526.646	$ 810.850.313	4,81%
9	24-09 a 23-10-2025	$ 691,258,882	$ 221,202,842	$ 912,461,724	$ 878,793,946	$ 33,667,778	$ 0	$ 131,819,092	$ 44,882,862	$ 897,657,241	$ 852,774,379	4,86%
10	24-10 a 23-11-2025	$ 890.151.592	$ 284,848,509	$ 1,175,000,101	$ 1,152,387,755	$ 22,612,346	$ 0	$ 172,858,163	$ 56,698,052	$ 1,133,961,030	$ 1,077,262,979	6,26%
11	24-11 a 23-12-2025	$ 92.487.319	$ 29.595.942	$ 122.083.261	$ 88.023.748	$ 34.059.513	$ 0	$ 13.203.562	$ 14.086.893	$ 281.737.862	$ 267.650.969	0,65%
12	24-11-25 a 23-01-26	$ 601,957,379	$ 192,626,361	$ 794,583,740	$ 794,583,740	$ 0	$ 0	$ 119,187,561	$ 34,429,987	$ 688,599,741	$ 654,169,754	4,23%

Tabla 5 Control presupuestal del contrato de obra
Fuente: propia

Respecto al contrato de interventoría No. 2024-3668, el informe financiero indica que durante el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026 se realizaron doce (12) cobros mensuales aprobados por la que los pagos se ejecutan mediante cuentas mensuales asociadas al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato de obra, manteniéndose las condiciones iniciales del contrato sin modificaciones presupuestales reportadas

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2024-3668 (CUENTA No. 12)

VR INICIAL	$ 5.401.025.748
VR ADICION	$ 0
VR TOTAL	$ 5.401.025.748

ITEM	PERIODO	VALOR 50% MENSUAL FIJO	VALOR 40% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	Concepto Favorable Georreferenciación (15%) **	DESCUENTOS *	Vr. A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA/ EN TRAMITE
Pago mes No. 1	24-ene-25 a 23-feb-25	$ 79.426.849	$ 102.835.530	4,76%	$ 15.425.330	$ 21.195.592	$ 145.641.458	$ 5.255.384.290	PAGADA
Pago mes No. 2	24-feb-25 a 23-mar-25	$ 79.426.849	$ 108.884.679	5,04%	$ 16.332.702	$ 2.912.829	$ 184.491.327	$ 5.070.892.964	PAGADA
Pago mes No. 3	24-mar-25 a 23-abr-25	$ 79.426.849	$ 148.852.270	6,89%	$ 22.327.840	$ 3.720.110	$ 218.563.870	$ 4.852.329.094	PAGADA
Pago mes No. 4	24-abr-25 a 23-may-25	$ 79.426.849	$ 111.477.171	5,16%	$ 16.721.576	$ 5.447.835	$ 191.062.450	$ 4.661.266.643	PAGADA
Pago mes No. 5	24-may-25 a 23-jun-25	$ 79.426.849	$ 84.688.084	3,92%	$ 12.703.213		$ 168.133.296	$ 4.493.133.348	PAGADA
Pago mes No. 6	24-jun-25 a 23-jul-25	$ 79.426.849	$ 66.324.596	3,07%	$ 9.948.689		$ 148.505.968	$ 4.344.627.379	PAGADA
Pago mes No. 7	24-jul-25 a 23-ago-25	$ 79.426.849	$ 59.195.242	2,74%	$ 8.879.286		$ 139.691.494	$ 4.204.935.885	PAGADA
Pago mes No. 8	24-ago-25 a 23-sep-25	$ 79.426.849	$ 103.915.735	4,81%	$ 15.587.360		$ 176.634.510	$ 4.028.301.374	PAGADA
Pago mes No. 9	24-sep-25 a 23-oct-25	$ 79.426.849	$ 104.995.941	4,86%	$ 15.749.391		$ 184.260.759	$ 3.844.040.616	PAGADA
Pago mes No. 10	24-oct-25 a 23-nov-25	$ 79.426.849	$ 135.241.685	6,26%	$ 20.286.253		$ 210.131.672	$ 3.633.908.944	PAGADA
Pago mes No. 11	24-nov-25 a 23-dic-25	$ 79.426.849	$ 14.042.667	0,65%	$ 2.106.400		$ 111.649.369	$ 3.522.259.575	EN TRAMITE
Pago mes No. 12	24-dic-25 a 23-ene-26	$ 79.426.849	$ 91.385.356	4,23%	$ 13.707.803		$ 159.210.801	$ 3.363.048.774	EN TRAMITE
TOTAL PAGADO CONTRATO INICIAL		$ 873.695.339	$ 1.040.453.600	48,15%		$ 33.276.366	$ 1.878.766.173		

Tabla 6 Control presupuestal contrato de interventoría
Fuente: propia

4.2. RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES DE PAGO MENSUAL.

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas legales suscritas por el Contratista hasta la fecha de corte del periodo en evaluación.

ACTA NO.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
0	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	24-ene-25
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1	7-mar-25
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2	7-abril-25
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 3	5-mayo-25
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 4	6-junio-25
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 5	7-julio-25
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6	7-agosto-25
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 7	8-septiembre-25
8	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 8	8-octubre-25
9	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 9	5-noviembre-25
10	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 10	5-diciembre-25
11	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 11	En tramite
12	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 12	En tramite

Tabla 7 Cuadro Control de Obra
Fuente: propia

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas legales tramitadas por la Interventoría hasta la fecha de corte del periodo en evaluación.

ACTA NO.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
0	ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24-ene-25
1	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 1	7-mar-25
2	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 2	2-abril-25
3	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 3	5-mayo-25
4	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 4	6-junio-25
5	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 5	8-julio-25
6	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 6	8-agosto-25
7	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 7	8-septiembre-25
8	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 8	8-octubre-25
9	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 9	5-noviembre-25

10	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 10	5-diciembre-25
11	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 11	En tramite
12	ACTA DE PAGO INTERVENTORÍA No. 12	En tramite

Tabla 8 Cuadro control de interventoría
Fuente: propia

La relación de actas parciales de pago mensual corresponde al consolidado de los documentos mediante los cuales se soporta y formaliza el reconocimiento económico de las actividades ejecutadas durante cada periodo de ejecución contractual. En este cuadro se relacionan las actas correspondientes tanto al Contrato de Obra No. SDM-2024-3653. Para el contrato de obra, los pagos se realizan de manera parcial y mensual, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y aprobadas por la interventoría.

CONTROL RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 2024-3653 ZONA 7

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR FACTURA	RETEGARANTÍA	VALOR EJECUTADO	SALDO EJECUTAR CRP
Ene/2025 a Feb/2025 – **Mes 1**	3649	2024	$ 2.815.721.000	$ 773.021.660	$ 38.651.083	$ 514.059.404	$ 2.301.661.596
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 220.311.173	$ 5.989.176.684
Feb/2025 a Mar/2025 – **Mes 2**	3649	2024	$ 2.815.121.000	$ 931.860.707	$ 46.593.035	$ 619.687.370	$ 1.681.974.226
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 265.580.302	$ 5.723.596.382
Mar/2025 a Abr/2025 – **Mes 3**	3649	2024	$ 2.815.121.000	$ 1.234.219.760	$ 61.710.988	$ 820.756.140	$ 861.218.085
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 351.752.632	$ 5.371.843.751
Abr/2025 a May/2025 – **Mes 4**	3649	2024	$ 2.815.121.000	$ 1.016.782.854	$ 50.839.143	$ 676.160.598	$ 185.057.488
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 289.783.113	$ 5.082.060.637
May/2025 a Jun/2025 – **Mes 5**	3649	2024	$ 2.815.121.000	$ 769.859.806	$ 38.492.990	$ 185.057.488	$ 0
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 546.309.328	$ 4.535.751.309
Jun/2025 a Jul/2025 – **Mes 6**	3649	2024	$ 2.815.121.000	$ 602.858.073	$ 30.142.904	$ 0	$ 0
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 572.715.169	$ 3.963.036.140
Jul/2025 a Ago/2025 – **Mes 7**	3649	2024	$ 2.815.121.000	$ 529.723.215	$ 26.486.161	$ 0	$ 0
	20	2025	$ 6.209.487.857			$ 503.237.054	$ 3.459.799.086
Ago/2025 a Sep/2025 – **Mes 8**	20	2025	$ 6.209.487.857	$ 853.526.645	$ 87.559.194	$ 765.967.451	$ 2.693.831.635
Sep/2025 a Oct/2025 – **Mes 9**	20	2025	$ 6.209.487.857	$ 897.657.242		$ 897.657.242	$ 1.796.174.393
Oct/2025 a Nov/2025 – **Mes 10**	20	2025	$ 6.209.487.857	$ 1.133.961.030	$ 70.784.945	$ 1.063.176.085	$ 732.998.308
Nov/2025 a Dic/2025 – **Mes 11**	20	2025	$ 6.209.487.857	$ 281.737.861		$ 281.737.861	$ 451.260.447
Dic/2025 a Ene/2026 – **Mes 12**	20	2025	$ 6.209.487.857	$ 688.599.741	$ 34.429.987	$ 451.260.447	$ 0
	5	2026	$ 6.423.895.143			$ 202.909.307	$ 6.220.985.836

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1. REGISTRO MENSUAL DEL PERSONAL

Se establece que tanto el contrato de obra No. 2024-3653 como el contrato de interventoría No. 2024-3668 deben contar con personal mínimo especializado para garantizar la correcta ejecución, supervisión y control de las actividades de señalización y seguridad vial.

Por su parte, la interventoría debe disponer de un equipo profesional encargado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato de obra. quienes tienen la responsabilidad de verificar la calidad de las actividades ejecutadas, controlar el cumplimiento contractual, validar cantidades de obra, aprobar documentación técnica y garantizar que las actividades desarrolladas por el contratista cumplan con las especificaciones técnicas y normativas establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Ver Anexo https://drive.google.com/drive/folders/15dwKMZyOK_svTLeHvHDApDe1Mp5379JL

5.1.2. PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo evaluado del contrato de obra No. 2024-3653, el contratista contó con el equipo mínimo de trabajo requerido para el adecuado desarrollo del proyecto, garantizando la disponibilidad del personal técnico, administrativo, operativo y de apoyo exigido contractualmente. El personal vinculado para la ejecución de las actividades estuvo conformado por Director de Obra, Especialista en Tránsito, Ingeniero Residente de Obra Diurno, Ingeniero Residente de Obra Nocturno, Trabajador Social, Profesional SISO Ambiental, Georreferenciador, Conductor Nocturno y Secretaria, cumpliendo con los perfiles, experiencia y dedicación establecidos en los documentos contractuales y aprobados previamente por la interventoría.

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del personal mínimo exigido, verificando hojas de vida, soportes de formación académica, experiencia profesional, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y permanencia del personal en los diferentes frentes de trabajo. Asimismo, se evidenció que la vinculación del personal con dedicación del 100% se mantuvo conforme a lo estipulado contractualmente y que ninguno de los integrantes del equipo mínimo desempeñara simultáneamente el mismo rol en otros contratos o zonas con dedicación superior al 100%, dando cumplimiento a las condiciones contractuales y normativas aplicables.

Durante el periodo evaluado del Contrato de Obra No. 2024-3653, no se presentaron cambios, reemplazos ni modificaciones en el personal que conforma el equipo mínimo de trabajo aprobado para la ejecución del contrato. El contratista mantuvo de manera continua el personal requerido,

#	NOMBRE	CARGO
ANTIGUO		
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN
7	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL
8	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1
9	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL
10	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA
11	ELIZABETH SUAREZ GARCES	PROFESIONAL DE APOYO
12	IRINA ROCIO GUTIERREZ DURAN	PROFESIONAL DE APOYO
13	JENNIFER YUDITH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PROFESIONAL DE APOYO
14	MICHEL VIRGINIA LÓPEZ ESPAÑA	TECNOLOGO EN DIBUJO
15	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1
16	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR
17	SONIA OLIVIA RAMOS HUERFANO	SERVICIOS GENERALES
NUEVO		
1	N/A	N/A
RETIRO		
1	N/A	N/A

Tabla 9 Personal del contratista
Fuente: propia

5.1.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

El personal mínimo requerido para el contrato de interventoría No. 2024-3668 estuvo conformado por el Director de Interventoría, especialistas y profesionales de apoyo en tránsito, residentes diurnos y nocturnos, ingenieros auxiliares, inspectores de interventoría, profesional SST, abogada, contadora, georreferenciador, secretaria y conductores, garantizando el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico durante la ejecución del contrato. La interventoría reportó el cumplimiento de la plantilla mínima exigida durante el periodo evaluado

#	NOMBRE	CARGO
	NUEVO	
1	JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO PARA OBRA Y GARANTÍAS (Diurno)
	ANTIGUO	
1	SERGIO VALDERRAMA CAMARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	WILMER ALFONSO GOMEZ MARTINEZ	ESPECIALISTA DE TRANSITO
3	JULIAN ANDRES ALVAREZ GAITAN	ING. RESIDENTE (Diurno)
4	FELIX EDUARDO ARIAS SAENZ	ING. RESIDENTE (Nocturno)
5	OMAR FABIAN CEBALLOS	TECNOLOGO EN GEORREFERENCIACION
6	SANDRA CRISTINA DUQUE GOMEZ	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO PARA OBRA Y GARANTÍAS (Nocturno)
7	JULIAN DAVID ORTEGON CARREÑO	INSPECTOR INTERVENTORIA (Diurno)
8	DIANA MARCELA LEÓN MOLANO	INSPECTOR INTERVENTORIA (Nocturno)
9	ANA MARIA POLANCO FRIEDMANN	PROFESIONAL EN SST
10	CINDY NATHALY TELLEZ GUEVARA	ABOGADA
11	JOHANA ANDREA PUIN TARAZONA	CONTADORA
12	ALIX MILENA TORRALBA ARIZA	SECRETARIA
13	JUAN PABLO PIÑEROS PIÑEROS	CONDUCTOR (Diurno)
14	YONATAN RODOLFO VILLAMIL ROJAS	CONDUCTOR (Nocturno)
15	DUBER EDUARDORODRIGUEZ PARRA	Conductor (Nocturno)
16	EFRAIN BERMUDEZ CASTILLO	CONDUCTOR (Diurno)
	RETIRO	
1	EDGAR OLIVERIO RAMIREZ MURILLO	CONDUCTOR (Nocturno)
2	ANDRES FERNANDO CARRANZA GOMEZ	INSPECTOR INTERVENTORIA (Diurno)
3	WILSON PULIDO SANTANA	CONDUCTOR (Nocturno)
4	HECTOR MAURICIO SANDOVAL RINCON	CONDUCTOR (Nocturno)
5	ORLANDO RICO FORERO	CONDUCTOR (Diurno)
6	MIGUEL ANGEL GAITAN SORIANO	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO PARA OBRA Y GARANTÍAS (DIURNO)
7	OMAR FABIAN CEBALLOS MARTINEZ	GEORREFERENCIADOR
8	ANA MARIA POLANCO FRIEDMANN	RESIDENTE SST
9	EFRAIN BERMUDEZ CASTILLO	CONDUCTOR (Diurno)
10	CARLOS ESTEBAN VARGAS ZUÑIGA	CONDUCTOR (Nocturno)

Tabla 10 Personal de Interventoría
Fuente: propia

La trazabilidad de los ingresos, retiros y demás novedades relacionadas con el personal vinculado al Contrato de Obra No. 2024-3653 se encuentra debidamente soportada en el Anexo Técnico No. 3, versión 2 (V2), en el cual se consolidan las tablas de seguimiento del personal en formato Excel. La información se encuentra organizada en la pestaña "Mes a Mes", permitiendo realizar el seguimiento cronológico de las novedades presentadas durante la ejecución contractual, así como identificar los ingresos, retiros y permanencia del personal en cada periodo.

5.2. REGISTRO MENSUAL DE CUADRILLAS

Durante el periodo evaluado del contrato de obra No. 2024-3653, el contratista mantuvo la conformación y operación de las cuadrillas mínimas requeridas para la implementación de señalización horizontal y vertical, conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el desarrollo de las actividades operativas variaban según el mes de actividades y la facturación pero se contó mínimo con cuatro (4) cuadrillas para implementación de señalización horizontal, tres (3) cuadrillas para implementación de señalización vertical y una (1) cuadrilla adicional destinada a la atención de emergencias y compromisos prioritarios, garantizando la cobertura operativa en los diferentes frentes de intervención.

Las cuadrillas operativas de señalización vertical estuvieron conformadas como mínimo por un (1) jefe de cuadrilla, dos (2) obreros y un (1) auxiliar de tráfico, mientras que las cuadrillas operativas de señalización horizontal estuvieron integradas por un (1) jefe de cuadrilla, un (1) operador de equipo, dos (2) obreros y dos (2) auxiliares de tráfico, conforme a la Tabla "Conformación de Cuadrillas Operacionales de Señalización". El contratista presentó a la interventoría los listados del personal operativo con sus respectivos soportes de afiliación a salud, pensión y ARL, verificándose además el cumplimiento de requisitos para el trabajo y actividades que así lo requerían.

La interventoría realizó seguimiento mensual a la disponibilidad, conformación y operación de las cuadrillas en campo, verificando cumplimiento de horarios, programación de actividades, condiciones de seguridad industrial, uso de elementos de protección personal y atención de requerimientos operativos. Durante el periodo evaluado, el contratista UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024 contó con un total de 761 colaboradores vinculados Asimismo, se evidenció coordinación permanente entre las cuadrillas operativas y el personal técnico del contrato, garantizando el cumplimiento de las metas de implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial dentro de los tiempos establecidos contractualmente.

CUADRILLAS DE LA UT	PERSONAL
ICOVÍAS	181
J.C	124
Nuevo milenio	231
Q&R	110
PDG	60
Cefevial	28
Nueva granada	27
TOTAL	**761**

Ver Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1i5LGtBTXQG7HbUXdzuBLqop5crc29-ai

5.3. REGISTRO MENSUAL DEL EQUIPO USADO

El contratista dispuso y mantuvo en operación el equipo mínimo requerido para la ejecución de las actividades de señalización horizontal y vertical contempladas en el contrato. Entre los equipos utilizados se encontraron camiones de apoyo para transporte de materiales y maquinaria, vehículos autopropulsados para demarcación vial, máquinas demarcadoras para aplicación de pintura acrílica y plástico en frío, equipos de aplicación manual para demarcación horizontal, compresores para atomización de pintura y microesfera, sistemas electrónicos de control de velocidad y programación de trazos, así como herramientas menores y accesorios necesarios para la correcta implementación de la señalización vial.

Durante las jornadas de trabajo se verificó la disponibilidad y operatividad de los equipos de demarcación vial tipo POWRTWIN 8900 y equipos autopropulsados para aplicación de pinturas líquidas y plástico en frío, dotados con pistolas de aplicación, sistemas de microesfera, boquillas, portaboquillas y mangueras especializadas para la ejecución de marcas viales conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Igualmente, se contó con vehículos de apoyo para el transporte de equipos, materiales y personal operativo en los diferentes frentes de intervención.

La interventoría realizó seguimiento permanente al estado, funcionamiento y disponibilidad de la maquinaria y equipos empleados en la ejecución de las actividades, verificando que estos cumplieran con las condiciones técnicas, de seguridad y rendimiento requeridas para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados. Asimismo, se evidenció que los equipos utilizados fueron suficientes para atender la programación mensual de actividades y el cumplimiento de las metas establecidas dentro del cronograma contractual.

TIPO DE VEHÍCULO				
MAQUINA	**SERIE**	**TIPO DE VEHICULO**	**PLACA**	**MARCA**
APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA	-	CAMIÓN	VFB357	CHEVROLET
MAQUINA AUTOPROPULSABLE TITAN 1000	TAPT002	CAMIÓN	WEP027	JAC
APLICACIÓN DE PLÁSTICO EN FRIO	IAPT001	CAMIÓN	WNN061	JAC

POWRLINER 8950, 2GUN	1. 1439800069	N/A	N/A	TITAN
POWRLINER 8950, 2GUN	2. 1439800007	N/A	N/A	TITAN
POWRLINER 8950, 2GUN	3. 1439800083	N/A	N/A	TITAN
FEATHERLITE	2001-454	N/A	N/A	THERMOMARK II
HYDRA M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	TITAN

Ver Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1dQSwr1gdu5JJ5UAsfuoJT7jK699d7PiF

5.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista desarrolló las actividades administrativas necesarias para garantizar la adecuada ejecución y control del contrato, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Entre las principales actividades realizadas se encuentran la elaboración y presentación de informes mensuales de avance, consolidación de soportes técnicos y administrativos, seguimiento a la programación de actividades, gestión documental del contrato, control y actualización de bases de datos operativas, atención de requerimientos efectuados por la interventoría y la Entidad, así como la participación en comités de seguimiento, reuniones técnicas y mesas de trabajo convocadas durante la ejecución contractual.

De igual manera, se realizó la gestión y control del personal vinculado al proyecto, incluyendo la verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social, seguimiento al cumplimiento de obligaciones laborales, control de asistencia, actualización de hojas de vida y administración de recursos humanos. Asimismo, se efectuó el trámite de cuentas de cobro, certificaciones, actas de pago, registros contables, control presupuestal y demás documentos requeridos para la gestión financiera del contrato.

El contratista también adelantó actividades relacionadas con la administración de inventarios, control de materiales, gestión de compras, coordinación logística para el suministro de insumos y equipos, seguimiento a pólizas y garantías contractuales, manejo de correspondencia oficial y actualización permanente de la información requerida por la interventoría. Estas actividades permitieron mantener la trazabilidad documental, el control administrativo y el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto.

Ver Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1phVuyXCwAD2Cewcmg6-DymJ9g-0cAUyx?usp=drive_link

5.5. REGISTRO MENSUAL DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y APORTES A LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.

El contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y contribuciones parafiscales del personal vinculado al proyecto. Mensualmente se verificó la realización oportuna de los pagos correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales (ARL), así como los aportes a las entidades parafiscales aplicables, de conformidad con la normatividad vigente y las obligaciones contractuales establecidas para la ejecución del contrato.

Como soporte para el trámite de las cuentas mensuales de cobro, el contratista presentó las certificaciones expedidas por el representante legal y/o revisor fiscal, junto con las planillas de pago correspondientes, evidenciando que el personal profesional, técnico, administrativo y operativo adscrito al proyecto se encontraba debidamente afiliado y al día en sus aportes al Sistema de Seguridad Social. La interventoría realizó la revisión y validación de dichos documentos, verificando la consistencia de la información reportada y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad.

El Registro mensual de pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales del contrato se encuentra en el "ANEXO 6".

https://drive.google.com/drive/folders/19a6C6Srb-jX3iLJdLU_trzpQ25e9mJ5C

CONTRATO No	SDM N° 2024-3653
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACION 2024
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" Zona Sur Oriente
PERIODO	DESDE: 24/01/2025 HASTA: 23/01/2026

PERIODO	DESDE: 24/01/2025 HASTA: 23/02/2025

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
INGRESO			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	AFILIACIONES SS

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	AFILIACIONES SS
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	AFILIACIONES SS
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	AFILIACIONES SS
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	AFILIACIONES SS
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	AFILIACIONES SS
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	AFILIACIONES SS
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	AFILIACIONES SS
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	AFILIACIONES SS
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	AFILIACIONES SS
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	AFILIACIONES SS
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	AFILIACIONES SS
CUACRILLAS OPERATIVAS			
13	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9481746343
14	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9481746343
15	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9481746343
16	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9481746343
17	ALVARINO ROMERO MORALES	JEFE DE PERSONAL CONDUCTOR	900193467-8
18	ANDRES FELIPE IBAÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-9
19	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-9
20	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
21	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
22	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
23	CRISTHIAN DAVID CARDENAS ESCOBAR	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
24	CRISTIAN SANTIAGO MORENO BENTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
25	DEIVI ACOSTA RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
26	DILAN CAMILO RUIZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
27	FELIPE ANCHICO ARROYO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
28	HAROL ANDRES CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
29	JAROL CAMILO LOZANO GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
30	JHON BAYRON AMADOR BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
31	JHON ALEJANDRO BERRIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-9
32	JOSE ARISTIBULO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-10
33	JOSE ARNULFO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-11
34	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
35	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-11
36	JOSE MAURICIO HINCAPIE RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
37	JORGE LEONARDO RAMIREZ RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
38	JOHAN STIVEN URREA MENDOZA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
39	JHON ANDRES GOMEZ BELTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
40	JESUS MANUEL VELASQUEZ RAMOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
41	JORGE ANDRES CARDENAS RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
42	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-11
43	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	900193467-8
44	LUIS MIGUEL IGUARAN RUBIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-11
45	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	OPERARIO	900193467-11
46	PAULO ANDRES DE LA ROSA PAEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
47	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	900193467-11
48	SANTIAGO MARTINEZ FORERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
49	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	900193467-8
50	XAVIER OSWALDO BLANCA SANCHEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
51	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	JEFE DE CUADRILLA	1257140084
52	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	1257140084
53	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	1257140084
54	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	1257140084
55	LEONARDO PANADERO PAREDES	COORDINADOR DE ALMACEN	1257140084
56	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS	AFILIACIONES SS
57	ANDEROSON EDUARDO MALDONADO MEZA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
58	YEISON HERNEY ANACONA ANACONA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
59	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	83965069
60	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	83965069
61	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	83965069
62	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	83965069
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO:N/A			
INGRESO-RETIRO			
1	BRAYAN ANDRES ACEVEDO CRISTANCHO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	DAVID ALEXANDER FERRIN RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	URIEL FELIPE BAQUERO RUBIANO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	VELOZA LEION ALEXANDER	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS

PERIODO	DESDE: 24/02/2025 HASTA: 23/03/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
INGRESO			
1	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
2	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	ANDRES ALFONSO RODRIGUEZ CHARRIS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
5	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
6	JOEL GREGORIO MERCADO CORTEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
7	YEIVER CAMILO IBAGUE GARAVITO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
8	JAROL MEDARDO ANGEL CALDERON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
9	SEBASTIAN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
10	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
11	NICOLAS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
12	JULIAN ANDRES CACERES PINTO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
13	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	AFILIACIONES SS
14	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	AFILIACIONES SS
15	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
16	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
17	MIGUEL ANGEL MASIAS CESPEDES	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
18	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
19	AQUILEO ZABALA OSPINA	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
20	STEVE MAURICIO DURAN ESGUERRA	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
21	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
22	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9483095606
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9483095606
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9483095606
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9483095606
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9483095606
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9483095606
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9483095606
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9483095606
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9483095606
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9483095606
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9483095606
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	483207723
CUACRILLAS OPERATIVAS			
13	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9483207723
14	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9483207723
15	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9483207723
16	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9483207723
17	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9483207723
18	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9483207723
19	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9483207723
20	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9483207723
21	ALVARINO ROMERO MORALES	JEFE DE PERSONAL CONDUCTOR	84179609
22	ANDRES FELIPE IBAÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
23	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
24	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
25	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
26	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
27	CRISTHIAN DAVID CARDENAS ESCOBAR	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
28	CRISTIAN SANTIAGO MORENO BENTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
29	DILAN CAMILO RUIZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
30	FELIPE ANCHICO ARROYO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
31	HAROL ANDRES CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
32	JHON BAYRON AMADOR BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
33	JHON ALEJANDRO BERRIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
34	JOSE ARISTIBULO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
35	JOSE ARNULFO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
36	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
37	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
38	JORGE LEONARDO RAMIREZ RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
39	JOHAN STIVEN URREA MENDOZA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
40	JHON ANDRES GOMEZ BELTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
41	JESUS MANUEL VELASQUEZ RAMOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
42	JORGE ANDRES CARDENAS RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
43	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
44	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	84179609
45	LUIS MIGUEL IGUARAN RUBIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
46	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	OPERARIO	84179609
47	PAULO ANDRES DE LA ROSA PAEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
48	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	84179609
49	SANTIAGO MARTINEZ FORERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
50	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
51	XAVIER OSWALDO BLANCA SANCHEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO			
1	LUIS SEBASTIAN CARRILLO DE LA HOZ	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	RONALDO JOSE MOYA PATIÑO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
INGRESO-RETIRO			
1	JAROL CAMILO LOZANO GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	EDINSON JOSE VERGARA MONTES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	AFILIACIONES SS
4	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	AFILIACIONES SS
RETIRO			
1	DEIVI ACOSTA RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
2	JOSE MAURICIO HINCAPIE RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609

PERIODO	DESDE: 24/03/2025 HASTA: 23/04/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
		PERSONAL FIJO	
INGRESO			
3	MERCADO CORTEZ JOEL GREGORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
5	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	AFILIACIONES SS
6	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	AFILIACIONES SS
7	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
8	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
9	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	AFILIACIONES SS
10	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS	AFILIACIONES SS
11	JHON SEBASTIAN TIQUE RIVERA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
12	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9484460511
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9484460511
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9484460511
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9484460511
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9484460511
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9484460511
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9484460511
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9484460511
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9484460511
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9484460511
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9484460511
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	9484667716
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
2	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
3	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9484667716
4	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
5	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
6	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
7	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9484667716
8	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
9	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
10	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
11	ANDRES ALFONSO RODRIGUEZ CHARRIS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
12	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
13	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
14	JOEL GREGORIO MERCADO CORTEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9484667716
15	ALVARINO ROMERO MORALES	JEFE DE PERSONAL CONDUCTOR	85647878
16	ANDRES FELIPE IBAÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
17	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
18	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
19	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
20	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
21	CRISTHIAN DAVID CARDENAS ESCOBAR	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
22	CRISTIAN SANTIAGO MORENO BENTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
23	DILAN CAMILO RUIZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
24	FELIPE ANCHICO ARROYO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
25	HAROL ANDRES CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
26	JHON BAYRON AMADOR BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
27	JHON ALEJANDRO BERRIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
28	JOSE ARISTIBULO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
29	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
30	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
31	JORGE LEONARDO RAMIREZ RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
32	JOHAN STIVEN URREA MENDOZA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
33	JHON ANDRES GOMEZ BELTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
34	JESUS MANUEL VELASQUEZ RAMOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
35	JORGE ANDRES CARDENAS RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
36	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
37	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	85647878
38	LUIS MIGUEL IGUARAN RUBIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
39	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	OPERARIO	85647878
40	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	85647878
41	SANTIAGO MARTINEZ FORERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
42	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
43	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	85687934
44	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	85687934
46	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
47	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
48	MIGUEL ANGEL MASIAS CESPEDES	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
49	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
50	AQUILEO ZABALA OSPINA	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
51	STEVE MAURICIO DURAN ESGUERRA	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
52	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	85421733
53	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	85421733
54	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	85421733
55	YEIVER CAMILO IBAGUE GARAVITO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
56	JAROL MEDARDO ANGEL CALDERON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
57	SEBASTIAN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
58	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
59	NICOLAS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
60	JULIAN ANDRES CACERES PINTO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
	PERSONAL ROTATIVO		
INGRESO-RETIRO			
1	FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	EDINSON JOSE VERGARA MONTES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	
RETIRO			
1	LUIS SEBASTIAN CARRILLO DE LA HOZ	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9484552026
2	RONALDO JOSE MOYA PATIÑO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9484552026
3	FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9484552026
4	JOSE ARNULFO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
5	PAULO ANDRES DE LA ROSA PAEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609
6	XAVIER OSWALDO BLANCA SANCHEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	84179609

PERIODO	DESDE: 24/04/2025 HASTA: 23/05/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
1	KEVIN LEONARDO SANDOVAL ACOSTA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	JUAN SEBASTIAN PAEZ VERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	YEFFERSON SMITH CAMPO HERNANDEz	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	JUAN SEBASTIAN RUIZ AVILA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9485978338
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9485978338
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9485978338
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9485978338
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9485978338
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9485978338
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9485978338
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9485978338
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9485978338
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9485978338
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9485978338
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	9486062936
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
2	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
3	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9486062936
4	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
5	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
6	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
7	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9486062936
8	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
9	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
10	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
11	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
12	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
13	JOEL GREGORIO MERCADO CORTEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
14	ALVARINO ROMERO MORALES	JEFE DE PERSONAL CONDUCTOR	85647878
15	ANDRES FELIPE IBAÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
16	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
17	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
18	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
19	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
20	CRISTHIAN DAVID CARDENAS ESCOBAR	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
21	DILAN CAMILO RUIZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
22	FELIPE ANCHICO ARROYO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
23	HAROL ANDRES CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
24	JHON BAYRON AMADOR BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
25	JHON ALEJANDRO BERRIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
26	JOSE ARISTIBULO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
27	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
28	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
29	JORGE LEONARDO RAMIREZ RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
30	JHON ANDRES GOMEZ BELTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
31	JORGE ANDRES CARDENAS RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
32	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
33	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	85647878
34	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	OPERARIO	85647878
35	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	85647878
36	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
37	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	85687934
38	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	85687934
40	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
41	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
42	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	85687934
43	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	86274190
44	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	86274190
45	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	86274190
46	JAROL MEDARDO ANGEL CALDERON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
47	SEBASTIAN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
48	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
49	NICOLAS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
50	JULIAN ANDRES CACERES PINTO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	85647878
51	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
52	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	484552026
53	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	484552026
54	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	484552026
55	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	484552026
56	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	484552026
57	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	484552026
58	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS	484552026
59	JHON SEBASTIAN TIQUE RIVERA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	484552026
60	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	484552026
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO-RETIRO: N/A			
RETIRO			
1	ANDRES ALFONSO RODRIGUEZ CHARRIS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	
2	SANTIAGO MARTINEZ FORERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	
3	CRISTIAN SANTIAGO MORENO BENTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	
4	LUIS MIGUEL IGUARAN RUBIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
5	JESUS MANUEL VELASQUEZ RAMOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	
6	YEIVER CAMILO IBAGUE GARAVITO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	
7	JOHAN STIVEN URREA MENDOZA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	
8	AQUILEO ZABALA OSPINA	AUXILIAR OPERATIVO	
9	MIGUEL ANGEL MASIAS CESPEDES	AUXILIAR OPERATIVO	
10	STEVE MAURICIO DURAN ESGUERRA	AUXILIAR OPERATIVO	

PERIODO	DESDE: 24/05/2025 HASTA: 23/06/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
1	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	AFILIACIONES SS
2	BRAYAN STEVEN MIRANDA CARDENAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	FABIAN ESTEBAN RINCON BALCEROS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	RAFAEL ANTONIO MEDINA BUSTOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
5	JOSE DANIEL GONZALEZ BERMUDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
6	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
7	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
8	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9487436273
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9487436273
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9487436273
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9487436273
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9487436273
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9487436273
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9487436273
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9487436273
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9487436273
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9487436273
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9487436273
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	9486062936
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
2	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
3	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9486062936
4	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
5	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
6	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
7	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9486062936
8	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
9	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
10	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
11	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
12	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
13	ALVARINO ROMERO MORALES	JEFE DE PERSONAL CONDUCTOR	87251668
14	ANDRES FELIPE IBAÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
15	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
16	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
17	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
18	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
19	CRISTHIAN DAVID CARDENAS ESCOBAR	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
20	DILAN CAMILO RUIZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
21	FELIPE ANCHICO ARROYO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
22	HAROL ANDRES CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
23	JHON BAYRON AMADOR BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
24	JHON ALEJANDRO BERRIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
25	JOSE ARISTIBULO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
26	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
27	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
28	JORGE LEONARDO RAMIREZ RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
29	JHON ANDRES GOMEZ BELTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
30	JORGE ANDRES CARDENAS RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
31	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
32	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	87251668
33	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	OPERARIO	87251668
34	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	87251668
35	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
36	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	87011261
37	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	87011261
38	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	87011261
39	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	87011261
40	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	87011261
41	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	87011261
42	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	87271599
43	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	87271599
44	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	87271599
45	JAROL MEDARDO ANGEL CALDERON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
46	SEBASTIAN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
47	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
48	NICOLAS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
49	JULIAN ANDRES CACERES PINTO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
50	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
51	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9487239178
52	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	9487239178
53	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	9487239178
54	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9487239178
55	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9487239178
56	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	9487239178
57	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS	9487239178

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
58	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9487239178
59	KEVIN LEONARDO SANDOVAL ACOSTA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
60	JUAN SEBASTIAN PAEZ VERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
61	YEFFERSON SMITH CAMPO HERNANDEz	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
62	JUAN SEBASTIAN RUIZ AVILA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	87251668
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO-RETIRO: N/A			
RETIRO			
1	JOEL GREGORIO MERCADO CORTEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9486062936
58	JHON SEBASTIAN TIQUE RIVERA	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9487239178

PERIODO	DESDE: 24/06/2025 HASTA: 23/07/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
1	PEROZO MENDOZA JESUS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	RIVERA MOLINA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	DUARTE RUIZ JUAN SEBASTIÁN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9488892358
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9488892358
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9488892358
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9488892358
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9488892358
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9488892358
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9488892358
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9488892358
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9488892358
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9488892358
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9488892358
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	9488987413
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	9488892358
2	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
3	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
4	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9488987413
5	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
6	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
7	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
8	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9488987413
9	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
10	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
11	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
12	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
13	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
14	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	87940262
15	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	87940262
16	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	87940262
17	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	87940262
18	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	87940262
19	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	87940262
20	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	87800900
21	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	87800900
22	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	87800900
23	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9488987413
24	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9488598303
25	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	9488598303
26	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	9488598303
27	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9488598303
28	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9488598303
29	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	9488598303
30	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS	9488598303
31	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9488598303
32	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	489018542
33	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	489018542
34	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	489018542
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO-RETIRO: N/A			
RETIRO			
1	ALVARINO ROMERO MORALES	JEFE DE PERSONAL CONDUCTOR	88024639
2	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
3	CAMILO ANDRES BARACALDO MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
4	CARLOS ANDRES VALBUENA GAITAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
5	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
6	CRISTHIAN DAVID CARDENAS ESCOBAR	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
7	DILAN CAMILO RUIZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
8	FELIPE ANCHICO ARROYO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
9	HAROL ANDRES CASTELLANOS HERNANDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
10	JHON BAYRON AMADOR BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
11	JOSE ARISTIBULO CETINA JIMENEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
12	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
13	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
14	JORGE LEONARDO RAMIREZ RINCON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
15	JORGE ANDRES CARDENAS RAMIREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
16	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
17	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	88024639
18	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	OPERARIO	88024639
19	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	JEFE DE CUADRILLACONDUCTOR	88024639
20	WILMER ESMIT LOPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
21	JAROL MEDARDO ANGEL CALDERON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
22	SEBASTIAN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
23	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
24	NICOLAS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
25	YEFFERSON SMITH CAMPO HERNANDEz	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
26	JUAN SEBASTIAN RUIZ AVILA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
27	RAFAEL ANTONIO MEDINA BUSTOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
28	KEVIN LEONARDO SANDOVAL ACOSTA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
29	JUAN SEBASTIAN PAEZ VERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
30	JOSE DANIEL GONZALEZ BERMUDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
31	FABIAN ESTEBAN RINCON BALCEROS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
32	ANDRES FELIPE IBAÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
33	JULIAN ANDRES CACERES PINTO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
34	JHON ALEJANDRO BERRIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
35	BRAYAN STEVEN MIRANDA CARDENAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639
36	JHON ANDRES GOMEZ BELTRAN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88024639

PERIODO	DESDE: 24/07/2025 HASTA: 23/08/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
1	SONIA OLIVIA RAMOS HUERFANO	SERVICIOS GENERALES	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9490278331
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9490278331
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9490278331
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9490278331
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9490278331
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9490278331
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9490278331
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9490278331
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9490278331
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9490278331
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9490278331
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	9490396199
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	9490278331
2	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
3	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
4	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9490396199
5	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
6	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
7	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199

8	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9490396199
9	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
10	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
11	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
12	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
13	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
14	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490396199
15	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	88791991
16	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	88791991
17	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	88791991
18	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	88791991
19	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	88791991
20	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	88791991
21	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	88992022
22	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	88992022
23	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	88992022
24	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9490281659
25	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	9490281659
26	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	9490281659
27	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9490281659
28	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9490281659
29	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	9490281659
30	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS	9490281659
31	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9490281659
32	PEROZO MENDOZA JESUS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490281659
33	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490513452
34	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490513452
35	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490513452
36	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490513452
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO-RETIRO: N/A			
RETIRO			
1	RIVERA MOLINA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9490281659
2	DUARTE RUIZ JUAN SEBASTIÁN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	88992022

PERIODO	DESDE: 24/08/2025 HASTA: 23/09/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
1	YEISON HERNEY ANACONA ANACONA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	BRAYAN DAVID CEPEDA VARGAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9491638801
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9491638801
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9491638801
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9491638801

5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9491638801
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9491638801
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9491638801
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9491638801
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9491638801
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9491638801
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9491638801
12	MORENO CRISTANCHO HUGO ALEJANDRO	CONDUCTOR 2	9491791251
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	9491638801
2	SONIA OLIVIA RAMOS HUERFANO	SERVICIOS GENERALES	9491638801
3	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
4	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
5	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9491791251
6	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
7	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
8	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
9	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9491791251
10	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
11	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
12	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
13	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
14	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
15	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491791251
16	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	89513900
17	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	89513900
18	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	89513900
19	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	89513900
20	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	89513900
21	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	89513900
22	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	89479384
23	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	89479384
24	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	89479384
25	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9492185469
26	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	9492185469
27	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	9492185469
28	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9492185469
29	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9492185469
30	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	9492185469
31	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9492185469
32	PEROZO MENDOZA JESUS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9492185469
33	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491870118
34	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491870118
35	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491870118
36	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9491870118
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO-RETIRO: N/A			
RETIRO			

1	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	9492185469

PERIODO	DESDE: 24/09/2025 HASTA: 23/10/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
1	ELIZABETH SUAREZ GARCES	PROFESIONAL DE APOYO	AFILIACIONES SS
2	IRINA ROCIO GUTIERREZ DURAN	PROFESIONAL DE APOYO	AFILIACIONES SS
3	JENNIFER YUDITH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PROFESIONAL DE APOYO	AFILIACIONES SS
4	MICHEL VIRGINIA LÓPEZ ESPAÑA	TECNOLOGO EN DIBUJO	AFILIACIONES SS
5	VANESSA FERNANDA CABRALES YEPEZ	PROFESIONAL DE APOYO	AFILIACIONES SS
6	LIZETH MANCHEGO ALVAREZ	TECNICO DE APOYO	AFILIACIONES SS
7	EMI LUZ JIMENEZ DE LA ROSA	SERVICIOS GENERALES	AFILIACIONES SS
8	ALVARINO ROMERO MORALES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
9	ANDRÉS FELIPE IBÁÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
10	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNÁNDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
11	BRAYAN STEVEN MIRANDA CÁRDENAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
12	CAMILO ANDRÉS BARACALDO MARTÍNEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
13	CARLOS ANDRÉS VALBUENA GAITÁN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
14	CRISTHIAN ANDRÉS MORALES GOMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
15	FABIAN ESTEBAN RINCÓN BALCEROS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
16	JAROL MEDARDO ÁNGEL CALDERÓN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
17	JHON ALEXANDER MORALES GÓMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
18	JOHN ALEJANDRO BERRIO MOYA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
19	JORGE ANDRÉS CÁRDENAS RAMÍREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
20	JORGE LEONARDO RAMÍREZ RINCÓN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
21	JOSÉ ARISTÓBULO CETINA JIMÉNEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
22	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
23	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
24	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
25	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
26	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
27	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
29	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
30	SANTIAGO PADILLA CASAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
31	SEBASTIÁN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
32	WILMER ESMIT LÓPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
33	JHONNY ARTUR SÁNCHEZ BUEN HOMBRE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9493139895
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9493139895
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9493139895
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9493139895
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9493139895
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9493139895

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
7	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9493121049
8	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9493139895
9	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9493139895
10	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9493139895
11	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9493139895
12	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO	CONDUCTOR 2	9493121049
CUACRILLAS OPERATIVAS			
1	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	9493139895
2	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
3	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
4	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9493121049
5	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
6	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
7	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
8	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9493121049
9	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
10	JESUS STIVENGAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
11	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
12	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
13	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
14	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493121049
15	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	90392892
16	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	90392892
17	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	90392892
18	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	90392892
19	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR OPERATIVO	90304854
21	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	90304854
22	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9493159158
23	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	9493159158
24	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	9493159158
25	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9493159158
26	LEONARDO PANADERO PAREDES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9493159158
27	DAYANA PATRICIA DELGADO	COORDINADOR DE ALMACEN	9493159158
30	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	90521420
31	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	90521420
32	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	90521420
33	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	90521420
34	YEISON HERNEY ANACONA ANACONA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493159158
35	BRAYAN DAVID CEPEDA VARGAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493159158
PERSONAL ROTATIVO			
INGRESO-RETIRO			
RETIRO			
1	SONIA OLIVIA RAMOS HUERFANO	SERVICIOS GENERALES	9493139895
2	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9493159158
3	PEROZO MENDOZA JESUS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9493159158
4	EDWIN REYES VERGARA	OPERARIO INSTALADOR	90392892
5	EMERSON FLOREZ DAVILA	AUXILIAR OPERATIVO	90392892

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
6	EDWIN ARLEY DUARTE SILVA	AUXILIAR OPERATIVO	90304854

PERIODO	DESDE: 24/10/2025 HASTA: 23/11/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
INGRESOS			
1	MARLON SANTIAGO SALAMANCA PARRA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
PERSONAL FIJO ACTIVO			
ANTIGUOS PLANTILLA MINIMA			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9494677211
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9494677211
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9494677211
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9494677211
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9494677211
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9494677211
7	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9494677211
8	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9494677211
9	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9494677211
10	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9494677211
11	ELIZABETH SUAREZ GARCES	PROFESIONAL DE APOYO	9494677211
12	IRINA ROCIO GUTIERREZ DURAN	PROFESIONAL DE APOYO	9494677211
13	JENNIFER YUDITH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PROFESIONAL DE APOYO	9494677211
14	MICHEL VIRGINIA LÓPEZ ESPAÑA	TECNOLOGO EN DIBUJO	9494677211
15	VANESSA FERNANDA CABRALES YEPEZ	PROFESIONAL DE APOYO	9494677211
16	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	9494677211
17	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9494854882
CUACRILLAS OPERATIVAS			
18	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
19	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9494854882
20	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO	CONDUCTOR	9494854882
21	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
22	LIZETH MANCHEGO ALVAREZ	TECNICO DE APOYO	9494854882
23	EMI LUZ JIMENEZ DE LA ROSA	SERVICIOS GENERALES	9494854882
24	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494926811
25	LEONARDO PANADERO PAREDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494926811
26	DAYANA PATRICIA DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494926811
27	YEISON HERNEY ANACONA ANACONA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494926811
28	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	91097890
29	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	91097890
30	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	91097890
31	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	91097890
32	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91170572
33	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91170572

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
34	JORGE ALEJANDRO PEÑA BOHÓRQUEZ	Auxiliar de señalización	9494926811
35	SEBASTIÁN ARLEY CHAPARRO MARROQUÍ	Auxiliar de señalización	9494926811
36	JEFFREY NICOLAS GÓMEZ	Auxiliar de señalización	9494926811
37	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	JEFE DE CUADRILLA	9494926811
38	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	JEFE DE CUADRILLA	9494926811
39	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AYUDANTE DE SEÑALIZACION	9494926811
40	BRAYAN DAVID CEPEDA VARGAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494926811
RETIROS			
1	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
2	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
PERSONAL ROTATIVO			
1	ALVARINO ROMERO MORALES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
2	ANDRÉS FELIPE IBÁÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
3	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
4	JOHN ALEJANDRO BERRIO MOYA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
5	WILMER ESMIT LÓPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
6	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
7	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
8	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
9	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
10	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
11	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
12	JESUS STIVEN GAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
13	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
14	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494854882
15	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNÁNDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
16	BRAYAN STEVEN MIRANDA CÁRDENAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
17	CAMILO ANDRÉS BARACALDO MARTÍNEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
18	CARLOS ANDRÉS VALBUENA GAITÁN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
19	CRISTHIAN ANDRÉS MORALES GOMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
20	FABIAN ESTEBAN RINCÓN BALCEROS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
21	JAROL MEDARDO ÁNGEL CALDERÓN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
22	JHON ALEXANDER MORALES GÓMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
23	JORGE ANDRÉS CÁRDENAS RAMÍREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
24	JORGE LEONARDO RAMÍREZ RINCÓN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
25	JOSÉ ARISTÓBULO CETINA JIMÉNEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
26	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
27	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
28	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
29	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
30	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
31	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
32	SANTIAGO PADILLA CASAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
33	SEBASTIÁN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91346794
34	JHONNY ARTUR SÁNCHEZ BUEN HOMBRE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9494926811

PERIODO	DESDE: 24/11/2025 HASTA: 23/12/2025

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
INGRESOS			
1	MARLON SANTIAGO SALAMANCA PARRA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
PERSONAL FIJO ACTIVO			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	9496310002
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	9496310002
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	9496310002
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	9496310002
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	9496310002
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	9496310002
7	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	9496310002
8	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	9496310002
9	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	9496310002
10	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	9496310002
11	ELIZABETH SUAREZ GARCES	PROFESIONAL DE APOYO	9496310002
12	IRINA ROCIO GUTIERREZ DURAN	PROFESIONAL DE APOYO	9496310002
13	JENNIFER YUDITH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PROFESIONAL DE APOYO	9496310002
14	MICHEL VIRGINIA LÓPEZ ESPAÑA	TECNOLOGO EN DIBUJO	9496310002
15	VANESSA FERNANDA CABRALES YEPEZ	PROFESIONAL DE APOYO	9496310002
16	ISIDRO BOTON QUINTERO	CONDUCTOR	9496310002
17	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9496286481
18	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
19	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9496286481
20	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO	CONDUCTOR	9496286481
21	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
22	LIZETH MANCHEGO ALVAREZ	TECNICO DE APOYO	9496286481
23	EMI LUZ JIMENEZ DE LA ROSA	SERVICIOS GENERALES	9496286481
24	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
25	LEONARDO PANADERO PAREDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
26	DAYANA PATRICIA DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
27	YEISON HERNEY ANACONA ANACONA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
28	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	92154091
29	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	92154091
30	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	92154091
31	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	92154091
32	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91963358
33	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	91963358
34	JORGE ALEJANDRO PEÑA BOHÓRQUEZ	Auxiliar de señalización	9496715341
35	SEBASTIÁN ARLEY CHAPARRO MARROQUÍ	Auxiliar de señalización	9496715341
36	JEFFREY NICOLAS GÓMEZ	Auxiliar de señalización	9496715341
RETIROS			
1	SONIA OLIVIA RAMOS HUERFANO	SERVICIOS GENERALES	9496310002

2	MARGARITA ROSA PARDO RESTREPO	PROFESIONAL DE APOYO	9496310002
3	ROSANA CONTRERAS ARIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOY	9496310002
4	ANDRES ALFONSO RODRIGUEZ CHARRIS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
5	JOEL GREGORIO MERCADO CORTEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
6	ÁLVARO MANUEL MATTA RODRÍGUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
7	ANGEL DAVID MIRANDA DE LA CRUZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
8	VELOZA LEION ALEXANDER	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
9	EDINSON JOSE VERGARA MONTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
10	LUIS SEBASTIAN CARRILLO DE LA HOZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
11	RONALDO JOSE MOYA PATIÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
12	ELMER DE JESUS GUEVARA NARANJO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
13	YEISON HERNEY ANACONA ANACONA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
14	DUVAN FERNANDO RAMIREZ SANDOVAL	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
15	JHON SEBASTIAN TIQUE RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
16	JOSUÉ LEVI TERAN MACHADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
17	JOSE DANIEL GONZALEZ BERMUDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
18	ALEX CAMILO RIVERA MOLINA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
19	JOHN FREDDY RODRIGUEZ PINEDA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
20	JUAN DAVID MORALES HERRERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
21	JESÚS PEROZO MENDOZA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
22	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
23	GERVYN MANUEL OSPINO REYES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
24	JEFFREY NICOLAS GÓMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
25	JHONNY ARTUR SÁNCHEZ BUEN HOMBRE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
26	ENDER DAVID MURLACO TAPIAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
27	JOSÉ ARISTÓBULO CETINA JIMÉNEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
28	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
29	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNÁNDEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
30	BRAYAN STEVEN MIRANDA CÁRDENAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
31	CAMILO ANDRÉS BARACALDO MARTÍNEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
32	CARLOS ANDRÉS VALBUENA GAITÁN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
33	CRISTHIAN ANDRÉS MORALES GOMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
34	FABIAN ESTEBAN RINCÓN BALCEROS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
35	JAROL MEDARDO ÁNGEL CALDERÓN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
36	JHON ALEXANDER MORALES GÓMEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
37	JORGE ANDRÉS CÁRDENAS RAMÍREZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
38	JORGE LEONARDO RAMÍREZ RINCÓN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
39	JUAN DAVID MORALES GUARACA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
40	JUNIOR CAMACARO SALON	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
41	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
42	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
43	ORLANDO FABIAN CÁRDENAS OLIVERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
44	SANTIAGO PADILLA CASAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
45	SEBASTIÁN MACHADO IBARGUEN	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
46	WILMER ESMIT LÓPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
47	BRAYAN DAVID CEPEDA VARGAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
48	RONALD ALEXANDER GARCIA DIAZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341
49	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496715341

PERSONAL ROTATIVO			
1	ALVARINO ROMERO MORALES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
2	ANDRÉS FELIPE IBÁÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
3	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
4	JOHN ALEJANDRO BERRIO MOYA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
5	WILMER ESMIT LÓPEZ CAJAMARCA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	92013586
6	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496636000
7	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496636000
8	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496636000
9	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496636000
10	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
11	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
12	JESUS STIVEN GAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
13	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481
14	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9496286481

PERIODO	DESDE: 24/12/2025 HASTA: 23/01/2026

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
PERSONAL FIJO			
INGRESOS			
1	ANDERSSON RUIZ RAMOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
2	BRAYAN DAVID CEPEDA VARGAS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
3	LUIS ALBERTO ROZO OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
4	EDILSON JAVIER LOZANO CHAVES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
5	BRAYAN JOSUE RAMIREZ SANDOVAL	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
6	HAROLD DUBAN HERNÁNDEZ MUÑOZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	AFILIACIONES SS
PERSONAL ACTIVO FIJO			
1	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO	DIRECTOR OBRA	497974743
2	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA	ESPECIALISTA GERENCIA PROYECTOS	497974743
3	ANDERSON YECID NIÑO CASTILLO	INGENIERO AUXILIAR	497974743
4	DIANA PAOLA PARADA SIERRA	ESPECIALISTA TRANSITO	497974743
5	DIEGO IGNACIO GUALTEROS CHAVEZ	RESIDENTE NOCTURNO	497974743
6	GIOVANNI ALEXANDER BRITTO NUÑEZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	497974743
7	YULID LILIANA GELVES HERRERA	SST- AMBIENTAL	497974743
8	WILMER SIERRA BARACETA	CONDUCTOR 1	497974743
9	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBON	PROFESIONAL SOCIAL	497974743
10	RUTH YOLIMA PATIÑO LOBATON	SECRETARIA	497974743
11	ELIZABETH SUAREZ GARCES	PROFESIONAL DE APOYO	497974743
12	IRINA ROCIO GUTIERREZ DURAN	PROFESIONAL DE APOYO	497974743
13	JENNIFER YUDITH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PROFESIONAL DE APOYO	497974743
14	MICHEL VIRGINIA LÓPEZ ESPAÑA	TECNOLOGO EN DIBUJO	497974743
15	Isidro Boton Quintero	CONDUCTOR	497974743
16	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO	RESIDENTE 1	9497974743
17	JUAN CARLOS ARBOLEDA MARTINEZ	CONDUCTOR	9497974743
18	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO	CONDUCTOR	9497974743

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PLANILLA SS
19	JESUS JAVIER YEJAS FUENTES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
20	LIZETH MANCHEGO ALVAREZ	TECNICO DE APOYO	9497974743
21	JOSE ARMANDO NEGRETTE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
22	JUAN CARLOS MENDEZ RIVERA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
23	YEIMER NEGRETE PAJARO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
24	CARLOS MANUEL YEJA LOPEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
25	CLEMENTE ROA BULLA	CONDUCTOR	526156
26	CARLOS ANDRES CASTILLO MORENO	INSTALADOR	526156
27	EDWARD STICK VARGAS VARGAS	AUXILIAR OPERATIVO	526156
28	PABLO CESAR RODRIGUEZ AMEZQUITA	AUXILIAR OPERATIVO	526156
29	CEFERINO MARTINEZ CUBILLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	274358
30	KENNEDY ROJAS MARTINEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	274358
31	JORGE ALEJANDRO PEÑA BOHÓRQUEZ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9498623438
32	SEBASTIÁN ARLEY CHAPARRO MARROQUÍ	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9498623438
33	DAYANA PATRICIA DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9498623438
34	JHON EDUARD GALVEZ HURTADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9498623438
RETIROS			
1	ALVARINO ROMERO MORALES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
2	ANDRÉS FELIPE IBÁÑEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
3	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
4	JOHN ALEJANDRO BERRIO MOYA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
5	Wilmer Esmit López Cajamarca	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
6	LEONARDO PANADERO PAREDES	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9498623438
7	MARLON SANTIAGO SALAMANCA PARRA	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9498623438
8	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
9	JESUS STIVEN GAMEZ ROMERO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
10	JOHAN CAMILO GOMEZ OSORIO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	9497974743
11	EMI LUZ JIMENEZ DE LA ROSA	SERVICIOS GENERALES	9497974743
12	VANESSA FERNANDA CABRALES YEPEZ	PROFESIONAL DE APOYO	497974743
PERSONAL ROTATIVO			
1	JONATHAN STIVEN DELGADO LAVERDE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
2	JONATHAN DELGADO	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
3	ESPINOSA MORALES ROBERTO CARLOS	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013
4	DILMER PATIÑO BUSTAMANTE	AUXILIAR DE SEÑALIZACION	497958013

5.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

La correspondencia relacionada con la ejecución del contrato, garantizando la comunicación oportuna entre el contratista, la interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad. La correspondencia enviada estuvo asociada principalmente a la presentación de informes mensuales, radicación de cuentas de cobro, entrega de planos récord, remisión de soportes técnicos y administrativos, respuestas a requerimientos, solicitudes de aprobación, atención

de observaciones, programación de actividades y entrega de documentación contractual requerida para el seguimiento del proyecto.

La documentación fue gestionada mediante los canales oficiales establecidos por la Entidad, garantizando su trazabilidad, archivo y control documental. Asimismo, se realizó seguimiento al estado de las comunicaciones y a la atención oportuna de los requerimientos recibidos, asegurando el cumplimiento de los tiempos de respuesta y el adecuado flujo de información entre las partes involucradas en la ejecución contractual.

La Correspondencia enviada y recibida del contrato se encuentra en el "ANEXO 7"

https://drive.google.com/drive/folders/1k8AIL3znuajzV2KVXW9Bc8FK7Z5hcCoK?usp=drive_link

5.7. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OBTUVO PUNTAJE ADICIONAL EN LA OFERTA

Los contratos de obra e interventoría se verificó el cumplimiento de los compromisos y condiciones que hicieron parte de los factores de selección y otorgaron puntaje adicional dentro del proceso de contratación. Para tal efecto, tanto el contratista de obra como la interventoría mantuvieron vigentes las condiciones ofertadas relacionadas con la disponibilidad del personal profesional y técnico, capacidad operativa, experiencia acreditada, equipos y recursos requeridos para la adecuada ejecución de las actividades contractuales.

El puntaje adicional obtenido en la oferta se encuentra soportado en el Anexo 8 – Puntaje Adicional, el cual incluye principalmente dos factores de selección que otorgaron calificación adicional al contratista durante el proceso licitatorio:

Programa de Gerencia de Proyectos, mediante el cual el contratista acreditó herramientas, metodologías y mecanismos de gestión para el seguimiento, control y administración eficiente de la ejecución contractual.

Maquinaria y Vehículos, correspondiente a la disponibilidad de equipos, maquinaria especializada y vehículos adicionales a los mínimos exigidos por la Entidad para la ejecución de las actividades de señalización y dispositivos de seguridad vial.

Por lo anterior, el soporte de cumplimiento consiste en demostrar durante la ejecución contractual que el contratista mantiene las condiciones ofertadas que le permitieron obtener dicho puntaje adicional, especialmente la disponibilidad del programa de gestión del proyecto y de la maquinaria y vehículos comprometidos en la

propuesta. Estos soportes reposan en el Anexo 8 PUNTAJE ADICIONAL se relacionan los documentos que soportan este puntaje:

Como resultado del seguimiento efectuado por la interventoría durante el período comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, se evidenció que la Unión Temporal Eco Señalización 2024 implementó las actividades de gestión social previstas para la ejecución del contrato, garantizando el relacionamiento permanente con las comunidades ubicadas en las zonas de intervención. En cada frente de obra donde fue requerida la intervención se realizó el diligenciamiento de las correspondientes actas de vecindad, registrando las condiciones iniciales de los predios y del entorno. De igual manera, se desarrollaron jornadas de socialización, reuniones informativas y espacios de atención a la comunidad, atendiendo las necesidades identificadas durante la ejecución de las actividades y las solicitudes presentadas por los diferentes actores sociales, permitiendo una adecuada comunicación entre el contratista y la ciudadanía. Como resultado de estas actividades, se contó con la participación de aproximadamente 52 personas durante el período evaluado.

Así mismo, durante el período comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, la Unión Temporal Eco Señalización 2024 contó con un promedio de 52 trabajadores vinculados a la ejecución del contrato. Del total del personal contratado, 11 trabajadores (21%) correspondieron a jóvenes entre 18 y 28 años, en cumplimiento de las estrategias de promoción del empleo juvenil; de este grupo, 5 trabajadores (10%) correspondieron a técnicos, tecnólogos y profesionales entre 18 y 28 años, conforme a lo establecido en la Ley 2119 de 2021. Así mismo, se evidenció la vinculación de 16 mujeres (31%), superando el porcentaje mínimo de participación femenina previsto contractualmente. El 48% restante del personal estuvo conformado por trabajadores pertenecientes a poblaciones objeto de especial protección constitucional, entre ellos 1 persona en condición de discapacidad, 3 adultos mayores, 3 personas desplazadas por la violencia, 3 personas en situación de pobreza y 6 mujeres cabeza de hogar, evidenciando el compromiso del contratista con la implementación del enfoque diferencial, poblacional, territorial, de derechos y de género, así como con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de inclusión laboral y generación de oportunidades para poblaciones vulnerables.

Tabla 10: Cantidad de Personal Vulnerable Contratado

GRUPO POBLACIONAL	CANTIDAD	PORCENTAJE
JOVENES 18 A 28 AÑOS	11	21%
JOVENES 18 A 28 AÑOS TECNICOS, TECNOLOGOS O PROFESIONALES	5	10%
MUJERES	16	31%
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	1	48%
ADULTOS MAYORES	3	
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA	3	
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA	17	
MUJERES CABEZA DE HOGAR	6	

Imagen: Reporte Contratista

En términos generales, la interventoría concluye que la gestión social desarrollada por el contratista durante el período evaluado fue adecuada y consistente con las obligaciones contractuales, evidenciándose una articulación efectiva con las comunidades intervenidas, una atención oportuna a las inquietudes ciudadanas y el cumplimiento de las estrategias de inclusión y empleabilidad establecidas para la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN TÉCNICA

6.1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 2024-3653 se enmarca dentro de las estrategias de la Secretaría Distrital de Movilidad para fortalecer las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá D.C., atendiendo la necesidad permanente de implementar, mantener y modernizar la señalización vial y los dispositivos de seguridad requeridos para regular, prevenir e informar a los diferentes actores viales. Esta iniciativa surge de la identificación de problemáticas asociadas a la siniestralidad vial, el deterioro o ausencia de señalización, los cambios en las condiciones operativas de la infraestructura vial y la creciente demanda ciudadana relacionada con la organización y seguridad del tránsito.

El contrato tiene como objeto realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., Zona Sur Oriente, contribuyendo al

fortalecimiento del sistema integral de señalización de la ciudad y al cumplimiento de las metas establecidas por el Distrito en materia de movilidad segura e inclusiva.

Desde el punto de vista geográfico, el proyecto se desarrolla en la Zona Sur Oriente de Bogotá D.C., comprendiendo las localidades de San Cristóbal, Usme y Sumapaz, territorios que presentan características urbanas y rurales diversas, una amplia extensión vial y necesidades permanentes de intervención en materia de señalización y seguridad vial. Las actividades se ejecutan sobre corredores viales, intersecciones, espacio público asociado a la infraestructura de transporte, andenes, ciclorrutas y demás áreas bajo competencia de la Secretaría Distrital de Movilidad, de conformidad con los diseños de señalización aprobados y las prioridades definidas por la entidad.

En cuanto a su alcance técnico, el contrato contempla la ejecución integral de actividades de señalización horizontal, señalización vertical y suministro e instalación de dispositivos de seguridad vial, incluyendo la atención de requerimientos derivados de inspecciones en campo, implementación de diseños aprobados, adopción y ejecución de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), levantamiento y actualización de planos récord, georreferenciación de las intervenciones ejecutadas y atención de corredores viales priorizados. Asimismo, incorpora actividades de diagnóstico, verificación de condiciones de infraestructura, programación de obras, control de calidad de materiales y ejecución de medidas orientadas a mejorar las condiciones de movilidad y reducir factores de riesgo para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del sistema vial.

La interventoría también verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial y demás normas aplicables, supervisa la correcta ejecución de las actividades constructivas, controla los tiempos de ejecución, revisa los planes de manejo de tránsito, valida los planos récord y la georreferenciación de las intervenciones, y realiza el seguimiento a las garantías de los elementos implementados, asegurando que las obras ejecutadas cumplan con los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

En conjunto, los contratos de obra e interventoría constituyen una estrategia integral para fortalecer las condiciones de movilidad y seguridad vial en el sector Sur Oriente de Bogotá, garantizando la adecuada implementación de medidas de señalización y control del tránsito que permitan mejorar la organización de la circulación, reducir los riesgos de siniestralidad y brindar entornos más seguros y accesibles para todos los usuarios de la vía.

Con el fin de realizar el seguimiento técnico, físico y financiero de las actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra No. 2024-3653, se presenta la matriz consolidada de intervenciones ejecutadas, en la cual se

relacionan los identificadores (ID) asignados por la Secretaría Distrital de Movilidad, el valor económico asociado a cada intervención.

CUENTA	ID	LOCALIDAD	VALOR - DIGITAL
1	SH_SV_PUNTO4_TMSA	USME	$ 12.235.496,00
1	EX_05_93_1244_11	USME	$ 42.787.232,74
1	PMT DE EMERGENCIA SDM-202461204315912 y SDM-202461204636702	USME	$ 8.199.410,00
1	PMT DE EMERGENCIA SDM-202461204158462	USME	$ 2.328.163,00
1	PMT DE EMERGENCIA SDM-202461203879272	USME	$ 2.055.197,00
1	PMT DE EMERGENCIA SDM-202461204426482	USME	$ 2.648.273,00
1	PMT DE EMERGENCIA – SDM-202461204137592	USME	$ 12.673.759,00
1	EX_05_119_1867_12	USME	$ 182.212.251,81
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	USME	$ 377.436.656,36
1	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 162.230.791,33
2	PMT DE EMERGENCIA – SDM-202561200270682	USME	$ 2.520.830,00
2	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	USME	$ 13.349.147,00
2	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	USME	$ 154.426.158,64
2	EX_05_119_1867_12	USME	$ 340.341.610,43
2	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 113.866.563,11
2	SH_SV_PUNTO4_TMSA	USME	$ 48.812.858,90
2	EX_05_053_1744_10	USME	$ 154.686.810,54
2	PMT DE EMERGENCIA – SDM-202461204137592	USME	$ 6.272.955,00
2	EX_05_119_1867_12	USME	$ 16.295.642,46
2	EX_05_053_1744_10	USME	$ 140.750.504,44
2	EX_05_119_1867_12	USME	$ 129.983.767,45
2	EX_05_119_1867_12	USME	$ 182.212.251,81
2	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 93.514.344,07
2	SH_SV_PUNTO4_TMSA	USME	$ 34.930.953,85
2	SH_SV_PUNTO4_TMSA	USME	$ 43.428.662,37
2	MV_05_122_1867	USME	$ 63.907.357,00
3	EX_05_053_1744_10	USME	$ 2.661.234,60
3	EX_05_053_1744_10	USME	$ 26.493.551,00
3	EX_05_110_1867_12	USME	$ 3.839.917,86
3	EX_05_110_1867_12	USME	$ 175.964.506,93
3	EX_05_93_1244_11	USME	$ 12.058.689,42
3	EX_05_93_1244_11	USME	$ 232.932.776,04

3	EX_05_093_1244	USME	$ 80.880.800,00
3	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 402.337.546,37
3	MV_05_122_1867_12	USME	$ 11.907.170,00
3	EX_05_108_1867_12_V6	USME	$ 9.740.978,64
3	EX_241_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 42.684.112,22
3	EX_04_241_1561	SAN CRISTOBAL	$ 6.026.042,00
3	EX_04_262_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 73.708.763,44
3	EX_04_262_1561	SAN CRISTOBAL	$ 8.784.144,00
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	USME	$ 114.866.071,00
3	MV_04_511_676 CP_AV_1_MAYO	SAN CRISTOBAL	$ 6.399.713,00
3	EX_04_001_1073_24_V2 CP KR4_CL19ASUR	SAN CRISTOBAL	$ 883.105,00
3	EX_04_262_1561_10_ CP-KR 6_ CL 23 S_CL 22C S_ CL 22A S	SAN CRISTOBAL	$ 5.544.745,00
3	EX_05_119_1867_12	USME	$ 71.582.587,00
3	CP 202561200744162	USME	$ 28.089,00
4	CP_04_1099 ID EX_04_261_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 3.786.406,50
	CP_04_1099 ID EX_04_261_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 11.729.795,00
4	EX_05_003_1073_24	USME	$ 3.786.406,50
4	EX_05_003_1073_24	USME	$ 111.654.029,28
4	EX_04_001_1073_24_V2_ DETECCIÓN ELECTRÓNICA	SAN CRISTOBAL	$ 2.060.542,81
4	EX_05_110_1867_12	USME	$ 140.051.093,27
4	EX_05_110_1867_12	USME	$ 48.197.815,00
4	EX_05_119_1867_12	USME	$ 16.613.434,24
4	EX_05_119_1867_12	USME	-$ 349.633,00
4	EX_05_119_1867_12	USME	$ 11.582.772,00
4	EX_05_113_1867_12	USME	$ 18.846.509,88
4	EX_05_053_1744	USME	$ 19.273.972,00
4	EX_05_108_1867_12_V6	USME	$ 162.950.383,70
4	EX_05_108_1867	USME	$ 22.090.060,00
4	PMT CAUCE SIRE 5453567	SUMAPAZ	$ 3.299.014,00
4	EX_04_241_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 7.380.365,63
4	EX_04_262_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 21.585.378,61
4	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 279.650.177,56
4	CP-202561200703942	USME	$ 1.186.152,00
4	EX_05_93_1244_11	USME	$ 83.916.344,98
4	EX_05_093_1244	USME	$ 967.720,00

4	PMT202552600458242	SAN CRISTOBAL	$ 3.409.970,00
5	EX_05_93_1244_11	USME	$ 81.253.621,35
5	CP-202561200703942	USME	$ 3.625.904,52
5	MV_04_511_676_09_V11	SAN CRISTOBAL	$ 65.159.679,11
5	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	USME	$ 6.517.878,19
5	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 31.011.369,42
5	EX_04_001_1073_24_V2	SAN CRISTOBAL	$ 1.954.210,50
5	EX_04_241_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 6.947.051,64
5	EX_05_003_1073_24	USME	$ 25.567.983,01
5	EX_05_003_1073	USME	$ 44.885.910,00
5	EX_05_108_1867_12_V6	USME	$ 6.508.121,04
5	EX_05_113_1867_12	USME	$ 259.838.787,76
5	EX_05_113_1867_12	USME	$ 87.933.124,00
5	EX_04_262_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 55.060.382,09
5	EX_04_262_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 24.688.767,03
5	EX_05_005_1073_24	USME	$ 6.948.354,54
5	EX_05_119_1867_12	USME	$ 10.750.782,00
5	PMT SIRE 202561201605332	USME	$ 4.045.171,00
5	SDM-202561201385182	USME	$ 4.045.171,00
5	SIRE 2561201777022	USME	$ 2.805.407,00
5	EMBALSE LA REGADERA	USME	$ 4.656.326,00
6	EX_05_005_1073_24	USME	$ 179.059.697,31
6	EX_05_005_1073_24	USME	$ 8.409.005,00
6	EX_05_113_1867_12	USME	$ 59.082.307,00
6	EX_05_119_1867_12	USME	$ 65.747.918,00
6	CP_DE_MV_AV_BOYACA_941_09	USME	$ 17.881.165,00
6	EX_05_001_1073_24	USME	$ 11.800.210,44
6	EX_05_001_1073_24	USME	$ 21.432.641,00
6	EX_05_101_1244_11	USME	$ 91.206.349,00
6	EX_05_101_1244_11	USME	$ 12.227.486,00
6	EX_05_008_1073_24	USME	$ 56.404.792,51
6	EX_05_003_1073_24	USME	$ 6.124.961,52
6	CP_KR 14 X CL 76 S_BIKE BOX	USME	$ 26.679.261,42
7	MV_05_122_1867_12_V7	USME	$ 9.032.079,00
7	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	USME	$ 3.842.128,00
7	EX_05_008_1073_24	USME	$ 6.830.741,60

7	EX_05_307_1561_10	USME	$ 14.098.810,02
7	EX_05_307_1561_10_V4	USME	$ 98.308.911,78
7	EX_05_310_1561_10	USME	$ 42.442.031,00
7	EX_05_280_1561_10	USME	$ 125.425.315,00
7	CP_PASACALLES_AV_BOYACÁ		$ 3.377.745,00
7	PMT SDM-202561202098412	USME	$ 989.058,00
7	SDM-202561202230222	SAN CRISTOBAL	$ 749.288,00
7	EX_05_101_1244_11	USME	$ 136.269.489,79
7	EX_05_101_1244_11	USME	$ 3.369.179,00
7	CP BIKE BOX KR 14	USME	$ 749.288,00
7	EX_05_006_1744_10	USME	$ 4.394.142,66
7	EX_05_001_1073_24	USME	$ 3.292.859,76
8	EX_05_001_1073_24	USME	$ 159.188.571,29
8	EX_05_006_1744_10	USME	$ 29.429.931,58
8	EX_05_006_1744_10	USME	$ 942.709,00
8	CP_ BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	SAN CRISTOBAL	$ 97.388.889,59
8	CP_NUEVA_ROMA_EX_04_006_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 59.591.438,70
8	CP_NUEVA_ROMA_ EX_04_044_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 67.710.016,07
8	EX_05_280_1561_10	USME	$ 13.629.111,00
8	EX_05_008_1561_10	USME	$ 12.436.711,00
8	EX_05_213_1561_10	USME	$ 298.864.346,87
8	EX_05_310_1561_10	USME	$ 3.965.820,00
8	SDM-202561202584052 y SDM- 202561202664192	SAN CRISTOBAL	$ 2.727.403,00
8	CP_05_1524	USME	$ 1.074.740,00
8	PMT SDM-202561202439322	SAN CRISTOBAL	$ 3.200.594,00
8	PMT SDM-202561202657962	USME	$ 2.706.066,00
8	PMT SDM-202561202378942	USME	$ 494.529,00
8	PMT SDM-202561202284382	USME - SUMAPAZ	$ 2.706.066,00
8	PMT SDM-202561202284382	USME- CIUDAD BOLIVAR	$ 3.455.354,00
8	PMT SDM- SIRE 5456812	USME	$ 494.529,00
8	PMT SDM- 202561202286462	SAN CRISTOBAL	$ 1.978.115,00
8	PMT SDM-202561202379632	USME	$ 1.978.115,00
8	EX_05_307_1561_10	USME	$ 15.731.607,00
8	EX_05_119_1867_12	USME	$ 402.733,00
9	EX_05_352_1561_10	USME	$ 97.543.537,71
9	EX_05_352_1561_10	USME	$ 19.074.359,00

9	EX_05_286_1561_10	USME	$ 2.252.732,70
9	EX_05_286_1561_10	USME	$ 270.070.049,30
9	PENDONES KR 7	USAQUEN-CHAPINERO	$ 8.242.540,00
9	EX_04_241_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 13.000.871,58
9	EX_04_241_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 170.146.056,81
9	EX_04_488_826_10	SAN CRISTOBAL	$ 48.928.016,46
9	EX_04_488_826_10	SAN CRISTOBAL	$ 219.474.038,24
9	CP_DE_AUTOPISTA_AL_LLANO_MV_05_122_1867_12_V8.	USME	$ 481.602,24
9	CP_BARRIO_LA_MARIA_EX_04_124_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 10.585.809,00
9	EX_04_044_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 9.911.411,00
9	EX_04_006_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 9.082.922,00
10	CP_05_1669	USME	$ 28.089,00
10	CP_05_1670	USME	$ 805.466,00
10	CP_05_1671	USME	$ 28.089,00
10	CP_05_1673	USME	$ 402.733,00
10	CP_05_1646	USME	$ 402.733,00
10	CP_05_1647	USME	$ 402.733,00
10	CP_05_1648	USME	$ 28.089,00
10	CP_04_1594	SAN CRISTOBAL	$ 1.046.494,00
10	CP_04_1630	SAN CRISTOBAL	$ 1.342.364,00
10	SDM-20256120339962-DI-22669	USME	$ 989.058,00
10	EX_04_488_826_10	SAN CRISTOBAL	$ 128.348.234,00
10	EX_04_241_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 387.417.192,00
10	CP_DE_AUTOPISTA_AL_LLANO_MV_05_122_1867_12_V8.	USME	$ 7.901.283,00
10	EX_04_051_414_11	SAN CRISTOBAL	$ 27.346.694,00
10	EX_04_051_414_11	SAN CRISTOBAL	$ 312.491.106,03
10	EX_04_030_1561_10_V7	SAN CRISTOBAL	$ 283.407.397,97
11	EX_04_030_1561_10_V7	SAN CRISTOBAL	$ 88.023.748,40
12	EX_04_030_1561_10_V7	SAN CRISTOBAL	$ 511.270.431,00
12	CP_05_1690	USME	$ 3.294.915,00
12	EX_04_051_414_11	SAN CRISTOBAL	$ 26.222.231,00
12	EX_04_051_414_11	SAN CRISTOBAL	$ 137.313.737,00
12	CP-04_1630_SDM-202561201666332	SAN CRISTOBAL	$ 26.697.506,00
12	CP_04_1625	SAN CRISTOBAL	$ 1.023.334,00
12	CP_04_1627	SAN CRISTOBAL	$ 16.213.471,00
12	CP_04_1627	SAN CRISTOBAL	$ 1.597.118,00

12	CP AV BOYACA-KR 14I	USME	$ 1.261.138,00
12	CP-AV_BOYACA - KR 14I	USME	$ 16.686.977,00
12	EX_05_213_1561_10	USME	$ 53.002.882,00

SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD.

El seguimiento de indicadores por localidad dentro del informe Anual proporciona un análisis detallado del avance en la implementación de la señalización y dispositivos de seguridad vial. Para ello, se deben incluir datos específicos sobre la cantidad de señales verticales instaladas, zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados implementados, kilómetros-carril demarcados y la instalación de reductores de velocidad, entre otros elementos.

La información que solicita por parte de la secretaria es suministrada y se entrega de forma mensual o con mes vencido a la secretaria. Para el presente informe se presentan indicadores Anual, que es al acumulado de mes a mes, presentados y aprobados por la entidad. En el informe esta la evaluación de la ejecución conforme al formato suministrado por la entidad se presentará en el Anexo

1. IMPLEMENTAR MEDIDAS INTEGRALES DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, PACIFICACIÓN O TRÁFICO CALMADO.

	MEDIDAS INTEGRALES DE GESTIÓN DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRÁFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV	DEMARCACIÓN DE PASOS (PUNTOS CONÉCTATE) PUNTOS POR INTERVENCIÓN	INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETÍCULAS RALENTIZADORAS) PUNTO POR INTERVENCIÓN
LOCALIDAD	**CONTRATOS DE OBRA**	**CONTRATOS DE OBRA**	**CONTRATOS DE OBRA**
4 - SAN CRISTOBAL	222	5	16
5 - USME	538	2	43
20 - SUMAPAZ	0	0	0

Tabla 11 Implementar medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado.

2. IMPLEMENTAR SEÑALES VERTICALES DE PEDESTAL.

	VERTICALES INSTALADAS REGLAMENTARIAS UND	VERTICALES INSTALADAS PREVENTIVAS UND	VERTICALES INSTALADAS INFORMATIVAS UND
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	248	235	33
5 - USME	890	730	152
20 - SUMAPAZ	4	1	3

Tabla 12 Implementar señales verticales de pedestal.

3. INTERVENIR INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON SEÑALIZACIÓN DE ZONA ESCOLAR EN LAS VÍAS ALEDAÑAS

	DEMARCACIÓN DESARROLLOS DE ZONAS ESCOLAR
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	38
5 - USME	156
20 - SUMAPAZ	0

Tabla 13 Demarcación desarrollos de zonas escolar

4. DESARROLLAR 16 PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO, CON EL FIN DE RECUPERAR Y RECONVERTIR EL ESPACIO PÚBLICO PARA PRIORIZAR LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PEATONAL

	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE URBANISMO TACTICO PUNTO INTERVENIDO M2
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	0
5 - USME	0
20 – SUMAPAZ	0

Tabla 14 Implementación de proyectos de urbanismo táctico punto intervenido

5. INTERVENIR PASOS PEATONALES.

	CEBRAS UND
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	363
5 - USME	682
20 - SUMAPAZ	0

Tabla 15 Intervenir pasos peatonales.

6. DEMARCAR KM-CARRIL.

	DEMARCACIÓN CARRILES MIXTOS Y CICLORRUTA KM-CARRIL	DEMARCACION FRANJAS CONEXIÓN DE BICIUSUARIOS Y CARRILES PREFERENCIALES CON EQUIVALENCIA A DEMARCACIÓN KM-CARRIL
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	0	0
5 - USME	0	0
20 - SUMAPAZ	0	0

Tabla 16 Demarcar km-carril.

7. IMPLEMENTAR 28 KM DE SEÑALIZACIÓN Y /O DEMARCACIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD

	IMPLEMENTACION DE NUEVAS CICLORRUTAS KM
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	0,7505
5 - USME	0
20 - SUMAPAZ	0

Tabla 17 Implementación de nuevas ciclorrutas (km)

8. REALIZAR 60 KM DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN EN CICLO-INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD

	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CICLORRUTA EXISTENTE KM
LOCALIDAD	CONTRATOS DE OBRA
4 - SAN CRISTOBAL	92
5 - USME	247
20 - SUMAPAZ	0

Tabla 18 Mantenimiento de señalización y/o demarcación en ciclo-infraestructura en la ciudad

9. OTROS INDICADORES

LOCALIDAD	ELEVADAS INSTALADAS (CONTRATO ESPECIFICO) UND	ELEVADAS MANTENIDA (CONTRATO ESPECIFICO) UND	ANDENES EMERGENTES UND	PASACALLES UND	RETIRO SEÑALES VERTICALES UND	REUBICACION SEÑALES VERTICALES UND
4 - SAN CRISTOBAL	0	0	0	0	20	0
5 - USME	0	0	0	4	352	0
20 - SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0

Tabla 19 Otros indicadores

6.2. RELACIÓN DE AVANCE MENSUAL POR ÍTEM

El contrato de obra contempla la ejecución de actividades de suministro e implementación de elementos de señalización y seguridad vial, las cuales se reconocen mediante ítems de pago definidos en el Anexo Técnico y en la oferta económica del contratista. Estos ítems incluyen actividades de señalización horizontal y vertical, tales como pintura de líneas de carril, líneas de borde, pasos peatonales, demarcaciones especiales, flechas direccionales, leyendas, símbolos, instalación de señales verticales reglamentarias, preventivas e informativas, suministro e instalación de postes, dispositivos de canalización, hitos, delineadores, tachas reflectivas y demás elementos requeridos para garantizar la seguridad vial.

El pago de cada ítem se realiza con base en las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, aplicando los precios unitarios ofertados por el contratista. Para su reconocimiento económico, las actividades deben contar con los respectivos soportes técnicos, planillas de obra, registros fotográficos, planos récord y georreferenciación aprobada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Las cantidades ejecutadas son medidas en las unidades establecidas para cada actividad, tales como metros lineales (ml), metros cuadrados (m²), unidades (und) o globales, según corresponda. La interventoría verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de materiales, ubicación, dimensiones y condiciones de instalación antes de autorizar su inclusión en las actas de pago. En consecuencia, únicamente se reconocen los elementos de señalización y seguridad vial que hayan sido suministrados, instalados y recibidos a satisfacción dentro de los parámetros técnicos y contractuales establecidos por la Entidad.

ÍTEMS DE PAGO DE LA ZONA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE TABLEROS EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI , PELÍCULA ANTIGRAFFITI, PARA SEÑALES SP-SR-SI CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	M2	389	$ 193.395.597
2	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PEDESTAL SENCILLO EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIAMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2MM PARA SEÑALES SP-SR-SI (PARA TABLEROS IGUALES A 60 CM) CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	765	$ 120.974.805
3	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PEDESTAL DOBLE EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIAMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2MM PARA SEÑALES TIPO DÚPLEX SR/SP - SR/SR - SR/PLAQUETA - SP/SP - SP/PLAQUETA (PARA TABLEROS IGUALES A 60 CM) CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	166	$ 32.953.158
4	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARÍA Ó INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5MM Y MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CON BRAZO VARIABLE DESDE 70CM HASTA 120 CM, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UN	0	$ 0
5	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA, PREVENTIVA O INFORMATIVA DE 60 CM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI , PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM PARA SR - SP CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	697	$ 269.561.265
6	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 60 CM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI , PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM PARA SP/SR-SI/SR CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	261	$ 159.792.552
7	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR DE 60 CM , MATERIAL REFLECTIVO TIPO TIPO XI AMARILLO/VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM. CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	99	$ 74.255.544
8	FABRICACIÓN DE PLAQUETAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SEÑAL SR - SP - SI - ST (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	M2	22	$ 10.585.676
9	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP-47 B, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI AMARILLO/VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM. CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	44	$ 27.172.156
10	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA, PREVENTIVA Ó INFORMATIVA DE 75 CM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI , PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	102	$ 49.535.484
11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE DE 75CM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1.5MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM PARA SP/SR - SI/SR CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	0	$ 0
12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL REGLAMENTARIA, PREVENTIVA Ó INFORMATIVA DE 90 CM, MATERIAL REFLECTIVOTIPO XI , PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GAVANIZADO DE 2" SR - SP CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	0	$ 0
13	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 51 X 36 CM (FIGURA 5-14 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024), MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI AMARILLO/VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO 2" CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	44	$ 11.025.344

14	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR DOBLE DE CURVA HORIZONTAL DE 51 X 66 CM (FIGURA 5-14 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024), MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI AMARILLO / VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	4	$ 1.349.240
15	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL DOBLE PLANO (FIGURA 5-23 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024) 90X45 CM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI AMARILLO /VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	12	$ 4.417.272
16	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL SENCILLO PLANO (FIGURA 5-23 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024) 90X30 CM,MATERIAL REFLECTIVOTIPO XI AMARILLO /VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	22	$ 6.397.974
17	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP-46 Ó SP-46A, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI AMARILLO / VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	36	$ 12.993.336
18	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP-46 B, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI AMARILLO/VERDE FLUORESCENTE, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	79	$ 37.853.719
19	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 75 X 25 CM, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO INTERIOR DE 2" Y E=2 MM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	18	$ 4.954.338
20	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARÍA E INFORMATIVA DE 45 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM Y MATERIAL REFLECTIVOTIPO IV O SUPERIOR, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, CON TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 2.0 MM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	0	$ 0
21	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 45 CM CON TABLERO DOBLE EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5MM Y MATERIAL REFLECTIVOTIPO IV O SUPERIOR, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, CON TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 2.0 MM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL)	UN	0	$ 0
22	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 60 CM, SEÑAL REGLAMENTARIA, PREVENTIVA O INFORMATIVA, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C16 E=1,5 MM, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	75	$ 14.446.950
23	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 75 CM, SEÑAL REGLAMENTARIA, PREVENTIVA O INFORMATIVA, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C16 E=1,5 MM, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	0	$ 0
24	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 90 CM, SEÑAL REGLAMENTARIA, PREVENTIVA O INFORMATIVA, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C16 E=1,5 MM, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	0	$ 0
25	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 45 CM, SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARÍA E INFORMATIVA, LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM Y MATERIAL REFLECTIVOTIPO IV O SUPERIOR, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	0	$ 0
26	INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE PEDESTAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS TIPO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA, DÚPLEX, CHEVRONES Y DELINEADORES DE TODAS LAS DIMENSIONES) CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	291	$ 15.734.661
27	INSTALACIÓN Y/O RETIRO DE TABLEROS PARA SEÑALES VERTICALES. (INCLUYE SEÑAL ADOSADA, DÚPLEX Y TODOS LOS TAMAÑOS)	UN	0	$ 0
28	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA A ALMACÉN DE LA SDM (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DÚPLEX)	UN	676	$ 19.601.296
29	REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DÚPLEX)	UN	1	$ 64.154
30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 12 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M	0	$ 0
31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M	89753	$ 231.204.836
32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 20 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M	46986	$ 138.514.433
33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 25 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M	5073	$ 17.467.716
34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	41398	$ 750.044.978
35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO BASE AGUA NEGRA M2. ESPESOR SECO 9 MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	0	$ 0

36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 12 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	M	4459	$ 26.435.810
37	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SOLVENTE 15 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN	M	0	$ 0
38	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 20 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M	184	$ 1.582.702
39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE MARCAS VIALES CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	27	$ 1.359.966
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE MARCAS VIALES SIN MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
41	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PIGMENTADA (MULTICOLOR SEGÚN 3.7.3. COLOR DE LAS DEMARCACIONES PLANAS PARA URBANISMOS TÁCTICOS U OTRAS INTERVENCIONES TÁCTICAS URBANAS) MARCAS VIALES SIN MICROESFERA, INCLUYE ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
42	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 12 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA,CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	M	0	$ 0
43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 15 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M	0	$ 0
44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 20 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	M	0	$ 0
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA MARCAS VIALES CON MICROESFERA, ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	0	$ 0
46	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA MARCAS VIALES SIN MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	0	$ 0
47	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PIGMENTADA, CON ANTIDESLIZANTE, (MULTICOLOR SEGÚN 3.7.3. COLOR DE LAS DEMARCACIONES PLANAS PARA URBANISMOS TÁCTICOS U OTRAS INTERVENCIONES TÁCTICAS URBANAS) PARA MARCAS VIALES SIN MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE. ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
48	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 10 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN EN CICLORRUTA, SIN MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	M	15	$ 54.090
49	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA MARCAS VIALES, CON ANTIDESLIZANTE, SIN MICROESFERA. DEMARCACIÓN DE BAHÍAS, ESPESOR SECO DE 9 MILS Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	M2	0	$ 0
50	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLÁSTICA A = 12 CM, PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN,CON ANTIDESLIZANTE, INCLUYE MICROESFERA Y ESPESOR SECO 90 MILS (2.3MM)	M	0	$ 0
51	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLÁSTICA A = 15 CM, PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN,CON ANTIDESLIZANTE, INCLUYE MICROESFERA Y ESPESOR SECO 90 MILS (2.3MM)	M	0	$ 0
52	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLÁSTICA A = 20 CM, PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN,CON ANTIDESLIZANTE, INCLUYE MICROESFERA Y ESPESOR SECO 90 MILS (2.3MM)	M	0	$ 0
53	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLÁSTICA PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, Y ESPESOR SECO DE 90 MILS (2.3MM), INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
54	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLÁSTICA PARA MARCAS VIALES, CON ANTIDESLIZANTE, CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO DE 90 MILS (2.3MM), INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
55	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE 12 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, Y ESPESOR SECO MÍNIMO DE 22 MILS (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY)SEGÚN NORMA NTC 4744	M	85370	$ 728.972.722
56	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE 15 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON ANTIDESLIZANTE, CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO MÍNIMO DE 22 MILS (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY) SEGÚN NORMA NTC 4744	M	46986	$ 688.390.421
57	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE 20 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON ANTIDESLIZANTE, CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO MÍNIMO DE 22 MILS (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY) SEGÚN NORMA NTC 4744	M	4890	$ 78.277.606
58	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES,CON ANTIDESLIZANTE, CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO MÍNIMO DE 22 MILS (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY) SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
59	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES SIN MICROESFERA,CON ANTIDESLIZANTE, Y ESPESOR SECO DE MÍNIMO DE 22 MILS (POR PULVERIZACIÓN O SPRAY) SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
60	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE 12 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, Y ESPESOR SECO DE 50 MILS (EXTRUIBLE) SEGÚN NORMA NTC 4744	M	0	$ 0
61	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE 15 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON ANTIDESLIZANTE, CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO DE 50 MILS (EXTRUIBLE) SEGÚN NORMA NTC 4744	M	0	$ 0

62	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE 20 CM PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, Y ESPESOR SECO DE 50 MILS (EXTRUIBLE) SEGÚN NORMA NTC 4744	M	0	$ 0
63	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON ANTIDESLIZANTE, CON MICROESFERA Y ESPESOR SECO DE 50 MILS (EXTRUIBLE) SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
64	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES SIN MICROESFERA, CON ANTIDESLIZANTE, Y ESPESOR SECO DE 50 MILS (EXTRUIBLE) SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
65	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL (MÉTODO LLANA) DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO CON MICROESFERAS, CON ANTIDESLIZANTE, PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE 50 MILS SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	17768	$ 2.313.479.755
66	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL (MÉTODO LLANA) DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO SIN MICROESFERAS, CON ANTIDESLIZANTE, PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE 50 MILS SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	9538	$ 1.286.809.070
67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL (MÉTODO LLANA) DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PIGMENTADA (MULTICOLOR SEGÚN 3.7.3. COLOR DE LAS DEMARCACIONES PLANAS PARA URBANISMOS TÁCTICOS U OTRAS INTERVENCIONES TÁCTICAS URBANAS) SIN MICROESFERAS, CON ANTIDESLIZANTE, PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE 50 MILS SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	324	$ 44.339.037
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTIDESLIZANTE PARA MARCAS VIALES SEGÚN NORMA NTC 2072	M2	0	$ 0
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS SEGUN DISEÑO. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UN	2114	$ 24.915.604
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS SEGÚN DISEÑO CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UN	6348	$ 104.361.120
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES PLÁSTICOS DE 10 CM DE DIÁMETRO Y 2 CM DE ALTURA (NTC 4745). FIGURA 5-22 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN	0	$ 0
72	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES PLÁSTICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. FIGURA 5-22 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN	0	$ 0
73	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. FIGURA 5-22 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN	66182	$ 1.098.356.472
74	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE TACHÓN EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y MATERIAL RETROREFLECTIVO TIPO XI EN LOS COSTADOS (TIPO PIRAMIDAL CON BASE RECTANGULAR, CON INCRUSTACIÓN AL PAVIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 6 CM, ANCHO DE 15 CM Y LARGO 25 CM). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UN	0	$ 0
75	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÁXIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UN	1608	$ 167.076.024
76	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE METÁLICO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÁXIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UN	0	$ 0
77	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE, EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O CONCRETO DE 4000 PSI CON VARILLA DE REFUERZO DE 1/2"(TIPO PIRAMIDAL CON INCRUSTACIÓN AL PAVIMENTO CON CUATRO ANCLAJES EN VARILLA DE 5/8" DE DIÁMETRO POR 4" DE LONGITUD, DIMENSIONES: ALTURA MÁXIMA DE 15 CM, ANCHO DE 20 CM Y LARGO 100 CM). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UN	22	$ 5.216.816
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA METÁLICA DE COLOR AMARILLO, CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON LENTES REFLECTANTES (DIMENSIONES MÁXIMAS: DE 7 CM DE ALTURA Y 24 CM DE BASE SEGÚN FIGURA 5-3 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	UN	0	$ 0
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO, CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON LENTES REFLECTANTES (DIMENSIONES MÁXIMAS: DE 7 CM DE ALTURA Y 24 CM DE BASE SEGÚN FIGURA 5-3 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	UN	0	$ 0
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (FIGURA 5-19 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE DE COLOR AMARILLO CON TRES BANDAS DE 7,5 CM EN MATERIAL REFLECTIVOBLANCO TIPO XI , ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UN	806	$ 52.702.728
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR DE CORONA (HITOS DE ARISTA) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE DE COLOR BLANCO, FRANJA NEGRA Y MATERIAL RETROFLECTIVO TIPO XI (TIPO "A", FIJADO EN CONCRETO, ALTURA MÍNIMA DE 75 CM Y MÁXIMA DE 120 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-11 RESOLUCIÓN	UN	0	$ 0

	20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. 8 (SEGUN DISEÑO)			
82	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 1 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA MONA #2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2	0	$ 0
83	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2	947	$ 444.162.207
84	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 3/4", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2	315	$ 131.915.589
85	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BANDA ALERTADORA EN RESINA CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MÍNIMO DE 25 CM Y ALTURA MÁXIMA DE 2 CM. INCLUYE MATERIALES PARA LA FIJACIÓN.	M	0	$ 0
86	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE RESALTO PORTÁTIL DE CAUCHO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MÍNIMO DE 30 CM Y ALTURA ENTRE 2 Y 8 CM. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. FIGURA 5.32 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	M	0	$ 0
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HITO DE VÉRTICE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AZUL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y MATERIAL RETRORREFLECTIVO TIPO XI EN LA PARTE SUPERIOR (TIPO SEMICILINDRICO CON INCRUSTACIÓN AL PAVIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 0,90 M ANCHO DE 1,0 M DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-26 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UN	0	$ 0
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALIZA ILUMINADA ELEVADA (LUZ INTERMITENTE DE COLOR AMARILLO) DIMENSIONES DE ACUERDO CON LA FIGURA 6.4 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN	0	$ 0
89	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LASTRADO (CON MATERIAL GRANULAR MÍNIMO A ¼ DE SU ALTURA) DE MALETÍN PLÁSTICO DE BASE MÍNIMA DE 50 CM POR 200 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 100 CM, CON MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI COLOR BLANCO, INCLUYE TRANSPORTES, INSTALACIÓN Y LASTRADO.	UN	0	$ 0
90	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LASTRADO (CON MATERIAL GRANULAR AL TOPE DE SU ALTURA) DE DELINEADOR TUBULAR TIPO CANALIZADOR DE 129 CM DE ALTURA, INCLUYE TRANSPORTES, INSTALACIÓN Y LASTRADO CON MATERIAL GRANULAR AL TOPE DE SU ALTURA.	UN	0	$ 0
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, DE CALIBRE MÍNIMO 2 MM DE 10 CM DE ANCHO POR 500M DE LONGITUD POR ROLLO.	M	0	$ 0
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASACALLE EN TELA VENDAVAL.	M2	108	$ 17.932.428
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRE CON POLISOMBRA AL 65% MIXTA (AZUL TRASLUCIDO-VERDE) DE ALTURA 2,1 METROS.	M2	0	$ 0
94	RETIRO DE TACHONES, HITO O RESALTOS PORTÁTILES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE, INCLUYE ENTREGA EN PATIOS DE LA SDM	UN	103	$ 826.678
95	RETIRO DE TACHAS REFLECTIVAS Ó ESTOPEROLES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE, INCLUYE ENTREGA EN PATIOS DE LA SDM	UN	1882	$ 6.777.082
96	RETIRO DE BANDAS EN AGREGADO.	M2	0	$ 0
97	RETIRO DE PASACALLE, INCLUYE TRANSPORTE A PATIOS DE LA SDM	UN	10	$ 538.840
98	DESMONTE Y RETIRO A NIVEL DE ESTRUCTURA METÁLICA, TABLEROS Y/O LAMAS EXISTENTES DE SEÑALES CON PEDESTAL DE 4" A 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE TRANSPORTE A PATIOS DE LA SDM	UN	0	$ 0
99	LIMPIEZA CON HIDROLAVADO	UN	0	$ 0
100	BORRADO MECÁNICO DE MARCAS VIALES.	M2	9995	$ 492.974.739
101	TRANSPORTE DE MATERIALES	TON	0	$ 0
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO)PARA LASTRADO DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0	$ 0
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO TRAPEZOIDAL O POMPEYANO, MATERIAL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, LARGO MIN 2,5 M, 2 RAMPAS DE ACCESO LARGO 1 M PENDIENTE 15% MÁX. Y ALTURA 10 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN (FIGURA 5-30 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024). (POR METRO DE ANCHO VIAL)	M2	0	$ 0
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR CILÍNDRICO O HITO TUBULAR, COLOR AMARILLO, MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE, DOS BANDAS DE MIN 10 CM EN MATERIAL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA ENTRE 45 Y 80 CM, DIÁMETRO ENTRE 9,5 Y 21,5 CM (FIGURA 5-23 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024), INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN	UN	0	$ 0
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESALTO PARABÓLICO Y CIRCULAR, MATERIAL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, LARGO ENTRE 3,7 Y 6,7 M Y ALTURA MÁX. 10 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN (FIGURA 5-31 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024) (POR METRO DE ANCHO VIAL)	M2	0	$ 0
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESALTO TIPO COJÍN EN CAUCHO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON LARGO ENTRE 2 Y 3 M, ANCHO ENTRE 1,6 Y 1,8 M Y ALTURA ENTRE 6 Y 7,5 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN). FIGURA 5-33 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	M2	0	$ 0

107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESALTO TIPO COJÍN EN PLÁSTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON LARGO ENTRE 2 Y 3 M, ANCHO ENTRE 1,6 Y 1,8 M Y ALTURA ENTRE 6 Y 7,5 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN). FIGURA 5-33 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	M2	0	$ 0
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ISLAS PEATONALES ANCHO MIN 1,2 M, ALTURA ENTRE 10 Y 15 CM, MATERIAL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN (FIGURA 6.8 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	UN	0	$ 0
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ISLAS PEATONALES ANCHO MIN 1,5 M, ALTURA ENTRE 10 Y 15 CM, MATERIAL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN (FIGURA 6.8 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	UN	0	$ 0
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA VIAL DE SEÑALIZACIÓN EN PVC O SIMILAR, COLOR NARANJA, CUATRO FRANJAS HORIZONTALES (2 BLANCAS, 2 NARANJA DE MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR), ALTURA 140 CM, FIGURA 7-16 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN	0	$ 0
111	BALIZA DESTELLANTE DE COLOR AMARILLO, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 3.18.5 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN	0	$ 0
112	TOPE VEHICULAR VERTICAL, MATERIAL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ALTURA MIN 60 CM CON UNA BANDA DE 15 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, DIÁMETRO MIN 60 MM (FIGURA 5-20 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024), INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN	UN	0	$ 0
113	ISLAS PEATONALES ANCHO MIN 1,8 M, ALTURA ENTRE 10 Y 15 CM, MATERIAL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN (FIGURA 6.8 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	UN	0	$ 0
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR BLANCO E= 90 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR BLANCO E= 125 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
116	HITO LUMINOSO, CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNO, LUZ CONTINUA, BLANCO O AMARILLO, ALTURA DE 70 CM, ANCHO MÍN. 30 CM (FIGURA 5-27 RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024) PROVISTO DE UN SISTEMA DE ENERGIZACIÓN	UN	0	$ 0
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TACHAS ILUMINADAS BIDIRECCIONALES INTERNAMENTE (LUZ CONTINUA O INTERMITENTE) CON SUPERFICIE RETRORREFLECTIVA DE ÁREA MÍNIMA DE 600 MM2,CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA ESTABLECIDOS EN LA NTC 4745.	UN	0	$ 0
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR AMARILLO E= 90 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR AMARILLO E= 125 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR ROJO E= 90 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR ROJO E= 125 MILS.CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR AZUL E= 90 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN TERMOPLÁSTICO PREFORMADA DE COLOR AZUL E= 125 MILS. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS FOTOLUMINISCENTES PARA PASO VEHICULAR DE 8 MM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 3 MM Y RESINA EPÓXICA. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NTC 5868 Y NTC 4744	M2	0	$ 0
125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS FOTOLUMINISCENTES PARA CICLORRUTAS; DE 8 MM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 3 MM Y RESINA EPÓXICA.	M2	0	$ 0
126	ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE, EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O CONCRETO DE 4000 PSI CON VARILLA DE REFUERZO DE 1/2"(TIPO PIRAMIDAL CON INCRUSTACIÓN AL PAVIMENTO CON CUATRO ANCLAJES EN VARILLA DE 5/8" DE DIÁMETROPOR 4" DE LONGITUD, DIMENSIONES: ALTURA MÍNIMA DE15 CM, ANCHO DE 20 CM Y LARGO 100 CM). INCLUYE TRANSPORTE DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN	UN	0	$ 0
127	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE PIGMENTADA (VERDE O NARANJA O ROJO O AZUL) MARCAS VIALES CON MICROESFERA Y ANTIDESLIZANTE, ESPESOR SECO 9 MILS Y 51% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, INCLUYE PICTOGRAMAS	M2	0	$ 0
128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL (MÉTODO LLANA) DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PIGMENTADA (MULTICOLOR SEGÚN 3.7.3. COLOR DE LAS DEMARCACIONES PLANAS PARA URBANISMOS TÁCTICOS U OTRAS INTERVENCIONES TÁCTICAS URBANAS) CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE 50 MILS SEGÚN NORMA NTC 4744, INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	0	$ 0
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS Y/O LAMAS EN LAMINA GALVANIZADA C-20, PAPEL RETROFLECTIVO TIPO XI; FONDOS, TEXTOS, FLECHAS, PICTOGRAMAS Y ORLAS EN IMPRESIÓN DIGITAL. INCLUYE PAPEL ANTIGRAFITTI, TORNILLERIA, PERFILES PARA MARCOS Y ABRAZADERAS.	M2	0	$ 0

Tabla 20. Ítems de Pago - Suministro e Implementación de elementos de señalización y seguridad vial
Fuente: propia

En el Anexo 9 RELACIÓN AVANCE MENSUAL POR ITEM, se presenta documento en Excel en donde se relacionan las cantidades ejecutadas y pagadas por cada uno de los ítems del componente de obra en cada uno de los 12 meses transcurridos del contrato para las actividades ejecutadas durante el periodo del 24 de enero de 2025 al 24 de enero de 2026

6.3. RELACIÓN DE SUMINISTROS POR ÍTEM

El contratista realizó el suministro de materiales, dispositivos y elementos requeridos para la implementación de la señalización vial y los dispositivos de seguridad vial contemplados en el contrato. Los suministros fueron entregados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad y comprendieron materiales para señalización horizontal, señalización vertical y elementos complementarios de seguridad vial.

La relación de suministros fue controlada mediante registros de entrada a almacén y actas de entrega, permitiendo verificar la trazabilidad de los materiales incorporados al proyecto. La interventoría efectuó seguimiento a las cantidades suministradas, calidad de los materiales y cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, verificando que los elementos utilizados correspondieran a los aprobados dentro del contrato.

Los suministros ejecutados durante el período fueron incorporados a las actividades de obra y reflejados en las respectivas actas de corte y pago, siendo reconocidos únicamente aquellos materiales efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por la interventoría y la secretaria de movilidad, de conformidad con las cantidades de obra ejecutadas y los precios unitarios establecidos contractualmente.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1S	Suministro de cono vial construido en material sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	258	$ 26.149.848
2S	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	200	$ 90.793.600
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura.	UND	0	$ 0
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	24	$ 5.191.176
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	188	$ 6.973.484
6S	Barricada, ancho 2,4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo iv o superior (blanco y naranja), altura min 1,5m, figura 7-14 resolución 20243040045005 del 17/09/2024.	UND	10	$ 4.554.920
7S	Señal pare/siga en papel retroreflectivo tipo IV o superior (30 cm)	UND	32	$ 1.665.248
8S	Valla de apertura tipo A	UND	0	$ 0
9S	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	UND	14	$ 586.628

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
10S	Bastón luminoso Bicolor	UND	334	$ 44.397.284
11S	Señales temporales SR- SP con apoyo trípode	UND	40	$ 13.442.920
12S	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	UND	20	$ 1.011.100
13S	Valla rompe tráfico de 0,80 x 1,20 m, construida en tubo cuadrado de 1" c-18 y lámina galvanizada c-20 (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND	14	$ 8.433.446
14S	Suministro de banner 1,20 m x 1,20 m con impresión digital full color, en lona vinílica (aplicación y el uso de la marca ciudad) con ojales	UND	0	$ 0

Tabla 21 Ítems de Pago - Suministro de elementos de señalización y seguridad vial
Fuente: propia

En el Anexo 10 RELACIÓN DE SUMINISTRO POR ÍTEM se presenta un documento en Excel donde se relacionan los 14 ítems del componente de suministro en cada uno de los 12 meses transcurridos del contrato para las actividades ejecutadas durante el periodo del 24 de enero de 2025 al 24 de enero de 2026

6.4. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el primer año de ejecución del contrato de obra No. 2024-3653 y del contrato de interventoría No. 2024-3668 se presentaron diversas situaciones que afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas. La principal dificultad estuvo relacionada con las condiciones climáticas adversas registradas en la ciudad, caracterizadas por periodos prolongados de lluvia y alta humedad sobre la carpeta asfáltica. Estas condiciones limitaron la ejecución de actividades de señalización horizontal, demarcación vial e instalación de algunos dispositivos de seguridad vial, debido a que los materiales utilizados requieren superficies secas y condiciones ambientales adecuadas para garantizar su correcta adherencia, durabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, se presentaron dificultades derivadas de la gestión técnica y administrativa del contrato, especialmente en los procesos de diseños definitivos y los reprocesos, la revisión de diseños que no fueron asignados y la aprobación de diseños, validación de planos récord, verificación de georreferenciación y consolidación de soportes documentales requeridos para el trámite de las cuentas mensuales. Estas actividades demandaron ajustes, revisiones complementarias y coordinación permanente entre el contratista, la interventoría y la Entidad, generando en algunos casos reprocesos y ampliación de los tiempos de validación.

Se evidenciaron situaciones de inconformidad y oposición por parte de algunos sectores de la comunidad frente a la implementación de elementos de moderación de tráfico, particularmente reductores de velocidad, lo que ocasionó retrasos temporales en determinados frentes de trabajo y la necesidad de desarrollar jornadas de

socialización y concertación para garantizar la continuidad de las intervenciones. Se anexan en los Anexos, Ver https://drive.google.com/drive/folders/1k8AIL3znuajzV2KVXW9Bc8FK7Z5hcCoK?usp=drive_link

6.5. ACTAS DE COMITÉS DEL CONTRATO

En el año del contrato se realizaron los comités de seguimiento y control contractual programados entre la Secretaría Distrital de Movilidad, el contratista de obra y la interventoría. En dichas reuniones se efectuó el seguimiento al avance físico, financiero y presupuestal del contrato, revisión de la programación de actividades, análisis de indicadores de gestión, control de calidad de las actividades ejecutadas, seguimiento a aspectos ambientales, sociales, administrativos y de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la revisión de observaciones, requerimientos y compromisos pendientes.

Reunión de Seguimiento No.	Fecha	Actas	Lugar	Contratista	Interventoría	SDM
1	29-enero-25	Comité 1 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
2	05-febrero-25	Comité 2 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
3	12-febrero-25	Comité 3 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
4	19-febrero-25	Comité 4 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
5	26-febrero-25	Comité 5 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
6	05-marzo-25	Comité 6 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
7	12-marzo-25	Comité 7 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
8	19-marzo-25	Comité 8 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
9	26-marzo-25	Comité 9 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
10	02-abril-25	Comité 10 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
11	09-abril-25	Comité 11 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
12	16-abril-25	Comité 12 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
13	16-abril-25	Comité 13 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
14	30-abril-25	Comité 14 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
15	07-mayo-25	Comité 15 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
16	14-mayo-25	Comité 16 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
17	21-mayo-25	Comité 17 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
18	28-mayo-25	Comité 18 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
19	04-junio-25	Comité 19 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
20	11-junio-25	Comité 20 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
21	18-junio-25	Comité 21 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x

Reunión de Seguimiento No.	Fecha	Actas	Lugar	Contratista	Interventoría	SDM
22	25-junio-25	Comité 22 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
23	02-julio-25	Comité 23 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
24	09-julio-25	Comité 24 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
25	16-julio-25	Comité 25 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
26	23-julio-25	Comité 26 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
27	30-julio-25	Comité 27 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
28	06-agosto-25	Comité 28 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
29	13-agosto-25	Comité 29 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
30	20-agosto-25	Comité 30 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
31	27-julio-25	Comité 31 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
32	03-septiembre-25	Comité 32 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
33	10-septiembre-25	Comité 33 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
34	17-septiembre-25	Comité 34 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
35	24-septiembre-25	Comité 35 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
36	01-octubre-25	Comité 36 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
37	08-octubre-25	Comité 37 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
38	15-octubre-25	Comité 38 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
39	22-octubre-25	Comité 39 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
40	29-octubre-25	Comité 40 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
41	03-noviembre-25	Comité 41 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
42	10-noviembre-25	Comité 42 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
43	17-noviembre-25	Comité 43 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
44	26-noviembre-25	Comité 44 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
45	03-diciembre-25	Comité 45 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
46	10-diciembre-25	Comité 46 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
47	17-diciembre-25	Comité 47 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
48	22-diciembre-25	Comité 48 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
49	29-diciembre-25	Comité 49 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
50	07-enero-26	Comité 50 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
51	14-enero-26	Comité 51 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x
52	21-enero-26	Comité 51 de seguimiento técnico	SDM	x	x	x

Las actas de comité fueron elaboradas y suscritas por los participantes de cada reunión, dejando constancia de las decisiones adoptadas, compromisos establecidos, responsables y plazos de cumplimiento. Estos documentos constituyen el soporte formal de coordinación y seguimiento del proyecto, permitiendo evidenciar el control

permanente ejercido por la interventoría y la Entidad sobre la ejecución contractual. En el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, se realizaron 52 comités técnicos del contrato, para los cuales existe un acta de reunión de cada uno y se presentan en el Anexo 11 ACTAS DE COMITÉS DEL CONTRATO.

6.6. REGISTRO MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El registro mensual del estado general del tiempo durante la ejecución del contrato de obra No. 2024-3653 y del contrato de interventoría No. 2024-3668 evidenció condiciones climáticas variables, presentándose jornadas con lluvia, nubosidad y humedad que afectaron principalmente las actividades de señalización horizontal, demarcación vial e implementación de dispositivos de seguridad vial, debido a las restricciones técnicas para la aplicación de pintura y materiales sobre superficies húmedas. Estas condiciones obligaron en algunos casos a reprogramar actividades operativas y ajustar cronogramas de trabajo en campo, manteniendo por parte de la interventoría el seguimiento y control permanente sobre la programación y calidad de las actividades ejecutadas.

FECHA (DD/MM/AA)	LLUVIAS	HORA INICIO (Diurno / Nocturno)	INTENSIDAD	ACTIVIDAD EN DESARROLLO	OBSEVACIONES
viernes, 24 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
sábado, 25 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
domingo, 26 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
lunes, 27 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
martes, 28 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PISTA Y PMT
miércoles, 29 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
jueves, 30 de enero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
viernes, 31 de enero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT

	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
sábado, 01 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
domingo, 02 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
lunes, 03 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
martes, 04 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
miércoles, 05 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
jueves, 06 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
	NO	Nocturna	NADA	N/A	NO SE INICIARON ACTIVIDADES POR FALTA DE PMT
viernes, 07 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 08 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 09 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
lunes, 10 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	N/A	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
martes, 11 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	N/A	
	NO	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
miércoles, 12 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 13 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 14 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 15 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	
	NO	Nocturna	NADA	N/A	

domingo, 16 de febrero de 2025	SI	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
lunes, 17 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
	NO	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
martes, 18 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 19 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 20 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
viernes, 21 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 22 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	N/A	
	NO	Nocturna	LLUVIA MODERADA	N/A	
domingo, 23 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
lunes, 24 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 25 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 26 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 27 de febrero de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	EL CONTRATISTA REANUDÓ ACTIVIDADES DESPUES DE LAS LLUVIAS
	SI	Nocturna	LLUVIA FUERTE	HORIZONTAL	
viernes, 28 de febrero de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA FUERTE	HORIZONTAL	
sábado, 01 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 02 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
lunes, 03 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	

martes, 04 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 05 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
jueves, 06 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
viernes, 07 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA FUERTE	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 08 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	
	NO	Nocturna	NADA	N/A	
domingo, 09 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 10 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 11 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
miércoles, 12 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 13 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA FUERTE	HORIZONTAL	CONTRATISTA CANCELA ACTIVIDADES
viernes, 14 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA FUERTE	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 15 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	
	NO	Nocturna	NADA	N/A	
domingo, 16 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
lunes, 17 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA FUERTE	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
martes, 18 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MUY FUERTE	HORIZONTAL	
miércoles, 19 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 20 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	

	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 21 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 22 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	N/A	
	NO	Nocturna	NADA	N/A	
domingo, 23 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 24 de marzo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 25 de marzo de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
miércoles, 26 de marzo de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
jueves, 27 de marzo de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
viernes, 28 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 29 de marzo de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
domingo, 30 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
lunes, 31 de marzo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA FUERTE	HORIZONTAL	
martes, 01 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
miércoles, 02 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
jueves, 03 de abril de 2025	NO	Diurna			
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
viernes, 04 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 05 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
domingo, 06 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
lunes, 07 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			

martes, 08 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
miércoles, 09 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
jueves, 10 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
viernes, 11 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna			
sábado, 12 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
domingo, 13 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
lunes, 14 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
martes, 15 de abril de 2025	NO	Diurna			
	NO	Nocturna			
miércoles, 16 de abril de 2025	NO	Diurna			
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
jueves, 17 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
viernes, 18 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
sábado, 19 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna			
domingo, 20 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
lunes, 21 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
martes, 22 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
miércoles, 23 de abril de 2025	NO	Diurna			
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
jueves, 24 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna			

viernes, 25 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	VERTICAL
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
sábado, 26 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
domingo, 27 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
lunes, 28 de abril de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
martes, 29 de abril de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
miércoles, 30 de abril de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
jueves, 01 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
viernes, 02 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	VERTICAL Y HORIZONTAL
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
sábado, 03 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
domingo, 04 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
lunes, 05 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	VERTICAL Y HORIZONTAL
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL Y HORIZONTAL	VERTICAL Y HORIZONTAL
martes, 06 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	VERTICAL
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
miércoles, 07 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
jueves, 08 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	VERTICAL
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
viernes, 09 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
sábado, 10 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON

domingo, 11 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
lunes, 12 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
martes, 13 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
miércoles, 14 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
jueves, 15 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
viernes, 16 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
sábado, 17 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
domingo, 18 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
lunes, 19 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	VERTICAL
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
martes, 20 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
miércoles, 21 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
jueves, 22 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
viernes, 23 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	HORIZONTAL
sábado, 24 de mayo de 2025	NO	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
	NO	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	NO PROGRAMARON
domingo, 25 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 26 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 27 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	

	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 28 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	MANIFESTACIONES
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	MANIFESTACIONES, SE PRESENTAN ACTIVIDADES PERO SE CANCELAN POR LLUVIAS DESDE 11 PM SAN CRISTOBAL
jueves, 29 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 30 de mayo de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 31 de mayo de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 01 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 02 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 03 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 04 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 05 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 06 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	Lluvias desde las 11:00 pm en el ID 113
sábado, 07 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 08 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	Lluvias desde las 11:54 pm en el ID 119
lunes, 09 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
martes, 10 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 11 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 12 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	

viernes, 13 de junio de 2025	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 14 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 15 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 16 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	Se cancelan actividades por lluvias 11:18PM
martes, 17 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	Se cancelan actividades por lluvias 11:59PM
miércoles, 18 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 19 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
viernes, 20 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 21 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 22 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 23 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
martes, 24 de junio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
miércoles, 25 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 26 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 27 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 28 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 29 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 30 de junio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO

	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
martes, 01 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 02 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 03 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 04 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 05 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 06 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 07 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
martes, 08 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 09 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 10 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
viernes, 11 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 12 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 13 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 14 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 15 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
miércoles, 16 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	Se cancelan actividades por lluvias 10:16AM
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	

jueves, 17 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
viernes, 18 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
sábado, 19 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 20 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 21 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
martes, 22 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 23 de julio de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 24 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 25 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 26 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 27 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
lunes, 28 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
martes, 29 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
miércoles, 30 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 31 de julio de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 01 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	

sábado, 02 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 03 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 04 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
martes, 05 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 06 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 07 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
viernes, 08 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 09 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 10 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 11 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 12 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 13 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 14 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	Se cancelan actividades por lluvias 12:11 AM
viernes, 15 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 16 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 17 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	

lunes, 18 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 19 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
miércoles, 20 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 21 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
viernes, 22 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 23 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 24 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 25 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 26 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 27 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	LLUVIAS PERMANENTES
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 28 de agosto de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
	SI		LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
viernes, 29 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 30 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 31 de agosto de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
lunes, 01 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
martes, 02 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	

miércoles, 03 de septiembre de 2025	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
jueves, 04 de septiembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 05 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 06 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 07 de septiembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 08 de septiembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 09 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 10 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 11 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 12 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	VERTICAL	
sábado, 13 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 14 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 15 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
martes, 16 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 17 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 18 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 19 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	

sábado, 20 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 21 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 22 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 23 de septiembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 24 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 25 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 26 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 27 de septiembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 28 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 29 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 30 de septiembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	LLUVIAS PERMANENTES
miércoles, 01 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 02 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 03 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 04 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
domingo, 05 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 06 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	

	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 07 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 08 de octubre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 09 de octubre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 10 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 11 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 12 de octubre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 13 de octubre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
martes, 14 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 15 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
jueves, 16 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
viernes, 17 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
sábado, 18 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 19 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 20 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
martes, 21 de octubre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 22 de octubre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	

jueves, 23 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 24 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 25 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 26 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 27 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
martes, 28 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 29 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 30 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 31 de octubre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 01 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 02 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 03 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 04 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 05 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
jueves, 06 de noviembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 07 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	

sábado, 08 de noviembre de 2025	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 09 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 10 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
martes, 11 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 12 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 13 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	HORIZONTAL	
viernes, 14 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
sábado, 15 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
domingo, 16 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
lunes, 17 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
martes, 18 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
miércoles, 19 de noviembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 20 de noviembre de 2025	SI	Diurna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA MODERADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 21 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 22 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	

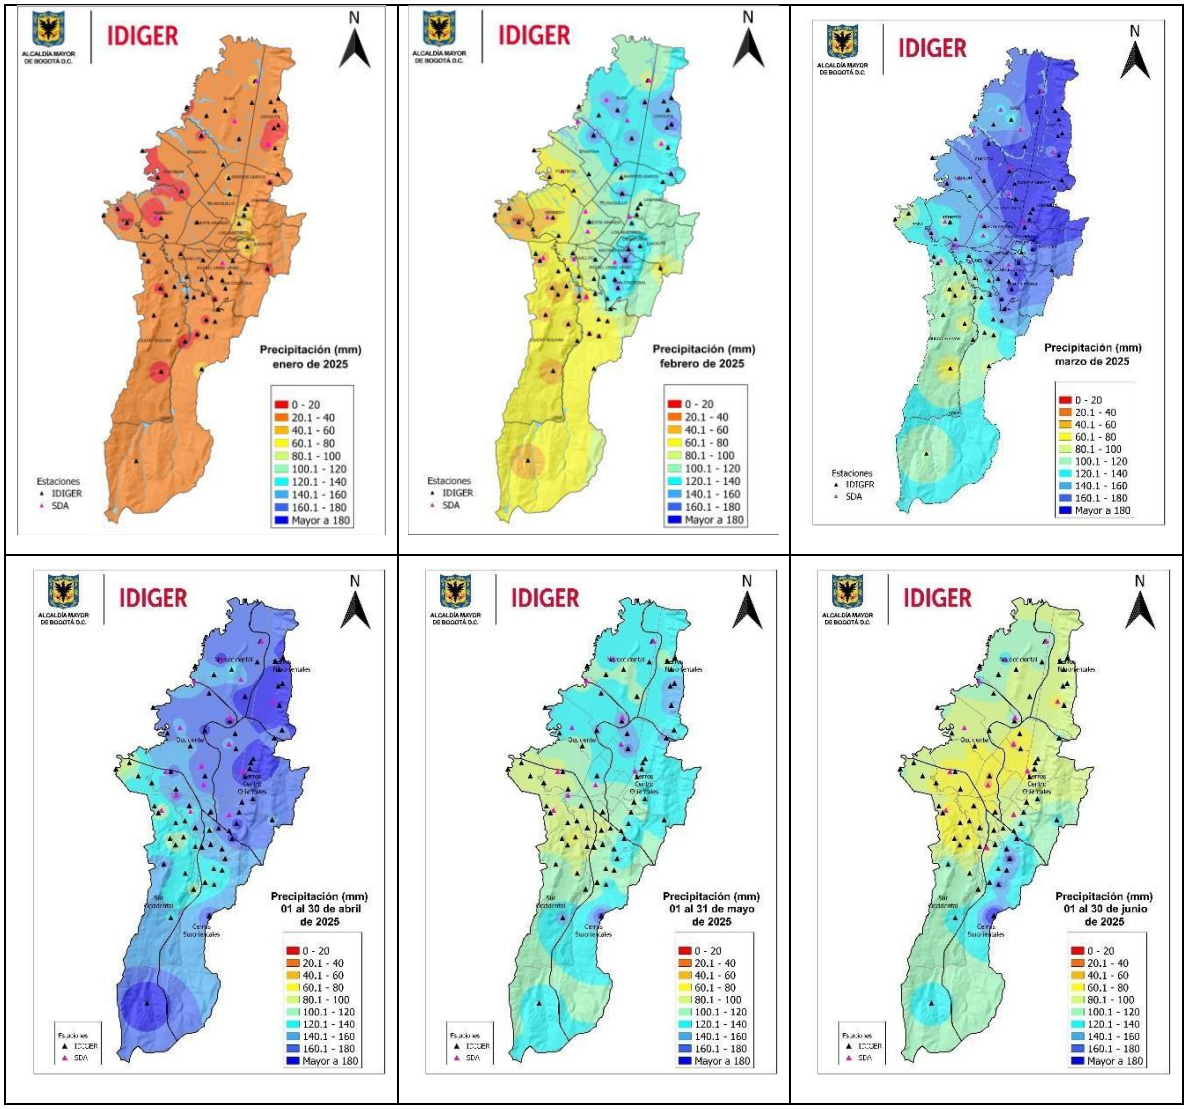
domingo, 23 de noviembre de 2025	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 24 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 25 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 26 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 27 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 28 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 29 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
domingo, 30 de noviembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 01 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 02 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 03 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 04 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 05 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 06 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 07 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 08 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 09 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 10 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	

jueves, 11 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 12 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 13 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 14 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
lunes, 15 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 16 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 17 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
jueves, 18 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
viernes, 19 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	HORIZONTAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
sábado, 20 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 21 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
lunes, 22 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
martes, 23 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 24 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 25 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 26 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 27 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	

	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 28 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 29 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
martes, 30 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 31 de diciembre de 2025	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
jueves, 01 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
viernes, 02 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
sábado, 03 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 04 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	
lunes, 05 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	VERTICAL	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
martes, 06 de enero de 2026	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
miércoles, 07 de enero de 2026	SI	Diurna	LLUVIA LIGERA	VERTICAL Y HORIZONTAL	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 08 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
viernes, 09 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 10 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 11 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	

lunes, 12 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	FESTIVO
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 13 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
miércoles, 14 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 15 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 16 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
sábado, 17 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
domingo, 18 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	NO PROGRAMARON	
lunes, 19 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
martes, 20 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
miércoles, 21 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
jueves, 22 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	NO	Nocturna	NADA	HORIZONTAL	
viernes, 23 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	HORIZONTAL	
sábado, 24 de enero de 2026	NO	Diurna	NADA	NO PROGRAMARON	
	SI	Nocturna	LLUVIA LIGERA	NO PROGRAMARON	

En el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, se ha presentado en todo el país, precipitaciones superiores a los promedios históricos registrados, lo cual generó afectación sobre las actividades de demarcación vial. En la figura 2, se muestra las gráficas de la precipitación anual en la ciudad de Bogotá.


IDIGER
Precipitación (mm) enero de 2025
Precipitación (mm) febrero de 2025
Precipitación (mm) marzo de 2025
Precipitación (mm) 01 al 30 de abril de 2025
Precipitación (mm) 01 al 31 de mayo de 2025
Precipitación (mm) 01 al 30 de junio de 2025
0 - 20
20.1 - 40
40.1 - 60
60.1 - 80
80.1 - 100
100.1 - 120
120.1 - 140
140.1 - 160
160.1 - 180
Mayor a 180
Estaciones
IDIGER
SDA

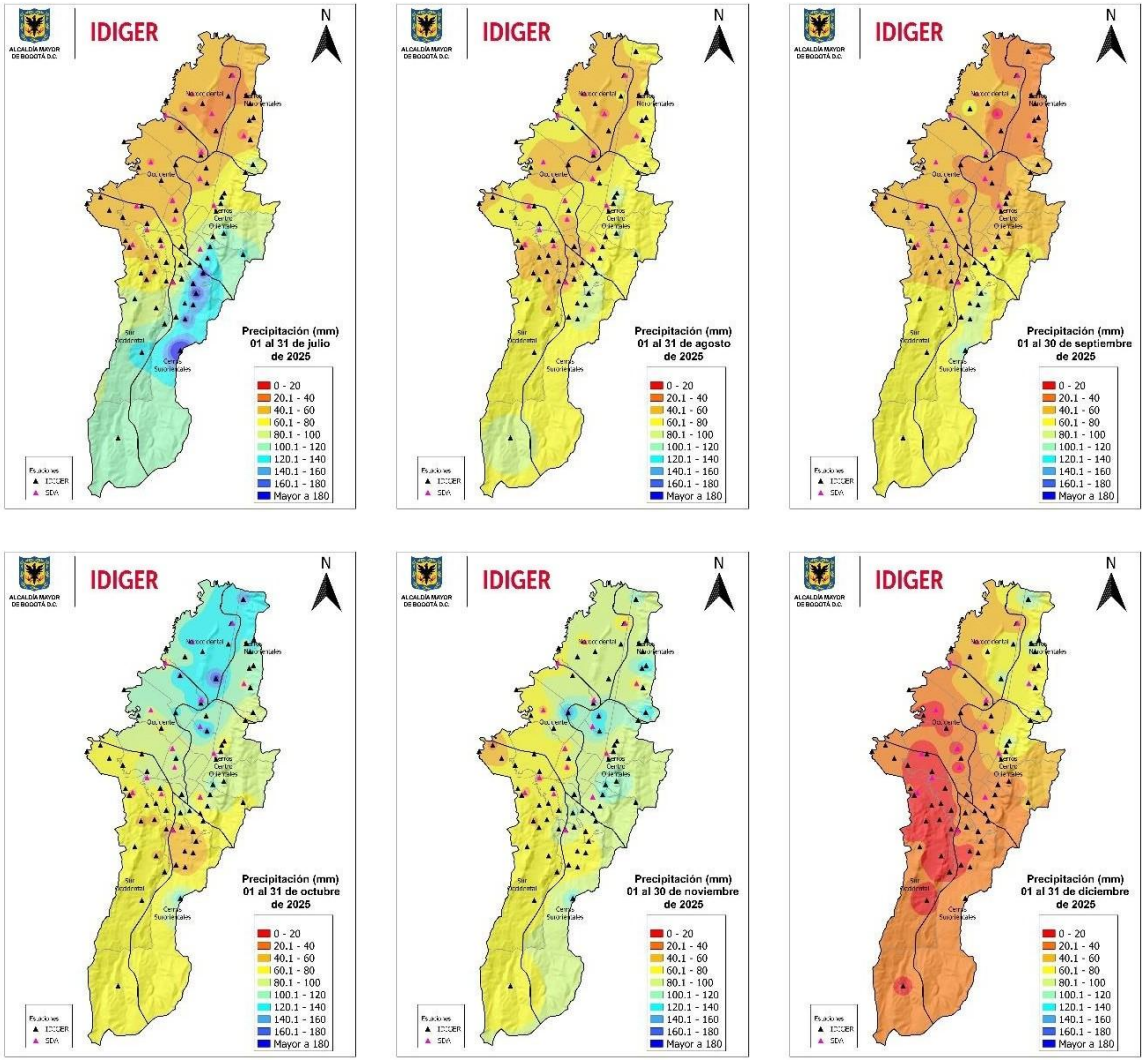


Ilustración 3 *Fuente: Elaboración propia mediante datos de https://www.sire.gov.co/web/sab*

6.7. LAS IMPLEMENTACIONES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

Se realizó el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de intervención, documentando las condiciones existentes antes de la ejecución de los trabajos, el desarrollo de las actividades durante su implementación y el estado final una vez culminadas las intervenciones. Estas evidencias permitieron verificar la correcta ejecución de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical y dispositivos de

seguridad vial, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El registro fotográfico constituyó un soporte fundamental para la validación de las cantidades ejecutadas, elaboración de informes, control de calidad, seguimiento por parte de la interventoría y aprobación de las actividades facturadas. Asimismo, permitió mantener la trazabilidad de las intervenciones realizadas, evidenciando de manera clara y objetiva el avance y resultado de las obras ejecutadas durante el período reportado.

El Registro fotográfico se encuentra en el "ANEXO 12" ye en el drive de la secretaria de movilidad https://drive.google.com/drive/folders/1YjJGJNHHf9I1r3eMYkiRRgr793q5wA7p

6.8. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Como soporte de cumplimiento en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contrato de obra No. 2024-3653 y el contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidencia la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de SST mediante verificación de afiliaciones al SGSS (EPS, ARL y AFP), pago de aportes parafiscales, realización de inducciones y capacitaciones al personal, exámenes médicos ocupacionales, entrega e inspección de elementos de protección personal, conformación de brigadas de emergencia, inspecciones SST a vehículos y equipos, control de sustancias químicas bajo lineamientos SGA, gestión de residuos peligrosos y seguimiento a indicadores de accidentalidad, reportándose cero accidentes laborales durante el periodo evaluado. Asimismo, la interventoría realizó seguimiento permanente al cumplimiento normativo y documental por parte del contratista y sus subcontratistas

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE INTERVERTORÍA
ACTIVIDADES SST- MA
PERIODO 1 - 24 Enero 2025 al 23 de febrero 2025

	
Descripción: Capacitación	Descripción: capacitación

	
Descripción: inspección de EPP	Descripción: EPP

	
Descripción: PMT	Descripción: PMT

	
Descripción: Químicos rotulados	Descripción: Químicos rotulados
	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Kit de derrames
	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Elementos de emergencia

	
Descripción: Actividades operativas	Descripción: Actividades operativas

PERIODO 2 - 24 Febrero 2025 al 23 de Marzo 2025

	
Descripción: Capacitación	Descripción: capacitación

	
Descripción: PMT	Descripción: PMT

	
Descripción: Químicos rotulados	Descripción: Químicos rotulados
	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Kit de derrames

	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Elementos de emergencia
	
Descripción: Actividades operativas	Descripción: Actividades operativas
	
Descripción: Rotulación con el **Código ONU**	Descripción: Actividades operativas

	
Descripción: extintores en los vehículos	Descripción: extintores en los vehículos

PERIODO 3 - 24 Marzo 2025 al 23 de Abril 2025

	
Descripción: Capacitación	Descripción: capacitación

	
Descripción: kit de derrames	Descripción: kit de derrames

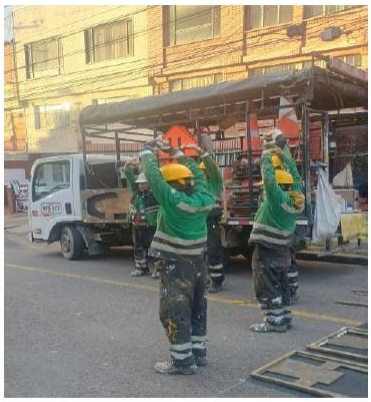
	
Descripción: Químicos rotulados	Descripción: Químicos rotulados

	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Elementos de emergencia

	
Descripción: Actividades operativas	Descripción: Actividades operativas

	
Descripción: Rotulación con el **Código ONU**	Descripción: Rotulación con el **Código ONU**

	
Descripción: extintores en los vehículos	Descripción: extintores en los vehículos

	
Descripción: pausas activas	Descripción: pausas activas

	
Seguimiento Uso de EPP	Verificacion de PMT
	

Seguimiento de inspecciones	Seguimiento de inspecciones

PERIODO 4 - 24 Abril 2025 al 23 de Mayo 2025

	
Descripción: kit de derrames	Descripción: kit de derrames
	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Elementos de emergencia

	
Descripción: Actividades operativas	Descripción: Actividades operativas

	
Descripción: Rotulación con el **Código ONU**	Descripción: Rotulación con el **Código ONU**

	
Descripción: extintores en los vehículos	Descripción: extintores en los vehículos

	
Descripción: Capacitaciones	Descripción: pausas activas

PERIODO 5 - 24 Mayo 2025 al 23 de Junio 2025

Descripción: kit de derrames	Descripción: kit de derrames
	
Descripción: capacitación primeros auxilios	Descripción: capacitación primeros auxilios
	
Descripción: Rotulación con el **Código** ONU	Descripción: Rotulación con el **Código** ONU
	
Descripción: capacitación primeros auxilios	Descripción: capacitación primeros auxilios

	
Descripción: Actividades operativas	Descripción: Actividades operativas

	
Descripción: Botequín	Descripción: Botequín

PERIODO 6 - 24 Junio 2025 al 23 de Julio 2025

	
Descripción: inspección de vehículos	Descripción: inspección de vehículos

	
Descripción: capacitación	Descripción: capacitación
	
Descripción: actividades operativas	Descripción: actividades operativas
	
Descripción: Elementos de emergencia	Descripción: Elementos de emergencia

	
Descripción: kit de derrames	Descripción: kit de derrames
	
Descripción: extintores	Descripción: extintores
	
Descripción: capacitación de primeros auxilios	Descripción: capacitación de primeros auxilios

Descripción: extintores	Descripción: extintores

	
Descripción: Capacitación Primeros auxilios con enfoque en derrames químicos	Descripción: Capacitación Primeros auxilios con enfoque en derrames químicos
	
Descripción: Capacitación Primeros auxilios con enfoque en derrames químicos	Descripción: Capacitación Primeros auxilios con enfoque en derrames químicos
	
Descripción: pausas activas	Descripción: pausas activas

	
Descripción: Capacitaciones	Descripción Capacitaciones
	
Descripción: Capacitaciones	Descripción: Capacitaciones
	
Descripción:Capacitaciones	Descripción: Capacitaciones

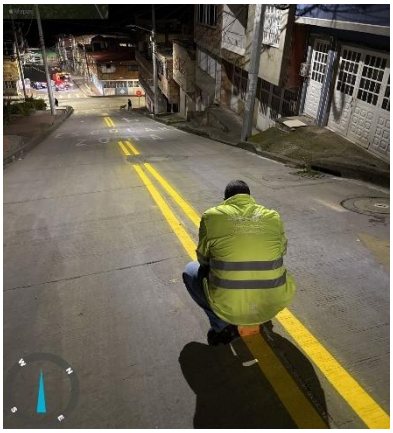
	
Descripción:Capacitaciones	Descripción: Capacitaciones
	
Descripción: entrega de dotación	Descripción: orden y aseo en áreas de trabajo
	
Descripción: Personal con todos los EPP	Descripción: Personal con todos los EPP

	
Descripción: inspección de vehículos	Descripción: inspección de vehículos

 	 
Descripción: kit de derrames	Descripción: kit de derrames

	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias

	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias
	
Descripción: extintores	Descripción: extintores

	
Descripción: Actividades operativas	Descripción: Actividades operativas
	
Descripción: Entrega de dotación	Descripción: Entrega de dotación




PERIODO 8 - 24 Agosto 2025 al 23 de Septiembre 2025

	
Descripción: inspección de vehículos	Descripción: inspección de vehículos
	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias
	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias

	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias
	
Descripción: Inspección de seguridad y salud laboral de secretaria	Descripción: Inspección de seguridad y salud laboral de secretaria
	
Descripción: Personal con EPP	Descripción: Actividades operativas


PERIODO 9 - 24 Septiembre 2025 al 23 de Octubre 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Descripción: inspección de vehículos	Descripción: inspección de vehículos
	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias
	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias

	
Descripción: Elementos de emergencias	Descripción: Elementos de emergencias
	
Descripción: Inspección de seguridad y salud laboral de secretaria	Descripción: Inspección de seguridad y salud laboral de secretaria


PERIODO 10 - 24 Octubre 2025 al 23 de Noviembre 2025

	
Descripción: fichas de datos de seguridad de químicos	Descripción: Actividades operativas

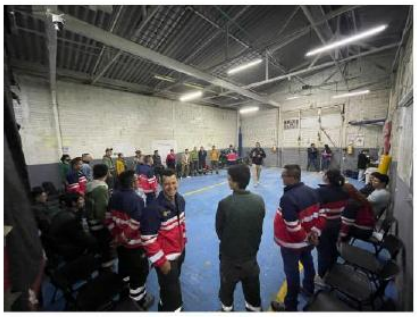
	
Descripción: Elementos de emergencias extintor	Descripción: Elementos de emergencias Botiquin
	
Descripción: Clasificación en la fuente de residuos	Descripción: colaborador con sus elementos de seguridad
	
Descripción: Pausas activas	Descripción: Capacitaciones

	
Descripción: Capacitaciones	Descripción: Elementos de emergencias Camilla

PERIODO 11 - 24 Noviembre 2025 al 23 de Diciembre 2025


	
Descripción: fichas de datos de seguridad de químicos	Descripción: Actividades operativas

	
Descripción: Rotulación de químicos	Descripción: Elementos de emergencias kit de derrames
	
Descripción: Elementos de emergencias extintor	Descripción: Elementos de emergencias Botiquín
	
Descripción: Pausas activas	Descripción: Elementos de emergencias Camilla

	
Descripción: Riesgo cardiovascular	Descripción: Capacitación de PEVS

PERIODO 12 - 24 Diciembre 2025 al 23 de Enero 2026

	
Descripción: Elementos de seguridad extintor	Descripción: Elementos de seguridad botiquin

	
Descripción: Elementos de emergencias camilla	Descripción: Elementos de seguridad kit de derrames.
	
Descripción: Rotulación de químicos	Descripción: fichas de seguridad
	
Descripción: kit de derrames	Descripción: vehículos

	
Descripción: PMT	Descripción: PMT

	
Descripción: Calistenia	Descripción: Charlas de seguridad

	
Descripción: trabajadores con EPP	Descripción: Actividades operativas

PREOPERACIONAL DEL VEHICULO	
	

INSPECCION DE EPP	
	

INSPECCION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA	
	
	

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (PMT)	
	

VERIFICACION DE FDS	
	



Se incorporan los soportes de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo para los 12 meses de ejecución del contrato en el Anexo 13 SOPORTE CUMPLIMIENTO SST.

6.9. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES (SI APLICAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE)

Como soporte de cumplimiento de protocolos de comunicaciones para el contrato de obra No. 2024-3653 y el contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidencia la realización periódica de comités técnicos, administrativos y SST entre la interventoría, el contratista y la Entidad, así como la entrega de informes mensuales, socializaciones, cronogramas de trabajo, piezas de divulgación y seguimiento permanente a las actividades ejecutadas en campo. Adicionalmente, se implementaron procesos de divulgación e inducción al personal, coordinación de brigadas de emergencia, comunicación de lineamientos de seguridad y control operacional, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y de la normatividad vigente aplicable a la ejecución de actividades de señalización y seguridad vial en Bogotá D.C.

Con base en lo establecido en el una Matriz de Control de Gestión Social y Comunicaciones, particularmente en los numerales relacionados con gestión social, socialización comunitaria, actas de reunión, inspecciones previas, registros fotográficos, comités de seguimiento y soporte de cumplimiento de protocolos de comunicaciones, se reestructurar el numeral así:

Soporte de cumplimiento de protocolos de comunicaciones

Durante el período reportado, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de comunicaciones y gestión social establecidos contractualmente, verificando la ejecución de las actividades de divulgación, socialización e interacción con la comunidad desarrolladas por el contratista de obra, así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad para el manejo de comunicaciones, reuniones, comités e información relacionada con la ejecución contractual.

La interventoría efectuó el control y seguimiento a las actividades de gestión social mediante visitas de inspección en campo, reuniones de seguimiento, socializaciones comunitarias, revisión de actas de aceptación cuando aplicó, y verificación permanente de la correcta divulgación de las intervenciones de señalización a los actores involucrados. Asimismo, se verificó la generación y conservación de los soportes documentales correspondientes, incluyendo actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos georreferenciados, comunicaciones oficiales, oficios, requerimientos y demás evidencias exigidas contractualmente.

Adicionalmente, la interventoría verificó que el contratista ejecutara las actividades de divulgación y socialización requeridas para cada intervención, especialmente en aquellos casos donde la normativa y los diseños exigían aceptación previa de la comunidad, dejando la correspondiente evidencia documental y fotográfica dentro del expediente contractual y de los informes periódicos.

MES	ACTIVIDAD EJECUTADA	TEMA IMPARTIDO / OBJETO	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	SOPORTE
Enero	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Registro fotográfico
Febrero	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Marzo	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico

	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Abril	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Mayo	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Junio	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Julio	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité

	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Agosto	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Septiembre	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Octubre	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Noviembre	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Diciembre	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico

	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico
Enero	Socialización Comunitaria	Presentación de intervenciones de señalización	Comunidad del área intervenida	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico
	Inspección de Campo	Verificación previa de condiciones del sector	Área de influencia del diseño asignado	Formato de inspección y fotografías
	Reunión de Seguimiento	Avance de ejecución contractual	Contratista, Interventoría y SDM	Acta de reunión
	Jornada Informativa	Divulgación de actividades ejecutadas	Usuarios y comunidad beneficiada	Registro fotográfico y acta
	Visita Técnica	Seguimiento a implementación	Frentes de obra intervenidos	Informe técnico y fotografías
	Socialización	Atención a requerimientos ciudadanos	Comunidad impactada	Acta y soportes
	Comité Técnico	Seguimiento a compromisos	Equipo del proyecto	Acta del comité
	Inspección y Socialización	Estado de las intervenciones	Comunidad y entidades interesadas	Fotografías y acta
	Reunión de Coordinación	Planeación de actividades	Stakeholders del proyecto	Acta
	Jornada Comunitaria	Divulgación de resultados	Comunidad beneficiaria	Evidencia fotográfica
	Visita de Verificación	Seguimiento de compromisos sociales	Zonas intervenidas	Informe y registro fotográfico

Las actividades desarrolladas fueron registradas mediante evidencias fotográficas del antes, durante y después de cada actividad, indicando fecha, hora, ubicación y descripción de la gestión realizada. Igualmente, se elaboraron y suscribieron las actas de reunión y comités de seguimiento conforme a los formatos institucionales vigentes, incorporando los compromisos adquiridos, observaciones, conclusiones y acciones de mejora.

6.10. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SEGURA

Como soporte de cumplimiento del Plan de Movilidad Segura para el contrato de obra No. 2024-3653 y el contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidencia la supervisión e implementación de actividades relacionadas con planes de manejo de tránsito, señalización temporal, control operacional en frentes de trabajo y verificación permanente de condiciones de seguridad vial durante la ejecución de las actividades. Asimismo, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos y operativos establecidos para minimizar afectaciones a la movilidad, incluyendo programación de labores principalmente en horario nocturno, inspecciones en campo, control de dispositivos de señalización y coordinación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de trabajadores, peatones y usuarios viales.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Interventoría realizó visitas de inspección en campo para verificar la correcta instalación de la señalización temporal, el cumplimiento de las condiciones aprobadas en los

PMT y COI, la presencia y desempeño de auxiliares de tránsito, el mantenimiento de corredores seguros para peatones y vehículos y la adecuada implementación de las medidas de mitigación definidas por la SDM.

Asimismo, se efectuó seguimiento permanente a las fechas autorizadas para intervención, verificando la correspondencia entre las aprobaciones emitidas por la SDM y las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista, dejando constancia de las inspecciones, observaciones, requerimientos y resultados mediante actas, formatos de control, registros fotográficos e informes de seguimiento elaborados por la Interventoría.

De acuerdo con lo exigido en el Anexo Técnico, la Interventoría verificó el cumplimiento de los PMT aprobados y reportó cualquier hallazgo o incumplimiento identificado durante las jornadas de implementación, realizando los requerimientos correspondientes al contratista cuando fue necesario.

ESTADO DE PMT				
N°	ID	INICIO	FIN	ESTADO
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	06-jun-25	28-ago-25	VENCIDO
2	MV_05_122_1867_12	06-jun-25	28-ago-25	VENCIDO
3	EX_05_119_1867_12	06-jun-25	28-ago-25	VENCIDO
4	EX_05_93_1244_11	23-may-25	21-ago-25	VENCIDO
5	EX_05_110_1867_12	23-may-25	21-ago-25	VENCIDO
6	EX_05_003_1073_24	04-abr-25	18-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_113_1867_12	28-mar-25	25-sep-25	VENCIDO
8	EX_05_005_1073_24	04-abr-25	18-sep-25	VENCIDO
9	EX_05_004_1073_24	11-abr-25	10-jul-25	VENCIDO
10	EX_04_261_1561_10	17-abr-25	17-jul-25	VENCIDO
11	EX_05_352_1561_10	01-ago-25	30-oct-25	VENCIDO
12	EX_05_101_1244_11	08-ago-25	6-nov-25	VENCIDO
13	EX_05_002_1073_24	16-may-25	14-ago-25	VENCIDO
14	EX_05_006_1744_10	23-may-25	21-ago-25	VENCIDO
15	EX_05_001_1073_24	30-ene-26	28-ago-25	VENCIDO
1	MV_04_230_1561_10	15-feb-25	17-mar-25	VENCIDO
1	EX_04_044_1561_10	04-feb-25	6-mar-25	VENCIDO
1	EX_04_211_1561_10	15-feb-25	17-mar-25	VENCIDO
1	EX_05_320_1561_10	09-feb-25	11-mar-25	VENCIDO
1	EX_05_341_1561_10	09-feb-25	11-mar-25	VENCIDO
2	MV_AV_BOYACA_941_09	02-abr-25	2-may-25	VENCIDO
2	EX_05_119_1867_12	30-mar-25	29-abr-25	VENCIDO
2	MV_05_122_1867_12	05-abr-25	5-may-25	VENCIDO

2	EX_05_053_1744_10	02-abr-25	2-may-25	VENCIDO
2	EX_04_211_1561_10 (pasacalle SDM-202461204137592)	22-mar-25	21-abr-25	VENCIDO
3	EX_04_262_1561_10_	29-abr-25	29-may-25	VENCIDO
3	EX_05_119_1867_12	29-abr-25	29-may-25	VENCIDO
3	EX_05_108_1867_12	19-abr-25	19-may-25	VENCIDO
3	EX_04_241_1561_10	28-abr-25	28-may-25	VENCIDO
3	MV_04_511_676_09	20-abr-25	20-may-25	VENCIDO
3	EX_05_053_1744_10	07-abr-25	7-may-25	VENCIDO
3	EX_05_93_1244_11_V5	06-may-25	5-jun-25	VENCIDO
3	MV_05_122_1867_12	27-abr-25	27-may-25	VENCIDO
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3 (CP 202561200744162)	29-abr-25	29-may-25	VENCIDO
4	EX_04_211_1561_10 PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	26-may-25	25-jun-25	VENCIDO
4	EX_04_001_1073_24	14-may-25	13-jun-25	VENCIDO
4	EX_05_110_1867_12	01-jun-25	1-jul-25	VENCIDO
4	EX_05_119_1867_12	19-may-25	18-jun-25	VENCIDO
4	EX_05_053_1744_10	21-may-25	20-jun-25	VENCIDO
4	EX_05_108_1867_12	20-may-25	19-jun-25	VENCIDO
4	MV_05_052_1744_10 PMT CAUCE SIRE 5453567	26-may-25	25-jun-25	VENCIDO
4	EX_04_241_1561_10	18-may-25	17-jun-25	VENCIDO
4	EX_04_262_1561_10	26-may-25	25-jun-25	VENCIDO
4	MV_05_122_1867_12	28-may-25	27-jun-25	VENCIDO
4	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	26-may-25	25-jun-25	VENCIDO
4	EX_05_93_1244_11	21-may-25	20-jun-25	VENCIDO
5	EX_05_93_1244_11	08-jun-25	8-jul-25	VENCIDO
5	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	16-jun-25	16-jul-25	VENCIDO
5	MV_04_511_676_09_V11	10-jun-25	10-jul-25	VENCIDO
5	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	16-jun-25	16-jul-25	VENCIDO
5	MV_05_122_1867_12_V7	24-jun-25	24-jul-25	VENCIDO
5	EX_04_001_1073_24_V2	11-jun-25	11-jul-25	VENCIDO
5	EX_04_241_1561_10	16-jun-25	16-jul-25	VENCIDO
5	EX_05_003_1073_24	29-jun-25	29-jul-25	VENCIDO
5	EX_05_108_1867_12_V6	16-jun-25	16-jul-25	VENCIDO
5	EX_05_113_1867_12	29-jun-25	29-jul-25	VENCIDO
5	EX_04_262_1561_10	24-jun-25	24-jul-25	VENCIDO
5	EX_05_119_1867_12	14-jun-25	14-jul-25	VENCIDO
5	PMT SIRE 5453778	24-jun-25	24-jul-25	VENCIDO
5	EX_04_264_1561_10 PMT SDM-202561201385182	18-jun-25	18-jul-25	VENCIDO

5	EX_04_211_1561_10 SIRE 2561201777022	18-jun-25	18-jul-25	VENCIDO
5	PMT EMBALSE LA REGADERA	24-jun-25	24-jul-25	VENCIDO
6	EX_05_005_1073_24	15-jul-25	14-ago-25	VENCIDO
6	EX_05_113_1867_12	14-jul-25	13-ago-25	VENCIDO
6	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	14-jul-25	13-ago-25	VENCIDO
6	EX_05_119_1867_12	14-jul-25	13-ago-25	VENCIDO
6	EX_05_001_1073_24	15-abr-25	15-may-25	VENCIDO
6	EX_05_008_1073_24	16-jul-25	15-ago-25	VENCIDO
6	EX_05_003_1073_24	14-jul-25	13-ago-25	VENCIDO
6	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	20-jul-25	19-ago-25	VENCIDO
7	MV_05_122_1867_12	20-ago-25	19-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_213_1561_10 SDM-202561202098412	16-ago-25	15-sep-25	VENCIDO
7	EX_04_126_1867_12 SDM-202561202230222	16-ago-25	15-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_101_1244_11	03-ago-25	2-sep-25	VENCIDO
7	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	03-ago-25	2-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_001_1073_24	09-ago-25	8-sep-25	VENCIDO
7	MV_AV_BOYACA_941_09	16-ago-25	15-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_008_1073_24	09-ago-25	8-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_307_1561_10	19-ago-25	18-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_310_1561_10	03-ago-25	2-sep-25	VENCIDO
7	EX_05_280_1561_10	12-ago-25	11-sep-25	VENCIDO
8	EX_05_001_1073_24	28-sep-25	28-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_006_1744_10	15-sep-25	15-oct-25	VENCIDO
8	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	23-sep-25	23-oct-25	VENCIDO
8	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	27-sep-25	27-oct-25	VENCIDO
8	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	28-sep-25	28-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_280_1561_10	15-sep-25	15-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_008_1561_10	10-sep-25	10-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_213_1561_10	05-oct-25	4-nov-25	VENCIDO
8	EX_05_310_1561_10	10-sep-25	10-oct-25	VENCIDO
8	PMT_CL_37D_S_KR_3B (SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192)	27-sep-25	27-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_93_1244_11 (CP_05_124)	15-sep-25	15-oct-25	VENCIDO
8	EX_04_316_1561_10 (PMT SDM-202561202439322)	15-sep-25	15-oct-25	VENCIDO
8	MV_05_99_1244_11 (PMT SDM-202561202657962)	15-sep-25	15-oct-25	VENCIDO
8	PMT BARRIO LA FISCALA (PMT SDM- 202561202378942)	10-sep-25	10-oct-25	VENCIDO
8	MV_05_052_1744_10 (PMT SDM-202561202284382 VDA LAS MARGARITAS)	28-sep-25	28-oct-25	VENCIDO
8	PMT VEREDA OLARTE SDM-202561202284382	27-sep-25	27-oct-25	VENCIDO

8	PMT_JUAN_REY_LA_FLORA SDM- SIRE 5456812	27-sep-25	27-oct-25	VENCIDO
8	EX_04_040_1561_10 SDM- 202561202286462	27-sep-25	27-oct-25	VENCIDO
8	PMT_USME_SECTOR RURAL CL 137D_ KR 1 SDM-202561202379632	28-sep-25	28-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_307_1561_10	07-sep-25	7-oct-25	VENCIDO
8	EX_05_119_1867_12	10-sep-25	10-oct-25	VENCIDO
9	EX_05_286_156_10	02-nov-25	2-dic-25	VENCIDO
9	CPS_676_MV_01_04 (pendones kr 7)	26-oct-25	25-nov-25	VENCIDO
9	EX_04_241_1561_10	26-oct-25	25-nov-25	VENCIDO
9	EX_04_488_826_10	01-nov-25	1-dic-25	VENCIDO
9	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	12-oct-25	11-nov-25	VENCIDO
9	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	27-oct-25	26-nov-25	VENCIDO
9	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	26-oct-25	25-nov-25	VENCIDO
9	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	03-nov-25	3-dic-25	VENCIDO
10	EX_05_341_1561_10 CP_05_1669	12-nov-25	12-dic-25	VENCIDO
10	MV_05_052_1744_10 CP_05_1670 5. CP_05_1671 CP_05_1673	12-nov-25	12-dic-25	VENCIDO
10	EX_05_002_1073_24 CP_05_1648	12-nov-25	12-dic-25	VENCIDO
10	EX_04_134_1867_12 CP_04_1594	12-nov-25	12-dic-25	VENCIDO
10	MV_15_78_1244_11 CP_04_1630	15-nov-25	15-dic-25	VENCIDO
10	EX_05_320_1561_10 SDM-20256120339962-DI-22669	16-nov-25	16-dic-25	VENCIDO
10	EX_04_488_826_10	16-nov-25	16-dic-25	VENCIDO
10	EX_04_241_1561_10	05-ene-26	4-feb-26	VIGENTE
10	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	17-nov-25	17-dic-25	VENCIDO
10	EX_04_051_414_11	15-dic-25	14-ene-26	VENCIDO
10	EX_04_030_1561_10	20-dic-25	19-ene-26	VENCIDO
11	EX_04_030_1561_10	05-ene-26	4-feb-26	VIGENTE
12	EX_04_030_1561_10	04-feb-26	6-mar-26	VIGENTE
12	CP_05_1690	21-ene-26	20-feb-26	VIGENTE
12	EX_04_051_414_11	21-ene-26	20-feb-26	VIGENTE
12	CP_04_1630	21-ene-26	20-feb-26	VIGENTE
12	CP_04_1625	25-ene-26	24-feb-26	VIGENTE
12	CP_04_1627	21-ene-26	20-feb-26	VIGENTE
12	CP_AV_BOYACA - KR14I	25-ene-26	24-feb-26	VIGENTE

Se incorporan los soportes de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo para los 12 meses de ejecución del contrato en el Anexo, Los soportes y demás información se encuentran en la carpeta del Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1phVuyXCwAD2Cewcmg6-DymJ9g-0cAUyx?usp=drive_link

6.11. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL

Como soporte de cumplimiento del manejo ambiental para el contrato de obra No. 2024-3653 y el contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidencia la implementación de medidas de control ambiental relacionadas con la correcta separación y disposición de residuos, gestión de residuos peligrosos, manejo y rotulación de sustancias químicas bajo el Sistema Globalmente Armonizado, control de almacenamiento temporal, reutilización de material producto de perforaciones para instalación de señales verticales y seguimiento al cumplimiento de lineamientos ambientales durante la ejecución de las actividades. Asimismo, la interventoría realizó verificación permanente a los procesos de manejo ambiental, control de residuos, inspecciones de campo y cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del contratista, evidenciando que las actividades ejecutadas correspondieron a intervenciones de bajo impacto ambiental.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Durante los primeros doce (12) meses de ejecución del contrato no se realizaron entregas para disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) ni de Residuos Peligrosos (RESPEL) mediante gestores autorizados. Esta situación responde a la naturaleza de las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales consisten principalmente en la perforación puntual de terreno para la instalación de señalización vertical, actividad que genera cantidades reducidas de residuos y, por tanto, no corresponde a una actividad de alta generación de RCD o RESPEL.

En cumplimiento de la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, el contratista implementó medidas orientadas a la prevención, minimización y aprovechamiento de los RCD generados. El material producto de las perforaciones es reutilizado, en la medida de su viabilidad técnica, para el relleno y conformación del terreno alrededor de las estructuras instaladas, reduciendo significativamente la cantidad de residuos destinados a disposición final. El material que no es susceptible de reutilización es segregado y almacenado temporalmente en el sitio de acopio del proyecto, en condiciones adecuadas de orden y limpieza, hasta alcanzar un volumen que haga técnica y ambientalmente viable su transporte y entrega a un gestor autorizado.

Respecto a los residuos peligrosos (RESPEL), el Título 6 del Decreto 1076 de 2015, que compila las disposiciones del Decreto 4741 de 2005, establece las obligaciones para la gestión integral de estos residuos, incluyendo su prevención, almacenamiento, transporte y disposición final. En el desarrollo de las actividades del contrato, la

generación de RESPEL corresponde únicamente a cantidades ocasionales derivadas de actividades menores de mantenimiento y reposición de insumos, las cuales son insuficientes para requerir entregas periódicas a gestores autorizados. No obstante, dichos residuos son identificados, clasificados, etiquetados y almacenados temporalmente conforme a los requisitos técnicos establecidos en la normatividad vigente, garantizando la prevención de riesgos para la salud y el ambiente.

Es importante precisar que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.6.1.6.2, el cual compila el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005, clasifica a los generadores de residuos peligrosos de acuerdo con la cantidad promedio mensual generada durante los últimos seis (6) meses, así:

Gran generador: igual o superior a 1.000 kg/mes.

Mediano generador: igual o superior a 100 kg/mes e inferior a 1.000 kg/mes.

Pequeño generador: igual o superior a 10 kg/mes e inferior a 100 kg/mes.

Así mismo, el parágrafo 1 del artículo 2.2.6.1.6.2 establece que los generadores que produzcan menos de 10 kg/mes de residuos o desechos peligrosos están exentos de la obligación de inscribirse en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, sin perjuicio de que deban garantizar el adecuado manejo ambiental de los residuos generados y de que la autoridad ambiental pueda exigir dicho registro mediante acto administrativo cuando exista una problemática ambiental que así lo justifique.

Con base en los registros de generación del proyecto, se evidencia que el contratista produce cantidades de RESPEL inferiores al umbral de 10 kg/mes, razón por la cual no se clasifica como pequeño, mediano ni gran generador para efectos del Registro de Generadores de RESPEL. En consecuencia, la ausencia de entregas para disposición final durante el período evaluado no obedece a un incumplimiento de las obligaciones ambientales, sino a la baja generación de residuos derivada de las actividades propias del contrato, manteniendo en todo momento el almacenamiento temporal en condiciones seguras y el compromiso de realizar la entrega a un gestor autorizado una vez se alcance un volumen que justifique técnica y ambientalmente su recolección.

Como interventoría, se verificó que el contratista mantiene implementadas las medidas de segregación en la fuente, almacenamiento temporal, identificación, rotulación y control de los residuos generados, así como el seguimiento permanente a las cantidades acumuladas, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la posterior disposición final mediante gestores debidamente autorizados cuando las condiciones operativas así lo requieran.

CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE

Se realizo supervisión de actividades de separación de residuos en la fuente, optimizando su manejo y reduciendo tiempos en el proceso de disposición.

Se utilizaron bolsas plásticas de acuerdo con la codificación establecida en la normativa vigente para facilitar la correcta separación de los residuos.

Se promovió en los trabajadores el cumplimiento del código de colores para la clasificación de residuos, asegurando una gestión adecuada.

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN

Se garantizó el acceso de la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos de la localidad, facilitando el retiro eficiente de los residuos ordinarios generados.

INDICADORES

N°	NOMBRE DEL INDICADOR	CANTIDAD (T)	INDICADOR / PORCENTAJE (%)
1	Cantidad de RCD generado en obra % respecto al total generado	0,00	0,0%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra % (t aprovechadas / t generadas)	0,00	0,0%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio % (t entregadas / t generadas)	0,00	0,0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento % (t entregadas / t generadas)	0,00	0,0%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor autorizado % (t entregadas / t generadas)	0,00	0,0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final autorizado % (t entregadas / t generadas)	0,00	0,0%
7	Meta total de aprovechamiento (según plan de gestión ambiental)	0,00	0,0%

APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACION DE RCD

- Perforación del terreno: Se realizó mediante herramienta manual tipo paladraga, generando una excavación puntual de aproximadamente 25 cm de ancho por 60 cm de profundidad por punto, suficiente para el anclaje de la estructura vertical de señalización.

- Instalación y sellado: Una vez posicionada la señal, el material excavado fue reutilizado de manera inmediata para realizar el relleno y compactación del área, asegurando la estabilidad del elemento instalado y evitando la generación de residuos para disposición externa.

Este procedimiento garantiza una intervención ambientalmente responsable, minimizando la generación de residuos y promoviendo el aprovechamiento in situ de los materiales. Las actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos del plan de manejo ambiental.

	
Perforación mediante herramienta manual tipo paladraga	Perforación

	
Instalación de la señal y reutilización del material en el relleno de la perforación	Actividad terminada

PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES

Durante el período evaluado, la Unión Temporal Eco Señalización 2024 desarrolló actividades asociadas a la instalación de señalización y demarcación vial, las cuales, por su naturaleza operativa, temporal y de bajo impacto ambiental, no requieren la obtención de licencia ambiental, permisos o trámites ambientales específicos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás normativa ambiental aplicable.

Las actividades ejecutadas corresponden a intervenciones puntuales sobre infraestructura vial existente, consistentes principalmente en perforaciones localizadas para la instalación de señalización vertical y labores de demarcación horizontal, sin generar modificaciones significativas sobre el medio ambiente, sin realizar aprovechamiento de recursos naturales, sin efectuar vertimientos, emisiones o ocupaciones que requieran autorización ambiental por parte de la autoridad competente. En consecuencia, para la ejecución del contrato no aplica la obtención de licencia ambiental ni de permisos ambientales específicos.

No obstante, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título 6 del Decreto 1076 de 2015, compilatorio del Decreto 4741 de 2005, y de los principios de gestión integral de residuos, el contratista ha implementado las medidas necesarias para garantizar el adecuado manejo de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Si bien, de acuerdo con las cantidades registradas, la Unión Temporal no alcanza los umbrales establecidos en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015 para clasificarse como pequeño, mediano o gran generador de residuos peligrosos (RESPEL), y por tanto no está obligada a inscribirse en el Registro de Generadores de RESPEL, sí cuenta de manera preventiva con proveedores y gestores ambientales debidamente autorizados para efectuar la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos cuando las cantidades acumuladas así lo requieran, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Para tal fin, la Unión Temporal cuenta con los siguientes gestores autorizados:

Residuos Peligrosos (RESPEL): gestionados mediante TRACOL S.A.S., empresa que cuenta con las autorizaciones ambientales vigentes para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

- Licencia Ambiental – TRACOL S.A.S.

Residuos de Construcción y Demolición (RCD): gestionados a través de un gestor inscrito y autorizado por la autoridad ambiental competente, conforme a lo establecido en la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021.

- Constancia de Gestor RCD

Las licencias, autorizaciones, constancias y demás soportes de los gestores ambientales se anexan en todos los informes reportados independiente de su la gestión de residuos, con el fin de garantizar el cumplimiento de medidas preventivas y en cumplimiento a los requisitos legales aplicables, asegurando que, una vez se alcancen las cantidades que justifiquen su movilización, los residuos serán entregados a gestores debidamente autorizados, garantizando su trazabilidad y adecuada disposición final.

Se incorporan los soportes de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo para los 12 meses de ejecución del contrato en el Anexo 14 SOPORTE MANEJO AMBIENTAL.

RTA: Ver anexo https://drive.google.com/drive/folders/1DpfpOnjHpkmNtKCx4bi35TEplTHxVjEr

6.12. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

Como soporte de cumplimiento de la implementación del Plan de Calidad para el contrato de obra No. 2024-3653 y el contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidencia el seguimiento permanente por parte de la interventoría a las especificaciones técnicas, control de calidad de materiales y procesos constructivos, revisión y aprobación de actividades ejecutadas, verificación de cantidades de obra, inspecciones en campo y control documental asociado a informes, actas y planos récord. Asimismo, se realizaron verificaciones periódicas al cumplimiento de procedimientos técnicos, supervisión de los planes de manejo de tránsito, control operativo de las actividades de señalización y validación de los estándares exigidos por la Secretaría Distrital de Movilidad, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento contractual por parte del contratista de obra.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico de Interventoría, la verificación del Plan de Calidad comprende el seguimiento permanente a la calidad de los materiales implementados, la ejecución y control de ensayos de campo y laboratorio, el seguimiento a las garantías de las intervenciones ejecutadas, la realización de inspecciones periódicas y la consolidación de registros técnicos que permitan demostrar la conformidad de las actividades ejecutadas por el contratista de obra. La interventoría debe verificar, documentar y reportar estos aspectos dentro de los informes periódicos mediante trazabilidad técnica y soportes verificables.

Durante la presente anualidad, la interventoría efectuó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad mediante inspecciones de campo, verificación de especificaciones técnicas, seguimiento a garantías, control de materiales y revisión de los resultados de los ensayos ejecutados tanto por el contratista de obra como por la

interventoría. Asimismo, se mantuvo el registro documental de requerimientos, conceptos técnicos, radicados, informes de inspección y soportes de laboratorio que permiten evidenciar la trazabilidad de los frentes intervenidos y el estado de sus garantías.

Los controles de calidad ejecutados permitieron verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, en las normas técnicas aplicables y en el Anexo Técnico contractual. La interventoría realizó seguimiento a los ensayos de laboratorio y pruebas de campo relacionados con retrorreflectividad, espesores de pintura, resistencia al deslizamiento, granulometría de microesferas, resistencia de tachas y estoperoles, así como a las verificaciones de calidad de los materiales implementados.

Los resultados obtenidos fueron objeto de análisis técnico por parte de la interventoría y constituyen soporte del cumplimiento del Plan de Calidad, permitiendo evidenciar la conformidad de los materiales utilizados y la adecuada ejecución de las actividades contractuales. Adicionalmente, se mantuvo la trazabilidad de las garantías mediante inspecciones periódicas, emisión de requerimientos, revisión de planes de acción y seguimiento a las correcciones efectuadas por el contratista cuando fue requerido

El soporte de cumplimiento de la implementación del plan de calidad se encuentra en el "ANEXO 15 PLAN DE CALIDAD, ver el anexo técnico en https://drive.google.com/drive/folders/1g8RyG_cHPVo3m68c-R4pQodWGInbblAx?usp=drive_link

6.13. PLANOS RECORD APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y CON VISTO BUENO DEL GRUPO SIG DE LA DIT

Como soporte de cumplimiento relacionado con los planos récord aprobados para el contrato de obra No. 2024-3653 y el contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidencia que la interventoría realizó el seguimiento, revisión técnica y validación documental de los planos récord generados durante la ejecución de las actividades de señalización y dispositivos de seguridad vial, verificando su correspondencia con las condiciones ejecutadas en campo y su conformidad con los lineamientos establecidos por el Grupo SIG y de Calidad de la Entidad. Asimismo, dentro de las obligaciones de la interventoría se incluyó la revisión y aprobación de documentación técnica, planos finales y soportes georreferenciados para garantizar el adecuado cierre y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

A continuación, se presenta el estado de la georreferenciación de las cuentas de obra aprobadas.

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_05_93_1244_11_C1	Aprobado SDM	06/03/2025
2	EX_05_320_1561_10_C1	Aprobado SDM	11/03/2025
3	EX_05_341_1561_10_C1	Aprobado SDM	11/03/2025
4	MV_04_230_1561_10_C1(PMT SDM	Aprobado SDM	17/03/2025
5	EX_04_211_1561_10_C1	Aprobado SDM	17/03/2025
6	EX_04_044_1561_10_C1	Aprobado SDM	20/03/2025
7	EX_05_119_1867_12_C1	Aprobado SDM	19/03/2025
8	MV_05_122_1867_12_C1	Aprobado SDM	20/03/2025
9	MV_BOYACA_941-09-C1-GEO	Aprobado SDM	25/03/2025

Tabla 22 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 1
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	SDM-202461204137592	Aprobado SDM	24/03/2025
2	SDM-202561200270682	Aprobado SDM	24/03/2025
3	MV_AV_BOYACA_941_09	Aprobado SDM	24/03/2025
4	MV_05_122_1867_12_C1	Aprobado SDM	24/03/2025
5	EX_05_119_1867_12_C1	Aprobado SDM	24/03/2025
6	SH_SV_PUNTO4_TMSA	Aprobado SDM	24/03/2025
7	EX_05_053_1744_10	Aprobado SDM	24/03/2025

Tabla 23 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 2
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_04_001_1073_24	Aprobado SDM	27/05/2025
2	EX_04_262_1561_10_	Aprobado SDM	29/05/2025

3	EX_05_119_1867_12	Aprobado SDM	29/05/2025
4	EX_05_108_1867_12	Aprobado SDM	19/05/2025
5	EX_04_241_1561_10	Aprobado SDM	28/05/2025
6	MV_04_511_676_09	Aprobado SDM	20/05/2025
7	EX_05_053_1744_10	Aprobado SDM	07/05/2025
8	EX_05_110_1867_12	Aprobado SDM	21/05/2025
9	EX_05_93_1244_11_V5	Aprobado SDM	05/06/2025
10	MV_05_122_1867_12	Aprobado SDM	27/05/2025
11	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3 (CP 202561200744162)	Aprobado SDM	29/05/2025

Tabla 24 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 3
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_04_211_1561_10 PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	APROBADO SDM	25-06-25
2	EX_04_261_1561_10 (CP_04_1049)	APROBADO SDM	01-07-25
3	EX_04_001_1073_24	APROBADO SDM	13-06-25
4	EX_05_003_1073_24	APROBADO SDM	13-06-25
5	EX_05_110_1867_12	APROBADO SDM	01-07-25
6	EX_05_119_1867_12	APROBADO SDM	18-06-25
7	EX_05_113_1867_V3	APROBADO SDM	20-06-25
8	EX_05_053_1744_10	APROBADO SDM	20-06-25
9	EX_05_108_1867_12	APROBADO SDM	19-06-25
10	MV_05_052_1744_10 PMT CAUCE SIRE 5453567	APROBADO SDM	25-06-25
11	EX_04_241_1561_10	APROBADO SDM	17-06-25
12	EX_04_262_1561_10	APROBADO SDM	25-06-25
13	MV_05_122_1867_12	APROBADO SDM	27-06-25
14	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	APROBADO SDM	25-06-25
15	EX_05_93_1244_11	APROBADO SDM	20-06-25

Tabla 25 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 4
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_05_93_1244_11	APROBADO SDM	08-07-25
2	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	APROBADO SDM	16-07-25
3	MV_04_511_676_09_V11	APROBADO SDM	10-07-25
4	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	APROBADO SDM	16-07-25
5	MV_05_122_1867_12_V7	APROBADO SDM	24-07-25
6	EX_04_001_1073_24_V2	APROBADO SDM	11-07-25
7	EX_04_241_1561_10	APROBADO SDM	16-07-25
8	EX_05_003_1073_24	APROBADO SDM	29-07-25
9	EX_05_108_1867_12_V6	APROBADO SDM	16-07-25
10	EX_05_113_1867_12	APROBADO SDM	29-07-25
11	EX_04_262_1561_10	APROBADO SDM	24-07-25
12	EX_05_005_1073_24	APROBADO SDM	24-07-25
13	EX_05_119_1867_12	APROBADO SDM	14-07-25
14	PMT SIRE 5453778	APROBADO SDM	24-07-25
15	EX_04_264_1561_10 PMT SDM-202561201385182	APROBADO SDM	18-07-25
16	EX_04_211_1561_10 SIRE 2561201777022	APROBADO SDM	18-07-25
17	PMT EMBALSE LA REGADERA	APROBADO SDM	24-07-25

Tabla 26 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 5
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_05_005_1073_24	APROBADO SDM	14-08-25
2	EX_05_113_1867_12	APROBADO SDM	13-08-25
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	APROBADO SDM	13-08-25
4	EX_05_119_1867_12	APROBADO SDM	13-08-25
5	EX_05_001_1073_24	APROBADO SDM	15-05-25
6	EX_05_101_1244_11	APROBADO SDM	15-05-25
7	EX_05_008_1073_24	APROBADO SDM	15-08-25
8	EX_05_003_1073_24	APROBADO SDM	13-08-25
9	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	APROBADO SDM	19-08-25

Tabla 27 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 6
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	MV_05_122_1867_12	APROBADO	19-09-25
2	EX_05_213_1561_10 SDM-202561202098412	APROBADO	15-09-25
3	EX_04_126_1867_12 SDM-202561202230222	APROBADO	15-09-25
4	EX_05_101_1244_11	APROBADO	02-09-25
5	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	APROBADO	02-09-25
6	EX_05_006_1561_10	APROBADO	10-09-25
7	EX_05_001_1073_24	APROBADO	08-09-25
8	MV_AV_BOYACA_941_09	APROBADO	15-09-25
9	EX_05_008_1073_24	APROBADO	08-09-25
10	EX_05_307_1561_10	APROBADO	18-09-25
11	EX_05_310_1561_10	APROBADO	02-09-25
12	EX_05_280_1561_10	APROBADO	11-09-25

Tabla 28 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 7
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_05_001_1073_24	APROBADO	28-10-25
2	EX_05_006_1744_10	APROBADO	15-10-25
3	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	APROBADO	23-10-25
4	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	APROBADO	27-10-25
5	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	APROBADO	28-10-25
6	EX_05_280_1561_10	APROBADO	15-10-25
7	EX_05_008_1561_10	APROBADO	10-10-25
8	EX_05_213_1561_10	APROBADO	04-11-25
9	EX_05_310_1561_10	APROBADO	10-10-25
10	PMT_CL_37D_S_KR_3B (SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192)	APROBADO	27-10-25
11	EX_05_93_1244_11 (CP_05_124)	APROBADO	15-10-25
12	EX_04_316_1561_10 (PMT SDM-202561202439322)	APROBADO	15-10-25
13	MV_05_99_1244_11 (PMT SDM-202561202657962)	APROBADO	15-10-25

14	PMT BARRIO LA FISCALA (PMT SDM- 202561202378942)	APROBADO	10-10-25
15	MV_05_052_1744_10 (PMT SDM-202561202284382 VDA LAS MARGARITAS)	APROBADO	28-10-25
16	PMT VEREDA OLARTE SDM-202561202284382	APROBADO	27-10-25
17	PMT_JUAN_REY_LA_FLORA SDM- SIRE 5456812	APROBADO	27-10-25
18	EX_04_040_1561_10 SDM- 202561202286462	APROBADO	27-10-25
19	PMT_USME_SECTOR RURAL CL 137D_ KR 1 SDM-202561202379632	APROBADO	28-10-25
20	EX_05_307_1561_10	APROBADO	07-10-25
21	EX_05_119_1867_12	APROBADO	10-10-25

Tabla 29 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 8
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_05_352_1561_10	APROBADO	2/12/2025
2	EX_05_286_156_10	APROBADO	2/12/2025
3	CPS_676_MV_01_04 (pendones kr 7)	APROBADO	25/11/2025
4	EX_04_241_1561_10	APROBADO	25/11/2025
5	EX_04_488_826_10	APROBADO	1/12/2025
6	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	APROBADO	11/11/2025
7	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	APROBADO	26/11/2025
8	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	APROBADO	25/11/2025
9	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	APROBADO	3/12/2025

Tabla 30 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 9
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_05_341_1561_10 CP_05_1669	APROBADO	12/12/2025
2	MV_05_052_1744_10 CP_05_1670 5. CP_05_1671 CP_05_1673	APROBADO	12/12/2025
3	EX_05_002_1073_24 CP_05_1648	APROBADO	12/12/2025
4	EX_04_134_1867_12 CP_04_1594	APROBADO	12/12/2025
5	MV_15_78_1244_11 CP_04_1630	APROBADO	15/12/2025
6	EX_05_320_1561_10 SDM-20256120339962-DI-22669	APROBADO	16/12/2025

7	EX_04_488_826_10	APROBADO	16/12/2025
8	EX_04_241_1561_10	APROBADO	16/01/2026
9	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	APROBADO	17/12/2025
10	EX_04_051_414_11	APROBADO	14/01/2026
11	EX_04_030_1561_10	APROBADO	16/01/2026

Tabla 31 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 10
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_04_030_1561_10	EN PROCESO	

Tabla 32Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 11
Fuente: propia

No.	ID	ESTADO	FECHA
1	EX_04_030_1561_10	EN PROCESO	
2	CP_05_1690	EN PROCESO	
3	EX_04_051_414_11	EN PROCESO	
4	CP_04_1630	EN PROCESO	
5	CP_04_1625	EN PROCESO	
6	CP_04_1627	EN PROCESO	
7	CP_AV_BOYACA - KR14I	EN PROCESO	
8	EX_05_213_1561_10	EN PROCESO	

Tabla 33 Estado de los diseños de Georreferenciación Cuenta 12
Fuente: propia

Para la aprobación del pago correspondiente a la georreferenciación, los planos récord y las planillas de obra deben cumplir con los parámetros establecidos y contar con la aprobación de la interventoría, así como con un concepto favorable por parte de la entidad. Están en el link del Anexo; https://drive.google.com/drive/folders/1g8RyG_cHPVo3m68c-R4pQodWGInbblAx?usp=drive_link

6.14. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ANUAL DE LA INTERVENTORÍA

El acta de recibo a satisfacción parcial anual del contrato de obra No. 2024-3653 y del contrato de interventoría No. 2024-3668 corresponde al documento mediante el cual la interventoría certifica el cumplimiento parcial de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, verificando que los trabajos de señalización y dispositivos de seguridad vial fueron desarrollados conforme a las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales, requisitos de calidad y lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. Asimismo, el acta contempla la validación de avances físicos y presupuestales, revisión documental, cumplimiento de actividades administrativas, SST, ambientales y financieras, dejando constancia del recibo parcial satisfactorio de las actividades ejecutadas tanto por el contratista de obra como por la interventoría.

De acuerdo con la revisión del informe anual, durante el período comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 24 de enero de 2026 se tramitaron doce (12) actas de recibo parcial de obra y doce (12) actas de pago de interventoría, correspondientes a la ejecución de la primera anualidad de los contratos No. 2024-3653 y No. 2024-3668. Asimismo, el informe financiero reporta una ejecución acumulada del Contrato de Obra por valor de $9.713.808.594, equivalente al 51,75 % del valor contractual ejecutado durante la anualidad evaluada.

Con el fin de fortalecer la trazabilidad financiera, contractual y técnica de la información, se incorpora la siguiente matriz de control financiero y seguimiento de la facturación, se anexa:

- Formato PA05-PR17-F01 completamente diligenciado.
- Consolidado de los IDs ejecutados durante la anualidad.
- Consolidado de cantidades por ítem ejecutado.
- Las doce (12) actas de recibo parcial de obra.
- Las doce (12) actas de pago de interventoría.
- Estado de facturación de cada cuenta.
- Relación de pagos efectuados por la SDM.
- Estado actualizado de saldos contractuales.
- Comprobantes de ingreso a almacén.
- Consolidando las doce (12) actas mensuales.
- Base de datos de cantidades ejecutadas asociadas a cada ID.
- Relación de diseños georreferenciados y aprobados.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra No. 2024-3653 y del contrato de interventoría No. 2024-3668, se evidenció cumplimiento satisfactorio en los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la ejecución de actividades de señalización y dispositivos de seguridad vial conforme a las especificaciones técnicas y lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad. La interventoría realizó seguimiento integral al control de calidad, ejecución presupuestal, cumplimiento documental, implementación del SG-SST, manejo ambiental, control operativo y validación de avances físicos y financieros, reportándose además cero accidentes laborales durante el periodo evaluado. En el componente social se desarrollaron actividades de divulgación y acompañamiento en los diferentes frentes de intervención, mientras que en el aspecto ambiental se evidenció manejo adecuado de residuos, sustancias químicas y control de impactos. Desde el componente legal y administrativo se mantuvo el cumplimiento de obligaciones contractuales, revisión de pólizas, actas, pagos y soportes documentales. Como recomendación, se sugiere continuar fortaleciendo el seguimiento documental, la programación operativa frente a condiciones climáticas adversas, el control de calidad en campo, la actualización de planos récord y la articulación permanente entre contratista, interventoría y Entidad para garantizar el cumplimiento integral de las metas contractuales hasta la finalización del proyecto.

COMPONENTE TÉCNICO

Durante la anualidad evaluada se ejecutaron actividades de señalización horizontal, vertical y dispositivos de seguridad vial en las localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz, cumpliendo los diseños aprobados, las especificaciones contractuales y los lineamientos del Manual de Señalización Vial. La interventoría verificó la ejecución de las actividades, la georreferenciación de las intervenciones y la elaboración de los respectivos planos récord asociados a los IDs ejecutados. Asimismo, se evidenció seguimiento técnico a los procesos constructivos y a los controles requeridos para la aceptación de las obras.

COMPONENTE FINANCIERO

El Contrato de Obra alcanzó una ejecución acumulada de $9.713.808.594, correspondiente al 51,75 % del valor contractual, soportada mediante 12 actas parciales de obra y 12 actas de pago de interventoría. Se observó trazabilidad entre el avance físico reportado y la ejecución financiera registrada, manteniendo control sobre cantidades de obra, soportes de pago y seguimiento presupuestal.

COMPONENTE DE TRÁNSITO

Los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) implementados durante la ejecución permitieron desarrollar las actividades minimizando afectaciones a la movilidad y garantizando condiciones de seguridad para usuarios viales y personal de obra. La interventoría realizó seguimiento a la implementación de los PMT, controles operativos y actividades asociadas a la gestión del tránsito en campo.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se efectuó seguimiento y control de calidad a los materiales y actividades ejecutadas mediante verificaciones técnicas y ensayos relacionados con retrorreflectividad, espesores, deslizamiento, granulometría y resistencia. La documentación revisada evidencia que los controles realizados sirvieron como soporte para la aceptación de las intervenciones y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales. Durante la anualidad se realizó seguimiento y control de calidad a los materiales y actividades ejecutadas mediante la realización y verificación de 363 ensayos, relacionados con retrorreflectividad, espesores de pintura, resistencia, flexión, compresión, fricción, densidad y contenido no volátil, entre otros controles técnicos. De acuerdo con la relación presentada en la tabla, estos ensayos permitieron verificar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas exigidas para los diferentes materiales e intervenciones ejecutadas, constituyéndose en soporte para la validación y aceptación de las actividades desarrolladas durante el año.

RELACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD			
ITEM	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ENSAYO DE RETROREFLEXIÓN POR SEÑAL VERTICAL		15
2	ENSAYO DE RETROREFLEXIÓN POR SEÑAL HORIZONTAL		16
3	ENSAYO DE FRICCIÓN CON EL PÉNDULO BRITANICO TRRL (PRUEBA DE ANTIDESLIZAMIENTO)		16
4	ESPESOR DE PINTURA EN SECO, EN LAMINAS	LAMINA	15
5	ENSAYO COMPRESIÓN PARA TACHAS	UNIDAD	30
6	ENSAYO FLEXIÓN PARA TACHAS	UNIDAD	30
7	ENSAYO COMPRESIÓN PARA TACHONES	UNIDAD	30
8	ENSAYO FLEXIÓN PARA TACHONES	UNIDAD	30
9	ENSAYO COMPRESIÓN, ESTOPEROLES METÁLICOS	UNIDAD	33
10	ENSAYO FLEXION, ESTOPEROLES METÁLICOS	UNIDAD	33

11	ENSAYO DENSIDAD POR GALÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTENIDO NO VOLATIL, PARA PINTURA	ENVASE	48
12	GRADACIÓN PARA MICROESFERA Y ANTIDESLIZANTE	ENVASE	37
13	ENSAYO DETERMINACIÓN DE CONTENIDO NO VOLATIL, PARA IMPRIMANTE	ENVASE	14
14	EVALUACIÓN ESPESORES DE PINTURA	ENVASE	16

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE SST

- Durante el período comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, el contratista no reportó accidentes de trabajo asociados a las actividades ejecutadas en el marco del contrato, evidenciando la implementación de medidas de prevención y control de los riesgos laborales.

- Durante el mismo período, el contratista no reportó enfermedades laborales relacionadas con las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato.

- El contratista ejecutó el 95 % de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), cumpliendo satisfactoriamente con las actividades planificadas para la vigencia evaluada.

- Se evidenció el desarrollo oportuno de los procesos de inducción, reinducción, capacitación, entrega y reposición de elementos de protección personal (EPP), de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.

- El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) desarrolló las reuniones y actividades establecidas en su plan de trabajo para la vigencia 2025, realizando seguimiento a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

- El Comité de Convivencia Laboral ejecutó las actividades previstas en su plan anual y, durante la vigencia 2025, no se reportaron casos o quejas relacionadas con presunto acoso laboral.

- Durante el período comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, la interventoría no registró accidentes de trabajo derivados de las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Durante el mismo período, no se presentaron enfermedades laborales asociadas al personal de la interventoría.

- La interventoría ejecutó el 95 % de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo del SG-SST, cumpliendo con las acciones de promoción, prevención y seguimiento establecidas para la vigencia.

- Se realizaron oportunamente los procesos de inducción, reinducción, capacitación y entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal de la interventoría, conforme a los riesgos identificados y al plan de trabajo establecido.

- El COPASST de la interventoría desarrolló las actividades y reuniones programadas durante la vigencia, realizando seguimiento a las condiciones de trabajo y promoviendo la mejora continua del SG-SST.

- Durante la vigencia evaluada no se presentaron casos de acoso laboral en la interventoría, evidenciando un adecuado ambiente laboral y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante el período comprendido entre el 24 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, las actividades desarrolladas por el contratista generaron bajas cantidades de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL), debido a que corresponden principalmente a perforaciones puntuales para la instalación de señalización vertical y actividades de demarcación vial.

- De conformidad con el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, el contratista no supera el umbral de 10 kg/mes de generación de residuos peligrosos (RESPEL), razón por la cual no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. No obstante, mantiene implementadas las medidas de gestión integral exigidas por la normativa ambiental vigente.

- En cumplimiento de la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, el contratista prioriza el aprovechamiento y reutilización del material proveniente de las perforaciones, reduciendo la cantidad de RCD destinada a disposición final.

- Los residuos de construcción y demolición (RCD) que no pueden ser reutilizados son almacenados temporalmente en un sitio de acopio acondicionado, hasta alcanzar un volumen que permita su transporte y disposición final mediante un gestor autorizado, garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento y control.

- Aunque durante el período evaluado no fue necesario realizar entregas de RCD ni de RESPEL para disposición final, el contratista cuenta con gestores ambientales autorizados para la recolección, transporte y disposición final de estos residuos, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental cuando las cantidades generadas requieran dicha gestión.

- El contratista implementó adecuadamente la separación en la fuente y la gestión de los residuos ordinarios y aprovechables generados durante la ejecución del contrato, promoviendo el aprovechamiento de materiales y garantizando su entrega a los prestadores del servicio de aseo o gestores autorizados, según correspondiera.

- Como resultado del seguimiento efectuado por la interventoría durante la vigencia evaluada, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables a la naturaleza del contrato, sin identificarse incumplimientos asociados al manejo integral de residuos sólidos, residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL).

NOTA:

En atención a lo establecido por la Secretaría de Movilidad mediante el comunicado No. SS202500001152241, suscrito por el señor Miguel Andrés Forero Guzmán, se reitera que los informes deben presentarse con la totalidad de sus anexos, con el fin de facilitar la revisión integral de los documentos.

Para tal efecto, se solicitó que los anexos sean organizados en carpetas independientes y dispuestos en el drive institucional de la Entidad. Adicionalmente, dichos anexos deben estar debidamente relacionados en el contenido del informe y suscritos adecuadamente de ser necesario.

Enlace del Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1BYF8CR-HrXsMWfMlHbUi5vrtKVY5RZDm

.

8. ANEXOS

ANEXO 1	PÓLIZAS
ANEXO 2	ACTAS PARCIALES DE PAGO MENSUAL
ANEXO 3	REGISTRO MENSUAL DE PERSONAL
ANEXO 4	REGISTRO MENSUAL DE CUADRILLAS
ANEXO 5	REGISTRO MENSUAL DE EQUIPO USADO
ANEXO 6	REGISTRO MENSUAL PAGO PARAFISCALES
ANEXO 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO 8	PUNTAJE ADICIONAL
ANEXO 9	RELACIÓN AVANCE MENSUAL POR ITEM
ANEXO 10	RELACIÓN DE SUMININSTRO POR ÍTEM
ANEXO 11	ACTAS DE COMITÉS DEL CONTRATO
ANEXO 12	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 13	SOPORTE CUMPLIMIENTO SST
ANEXO 14	SOPORTE MANEJO AMBIENTAL.
ANEXO 15	PLAN DE CALIDAD.
ANEXO 16	PLANOS RECORD APROBADOS
ANEXO 17	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ANUAL
