SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES GUAJIRA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 04

PERÍODO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Ing. Soraya Navarro Bolaño	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 6
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 7
1.4. LOCALIZACIÓN 7

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9

2.1. FORMA DE PAGO 10
2.2. ANTICIPO DE OBRA 10
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 11
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 11
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 12
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 13
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 13
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 13

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.2. FORMA DE PAGO 15
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 17
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 17
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 18
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 18
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 18
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 19

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 19

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 20

SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA: 20
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO: 20
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA: 20
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA: 21

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

6.1. CONCLUSIONES: 21
6.2. RECOMENDACIONES: 23

LISTA DE GRÁFICOS:

Gráfica 1 Localización de la zona del proyecto 7
Gráfica 2 Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA 7
Gráfica 3 Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO 8
Gráfica 4 Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA .8
Gráfica 5 Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS – RIOHACHA 8

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 9
Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323.....11
Tabla 3 Control financiero contratista.....13
Tabla 4 Relación del personal Contrato 13
Tabla 5 Información general del contrato de interventoría 14
Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 16
Tabla 7 Control financiero Interventoría 16
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría 17
Tabla 9. Relación de equipos del interventor 17
Tabla 10 Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha 20
Tabla 11 Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao ..20
Tabla 12 Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha 20
Tabla 13 Control financiero contratista Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca.....21

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 4, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020 correspondiente al cuarto mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento de la Guajira, en los Municipios de Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas).



Gráfica 1 Localización de la zona del proyecto



Gráfica 2 Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



Gráfica 3 Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



Gráfica 4 Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



Gráfica 5 Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS – RIOHACHA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR ADICIÓN No. 01	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su cuarto mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

De acuerdo a la modificación No. 1 al contrato de Obra, se presenta las garantías actualizadas, las cuales contemplan como fecha de terminación del contrato el 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.755.459.751	M-100115506	1/12/2020	30/06/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$438.864.937		1/12/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.755.459.751		1/12/2020	30/06/2021
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.755.459.751		31/12/2020	31/12/2021
CALIDAD		$1.755.459.751		1/12/2020	30/06/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$438.901.500	M-100019446	07/05/2020	31/12/2020

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- **Semana 13:** 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2020
  Programado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 98,34%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 100%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

  Ejecutado: 0,00%
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 40,37%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 14:** 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2020
  Programado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 99,89%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 100%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

Ejecutado:
- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 40,37%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 15:** 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2020
  Programado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 100%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 100%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

  Ejecutado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 40,37%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 16:** 07 de diciembre al 11 de diciembre de 2020
  Programado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 100%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 100%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

  Ejecutado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 40,37%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
  - Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo del presente informe el Contratista presenta el Corte de Obra No 1 para revisión y aprobación, sin embargo, esta Interventoría realizó las respectivas observaciones mediante el comunicado CINP-BTA-023-0457-7302 de asunto *"COMUNICADOS DCS-297-CO1.2323 DCS-306.CO1.2323 DCS-313-CO1.2323 ESTADO REVISIÓN CORTE DE OBRA No. 1".* Se diligencia formato "Control Financiero Contratista" y se encuentra en el Anexo No.01.

Tabla 3 Control financiero contratista

CONTROL FINANCIERO						
No. Acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	21/08/20 – 11/09/20	$0	$0	$0	$0	$0
	12/09/20 – 11/10/20	$0	$0	$0	$0	$0
	12/10/20 – 11/11/20	$0	$0	$0	$0	$0
	11/11/20 – 12/12/20	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
4	Profesional SST	SERGIO FERNANDO ALONSO CARVAJAL
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.


En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de noviembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																													
	NOVIEMBRE																	DICIEMBRE											
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	2	2	2	4	4	2	4	2	0	6	2	4	4	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	134
Nublado	6	6	6	4	4	6	4	6	8	2	6	4	4	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	106
Lluvias intensas															2																2
Lluvias moderadas	2		2					2																							6
TOTAL HORAS DE LLUVIA	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

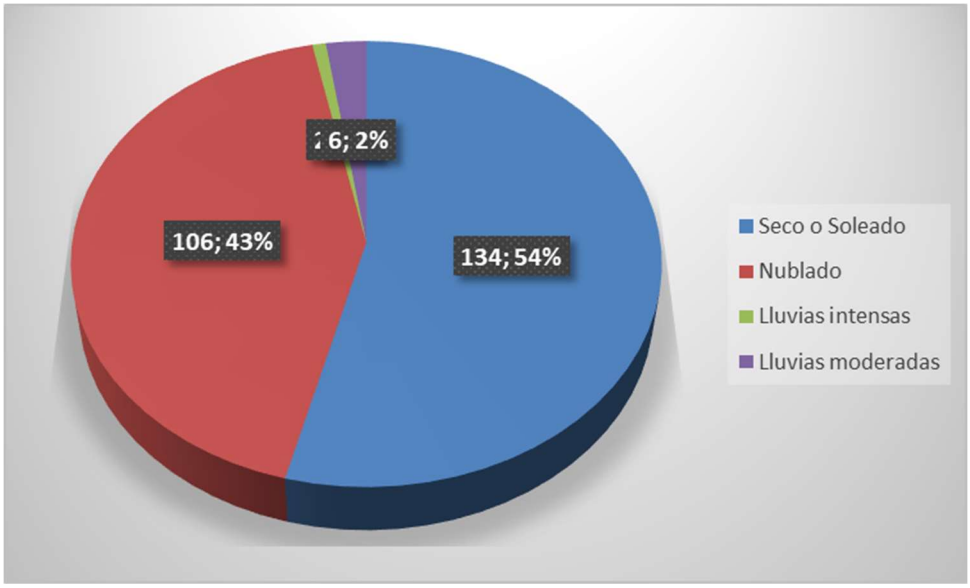

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	15 DÍAS
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción,

hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del cuarto mes de ejecución. El estado legal del contrato de Interventoría se encuentra registrado en la siguiente tabla:

Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580	15-44-101228786	12/08/2020	14/08/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580		12/08/2020	29/01/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395		12/08/2020	13/02/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200	15-40-101064985	12/08/2020	13/02/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Debido a que los pagos parciales mensuales de interventoría equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción y a la fecha de este informe el Contratista no ha ejecutado actividades a completa satisfacción del cliente, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría relacionando valores en cero pagados a la Interventoría, valor ejecutado y valor programado a la fecha del presente informe. Se diligencia formato “Control Financiero Interventoría” y se encuentra en el Anexo No. 07.

Tabla 7 Control financiero Interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	Mes	COSTO DIRECTO	IVA	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Saldo
	12/08/20–11/09/20	$0	$0	$0	$0	$0
	12/09/20–11/10/20	$0	$0	$0	$0	$0

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
	12/10/20–11/11/20	$0	$0	$0	$0	$0
	12/11/20–11/12/20	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del cuarto mes comprendido entre el 12 de noviembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	SORAYA NAVARRO
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el periodo del presente informe no se realizaron reuniones de comité.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Gestionar toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redirección al SENA.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el período.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Revisión del cumplimiento del programa de calidad presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

AMBIENTALES

- Se continua con el seguimiento al acopio de materiales y disposición de materiales.
- Se verifica que se sede se encuentre en buenas condiciones de orden y aseo, que no se generen afectaciones a fuentes hídricas.
- Se continua con el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

El Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA presentó mediante oficio DCS-135-CO1. 2323 del 06 de octubre los PDF correspondientes a los flujos de caja de cada una de las sedes del Departamento de la Guajira acorde a su respectiva programación, mediante el cual se hace el respectivo seguimiento financiero del contrato.

SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA:

Tabla 10 Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 56.536.388	$ 56.536.388	$ 179.765.940
	3	$ 72.570.665	$ 72.570.665	$ 112.066.087	$ 168.602.475	$ 107.195.275
	4	$ 0	$ 72.570.665	$ 11.163.465	$ 179.765.940	$ 107.195.275
TOTALES			$ 72.570.665		$ 179.765.940	$ 107.195.275

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO:

Tabla 11 Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 23.603.463	$ 23.603.463	$ 50.771.054
	3	$ 7.026.713	$ 7.026.713	$ 25.903.391	$ 49.506.855	$ 43.744.339
	4	$ 0	$ 7.026.713	$ 1.264.199	$ 50.771.054	$ 43.744.339
TOTALES			$ 7.026.713		$ 50.771.054	$ 43.744.339

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA:

Tabla 12 Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 50.864.762	$ 50.864.762	$ 80.076.766
	3	$ 21.232.354	$ 21.232.354	$ 29.212.004	$ 80.076.766	$ 58.844.411
	4	$ 0	$ 21.232.354	$ 0	$ 80.076.766	$ 58.844.411
TOTALES			$ 21.232.354		$ 80.076.766	$ 58.844.411

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA:

Tabla 13 Control financiero contratista Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346	$ 27.364.346
	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346
	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346
TOTALES			$ 0		$ 27.364.346	$ 27.364.346

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. CONCLUSIONES:

El contratista a la fecha no ha presentado completamente los respectivos informes de diagnósticos para las diferentes sedes del Departamento de la Guajira. Mediante oficio DCS-233-CO1. 2323 del 03 de noviembre remitió el Diagnóstico consolidado del Departamento de la Guajira, sin embargo, el documento solo contenía el diagnóstico del SEDE COMERCIO Y SERVICIO RIOHACHA. Esta interventoría mediante comunicado CINP-BTA-023-0378-6523 de Noviembre 12 de 2020 remitió observaciones respecto al contenido del mismo. Además se recuerda, que el contenido de los mismos debe ajustarse a lo descrito en su contrato de obra, Capítulo 2.3 ítem 3.2 el cual indica que debe contener un consolidado final del estado actual de las instalaciones a intervenir (con sugerencias de intervención, evaluación programación, detalles de ejecución en los casos que aplique), presentar un cronograma de intervenciones por instalación de la Entidad, presentar el Programa de Calidad específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e indiciadores que deben tenerse en cuenta en cuanto a procesos constructivos, calidad de materiales a emplear acabados y demás aspectos contemplados en el Manual de Mantenimiento de la Entidad. Dicha obligación fue solicitada mediante comunicados CINP-BTA-023-0071-4700 del 7 de septiembre, CINP-BTA-023-0122-5009 del 17 de septiembre, CINP-BTA-023-0142-5186 del 23 de septiembre.

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no presenta adelanto en su programación, teniendo en cuenta que para el cuarto mes NO se realizaron actividades en ninguna de las sedes:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-

118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 59,63% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 40,37% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 86,16% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 13,84% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 73,48% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 26,52% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficios DCS-103-CO1. 6309 del 29 de septiembre y DCS-115-CO1. 6309 del 30 de septiembre que posteriormente fueron ajustadas mediante oficio DCS-117-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 100% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones

presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

6.2. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato. Dar cumplimiento oportuno a las actividades administrativas que hacen parte del contrato como son la presentación de APU´s, Presupuestos definitivos, Programación de Obra de las actividades a realizar, Programa de Inversiones semana por semana, Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades, Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada.

A la fecha no se ha presentado de manera completa y en debida forma la documentación requerida de ningún trabajador, por lo que se debe realizar la respectiva subsanación.

Si bien es cierto se presentaron reprogramaciones para las sedes a intervenir, a la fecha ya se presentan atrasos en todas las sedes y se requiere iniciar actividades cuanto antes para revertir el atraso presentado en las mismas.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA [X]
INTERVENTORIA [ ]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2020

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0	$ -	$ 0
1	Agos Sep	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Sep Oct	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	Oct Nov	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	Nov Dic	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ 0	-	$ -	$ 0

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR DE LA HOZ **PERIODO:** 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020

FECHA / CARGO	NOVIEMBRE																			DICIEMBRE											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLANO**		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **LUIS ALFREDO GRANADOS**		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
PROFESIONAL SST - **SERGIO FERNANDO ALONSO CARVAJAL**		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
PROFESIONAL AMBIENTAL -																															
PROFESIONAL SOCIAL -																															
OFICIALES Y MAESTROS DE OBRA																															
AYUDANTES																															
OPERADORES DE MAQUINARIA																															
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																															
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	TOTAL PERIODO 72
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																														SUMATORIA / PORCENTAJE / CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0** / **0.00%**
De la región																															0 / 0.00%
De fuera de la región																															0 / 0.00%
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0** / **0.00%**
De la región																															0 / 0.00%
De fuera de la región																															0 / 0.00%
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**3**	**3**	**3**			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**		**3**	**3**	**3**	**72** / **100.00%**
De la región	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	35 / 48.61%
De fuera de la región	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	37 / 51.39%
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0** / **0.00%**
En proceso de reinserción social																															0 / 0.00%
En condición de desplazamiento																															0 / 0.00%
MUJERES	**2**	**2**	**2**			**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**		**2**	**2**	**2**	**48** / **66.67%**
Mano de Obra no Calificada																															0 / 0.00%
Mano de Obra Calificada																															0 / 0.00%
Profesionales - Técnicos	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	48 / 66.67%
PROVEEDORES	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0** / **0.00%**
Local																															0 / 0.00%
Nacional																															0 / 0.00%
Internactional																															0 / 0.00%

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 de Noviembre al 11 de diciembre de 2020

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	NOVIEMBRE																		DICIEMBRE											
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	2	2	2	4	4	2	4	2	0	6	2	4	4	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	134
Nublado	6	6	6	4	4	6	4	6	8	2	6	4	4	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	106
Lluvias intensas															2																2
Lluvias moderadas	2		2					2																							6
TOTAL HORAS DE LLUVIA	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA **INTERVENTORIA** X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2020

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		$ -	$ -	$ -
1	Agos Sep	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
2	Sep Oct	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
3	Oct Nov	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
4	Nov Dic	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**			

CALCULO DE CORTE DE INTERVENTORIA No.04		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		
VCI=	Valor inicial del contrato de Interventoria	$ 691,547,900.00
VACI 1=	Valor adiciones	$ -
VACT=	Valor total contrato de Interventoria	$ 691,547,900.00
	FORMA DE PAGO CONTRATO INTERVENTORIA	
	Costo variable (90%)	$ 622,393,110.00
	Liquidacion (10%)	$ 69,154,790.00
	TOTAL	$ 691,547,900.00
CONTRATO DE OBRA		
VICO=	Valor inicial contrato de obra	$ 8,777,298,757.00
VACO 1=	Valor adiciones	$ -
VTCO=	Valor Total contrato de obra	$ 8,777,298,757.00
VAO=	Valor acta de obra No.01	$ -
%AO=	(VAO/VTCO)*100=($0/$8.777.298.757)*100=	0.00%
%AO=	Porcentaje de avance de obra	**0.00%**
CALCULO VALOR VARIABLE PRESENTE ACTA		
VAI=	(%AO*VTCI)/100 = (0,0%*$691.547.900) =	$ -
VAI=	Valor acta de Interventoria	**$** -
	VALOR A FACTURAR	**$ -**

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2020

FECHA / CARGO	NOVIEMBRE																		DICIEMBRE											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **SORAYA NAVARRO**	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**6**	**6**	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	6	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	6	**TOTAL PERIODO** **156**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
De la región																															0	0.00%	
De fuera de la región																															0	0.00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
De la región																															0	0.00%	
De fuera de la región																															0	0.00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**78**	**50.00%**	
De la región	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	26	16.67%	
De fuera de la región	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	52	33.33%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
En proceso de reinserción social																															0	0.00%	
En condición de desplazamiento																															0	0.00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
Mano de Obra no Calificada																															0	0.00%	
Mano de Obra Calificada																															0	0.00%	
Profesionales - Técnicos	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	52	33.33%	
PROVEEDORES	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
Local																															0	0.00%	
Nacional																															0	0.00%	
Internactional																															0	0.00%	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7771857247**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		821339155	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.477.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.477.300	$ 0	$ 2.477.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.000	$ 0	$ 704.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 404.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.500	$ 0	$ 404.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 0	$ 504.000
SUBTOTALES:										**$ 4.089.800**	**$ 0**	**$ 4.089.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 16.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 74.700
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 182.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 199.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 433.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200	$ 0	$ 0	$ 433.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 117.600
SUBTOTALES:													**$ 1.022.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.022.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.103.500	$ 1.103.500	$ 0	$ 0	$ 1.103.500
SUBTOTALES:									**$ 1.103.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.103.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF64	CCF64-CAJASAI	3	$ 106.700	$ 0	$ 106.700
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	3	$ 299.600	$ 0	$ 299.600
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 616.300	$ 0	$ 616.300
SUBTOTALES:			**$ 1.022.600**	**$ 0**	**$ 1.022.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	ESP SUBSISTENCIA	ESP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1013659310	BORJA MEJIA YULLY CATHERINE	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.650.000		$ 8.700	30	$ 1.650.000	CCF24-COMPENSAR	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.900.000		$ 15.200	30	$ 2.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1054916932	GUTIERREZ RODAS MANUEL ENRIQUE	DEPEND		$ 2.940.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.940.000	$ 470.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 470.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.940.000	$ 117.600	$ 0	$ 117.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.940.000		$ 204.700	30	$ 2.940.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1060588261	LOPEZ VILLADA JOHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 400.000		$ 27.900	4	$ 400.000	CCF64-CAJASAI	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 18004431	ABRAHAMS CHOW HARTLEY EDWARD	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 400.000		$ 27.900	4	$ 400.000	CCF64-CAJASAI	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 40042302	PATARROYO CABRERA AIDEE JAZMIN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7771857247**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	821339155

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
9	CC 42081884	ARISTIZABAL MURILLO CARMEN PATRICIA	DEPEND		$ 3.150.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 3.150.000	$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 126.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.150.000		$ 219.300	30	$ 3.150.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52076340	VASQUEZ BORDA CLAUDIA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.075.850	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.075.850	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.075.850	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.075.850		$ 10.900	30	$ 2.075.850	CCF24-COMPENSAR	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 53043823	LOPEZ BARRETO LEIDI NAYIVE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	03															25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.400.000		$ 97.500	28	$ 1.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 6891298	NEGRETE NORIEGA CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO			SI	24															230301-PORVENIR	7	$ 1.866.667	$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.700	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 74.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 1.866.667		$ 130.000	7	$ 1.866.667	CCF64-CAJASAI	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 7.238.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901286694
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO GUATAVITA 2019
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7771858782**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		821293551	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.308.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 2.355.400	$ 0	$ 2.355.400
230301	230301-PORVENIR	3	$ 900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.000	$ 0	$ 900.000
SUBTOTALES:										**$ 3.255.400**	**$ 0**	**$ 3.255.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 0	$ 317.000
EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 165.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:													**$ 802.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 802.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 885.400	$ 885.400	$ 0	$ 0	$ 885.400
SUBTOTALES:									**$ 885.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 885.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 802.000	$ 0	$ 802.000
SUBTOTALES:			**$ 802.000**	**$ 0**	**$ 802.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7771863931**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	821322794		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 548.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7771855090**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		821267799	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.209.300	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 1.254.300	$ 0	$ 1.254.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 4.586.800	$ 0	$ 0	$ 133.100	$ 133.100	$ 0	$ 0	$ 4.853.000	$ 0	$ 4.853.000
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.596.000	$ 0	$ 0	$ 49.900	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 1.695.800	$ 0	$ 1.695.800
SUBTOTALES:										**$ 7.803.100**	**$ 0**	**$ 7.803.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.900	$ 0	$ 0	$ 253.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.650.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.650.100	$ 0	$ 0	$ 2.650.100
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 56.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 273.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 369.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.000	$ 0	$ 0	$ 369.000
SUBTOTALES:													**$ 3.602.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.602.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 826.700	$ 826.700	$ 0	$ 0	$ 826.700
SUBTOTALES:									**$ 826.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 826.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	10	$ 1.904.800	$ 0	$ 1.904.800
SUBTOTALES:			**$ 1.904.800**	**$ 0**	**$ 1.904.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 599.300	$ 0	$ 599.300
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:			**$ 799.300**	**$ 0**	**$ 799.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.417.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.417.000	$ 56.700	$ 0	$ 56.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.417.000		$ 98.700	30	$ 1.417.000	CCF24-COMPENSAR	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19377460	POSADA MARTINEZ GUILLERMO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 765.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.500.000		$ 313.200	30	$ 4.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		$ 10.000.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 10.000.000	$ 1.600.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.700.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.000.000	$ 1.250.000	$ 0	$ 1.250.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.000.000		$ 52.200	30	$ 10.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0
4	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.080.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.080.000	$ 332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.080.000	$ 83.200	$ 0	$ 83.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.080.000		$ 10.900	30	$ 2.080.000	CCF24-COMPENSAR	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.037.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.037.500	$ 806.000	$ 25.200	$ 25.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 856.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.037.500	$ 201.500	$ 0	$ 201.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.037.500		$ 26.300	30	$ 5.037.500	CCF24-COMPENSAR	$ 201.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 9.975.000	FIJO			NO																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 9.975.000	$ 1.596.000	$ 49.900	$ 49.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.695.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.975.000	$ 1.246.900	$ 0	$ 1.246.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 9.975.000		$ 52.100	30	$ 9.975.000	CCF24-COMPENSAR	$ 399.000	$ 0	$ 299.300	$ 0	$ 0
7	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 24.700	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.825.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.825.000	$ 1.092.000	$ 34.200	$ 34.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.160.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.825.000	$ 273.000	$ 0	$ 273.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.825.000		$ 35.700	30	$ 6.825.000	CCF24-COMPENSAR	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7771855090**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	821267799

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 8002292	SANCHEZ OSPINA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.308.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.308.000	$ 209.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.308.000	$ 52.400	$ 0	$ 52.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.308.000		$ 91.100	30	$ 1.308.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.750.000		$ 121.800	30	$ 1.750.000	CCF24-COMPENSAR	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 14.936.600**

Planilla Pagada

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/11/2020	CINP-BTA-023-0376-6521	Comunicado DCS-245-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del OFICIO CINP-BTA-023-0367-6410 Comunicado DCS-242-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0377-6522	Comunicado DCS-246-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del OFICIO CINP-BTA-023-0325-6112 Comunicado DCS-179-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0378-6523	Comunicado DCS-233-CO1.2323; Informe de Diagnóstico consolidado y registro fotográfico del Departamento de la Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0379-6526	Comunicado DCS-226-CO1.2323; Informe de Diagnóstico de los equipos de aires acondicionado de las Regionales Guajira y Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0380-6527	Oficio 9-2020-049588 NIS 2020-02-253217; Solicitud urgente de la entidad contratante sobre el lavado de tanques en Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0381-6543	Estado actual contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0382-6546	Informe mensual No. 2, Componente SST Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/11/2020	CINP-BTA-023-0383-6548	Oficio 92020048666 NIS 2020-01-258836; Cambio residente SST contrato de interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0384-6552	Comunicado DCS-225-CO1. 2323; solicitud de justificación por qué no se realizaron los mantenimientos a los aires acondicionados de la regional Magdalena: Gaira, Fundación, Banco y Servicio Médico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0385-6561	Comunicado DCS-250-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0359-6384 Comunicado DCS-231-CO1.2323; Ingreso personal Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0386-6562	Comunicado DCS-251-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0360-6385 Comunicado DCS-224-CO1.2323; Documentos de coordinador de SST del departamento de CÓRDOBA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0387-6563	Comunicado DCS-252-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0362-6404 Comunicado DCS-220-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de la GUAJIRA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0388-6564	Comunicado DCS-253-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0365-6407 Comunicado DCS-239-CO1.2323; Relación y documentos del personal de poda departamento de SUCRE.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0389-6565	Comunicado DCS-255-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0359-6384 Comunicado DCS-242-CO1.2323; DCS-245-CO1.2323 Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0390-6566	Comunicado DCS-254-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0368-6433 Comunicado DCS-243-CO1.2323; Relación y documentos del personal eléctrico del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0391-6578	Informe mensual No. 2, Regional Magdalena Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0392-6583	Informes semanales No. 10 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/11/2020	CINP-BTA-023-0393-6586	Informes semanales No. 10 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/11/2020	CINP-BTA-023-0394-6596	Informes semanales No. 10 Contrato de Interventoría-Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0395-6615	Comunicado DCS-262-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del OFICIO CINP-BTA-023-0389-6565, CINP- BTA-023-0376-6521, CINP-BTA-023-0367-6410 Comunicado DCS-261-CO1.2323, DCS-245-CO1.232, DCS-242-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0396-6616	Actividades suspendidas por el contratista sede Comercio y Servicios, Barranquilla, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0397-6617	Comunicados DCS-244-CO1. 2323 y DCS-247-CO1. 2323; Trámite de actualización de vigencias y solicitud concepto prórroga y adición Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0398-6618	Inicio de actividades sede Cedagro urbano y rural, Sabanalarga, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0399-6620	Comunicado DCS-256-CO1.2323; Respuesta a observaciones del OFICIO CINP-BTA-023-0364-6406 Comunicado DCS-238-CO1.2323; Relación y documentos del personal de SST, Ambiental y Coordinador de Obra de todas las regionales de los	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0400-6621	Reiteración de Actividades en el edificio Administrativo por filtraciones en el cuarto piso Sedes - Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
18/11/2020	CINP-BTA-023-0401-6649	Comunicado DCS-230-CO1.2323; Informe de Diagnostico consolidado y registro fotográfico departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0402-6651	Comunicado DCS-241-CO1. 2323 presupuestos y programaciones Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0403-6652	Comunicado DCS-228-CO1.2323; Informe de Diagnostico consolidado y registro fotográfico departamento Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/11/2020	CINP-BTA-023-0404-6653	Comunicado DCS-229-CO1.2323; Informe de Diagnostico consolidado y registro fotográfico departamento Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/11/2020	CINP-BTA-023-0405-6706	Comunicado: DCS-262-CO1.2323 Respuesta a observaciones CINP-BTA-023-0389-6565, CINP-BTA-023-0376-6521, CINP-BTA-023-0367-6410; Comunicado DCS-261-CO1.2323, DCS-245-CO1.232, DCS-242-CO1.2323; Relación y documentos del personal del	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/11/2020	CINP-BTA-023-0406-6707	Comunicado: DCS-262-CO1.2323; Respuesta CINP-BTA-023-0389-6565, CINP-BTA-023-0376-6521, CINP-BTA-023-0367-6410 Comunicado DCS-261-CO1.2323, DCS-245-CO1.232, DCS-242-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/11/2020	CINP-BTA-023-0407-6708	Comunicado DCS-232-CO1.2323; Informe de Diagnóstico consolidado y registro fotográfico del Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/11/2020	CINP-BTA-023-0408-6713	Informes semanales No. 10 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/11/2020	CINP-BTA-023-0409-6742	Comunicado DCS-266-CO1.2323; Solicitud prorroga Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/11/2020	CINP-BTA-023-0410-6816	Correo electrónico, Estado instalaciones Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/11/2020	CINP-BTA-023-0411-6817	Correo electrónico; Reiteración de Mantenimiento General- Sedes Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/11/2020	CINP-BTA-023-0412-6818	Comunicado DCS-273-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/11/2020	CINP-BTA-023-0413-6819	Comunicado DCS-273-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/11/2020	CINP-BTA-023-0414-6820	Comunicado DCS-272-CO1.2323; Remisión cesión económica del Consorcio Constructor Alfa.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/11/2020	CINP-BTA-023-0415-6822	Abandono de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0416-6905	Comunicado DCS-275-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0354-6326, COMUNICADO DCS-222-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal eléctrico departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0417-6906	Estado actual contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0418-6907	Solicitud informes mensuales contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0419-6908	Solicitud entrega de diagnósticos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0420-6909	Solicitud de entrega de informes semanales PAPSO e Informes mensuales del componente SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0421-6921	Remisión Acta de seguimiento No 5 del 12 noviembre - Sede regional San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0422-6922	Comunicado DCS-283-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/11/2020	CINP-BTA-023-0423-6928	Informes semanales No. 11 Contrato de Interventoría, Bolívar Y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0424-6935	Informes semanales No. 12 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0425-6937	Comunicados DCS-235-CO1. 2323 y DCS-267-CO1. 2323; APUS no previstos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0426-6938	Comunicados DCS-284-CO1.2323, DCS-264-CO1.2323, DCS-278-CO1.2323, DCS-281-CO1.2323 y DCS-282-CO1.2323; Presupuestos y programaciones.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE OCTUBRE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
30/11/2020	CINP-BTA-023-0427-6939	Oficio 92020057549 NIS 2020-01-276333, Certificado antecedentes disciplinarios profesional SST Xiomara Pérez, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0428-6940	Comunicado DCS-269-CO1. 2323; Solicitud remisión Sistema de Gestión Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0429-6941	Correo electrónico, solicitud lavado tanques en las sedes de la Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0430-6942	Oficio 92020057552 NIS 2020-01-278092, Intervención aire acondicionado Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0431-6943	Comunicado DCS-285-CO1. 2323: Respuesta a observaciones de los oficio CINP-BTA-023-0377-6522 Solicitud De Ingreso Personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0432-6944	Comunicado DCS-266-CO1. 2323 y DCS-296-CO1. 2323: Solicitud Prórroga Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/11/2020	CINP-BTA-023-0433-6948	Informes semanales No. 13 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/12/2020	CINP-BTA-023-0434-6993	Informe mensual No. 3, Componente SST Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/12/2020	CINP-BTA-023-0435-7010	Comunicado DCS-298-CO1. 2323; Respuesta a observaciones de los comunicados CINP-BTA-023-0359-66384, CINP-BTA-023-0360-6385, CINP-BTA-023-0362-6404, CINP-BTA-023- 0365-6407, CINP-BTA-023-0366-6409.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/12/2020	CINP-BTA-023-0436-7086	Actualización posible incumplimiento Contratista de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/12/2020	CINP-BTA-023-0437-7108	Comunicado DCS-202-CO1. 2323 INFORME MENSUAL No. 2 Ambiental y SST, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/12/2020	CINP-BTA-023-0438-7109	Comunicado DCS-196-CO1. 2323 INFORME MENSUAL No. 1, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/12/2020	CINP-BTA-023-0439-7110	Comunicado DCS-202-CO1. 2323 INFORME MENSUAL No. 3 Ambiental y SST, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
7/12/2020	CINP-BTA-023-0440-7129	Comunicado DCS-285-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0377-6522; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/12/2020	CINP-BTA-023-0441-7195	Comunicado DCS-305-CO1.2323; Solicitud entrega de diagnósticos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/12/2020	CINP-BTA-023-0442-7197	Comunicado DCS-303-CO1. 2323; solicitud topes presupuestales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/12/2020	CINP-BTA-023-0443-7198	Comunicado DCS-302-CO1.2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0435-7010.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/12/2020	CINP-BTA-023-0444-7199	Comunicado DCS-306-CO1.2323; Análisis de precios unitarios implementación protocolo de Bioseguridad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/12/2020	CINP-BTA-023-0445-7211	Comunicado DCS-282-CO1.2323. Diagnóstico consolidado Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/12/2020	CINP-BTA-023-0446-7225	Comunicado DCS-304-CO1.2323; APUS no previstos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/12/2020	CINP-BTA-023-0447-7226	Comunicado DCS-309-CO1.2323; Cambio profesional SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/12/2020	CINP-BTA-023-0448-7227	Comunicado DCS-302-CO1.2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0435-7010.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/12/2020	CINP-BTA-023-0449-7228	Apu NP-10.208 “Construcción de torta de desnivel de techo con pendiente 1% en concreto de 2500 psi elaborado en obra”.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Firma:
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	YALILE RINCÓN RUIZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

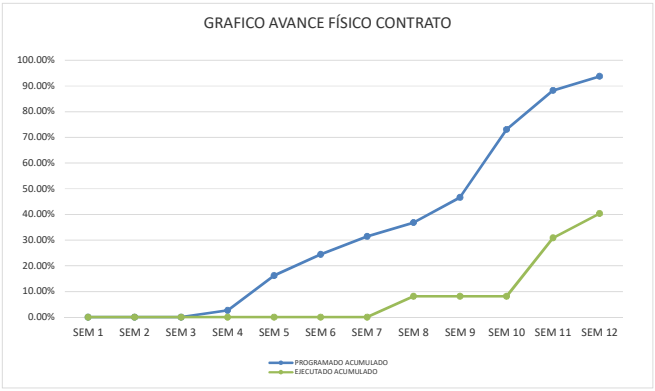

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 2	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 3	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 4	2.60%	0.00%	**-2.60%**
SEM 5	16.22%	0.00%	**-16.22%**
SEM 6	24.46%	0.00%	**-24.46%**
SEM 7	31.45%	0.00%	**-31.45%**
SEM 8	36.81%	8.13%	**-28.68%**
SEM 9	46.64%	8.13%	**-38.51%**
SEM 10	73.13%	8.13%	**-65.00%**
SEM 11	88.33%	30.89%	**-57.44%**
SEM 12	93.79%	40.37%	**-53.42%**
		ALERTAS	**-53.42%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

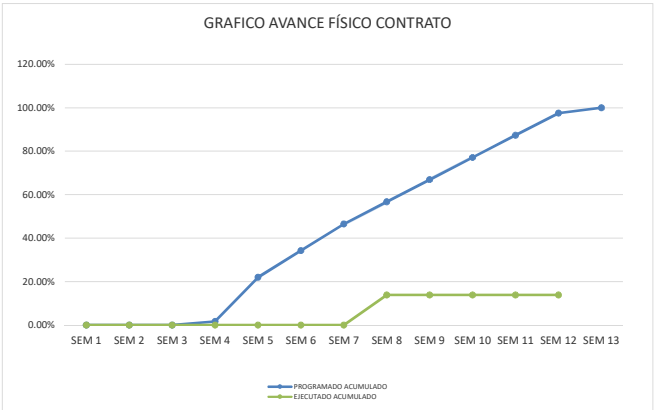

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 2	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 3	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 4	1.64%	0.00%	**-1.64%**
SEM 5	22.00%	0.00%	**-22.00%**
SEM 6	34.24%	0.00%	**-34.24%**
SEM 7	46.49%	0.00%	**-46.49%**
SEM 8	56.69%	13.84%	**-42.85%**
SEM 9	66.90%	13.84%	**-53.06%**
SEM 10	77.10%	13.84%	**-63.26%**
SEM 11	87.30%	13.84%	**-73.46%**
SEM 12	97.51%	13.84%	**-83.67%**
SEM 13	100.00%		
		ALERTAS	**-83.67%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

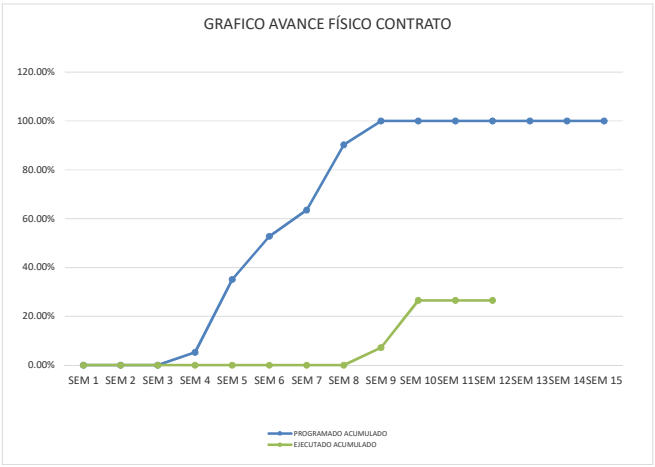


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	5.23%	0.00%	-5.23%
SEM 5	35.06%	0.00%	-35.06%
SEM 6	52.80%	0.00%	-52.80%
SEM 7	63.52%	0.00%	-63.52%
SEM 8	90.25%	0.00%	-90.25%
SEM 9	100.00%	7.18%	-92.82%
SEM 10	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 11	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 12	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 13	100.00%		
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

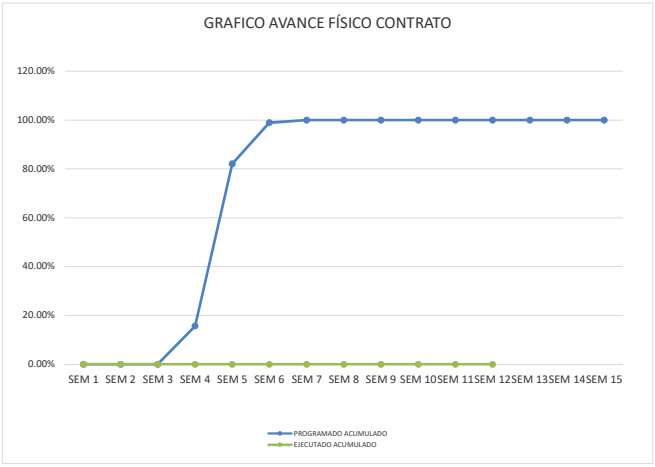

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	15.64%	0.00%	-15.64%
SEM 5	82.09%	0.00%	-82.09%
SEM 6	98.93%	0.00%	-98.93%
SEM 7	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 8	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 9	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 10	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 11	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 12	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 13	100.00%		
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

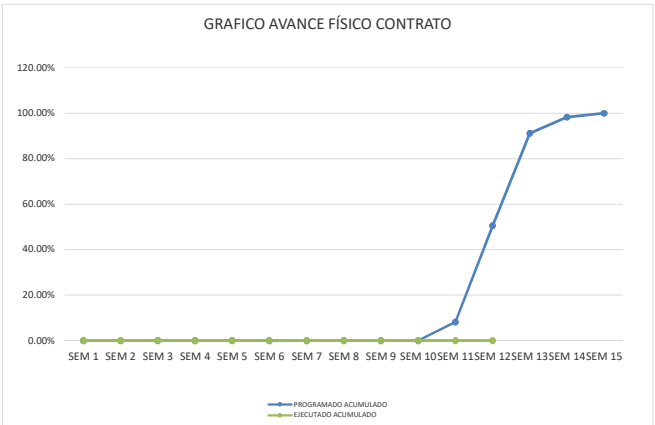


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	8.12%	0.00%	-8.12%
SEM 12	50.52%	0.00%	-50.52%
SEM 13	91.19%		
SEM 14	98.27%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-50.52%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

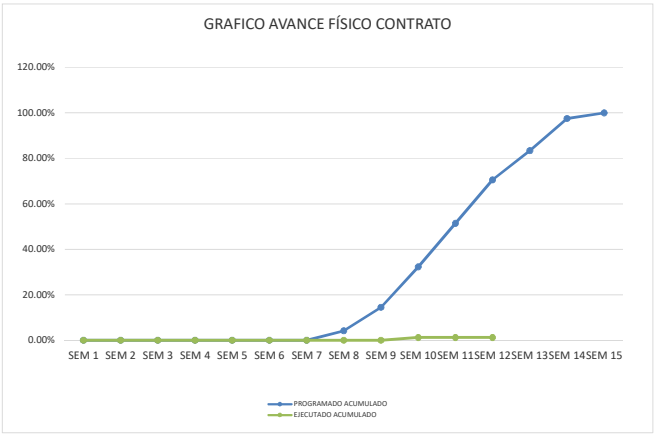

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	4.22%	0.00%	-4.22%
SEM 9	14.52%	0.00%	-14.52%
SEM 10	32.35%	1.25%	-31.10%
SEM 11	51.42%	1.25%	-50.17%
SEM 12	70.58%	1.25%	-69.33%
SEM 13	83.44%		
SEM 14	97.57%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-69.33%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

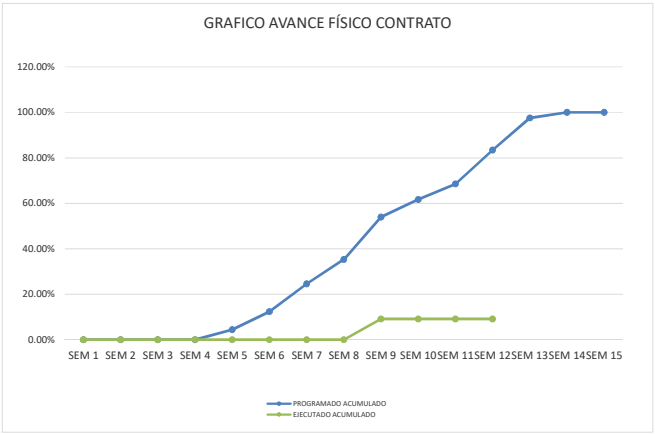

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	4.45%	0.00%	-4.45%
SEM 6	12.38%	0.00%	-12.38%
SEM 7	24.56%	0.00%	-24.56%
SEM 8	35.28%	0.00%	-35.28%
SEM 9	53.97%	9.13%	-44.84%
SEM 10	61.72%	9.13%	-52.59%
SEM 11	68.50%	9.13%	-59.37%
SEM 12	83.41%	9.13%	-74.28%
SEM 13	97.54%		
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-74.28%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

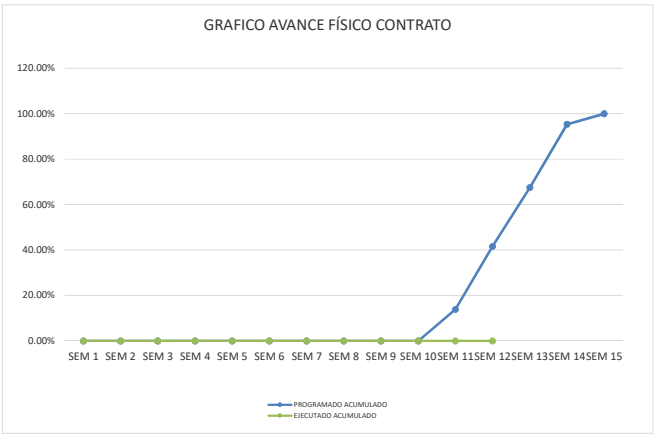

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	13.86%	0.00%	-13.86%
SEM 12	41.65%	0.00%	-41.65%
SEM 13	67.58%		
SEM 14	95.38%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-41.65%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

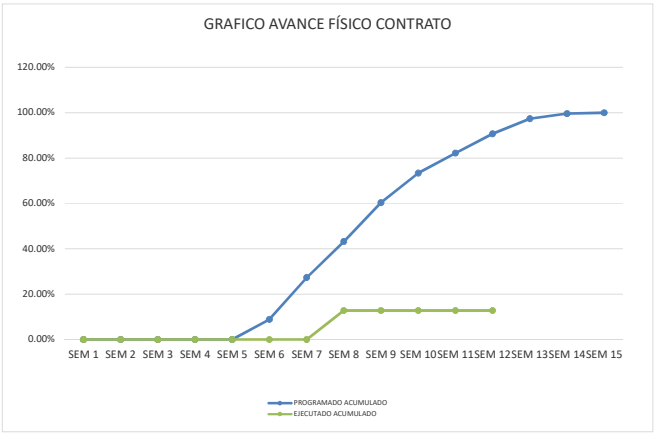


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	8.86%	0.00%	-8.86%
SEM 7	27.37%	0.00%	-27.37%
SEM 8	43.24%	12.81%	-30.43%
SEM 9	60.37%	12.81%	-47.56%
SEM 10	73.35%	12.81%	-60.54%
SEM 11	82.18%	12.81%	-69.37%
SEM 12	90.69%	12.81%	-77.88%
SEM 13	97.40%		
SEM 14	99.57%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-77.88%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

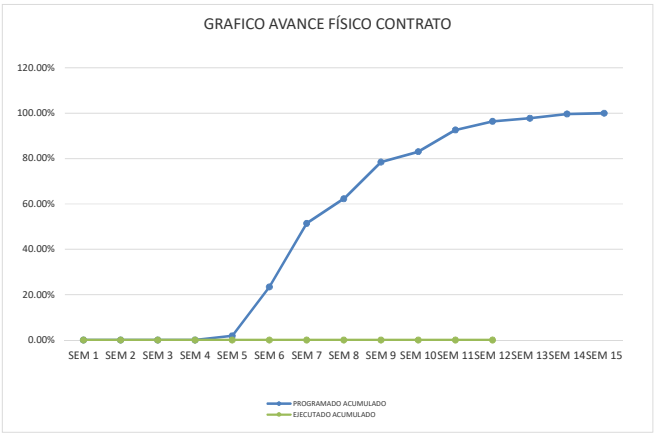

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	1.84%	0.00%	-1.84%
SEM 6	23.43%	0.00%	-23.43%
SEM 7	51.42%	0.00%	-51.42%
SEM 8	62.28%	0.00%	-62.28%
SEM 9	78.45%	0.00%	-78.45%
SEM 10	83.05%	0.00%	-83.05%
SEM 11	92.63%	0.00%	-92.63%
SEM 12	96.41%	0.00%	-96.41%
SEM 13	97.78%		
SEM 14	99.67%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-96.41%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

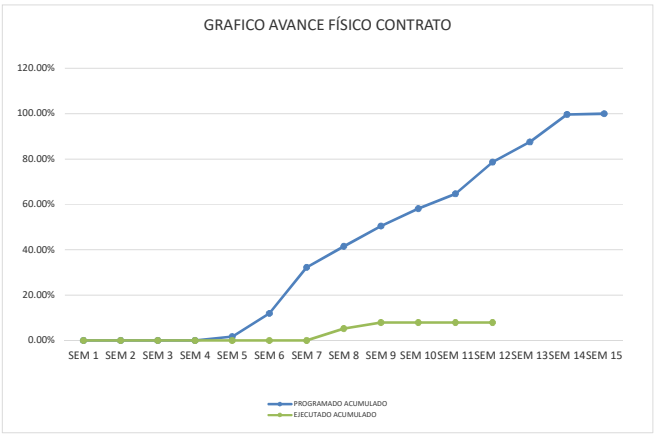

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	1.72%	0.00%	-1.72%
SEM 6	11.94%	0.00%	-11.94%
SEM 7	32.23%	0.00%	-32.23%
SEM 8	41.50%	5.28%	-36.22%
SEM 9	50.44%	7.94%	-42.50%
SEM 10	58.15%	7.94%	-50.21%
SEM 11	64.66%	7.94%	-56.72%
SEM 12	78.62%	7.94%	-70.68%
SEM 13	87.55%		
SEM 14	99.65%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-70.68%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

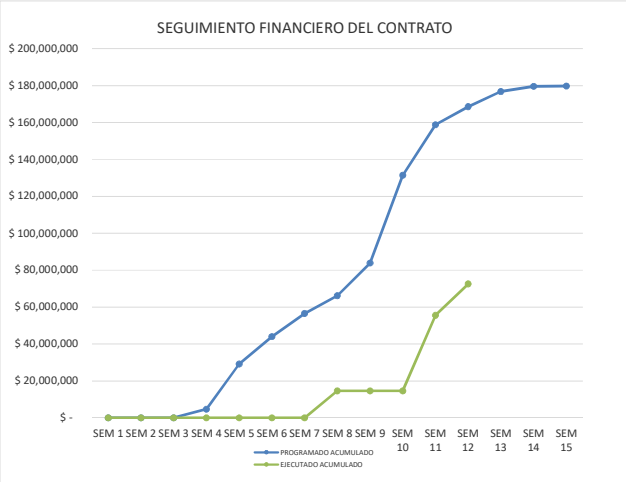


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 4,673,914	$ -	$ -4,673,914.44
SEM 5	$ 29,158,035	$ -	$ -29,158,035.48
SEM 6	$ 43,970,749	$ -	$ -43,970,748.95
SEM 7	$ 56,536,388	$ -	$ -56,536,388.16
SEM 8	$ 66,171,843	$ 14,607,200	$ -51,564,642.93
SEM 9	$ 83,842,834	$ 14,607,200	$ -69,235,634.84
SEM 10	$ 131,462,832	$ 14,607,200	$ -116,855,632.37
SEM 11	$ 158,787,255	$ 55,537,298	$ -103,249,956.96
SEM 12	$ 168,602,475	$ 72,570,665	$ -96,031,810.29
SEM 13	$ 176,781,825		
SEM 14	$ 179,568,198		
SEM 15	$ 179,765,940		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

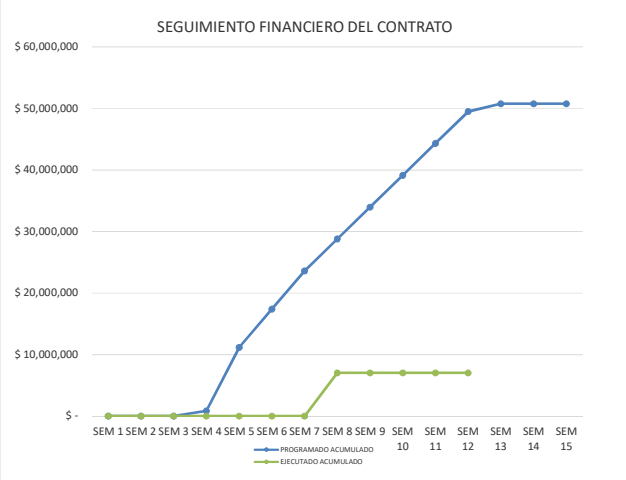

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 832,645	$ -	$ -832,645.28
SEM 5	$ 11,169,632	$ -	$ -11,169,631.83
SEM 6	$ 17,384,009	$ -	$ -17,384,008.81
SEM 7	$ 23,603,463	$ -	$ -23,603,462.90
SEM 8	$ 28,782,110	$ 7,026,713.84	$ -21,755,396.54
SEM 9	$ 33,965,835	$ 7,026,713.84	$ -26,939,121.13
SEM 10	$ 39,144,482	$ 7,026,713.84	$ -32,117,768.62
SEM 11	$ 44,323,130	$ 7,026,713.84	$ -37,296,416.10
SEM 12	$ 49,506,855	$ 7,026,713.84	$ -42,480,140.69
SEM 13	$ 50,771,054		
SEM 14	$ 50,771,054		
SEM 15	$ 50,771,054		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

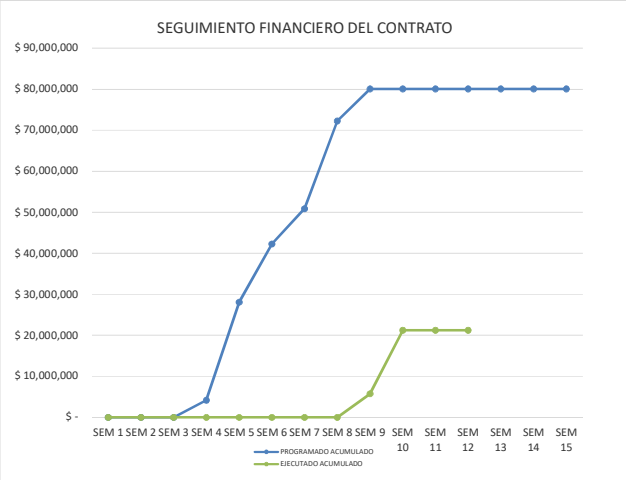


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 4,188,015	$ -	$ -4,188,014.89
SEM 5	$ 28,074,914	$ -	$ -28,074,914.32
SEM 6	$ 42,280,533	$ -	$ -42,280,532.68
SEM 7	$ 50,864,762	$ -	$ -50,864,762.05
SEM 8	$ 72,269,282	$ -	$ -72,269,281.72
SEM 9	$ 80,076,766	$ 5,749,511.83	$ -74,327,254.61
SEM 10	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 11	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 12	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 13	$ 80,076,766		
SEM 14	$ 80,076,766		
SEM 15	$ 80,076,766		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

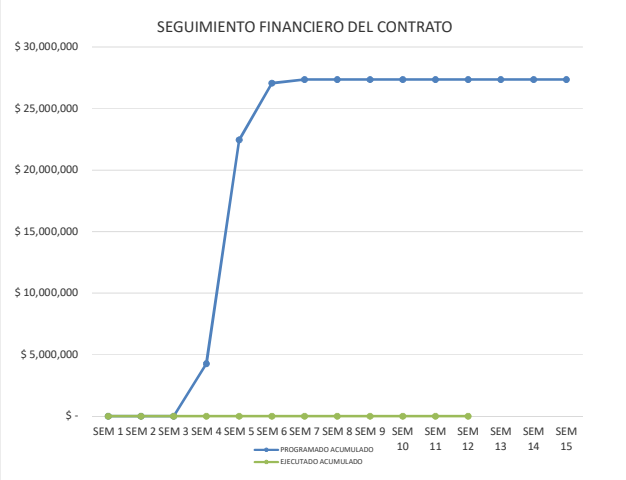

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 4,279,784	$ -	$ -4,279,783.68
SEM 5	$ 22,463,391	$ -	$ -22,463,391.45
SEM 6	$ 27,071,547	$ -	$ -27,071,547.28
SEM 7	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 8	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 9	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 10	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 11	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 12	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 13	$ 27,364,346		
SEM 14	$ 27,364,346		
SEM 15	$ 27,364,346		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ -	$ -	$ -
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 393,036	$ -	$ -393,036.19
SEM 12	$ 2,445,343	$ -	$ -2,445,343.37
SEM 13	$ 4,413,913		
SEM 14	$ 4,756,609		
SEM 15	$ 4,840,347		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ -	$ -	$ -
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ 5,001,677	$ -	$ -5,001,676.93
SEM 9	$ 17,209,561	$ -	$ -17,209,561.39
SEM 10	$ 38,342,239	$ 1,481,539.38	$ -36,860,699.68
SEM 11	$ 60,944,604	$ 1,481,539.38	$ -59,463,064.41
SEM 12	$ 83,653,639	$ 1,481,539.38	$ -82,172,099.97
SEM 13	$ 98,895,716		
SEM 14	$ 115,643,038		
SEM 15	$ 118,523,150		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

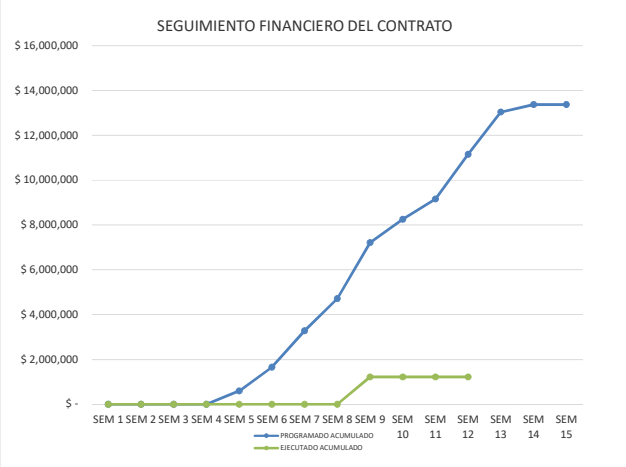

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ 595,159	$ -	$ -595,158.84
SEM 6	$ 1,655,745	$ -	$ -1,655,745.26
SEM 7	$ 3,284,742	$ -	$ -3,284,741.82
SEM 8	$ 4,718,473	$ -	$ -4,718,472.77
SEM 9	$ 7,218,140	$ 1,221,078.70	$ -5,997,061.20
SEM 10	$ 8,254,652	$ 1,221,078.70	$ -7,033,573.78
SEM 11	$ 9,161,434	$ 1,221,078.70	$ -7,940,355.12
SEM 12	$ 11,155,550	$ 1,221,078.70	$ -9,934,471.58
SEM 13	$ 13,045,347		
SEM 14	$ 13,374,356		
SEM 15	$ 13,374,356		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ -	$ -	$ -
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 174,097	$ -	$ -174,097.00
SEM 12	$ 523,170	$ -	$ -523,170.27
SEM 13	$ 848,880		
SEM 14	$ 1,198,079		
SEM 15	$ 1,256,111		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

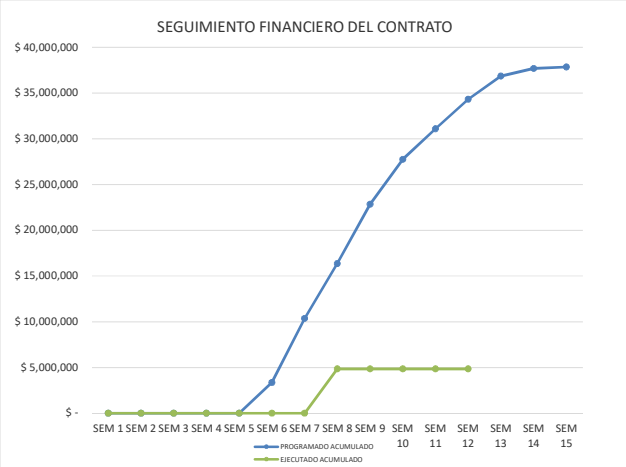

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ 3,353,144	$ -	$ -3,353,143.96
SEM 7	$ 10,358,414	$ -	$ -10,358,414.23
SEM 8	$ 16,364,554	$ 4,848,055.77	$ -11,516,497.81
SEM 9	$ 22,847,551	$ 4,848,055.77	$ -17,999,495.10
SEM 10	$ 27,759,945	$ 4,848,055.77	$ -22,911,888.84
SEM 11	$ 31,101,735	$ 4,848,055.77	$ -26,253,679.03
SEM 12	$ 34,322,418	$ 4,848,055.77	$ -29,474,362.45
SEM 13	$ 36,861,876		
SEM 14	$ 37,683,131		
SEM 15	$ 37,845,869		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

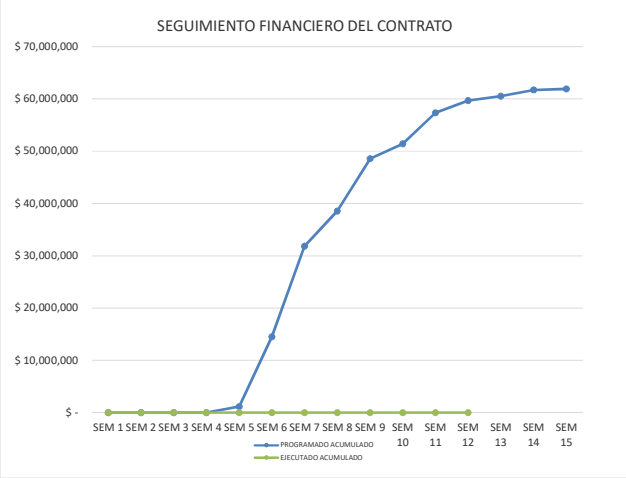

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ 1,139,279	$ -	$ -1,139,278.93
SEM 6	$ 14,507,231	$ -	$ -14,507,231.16
SEM 7	$ 31,837,893	$ -	$ -31,837,892.71
SEM 8	$ 38,562,115	$ -	$ -38,562,115.09
SEM 9	$ 48,574,148	$ -	$ -48,574,147.86
SEM 10	$ 51,422,345	$ -	$ -51,422,345.18
SEM 11	$ 57,354,026	$ -	$ -57,354,025.70
SEM 12	$ 59,694,501	$ -	$ -59,694,500.89
SEM 13	$ 60,542,768		
SEM 14	$ 61,713,006		
SEM 15	$ 61,917,333		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

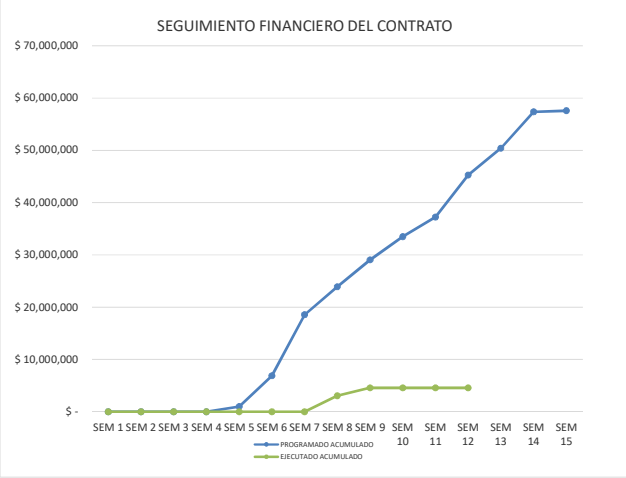

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ 990,408	$ -	$ -990,408.24
SEM 6	$ 6,875,276	$ -	$ -6,875,275.82
SEM 7	$ 18,558,638	$ -	$ -18,558,638.15
SEM 8	$ 23,896,478	$ 3,040,322.97	$ -20,856,154.95
SEM 9	$ 29,044,298	$ 4,572,000.84	$ -24,472,296.67
SEM 10	$ 33,483,860	$ 4,572,000.84	$ -28,911,859.19
SEM 11	$ 37,232,440	$ 4,572,000.84	$ -32,660,439.22
SEM 12	$ 45,270,870	$ 4,572,000.84	$ -40,698,868.90
SEM 13	$ 50,412,931		
SEM 14	$ 57,380,338		
SEM 15	$ 57,581,875		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020	6/10/2020	18/09/2020		**-18.00**	**44092.00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/09/2020	3/11/2020	1/12/2020		**-45.00**	**44166.00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		30/11/2020		**44093.00**	**44165.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020	3/11/2020	7/10/2020	13/11/2020	**-45.00**	**-37.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		29/09/2020		**44093.00**	**44103.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/09/2020		6/10/2020		**44095.00**	**44110.00**
10	NO PREVISTOS	21/09/2020	6/10/2020	25/11/2020		**-15.00**	**44160.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**44092.00**	**44092.00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/09/2020		18/11/2020		**44096.00**	**44153.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		26/09/2020		**44093.00**	**44100.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**44093.00**	**44095.00**
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		25/11/2020		**44093.00**	**44160.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**44092.00**	**44092.00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		21/10/2020		**44093.00**	**44125.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		7/10/2020		**44093.00**	**44111.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**44093.00**	**44095.00**
10	NO PREVISTOS	21/10/2020		25/11/2020		**44125.00**	**44160.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**44092.00**	**44092.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		**44093.00**	**44166.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**44093.00**	**44109.00**
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**44095.00**	**44160.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**44138.00**	**44138.00**
5	LAVADO DE TANQUES	17/11/2020		17/11/2020		**44152.00**	**44152.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**44139.00**	**44166.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		19/11/2020		**44139.00**	**44154.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	10/11/2020		30/11/2020		**44145.00**	**44165.00**
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		1/12/2020		**44139.00**	**44166.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/10/2020		13/10/2020		**44117.00**	**44117.00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		**44118.00**	**44166.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		1/12/2020		**44118.00**	**44166.00**
5	LAVADO DE TANQUES	26/10/2020		30/10/2020		**44130.00**	**44134.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/10/2020		1/12/2020		**44118.00**	**44166.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/10/2020		1/12/2020		**44118.00**	**44166.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020		**44135.00**	**44166.00**
10	NO PREVISTOS	14/10/2020		1/12/2020		**44118.00**	**44166.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**44099.00**	**44099.00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		25/11/2020		**44100.00**	**44160.00**
5	LAVADO DE TANQUES	8/10/2020		24/10/2020		**44112.00**	**44128.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**44100.00**	**44166.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		28/10/2020		**44100.00**	**44132.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/10/2020		9/10/2020		**44109.00**	**44113.00**
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		11/11/2020		**44100.00**	**44146.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**44138.00**	**44138.00**
5	LAVADO DE TANQUES	12/11/2020		19/11/2020		**44147.00**	**44154.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**44139.00**	**44166.00**
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		24/11/2020		**44139.00**	**44159.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020		29/09/2020		**44103.00**	**44103.00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		21/11/2020		**44104.00**	**44156.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/09/2020		14/11/2020		**44104.00**	**44149.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		13/10/2020		**44104.00**	**44117.00**
5	LAVADO DE TANQUES	6/10/2020		20/10/2020		**44110.00**	**44124.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/09/2020		1/12/2020		**44104.00**	**44166.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/10/2020		14/11/2020		**44110.00**	**44149.00**
10	NO PREVISTOS	30/09/2020		14/11/2020		**44104.00**	**44149.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**44099.00**	**44099.00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		16/10/2020		**44100.00**	**44120.00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	28/09/2020		28/10/2020		**44102.00**	**44132.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		22/10/2020		**44100.00**	**44126.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	28/10/2020		1/12/2020		**44132.00**	**44166.00**
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		12/11/2020		**44100.00**	**44147.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/10/2020		23/10/2020		**44109.00**	**44127.00**
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		2/10/2020		**44100.00**	**44106.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**44099.00**	**44099.00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		9/10/2020		**44100.00**	**44113.00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	26/09/2020		8/10/2020		**44100.00**	**44112.00**
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		8/10/2020		**44100.00**	**44112.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		2/10/2020		**44100.00**	**44106.00**
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		5/10/2020		**44100.00**	**44109.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**44100.00**	**44166.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		1/12/2020		**44100.00**	**44166.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/09/2020		28/10/2020		**44103.00**	**44132.00**
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		14/11/2020		**44100.00**	**44149.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**102**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**16**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

GUAJIRA

• **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA:** Durante el desarrollo de la semana del 02 de novimebre al 08 de noviembre se desarrollaron actividades de jardinería, por lo cual el porcentaje de avance acumulado es del 40,37% frente a un 93,79% programado, lo que representa un atraso del 53,42%.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	1	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA	2			AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	5	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7768734177	
3 4	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279	
4 5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
9/11/2020	15/11/2020	SEMANA No. 12	17-nov-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

DIECISIETE	17	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	12	DEL	9 de noviembre de 2020	AL	15 de noviembre de 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERIO Y SERVICIO - RIOHACHA	ACTIVIDADES DE JARDINERÍA



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA	ACTIVIDADES DE JARDINERÍA



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERIO Y SERVICIO - RIOHACHA	ACTIVIDADES DE JARDINERÍA



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA	ACTIVIDADES DE JARDINERÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

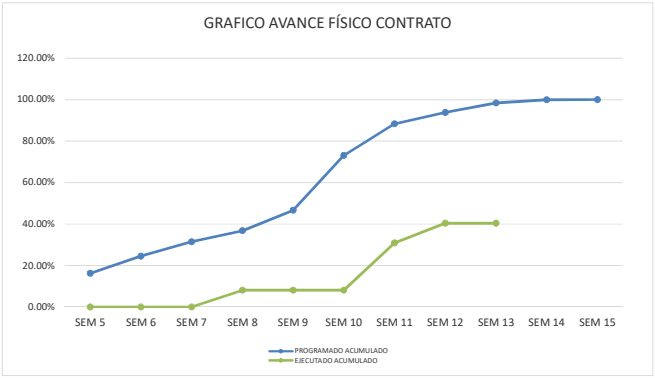

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 5	16.22%	0.00%	**-16.22%**
SEM 6	24.46%	0.00%	**-24.46%**
SEM 7	31.45%	0.00%	**-31.45%**
SEM 8	36.81%	8.13%	**-28.68%**
SEM 9	46.64%	8.13%	**-38.51%**
SEM 10	73.13%	8.13%	**-65.00%**
SEM 11	88.33%	30.89%	**-57.44%**
SEM 12	93.79%	40.37%	**-53.42%**
SEM 13	98.34%	40.37%	**-57.97%**
SEM 14	99.89%		
SEM 15	100.00%		
	ALERTAS		**-53.42%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

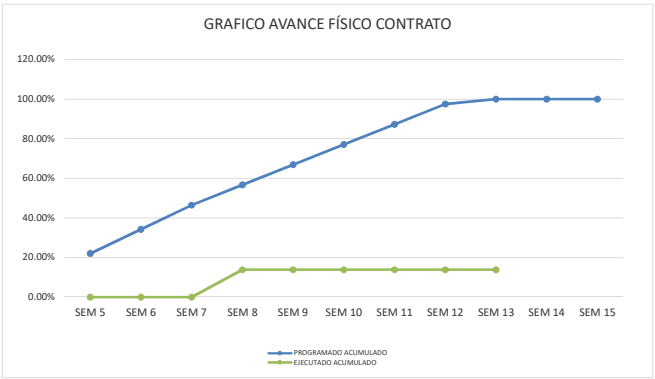

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 5	22.00%	0.00%	**-22.00%**
SEM 6	34.24%	0.00%	**-34.24%**
SEM 7	46.49%	0.00%	**-46.49%**
SEM 8	56.69%	13.84%	**-42.85%**
SEM 9	66.90%	13.84%	**-53.06%**
SEM 10	77.10%	13.84%	**-63.26%**
SEM 11	87.30%	13.84%	**-73.46%**
SEM 12	97.51%	13.84%	**-83.67%**
SEM 13	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
	ALERTAS		**-83.67%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

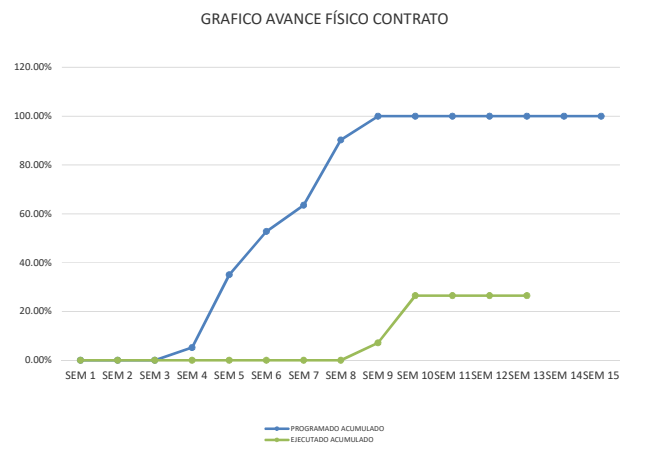


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	5.23%	0.00%	-5.23%
SEM 5	35.06%	0.00%	-35.06%
SEM 6	52.80%	0.00%	-52.80%
SEM 7	63.52%	0.00%	-63.52%
SEM 8	90.25%	0.00%	-90.25%
SEM 9	100.00%	7.18%	-92.82%
SEM 10	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 11	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 12	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 13	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

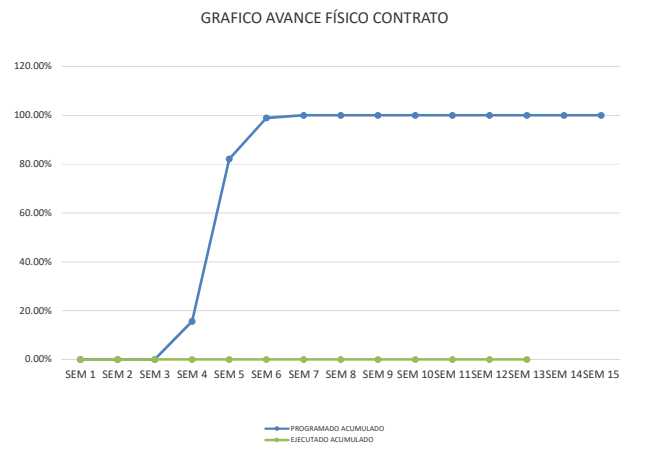

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	15.64%	0.00%	-15.64%
SEM 5	82.09%	0.00%	-82.09%
SEM 6	98.93%	0.00%	-98.93%
SEM 7	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 8	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 9	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 10	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 11	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 12	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 13	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

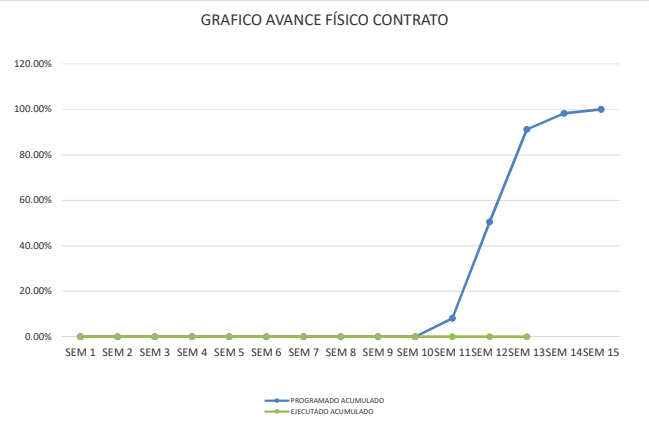


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	8.12%	0.00%	-8.12%
SEM 12	50.52%	0.00%	-50.52%
SEM 13	91.19%	0.00%	-91.19%
SEM 14	98.27%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-91.19%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

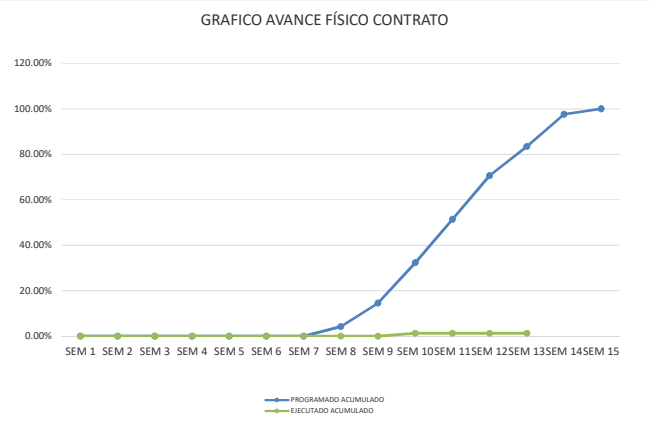


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	4.22%	0.00%	-4.22%
SEM 9	14.52%	0.00%	-14.52%
SEM 10	32.35%	1.25%	-31.10%
SEM 11	51.42%	1.25%	-50.17%
SEM 12	70.58%	1.25%	-69.33%
SEM 13	83.44%	1.25%	-82.19%
SEM 14	97.57%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-82.19%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

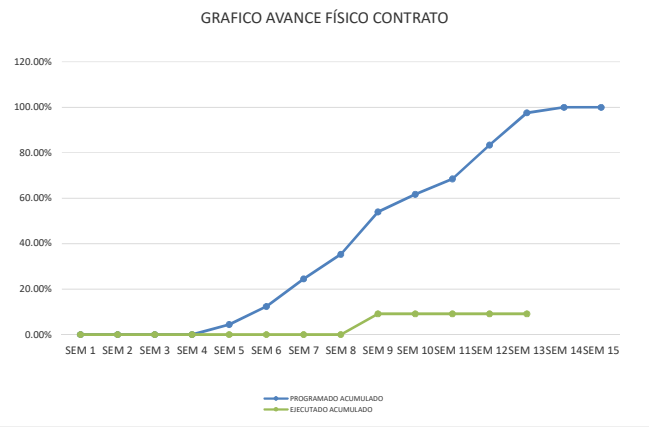

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	4.45%	0.00%	-4.45%
SEM 6	12.38%	0.00%	-12.38%
SEM 7	24.56%	0.00%	-24.56%
SEM 8	35.28%	0.00%	-35.28%
SEM 9	53.97%	9.13%	-44.84%
SEM 10	61.72%	9.13%	-52.59%
SEM 11	68.50%	9.13%	-59.37%
SEM 12	83.41%	9.13%	-74.28%
SEM 13	97.54%	9.13%	-88.41%
SEM 14	100.00%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-88.41%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

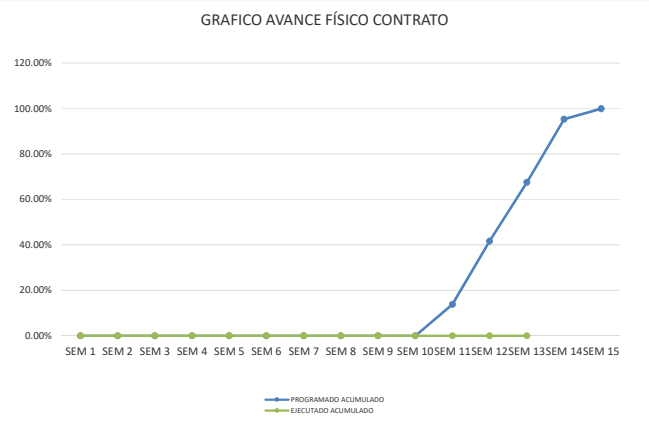


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	13.86%	0.00%	-13.86%
SEM 12	41.65%	0.00%	-41.65%
SEM 13	67.58%	0.00%	-67.58%
SEM 14	95.38%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-67.58%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

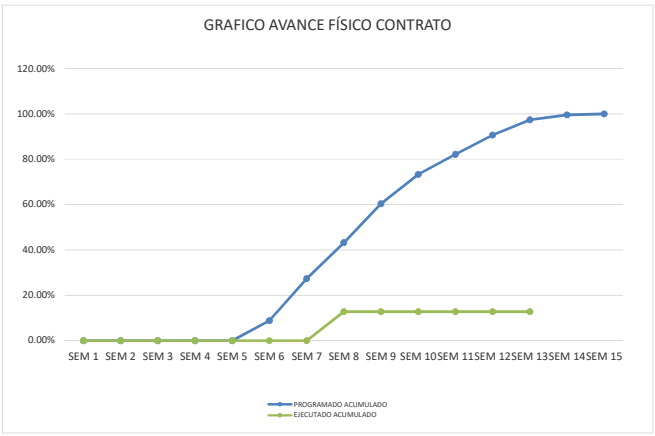


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	8.86%	0.00%	-8.86%
SEM 7	27.37%	0.00%	-27.37%
SEM 8	43.24%	12.81%	-30.43%
SEM 9	60.37%	12.81%	-47.56%
SEM 10	73.35%	12.81%	-60.54%
SEM 11	82.18%	12.81%	-69.37%
SEM 12	90.69%	12.81%	-77.88%
SEM 13	97.40%	12.81%	-84.59%
SEM 14	99.57%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-84.59%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

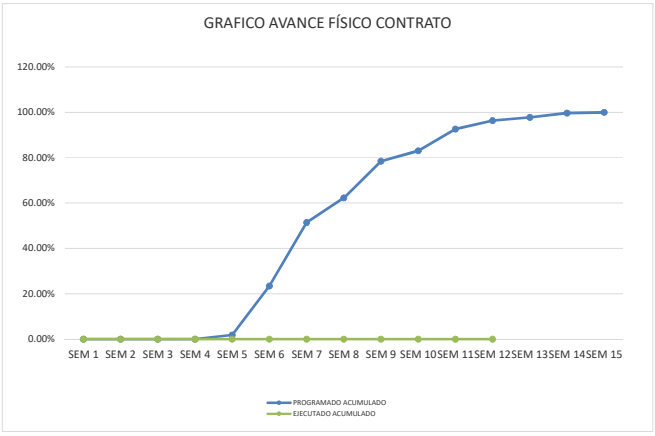

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	1.84%	0.00%	-1.84%
SEM 6	23.43%	0.00%	-23.43%
SEM 7	51.42%	0.00%	-51.42%
SEM 8	62.28%	0.00%	-62.28%
SEM 9	78.45%	0.00%	-78.45%
SEM 10	83.05%	0.00%	-83.05%
SEM 11	92.63%	0.00%	-92.63%
SEM 12	96.41%	0.00%	-96.41%
SEM 13	97.78%		
SEM 14	99.67%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-96.41%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

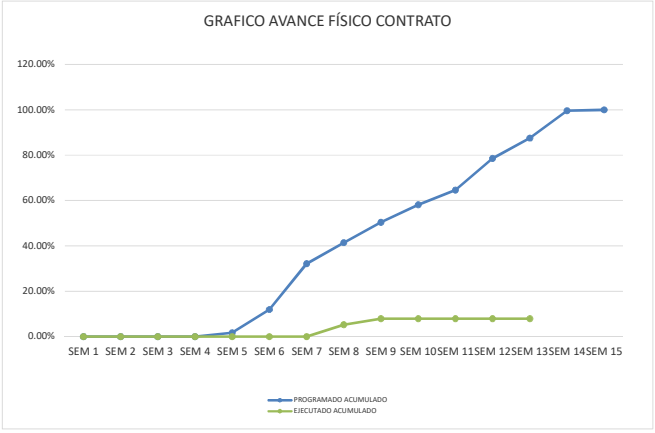

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	1.72%	0.00%	-1.72%
SEM 6	11.94%	0.00%	-11.94%
SEM 7	32.23%	0.00%	-32.23%
SEM 8	41.50%	5.28%	-36.22%
SEM 9	50.44%	7.94%	-42.50%
SEM 10	58.15%	7.94%	-50.21%
SEM 11	64.66%	7.94%	-56.72%
SEM 12	78.62%	7.94%	-70.68%
SEM 13	87.55%	7.94%	-79.61%
SEM 14	99.65%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-79.61%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

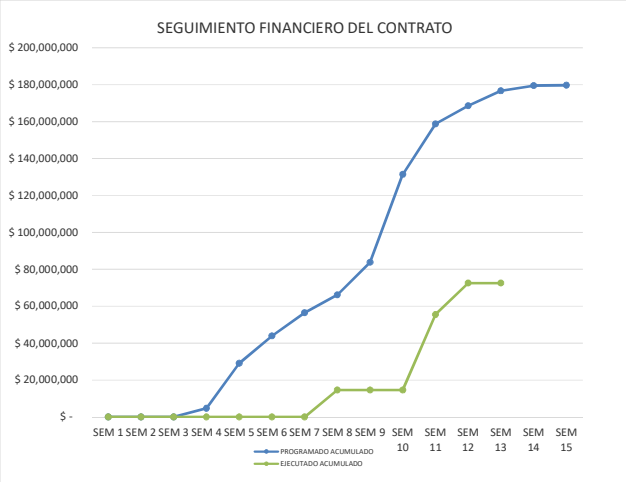

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 4,673,914	$ -	$ -4,673,914.44
SEM 5	$ 29,158,035	$ -	$ -29,158,035.48
SEM 6	$ 43,970,749	$ -	$ -43,970,748.95
SEM 7	$ 56,536,388	$ -	$ -56,536,388.16
SEM 8	$ 66,171,843	$ 14,607,200	$ -51,564,642.93
SEM 9	$ 83,842,834	$ 14,607,200	$ -69,235,634.84
SEM 10	$ 131,462,832	$ 14,607,200	$ -116,855,632.37
SEM 11	$ 158,787,255	$ 55,537,298	$ -103,249,956.96
SEM 12	$ 168,602,475	$ 72,570,665	$ -96,031,810.29
SEM 13	$ 176,781,825	$ 72,570,665	$ -104,211,160.56
SEM 14	$ 179,568,198		
SEM 15	$ 179,765,940		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

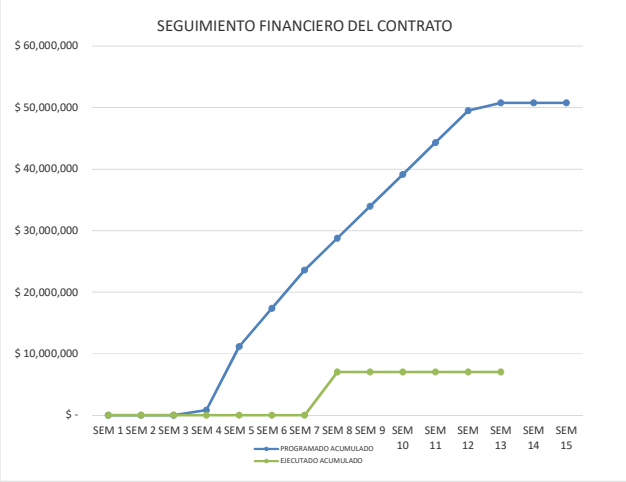

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 832,645	$ -	$ -832,645.28
SEM 5	$ 11,169,632	$ -	$ -11,169,631.83
SEM 6	$ 17,384,009	$ -	$ -17,384,008.81
SEM 7	$ 23,603,463	$ -	$ -23,603,462.90
SEM 8	$ 28,782,110	$ 7,026,713.84	$ -21,755,396.54
SEM 9	$ 33,965,835	$ 7,026,713.84	$ -26,939,121.13
SEM 10	$ 39,144,482	$ 7,026,713.84	$ -32,117,768.62
SEM 11	$ 44,323,130	$ 7,026,713.84	$ -37,296,416.10
SEM 12	$ 49,506,855	$ 7,026,713.84	$ -42,480,140.69
SEM 13	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 14	$ 50,771,054		
SEM 15	$ 50,771,054		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

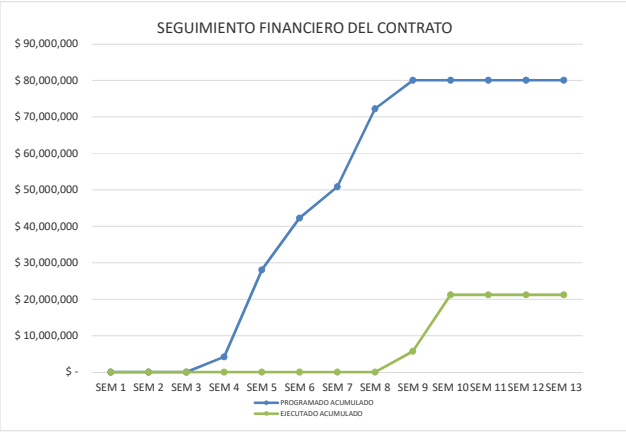

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 4,188,015	$ -	$ -4,188,014.89
SEM 5	$ 28,074,914	$ -	$ -28,074,914.32
SEM 6	$ 42,280,533	$ -	$ -42,280,532.68
SEM 7	$ 50,864,762	$ -	$ -50,864,762.05
SEM 8	$ 72,269,282	$ -	$ -72,269,281.72
SEM 9	$ 80,076,766	$ 5,749,511.83	$ -74,327,254.61
SEM 10	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 11	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 12	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 13	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

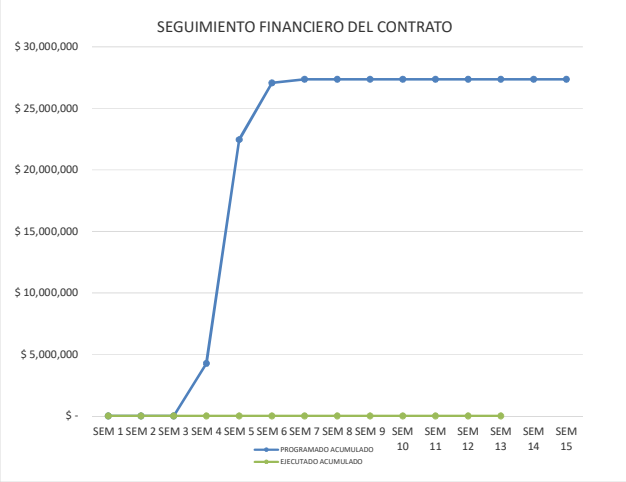

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ 4,279,784	$ -	$ -4,279,783.68
SEM 5	$ 22,463,391	$ -	$ -22,463,391.45
SEM 6	$ 27,071,547	$ -	$ -27,071,547.28
SEM 7	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 8	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 9	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 10	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 11	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 12	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 13	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 14	$ 27,364,346		
SEM 15	$ 27,364,346		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ -	$ -	$ -
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 393,036	$ -	$ -393,036.19
SEM 12	$ 2,445,343	$ -	$ -2,445,343.37
SEM 13	$ 4,413,913	$ -	$ -4,413,912.54
SEM 14	$ 4,756,609		
SEM 15	$ 4,840,347		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ -	$ -	$ -
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ 5,001,677	$ -	$ -5,001,676.93
SEM 9	$ 17,209,561	$ -	$ -17,209,561.39
SEM 10	$ 38,342,239	$ 1,481,539.38	$ -36,860,699.68
SEM 11	$ 60,944,604	$ 1,481,539.38	$ -59,463,064.41
SEM 12	$ 83,653,639	$ 1,481,539.38	$ -82,172,099.97
SEM 13	$ 98,895,716	$ 1,481,539.38	$ -97,414,177.07
SEM 14	$ 115,643,038		
SEM 15	$ 118,523,150		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

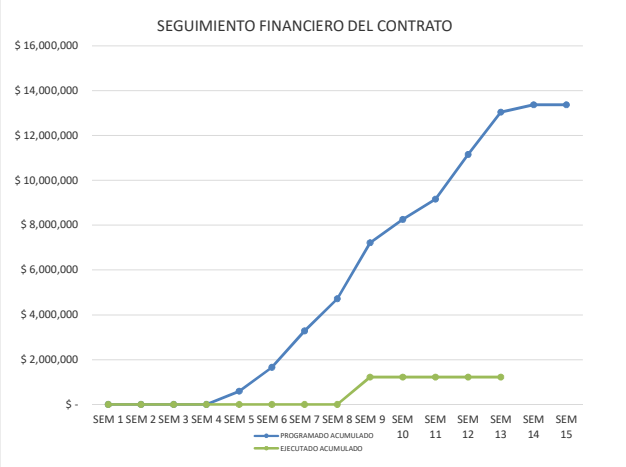


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ 595,159	$ -	$ -595,158.84
SEM 6	$ 1,655,745	$ -	$ -1,655,745.26
SEM 7	$ 3,284,742	$ -	$ -3,284,741.82
SEM 8	$ 4,718,473	$ -	$ -4,718,472.77
SEM 9	$ 7,218,140	$ 1,221,078.70	$ -5,997,061.20
SEM 10	$ 8,254,652	$ 1,221,078.70	$ -7,033,573.78
SEM 11	$ 9,161,434	$ 1,221,078.70	$ -7,940,355.12
SEM 12	$ 11,155,550	$ 1,221,078.70	$ -9,934,471.58
SEM 13	$ 13,045,347	$ 1,221,078.70	$ -11,824,268.08
SEM 14	$ 13,374,356		
SEM 15	$ 13,374,356		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ -	$ -	$ -
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 174,097	$ -	$ -174,097.00
SEM 12	$ 523,170	$ -	$ -523,170.27
SEM 13	$ 848,880	$ -	$ -848,879.87
SEM 14	$ 1,198,079		
SEM 15	$ 1,256,111		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

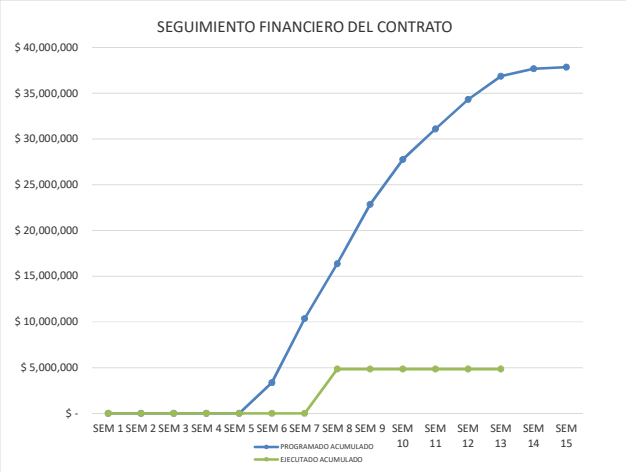


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ 3,353,144	$ -	$ -3,353,143.96
SEM 7	$ 10,358,414	$ -	$ -10,358,414.23
SEM 8	$ 16,364,554	$ 4,848,055.77	$ -11,516,497.81
SEM 9	$ 22,847,551	$ 4,848,055.77	$ -17,999,495.10
SEM 10	$ 27,759,945	$ 4,848,055.77	$ -22,911,888.84
SEM 11	$ 31,101,735	$ 4,848,055.77	$ -26,253,679.03
SEM 12	$ 34,322,418	$ 4,848,055.77	$ -29,474,362.45
SEM 13	$ 36,861,876	$ 4,848,055.77	$ -32,013,820.23
SEM 14	$ 37,683,131		
SEM 15	$ 37,845,869		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

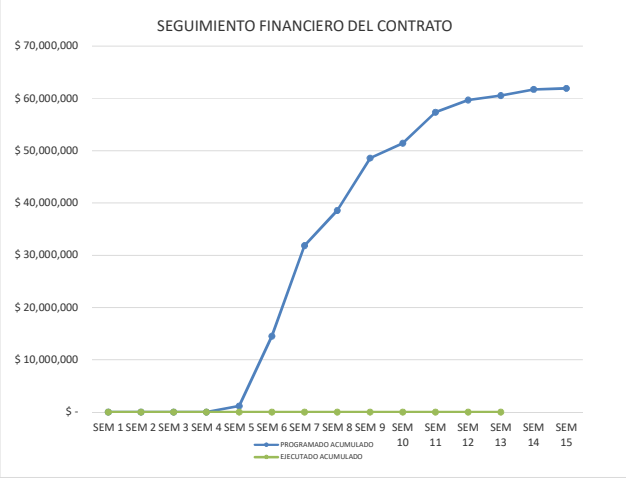

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ 1,139,279	$ -	$ -1,139,278.93
SEM 6	$ 14,507,231	$ -	$ -14,507,231.16
SEM 7	$ 31,837,893	$ -	$ -31,837,892.71
SEM 8	$ 38,562,115	$ -	$ -38,562,115.09
SEM 9	$ 48,574,148	$ -	$ -48,574,147.86
SEM 10	$ 51,422,345	$ -	$ -51,422,345.18
SEM 11	$ 57,354,026	$ -	$ -57,354,025.70
SEM 12	$ 59,694,501	$ -	$ -59,694,500.89
SEM 13	$ 60,542,768	$ -	$ -60,542,768.36
SEM 14	$ 61,713,006		
SEM 15	$ 61,917,333		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

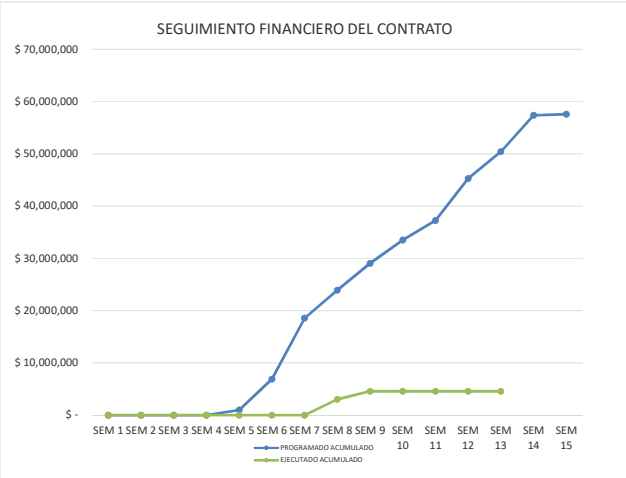

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ 990,408	$ -	$ -990,408.24
SEM 6	$ 6,875,276	$ -	$ -6,875,275.82
SEM 7	$ 18,558,638	$ -	$ -18,558,638.15
SEM 8	$ 23,896,478	$ 3,040,322.97	$ -20,856,154.95
SEM 9	$ 29,044,298	$ 4,572,000.84	$ -24,472,296.67
SEM 10	$ 33,483,860	$ 4,572,000.84	$ -28,911,859.19
SEM 11	$ 37,232,440	$ 4,572,000.84	$ -32,660,439.22
SEM 12	$ 45,270,870	$ 4,572,000.84	$ -40,698,868.90
SEM 13	$ 50,412,931	$ 4,572,000.84	$ -45,840,930.29
SEM 14	$ 57,380,338		
SEM 15	$ 57,581,875		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020	6/10/2020	18/09/2020		**-18.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/09/2020	3/11/2020	1/12/2020		**-45.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		30/11/2020		**-64.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020	3/11/2020	7/10/2020	13/11/2020	**-45.00**	**-37.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		29/09/2020		**-64.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/09/2020		6/10/2020		**-62.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020	6/10/2020	25/11/2020		**-15.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-65.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/09/2020		18/11/2020		**-61.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		26/09/2020		**-64.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-64.00**	
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		25/11/2020		**-64.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-65.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		21/10/2020		**-64.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		7/10/2020		**-64.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-64.00**	
10	NO PREVISTOS	21/10/2020		25/11/2020		**-32.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-65.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		**-64.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**-64.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**-62.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-19.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	17/11/2020		17/11/2020		**-5.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-18.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		19/11/2020		**-18.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	10/11/2020		30/11/2020		**-12.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		1/12/2020		**-18.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/10/2020		13/10/2020		**-40.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		**-39.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		1/12/2020		**-39.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/10/2020		30/10/2020		**-27.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/10/2020		1/12/2020		**-39.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/10/2020		1/12/2020		**-39.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020		**-22.00**	
10	NO PREVISTOS	14/10/2020		1/12/2020		**-39.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-58.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		25/11/2020		**-57.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	8/10/2020		24/10/2020		**-45.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-57.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		28/10/2020		**-57.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/10/2020		9/10/2020		**-48.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		11/11/2020		**-57.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-19.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	12/11/2020		19/11/2020		**-10.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-18.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		24/11/2020		**-18.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020		29/09/2020		**-54.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		21/11/2020		**-53.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/09/2020		14/11/2020		**-53.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		13/10/2020		**-53.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/10/2020		20/10/2020		**-47.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/09/2020		1/12/2020		**-53.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/10/2020		14/11/2020		**-47.00**	
10	NO PREVISTOS	30/09/2020		14/11/2020		**-53.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-58.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		16/10/2020		**-57.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	28/09/2020		28/10/2020		**-55.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		22/10/2020		**-57.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	28/10/2020		1/12/2020		**-25.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		12/11/2020		**-57.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/10/2020		23/10/2020		**-48.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		2/10/2020		**-57.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-58.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		9/10/2020		**-57.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	26/09/2020		8/10/2020		**-57.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		8/10/2020		**-57.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		2/10/2020		**-57.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		5/10/2020		**-57.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-57.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		1/12/2020		**-57.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/09/2020		28/10/2020		**-54.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		14/11/2020		**-57.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**102**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**9**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	13	DEL	16 de noviembre de 2020	AL	22 de noviembre de 2020

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7768734177	
4	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7768723140	
5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
16/11/2020	22/11/2020	SEMANA No. 13	23-nov-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

VEINTITRÉS	23	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020 (dd-mm-aaaa)	AL	29 de noviembre de 2020 (dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

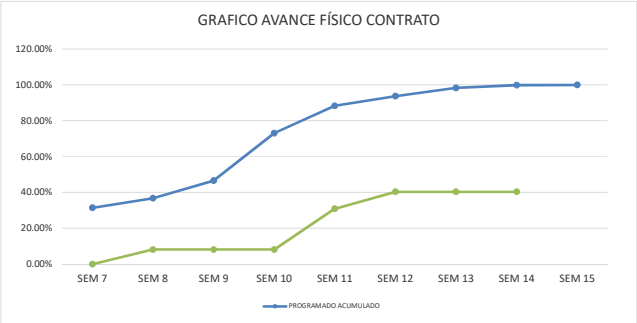

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	31.45%	0.00%	**-31.45%**
SEM 8	36.81%	8.13%	**-28.68%**
SEM 9	46.64%	8.13%	**-38.51%**
SEM 10	73.13%	8.13%	**-65.00%**
SEM 11	88.33%	30.89%	**-57.44%**
SEM 12	93.79%	40.37%	**-53.42%**
SEM 13	98.34%	40.37%	**-57.97%**
SEM 14	99.89%	40.37%	**-59.52%**
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			**-59.52%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

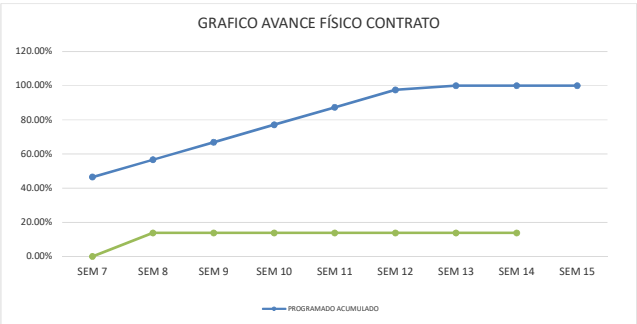

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	46.49%	0.00%	**-46.49%**
SEM 8	56.69%	13.84%	**-42.85%**
SEM 9	66.90%	13.84%	**-53.06%**
SEM 10	77.10%	13.84%	**-63.26%**
SEM 11	87.30%	13.84%	**-73.46%**
SEM 12	97.51%	13.84%	**-83.67%**
SEM 13	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 14	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			**-86.16%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

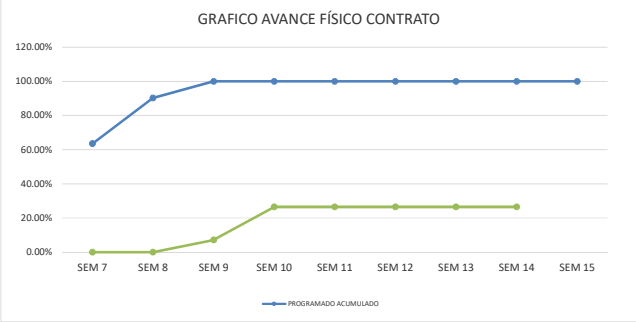

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	63.52%	0.00%	-63.52%
SEM 8	90.25%	0.00%	-90.25%
SEM 9	100.00%	7.18%	-92.82%
SEM 10	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 11	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 12	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 13	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 14	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-73.48%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

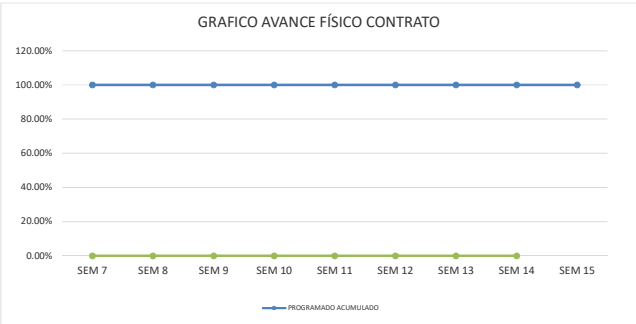

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 8	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 9	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 10	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 11	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 12	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 13	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 14	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

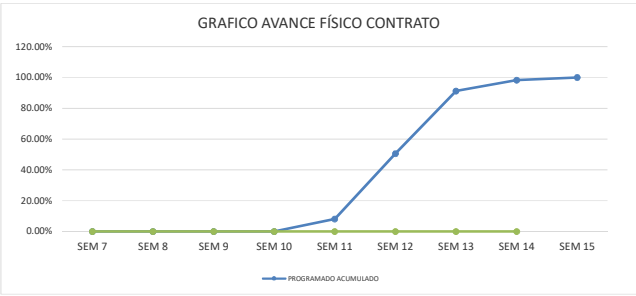

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	8.12%	0.00%	-8.12%
SEM 12	50.52%	0.00%	-50.52%
SEM 13	91.19%	0.00%	-91.19%
SEM 14	98.27%	0.00%	-98.27%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-98.27%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

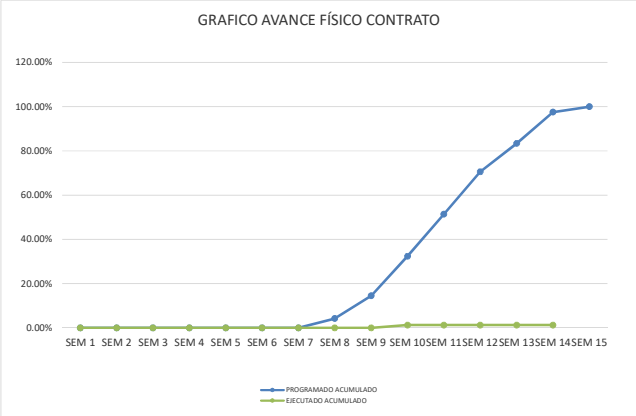

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	4.22%	0.00%	-4.22%
SEM 9	14.52%	0.00%	-14.52%
SEM 10	32.35%	1.25%	-31.10%
SEM 11	51.42%	1.25%	-50.17%
SEM 12	70.58%	1.25%	-69.33%
SEM 13	83.44%	1.25%	-82.19%
SEM 14	97.57%	1.25%	-96.32%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-96.32%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

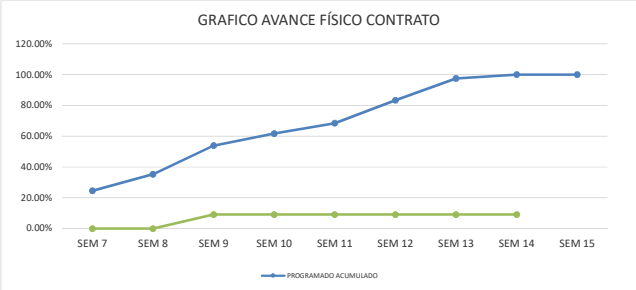


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	24.56%	0.00%	-24.56%
SEM 8	35.28%	0.00%	-35.28%
SEM 9	53.97%	9.13%	-44.84%
SEM 10	61.72%	9.13%	-52.59%
SEM 11	68.50%	9.13%	-59.37%
SEM 12	83.41%	9.13%	-74.28%
SEM 13	97.54%	9.13%	-88.41%
SEM 14	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-90.87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

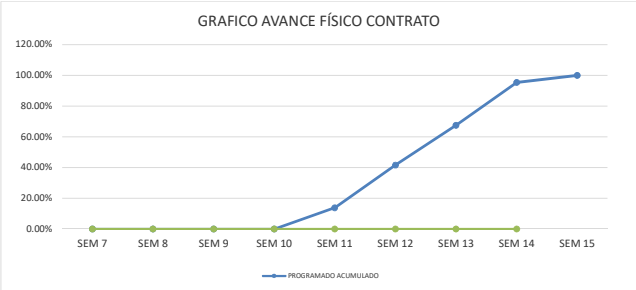


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	13.86%	0.00%	-13.86%
SEM 12	41.65%	0.00%	-41.65%
SEM 13	67.58%	0.00%	-67.58%
SEM 14	95.38%	0.00%	-95.38%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-95.38%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

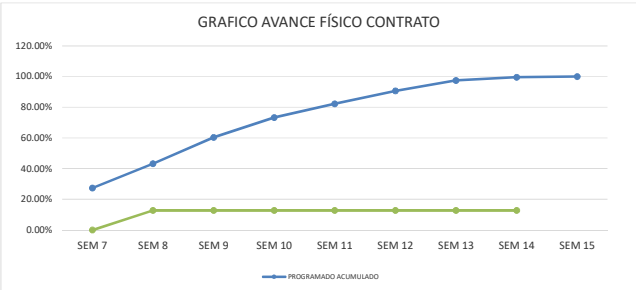

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	27.37%	0.00%	-27.37%
SEM 8	43.24%	12.81%	-30.43%
SEM 9	60.37%	12.81%	-47.56%
SEM 10	73.35%	12.81%	-60.54%
SEM 11	82.18%	12.81%	-69.37%
SEM 12	90.69%	12.81%	-77.88%
SEM 13	97.40%	12.81%	-84.59%
SEM 14	99.57%	12.81%	-86.76%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-86.76%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

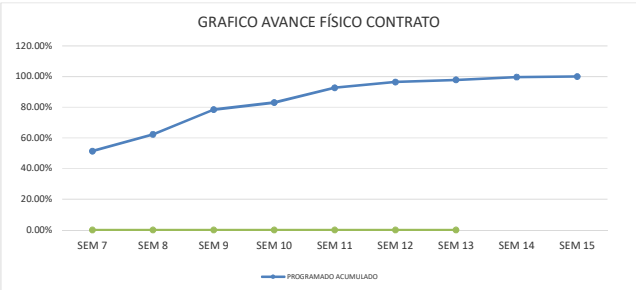


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	51.42%	0.00%	-51.42%
SEM 8	62.28%	0.00%	-62.28%
SEM 9	78.45%	0.00%	-78.45%
SEM 10	83.05%	0.00%	-83.05%
SEM 11	92.63%	0.00%	-92.63%
SEM 12	96.41%	0.00%	-96.41%
SEM 13	97.78%	0.00%	-97.78%
SEM 14	99.67%		
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-97.78%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

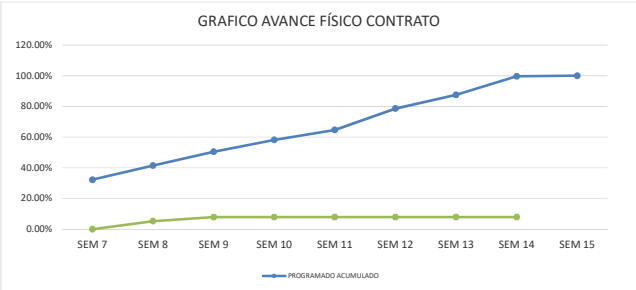


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	32.23%	0.00%	-32.23%
SEM 8	41.50%	5.28%	-36.22%
SEM 9	50.44%	7.94%	-42.50%
SEM 10	58.15%	7.94%	-50.21%
SEM 11	64.66%	7.94%	-56.72%
SEM 12	78.62%	7.94%	-70.68%
SEM 13	87.55%	7.94%	-79.61%
SEM 14	99.65%	7.94%	-91.71%
SEM 15	100.00%		
ALERTAS			-91.71%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

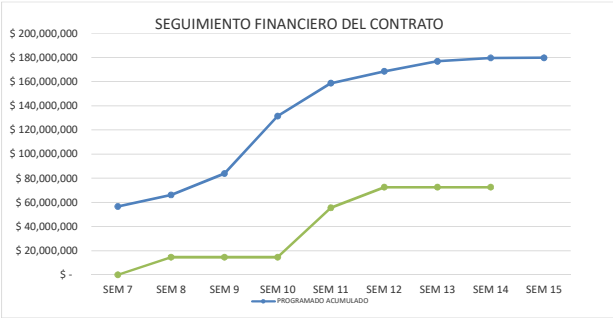

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 56,536,388	$ -	$ -56,536,388.16
SEM 8	$ 66,171,843	$ 14,607,200	$ -51,564,642.93
SEM 9	$ 83,842,834	$ 14,607,200	$ -69,235,634.84
SEM 10	$ 131,462,832	$ 14,607,200	$ -116,855,632.37
SEM 11	$ 158,787,255	$ 55,537,298	$ -103,249,956.96
SEM 12	$ 168,602,475	$ 72,570,665	$ -96,031,810.29
SEM 13	$ 176,781,825	$ 72,570,665	$ -104,211,160.56
SEM 14	$ 179,568,198	$ 72,570,665	$ -106,997,532.64
SEM 15	$ 179,765,940		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

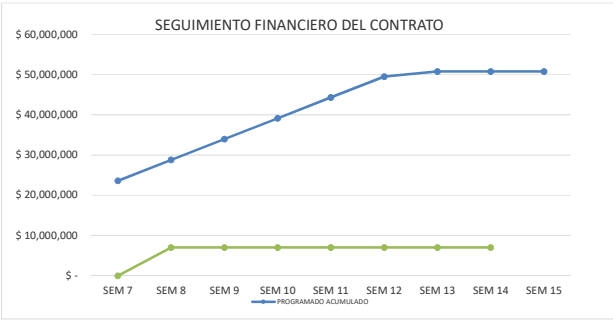

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 23,603,463	$ -	$ -23,603,462.90
SEM 8	$ 28,782,110	$ 7,026,713.84	$ -21,755,396.54
SEM 9	$ 33,965,835	$ 7,026,713.84	$ -26,939,121.13
SEM 10	$ 39,144,482	$ 7,026,713.84	$ -32,117,768.62
SEM 11	$ 44,323,130	$ 7,026,713.84	$ -37,296,416.10
SEM 12	$ 49,506,855	$ 7,026,713.84	$ -42,480,140.69
SEM 13	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 14	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 15	$ 50,771,054		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

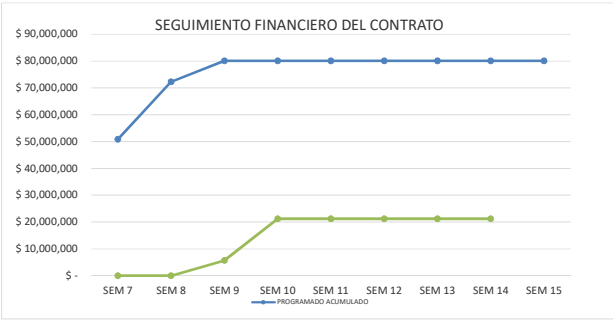

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 50,864,762	$ -	$ -50,864,762.05
SEM 8	$ 72,269,282	$ -	$ -72,269,281.72
SEM 9	$ 80,076,766	$ 5,749,511.83	$ -74,327,254.61
SEM 10	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 11	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 12	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 13	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 14	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 15	$ 80,076,766		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

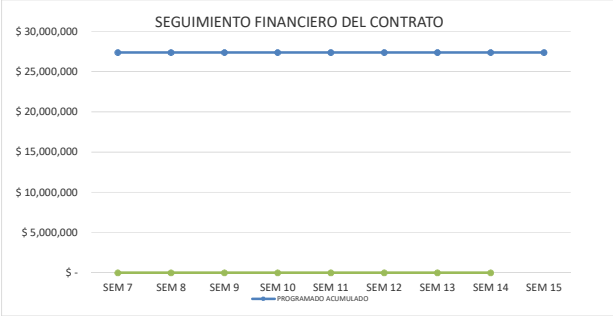


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 8	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 9	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 10	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 11	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 12	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 13	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 14	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 15	$ 27,364,346		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

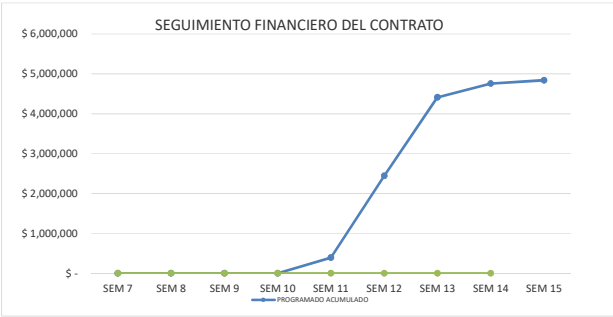


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 393,036	$ -	$ -393,036.19
SEM 12	$ 2,445,343	$ -	$ -2,445,343.37
SEM 13	$ 4,413,913	$ -	$ -4,413,912.54
SEM 14	$ 4,756,609	$ -	$ -4,756,609.12
SEM 15	$ 4,840,347		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

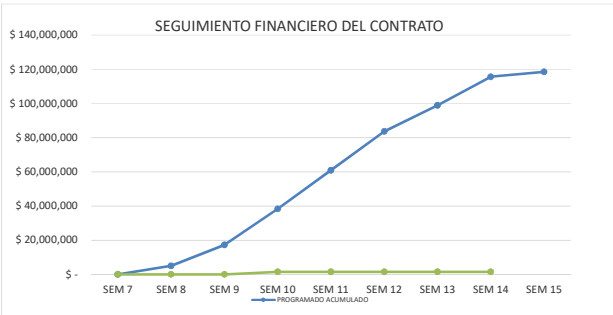

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ 5,001,677	$ -	$ -5,001,676.93
SEM 9	$ 17,209,561	$ -	$ -17,209,561.39
SEM 10	$ 38,342,239	$ 1,481,539.38	$ -36,860,699.68
SEM 11	$ 60,944,604	$ 1,481,539.38	$ -59,463,064.41
SEM 12	$ 83,653,639	$ 1,481,539.38	$ -82,172,099.97
SEM 13	$ 98,895,716	$ 1,481,539.38	$ -97,414,177.07
SEM 14	$ 115,643,038	$ 1,481,539.38	$ -114,161,498.18
SEM 15	$ 118,523,150		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

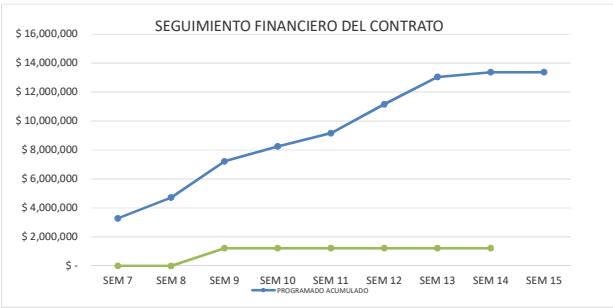


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 3,284,742	$ -	$ -3,284,741.82
SEM 8	$ 4,718,473	$ -	$ -4,718,472.77
SEM 9	$ 7,218,140	$ 1,221,078.70	$ -5,997,061.20
SEM 10	$ 8,254,652	$ 1,221,078.70	$ -7,033,573.78
SEM 11	$ 9,161,434	$ 1,221,078.70	$ -7,940,355.12
SEM 12	$ 11,155,550	$ 1,221,078.70	$ -9,934,471.58
SEM 13	$ 13,045,347	$ 1,221,078.70	$ -11,824,268.08
SEM 14	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 15	$ 13,374,356		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

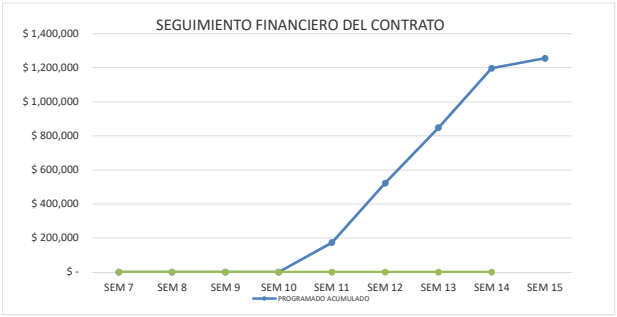

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 174,097	$ -	$ -174,097.00
SEM 12	$ 523,170	$ -	$ -523,170.27
SEM 13	$ 848,880	$ -	$ -848,879.87
SEM 14	$ 1,198,079	$ -	$ -1,198,078.76
SEM 15	$ 1,256,111		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

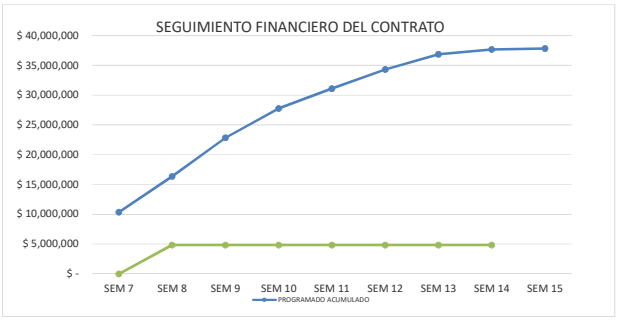

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 10,358,414	$ -	$ -10,358,414.23
SEM 8	$ 16,364,554	$ 4,848,055.77	$ -11,516,497.81
SEM 9	$ 22,847,551	$ 4,848,055.77	$ -17,999,495.10
SEM 10	$ 27,759,945	$ 4,848,055.77	$ -22,911,888.84
SEM 11	$ 31,101,735	$ 4,848,055.77	$ -26,253,679.03
SEM 12	$ 34,322,418	$ 4,848,055.77	$ -29,474,362.45
SEM 13	$ 36,861,876	$ 4,848,055.77	$ -32,013,820.23
SEM 14	$ 37,683,131	$ 4,848,055.77	$ -32,835,075.58
SEM 15	$ 37,845,869		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

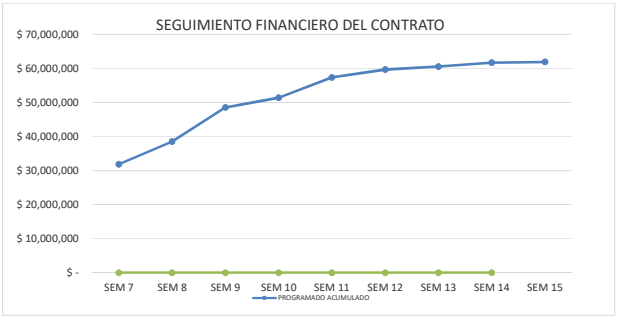

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 31,837,893	$ -	$ -31,837,892.71
SEM 8	$ 38,562,115	$ -	$ -38,562,115.09
SEM 9	$ 48,574,148	$ -	$ -48,574,147.86
SEM 10	$ 51,422,345	$ -	$ -51,422,345.18
SEM 11	$ 57,354,026	$ -	$ -57,354,025.70
SEM 12	$ 59,694,501	$ -	$ -59,694,500.89
SEM 13	$ 60,542,768	$ -	$ -60,542,768.36
SEM 14	$ 61,713,006	$ -	$ -61,713,005.95
SEM 15	$ 61,917,333		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

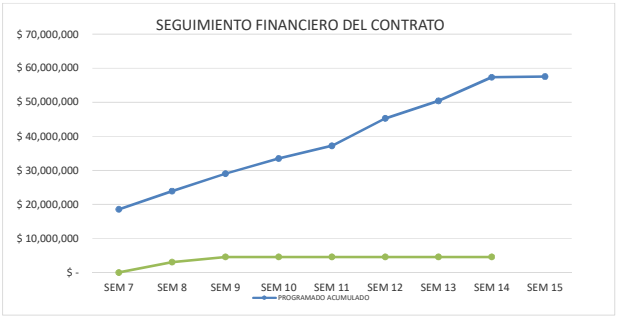

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 18,558,638	$ -	$ -18,558,638.15
SEM 8	$ 23,896,478	$ 3,040,322.97	$ -20,856,154.95
SEM 9	$ 29,044,298	$ 4,572,000.84	$ -24,472,296.67
SEM 10	$ 33,483,860	$ 4,572,000.84	$ -28,911,859.19
SEM 11	$ 37,232,440	$ 4,572,000.84	$ -32,660,439.22
SEM 12	$ 45,270,870	$ 4,572,000.84	$ -40,698,868.90
SEM 13	$ 50,412,931	$ 4,572,000.84	$ -45,840,930.29
SEM 14	$ 57,380,338	$ 4,572,000.84	$ -52,808,337.11
SEM 15	$ 57,581,875		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020	6/10/2020	18/09/2020		**-18.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/09/2020	3/11/2020	1/12/2020		**-45.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		30/11/2020		**-71.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020	3/11/2020	7/10/2020	13/11/2020	**-45.00**	**-37.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		29/09/2020		**-71.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/09/2020		6/10/2020		**-69.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020	6/10/2020	25/11/2020		**-15.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-72.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/09/2020		18/11/2020		**-68.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		26/09/2020		**-71.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-71.00**	
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		25/11/2020		**-71.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-72.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		21/10/2020		**-71.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		7/10/2020		**-71.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-71.00**	
10	NO PREVISTOS	21/10/2020		25/11/2020		**-39.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-72.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		**-71.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**-71.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**-69.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-26.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	17/11/2020		17/11/2020		**-12.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-25.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		19/11/2020		**-25.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	10/11/2020		30/11/2020		**-19.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		1/12/2020		**-25.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/10/2020		13/10/2020		**-47.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		**-46.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		1/12/2020		**-46.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/10/2020		30/10/2020		**-34.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/10/2020		1/12/2020		**-46.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/10/2020		1/12/2020		**-46.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020		**-29.00**	
10	NO PREVISTOS	14/10/2020		1/12/2020		**-46.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-65.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		25/11/2020		**-64.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	8/10/2020		24/10/2020		**-52.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-64.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		28/10/2020		**-64.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/10/2020		9/10/2020		**-55.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		11/11/2020		**-64.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-26.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	12/11/2020		19/11/2020		**-17.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-25.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		24/11/2020		**-25.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020		29/09/2020		**-61.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		21/11/2020		**-60.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/09/2020		14/11/2020		**-60.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		13/10/2020		**-60.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/10/2020		20/10/2020		**-54.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/09/2020		1/12/2020		**-60.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/10/2020		14/11/2020		**-54.00**	
10	NO PREVISTOS	30/09/2020		14/11/2020		**-60.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-65.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		16/10/2020		**-64.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	28/09/2020		28/10/2020		**-62.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		22/10/2020		**-64.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	28/10/2020		1/12/2020		**-32.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		12/11/2020		**-64.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/10/2020		23/10/2020		**-55.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		2/10/2020		**-64.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-65.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		9/10/2020		**-64.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	26/09/2020		8/10/2020		**-64.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		8/10/2020		**-64.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		2/10/2020		**-64.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		5/10/2020		**-64.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-64.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		1/12/2020		**-64.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/09/2020		28/10/2020		**-61.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		14/11/2020		**-64.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**102**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**2**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY CASTRO AGUIRRE		
2	RESIDENTE ELÉCTRICO			
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO			
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
5	RESIDENTE SISO DE OBRA			

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7768734177	
4	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7768723140	
5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
23/11/2020	29/11/2020	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

TREINTA	30	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

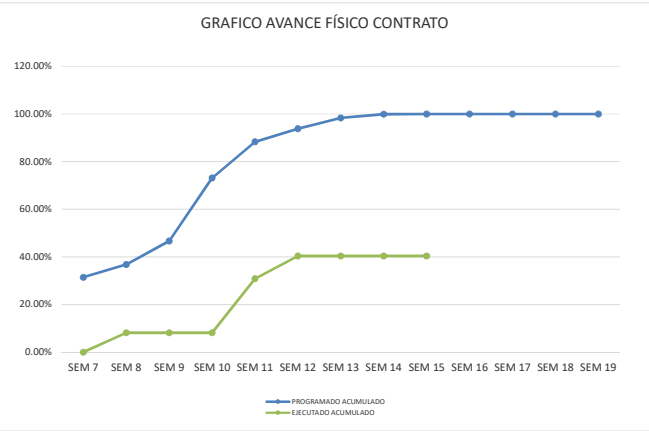

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	31.45%	0.00%	-31.45%
SEM 8	36.81%	8.13%	-28.68%
SEM 9	46.64%	8.13%	-38.51%
SEM 10	73.13%	8.13%	-65.00%
SEM 11	88.33%	30.89%	-57.44%
SEM 12	93.79%	40.37%	-53.42%
SEM 13	98.34%	40.37%	-57.97%
SEM 14	99.89%	40.37%	-59.52%
SEM 15	100.00%	40.37%	-59.63%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-59.63%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

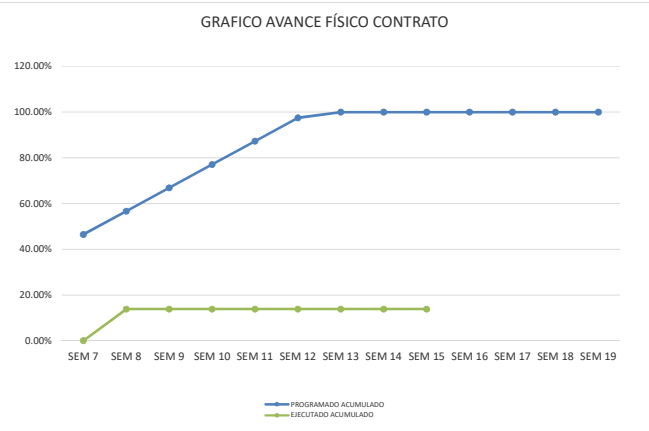

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	46.49%	0.00%	-46.49%
SEM 8	56.69%	13.84%	-42.85%
SEM 9	66.90%	13.84%	-53.06%
SEM 10	77.10%	13.84%	-63.26%
SEM 11	87.30%	13.84%	-73.46%
SEM 12	97.51%	13.84%	-83.67%
SEM 13	100.00%	13.84%	-86.16%
SEM 14	100.00%	13.84%	-86.16%
SEM 15	100.00%	13.84%	-86.16%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-86.16%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

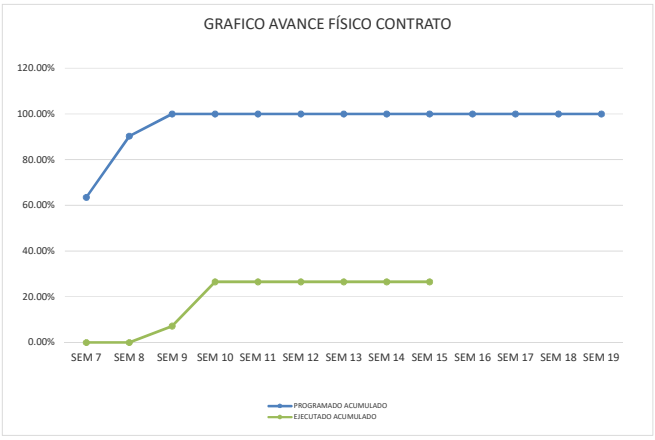


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	63.52%	0.00%	-63.52%
SEM 8	90.25%	0.00%	-90.25%
SEM 9	100.00%	7.18%	-92.82%
SEM 10	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 11	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 12	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 13	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 14	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 15	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

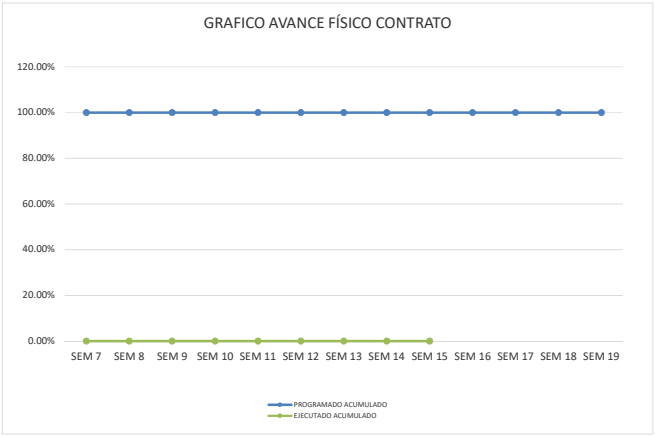

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 8	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 9	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 10	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 11	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 12	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 13	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 14	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

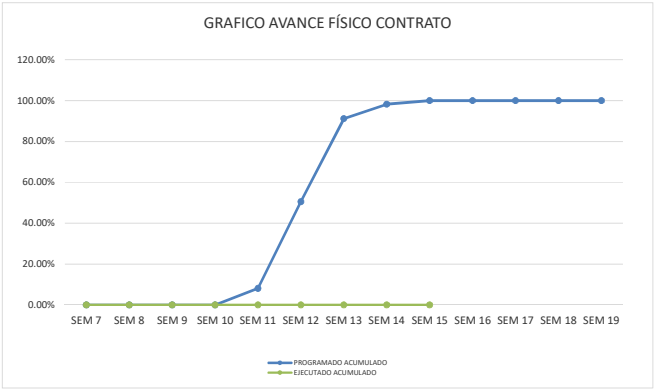


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	8.12%	0.00%	-8.12%
SEM 12	50.52%	0.00%	-50.52%
SEM 13	91.19%	0.00%	-91.19%
SEM 14	98.27%	0.00%	-98.27%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

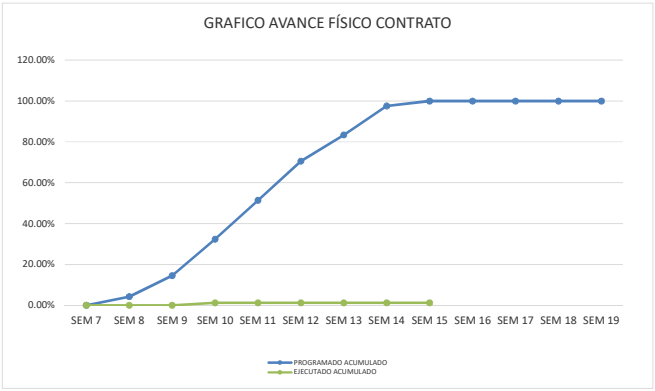

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	4.22%	0.00%	-4.22%
SEM 9	14.52%	0.00%	-14.52%
SEM 10	32.35%	1.25%	-31.10%
SEM 11	51.42%	1.25%	-50.17%
SEM 12	70.58%	1.25%	-69.33%
SEM 13	83.44%	1.25%	-82.19%
SEM 14	97.57%	1.25%	-96.32%
SEM 15	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-98.75%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

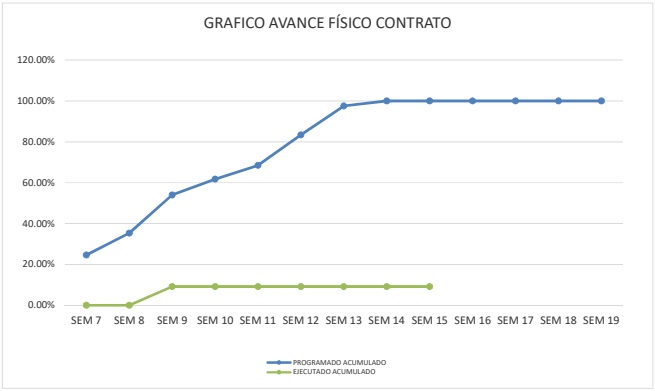

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	24.56%	0.00%	-24.56%
SEM 8	35.28%	0.00%	-35.28%
SEM 9	53.97%	9.13%	-44.84%
SEM 10	61.72%	9.13%	-52.59%
SEM 11	68.50%	9.13%	-59.37%
SEM 12	83.41%	9.13%	-74.28%
SEM 13	97.54%	9.13%	-88.41%
SEM 14	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 15	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-90.87%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

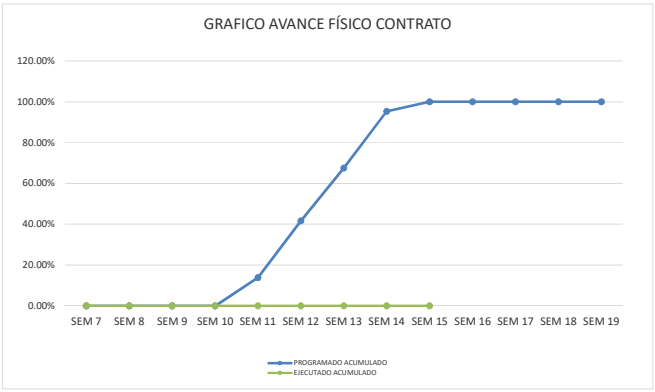

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	13.86%	0.00%	-13.86%
SEM 12	41.65%	0.00%	-41.65%
SEM 13	67.58%	0.00%	-67.58%
SEM 14	95.38%	0.00%	-95.38%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

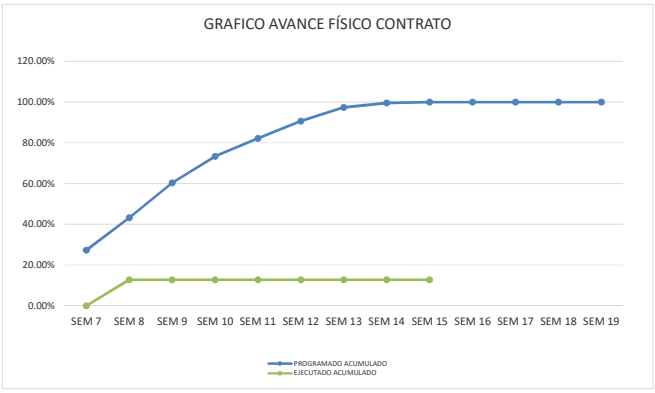

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	27.37%	0.00%	-27.37%
SEM 8	43.24%	12.81%	-30.43%
SEM 9	60.37%	12.81%	-47.56%
SEM 10	73.35%	12.81%	-60.54%
SEM 11	82.18%	12.81%	-69.37%
SEM 12	90.69%	12.81%	-77.88%
SEM 13	97.40%	12.81%	-84.59%
SEM 14	99.57%	12.81%	-86.76%
SEM 15	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-87.19%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

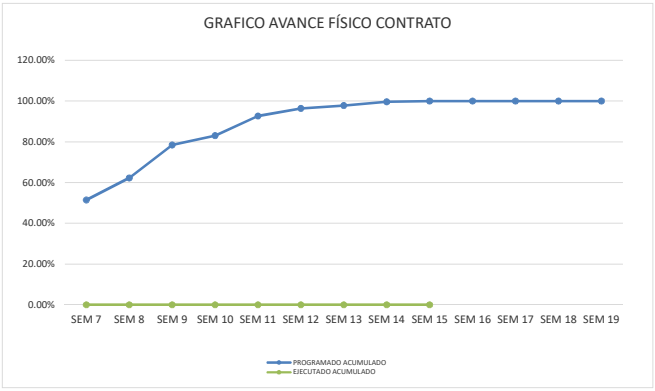

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	51.42%	0.00%	-51.42%
SEM 8	62.28%	0.00%	-62.28%
SEM 9	78.45%	0.00%	-78.45%
SEM 10	83.05%	0.00%	-83.05%
SEM 11	92.63%	0.00%	-92.63%
SEM 12	96.41%	0.00%	-96.41%
SEM 13	97.78%	0.00%	-97.78%
SEM 14	99.67%	0.00%	-99.67%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

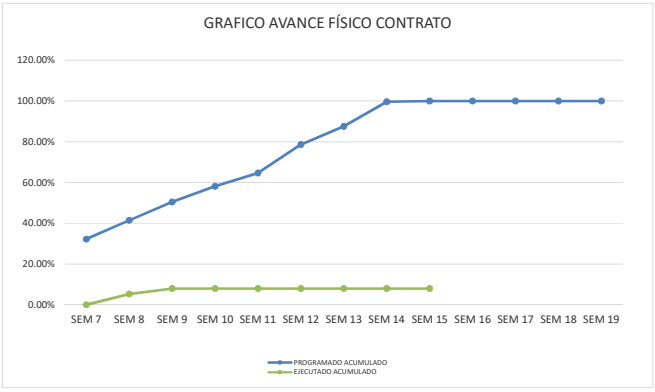

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	32.23%	0.00%	-32.23%
SEM 8	41.50%	5.28%	-36.22%
SEM 9	50.44%	7.94%	-42.50%
SEM 10	58.15%	7.94%	-50.21%
SEM 11	64.66%	7.94%	-56.72%
SEM 12	78.62%	7.94%	-70.68%
SEM 13	87.55%	7.94%	-79.61%
SEM 14	99.65%	7.94%	-91.71%
SEM 15	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 16	100.00%		
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-92.06%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

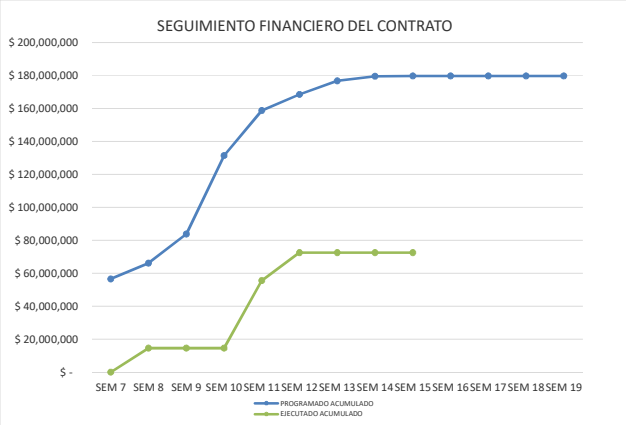

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 56,536,388	$ -	$ -56,536,388.16
SEM 8	$ 66,171,843	$ 14,607,200	$ -51,564,642.93
SEM 9	$ 83,842,834	$ 14,607,200	$ -69,235,634.84
SEM 10	$ 131,462,832	$ 14,607,200	$ -116,855,632.37
SEM 11	$ 158,787,255	$ 55,537,298	$ -103,249,956.96
SEM 12	$ 168,602,475	$ 72,570,665	$ -96,031,810.29
SEM 13	$ 176,781,825	$ 72,570,665	$ -104,211,160.56
SEM 14	$ 179,568,198	$ 72,570,665	$ -106,997,532.64
SEM 15	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 16	$ 179,765,940		
SEM 17	$ 179,765,940		
SEM 18	$ 179,765,940		
SEM 19	$ 179,765,940		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

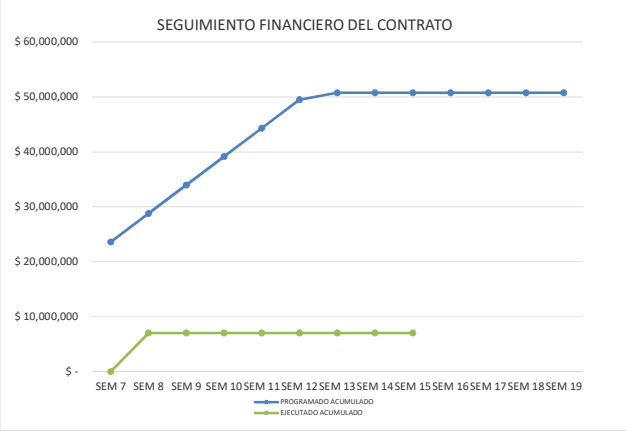

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 23,603,463	$ -	$ -23,603,462.90
SEM 8	$ 28,782,110	$ 7,026,713.84	$ -21,755,396.54
SEM 9	$ 33,965,835	$ 7,026,713.84	$ -26,939,121.13
SEM 10	$ 39,144,482	$ 7,026,713.84	$ -32,117,768.62
SEM 11	$ 44,323,130	$ 7,026,713.84	$ -37,296,416.10
SEM 12	$ 49,506,855	$ 7,026,713.84	$ -42,480,140.69
SEM 13	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 14	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 15	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 16	$ 50,771,054		
SEM 17	$ 50,771,054		
SEM 18	$ 50,771,054		
SEM 19	$ 50,771,054		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

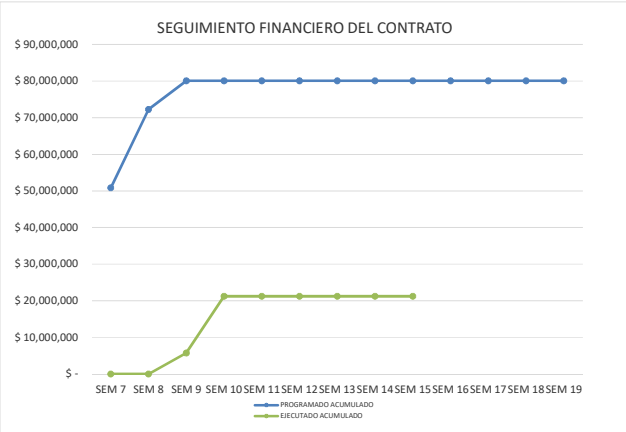

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 50,864,762	$ -	$ -50,864,762.05
SEM 8	$ 72,269,282	$ -	$ -72,269,281.72
SEM 9	$ 80,076,766	$ 5,749,511.83	$ -74,327,254.61
SEM 10	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 11	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 12	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 13	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 14	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 15	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 16	$ 80,076,766		
SEM 17	$ 80,076,766		
SEM 18	$ 80,076,766		
SEM 19	$ 80,076,766		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

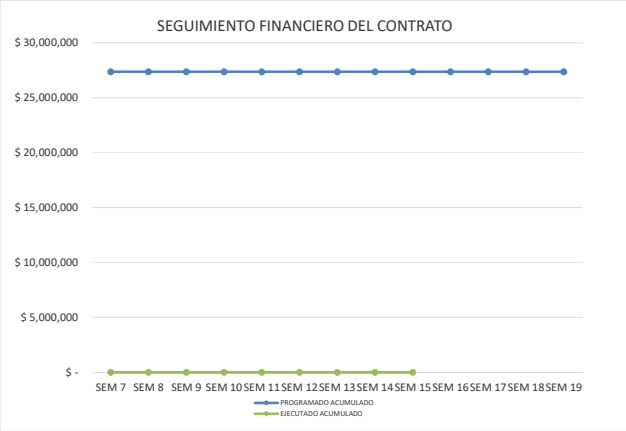


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 8	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 9	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 10	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 11	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 12	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 13	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 14	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 15	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 16	$ 27,364,346		
SEM 17	$ 27,364,346		
SEM 18	$ 27,364,346		
SEM 19	$ 27,364,346		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

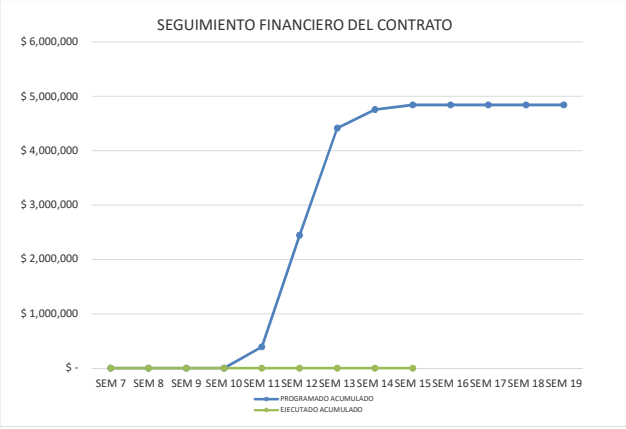

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 393,036	$ -	$ -393,036.19
SEM 12	$ 2,445,343	$ -	$ -2,445,343.37
SEM 13	$ 4,413,913	$ -	$ -4,413,912.54
SEM 14	$ 4,756,609	$ -	$ -4,756,609.12
SEM 15	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 16	$ 4,840,347		
SEM 17	$ 4,840,347		
SEM 18	$ 4,840,347		
SEM 19	$ 4,840,347		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

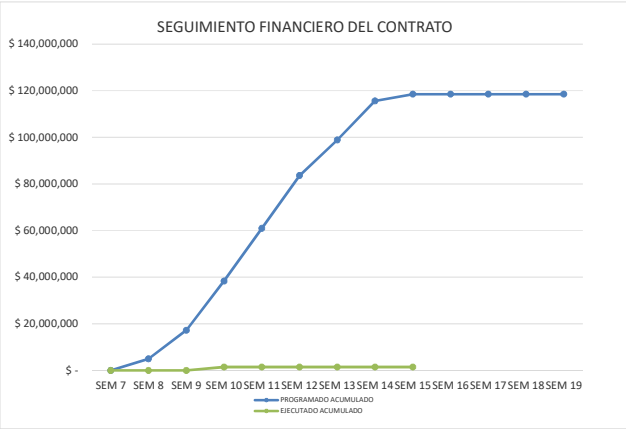


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ 5,001,677	$ -	$ -5,001,676.93
SEM 9	$ 17,209,561	$ -	$ -17,209,561.39
SEM 10	$ 38,342,239	$ 1,481,539.38	$ -36,860,699.68
SEM 11	$ 60,944,604	$ 1,481,539.38	$ -59,463,064.41
SEM 12	$ 83,653,639	$ 1,481,539.38	$ -82,172,099.97
SEM 13	$ 98,895,716	$ 1,481,539.38	$ -97,414,177.07
SEM 14	$ 115,643,038	$ 1,481,539.38	$ -114,161,498.18
SEM 15	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 16	$ 118,523,150		
SEM 17	$ 118,523,150		
SEM 18	$ 118,523,150		
SEM 19	$ 118,523,150		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

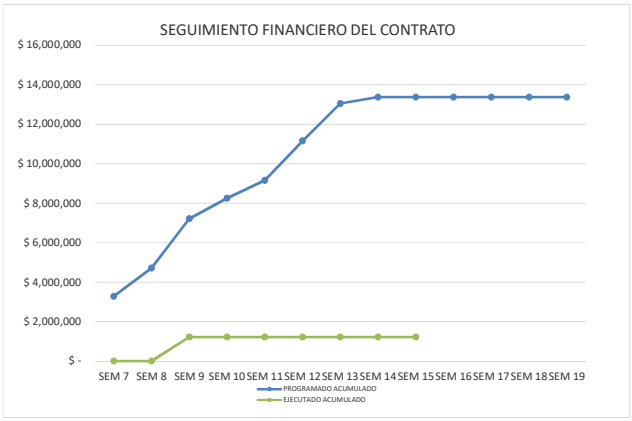


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 3,284,742	$ -	$ -3,284,741.82
SEM 8	$ 4,718,473	$ -	$ -4,718,472.77
SEM 9	$ 7,218,140	$ 1,221,078.70	$ -5,997,061.20
SEM 10	$ 8,254,652	$ 1,221,078.70	$ -7,033,573.78
SEM 11	$ 9,161,434	$ 1,221,078.70	$ -7,940,355.12
SEM 12	$ 11,155,550	$ 1,221,078.70	$ -9,934,471.58
SEM 13	$ 13,045,347	$ 1,221,078.70	$ -11,824,268.08
SEM 14	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 15	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 16	$ 13,374,356		
SEM 17	$ 13,374,356		
SEM 18	$ 13,374,356		
SEM 19	$ 13,374,356		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

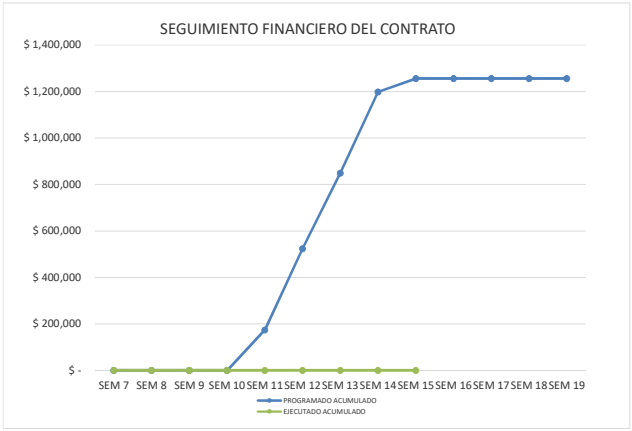

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ -	$ -	$ -
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 174,097	$ -	$ -174,097.00
SEM 12	$ 523,170	$ -	$ -523,170.27
SEM 13	$ 848,880	$ -	$ -848,879.87
SEM 14	$ 1,198,079	$ -	$ -1,198,078.76
SEM 15	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 16	$ 1,256,111		
SEM 17	$ 1,256,111		
SEM 18	$ 1,256,111		
SEM 19	$ 1,256,111		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

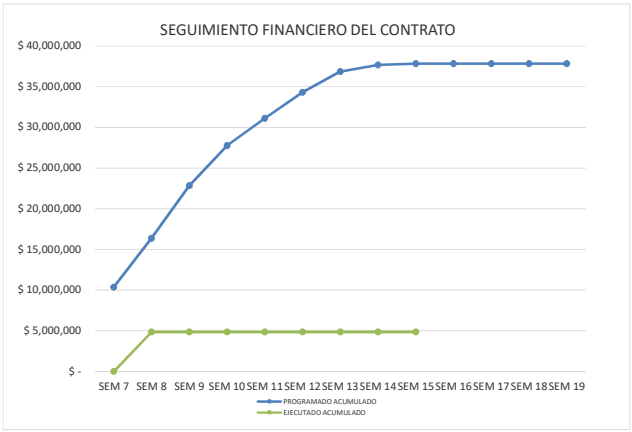


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 10,358,414	$ -	$ -10,358,414.23
SEM 8	$ 16,364,554	$ 4,848,055.77	$ -11,516,497.81
SEM 9	$ 22,847,551	$ 4,848,055.77	$ -17,999,495.10
SEM 10	$ 27,759,945	$ 4,848,055.77	$ -22,911,888.84
SEM 11	$ 31,101,735	$ 4,848,055.77	$ -26,253,679.03
SEM 12	$ 34,322,418	$ 4,848,055.77	$ -29,474,362.45
SEM 13	$ 36,861,876	$ 4,848,055.77	$ -32,013,820.23
SEM 14	$ 37,683,131	$ 4,848,055.77	$ -32,835,075.58
SEM 15	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 16	$ 37,845,869		
SEM 17	$ 37,845,869		
SEM 18	$ 37,845,869		
SEM 19	$ 37,845,869		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

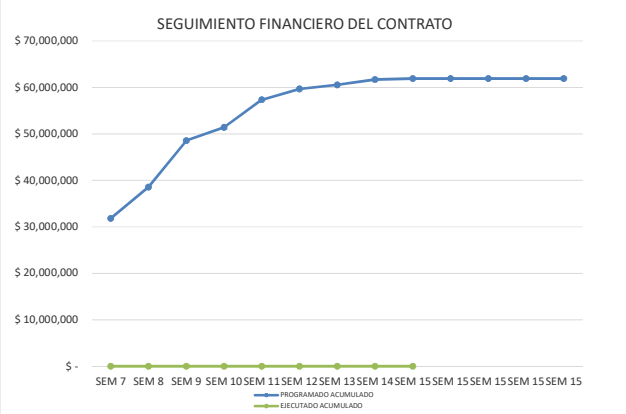

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 31,837,893	$ -	$ -31,837,892.71
SEM 8	$ 38,562,115	$ -	$ -38,562,115.09
SEM 9	$ 48,574,148	$ -	$ -48,574,147.86
SEM 10	$ 51,422,345	$ -	$ -51,422,345.18
SEM 11	$ 57,354,026	$ -	$ -57,354,025.70
SEM 12	$ 59,694,501	$ -	$ -59,694,500.89
SEM 13	$ 60,542,768	$ -	$ -60,542,768.36
SEM 14	$ 61,713,006	$ -	$ -61,713,005.95
SEM 15	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 15	$ 61,917,333		
SEM 15	$ 61,917,333		
SEM 15	$ 61,917,333		
SEM 15	$ 61,917,333		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

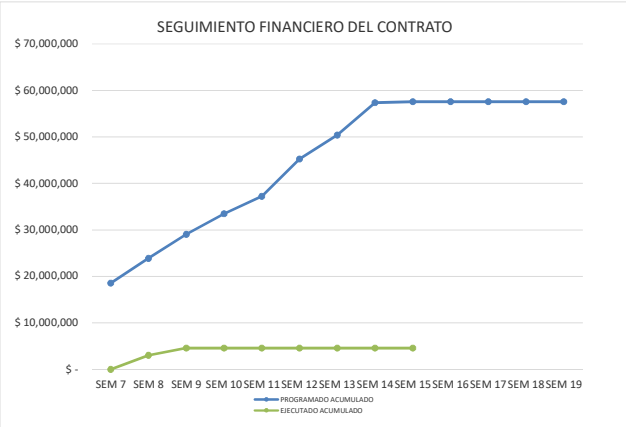

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 18,558,638	$ -	$ -18,558,638.15
SEM 8	$ 23,896,478	$ 3,040,322.97	$ -20,856,154.95
SEM 9	$ 29,044,298	$ 4,572,000.84	$ -24,472,296.67
SEM 10	$ 33,483,860	$ 4,572,000.84	$ -28,911,859.19
SEM 11	$ 37,232,440	$ 4,572,000.84	$ -32,660,439.22
SEM 12	$ 45,270,870	$ 4,572,000.84	$ -40,698,868.90
SEM 13	$ 50,412,931	$ 4,572,000.84	$ -45,840,930.29
SEM 14	$ 57,380,338	$ 4,572,000.84	$ -52,808,337.11
SEM 15	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 16	$ 57,581,875		
SEM 17	$ 57,581,875		
SEM 18	$ 57,581,875		
SEM 19	$ 57,581,875		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020	6/10/2020	18/09/2020		**-18.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/09/2020	3/11/2020	1/12/2020		**-45.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		30/11/2020		**-78.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020	3/11/2020	7/10/2020	13/11/2020	**-45.00**	**-37.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		29/09/2020		**-78.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/09/2020		6/10/2020		**-76.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020	6/10/2020	25/11/2020		**-15.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-79.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/09/2020		18/11/2020		**-75.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		26/09/2020		**-78.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-78.00**	
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		25/11/2020		**-78.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-79.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		21/10/2020		**-78.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		7/10/2020		**-78.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-78.00**	
10	NO PREVISTOS	21/10/2020		25/11/2020		**-46.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-79.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		**-78.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**-78.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**-76.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-33.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	17/11/2020		17/11/2020		**-19.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-32.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		19/11/2020		**-32.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	10/11/2020		30/11/2020		**-26.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		1/12/2020		**-32.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/10/2020		13/10/2020		**-54.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		**-53.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		1/12/2020		**-53.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/10/2020		30/10/2020		**-41.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/10/2020		1/12/2020		**-53.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/10/2020		1/12/2020		**-53.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020		**-36.00**	
10	NO PREVISTOS	14/10/2020		1/12/2020		**-53.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-72.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		25/11/2020		**-71.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	8/10/2020		24/10/2020		**-59.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-71.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		28/10/2020		**-71.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/10/2020		9/10/2020		**-62.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		11/11/2020		**-71.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-33.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	12/11/2020		19/11/2020		**-24.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-32.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		24/11/2020		**-32.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020		29/09/2020		**-68.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		21/11/2020		**-67.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/09/2020		14/11/2020		**-67.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		13/10/2020		**-67.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/10/2020		20/10/2020		**-61.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/09/2020		1/12/2020		**-67.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/10/2020		14/11/2020		**-61.00**	
10	NO PREVISTOS	30/09/2020		14/11/2020		**-67.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-72.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		16/10/2020		**-71.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	28/09/2020		28/10/2020		**-69.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		22/10/2020		**-71.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	28/10/2020		1/12/2020		**-39.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		12/11/2020		**-71.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/10/2020		23/10/2020		**-62.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		2/10/2020		**-71.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-72.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		9/10/2020		**-71.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	26/09/2020		8/10/2020		**-71.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		8/10/2020		**-71.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		2/10/2020		**-71.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		5/10/2020		**-71.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-71.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		1/12/2020		**-71.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/09/2020		28/10/2020		**-68.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		14/11/2020		**-71.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY CASTRO AGUIRRE		
2	RESIDENTE ELÉCTRICO			
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO			
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
5	RESIDENTE SISO DE OBRA			

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7771863931	
4	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7771858782	
5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
30/11/2020	6/12/2020	SEMANA No. 15	7-dic-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

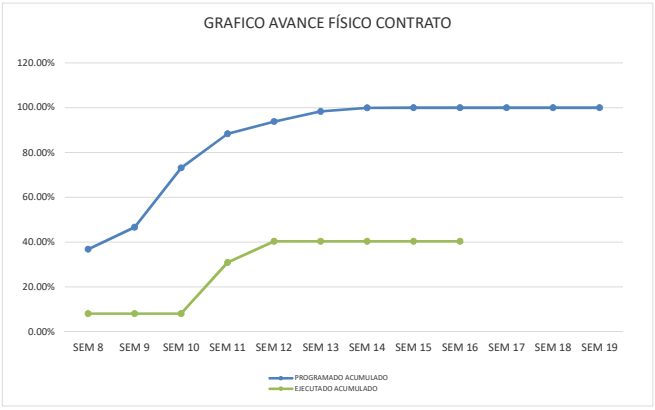

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	36.81%	8.13%	**-28.68%**
SEM 9	46.64%	8.13%	**-38.51%**
SEM 10	73.13%	8.13%	**-65.00%**
SEM 11	88.33%	30.89%	**-57.44%**
SEM 12	93.79%	40.37%	**-53.42%**
SEM 13	98.34%	40.37%	**-57.97%**
SEM 14	99.89%	40.37%	**-59.52%**
SEM 15	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 16	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
	ALERTAS		**-59.63%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

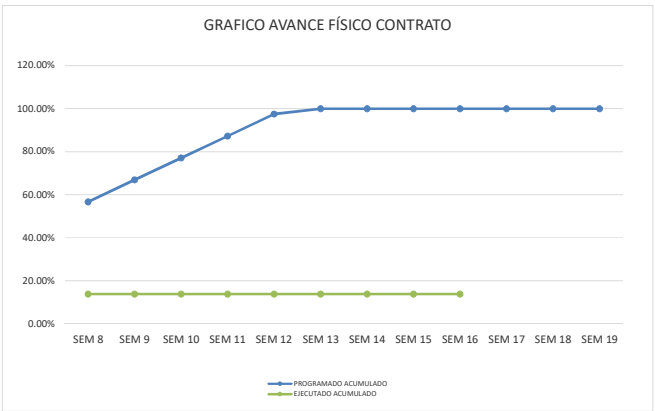

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	56.69%	13.84%	**-42.85%**
SEM 9	66.90%	13.84%	**-53.06%**
SEM 10	77.10%	13.84%	**-63.26%**
SEM 11	87.30%	13.84%	**-73.46%**
SEM 12	97.51%	13.84%	**-83.67%**
SEM 13	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 14	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 15	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 16	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
	ALERTAS		**-86.16%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

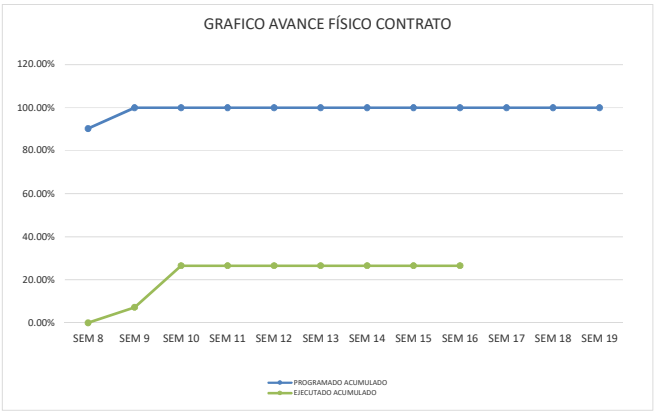


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	90.25%	0.00%	-90.25%
SEM 9	100.00%	7.18%	-92.82%
SEM 10	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 11	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 12	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 13	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 14	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 15	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 16	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

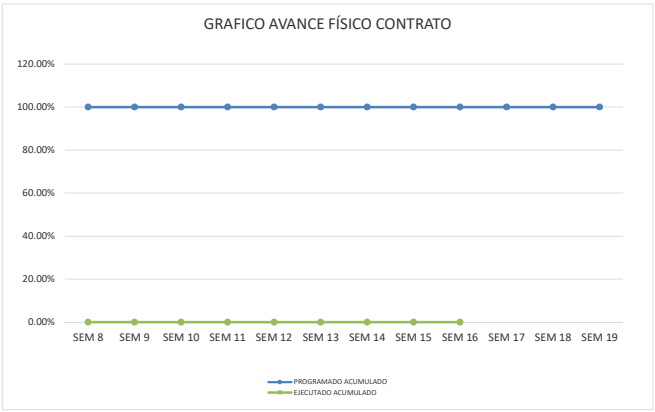

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 9	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 10	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 11	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 12	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 13	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 14	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

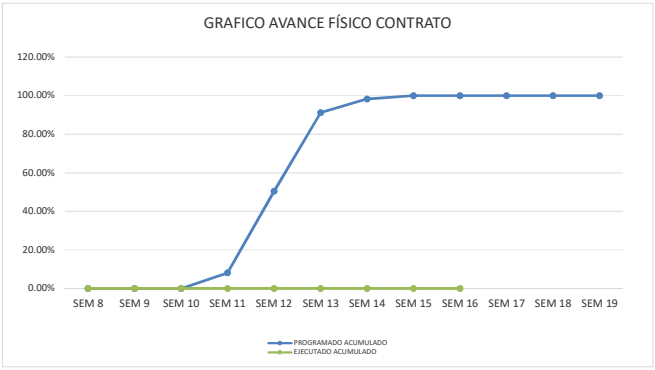


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	8.12%	0.00%	-8.12%
SEM 12	50.52%	0.00%	-50.52%
SEM 13	91.19%	0.00%	-91.19%
SEM 14	98.27%	0.00%	-98.27%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

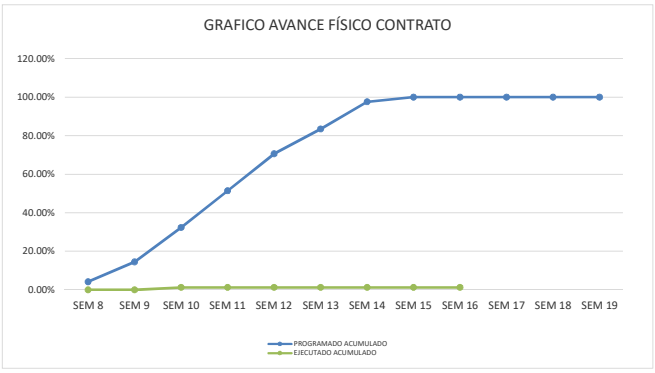

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	4.22%	0.00%	-4.22%
SEM 9	14.52%	0.00%	-14.52%
SEM 10	32.35%	1.25%	-31.10%
SEM 11	51.42%	1.25%	-50.17%
SEM 12	70.58%	1.25%	-69.33%
SEM 13	83.44%	1.25%	-82.19%
SEM 14	97.57%	1.25%	-96.32%
SEM 15	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 16	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-98.75%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

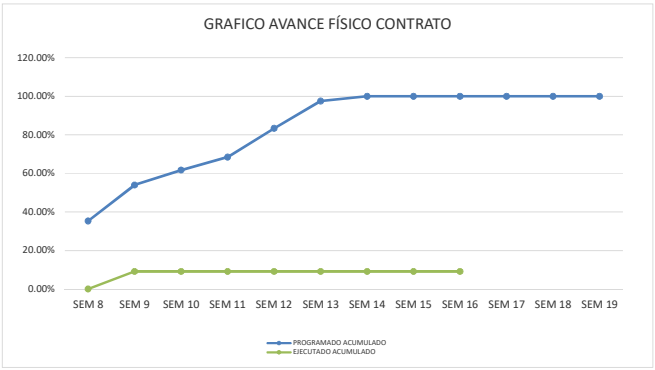

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	35.28%	0.00%	-35.28%
SEM 9	53.97%	9.13%	-44.84%
SEM 10	61.72%	9.13%	-52.59%
SEM 11	68.50%	9.13%	-59.37%
SEM 12	83.41%	9.13%	-74.28%
SEM 13	97.54%	9.13%	-88.41%
SEM 14	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 15	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 16	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-90.87%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

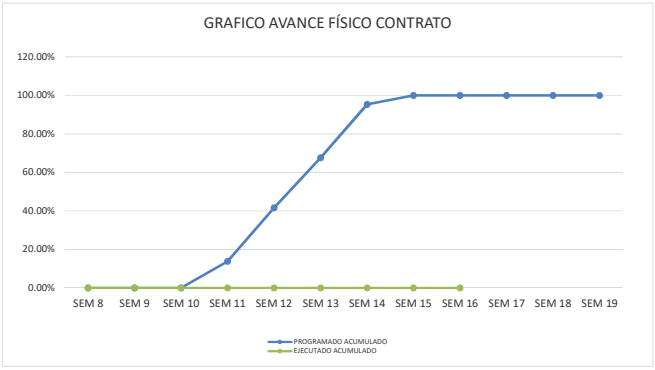

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 9	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 10	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 11	13.86%	0.00%	-13.86%
SEM 12	41.65%	0.00%	-41.65%
SEM 13	67.58%	0.00%	-67.58%
SEM 14	95.38%	0.00%	-95.38%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

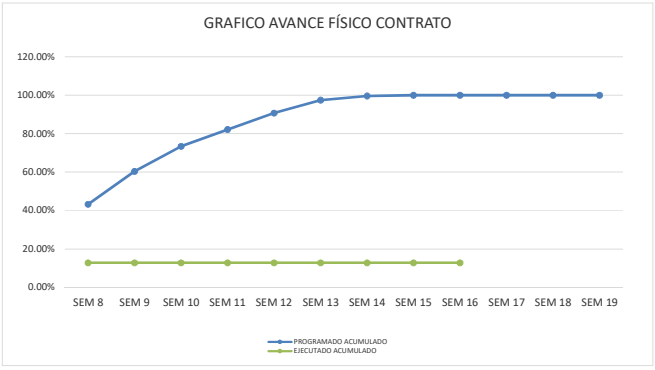

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	43.24%	12.81%	-30.43%
SEM 9	60.37%	12.81%	-47.56%
SEM 10	73.35%	12.81%	-60.54%
SEM 11	82.18%	12.81%	-69.37%
SEM 12	90.69%	12.81%	-77.88%
SEM 13	97.40%	12.81%	-84.59%
SEM 14	99.57%	12.81%	-86.76%
SEM 15	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 16	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-87.19%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

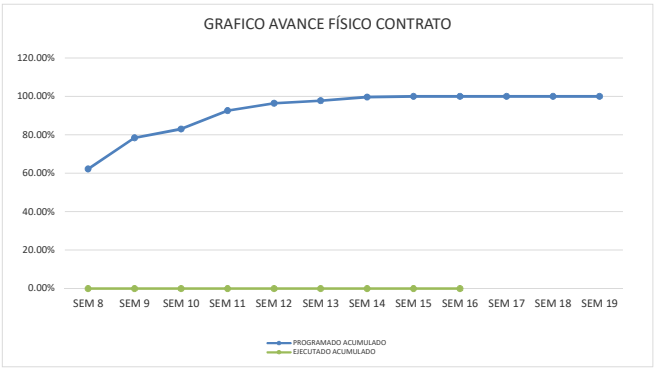

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	62.28%	0.00%	-62.28%
SEM 9	78.45%	0.00%	-78.45%
SEM 10	83.05%	0.00%	-83.05%
SEM 11	92.63%	0.00%	-92.63%
SEM 12	96.41%	0.00%	-96.41%
SEM 13	97.78%	0.00%	-97.78%
SEM 14	99.67%	0.00%	-99.67%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

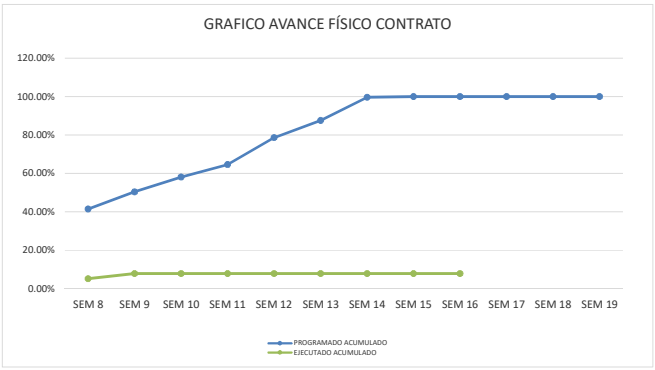

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	41.50%	5.28%	-36.22%
SEM 9	50.44%	7.94%	-42.50%
SEM 10	58.15%	7.94%	-50.21%
SEM 11	64.66%	7.94%	-56.72%
SEM 12	78.62%	7.94%	-70.68%
SEM 13	87.55%	7.94%	-79.61%
SEM 14	99.65%	7.94%	-91.71%
SEM 15	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 16	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 17	100.00%		
SEM 18	100.00%		
SEM 19	100.00%		
ALERTAS			-92.06%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

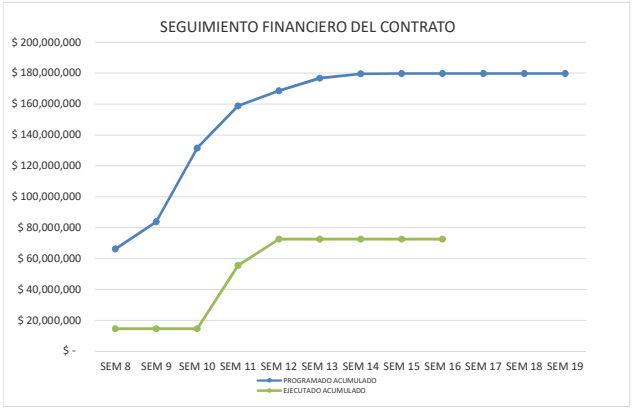

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 66,171,843	$ 14,607,200	$ -51,564,642.93
SEM 9	$ 83,842,834	$ 14,607,200	$ -69,235,634.84
SEM 10	$ 131,462,832	$ 14,607,200	$ -116,855,632.37
SEM 11	$ 158,787,255	$ 55,537,298	$ -103,249,956.96
SEM 12	$ 168,602,475	$ 72,570,665	$ -96,031,810.29
SEM 13	$ 176,781,825	$ 72,570,665	$ -104,211,160.56
SEM 14	$ 179,568,198	$ 72,570,665	$ -106,997,532.64
SEM 15	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 16	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 17	$ 179,765,940		
SEM 18	$ 179,765,940		
SEM 19	$ 179,765,940		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

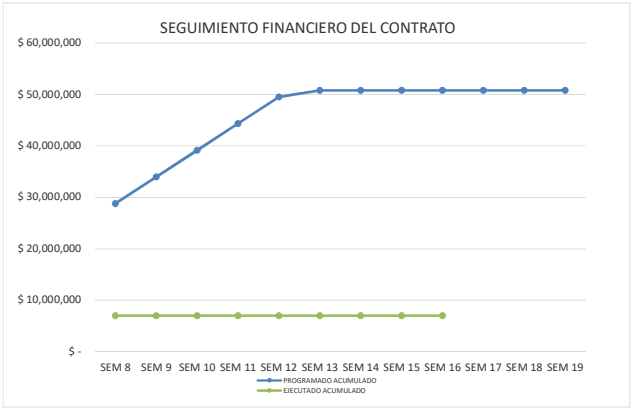

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 28,782,110	$ 7,026,713.84	$ -21,755,396.54
SEM 9	$ 33,965,835	$ 7,026,713.84	$ -26,939,121.13
SEM 10	$ 39,144,482	$ 7,026,713.84	$ -32,117,768.62
SEM 11	$ 44,323,130	$ 7,026,713.84	$ -37,296,416.10
SEM 12	$ 49,506,855	$ 7,026,713.84	$ -42,480,140.69
SEM 13	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 14	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 15	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 16	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 17	$ 50,771,054		
SEM 18	$ 50,771,054		
SEM 19	$ 50,771,054		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

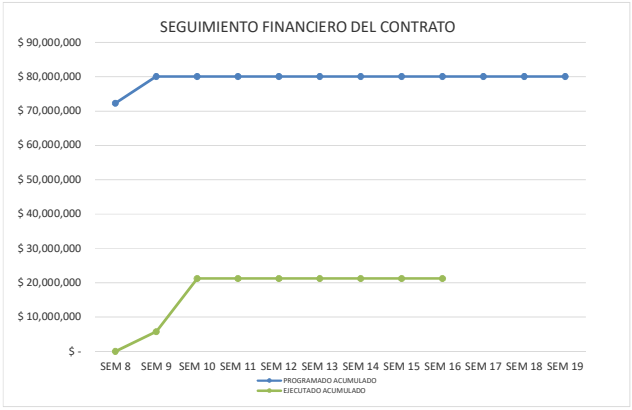

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 72,269,282	$ -	$ -72,269,281.72
SEM 9	$ 80,076,766	$ 5,749,511.83	$ -74,327,254.61
SEM 10	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 11	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 12	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 13	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 14	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 15	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 16	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 17	$ 80,076,766		
SEM 18	$ 80,076,766		
SEM 19	$ 80,076,766		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

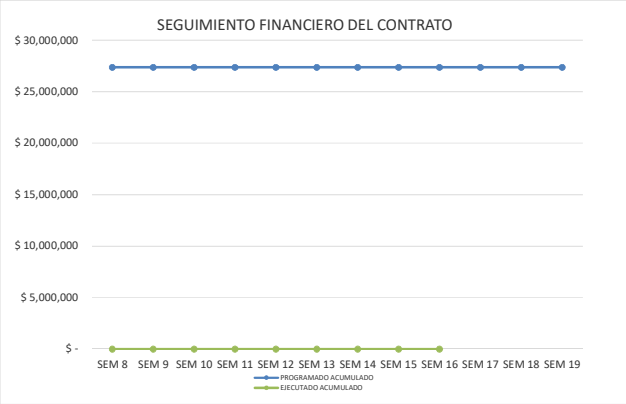

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 9	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 10	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 11	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 12	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 13	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 14	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 15	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 16	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 17	$ 27,364,346		
SEM 18	$ 27,364,346		
SEM 19	$ 27,364,346		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

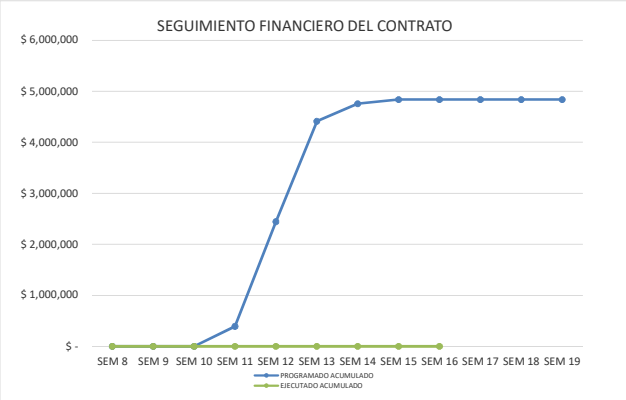

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 393,036	$ -	$ -393,036.19
SEM 12	$ 2,445,343	$ -	$ -2,445,343.37
SEM 13	$ 4,413,913	$ -	$ -4,413,912.54
SEM 14	$ 4,756,609	$ -	$ -4,756,609.12
SEM 15	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 16	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 17	$ 4,840,347		
SEM 18	$ 4,840,347		
SEM 19	$ 4,840,347		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

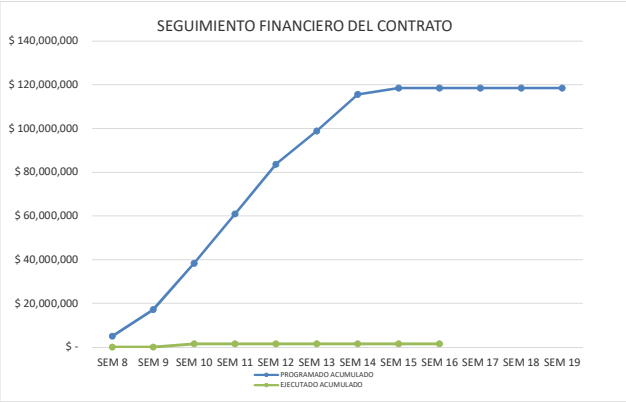

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 5,001,677	$ -	$ -5,001,676.93
SEM 9	$ 17,209,561	$ -	$ -17,209,561.39
SEM 10	$ 38,342,239	$ 1,481,539.38	$ -36,860,699.68
SEM 11	$ 60,944,604	$ 1,481,539.38	$ -59,463,064.41
SEM 12	$ 83,653,639	$ 1,481,539.38	$ -82,172,099.97
SEM 13	$ 98,895,716	$ 1,481,539.38	$ -97,414,177.07
SEM 14	$ 115,643,038	$ 1,481,539.38	$ -114,161,498.18
SEM 15	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 16	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 17	$ 118,523,150		
SEM 18	$ 118,523,150		
SEM 19	$ 118,523,150		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

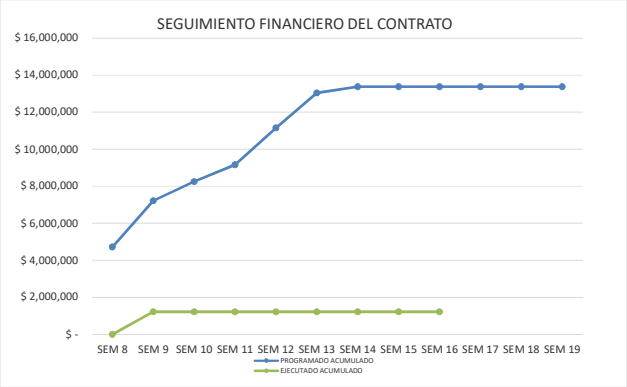

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 4,718,473	$ -	$ -4,718,472.77
SEM 9	$ 7,218,140	$ 1,221,078.70	$ -5,997,061.20
SEM 10	$ 8,254,652	$ 1,221,078.70	$ -7,033,573.78
SEM 11	$ 9,161,434	$ 1,221,078.70	$ -7,940,355.12
SEM 12	$ 11,155,550	$ 1,221,078.70	$ -9,934,471.58
SEM 13	$ 13,045,347	$ 1,221,078.70	$ -11,824,268.08
SEM 14	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 15	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 16	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 17	$ 13,374,356		
SEM 18	$ 13,374,356		
SEM 19	$ 13,374,356		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

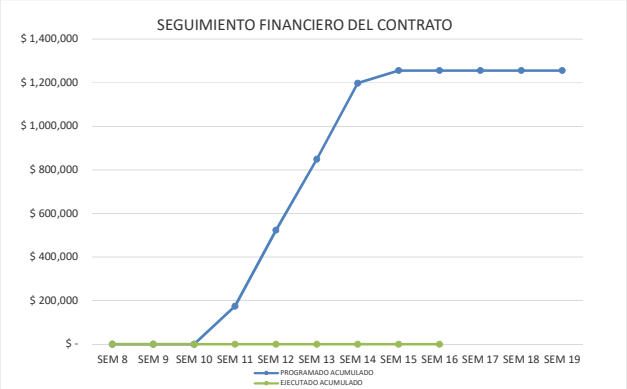

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ -	$ -	$ -
SEM 9	$ -	$ -	$ -
SEM 10	$ -	$ -	$ -
SEM 11	$ 174,097	$ -	$ -174,097.00
SEM 12	$ 523,170	$ -	$ -523,170.27
SEM 13	$ 848,880	$ -	$ -848,879.87
SEM 14	$ 1,198,079	$ -	$ -1,198,078.76
SEM 15	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 16	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 17	$ 1,256,111		
SEM 18	$ 1,256,111		
SEM 19	$ 1,256,111		

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

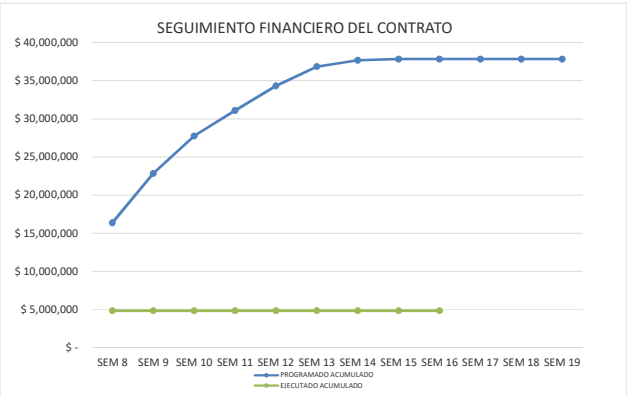

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 16,364,554	$ 4,848,055.77	$ -11,516,497.81
SEM 9	$ 22,847,551	$ 4,848,055.77	$ -17,999,495.10
SEM 10	$ 27,759,945	$ 4,848,055.77	$ -22,911,888.84
SEM 11	$ 31,101,735	$ 4,848,055.77	$ -26,253,679.03
SEM 12	$ 34,322,418	$ 4,848,055.77	$ -29,474,362.45
SEM 13	$ 36,861,876	$ 4,848,055.77	$ -32,013,820.23
SEM 14	$ 37,683,131	$ 4,848,055.77	$ -32,835,075.58
SEM 15	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 16	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 17	$ 37,845,869		
SEM 18	$ 37,845,869		
SEM 19	$ 37,845,869		


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

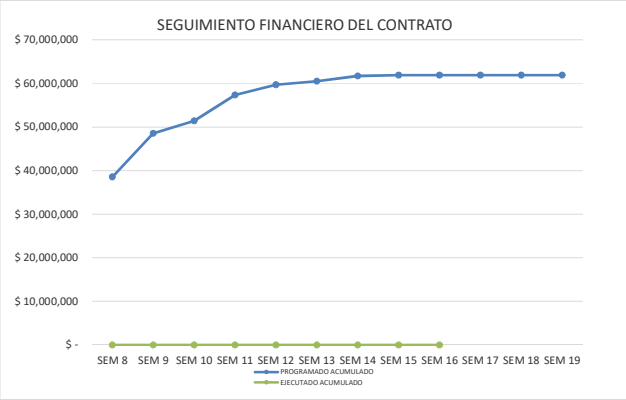

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 38,562,115	$ -	$ -38,562,115.09
SEM 9	$ 48,574,148	$ -	$ -48,574,147.86
SEM 10	$ 51,422,345	$ -	$ -51,422,345.18
SEM 11	$ 57,354,026	$ -	$ -57,354,025.70
SEM 12	$ 59,694,501	$ -	$ -59,694,500.89
SEM 13	$ 60,542,768	$ -	$ -60,542,768.36
SEM 14	$ 61,713,006	$ -	$ -61,713,005.95
SEM 15	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 16	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 17	$ 61,917,333		
SEM 18	$ 61,917,333		
SEM 19	$ 61,917,333		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

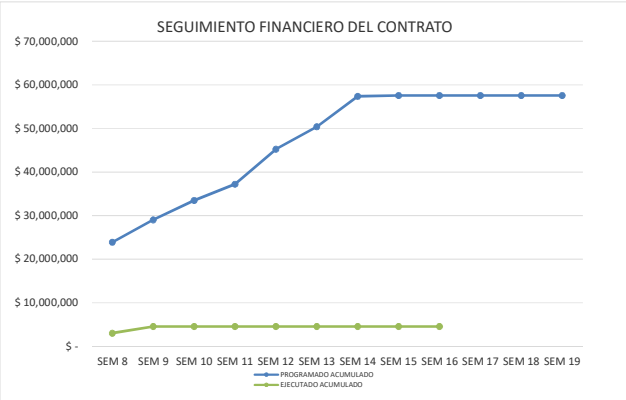

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 23,896,478	$ 3,040,322.97	$ -20,856,154.95
SEM 9	$ 29,044,298	$ 4,572,000.84	$ -24,472,296.67
SEM 10	$ 33,483,860	$ 4,572,000.84	$ -28,911,859.19
SEM 11	$ 37,232,440	$ 4,572,000.84	$ -32,660,439.22
SEM 12	$ 45,270,870	$ 4,572,000.84	$ -40,698,868.90
SEM 13	$ 50,412,931	$ 4,572,000.84	$ -45,840,930.29
SEM 14	$ 57,380,338	$ 4,572,000.84	$ -52,808,337.11
SEM 15	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 16	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 17	$ 57,581,875		
SEM 18	$ 57,581,875		
SEM 19	$ 57,581,875		
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020	6/10/2020	18/09/2020		**-18.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/09/2020	3/11/2020	1/12/2020		**-45.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		30/11/2020		**-85.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020	3/11/2020	7/10/2020	13/11/2020	**-45.00**	**-37.00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		29/09/2020		**-85.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/09/2020		6/10/2020		**-83.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020	6/10/2020	25/11/2020		**-15.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-86.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/09/2020		18/11/2020		**-82.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		26/09/2020		**-85.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-85.00**	
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		25/11/2020		**-85.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-86.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		21/10/2020		**-85.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		7/10/2020		**-85.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-85.00**	
10	NO PREVISTOS	21/10/2020		25/11/2020		**-53.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-86.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		**-85.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**-85.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**-83.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-40.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	17/11/2020		17/11/2020		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-39.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		19/11/2020		**-39.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	10/11/2020		30/11/2020		**-33.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		1/12/2020		**-39.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/10/2020		13/10/2020		**-61.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		**-60.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		1/12/2020		**-60.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/10/2020		30/10/2020		**-48.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/10/2020		1/12/2020		**-60.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/10/2020		1/12/2020		**-60.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020		**-43.00**	
10	NO PREVISTOS	14/10/2020		1/12/2020		**-60.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-79.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		25/11/2020		**-78.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	8/10/2020		24/10/2020		**-66.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-78.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		28/10/2020		**-78.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/10/2020		9/10/2020		**-69.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		11/11/2020		**-78.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-40.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	12/11/2020		19/11/2020		**-31.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-39.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		24/11/2020		**-39.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020		29/09/2020		**-75.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		21/11/2020		**-74.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/09/2020		14/11/2020		**-74.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		13/10/2020		**-74.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/10/2020		20/10/2020		**-68.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/09/2020		1/12/2020		**-74.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/10/2020		14/11/2020		**-68.00**	
10	NO PREVISTOS	30/09/2020		14/11/2020		**-74.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-79.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		16/10/2020		**-78.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	28/09/2020		28/10/2020		**-76.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		22/10/2020		**-78.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	28/10/2020		1/12/2020		**-46.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		12/11/2020		**-78.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/10/2020		23/10/2020		**-69.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		2/10/2020		**-78.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	25/09/2020		25/09/2020		**-79.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/09/2020		9/10/2020		**-78.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	26/09/2020		8/10/2020		**-78.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	26/09/2020		8/10/2020		**-78.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		2/10/2020		**-78.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	26/09/2020		5/10/2020		**-78.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26/09/2020		1/12/2020		**-78.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26/09/2020		1/12/2020		**-78.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/09/2020		28/10/2020		**-75.00**	
10	NO PREVISTOS	26/09/2020		14/11/2020		**-78.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7771858782	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
7/12/2020	13/12/2020	SEMANA No. 16	14-dic-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

NO APLICA


Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada.

PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-FONSECA-GUAJIRA**	**56 days**	**Sep 18 '20**	**Dec 1 '20**
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**55 days**	**Sep 19 '20**	**Dec 1 '20**
4		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	30 days	Sep 19 '20	Oct 28 '20
5		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	25 days	Oct 28 '20	Dec 1 '20
6		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	30 days	Sep 19 '20	Oct 28 '20
7		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	12 days	Sep 19 '20	Oct 5 '20
8		**5**	**LAVADO TANQUES**	**12 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 5 '20**
9		5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
10		5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	1 day	Sep 21 '20	Sep 22 '20
11		5.3.4	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107	3 days	Sep 22 '20	Sep 25 '20
12		5.3.5	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	7 days	Sep 25 '20	Oct 5 '20
13		5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1"	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
14		**NP**	**NO PREVISTOS**	**20 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 15 '20**
15		NP-10.337	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
16		NP-10.338	Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño mujeres, 4 sanitarios y 3 en Lavamanos	7 days	Sep 21 '20	Sep 29 '20

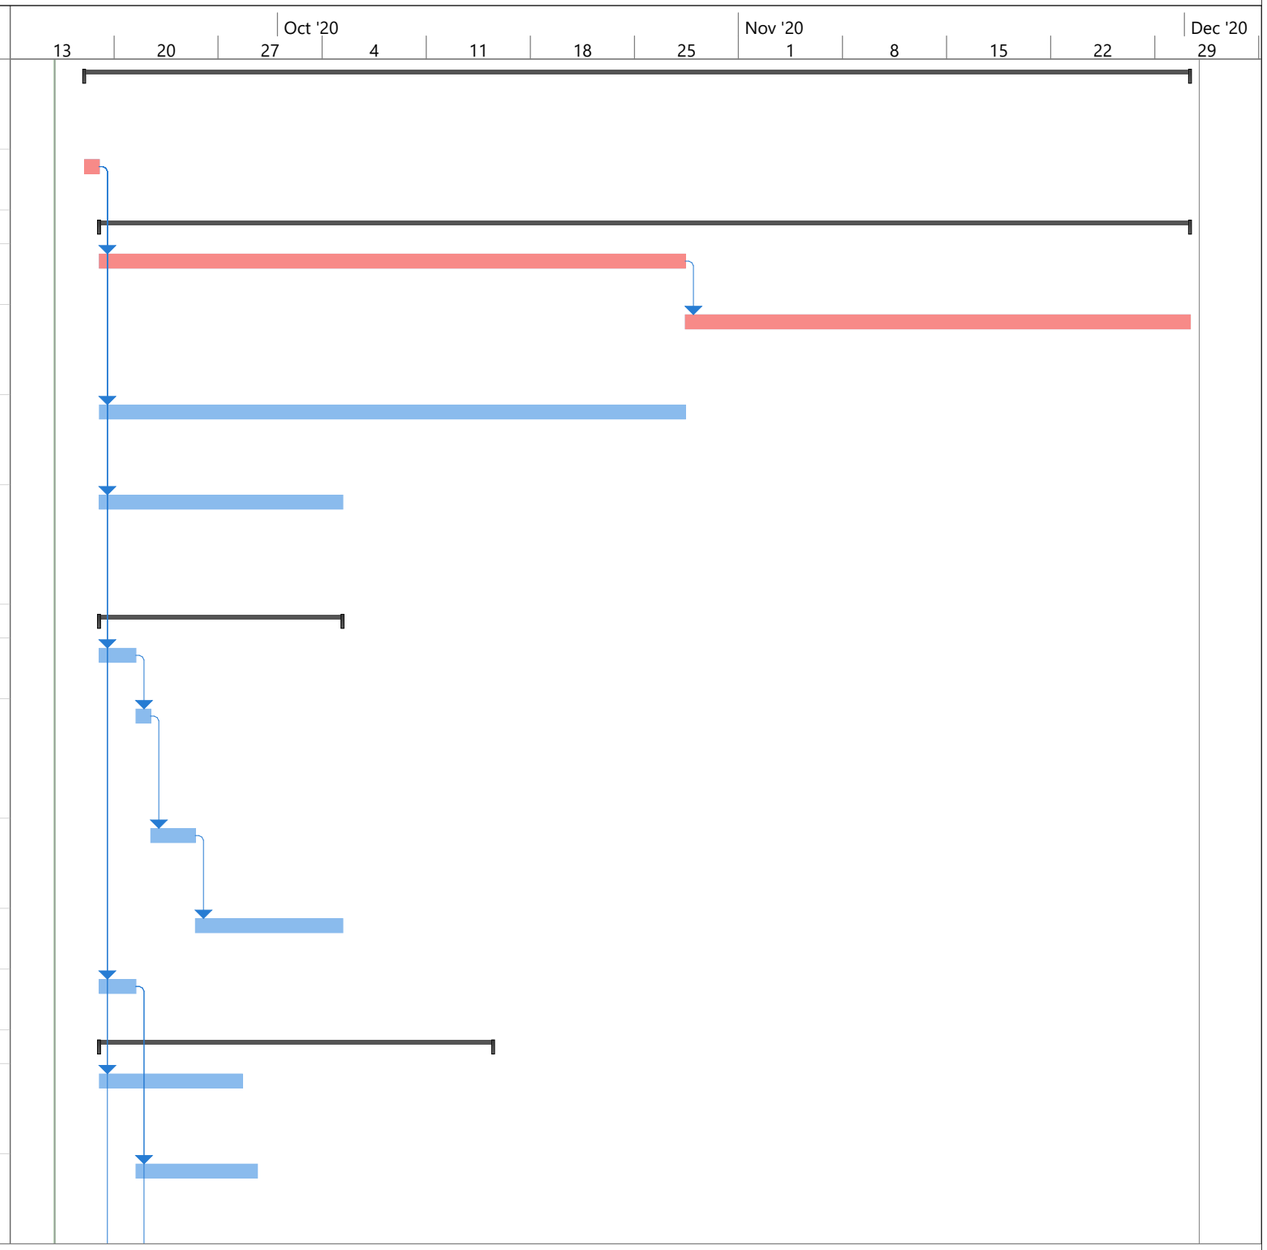


Projecto: CENTRO AGROEMPRE
Date: Sep 16 '20

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Tareas críticas	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone			
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress			
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress			

Aprobó:

PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
17		NP-10.339	Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño Hombres, 3 en Lavamanos, 5 en orinales y 3 en Sanitarios.	7 days	Sep 21 '20	Sep 29 '20
18		NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Sep 19 '20	Oct 15 '20

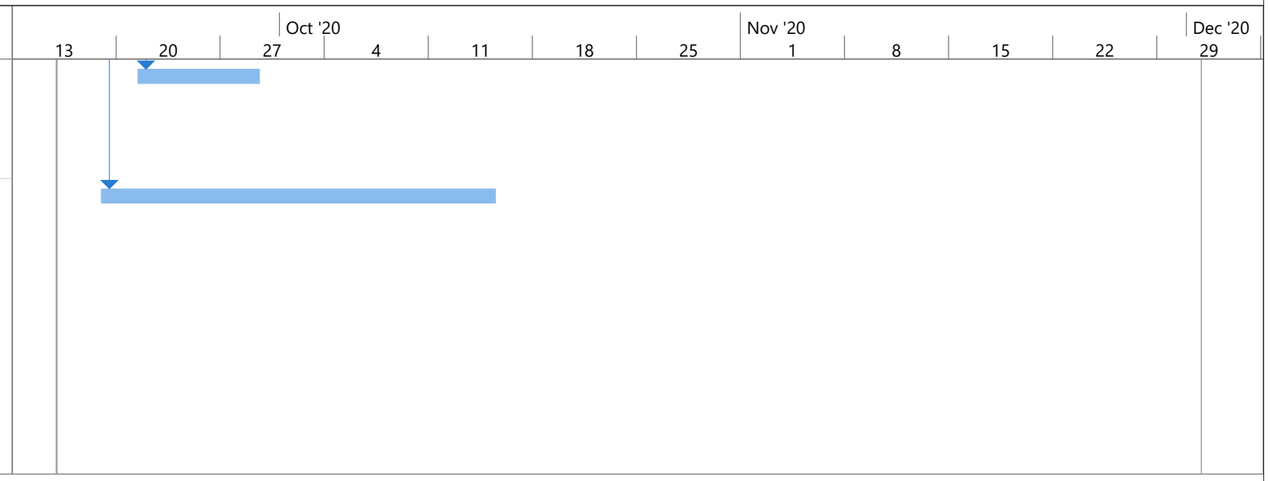


Projecto: CENTRO AGROEMPRE
Date: Sep 16 '20

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Tareas críticas
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress		
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress		

Aprobó:

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO**	**52 days**	**Sep 18 '20**	**Nov 25 '20**
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3		**1**	**IMPERMEABILIZACIONES**	**43 days**	**Sep 22 '20**	**Nov 18 '20**
4		1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	42 days	Sep 22 '20	Nov 17 '20
5		1.9	INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	1 day	Nov 17 '20	Nov 18 '20
6		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**6 days**	**Sep 19 '20**	**Sep 26 '20**
7		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	3 days	Sep 19 '20	Sep 23 '20
8		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	3 days	Sep 23 '20	Sep 26 '20
9		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	6 days	Sep 19 '20	Sep 26 '20
10		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	6 days	Sep 19 '20	Sep 26 '20
11		**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**1 day**	**Sep 19 '20**	**Sep 21 '20**
12		5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
13		**NP**	**NO PREVISTO**	**51 days**	**Sep 19 '20**	**Nov 25 '20**
14		NP-10.342	Aplicación de pintura epoxica aluminio para mantenimiento	7 days	Nov 17 '20	Nov 25 '20
15		NP-10.343	DESMONTE MANTO ASFALTICO PARA INSTALACION DE MANTO NUEVO	4 days	Sep 19 '20	Sep 24 '20

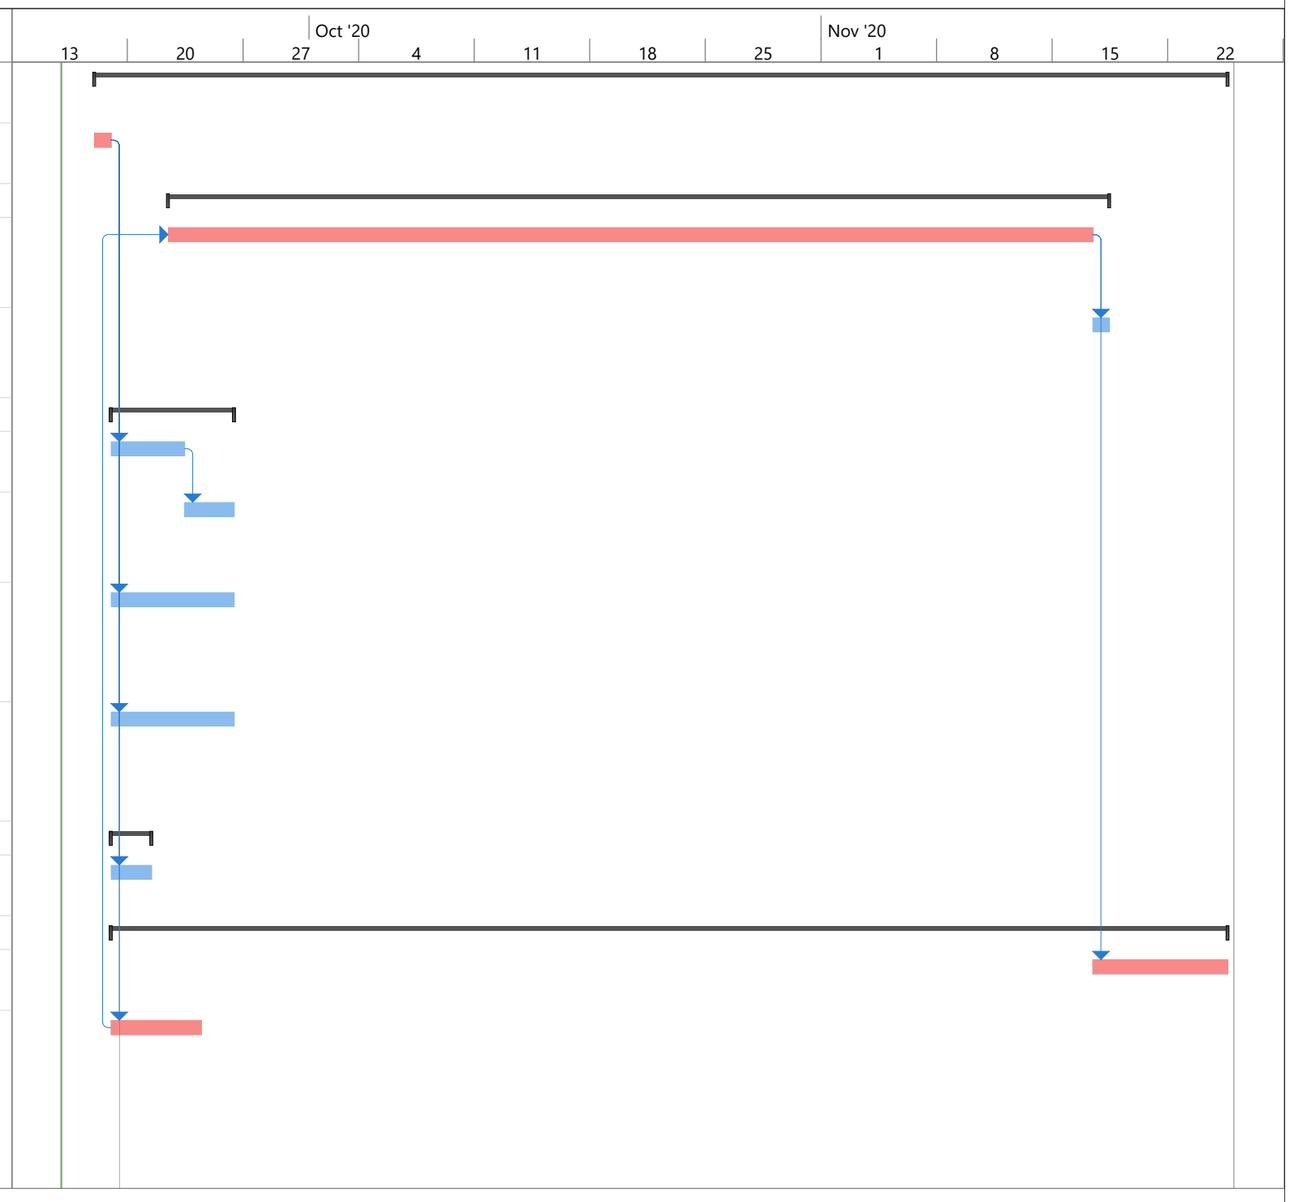


Project: CIEA-MAICAO
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
16		NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Sep 19 '20	Oct 15 '20

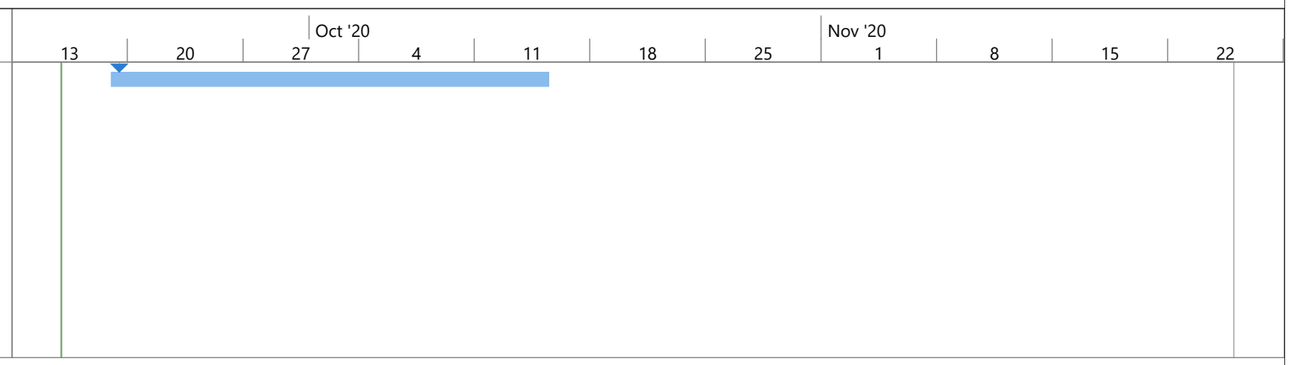


Project: CIEA-MAICAO
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA**	**56 days**	**Sep 18 '20**	**Dec 1 '20**
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3		**1**	**IMPERMEABILIZACIONES**	**55 days**	**Sep 19 '20**	**Dec 1 '20**
4		1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	42 days	Oct 2 '20	Nov 27 '20
5		1.5	CORRECCION FILTRACION BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRAULICO	6 days	Sep 19 '20	Sep 26 '20
6		1.7	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MORTER PLASTICO PREPARADO	2 days	Nov 27 '20	Dec 1 '20
7		**2**	**SISTEMA ELÉCTRICO**	**54 days**	**Sep 19 '20**	**Nov 30 '20**
8		2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	25 days	Sep 19 '20	Oct 21 '20
9		2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Oct 21 '20	Oct 30 '20
10		2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Oct 21 '20	Oct 30 '20
11		2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Oct 21 '20	Oct 30 '20

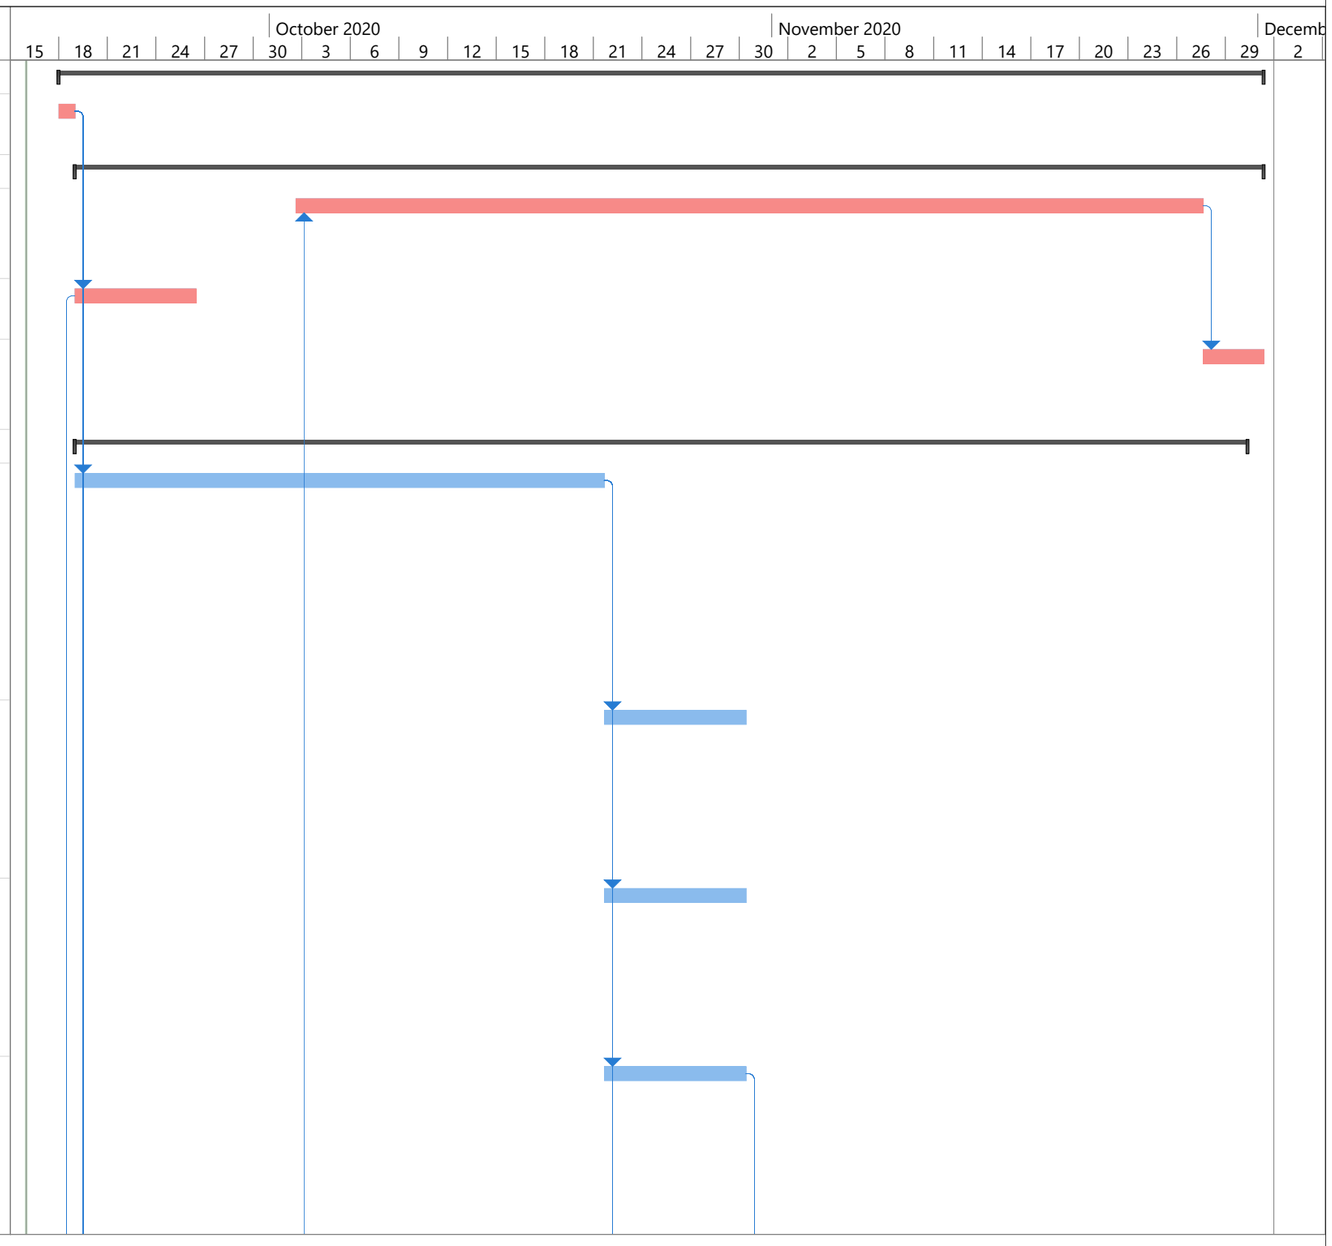


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
12		2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA.	2 days	Oct 30 '20	Nov 3 '20
13		2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	7 days	Oct 30 '20	Nov 9 '20
14		2.13	CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0	3 days	Oct 30 '20	Nov 4 '20
15		2.16	PLANTA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE OPERACIÓN.	25 days	Oct 21 '20	Nov 24 '20
16		2.17	TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES.	3 days	Oct 21 '20	Oct 26 '20
17		2.20	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE TRAMOS, COLOCACIÓN DE TAPAS A CANALETA METÁLICA DOBLE COMPARTIMENTO 12X5 CM.	6 days	Oct 21 '20	Oct 29 '20
18		2.21	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA UNA VEZ AL AÑO. SE DEBE OBTENER UNA LECTURA DE 3 OHMIOS O MENOR.	2 days	Nov 24 '20	Nov 26 '20
19		2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2 days	Nov 26 '20	Nov 30 '20
20		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**14 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 7 '20**
21		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
22		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	7 days	Sep 28 '20	Oct 7 '20

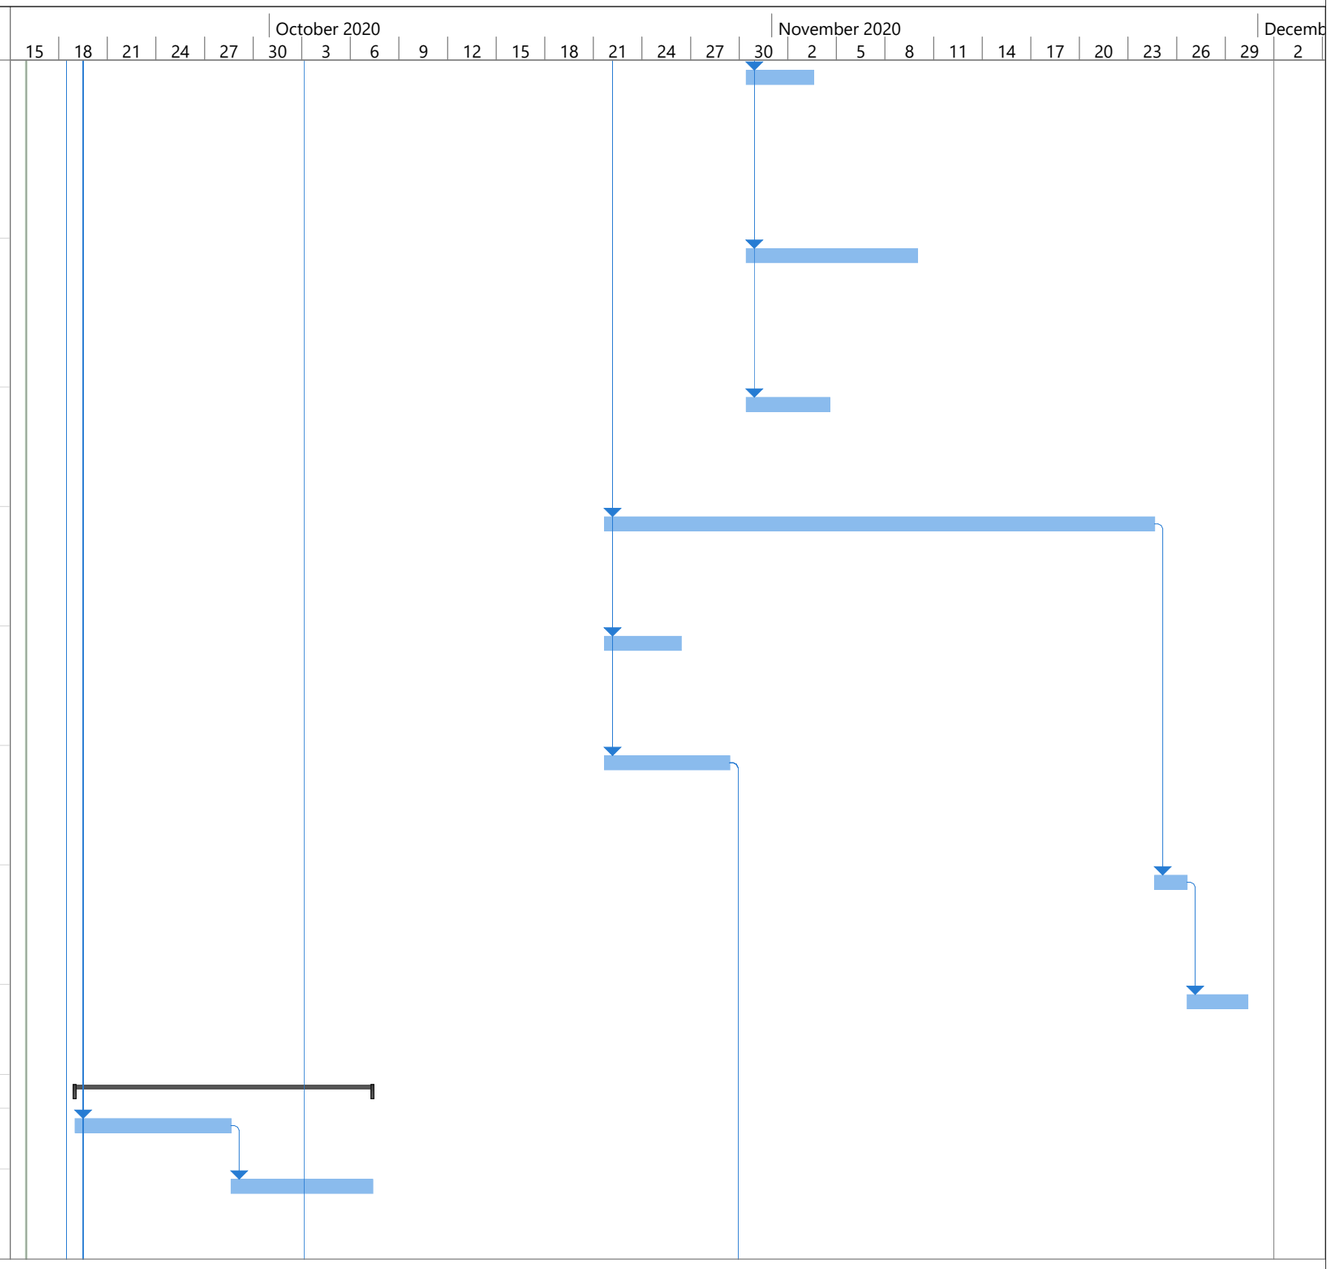


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica	Project Summary	Duration-only	External Tasks	Tareas críticas
Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Progress	
Summary	Manual Task	Finish-only	Manual Progress	

Aprobó:

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
23		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
24		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	3 days	Sep 19 '20	Sep 23 '20
25		**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**8 days**	**Sep 19 '20**	**Sep 29 '20**
26		5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
27		5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	1 day	Sep 21 '20	Sep 22 '20
28		5.3.4	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107	4 days	Sep 22 '20	Sep 26 '20
29		5.3.5	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	2 days	Sep 26 '20	Sep 29 '20
30		5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1"	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
31		**8**	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	**12 days**	**Sep 21 '20**	**Oct 6 '20**
32		8.37	TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3	12 days	Sep 21 '20	Oct 6 '20
33		**NP**	**NO PREVISTOS**	**50 days**	**Sep 21 '20**	**Nov 25 '20**
34		NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Oct 29 '20	Nov 25 '20
35		NP-10.342	Aplicación de pintura epoxica aluminio para mantenimiento	20 days	Sep 21 '20	Oct 16 '20

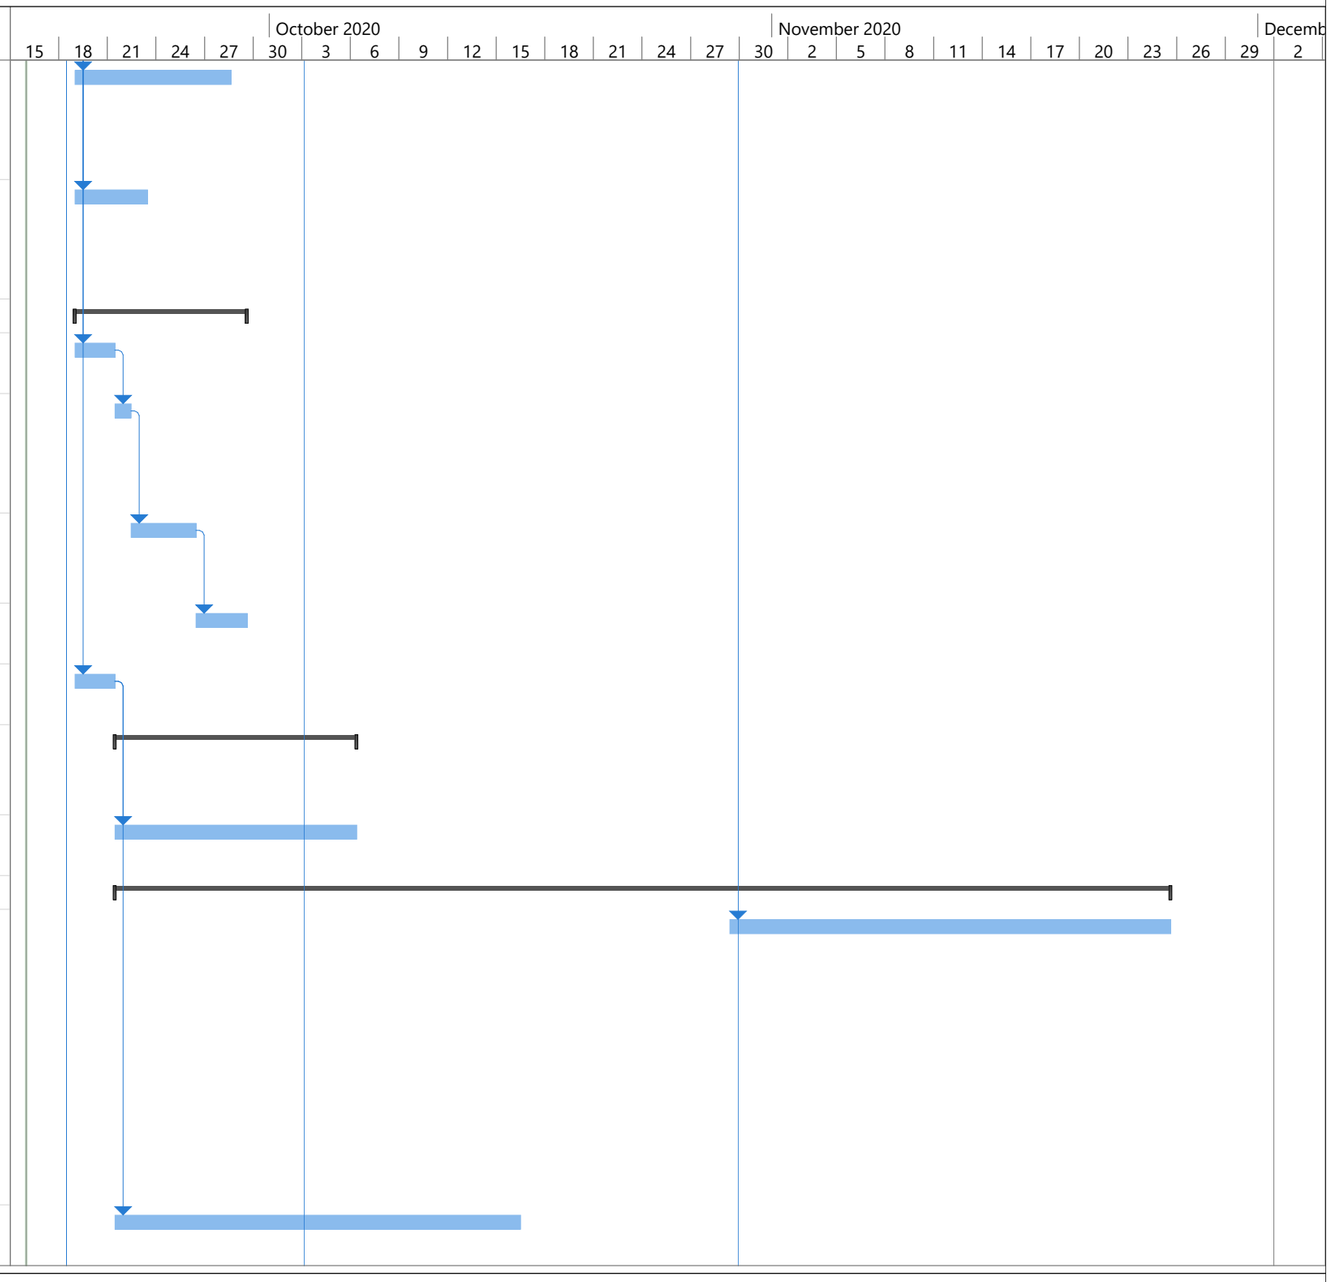


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
36		NP-10.345	Mantenimiento de subestacion electrica Sede Comercio y Servicio	20 days	Oct 29 '20	Nov 25 '20
37		NP-10.346	Mantenimiento de Estructura de Kiosko incluye inmunizacion	20 days	Oct 29 '20	Nov 25 '20
38		NP-10.347	RETIRO DE MANTO ASFALTICO PARA INSTALACION DE MANTO NUEVO (INCLUYE DESALOJO)	7 days	Sep 24 '20	Oct 2 '20

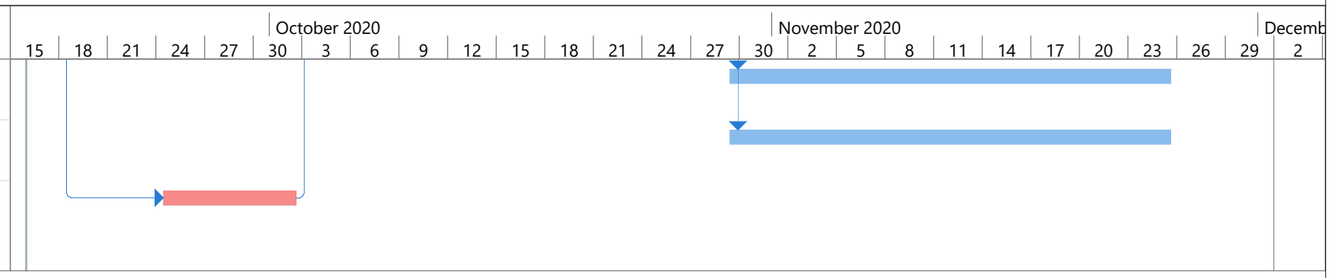


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

ID	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA**	**50 days**	**Sep 18 '20**	**Nov 23 '20**
2		PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3	**2**	**SISTEMAS ELECTRICOS**	**25 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 21 '20**
4	2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
5	2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	2 days	Sep 28 '20	Sep 30 '20
6	2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Sep 30 '20	Oct 9 '20
7	2.7	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS.	7 days	Sep 30 '20	Oct 9 '20
8	2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
9	2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA.	2 days	Sep 30 '20	Oct 2 '20
10	2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	7 days	Oct 2 '20	Oct 13 '20
11	2.13	CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0	7 days	Oct 13 '20	Oct 21 '20
12	**3**	**SERVICIO JARDINERIA**	**14 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 7 '20**
13	3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
14	3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	7 days	Sep 24 '20	Oct 2 '20

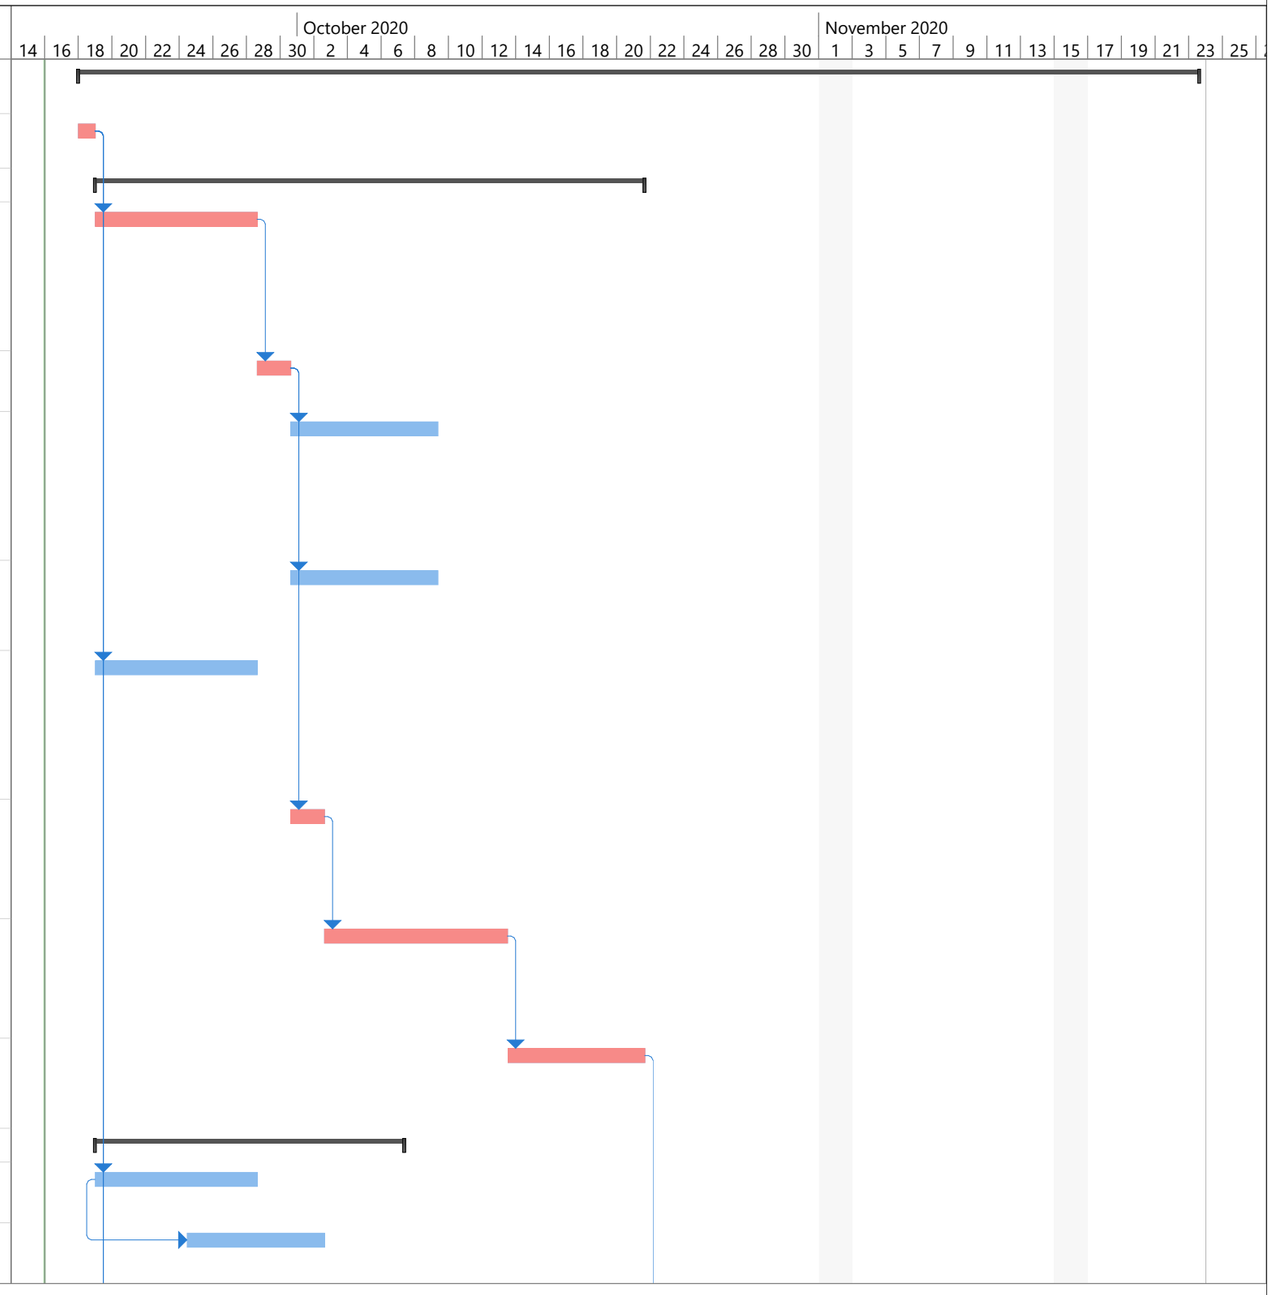


Project: CENTRO INDUSTRIAL Y
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ID	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
15	3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	14 days	Sep 19 '20	Oct 7 '20
16	3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
17	**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**1 day**	**Sep 19 '20**	**Sep 21 '20**
18	5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
19	**NP**	**NO PREVISTOS**	**24 days**	**Oct 21 '20**	**Nov 23 '20**
20	NP-10.349	Mantenimientos de Plantas Electricas CIEA	4 days	Oct 21 '20	Oct 27 '20
21	NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Oct 27 '20	Nov 23 '20

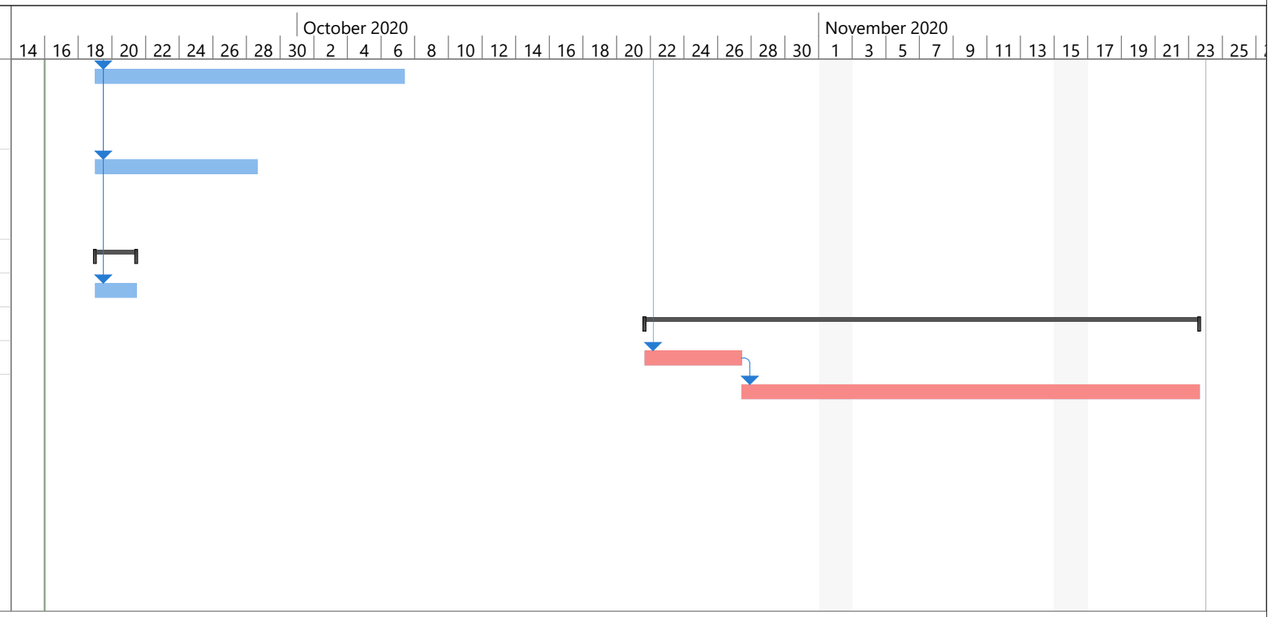

Project: CENTRO INDUSTRIAL Y
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:
