DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PERES

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

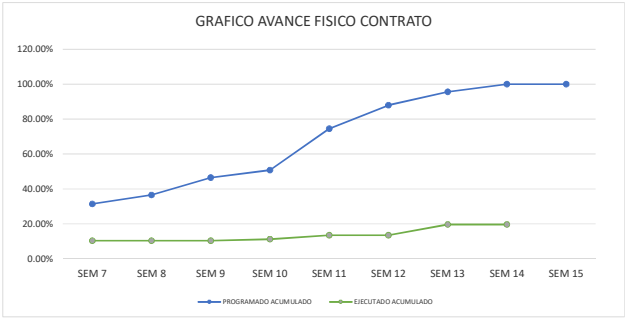


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	15.56%	31.47%	10.38%	10.38%	**-21.09%**
SEM 8	5.10%	36.57%	0.00%	10.38%	**-26.19%**
SEM 9	10.02%	46.59%	0.00%	10.38%	**-36.22%**
SEM 10	4.21%	50.80%	0.88%	11.25%	**-39.55%**
SEM 11	23.73%	74.54%	2.29%	13.54%	**-60.99%**
SEM 12	13.43%	87.97%	0.00%	13.54%	**-74.42%**
SEM 13	7.68%	95.65%	6.14%	19.68%	**-75.97%**
SEM 14	4.35%	100.00%	0.00%	19.68%	**-80.32%**
SEM 15	0.00%	100.00%			
ALERTAS					**-80.32%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

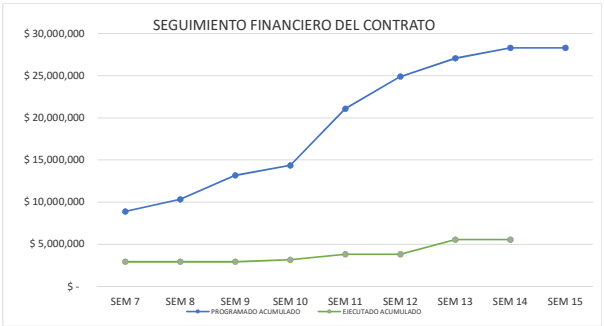

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 4,400,242	$ 8,901,614	$ 2,935,096	$ 2,935,096	**$ -5,966,518**
SEM 8	$ 1,442,724	$ 10,344,338	0	$ 2,935,096	**$ -7,409,242**
SEM 9	$ 2,835,511	$ 13,179,849	0	$ 2,935,096	**$ -10,244,753**
SEM 10	$ 1,189,920	$ 14,369,769	248,100	$ 3,183,196	**$ -11,186,573**
SEM 11	$ 6,713,529	$ 21,083,298	648,380	$ 3,831,576	**$ -17,251,722**
SEM 12	$ 3,799,428	$ 24,882,726	0	$ 3,831,576	**$ -21,051,150**
SEM 13	$ 2,173,332	$ 27,056,057	1,736,700	$ 5,568,276	**$ -21,487,781**
SEM 14	$ 1,230,174	$ 28,286,231	0	$ 5,568,276	**$ -22,717,955**
SEM 15	$ -	$ 28,286,231			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	2/10/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	2/10/2020		2/10/2020				
2	IMPERMEABILIZACIONES	3/10/2020		7/10/2020			**-57.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/10/2020		5/10/2020			**-58.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	3/10/2020	26/10/2020	13/10/2020	3/11/2020		**-23.00**	**-21.00**
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		21/10/2020			**-47.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	21/10/2020		23/10/2020			**-39.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3/10/2020		19/10/2020			**-57.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	23/10/2020		20/11/2020			**-37.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		26/11/2020			**-26.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	21/10/2020		1/12/2020			**-39.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**102**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**2**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra.
En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó poda de árboles en el Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, en las demás sedes no realizó actividades. También se realizó visita en los centros donde el Contratista realizó actividades encontrando lo siguiente:
1.Sede Administrativa se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
2.Centro Administrativo de Comercio y Turismo (Montería): se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
3.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Montelíbano: se realizó mantenimiento de aires acondicionados.
4.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Lorica: se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
5.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Los Garzones: se realizó poda de árboles.
6.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel: se realizó poda de árboles.
Otra actividad que aduce el Contratista que realizó fue la pradización de jardines, la cual en la visita no se evidencia que se haya realizado, ni tampoco existe un registro fotográfico que avale que se haya realizado dicha actividad.

Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
4	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7	13-oct-20	El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad.. El Contratista al corte de este informe tiene un retraso del 2,48% .
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.

TREINTA	30	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

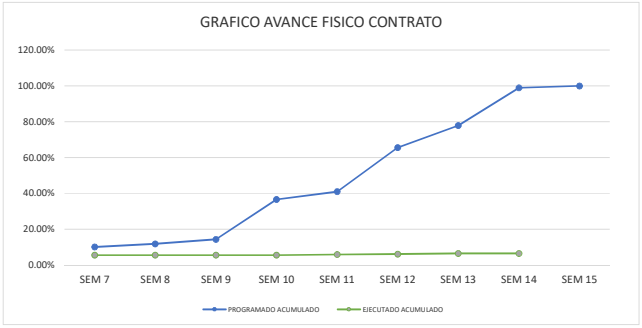


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	**5.45%**	10.18%	5.62%	5.62%	**-4.56%**
SEM 8	**1.77%**	11.95%	0.00%	5.62%	**-6.33%**
SEM 9	**2.51%**	14.45%	0.00%	5.62%	**-8.83%**
SEM 10	**22.20%**	36.66%	0.00%	5.62%	**-31.04%**
SEM 11	**4.43%**	41.08%	0.30%	5.92%	**-35.16%**
SEM 12	**24.59%**	65.67%	0.28%	6.21%	**-59.47%**
SEM 13	**12.21%**	77.88%	0.39%	6.60%	**-71.29%**
SEM 14	**21.09%**	98.97%	0.00%	6.60%	**-92.38%**
SEM 15	**1.03%**	100.00%			**-1.03%**
ALERTAS					**-92.38%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

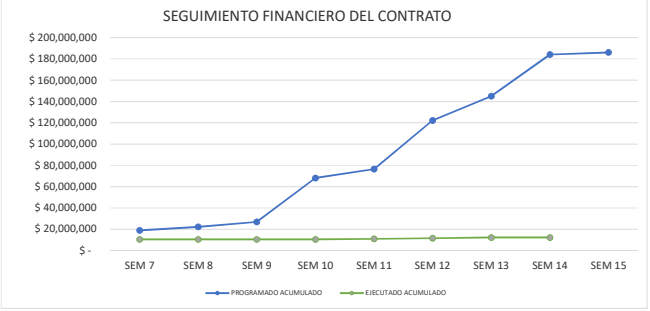

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 10,133,847	$ 18,948,278	$ 10,460,813	$ 10,460,813	$ **-8,487,465**
SEM 8	$ 3,286,307	$ 22,234,585	$ -	$ 10,460,813	$ **-11,773,772**
SEM 9	$ 4,667,040	$ 26,901,625	$ -	$ 10,460,813	$ **-16,440,812**
SEM 10	$ 41,321,978	$ 68,223,603	$ -	$ 10,460,813	$ **-57,762,790**
SEM 11	$ 8,236,821	$ 76,460,424	$ 563,176	$ 11,023,989	$ **-65,436,436**
SEM 12	$ 45,759,725	$ 122,220,150	$ 524,019	$ 11,548,007	$ **-110,672,143**
SEM 13	$ 22,727,630	$ 144,947,780	$ 732,134	$ 12,280,141	$ **-132,667,638**
SEM 14	$ 39,251,669	$ 184,199,448	$ -	$ 12,280,141	$ **-171,919,307**
SEM 15	$ 1,908,550	$ 186,107,998			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		14/10/2020			**-60.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/10/2020	3/11/2020	11/11/2020			**-10.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		24/10/2020			**-46.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	28/09/2020		7/10/2020			**-62.00**	
6	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020	5/10/2020	21/10/2020			**-5.00**	
7	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/10/2020		26/11/2020			**-57.00**	
8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			**-29.00**	
9	ITEM NO PREVSITOS	28/09/2020		30/11/2020			**-62.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**102**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**2**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó poda de árboles en el Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, en las demás sedes no realizó actividades. También se realizó visita en los centros donde el Contratista realizó actividades encontrando lo siguiente:
1.Sede Administrativa se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
2.Centro Administrativo de Comercio y Turismo (Montería): se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
3.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Montelíbano: se realizó mantenimiento de aires acondicionados.
4.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Lorica: se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
5.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Los Garzones: se realizó poda de árboles.
6.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel: se realizó poda de árboles.
Otra actividad que aduce el Contratista que realizó fue la pradización de jardines, la cual en la visita no se evidencia que se haya realizado, ni tampoco existe un registro fotográfico que avale que se haya realizado dicha actividad.

Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7	13-oct-20	El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad.. El Contratista al corte de este informe tiene un retraso del 2,48% .
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**14**	**DEL**	23 de noviembre de 2020	**AL**	29 de noviembre de 2020
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.		

30	**TREINTA**	**días del mes de**	**NOVIEMBRE**	**de**	**2020**
(Día en letras)	**(Día en números)**				**(Año en que se firma el acta)**

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

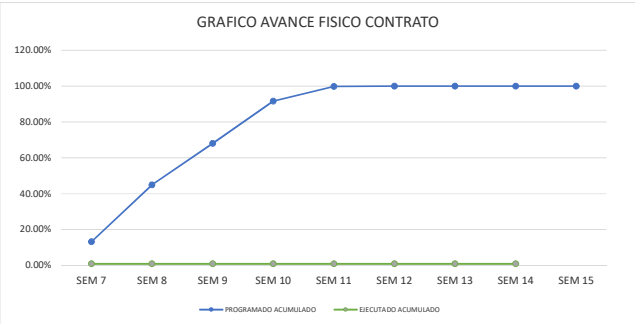


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	5.73%	13.17%	0.91%	0.91%	**-12.26%**
SEM 8	31.77%	44.94%	0.00%	0.91%	**-44.03%**
SEM 9	23.18%	68.13%	0.00%	0.91%	**-67.21%**
SEM 10	23.55%	91.67%	0.00%	0.91%	**-90.76%**
SEM 11	8.16%	99.83%	0.00%	0.91%	**-98.92%**
SEM 12	0.17%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 13	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 14	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 15	0.00%	100.00%			
ALERTAS					**-99.09%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

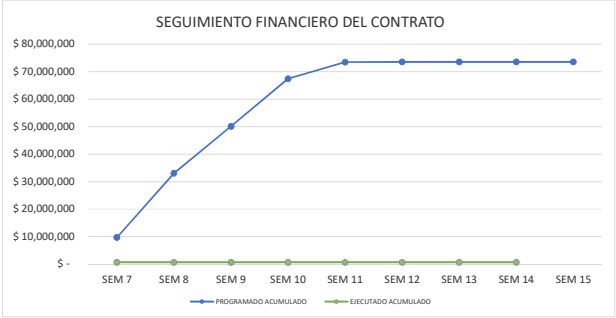

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 4,214,013	$ 9,688,179	$ 671,630	$ 671,630	$ -9,016,549
SEM 8	$ 23,375,009	$ 33,063,188	$ -	$ 671,630	$ -32,391,558
SEM 9	$ 17,055,702	$ 50,118,890	$ -	$ 671,630	$ -49,447,260
SEM 10	$ 17,323,038	$ 67,441,928	$ -	$ 671,630	$ -66,770,298
SEM 11	$ 6,002,426	$ 73,444,354	$ -	$ 671,630	$ -72,772,724
SEM 12	$ 122,116	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 13	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 14	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 15	$ -	$ 73,566,470			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	30/09/2020		24/11/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	30/09/2020		30/09/2020				
2	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		6/10/2020			**-59.00**	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	6/10/2020		10/10/2020			**-54.00**	
4	LAVADO DE TANQUES	10/10/2020		14/10/2020			**-50.00**	
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/10/2020		19/10/2020			**-45.00**	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		4/11/2020			**-59.00**	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	4/11/2020		11/11/2020			**-25.00**	
8	ITEM NO PREVSITOS	11/11/2020		24/11/2020			**-18.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**102**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**2**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó poda de árboles en el Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, en las demás sedes no realizó actividades. También se realizó visita en los centros donde el Contratista realizó actividades encontrando lo siguiente:
1.Sede Administrativa se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
2.Centro Administrativo de Comercio y Turismo (Montería): se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
3.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Montelíbano: se realizó mantenimiento de aires acondicionados.
4.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Lorica: se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
5.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Los Garzones: se realizó poda de árboles.
6.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel: se realizó poda de árboles.
Otra actividad que aduce el Contratista que realizó fue la pradización de jardines, la cual en la visita no se evidencia que se haya realizado, ni tampoco existe un registro fotográfico que avale que se haya realizado dicha actividad.

Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7	13-oct-20	El Consorcio Constructor Alfa inicio actividades en la Sede de Lorica sin haber presentado el debido soporte de las afiliaciones, dicho personal que se encentraba laborando sin haber presentado ningún documento de ingreso ni tener los elementos de protección personal, por lo anterior es responsabilidad del Consorcio Constructor Alfa cualquier incidente o accidente laboral que suceda, por el ingreso no autorizado del personal sin elementos de protección personal y sin pagos de seguridad social, además toda vez que realice actividad sin la previa autorización de la Interventoría no se será reconocida y serán a su cuenta y riesgo. En la presente semana el Contratista continúa con el retraso por la mala ejecución de su programa de obra.
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.

TREINTA	30	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

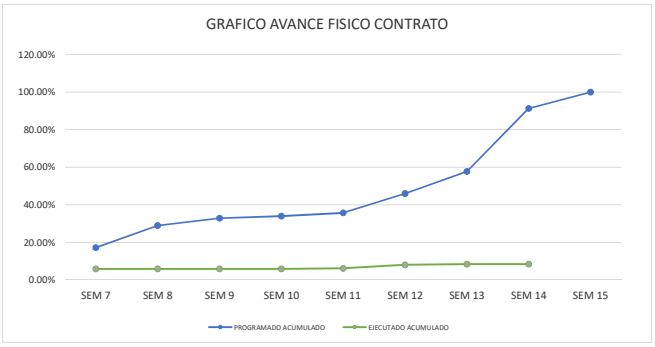


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	15.82%	17.24%	5.96%	5.96%	**-11.29%**
SEM 8	11.79%	29.03%	0.00%	5.96%	**-23.08%**
SEM 9	3.86%	32.89%	0.00%	5.96%	**-26.94%**
SEM 10	1.11%	34.00%	0.00%	5.96%	**-28.05%**
SEM 11	1.72%	35.73%	0.26%	6.21%	**-29.51%**
SEM 12	10.26%	45.99%	1.88%	8.09%	**-37.90%**
SEM 13	11.74%	57.73%	0.37%	8.46%	**-49.27%**
SEM 14	33.55%	91.27%	0.00%	8.46%	**-82.81%**
SEM 15	8.73%	100.00%			
		ALERTAS			**-82.81%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

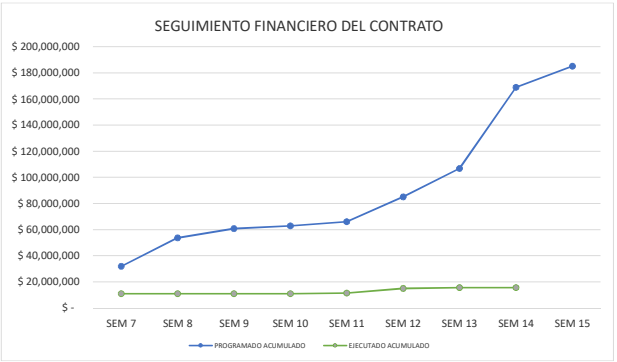

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 29,276,105	$ 31,904,649	$ 11,018,172	$ 11,018,172	$ -20,886,477
SEM 8	$ 21,813,109	$ 53,717,758	$ -	$ 11,018,172	$ -42,699,586
SEM 9	$ 7,142,525	$ 60,860,282	$ -	$ 11,018,172	$ -49,842,110
SEM 10	$ 2,051,672	$ 62,911,954	$ -	$ 11,018,172	$ -51,893,782
SEM 11	$ 3,187,369	$ 66,099,323	$ 477,082	$ 11,495,254	$ -54,604,069
SEM 12	$ 18,984,315	$ 85,083,638	$ 3,489,028	$ 14,984,282	$ -70,099,356
SEM 13	$ 21,717,065	$ 106,800,703	$ 680,275	$ 15,664,557	$ -91,136,146
SEM 14	$ 62,067,108	$ 168,867,811	$ -	$ 15,664,557	$ -153,203,254
SEM 15	$ 16,148,550	$ 185,016,361			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	44076		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	44074		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	44075		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	44076		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		2/10/2020			**-60.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/10/2020		27/10/2020			**-57.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	27/10/2020	3/11/2020	29/10/2020			**-7.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	29/10/2020		4/11/2020			**-31.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		28/10/2020			**-60.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		1/12/2020			**-25.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		21/11/2020			**-26.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	14/10/2020		1/12/2020			**-46.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**102**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**2**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó poda de árboles en el Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, en las demás sedes no realizó actividades. También se realizó visita en los centros donde el Contratista realizó actividades encontrando lo siguiente:
1.Sede Administrativa se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
2.Centro Administrativo de Comercio y Turismo (Montería): se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
3.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Montelíbano: se realizó mantenimiento de aires acondicionados.
4.Centro Administrativo de Comercio y Turismo Lorica: se realizó mantenimiento de aires acondicionados y poda de césped y árboles, se resalta que en esta actividad se presentaron mayores cantidades de obra
5.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Los Garzones: se realizó poda de árboles.
6.Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel: se realizó poda de árboles.
Otra actividad que aduce el Contratista que realizó fue la pradización de jardines, la cual en la visita no se evidencia que se haya realizado, ni tampoco existe un registro fotográfico que avale que se haya realizado dicha actividad.

Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	14	DEL	23 de noviembre de 2020	AL	29 de noviembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7	13-oct-20	El Consorcio Constructor Alfa inicio actividades en la Sede de Lorica sin haber presentado el debido soporte de las afiliaciones, dicho personal que se encontraba laborando sin haber presentado ningún documento de ingreso ni tener los elementos de protección personal, por lo anterior es responsabilidad del Consorcio Constructor Alfa cualquier incidente o accidente laboral que suceda, por el ingreso no autorizado del personal sin elementos de protección personal y sin pagos de seguridad social, además toda vez que realice actividad sin la previa autorización de la Interventoría no se será reconocida y serán a su cuenta y riesgo. En la presente semana el Contratista continúa con el retraso por la mala ejecución de su programa de obra.
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	26-oct-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.

TREINTA	30	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

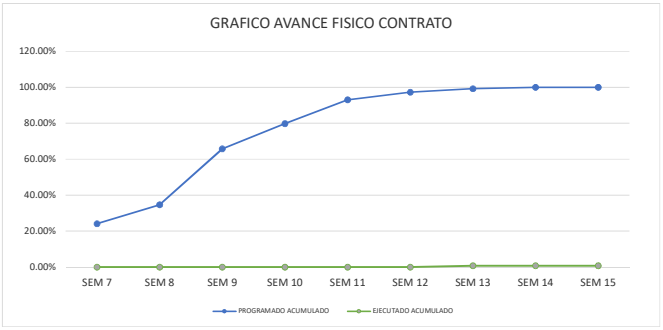


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	14.40%	24.11%	0.00%	0.00%	**-24.11%**
SEM 8	10.56%	34.67%	0.00%	0.00%	**-34.67%**
SEM 9	31.09%	65.77%	0.00%	0.00%	**-65.77%**
SEM 10	14.00%	79.77%	0.00%	0.00%	**-79.77%**
SEM 11	13.27%	93.04%	0.00%	0.00%	**-93.04%**
SEM 12	4.22%	97.25%	0.00%	0.00%	**-97.25%**
SEM 13	1.98%	99.24%	0.74%	0.74%	**-98.50%**
SEM 14	0.76%	100.00%	0.00%	0.74%	**-99.26%**
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	0.74%	**-99.26%**
		ALERTAS			**-99.26%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

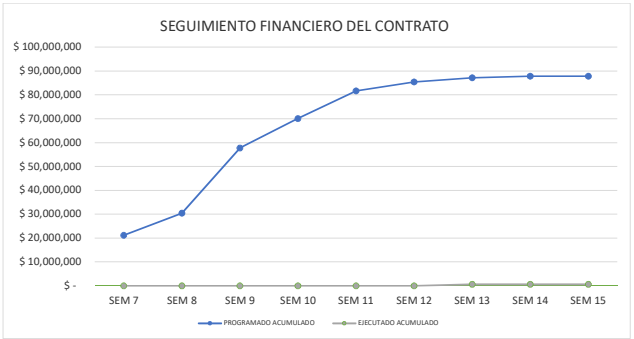

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 12,645,341	$ 21,171,791	$ -	$ -	**$ -21,171,791**
SEM 8	$ 9,273,839	$ 30,445,630	$ -	$ -	**$ -30,445,630**
SEM 9	$ 27,304,511	$ 57,750,140	$ -	$ -	**$ -57,750,140**
SEM 10	$ 12,292,529	$ 70,042,669	$ -	$ -	**$ -70,042,669**
SEM 11	$ 11,654,752	$ 81,697,421	$ -	$ -	**$ -81,697,421**
SEM 12	$ 3,702,152	$ 85,399,573	$ -	$ -	**$ -85,399,573**
SEM 13	$ 1,741,572	$ 87,141,145	$ 648,380	$ 648,380	**$ -86,492,765**
SEM 14	$ 668,998	$ 87,810,143	$ -	$ 648,380	**$ -87,161,763**
SEM 15	$ -	$ 87,810,143	$ -	$ 648,380	**$ -87,161,763**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	29/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	29/09/2020		29/09/2020			**-68.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		23/10/2020			**-67.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	13/10/2020		6/11/2020			**-54.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	23/10/2020		28/10/2020			**-44.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	5/10/2020		13/10/2020			**-62.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		5/10/2020			**-67.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		5/10/2020			**-67.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	28/10/2020		26/11/2020			**-39.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	5/10/2020		1/12/2020			**-62.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

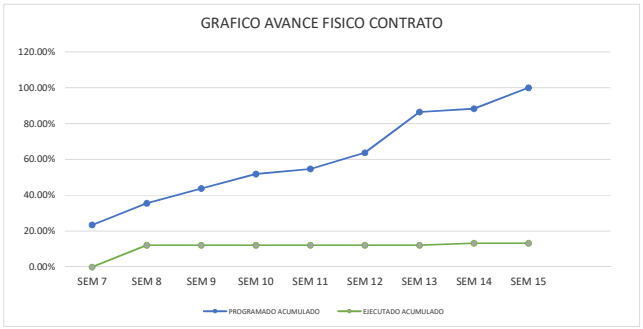


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	11.77%	23.46%	0.00%	0.00%	**-23.46%**
SEM 8	12.11%	35.58%	12.14%	12.14%	**-23.44%**
SEM 9	8.26%	43.83%	0.00%	12.14%	**-31.69%**
SEM 10	8.08%	51.91%	0.00%	12.14%	**-39.77%**
SEM 11	2.82%	54.73%	0.00%	12.14%	**-42.59%**
SEM 12	9.06%	63.79%	0.00%	12.14%	**-51.65%**
SEM 13	22.67%	86.46%	0.00%	12.14%	**-74.32%**
SEM 14	1.85%	88.31%	1.13%	13.27%	**-75.04%**
SEM 15	11.69%	100.00%	0.00%	13.27%	**-86.73%**
ALERTAS					**-86.73%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

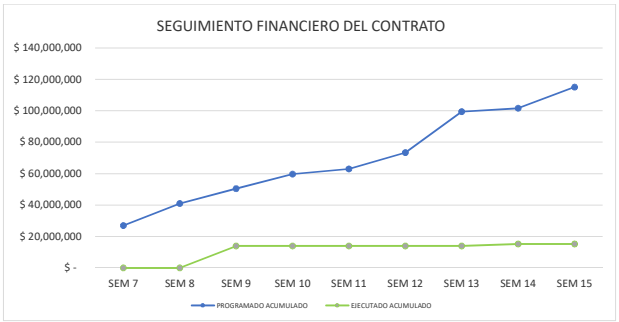

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 13,549,625	$ 26,999,142	$ -	$ -	**$ -26,999,142**
SEM 8	$ 13,941,619	$ 40,940,761	$ -	$ -	**$ -40,940,761**
SEM 9	$ 9,500,179	$ 50,440,940	$ 13,971,792	$ 13,971,792	**$ -36,469,148**
SEM 10	$ 9,300,879	$ 59,741,819	$ -	$ 13,971,792	**$ -45,770,027**
SEM 11	$ 3,241,811	$ 62,983,630	$ -	$ 13,971,792	**$ -49,011,837**
SEM 12	$ 10,429,087	$ 73,412,717	$ -	$ 13,971,792	**$ -59,440,924**
SEM 13	$ 26,084,347	$ 99,497,064	$ -	$ 13,971,792	**$ -85,525,272**
SEM 14	$ 2,130,904	$ 101,627,968	$ 1,296,760	$ 15,268,552	**$ -86,359,416**
SEM 15	$ 13,453,290	$ 115,081,258	$ -	$ 15,268,552	**$ -99,812,706**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL	1/10/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	1/10/2020		1/10/2020			**-66.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	2/10/2020		3/11/2020			**-65.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	1/10/2020		2/10/2020			**-66.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/10/2020		13/10/2020			**-65.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		20/10/2020			**-54.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	20/10/2020		3/11/2020			**-47.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/10/2020		16/10/2020			**-65.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		1/12/2020			**-33.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	2/10/2020		7/10/2020			**-65.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
4	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	
5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

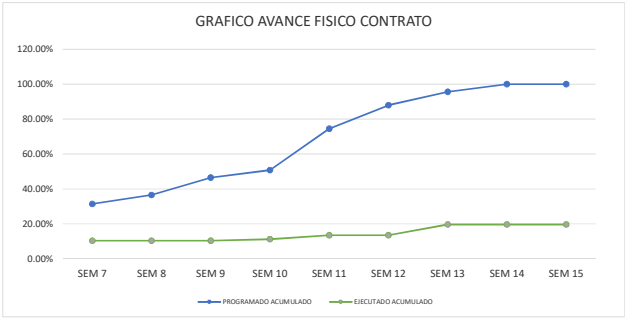


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	15.56%	31.47%	10.38%	10.38%	**-21.09%**
SEM 8	5.10%	36.57%	0.00%	10.38%	**-26.19%**
SEM 9	10.02%	46.59%	0.00%	10.38%	**-36.22%**
SEM 10	4.21%	50.80%	0.88%	11.25%	**-39.55%**
SEM 11	23.73%	74.54%	2.29%	13.54%	**-60.99%**
SEM 12	13.43%	87.97%	0.00%	13.54%	**-74.42%**
SEM 13	7.68%	95.65%	6.14%	19.68%	**-75.97%**
SEM 14	4.35%	100.00%	0.00%	19.68%	**-80.32%**
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	**-80.32%**
ALERTAS					**-80.32%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

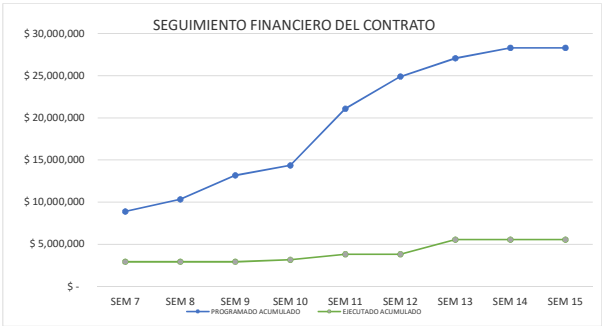

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 4,400,242	$ 8,901,614	$ 2,935,096	$ 2,935,096	**$ -5,966,518**
SEM 8	$ 1,442,724	$ 10,344,338	0	$ 2,935,096	**$ -7,409,242**
SEM 9	$ 2,835,511	$ 13,179,849	0	$ 2,935,096	**$ -10,244,753**
SEM 10	$ 1,189,920	$ 14,369,769	248,100	$ 3,183,196	**$ -11,186,573**
SEM 11	$ 6,713,529	$ 21,083,298	648,380	$ 3,831,576	**$ -17,251,722**
SEM 12	$ 3,799,428	$ 24,882,726	0	$ 3,831,576	**$ -21,051,150**
SEM 13	$ 2,173,332	$ 27,056,057	1,736,700	$ 5,568,276	**$ -21,487,781**
SEM 14	$ 1,230,174	$ 28,286,231	0	$ 5,568,276	**$ -22,717,955**
SEM 15	$ -	$ 28,286,231	0	$ 5,568,276	**$ -22,717,955**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	2/10/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	2/10/2020		2/10/2020			**-65.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	3/10/2020		7/10/2020			**-64.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/10/2020		5/10/2020			**-65.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	3/10/2020	26/10/2020	13/10/2020	3/11/2020		**-23.00**	**-21.00**
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		21/10/2020			**-54.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	21/10/2020		23/10/2020			**-46.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3/10/2020		19/10/2020			**-64.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	23/10/2020		20/11/2020			**-44.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		26/11/2020			**-33.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	21/10/2020		1/12/2020			**-46.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
4	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

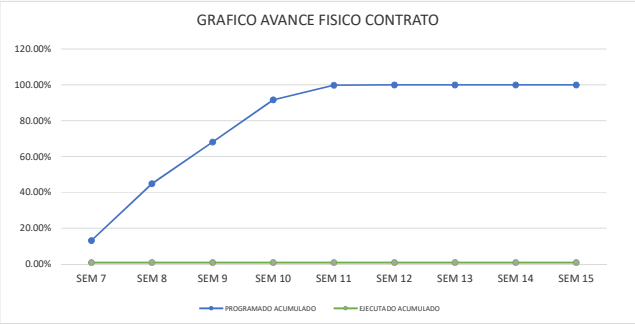


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	5.73%	13.17%	0.91%	0.91%	**-12.26%**
SEM 8	31.77%	44.94%	0.00%	0.91%	**-44.03%**
SEM 9	23.18%	68.13%	0.00%	0.91%	**-67.21%**
SEM 10	23.55%	91.67%	0.00%	0.91%	**-90.76%**
SEM 11	8.16%	99.83%	0.00%	0.91%	**-98.92%**
SEM 12	0.17%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 13	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 14	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
ALERTAS					**-99.09%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

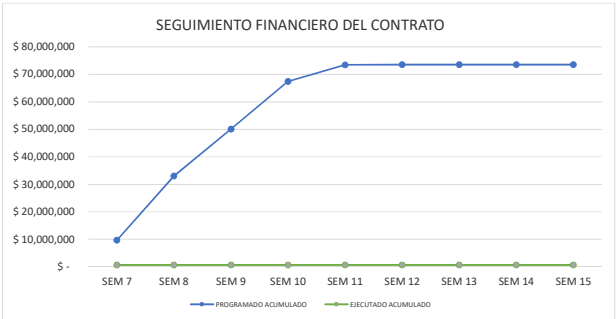

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 4,214,013	$ 9,688,179	$ 671,630	$ 671,630	**$ -9,016,549**
SEM 8	$ 23,375,009	$ 33,063,188	$ -	$ 671,630	**$ -32,391,558**
SEM 9	$ 17,055,702	$ 50,118,890	$ -	$ 671,630	**$ -49,447,260**
SEM 10	$ 17,323,038	$ 67,441,928	$ -	$ 671,630	**$ -66,770,298**
SEM 11	$ 6,002,426	$ 73,444,354	$ -	$ 671,630	**$ -72,772,724**
SEM 12	$ 122,116	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	**$ -72,894,840**
SEM 13	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	**$ -72,894,840**
SEM 14	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	**$ -72,894,840**
SEM 15	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	**$ -72,894,840**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	30/09/2020		24/11/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	30/09/2020		30/09/2020				
2	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		6/10/2020				
3	EQUIPOS DE BOMBEO	6/10/2020		10/10/2020				
4	LAVADO DE TANQUES	10/10/2020		14/10/2020				
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/10/2020		19/10/2020				
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		4/11/2020				
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	4/11/2020		11/11/2020				
8	ITEM NO PREVSITOS	11/11/2020		24/11/2020				
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

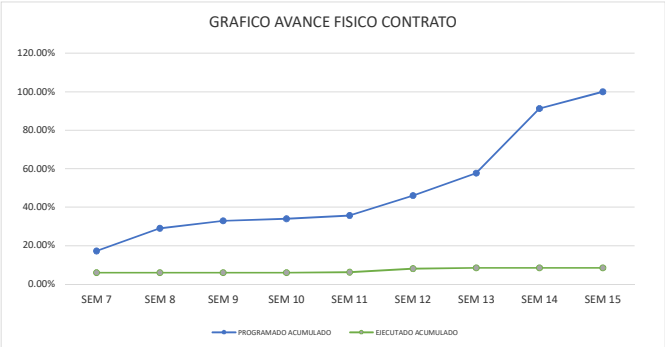


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	15.82%	17.24%	5.96%	5.96%	**-11.29%**
SEM 8	11.79%	29.03%	0.00%	5.96%	**-23.08%**
SEM 9	3.86%	32.89%	0.00%	5.96%	**-26.94%**
SEM 10	1.11%	34.00%	0.00%	5.96%	**-28.05%**
SEM 11	1.72%	35.73%	0.26%	6.21%	**-29.51%**
SEM 12	10.26%	45.99%	1.88%	8.09%	**-37.90%**
SEM 13	11.74%	57.73%	0.37%	8.46%	**-49.27%**
SEM 14	33.55%	91.27%	0.00%	8.46%	**-82.81%**
SEM 15	8.73%	100.00%	0.00%	8.46%	**-91.54%**
ALERTAS					**-91.54%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

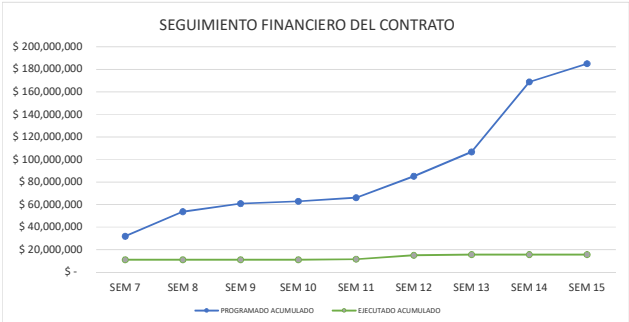

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 7	$ 29,276,105	$ 31,904,649	$ 11,018,172	$ 11,018,172	$ **-20,886,477**
SEM 8	$ 21,813,109	$ 53,717,758	$ -	$ 11,018,172	$ **-42,699,586**
SEM 9	$ 7,142,525	$ 60,860,282	$ -	$ 11,018,172	$ **-49,842,110**
SEM 10	$ 2,051,672	$ 62,911,954	$ -	$ 11,018,172	$ **-51,893,782**
SEM 11	$ 3,187,369	$ 66,099,323	$ 477,082	$ 11,495,254	$ **-54,604,069**
SEM 12	$ 18,984,315	$ 85,083,638	$ 3,489,028	$ 14,984,282	$ **-70,099,356**
SEM 13	$ 21,717,065	$ 106,800,703	$ 680,275	$ 15,664,557	$ **-91,136,146**
SEM 14	$ 62,067,108	$ 168,867,811	$ -	$ 15,664,557	$ **-153,203,254**
SEM 15	$ 16,148,550	$ 185,016,361	$ -	$ 15,664,557	$ **-169,351,804**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020			**-69.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		2/10/2020			**-67.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/10/2020		27/10/2020			**-64.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	27/10/2020	3/11/2020	29/10/2020			**-7.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	29/10/2020		4/11/2020			**-38.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		28/10/2020			**-67.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		1/12/2020			**-32.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		21/11/2020			**-33.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	14/10/2020		1/12/2020			**-53.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	26-oct-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

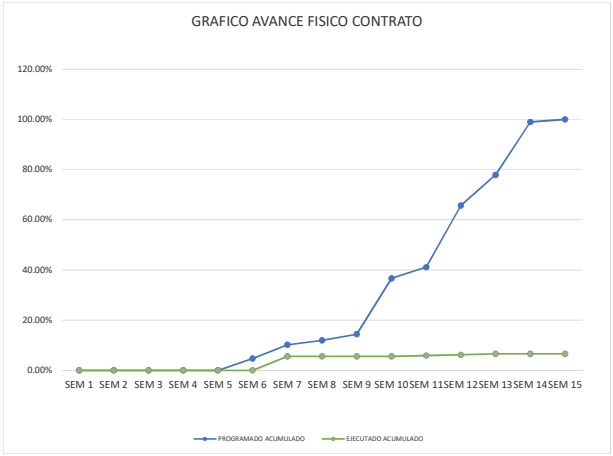


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 6	**4.74%**	4.74%	0.00%	0.00%	**-4.74%**
SEM 7	**5.45%**	10.18%	5.62%	5.62%	**-4.56%**
SEM 8	**1.77%**	11.95%	0.00%	5.62%	**-6.33%**
SEM 9	**2.51%**	14.45%	0.00%	5.62%	**-8.83%**
SEM 10	**22.20%**	36.66%	0.00%	5.62%	**-31.04%**
SEM 11	**4.43%**	41.08%	0.30%	5.92%	**-35.16%**
SEM 12	**24.59%**	65.67%	0.28%	6.21%	**-59.47%**
SEM 13	**12.21%**	77.88%	0.39%	6.60%	**-71.29%**
SEM 14	**21.09%**	98.97%	0.00%	6.60%	**-92.38%**
SEM 15	**1.03%**	100.00%	0.00%	6.60%	**-93.40%**
		ALERTAS			**-93.40%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

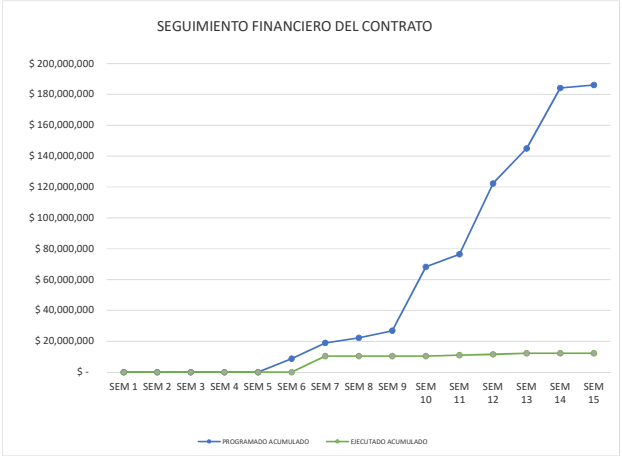

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEM 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEM 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEM 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEM 6	$ 8,814,431	$ 8,814,431	$ -	$ -	$ -8,814,431
SEM 7	$ 10,133,847	$ 18,948,278	$ 10,460,813	$ 10,460,813	$ -8,487,465
SEM 8	$ 3,286,307	$ 22,234,585	$ -	$ 10,460,813	$ -11,773,772
SEM 9	$ 4,667,040	$ 26,901,625	$ -	$ 10,460,813	$ -16,440,812
SEM 10	$ 41,321,978	$ 68,223,603	$ -	$ 10,460,813	$ -57,762,790
SEM 11	$ 8,236,821	$ 76,460,424	$ 563,176	$ 11,023,989	$ -65,436,436
SEM 12	$ 45,759,725	$ 122,220,150	$ 524,019	$ 11,548,007	$ -110,672,143
SEM 13	$ 22,727,630	$ 144,947,780	$ 732,134	$ 12,280,141	$ -132,667,638
SEM 14	$ 39,251,669	$ 184,199,448	$ -	$ 12,280,141	$ -171,919,307
SEM 15	$ 1,908,550	$ 186,107,998	$ -	$ 12,280,141	$ -173,827,857

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020			**-69.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		14/10/2020			**-67.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/10/2020	3/11/2020	11/11/2020			**-10.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		24/10/2020			**-53.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	28/09/2020		7/10/2020			**-69.00**	
6	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020	5/10/2020	21/10/2020			**-5.00**	
7	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/10/2020		26/11/2020			**-64.00**	
8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			**-36.00**	
9	ITEM NO PREVSITOS	28/09/2020		30/11/2020			**-69.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**25**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	15	DEL	30 de noviembre de 2020	AL	6 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

SIETE	7	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

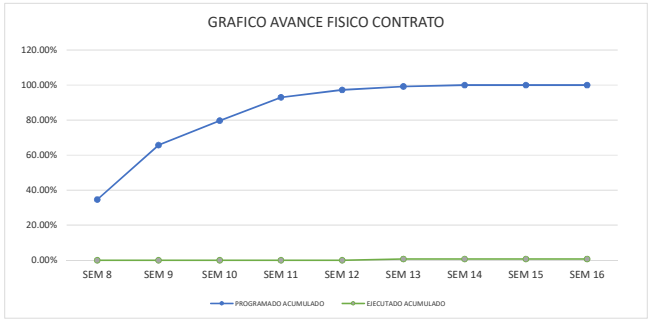


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	10.56%	34.67%	0.00%	0.00%	**-34.67%**
SEM 9	31.09%	65.77%	0.00%	0.00%	**-65.77%**
SEM 10	14.00%	79.77%	0.00%	0.00%	**-79.77%**
SEM 11	13.27%	93.04%	0.00%	0.00%	**-93.04%**
SEM 12	4.22%	97.25%	0.00%	0.00%	**-97.25%**
SEM 13	1.98%	99.24%	0.74%	0.74%	**-98.50%**
SEM 14	0.76%	100.00%	0.00%	0.74%	**-99.26%**
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	0.74%	**-99.26%**
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	0.74%	**-99.26%**
		ALERTAS			**-99.26%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

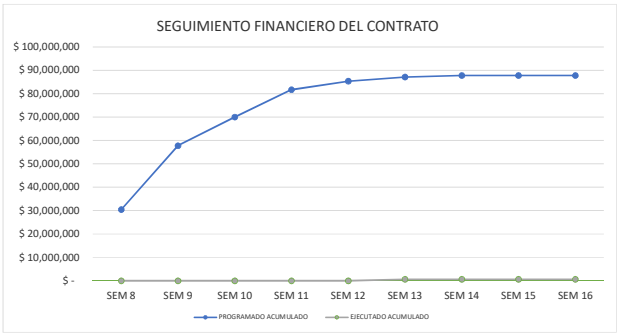

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 9,273,839	$ 30,445,630	$ -	$ -	**$ -30,445,630**
SEM 9	$ 27,304,511	$ 57,750,140	$ -	$ -	**$ -57,750,140**
SEM 10	$ 12,292,529	$ 70,042,669	$ -	$ -	**$ -70,042,669**
SEM 11	$ 11,654,752	$ 81,697,421	$ -	$ -	**$ -81,697,421**
SEM 12	$ 3,702,152	$ 85,399,573	$ -	$ -	**$ -85,399,573**
SEM 13	$ 1,741,572	$ 87,141,145	$ 648,380	$ 648,380	**$ -86,492,765**
SEM 14	$ 668,998	$ 87,810,143	$ -	$ 648,380	**$ -87,161,763**
SEM 15	$ -	$ 87,810,143	$ -	$ 648,380	**$ -87,161,763**
SEM 16	$ -	$ 87,810,143	$ -	$ 648,380	**$ -87,161,763**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	29/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	29/09/2020		29/09/2020			**-75.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		23/10/2020			**-74.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	13/10/2020		6/11/2020			**-61.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	23/10/2020		28/10/2020			**-51.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	5/10/2020		13/10/2020			**-69.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		5/10/2020			**-74.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		5/10/2020			**-74.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	28/10/2020		26/11/2020			**-46.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	5/10/2020		1/12/2020			**-69.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

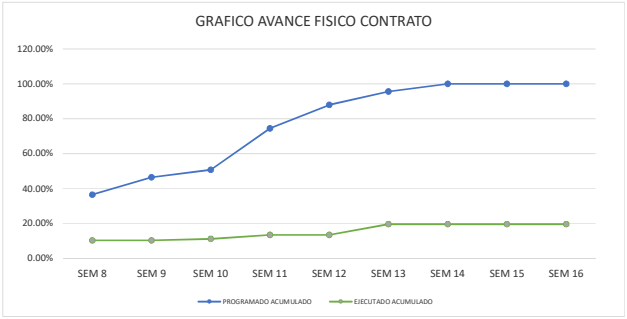


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	5.10%	36.57%	0.00%	10.38%	**-26.19%**
SEM 9	10.02%	46.59%	0.00%	10.38%	**-36.22%**
SEM 10	4.21%	50.80%	0.88%	11.25%	**-39.55%**
SEM 11	23.73%	74.54%	2.29%	13.54%	**-60.99%**
SEM 12	13.43%	87.97%	0.00%	13.54%	**-74.42%**
SEM 13	7.68%	95.65%	6.14%	19.68%	**-75.97%**
SEM 14	4.35%	100.00%	0.00%	19.68%	**-80.32%**
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	**-80.32%**
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	**-80.32%**
ALERTAS					**-80.32%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

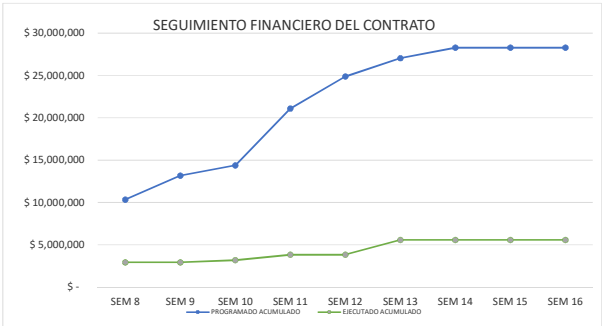

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 1,442,724	$ 10,344,338	0	$ 2,935,096	$ -7,409,242
SEM 9	$ 2,835,511	$ 13,179,849	0	$ 2,935,096	$ -10,244,753
SEM 10	$ 1,189,920	$ 14,369,769	248,100	$ 3,183,196	$ -11,186,573
SEM 11	$ 6,713,529	$ 21,083,298	648,380	$ 3,831,576	$ -17,251,722
SEM 12	$ 3,799,428	$ 24,882,726	0	$ 3,831,576	$ -21,051,150
SEM 13	$ 2,173,332	$ 27,056,057	1,736,700	$ 5,568,276	$ -21,487,781
SEM 14	$ 1,230,174	$ 28,286,231	0	$ 5,568,276	$ -22,717,955
SEM 15	$ -	$ 28,286,231	0	$ 5,568,276	$ -22,717,955
SEM 16	$ -	$ 28,286,231	0	$ 5,568,276	$ -22,717,955

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	2/10/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	2/10/2020		2/10/2020			**-72.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	3/10/2020		7/10/2020			**-71.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/10/2020		5/10/2020			**-72.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	3/10/2020	26/10/2020	13/10/2020	3/11/2020		**-23.00**	**-21.00**
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		21/10/2020			**-61.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	21/10/2020		23/10/2020			**-53.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3/10/2020		19/10/2020			**-71.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	23/10/2020		20/11/2020			**-51.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		26/11/2020			**-40.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	21/10/2020		1/12/2020			**-53.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

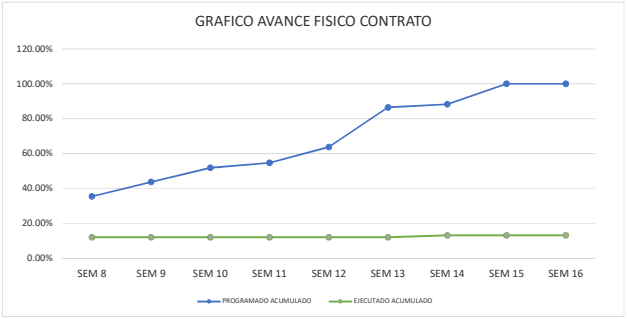


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	12.11%	35.58%	12.14%	12.14%	**-23.44%**
SEM 9	8.26%	43.83%	0.00%	12.14%	**-31.69%**
SEM 10	8.08%	51.91%	0.00%	12.14%	**-39.77%**
SEM 11	2.82%	54.73%	0.00%	12.14%	**-42.59%**
SEM 12	9.06%	63.79%	0.00%	12.14%	**-51.65%**
SEM 13	22.67%	86.46%	0.00%	12.14%	**-74.32%**
SEM 14	1.85%	88.31%	1.13%	13.27%	**-75.04%**
SEM 15	11.69%	100.00%	0.00%	13.27%	**-86.73%**
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	13.27%	**-86.73%**
		ALERTAS			**-86.73%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

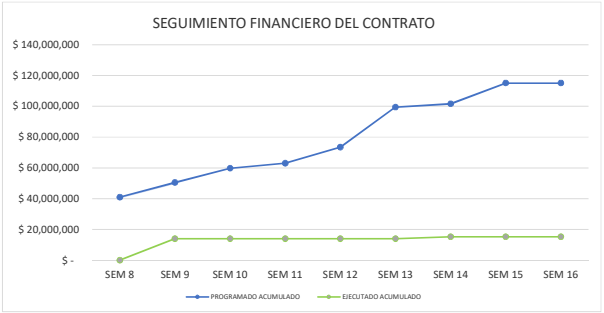

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 13,941,619	$ 40,940,761	$ -	$ -	**$ -40,940,761**
SEM 9	$ 9,500,179	$ 50,440,940	$ 13,971,792	$ 13,971,792	**$ -36,469,148**
SEM 10	$ 9,300,879	$ 59,741,819	$ -	$ 13,971,792	**$ -45,770,027**
SEM 11	$ 3,241,811	$ 62,983,630	$ -	$ 13,971,792	**$ -49,011,837**
SEM 12	$ 10,429,087	$ 73,412,717	$ -	$ 13,971,792	**$ -59,440,924**
SEM 13	$ 26,084,347	$ 99,497,064	$ -	$ 13,971,792	**$ -85,525,272**
SEM 14	$ 2,130,904	$ 101,627,968	$ 1,296,760	$ 15,268,552	**$ -86,359,416**
SEM 15	$ 13,453,290	$ 115,081,258	$ -	$ 15,268,552	**$ -99,812,706**
SEM 16	$ -	$ 115,081,258	$ -	$ 15,268,552	**$ -99,812,706**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL	1/10/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	1/10/2020		1/10/2020			**-73.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	2/10/2020		3/11/2020			**-72.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	1/10/2020		2/10/2020			**-73.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/10/2020		13/10/2020			**-72.00**	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		20/10/2020			**-61.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	20/10/2020		3/11/2020			**-54.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/10/2020		16/10/2020			**-72.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		1/12/2020			**-40.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	2/10/2020		7/10/2020			**-72.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7768738301	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7768734177	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7768723140	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

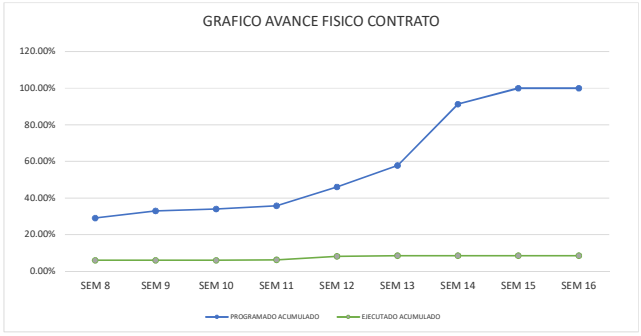


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	11.79%	29.03%	0.00%	5.96%	**-23.08%**
SEM 9	3.86%	32.89%	0.00%	5.96%	**-26.94%**
SEM 10	1.11%	34.00%	0.00%	5.96%	**-28.05%**
SEM 11	1.72%	35.73%	0.26%	6.21%	**-29.51%**
SEM 12	10.26%	45.99%	1.88%	8.09%	**-37.90%**
SEM 13	11.74%	57.73%	0.37%	8.46%	**-49.27%**
SEM 14	33.55%	91.27%	0.00%	8.46%	**-82.81%**
SEM 15	8.73%	100.00%	0.00%	8.46%	**-91.54%**
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	8.46%	**-91.54%**
		ALERTAS			**-91.54%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

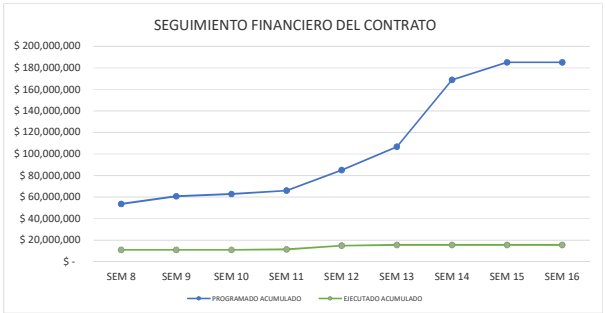

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 21,813,109	$ 53,717,758	$ -	$ 11,018,172	**$ -42,699,586**
SEM 9	$ 7,142,525	$ 60,860,282	$ -	$ 11,018,172	**$ -49,842,110**
SEM 10	$ 2,051,672	$ 62,911,954	$ -	$ 11,018,172	**$ -51,893,782**
SEM 11	$ 3,187,369	$ 66,099,323	$ 477,082	$ 11,495,254	**$ -54,604,069**
SEM 12	$ 18,984,315	$ 85,083,638	$ 3,489,028	$ 14,984,282	**$ -70,099,356**
SEM 13	$ 21,717,065	$ 106,800,703	$ 680,275	$ 15,664,557	**$ -91,136,146**
SEM 14	$ 62,067,108	$ 168,867,811	$ -	$ 15,664,557	**$ -153,203,254**
SEM 15	$ 16,148,550	$ 185,016,361	$ -	$ 15,664,557	**$ -169,351,804**
SEM 16	$ -	$ 185,016,361	$ -	$ 15,664,557	**$ -169,351,804**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020			**-76.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		2/10/2020			**-74.00**	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/10/2020		27/10/2020			**-71.00**	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	27/10/2020	3/11/2020	29/10/2020			**-7.00**	
6	LAVADO DE TANQUES	29/10/2020		4/11/2020			**-45.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		28/10/2020			**-74.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		1/12/2020			**-39.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		21/11/2020			**-40.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	14/10/2020		1/12/2020			**-60.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	26-oct-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

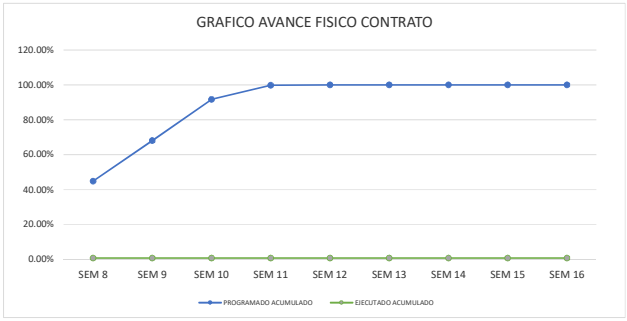


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	31.77%	44.94%	0.00%	0.91%	**-44.03%**
SEM 9	23.18%	68.13%	0.00%	0.91%	**-67.21%**
SEM 10	23.55%	91.67%	0.00%	0.91%	**-90.76%**
SEM 11	8.16%	99.83%	0.00%	0.91%	**-98.92%**
SEM 12	0.17%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 13	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 14	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	0.91%	**-99.09%**
ALERTAS					**-99.09%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

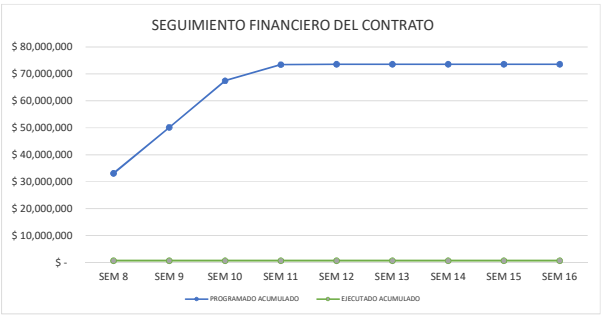

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 23,375,009	$ 33,063,188	$ -	$ 671,630	$ -32,391,558
SEM 9	$ 17,055,702	$ 50,118,890	$ -	$ 671,630	$ -49,447,260
SEM 10	$ 17,323,038	$ 67,441,928	$ -	$ 671,630	$ -66,770,298
SEM 11	$ 6,002,426	$ 73,444,354	$ -	$ 671,630	$ -72,772,724
SEM 12	$ 122,116	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 13	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 14	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 15	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840
SEM 16	$ -	$ 73,566,470	$ -	$ 671,630	$ -72,894,840

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	30/09/2020		24/11/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	30/09/2020		30/09/2020			**-74.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		6/10/2020			**-73.00**	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	6/10/2020		10/10/2020			**-68.00**	
4	LAVADO DE TANQUES	10/10/2020		14/10/2020			**-64.00**	
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/10/2020		19/10/2020			**-59.00**	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		4/11/2020			**-73.00**	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	4/11/2020		11/11/2020			**-39.00**	
8	ITEM NO PREVSITOS	11/11/2020		24/11/2020			**-32.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 8,777,298,757**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	30 DÍAS	Prórroga:	15 DÍAS
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

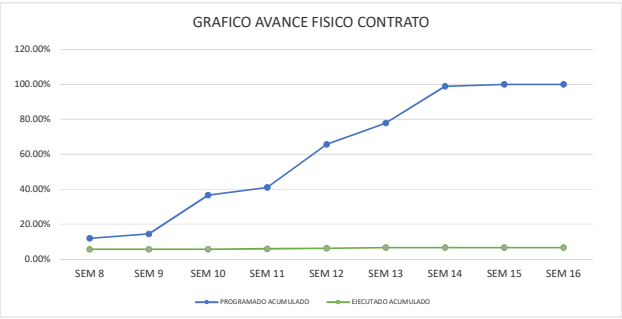


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	1.77%	11.95%	0.00%	5.62%	-6.33%
SEM 9	2.51%	14.45%	0.00%	5.62%	-8.83%
SEM 10	22.20%	36.66%	0.00%	5.62%	-31.04%
SEM 11	4.43%	41.08%	0.30%	5.92%	-35.16%
SEM 12	24.59%	65.67%	0.28%	6.21%	-59.47%
SEM 13	12.21%	77.88%	0.39%	6.60%	-71.29%
SEM 14	21.09%	98.97%	0.00%	6.60%	-92.38%
SEM 15	1.03%	100.00%	0.00%	6.60%	-93.40%
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	6.60%	-93.40%
		ALERTAS			-93.40%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

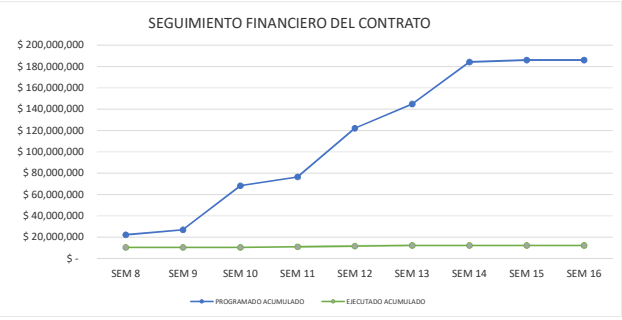

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 8	$ 3,286,307	$ 22,234,585	$ -	$ 10,460,813	$ -11,773,772
SEM 9	$ 4,667,040	$ 26,901,625	$ -	$ 10,460,813	$ -16,440,812
SEM 10	$ 41,321,978	$ 68,223,603	$ -	$ 10,460,813	$ -57,762,790
SEM 11	$ 8,236,821	$ 76,460,424	$ 563,176	$ 11,023,989	$ -65,436,436
SEM 12	$ 45,759,725	$ 122,220,150	$ 524,019	$ 11,548,007	$ -110,672,143
SEM 13	$ 22,727,630	$ 144,947,780	$ 732,134	$ 12,280,141	$ -132,667,638
SEM 14	$ 39,251,669	$ 184,199,448	$ -	$ 12,280,141	$ -171,919,307
SEM 15	$ 1,908,550	$ 186,107,998	$ -	$ 12,280,141	$ -173,827,857
SEM 16	$ -	$ 186,107,998	$ -	$ 12,280,141	$ -173,827,857

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	28/09/2020		1/12/2020				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020			**-76.00**	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		14/10/2020			**-74.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/10/2020	3/11/2020	11/11/2020			**-10.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		24/10/2020			**-60.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	28/09/2020		7/10/2020			**-76.00**	
6	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020	5/10/2020	21/10/2020			**-5.00**	
7	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/10/2020		26/11/2020			**-71.00**	
8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			**-43.00**	
9	ITEM NO PREVSITOS	28/09/2020		30/11/2020			**-76.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**132**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**18**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	16	DEL	7 de diciembre de 2020	AL	13 de diciembre de 2020

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12-oct-20	18-oct-20	SEMANA No. 8	19-oct-20	En la presenta semana el Contratista continúa con el atraso debido a que tenían previsto una Inversión programada de $ 140.934.740,42 que equivale 11,26% y solo logró ejecutar un valor de 248.100 que equivale al 0,02% del valor del Contrato (no incluye AIU) y toda esta actividad fue realizada sin la previa autorización de la entrada del personal a la obra.
19-oct-20	25-oct-20	SEMANA No. 9	26-oct-20	En la presente semana se realizaron actividades en los centros de Santa Lucia y de Montelíbano con instalación de manto, de cielo raso y de pintura. Continua la preocupación de la Interventoría por la no iniciación de las actividades en todas las sedes del departamento de Córdoba, lo cual está generando atrasos imputables al Consorcio Constructor Alfa hasta la semana 9 tenían previsto una Inversión Programada de $ 418.970.691,81 que equivale al 25,79 % y solo llevan ejecutado $ 73.172.461 que equivale al 5,85% lo que equivale un atraso del 19,94 %. lo que se presume que el Consorcio Alfa no va cumplir con el plazo contractual de la obra.
26-oct-20	1-nov-20	SEMANA No. 10	3-nov-20	Nuevamente se solicitó un Plan detallado de trabajo, donde se indique un cronograma, recursos y acciones que tomará el Contratista para recuperar el atraso que presenta el proyecto al día hoy en el departamento de Córdoba y así cumplir con el plazo contractual de la obra, toda vez que lo anterior fue solicitado mediante comunicado CINP-BTA-023-0327- 6114 del pasado 27 de octubre, a la fecha no se tiene respuesta
2-nov-20	8-nov-20	SEMANA No. 11	9-nov-20	En la presente semana el Contratista realizó poda de Césped en la sede administrativa, y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería. Se realizó Comité de Obra donde se le manifestó al Contratista la preocupación por el bajo rendimiento que presenta en la ejecución de las actividades principalmente en las contractuales y que a falta de menos de 1 mes y no se ha visto el avance que tenían previsto según su programación de obra. Al corte de esta semana el Consorcio Alfa tenían previsto una inversión acumulada para el departamento de Córdoba de $ 390.608.445,45 que equivale al 60,67% y solo llevan ejecutado un $ 50.483.948,50 que equivale al 7,46% lo que representa un atraso del 53,21%.
9-nov-20	15-nov-20	SEMANA No. 12	17-nov-20	La presente semana el Contratista realizó actividades en el Centro de Comercio Industria y Turismo, y en la Sede Administrativo poda de césped y de árboles. En las demás sedes no se realiza actividades sin justificación. Se solicitó al Contratista presentar el Informe Diagnostico de las visitas eléctricas que realizó el especialista el pasado 28 de septiembre, además de la inclusión de las actividades de la instalación de energía de al Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir sede los Garzones Montería.
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de $ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 58.294.484 presentando un atraso de $ 480.714.735.
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Lorica la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.

CATORCE	14	días del mes de	DICIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.
