ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

ATENCIÓN INTEGRAL EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., ZONA 3 SUR OCCIDENTE

COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN

INFORME MENSUAL No. 14

Versión 0

Original

Bogotá D.C., diciembre de 2020

CONTROL DE LA REVISIÓN

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
1	Documento Original	N/A	08/12/2020
2			

Firma	[Firma en documento impreso]	[Firma en documento impreso]	[Firma en documento impreso]
Nombre	Ing. Hugo Francisco Aponte	Ing. Luis Eduardo Acosta	Ing. Luis Mario Varón
Cargo	Ingeniero Residente	Director de Proyecto	Representante Legal Contratista
	Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma	[Firma en documento impreso]	[Firma en documento impreso]	[Firma en documento impreso]
Nombre	Ing. Julián Andrés Álvarez	Ing. Sergio Valderrama	Ing. Nicolai Wilches
Cargo	Residente Interventoría	Director de Interventoría	Supervisor Interventoría
	Revisó	Revisó	Revisó

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVO 4

GENERALIDADES 4

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4

3.2 LOCALIZACION DE LA OBRA 4

4 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 5

4.1 RECURSOS UTILIZADOS 5

4.1.1 PERSONAL DEL CONTRATO 5

4.1.2 EQUIPOS UTILIZADOS 6

4.1.3 MATERIALES UTILIZADOS 7

4.2 RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 8

5 ANEXOS 43

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual del contrato 1782 de 2019, proyecto: “REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN BOGOTÁ, EN LA ZONA SUR OCCIDENTE DE LA CIUDAD”.

El informe corresponde al periodo comprendido entre el 29 de noviembre y el 28 de diciembre de 2020, al cumplirse el décimo cuarto mes de la ejecución.

OBJETIVO

El objetivo del presente documento es presentar un resumen de las actividades realizadas por el contratista en el desarrollo del décimo cuarto mes del contrato en lo que corresponde a las actividades de obra.

GENERALIDADES

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en “ATENDER EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, EN LA ZONA 3 SUR OCCIDENTE DE LA CIUDAD” y se desarrolla en cumplimiento del Contrato 1782 de 2019, cuyo objeto es “EL CONTRATISTA se obliga con LA SECRETARIA a realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá, en la Zona Sur Occidente”.

3.2 LOCALIZACION DE LA OBRA

Los trabajos de implementación de señalización horizontal y vertical serán ejecutados en la red vial de la **zona sur occidente de** la ciudad de Bogotá.

La zona centro comprende las localidades de:

08. Kennedy

09. Fontibón

06. Tunjuelito

4 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

4.1 RECURSOS UTILIZADOS

4.1.1 PERSONAL DEL CONTRATO

Para la ejecución de los trabajos de obra, el CONSORCIO DE SEÑALIZACION D.C., cuenta con el personal solicitado en los Términos de Referencia, el cual fue aprobado por la Interventoría, y se relaciona a continuación:

C.C.	EMPLEADO	CARGO	ARL
1.016.036.144	Angie Yamile Barbosa Jiménez	Secretaria	SURA
81.717.588	Giovanni Armando Caicedo Rincón	Georreferenciador	SURA
1033722011	Manuel Ibagué Coca	Almacenista	SURA
54.259.052	Nelly Ríos Perlaza	Mensajera	SURA
79.938.276	Hugo Francisco Aponte López	Ing. Residente	SURA
79.626.040	Luis Eduardo Acosta	Director de Obra	Positiva
80.818.373	Mario Andrés Varón	Gerente financiero	SURA
80.810.885	Boddy Andrés Grajales Vera	Supervisor de Vertical	SURA
79.519.898	Adriana Núñez Camelo	Trabajadora Social	ser
1018431658	Fasleidy Camargo	Ing. Residente	SURA
80.502.486	Wilson Andrés Morales Álvarez	Conductor 1	SURA
17594602	Fabio Enrique Martínez	SISO	Positiva
GRUPO / CUADRILLA 1 (MIGUEL GRANADA)			
CC: 1.033.792.481	Jusselfy Hernández	Aux. de cuadrilla	POSITIVA
CC: 1.006.015.116	Jonatan Iguad	Aux. de cuadrilla	POSITIVA
CC: 1.033.767.275	Henry Otálora	Aux. de cuadrilla	POSITIVA
CC: 1.033.790.875	Andrés Parra	Jefe de cuadrilla	POSITIVA
GRUPO / CUADRILLA 2 (GONZALO SONATI)			
PE-931922219071987	Henrol Pinto	Jefe de cuadrilla	POSITIVA
PE-944412631051995	Víctor Lima	Aux. de cuadrilla	POSITIVA
GRUPO / CUADRILLA 3 (Miller Morales)			
CC: 1.022.346.321	Alvarino Romero	Jefe de cuadrilla	Axa Colpatria
CC: 1.071.914.609	Elkin Zubieta	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria

CC: 1.072.427.701	John Berrio	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria
PE-936765417071987	Javier García	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria
PE-953879205011996	Wilfredo Caballero	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria
CC: 1.071.914.651	José Cetina	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria
CC: 1.006.658.291	Luis Galindo	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria
CC: 1.033.741.928	Andrés Ibañez	Jefe de cuadrilla	Axa Colpatria
CC: 1.022.346.321	Alvarino Romero	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria
CC: 1.071.914.609	Elkin Zubieta	Aux. de cuadrilla	Axa Colpatria

4.1.2 EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS DE APLICACION			
	EQUIPO MINIMO	**CANT**	**CAPACIDAD MINIMA**
1	Vehículos autopropulsados y/o montados para aplicación de pintura liquida que tengan incorporado el equipo delineador el cual deberá poseer, como mínimo dos (2) boquillas para la aplicación de pintura acrilica y otras tres (3) para la aplicación de micro esfera tipo drop–on sembrado, NTC 4744-2 numeral 5.2 CAMION DELINEADOR, MARCA DONG FENG, COMBUSTIBLE DIESSEL, SERIE 2012, PLACA TSW-675, VIDA UTIL DE 10 AÑOS, CAPACIDAD 5 TON, COMPRESOR DE 180 PSI, 6 PISTOLAS DE PINTURA Y MICROESFERA, CONTROLADOR ELECTRICO, MAQUINA ROAD LAZER CON TRES BOMBAS QUE PUEDEN TRABAJAR DE MANERA INDEPENDIENTE, 1 TANQUE DE MICROESFERA CAPACIDAD DE 325 KG, CAMARA Y MONITOR.	1	Según NTC 4744-2
2	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación plástico en frio NTC 4744-2 numeral 5.2 MAQUINA DELINEADORA H-26, PROCEDENCIA ALEMANA, PARA FORMULACION 98-2	1	Doscientos (400 L) litros
3	Maquina manual para pintura liquida NTC 4744-2 numeral 5.1 . MARCA POWER TWIN REF. 8900 XLT, MAQUINA MANUAL AIRLESS CON POTENCIA DE 3000 LIBRAS DE PRESIÓN CON UN MOTOR DE 2 CABALLOS DE FUERZA. MODELO 2010, VIDA UTIL 15 AÑOS	3.	5 Galones de pintura

	Maquina manual para aplicación de plástico en frio M2, NTC 4744-2 numeral 5.1	2	5 Galones de pintura
5	Equipo Autopropulsado aplicación en caliente. MARCA TERMO RAYAS, MODELO 2010, CAPACIDAD DE LA CALDERA 400 KG, CAPACIDAD DEL TANQUE DE MICROESFERA 75 KG, FUENTE DE ALIMENTACIÓN CALDERA DE 750 KG, PUEDE HACER ANCHOS D ELINEA DESDE 8 CM HASTA 20 CM.	1	400 KG
4	CAMIONETA FORD EXPLORER PARA INSPECCIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	1	5 CUPOS

EQUIPOS DE CONTROL	
CANTIDAD	**DESCRIPCION**
1	Velocímetro
1	Galga para la verificación de espesores húmedos
1	Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos POSIPEN
1	Retro-reflecto metro MIROLUX, MODELO ULTRA 30
1	Lupa con aumento de 80x
1	Cinta métrica
1	Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar Marca MINIMA MT-241
1	Equipo para medir humedad relativa. Marca

4.1.3 MATERIALES UTILIZADOS

RELACION DE MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	MARCA	LOTE
Pintura bicomponente spray blanco	GMP	107409T
Pintura bicomponente spray amarillo	PINTUCO	IU9-230910 / IU9-230927
Micro esfera	SWARCO	101717-E
Pintura base solvente blanca	ROAD LINE	74
Pintura base solvente amarilla	ROAD LINE	50
Pintura base solvente negra	ROAD LINE	30 / 27
Pintura llana blanca	PINTUCO	IU9-231052

Pintura llana Amarilla	GMP	107443 / 107432 /107445
Estoperol plástico	EFEXPORT ZF S.A.S	N/A
Papel Reflectivo	3M	G17066 / BIE2 / 2BIE1 /
Antideslizante	PINTUCO	JU9-229427 /

4.2 RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

Para el periodo comprendido del 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2020, se adelantaron trabajos de señalización vial en los siguientes puntos:

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL		
ID	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
MV_08_260_1244_11 INTERSECCION IDU	CL 41SUR CON KR 78	KENNEDY
new jersey	CALLE 13 ENTRE KR 104 Y KR 135	FONTIBON
EX_08_043_1556_10	CALLE 42B SUR CON KR 72Q	KENNEDY
ZE_08_461_943_10	ENTRE KR 75 Y KR 73 DESDE LA AC 5A HASTA LA CL 6	KENNEDY
MV_AV_BOYACA_941_09	Av. BOYACA CON CL 71B BIS	CIUDAD BOLIVAR

SEÑALIZACION HORIZONTAL		
ID	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
MV_09_048 / MV_09_189	CALLE 13 ENTRE KR 1OO Y KR 135	FONTIBON

SEÑALIZACION VERTICAL		
ID	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
EMERGENCIA KM 1 CALERA	KM 1 CALERA	CHAPINERO
EMERGENCIA KR 1E CL 77	KR 1E CL 77	CHAPINERO
MV_03_001_1783_19	VIA A CHOACHI	SANTAFE
PASACALLES	CALLE 13	FONTIBON

4.3 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Para el periodo comprendido del 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2020, se adjunta cuadro de acta de obra en medio físico y magnético.

4.4 AVANCE DE ACTIVIDADES DE INSPECCION E IMPLEMENTACION

Ver CD Hoja de Vida Zona Sur Occidente

4.5 REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD

Ver anexo 1

4.6 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

Ver anexo 2

4.7 ENSAYOS DE LABORATORIO (PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO)

Ver anexo 3

4.8 PROBLEMAS PRESENTADOS

En el presente mes no se presentaron circunstancias adversas que pudieran afectar significativamente las metas económicas del contrato.

4.9 PLANILLAS DE OBRA

Ver anexo 4

4.10 HOJA DE VIDA DEL CONTRATO

Ver anexo 5

4.11 ID´s CON GARANTIA MENORES A SEIS (6) MESES

Para el presente mes se presenta un ID con garantía menor o igual a seis meses, corresponde a la calle 13 entre kr 100 y kr 135.

4.12 RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

Ver anexo 6

4.13 REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD CHAPINERO

EMERGENCIA KM 1 CALERA

EMERGENCIA KR 1E CL 77

LOCALIDAD KENNEDY

MV_08_260_1244_11 INTERSECCION IDU













29 dic. 2020 11:41:48 p. m.
4.6185N 74.1563W
Kennedy
Bogotá

EX_08_043_1556_10







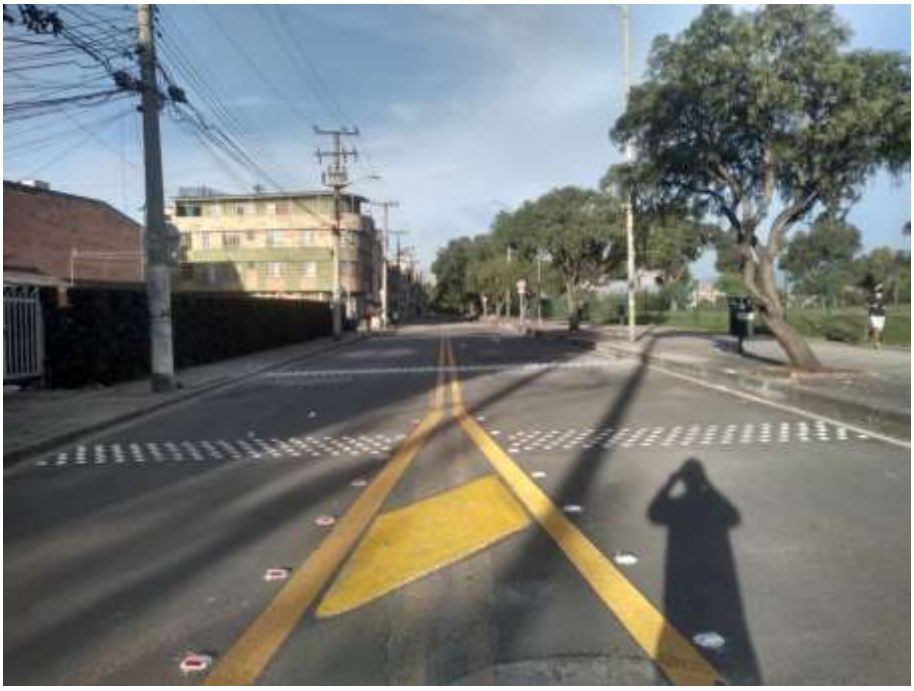


ZE_08_461_943_10




14 dic. 2020 12:50:46 a. m.
4.6280N 74.1430W
73-35 Calle 5
Kennedy
Bogotá



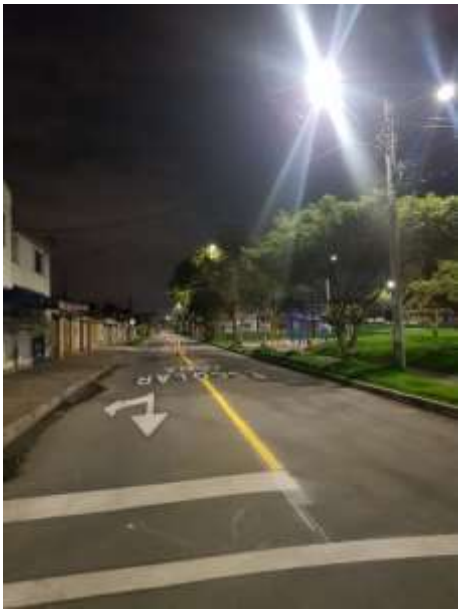





CIUDAD BOLIVAR

MV_AV_BOYACA_941_09





FONTIBON

New jersey





MV_09_048 / MV_09_189







SANTAFE

MV_03_001_1783_19






21/12/2020 04:38 PM


21/12/2020 04:48 PM

PASACALLES


-RUTA ALTERNA A AV CENTENARIO-
ENTRE LAS 2:00 PM Y 7:30 PM
TOMAR CL 17 Y KR 116 HACIA LA AV. ESPERANZA


-RUTA ALTERNA A AV CENTENARIO-
ENTRE LAS 2:00 PM Y 7:30 PM
TOMAR CL 17 Y KR 116 HACIA LA AV. ESPERANZA


RUTA ALTERNA A AV CENTENARIO
ENTRE LAS 2:00 PM Y 7:30 PM
TOMAR AV ESPERANZA HASTA CARRERA 128


RUTA ALTERNA A AV CENTENARIO
ENTRE LAS 2:00 PM Y 7:30 PM
TOMAR AV ESPERANZA HASTA CARRERA 128

4.14 ACTIVIDADES DE ELABORACION Y TRAMITE DE APROBACION PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

No.	ID	CODIGO	TIPO	LOCALIDAD	COI
12	COMPROMISOS PRIORITARIOS KENNEDY	PMT 012N	**N**	KENNEDY	COI 08/COI 20
14	COMPROMISOS PRIORITARIOS TUNJUELITO	PMT 014N	**N**	TUNJUELITO	COI 08/COI 20

18	CP KENNEDY: 1.CP_SDM-DSVCT-7089, 17. CP_SDM_76913-19, 21.CP_SDM-52014-19, 125. CP_SDQS-138374-2018, 134. CP_SDM-27566-18, 135. CP_SDM-243618-18, 144.CP_SDM-259296-18, 146. CP-SDM-294379-18, 150.SDQS-1891962018,154. CP_SDM-316519-18, 160.CP_SDM-316509-18, 161. CP_SLM_180320-00001, 170. CP_SDM-356525-18	PMT 018N	**N**	KENNEDY	COI 08/COI 20
19	CP TUNJUELITO: 25.CP_CLM_18051-000083, 10.CP_SDM-229731-18	PMT 019N	**N**	TUNJUELITO	COI 08/COI 20
20	CP FONTIBÓN: 17.CP_SDM-293996-18	PMT 020N	**N**	FONTBON	COI 08/COI 20
21	MV_AV_CALI_941_09_V24	PMT 021N	**N**	CORREDOR	COI 08/COI 20
22	MV_AV_BOYACA_941_09_V29-CALZADAS RAPIDAS	PMT 022N	**N**	CORREDOR	COI 07/COI 20
23	CP KENNEDY: 130.CP_SDM-DSC-136240-18	PMT 023N	**N**	KENNEDY	COI 08/COI 20
24	CP KENNEDY: 134.CP_SDM-275666-18, 17.CP-SDM-76913-19	PMT 024N	**N**	KENNEDY	COI 08/COI 20
27	EX_09_201_1881_12	PMT 027N	**N**	FONTIBON	COI 07/COI 19
28	EX_08_323_1867_12	PMT 028N	**N**	KENNEDY	COI 07/COI 19

29	EX_08_327_1867_12	PMT 029N	**N**	KENNEDY	COI 07/COI 19
30	ZE_06_269_937_09	PMT 030N	**N**	TUNJUELITO	COI 07/COI 19
31	ZE_06_168_1561_10	PMT 031N	**N**	TUNJUELITO	COI 07/COI 19
34	EM_08_124_V10	PMT 034N	**N**	TUNJUELITO	COI 08/COI 20
35	MV_AV_BOYACA_941_09_V29-CALZADAS LENTAS	PMT 035N	**N**	CORREDOR	COI 08/COI 20
37	MV_AV_CALI_941_09_V24 ENTRE DG3/CL46S	PMT 037N	**N**	CORREDOR	COI 09/COI 20
38	EX_08_042_1556_10_V6	PMT 038N	**N**	KENNEDY	COI 10/COI 20
49	CP 141-KENNEDY	PMT 049N	**N**	KENNEDY	COI 23
50	CP 42-FONTIBÓN	PMT 050N	**N**	FONTIBON	COI 23
51	CP 17-FONTIBÓN	PMT 051N	**N**	FONTIBON	COI 30
52	CP 168-FONTIBÓN	PMT 052N	**N**	FONTIBON	COI 28

53	CP 26-FONTIBÓN	PMT 053N	**N**	FONTIBON	COI 25
54	Ciclorruta CL13 MV_09_189_1556_10_V9, MV_09_048_1556_10_V5	PMT 054N	**E**	CORREDOR	COI EMERGENCIA
54	Ciclorruta CL13 MV_09_189_1556_10_V9, MV_09_048_1556_10_V5	PMT 054N	**N**	CORREDOR	COI 26
55	EX_09_001_1214_15	PMT 055N	**E**	FONTIBON	COI EMERGENCIA
55	EX_09_001_1214_15	PMT 055N	**E**	FONTIBON	COI 27
56	CP TUNJUELITO CP30	PMT 056N	**N**	FONTIBON	COI 31
57	KR79-CL45S	PMT 057E	**E**	FONTIBON	COI EMERGENCIA

4.15 REGISTRO DE LLUVIAS

MES	14	
FECHA	DESCRIPCION	LOCALIDAD
29/11/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
30/11/2020	LLUVIAS EN LA NOCHE	ZONA SUR - OCCIDENTAL
1/12/2020	LLUVIAS EN LA NOCHE	ZONA SUR - OCCIDENTAL
2/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
3/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
4/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
5/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
6/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
7/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
8/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
9/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
10/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
11/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
12/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
13/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
14/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
15/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
16/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
17/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
18/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
19/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
20/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
21/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
22/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
23/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
24/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
25/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
26/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
27/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL
28/12/2020	NO LLOVIO	ZONA SUR - OCCIDENTAL

4.16 BITACORA DE OBRA

Ver anexo 7

4.17 COMITES DE OBRA

Ver anexo

4.18 AVANCE DE FABRICACION EN SEÑALIZACION VERTICAL

ID	Cuenta	Localidad	Dirección	Estado
ID 82	1	CHAPINERO	CL 75 ENTRE AK 11 Y KR 13	Ejecutado
ID 162	1	CHAPINERO	CL 69 ENTRE AK 7 Y KR 7A	Ejecutado
ID 163	1	CHAPINERO	CL 65 ENTRE KR 9 Y KR 10	Ejecutado
ID 23	1	CHAPINERO	CL 72BIS ENTRE KR 5 Y KR 7	Ejecutado
ID 15	1	CHAPINERO	CALLE 68 ENTRE KR 12 Y AK 13	Ejecutado
ID 16	1	CHAPINERO	KR 8 ENTRE CL 69 Y CL 70	Ejecutado
ID 18	1	CHAPINERO	CL 70A ENTRE KR 4 Y KR 5	Ejecutado
ID 97	1	CHAPINERO	KR 12 ENTRE CL 71 Y AC 72	Ejecutado
ID 10	1	CHAPINERO	CALLE 65 ENTRE KR 11 Y AK 13	Ejecutado
ID 19	1	CHAPINERO	CL 70A ENTRE KR 7 Y KR 9	Ejecutado
ID 26	1	CHAPINERO	CL 64 ENTRE KR 7 Y KR 8	Ejecutado
ID 186	1	CHAPINERO	CL 70A ENTRE ENTRE KR 5 Y KR 7	Ejecutado
SEÑALES SR-30 (50)	1	FONTIBON	CORREDOR CALLE 13	Ejecutado
EX_09_031_1556_10	2	FONTIBON	KR 112 - KR 113 (BICICARRIL ATAHUALPA)	Ejecutado
ID 159	2	CHAPINERO	KR 14 ENTRE CL 75 Y CL 76	Ejecutado
ID 160	2	CHAPINERO	CL 70 ENTRE KR 12 Y AK 14	Ejecutado
ID 182	2	CHAPINERO	KR 18 ENTRE CL 79 - CL 79A	Ejecutado
ID 167	2	CHAPINERO	CL 77 ENTRE KR 13 Y KR 14	Ejecutado
ID 30	2	CHAPINERO	KR 12A ENTRE CL 77 Y CL 77A	Ejecutado
ID 110	2	CHAPINERO	KR 13A ENTRE CL 78 Y CL 79	Ejecutado
CP_SDM-DTI-173219-17	2	KENNEDY	CL 21A S entre KR 68I y KR 69	Ejecutado
CP_SDM-119278-18	2	KENNEDY	CL 38 S CON KR 89C	Ejecutado

CP_SDM-164518-18	2	KENNEDY	CL 42B Bis S entre KR 78F y KR 78G	Ejecutado
CP_CLM-180530-000118	2	KENNEDY	CL 38A S ENTRE KR 72H Y KR 72i	Ejecutado
CP_CLM-180417-000004	2	KENNEDY	KR 68L Bis entre CL 37D S	Ejecutado
CP_CLM-180718-000034	2	KENNEDY	KR 79C con CL 6, CL 6 con KR 80G	Ejecutado
CP_SDM-87682-14	2	KENNEDY	CL 6 entre KR 78 y KR 78H	Ejecutado
CP_CLM-180320-000003	2	KENNEDY	CL 21 S entre KR 69B	Ejecutado
CP_SDM-113155-19	2	KENNEDY	KR 80I entre DG 42F S y Av. Villavicencio	Ejecutado
CP_SDM-87682-14	2	KENNEDY	CL 6 entre KR 78 y KR 78H	Ejecutado
CP_SDM-195981-19	2	KENNEDY	CL 19 S CON KR 69B	Ejecutado
CP_SDM-272125-18	2	KENNEDY	KR 72N con CL 35A S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-147422-18	2	KENNEDY	KR 89C entre CL 38 S y CL 41 S	Ejecutado
CP_SDM- DTI- 42156-19	2	KENNEDY	CL 38 S entre KR 78 y KR 78B	Ejecutado
MV _09_278_1703	3	FONTIBON	KR 112 - KR 113 (BICICARRIL ATAHUALPA)	Ejecutado
ID 29	3	CHAPINERO	CL 77 ENTRE AK 15 Y KR 16A	Ejecutado
EX_18_158_1244_11	3	RAFAEL URIBE	ENTRE CL 46 S Y CL 47 S ENTRE AK 14A Y KR 22	Ejecutado
EX_02_033 (PATINETAS)	3	CHAPINERO	KR 13 ENTRE CL 98 - CL 99	Ejecutado
PATINETAS CALLE 88 ENTRE KR 16 Y 17	3	CHAPINERO	CALLE 88 ENTRE KR 16 Y 17	Ejecutado
PATINETAS CALLE 88 ENTRE KR 13 Y 14	3	CHAPINERO	CALLE 88 ENTRE KR 13 Y 14	Ejecutado
CLM-181002-000006	3	TUNJUELITO	DG 50 S ENTRE AK 54 Y KR 54B	Ejecutado
CLM-181114-000025	3	KENNEDY	KR 73 ENTRE CL 9 Y CL 8B Bis	Ejecutado
SDM-236118-19	3	KENNEDY	KR 83 entre CL 13A y CL 15A	Ejecutado
CP_SDQS-2236492018	3	KENNEDY	KR 69B con CL 3 S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-239733-18	3	KENNEDY	KR 72G entre CL 39B S y CL 40 S	Ejecutado
CP_SDM-DSVCT-270989-18	3	KENNEDY	AV AMERICAS CON CARRERA 78G	Ejecutado
CP_SDM-DTI-128946-18	3	KENNEDY	KR 73C entre CL 5B y DG 5A	Ejecutado
CP_SDM-DTI-181689-18	3	KENNEDY	entre KR 74B Y KR 78 entre CL 35A S y CL 35 S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-228915-18	3	KENNEDY	Cuadrante vial desde la CL 6 hasta la CL 6B entre TV 78C y KR 80G	Ejecutado

CP_SDM-DTI-238838-18	3	KENNEDY	KR 82A entre Av las Américas (Dg 3) y CL 6B	Ejecutado
CP_SDM-DTI-239184-18	3	KENNEDY	KR 73 entre CL 36 S y CL 37 S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-258434-19	3	KENNEDY	CL 42B S entre KR 81G y AK 86	Ejecutado
CP_SDM-DTI-262632-18	3	KENNEDY	KR 69A entre CL 19 S y CL 21 S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-270985-18	3	KENNEDY	KR 79C entre CL 40C S y CL 41B S	Ejecutado
CP_SDQS-30312019	3	KENNEDY	KR 73B Bis No 26-20 S	Ejecutado
CP_SDM-104163-19	3	KENNEDY	CL 33A S con KR 78D Bahía	Ejecutado
CP_SDM-SI-149468-19	3	KENNEDY	KR 69B ENTRE CL 19 S Y AC 26 S	Ejecutado
CP_SDQS-55955-19	3	KENNEDY	Acceso sur y norte puente peatonal Estación Mundo Aventura	Ejecutado
CP_SDM-SI-174589-19	3	KENNEDY	CL 48 S entre Av. Ciudad de Cali y KR 87	Ejecutado
CP_SDM-SI-187392-19	3	KENNEDY	KR 69D POR CL 3 S	Ejecutado
CP_SDQS-66734-2019	3	KENNEDY	CL 42G S entre KR 74 y KR 78	Ejecutado
CP_SDQS-1135762019	3	KENNEDY	KR 89 Bis CON CL 42G S	Ejecutado
CP_SDQS-709692019	3	KENNEDY	KR 87B Bis CON CL 40B S	Ejecutado
CP_SDQS-1672882019	3	KENNEDY	KR 87I entre CL 42F S y CL 43 S	Ejecutado
CP_Solicitud Subdirección	3	KENNEDY	CL 56F Bis S con AK 89B (Av tintal)	Ejecutado
CP_Solicitud Gerente de la localidad-19	3	KENNEDY	KR 22 POR CL 46 S	Ejecutado
MV_08_001_1703_10	4	KENNEDY	INTERSECCIÓN KR 79 CON CL 42SUR	Ejecutado
CP_CLM-181101-000034	4	TUNJUELITO	KR 11A CON CL 53 S	Ejecutado
SDQS-1891962018	4	KENNEDY	CL 8A Bis ENTRE KR 79 y KR 80	Ejecutado
CP_SDM-322422-18	4	TUNJUELITO	AK 14 CON DG 48 S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-207452-17	4	TUNJUELITO	CL 47 S ENTRE TV 14 Y KR 19 BIS	Ejecutado
CP_SDM-DTI-217089-2018	4	TUNJUELITO	KR 61 ENTRE AC 45A SUR Y KR 60F	Ejecutado
CP_SDM-304215-18	4	TUNJUELITO	DG 54 S CON KR 18B Y CL 53 S CON KR 18B	Ejecutado
CP_SDM-DTI-167232-17	4	TUNJUELITO	KR 37A ENTRE CL 52A S Y CL 53 S	Ejecutado
CP_CLM-181021-000014	4	TUNJUELITO	KR 54 ENTRE AUTOSUR Y DG 47 S	Ejecutado
OGS_22760119	4	TUNJUELITO	CARRERA 27 CON CALLE 49A SUR	Ejecutado
CP_SQDS-1387272019	4	KENNEDY	KR 69D con CL 3 S, KR 69D con CL 8 S	Ejecutado

SDM-76913	4	KENNEDY	CL 38C S No 87F – 30 y CL 38A Bis S No 87F – 27	Ejecutado
EX_08_338_1867_12	4	KENNEDY	CL 5A ENTRE AV. BOYACA Y KR 71	Ejecutado
EX_09_200_1881_12	4	FONTIBON	CALLE 23D ENTRE AV. CALI Y TV 88B	Ejecutado
EX_08_323_1867_12	4	KENNEDY	KR 78 CON CL 35A SUR	Ejecutado
CP_SDM-DSC-136240-18	4	KENNEDY	CL 7C Bis con KR 73B	Ejecutado
Av. Calle 13	5	FONTIBON	CALLE 16 CON AV. CIUDAD DE CALI	Ejecutado
AV_BOYACA	6	TUNJUELITO	AV. BOYACA ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y AUTO SUR	Ejecutado
CP_SDM-DSC-83051-18	6	KENNEDY	KR 79G entre CL 42A S	Ejecutado
EX_08_329_1867_12	7	KENNEDY	DESDE KR 89C HASTA KR 88F ENTRE CL 39A SUR Y CL 38B SUR	Ejecutado
EX_08_327_1867_12	7	KENNEDY	DESDE AK 80HASTA DG 56 SUR ENTRE CL 57D SUR Y CL 55 SUR	Ejecutado
ZE_06_269_937_09	7	TUNJUELITO	DESDE KR 19B HASTA LA KR 17 ENTRE LA CL 53S Y LA DG 49S	Ejecutado
EX_09_201_1881_12	7	FONTIBON	DESDES AC 22 HASTA CL 23G ENTRE TV 85C Y KR 82	Ejecutado
AV_BOYACA	7	TUNJUELITO	DESDE LA AV. PRIMERA DE MAYO HASTA LA AUTO SUR	Ejecutado
SDM-SCTT-225169-2019	7	KENNEDY	CL 41C SUR Y L 41D SUR ENTRE TV 78IBIS A Y TV 78HBISB	Ejecutado
SDM-318531-2019	7	KENNEDY	KR 72U POR CL 43B SUR	Ejecutado
SDM-286234	7	FONTIBON	AVENIDA CALLE 26 CON CARRERA 103	Ejecutado
SDM-237461	7	FONTIBON	CALLE 24C CON AVENIDA CIUDAD DE CALI	Ejecutado
SDM-15023-2020	7	KENNEDY	CL 6 SUR POR KR 72C	Ejecutado
SDM-554-20	7	KENNEDY	CALLE 48 SUR CON CARRERA 87	Ejecutado
CP_SDM-29716-19	7	KENNEDY	CL 57D S con KR 77I	Ejecutado
CP_SDM-25561-18	7	KENNEDY	KR 78G con CL 47B S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-48768-18	7	KENNEDY	CL 12A entre KR 71B Bis yKR 71D	Ejecutado
CP_SDM-119231-18	7	KENNEDY	CL 57A S entre KR 78 y KR 87F	Ejecutado
CP_SDM-DTI-169293-18	7	KENNEDY	KR 78GBisC con CL 48A S, KR 78H CON TV 78H	Ejecutado
CP_SDM-DTI-185606-18	7	KENNEDY	TV 78H Bis A con CL 44A S	Ejecutado
CP_SDM-DTI-262946-18	7	KENNEDY	CL 57A S con KR 78H	Ejecutado

CP_SDM-44960-2019	7	KENNEDY	DG 40C S entre KR 73 y KR 74	Ejecutado
CP_SDQS-2231072018	7	KENNEDY	CL 8C entre KR 79C y KR 80	Ejecutado
CP_SDM-DTI-272643-18	7	KENNEDY	CL 11 entre KR 72B y KR 72F	Ejecutado
CP_SDM-DTI-79420-18	7	KENNEDY	KR 72I entre CL 43A S y CL 42B S; CL 42B S entre KR 72I y KR 72H Bis	Ejecutado
CP_CLM-180524-000030	7	FONTIBON	CL 23 entre AK 68 y KR 68 A	Ejecutado
CP_SDM-33146-19	7	FONTIBON	KR 68B entre CL 25B y CL 26	Ejecutado
CP_SDM-DTI-184614-2018	7	FONTIBON	KR 80A Y KR 80B ENTRE CL 25B Y CL 25F	Ejecutado
CP_SDM-356361-18	7	FONTIBON	AC 24 ENTRE KR 103 YB KR 103B	Ejecutado
CP_SDM-DTI-184614-2018	7	FONTIBON	KR 80A Y KR 80B ENTRE CL 25B Y CL 25F	Ejecutado
CP_SDQS-2189562019	7	FONTIBON	KR 123B entre AC 17 y CL 17C	Ejecutado
CP_SD-SI-118425-19	7	FONTIBON	CL 17 entre KR 106 y KR 108	Ejecutado
CP_SDM-112701-19	7	KENNEDY	TV 80 G (Avenida Agoberto Mejía) entre CL 5 A S y DG 2 (Av. de las Américas)	Ejecutado
CP_SDQS-2309712018	7	KENNEDY	DG 38 S ENTRE TV 81C Y TV 81D; TV 80G CON DG 38 S	Ejecutado
CP_Solicitud semáforos-2018	7	FONTIBON	KR 68B con CL 25	Ejecutado
CP_SDM-DTI-10017-18	7	KENNEDY	KR 78F entre CL 53B S y CL 54A S	Ejecutado
CP_SDM-316519-18	8	KENNEDY	KR 69C entre AV 1 DE MAYO y CL 24A	Ejecutado
CP_CLM-181123-000032	8	TUNJUELITO	CL 52G S ENTRE ENTRE TV 35B Y KR 36A	Ejecutado
EX_06 _93_1244_11	8	TUNJUELITO	DESDE KR 12D Y DG 54 SUR ENTRE CL 60 SUR Y CL 58 SUR	Ejecutado
CP_CLM_180405_000032	8	TUNJUELITO	KR 53 ENTRE DG 46A S Y DG 47A S	Ejecutado
CP_SDM-229731-18	8	TUNJUELITO	CL 48C S entre KR 24D y KR 24	Ejecutado
EX_09_203_1881_12_V2	8	FONTIBON	DESDE AV. KR 116 HASTA KR 108 ENTRE CL 17 Y CL 22D BIS	Ejecutado
CP_SDM-231956-18	8	KENNEDY	TV 69B entre CL 9D y final de la vía	Ejecutado
SDM-274382	8	TUNJUELITO	TRANSVERASL 33 No. 48c - 21 SUR	Ejecutado
SDM-302062-2019	8	KENNEDY	KR 78G BIS C ENTRE CL 49B SUR Y CL 51 SUR	Ejecutado
SDM-303410-2019	8	KENNEDY	KR 72K BIS CON CALLE 40 SUR	Ejecutado
SDM-306808-19	8	KENNEDY	CARRERA 86D ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 2	Ejecutado
CP_SDM-DTI-91649-2018	8	FONTIBON	CL 18 entre KR 99 Y KR 100	Ejecutado

CP_SDM-DTI-179946-18	8	KENNEDY	CL 2 entre KR 87 y KR 87D	Ejecutado
SDM-SI-239075-2019	8	KENNEDY	KR 68D ENTRE CL 10A Y CL 11	Ejecutado
SDM-SI-239075-2019	8	KENNEDY	KR 68D ENTRE CL 10A Y CL 11	Ejecutado
SDM-SI-258927-2019	8	KENNEDY	KR 73C ENTRE CL 35C SUR Y CL 36BIS SUR	Ejecutado
SDM-SI-273763-2019	8	FONTIBON	CARRERA 81 ENTRE CALLE 24B Y 24C	Ejecutado
SDM-STP-195853-2019	8	FONTIBON	CARRERA 115 ENTRE CALLE 17 Y 17C	Ejecutado
SDM-SS-221749-19	8	TUNJUELITO	CALLE 53 SUR CON CARRERA 13F	Ejecutado
SDM-STP-260255-2019	8	FONTIBON	CALLE 23B ENTRE CARRERA 116 Y 113	Ejecutado
CP_SDQS-2186962019	8	KENNEDY	KR 79A con CL 11B Bis A	Ejecutado
SDQS-2384632019	8	KENNEDY	CALLE 41 SUR ENTRE CARRERA 82B Y CARRERA 86	Ejecutado
SI-216233-2019	8	FONTIBON	CALLE 22J ENTRE LA CARRERA 98A Y LA CARRERA 100	Ejecutado
RETIROS DE PEDESTALES	8	FONTIBON	CICLORUTA CALLE 13	Ejecutado
EX_09_203_1881_12_V2	9	FONTIBON	DESDE AV. KR 116 HASTA KR 108 ENTRE CL 17 Y CL 22D BIS	Ejecutado
EX_09_001	9	FONTIBON	DG 15A ENTRE KR 104 -KR 106 / KR 106 ENTRE DG 15A Y CL 17	Ejecutado
CP_CLM-181116-000006	9	KENNEDY	KR 72I ENTRE CL 41A S Y CL 45 S	Ejecutado
CP_CLM-180320-000001	9	KENNEDY	CL 42F S ENTRE KR 88A Y KR 88F BIS	Ejecutado
CP_SDM-336642-18	9	KENNEDY	KR 73B No 6B-12 MANZANA 2	Ejecutado
SDM-250304-19	9	KENNEDY	CALLE 9 ENTRE CARRERA 78G Y CARRERA 80	Ejecutado
CP_SDQS-2096672019	9	KENNEDY	KR 80C con CL 8C	Ejecutado
CP_SDQS-176672-2018	9	TUNJUELITO	CL 51 S CON AV. VILLAVICENCIO	Ejecutado
SDM-914-2020	9	FONTIBON	CALLE 13 CON CARRERA 68	Ejecutado
SDM-CORREO ELECTRONICO ENE/07/2020	9	KENNEDY	CARRERA 80C CON CALLE 8B	Ejecutado
SDM-2471882019	9	FONTIBON	CL 23 CON KR 103A	Ejecutado
CP_CLM-180427-000054	9	FONTIBON	CL 16I Bis frente al No. 110-31	Ejecutado
CP_SDM-391522-18	9	FONTIBON	KR 107A y TV 107A entre CL 17 y CL 16H	Ejecutado
CP_SDM-DTI-184605-18	9	FONTIBON	KR 98A entre DG 15A y DG 15D	Ejecutado
SDM-SI-249869	9	TUNJUELITO	DIAGONAL 50 SUR ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 54	Ejecutado

SDM-234694-19	9	KENNEDY	CARRERA 81 Y CARRERA 81D ENTRE AV. VILLAVICENCIO Y CALLE 42F SUR	Ejecutado
SDM-320942-2019	9	KENNEDY	CL 51 A SUR ENTRE KR 78G Y KR 78H	Ejecutado
CP_SDQS-2108342019	10	FONTIBON	TV 96B ENTRE CL 20A Y CL 20D	Ejecutado
SOLICITUD DE EMERGENCIA	10	FONTIBON	KR 100 CON CL 24	Ejecutado
CP_SDM_261160	10	FONTIBON	CALLE 24 A CALLE 24A, ENTRE CARRERAS 68A Y CARRERA 69D	Ejecutado
CP_SDQS-1740742019	10	KENNEDY	TV 78H Bis entre CL 41G S y CL 41G BIS S	Ejecutado
CP_SDM-401002-18	10	FONTIBON	KR 107 CON CL 22J	Ejecutado
CP_SDQS-1558112019	10	FONTIBON	KR 112B CON CL 22F	Ejecutado
CP_SDQS-2189972019	10	FONTIBON	KR 104A con CL 20	Ejecutado
CP_SDQS-2927372018	10	FONTIBON	CL 17A ENTRE KR 96C Y KR 96G	Ejecutado
CP_SDM-DTI-236009-18	10	FONTIBON	KR 68B entre CL 17 y CL 19	Ejecutado
CP_SDM-32318-19	10	FONTIBON	CL 25F entre KR 81D Bis y KR 75	Ejecutado
CP_SDM-DTI-35158-18	10	FONTIBON	CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE KR 88 Y KR 92 ENTRE AC 17 Y DG 17B	Ejecutado
CP_CLM-180524-000023	10	FONTIBON	KR 112 con CL 16J Bis	Ejecutado
CP_SDM-45718-19	10	FONTIBON	CL 20 entre KR 68A y KR 68B - KR 68B entre CL 20 y CL 21	Ejecutado
CP_SDM-SI-183307-19	10	FONTIBON	CL 16H entre KR 96B y KR 96	Ejecutado
CP_SDM-42121-19	10	FONTIBON	CL 21 entre AK 68D y KR 69	Ejecutado
CP_CLM-180815-000008	10	KENNEDY	KR 78C entre AV Américas y CL 6A Bis	Ejecutado
CP_SDM-DSC-215721-18	10	FONTIBON	DG 16 / AC 17 con KR 123	Ejecutado
CP_SDM-266091-18	10	FONTIBON	KR 69 ENTRE CL 24C Y CL 25	Ejecutado
SDM-STP-2032-2020	10	FONTIBON	AVENIDA CALLE 22 ENTRE CARRERAS 96D BIS Y 96I	Ejecutado
CP_SDM-DTI-36073-19	10	FONTIBON	CL 23 entre Kr 85A y Kr 86	Ejecutado
EX_10_008_1560_10	11	ENGATIVA	CALLE 64C ENTRE AV. 68 Y CARRERA 70	Ejecutado
EX_10_006_1560_10	11	ENGATIVA	AK 96 ENTRE CALLE 66A Y CALLE 72	Ejecutado
EX_10_372_1842_12	11	ENGATIVA	AK 96 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 80	Ejecutado
TPD_PL_2342	12	SANTA FE	PARQUE NACIONAL	Ejecutado
EX_10_377_1842_12	12	ENGATIVA	AK 96 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 80	Ejecutado

MV_12_281_941_09	12	BARRIOS UNIDOS	AK 96 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 80	Ejecutado
MV_09_048_1556_10	12	FONTIBON	CALLE 13 ENTRE KR 104 Y KR 111A	Ejecutado
INTERSECCIÓN CL 26 SUR CON CARRERA 78B	12	KENNEDY	CL 26 SUR CON CARRERA 78B	Ejecutado
EX_13_003_1560_10	12	TEUSAQUILLO	CALLE 22 ENTRE KR 40 Y KR 50	Ejecutado
INTERSECCIÓN CALLE 26 SUR CON CARRERA 75	12	KENNEDY	CALLE 26 SUR CON CARRERA 75	Ejecutado
MV_09_048_1556_10 / MV_09_189_1556_10	13	FONTIBON	CALLE 13 ENTRE KR 111A Y KR 135	Ejecutado
MV_08_039_1747_10	13	KENNEDY	CARRERA 79 CON CALLE 45 SUR	Ejecutado
CALLE 26 SUR CON CARRERA 78 K	13	KENNEDY	CALLE 26 SUR CON CARRERA 78 K	Ejecutado
MV_10_183_1747_10	13	ENGATIVA	AK 96 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 80	Ejecutado
PASACALLES	13	FONTIBON, KENNEDY	MADELENA , CARRERA 7 Y CALLE 13	Ejecutado
CP_CLM_181008-000046	13	FONTIBON	KR 103A entre CL 18 y CL 19	Ejecutado
SDM 243618-18 TPD_PL 417	13	KENNEDY	AV. Boyacá con CL 40 S	Ejecutado
SDM 243618-18 TPD_PL 417	13	KENNEDY	AV. Boyacá con CL 40 S	Ejecutado
EMERGENCIA	13	CHAPINERO	CL 83 CON TV 3	Ejecutado
EMERGENCIA	13	USME	Carrera 15 Este a la altura de la Calle 80 Sur.	Ejecutado
MV_08_260_1244_11 INTERSECCION IDU	14	KENNEDY	CL 41SUR CON KR 78	Ejecutado
new jersey	14	FONTIBON	CALLE 13 ENTRE KR 104 Y KR 135	Ejecutado
EX_08_043_1556_10	14	KENNEDY	CALLE 42B SUR CON KR 72Q	Ejecutado
ZE_08_461_943_10	14	KENNEDY	ENTRE KR 75 Y KR 73 DESDE LA AC 5A HASTA LA CL 6	Ejecutado
MV_AV_BOYACA_941_09	14	CIUDAD BOLIVAR	Av. BOYACA CON CL 71B BIS	Ejecutado
EMERGENCIA KM 1 CALERA	14	CHAPINERO	KM 1 CALERA	Ejecutado
EMERGENCIA KR 1E CL 77	14	CHAPINERO	KR 1E CL 77	Ejecutado
MV_03_001_1783_19	14	SANTAFE	VÍA CHOACHI	Ejecutado
PASACALLES	14	FONTIBON	CALLE 13	Ejecutado

4.19 RELACION DE SEÑALES SUMINISTRADAS

Ver anexo 9

4.20 RELACION DE SEÑALES RETIRADAS Y ENTREGADAS A PATIO 4

Ver anexo 10

4.21 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	
CONTRATISTA	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	
NIT:	901316246-0	
PLAZO INICIAL	10 MESES	
PLAZO ADICIÓN	5 MESES	
FECHA DE INICIO	29/10/2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	25/03/2020	
FECHA DE REINICIO	13/04/2020	
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	28/08/2020	
FECHA DE FINALIZACION FINAL	15/09/2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN ADICIÓN	15/02/2021	
VALOR COMPONENTE DE OBRA	$	4.882.890.333
VALOR ADICION	$	2.440.300.000
EJECUTADO EN EL MES 1 (PATINETAS)	$	53.855.878
EJECUTADO EN EL MES 1	$	247.745.672
EJECUTADO EN EL MES 2 (PATINETAS)	$	23.142.234
EJECUTADO EN EL MES 2	$	412.398.308
EJECUTADO EN EL MES 3 (PATINETAS)	$	15.513.087
EJECUTADO EN EL MES 3	$	273.708.962
EJECUTADO EN EL MES 4	$	581.672.728
EJECUTADO EN EL MES 5	$	547.467.129
EJECUTADO EN EL MES 6	$	444.376.468
EJECUTADO EN EL MES 7	$	746.922.987
EJECUTADO EN EL MES 8	$	447.352.519
EJECUTADO EN EL MES 9	$	661.049.421
EJECUTADO EN EL MES 10	$	427.684.940
EJECUTADO EN EL MES 11	$	433.861.703
EJECUTADO EN EL MES 12	$	671.754.409
EJECUTADO EN EL MES 13	$	272.392.698
EJECUTADO EN EL MES 14	$	497.444.436
EJECUTADO EN EL MES 15		
VALOR POR EJECUTAR	$	564.846.755

4.22 INFORME DE GEORREFERENCIACION

Ver anexo 11

4.23 INFORME DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Ver anexo 12

4.24 INFORME DE TRABAJO SOCIAL

Ver anexo 13

4.25 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se presentó un resumen de las actividades realizadas por el contratista en el desarrollo del décimo cuarto mes del contrato en lo que corresponde a las actividades de obra.

2. A la fecha del presente informe se intervinieron en señalización horizontal y vertical en los siguientes ID: MV_08_260_1244_11 INTERSECCION IDU, new jersey, EX_08_043_1556_10, ZE_08_461_943_10, MV_AV_BOYACA_941_09.

3. A la fecha del presente informe se intervinieron en señalización horizontal los siguientes ID: MV_09_048 / MV_09_189.

4. A la fecha del presente informe se intervinieron en señalización vertical los siguientes ID: EMERGENCIA KM 1 CALERA, EMERGENCIA KR 1E CL 77, MV_03_001_1783_19, PASACALLES.

5. Dentro del periodo de tiempo del presente informe, se presentaron lluvias durante 2 días, se logró completar una ejecución de 138,41% del 132,68% programado, gracias a los planes de acción programados en conjunto con la interventoría.

6. Respecto al tema de PMT, se solicitaron el ID CALLE 13, MV_08_039_1747_10, CALLE 26 SUR CON CARRERA 78 K. ZE_08_461_943_10, EX_08_043_1556_10 Con lo cual se sigue abriendo la pista de implementación.

7. El presente informe logro un valor de $ 497, 444,436 logrando un porcentaje acumulado del 138,41%. Quedando un saldo por ejecutar de $ 564,847,779

8. Se presentó un excelente acompañamiento por parte del personal de la interventoría, lo que ayudo a generar los buenos resultados Del décimo cuarto mes de ejecución del Contrato 1782/2019.

5 ANEXOS

ANEXO 1
REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD

ANEXO 2
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

ANEXO 3
ENSAYOS DE LABORATORIO
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

ANEXO 4
PLANILLAS DE OBRA

ANEXO 5
HOJA DE VIDA DEL CONTRATO

ANEXO 6
RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

ANEXO 7
BITACORA DE OBRA

ANEXO 8
COMITES DE OBRA

ANEXO 9
RELACION DE SEÑALES SUMINISTRADAS

ANEXO 10
SEÑALES RETIRADAS ENTREGADAS A PATIO 4

ANEXO 11
INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN

ANEXO 12
INFORME DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANEXO 13
INFORME DE TRABAJO SOCIAL

ANEXO 1

REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD

I. CONTROL DE CALIDAD

1) Calidad horizontal.

Dentro de las implementaciones realizadas durante la ejecución, se hace necesario llevar un control estricto y puntual de las tareas realizadas.

A continuación, se presentan los aspectos en que se realiza tal control de calidad.

(a) Dosificación y espesores

El registro de dosificaciones y control de espesores se realiza de forma diaria a todas las cuadrillas y en todos los ID´S que se encuentran en la programación de obra diaria; dicho procedimiento se realiza teniendo en cuenta los parámetros dictaminados en la norma técnica colombiana NTC 4744-4 que se refiere a la aplicación de materiales para la demarcación horizontal de pavimentos, que en su numeral 4.5 habla acerca de los espesores que deben tener cada una de las marcas que se realizan en obra. Esta medición en espesor húmedo se realiza con la ayuda de una galga suministrada por la empresa GMP, por otro lado la medición de espesores secos se hace por medio de un medidor digital de espesores.

Se aclara que no aplica la medición de espesores secos de plástico en frío por método llana debido a que el medidor digital de espesores secos no mide sobre películas de pintura desnivelas.

(i) Equipos Espesores.

	**Galga Micrométrica.** Instrumento de medición para espesores húmedos que determina el grosor de una capa según sea la diferencia entre la base y el “diente” siguiente al marcado por el fluido.
	**Probador de espesores secos de pintura.** Instrumento digital que utiliza el ultrasonido para determinar el espesor de una pintura mediante una señal unidirecional que parte del diodo y revota en una superficie metalica. Aquella direrencia en tiempos es tabulada determina el valor expresado.

(b) In Situ.

Las variaciones térmicas y de humedades son factores fundamentales en la correcta implementación por lo que se hace necesario de llevar un control estricto, para que los materiales usados cumplan con los estándares de calidad y su posterior vida de servicio.

Los valores son debidamente revisados dentro de los estándares con equipos especializados y correctamente calibrados. A continuación se relacionan aquellos que se usan a diario en las implementaciones.

(i) Equipos In Situ (Variables)

	**Termo-Higrómetro.** Instrumento de medición digital que determina las variaciones de la humedad del ambiente en grados porcentuales.
	**Termometro Digital.** Instrumento que determina la temperatura mediante la utilizacion de un rayo infrarojo que cataloga la cantidad de energia calorica que posee un cuerpo.
	**Retroreflectometro Horizontal.** Intrumento me mide la cantidad de luz reflejada en una superficie mediante la utilizacion de aces de lus en distintas geometrias.

(ii) Registro Fotográfico.

Las siguientes son imágenes del avance en los compromisos desarrollados bajo la ejecución del contrato.








SOLO








#130-80 Avenida Calle 17
Bogotá
23/11/20 00:46:14.2










ESCOLAR
ZONA

2. Calidad Vertical.

Referente al aspecto calidad en los componentes verticales del contrato se realizan estrictas pruebas en los materiales, procesos de transformación e implementación.

Basados en los criterios especificados en la NTC 4739 referente a los aspectos con lo cumplir una señal vertical, llevamos a cabo el control de calidad para que se cumpla a cabalidad. De igual forma se rige la implementación y dimensionamiento de tales basados en el Capítulo 2 del manual de señalización vigente.

	**Retroreflectometro Vertical**. Intrumento me mide la cantidad de luz reflejada en una superficie mediante la utilizacion de aces de lus en distintas geometrias.
	**Probador de espesores secos de pintura.** Instrumento digital que utiliza el ultrasonido para determinar el espesor de una pintura mediante una señal unidirecional que parte del diodo y revota en una superficie metalica. Aquella direrencia en tiempos es tabulada determina el valor expresado.

(i) Registro Fotográfico.

Las siguientes son imágenes del avance en los compromisos desarrollados bajo la ejecución del contrato.

Verificación de homogeneidad de espesores de pintura en elementos. Tableros y Postes.

Las pruebas se realizaron con variedad de elementos




VÍA
CERRA


2

















ANEXO 2

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 07/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 53887

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e Instructivos Internos			
PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY BLANCO COMPONENTE A			
LOTE: P-0001419			
FECHA DE FABRICACION: 17/11/20			
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/05/21			
FINURA DE DISPERSION	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU a 25ºC)	90 - 92	92	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25ºC)	6,90 - 7,20	7,11	NTC 1360 NUMERAL 8.5 NTC-561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,35	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	MINIMO 95	99	NTC 1360 NUMERAL 6.2.6
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 - 15	9 EMPERATURA: 12ºC HUMEDAD: 94%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L ≥90 a -2,2-0 b 0-5**	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L 91,85 a -1,15 b 4,65**	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	98 MINIMO	99	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO (%)	Máximo 5	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.3 NTC 6106
BRILLO 85º	0 - 30	10	NTC 1360 NUMERAL 4.3
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>200	400	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10
DUREZA	MINIMO H	H	I-GP-132

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 07/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 53887

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos			
PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY BLANCO COMPONENTE B			
LOTE: P-0001420			
FECHA DE FABRICACION: 17/11/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/05/2021			
FINURA DE DISPERSION (UH)	Máximo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (25°C EN KU)	90 - 92	90	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25°C)	7,00 – 7,25	07.09	NTC-561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,22 *	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	95 MINIMO	99	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP) EN MINUTOS	7 - 15	8 TEMPERATURA:13°C HUMEDAD:90%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR BLANCO L ≥90 a -2,2-0 b 0-5	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L 92,39 a -1,21 b 5** ESPECTROFOTÓMETRO BYK SPECTRO GUIDE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	99 - 100%	99,00%	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4 UK	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85°	MAXIMO 10	10	NTC 1360 NUMERAL 4.3
DUREZA	MINIMO H	H	I-GP-132
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.7 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN dm3	>200	400	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTÓMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 07/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 53887

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY AMARILLO COMPONENTE A

LOTE: P-0001200			
FECHA DE FABRICACION: 06/11/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO:06/05/2021			
DISPERSION EN UH	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU A 25°C)	90 - 92	91	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25°C)	6,10 - 6,40	6,27	NTC-561
DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/ml A 25°C)	MINIMO 1,4	1,65	NTC 1360 NUMERAL 6.1.4 NTC 561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,39	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO	90 MINIMO%	93,31	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7-15 MINUTOS	15 EMPERATURA:09°C HUMEDAD: 89%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 72-82 a 18-27 b 74-86**	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 74,85 a 18,78 B: 74**	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	99 - 100%	99	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85°	MAXIMO 10	5.3	I-GP-132
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 111.5
DUREZA	H MMINIMO	3H	I-GP-132
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 8.3.2 /8.15
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 8.3.1 /8.14
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION	>200 dm3	> 400 dm3	NTC 1360 NUMERSAL 8.3.3 /8.16
DETERMINACION DE LA APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 07/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 53887

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY AMARILLO COMPONENTE B

LOTE: P-0001201			
FECHA DE FABRICACION: 30/10/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2021			
DISPERSIÓN EN UH	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU A 25°C)	90 - 92	92	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25°C)	6,10 - 6,40	6,11	NTC-561
DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/ml A 25°C)	MINIMO 1,4	1,61	NTC 1360 NUMERAL 6.1.4 NTC 561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,5	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO	90 MINIMO%	91,97	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7-15 MINUTOS	9 TEMPERATURA12°C HUMEDAD: 99%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 72-82 a 18-27 b 74-86**	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 74,84 a 18,78 B: 74**	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	99 - 100%	99	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85°	MAXIMO 10	5,3	I-GP-132
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 1115
DUREZA	H MMINIMO	3H	I-GP-132
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.18
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION	>200 dm3	> 350	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
DETERMINACION DE LA APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantia de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 15/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 54033

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos			
PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY BLANCO COMPONENTE A			
LOTE: P-0001549			
FECHA DE FABRICACION: 12/12/20			
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/06/21			
FINURA DE DISPERSION	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU a 25ºC)	90 - 92	90	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25ºC)	6,90 - 7,20	7,1	NTC 1360 NUMERAL 8.5 NTC-561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,51	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	MINIMO 95	99	NTC 1360 NUMERAL 6.2.6
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 – 15	7 TEMPERATURA: 19ºC HUMEDAD: 63%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L ≥90 a -2,2-0 b 0-5**	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L 92,20 a -0,85 b 5**	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	98 MINIMO	99	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO (%)	Máximo 5	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.3 NTC 6108
BRILLO 85°	0 - 30	10	NTC 1360 NUMERAL 4.3
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>200	400	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10
DUREZA	MINIMO H	H	I-GP-132

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 15/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 54033

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos			
PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY BLANCO COMPONENTE B			
LOTE: P-0001550			
FECHA DE FABRICACION: 10/12/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/06/2021			
FINURA DE DISPERSION (UH)	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (25°C EN KU)	90 - 92	92	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25°C)	7,00 - 7,25	7,12	NTC-561
COLOR	ΔE = 0,50 máx	0,22	1-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	95 MINIMO	98,89	1-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP) EN MINUTOS	7 - 15	11 EMPERATURA:17°C HUMEDAD: 71%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L ≥90 a -2,2-0 b 0-5**	CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L 92,51 a -1,51 b 5** ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	99 - 100%	99,00%	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4 UK	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85°	MAXIMO 10	10	NTC 1360 NUMERAL 4.3
DUREZA	MINIMO H	H	1-GP-132
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.7 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION EN dm3	>200	400	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARTENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 15/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 54033

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY AMARILLO COMPONENTE A

LOTE: P-0001551			
FECHA DE FABRICACION: 15/12/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO:15/06/2021			
DISPERSION EN UH	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU A 25°C)	90 - 92	90	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25°C)	6,10 - 6,40	6,35	NTC-561
DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/ml A 25°C)	MINIMO 1,4	1,67	NTC 1360 NUMERAL 8.1.4 NTC 561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,47	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO	90 MINIMO%	92,86	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7-15 MINUTOS	14 TEMPERATURA:09°C HUMEDAD: 89%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 72-82 a 18-27 b 74-86**	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 74,85 a 18,78 B: 74**	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	99 - 100%	99	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1796
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACIÓN DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85°	MAXIMO 10	5.3	I-GP-132
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 1115
DUREZA	H MMINIMO	3H	I-GP-132
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION	>200 dm3	> 400 dm3	NTC 1360 NUMERSAL 6.3.3 /8.16
DETERMINACION DE LA APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 15/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 54033

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO SPRAY AMARILLO COMPONENTE B

LOTE: P-0001552			
FECHA DE FABRICACION: 12/12/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/06/2021			
DISPERSION EN UK	Mlalmo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU A 25°C)	90 - 92	92	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25°C)	6,10 - 6,40	6,14	NTC-561
DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/ml A 25°C)	MINIMO 1,4	1,62	NTC 1360 NUMERAL 6.1.4 NTC 561
COLOR	ΔE = 0,50 máx	1	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO	90 MINIMO%	93,63	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7-15 MINUTOS	B TEMPERATURA 19°C HUMEDAD: 63%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 72-82 a 18-27 b 74-86**	CARACTERISTICA COLOR AMARILLO **L 75,14 a 19,68 B: 74**	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	99 - 100%	99	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85°	MAXIMO 10	5,3	I-GP-132
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 1115
DUREZA	H MMINIMO	3H	I-GP-132
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION	>200 dm3	> 300	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
DETERMINACION DE LA APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.

NIT : 901316246

LUGAR Y FECHA: 09/12/2020

FACTURA Y/O PEDIDO: 53904

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: IMPRIMANTE BASE SOLVENTE ORBITEX® NEGRO

LOTE		P-0001497	
FECHA DE FABRICACION: 25/11/20			
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/11/21			
PARAMETRO	**ESPECIFICACIONES**	**RESULTADO**	**NTC /INSTRUCTIVO INTERNO**
FINURA DE DISPERSION (UH)	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU a 25ºC)	80 - 90	88	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25ºC)	5,45 - 5,85	5,67	NTC-561
COLOR	ΔE = 0.1 máx	0,5	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	98-100	99	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 – 15	8 Humedad: 64% Temperatura: 16°C	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO EN %	Mínimo 60	60,35	NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN EN %	Mínimo 50	50,1	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4 UK	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
BRILLO 85º	10 MAXIMO	2,5	I-GP-132
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XTLOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	I-GP-132
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.17 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>80	200	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q SANDRA SOLANO LARA

JEFE DE LABORATORIO

CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS

preflex

ISO 9001 icontec Certificado N° SC 493-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PRODUCTO:ROAD LINE TRAFICO AMARILLO

LOTE: 72

FECHA DE ANÁLISIS:JULIO-21-2020

Estos datos indican los resultados de control realizados sobre una muestra representativa del lote y no eximen al cliente de realizar sus controles y análisis en la recepción de este producto.

ANÁLISIS REALIZADOS	RESULTADOS ANALÍTICOS	ESPECIFICACIONES
TIPO DE PINTURA	Tipo B	Tipo B
APARIENCIA	Uniforme,homogenea, libre de particulas	Uniforme,homogenea, libre de particulas
FINURA (Hegman)	4,5	Mínimo 3
% DE SÓLIDOS (peso)	75,4%	≥60 %
% DE SÓLIDOS (volumen)	54,1%	≥50 %
VISCOSIDAD (25°C)	84,8 K.U	75-90 K.U
COLOR (CIELAB)		
L*	77,5	Entre 72 y 82
a*	30,97	Entre 18 y 27
b*	58,92	Entre 74 y 86
DELTA E (vs STD)	58,62	Menor a 4
BRILLO ESPECULAR 60°	2,3	Máximo 3 Unidades
DENSIDAD (kg/Galón)	5,83	5,90 ± 0,10
TIEMPO DE SECADO (No Pick up)	14 Minutos	≤15 Minutos
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	> 80 dm^3	> 80 dm^3

FECHA DE VENCIMIENTO JULIO-21-2021

ANDRES CORREDOR
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

REV 03. 2010-10-07 F-R-20

CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS

preflex

ISO 9001 icontec Certificado Nº SC 493-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PRODUCTO: ROAD LINE TRAFICO BLANCO

LOTE: 104

FECHA DE ANÁLISIS:DICIEMBRE-08-2020

Estos datos indican los resultados de control realizados sobre una muestra representativa del lote y no eximen al cliente de realizar sus controles y análisis en la recepción de este producto.

ANÁLISIS REALIZADOS	RESULTADOS ANALÍTICOS	ESPECIFICACIONES
TIPO DE PINTURA	Tipo B	Tipo B
APARIENCIA	Uniforme,homogenea, libre de particulas	Uniforme,homogenea, libre de particulas
FINURA (Hegman)	4,5	Minimo 3
% DE SÓLIDOS (peso)	75,9%	≥60 %
% DE SÓLIDOS (volumen)	50,2%	≥50 %
VISCOSIDAD (25ºC)	82,2 K.U	75-90 K.U
COLOR (CIELAB)		
L*	92,5	Mínimo 90
a*	-0,88	Entre 0 y 2,2
b*	2,67	Entre 0 y 5
DELTA E (vs STD)	0,53	Menor a 4
BRILLO ESPECULAR 60°	2,1	Máximo 3 Unidades
DENSIDAD (kg/Galón)	5,9	5,90 ± 0,10
TIEMPO DE SECADO (No Pick up)	13 Minutos	≤15 Minutos
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	>80 dm^3	> 80 dm^3

FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE -08 - 2021

ANDRES CORREDOR
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Preflex S.A. NIT. 860.508.470-0,
Oficina: Carrera 7 No. 26-20 Of. 2402 Bogotá - Colombia
Planta: Dir. nueva: Carrera 2 No. 56-37 Zona Ind. Cazucá, Soacha - Cundinamarca
Dir. antigüa: Transversal 5 No. 12-75, Entrada 2 Cazucá, Soacha - Cundinamarca
PBX: (+571) 779 9222 - FAX: (+571) 719 5103 - www.preflex.com.co

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.
NIT : 901316246
LUGAR Y FECHA: 11/12/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 53952

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA BLANCO

LOTE: P-0001547			
FECHA DE FABRICACION: 09/12/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO:09/06/2021			
VISCOSIDAD (KU) AGUJA ALTA VISCOSIDAD	90 - 93	90	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25ºC)	7.25- 7.55	7,49	NTC 1360 NUMERAL 8.5 NTC-561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,42	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	95 MINIMO	99	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 – 35	15 TEMPERATURA:18°C HUMEDAD: 68%	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
COLOR	CARACTERISTICA COLOR BLANCO L ≥80 h -2,2-0 b 0-5	CARACTERISTICA COLOR BLANCO L 90 a: 0,95 b 8	NTC 1360 NUMERAL 6.2.1
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO (%)	100	100	NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	Mínimo 98	99,98	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO (%)	Máximo 5	4	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.3 NTC 6108
DUREZA	MINIMO H	3H	I-GP-132
BRILLO 85º	MAXIMO 10	10	NTC 1360 NUMERAL 4.3
ELONGACION	PASA/ NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>200	350	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

SANDRA MILENA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO

Potters

Ballotini Panamericana, S. De R.L. De C.V.

CERTIFICADO DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE PRUEBAS FISICAS Y QUIMICAS EN MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE

MATERIAL: GLASS BEADS
TIPO: GRUP ON CO

OBSERVACIONES:
LAS ESFERAS NO PRODUCEN SILICOSIS

NORMAS DE CALIDAD
MICROESFERA DE VIDRIO CO

LOTE (S) ORIGINAL (ES)

1905089122	1905091614	1905091624
1905089122	1905091615	
1905091606	1905091616	
1905091607	1905091617	
1905091608	1905091618	
1905091609	1905091619	
1905091610	1905091620	
1905091611	1905091621	
1905091612	1905091622	
1905091613	1905091623	

CLIENTE: **PINTUCO COLOMBIA S.A**

CANTIDAD ENTREGADA: 21,000.00 Kgs

No. DE LICITACION/REMISION: **81277980**

PRUEBAS EFECTUADAS	METODOS UTILIZADOS	RESULTADOS	ESPECIFICACION
ESFERICIDAD	MT-AC-08	CUMPLE	75 % MINIMO
CONTENIDO DE SILICE	MT-AC-13	CUMPLE	65 % MINIMO
INDICE DE REFRACCION	MT-AC-09	CUMPLE	1.50 - 1.55
GRAVEDAD ESPECIFICA	MT-AC-12	CUMPLE	2.5-2.6 g/cm³
ADHERENCIA	MT-AC-11	CUMPLE	CUMPLE
RESISTENCIA AL AGUA	MT-AC-10	CUMPLE	CUMPLE
RESISTENCIA AL ACIDO CLORHIDRICO	MT-AC-10	CUMPLE	CUMPLE
RESISTENCIA AL SULFURO DE SODIO	MT-AC-10	CUMPLE	CUMPLE
RESISTENCIA AL CLORURO DE CALCIO	MT-AC-10	CUMPLE	CUMPLE
CONTENIDO PLOMO (Pb)	MT-AC-06	CUMPLE	100 PPM MAXIMO
CONTENIDO ARSENICO (As)	MT-AC-05	CUMPLE	75 PPM MAXIMO
GRANULOMETRIA	MT-AC-03	CUMPLE	

ABERTURA DE TAMIZ

TAMIZ US	MICRONES	% RETENIDO	% PASA	% PASA MINIMO	% PASA MAXIMO
20	850	-	100.00		100
30	600	19.11	80.89	70	90
40	425	34.77	46.12	30	60
50	300	26.90	19.23	10	25
80	180	19.22		0	5
CHAROLA	0	-			
		100.00			

OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS EFECTUADOS INDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS ESTABLECIDAS

Potters Ballotini Panamericana, S. De R.L. De C.V.

RESULTADO FINAL: RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD

APROBADO: APROBADO

DANIEL OCAÑA B.

FECHA: Febrero 24 de, 2017

RIO LERMA No. 55 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL SAN NICOLAS, C.P. 54030 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO
TEL.: (55) 1665-9292, 1665-9295, 1665-9298 FAX: (55) 1643-3294

Certificado de Análisis

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Articulo1 10115021
PINTUTRAFICO SUPERGRIP ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 13779 1 GL
Lote: JU0-246779
Cliente.
Fecha de Fabricación: 11-SEP-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
APARIENCIA	Similar Std	Similar Std		

Observaciones.

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto

Persona Responsable de Aprobación: JAVIER.CASTANEDA

Reflex
SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S.

19 de agosto de 202020

CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal de la firma REFLEX SEÑALIZACION VIAL SAS.
Se permite certificar que el producto DELINEADOR TUBULAR. Altura 80 cm. 20 cm de base con 3 cintas reflectivas, Cumple con las especificaciones de calidad requeridas.
La pieza cuenta con garantía de seis meses a partir de la entrega por defectos de fabricación.

La presente se expide por petición de CONSORCIO SEÑALIZACION DC Nit: 901.316.246-0

Atte.

MARTHA CECILIA RESTREPO M.
Representante Legal.

TEL. (57) (2)2856456 Celular 300 6089719 Calle 21 No. 30-48 Palmira-Valle- Colombia
Correo: administracion@reflex.co

GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S

CC-003-2020

Tocancipá., Noviembre 3 de 2020

CERTIFICACIÒN

El suscrito Representante Legal de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **HITO FLEXIBLE AMARILLO BASE NEGRA** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. lote HFA 38046 fecha fabricación julio 27 de 2020.

La presente se expide por petición de la firma a los veinte (3) días del mes de noviembre de 2020

Atentamente,

JUAN FRANCISCO VELASQUEZ LEON
Representante Legal

CC-020-2020

Tocancipá., Diciembre 21 de 2020

CERTIFICACIÒN

El suscrito Representante Legal de la firma **GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S** se permite certificar que el producto **TACHA BLANCA CON ESPIGO** es un producto el cual cumple con las especificaciones de calidad establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte**. Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. Factura FEVO 3737 Lote **TBC 03124** fecha fabricación 27 de octubre de 2020 .

La presente se expide por petición a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

NIT. 900.956.926-1

JUAN FRANCISCO VELASQUEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S

CC-002-2020

Tocancipá., Noviembre 3 de 2020

CERTIFICACIÒN

El suscrito Representante Legal de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **TACHON PLASTICO LISO** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. lote TP 1103A fecha fabricación octubre 4 de 2020.

La presente se expide por petición de la firma a los veinte (3) días del mes de noviembre de 2020

Atentamente,

JUAN FRANCISCO VELASQUEZ LEON
Representante Legal

ANEXO 3

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

CONTRATO SUR OCCIDENTE 2019_1782						
REGISTRO DE PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO						
NÚMERO DE INFORME:	**14**		**MES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:**	**14**		
CANTIDAD DE ID INTERVENIDOS	**5**		**FECHA:**	**28 DE DICIEMBRE DEL 2020**		
14						
DEMARCACIÓN HORIZONTAL						
1	**CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN**		**FECHA DE ULTIMA CALIBRACIÓN:**	**FECHA DE PROXIMA CALIBRACIÓN:**	**PARAMETROS DE CONTROL:**	**FUNCIONAMIENTO:**
1.1	Termo higrómetro de Marca CEM DT-322		13/10/2020	13/01/2020	23°/60% MANUAL	C
1.2	Termo higrómetro infrarrojo Etekcity Lasergrip 800		13/10/2020	13/01/2020	22° MANUAL	C
1.3	Termometro infrarrojo de contacto		20/11/2020	20/02/2021		C
1.4	Medición de Saturación de Humedad General Tools & Instruments MMD4E		20/11/2020	20/02/2021	12%	C
1.5	Báscula BL-1KG-BLK de 1 KG		15/11/2020	15/02/2020	500 g	C
1.6	Retroreflectómetro Mirolux Ultra Geometría 15 metros		15/11/2020	15/02/2020	Negro: 0 Blanca:820	C
2	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**		**FECHA DE ÚLTIMA REVISION:**	**FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN:**	**FUNCIONAMIENTO:**	
2.1	• Equipos de Aplicación para Metro Cuadrado en Base Solvente					
2.1.1	MIGUEL GRANADA	Titán 6900	22/10/2020	22/01/2021	C	
2.1.3	GONZALO SONATI	Titán 8500	22/10/2020	22/01/2021	C	
2.1.4	MILLER MORALES	Titán 5900	22/10/2020	22/01/2021	C	

3	**ASPECTO AMBIENTAL DURANTE IMPLEMENTACION**					
3.1	**ID**	**PRECIPITACION**	**CONDENSACION SUPERFICIAL**	**TEMPERATURA °C CARPETA**	**TEMPERATURA AMBIENTE**	**HUMEDAD RELATIVA**
3.1.1	MV_08_260_1244_11 INTERSECCION IDU	N- ROCIO	NINGUNA	14°-22°	12°-17°	61%-79%
3.1.2	EX_08_043_1556_10	LLOVIZNA	NINGUNA	16°-26°	13°-20°	57%-69%
3.1.3	ZE_08_461_943_10	LLOVIZNA	NINGUNA	16°-26°	13°-20°	59%-69%
3.1.4	MV_09_048 / MV_09_189	LLOVIZNA	NINGUNA	16°-26°	13°-20°	65%-69%
3.1.5	MV_AV_BOYACA_941_09	LLOVIZNA	NINGUNA	16°-26°	13°-20°	60%-69%

ANEXO 4

PLANILLAS DE OBRA

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C	REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION		DATOS DE IMPLEMENTACION			
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		COI		GRUPO	14
	LOCALIDAD		FECHA DE INICIO			
CONTRATO 2019 - 1782	UPZ		FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
	ID	CL 41S - TV 78B			TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
BORRADO		PCP	M2				4,18		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		FF	M2				1,20		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		PP	M2	0,40	4,50	2,00	3,60		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		FDD	M2				2,20		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		FDI	M2				2,20		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		LPA	ML	0,15	15,00		2,25		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		LP	M2	0,60	7,20		4,32		CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B						N/A
BORRADO		FGD	M2				1,5		CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO						N/A
BORRADO		FGD	M2				1,5		CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO						N/A
BORRADO		LP	M2	0,60	6,20		3,72		CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO						N/A
BORRADO		FDD	M2				2,20		TV 78B CON CL 41S						N/A
BORRADO		FDD	M2				2,20		TV 78B CON CL 41S						N/A
BORRADO		FF	M2				1,20		CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K						N/A
BORRADO		FDI	M2				2,20		CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K						N/A
BORRADO		LP	M2	0,60	6,00		3,60		CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K						N/A
BORRADO		LPA	ML	0,15	15,00		2,25		CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K						N/A
BORRADO		FDD	M2				2,20		CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B						N/A
BORRADO		FDI	M2				2,20		CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B						N/A
BORRADO		LP	M2	0,60	6,50		3,90		CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B						N/A
BORRADO		LPA	ML	0,15	15,00		2,25		CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B						N/A
BORRADO		LB	ML	0,12	154,60		18,55		CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO						N/A
						TOTAL									

OBSERVACIONES:	DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD	

CONVENCIONES PARA MARCAS VIALES						
FLECHA DIRECCIONAL	PSOLO		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL **0,20**	RE	RESALTO REAL
FLECHA GIRO DERECHA	PMIN		LL	LINEA LOGARITMICA	RV	RESALTO VIRTUAL
FLECHA GIRO IZQUIERDA	FMIN		LP	LINEA DE PARE	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO
FLECHA DOBLE DERECHA	ACH		LPA	LINEA DE PARADA **0,15**	SPT	SENDERO PEATONAL
FLECHA DOBLE IZQUIERDA	BS		PAB	PARADA AUTOBUS **(0,25*6*L)**	EP	ESTOPEROL
FLECHA DOBLE GIRO	DS		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL	TCH	TACHON CON ESPIGO
FLECHA TRIPLE	LA		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO	TR	TACHA REFLEC.
REDUCCION CARRIL DERECHA	LB		PP	PASO PEATONAL - CEBRA	BL	BALIZAS O HITOS
REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	LC		PM	PINTURA PARA MUROS		
PICTOGRAMA ESCOLAR	LCA		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	LCI		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
PICTOGRAMA PARE	LCM		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
CEDA EL PASO	LCN		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
PICTOGRAMA SOLO BUS	LCP		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		

IMP L12			NEGRO			
IMP L15			NEGRO			
IMP L20			NEGRO			
IMP L25			NEGRO			
IMP M2			NEGRO			
SPRAY L10			B/A			
SPRAY 12			B/A			
SPRAY 15			B/A			
SPRAY 20			B/A			
LLANA ML			B/A			
SOLVENTE M2			B/A			
LLANA M2			B/A			
ANTIDESLIZANTE		PP	B			
BASE SOLVENTE M2			B/A			
BORDILLO CONCRETO			B			
TR			BB/BR/A			
TCH			A			
HITOS / BALIZAS			N			
EP METALICO			B/A			
BA AGREGADO			A			
RETIRO DE TCH			N			
BORRADO MECANICO			N/A	69,42		

FIRMA RESIDENTE

NOMBRE

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE: DIEGO GUALTEROS CHAVEZ

CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C	REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION		DATOS DE IMPLEMENTACION			
		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		COI		GRUPO	14
		LOCALIDAD		FECHA DE INICIO			
	CONTRATO 2019 - 1782	UPZ		FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
		ID	CL 41S - TV 78B			TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
LLANA	A	PCP	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCP	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FF	M2				1,20	1,80	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FF	M2				1,20	1,80	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	9,00	14,40	18,45	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCC	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCC	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PRIORIDAD	M2				1,56	4,32	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDI	M2				2,20	3,00	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	LP	M2	0,60	5,80		3,48	4,06	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	4,00	7,20		28,80	29,93	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,10	12,10		13,31	14,64	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	15,00	2,40	3,75	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			14,0			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	M	A	B	B	8
LLANA	B	LP_C	M2	0,40	7,20		2,88	3,60	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PBU	M2				3,84	4,25	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PBU	M2				3,84	4,25	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	A	TCH	UND			14,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			5,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	17,10		17,10	17,10	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	M	B	M	7

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	6,00	0,96	1,50	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			5,0			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	8
PLASTICO	A	TCH	UND			7,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			2,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	8,50		8,50	8,50	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	M	B	M	7
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	9,00	1,44	2,25	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			8,0			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	8
PLASTICO	A	TCH	UND			7,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			2,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	8,50		8,50	8,50	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	M	B	M	7
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	8,00	1,28	2,00	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			7,0			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	8
PLASTICO	A	TCH	UND			12,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			6,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			4,00			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	14,60		14,60	14,60	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	6,0	18,00	18,00	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	15,10		15,10	15,10	CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			16,0			CL 41S ENTRE AV 1 DE MAYO - TV 78B	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	9,00	14,40	18,45	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	VMP30	M2				3,36	8,09	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	VMP30	M2				3,36	8,09	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PTEX	M2				4,08	10,04	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCP	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCP	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FF	M2				1,20	1,80	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
LLANA	B	FF	M2				1,20	1,80	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	9,00	14,40	18,45	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FGD	M2				1,5	2,2	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FGD	M2				1,5	2,2	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	LP	M2	0,60	5,80		3,48	4,06	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	6,00	9,00	21,60	27,45	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,80	7,10		12,78	13,68	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	9,00	1,44	2,25	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			8,0			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE (M2)	B	PSOLO_C	M2				0,27	1,01	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
PLASTICO	A	TCH	UND			56,00			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			26,00			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	81,90		81,90	81,90	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	10,0	30,00	30,00	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	15,10		15,10	15,10	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			16,0			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	CP_C	M2				0,18	0,78	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	LCP_C	M2	0,20	0,3,	2,00	0,12	0,24	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
PLASTICO	A	TCH	UND			89,00			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			6,00			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			42,00			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	131,50		131,50	131,50	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	14,0	42,00	42,00	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	M	B	M	7

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	15,10		15,10	15,10	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			15,0			CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FGI_C	M2				0,25	0,53	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	LP_C	M2	0,20	1,00		0,20	0,30	CL 41S ENTRE TV 78B -AV 1 DE MAYO	F	M	A	B	B	8
LLANA	A	ZB	M2	0,30	96,20		28,86	38,48	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,00	18,00		18,00	19,91	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	35,00	5,60	8,75	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			34,0			TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	8,00	12,80	16,40	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	2,80	1,00	1,12	1,45	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	LP	M2	0,60	3,80		2,28	2,66	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FT	M2				3,15	4,30	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE	A	LCM	ML	0,12	15,10	2,00	30,20	30,20	TV 78B CON CL 41S	F	A	M	B	M	7
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,00	19,40		19,40	21,45	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	44,00	7,04	11,00	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			43,0			TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	15,00	24,00	30,75	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	3,00	1,00	1,20	1,55	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	LP	M2	0,60	6,60		3,96	4,62	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDD	M2				2,20	3,00	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDI	M2				2,20	3,00	TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	16,00		16,00	16,00	TV 78B CON CL 41S	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			17,0			TV 78B CON CL 41S	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	2,0	6,00	6,00	TV 78B CON CL 41S	F	A	M	B	M	7
LLANA	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PZE	M2				6,06	18,75	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
LLANA	B	FF	M2				1,20	1,80	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDI	M2				2,20	3,00	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	LP	M2	0,60	6,00		3,60	4,20	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	3,60	1,00	1,44	1,85	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	3,30	1,00	1,32	1,70	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE (M2)	B	PSOLO_C	M2				0,27	1,01	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	CP_C	M2				0,18	0,78	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	LCP_C	M2	0,20	0,3,	2,00	0,12	0,24	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
PLASTICO	A	TCH	UND			12,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			5,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	17,50		17,50	17,50	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,10	10,80		11,88	13,08	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	14,00	2,24	3,50	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			13,0			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	8
LLANA	VERDE	RECUADRO PARADERO	M2	0,30	42,40		12,72	16,96	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PAB	M2	0,30	20,40		6,12	8,16	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,10	4,20		4,62	5,16	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	12,00	1,92	3,00	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			12,0			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE (M2)	B	PSOLO_C	M2				0,27	1,01	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SOLVENTE (M2)	B	LP_C	M2	0,20	1,00		0,20	0,30	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	M	A	B	B	8
PLASTICO	A	TCH	UND			7,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			2,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	7,30		7,30	7,30	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LINEA DE INCORPORACION	ML	0,20	15,20		15,20	15,20	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	2,0	6,00	6,00	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LCN	ML	0,15	35,40		35,40	35,40	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			36,0			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	8
SOLVENTE	B	LINEA DE INCORPORACION	ML	0,20	15,90		15,90	15,90	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	2,0	6,00	6,00	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	15,00		15,00	15,00	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			16,0			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	7,00	1,12	1,75	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			6,0			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	8
PLASTICO	A	TCH	UND			6,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			3,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	8,80		8,80	8,80	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	9,00	1,44	2,25	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			8,0			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	8
PLASTICO	A	TCH	UND			7,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			3,00			CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	9,70		9,70	9,70	CL 41S ENTRE TV 78B - KR 78K	F	A	M	B	M	7
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	9,00	14,40	18,45	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCC	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	A	PCC	M2				4,18	4,66	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
LLANA	B	PRIORIDAD	M2				1,56	4,32	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDI	M2				2,20	3,00	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE (M2)	B	PSOLO_C	M2				0,27	1,01	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	M	A	B	B	8
PLASTICO	A	TCH	UND			55,00			CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	7
PLASTICO	A	HITOS	UND			5,00			CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	7
CONCRETO	A	BNT	UND			26,00			CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	7
SOLVENTE	B	LB	ML	0,12	78,90		78,90	78,90	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	M	B	M	7
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,00	12,10		12,10	13,42	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	3,90	7,35		28,67	29,80	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE (M2)	B	PBB	M2				0,96	1,17	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE (M2)	B	FF_C	M2				0,28	0,51	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	M	A	B	B	8
LLANA	B	PBU	M2				3,84	4,25	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PBU	M2				3,84	4,25	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	15,00	2,40	3,75	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			14,0			CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	LP	M2	0,60	5,90		3,54	4,13	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE (M2)	B	LP_C	M2	0,40	7,35		2,94	3,68	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	M	A	B	B	8
SOLVENTE	B	LCA	ML	0,12	3,00	8,0	24,00	24,00	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	M	B	M	7
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	15,00		15,00	15,00	CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			16,0			CL 41S ENTRE KR 78K - TV 78B	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	PP	M2	0,40	4,00	14,00	22,40	28,70	TV 78K CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PP	M2	0,40	3,10	2,00	2,48	3,20	TV 78K CON CL 41S	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,00	21,90		21,90	24,20	CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	47,00	7,52	11,75	CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B/R	TR	UND			48,0			CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	12

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
LLANA	A	ZB	M2	0,30	100,90		30,27	40,36	CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	VERDE	ACH	M2	1,00	31,50		31,50	34,76	CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	PC	M2	0,40	0,40	40,00	6,40	10,00	CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
PLASTICO	B/R	TR	UND			39,0			CL 41S ENTRE CON KR 78K	F	A	A	B	A	8
LLANA	B	FF	M2				1,20	1,80	CL 41S CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 41S CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
LLANA	B	LP	M2	0,60	5,80		3,48	4,06	CL 41S CON KR 78K	F	A	A	B	A	12
SOLVENTE	B	LPA	ML	0,15	14,50		14,50	14,50	CL 41S CON KR 78K	F	A	M	B	M	7
PLASTICO	B/R	TR	UND			15,0			CL 41S CON KR 78K	F	A	A	B	A	8

TOTAL

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMP L12			NEGRO		-	
IMP L15			NEGRO		546,5	
IMP L20			NEGRO		141,2	
IMP L25			NEGRO		31,1	
IMP M2			NEGRO	-		
SPRAY L10			B/A		-	
Solvente 12			B/A		546,5	
Solvente 15			B/A		141,2	
Solvente 20			B/A		31,1	
LLANA ML			B/A			
SOLVENTE M2			B/A	16,15	-	
LLANA M2			B/A	619,32		
ANTIDESLIZANTE		PP	B	619,32		
BASE SOLVENTE M2			B/A			
BORDILLO CONCRETO			B			120,00

CONVENCIONES PARA MARCAS VIALES

FLECHA DIRECCIONAL	PSOLO		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL **0,20**	RE	RESALTO REAL
FLECHA GIRO DERECHA	PMIN		LL	LINEA LOGARITMICA	RV	RESALTO VIRTUAL
FLECHA GIRO IZQUIERDA	FMIN		LP	LINEA DE PARE	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO
FLECHA DOBLE DERECHA	ACH		LPA	LINEA DE PARADA **0,15**	SPT	SENDERO PEATONAL
FLECHA DOBLE IZQUIERDA	BS		PAB	PARADA AUTOBUS **(0,25*6*L)**	EP	ESTOPEROL
FLECHA DOBLE GIRO	DS		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL	TCH	TACHON CON ESPIGO
FLECHA TRIPLE	LA		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO	TR	TACHA REFLEC.
REDUCCION CARRIL DERECHA	LB		PP	PASO PEATONAL - CEBRA	BL	BALIZAS O HITOS
REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	LC		PM	PINTURA PARA MUROS		
PICTOGRAMA ESCOLAR	LCA		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	LCI		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE	DIRECCION						
PICTOGRAMA PARE	LCM		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30				TR			BB/BR/A			406,00	
CEDA EL PASO	LCN		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS				TCH			A			272,00	
PICTOGRAMA SOLO BUS	LCP		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON				HITOS / BALIZAS			N			57,00	
								EP METALICO			B/A			-	
								BA AGREGADO			A	-			
								RETIRO DE TCH			N				
								BORRADO MECANICO			N/A				

FIRMA RESIDENTE

NOMBRE

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE : DIEGO GUALTEROS CHAVEZ

CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	EX_08_043_1556_10_V4	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	KENNEDY	CUENTA	
		UPZ	TIMIZA	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	556872	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72R BIS KR 72R	20	6				5	
3	556866	SP-24	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q BIS KR 72R		5				5	
4	556865	SP-24	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q BIS KR 72R		5				5	
5	556862	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72Q CL 43S CL 42 B S	20	6				5	
6	445319	SP-48	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72Q CL 43S CL 42 B S			30				
7	255410	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72Q CL 43S CL 42 B S		5	30			5	
8	556859	SR-28	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q KR 72 P		5	30			5	
9	556858	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q KR 72 P		6				5	
10	445404	SR-28 PLAQUET	60	60	27	46	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q KR 72 P	EN ESTA CUADRA	8	30			5	

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 224.928	3	$ 674.784
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV O superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 187.708	1	$ 187.708
30	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 13.595	4	$ 54.380
		SUBTOTAL		$ 1.584.572
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 473.787
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 31.691
		UTILIDAD	5,00%	$ 79.229
		TOTAL		$ 2.169.279

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	EX_02_171_1249_11 PMT-Emergencia la Calera	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	CHAPINERO	CUENTA	
		UPZ	BOSQUES DE BELLAVISTA	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	629907	SPO-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					
3	629908	SPO-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					
4	629909	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA	0. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
5	629910	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA	0. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
6	629911	SP-42	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					
7	629912	SR-30	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	0,58	$ 101.162
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	2	$ 123.776
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo	$ 30.280	2	$ 60.560
	SUBTOTAL			$ 953.198
	ADMINISTRACIÓN	29,90%		$ 285.006
	IMPREVISTOS	2,00%		$ 19.064
	UTILIDAD	5,00%		$ 47.660
	TOTAL			$ 1.304.929

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID: EX_02_180_1881_12 Inspección_Emergencia_KR1 con CL 77	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD: CHAPINERO	CUENTA
		UPZ: AKIE	14

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO					SUM E INST	RET	REUB	INST	BARANTIA	SUM
1																
2		SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	TRANSITE POR LA ACERA	1	2				28
3		SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	TRANSITE POR LA ACERA	1	2				28
4		SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	O. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
5		SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	O. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
6		SRO-03	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77		5					
7		SRO-03	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77		5					
8		SPO-31	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77		5					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	1,15	$ 200.581
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	4	$ 247.552
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	3	$ 500.775
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo	$ 30.280	4	$ 121.120
	SUBTOTAL			$ 1.070.028
	ADMINISTRACIÓN	29,90%		$ 319.938
	IMPREVISTOS	2,00%		$ 21.401
	UTILIDAD	5,00%		$ 53.501
	TOTAL			$ 1.464.868

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	MV_03_001_1783_19	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	SANTA FE	CUENTA	
		UPZ	CERROS DE ORIENTE	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 0+200	PAVAS ANDINAS	1			28	5	2
3		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 0+500	PAVAS ANDINAS	1			28	5	2
4		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 1+300	ZARIGUEYAS	1			28	5	2
5		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 1+700	ZARIGUEYAS	1			28	5	2
6		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 1+800	ARDILLAS	1			28	5	2
7		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 2+100	ARDILLAS	1			28	5	2
8		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 5+700	TIGRILLOS LANUDOS	1			28	5	2
9		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 5+900	TIGRILLOS LANUDOS	1			28	5	2
10		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 9+200	ZORROS PERRUNOS	1			28	5	2
11		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 9+500	ZORROS PERRUNOS	1			28	5	2

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	7,13	$ 1.243.600
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	10	$ 618.880
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	$ 30.280	10	$ 302.800
		SUBTOTAL		$ 2.165.280
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 647.419
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 43.306
		UTILIDAD	5,00%	$ 108.264
		TOTAL		$ 2.964.269

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID: MV_08_26_1244_11 CONVENIO SDM - IDU	27/11/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD: KENNEDY	CUENTA:
		UPZ: KENNEDY CENTRAL	13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO					SUM E INST.	RET	REUB	INST	CAPACITACIÓN	SUM
1																
2		SRC-05/PLAQ	45	45	19	43	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	PRIORIDAD PEATON	21				5	
3		SIC -02	25	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	AV 1 DE MAYO	20				5	
4		SP-24	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B		5	30			5	
5		SIC -02	25	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	AV 1 DE MAYO	20				5	
6		SP-59	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B		5	30			5	
7		SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
8		SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
9		SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		6	30			5	
10		SRB-02	45	45			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		20				5	
11		SP-46B	60	60	37	35	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		6	30			5	
12		SP-46B	60	60	37	35	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		6	30			5	
13		SRB-02	45	45			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		20				5	
14		SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B		6	30			5	
15		SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
16		SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
17		SI-27A	69	49			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B		1			2	5	28
18		SP-24	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B		5	30			5	
19		SR-28	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 78B CL 41 SUR CL 40 SUR		5	30			5	
20		SRB-02	45	45			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B		20				5	
21		SI-27A	69	49			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B		1			2	5	28
22		SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
23		SP-48/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B		6	30			5	
24		SI-27A	69	49			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 79		1			2	5	28

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	1,01	$ 176.162
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	3	$ 185.664
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 224.928	5	$ 1.124.640
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV O superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 187.708	5	$ 938.540
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de	$ 215.555	5	$ 1.077.775
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo	$ 250.374	1	$ 250.374
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones)	$ 30.280	3	$ 90.840
30	Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 13.595	14	$ 190.330
	SUBTOTAL			$ 4.702.025
	ADMINISTRACIÓN	29,90%		$ 1.405.906
	IMPREVISTOS	2,00%		$ 94.041
	UTILIDAD	5,00%		$ 235.101
	TOTAL			$ 6.437.072

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	MV_AV_BOYACA_941_09	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR	CUENTA	ITEM DE PAGO
		UPZ	EL TESORO	14	

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2		SP-23	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 70C CL 71 BIS S		5				5	
3		SP-23	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 70C CL 71 BIS S		5				5	
4		SP-23	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C		5				5	
5		SP-23	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C		5				5	
6	431037	SP-67/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C	60		30			5	
7	431038	SP-67/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C	60		30			5	
8	431039	SP-46/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C	40		30			5	
9	431040	SP-46/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C	40		30			5	
10	431041	SP-24/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C	30		30			5	
11	431042	SP-24/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA CL 71 BIS S CL 70C	30		30			5	

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
30	Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 13.595	6	$ 81.570
		SUBTOTAL		$ 749.270
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 224.032
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 14.985
		UTILIDAD	5,00%	$ 37.464
		TOTAL		$ 1.025.751

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Lilian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	PASACALLES	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	FONTIBON	CUENTA	
		UPZ	FONTIBON	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	BARANTIA	SUM
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
1		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 24C AV BOYACA		95					
2		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 48 AV BOYACA		95					
3		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CARRERA 81B AV CENTENARIO		95					
4		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 15A AV CIUDAD DE CALI		95					
5		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CARRERA 104 AV CENTENARIO		95					
6		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CARRERA 111A AV CENTENARIO		95					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
95	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	$ 61.294	90	$ 5.516.460
		SUBTOTAL		$ 5.516.460
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 1.649.422
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 110.329
		UTILIDAD	5,00%	$ 275.823
		TOTAL		$ 7.552.034

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	ZE_08_461_943_10	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	KENNEDY	CUENTA
		UPZ	TIMIZA	14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
											SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	562876	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 78 KR 74	20	6				5	
3	1757	SR-30	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 78 KR 74			30				
4	562877	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 75 CL 4 CL 3	20	7				5	
5	1789	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 75 CL 4 CL 3A		5				5	
6	23260	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 75 KR 74		5				5	
7	195863	SP-47	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 75 KR 74			30				
8	23262	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3A KR 74 KR 75		5	30			5	
9	562878	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3A KR 74 KR 75	20	7				5	
10	23261	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 3A CL 4		5				5	
11	562857	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3A KR 74 KR 73C	20	6				5	
12	1751	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3A KR 74 KR 73C		5	30			5	
13	562881	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 75 CL 3A DG 5A		6				5	
14	562882	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3 KR 75 KR 78		5				5	
15	236841	SR-38	25	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3 KR 75 KR 78		19				5	
16	236844	SR-38	25	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3 KR 75 KR 78		19				5	
17	562883	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3 KR 75 KR 78	30	7				5	
18	23269	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 75 CL 3 DG 5A		5	30			5	
19	186462	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 DG 5A		5				5	
20	562879	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 DG 5A	VIA CERRADA	18				5	
21	1752	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C DG 5A CL 3A		5	30			5	
22	236817	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B KR 73C	VIA CERRADA	18				5	
23	23259	SRO-01	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B KR 73C	VIA CERRADA		30				
24	23258	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B KR 73C		5	30			5	
25	562856	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 3B CL 5	20	7				5	
26	522855	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 73C		10				5	
27	1778	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 73C		5				5	
28	236818	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 4 KR 73C	VIA CERRADA	18				5	
29	562875	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 4 CL 5A	20	6				5	
30	562874	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 3A CL 5A	20	6				5	
31	562873	SP-46	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 3A CL 5A			30				
32	562845	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 78 KR 74A	VIA CERRADA	18				5	
33	562846	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74A CL 5	VIA CERRADA	18				5	
34	191690	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74A CL 5		5				5	
35	562847	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 74A KR 74	20	6				5	
36	1772	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 74A KR 74		5	30			5	
37	1787	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74A CL 5		5				5	

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	ZE_08_461_943_10	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	KENNEDY	CUENTA
		UPZ	TIMIZA	14

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
											SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
38	562848	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 74 KR 73C	20	7				5	
39	1749	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 74 KR 73C		5	30			5	
40	1759	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 74 KR 73C		5	30			5	
41	1750	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B KR 73C		5				5	
42	562852	SP-47B	75	75	37	35	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5B CL 5		7				5	
43	562853	SP-47B	75	75	37	35	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5 CL 5B		7				5	
44	562851	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 4 CL 5A	20	7				5	
45	562854	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5 CL 5B	20	6				5	
46	562849	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5 CL 5B		10				5	
47	208150	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5 CL 5B		5	30			5	
48	143829	SR-28	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5A CL 5B		5	30			5	
49	562850	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5A CL 5B	20	7				5	
50	562844	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5A CL 5B	20	6				5	
51	562843	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5A CL 5B		10				5	
52	1760	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5A CL 5B		5	30			5	
53	562814	SP-48	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78		5				5	
54	208153	SP-47	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78			30				
55	562815	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78	20	6				5	
56	562816	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78		10				5	
57	23303	SP-48	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78			30				
58	562817	SP-47B	75	75	37	35	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78		7				5	
59	1762	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74A CL 5C CL 5B		5	30			5	
60	562813	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74A CL 5C CL 5B		5				5	
61	1792	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74A CL 5C CL 5B	VIA CERRADA	18				5	
62	562819	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5B		10				5	
63	562821	SP-24	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5B		5				5	
64	208146	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5B		5	30			5	
65	562818	SP-47B	75	75	37	35	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 78		7				5	
66	208148	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 74 CL 5B		18				5	
67	562822	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 73C	20	6				5	
68	562823	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 73C		10				5	
69	562824	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 73C		10				5	
70	23305	SP-47	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 73C			30				
71	562825	SP-24	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 74 KR 73C		5				5	
72	208149	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5B CL 5C		5	30			5	
73	562826	SP-47A	75	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5B CL 5C		10				5	
74	143825	SR-28	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5B CL 5C		5				5	
75	562827	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5B CL 5C		6				5	

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	ZE_08_461_943_10	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	KENNEDY	CUENTA
		UPZ	TIMIZA	14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
											SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
76	1780	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73C		5				5	
77	562828	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73C	VIA CERADA	18				5	
78	562830	SP-25	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5C CL 6		5	30			5	
79	595849	SP-59	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5C CL 6		5	30			5	
80	143830	SR-28	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73C CL 5C CL 6		5				5	
81	562858	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 73C KR 73B	20	7				5	
82	562859	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 73C KR 73B	20	6				5	
83	562860	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 73C KR 73B		5				5	
84	562861	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL5	VIA CERADA	18				5	
85	562802	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 73B KR 73A		5				5	
86	562864	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 73B KR 73A	20	6				5	
87	562863	SR-30	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5 KR 73B KR 73A	20	5				5	
88	562866	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5		5				5	
89	189777	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5		5				5	
90	562867	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B KR 73	20	6				5	
91	562868	SR-30	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B KR 73A	20	5				5	
92	195909	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B KR 73		5				5	
93	195903	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B		5				5	
94	148735	SP-48	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B		5				5	
95	562869	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5A KR 73B	VIA CERRADA	18				5	
96	562870	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5B CL 5A	20	6				5	
97	562871	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5B CL 5A	20	7				5	
98	562827	SP-48	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5B CL 5A		5				5	
99	1743	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5B CL 5A		5	30			5	
100	208151	SR-28	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73C KR 73B		5				5	
101	562831	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73C KR 73B	20	7				5	
102	23308	SP-48	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73C KR 73B		5				5	
103	23307	SP-47	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73C KR 73B		10	30			5	
104	562833	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73C KR 73B	20	6				5	
105	208152	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5B CL 5C		5				5	

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID: ZE_08_461_943_10	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD: KENNEDY	CUENTA
		UPZ: TIMIZA	14

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
											SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
106	186448	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5B CL 5C		5	30			5	
107	562841	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5B	VIA CERRADA	18				5	
108	23310	SP-48	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73A KR 73			30				
109	189767	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5B		5				5	
110	562842	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73A KR 73	20	6				5	
111	225889	SR-28	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5B KR 73A KR 73		5	30			5	
112	562829	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73C	VIA CERRADA	18				5	
113	195904	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73C		5				5	
114	562836	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5C CL 5B	20	7				5	
115	562835	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5C	VIA CERRADA	18				5	
116	562834	SP-48	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73B CL 5C		5				5	
117	189768	SR-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73B KR 73A		5				5	
118	562838	SP-46/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73B KR 73A	20	6				5	
119	562837	SP-46/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 5C KR 73B KR 73A	20	6				5	
120	562839	SI-27	40	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5C		18				5	
121	562840	SP-48	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 73A CL 5C		5				5	

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	53	$ 8.847.025
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 224.928	19	$ 4.273.632
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cms ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 276.665	15	$ 4.149.975
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 227.793	9	$ 2.050.137
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 142.074	14	$ 1.989.036
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 131.638	2	$ 263.276
30	Retiro de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 13.595	28	$ 380.660
		SUBTOTAL		$ 21.953.741
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 6.564.169
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 439.075
		UTILIDAD	5,00%	$ 1.097.687
		TOTAL		$ 30.054.671

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	EM_02_01_1782_19 Inspección_Emergencia_KR1 con CL 77	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	CHAPINERO	CUENTA		
		UPZ	AKIE	14	ITEM DE PAGO	

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	629399	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	TRANSITE POR LA ACERA	1	2				28
3	629400	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	TRANSITE POR LA ACERA	1	2				28
4	629401	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	0. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
5	629402	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77	0. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
6	629403	SRO-03	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77		5					
7	629404	SRO-03	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77		5					
8	629405	SPO-31	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1E CL 77		5					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	1,15	$ 200.581
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	4	$ 247.552
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	3	$ 500.775
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo	$ 30.280	4	$ 121.120
		SUBTOTAL		$ 1.070.028
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 319.938
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 21.401
		UTILIDAD	5,00%	$ 53.501
		TOTAL		$ 1.464.868

CONTRATISTA


FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

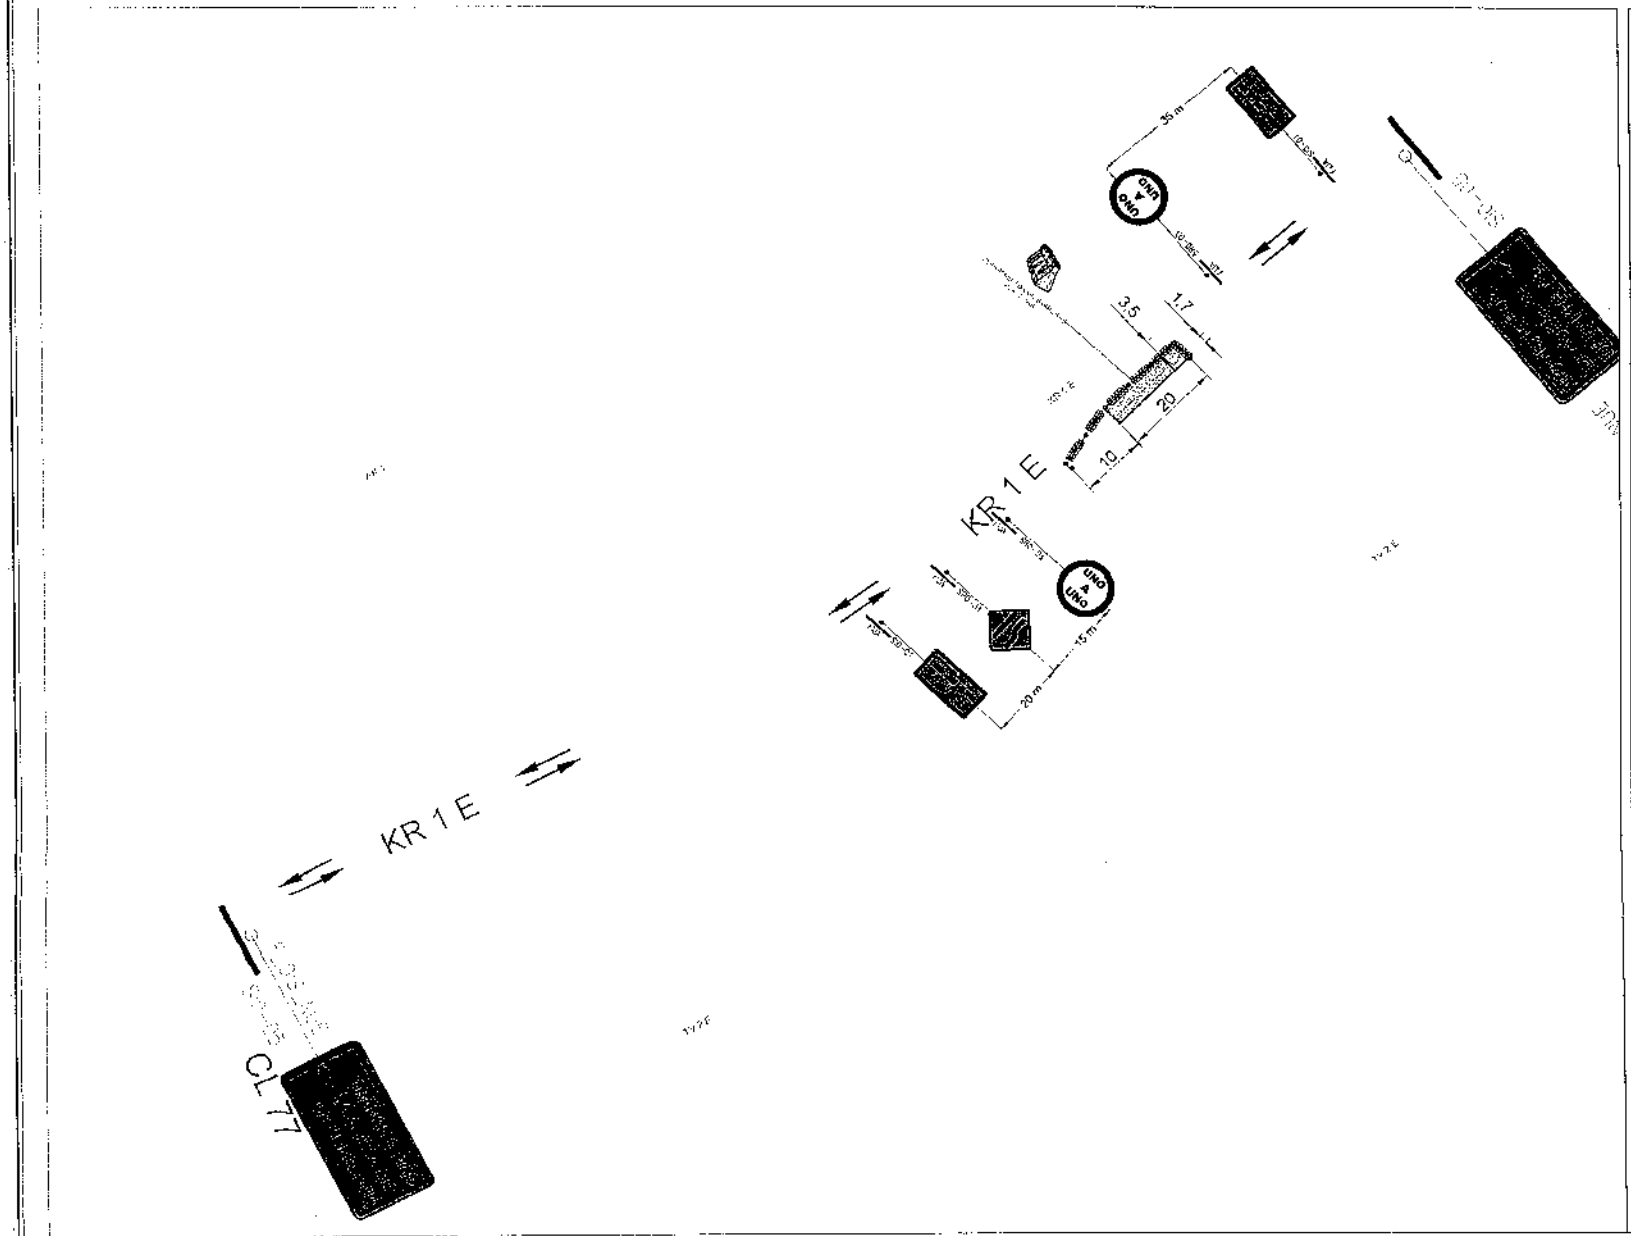

CONVENCIONES

	SENTIDO CIRCULACION VEHICULAR
	DESVIO VEHICULAR
	SEMAFORO
	DELINEADORES TUBULARES VISTA PERFIL
	DELINEADORES TUBULARES VISTA PLANTA
	CONOS VISTA PERFIL
	CONOS VISTA PLANTA
	BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES VISTA PERFIL
	BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES VISTA PLANTA
	BARRICADA VISTA PERFIL
	PANEL FLECHA LUMINOSA
	BANDEREROS
	SEÑALIZACION VERTICAL TEMPORAL
	ZONA DE OBRA
	VEHICULO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

BOGOTÁ

CONTIENE

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO POR EMERGENCIA: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA KR 1 ESTE 215m AL NORTE DE LA CL 77

encontro alguna en compos.

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	EX_08_043_1556_10_V4	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	KENNEDY	CUENTA	
		UPZ	TIMIZA	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	BARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	556872	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72R BIS KR 72R	20	6				5	
3	556866	SP-24	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q BIS KR 72R		5				5	
4	556865	SP-24	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q BIS KR 72R		5				5	
5	556862	SP-48/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72Q CL 43S CL 42 B S	20	6				5	
6	445319	SP-48	60	60			RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72Q CL 43S CL 42 B S			30				
7	255410	SR-01	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72Q CL 43S CL 42 B S		5	30			5	
8	556859	SR-28	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q KR 72 P		5	30			5	
9	556858	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q KR 72 P		6				5	
10	445404	SR-28 PLAQUET	60	60	27	46	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 42B S KR 72Q KR 72 P	EN ESTA CUADRA	8	30			5	

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 224.928	3	$ 674.784
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV O superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 187.708	1	$ 187.708
30	Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 13.595	4	$ 54.380
		SUBTOTAL		$ 1.584.572
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 473.787
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 31.691
		UTILIDAD	5,00%	$ 79.229
		TOTAL		$ 2.169.279

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	MV_03_001_1783_19	27/12/2020	Consorcio InterSEÑALIZACION
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	SANTA FE	CUENTA	
		UPZ	CERROS DE ORIENTE	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 0+200	PAVAS ANDINAS	1			28	5	2
3		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 0+500	PAVAS ANDINAS	1			28	5	2
4		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 1+300	ZARIGUEYAS	1			28	5	2
5		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 1+700	ZARIGUEYAS	1			28	5	2
6		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 1+800	ARDILLAS	1			28	5	2
7		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 2+100	ARDILLAS	1			28	5	2
8		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 5+700	TIGRILLOS LANUDOS	1			28	5	2
9		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 5+900	TIGRILLOS LANUDOS	1			28	5	2
10		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 9+200	ZORROS PERRUNOS	1			28	5	2
11		SI-27A	95,5	75			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	PR 9+500	ZORROS PERRUNOS	1			28	5	2

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	7,13	$ 1.243.600
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	10	$ 618.880
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	$ 30.280	10	$ 302.800
		SUBTOTAL		$ 2.165.280
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 647.419
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 43.306
		UTILIDAD	5,00%	$ 108.264
		TOTAL		$ 2.964.269

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	MV_08_260_1244_11	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	KENNEDY	CUENTA
		UPZ	CIUDAD KENNEDY	14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ÍTEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	MANTTA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	630174	SRC-05/PLAQ	45	45	19	43	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	PRIORIDAD PEATON	21				5	
3	630175	SIC -02	25	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	AV 1 DE MAYO	20				5	
4	630176	SP-24	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B		5	30			5	
5	630177	SIC -02	25	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	AV 1 DE MAYO	20				5	
6	630178	SP-59	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B		5	30			5	
7	630179	SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
8	630180	SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
9	630181	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		6	30			5	
10	630182	SRB-02	45	45			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		20				5	
11	630183	SP-46B	60	60	37	35	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		6	30			5	
12	630184	SP-46B	60	60	37	35	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		6	30			5	
13	630185	SRB-02	45	45			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR AV 1 DE MAYO TV 78		20				5	
14	630186	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B		6	30			5	
15	630187	SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
16	630188	SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
17	630189	SI-27A	69	49			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B		1			2	5	28
18	630190	SP-24	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78 TV 78B		5	30			5	
19	630191	SR-28	60	60			REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 78B CL 41 SUR CL 40 SUR		5	30			5	
20	630192	SRB-02	45	45			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B		20				5	
21	630193	SI-27A	69	49			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B		1			2	5	28
22	630194	SR-28 PLAQUETA	60	60	31	61	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B	EN AMBOS COSTADOS	8	30			5	
23	630195	SP-48/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 78B		6	30			5	
24	630196	SI-27A	69	49			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 41 SUR TV 78K TV 79		1			2	5	28

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	1,01	$ 176.162
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	3	$ 185.664
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 224.928	5	$ 1.124.640
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV O superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 187.708	5	$ 938.540
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de	$ 215.555	5	$ 1.077.775
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo	$ 250.374	1	$ 250.374
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo	$ 30.280	3	$ 90.840
30	Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 13.595	14	$ 190.330
	SUBTOTAL			$ 4.702.025
	ADMINISTRACIÓN	29,90%		$ 1.405.906
	IMPREVISTOS	2,00%		$ 94.041
	UTILIDAD	5,00%		$ 235.101
	TOTAL			$ 6.437.072

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C	REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION		DATOS DE IMPLEMENTACION			
		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		COI		GRUPO	14
		LOCALIDAD	FONTIBON	FECHA DE INICIO			
	CONTRATO 2019 - 1782	UPZ	FONTIBON	FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
		ID	MV_09_048_1556_10			TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
PLASTICO	A	BL	UND			2,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	TCH	UND			3,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			22,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	BL	UND			2,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	TCH	UND			3,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			6,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			67,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			22,00			DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	<6
LLANA	VERDE	DIRECCION	M2				0,72	1,02	DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,5	1,71	DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,56	1,71	DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	11
LLANA	VERDE	DIRECCION	M2				0,72	1,02	DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	F	A	A	R	A	11
PLASTICO	A	BL	UND			2,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	TCH	UND			3,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			39,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			10,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			124,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			78,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			16,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			41,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	BL	UND			2,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	TCH	UND			3,00			DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	<6
LLANA	VERDE	DIRECCION	M2				0,72	1,02	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,5	1,71	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,56	1,71	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,5	1,71	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,56	1,71	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
LLANA	VERDE	DIRECCION	M2				0,72	1,02	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	FGI_C	M2				0,25	0,53	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	DIRECCION	M2				0,64	1,02	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	DIRECCION	M2				0,64	1,02	DG 16 ENTRE KR 104 - AK 106	F	A	A	R	A	11
PLASTICO	A	BL	UND			2,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	TCH	UND			3,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			53,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			1,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			43,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			17,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			56,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			16,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			50,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	BL	UND			2,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	A	TCH	UND			3,00			DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	<6
SPRAY M2	B	DIRECCION	M2				0,64	1,02	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	DIRECCION	M2				0,64	1,02	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
LLANA	VERDE	DIRECCION	M2				0,72	1,02	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	FGD_C	M2				0,25	0,53	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,5	1,71	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,56	1,71	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,5	1,71	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,56	1,71	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,5	1,71	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
SPRAY M2	B	TAPABOCAS	M2				0,56	1,71	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
LLANA	VERDE	DIRECCION	M2				0,72	1,02	DG 16 ENTRE AK 106 - KR 111A	F	A	A	R	A	11
PLASTICO	B/R	TR	UND			77,00			DG 16 ENTRE KR 111A - KR 116	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			20,00			DG 16 ENTRE KR 111A - KR 116	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			43,00			DG 16 ENTRE KR 116 - KR 123	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			19,00			DG 16 ENTRE KR 116 - KR 123	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			5,00			DG 16 ENTRE KR 116 - KR 123	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			9,00			DG 16 ENTRE KR 116 - KR 123	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			21,00			AC 17 ENTRE KR 123 - KR 124	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			45,00			AC 17 ENTRE KR 124 - AK 128	F	A	A	R	A	<6
PLASTICO	B/R	TR	UND			93,00			AC 17 ENTRE AK 128 - KR 135	F	A	A	R	A	<6

TOTAL

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PARA MARCAS VIALES

FLECHA DIRECCIONAL	PSOLO		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL **0,20**	RE	RESALTO REAL
FLECHA TRIPLE	LA		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO	TR	TACHA REFLEC.
REDUCCION CARRIL DERECHA	LB		PP	PASO PEATONAL - CEBRA	BL	BALIZAS O HITOS
PICTOGRAMA PARE	LCM		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
CEDA EL PASO	LCN		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
PICTOGRAMA SOLO BUS	LCP		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMP L25			NEGRO			
IMP M2			NEGRO	31,78		
SPRAY M2			B/A	9,42	-	
LLANA M2			B/A	4,32		
TR			BB/BR/A			993,00
TCH			A			18,00
HITOS / BALIZAS			N			12,00

FIRMA RESIDENTE

NOMBRE

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE : DIEGO GUALTEROS CHAVEZ

CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C	REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION		DATOS DE IMPLEMENTACION			
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		COI		GRUPO	14
	LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR	FECHA DE INICIO			
CONTRATO 2019 - 1782	UPZ	EL TESORO	FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
	ID	MV_AV_BOYACA_941_09			TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	3,0	9,00	9,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	3,0	9,00	9,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LP	M2	0,60	9,85		5,91	6,90	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	PP	M2	0,40	4,00	12,00	19,20	24,60	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCN	ML	0,15	129,70		129,70	129,70	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCN	ML	0,15	129,70		129,70	129,70	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	3,0	9,00	9,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	3,0	9,00	9,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	R	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	5,0	15,00	15,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	PAB	M2	0,30	21,90		6,57	8,76	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	10,0	30,00	30,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	FF	M2				1,20	1,80	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LP	M2	0,60	9,70		5,82	6,79	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	PP	M2	0,40	4,00	12,00	19,20	24,60	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LPA	ML	0,15	14,20		14,20	14,20	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCN	ML	0,15	54,20		54,20	54,20	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6

SPRAY	B	LCN	ML	0,15	40,70		40,70	40,70	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6
SPRAY	B	LCA	ML	0,12	3,00	5,0	15,00	15,00	AV BOYACA ENTRE CL 70C S - KR 16C	F	A	A	R	A	<6

TOTAL

OBSERVACIONES:							

CONVENCIONES PARA MARCAS VIALES

FLECHA DIRECCIONAL	PSOLO		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL **0,20**	RE	RESALTO REAL
FLECHA GIRO DERECHA	PMIN		LL	LINEA LOGARITMICA	RV	RESALTO VIRTUAL
FLECHA GIRO IZQUIERDA	FMIN		LP	LINEA DE PARE	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO
FLECHA DOBLE DERECHA	ACH		LPA	LINEA DE PARADA **0,15**	SPT	SENDERO PEATONAL
FLECHA DOBLE IZQUIERDA	BS		PAB	PARADA AUTOBUS **(0,25*6*L)**	EP	ESTOPEROL
FLECHA DOBLE GIRO	DS		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL	TCH	TACHON CON ESPIGO
FLECHA TRIPLE	LA		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO	TR	TACHA REFLEC.
REDUCCION CARRIL DERECHA	LB		PP	PASO PEATONAL - CEBRA	BL	BALIZAS O HITOS
REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	LC		PM	PINTURA PARA MUROS		
PICTOGRAMA ESCOLAR	LCA		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	LCI		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
PICTOGRAMA PARE	LCM		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
CEDA EL PASO	LCN		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
PICTOGRAMA SOLO BUS	LCP		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMP L12			NEGRO		-	
IMP L15			NEGRO		96,0	
IMP L20			NEGRO		368,5	
IMP L25			NEGRO			
IMP M2			NEGRO	89,05		
SPRAY L10			B/A		-	
SPRAY 12			B/A		96,0	
SPRAY 15			B/A		368,5	
SPRAY 20			B/A			
LLANA ML			B/A			
SPRAY M2			B/A	68,50	-	
LLANA M2			B/A	-		
ANTIDESLIZANTE		PP	B	38,40		
BASE SOLVENTE M2			B/A			
BORDILLO CONCRETO			B			-
TR			BB/BR/A			-
TCH			A			-
HITOS / BALIZAS			N			-
EP METALICO			B/A			-
BA AGREGADO			A	-		
RETIRO DE TCH			N			

FIRMA RESIDENTE

NOMBRE

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE : DIEGO GUALTEROS CHAVEZ

CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C	REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION		DATOS DE IMPLEMENTACION			
		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		COI		GRUPO	14
		LOCALIDAD	FONTIBON	FECHA DE INICIO			
	CONTRATO 2019 - 1782	UPZ	FONTIBON	FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
		ID	MV_09_048_1556_10			TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	121,00	130,68		DG 16 ENTRE KR 100 - KR 104	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	191,00	206,28		DG 16 ENTRE KR 104 - KR 106	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	265,00	286,2		DG 16 ENTRE KR 106 - KR 111A	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	378,00	408,24		DG 16 ENTRE KR 111A - KR 116	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	233,00	251,64		DG 16 ENTRE KR 116 - KR 120	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	123,00	132,84		DG 16 ENTRE KR 120 - KR 123	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	100,00	108		DG 16 ENTRE KR 123 - KR 124	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	233,00	251,64		DG 16 ENTRE KR 124 - KR 128	R	B	A	B	M	8
SOLVENTE	A	New Jersey	UND	0,72	1,50	456,00	492,48		DG 16 ENTRE KR 128 - KR 135	R	B	A	B	M	8

TOTAL

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMP L12			NEGRO		-	
IMP L15			NEGRO		-	
IMP L20			NEGRO		-	
IMP L25			NEGRO			
IMP M2			NEGRO	-		
SPRAY L10			B/A		-	
SPRAY 12			B/A		-	
LLANA 15			B/A		-	
SPRAY 20			B/A			
LLANA ML			B/A			
SOLVENTE M2			B/A	2.268,00	-	
SPRAY M2			B/A			
ANTIDESLIZANTE		PP	B			
BASE SOLVENTE M2			B/A			
BORDILLO CONCRETO			B			
TR			BB/BR/A			
TCH			A			
HITOS / BALIZAS			N			

CONVENCIONES PARA MARCAS VIALES

FLECHA DIRECCIONAL	PSOLO		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL **0,20**	RE	RESALTO REAL
FLECHA GIRO DERECHA	PMIN		LL	LINEA LOGARITMICA	RV	RESALTO VIRTUAL
FLECHA GIRO IZQUIERDA	FMIN		LP	LINEA DE PARE	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO
FLECHA DOBLE DERECHA	ACH		LPA	LINEA DE PARADA **0,15**	SPT	SENDERO PEATONAL
FLECHA DOBLE IZQUIERDA	BS		PAB	PARADA AUTOBUS **(0,25*6*L)**	EP	ESTOPEROL
FLECHA DOBLE GIRO	DS		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL	TCH	TACHON CON ESPIGO
FLECHA TRIPLE	LA		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO	TR	TACHA REFLEC.
REDUCCION CARRIL DERECHA	LB		PP	PASO PEATONAL - CEBRA	BL	BALIZAS O HITOS
REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	LC		PM	PINTURA PARA MUROS		
PICTOGRAMA ESCOLAR	LCA		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	LCI		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
PICTOGRAMA PARE	LCM		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
CEDA EL PASO	LCN		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
PICTOGRAMA SOLO BUS	LCP		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		

FIRMA RESIDENTE

NOMBRE

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE :DIEGO GUALTEROS CHAVEZ

CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA FASE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Consorcio InterSEÑALIZACION
CONTRATO No.:	2019-1782	ID	PASACALLES	27/12/2020	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD	FONTIBON	CUENTA	
		UPZ	FONTIBON	14	ITEM DE PAGO

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
1		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 24C AV BOYACA		95					
2		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 48 AV BOYACA		95					
3		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CARRERA 81B AV CENTENARIO		95					
4		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 15A AV CIUDAD DE CALI		95					
5		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CARRERA 104 AV CENTENARIO		95					
6		PASACALLE	1,5	10			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CARRERA 111A AV CENTENARIO		95					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
95	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	$ 61.294	90	$ 5.516.460
		SUBTOTAL		$ 5.516.460
		ADMINISTRACIÓN	29,90%	$ 1.649.422
		IMPREVISTOS	2,00%	$ 110.329
		UTILIDAD	5,00%	$ 275.823
		TOTAL		$ 7.552.034

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA FASE
CONTRATO No.:	2019-1782	ID: EX_02_171_1249_11 PMT-Emergencia la Calera	27/12/2020
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN	LOCALIDAD: CHAPINERO	CUENTA
		UPZ: BOSQUES DE BELLAVISTA	14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Consorcio InterSEÑALIZACION

No.	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	ITEM DE PAGO					
											SUM E INST	RET	REUB	INST	GARANTIA	SUM
1			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO										
2	629907	SPO-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					
3	629908	SPO-01	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					
4	629909	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA	0. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
5	629910	SIO-05	32	90			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA	0. EN LA VIA A 50 M	1	2				28
6	629911	SP-42	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					
7	629912	SR-30	60	60			INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KM 1 VIA LA CALERA		5					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 174.418	0,58	$ 101.162
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 61.888	2	$ 123.776
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 166.925	4	$ 667.700
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo	$ 30.280	2	$ 60.560
	SUBTOTAL			$ 953.198
	ADMINISTRACIÓN	29,90%		$ 285.006
	IMPREVISTOS	2,00%		$ 19.064
	UTILIDAD	5,00%		$ 47.660
	TOTAL			$ 1.304.929

CONTRATISTA


FIRMA: _____

NOMBRE _____

INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: Julian Alvarez

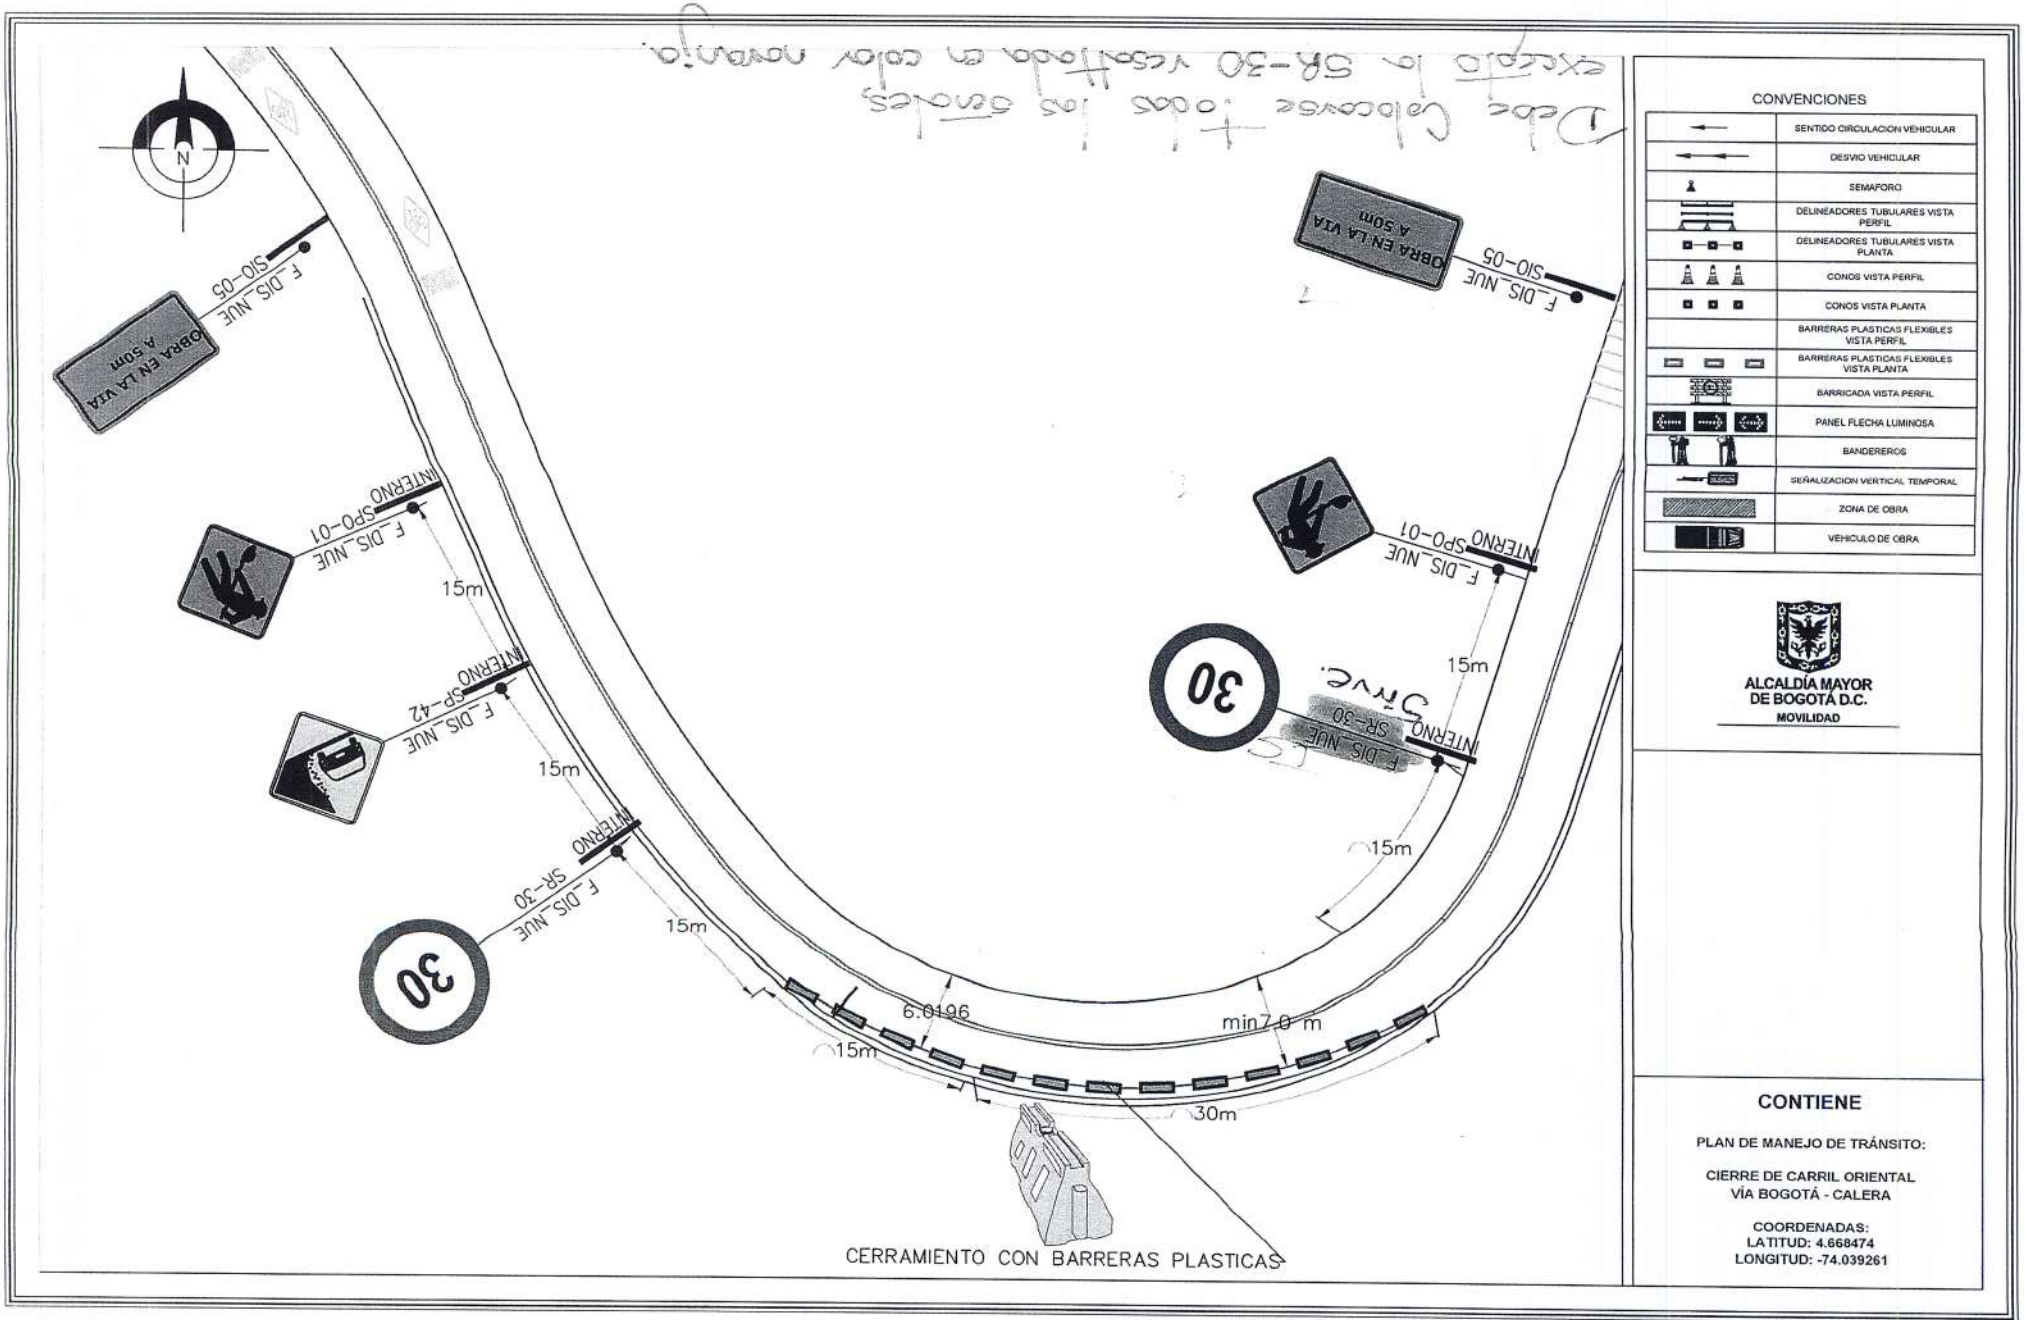

PMT_Emergencia vía la Calera

	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C	REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION		DATOS DE IMPLEMENTACION			
		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		COI		GRUPO	14
		LOCALIDAD	KENNEDY	FECHA DE INICIO			
	CONTRATO 2019 - 1782	UPZ	TIMIZA	FECHA DE TERMINACION		LAMINA	
		ID	ZE_08_461_943_10			TESTIGO	

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 5A ENTRE KR 74 - KR 74A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	VMP20	M2				3,3	8,09	CL 5A ENTRE KR 74 - KR 74A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	LC	ML	0,12	71,10		71,10	71,10	CL 5A ENTRE KR 74 - KR 74A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73A ENTRE CL 5A - CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73A ENTRE CL 5A - CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	LP	M2	0,60	2,40		1,44	1,68	KR 73A ENTRE CL 5A - CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73A ENTRE CL 5A - CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73A ENTRE CL 5A - CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	13,30		3,99	5,32	KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
SPRAY	A	LC	ML	0,12	47,90		47,90	47,90	KR 73B ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	13,80		4,14	5,52	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	LP	M2	0,60	2,50		1,50	1,75	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDG	M2				2,50	3,50	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			130,00			CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			130,00			CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			130,00			CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			130,00			CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	A	13
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	14,10		4,23	5,64	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	LP	M2	0,60	2,70		1,62	1,89	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	LC	ML	0,12	54,30		54,30	54,30	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	CL 5 ENTRE KR 73B - KR 73C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	KR 73B CON CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	LC	ML	0,12	18,90		18,90	18,90	KR 73B CON CL 5	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	15,80		4,74	6,32	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FF	M2				1,2	1,8	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			176,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13
SPRAY	A	LCM	ML	0,12	43,20	2,00	86,40	86,40	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 5A	F	M	M	R	A	13

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	17,20		5,16	6,88	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			178,00			KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			173,00			KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			178,00			KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	A	13
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	18,70		5,61	7,48	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	LP	M2	0,60	3,20		1,92	2,24	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	LC	ML	0,12	51,20		51,20	51,20	KR 73C ENTRE CL 5A - CL 5B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	ZBC	M2	0,30	67,90		20,37	27,16	CL 5B ENTRE CON KR 73B	F	M	M	R	M	18
AGREGADO	B	CONTORNO RET	M2	0,40	34,90		13,96	17,45	CL 5B ENTRE CON KR 73B	F	M	M	R	A	12
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	16,20		4,86	6,48	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			179,00			CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	A	13
SPRAY	A	LCM	ML	0,12	59,60	2,00	119,20	119,20	CL 5B ENTRE KR 73C - KR 73B	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	17,60		5,28	7,04	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PE	M2				3,24	3,24	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	LP	M2	0,60	3,50		2,10	2,45	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FDD	M2				2,20	3,00	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	LCM	ML	0,12	44,00	2,00	88,00	88,00	KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			178,00			KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5C	F	M	M	R	A	13
SPRAY	B	SPT	M2	0,30	18,40		5,52	7,36	KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FF	M2				1,2	1,8	KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			175,00			KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			180,00			KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	A	13

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
SPRAY	A	LCM	ML	0,12	50,70	2,00	101,40	101,40	KR 73C CON CL 5C	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			203,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			174,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			209,00			KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	A	13
SPRAY	A	LCM	ML	0,12	8,20	2,00	16,40	16,40	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	FF	M2				1,2	1,8	KR 73C ENTRE CL 5 - CL 3A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 75 ENTRE CL 3 - DG 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP	M2				3,00	3,00	KR 75 ENTRE CL 3 - DG 5A	F	M	M	R	M	18
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	CL 3A ENTRE KR 74 - KR 75	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	CL 3A ENTRE KR 74 - KR 75	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 3A ENTRE KR 74 - KR 75	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			125,00			CL 3A ENTRE KR 74 - KR 75	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 3A ENTRE KR 74 - KR 75	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 3A ENTRE KR 74 - KR 75	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 75 ENTRE CL 3A - CL 4	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 75 ENTRE CL 3A - CL 4	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 75 ENTRE CL 3A - CL 4	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			KR 75 ENTRE CL 3A - CL 4	F	M	M	R	A	13
SPRAY	B	PZE	M2				6,06	18,75	KR 75 ENTRE CL 3A - CL 4	F	M	M	R	M	18
SPRAY	A	PSP47A	M2				5,8	6,3	KR 75 ENTRE CL 3A - CL 4	F	M	M	R	M	18
PLASTICO	B	EP	UND			123,00			CL 4 ENTRE KR 75 - KR 78	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 4 ENTRE KR 75 - KR 78	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 4 ENTRE KR 75 - KR 74	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 4 ENTRE KR 75 - KR 74	F	M	M	R	A	13

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION	TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE							
PLASTICO	B	EP	UND			128,00			CL 4 ENTRE KR 75 - KR 74	F	M	M	R	A	13
PLASTICO	B	EP	UND			129,00			CL 4 ENTRE KR 75 - KR 74	F	M	M	R	A	13
BORRADO		FDD	M2			2,20			KR 73C ENTRE CL 5B - CL 5A						N/A

TOTAL

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMP L12			NEGRO		-	
IMP L15			NEGRO		654,8	
IMP L20			NEGRO		-	
IMP L25			NEGRO			
IMP M2			NEGRO	459,98		
SPRAY L10			B/A		-	
SPRAY 12			B/A		654,8	
LLANA 15			B/A		-	
SPRAY 20			B/A			
LLANA ML			B/A			
SOLVENTE M2			B/A	-	-	
SPRAY M2			B/A	285,50		
ANTIDESLIZANTE		PP	B	164,13		
BASE SOLVENTE M2			B/A			
BORDILLO CONCRETO			B			-
TR			BB/BR/A			-
TCH			A			-
HITOS / BALIZAS			N			-
EP PLASTICO			B/A			6.980,00

CONVENCIONES PARA MARCAS VIALES

FLECHA DIRECCIONAL	PSOLO		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL **0,20**	RE	RESALTO REAL
FLECHA GIRO DERECHA	PMIN		LL	LINEA LOGARITMICA	RV	RESALTO VIRTUAL
FLECHA GIRO IZQUIERDA	FMIN		LP	LINEA DE PARE	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO
FLECHA DOBLE DERECHA	ACH		LPA	LINEA DE PARADA **0,15**	SPT	SENDERO PEATONAL
FLECHA DOBLE IZQUIERDA	BS		PAB	PARADA AUTOBUS **(0,25*6*L)**	EP	ESTOPEROL
FLECHA DOBLE GIRO	DS		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL	TCH	TACHON CON ESPIGO
FLECHA TRIPLE	LA		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO	TR	TACHA REFLEC.
REDUCCION CARRIL DERECHA	LB		PP	PASO PEATONAL - CEBRA	BL	BALIZAS O HITOS
REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	LC		PM	PINTURA PARA MUROS		
PICTOGRAMA ESCOLAR	LCA		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	LCI		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
PICTOGRAMA PARE	LCM		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
CEDA EL PASO	LCN		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
PICTOGRAMA SOLO BUS	LCP		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			TIPO DE PAVIMENTO	TPD	CONTAM.	ESTADO DE PAVIMENTO	TIPO VIA	GARANTIA (MESES)
							PINTURA	IMPRIMANTE	DIRECCION						
								BA AGREGADO			A	13,96			
								RETIRO DE RPA			N				
								BORRADO MECANICO			N/A	2,20			

FIRMA RESIDENTE

NOMBRE

CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE : DIEGO GUALTEROS CHAVEZ

CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

ANEXO 5

HOJA DE VIDA DEL CONTRATO

ANEXO 6

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 1

ID	CIV	OBSERVACION
MV_09_024_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_048_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_189_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_038_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_192_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_201_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_180_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_424_947_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_019_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_187_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 2

ID	CIV	OBSERVACION
EX_08_323_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_284_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_181_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_263_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_336_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EM_08_124	N/A	EJECUTADO 100%
CPS_937_ZE_08_160	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_328_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_08_462_943_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_256_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_287_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_298_943_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_251_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_038_1556_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_185_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_201_1881_12_V5	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_031_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%

MV_09_278_1703_10	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_140_GEN	N/A	EJECUTADO 100%
EX_13_001_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_13_002_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_13_003_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_13_168_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 3

ID	CIV	OBSERVACION
TPD_PL_GEN_140	N/A	EJECUTADO 100%
AV. ESPERANZA C3	N/A	EJECUTADO 100%
MV _09_278_1703	N/A	EJECUTADO 100%
ID 29	N/A	EJECUTADO 100%
EX_18_158_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_033 (PATINETAS)	N/A	EJECUTADO 100%
PATINETAS CALLE 88 ENTRE KR 16 Y 17	N/A	EJECUTADO 100%
CLM-181002-000006	N/A	EJECUTADO 100%
CLM-181114-000013	N/A	EJECUTADO 100%
CLM-181114-000025	N/A	EJECUTADO 100%
SDM-236118-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-2236492018	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-239733-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DSVCT-270989-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-128946-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-181689-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-228915-18	N/A	EJECUTADO 100%

CP_SDM-DTI-238838-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-239184-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-258434-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-262632-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-DTI-270985-18	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-30312019	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-104163-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-SI-149468-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-55955-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-SI-174589-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDM-SI-187392-19	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-66734-2019	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-1135762019	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-709692019	N/A	EJECUTADO 100%
CP_SDQS-1672882019	N/A	EJECUTADO 100%
CP_Solicitud Subdirección	N/A	EJECUTADO 100%
CP_Solicitud Gerente de la localidad-19	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 4

ID	CIV	OBSERVACION
MV_08_001_1703_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_CALI_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_321_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_08_462_943_10	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_1847	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_002_1703_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_330_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_338_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_200_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_323_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_08_050_670_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_115_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_042_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_163_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_18_031_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_18_158_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_115_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%

MV_06_271_937_09	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_2186	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_097_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_06_024_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_108_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 5

ID	CIV	OBSERVACION
EM_08_124	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_042_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_327_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_329_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_201_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_BOYACA_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_CALI_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_168_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_269_937_09	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 6

ID	CIV	OBSERVACION
EX_08_279_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_296_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_343_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_BOYACA_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_CALI_941_09	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 7

ID	CIV	OBSERVACION
CPS_676_EM_09_80	N/A	EJECUTADO 100%
EM_08_124	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_009_1445_14	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_039_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_043_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_256_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_271_670_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_279_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_283_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_284_1244-11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_288_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_293_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_299_943_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_299_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_318_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_321_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_323_943_10	N/A	EJECUTADO 100%

EX_08_327_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_329_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_002_1214_15	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_017_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_032_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_184_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_185_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_195_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_201_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_203_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_06_364_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_235_1744_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_259_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_290_989_09	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_435_676_09	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_457_943_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_189_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_214_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_BOYACA_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_CALI_941_09	N/A	EJECUTADO 100%

SC_06_044	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_1383	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_2100	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_269_937_09	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 8

ID	CIV	OBSERVACION
CPS_941_EM_19_111	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06 _93_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_94_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_101_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_104_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_006	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_041_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_208_1744_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_211_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_284_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_293_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_323_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_331_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_348_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_035_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_184_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_203_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%

EX_09_217_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_278_1703_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_BOYACA_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
SC_06_044	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_154_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_522_943_10	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_08_050_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 9

ID	CIV	OBSERVACION
CPS_676_EM_09_58	N/A	EJECUTADO 100%
EX_06_104_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_009_1445_14	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_039_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_157_1703_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_256_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_284_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_325_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_332_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_001_1214_15	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_032_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_185_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_186_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_203_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_06_054_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_278_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_001_1214_15	N/A	EJECUTADO 100%

MV_09_024_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_048_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_BOYACA_941_09	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 10

ID	CIV	OBSERVACION
EX_08_157_1703_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_279_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_08_344_1867_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_001_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_031_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_034_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_035_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_181_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_184_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_187_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_195_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_203_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_218_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_218_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_219_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_220_1881_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_10_008_1560_10	N/A	EJECUTADO 100%

MV_08_039_1747_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_251_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_435_676_09	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_001_1214_15	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_019_1249_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_048_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_189_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
SH_SV_CTO_IDU_1707_2014	N/A	EJECUTADO 100%
SH_SV_CTO_IDU_1835_14	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_06_163_1561_10	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_09_473_947_10	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 11

ID	CIV	OBSERVACION
EX_10_006_1560_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_10_008_1560_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_10_372_1842_12	N/A	EJECUTADO 100%
MV_12_281_941_09	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 12

ID	CIV	OBSERVACION
EX_10_006_1560_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_10_008_1560_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_10_372_1842_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_10_377_1842_12	N/A	EJECUTADO 100%
EX_13_003_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_014	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_261_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_048_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_12_281_941_12	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_2345	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 13

ID	CIV	OBSERVACION
MV_08_261_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_048_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_039_1747_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_02_01_1207_16	N/A	EJECUTADO 100%
MV_05_99_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_260_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_189_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_10_183_1747_10	N/A	EJECUTADO 100%
EX_09_034_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL 417	N/A	EJECUTADO 100%
TPD_PL_1778	N/A	EJECUTADO 100%

RELACION DE CIV QUE NECESITAN INTERVENCION

CUENTA 14

ID	CIV	OBSERVACION
EX_08_043_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
KM 1 CALERA	N/A	EJECUTADO 100%
KR 1E CL 77	N/A	EJECUTADO 100%
MV_03_001_1783_19	N/A	EJECUTADO 100%
MV_08_260_1244_11	N/A	EJECUTADO 100%
MV_09_048_1556_10	N/A	EJECUTADO 100%
MV_AV_BOYACA_941_09	N/A	EJECUTADO 100%
ZE_08_461_943_10	N/A	EJECUTADO 100%

ANEXO 7

BITACORA DE OBRA

ciudad Calle 13 entre Kr 100 y Kr 135. Se realiza instalación de 40 tachas reflectivas, aplicación de pintura plástico en frío spray: 35,4 m², instalación tachones: 22 und, hito flexibles: 12 und y se realiza aplicación de pintura acrílica base solvente sobre 250 und New Jersey. Cuadrillas: 3. trabajadores: 15

Contratista: Interventoría:

30 de Noviembre de 2020

ID MV09048_1556_10 y MV-09-189-1556_10. localidad Fontbon Ciudad Av 13 entre Kr 100 y Kr 134. Se realiza pintu acrilica sobre New jersey: 016 und, instalacion de 7 Tachones plasticos y 4 hito flexibles. Cuadrillas: 3. Trabajadores: 16. Las actividades de demarcacion se suspenden a partir de las 11:30 pm por llamados que se presentan en el sector.
ID. EX-08-043-1556-10. localidad Kennedy. Calle 42B Sur con Kr 72Q. Pacificacion vial. Se realiza borrado mecanico: 524 m² Cuadrillas: 1 trabajadores: 5.

Contratista: Interventoria:

01 de Diciembre de 2020.

ID MV09-048-1656-10. localidad Fontbon. Ciudad Av 13 entre Kr 100 y Kr 134. Se realiza pintura acrilica sobre New jersey: 668 und. Cuadrillas: 2. trabajadores: 10.
Por humedad en el pavimento se cancelan actividades en el ID EX-08-043-1556-10. por llamados que se presentaron en la ciudad durante la tarde.

Contratista: Interventoría.

02 de Diciembre de 2020 (Jornada Diurna)
Se realiza inspeccion de señalizacion vertical en los

IDs: CP-STPRI-197577-2020 y PMT-Emergencia la calera Ckm 1 vía a la calera) en donde se determina ubicar dos señales duplex nuevas y dos señales nuevas sencillas para el 1er ID, mientras que en el PMT de los actc (7) señales relacionadas en el plano, solo se instalarán dos (6).

Contratista: Interventoría:

02 de Diciembre de 2020 (jornada Nocturna)

ID TV-09-048-1556-10. Localidad Fontibon Ciudad ruta AC 13 entre kr 100 y kr 135. Se realiza aplicacion de pintura acrilica sobre New Jersey: 561 und, aplicacion de imprimante acrilico negro: 63 ML y 3,6 m² y pintura plastico en fio Spray: 63 ML y 24 m². Cuadrilla: 3. Trabajadores: 16.

ID TX-08-043-1556-10. Localidad Kennedy. Pacificacion Vial. Calle 42B Sur * kr 72Q. Se realiza aplicacion de imprimante acrilico negro: 103,5 m² y 416 ML. Cuadrilla: 2 trabajadores: 10.

Contratista: Interventoria:

03 de Diciembre de 2020 (jornada Diurna)

Se realiza inspeccion en la kr 1E 215 m al Norte de la Calle 77 verificando la neceadad de las señales de PMT de emergencia: cierretotal del anden costado oriental, por lo tanto se deben instalar 7 señales temporales.

Contratista: Interventoria:

03 de Diciembre de 2020 (jornada Nocturna)

ID TX-08-043-1556-10. Localidad Kennedy. Pacificacion

Vial. Calle 42B Sur con kr 72Q. Se realiza aplicación de pintura plástico en frio por spray: 63,97 m² y 416 ML. Cuadrillas: 2. trabajadores: 10.

04 de Diciembre de 2020 (jornada Diurna)

Se realiza inspección del ID ZE-08-461-943-10-V2 verificando señalización vertical, en donde se determina cambiar varias de las señales debido al deterioro o cumplimiento del periodo de servicio.

Contratista: Interventoría:

04 de Diciembre de 2020 (jornada Nocturna)

ID TV-09-048-1556-10. localidad Fontibon Ciclorruta AC 13 entre kr 100 y kr 135. Se realiza instalacion de 190 und de tachas reflectivas. Cuadrillas: 2 trabajadores: 10.
ID EX-08-043-943-10-V2. localidad Kennedy. Demarcacion zona escolar y reductores de velocidad. Se realiza aplicacion de imprimante acrilico negro: 426,6 m² y pintura plástico en frio por spray: 145,2 m². entre kr 75 y kr 73 desde la Calle 5a hasta la Calle 6. Cuadrillas: 2 trabajadores: 12.

Contratista: Interventoría:

05 de Diciembre de 2020.

No se programan actividades de obra

Contratista: Interventoría:

06 de Diciembre de 2020
ID TV-09-048-1556-10. Localidad Fontibon Ciclorruta AC 13

entre Kr 100 y Kr 135. Se realiza instalacion de 395 tachas reflectivas. Cuadrillas: 1. trabajadores: 6.

Contratista: Interventoria:

07 de Diciembre de 2020

ID ZE-08-A61-943-10-V2. Localidad Kennedy. Demarcacion zona escolar y reductores de velocidad entre Kr 73 y Kr 75 desde calle 5a y calle 6. Se realiza instalacion de estoperoles plasticos con espigo 900 und. Cuadrillas: 1. trabajadores: 4.

Contratista: Interventoria:

08 de Diciembre de 2020

ID MV-09-048-1556-10. localidad Fontibon. Ciclorruta AC 13 entre Kr 100 y Kr 135. Se realiza instalacion de 265 tachas reflectivas. Cuadrillas: 1. trabajadores: 7.
Para los ID's: EX-08-043-1556-10 y ZE-08-461-943-10-V2 se cancelan actividades programadas por humedad en el pavimento producto de lluvias que se presentaron durante la tarde

Contratista: Interventoria:

09 de Diciembre de 2020

ID EX-08-043-1556-10 localidad Kennedy. Calle 42B Sur con Kr 72Q, se realiza construccion de bordos en agregado Peñoco: 46,08 m², aplicacion de imprimante. acrilico negro: 57,9 m² e instalacion de tachas reflectivas: 133 und. Cuadrillas: 2 trabajadores: 10.
ID MV-09-048-1556-10. localidad Fontibon Colombia AC 13 entre Kr 100 y Kr 135. Se realizo instalacion de 121 und

Cuadillas: 1 trabajadores 7.
10 ZE-08461-943-10-V2. Localidad Kennedy. Se realiza instalación de 1602 und de estaperdes plásticos con espigo, se realiza construcción de bandas en agregado pétreo: 13,8 m², aplicación de pintura plástico en frio por spray: 530 ML e imprimante acrílico negro: 530 ML. Cuadrillas: 1 trabajadores: 12.

Contratista: Interventoría:

10 de Diciembre de 2020.

10 ZE-08-461-943-10-V2. Localidad Kennedy. Entre Kr 73 y Kr 75 desde Calle 5a hasta la calle 6. Se realiza instalación de 1340 und estoperoles plásticos con espigo, aplicación de pintura plástico en frio por spray: 91,7 M², y aplicación de imprimante acrílico negro 94,2 ML y 29 m². Cuadrillas: 2 trabajadores: 20

Contratista: Interventoría:

11 de Diciembre de 2020

No se programan actividades de obra, se realiza inspección de compromisos pactados Zona Escolar IED Alegro Venecia nuevo MUZO. y de la intersección Semaforizada de la Av Bayacá con Calle 71B1S Sur.

Contratista: Interventoría:

12 de Diciembre de 2020

No se realizan actividades de obra durante la jornada.

Contratista: Interventoría:

13 de Diciembre de 2020

ID ZE-08-461-943-10-V2. Localidad Kennedy. Entre KR 73 y KR 75 desde la Calle 5a hasta calle 6. Se realiza instalacion de estoperoles plasticos con espigo: 1124 und Cuadrilla: 1 trabajadores: 6.

Contratista: Interventoria:

14 de Diciembre de 2020

ID MV09-048-1556-10. localidad Fontibon Ciclomotu AC 13 entre KR 100 y KR 135. Se realiza instalacion de laminas con reflectivo en new jersey: 430 und. Cuadrillas: 1 trabajadores: 6
ID EX-08-043-1556-10. Localidad Kennedy. Ubicado en Calle 42B Sur con KR 72Q. Se realiza instalacion de estoperoles plasticos con espigo: 950 und. Cuadrillas: 1 trabajadores: 5

Contratista. Interventoria:

15 de Diciembre de 2020

Para la jornada nocturna se cancelan todas las actividades programadas por lluvias que se presentaron durante la tarde-noche en la ciudad.

Contratista Interventoria:

16 de Diciembre de 2020

ID MV-09-048-1556-10. Localidad Fontibon. Ciclorruta AC 13 entre KR 100 y KR 135. Se realiza instalacion de laminas ciclorruta de la AC 13: 682 und. Cuadrillas: 1 trabajadores: 5
ID Convenio IDU: Ciclorruta Calle 41 Sur entre AV 1 Mayo

y KR 78K. Se realiza aplicación de imprimante acrílico negro: 163,4 m², aplicación de pintura plástico en frío por llana 98,2 m². Cuadrillas: 2. trabajadores: 10.

Contratista: Interventoría:

17 de Diciembre de 2020

ID EX-08-043-1556-10. Localidad Kennedy. Ubicado en la calle 42B Sur con KR 72Q. Se realiza instalación de estopesoles plásticos con espigo: 529 und. Cuadrillas: 1. trabajadores: 5.
ID Ciclorruta Calle 41 Sur entre Av. 1 Mayo y KR 78K. Localidad Kennedy Se realiza aplicación de imprimante acrílico negro 94.4 m², pintura plástico en frío Llana: 103,6 m² y borrado mecánico 88,8 m². Cuadrillas: 2, trabajadores: 10.

Contratista: Interventoría:

18 de Diciembre de 2020

ID MV09-043-1556-10. Localidad Fontibon. Ciclorruta Ac 13 entre KR 100 y KR 135. Se realiza instalación de láminas con papel reflectivo sobre New jersey: 733 und. Cuadrillas: 1 trabajadores: 5
ID MV-AV-BOYACA_9A1.09. Localidad Ciudad Bolivar. Intersección Semaforizada Av. Boyacá con Calle 71B BIS Sur. Se realiza aplicación de imprimante acrílico negro: 88.98 m² y pintura plástico en frío por spray: 68,45 m². Cuadrillas: 1 trabajadores: 7
ID: Convenio 100. Ciclorruta Calle 41 Sur entre Av. 1 mayo y KR 78K. se realiza aplicación de imprimante acrílico negro: 283,7 m², pintura plastico en frío por llana: 140,2 m². Se le solicita al contratista revisar el proceso de aplicación del antideslizante para garantizar una mayor adherencia del producto. Cuadrilla: 1. trabajadores: 6

Contratista: Interventoría:

19 de Diciembre de 2020

Para la jornada nocturna se cancelan las actividades de obra programadas por lluvias que se presentaron en la ciudad.

Contratista: Interventoría:

20 de Diciembre de 2020

ID MV-09-048_1556-10. localidad Fontibon. Ciclorruta Av 13 entre KR 100 y KR 135. Se realizo instalacion de. laminas con papel reflectivo en New jersey: 511 und. Cuadrillas: 1 trabajadores: 5.

ID. Convenio IDU, Ciclorruta Calle 41 Sur. entre Av. 1 Mayo y KR 78K. Localidad Kennedy. Se realizo aplicacion de imprimante acrilico negro: 197,8 m², pintura plastico en frio. llana: 169,8 m² e imprimante ML=428,8 ML. Cuadrillas: 1 trabajadores: 6.

Contratista Interventoría:

21 de Diciembre de 2020 (Jornada Diurna)

Se realiza visita de garantias al 70% al ID MV-08_001. 1703_10 y del 50% al C-P-CLM_181114-00025 y SDM-SCTT-225169-2019

Contratista Interventoría.

21 de Diciembre de 2020 (Jornada Nocturna)

ID MV-AV-BOYACA-941_09. localidad: Ciudad Bolivar. Interseccion semaforizada. Av. Boyaca con Calle 71 B Sur. Se realiza aplicacion de imprimante acrilico negro = 465,5 M pintura

plastico en frio por spray: 465,5 ML. Cuadrillas: 1. trabajadores: 7. ID: Convenio 100. Ciclorruta calle 41 sur entre Av. 1 mayo y carrera 78 k. Se realiza aplicacion de pintura plastico en frio por llana: 49,9 m² y pintura acrilica base solvente: 373 ML Cuadrillas: 1 trabajadores: 5.

Contratista: Interventoria:

22 de Diciembre de 2020 (Jornada Diurna)

Se realiza recorrido de verificacion de garantias al 50% del diseño MV-09-048-1556-10 y se realizo prueba de pendulo (resistencia al deslizamiento). Se realiza visita de garantias al 50% al CP-3DM-318531 y CLM-181114 -00025.

Contratista: Interventoria:

22 de Diciembre de 2020 (jornada Nocturna)

ID Convenio 100. Ciclorruta Calle 41 SUR entre Av. 1 de mayo y KR 78 K. Se realiza aplicacion de pintura plastico en frio por llana: 427 m², instalacion de tachones plasticos: 219 und instalacion de hitos flexibles: 25 und. Cuadrillas: 2. trabajadores: 8.

Contratista: Interventoria:

23 de Diciembre de 2020

Se realiza recorrido de seguimiento de garantias al 50% al ID: 3DM-229731 y al CP-CLM-180405-000032.
Para la jornada nocturna no se programan actividades de obra.

Contratista: Interventoria:

Para los días 24 y 25 de Diciembre de 2020 no se programan actividades de obra.

Contratista: Interventoría:

26 de Diciembre de 2020

10 Convenio 100. Ciclorruta Calle 41 sur entre Av. 1 de Mayo y KR 78 K Se realiza aplicación de pintura plástico en frío llana: 59,6 m², instalación de tachones plásticos: 52 und, instalación de hitos flexibles: 31 und e instalación de tachas reflectivas: 149 und Cuadrillas: 2. trabajadores: 8.

Contratista: Interventoría:

27 de Diciembre de 2020.

Por medio del decreto 325 de 27 de Diciembre de 2020 se decreta ley seca, restricciones a la movilidad en la ciudad por las afectaciones de la final del futbol profesional Colombiano, por tal razon se suspenden las actividades de obra programadas.

Contratista: Interventoría:

28 de Diciembre de 2020.

No se programan actividades de obra.

Contratista: Interventoría:

29 de Diciembre de 2020

ID Convenio 100. Ciclorruta Calle 41 Sur entre Av. 1 de Mayo

y Kr 78k. Localidad Kennedy. Se realiza aplicación de pintura plástico en frío en llana: 5,8 m², instalación de bordillos No traspasables: 122 und. e instalación de tachas reflectivas: 222 und Cuadrillas: 2 trabajadores: 8.

Contratista: Interventoría:

30 de Diciembre de 2020 (jornada Diurna)

Se realiza visita de garantías inicial a los 10's: IAV-09-048-1556-10 y IAV-08-043-1556-10.

Contratista: Interventoría:

30 de Diciembre de 2020 (jornada Nocturna)

ID. Convenio IDU. Ciclorruta. Calle 41 Sur entre Av. 1 de Mayo y Kr 78k. Localidad Kennedy. se realiza aplicación de pintura plástico en frío llana: 31,2 m², instalación de tachones plásticos: 5 und, instalación de hitos flexibles: 2 und, aplicación de pintura acrílica base solvente: 308,4 ML y 13,3 m² e imprimante acrílico negro: 20,7 m². Cuadrillas: 2: trabajadores: 8.

Contratista: Interventoría:

El día 31 de Diciembre de 2020 y los días 1, 2, 3 de enero de 2021. no se programan actividades de obra.

Contratista: Interventoría:

ANEXO 8

COMITES DE OBRA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 2 de 2020.	HORA: 9:40 a.m. a 10:20 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos.
2. Informe de Consultoría.
3. Informe de Georreferenciación.
4. Informe de Garantías.
5. Informe de Obra.
6. Varios.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS

1. Aún no les han dado repuesta de seguridad vial, manifiesta el Arq. Juan Camilo

2. Presupuesto de la pintura de todos los new jersey de la avenida calle 13 por la cara externa, instalación de la plaqueta reflectiva el contratista pasó el presupuesto y unas modificaciones está aprobado y está en proceso, los new jersey van en un avance del 35%, no se han iniciado la instalación de las plaquetas reflectivas.

3. Verificación con el Arq. Elvis Chavarro sobre las intervenciones del convenio IDU-SDM, El Arq. Juan Camilo comenta que el Ing. Elvis tuvo un comité técnico el 30 de noviembre, en la avenida Boyacá por calle 3 adecuaciones de isletas y rampas a cargo de la Dirección de Semaforización el inicio y la intervención será finalizando el mes de diciembre, calle 41 sur entre avenida 1 de mayo y carrera 48K el IDU indicó que el 3 y/o 4 de diciembre realizan la socialización, calle 40 sur por carrera 73 mantenimiento del pavimento se revisará la próxima semana jueves o viernes para confirmar si se puede manejar lo más pronto posible o de lo contrario se tendría que hablar con las áreas jurídicas y sacarlo del convenio, hay un punto a intervenir la próxima semana con la socialización calle 41 sur entre avenida 1 de mayo y carrera 48K.

   Pregunta el Ing. Sergio Valderrama si tienen información de la calzada sur de la ciclo ruta de la calle 13 a lo que el Arq. Juan Camilo comenta que no y que es un tema de revisión en la siguiente semana, interviene el Ing. Luis Eduardo comenta que si cambia la priorización, el Arq. Juan Camilo manifiesta que se entendería que si ya que afectaría el contrato pero que deben esperar a la próxima semana, interviene el Ing. Luis Eduardo pregunta respecto a la intersección de la 80 con 96, el Arq. Juan Camilo comenta que le consultará al Ing. Mario, el Ing. Luis Eduardo comenta que con los new jersey quedan $250.000.000 por asignar, con la intersección y los new jersey se tendría la obra de diciembre,

TEMA:	Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.	
FECHA: diciembre 2 de 2020.	HORA: 9:40 a.m. a 10:20 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

pregunta que les van a asignar con los $250.000.000, al Arq. Juan Camilo respondió de que lo de Mandalay el Ing. Jeison lo remitió al Ing. Nicolai para revisión, el Ing. Nicolai confirma que es un diseño de zona escolar por lo cual confirma que si se puede asignar, el Ing. Luis Eduardo pregunta si lo recibirían hoy como asignación oficial, el Ing. Nicolai comenta que depende de las priorizaciones que tenga la entidad, pregunta el Ing. Luis Eduardo si la asignación se puede manejar como plan de manejo de emergencia para poder ingresar el fin de semana, el Ing. Nicolai manifiesta estar de acuerdo.

INFORME CONSULTORIA

INVENTARIOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**68**	**1000,36**
INVENTARIOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**60**	931,74
INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	8	68,62

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha		REV
EN PODER DEL CONTRATISTA	0	0,00		0,0
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	8	68,62		68,6
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00		0,0
	8	**68,62**		**68,6**

DISEÑOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**60**	**932,74**
DISEÑOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**55**	795,95
DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	5	136,79

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE APROBACION

TEMA:	**Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.**	
FECHA: diciembre 2 de 2020.	**HORA: 9:40 a.m. a 10:20 a.m.**	**LUGAR: Sesión virtual**

	ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha
	EN PODER DEL CONTRATISTA	1	53,18
	EN PODER DE LA INTERVENTORIA	4	83,61
	EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00
		5	**136,79**

INFORME GEOREFERENCIACION

GEORREFERENCIACION OBRA • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 54/ CORTE A 01 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	REVISION CONTRATISTA	APROBADOS SDM	REVISION SDM
6	5	5	0	0	4	1
7	41	41	0	0	40	1
8	23	23	1	0	22	0
9	20	20	1	0	19	0
10	27	27	0	1	20	6
11	4	4	2	2	0	0
12	10	8	8	2	0	0
TOTAL	**130**	**128**	**12**	**5**	**105**	**8**

GEORREFERENCIACION DISEÑO • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 54/ CORTE A 01 DE DICIEMBRE DE 2020

MES	DISEÑOS MES	DISEÑOS RECIBIDOS	HA (hectáreas) RECIBIDAS	HA (hectáreas) APROBADAS SDM	HA (hectáreas) REVISION SDM	HA (hectáreas) REVISION CONTRATISTA	HA (hectáreas) REVISION INTERVENTORIA
MES 3	5	5	55,78	55,78	0	0	0
MES 4	6	6	66,75	42,75	24	0	0
MES 5	2	2	49,87	20,57	29,3	0	0
MES 7	4	4	65,61	50,61	15	0	0
MES 8	6	6	140,4	140,4	0	0	0
MES 9	12	12	99,78	71,58	16,1	12,1	0
MES 10	10	10	209,81	116,06	12	28,45	53,3
MES 12	3	3	12,45	0	3,25	0	9,2
TOTAL	**48**	**48**	**700,45**	**497,75**	**99,65**	**40,55**	**62,5**

TEMA:	Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.	
FECHA: diciembre 2 de 2020.	HORA: 9:40 a.m. a 10:20 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

en revisión.

INFORME GARANTIAS

TOTAL REVISADOS A LA FECHA POR INTERVENTORIA	101	
SIN OBSERVACION A LA FECHA	33	33%
REVISADAS SIN OBSERVACION MAS ATENDIDAS REVISADAS EN CAMPO	61	60%
GARANTIAS SOLICITADAS A LA FECHA POR INTERVENTORIA	68	67%
ATENDIDAS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADAS POR LA INTERVENTORIA	32	32%
ATENCIONES RECHAZADAS POR INTERVENTORÍA	12	12%
PENDIENTES POR ATENDER	40	40%

INFORME DE OBRA

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS		TOTAL
					PATINETAS	OTROS	
ID ASIGNADOS	18	6	0	186	24	26	260
ID INSPECCIONADOS	18	0	0	185	24	26	253
ID POR INSPECCIONAR	0	0	0	0	0	0	0
ID EN IMPLEMENTACIÓN	2	0	0	0	0	3	5
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	16	6	0	180	24	23	249
ID POR IMPLEMENTAR	0	0	0	6	0	0	6

En la semana se ejecutó obra por valor de $133.689.721 se incrementa 1,83%, se presentaron 7 jornadas de lluvia, 3 en horario diurno y 4 en horario nocturno, se programaron 7 jornadas de trabajo, 1 en horario diurno y 6 en nocturno, en observaciones en los días 24, 27 y 28 de noviembre se cancelaron actividades programadas por fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad durante la tarde y parte de la noche, en el ID de la calle 13 entre carreras 100 y 135 el porcentaje de avance en la ciclo ruta es del 90%, los carriles mixtos el 92% , como lo manifestó el Ing. Sergio Valderrama al inicio la pintura de los new jersey está en un 35%, días transcurridos del contrato 398, días para terminar el contrato 77, valor a ejecutar diario $12.799.893, en la gráfica de avance el contratista debería estar en un avance del 122,85%, tiene un avance de 129,79% lo que significa que está en un avance positivo del 5,65%.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 2 de 2020.	HORA: 9:40 a.m. a 10:20 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

VARIOS

Interviene el Ing. Luis Eduardo, les habían dado unas instrucciones para colocar una señal de emergencia de un PMT, las 6 señales se fueron a colocar, pero ya había en campo 4, pregunta que debe hacer con las 4 señales ya que están hechas y no hay donde implementarlas; interviene el Ing. Nicolai y comenta que el subdirector en el día de ayer envió una solicitud de PMT, pregunta si la interventoría ya la envió, el Ing. Luis Eduardo confirma el recibido del mismo, el Ing. Nicolai manifiesta que también se solicitaron unas señales verticales y pregunta si pueden utilizar las que están en stop para ese nuevo PMT, el Ing. Luis Eduardo comenta que están en inspección y ellos confirmarán si les sirve las que tienen, adicionalmente pregunta si los $117.000 por asignar de obra van a designar de una vez, el Arq. Juan Camilo comenta que no se puede asignar completo porque no pueden estar sin recurso, el Ing. Sergio solicita confirmación de la zona escolar de Mandalay, el Arq. Juan Camilo solicita tramitar el PMT, el Ing. Sergio Valderrama manifiesta que están a dos meses de terminar el contrato, el Ing. Luis Eduardo solicita el correo de autorización para Mandalay, el Ing. Sergio Valderrama solicita hacer nuevamente la inspección, a lo cual el Ing. Luis Eduardo solicita el correo para la formalización del ID, el Ing. Sergio Valderrama manifiesta que queda formalizado a través de esta acta del comité, el Ing. Luis Eduardo manifiesta estar de acuerdo, el Ing. Sergio Valderrama solicita el dato completo para el informe del mes teniendo en cuenta que los tiempos son más cortos, el Ing. Nicolai comenta que están pendientes las cuentas de noviembre y diciembre por lo cual solicita agilidad en el tema, el Ing. Luis Eduardo comenta que es importante saber si la intersección del IDU queda liberada para poder incluirla en este mes, igualmente manifiesta que todas las planillas ya están en la entidad para la firma, el Ing. Sergio Valderrama que revisará el tema.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Inspección Zona Escolar Mandalay y envió Id actualizado.	Interventoría, SDM	4-dic-2020
2. Tramite cuenta No. 13 obra y consultoría	Interventoría, Contratista	7-dic-2020

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 3 - SUR OCCIDENTE

PERIODO: DESDE 24/11/2020 A 30/11/2020 SEMANA: **54**

Consorcio InterSEÑALIZACION

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**	CONTRATO No.	**2019 - 1782**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 4.882.890.333,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 2.440.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 7.323.190.333,00

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS		TOTAL
					PATINETAS	OTROS	
ID ASIGNADOS	18	6	0	186	24	26	260
ID INSPECCIONADOS	18	0	0	185	24	26	253
ID POR INSPECCIONAR	0	0	0	0	0	0	0
ID EN IMPLEMENTACIÓN	2	0	0	0	0	3	5
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	16	6	0	180	24	23	249
ID POR IMPLEMENTAR	0	0	0	6	0	0	6

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR POR SEPARADO		VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$28.987.700	$203.847.546	PATINETAS	$53.855.878	$301.601.550
			OBRA	$247.745.672	
MES 2	$15.694.587	$302.450.440	PATINETAS	$23.142.234	$435.540.543
			OBRA	$412.398.308	
MES 3	$50.906.552	$160.036.785	PATINETAS	$15.513.088	$289.222.050
			OBRA	$273.708.962	
MES 4	$26.177.750	$555.494.979	$581.672.728		
MES 5	$25.601.175	$521.865.954	$547.467.129		
MES 6	$50.453.865	$290.269.932	$444.376.468		
MES 7	$65.242.246	$615.557.486	$746.922.987		
MES 8	$69.446.196	$377.906.324	$447.352.519		
MES 9	$85.041.157	$576.008.263	$661.049.420		
MES 10	$25.874.362	$400.936.858	$427.684.940		
MES 11	$47.730.633	$313.109.721	$433.860.679		
MES 12	$66.066.057	$605.688.352	$671.754.409		
MES 13	$12.230.647	$336.818.454	$349.093.163		
MES 14	$0	$0	$0		
MES 15	$0	$0	$0		
MES 16	$0	$0	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**54**	**$6.337.598.584**		

Valor programado	MES 1	$244.144.517	3,24%
Valor ejecutado		$301.601.550	4,12%
Valor programado Acumulado	MES 2	$634.775.743	8,42%
Valor ejecutado		$737.142.092	10,07%
Valor programado Acumulado	MES 3	$1.123.064.777	14,90%
Valor ejecutado		$1.026.364.142	14,02%
Valor programado Acumulado	MES 4	$1.660.182.713	22,03%
Valor ejecutado Acumulado		$1.608.036.871	21,96%
Valor programado Acumulado	MES 5	$2.141.736.725	28,42%
Valor ejecutado		$2.155.504.000	29,43%
SUSPENSION			
Valor programado Acumulado	MES 6	$2.418.958.886	32,10%
Valor ejecutado		$2.599.880.467	35,50%
Valor programado Acumulado	MES 7	$2.956.076.823	39,23%
Valor ejecutado		$3.346.803.454	45,70%
Valor programado Acumulado	MES 8	$3.493.194.759	46,36%
Valor ejecutado		$3.794.155.973	51,81%
Valor programado Acumulado	MES 9	$4.030.312.696	53,49%
Valor ejecutado		$4.455.205.394	60,84%
Valor programado Acumulado	MES 10	$4.567.430.633	60,61%
Valor ejecutado		$4.882.890.334	66,68%
Valor programado Acumulado	MES 11	$4.882.890.333	64,80%
Valor ejecutado		$5.316.751.012	72,60%
Valor programado Acumulado	MES 12	$5.413.390.333	71,84%
Valor ejecutado		$5.988.505.421	81,77%
Valor programado Acumulado	MES 13	$5.943.890.333	78,88%
Valor ejecutado		$6.337.598.584	86,54%
Valor programado Acumulado	MES 14	$6.474.390.333	85,92%
Valor ejecutado		$6.337.598.584	86,54%
Valor programado Acumulado	MES 15	$7.004.890.333	92,96%
Valor ejecutado		$6.337.598.584	86,54%
Valor programado Acumulado	MES 16	$7.535.390.333	100,00%
Valor ejecutado		$6.337.598.584	86,54%
Valor ejecutado semana	54	**$133.689.721**	1,83%
Valor Total Contrato de Obra		$7.323.190.333	100,00%
Valor por ejecutar		$985.591.749	13,46%


OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	7	DIURNA	3	NOCTURNA	4		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				7	DIURNA	1	NOCTURNA 6

OBSERVACIONES: Para los días 24, 27, y 28 de Noviembre de 2020 se cancelan todas las actividades programadas, por fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad durante la tarde y gran parte de la noche.
En el Id MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10 Calle 13 Entre KR 100 hasta KR 135
Porcentaje de avance:
*Ciclorruta: 90 %
*Carriles mixtos: 92 %

Dias transcurridos del contrato	398	Dias para terminar el contrato	77	Valor a ejecutar diario	$12.799.893

AVANCE INVERSION CONTRATO 2019-1782
ZONA SUR-OCCIDENTAL

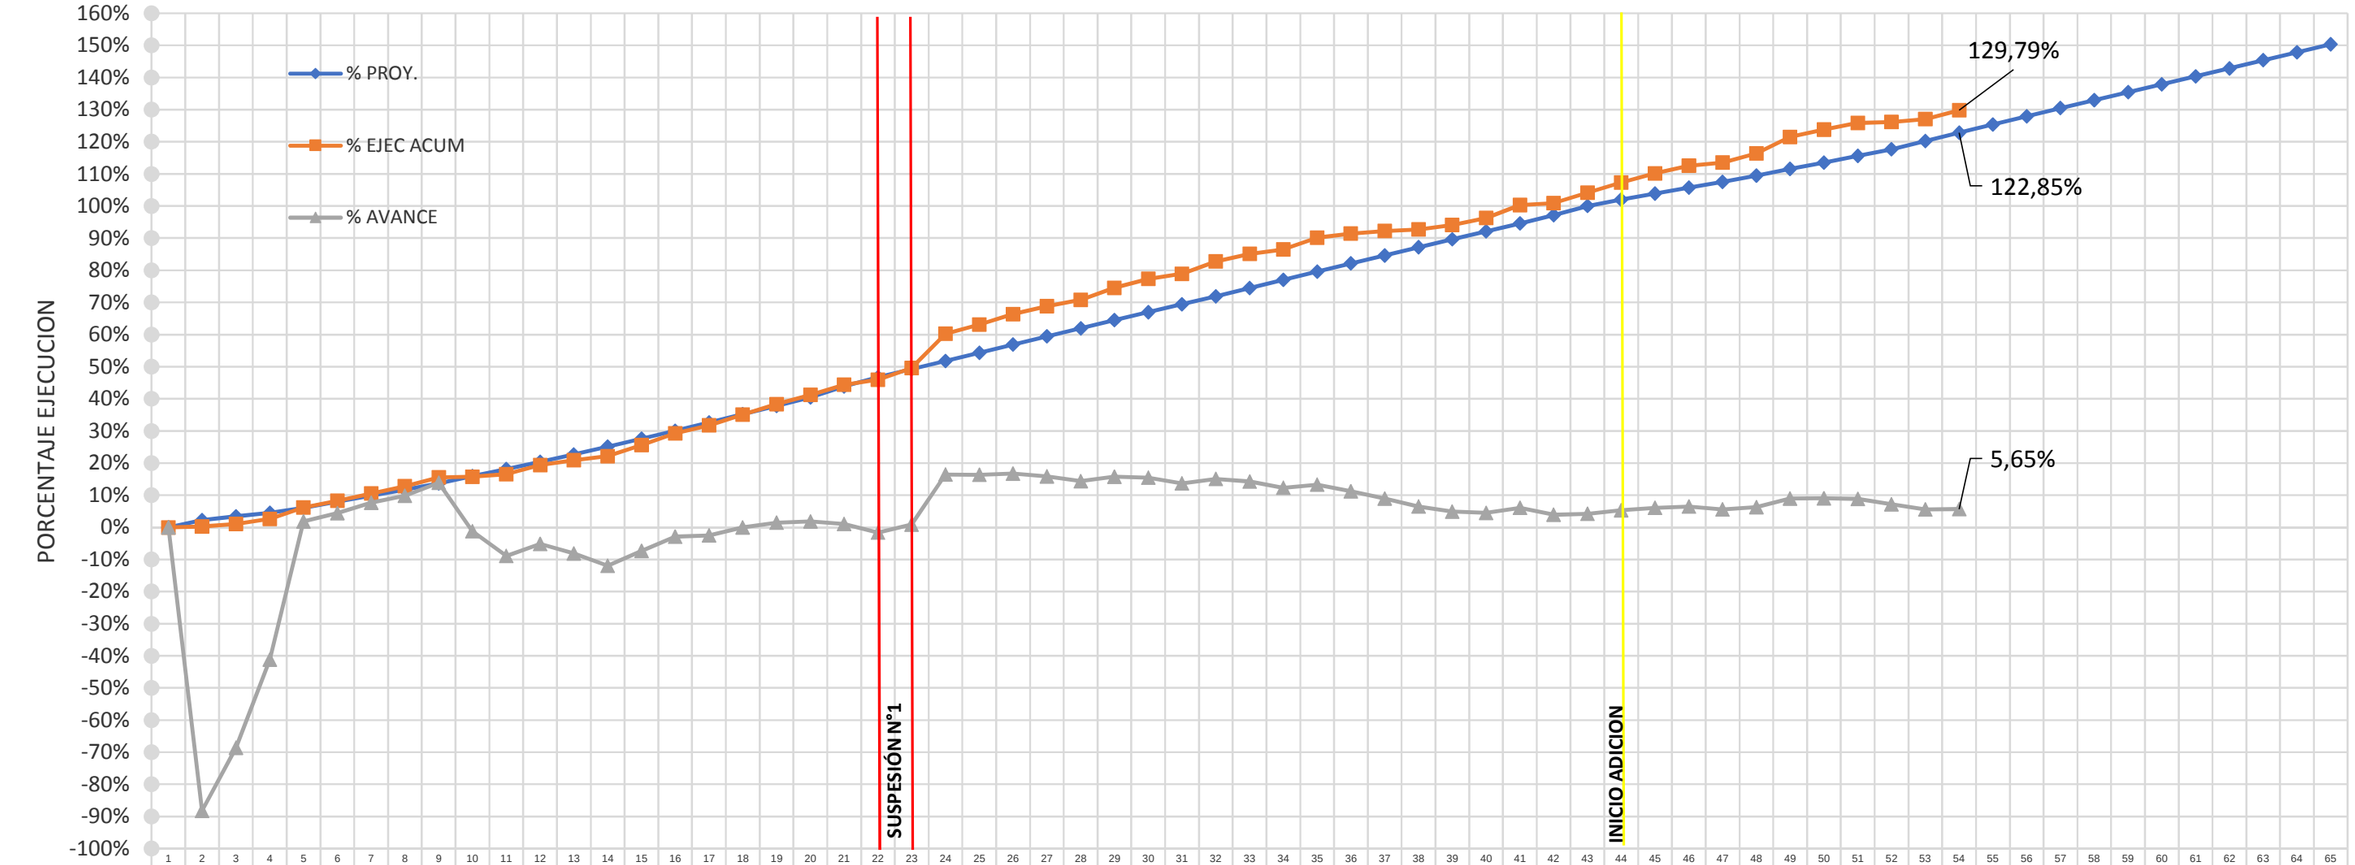

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
% PROY.	0,00%	2,26%	3,39%	4,52%	6,07%	7,93%	9,80%	11,67	13,65	15,90	18,16	20,42	22,68	25,13	27,61	30,10	32,58	35,14	37,79	40,45	43,86	46,70	49,18	51,74	54,31	56,87	59,44	61,96	64,44	66,93	69,41	71,91	74,47	77,04	79,61	82,17	84,67	87,15	89,64	92,12	94,62	97,13	100,0	101,9	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	115,6	117,7	120,2	122,8	125,4	127,9	130,4	132,9	135,4	137,9	140,4	142,8	145,3	147,8	150,3
% EJEC ACUM	0,00%	0,27%	1,06%	2,66%	6,18%	8,28%	10,55	12,82	15,54	15,71	16,54	19,35	20,83	22,12	25,59	29,22	31,77	35,12	38,34	41,20	44,33	45,93	49,62	60,26	63,15	66,38	68,86	70,84	74,60	77,29	78,93	82,73	85,12	86,53	90,16	91,40	92,24	92,76	94,05	96,23	100,3	100,8	104,1	107,3	110,1	112,5	113,5	116,3	121,5	123,8	125,8	126,1	127,0	129,7											
% AVANCE	0,00%	-88,2	-68,6	-41,1	1,81%	4,43%	7,67%	9,87%	13,88	-1,21	-8,95	-5,22	-8,13	-11,9	-7,33	-2,91	-2,48	-0,06	1,44%	1,86%	1,07%	-1,66	0,89%	16,46	16,29	16,71	15,85	14,33	15,75	15,49	13,72	15,06	14,30	12,32	13,25	11,23	8,94%	6,43%	4,93%	4,47%	6,04%	3,88%	4,19%	5,27%	6,11%	6,46%	5,54%	6,25%	8,93%	9,02%	8,84%	7,16%	5,63%	5,65%											

SEMANA 54

Consorcio InterSEÑALIZACION

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CUADRO CONTROL SEMANAL

GEORREFERENCIACION INTERVENTORIA CTO 1802 - 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

GEORREFERENCIACION OBRA • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 •SEMANA 54 / CORTE A 01 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	REGISTRO VERTICAL	REGISTRO HORIZONTAL	OBSERVACIONES
1	10	10	0	10	0	10	10	0	0	117	542	APROBADA
2	20	20	0	20	0	20	20	0	0	48	1168	APROBADA
3	31	31	0	31	0	31	31	0	0	307	536	APROBADA
4	21	21	0	21	0	21	21	0	0	124	753	APROBADA
5	9	9	0	9	0	9	9	0	0	107	873	APROBADA
6	5	5	0	5	0	5	4	1	0	204	519	-
7	41	41	0	41	0	41	40	1	0	297	801	-
8	23	23	1	22	0	22	22	0	0	114	937	-
9	20	20	1	19	1	19	19	0	0	430	517	-
10	27	27	0	26	0	26	20	6	0	297	801	-
11	4	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
12	10	8	8	0	2	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	221	219	12	204	5	204	**196**	8	0	2045	7447	-

GEORREFERENCIACION DISEÑO • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 54 / CORTE A 01 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	HA (hectáreas) RECIBIDAS	HA (hectáreas) APROBADAS INTERVENTORIA	HA (hectáreas) APROBADAS SDM	HA (hectáreas) REVISION SDM	HA (hectáreas) REVISION CONTRATISTA	HA (hectáreas) REVISION INTERVENTORIA
MES 3	5	5	0	5	5	5	5	0	0	55,78	55,78	55,78	0	0	0
MES 4	6	6	0	6	0	6	5	1	0	66,75	66,75	42,75	24	0	0
MES 5	2	2	0	1	0	1	1	1	0	49,87	49,87	20,57	29,3	0	0
MES 7	4	4	0	3	0	3	1	2	1	65,61	65,61	50,61	15	0	0
MES 8	6	6	0	1	0	3	0	3	1	140,4	140,4	140,4	0	0	0
MES 9	12	12	1	0	0	0	6	5	0	99,78	87,68	71,58	16,1	12,1	0
MES 10	10	10	3	0	0	1	0	1	7	209,81	128,06	116,06	12	28,45	53,3
MES 12	3	1	1	0	0	0	0	-	-	12,45	3,25	0	3,25	0	9,2
TOTAL	48	46	5	16	5	19	18	13	9	700,45	597,4	**497,75**	99,65	40,55	62,5

RESPONSABLE
Anny Lopez Fajardo
Georreferenciación Zona Sur Occidente Cto 1802

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 54 **CORTE** 01 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE INVENTARIOS DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 3	A01	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-nov-19	REV. 4	27-dic-19	MES 3	
2	MES 1	SEM. 3	A02	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	18-nov-19	REV. 3	24-dic-19	MES 3	
3	MES 1	SEM. 3	A03	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	18-nov-19	REV. 2	05-dic-19	MES 3	
4	MES 1	SEM. 4	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	25-nov-19	REV. 3	20-dic-19	MES 3	
5	MES 2	SEM. 5	A05	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 3	15-ene-20	MES 3	
6	MES 2	SEM. 7	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	12-dic-19	REV. 3	23-ene-20	MES 3	
7	MES 2	SEM. 8	A07	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	18-dic-19	REV. 2	31-ene-20	MES 4	
8	MES 2	SEM. 8	A08	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	18-dic-19	REV. 3	30-ene-20	MES 4	
9	MES 2	SEM. 8	A09	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	19-dic-19	REV. 2	10-feb-20	MES 4	
10	MES 2	SEM. 8	A10	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
11	MES 3	SEM. 11	A11	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	04-feb-20	MES 4	
12	MES 3	SEM. 11	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
13	MES 3	SEM. 12	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	17-ene-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
14	MES 3	SEM. 12	A14	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	20-ene-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
15	MES 4	SEM. 15	A15	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	07-feb-20	REV. 3	12-mar-20	MES 5	**
16	MES 4	SEM. 15	A16	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	10-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
17	MES 4	SEM. 16	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	12-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
18	MES 5	SEM. 18	A18	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	27-feb-20	REV. 2	11-may-20	MES 7	
19	MES 5	SEM. 18	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	02-mar-20	REV. 2	12-may-20	MES 7	
20	MES 5	SEM. 19	A20	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	06-mar-20	REV. 1	13-mar-20	MES 5	
21	MES 5	SEM. 20	A21	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	05-may-20	MES 7	
22	MES 5	SEM. 20	A22	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	13-may-20	MES 7	****
23	MES 5	SEM. 20	A23	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	14-may-20	MES 7	
24	MES 5	SEM. 20	A24	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	26-may-20	MES 7	
25	MES 5	SEM. 20	A25	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	13-mar-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	
26	MES 5	SEM. 21	A26	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-mar-20	REV. 3	28-may-20	MES 7	
27	MES 6	SEM. 23	A27	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	04-jun-20	MES 8	
28	MES 6	SEM. 23	A28	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	23-jun-20	MES 8	****
19	MES 6	SEM. 23	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2	20,00	20,00	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
29	MES 6	SEM. 23	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	27-abr-20	REV. 4	09-jun-20	MES 8	
30	MES 6	SEM. 23	A30	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	27-abr-20	REV. 2	01-jun-20	MES 8	
31	MES 7	SEM. 25	A31	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	12-may-20	REV. 3	02-jun-20	MES 8	
32	MES 7	SEM. 26	A32	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	11-jun-20	REV. 4	16-jun-20	MES 8	****
33	MES 7	SEM. 26	A33	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	18-may-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	*****
19	MES 7	SEM. 27	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE3	20,00	20,00	APROBADO	20-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
34	MES 7	SEM. 27	A34	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	21-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	****
35	MES 7	SEM. 27	A35	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	*** y ****
36	MES 7	SEM. 27	A36	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	09-jul-20	REV. 4	10-jul-20	MES 9	
37	MES 7	SEM. 27	A37	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	24-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	
38	MES 8	SEM. 29	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	
39	MES 8	SEM. 29	A39	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	29-jul-20	MES 10	
40	MES 8	SEM. 29	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	13-jul-20	MES 9	
41	MES 8	SEM. 29	A41	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 3	10-jul-20	MES 9	***
42	MES 8	SEM. 29	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	17-jul-20	REV. 3	17-jul-20	MES 9	******
43	MES 8	SEM. 29	A43	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	14-jul-20	REV. 2	15-jul-20	MES 9	*******
44	MES 8	SEM. 29	A44	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	21-jul-20	REV. 3	21-jul-20	MES 9	********
45	MES 8	SEM. 29	A45	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	05-ago-20	REV. 4	06-ago-20	MES 10	********
46	MES 8	SEM. 31	A46	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	23-jul-20	REV. 3	24-jul-20	MES 9	
47	MES 8	SEM. 32	A47	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	27-jul-20	MES 9	
48	MES 10	SEM. 37	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	01-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	a
49	MES 11	SEM. 43	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	02-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	
50	MES 11	SEM. 43	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	14-sep-20	REV. 3	14-oct-20	MES 11	
51	MES 11	SEM. 44	A51	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
52	MES 11	SEM. 45	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	20-oct-20	REV. 3	20-oct-20	MES 12	
53	MES 11	SEM. 45	A53	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-oct-20	REV. 2	14-oct-20	MES 11	
54	MES 11	SEM. 45	A54	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	APROBADO	20-nov-20	REV. 2	20-nov-20	MES 13	c
55	MES 12	SEM. 46	A55	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
56	MES 12	SEM. 46	A56	MV_08_261_1244_11_V2	19,80	19,80	APROBADO	19-nov-20	REV. 3	20-nov-20	MES 13	b
57	MES 12	SEM. 47	A57	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
58	MES 12	SEM. 47	A58	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
59	MES 12	SEM. 48	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	APROBADO	24-oct-20	REV. 3	24-nov-20	MES 13	
60	MES 12	SEM. 48	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	APROBADO	20-oct-20	REV. 2	23-nov-20	MES 13	
61	MES 12	SEM. 48	A61	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	INTERVENTORIA	20-oct-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
62	MES 12	SEM. 49	A62	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	INTERVENTORIA	23-oct-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
63	MES 12	SEM. 49	A63	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	INTERVENTORIA	26-oct-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
64	MES 12	SEM. 49	A64	EX_08_333_1867_12_V3	7,50	7,50	INTERVENTORIA	27-oct-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
65	MES 12	SEM. 49	A65	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	INTERVENTORIA	27-oct-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
66	MES 13	SEM. 52	A66	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	INTERVENTORIA	11-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
67	MES 13	SEM. 53	A67	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	INTERVENTORIA	19-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
68	MES 13	SEM. 53	A68	EM_08_124_V11	16,80	16,80	INTERVENTORIA	20-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE INVENTARIO DE DISEÑOS. ZONA SW

* En la Revisión 1 se detecta que esta incompleto el Registro Fotográfico-RF entregado en 3 CDs y el contratista entrega en Comité del 11/03/2020 3 CDs con este RF faltante; una vez aprobado y con VoBo de la SDM se le autorizó al contratista a presentar de manera parcial el Diseño

** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)

**** Falta VoBo de la SDM

*** Cambia la meta de 8,5Ha a 5,15Ha por disminución de ZI

***** La meta cambió de 5,08Ha a 5,3Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba - Correo SDM del 28/05/2020)

******* Cambia la meta de 3,20Ha a 3,25Ha por ampliación de ZI para empalmes

******

******** Cambia la meta de 6,60Ha a 7,00Ha por ajuste equivalencias

******** La meta cambió de 20,10Ha a 20,18 Ha por nueva medición de la ZI

La meta cambió de 30,13Ha a 28,45 Ha por ajuste de la ZI

a Se ajustó la meta de 2,5Ha a 6,7Ha por ajuste de equivalencias

b Se ajustó la meta de 17,9Ha a 19,8 Ha por ajuste de equivalencias

c Se ajustó la meta de 38,9Ha a 38,4Ha por ajuste de la meta al no incluir el tramo de la KR73

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 54 **CORTE** 01 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICAS **SEMANA** 54 **CORTE** 01 Dic./2020

INVENTARIOS ENTREGADOS / APROBADOS


	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	68	1000,36
INVENTARIOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	60	931,74
INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	8	68,62

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	8	68,62	68,62	0,00	0,00	931,74
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	68,62	68,62	0,00	0,00	

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha INVENTARIADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		INVENTARIADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	3,4	0,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	6,8	1,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	10,2	1,5%	12,50	12,50	1,8%	-	-	0,0%
4	18 NOV - 25 NOV	13,6	2,0%	19,28	31,78	4,6%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	16,72	2,4%	2,50	34,28	5,0%	-	-	0,0%
6	03 DIC - 09 DIC	19,84	2,9%	-	34,28	5,0%	2,50	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,96	3,3%	21,50	55,78	8,1%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	26,08	3,8%	40,25	96,03	13,9%	19,28	21,78	3,2%
9	24 DIC - 30 DIC	29,2	4,2%	-	96,03	13,9%	10,00	31,78	4,6%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,95	6,4%	-	96,03	13,9%	-	31,78	4,6%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	58,7	8,5%	26,50	122,53	17,7%	-	31,78	4,6%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	73,45	10,6%	31,80	154,33	22,3%	2,50	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	88,2	12,8%	-	154,33	22,3%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	112,06	16,2%	-	154,33	22,3%	40,25	96,03	13,9%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	135,92	19,7%	30,57	184,90	26,8%	26,50	122,53	17,7%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	159,78	23,1%	50,61	235,51	34,1%	-	122,53	17,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	183,64	26,6%	-	235,51	34,1%	2,50	125,03	18,1%
18	25 FEB/20 - 02 MAR/20	207,50	30,0%	86,10	321,61	46,5%	49,87	174,90	25,3%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	259,93	37,6%	2,50	324,11	46,9%	-	174,90	25,3%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	312,37	45,2%	16,80	340,91	49,3%	63,11	238,01	34,4%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	364,80	52,8%	12,10	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	397,35	57,5%	-	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	429,90	62,2%	46,00	399,01	57,7%	-	238,01	34,4%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	462,45	66,9%	-	399,01	57,7%	2,50	240,51	34,8%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	495,00	71,6%	11,01	410,02	59,3%	86,10	326,61	47,3%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	515,35	74,6%	15,30	425,32	61,6%	7,50	334,11	48,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	535,70	77,5%	63,52	488,84	70,7%	24,20	358,31	51,9%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	556,05	80,5%	-	488,84	70,7%	16,01	374,32	54,2%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	576,40	83,4%	109,38	598,22	86,6%	18,50	392,82	56,8%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	594,43	86,0%	-	598,22	86,6%	57,37	450,19	65,2%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	612,47	88,6%	60,40	658,62	95,3%	2,50	452,69	65,5%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	625,35	90,5%	32,63	691,25	100,0%	7,00	459,69	66,5%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	648,53	93,9%	-	691,25	100,0%	17,15	476,84	69,0%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	656,18	95,0%	-	691,25	100,04%	68,95	545,79	79,0%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	663,82	96,1%	-	691,25	100,04%	30,43	576,22	83,4%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	671,47	97,2%	-	691,25	100,04%	54,33	630,55	91,3%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	679,11	98,3%	6,70	697,95	101,01%	32,25	662,80	95,9%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	686,76	99,4%	-	697,95	101,01%	28,45	691,25	100,04%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	687,61	99,5%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	688,82	99,69%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	689,30	99,76%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	690,14	99,88%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	13,50	711,45	102,96%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	697,084	100,88%	72,78	784,23	113,49%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	703,176	101,76%	38,40	822,63	119,05%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	709,269	102,65%	59,40	882,03	127,65%	9,20	700,45	101,37%
47	07 OCT/20 - 13 OCT/20	715,361	103,53%	25,30	907,33	131,31%	-	700,45	101,37%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	734,161	106,25%	28,21	935,54	135,39%	30,60	731,05	105,80%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	752,961	108,97%	22,50	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	771,761	111,69%	-	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	790,561	114,41%	-	958,04	138,65%	118,08	849,13	122,89%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	809,361	117,13%	14,72	972,76	140,78%	-	849,13	122,89%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	835,361	120,89%	27,60	1.000,36	144,77%	82,61	931,74	134,84%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	861,361	124,66%	-	1.000,36	144,77%	-	931,74	134,84%

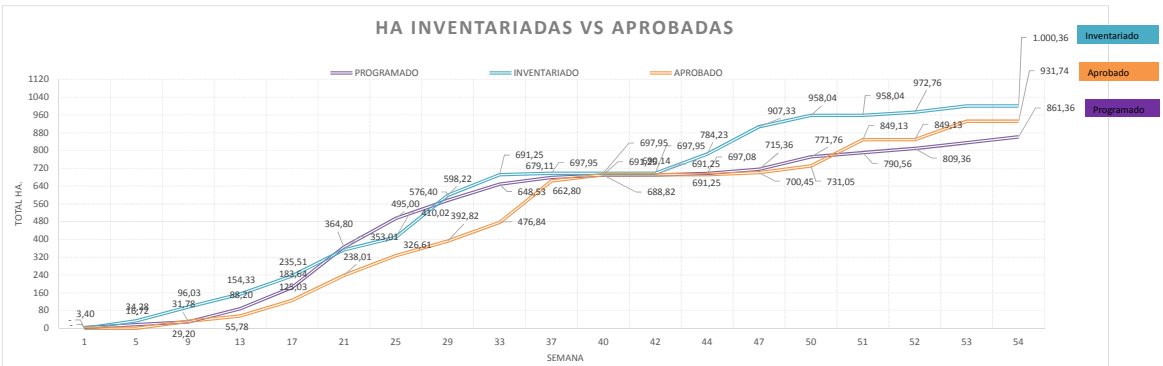

INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA **54** **CORTE** **01 Dic./2020**

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 3	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 4	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 5	A01	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	05-dic-19	REV. 2	05-dic-19	MES 2	
2	MES 2	SEM. 6	A02	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 1	15-ene-20	MES 3	
3	MES 2	SEM. 6	A03	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	24-dic-19	REV. 3	24-dic-19	MES 2	
4	MES 2	SEM. 8	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	20-ene-20	MES 3	
5	MES 2	SEM. 9	A05	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	27-dic-19	REV. 1	27-dic-19	MES 2	
6	MES 3	SEM. 13	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	23-ene-20	REV. 1	28-ene-20	MES 3	
7	MES 4	SEM. 14	A07	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	30-ene-20	REV. 1	10-feb-20	MES 4	
8	MES 4	SEM. 14	A08	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
9	MES 4	SEM. 14	A09	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
10	MES 4	SEM. 15	A10	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	11-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
11	MES 4	SEM. 16	A11	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	12-feb-20	REV. 1	17-feb-20	MES 4	
12	MES 4	SEM. 17	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	19-feb-20	REV. 1	28-feb-20	MES 4	
13	MES 4	SEM. 17	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	24-feb-20	REV. 1	09-mar-20	MES 5	
14	MES 4	SEM. 18	A14	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	25-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
15	MES 5	SEM. 19	A15	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	05-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
16	MES 5	SEM. 19	A16	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
17	MES 5	SEM. 20	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
18	MES 5	SEM. 20	A18	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	16-mar-20	REV. 4	08-may-20	MES 7	****
19	MES 7	SEM. 25	A19	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	12-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
20	MES 7	SEM. 26	A20	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	13-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
21	MES 7	SEM. 26	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	13-may-20	REV. 1	09-jun-20	MES 8	***
22	MES 7	SEM. 26	A22	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	19-may-20	REV. 4	18-jun-20	MES 8	
23	MES 7	SEM. 27	A23	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	19-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
24	MES 7	SEM. 27	A24	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	24-jun-20	REV. 4	25-jun-20	MES 8	*****
25	MES 8	SEM. 27	A24	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	03-jul-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	
26	MES 8	SEM. 29	A25	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	04-jun-20	REV. 2	07-jul-20	MES 9	
27	MES 8	SEM. 30	A26	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 2	08-jul-20	MES 9	
21	MES 8	SEM. 31	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2y3	40,00	40,00	APROBADO	25-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	****
28	MES 8	SEM. 31	A27	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
29	MES 8	SEM. 31	A28	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	19-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	****
30	MES 8	SEM. 31	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
31	MES 8	SEM. 31	A30	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-jun-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	****
32	MES 8	SEM. 31	A32	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	03-jul-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	******
33	MES 8	SEM. 32	A33	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	14-jul-20	MES 9	
34	MES 8	SEM. 32	A34	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	26-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	******
35	MES 9	SEM. 33	A35	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	10-jul-20	REV. 2	10-jul-20	MES 9	
36	MES 9	SEM. 34	A36	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	22-jul-20	REV. 3	22-jul-20	MES 9	
37	MES 9	SEM. 34	A37	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	10-ago-20	REV. 5	10-ago-20	MES 10	
38	MES 9	SEM. 34	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	13-ago-20	REV. 2	13-ago-20	MES 10	*******
39	MES 9	SEM. 34	A39	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	11-ago-20	REV. 4	16-ago-20	MES 10	*
40	MES 9	SEM. 35	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 4	17-ago-20	MES 10	
41	MES 9	SEM. 35	A41	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	05-ago-20	REV. 2	05-ago-20	MES 10	
42	MES 9	SEM. 36	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	18-ago-20	REV. 4	18-ago-20	MES 10	
43	MES 9	SEM. 36	A43	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	17-ago-20	MES 10	
44	MES 10	SEM. 37	A44	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	13-ago-20	MES 10	*******
45	MES 10	SEM. 37	A45	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	17-ago-20	REV. 3	18-ago-20	MES 10	
46	MES 10	SEM. 37	A46	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	14-ago-20	REV. 2	17-ago-20	MES 10	
47	MES 10	SEM. 38	A47	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 2	18-ago-20	MES 10	
48	MES 12	SEM. 48	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
49	MES 12	SEM. 48	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
50	MES 12	SEM. 48	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
51	MES 12	SEM. 48	A51	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 2	04-nov-20	MES 13	
52	MES 12	SEM. 49	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	05-nov-20	REV. 2	05-nov-20	MES 13	
53	MES 13	SEM. 51	A53	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	27-nov-20	REV. 4	27-nov-20	MES 13	
54	MES 13	SEM. 51	A54	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	27-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
55	MES 13	SEM. 51	A55	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	26-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
56	MES 13	SEM. 52	A56	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	CONTRATISTA	27-nov-20	REV. 2	01-dic-20	MES 14	MALA REVISIÓN
57	MES 13	SEM. 53	A57	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	INTERVENTORIA	25-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
58	MES 13	SEM. 53	A58	MV_08_261_1244_11_V2	19,80	19,80	INTERVENTORIA	25-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
59	MES 13	SEM. 53	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	INTERVENTORIA	26-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	
60	MES 13	SEM. 53	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	INTERVENTORIA	27-nov-20	REV. 1	01-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE DISEÑOS. ZONA SW

* El contratista no lo cobró en el segundo mes
** Aprobado por interventoría; falta VoBo de SDM.
*** Aprobación parcial de 113Ha; no se puede facturar
**** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)
Falta VoBo de la SDM
La meta cambió de 70,5Ha a 73,0Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba)
***** La meta cambió de la originalmente presentada y de 4,18Ha a 4,30Ha
****** La meta cambió de la originalmente presentada en Inventario y pasa de 15,20Ha a 14,90Ha
******* La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 32,20Ha a 32,25Ha
******** La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 11,75Ha a 12,00Ha
NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
META CONTRATO INICIAL: 690,991 Ha
META ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 AL CONTRATO INICIAL: 347,37 Ha
META FINAL CONTRATO: 1038,61 Ha

ESTADISTICAS SEMANA 54 CORTE 01 Dic./2020

DISEÑOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**60**	**931,74**
DISEÑOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**55**	795,95
DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	5	135,79

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	1	53,18	0,00	53,18	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	4	82,61	82,61	0,00	0,00	**795,95**
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	**135,79**	**82,61**	**53,18**	**0,00**	


INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 54 **CORTE** 01 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha DISEÑADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		DISEÑADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	2,55	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	5,1	0,7%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	7,65	1,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
4	19 NOV - 25 NOV	10,2	1,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	14,4	2,1%	2,50	2,50	0,4%	2,50	2,50	0,4%
6	03 DIC - 09 DIC	18,6	2,7%	7,50	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,8	3,3%	-	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	27	3,9%	19,28	29,28	4,2%	-	2,50	0,4%
9	24 DIC - 30 DIC	31,2	4,5%	5,00	34,28	5,0%	10,00	12,50	1,8%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,2	6,3%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	55,3	8,0%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	67,3	9,7%	-	34,28	5,0%	21,78	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	79,3	11,5%	21,50	55,78	8,1%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	99,5	14,4%	37,75	93,53	13,5%	-	55,78	8,1%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	119,7	17,3%	-	93,53	13,5%	29,45	85,23	12,3%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	139,9	20,2%	26,50	120,03	17,4%	2,50	87,73	12,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	160,1	23,2%	31,80	151,83	22,0%	5,80	93,53	13,5%
18	25 FEB/20 -02 MAR/20	180,3	26,1%	20,57	172,40	24,9%	29,00	122,53	17,7%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	216,2	31,3%	5,00	177,40	25,7%	29,30	151,83	22,0%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	252,2	36,5%	60,61	238,01	34,4%	20,57	172,40	24,9%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	288,1	41,7%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	315,2	45,6%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	342,4	49,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	369,5	53,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	396,6	57,4%	13,10	251,11	36,3%	65,61	238,01	34,4%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	422,5	61,1%	87,30	338,41	49,0%	-	238,01	34,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	448,5	64,9%	-	338,41	49,0%		238,01	34,4%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	474,4	68,7%	5,30	343,71	49,7%	18,10	256,11	37,1%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	500,3	72,4%	5,00	348,71	50,5%	73,00	329,11	47,6%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	523,3	75,7%	2,50	351,21	50,8%	-	329,11	47,6%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	546,2	79,0%	88,98	440,19	63,7%	5,00	334,11	48,4%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	562,6	81,4%	12,50	452,69	65,5%	44,30	378,41	54,8%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	592,1	85,7%	7,00	459,69	66,5%	61,78	440,19	63,7%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	606,4	87,8%	59,65	519,34	75,2%	19,50	459,69	66,5%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	620,7	89,8%	56,88	576,22	83,4%	18,50	478,19	69,2%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	635,0	91,9%	-	576,22	83,4%	-	478,19	69,2%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	649,3	94,0%	86,58	662,80	95,9%	-	478,19	69,2%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	663,6	96,0%	28,45	691,25	100,04%	5,15	483,34	69,9%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	669,0	96,8%	-	691,25	100,04%	207,91	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	676,9	97,96%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	680,02	98,41%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	685,5	99,21%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	694,741	100,54%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	698,491	101,09%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	702,241	101,63%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
47	06 OCT/20 - 13 OCT/20	705,991	102,17%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	720,991	104,34%	25,20	716,45	103,68%	-	691,25	100,04%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	735,991	106,51%	14,60	731,05	105,80%	9,20	700,45	101,37%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	750,991	108,68%	-	731,05	105,80%	-	700,45	101,37%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	765,991	110,85%	47,70	778,75	112,70%	30,60	731,05	105,80%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	780,991	113,02%	70,38	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	804,741	116,46%	-	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	828,491	119,90%	82,61	931,74	134,84%	64,90	795,95	115,19%

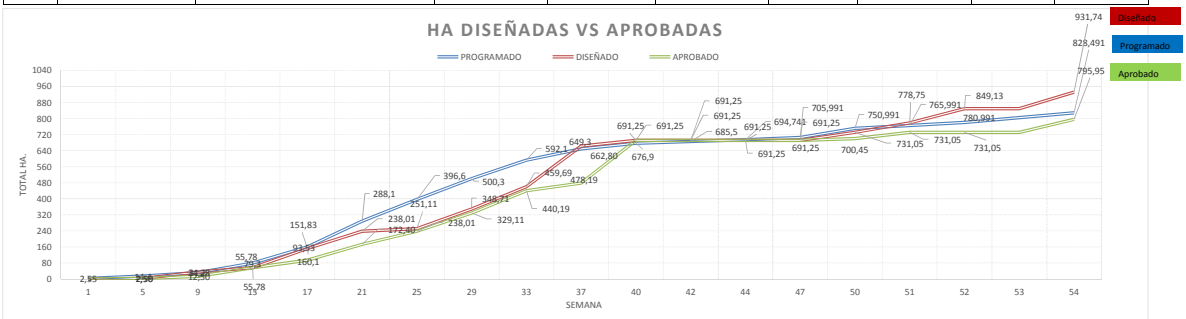

FACTURACION

VALOR HA $ 610.876,00

FACTURACION	Ha DISEÑADAS	Ha APROB. EN FISICO	Ha APROB. DIG. INTERV.	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	VALOR MENSUAL		VALOR ACUMULADO	
					Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM
MES 1	2,50	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 2	10,00	12,50	-	-	$ 7.635.950,00	$ -	$ 7.635.950,00	$ -
MES 3	43,28	43,28	-	-	$ 26.438.713,00	$ -	$ 34.074.663,00	$ -
MES 4	116,62	66,75	-	-	$ 40.775.973,00	$ -	$ 74.850.636,00	$ -
MES 5	65,61	49,87	-	-	$ 30.464.386,12	$ -	$ 105.315.022,12	$ -
MES 6	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 7	100,40	65,61	-	-	$ 40.079.574,36	$ -	$ 145.394.596,48	$ -
MES 8	114,28	140,40	-	-	$ 85.766.990,40	$ -	$ 231.161.586,88	$ -
MES 9	123,53	99,78	-	-	$ 60.953.207,28	$ -	$ 292.114.794,16	$ -
MES 10	115,03	213,06	-	-	$ 130.153.240,56	$ -	$ -	$ -
MES 11	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 12	39,80	9,20	-	-	$ 5.620.059,20	$ -	$ -	$ -
MES 13	190,69	95,50	-	-	$ 58.338.658,00	$ -	$ -	$ -
SUB-TOTAL CONTRATO	**921,74**	**795,95**	**0,00**	**0,00**	**$ 486.226.751,92**	**$ -**	**$ 486.226.751,92**	**$ -**

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 54 **DEL** 24/11/2020 **AL** 30/11/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1782-2019 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Revisión INICIAL en diseños MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10, en donde se evidencia desprendimiento de pintura en algunas marcas



Descripción Foto 2.

Revisión INICIAL en diseños MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10, en donde se evidencia desprendimiento de pintura en algunas marcas



Descripción Foto 3.

Revisión INICIAL en diseños MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10, en donde se evidencia desprendimiento de pintura en algunas marcas



Descripción Foto 4.

Revisión INICIAL en diseños MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10, en donde se evidencia desprendimiento de pintura en algunas marcas



Descripción Foto 5.

Revisión 70% en compromiso SDQS-2725482019, en donde se evidencia desgaste en marcas



Descripción Foto 6.

Revisión 70% en compromiso SDQS-2725482019, en donde se evidencia desgaste en marcas

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 54 (consecutivo) **DEL** 24/11/2020 (dd-mm-aa) **AL** 30-nov (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra cuando lo requiera)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		-
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	-
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

FRENTES TERMINADOS PARA APLICACIÓN GARANTIAS

No	ID	CP	UPZ	LOCALIDAD	Tipo de implementación	SEÑALES VERTICALES			SEÑALES horizontales																												
						Dias de garantia	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	M2 (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	ML (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	bordillos trasversales (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Techos (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Techoss (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Hitos (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Boyas(Dias garan	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	AGREBADO (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	RESALTOS (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	Estepariras (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha
1	EX_02_038_1556_10	ID 82	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	27/11/2019	121,31%	304	27/11/2019	121,31%	426	27/11/2019	86,65%	633	27/11/2019	58,32%	426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,7%									
2	EX_02_201_1881_12	ID 162	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal				304	15/11/2019	125,26%	304	15/11/2019	125,26%				593	0/01/1900	64,24%				426	15/11/2019	89,47%	426	15/11/2019	89,5%									
3	EX_02_201_1881_12	ID 163	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	22/11/2019	122,96%	304	22/11/2019	122,96%				633	0/01/1900	59,11%				426	22/11/2019	87,83%	426	22/11/2019	87,8%									
4	EX_02_201_1881_12	ID16	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	24/11/2019	122,30%	304	24/11/2019	122,30%				633	0/01/1900	58,80%				426	24/11/2019	87,36%	426	24/11/2019	87,4%									
5	EX_02_201_1881_12	ID 15	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	19/11/2019	123,95%	304	19/11/2019	123,95%				633	0/01/1900	59,59%				426	19/11/2019	88,53%	426	19/11/2019	88,5%									
6	MV_09_048_1556_10	CARRA 13	90- Fontibón	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	20,33%																													
7	MV_09_024_1249_11	CARRA 13	16-puente aranda 112-granjaripjas techo 113-Bavaria 111- Puente aranda	75 - Fontibón16-Puente	Vertical	1825	25/11/2019	20,33%																													
8	MV_09_189_1556_10	CARRA 13	76- Fontibon san pablo	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	20,33%																													
9	EX_02_201_1881_12	ID 19	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	25/11/2019	121,97%	304	25/11/2019	121,97%				633	25/11/2019	58,64%				426	25/11/2019	87,12%	426	25/11/2019	87,1%									
10	EX_02_192_1881_12	ID 18	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	27/11/2019	121,31%	304	27/11/2019	121,31%				633	27/11/2019	58,32%	426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,7%									
11	EX_02_201_1881_12	ID 97	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	27/11/2019	121,31%	304	27/11/2019	121,31%				633	27/11/2019	58,32%				426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,7%									
12	EX_02_180_1881_12	ID 23	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	24/11/2019	122,30%	304	24/11/2019	122,30%				633	24/11/2019	58,80%				426	24/11/2019	87,36%	426	24/11/2019	87,4%									
13	EX_02_038_1556_10	ID 26	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	30/11/2019	20,05%	304	27/11/2019	121,31%	304	27/11/2019	121,31%				633	27/11/2019	58,32%				426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,7%	487	27/11/2019	78%						
14	EX_02_201_1881_12	ID 10	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	27/11/2019	121,31%	304	27/11/2019	121,31%				633	27/11/2019	58,32%				426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,7%									
15	EX_02_192_1881_12	ID 186	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	27/11/2019	121,31%	304	27/11/2019	121,31%				633	27/11/2019	58,32%				426	27/11/2019	86,65%	426	27/11/2019	86,7%									
16	EX_02_038_1556_10	ID 159	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	20,33%	304	27/11/2019	121,31%	304	29/11/2019	121,31%				633	27/11/2019	58,32%				426	27/11/2019	86,65%	426	21/11/2019	88,1%									
17	MV_09_019_1249_11	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	27/11/2019	101,10%																							
18	EX_09_200_1881_12	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	15/11/2019	104,38%																							
19	EX_09_031_1556_10	ATAHUALPA	0	09_Fontibon	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	821	26/12/2019	41,40%	821	26/12/2019	41,40%				554	26/12/2019	61,42%																	
20	MV_09_424_947_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	101,10%																							
21	EX_13_002_1556_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	94,79%																							
22	EX_02_185_1881_12	ID 182	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	213	12/12/2019	166,26%	213	12/12/2019	166,26%				514	12/12/2019	68,87%				335	12/12/2019	105,80%	335	12/12/2019	105,8%									
23	EX_02_038_1556_10	ID 110	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	365	12/12/2019	96,99%	365	12/12/2019	96,99%				949	12/12/2019	37,30%				548	12/12/2019	64,66%	548	12/12/2019	64,7%									
24	EX_02_038_1556_10	ID 167	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	213	12/12/2019	166,26%	213	12/12/2019	166,26%				514	12/12/2019	68,87%				335	12/12/2019	105,80%	335	12/12/2019	105,8%									
25	EX_02_038_1556_10	ID 30	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	213	12/12/2019	166,26%	213	12/12/2019	166,26%				475	12/12/2019	74,60%				304	12/12/2019	116,38%	304	12/12/2019	116,4%									
26	EX_02_201_1881_12	ID 160	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	274	12/12/2019	129,31%	274	12/12/2019	129,31%				593	12/12/2019	59,68%				304	12/12/2019	116,38%	304	12/12/2019	116,4%									
27	EX_02_185_1881_12	ID 29	Chico lago	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	243	16/12/2019	143,84%	243	16/12/2019	143,84%				475	16/12/2019	73,76%				365	16/12/2019	95,89%	365	16/12/2019	95,9%									
28	MV_13_168_1249_11	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	94,79%																							
29	EX_13_001_1556_10	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	94,79%																							
30		ATAHUALPA	Fontibon	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	19,12%	821	26/12/2019	41,40%	821	26/12/2019	41,40%				554	26/12/2019	61,42%																335	16/12/2019	105%
31	EX_02_033_1556_001	ID13	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	365	3/01/2020	90,96%	365	3/01/2020	90,96%				870	3/01/2020	38,16%				517	3/01/2020	64,21%	517	3/01/2020	64,2%									
32	sc_02_166_v1	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	horizontal							365	3/01/2020	90,96%										548	29/12/2019	61,55%											
33	EX_02_356_946_10	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	335	3/01/2020	99,23%	335	3/01/2020	99,23%				909	3/01/2020	36,51%				487	3/01/2020	68,22%	487	3/01/2020	68,2%									
34	EX_18_158_1244_11	0	Rafael uribe	0	horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	335	20/01/2020	94,15%	335	20/01/2020	94,15%																							
35	EX_09_214_1881_12_V2	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							350	8/01/2020	93,48%																							
36	CLM-181002-000006	0	0	Tunjuelito	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	578	20/01/2020	54,51%	548	20/01/2020	57,53%																							
37	CP_CLM-181114-000025	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	882	27/01/2020	34,92%	852	27/01/2020	36,16%																					633	27/01/2020	49%
38	CP_CLM-181114-000013	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	16,88%	821	27/01/2020	37,50%	1095	27/01/2020	28,13%																					913	27/01/2020	34%
39	CP_SDM-236118-19	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	213	27/02/2020	130,10%	335	27/02/2020	82,79%																					274	27/02/2020	101%
40	MV_AV_CALI_941_09_ AMERICAS Y ESPERANZA	0	Kennedy	Castilla	horizontal				365	27/02/2020	75,89%	365	27/02/2020	75,89%																							
41	SDM-299509-18	0	Kennedy	Castilla	horizontal				578	27/02/2020	47,93%	578	27/02/2020	47,93%																							
42	Solicitud gerente localidad	0	tunjuelito	Tunjuelito	horizontal				730	21/01/2020	43,01%	669	21/01/2020	46,92%																					633	14/01/2020	51%
43	MV_08_001_1703_10	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	487	27/02/2020	56,92%	335	27/02/2020	82,79%				304	27/02/2020	91,07%	304	27/02/2020	91,07%	213	27/02/2020	130,10%									304	27/02/2020	91%
44	CP_SDM-DSC-136240-18	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	28/02/2020	15,12%																													
45	CP_SDM-76913-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	16,22%	669	27/02/2020	41,39%	608	27/02/2020	45,53%																					633	4/02/2020	47%	395	27/02/2020	70%

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 54 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2020 (dd/mm/aa) **AL** 30-nov (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de interventoría)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de obra)

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 7.957.500.000
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 7.957.500.000
Plazo Inicial	15 MESES
Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15 MESES
Fecha de Iniciación	29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial	15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.061.619.391
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 2.061.619.391
Plazo Inicial	16MESES
Plazo Prorroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15MESES
Fecha de Iniciación	29/10/2019
Fecha de Terminación	16/03/2021

2. GARANTIAS

46	CP_SDM-29716-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	16,22%																			791	27/05/2020	24%			
47	CP_SQDS-1387272019	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	578	27/02/2020	47,93%	730	27/02/2020	41,64%													578	14/01/2020	56%				593	14/01/2020	54%
48	EX_08_338_1867_12_V4	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	548	27/02/2020	50,59%	548	27/02/2020	50,59%																			395	27/02/2020	70%
49	SDQS 18919622018	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	213	27/02/2020	130,10%	213	27/02/2020	130,10%																			395	31/01/2020	77%
50	CP_SDM-DSVCT-7089-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	183	27/02/2020	151,78%	183	27/02/2020	151,78%				243	27/02/2020	113,84%	183	27/02/2020	151,78%											
51	EM_08_124	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/05/2020	10,25%	578	27/05/2020	32,36%	456	27/05/2020	40,99%													213	4/05/2020	99%				426	4/05/2020	49%
52	EX_09_200_1881_12_V2	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	426	27/02/2020	65,05%	426	27/02/2020	65,05%				183	27/02/2020	151,78%	304	27/02/2020	91,07%	243	27/02/2020	113,84%				304	27/02/2020	91%				243	27/02/2020	114%
53	SSDQS-1383742018	0	Fontibon	0	horizontal																											304	27/02/2020	91%
54	EX_08_323_1867_12	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	15,18%	365	27/02/2020	75,89%	426	27/02/2020	65,05%																			277	27/02/2020	100%
55	EX_08_042_1556_10	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	28/03/2020	13,53%	669	28/03/2020	36,91%																							
56	EX_08_327_1867_10	ZONA ESCOLAR	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	7/03/2020	14,68%	213	28/03/2020	116,01%	213	28/03/2020	116,01%																			277	28/03/2020	89%
57	EX_08_329_1867_12	ZONA ESCOLAR	patio bonito	Kennedy	Vertical horizontal	1825	28/04/2020	11,84%	426	28/04/2020	50,72%	426	28/04/2020	50,72%																					
58	SDM_DSC_83051_18	0	Carvajal	Kennedy	horizontal	1825	23/03/2020	13,81%																			514	23/03/2020	49%						
59	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y AMERICAS)	0	Kennedy	0	horizontal							365	24/04/2020	60,27%																				
60	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y CALLE 59S)	0	Kennedy	0	horizontal							365	26/04/2020	59,73%																				
61	SDM-294379-18	0	Kennedy	0	horizontal				183	29/04/2020	117,81%																							
62	SDM_316509_18	0	Kennedy	0	horizontal																						487	27/04/2020	45%					
63	SDQS_2725482019	0	Fontibon	San pablo	horizontal				213	28/05/2020	87,36%																							
64	SDM-261374-2019	0	Capellania	Fontibon	horizontal				517	28/05/2020	35,97%	517	28/05/2020	35,97%																				
65	SDM-SCTT-225169-2019	Zona Escolar	0	kennedy	horizontal				517	27/05/2020	36,16%	517	27/05/2020	36,16%																				
66	SDM-318531-2019	Zona escolar	0	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	10,25%	517	27/05/2020	36,16%	517	27/05/2020	36,16%																				
67	ZE_06_269_1561_10	Zona escolar	0	Tunjuelito	horizontal	1825	27/04/2020	11,89%	669	27/03/2020	37,06%	548	27/03/2020	45,30%				544	27/03/2020	45,55%	335	27/03/2020	74,12%							487	27/03/2020	51%				395	27/03/2020	63%
68	ZE_06_168_151_10	Zona escolar	modelia	fontibon	horizontal				639	27/04/2020	33,97%																						487	27/04/2020	45%
69	SDQS_272490-2019	Zona escolar	FONTIBON	fontibon	horizontal				213	28/05/2020	87,36%	213	28/05/2020	87,36%																			395	28/05/2020	47%
70	MV_AV_BOYACA_941_09_V27	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal				365	23/05/2020	52,33%	365	23/05/2020	52,33%				544	23/05/2020	35,08%															
71	SDM-15023-2020	N/A	castilla	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	10,25%	669	27/05/2020	27,95%	669	27/05/2020	28,54%																			426	27/05/2020	44%
72	CLM-180320-000001	N/A	0	0	horizontal				760	27/05/2020	24,59%	700	27/05/2020	26,73%																			395	27/05/2020	47%
73	SDM-265092	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	23/05/2020	89,71%	213	23/05/2020	89,71%																			487	27/05/2020	38%
74	SDM-242548	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	27/05/2020	87,83%	213	27/05/2020	87,83%																			395	27/05/2020	47%
75	SDM-316519-2018	N/A	Americas	Kennedy	horizontal	1825	27/06/2020	8,55%	213	27/06/2020	73,27%	213	27/06/2020	73,27%																			517	27/06/2020	30%
76	SDM-554-20	N/A	margaritas	kennedy	horizontal				700	23/05/2020	27,30%	700	23/05/2020	27,30%																			487	27/05/2020	38%
77	SDM_SGV_281345_19	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal										304	28/05/2020	61,15%	304	28/05/2020	61,15%															
78	SDQS_176846-2019	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal																											456	27/05/2020	41%
79	CLM_181123-00032	N/A	venecia	Tunjuilito	horizontal	1825	28/06/2020	8,49%	548	28/06/2020	28,31%	548	28/06/2020	28,31%																			517	26/06/2020	30%
80	SDQS_2672752019	N/A	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																						304	3/06/2020	59%				517	28/06/2020	30%
81	SDQS_237461	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	10,25%																			304	27/05/2020	61%						
82	SDQS_237461	N/A	CAPELLANIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	10,25%																			213	27/05/2020	88%						
83	EX_06_93_1244_11	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	8,60%	578	26/06/2020	27,17%	456	26/06/2020	34,41%													304	26/06/2020	52%				274	26/06/2020	57%
84	CLM_180405-000032	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	8,49%	395	28/06/2020	39,20%	517	28/06/2020	29,98%													365	26/06/2020	43%				274	28/06/2020	57%
85	SDM_229731_18	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	8,49%	487	26/06/2020	32,26%	335	26/06/2020	46,92%																			435	26/06/2020	36%
86	SDM_229731	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	8,60%																			213	26/06/2020	74%						
87	SDM_DCV_293492_18	N/A	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal																						213	10/07/2020	67%						

Consorcio InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 54 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2020 (dd/mm/aa) **AL** 30-nov (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre y razon social del contratista)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

88	CLM_181008_000042	N/A	FONTIBON	FONTIBON	horizontal	1825	10/07/2020	7,84%																						475	10/07/2020	30%			
89	SDQS_280824-2018	N/A	LA CABAÑA	FONTIBON	horizontal																		243	10/07/2020	58,77%									
90	EX_09_001_1214_15_V4	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	7,45%	213	27/07/2020	59,18%	213	27/07/2020	59,18%	304	27/07/2020	41,42%				335	17/07/2020	40,65%										183	27/07/2020	69%
91	EX_09_203_1881_12_V44	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	7,45%	487	17/07/2020	27,95%	335	17/07/2020	40,65%																		435	17/07/2020	31%
92	EX_08_338_1867_12	N/A	Americas	KENNEDY	horizontal	1825	28/02/2020	15,12%	548	27/02/2020	50,59%	548	27/02/2020	50,59%																				
93	EX_09_201_1881_12	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal	1825	28/04/2020	11,84%	578	28/03/2020	42,74%	821	28/03/2020	30,08%																		487	28/05/2020	38%
94	clm_180517-000083	N/A	N/A	tunjuelito	horizontal																								365	28/06/2020	42%			
95	SDQS_1772412019	SDQS_1772412019	ciudad salitre	fontibon	horizontal										304	27/07/2020	41,42%																	
96	MV_08_001_1214	2808242018	la cabaña	fontibon	horizontal																		243	27/07/2020	51,78%									
97	EX_09_185_1249	181008_000042	FONTIBON	fontibon	horizontal																									365	27/07/2020	35%			
98	SDM_394713_18	SDM_394713_18	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																											730	28/07/2020	17%
99	ze_06_163_1561_10	CP_SDM-OGS-227601-19	CASTILLA	KENNEDY	horizontal				548	6/08/2020	21,19%	548	6/08/2020	21,19%																			395	6/08/2020	29%
100	CLM-181116-000006	CLM-181116-000006	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal	1825	27/07/2020	6,90%	183	27/07/2020	69,04%																					183	6/08/2020	64%
101	CLM_180823_000003	CLM_180823_000003	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal				548	27/08/2020	17,35%							274	27/08/2020	34,70%			243	27/08/2020	39,04%							213	27/08/2020	45%			
102	EM-08_073	SDM_316511_18	AMERICAS	KENNEDY	horizontal				669	27/07/2020	18,83%	669	27/07/2020	18,83%				395	27/07/2020	31,87%	243	27/07/2020	51,78%	304	27/07/2020	41,42%							213	27/07/2020	59%	395	6/08/2020	29%
103	EX_10_008_1560_10	N/A	AMERICAS	ENGATIVA	horizontal	1825	6/09/2020	4,66%	548	6/09/2020	15,53%	365	6/09/2020	23,29%				243	6/09/2020	34,93%	243	6/09/2020	34,93%	243	27/07/2020	51,78%				304	6/09/2020	28%				243	6/09/2020	35%
104	CLM_180823_000004	N/A	castilla	kennedy	horizontal				487	28/07/2020	25,68%	335	28/07/2020	37,36%				335	28/07/2020	37,36%																
105	EX_09_200_1881_12	SDQS_2108342019	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				517	28/08/2020	18,18%	517	28/08/2020	18,18%																			395	28/08/2020	24%
106	EX_09_048_1556-10	0	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				183	28/08/2020	51,51%	183	28/08/2020	51,51%				183	28/08/2020	51,51%				183	28/08/2020	51,51%									
107	mv_08_435_676_09	SDM_275666-18	TIMIZA	KENNEDY	horizontal													243	28/09/2020	25,89%				243	28/08/2020	38,63%				304	28/09/2020	21%			
108	EX_10_006_1560_10	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	3,45%	335	28/09/2020	18,83%	335	28/09/2020	18,83%				243	28/09/2020	25,89%	213	28/09/2020	29,59%	213	28/09/2020	29,59%							243	28/09/2020	26%
109	EX_10_372_1842_12	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	3,45%	335	28/09/2020	18,83%	335	28/09/2020	18,83%				243	28/09/2020	25,89%	213	28/09/2020	29,59%	213	28/09/2020	29,59%				304	28/09/2020	21%		243	28/09/2020	26%
110	EX_10_008_1560_10	0	FERIAS	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	3,45%	365	28/09/2020	17,26%	365	28/09/2020	17,26%																			395	28/09/2020	16%
111	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78B	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	2,47%	365	16/10/2020	12,33%	274	16/10/2020	16,44%				243	28/10/2020	13,56%	213	16/10/2020	21,14%	213	16/10/2020	21,14%									
112	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 75	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	2,47%	365	28/10/2020	9,04%	274	28/10/2020	12,05%				243	28/10/2020	13,56%	213	16/10/2020	21,14%	213	28/10/2020	15,50%									
113	EX_13_003_1556_10	0	CUIDAD SALITRE	TEUSAQUILLO	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	1,81%	487	28/10/2020	6,78%	335	28/10/2020	9,86%				243	28/10/2020	13,56%	243	16/10/2020	18,49%	243	28/10/2020	13,56%				243	28/10/2020	14%	243	28/10/2020	14%
114	MV_09_048_1556_10	0	fontibon	fontibon	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	1,81%	183	28/10/2020	18,08%	183	28/10/2020	18,08%																				
115	MV_12_281	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	1,81%	335	28/10/2020	9,86%	335	28/10/2020	9,86%				243	28/10/2020	13,56%															
116	TPD_PL_2342	0	0	SANTAFE	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	1,81%	426	28/10/2020	7,75%	426	28/10/2020	7,75%				243	28/10/2020	13,56%	243	28/10/2020	13,56%	243	28/10/2020	13,56%				304	28/10/2020	11%			
117	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78k	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	2,47%	365	5/11/2020	6,85%	274	5/11/2020	9,13%				243	28/10/2020	13,56%	213	16/10/2020	21,14%	213	5/11/2020	11,74%									

3. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
Se relacionan actividades que a la fecha hantterminado sus labores .
Se registran tambien actividades que estan en ejecución.


4. ANEXOS

	SI	NO
1. Registro Fotográfico	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los _____ (Día en letras) 30 (Día en número) días del mes de noviembre (Mes en letras)

(Nombre) Firma de Ing. RESIDENTE

(Nombre) FELIPE MAJANA OSSO
(Nombre) LUZ JARMANA OSSO

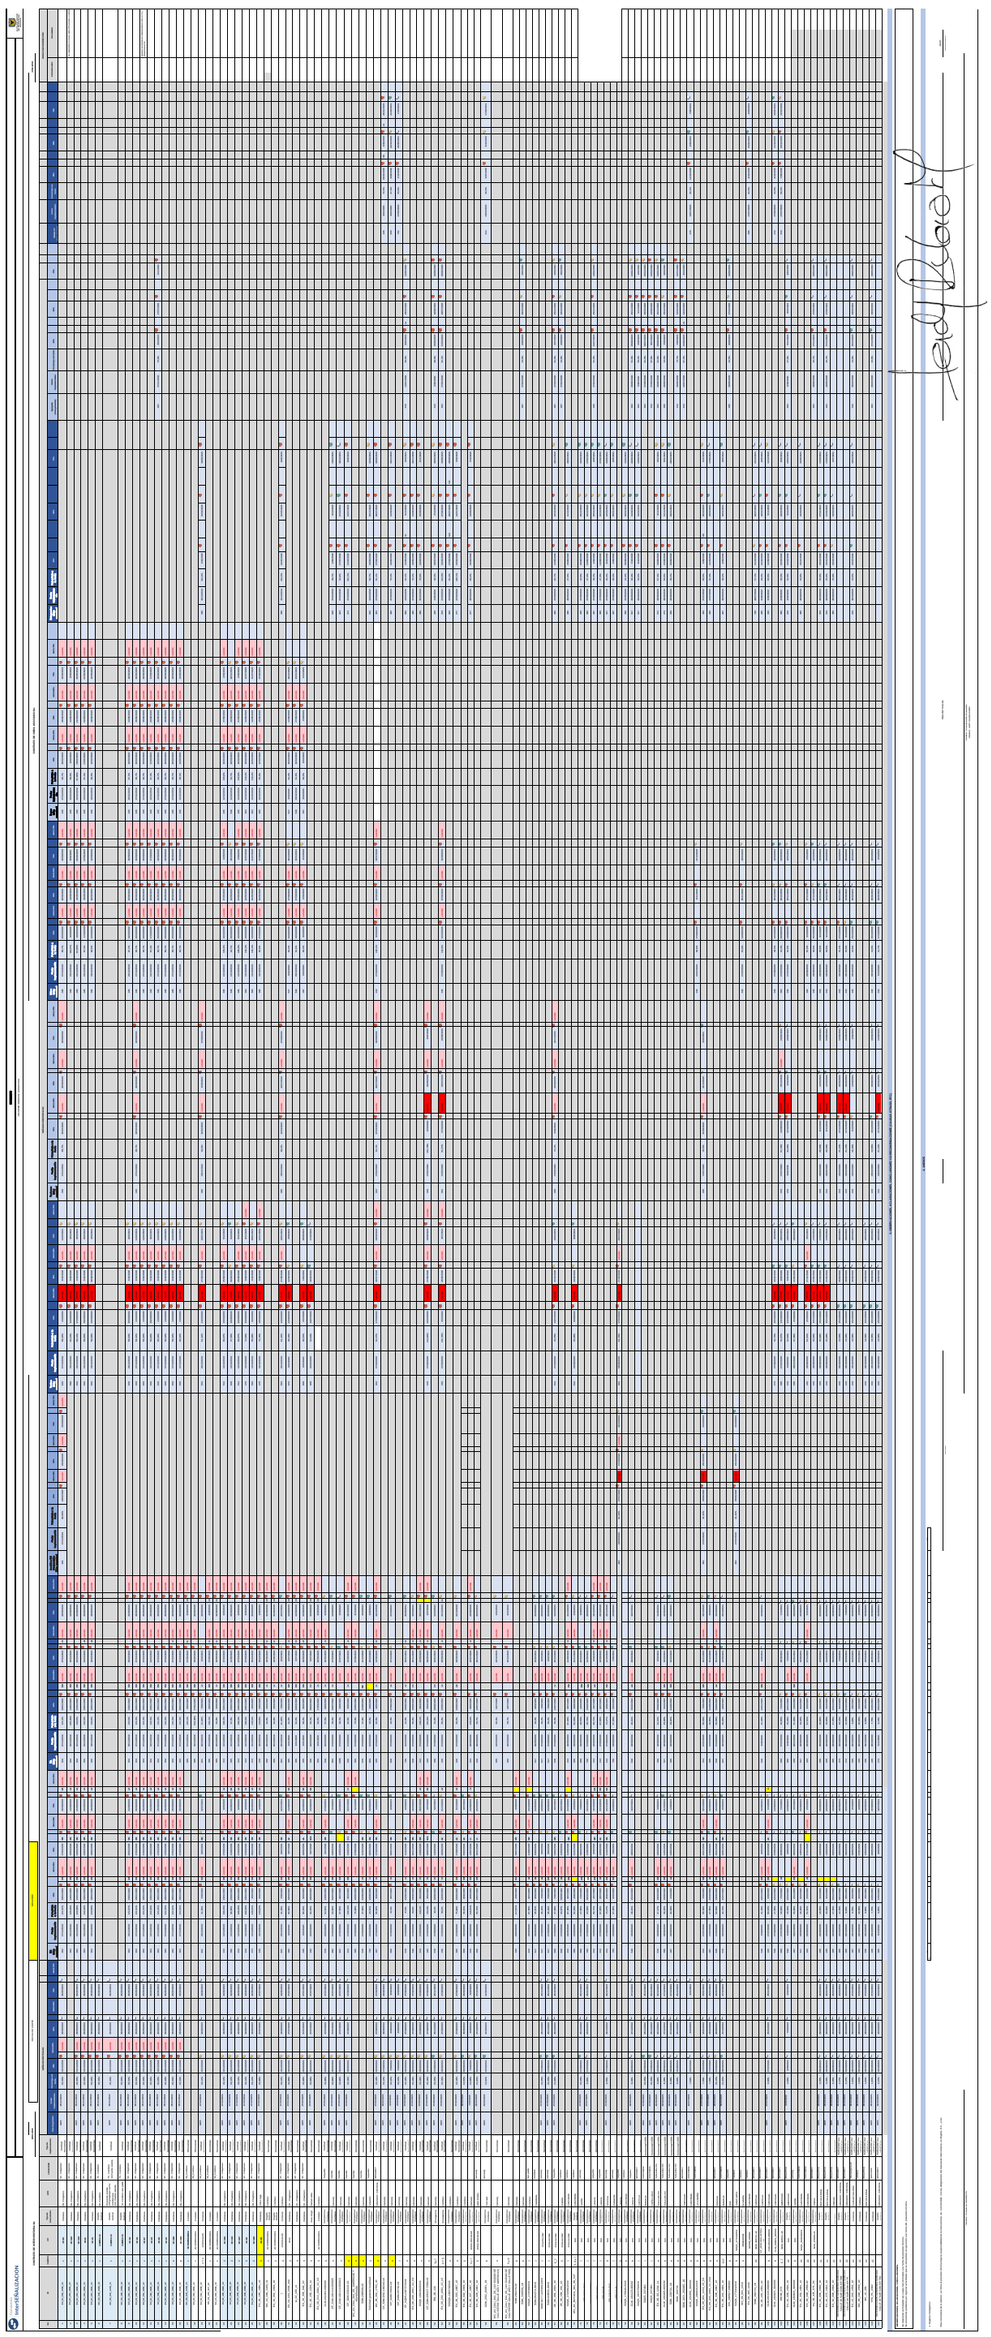

ALCALDIA MAY DE BOGOTA I	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.**	
FECHA: diciembre 9 de 2020.	**HORA: 9:00 a.m. a 9:40 a.m.**	**LUGAR: Sesión virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos.
2. Informe de Consultoría.
3. Informe de Georreferenciación.
4. Informe de Garantías.
5. Informe de Obra y varios.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS

1. Inspección de la zona escolar de Mandaly, se entregó la inspección y PMT
2. Trámite cuenta 13 de consultoría e interventoría, están en trámite de firmas, hoy ya pueden presentar las cuentas.

INFORME CONSULTORIA

Interviene el Ing. Sergio Valderrama, el contratista tiene en total entregadas 71 IDS que suman 1.016,66 hectáreas, 147,13%, inventarios aprobados 60 IDS que suman 931,74 hectáreas, 134,84%, está por encima de la meta en 44,38 hectáreas y porcentaje de 6,42%, los inventarios en proceso de revisión al corte son 11, total diseños entregados por el contratista 60, suman 932,74 hectáreas, 134,99%, diseños aprobados 56 con 849,3 hectáreas equivalentes al 122,89%, está por debajo del cronograma en 3,11% equivalente al 0,45%, diseños en proceso de revisión al corte 4, interviene el Ing. Luis Eduardo y solicita seguir avanzando en las revisiones de diseño.

INFORME GEOREFERENCIACION

Interviene la Ing. Anny, para la semana 55 con corte a hoy, tienen un total de 130 IDS de los cuales han llegado 128, revisión interventoría 13, revisión contratista 4, aprobados por SDM 105 y en revisión por SDM 8, en diseño tienen 48 de los cuales han llegado 48, 700,45 hectáreas de los cuales tienen 497,75 aprobadas en revisión de SDM 131,25 contratista 40,55, en revisión por Interventoria 30,9 hectáreas que equivalen a 2 diseños, la ingeniera manifiesta una preocupación ante la asignación de unas intersecciones IDU, realizaron la solicitud a la Ing. Adriana Páez para los interno, los diseños llegaron con las direcciones no con los IDS que le corresponden M208261 pertenece a la calle 26 sur con 78B, la Ing. Adriana comenta que no los tiene socializados y no le han hecho llegar ningún reporte de estas tres intersecciones, por lo cual no se esta asignando

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 9 de 2020.	HORA: 9:00 a.m. a 9:40 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

ningún interno de señales verticales instaladas igual sucede con el diseño EX13150031556 que está en actualización por parte de otro contrato según le manifestó la Ing. Adriana Páez, hasta que no lo aprueben no pueden asignar internos, interviene el Arq. Juan Camilo y comenta que es con el Ing. Elvis Chavarro, por lo cual solicita reunión con el equipo de interventoría para que revisen el tema.

INFORME GARANTIAS

Interviene la Ing. Leidy, a la semana tienen 101 diseños revisados por la interventoría, revisados sin observación 62 equivalentes al 61%, atendidos por el contratista y aceptados por la interventoría 32 equivalentes al 32%, atenciones rechazadas por la interventoría 12 equivalentes al 12%, pendientes por atender por el contratista 39 equivalente al 39%, en el transcurso de la semana se hizo recorrido CPSEQS2724902 se evidencio que la observación ya está atendida por el contratista pero no han hecho llegar formalmente por comunicado por esto hay 1 atención menos, en el transcurso de la semana tampoco ha llegado ninguna atención a observación.

INFORME DE OBRA Y VARIOS

Al corte de la semana 55, 7 de diciembre, el contratista tiene entregados en diseños normales 18, inspeccionados 18, en implementación 2, implementados total 16, suministros asignados 6, entregados 6, medidas de gestión 0, compromisos prioritarios 186 asignados, 185 inspeccionados, implementados totalmente 180, pendientes por implementar 6, en emergencia patinetas asignadas 24, rentadas 24, otras emergencias asignadas 26 , inspeccionadas 26, en implementación 13, implementadas totalmente 23, en la semana ejecuto obra por valor de $86.446.863 equivalente al 1,18%, tiene obra por ejecutar por valor de $963.898.155 equivalente al 13,16%, no se presentaron jornadas de lluvia, se programaron 6 jornadas de trabajo, todas en horario nocturno, observaciones, no se presentan lluvias en la semana en el ID de la calle 13 entre carrera 135 se demarcaron 1229 new jersey para un total de 1975 y se implementaron la totalidad de las tachas reflectivas, se inicia implementación en diseño ZE0846194310, días transcurridos del contrato 405, días para terminar el contrato 70, valor a ejecutar diario $13.769.974, en la gráfica de avance el contratista debería estar en un 125,41%, tiene un avance real de 130,24%, lo cual significa que está por encima en un 3,85%.

Interviene el Ing. Luis Eduardo y comenta que en la gráfica ya se está viendo el efecto de no tener la pista para seguir trabajando, están cerca para llegar a la curva, pregunta por los pendientes, responde el Ing. Sergio Valderrama que están pendientes de las intersecciones del IDU, comenta EL Ing. Luis Eduardo que estarían 2 pendientes la de la tercera con Av., Boyacá y otra, adicionalmente está la de la 80 con 26 y la de la calzada sur de la calle 13, pregunta si hay luz verde para iniciar implementación de estos sectores, responde el Ing. Sergio Valderrama que no ha recibido ningún dato por parte de la SDM sobre el tema.

Interviene el Arq. Juan Camilo y comenta que como lo hablaron el viernes la socialización la van a hacer en conjunto con el IDU de la intersección que hace parte del convenio, para el tema del bici carril el proceso es diferente, el equipo de gestión de la SDM quedó de realizarlo esta semana para el viernes poder tener el inicio de obra, los otros dos puntos ya los habían tratado la semana pasada un tema de semáforos que terminará a final de diciembre, están pendientes del IDU sobre el tema de mantenimiento, a la fecha no han recibido respuesta de la calle 80 por carrera 96, se ha enviado por varios medios y aún

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 9 de 2020.	HORA: 9:00 a.m. a 9:40 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

no tienen respuesta, la Ing. Marcela está pendiente del tema de la calzada sur, pero no han tenido respuesta, pregunta el Ing. Luis Eduardo cual sería la fecha para definir lo de la carrera 96 con calle 80 y la calzada sur de la calle 13, el Arq. Juan Camilo invita a una mesa de trabajo con presupuesto en mano, lo de obra y la 13, el Ing. Luis Eduardo comenta que máximo al 10 de enero debería estar hecha la obra por parte del IDU.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Coordinación, mesa de trabajo para definición intervención costado sur de la AC 13 y adicionales.	SDM	11-dic-2020
2. Definición intervención cruce AC 80 por Kr 96	SDM	11-dic-2020

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 3 - SUR OCCIDENTE

PERIODO: DESDE 01/12/2020 A 07/12/2020 SEMANA: **55**

Consorcio InterSEÑALIZACION

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**	CONTRATO No.	**2019 - 1782**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 4.882.890.333,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 2.440.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 7.323.190.333,00

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS		TOTAL
					PATINETAS	OTROS	
ID ASIGNADOS	18	6	0	186	24	26	260
ID INSPECCIONADOS	18	0	0	185	24	26	253
ID POR INSPECCIONAR	0	0	0	0	0	0	0
ID EN IMPLEMENTACIÓN	2	0	0	0	0	3	5
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	16	6	0	180	24	23	249
ID POR IMPLEMENTAR	0	0	0	6	0	0	6

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR POR SEPARADO		VALOR TOTAL
MES 1	$28.987.700	$203.847.546	PATINETAS	$53.855.878	$301.601.550
			OBRA	$247.745.672	
MES 2	$15.694.587	$302.450.440	PATINETAS	$23.142.234	$435.540.543
			OBRA	$412.398.308	
MES 3	$50.906.552	$160.036.785	PATINETAS	$15.513.088	$289.222.050
			OBRA	$273.708.962	
MES 4	$26.177.750	$555.494.979	$581.672.728		
MES 5	$25.601.175	$521.865.954	$547.467.129		
MES 6	$50.453.865	$290.269.932	$444.376.468		
MES 7	$65.242.246	$615.557.486	$746.922.987		
MES 8	$69.446.196	$377.906.324	$447.352.519		
MES 9	$85.041.157	$576.008.263	$661.049.420		
MES 10	$25.874.362	$400.936.858	$427.684.940		
MES 11	$47.730.633	$313.109.721	$433.860.679		
MES 12	$66.066.057	$605.688.352	$671.754.409		
MES 13	$23.003.273	$249.345.363	$272.392.698		
MES 14	$6.675.047	$91.719.012	$98.394.059		
MES 15	$0	$0	$0		
MES 16	$0	$0	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**55**	**$6.359.292.178**		

Valor programado	MES 1	$244.144.517	3,24%
Valor ejecutado		$301.601.550	4,12%
Valor programado Acumulado	MES 2	$634.775.743	8,42%
Valor ejecutado		$737.142.092	10,07%
Valor programado Acumulado	MES 3	$1.123.064.777	14,90%
Valor ejecutado		$1.026.364.142	14,02%
Valor programado Acumulado	MES 4	$1.660.182.713	22,03%
Valor ejecutado Acumulado		$1.608.036.871	21,96%
Valor programado Acumulado	MES 5	$2.141.736.725	28,42%
Valor ejecutado		$2.155.504.000	29,43%
		SUSPENSION	
Valor programado Acumulado	MES 6	$2.418.958.886	32,10%
Valor ejecutado		$2.599.880.467	35,50%
Valor programado Acumulado	MES 7	$2.956.076.823	39,23%
Valor ejecutado		$3.346.803.454	45,70%
Valor programado Acumulado	MES 8	$3.493.194.759	46,36%
Valor ejecutado		$3.794.155.973	51,81%
Valor programado Acumulado	MES 9	$4.030.312.696	53,49%
Valor ejecutado		$4.455.205.394	60,84%
Valor programado Acumulado	MES 10	$4.567.430.633	60,61%
Valor ejecutado		$4.882.890.334	66,68%
Valor programado Acumulado	MES 11	$4.882.890.333	64,80%
Valor ejecutado		$5.316.751.012	72,60%
Valor programado Acumulado	MES 12	$5.413.390.333	71,84%
Valor ejecutado		$5.988.505.421	81,77%
Valor programado Acumulado	MES 13	$5.943.890.333	78,88%
Valor ejecutado		$6.260.898.119	85,49%
Valor programado Acumulado	MES 14	$6.474.390.333	85,92%
Valor ejecutado		$6.359.292.178	86,84%
Valor programado Acumulado	MES 15	$7.004.890.333	92,96%
Valor ejecutado		$6.359.292.178	86,84%
Valor programado Acumulado	MES 16	$7.535.390.333	100,00%
Valor ejecutado		$6.359.292.178	86,84%
Valor ejecutado semana	55	**$86.441.863**	1,18%
Valor Total Contrato de Obra		$7.323.190.333	100,00%
Valor por ejecutar		$963.898.155	13,16%


OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	0	DIURNA	0	NOCTURNA	0		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:				6	DIURNA	0	NOCTURNA 6

OBSERVACIONES: No se presentaron lluvias en la semana.
En el Id MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10 Calle 13 Entre KR 100 hasta KR 135, se pintaron en esta semana 1229 New jersey para un total 1975 y se implementaron la totalidad de las tachas reflectivas.
Se inicia la implementacion en el diseño ZE_08_461_943_10

Dias transcurridos del contrato	405	Dias para terminar el contrato	70	Valor a ejecutar diario	$13.769.974

AVANCE INVERSION CONTRATO 2019-1782
ZONA SUR-OCCIDENTAL

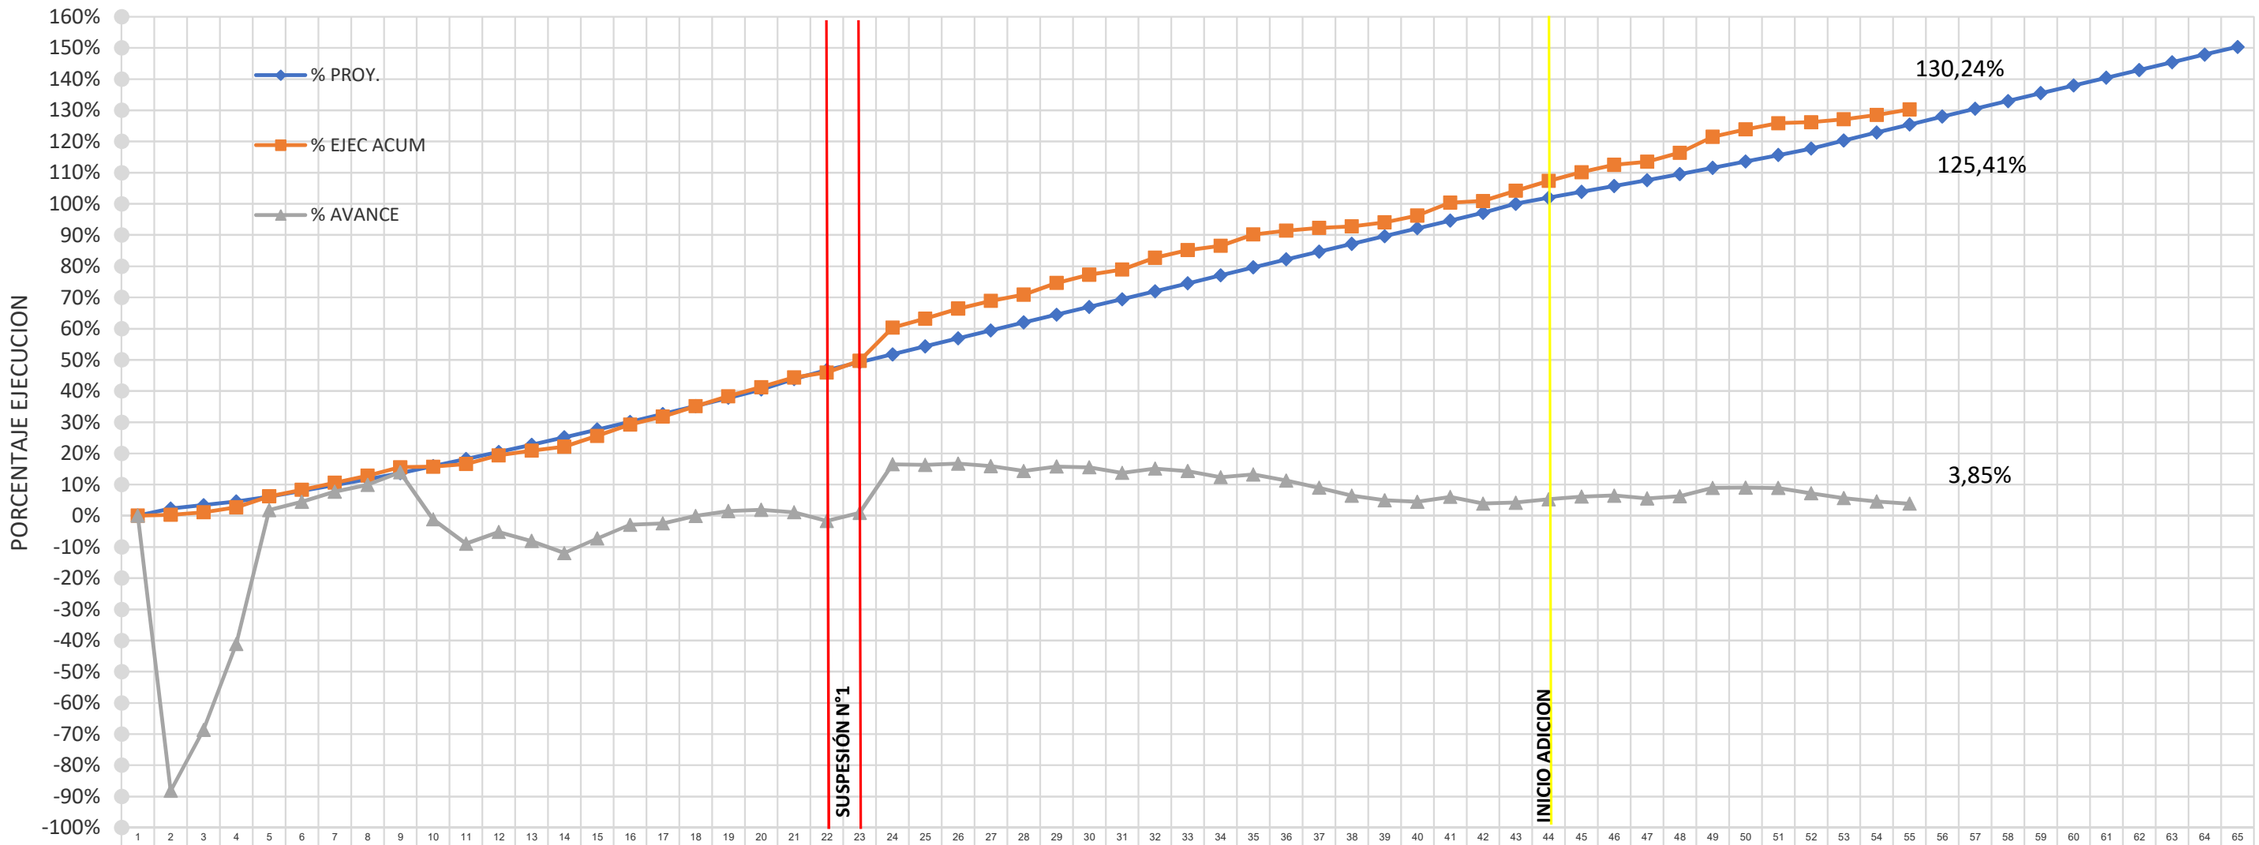

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
% PROY.	0,00%	2,26%	3,39%	4,52%	6,07%	7,93%	9,80%	11,67	13,65	15,90	18,16	20,42	22,68	25,13	27,61	30,10	32,58	35,14	37,79	40,45	43,86	46,70	49,18	51,74	54,31	56,87	59,44	61,96	64,44	66,93	69,41	71,91	74,47	77,04	79,61	82,17	84,67	87,15	89,64	92,12	94,62	97,13	100,0	101,9	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	115,6	117,7	120,2	122,8	125,4	127,9	130,4	132,9	135,4	137,9	140,4	142,8	145,3	147,8	150,3
% EJEC ACUM	0,00%	0,27%	1,06%	2,66%	6,18%	8,28%	10,55	12,82	15,54	15,71	16,54	19,35	20,83	22,12	25,59	29,22	31,77	35,12	38,34	41,20	44,33	45,93	49,62	60,26	63,15	66,38	68,86	70,84	74,60	77,29	78,93	82,73	85,12	86,53	90,16	91,40	92,24	92,76	94,05	96,23	100,3	100,8	104,1	107,3	110,1	112,5	113,5	116,3	121,5	123,8	125,8	126,1	127,0	128,4	130,2									
% AVANCE	0,00%	-88,2	-68,6	-41,1	1,81%	4,43%	7,67%	9,87%	13,88	-1,21	-8,95	-5,22	-8,13	-11,9	-7,33	-2,91	-2,48	-0,06	1,44%	1,86%	1,07%	-1,66	0,89%	16,46	16,29	16,71	15,85	14,33	15,75	15,49	13,72	15,06	14,30	12,32	13,25	11,23	8,94%	6,43%	4,93%	4,47%	6,04%	3,88%	4,19%	5,27%	6,11%	6,46%	5,54%	6,25%	8,93%	9,02%	8,84%	7,16%	5,63%	4,57%	3,85%									

SEMANA 55

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA **55** **CORTE** **08 Dic./2020**

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE INVENTARIOS DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 3	A01	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-nov-19	REV. 4	27-dic-19	MES 3	
2	MES 1	SEM. 3	A02	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	18-nov-19	REV. 3	24-dic-19	MES 3	
3	MES 1	SEM. 3	A03	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	18-nov-19	REV. 2	05-dic-19	MES 3	
4	MES 1	SEM. 4	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	25-nov-19	REV. 3	20-dic-19	MES 3	
5	MES 2	SEM. 5	A05	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 3	15-ene-20	MES 3	
6	MES 2	SEM. 7	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	12-dic-19	REV. 3	23-ene-20	MES 3	
7	MES 2	SEM. 8	A07	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	18-dic-19	REV. 2	31-ene-20	MES 4	
8	MES 2	SEM. 8	A08	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	18-dic-19	REV. 3	30-ene-20	MES 4	
9	MES 2	SEM. 8	A09	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	19-dic-19	REV. 2	10-feb-20	MES 4	
10	MES 2	SEM. 8	A10	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
11	MES 3	SEM. 11	A11	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	04-feb-20	MES 4	
12	MES 3	SEM. 11	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
13	MES 3	SEM. 12	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	17-ene-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
14	MES 3	SEM. 12	A14	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	20-ene-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
15	MES 4	SEM. 15	A15	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	07-feb-20	REV. 3	12-mar-20	MES 5	**
16	MES 4	SEM. 15	A16	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	10-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
17	MES 4	SEM. 16	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	12-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
18	MES 5	SEM. 18	A18	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	27-feb-20	REV. 2	11-may-20	MES 7	
19	MES 5	SEM. 18	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	02-mar-20	REV. 2	12-may-20	MES 7	
20	MES 5	SEM. 19	A20	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	06-mar-20	REV. 1	13-mar-20	MES 5	
21	MES 5	SEM. 20	A21	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	05-may-20	MES 7	
22	MES 5	SEM. 20	A22	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	13-may-20	MES 7	****
23	MES 5	SEM. 20	A23	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	14-may-20	MES 7	
24	MES 5	SEM. 20	A24	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	26-may-20	MES 7	
25	MES 5	SEM. 20	A25	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	13-mar-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	
26	MES 5	SEM. 21	A26	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-mar-20	REV. 3	28-may-20	MES 7	
27	MES 6	SEM. 23	A27	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	04-jun-20	MES 8	
28	MES 6	SEM. 23	A28	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	23-jun-20	MES 8	****
19	MES 6	SEM. 23	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2	20,00	20,00	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
29	MES 6	SEM. 23	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	27-abr-20	REV. 4	09-jun-20	MES 8	
30	MES 6	SEM. 23	A30	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	27-abr-20	REV. 2	01-jun-20	MES 8	
31	MES 7	SEM. 25	A31	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	12-may-20	REV. 3	02-jun-20	MES 8	
32	MES 7	SEM. 26	A32	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	11-jun-20	REV. 4	16-jun-20	MES 8	****
33	MES 7	SEM. 26	A33	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	18-may-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	*****
19	MES 7	SEM. 27	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE3	20,00	20,00	APROBADO	20-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
34	MES 7	SEM. 27	A34	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	21-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	****
35	MES 7	SEM. 27	A35	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	*** y ****
36	MES 7	SEM. 27	A36	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	09-jul-20	REV. 4	10-jul-20	MES 9	
37	MES 7	SEM. 27	A37	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	24-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	
38	MES 8	SEM. 29	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	
39	MES 8	SEM. 29	A39	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	29-jul-20	MES 10	
40	MES 8	SEM. 29	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	13-jul-20	MES 9	
41	MES 8	SEM. 29	A41	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 3	10-jul-20	MES 9	***
42	MES 8	SEM. 29	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	17-jul-20	REV. 3	17-jul-20	MES 9	******
43	MES 8	SEM. 29	A43	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	14-jul-20	REV. 2	15-jul-20	MES 9	*******
44	MES 8	SEM. 29	A44	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	21-jul-20	REV. 3	21-jul-20	MES 9	********
45	MES 8	SEM. 29	A45	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	05-ago-20	REV. 4	06-ago-20	MES 10	********
46	MES 8	SEM. 31	A46	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	23-jul-20	REV. 3	24-jul-20	MES 9	
47	MES 8	SEM. 32	A47	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	27-jul-20	MES 9	
48	MES 10	SEM. 37	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	01-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	a
49	MES 11	SEM. 43	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	02-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	
50	MES 11	SEM. 43	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	14-sep-20	REV. 3	14-oct-20	MES 11	
51	MES 11	SEM. 44	A51	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
52	MES 11	SEM. 45	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	20-oct-20	REV. 3	20-oct-20	MES 12	
53	MES 11	SEM. 45	A53	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-oct-20	REV. 2	14-oct-20	MES 11	
54	MES 11	SEM. 45	A54	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	APROBADO	20-nov-20	REV. 2	20-nov-20	MES 13	c
55	MES 12	SEM. 46	A55	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
56	MES 12	SEM. 46	A56	MV_08_261_1244_11_V2	19,80	19,80	APROBADO	19-nov-20	REV. 3	20-nov-20	MES 13	b
57	MES 12	SEM. 47	A57	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
58	MES 12	SEM. 47	A58	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
59	MES 12	SEM. 48	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	APROBADO	24-oct-20	REV. 3	24-nov-20	MES 13	
60	MES 12	SEM. 48	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	APROBADO	20-oct-20	REV. 2	23-nov-20	MES 13	
61	MES 12	SEM. 48	A61	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	INTERVENTORIA	20-oct-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
62	MES 12	SEM. 49	A62	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	INTERVENTORIA	23-oct-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
63	MES 12	SEM. 49	A63	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	INTERVENTORIA	26-oct-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
64	MES 12	SEM. 49	A64	EX_08_333_1867_12_V3	7,50	7,50	CONTRATISTA	27-oct-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
65	MES 12	SEM. 49	A65	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	CONTRATISTA	27-oct-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
66	MES 13	SEM. 52	A66	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	CONTRATISTA	11-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
67	MES 13	SEM. 53	A67	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	MOVILIDAD	19-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
68	MES 13	SEM. 53	A68	EM_08_124_V11	16,80	16,80	INTERVENTORIA	20-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
69	MES 14	SEM. 55	A69	EX_08_305_1867_12_V2	8,30	8,30	INTERVENTORIA	03-dic-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
70	MES 14	SEM. 55	A70	EX_08_315_1867_12_V1	4,00	4,00	INTERVENTORIA	04-dic-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
71	MES 14	SEM. 55	A71	EX_09_218_1556_10_V4	4,00	4,00	INTERVENTORIA	04-dic-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE INVENTARIO DE DISEÑOS. ZONA SW

* En la Revisión 1 se detecta que está incompleto el Registro Fotográfico-RF entregado en 3 CDs y el contratista entrega en Comité del 11/03/2020 3 CDs con este RF faltante; una vez aprobado y con VoBo de la SDM se le autorizó al contratista a presentar de manera parcial el Diseño

*** Cambia la meta de 8,5Ha a 5,15Ha por disminución de ZI
******* Cambia la meta de 3,20Ha a 3,25Ha por ampliación de ZI para empalmes
******** Cambia la meta de 6,60Ha a 7,00Ha por ajuste equivalencias

a Se ajustó la meta de 2,5Ha a 6,7Ha por ajuste de equivalencias
c Se ajustó la meta de 38,9Ha a 38,4Ha por ajuste de la meta al no incluir el tramo de la KR73

** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)
**** Falta VoBo de la SDM
***** La meta cambió de 5,08Ha a 5,3Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba - Correo SDM del 28/05/2020)

****** La meta cambió de 20,10Ha a 20,18 Ha por nueva medición de la ZI
******** La meta cambió de 30,13Ha a 28,45 Ha por ajuste de la ZI
b Se ajustó la meta de 17,9Ha a 19,8 Ha por ajuste de equivalencias

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 55 **CORTE** 08 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICAS **SEMANA** 55 **CORTE** 08 Dic./2020

INVENTARIOS ENTREGADOS / APROBADOS


	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	71	1016,66
INVENTARIOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	60	931,74
INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	11	84,92

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	3	30,72	30,72	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	7	43,40	43,40	0,00	0,00	931,74
EN PODER DE MOVILIDAD	1	10,80	10,80	0,00	0,00	
	11	**84,92**	**84,92**	**0,00**	**0,00**	

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha INVENTARIADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		INVENTARIADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	3,4	0,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	6,8	1,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	10,2	1,5%	12,50	12,50	1,8%	-	-	0,0%
4	18 NOV - 25 NOV	13,6	2,0%	19,28	31,78	4,6%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	16,72	2,4%	2,50	34,28	5,0%	-	-	0,0%
6	03 DIC - 09 DIC	19,84	2,9%	-	34,28	5,0%	2,50	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,96	3,3%	21,50	55,78	8,1%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	26,08	3,8%	40,25	96,03	13,9%	19,28	21,78	3,2%
9	24 DIC - 30 DIC	29,2	4,2%	-	96,03	13,9%	10,00	31,78	4,6%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,95	6,4%	-	96,03	13,9%	-	31,78	4,6%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	58,7	8,5%	26,50	122,53	17,7%	-	31,78	4,6%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	73,45	10,6%	31,80	154,33	22,3%	2,50	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	88,2	12,8%	-	154,33	22,3%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	112,06	16,2%	-	154,33	22,3%	40,25	96,03	13,9%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	135,92	19,7%	30,57	184,90	26,8%	26,50	122,53	17,7%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	159,78	23,1%	50,61	235,51	34,1%	-	122,53	17,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	183,64	26,6%	-	235,51	34,1%	2,50	125,03	18,1%
18	25 FEB/20 - 02 MAR/20	207,50	30,0%	86,10	321,61	46,5%	49,87	174,90	25,3%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	259,93	37,6%	2,50	324,11	46,9%	-	174,90	25,3%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	312,37	45,2%	16,80	340,91	49,3%	63,11	238,01	34,4%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	364,80	52,8%	12,10	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	397,35	57,5%	-	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	429,90	62,2%	46,00	399,01	57,7%	-	238,01	34,4%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	462,45	66,9%	-	399,01	57,7%	2,50	240,51	34,8%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	495,00	71,6%	11,01	410,02	59,3%	86,10	326,61	47,3%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	515,35	74,6%	15,30	425,32	61,6%	7,50	334,11	48,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	535,70	77,5%	63,52	488,84	70,7%	24,20	358,31	51,9%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	556,05	80,5%	-	488,84	70,7%	16,01	374,32	54,2%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	576,40	83,4%	109,38	598,22	86,6%	18,50	392,82	56,8%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	594,43	86,0%	-	598,22	86,6%	57,37	450,19	65,2%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	612,47	88,6%	60,40	658,62	95,3%	2,50	452,69	65,5%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	625,35	90,5%	32,63	691,25	100,0%	7,00	459,69	66,5%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	648,53	93,9%	-	691,25	100,0%	17,15	476,84	69,0%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	656,18	95,0%	-	691,25	100,04%	68,95	545,79	79,0%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	663,82	96,1%	-	691,25	100,04%	30,43	576,22	83,4%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	671,47	97,2%	-	691,25	100,04%	54,33	630,55	91,3%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	679,11	98,3%	6,70	697,95	101,01%	32,25	662,80	95,9%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	686,76	99,4%	-	697,95	101,01%	28,45	691,25	100,04%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	687,61	99,5%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	688,82	99,69%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	689,30	99,76%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	690,14	99,88%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	13,50	711,45	102,96%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	697,084	100,88%	72,78	784,23	113,49%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	703,176	101,76%	38,40	822,63	119,05%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	709,269	102,65%	59,40	882,03	127,65%	9,20	700,45	101,37%
47	07 OCT/20 - 13 OCT/20	715,361	103,53%	25,30	907,33	131,31%	-	700,45	101,37%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	734,161	106,25%	28,21	935,54	135,39%	30,60	731,05	105,80%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	752,961	108,97%	22,50	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	771,761	111,69%	-	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	790,561	114,41%	-	958,04	138,65%	118,08	849,13	122,89%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	809,361	117,13%	14,72	972,76	140,78%	-	849,13	122,89%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	835,361	120,89%	27,60	1.000,36	144,77%	82,61	931,74	134,84%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	861,361	124,66%	-	1.000,36	144,77%	-	931,74	134,84%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	887,361	128,42%	16,30	1.016,66	147,13%	-	931,74	134,84%

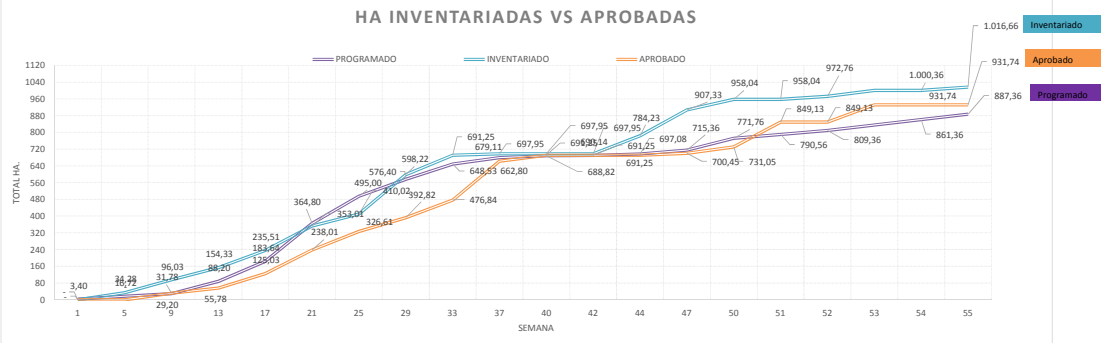

INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA **55** **CORTE** **08 Dic./2020**

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 3	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 4	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 5	A01	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	05-dic-19	REV. 2	05-dic-19	MES 2	
2	MES 2	SEM. 6	A02	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 1	15-ene-20	MES 3	
3	MES 2	SEM. 6	A03	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	24-dic-19	REV. 3	24-dic-19	MES 2	
4	MES 2	SEM. 8	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	20-ene-20	MES 3	
5	MES 2	SEM. 9	A05	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	27-dic-19	REV. 1	27-dic-19	MES 2	
6	MES 3	SEM. 13	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	23-ene-20	REV. 1	28-ene-20	MES 3	
7	MES 4	SEM. 14	A07	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	30-ene-20	REV. 1	10-feb-20	MES 4	
8	MES 4	SEM. 14	A08	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
9	MES 4	SEM. 14	A09	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
10	MES 4	SEM. 15	A10	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	11-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
11	MES 4	SEM. 16	A11	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	12-feb-20	REV. 1	17-feb-20	MES 4	
12	MES 4	SEM. 17	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	19-feb-20	REV. 1	28-feb-20	MES 4	
13	MES 4	SEM. 17	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	24-feb-20	REV. 1	09-mar-20	MES 5	
14	MES 4	SEM. 18	A14	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	25-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
15	MES 5	SEM. 19	A15	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	05-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
16	MES 5	SEM. 19	A16	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
17	MES 5	SEM. 20	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
18	MES 5	SEM. 20	A18	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	16-mar-20	REV. 4	08-may-20	MES 7	****
19	MES 7	SEM. 25	A19	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	12-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
20	MES 7	SEM. 26	A20	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	13-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
21	MES 7	SEM. 26	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	13-may-20	REV. 1	09-jun-20	MES 8	***
22	MES 7	SEM. 26	A22	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	19-may-20	REV. 4	18-jun-20	MES 8	
23	MES 7	SEM. 27	A23	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	19-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
24	MES 7	SEM. 27	A24	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	24-jun-20	REV. 4	25-jun-20	MES 8	*****
25	MES 8	SEM. 27	A24	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	03-jul-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	
26	MES 8	SEM. 29	A25	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	04-jun-20	REV. 2	07-jul-20	MES 9	
27	MES 8	SEM. 30	A26	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 2	08-jul-20	MES 9	
21	MES 8	SEM. 31	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2y3	40,00	40,00	APROBADO	25-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	****
28	MES 8	SEM. 31	A27	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
29	MES 8	SEM. 31	A28	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	19-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	****
30	MES 8	SEM. 31	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
31	MES 8	SEM. 31	A30	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-jun-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	****
32	MES 8	SEM. 31	A32	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	03-jul-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	******
33	MES 8	SEM. 32	A33	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	14-jul-20	MES 9	
34	MES 8	SEM. 32	A34	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	26-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	******
35	MES 9	SEM. 33	A35	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	10-jul-20	REV. 2	10-jul-20	MES 9	
36	MES 9	SEM. 34	A36	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	22-jul-20	REV. 3	22-jul-20	MES 9	
37	MES 9	SEM. 34	A37	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	10-ago-20	REV. 5	10-ago-20	MES 10	
38	MES 9	SEM. 34	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	13-ago-20	REV. 2	13-ago-20	MES 10	*******
39	MES 9	SEM. 34	A39	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	11-ago-20	REV. 4	16-ago-20	MES 10	*
40	MES 9	SEM. 35	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 4	17-ago-20	MES 10	
41	MES 9	SEM. 35	A41	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	05-ago-20	REV. 2	05-ago-20	MES 10	
42	MES 9	SEM. 36	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	18-ago-20	REV. 4	18-ago-20	MES 10	
43	MES 9	SEM. 36	A43	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	17-ago-20	MES 10	
44	MES 10	SEM. 37	A44	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	13-ago-20	MES 10	*******
45	MES 10	SEM. 37	A45	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	17-ago-20	REV. 3	18-ago-20	MES 10	
46	MES 10	SEM. 37	A46	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	14-ago-20	REV. 2	17-ago-20	MES 10	
47	MES 10	SEM. 38	A47	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 2	18-ago-20	MES 10	
48	MES 12	SEM. 48	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
49	MES 12	SEM. 48	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
50	MES 12	SEM. 48	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
51	MES 12	SEM. 48	A51	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 2	04-nov-20	MES 13	
52	MES 12	SEM. 49	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	05-nov-20	REV. 2	05-nov-20	MES 13	
53	MES 13	SEM. 51	A53	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	27-nov-20	REV. 4	27-nov-20	MES 13	
54	MES 13	SEM. 51	A54	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	27-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
55	MES 13	SEM. 51	A55	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	26-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
56	MES 13	SEM. 52	A56	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	08-dic-20	REV. 5	08-dic-20	MES 14	"
57	MES 13	SEM. 54	A57	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	INTERVENTORIA	25-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
58	MES 13	SEM. 54	A58	MV_08_261_1244_11_V2	20,80	20,80	INTERVENTORIA	25-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
59	MES 13	SEM. 54	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	INTERVENTORIA	26-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	
60	MES 13	SEM. 54	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	INTERVENTORIA	27-nov-20	REV. 1	08-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE DISEÑOS. ZONA SW

* El contratista no lo cobró en el segundo mes
** Aprobado por interventoría; falta VoBo de SDM.
*** Aprobación parcial de 113Ha; no se puede facturar
**** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)
Falta VoBo de la SDM
La meta cambió de 70,5Ha a 73,0Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba)
***** La meta cambió de la originalmente presentada y de 4,18Ha a 4,30Ha
****** La meta cambió de la originalmente presentada en Inventario y pasa de 15,20Ha a 14,90Ha
******* La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 32,20Ha a 32,25Ha
******** La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 11,75Ha a 12,00Ha
NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
META CONTRATO INICIAL: 690,991 Ha
META ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 AL CONTRATO INICIAL: 347,37 Ha
META FINAL CONTRATO: 1038,61 Ha

ESTADISTICAS SEMANA 55 CORTE 08 Dic./2020

DISEÑOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**60**	**932,74**
DISEÑOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**56**	849,13
DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	4	83,61

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	4	83,61	83,61	0,00	0,00	**849,13**
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	**83,61**	**83,61**	**0,00**	**0,00**	


INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 55 **CORTE** 08 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha DISEÑADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		DISEÑADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	2,55	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	5,1	0,7%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	7,65	1,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
4	19 NOV - 25 NOV	10,2	1,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	14,4	2,1%	2,50	2,50	0,4%	2,50	2,50	0,4%
6	03 DIC - 09 DIC	18,6	2,7%	7,50	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,8	3,3%	-	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	27	3,9%	19,28	29,28	4,2%	-	2,50	0,4%
9	24 DIC - 30 DIC	31,2	4,5%	5,00	34,28	5,0%	10,00	12,50	1,8%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,2	6,3%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	55,3	8,0%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	67,3	9,7%	-	34,28	5,0%	21,78	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	79,3	11,5%	21,50	55,78	8,1%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	99,5	14,4%	37,75	93,53	13,5%	-	55,78	8,1%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	119,7	17,3%	-	93,53	13,5%	29,45	85,23	12,3%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	139,9	20,2%	26,50	120,03	17,4%	2,50	87,73	12,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	160,1	23,2%	31,80	151,83	22,0%	5,80	93,53	13,5%
18	25 FEB/20 -02 MAR/20	180,3	26,1%	20,57	172,40	24,9%	29,00	122,53	17,7%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	216,2	31,3%	5,00	177,40	25,7%	29,30	151,83	22,0%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	252,2	36,5%	60,61	238,01	34,4%	20,57	172,40	24,9%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	288,1	41,7%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	315,2	45,6%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	342,4	49,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	369,5	53,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	396,6	57,4%	13,10	251,11	36,3%	65,61	238,01	34,4%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	422,5	61,1%	87,30	338,41	49,0%	-	238,01	34,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	448,5	64,9%	-	338,41	49,0%		238,01	34,4%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	474,4	68,7%	5,30	343,71	49,7%	18,10	256,11	37,1%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	500,3	72,4%	5,00	348,71	50,5%	73,00	329,11	47,6%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	523,3	75,7%	2,50	351,21	50,8%	-	329,11	47,6%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	546,2	79,0%	88,98	440,19	63,7%	5,00	334,11	48,4%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	562,6	81,4%	12,50	452,69	65,5%	44,30	378,41	54,8%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	592,1	85,7%	7,00	459,69	66,5%	61,78	440,19	63,7%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	606,4	87,8%	59,65	519,34	75,2%	19,50	459,69	66,5%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	620,7	89,8%	56,88	576,22	83,4%	18,50	478,19	69,2%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	635,0	91,9%	-	576,22	83,4%	-	478,19	69,2%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	649,3	94,0%	86,58	662,80	95,9%	-	478,19	69,2%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	663,6	96,0%	28,45	691,25	100,04%	5,15	483,34	69,9%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	669,0	96,8%	-	691,25	100,04%	207,91	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	676,9	97,96%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	680,02	98,41%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	685,5	99,21%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	694,741	100,54%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	698,491	101,09%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	702,241	101,63%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
47	06 OCT/20 - 13 OCT/20	705,991	102,17%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	720,991	104,34%	25,20	716,45	103,68%	-	691,25	100,04%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	735,991	106,51%	14,60	731,05	105,80%	9,20	700,45	101,37%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	750,991	108,68%	-	731,05	105,80%	-	700,45	101,37%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	765,991	110,85%	47,70	778,75	112,70%	30,60	731,05	105,80%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	780,991	113,02%	70,38	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	804,741	116,46%	-	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	828,491	119,90%	83,61	932,74	134,99%	64,90	795,95	115,19%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	852,241	123,34%	-	932,74	134,99%	53,18	849,13	122,89%

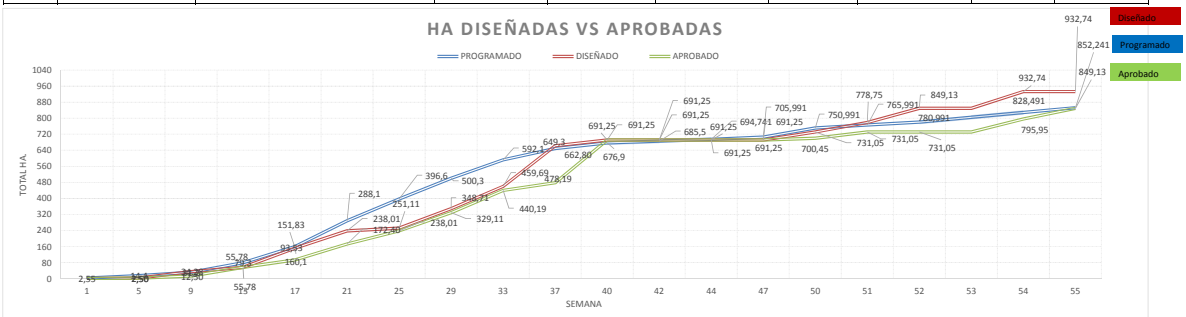

FACTURACION VALOR HA $ 610.876,00

FACTURACION	Ha DISEÑADAS	Ha APROB. EN FISICO	Ha APROB. DIG. INTERV.	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	VALOR MENSUAL		VALOR ACUMULADO	
					Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM
MES 1	2,50	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 2	10,00	12,50	-	-	$ 7.635.950,00	$ -	$ 7.635.950,00	$ -
MES 3	43,28	43,28	-	-	$ 26.438.713,00	$ -	$ 34.074.663,00	$ -
MES 4	116,62	66,75	-	-	$ 40.775.973,00	$ -	$ 74.850.636,00	$ -
MES 5	65,61	49,87	-	-	$ 30.464.386,12	$ -	$ 105.315.022,12	$ -
MES 6	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 7	100,40	65,61	-	-	$ 40.079.574,36	$ -	$ 145.394.596,48	$ -
MES 8	114,28	140,40	-	-	$ 85.766.990,40	$ -	$ 231.161.586,88	$ -
MES 9	123,53	99,78	-	-	$ 60.953.207,28	$ -	$ 292.114.794,16	$ -
MES 10	115,03	213,06	-	-	$ 130.153.240,56	$ -	$ -	$ -
MES 11	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 12	39,80	9,20	-	-	$ 5.620.059,20	$ -	$ -	$ -
MES 13	201,69	95,50	-	-	$ 58.338.658,00	$ -	$ -	$ -
MES 14	-	53,18	-	-	$ 32.486.385,68	$ -	$ -	$ -
SUB-TOTAL CONTRATO	**932,74**	**849,13**	**0,00**	**0,00**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 **DEL** 1/12/2020 **AL** 7/12/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1782-2019 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Revisión CLM-181114-000013 visita 50% , no se evidencia alguna observación



Descripción Foto 2.

Revisión CLM-181114-000013 visita 50% , no se evidencia alguna observación



Descripción Foto 3.

Revisión CLM 294379-18 visita 70%, No se evidencia observación



Descripción Foto 4.

Revisión CLM 294379-18 visita 70%, No se evidencia observación



Descripción Foto 5.

Revisión 70% en compromiso SDQS-2725482019, en donde se evidencia desgaste en marcas



Descripción Foto 6.

Revisión 70% en compromiso SDQS-2725482019, en donde se evidencia desgaste en marcas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SEC. SECRETARÍA DE MOVILIDAD
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 (consecutivo) **DEL** 1/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 7-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		-
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	-
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

FRENTES TERMINADOS PARA APLICACIÓN GARANTIAS

No	ID	CP	UPZ	LOCALIDAD	Tipo de implementación	SEÑALES VERTICALES			SEÑALES horizontales																										
						Dias de garantia	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	M2 (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	ML (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	bordillos trasversales (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Techos (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Tecnicos (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Hitos (Dias garantias)	Fecha implamentacion	Porcentaje a la fecha	Boyas(Dias garan	Fecha implamentacion	Porcentaje a la fecha	AGREBADO (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	RESALTOS (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	Estepariras (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha
1	EX_02_038_1556_10	ID 82	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%	426	27/11/2019	81,25%	633	27/11/2019	54,69%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
2	EX_02_201_1881_12	ID 162	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal				304	15/11/2019	117,70%	304	15/11/2019	117,70%				593	0/01/1900	60,36%				426	15/11/2019	84,07%	426	15/11/2019	84,1%								
3	EX_02_201_1881_12	ID 163	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	22/11/2019	115,40%	304	22/11/2019	115,40%				633	0/01/1900	55,48%				426	22/11/2019	82,43%	426	22/11/2019	82,4%								
4	EX_02_201_1881_12	ID16	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	24/11/2019	114,74%	304	24/11/2019	114,74%				633	0/01/1900	55,16%				426	24/11/2019	81,96%	426	24/11/2019	82,0%								
5	EX_02_201_1881_12	ID 15	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	19/11/2019	116,38%	304	19/11/2019	116,38%				633	0/01/1900	55,95%				426	19/11/2019	83,13%	426	19/11/2019	83,1%								
6	MV_09_048_1556_10	CARRA 13	90- Fontibón	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	19,07%																												
7	MV_09_024_1249_11	CARRA 13	16-puente aranda 112-granjaripjas techo 113-Bavaria 111- Puente aranda	75 - Fontibón16-Puente	Vertical	1825	25/11/2019	19,07%																												
8	MV_09_189_1556_10	CARRA 13	76- Fontibon san pablo	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	19,07%																												
9	EX_02_201_1881_12	ID 19	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	25/11/2019	114,41%	304	25/11/2019	114,41%				633	25/11/2019	55,01%				426	25/11/2019	81,72%	426	25/11/2019	81,7%								
10	EX_02_192_1881_12	ID 18	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
11	EX_02_201_1881_12	ID 97	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
12	EX_02_180_1881_12	ID 23	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	24/11/2019	114,74%	304	24/11/2019	114,74%				633	24/11/2019	55,16%				426	24/11/2019	81,96%	426	24/11/2019	82,0%								
13	EX_02_038_1556_10	ID 26	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	30/11/2019	18,79%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%	487	27/11/2019	71%						
14	EX_02_201_1881_12	ID 10	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
15	EX_02_192_1881_12	ID 186	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
16	EX_02_038_1556_10	ID 159	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	29/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	21/11/2019	82,7%								
17	MV_09_019_1249_11	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	27/11/2019	94,79%																						
18	EX_09_200_1881_12	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	15/11/2019	98,08%																						
19	EX_09_031_1556_10	ATAHUALPA	0	09_Fontibon	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	821	26/12/2019	38,60%	821	26/12/2019	38,60%				554	26/12/2019	57,26%																
20	MV_09_424_947_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	94,79%																						
21	EX_13_002_1556_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	88,49%																						
22	EX_02_185_1881_12	ID 182	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	213	12/12/2019	155,46%	213	12/12/2019	155,46%				514	12/12/2019	64,39%				335	12/12/2019	98,93%	335	12/12/2019	98,9%								
23	EX_02_038_1556_10	ID 110	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	365	12/12/2019	90,68%	365	12/12/2019	90,68%				949	12/12/2019	34,88%				548	12/12/2019	60,46%	548	12/12/2019	60,5%								
24	EX_02_038_1556_10	ID 167	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	213	12/12/2019	155,46%	213	12/12/2019	155,46%				514	12/12/2019	64,39%				335	12/12/2019	98,93%	335	12/12/2019	98,9%								
25	EX_02_038_1556_10	ID 30	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	213	12/12/2019	155,46%	213	12/12/2019	155,46%				475	12/12/2019	69,76%				304	12/12/2019	108,82%	304	12/12/2019	108,8%								
26	EX_02_201_1881_12	ID 160	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	274	12/12/2019	120,91%	274	12/12/2019	120,91%				593	12/12/2019	55,81%				304	12/12/2019	108,82%	304	12/12/2019	108,8%								
27	EX_02_185_1881_12	ID 29	Chico lago	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	243	16/12/2019	134,38%	243	16/12/2019	134,38%				475	16/12/2019	68,91%				365	16/12/2019	89,59%	365	16/12/2019	89,6%								
28	MV_13_168_1249_11	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	88,49%																						
29	EX_13_001_1556_10	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	88,49%																						
30		ATAHUALPA	Fontibon	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	821	26/12/2019	38,60%	821	26/12/2019	38,60%				554	26/12/2019	57,26%															335	16/12/2019	98%
31	EX_02_033_1556_001	ID13	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	365	3/01/2020	84,66%	365	3/01/2020	84,66%				870	3/01/2020	35,52%				517	3/01/2020	59,76%	517	3/01/2020	59,8%								
32	sc_02_166_v1	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	horizontal							365	3/01/2020	84,66%																						
33	EX_02_356_946_10	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	335	3/01/2020	92,35%	335	3/01/2020	92,35%				909	3/01/2020	33,98%				487	3/01/2020	63,49%	487	3/01/2020	63,5%								
34	EX_18_158_1244_11	0	Rafael uribe	0	horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	335	20/01/2020	87,27%	335	20/01/2020	87,27%																						
35	EX_09_214_1881_12_V2	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							350	8/01/2020	86,91%																						
36	CLM-181002-000006	0	0	Tunjuelito	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	578	20/01/2020	50,53%	548	20/01/2020	53,33%																						
37	CP_CLM-181114-000025	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	882	27/01/2020	32,31%	852	27/01/2020	33,46%																				633	27/01/2020	45%
38	CP_CLM-181114-000013	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	821	27/01/2020	34,70%	1095	27/01/2020	26,03%																				913	27/01/2020	31%
39	CP_SDM-236118-19	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	213	27/02/2020	119,30%	335	27/02/2020	75,92%																				274	27/02/2020	93%
40	MV_AV_CALI_941_09_ AMERICAS Y ESPERANZA	0	Kennedy	Castilla	horizontal				365	27/02/2020	69,59%	365	27/02/2020	69,59%																						
41	SDM-299509-18	0	Kennedy	Castilla	horizontal				578	27/02/2020	43,95%	578	27/02/2020	43,95%																						
42	Solicitud gerente localidad	0	tunjuelito	Tunjuelito	horizontal				730	21/01/2020	39,86%	669	21/01/2020	43,49%																				633	14/01/2020	47%
43	MV_08_001_1703_10	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	487	27/02/2020	52,19%	335	27/02/2020	75,92%				304	27/02/2020	83,51%	304	27/02/2020	83,51%	213	27/02/2020	119,30%								304	27/02/2020	84%
44	CP_SDM-DSC-136240-18	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	28/02/2020	13,86%																												
45	CP_SDM-76913-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	14,96%	669	27/02/2020	37,96%	608	27/02/2020	41,75%																				633	4/02/2020	44%	395	27/02/2020	64%

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 (Consecutivo) **DEL** 1/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 7-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 7.957.500.000
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 7.957.500.000
Plazo Inicial	15 MESES
Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15 MESES
Fecha de Iniciación	29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial	15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.061.619.391
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 2.061.619.391
Plazo Inicial	16MESES
Plazo Prorroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15MESES
Fecha de Iniciación	29/10/2019
Fecha de Terminación	16/03/2021

2. GARANTIAS

46	CP_SDM-29716-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	14,96%																			791	27/05/2020	21%				
47	CP_SQDS-1387272019	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	578	27/02/2020	43,95%	730	27/02/2020	38,49%													578	14/01/2020	52%				593	14/01/2020	50%
48	EX_08_338_1867_12_V4	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	548	27/02/2020	46,39%	548	27/02/2020	46,39%																			395	27/02/2020	64%
49	SDQS 18919622018	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	213	27/02/2020	119,30%	213	27/02/2020	119,30%																			395	31/01/2020	71%
50	CP_SDM-DSVCT-7089-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	183	27/02/2020	139,18%	183	27/02/2020	139,18%				243	27/02/2020	104,38%	183	27/02/2020	139,18%											
51	EM_08_124	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/05/2020	8,99%	578	27/05/2020	28,38%	456	27/05/2020	35,95%													213	4/05/2020	88%				426	4/05/2020	44%
52	EX_09_200_1881_12_V2	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	426	27/02/2020	59,65%	426	27/02/2020	59,65%				183	27/02/2020	139,18%	304	27/02/2020	83,51%	243	27/02/2020	104,38%				304	27/02/2020	84%				243	27/02/2020	104%
53	SSDQS-1383742018	0	Fontibon	0	horizontal																											304	27/02/2020	84%
54	EX_08_323_1867_12	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	365	27/02/2020	69,59%	426	27/02/2020	59,65%																			277	27/02/2020	92%
55	EX_08_042_1556_10	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	28/03/2020	12,27%	669	28/03/2020	33,47%																							
56	EX_08_327_1867_10	ZONA ESCOLAR	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	7/03/2020	13,42%	213	28/03/2020	105,21%	213	28/03/2020	105,21%																			277	28/03/2020	81%
57	EX_08_329_1867_12	ZONA ESCOLAR	patio bonito	Kennedy	Vertical horizontal	1825	28/04/2020	10,58%	426	28/04/2020	45,32%	426	28/04/2020	45,32%																					
58	SDM_DSC_83051_18	0	Carvajal	Kennedy	horizontal	1825	23/03/2020	12,55%																			514	23/03/2020	45%						
59	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y AMERICAS)	0	Kennedy	0	horizontal							365	24/04/2020	53,97%																				
60	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y CALLE 59S)	0	Kennedy	0	horizontal							365	26/04/2020	53,42%																				
61	SDM-294379-18	0	Kennedy	0	horizontal				183	29/04/2020	105,21%																							
62	SDM_316509_18	0	Kennedy	0	horizontal																						487	27/04/2020	40%						
63	SDQS_2725482019	0	Fontibon	San pablo	horizontal				213	28/05/2020	76,56%																							
64	SDM-261374-2019	0	Capellania	Fontibon	horizontal				517	28/05/2020	31,52%	517	28/05/2020	31,52%																				
65	SDM-SCTT-225169-2019	Zona Escolar	0	kennedy	horizontal				517	27/05/2020	31,72%	517	27/05/2020	31,72%																				
66	SDM-318531-2019	Zona escolar	0	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	8,99%	517	27/05/2020	31,72%	517	27/05/2020	31,72%																				
67	ZE_06_269_1561_10	Zona escolar	0	Tunjuelito	horizontal	1825	27/04/2020	10,63%	669	27/03/2020	33,62%	548	27/03/2020	41,10%				544	27/03/2020	41,33%	335	27/03/2020	67,25%				487	27/03/2020	46%				395	27/03/2020	57%
68	ZE_06_168_151_10	Zona escolar	modelia	fontibon	horizontal				639	27/04/2020	30,37%																487	27/04/2020	40%						
69	SDQS_272490-2019	Zona escolar	FONTIBON	fontibon	horizontal				213	28/05/2020	76,56%	213	28/05/2020	76,56%																			395	28/05/2020	41%
70	MV_AV_BOYACA_941_09_V27	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal				365	23/05/2020	46,03%	365	23/05/2020	46,03%				544	23/05/2020	30,86%														
71	SDM-15023-2020	N/A	castilla	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	8,99%	669	27/05/2020	24,51%	669	27/05/2020	25,11%																			426	27/05/2020	39%
72	CLM-180320-000001	N/A	0	0	horizontal				760	27/05/2020	21,57%	700	27/05/2020	23,44%																			395	27/05/2020	41%
73	SDM-265092	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	23/05/2020	78,90%	213	23/05/2020	78,90%													426	27/04/2020	46%				487	27/05/2020	34%
74	SDM-242548	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	27/05/2020	77,03%	213	27/05/2020	77,03%																			395	27/05/2020	41%
75	SDM-316519-2018	N/A	Americas	Kennedy	horizontal	1825	27/06/2020	7,29%	213	27/06/2020	62,47%	213	27/06/2020	62,47%																			517	27/06/2020	26%
76	SDM-554-20	N/A	margaritas	kennedy	horizontal				700	23/05/2020	24,01%	700	23/05/2020	24,01%																			487	27/05/2020	34%
77	SDM_SGV_281345_19	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal										304	28/05/2020	53,59%	304	28/05/2020	53,59%															
78	SDQS_176846-2019	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal																											456	27/05/2020	36%
79	CLM_181123-00032	N/A	venecia	Tunjuilito	horizontal	1825	28/06/2020	7,23%	548	28/06/2020	24,11%	548	28/06/2020	24,11%													304	26/06/2020	44%				517	26/06/2020	26%
80	SDQS_2672752019	N/A	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																						304	3/06/2020	52%				517	28/06/2020	26%
81	SDQS_237461	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	8,99%																			304	27/05/2020	54%						
82	SDQS_237461	N/A	CAPELLANIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	8,99%																			213	27/05/2020	77%						
83	EX_06_93_1244_11	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	7,34%	578	26/06/2020	23,19%	456	26/06/2020	29,37%													304	26/06/2020	44%				274	26/06/2020	49%
84	CLM_180405-000032	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	7,23%	395	28/06/2020	33,38%	517	28/06/2020	25,53%													365	26/06/2020	37%				274	28/06/2020	48%
85	SDM_229731_18	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	7,23%	487	26/06/2020	27,53%	335	26/06/2020	40,05%																			435	26/06/2020	31%
86	SDM_229731	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	7,34%																			213	26/06/2020	63%						
87	SDM_DCV_293492_18	N/A	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal																						213	10/07/2020	56%						

Consorcio InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 (Consecutivo) **DEL** 1/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 7-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra en sus letras)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre y razon social del contratista)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	-
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

88	CLM_181008_000042	N/A	FONTIBON	FONTIBON	horizontal	1825	10/07/2020	6,58%																						475	10/07/2020	25%			
89	SDQS_280824-2018	N/A	LA CABAÑA	FONTIBON	horizontal																	243	10/07/2020	49,32%											
90	EX_09_001_1214_15_V4	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	6,19%	213	27/07/2020	48,38%	213	27/07/2020	48,38%	304	27/07/2020	33,86%				335	17/07/2020	33,77%										183	27/07/2020	56%
91	EX_09_203_1881_12_V44	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	6,19%	487	17/07/2020	23,22%	335	17/07/2020	33,77%																		435	17/07/2020	26%
92	EX_08_338_1867_12	N/A	Americas	KENNEDY	horizontal	1825	28/02/2020	13,86%	548	27/02/2020	46,39%	548	27/02/2020	46,39%																					
93	EX_09_201_1881_12	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal	1825	28/04/2020	10,58%	578	28/03/2020	38,76%	821	28/03/2020	27,28%																		487	28/05/2020	33%
94	clm_180517-000083	N/A	N/A	tunjuelito	horizontal																								365	28/06/2020	36%			
95	SDQS_1772412019	SDQS_1772412019	ciudad salitre	fontibon	horizontal										304	27/07/2020	33,86%																	
96	MV_08_001_1214	2808242018	la cabaña	fontibon	horizontal																	243	27/07/2020	42,33%										
97	EX_09_185_1249	181008_000042	FONTIBON	fontibon	horizontal																									365	27/07/2020	28%			
98	SDM_394713_18	SDM_394713_18	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																											730	28/07/2020	14%
99	ze_06_163_1561_10	CP_SDM-OGS-227601-19	CASTILLA	KENNEDY	horizontal				548	6/08/2020	16,99%	548	6/08/2020	16,99%																		395	6/08/2020	24%
100	CLM-181116-000006	CLM-181116-000006	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal	1825	27/07/2020	5,64%	183	27/07/2020	56,44%																					183	6/08/2020	51%
101	CLM_180823_000003	CLM_180823_000003	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal				548	27/08/2020	13,15%							274	27/08/2020	26,30%		243	27/08/2020	29,59%								213	27/08/2020	34%			
102	EM-08_073	SDM_316511_18	AMERICAS	KENNEDY	horizontal				669	27/07/2020	15,39%	669	27/07/2020	15,39%				395	27/07/2020	26,05%	243	27/07/2020	42,33%	304	27/07/2020	33,86%						213	27/07/2020	48%	395	6/08/2020	24%
103	EX_10_008_1560_10	N/A	AMERICAS	ENGATIVA	horizontal	1825	6/09/2020	3,40%	548	6/09/2020	11,32%	365	6/09/2020	16,99%				243	6/09/2020	25,48%	243	6/09/2020	25,48%	243	27/07/2020	42,33%				304	6/09/2020	20%			
104	CLM_180823_000004	N/A	castilla	kennedy	horizontal				487	28/07/2020	20,96%	335	28/07/2020	30,49%				335	28/07/2020	30,49%																
105	EX_09_200_1881_12	SDQS_2108342019	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				517	28/08/2020	13,73%	517	28/08/2020	13,73%																		395	28/08/2020	18%
106	EX_09_048_1556-10	0	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				183	28/08/2020	38,90%	183	28/08/2020	38,90%				183	28/08/2020	38,90%				183	28/08/2020	38,90%										
107	mv_08_435_676_09	SDM_275666-18	TIMIZA	KENNEDY	horizontal													243	28/09/2020	16,44%				243	28/08/2020	29,18%				304	28/09/2020	13%			
108	EX_10_006_1560_10	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	2,19%	335	28/09/2020	11,96%	335	28/09/2020	11,96%				243	28/09/2020	16,44%	213	28/09/2020	18,79%	213	28/09/2020	18,79%							243	28/09/2020	16%
109	EX_10_372_1842_12	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	2,19%	335	28/09/2020	11,96%	335	28/09/2020	11,96%				243	28/09/2020	16,44%	213	28/09/2020	18,79%	213	28/09/2020	18,79%				304	28/09/2020	13%	243	28/09/2020	16%
110	EX_10_008_1560_10	0	FERIAS	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	2,19%	365	28/09/2020	10,96%	365	28/09/2020	10,96%																		395	28/09/2020	10%
111	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78B	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	1,21%	365	16/10/2020	6,03%	274	16/10/2020	8,04%				243	28/10/2020	4,11%	213	16/10/2020	10,33%	213	16/10/2020	10,33%									
112	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 75	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	1,21%	365	28/10/2020	2,74%	274	28/10/2020	3,65%				243	28/10/2020	4,11%	213	16/10/2020	10,33%	213	28/10/2020	4,70%									
113	EX_13_003_1556_10	0	CUIDAD SALITRE	TEUSAQUILLO	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	487	28/10/2020	2,05%	335	28/10/2020	2,99%				243	28/10/2020	4,11%	243	16/10/2020	9,04%	243	28/10/2020	4,11%				243	28/10/2020	4%	243	28/10/2020	4%
114	MV_09_048_1556_10	0	fontibon	fontibon	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	183	28/10/2020	5,48%	183	28/10/2020	5,48%																					
115	MV_12_281	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	335	28/10/2020	2,99%	335	28/10/2020	2,99%				243	28/10/2020	4,11%															
116	TPD_PL_2342	0	0	SANTAFE	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	426	28/10/2020	2,35%	426	28/10/2020	2,35%				243	28/10/2020	4,11%	243	28/10/2020	4,11%	243	28/10/2020	4,11%				304	28/10/2020	3%			
117	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78k	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	1,21%	365	5/11/2020	0,55%	274	5/11/2020	0,73%				243	28/10/2020	4,11%	213	16/10/2020	10,33%	213	5/11/2020	0,94%									

3. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
Se relacionan actividades que a la fecha hantterminado sus labores .
Se registran tambien actividades que estan en ejecución.


4. ANEXOS

	SI	NO
1. Registro Fotográfico	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los _____ (Día en letras) 7 (Día en número) días del mes de diciembre (Mes en letras)

(Nombre) Firma de Ing. RESIDENTE

(Nombre) Firma de Profesional de Apoyo
Profesional LEIDY LORENA PARDO



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 16 de 2020.	HORA: 8:20 a.m. a 9:00 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos.
2. Informe de Consultoría.
3. Informe de Georreferenciación.
4. Informe de Garantías.
5. Informe de Obra y varios.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS

1. Definición de mesa de trabajo para definir e intervenir el costado sur de la calle 13 y adicionales, la reunión se llevó a cabo el día de ayer, ya se definieron las señales verticales y lo que se debe adicionar al corredor, en las horas de la mañana el Ing. Sergio Rairan les envió el correo, se autorizó adaptación costado sur de la calle 13 en pintura acrílica, se realizará una inspección, pero hay una intervención del IDU, por lo cual se solicita fecha de intervención.

2. Definición intervención del cruce de la AC 80 por carrera 96, el Ing. Sergio Valderrama manifiesta que estuvo por el sitio, necesitan autorización para poder intervenir, interviene el Ing. Luis Eduardo y comenta que ayer quedo definido la intersección de la calle 41 sur con carrera 78 la cual tenía pendiente la socialización, movilidad les colaboró para poder entrar a obra, están atentos de recibir las asignaciones pendientes lo que suma $244.000.000 que suma el saldo, según intención en el día de ayer es que les asignarán $200.000.000 y el restante para el próximo año.

INFORME CONSULTORIA

En el tema de inventarios semana 56 corte 15 de diciembre, hectáreas entregadas por el contratista 74 IDS, 1041 hectáreas, inventarios aprobados 940 correspondientes a 61 IDS y en proceso de revisión hay 13 inventarios que son 101 hectáreas, respecto a la meta acorde a la programación deberían estar en 913 hectáreas, y se han aprobado 940 hectáreas, se han presentado 1041, están por encima en un 4%, frente al tema del control de diseños, total de hectáreas entregadas 61, que corresponden a 941 hectáreas, diseños aprobados 56 que son 849 hectáreas, diseños en proceso de revisión 92 que están en poder de interventoría, frente a la meta deberían ser 876 aprobadas y entregadas 941 hectáreas, frente de la meta semanal están en inventarios aprobados están 27

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 16 de 2020.	HORA: 8:20 a.m. a 9:00 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

por encima aprobados que corresponden al 3,87% , en diseño están 3,89% por debajo.

Interviene el Ing. Luis Eduardo y comenta que solicitan el apoyo ya que están a dos meses de finalización del contrato, y en la parte de diseño les falta una cantidad importante por lo cual solicita cerrar inventarios este mes, el Ing. Jorge Enrique manifiesta estar de acuerdo, interviene el Ing. Jeison y pregunta si los diseños que tiene la interventoría cuando los estarían entregando a SDM, el Ing. Jorge Enrique responde que el de 38,4 a más tardar mañana en horas a.m. y los otros antes del comité de la próxima semana, el Ing. Jeison pregunta si los 5 diseños son de primera revisión, el Ing. Jorge Enrique responde que sí, el Ing. Jeison solicita incluir los 5 faltantes en este corte, el Ing. Sergio Valderrama comenta que habían acordado dejar al día el tema de inventarios lo cual es otra meta, adicionalmente dice que el Ing. Jorge Enrique ha estado disponible y apoyando la revisión, adicional a esto se debe tener en cuenta la calidad del inventario, las observaciones hacen más dispendiosas las aprobaciones.

INFORME GEOREFERENCIACION

Interviene la Ing. Anny, para la semana 56 con corte al 15 de diciembre, en obra de la cuenta 6 a la cuenta 13 hay un total de 138 IDS, de los cuales han recibido 128, 4 en revisión de interventoría, 22 en revisión del contratista, de los 138, hay aprobados 108, y en revisión por SDM 4, en diseño a corte de la semana 56 son 54 diseños de los cuales han llegado 54, suman 725,95 hectáreas aprobadas 503,5 hectáreas, revisión de SDM 147,42 hectáreas, en revisión de interventoría 69,8 hectáreas, el Ing. Jorge Enrique comenta que la Ing. Anny le hizo ayer una consulta a la Ing. Adriana sobre georreferenciación del EX08311186712, la Ing. Anny comenta que el diseño dentro del nombre del archivo está en versión 1, preguntó sobre la versión que debe presentar el contratista a lo que la Ing. Adriana solicitó cambiar a versión 2, el contratista en este momento entregó la versión 1, interviene el Ing. Luis Fernando y comenta que esto no cambia en nada, la Ing. Anny comenta que sólo es el nombre, el Ing. Jorge Enrique comenta que es de cambiar los nombres de los archivos y volver a firmar, el Ing. Sergio Valderrama pregunta sobre el tema de georreferenciación con el IDU, la Ing. Anny responde que ya realizaron con el Ing. Jeison y con el Arq. Elvis, ya suministraron los diseños a la Ing. Adriana, ya se realizó la solicitud está a la espera de la entrega o repuesta del correo, interviene el Ing. Sergio Valderrama y comenta que van a radicar un oficio con un llamado de atención por incumplimiento en las entregas de los compromisos que se han hecho en las mesas de trabajo semanales, el contratista no está cumpliendo con las fechas de entrega y es complicado para la liquidación, el Ing. Luis Eduardo dice que en los últimos meses ha estado muy pendiente del tema, en el último mes y medio las únicas fechas que se han corrido son esta y el 4 que tenían que entregar se le dificultó el desarrollo, trataron de cumplir pero se les presento un tema interno, y comenta que van avanzados, la Ing. Anny comenta que los compromisos se acumularon con la cuenta 13, la cual al día de ayer debió haberse entregado un parcial, a la fecha no han recibido ningún ID de los 8 que corresponden a la cuenta 13, el Ing. Luis Eduardo responde que esa fue la decisión para sacar lo anterior y atender la cuenta 13 el compromiso para este año es dejar todo al día y la georreferenciación va adelantada, la Ing. Anny manifiesta que 15 días después del compromiso se debe hacer cumplimiento del mismo.

INFORME GARANTIAS

Interviene el Ing. Sergio Valderrama, al corte de la semana 56, la interventoría ha revisado 101 IDS, 73 sin observaciones, 61 con observaciones, atendidas y revisada en campo garantías atendidas a la fecha 68, atendidas

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 16 de 2020.	HORA: 8:20 a.m. a 9:00 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

por el contratista y aceptadas 32, atenciones rechazadas por la interventoría 12, pendientes por atender 40, el Ing. Sergio Valderrama solicita poner atención al tema de las garantías ya que deben quedar cerradas a la finalización del contrato y para la liquidación del mismo, presenta un atraso del 40%, el Ing. Luis Eduardo manifiesta que revisará el tema.

INFORME DE OBRA

Interviene el Ing. Sergio Valderrama, reporte semana 56 con corte al 14 de diciembre del 2020, el contratista tiene en diseños asignados 18, inspeccionados 18, en implementación 2, implementados totalmente 16, suministros asignados 6, atendidos 6, medidas de gestión 0, compromisos prioritarios asignados 186, inspeccionados 185, atendidos 186, por implementar 6, emergencias patinetas asignadas 24, atendidas 24, otras emergencias 26 asignadas, inspeccionadas 26, en implementación 3, implementadas totalmente 23, en la semana se ejecutó obra por valor de $164.623.547, equivalente al 2,25% tiene un valor por ejecutar de obra de $799.274.808 equivalente al 10,91%, se presentó una jornada de lluvia en horario nocturno, hay un error en el informe de actividades porque sale todo en 0, se programaron todos los 7 días actividades en horario nocturno, en observaciones el ID de la calle 13 entre carreras 100 y 135 se instalaron 430 láminas con reflectivo en los new jersey los días 10 y 11 se observaron pandillas de mantenimiento en la calzada sur, en el ID de la carrera 75 hasta la carrera 6 un avance del 89%, la comunidad informa que el acueducto va a intervenir se realizan inspecciones, al colegio Venecia, Nuevo Muzú y la intersección de la Av. Boyacá con calle 71 sur, están realizando un informe porque el pavimento no está en buenas condiciones el contratista afirma que responde a garantías menores a 6 meses, días transcurridos del contrato 402, días para terminar el contrato 63, valor a ejecutar diario $12.686.899 en la gráfica de avance el contratista debería estar en un avance del 127,98 % acorde al cronograma, tiene un avance real del 133,61%, está por encima de la curva de programación en un 4,40%.

VARIOS

El Ing. Jorge Enrique comenta que está pendiente un PMT por emergencia desea saber sobre el mismo, comenta el Ing. Luis Eduardo que es el de la avenida Boyacá con calle 71 sur, el Ing. Nicolai comenta que los PMT los ha tramitado todos. interviene el Ing. Julián comenta que el Ing. Nicolai Envió el correo con la aprobación de la avenida Boyacá.

Se entregaron los pasacalles en el nuevo corredor de la calle 13 se deben reunir para lo que se debe intervenir mañana en la tarde, y pregunta el Ing. Sergio Valderrama ¿si se puede agilizar para hoy?

El Ing. Luis Eduardo pregunta cuando harán las asignaciones, el Ing. Mario Comenta que ayer se revisó un diseño con el Ing. Jeison, y lo pasarán al Ing. Nicolai, el presupuesto está alrededor de 348.000.000, por el estado del pavimento puede bajar a los $200.000 comenta el Ing. Jeison, adicionalmente el Ing. Luis Eduardo comenta que las señales de Choachí se coordinaron internamente, manifiesta preocupación por la Cl 40 sur con 93, ya que hay re parcheo en la zona y el curado es de un mes, estarían apenas de tiempo de hacer la ejecución, solicita al Ing. Mario y Arq. Juan Camilo revisar el tema, a lo que ellos manifiestan estar de acuerdo.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.**	
FECHA: diciembre 16 de 2020.	**HORA: 8:20 a.m. a 9:00 a.m.**	**LUGAR: Sesión virtual**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Revisión aprobación PMT Av. Boyacá por Cl 71 sur y envió al Contratista.	Interventoría	16-12-2020
2. Entrega al Ingeniero Nicolai Wilches Id EX_06_104_1867_V2, para asignación al componente de obra	SDM	16-12-2020
3. Consulta a IDU de intervención Cl 40 Sur por Kr 93, para definir intervención por curado del pavimento	SDM	18-12-2020

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 3 - SUR OCCIDENTE

PERIODO: DESDE 08/12/2020 A 14/12/2020 SEMANA: **56**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**	CONTRATO No.	**2019 - 1782**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 4.882.890.333,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 2.440.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 7.323.190.333,00

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS		TOTAL
					PATINETAS	OTROS	
ID ASIGNADOS	18	6	0	186	24	26	260
ID INSPECCIONADOS	18	0	0	185	24	26	253
ID POR INSPECCIONAR	0	0	0	0	0	0	0
ID EN IMPLEMENTACIÓN	2	0	0	0	0	3	5
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	16	6	0	180	24	23	249
ID POR IMPLEMENTAR	0	0	0	6	0	0	6

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR POR SEPARADO		VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$28.987.700	$203.847.546	PATINETAS	$53.855.878	$301.601.550
			OBRA	$247.745.672	
MES 2	$15.694.587	$302.450.440	PATINETAS	$23.142.234	$435.540.543
			OBRA	$412.398.308	
MES 3	$50.906.552	$160.036.785	PATINETAS	$15.513.088	$289.222.050
			OBRA	$273.708.962	
MES 4	$26.177.750	$555.494.979	$581.672.728		
MES 5	$25.601.175	$521.865.954	$547.467.129		
MES 6	$50.453.865	$290.269.932	$444.376.468		
MES 7	$65.242.246	$615.557.486	$746.922.987		
MES 8	$69.446.196	$377.906.324	$447.352.519		
MES 9	$85.041.157	$576.008.263	$661.049.420		
MES 10	$25.874.362	$400.936.858	$427.684.940		
MES 11	$47.730.633	$313.109.721	$433.860.679		
MES 12	$66.066.057	$605.688.352	$671.754.409		
MES 13	$23.003.273	$249.345.363	$272.392.698		
MES 14	$74.926.139	$188.091.468	$263.017.606		
MES 15	$0	$0	$0		
MES 16	$0	$0	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**56**	**$6.523.915.725**		

Valor programado	MES 1	$244.144.517	3,24%
Valor ejecutado		$301.601.550	4,12%
Valor programado Acumulado	MES 2	$634.775.743	8,42%
Valor ejecutado		$737.142.092	10,07%
Valor programado Acumulado	MES 3	$1.123.064.777	14,90%
Valor ejecutado		$1.026.364.142	14,02%
Valor programado Acumulado	MES 4	$1.660.182.713	22,03%
Valor ejecutado Acumulado		$1.608.036.871	21,96%
Valor programado Acumulado	MES 5	$2.141.736.725	28,42%
Valor ejecutado		$2.155.504.000	29,43%
SUSPENSION			
Valor programado Acumulado	MES 6	$2.418.958.886	32,10%
Valor ejecutado		$2.599.880.467	35,50%
Valor programado Acumulado	MES 7	$2.956.076.823	39,23%
Valor ejecutado		$3.346.803.454	45,70%
Valor programado Acumulado	MES 8	$3.493.194.759	46,36%
Valor ejecutado		$3.794.155.973	51,81%
Valor programado Acumulado	MES 9	$4.030.312.696	53,49%
Valor ejecutado		$4.455.205.394	60,84%
Valor programado Acumulado	MES 10	$4.567.430.633	60,61%
Valor ejecutado		$4.882.890.334	66,68%
Valor programado Acumulado	MES 11	$4.882.890.333	64,80%
Valor ejecutado		$5.316.751.012	72,60%
Valor programado Acumulado	MES 12	$5.413.390.333	71,84%
Valor ejecutado		$5.988.505.421	81,77%
Valor programado Acumulado	MES 13	$5.943.890.333	78,88%
Valor ejecutado		$6.260.898.119	85,49%
Valor programado Acumulado	MES 14	$6.474.390.333	85,92%
Valor ejecutado		$6.523.915.725	89,09%
Valor programado Acumulado	MES 15	$7.004.890.333	92,96%
Valor ejecutado		$6.523.915.725	89,09%
Valor programado Acumulado	MES 16	$7.535.390.333	100,00%
Valor ejecutado		$6.523.915.725	89,09%
Valor ejecutado semana	56	**$164.623.547**	2,25%
Valor Total Contrato de Obra		$7.323.190.333	100,00%
Valor por ejecutar		$799.274.608	10,91%

OBSERVACIONES


JORNADAS DE LLUVIA:	1	DIURNA	0	NOCTURNA	1		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:	0	DIURNA	0	NOCTURNA	0		

OBSERVACIONES:

En el Id MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10 Calle 13 Entre KR 100 hasta KR 135, se instalación 430 láminas con reflectivo en los New jersey.
Los días 10 y 11 se han observado cuadrillas de mantenimiento de asfaltos en la calle 13 calzada sur
El ID ZE_08_461_943_10_V2 el de la KR 75 y KR 73 desde la CL 5ª hasta la CL 6 esta en un avance del 89%. La comunidad informa que el acueducto va intervenir
Se realizan inspecciones a los IDs del IED colegio venecia nuevo muzu y a la intersección de la Av boyacá con calle 71 bis sur, el contratista informa que lo hace sin garantia.

Dias transcurridos del contrato	412	Dias para terminar el contrato	63	Valor a ejecutar diario	$12.686.899

AVANCE INVERSION CONTRATO 2019-1782
ZONA SUR-OCCIDENTAL

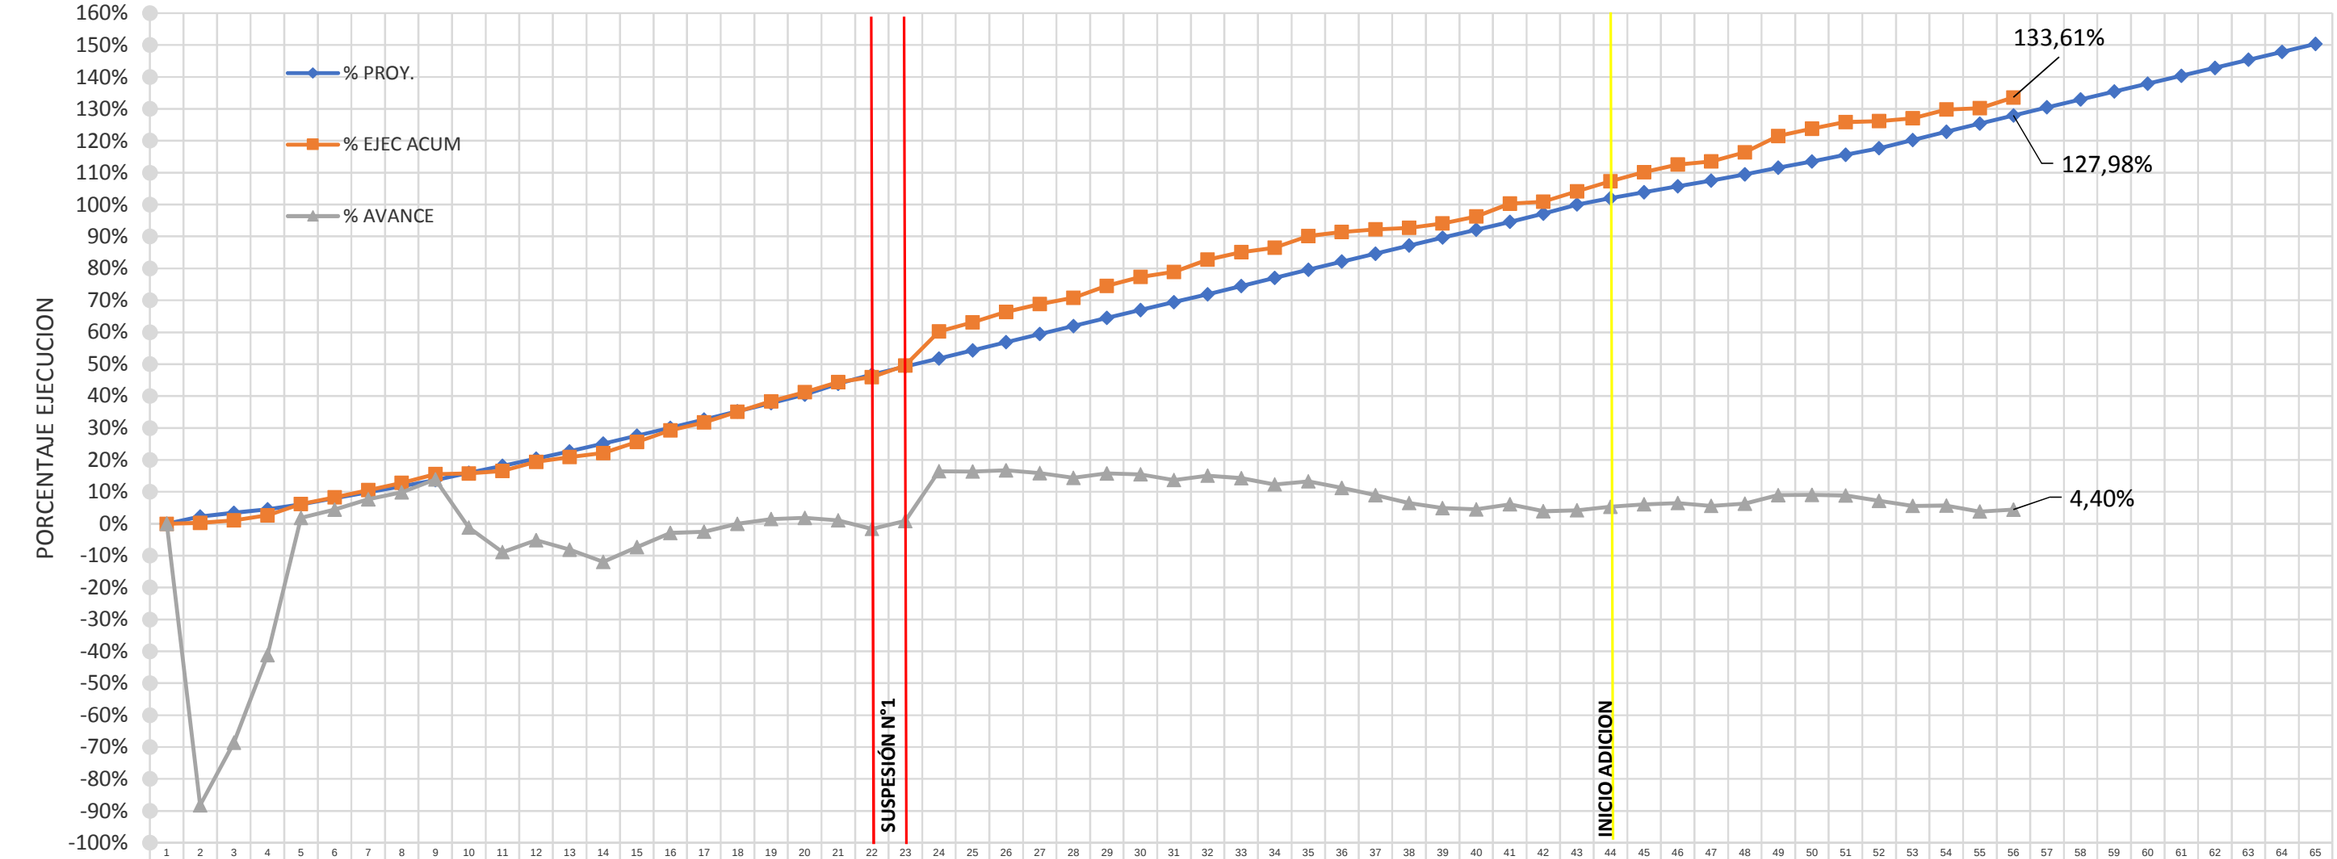

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
% PROY.	0,00%	2,26%	3,39%	4,52%	6,07%	7,93%	9,80%	11,67	13,65	15,90	18,16	20,42	22,68	25,13	27,61	30,10	32,58	35,14	37,79	40,45	43,86	46,70	49,18	51,74	54,31	56,87	59,44	61,96	64,44	66,93	69,41	71,91	74,47	77,04	79,61	82,17	84,67	87,15	89,64	92,12	94,62	97,13	100,0	101,9	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	115,6	117,7	120,2	122,8	125,4	127,9	130,4	132,9	135,4	137,9	140,4	142,8	145,3	147,8	150,3
% EJEC ACUM	0,00%	0,27%	1,06%	2,66%	6,18%	8,28%	10,55	12,82	15,54	15,71	16,54	19,35	20,83	22,12	25,59	29,22	31,77	35,12	38,34	41,20	44,33	45,93	49,62	60,26	63,15	66,38	68,86	70,84	74,60	77,29	78,93	82,73	85,12	86,53	90,16	91,40	92,24	92,76	94,05	96,23	100,3	100,8	104,1	107,3	110,1	112,5	113,5	116,3	121,5	123,8	125,8	126,1	127,0	129,7	130,2	133,6								
% AVANCE	0,00%	-88,2	-68,6	-41,1	1,81%	4,43%	7,67%	9,87%	13,88	-1,21	-8,95	-5,22	-8,13	-11,9	-7,33	-2,91	-2,48	-0,06	1,44%	1,86%	1,07%	-1,66	0,89%	16,46	16,29	16,71	15,85	14,33	15,75	15,49	13,72	15,06	14,30	12,32	13,25	11,23	8,94%	6,43%	4,93%	4,47%	6,04%	3,88%	4,19%	5,27%	6,11%	6,46%	5,54%	6,25%	8,93%	9,02%	8,84%	7,16%	5,63%	5,65%	3,85%	4,40%								

SEMANA 56

Consorcio InterSEÑALIZACION

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CUADRO CONTROL SEMANAL

GEORREFERENCIACION INTERVENTORIA CTO 1802 - 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

GEORREFERENCIACION OBRA • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 56 / CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	REGISTRO VERTICAL	REGISTRO HORIZONTAL	OBSERVACIONES
1	10	10	0	10	0	10	10	0	0	117	542	APROBADA
2	20	20	0	20	0	20	20	0	0	48	1168	APROBADA
3	31	31	0	31	0	31	31	0	0	307	536	APROBADA
4	21	21	0	21	0	21	21	0	0	124	753	APROBADA
5	9	9	0	9	0	9	9	0	0	107	873	APROBADA
6	5	5	0	4	1	4	4	0	0	204	519	-
7	41	41	0	40	1	40	40	0	0	297	801	-
8	23	23	1	22	0	22	22	0	0	114	937	-
9	20	20	1	19	0	19	19	0	0	430	517	-
10	27	27	0	25	2	25	23	2	0	297	801	-
11	4	4	0	0	3	0	0	1	0	25	450	-
12	10	8	2	0	7	0	0	1	0	57	350	-
13	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	229	219	4	201	22	201	**199**	4	0	2127	8247	-

GEORREFERENCIACION DISEÑO • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 56 / CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	HA (hectáreas) RECIBIDAS	HA (hectáreas) APROBADAS INTERVENTORIA	HA (hectáreas) APROBADAS SDM	HA (hectáreas) REVISION SDM	HA (hectáreas) REVISION CONTRATISTA	HA (hectáreas) REVISION INTERVENTORIA
MES 3	5	5	0	5	5	5	5	0	0	55,78	55,78	55,78	0	0	0
MES 4	6	6	0	6	0	6	5	1	0	66,75	66,75	42,75	24	0	0
MES 5	2	2	0	1	0	1	1	1	0	49,87	49,87	20,57	29,3	0	0
MES 7	4	4	0	3	0	3	1	2	1	65,61	65,61	53,11	12,5	0	0
MES 8	6	6	0	1	0	3	0	3	1	140,4	140,4	140,4	0	0	0
MES 9	12	12	0	0	0	0	6	5	0	99,78	87,68	71,58	16,1	12,1	0
MES 10	10	10	0	0	0	1	0	1	7	209,81	181,36	116,06	65,3	28,45	0
MES 12	3	3	1	1	0	0	0	-	-	12,45	3,25	3,25	0	6,7	2,5
MES 12	6	6	4	0	0	0	0	-	-	95,5	0	0	0	28,2	67,3
TOTAL	54	54	5	17	5	19	18	13	9	795,95	650,7	**503,5**	147,2	75,45	69,8

RESPONSABLE

Anny Lopez Fajardo
Georreferenciación Zona Sur Occidente Cto 1802

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 56 **CORTE** 15 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE INVENTARIOS DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 3	A01	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-nov-19	REV. 4	27-dic-19	MES 3	
2	MES 1	SEM. 3	A02	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	18-nov-19	REV. 3	24-dic-19	MES 3	
3	MES 1	SEM. 3	A03	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	18-nov-19	REV. 2	05-dic-19	MES 3	
4	MES 1	SEM. 4	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	25-nov-19	REV. 3	20-dic-19	MES 3	
5	MES 2	SEM. 5	A05	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 3	15-ene-20	MES 3	
6	MES 2	SEM. 7	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	12-dic-19	REV. 3	23-ene-20	MES 3	
7	MES 2	SEM. 8	A07	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	18-dic-19	REV. 2	31-ene-20	MES 4	
8	MES 2	SEM. 8	A08	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	18-dic-19	REV. 3	30-ene-20	MES 4	
9	MES 2	SEM. 8	A09	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	19-dic-19	REV. 2	10-feb-20	MES 4	
10	MES 2	SEM. 8	A10	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
11	MES 3	SEM. 11	A11	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	04-feb-20	MES 4	
12	MES 3	SEM. 11	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
13	MES 3	SEM. 12	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	17-ene-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
14	MES 3	SEM. 12	A14	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	20-ene-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
15	MES 4	SEM. 15	A15	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	07-feb-20	REV. 3	12-mar-20	MES 5	**
16	MES 4	SEM. 15	A16	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	10-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
17	MES 4	SEM. 16	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	12-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
18	MES 5	SEM. 18	A18	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	27-feb-20	REV. 2	11-may-20	MES 7	
19	MES 5	SEM. 18	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	02-mar-20	REV. 2	12-may-20	MES 7	
20	MES 5	SEM. 19	A20	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	06-mar-20	REV. 1	13-mar-20	MES 5	
21	MES 5	SEM. 20	A21	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	05-may-20	MES 7	
22	MES 5	SEM. 20	A22	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	13-may-20	MES 7	****
23	MES 5	SEM. 20	A23	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	14-may-20	MES 7	
24	MES 5	SEM. 20	A24	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	26-may-20	MES 7	
25	MES 5	SEM. 20	A25	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	13-mar-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	
26	MES 5	SEM. 21	A26	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-mar-20	REV. 3	28-may-20	MES 7	
27	MES 6	SEM. 23	A27	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	04-jun-20	MES 8	
28	MES 6	SEM. 23	A28	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	23-jun-20	MES 8	****
19	MES 6	SEM. 23	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2	20,00	20,00	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
29	MES 6	SEM. 23	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	27-abr-20	REV. 4	09-jun-20	MES 8	
30	MES 6	SEM. 23	A30	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	27-abr-20	REV. 2	01-jun-20	MES 8	
31	MES 7	SEM. 25	A31	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	12-may-20	REV. 3	02-jun-20	MES 8	
32	MES 7	SEM. 26	A32	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	11-jun-20	REV. 4	16-jun-20	MES 8	****
33	MES 7	SEM. 26	A33	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	18-may-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	*****
19	MES 7	SEM. 27	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE3	20,00	20,00	APROBADO	20-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
34	MES 7	SEM. 27	A34	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	21-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	****
35	MES 7	SEM. 27	A35	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	*** y ****
36	MES 7	SEM. 27	A36	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	09-jul-20	REV. 4	10-jul-20	MES 9	
37	MES 7	SEM. 27	A37	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	24-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	
38	MES 8	SEM. 29	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	
39	MES 8	SEM. 29	A39	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	29-jul-20	MES 10	
40	MES 8	SEM. 29	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	13-jul-20	MES 9	
41	MES 8	SEM. 29	A41	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 3	10-jul-20	MES 9	***
42	MES 8	SEM. 29	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	17-jul-20	REV. 3	17-jul-20	MES 9	******
43	MES 8	SEM. 29	A43	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	14-jul-20	REV. 2	15-jul-20	MES 9	*******
44	MES 8	SEM. 29	A44	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	21-jul-20	REV. 3	21-jul-20	MES 9	********
45	MES 8	SEM. 29	A45	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	05-ago-20	REV. 4	06-ago-20	MES 10	********
46	MES 8	SEM. 31	A46	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	23-jul-20	REV. 3	24-jul-20	MES 9	
47	MES 8	SEM. 32	A47	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	27-jul-20	MES 9	
48	MES 10	SEM. 37	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	01-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	a
49	MES 11	SEM. 43	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	02-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	
50	MES 11	SEM. 43	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	14-sep-20	REV. 3	14-oct-20	MES 11	
51	MES 11	SEM. 44	A51	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
52	MES 11	SEM. 45	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	20-oct-20	REV. 3	20-oct-20	MES 12	
53	MES 11	SEM. 45	A53	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-oct-20	REV. 2	14-oct-20	MES 11	
54	MES 11	SEM. 45	A54	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	APROBADO	20-nov-20	REV. 2	20-nov-20	MES 13	c
55	MES 12	SEM. 46	A55	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
56	MES 12	SEM. 46	A56	MV_08_261_1244_11_V2	19,80	19,80	APROBADO	19-nov-20	REV. 3	20-nov-20	MES 13	b
57	MES 12	SEM. 47	A57	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
58	MES 12	SEM. 47	A58	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
59	MES 12	SEM. 48	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	APROBADO	24-oct-20	REV. 3	24-nov-20	MES 13	
60	MES 12	SEM. 48	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	APROBADO	20-oct-20	REV. 2	23-nov-20	MES 13	
61	MES 12	SEM. 48	A61	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	MOVILIDAD	20-oct-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
62	MES 12	SEM. 49	A62	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	CONTRATISTA	23-oct-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
63	MES 12	SEM. 49	A63	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	CONTRATISTA	26-oct-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
64	MES 12	SEM. 49	A64	EX_08_333_1867_12_V3	7,50	7,50	INTERVENTORIA	10-dic-20	REV. 2	15-dic-20	MES 14	
65	MES 12	SEM. 49	A65	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	APROBADO	09-dic-20	REV. 2	11-dic-20	MES 14	***
66	MES 13	SEM. 52	A66	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	CONTRATISTA	09-dic-20	REV. 2	15-dic-20	MES 14	
67	MES 13	SEM. 53	A67	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	CONTRATISTA	09-dic-20	REV. 2	15-dic-20	MES 14	
68	MES 13	SEM. 53	A68	EM_08_124_V11	16,80	16,80	CONTRATISTA	20-nov-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
69	MES 14	SEM. 55	A69	EX_08_305_1867_12_V2	8,30	8,30	INTERVENTORIA	03-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
70	MES 14	SEM. 55	A70	EX_08_315_1867_12_V1	4,00	4,00	INTERVENTORIA	04-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
71	MES 14	SEM. 55	A71	EX_09_218_1556_10_V4	4,00	4,00	INTERVENTORIA	04-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
72	MES 14	SEM. 56	A72	EX_09_185_1249_11_V7	10,67	10,67	INTERVENTORIA	09-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
73	MES 14	SEM. 56	A73	EX_08_212_1556_10_V5	2,50	2,50	INTERVENTORIA	09-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
74	MES 14	SEM. 56	A74	EX_09_219_1881_12_V6	11,90	11,90	INTERVENTORIA	09-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE INVENTARIO DE DISEÑOS. ZONA SW

* En la Revisión 1 se detecta que está incompleto el Registro Fotográfico-RF entregado en 3 CDs y el contratista entrega en Comité del 11/03/2020 3 CDs con este RF faltante; una vez aprobado y con VoBo de la SDM se le autorizó al contratista a presentar de manera parcial el Diseño

*** Cambia la meta de 8,5Ha a 5,15Ha por disminución de ZI
Cambia la meta de 3,20Ha a 3,25Ha por ampliación de ZI para empalmes
******* Cambia la meta de 6,60Ha a 7,00Ha por ajuste equivalencias
****

a Se ajustó la meta de 2,5Ha a 6,7Ha por ajuste de equivalencias
c Se ajustó la meta de 38,9Ha a 38,4Ha por ajuste de la meta al no incluir el tramo de la KR73

** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)
**** Falta VoBo de la SDM
***** La meta cambió de 5,08Ha a 5,3Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba - Correo SDM del 28/05/2020)
******
******** La meta cambió de 20,10Ha a 20,18 Ha por nueva medición de la ZI
La meta cambió de 30,13Ha a 28,45 Ha por ajuste de la ZI
b Se ajustó la meta de 17,9Ha a 19,8 Ha por ajuste de equivalencias

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 56 **CORTE** 15 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICAS **SEMANA** 56 **CORTE** 15 Dic./2020

INVENTARIOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	74	1041,73
INVENTARIOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	61	940,24
INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	13	101,49

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	5	48,82	23,30	25,52	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	7	48,87	41,37	7,50	0,00	**940,24**
EN PODER DE MOVILIDAD	1	3,80	3,80	0,00	0,00	
	13	**101,49**	**68,47**	**33,02**	**0,00**	

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha INVENTARIADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		INVENTARIADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	3,4	0,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	6,8	1,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	10,2	1,5%	12,50	12,50	1,8%	-	-	0,0%
4	18 NOV - 25 NOV	13,6	2,0%	19,28	31,78	4,6%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	16,72	2,4%	2,50	34,28	5,0%	-	-	0,0%
6	03 DIC - 09 DIC	19,84	2,9%	-	34,28	5,0%	2,50	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,96	3,3%	21,50	55,78	8,1%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	26,08	3,8%	40,25	96,03	13,9%	19,28	21,78	3,2%
9	24 DIC - 30 DIC	29,2	4,2%	-	96,03	13,9%	10,00	31,78	4,6%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,95	6,4%	-	96,03	13,9%	-	31,78	4,6%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	58,7	8,5%	26,50	122,53	17,7%	-	31,78	4,6%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	73,45	10,6%	31,80	154,33	22,3%	2,50	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	88,2	12,8%	-	154,33	22,3%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	112,06	16,2%	-	154,33	22,3%	40,25	96,03	13,9%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	135,92	19,7%	30,57	184,90	26,8%	26,50	122,53	17,7%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	159,78	23,1%	50,61	235,51	34,1%	-	122,53	17,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	183,64	26,6%	-	235,51	34,1%	2,50	125,03	18,1%
18	25 FEB/20 - 02 MAR/20	207,50	30,0%	86,10	321,61	46,5%	49,87	174,90	25,3%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	259,93	37,6%	2,50	324,11	46,9%	-	174,90	25,3%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	312,37	45,2%	16,80	340,91	49,3%	63,11	238,01	34,4%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	364,80	52,8%	12,10	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	397,35	57,5%	-	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	429,90	62,2%	46,00	399,01	57,7%	-	238,01	34,4%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	462,45	66,9%	-	399,01	57,7%	2,50	240,51	34,8%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	495,00	71,6%	11,01	410,02	59,3%	86,10	326,61	47,3%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	515,35	74,6%	15,30	425,32	61,6%	7,50	334,11	48,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	535,70	77,5%	63,52	488,84	70,7%	24,20	358,31	51,9%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	556,05	80,5%	-	488,84	70,7%	16,01	374,32	54,2%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	576,40	83,4%	109,38	598,22	86,6%	18,50	392,82	56,8%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	594,43	86,0%	-	598,22	86,6%	57,37	450,19	65,2%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	612,47	88,6%	60,40	658,62	95,3%	2,50	452,69	65,5%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	625,35	90,5%	32,63	691,25	100,0%	7,00	459,69	66,5%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	648,53	93,9%	-	691,25	100,0%	17,15	476,84	69,0%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	656,18	95,0%	-	691,25	100,04%	68,95	545,79	79,0%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	663,82	96,1%	-	691,25	100,04%	30,43	576,22	83,4%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	671,47	97,2%	-	691,25	100,04%	54,33	630,55	91,3%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	679,11	98,3%	6,70	697,95	101,01%	32,25	662,80	95,9%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	686,76	99,4%	-	697,95	101,01%	28,45	691,25	100,04%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	687,61	99,5%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	688,82	99,69%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	689,30	99,76%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	690,14	99,88%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	13,50	711,45	102,96%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	697,084	100,88%	72,78	784,23	113,49%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	703,176	101,76%	38,40	822,63	119,05%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	709,269	102,65%	59,40	882,03	127,65%	9,20	700,45	101,37%
47	07 OCT/20 - 13 OCT/20	715,361	103,53%	25,30	907,33	131,31%	-	700,45	101,37%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	734,161	106,25%	28,21	935,54	135,39%	30,60	731,05	105,80%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	752,961	108,97%	22,50	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	771,761	111,69%	-	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	790,561	114,41%	-	958,04	138,65%	118,08	849,13	122,89%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	809,361	117,13%	14,72	972,76	140,78%	-	849,13	122,89%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	835,361	120,89%	27,60	1.000,36	144,77%	82,61	931,74	134,84%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	861,361	124,66%	-	1.000,36	144,77%	-	931,74	134,84%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	887,361	128,42%	16,30	1.016,66	147,13%	-	931,74	134,84%
56	09 DIC/20 - 15 DIC/20	913,361	132,18%	25,07	1.041,73	150,76%	8,50	940,24	136,07%

INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA **56** **CORTE** **15 Dic./2020**

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 3	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 4	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 5	A01	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	05-dic-19	REV. 2	05-dic-19	MES 2	
2	MES 2	SEM. 6	A02	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 1	15-ene-20	MES 3	
3	MES 2	SEM. 6	A03	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	24-dic-19	REV. 3	24-dic-19	MES 2	
4	MES 2	SEM. 8	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	20-ene-20	MES 3	
5	MES 2	SEM. 9	A05	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	27-dic-19	REV. 1	27-dic-19	MES 2	
6	MES 3	SEM. 13	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	23-ene-20	REV. 1	28-ene-20	MES 3	
7	MES 4	SEM. 14	A07	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	30-ene-20	REV. 1	10-feb-20	MES 4	
8	MES 4	SEM. 14	A08	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
9	MES 4	SEM. 14	A09	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
10	MES 4	SEM. 15	A10	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	11-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
11	MES 4	SEM. 16	A11	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	12-feb-20	REV. 1	17-feb-20	MES 4	
12	MES 4	SEM. 17	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	19-feb-20	REV. 1	28-feb-20	MES 4	
13	MES 4	SEM. 17	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	24-feb-20	REV. 1	09-mar-20	MES 5	
14	MES 4	SEM. 18	A14	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	25-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
15	MES 5	SEM. 19	A15	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	05-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
16	MES 5	SEM. 19	A16	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
17	MES 5	SEM. 20	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
18	MES 5	SEM. 20	A18	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	16-mar-20	REV. 4	08-may-20	MES 7	****
19	MES 7	SEM. 25	A19	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	12-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
20	MES 7	SEM. 26	A20	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	13-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
21	MES 7	SEM. 26	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	13-may-20	REV. 1	09-jun-20	MES 8	***
22	MES 7	SEM. 26	A22	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	19-may-20	REV. 4	18-jun-20	MES 8	
23	MES 7	SEM. 27	A23	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	19-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
24	MES 7	SEM. 27	A24	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	24-jun-20	REV. 4	25-jun-20	MES 8	*****
25	MES 8	SEM. 27	A24	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	03-jul-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	
26	MES 8	SEM. 29	A25	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	04-jun-20	REV. 2	07-jul-20	MES 9	
27	MES 8	SEM. 30	A26	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 2	08-jul-20	MES 9	
21	MES 8	SEM. 31	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2y3	40,00	40,00	APROBADO	25-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	****
28	MES 8	SEM. 31	A27	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
29	MES 8	SEM. 31	A28	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	19-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	****
30	MES 8	SEM. 31	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
31	MES 8	SEM. 31	A30	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-jun-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	****
32	MES 8	SEM. 31	A32	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	03-jul-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	******
33	MES 8	SEM. 32	A33	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	14-jul-20	MES 9	
34	MES 8	SEM. 32	A34	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	26-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	******
35	MES 9	SEM. 33	A35	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	10-jul-20	REV. 2	10-jul-20	MES 9	
36	MES 9	SEM. 34	A36	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	22-jul-20	REV. 3	22-jul-20	MES 9	
37	MES 9	SEM. 34	A37	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	10-ago-20	REV. 5	10-ago-20	MES 10	
38	MES 9	SEM. 34	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	13-ago-20	REV. 2	13-ago-20	MES 10	******* *
39	MES 9	SEM. 34	A39	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	11-ago-20	REV. 4	16-ago-20	MES 10	
40	MES 9	SEM. 35	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 4	17-ago-20	MES 10	
41	MES 9	SEM. 35	A41	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	05-ago-20	REV. 2	05-ago-20	MES 10	
42	MES 9	SEM. 36	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	18-ago-20	REV. 4	18-ago-20	MES 10	
43	MES 9	SEM. 36	A43	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	17-ago-20	MES 10	
44	MES 10	SEM. 37	A44	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	13-ago-20	MES 10	*******
45	MES 10	SEM. 37	A45	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	17-ago-20	REV. 3	18-ago-20	MES 10	
46	MES 10	SEM. 37	A46	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	14-ago-20	REV. 2	17-ago-20	MES 10	
47	MES 10	SEM. 38	A47	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 2	18-ago-20	MES 10	
48	MES 12	SEM. 48	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
49	MES 12	SEM. 48	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
50	MES 12	SEM. 48	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
51	MES 12	SEM. 48	A51	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 2	04-nov-20	MES 13	
52	MES 12	SEM. 49	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	05-nov-20	REV. 2	05-nov-20	MES 13	
53	MES 13	SEM. 51	A53	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	27-nov-20	REV. 4	27-nov-20	MES 13	
54	MES 13	SEM. 51	A54	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	27-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
55	MES 13	SEM. 51	A55	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	26-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
56	MES 13	SEM. 52	A56	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	08-dic-20	REV. 5	08-dic-20	MES 14	
57	MES 13	SEM. 54	A57	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	INTERVENTORIA	25-nov-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
58	MES 13	SEM. 54	A58	MV_08_261_1244_11_V2	20,80	20,80	INTERVENTORIA	25-nov-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
59	MES 13	SEM. 54	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	INTERVENTORIA	26-nov-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
60	MES 13	SEM. 54	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	INTERVENTORIA	27-nov-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	
61	MES 14	SEM. 56	A61	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	INTERVENTORIA	14-dic-20	REV. 1	15-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE DISEÑOS. ZONA SW

* El contratista no lo cobró en el segundo mes
*** Aprobación parcial de 113Ha; no se puede facturar
**** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)
Falta VoBo de la SDM
La meta cambió de 70,5Ha a 73,0Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba)

** Aprobado por interventoría; falta VoBo de SDM.
***** La meta cambió de la originalmente presentada y de 4,18Ha a 4,30Ha
****** La meta cambió de la originalmente presentada en Inventario y pasa de 15,20Ha a 14,90Ha
******* La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 32,20Ha a 32,25Ha
******** La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 11,75Ha a 12,00Ha
NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
META CONTRATO INICIAL: 690,991 Ha
META ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 AL CONTRATO INICIAL: 347,37 Ha
META FINAL CONTRATO: 1038,61 Ha

ESTADISTICAS SEMANA 56 CORTE 15 Dic./2020

DISEÑOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**61**	**941,24**
DISEÑOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**56**	849,13
DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	5	92,11

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	5	92,11	92,11	0,00	0,00	**849,13**
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	**92,11**	**92,11**	**0,00**	**0,00**	

INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 56 **CORTE** 15 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha DISEÑADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		DISEÑADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	2,55	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	5,1	0,7%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	7,65	1,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
4	19 NOV - 25 NOV	10,2	1,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	14,4	2,1%	2,50	2,50	0,4%	2,50	2,50	0,4%
6	03 DIC - 09 DIC	18,6	2,7%	7,50	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,8	3,3%	-	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	27	3,9%	19,28	29,28	4,2%	-	2,50	0,4%
9	24 DIC - 30 DIC	31,2	4,5%	5,00	34,28	5,0%	10,00	12,50	1,8%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,2	6,3%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	55,3	8,0%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	67,3	9,7%	-	34,28	5,0%	21,78	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	79,3	11,5%	21,50	55,78	8,1%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	99,5	14,4%	37,75	93,53	13,5%	-	55,78	8,1%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	119,7	17,3%	-	93,53	13,5%	29,45	85,23	12,3%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	139,9	20,2%	26,50	120,03	17,4%	2,50	87,73	12,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	160,1	23,2%	31,80	151,83	22,0%	5,80	93,53	13,5%
18	25 FEB/20 -02 MAR/20	180,3	26,1%	20,57	172,40	24,9%	29,00	122,53	17,7%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	216,2	31,3%	5,00	177,40	25,7%	29,30	151,83	22,0%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	252,2	36,5%	60,61	238,01	34,4%	20,57	172,40	24,9%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	288,1	41,7%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	315,2	45,6%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	342,4	49,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	369,5	53,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	398,6	57,4%	13,10	251,11	36,3%	65,61	238,01	34,4%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	422,5	61,1%	87,30	338,41	49,0%	-	238,01	34,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	448,5	64,9%	-	338,41	49,0%		238,01	34,4%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	474,4	68,7%	5,30	343,71	49,7%	18,10	256,11	37,1%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	500,3	72,4%	5,00	348,71	50,5%	73,00	329,11	47,6%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	523,3	75,7%	2,50	351,21	50,8%	-	329,11	47,6%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	546,2	79,0%	88,98	440,19	63,7%	5,00	334,11	48,4%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	562,6	81,4%	12,50	452,69	65,5%	44,30	378,41	54,8%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	592,1	85,7%	7,00	459,69	66,5%	61,78	440,19	63,7%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	606,4	87,8%	59,65	519,34	75,2%	19,50	459,69	66,5%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	620,7	89,8%	56,88	576,22	83,4%	18,50	478,19	69,2%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	635,0	91,9%	-	576,22	83,4%	-	478,19	69,2%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	649,3	94,0%	86,58	662,80	95,9%	-	478,19	69,2%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	663,6	96,0%	28,45	691,25	100,04%	5,15	483,34	69,9%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	669,0	96,8%	-	691,25	100,04%	207,91	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	676,9	97,96%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	680,02	98,41%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	685,5	99,21%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	694,741	100,54%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	698,491	101,09%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	702,241	101,63%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
47	06 OCT/20 - 13 OCT/20	705,991	102,17%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	720,991	104,34%	25,20	716,45	103,68%	-	691,25	100,04%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	735,991	106,51%	14,60	731,05	105,80%	9,20	700,45	101,37%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	750,991	108,68%	-	731,05	105,80%	-	700,45	101,37%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	765,991	110,85%	47,70	778,75	112,70%	30,60	731,05	105,80%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	780,991	113,02%	70,38	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	804,741	116,46%	-	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	828,491	119,90%	83,61	932,74	134,99%	64,90	795,95	115,19%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	852,241	123,34%	-	932,74	134,99%	53,18	849,13	122,89%
56	09 DIC/20 - 15 DIC/20	875,991	126,77%	8,50	941,24	136,22%	-	849,13	122,89%

FACTURACION

VALOR HA $ 610.876,00

FACTURACION	Ha DISEÑADAS	Ha APROB. EN FISICO	Ha APROB. DIG. INTERV.	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	VALOR MENSUAL		VALOR ACUMULADO	
					Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM
MES 1	2,50	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 2	10,00	12,50	-	-	$ 7.635.950,00	$ -	$ 7.635.950,00	$ -
MES 3	43,28	43,28	-	-	$ 26.438.713,00	$ -	$ 34.074.663,00	$ -
MES 4	116,62	66,75	-	-	$ 40.775.973,00	$ -	$ 74.850.636,00	$ -
MES 5	65,61	49,87	-	-	$ 30.464.386,12	$ -	$ 105.315.022,12	$ -
MES 6	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 7	100,40	65,61	-	-	$ 40.079.574,36	$ -	$ 145.394.596,48	$ -
MES 8	114,28	140,40	-	-	$ 85.766.990,40	$ -	$ 231.161.586,88	$ -
MES 9	123,53	99,78	-	-	$ 60.953.207,28	$ -	$ 292.114.794,16	$ -
MES 10	115,03	213,06	-	-	$ 130.153.240,56	$ -	$ -	$ -
MES 11	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 12	39,80	9,20	-	-	$ 5.620.059,20	$ -	$ -	$ -
MES 13	201,69	95,50	-	-	$ 58.338.658,00	$ -	$ -	$ -
MES 14	8,50	53,18	-	-	$ 32.486.385,68	$ -	$ -	$ -
SUB-TOTAL CONTRATO	**941,24**	**849,13**	**0,00**	**0,00**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 **DEL** 1/12/2020 **AL** 7/12/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1782-2019 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Revisión CLM-181114-000013 visita 50% , no se evidencia alguna observación



Descripción Foto 2.

Revisión CLM-181114-000013 visita 50% , no se evidencia alguna observación



Descripción Foto 3.

Revisión CLM 294379-18 visita 70%, No se evidencia observación



Descripción Foto 4.

Revisión CLM 294379-18 visita 70%, No se evidencia observación



Descripción Foto 5.

Revisión 70% en compromiso SDQS-2725482019, en donde se evidencia desgaste en marcas



Descripción Foto 6.

Revisión 70% en compromiso SDQS-2725482019, en donde se evidencia desgaste en marcas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SEC. SECRETARÍA DE MOVILIDAD
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 (consecutivo) **DEL** 1/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 7-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		-
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	-
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

FRENTES TERMINADOS PARA APLICACIÓN GARANTIAS

No	ID	CP	UPZ	LOCALIDAD	Tipo de implementación	SEÑALES VERTICALES			SEÑALES horizontales																										
						Dias de garantia	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	M2 (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	ML (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	bordillos trasversales (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Techos (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Tecnicos (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Hitos (Dias garantias)	Fecha implamentacion	Porcentaje a la fecha	Boyas(Dias garan	Fecha implamentacion	Porcentaje a la fecha	AGREBADO (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	RESALTOS (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	Estepariras (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha
1	EX_02_038_1556_10	ID 82	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%	426	27/11/2019	81,25%	633	27/11/2019	54,69%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
2	EX_02_201_1881_12	ID 162	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal				304	15/11/2019	117,70%	304	15/11/2019	117,70%				593	0/01/1900	60,36%				426	15/11/2019	84,07%	426	15/11/2019	84,1%								
3	EX_02_201_1881_12	ID 163	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	22/11/2019	115,40%	304	22/11/2019	115,40%				633	0/01/1900	55,48%				426	22/11/2019	82,43%	426	22/11/2019	82,4%								
4	EX_02_201_1881_12	ID16	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	24/11/2019	114,74%	304	24/11/2019	114,74%				633	0/01/1900	55,16%				426	24/11/2019	81,96%	426	24/11/2019	82,0%								
5	EX_02_201_1881_12	ID 15	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	19/11/2019	116,38%	304	19/11/2019	116,38%				633	0/01/1900	55,95%				426	19/11/2019	83,13%	426	19/11/2019	83,1%								
6	MV_09_048_1556_10	CARRA 13	90- Fontibón	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	19,07%																												
7	MV_09_024_1249_11	CARRA 13	16-puente aranda 112-granjaripjas techo 113-Bavaria 111- Puente aranda	75 - Fontibón16-Puente	Vertical	1825	25/11/2019	19,07%																												
8	MV_09_189_1556_10	CARRA 13	76- Fontibon san pablo	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	19,07%																												
9	EX_02_201_1881_12	ID 19	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	25/11/2019	114,41%	304	25/11/2019	114,41%				633	25/11/2019	55,01%				426	25/11/2019	81,72%	426	25/11/2019	81,7%								
10	EX_02_192_1881_12	ID 18	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
11	EX_02_201_1881_12	ID 97	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
12	EX_02_180_1881_12	ID 23	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	24/11/2019	114,74%	304	24/11/2019	114,74%				633	24/11/2019	55,16%				426	24/11/2019	81,96%	426	24/11/2019	82,0%								
13	EX_02_038_1556_10	ID 26	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	30/11/2019	18,79%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%	487	27/11/2019	71%						
14	EX_02_201_1881_12	ID 10	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
15	EX_02_192_1881_12	ID 186	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	27/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	27/11/2019	81,3%								
16	EX_02_038_1556_10	ID 159	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	19,07%	304	27/11/2019	113,75%	304	29/11/2019	113,75%				633	27/11/2019	54,69%				426	27/11/2019	81,25%	426	21/11/2019	82,7%								
17	MV_09_019_1249_11	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	27/11/2019	94,79%																						
18	EX_09_200_1881_12	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	15/11/2019	98,08%																						
19	EX_09_031_1556_10	ATAHUALPA	0	09_Fontibon	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	821	26/12/2019	38,60%	821	26/12/2019	38,60%				554	26/12/2019	57,26%																
20	MV_09_424_947_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	94,79%																						
21	EX_13_002_1556_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	88,49%																						
22	EX_02_185_1881_12	ID 182	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	213	12/12/2019	155,46%	213	12/12/2019	155,46%				514	12/12/2019	64,39%				335	12/12/2019	98,93%	335	12/12/2019	98,9%								
23	EX_02_038_1556_10	ID 110	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	365	12/12/2019	90,68%	365	12/12/2019	90,68%				949	12/12/2019	34,88%				548	12/12/2019	60,46%	548	12/12/2019	60,5%								
24	EX_02_038_1556_10	ID 167	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	213	12/12/2019	155,46%	213	12/12/2019	155,46%				514	12/12/2019	64,39%				335	12/12/2019	98,93%	335	12/12/2019	98,9%								
25	EX_02_038_1556_10	ID 30	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	213	12/12/2019	155,46%	213	12/12/2019	155,46%				475	12/12/2019	69,76%				304	12/12/2019	108,82%	304	12/12/2019	108,8%								
26	EX_02_201_1881_12	ID 160	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	274	12/12/2019	120,91%	274	12/12/2019	120,91%				593	12/12/2019	55,81%				304	12/12/2019	108,82%	304	12/12/2019	108,8%								
27	EX_02_185_1881_12	ID 29	Chico lago	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	243	16/12/2019	134,38%	243	16/12/2019	134,38%				475	16/12/2019	68,91%				365	16/12/2019	89,59%	365	16/12/2019	89,6%								
28	MV_13_168_1249_11	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	88,49%																						
29	EX_13_001_1556_10	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	88,49%																						
30		ATAHUALPA	Fontibon	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	17,86%	821	26/12/2019	38,60%	821	26/12/2019	38,60%				554	26/12/2019	57,26%															335	16/12/2019	98%
31	EX_02_033_1556_001	ID13	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	365	3/01/2020	84,66%	365	3/01/2020	84,66%				870	3/01/2020	35,52%				517	3/01/2020	59,76%	517	3/01/2020	59,8%								
32	sc_02_166_v1	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	horizontal							365	3/01/2020	84,66%																						
33	EX_02_356_946_10	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	335	3/01/2020	92,35%	335	3/01/2020	92,35%				909	3/01/2020	33,98%				487	3/01/2020	63,49%	487	3/01/2020	63,5%								
34	EX_18_158_1244_11	0	Rafael uribe	0	horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	335	20/01/2020	87,27%	335	20/01/2020	87,27%																						
35	EX_09_214_1881_12_V2	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							350	8/01/2020	86,91%																						
36	CLM-181002-000006	0	0	Tunjuelito	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	578	20/01/2020	50,53%	548	20/01/2020	53,33%																						
37	CP_CLM-181114-000025	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	882	27/01/2020	32,31%	852	27/01/2020	33,46%																				633	27/01/2020	45%
38	CP_CLM-181114-000013	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	15,62%	821	27/01/2020	34,70%	1095	27/01/2020	26,03%																				913	27/01/2020	31%
39	CP_SDM-236118-19	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	213	27/02/2020	119,30%	335	27/02/2020	75,92%																				274	27/02/2020	93%
40	MV_AV_CALI_941_09_ AMERICAS Y ESPERANZA	0	Kennedy	Castilla	horizontal				365	27/02/2020	69,59%	365	27/02/2020	69,59%																						
41	SDM-299509-18	0	Kennedy	Castilla	horizontal				578	27/02/2020	43,95%	578	27/02/2020	43,95%																						
42	Solicitud gerente localidad	0	tunjuelito	Tunjuelito	horizontal				730	21/01/2020	39,86%	669	21/01/2020	43,49%																				633	14/01/2020	47%
43	MV_08_001_1703_10	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	487	27/02/2020	52,19%	335	27/02/2020	75,92%				304	27/02/2020	83,51%	304	27/02/2020	83,51%	213	27/02/2020	119,30%								304	27/02/2020	84%
44	CP_SDM-DSC-136240-18	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	28/02/2020	13,86%																												
45	CP_SDM-76913-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	14,96%	669	27/02/2020	37,96%	608	27/02/2020	41,75%																				633	4/02/2020	44%	395	27/02/2020	64%

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 (Consecutivo) **DEL** 1/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 7-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 7.957.500.000
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 7.957.500.000
Plazo Inicial	15 MESES
Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15 MESES
Fecha de Iniciación	29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial	15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.061.619.391
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 2.061.619.391
Plazo Inicial	16MESES
Plazo Prorroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15MESES
Fecha de Iniciación	29/10/2019
Fecha de Terminación	16/03/2021

2. GARANTIAS

46	CP_SDM-29716-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	14,96%																			791	27/05/2020	21%				
47	CP_SQDS-1387272019	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	578	27/02/2020	43,95%	730	27/02/2020	38,49%													578	14/01/2020	52%				593	14/01/2020	50%
48	EX_08_338_1867_12_V4	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	548	27/02/2020	46,39%	548	27/02/2020	46,39%																			395	27/02/2020	64%
49	SDQS 18919622018	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	213	27/02/2020	119,30%	213	27/02/2020	119,30%																			395	31/01/2020	71%
50	CP_SDM-DSVCT-7089-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	183	27/02/2020	139,18%	183	27/02/2020	139,18%				243	27/02/2020	104,38%	183	27/02/2020	139,18%											
51	EM_08_124	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/05/2020	8,99%	578	27/05/2020	28,38%	456	27/05/2020	35,95%													213	4/05/2020	88%				426	4/05/2020	44%
52	EX_09_200_1881_12_V2	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	426	27/02/2020	59,65%	426	27/02/2020	59,65%				183	27/02/2020	139,18%	304	27/02/2020	83,51%	243	27/02/2020	104,38%				304	27/02/2020	84%				243	27/02/2020	104%
53	SSDQS-1383742018	0	Fontibon	0	horizontal																											304	27/02/2020	84%
54	EX_08_323_1867_12	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	13,92%	365	27/02/2020	69,59%	426	27/02/2020	59,65%																			277	27/02/2020	92%
55	EX_08_042_1556_10	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	28/03/2020	12,27%	669	28/03/2020	33,47%																							
56	EX_08_327_1867_10	ZONA ESCOLAR	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	7/03/2020	13,42%	213	28/03/2020	105,21%	213	28/03/2020	105,21%																			277	28/03/2020	81%
57	EX_08_329_1867_12	ZONA ESCOLAR	patio bonito	Kennedy	Vertical horizontal	1825	28/04/2020	10,58%	426	28/04/2020	45,32%	426	28/04/2020	45,32%																					
58	SDM_DSC_83051_18	0	Carvajal	Kennedy	horizontal	1825	23/03/2020	12,55%																			514	23/03/2020	45%						
59	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y AMERICAS)	0	Kennedy	0	horizontal							365	24/04/2020	53,97%																				
60	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y CALLE 59S)	0	Kennedy	0	horizontal							365	26/04/2020	53,42%																				
61	SDM-294379-18	0	Kennedy	0	horizontal				183	29/04/2020	105,21%																							
62	SDM_316509_18	0	Kennedy	0	horizontal																						487	27/04/2020	40%						
63	SDQS_2725482019	0	Fontibon	San pablo	horizontal				213	28/05/2020	76,56%																							
64	SDM-261374-2019	0	Capellania	Fontibon	horizontal				517	28/05/2020	31,52%	517	28/05/2020	31,52%																				
65	SDM-SCTT-225169-2019	Zona Escolar	0	kennedy	horizontal				517	27/05/2020	31,72%	517	27/05/2020	31,72%																				
66	SDM-318531-2019	Zona escolar	0	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	8,99%	517	27/05/2020	31,72%	517	27/05/2020	31,72%																				
67	ZE_06_269_1561_10	Zona escolar	0	Tunjuelito	horizontal	1825	27/04/2020	10,63%	669	27/03/2020	33,62%	548	27/03/2020	41,10%				544	27/03/2020	41,33%	335	27/03/2020	67,25%				487	27/03/2020	46%				395	27/03/2020	57%
68	ZE_06_168_151_10	Zona escolar	modelia	fontibon	horizontal				639	27/04/2020	30,37%																487	27/04/2020	40%						
69	SDQS_272490-2019	Zona escolar	FONTIBON	fontibon	horizontal				213	28/05/2020	76,56%	213	28/05/2020	76,56%																			395	28/05/2020	41%
70	MV_AV_BOYACA_941_09_V27	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal				365	23/05/2020	46,03%	365	23/05/2020	46,03%				544	23/05/2020	30,86%														
71	SDM-15023-2020	N/A	castilla	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	8,99%	669	27/05/2020	24,51%	669	27/05/2020	25,11%																			426	27/05/2020	39%
72	CLM-180320-000001	N/A	0	0	horizontal				760	27/05/2020	21,57%	700	27/05/2020	23,44%																			395	27/05/2020	41%
73	SDM-265092	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	23/05/2020	78,90%	213	23/05/2020	78,90%													426	27/04/2020	46%				487	27/05/2020	34%
74	SDM-242548	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	27/05/2020	77,03%	213	27/05/2020	77,03%																			395	27/05/2020	41%
75	SDM-316519-2018	N/A	Americas	Kennedy	horizontal	1825	27/06/2020	7,29%	213	27/06/2020	62,47%	213	27/06/2020	62,47%																			517	27/06/2020	26%
76	SDM-554-20	N/A	margaritas	kennedy	horizontal				700	23/05/2020	24,01%	700	23/05/2020	24,01%																			487	27/05/2020	34%
77	SDM_SGV_281345_19	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal										304	28/05/2020	53,59%	304	28/05/2020	53,59%															
78	SDQS_176846-2019	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal																											456	27/05/2020	36%
79	CLM_181123-00032	N/A	venecia	Tunjuilito	horizontal	1825	28/06/2020	7,23%	548	28/06/2020	24,11%	548	28/06/2020	24,11%													304	26/06/2020	44%				517	26/06/2020	26%
80	SDQS_2672752019	N/A	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																						304	3/06/2020	52%				517	28/06/2020	26%
81	SDQS_237461	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	8,99%																			304	27/05/2020	54%						
82	SDQS_237461	N/A	CAPELLANIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	8,99%																			213	27/05/2020	77%						
83	EX_06_93_1244_11	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	7,34%	578	26/06/2020	23,19%	456	26/06/2020	29,37%													304	26/06/2020	44%				274	26/06/2020	49%
84	CLM_180405-000032	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	7,23%	395	28/06/2020	33,38%	517	28/06/2020	25,53%													365	26/06/2020	37%				274	28/06/2020	48%
85	SDM_229731_18	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	7,23%	487	26/06/2020	27,53%	335	26/06/2020	40,05%																			435	26/06/2020	31%
86	SDM_229731	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	7,34%																			213	26/06/2020	63%						
87	SDM_DCV_293492_18	N/A	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal																						213	10/07/2020	56%						

Consorcio InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 55 (Consecutivo) **DEL** 1/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 7-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre y razon social del contratista)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

(Incluya el nombre y razon social del interventor)

2. GARANTIAS

88	CLM_181008_000042	N/A	FONTIBON	FONTIBON	horizontal	1825	10/07/2020	6,58%																						475	10/07/2020	25%			
89	SDQS_280824-2018	N/A	LA CABAÑA	FONTIBON	horizontal																		243	10/07/2020	49,32%										
90	EX_09_001_1214_15_V4	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	6,19%	213	27/07/2020	48,38%	213	27/07/2020	48,38%	304	27/07/2020	33,86%				335	17/07/2020	33,77%										183	27/07/2020	56%
91	EX_09_203_1881_12_V44	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	6,19%	487	17/07/2020	23,22%	335	17/07/2020	33,77%																		435	17/07/2020	26%
92	EX_08_338_1867_12	N/A	Americas	KENNEDY	horizontal	1825	28/02/2020	13,86%	548	27/02/2020	46,39%	548	27/02/2020	46,39%																					
93	EX_09_201_1881_12	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal	1825	28/04/2020	10,58%	578	28/03/2020	38,76%	821	28/03/2020	27,28%																		487	28/05/2020	33%
94	clm_180517-000083	N/A	N/A	tunjuelito	horizontal																								365	28/06/2020	36%				
95	SDQS_1772412019	SDQS_1772412019	ciudad salitre	fontibon	horizontal										304	27/07/2020	33,86%																		
96	MV_08_001_1214	2808242018	la cabaña	fontibon	horizontal																		243	27/07/2020	42,33%										
97	EX_09_185_1249	181008_000042	FONTIBON	fontibon	horizontal																									365	27/07/2020	28%				
98	SDM_394713_18	SDM_394713_18	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																											730	28/07/2020	14%
99	ze_06_163_1561_10	CP_SDM-OGS-227601-19	CASTILLA	KENNEDY	horizontal				548	6/08/2020	16,99%	548	6/08/2020	16,99%																			395	6/08/2020	24%
100	CLM-181116-000006	CLM-181116-000006	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal	1825	27/07/2020	5,64%	183	27/07/2020	56,44%																					183	6/08/2020	51%
101	CLM_180823_000003	CLM_180823_000003	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal				548	27/08/2020	13,15%							274	27/08/2020	26,30%			243	27/08/2020	29,59%							213	27/08/2020	34%			
102	EM-08_073	SDM_316511_18	AMERICAS	KENNEDY	horizontal				669	27/07/2020	15,39%	669	27/07/2020	15,39%				395	27/07/2020	26,05%	243	27/07/2020	42,33%	304	27/07/2020	33,86%							213	27/07/2020	48%	395	6/08/2020	24%
103	EX_10_008_1560_10	N/A	AMERICAS	ENGATIVA	horizontal	1825	6/09/2020	3,40%	548	6/09/2020	11,32%	365	6/09/2020	16,99%				243	6/09/2020	25,48%	243	6/09/2020	25,48%	243	27/07/2020	42,33%				304	6/09/2020	20%				243	6/09/2020	25%
104	CLM_180823_000004	N/A	castilla	kennedy	horizontal				487	28/07/2020	20,96%	335	28/07/2020	30,49%				335	28/07/2020	30,49%																	
105	EX_09_200_1881_12	SDQS_2108342019	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				517	28/08/2020	13,73%	517	28/08/2020	13,73%																			395	28/08/2020	18%		
106	EX_09_048_1556-10	0	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				183	28/08/2020	38,90%	183	28/08/2020	38,90%				183	28/08/2020	38,90%				183	28/08/2020	38,90%										
107	mv_08_435_676_09	SDM_275666-18	TIMIZA	KENNEDY	horizontal													243	28/09/2020	16,44%				243	28/08/2020	29,18%				304	28/09/2020	13%					
108	EX_10_006_1560_10	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	2,19%	335	28/09/2020	11,96%	335	28/09/2020	11,96%				243	28/09/2020	16,44%	213	28/09/2020	18,79%	213	28/09/2020	18,79%							243	28/09/2020	16%		
109	EX_10_372_1842_12	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	2,19%	335	28/09/2020	11,96%	335	28/09/2020	11,96%				243	28/09/2020	16,44%	213	28/09/2020	18,79%	213	28/09/2020	18,79%				304	28/09/2020	13%				243	28/09/2020	16%
110	EX_10_008_1560_10	0	FERIAS	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	2,19%	365	28/09/2020	10,96%	365	28/09/2020	10,96%																			395	28/09/2020	10%		
111	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78B	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	1,21%	365	16/10/2020	6,03%	274	16/10/2020	8,04%				243	28/10/2020	4,11%	213	16/10/2020	10,33%	213	16/10/2020	10,33%											
112	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 75	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	1,21%	365	28/10/2020	2,74%	274	28/10/2020	3,65%				243	28/10/2020	4,11%	213	16/10/2020	10,33%	213	28/10/2020	4,70%											
113	EX_13_003_1556_10	0	CUIDAD SALITRE	TEUSAQUILLO	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	487	28/10/2020	2,05%	335	28/10/2020	2,99%				243	28/10/2020	4,11%	243	16/10/2020	9,04%	243	28/10/2020	4,11%				243	28/10/2020	4%				243	28/10/2020	4%
114	MV_09_048_1556_10	0	fontibon	fontibon	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	183	28/10/2020	5,48%	183	28/10/2020	5,48%																							
115	MV_12_281	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	335	28/10/2020	2,99%	335	28/10/2020	2,99%				243	28/10/2020	4,11%																	
116	TPD_PL_2342	0	0	SANTAFE	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	0,55%	426	28/10/2020	2,35%	426	28/10/2020	2,35%				243	28/10/2020	4,11%	243	28/10/2020	4,11%	243	28/10/2020	4,11%				304	28/10/2020	3%					
117	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78k	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	1,21%	365	5/11/2020	0,55%	274	5/11/2020	0,73%				243	28/10/2020	4,11%	213	16/10/2020	10,33%	213	5/11/2020	0,94%											

3. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
Se relacionan actividades que a la fecha hantterminado sus labores .
Se registran tambien actividades que estan en ejecución.


4. ANEXOS

	SI	NO
1. Registro Fotográfico	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los _____ (Día en letras) 7 (Día en número) días del mes de diciembre (Mes en letras)

(Nombre) Firma de Ing. RESIDENTE

(Nombre) Firma de Profesional de Apoyo
Profesional LEIDY LORENA PARDO



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.**	
FECHA: diciembre 23 de 2020.	**HORA: 11:00 a.m. a 11:40 a.m.**	**LUGAR: Sesión virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos.
2. Informe de Consultoría.
3. Informe de Georreferenciación.
4. Informe de Garantías.
5. Informe de Obra y varios.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS

1. Revisión aprobación PMT avenida Boyacá calle 71 sur que envió el contratista, se entregó PMT autorizado al contratista

2. Entrega al Ing. Nicolai Wilches el ID EX_06_104_1867_V2, para asignación de componente de obra, ya lo pasó el Ing. Nicolai y se lo asignaron al contratista al componente de obra

3. Intervención de la calle 40 sur por carrera 92, no hay intervención por curado del pavimento, igual con la ciclo ruta de la carrera 96 con la calle 80, aún no hay pronunciamiento del IDU, interviene el Arq. Juan Camilo y comenta que estuvieron en comité el jueves pasado revisando con todos los directivos de área del IDU, desde SDM desde el marco del convenio no podrían realizar el retiro de esos recursos que ya estaban asignados y adjudicarlos a un tipo de servicio diferente, tiene que estar amarrados por proyectos del IDU, la tarea que hay es identificar zonas dentro de la misma zona del contrato integral, Fontibón y/o Tunjuelito para poder suplir estos puntos que no se van a poder intervenir, IDU manifestó que no cuenta con los recursos para hacerle mantenimiento a la capa asfáltica, se hará un reemplazo por puntos, hablando con el Arq. Elvis aún siguen con el proceso de revisión aún no han tenido respuesta, y se citó nuevamente comité inter-institucional para el próximo martes, esperan tener una respuesta más precisa sobre el tema.

   Interviene el Ing. Luis Eduardo Acosta y manifiesta que le preocupa los tiempos para poder hacer compra de materiales para su implementación, si la próxima semana no hay definición va a ser muy complejo cumplir, por tarde deben iniciar obra la segunda semana de enero, por lo cual solicita tener listo el PMT, para iniciar las obras en enero, comenta el Ing. Sergio Valderrama y comenta que lo que entiende es que ya no se va a intervenir y están buscando otro punto del IDU, comenta el Arq. Juan Camilo que esta fue la respuesta del

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 23 de 2020.	HORA: 11:00 a.m. a 11:40 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

IDU, comenta el Ing. Luis Eduardo que el presupuesto para la obra está entre $100.000.000 y $105.000.000, el Ing. Sergio Valderrama comenta que quedan pendiente de la asignación del nuevo punto del IDU, pregunta el Ing. Sergio Valderrama sobre la calle 13 y el Arq. Juan Camilo le responde que la última determinación que se dio es intervenir la calzada, el IDU, ya tuvo tiempo de hacer los trabajos, pregunta el Ing. Luis Eduardo sobre la respuesta de la calle 80 con carrera 96, el Arq. Juan Camilo comenta que no les han dado respuesta, el Ing. Luis Eduardo comenta que en la calle 13 hay trabajo de reparcheo en la calzada sur del IDU, el Ing. Sergio Valderrama comenta que adicionalmente ya quedaron instalados todos los pasacalles de la calle 13, el Ing. Luis Eduardo confirma tanto los pasacalles como las señales de Choachi instalados.

INFORME CONSULTORIA

Interviene el Ing. Jorge Enrique, para la semana 57 con corte al 22 de diciembre en inventarios total de hectáreas entregadas por el contratista son 74 IDS que corresponde a 1041 hectáreas y en proceso de revisión van 6 IDs que son 41 hectáreas, el total de hectáreas aprobados es de 1000,36, en el tema de diseños hay 2 en poder del contratista que son 60 hectáreas enviados ayer de observaciones, uno en la SDM con el Ing. Jeison de ayer que son 14 hectáreas y los otros están en revisión en este momento para un total de 127 hectáreas en diseños, frente a las metas lo que tienen actualmente en inventarios que son las 936 corresponden al 135% y lo aprobado esta en 144% es decir están por encima en 64 hectáreas que corresponde al 9,3% por encima del corte semanal y el lunes tienen un corte mensual, en el tema de diseños de las 902 que deberían estar programadas y ya aprobadas que corresponderían al 130, 57% del contrato tienen 849 aprobadas que es el 122% esta 53% por debajo que corresponde al 7,69% en esta semana saldrían las 70 hectáreas, interviene el Ing. Luis Eduardo y solicita la colaboración para poder incluir las hectáreas en el próximo corte, el Ing. Jorge Enrique comenta que respecto al tema de PMTS anoche le llegaron para volver a revisar, uno es la intersección de la carrera 72 por calle 3 el PMT 063, en este momento gerencia de PMTS cambió el concepto técnico, por lo cual no sabe si en los formatos continua la misma estructura, el Ing. Luis Eduardo propone radicarlo como esta y si les piden los ajustes realizarlos, igualmente el Ing. Jorge Enrique comenta que la Ing. Anny le dijo que había otro diseño que cambiaba la versión el EX08331 debe ser presentado en versión 4 para que el Ing. Luis Fernando realice los cambios y él manifiesta estar de acuerdo.

INFORME GEOREFERENCIACION

Interviene la Ing. Anny, para la semana 57 con corte al 22 de diciembre en obra hay 140 IDS de la cuenta 6 a la cuenta 13, 129 recibidos, 5 en revisión por interventoría, en revisión contratista tienen 21, de los 140 hay 108 aprobados y en revisión de SDM tienen 6; en diseño tienen 54 diseños en total, 54 recibidos, suma 795,95 hectáreas 503,5 están aprobadas por SDM, 173,9 está en revisión de SDM, el contratista tiene 53,65 que corresponde a 4 diseños y en revisión interventoría 64,9 que corresponden a 2 diseños.

INFORME GARANTIAS

Interviene la Ing. Leidy, para el corte de la semana 57 tienen revisados por parte de la interventoría 101 diseños, revisadas sin observación 25 equivalente al 25%, revisados sin observación más los atendidos en campo por el

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 23 de 2020.	HORA: 11:00 a.m. a 11:40 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

contratista tienen 59, atendidas por el contratista y aceptadas por la interventoría tienen 32, rechazadas por la interventoría a la fecha 12, atenciones por atender por parte del contratista 42, en el transcurso de la semana la interventoría envía comunicado al contratista donde se adjuntan 4 informes con atenciones realizadas por el áreas de garantías después de transcurrido el 55% de implementación de los diseños, el contratista a la fecha no ha radicado más comunicados de atención a observación de garantías.

INFORME DE OBRA

Interviene el Ing. Sergio Valderrama, al corte de la semana 57, 21 de diciembre, el contratista tiene diseños normales asignados 21, inspeccionados 21, en implementación 2, implementados totalmente 16, por implementar 3, suministros asignados 6, atendidos 6, medidas de gestión 0, compromisos prioritarios asignados 189, inspeccionados 189, en implementación 1, implementados totalmente 181, pendientes por implementar 7, emergencias en patinetas asignadas 24, atendidas 24, otras emergencias asignadas 28, inspeccionadas 28, implementadas 1, implementadas totalmente 26, por implementar 1, en la semana ejecutó obre por valor de $185.361.928 equivalente al 2,53%, tiene obra por ejecutar por valor de $613.913.679, equivalente al 8,38%, se presentaron 2 jornadas de lluvia, una en horario diurno y otra en horario nocturno, se programaron 7 jornadas de trabajo, 1 en horario diurno y 6 en horario nocturno, para los días 15 y 19 se presentaron lluvias gran parte de la noche, el ID de la calle 13 entre carrera 120 se instalaron 926 láminas reflectivas en los new jersey, se han observado cuadrillas de mantenimiento de asfalto en la carrera 123 y calle 13 calzada sur, la intersección de la Av. Boyacá con la intersección de la calle 61 sur está en un avance del 50%, se instalaron las 10 señales de fauna en la vía Choachí, días transcurridos del contrato 419, días para terminar el contrato 56, valor a ejecutar diario $10.962.744, en la gráfica el contratista debería estar en un avance del 130,40% está en un avance real del 137,40%, está por encima de la curva de programación 5,35%.

VARIOS

Pregunta el Ing. Sergio Valderrama si este año se van a facturar más cuentas, el Ing. Nicolai manifiesta que no les han dicho nada, y las cuentas se van a facturar para el mes de enero, el Ing. Sergio Valderrama comenta estar pendiente a la respuesta, el Ing. Nicolai solicita tener al día el tema de las actas.

El Ing. Luis Eduardo recomienda los pendientes a ejecutar y donde se ejecutaría.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA:	**Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.**	
FECHA: diciembre 23 de 2020.	**HORA: 11:00 a.m. a 11:40 a.m.**	**LUGAR: Sesión virtual**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Consulta facturación acta de diciembre	SDM.	28-12-2020
2. Asignación de un nuevo ID en el componente de obra, para el convenio IDU – SDM.	SDM.	28-12-2020
3. Comité Inter-institucional, para definir intervenciones convenio IDU-SDM.	SDM.	24-12-2020

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 3 - SUR OCCIDENTE

PERIODO: DESDE 15/12/2020 A 21/12/2020 SEMANA: **57**

Consorcio InterSEÑALIZACION

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**	CONTRATO No.	**2019 - 1782**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 4.882.890.333,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 2.440.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 7.323.190.333,00

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS		TOTAL
					PATINETAS	OTROS	
ID ASIGNADOS	21	6	0	189	24	28	268
ID INSPECCIONADOS	21	0	0	189	24	28	262
ID POR INSPECCIONAR	0	0	0	0	0	0	0
ID EN IMPLEMENTACIÓN	2	0	0	1	0	1	4
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	16	6	0	181	24	26	253
ID POR IMPLEMENTAR	3	0	0	7	0	1	10

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR POR SEPARADO		VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$28.987.700	$203.847.546	PATINETAS	$53.855.878	$301.601.550
			OBRA	$247.745.672	
MES 2	$15.694.587	$302.450.440	PATINETAS	$23.142.234	$435.540.543
			OBRA	$412.398.308	
MES 3	$50.906.552	$160.036.785	PATINETAS	$15.513.088	$289.222.050
			OBRA	$273.708.962	
MES 4	$26.177.750	$555.494.979	$581.672.728		
MES 5	$25.601.175	$521.865.954	$547.467.129		
MES 6	$50.453.865	$290.269.932	$444.376.468		
MES 7	$65.242.246	$615.557.486	$746.922.987		
MES 8	$69.446.196	$377.906.324	$447.352.519		
MES 9	$85.041.157	$576.008.263	$661.049.420		
MES 10	$25.874.362	$400.936.858	$427.684.940		
MES 11	$47.730.633	$313.109.721	$433.860.679		
MES 12	$66.066.057	$605.688.352	$671.754.409		
MES 13	$23.003.273	$249.345.363	$272.392.698		
MES 14	$188.906.563	$259.471.972	$448.378.535		
MES 15	$0	$0	$0		
MES 16	$0	$0	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA	**57**		**$6.709.276.654**		

Valor programado	MES 1	$244.144.517	3,24%
Valor ejecutado		$301.601.550	4,12%
Valor programado Acumulado	MES 2	$634.775.743	8,42%
Valor ejecutado		$737.142.092	10,07%
Valor programado Acumulado	MES 3	$1.123.064.777	14,90%
Valor ejecutado		$1.026.364.142	14,02%
Valor programado Acumulado	MES 4	$1.660.182.713	22,03%
Valor ejecutado Acumulado		$1.608.036.871	21,96%
Valor programado Acumulado	MES 5	$2.141.736.725	28,42%
Valor ejecutado		$2.155.504.000	29,43%
SUSPENSION			
Valor programado Acumulado	MES 6	$2.418.958.886	32,10%
Valor ejecutado		$2.599.880.467	35,50%
Valor programado Acumulado	MES 7	$2.956.076.823	39,23%
Valor ejecutado		$3.346.803.454	45,70%
Valor programado Acumulado	MES 8	$3.493.194.759	46,36%
Valor ejecutado		$3.794.155.973	51,81%
Valor programado Acumulado	MES 9	$4.030.312.696	53,49%
Valor ejecutado		$4.455.205.394	60,84%
Valor programado Acumulado	MES 10	$4.567.430.633	60,61%
Valor ejecutado		$4.882.890.334	66,68%
Valor programado Acumulado	MES 11	$4.882.890.333	64,80%
Valor ejecutado		$5.316.751.012	72,60%
Valor programado Acumulado	MES 12	$5.413.390.333	71,84%
Valor ejecutado		$5.988.505.421	81,77%
Valor programado Acumulado	MES 13	$5.943.890.333	78,88%
Valor ejecutado		$6.260.898.119	85,49%
Valor programado Acumulado	MES 14	$6.474.390.333	85,92%
Valor ejecutado		$6.709.276.654	91,62%
Valor programado Acumulado	MES 15	$7.004.890.333	92,96%
Valor ejecutado		$6.709.276.654	91,62%
Valor programado Acumulado	MES 16	$7.535.390.333	100,00%
Valor ejecutado		$6.709.276.654	91,62%
Valor ejecutado semana	57	**$185.360.928**	2,53%
Valor Total Contrato de Obra		$7.323.190.333	100,00%
Valor por ejecutar		$613.913.679	8,38%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	1	NOCTURNA	1		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:			7	DIURNA	1	NOCTURNA	6

OBSERVACIONES:

• Para los días 15 y 19 de Diciembre de 2020 se cancelan todas las actividades programadas, por fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad durante la tarde y gran parte de la noche.

• En el Id MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10 Calle 13 Entre KR 100 hasta KR 135, se instalación 1,926 láminas reflectivas en los New jersey.


• Se han observado cuadrillas de mantenimiento en asfaltos despues de la carrera 123 en la calle 13 calzada sur.

• La intersección de la Av boyacá con calle 71 bis sur, esta en un avance del 50%

• Se instalaron todas las 10 señales de fauna en la via choachi

Dias transcurridos del contrato	419	Dias para terminar el contrato	56	Valor a ejecutar diario	$10.962.744

AVANCE INVERSION CONTRATO 2019-1782
ZONA SUR-OCCIDENTAL

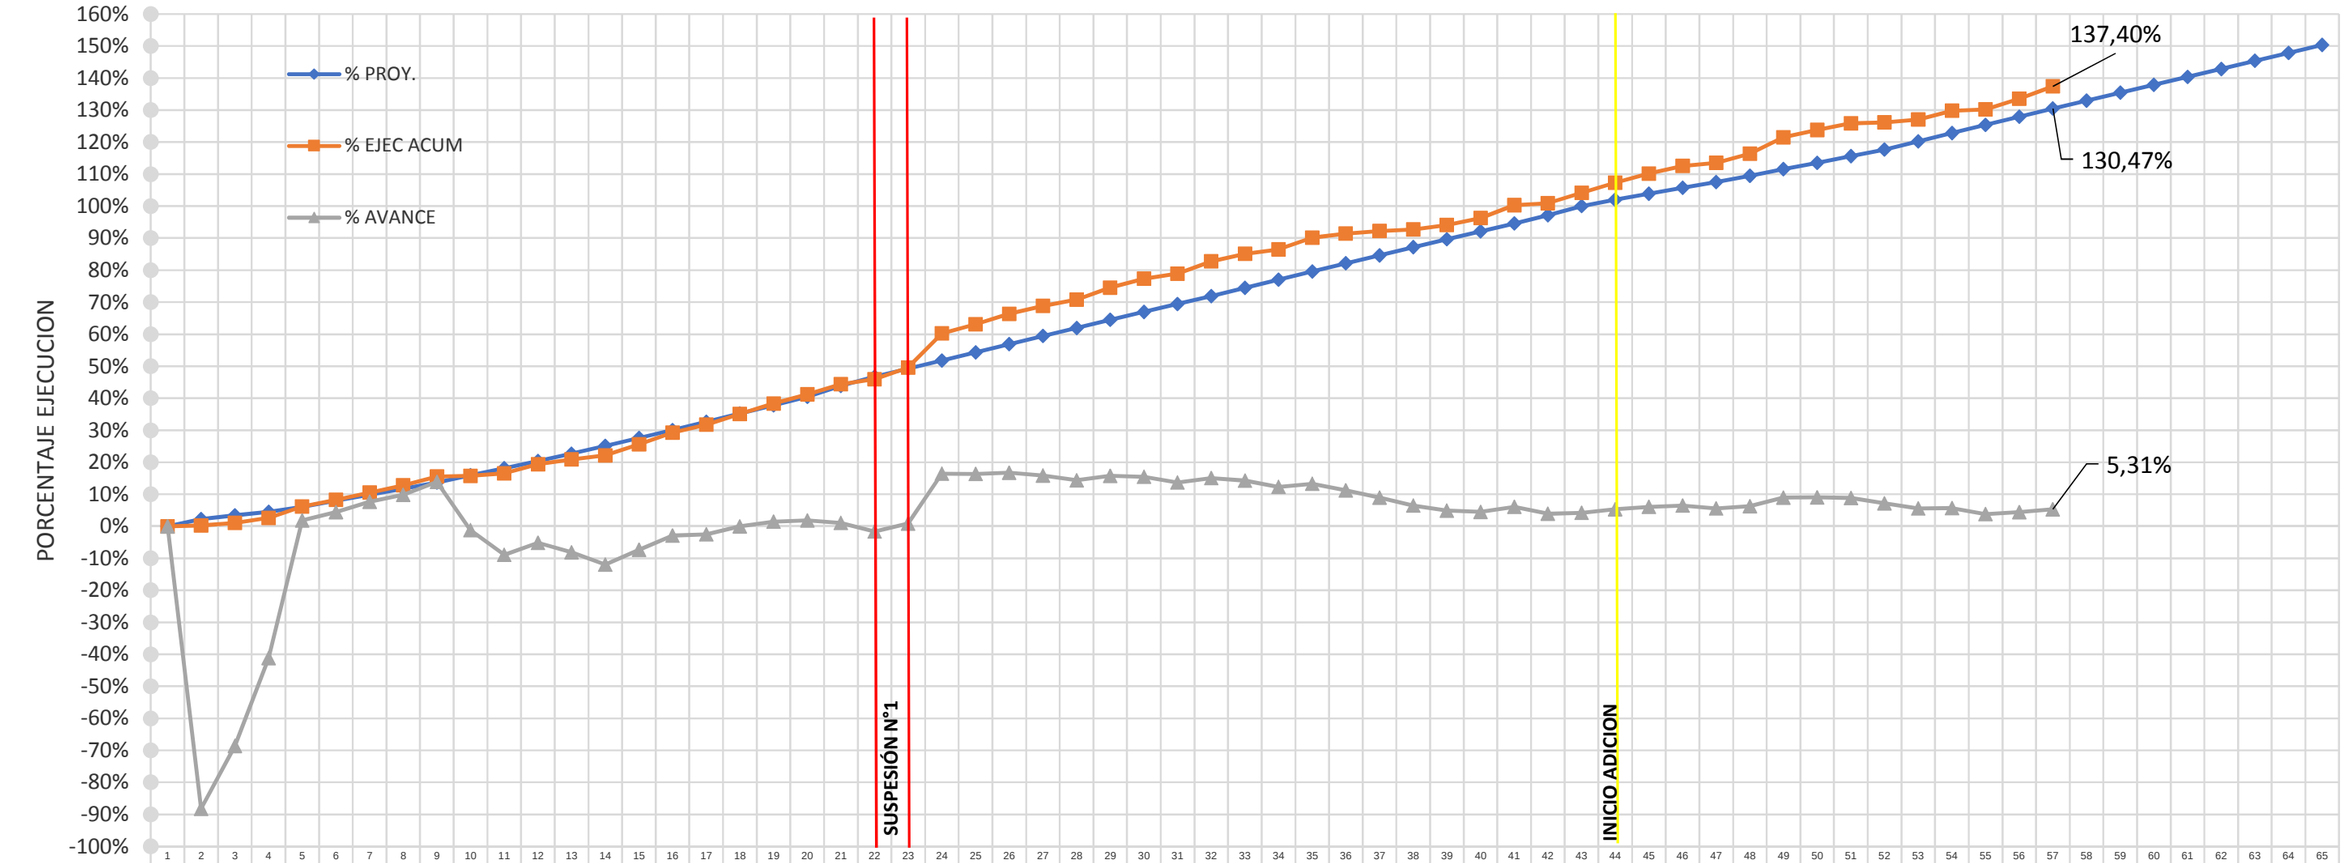

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
% PROY.	0,00%	2,26%	3,39%	4,52%	6,07%	7,93%	9,80%	11,67	13,65	15,90	18,16	20,42	22,68	25,13	27,61	30,10	32,58	35,14	37,79	40,45	43,86	46,70	49,18	51,74	54,31	56,87	59,44	61,96	64,44	66,93	69,41	71,91	74,47	77,04	79,61	82,17	84,67	87,15	89,64	92,12	94,62	97,13	100,0	101,9	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	115,6	117,7	120,2	122,8	125,4	127,9	130,4	132,9	135,4	137,9	140,4	142,8	145,3	147,8	150,3
% EJEC ACUM	0,00%	0,27%	1,06%	2,66%	6,18%	8,28%	10,55	12,82	15,54	15,71	16,54	19,35	20,83	22,12	25,59	29,22	31,77	35,12	38,34	41,20	44,33	45,93	49,62	60,26	63,15	66,38	68,86	70,84	74,60	77,29	78,93	82,73	85,12	86,53	90,16	91,40	92,24	92,76	94,05	96,23	100,3	100,8	104,1	107,3	110,1	112,5	113,5	116,3	121,5	123,8	125,8	126,1	127,0	129,7	130,2	133,6	137,4							
% AVANCE	0,00%	-88,2	-68,6	-41,1	1,81%	4,43%	7,67%	9,87%	13,88	-1,21	-8,95	-5,22	-8,13	-11,9	-7,33	-2,91	-2,48	-0,06	1,44%	1,86%	1,07%	-1,66	0,89%	16,46	16,29	16,71	15,85	14,33	15,75	15,49	13,72	15,06	14,30	12,32	13,25	11,23	8,94%	6,43%	4,93%	4,47%	6,04%	3,88%	4,19%	5,27%	6,11%	6,46%	5,54%	6,25%	8,93%	9,02%	8,84%	7,16%	5,63%	5,65%	3,85%	4,40%	5,31%							

SEMANA 57

Consorcio InterSEÑALIZACION

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CUADRO CONTROL SEMANAL

GEORREFERENCIACION INTERVENTORIA CTO 1802 - 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

GEORREFERENCIACION OBRA • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 57 / CORTE A 22 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	REGISTRO VERTICAL	REGISTRO HORIZONTAL	OBSERVACIONES
1	10	10	0	10	0	10	10	0	0	117	542	APROBADA
2	20	20	0	20	0	20	20	0	0	48	1168	APROBADA
3	31	31	0	31	0	31	31	0	0	307	536	APROBADA
4	21	21	0	21	0	21	21	0	0	124	753	APROBADA
5	9	9	0	9	0	9	9	0	0	107	873	APROBADA
6	5	5	0	4	1	4	4	0	0	204	519	-
7	41	41	0	41	0	40	40	1	0	297	801	-
8	23	23	0	22	1	22	22	0	0	114	937	-
9	20	20	0	19	1	19	19	0	0	430	517	-
10	27	27	0	25	2	25	23	2	0	297	801	-
11	4	4	0	0	2	0	0	2	0	25	450	-
12	10	9	5	0	4	0	0	1	0	57	350	-
13	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	231	220	5	202	21	201	**199**	6	0	2127	8247	-

GEORREFERENCIACION DISEÑO • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 57 / CORTE A 22 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	HA (hectáreas) RECIBIDAS	HA (hectáreas) APROBADAS INTERVENTORIA	HA (hectáreas) APROBADAS SDM	HA (hectáreas) REVISION SDM	HA (hectáreas) REVISION CONTRATISTA	HA (hectáreas) REVISION INTERVENTORIA
MES 3	5	5	0	5	5	5	5	0	0	55,78	55,78	55,78	0	0	0
MES 4	6	6	0	6	0	6	5	1	0	66,75	66,75	42,75	24	0	0
MES 5	2	2	0	1	0	1	1	1	0	49,87	49,87	20,57	29,3	0	0
MES 7	4	4	0	3	0	3	1	2	1	65,61	65,61	53,11	12,5	0	0
MES 8	6	6	0	1	0	3	0	3	1	140,4	140,4	140,4	0	0	0
MES 9	12	12	0	0	0	0	6	5	0	99,78	87,68	71,58	28,2	0	0
MES 10	10	10	0	0	0	1	0	1	7	209,81	181,36	116,06	65,3	28,45	0
MES 12	3	3	0	1	0	0	0	-	-	12,45	3,25	3,25	0	9,2	0
MES 12	6	6	3	1	0	0	0	-	-	95,5	14,6	0	14,6	16	64,9
TOTAL	54	54	3	18	5	19	18	13	9	795,95	665,3	**503,5**	173,9	53,65	64,9

RESPONSABLE

Anny Lopez Fajardo
Georreferenciación Zona Sur Occidente Cto 1802

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 57 **CORTE** 22 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE INVENTARIOS DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 3	A01	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-nov-19	REV. 4	27-dic-19	MES 3	
2	MES 1	SEM. 3	A02	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	18-nov-19	REV. 3	24-dic-19	MES 3	
3	MES 1	SEM. 3	A03	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	18-nov-19	REV. 2	05-dic-19	MES 3	
4	MES 1	SEM. 4	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	25-nov-19	REV. 3	20-dic-19	MES 3	
5	MES 2	SEM. 5	A05	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 3	15-ene-20	MES 3	
6	MES 2	SEM. 7	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	12-dic-19	REV. 3	23-ene-20	MES 3	
7	MES 2	SEM. 8	A07	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	18-dic-19	REV. 2	31-ene-20	MES 4	
8	MES 2	SEM. 8	A08	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	18-dic-19	REV. 3	30-ene-20	MES 4	
9	MES 2	SEM. 8	A09	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	19-dic-19	REV. 2	10-feb-20	MES 4	
10	MES 2	SEM. 8	A10	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
11	MES 3	SEM. 11	A11	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	04-feb-20	MES 4	
12	MES 3	SEM. 11	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	09-ene-20	REV. 2	03-feb-20	MES 4	
13	MES 3	SEM. 12	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	17-ene-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
14	MES 3	SEM. 12	A14	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	20-ene-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
15	MES 4	SEM. 15	A15	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	07-feb-20	REV. 3	12-mar-20	MES 5	**
16	MES 4	SEM. 15	A16	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	10-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
17	MES 4	SEM. 16	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	12-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
18	MES 5	SEM. 18	A18	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	27-feb-20	REV. 2	11-may-20	MES 7	
19	MES 5	SEM. 18	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	02-mar-20	REV. 2	12-may-20	MES 7	
20	MES 5	SEM. 19	A20	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	06-mar-20	REV. 1	13-mar-20	MES 5	
21	MES 5	SEM. 20	A21	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	05-may-20	MES 7	
22	MES 5	SEM. 20	A22	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	13-may-20	MES 7	****
23	MES 5	SEM. 20	A23	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	14-may-20	MES 7	
24	MES 5	SEM. 20	A24	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	26-may-20	MES 7	
25	MES 5	SEM. 20	A25	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	13-mar-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	
26	MES 5	SEM. 21	A26	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-mar-20	REV. 3	28-may-20	MES 7	
27	MES 6	SEM. 23	A27	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	04-jun-20	MES 8	
28	MES 6	SEM. 23	A28	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	23-jun-20	MES 8	****
19	MES 6	SEM. 23	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2	20,00	20,00	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
29	MES 6	SEM. 23	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	27-abr-20	REV. 4	09-jun-20	MES 8	
30	MES 6	SEM. 23	A30	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	27-abr-20	REV. 2	01-jun-20	MES 8	
31	MES 7	SEM. 25	A31	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	12-may-20	REV. 3	02-jun-20	MES 8	
32	MES 7	SEM. 26	A32	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	11-jun-20	REV. 4	16-jun-20	MES 8	****
33	MES 7	SEM. 26	A33	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	18-may-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	*****
19	MES 7	SEM. 27	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE3	20,00	20,00	APROBADO	20-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
34	MES 7	SEM. 27	A34	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	21-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	****
35	MES 7	SEM. 27	A35	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	*** y ****
36	MES 7	SEM. 27	A36	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	09-jul-20	REV. 4	10-jul-20	MES 9	
37	MES 7	SEM. 27	A37	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	24-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	
38	MES 8	SEM. 29	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	07-jul-20	REV. 3	07-jul-20	MES 9	
39	MES 8	SEM. 29	A39	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	29-jul-20	MES 10	
40	MES 8	SEM. 29	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	13-jul-20	MES 9	
41	MES 8	SEM. 29	A41	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 3	10-jul-20	MES 9	***
42	MES 8	SEM. 29	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	17-jul-20	REV. 3	17-jul-20	MES 9	******
43	MES 8	SEM. 29	A43	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	14-jul-20	REV. 2	15-jul-20	MES 9	*******
44	MES 8	SEM. 29	A44	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	21-jul-20	REV. 3	21-jul-20	MES 9	********
45	MES 8	SEM. 29	A45	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	05-ago-20	REV. 4	06-ago-20	MES 10	********
46	MES 8	SEM. 31	A46	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	23-jul-20	REV. 3	24-jul-20	MES 9	
47	MES 8	SEM. 32	A47	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	27-jul-20	MES 9	
48	MES 10	SEM. 37	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	01-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	a
49	MES 11	SEM. 43	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	02-oct-20	REV. 2	02-oct-20	MES 11	
50	MES 11	SEM. 43	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	14-sep-20	REV. 3	14-oct-20	MES 11	
51	MES 11	SEM. 44	A51	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
52	MES 11	SEM. 45	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	20-oct-20	REV. 3	20-oct-20	MES 12	
53	MES 11	SEM. 45	A53	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-oct-20	REV. 2	14-oct-20	MES 11	
54	MES 11	SEM. 45	A54	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	APROBADO	20-nov-20	REV. 2	20-nov-20	MES 13	c
55	MES 12	SEM. 46	A55	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
56	MES 12	SEM. 46	A56	MV_08_261_1244_11_V2	19,80	19,80	APROBADO	19-nov-20	REV. 3	20-nov-20	MES 13	b
57	MES 12	SEM. 47	A57	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	09-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
58	MES 12	SEM. 47	A58	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
59	MES 12	SEM. 48	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	APROBADO	24-oct-20	REV. 3	24-nov-20	MES 13	
60	MES 12	SEM. 48	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	APROBADO	20-oct-20	REV. 2	23-nov-20	MES 13	
61	MES 12	SEM. 48	A61	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	APROBADO	21-dic-20	REV. 3	21-dic-20	MES 14	
62	MES 12	SEM. 49	A62	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	16-dic-20	REV. 2	16-dic-20	MES 14	
63	MES 12	SEM. 49	A63	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	APROBADO	16-dic-20	REV. 2	16-dic-20	MES 14	
64	MES 12	SEM. 49	A64	EX_08_333_1867_12_V3	7,50	7,50	APROBADO	10-dic-20	REV. 2	16-dic-20	MES 14	
65	MES 12	SEM. 49	A65	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	APROBADO	09-dic-20	REV. 2	11-dic-20	MES 14	
66	MES 13	SEM. 52	A66	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	APROBADO	16-dic-20	REV. 3	16-dic-20	MES 14	
67	MES 13	SEM. 53	A67	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	APROBADO	18-dic-20	REV. 4	18-dic-20	MES 14	
68	MES 13	SEM. 53	A68	EM_08_124_V11	16,80	16,80	APROBADO	18-dic-20	REV. 3	18-dic-20	MES 14	
69	MES 14	SEM. 55	A69	EX_08_305_1867_12_V2	8,30	8,30	INTERVENTORIA	03-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
70	MES 14	SEM. 55	A70	EX_08_315_1867_12_V1	4,00	4,00	INTERVENTORIA	04-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
71	MES 14	SEM. 55	A71	EX_09_218_1556_10_V4	4,00	4,00	INTERVENTORIA	04-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
72	MES 14	SEM. 56	A72	EX_09_185_1249_11_V7	10,67	10,67	INTERVENTORIA	09-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
73	MES 14	SEM. 56	A73	EX_08_212_1556_10_V5	2,50	2,50	INTERVENTORIA	09-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
74	MES 14	SEM. 56	A74	EX_09_219_1881_12_V6	11,90	11,90	INTERVENTORIA	09-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE INVENTARIO DE DISEÑOS. ZONA SW

* En la Revisión 1 se detecta que está incompleto el Registro Fotográfico-RF entregado en 3 CDs y el contratista entrega en Comité del 11/03/2020 3 CDs con este RF faltante; una vez aprobado y con VoBo de la SDM se le autorizó al contratista a presentar de manera parcial el Diseño

** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)

**** Falta VoBo de la SDM

***** La meta cambió de 5,08Ha a 5,3Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba - Correo SDM del 28/05/2020)

*** Cambia la meta de 8,5Ha a 5,15Ha por disminución de ZI

****** La meta cambió de 20,10Ha a 20,18 Ha por nueva medición de la ZI

******* Cambia la meta de 3,20Ha a 3,25Ha por ampliación de ZI para empalmes

******** La meta cambió de 30,13Ha a 28,45 Ha por ajuste de la ZI

******** Cambia la meta de 6,60Ha a 7,00Ha por ajuste equivalencias

a Se ajustó la meta de 2,5Ha a 6,7Ha por ajuste de equivalencias

b Se ajustó la meta de 17,9Ha a 19,8 Ha por ajuste de equivalencias

c Se ajustó la meta de 38,9Ha a 38,4Ha por ajuste de la meta al no incluir el tramo de la KR73

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 57 **CORTE** 22 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICAS **SEMANA** 57 **CORTE** 22 Dic./2020

INVENTARIOS ENTREGADOS / APROBADOS


	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	74	1041,73
INVENTARIOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	68	1000,36
INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	6	41,37

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	6	41,37	41,37	0,00	0,00	**1000,36**
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	**41,37**	**41,37**	**0,00**	**0,00**	

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha INVENTARIADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		INVENTARIADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	3,4	0,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	6,8	1,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	10,2	1,5%	12,50	12,50	1,8%	-	-	0,0%
4	18 NOV - 25 NOV	13,6	2,0%	19,28	31,78	4,6%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	16,72	2,4%	2,50	34,28	5,0%	-	-	0,0%
6	03 DIC - 09 DIC	19,84	2,9%	-	34,28	5,0%	2,50	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,96	3,3%	21,50	55,78	8,1%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	26,08	3,8%	40,25	96,03	13,9%	19,28	21,78	3,2%
9	24 DIC - 30 DIC	29,2	4,2%	-	96,03	13,9%	10,00	31,78	4,6%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,95	6,4%	-	96,03	13,9%	-	31,78	4,6%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	58,7	8,5%	26,50	122,53	17,7%	-	31,78	4,6%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	73,45	10,6%	31,80	154,33	22,3%	2,50	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	88,2	12,8%	-	154,33	22,3%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	112,06	16,2%	-	154,33	22,3%	40,25	96,03	13,9%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	135,92	19,7%	30,57	184,90	26,8%	26,50	122,53	17,7%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	159,78	23,1%	50,61	235,51	34,1%	-	122,53	17,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	183,64	26,6%	-	235,51	34,1%	2,50	125,03	18,1%
18	25 FEB/20 - 02 MAR/20	207,50	30,0%	86,10	321,61	46,5%	49,87	174,90	25,3%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	259,93	37,6%	2,50	324,11	46,9%	-	174,90	25,3%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	312,37	45,2%	16,80	340,91	49,3%	63,11	238,01	34,4%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	364,80	52,8%	12,10	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	397,35	57,5%	-	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	429,90	62,2%	46,00	399,01	57,7%	-	238,01	34,4%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	462,45	66,9%	-	399,01	57,7%	2,50	240,51	34,8%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	495,00	71,6%	11,01	410,02	59,3%	86,10	326,61	47,3%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	515,35	74,6%	15,30	425,32	61,6%	7,50	334,11	48,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	535,70	77,5%	63,52	488,84	70,7%	24,20	358,31	51,9%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	556,05	80,5%	-	488,84	70,7%	16,01	374,32	54,2%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	576,40	83,4%	109,38	598,22	86,6%	18,50	392,82	56,8%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	594,43	86,0%	-	598,22	86,6%	57,37	450,19	65,2%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	612,47	88,6%	60,40	658,62	95,3%	2,50	452,69	65,5%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	625,35	90,5%	32,63	691,25	100,0%	7,00	459,69	66,5%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	648,53	93,9%	-	691,25	100,0%	17,15	476,84	69,0%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	656,18	95,0%	-	691,25	100,04%	68,95	545,79	79,0%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	663,82	96,1%	-	691,25	100,04%	30,43	576,22	83,4%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	671,47	97,2%	-	691,25	100,04%	54,33	630,55	91,3%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	679,11	98,3%	6,70	697,95	101,01%	32,25	662,80	95,9%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	686,76	99,4%	-	697,95	101,01%	28,45	691,25	100,04%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	687,61	99,5%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	688,82	99,69%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	689,30	99,76%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	690,14	99,88%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	13,50	711,45	102,96%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	697,084	100,88%	72,78	784,23	113,49%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	703,176	101,76%	38,40	822,63	119,05%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	709,269	102,65%	59,40	882,03	127,65%	9,20	700,45	101,37%
47	07 OCT/20 - 13 OCT/20	715,361	103,53%	25,30	907,33	131,31%	-	700,45	101,37%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	734,161	106,25%	28,21	935,54	135,39%	30,60	731,05	105,80%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	752,961	108,97%	22,50	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	771,761	111,69%	-	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	790,561	114,41%	-	958,04	138,65%	118,08	849,13	122,89%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	809,361	117,13%	14,72	972,76	140,78%	-	849,13	122,89%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	835,361	120,89%	27,60	1.000,36	144,77%	82,61	931,74	134,84%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	861,361	124,66%	-	1.000,36	144,77%	-	931,74	134,84%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	887,361	128,42%	16,30	1.016,66	147,13%	-	931,74	134,84%
56	09 DIC/20 - 15 DIC/20	913,361	132,18%	25,07	1.041,73	150,76%	8,50	940,24	136,07%
57	16 DIC/20 - 22 DIC/20	936,111	135,47%	-	1.041,73	150,76%	60,12	1.000,36	144,77%

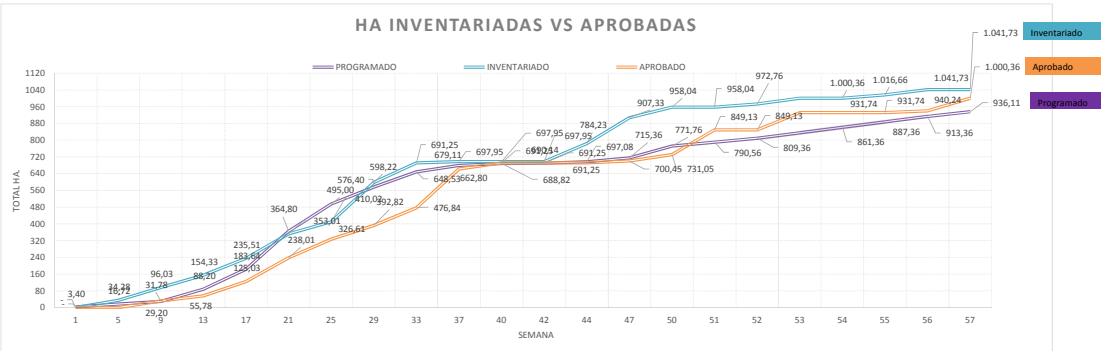

INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 57 **CORTE** 22 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 3	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 4	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 5	A01	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	05-dic-19	REV. 2	05-dic-19	MES 2	
2	MES 2	SEM. 6	A02	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 1	15-ene-20	MES 3	
3	MES 2	SEM. 6	A03	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	24-dic-19	REV. 3	24-dic-19	MES 2	
4	MES 2	SEM. 8	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	20-ene-20	MES 3	
5	MES 2	SEM. 9	A05	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	27-dic-19	REV. 1	27-dic-19	MES 2	
6	MES 3	SEM. 13	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	23-ene-20	REV. 1	28-ene-20	MES 3	
7	MES 4	SEM. 14	A07	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	30-ene-20	REV. 1	10-feb-20	MES 4	
8	MES 4	SEM. 14	A08	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
9	MES 4	SEM. 14	A09	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	03-feb-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
10	MES 4	SEM. 15	A10	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	11-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
11	MES 4	SEM. 16	A11	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	12-feb-20	REV. 1	17-feb-20	MES 4	
12	MES 4	SEM. 17	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	19-feb-20	REV. 1	28-feb-20	MES 4	
13	MES 4	SEM. 17	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	24-feb-20	REV. 1	09-mar-20	MES 5	
14	MES 4	SEM. 18	A14	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	25-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
15	MES 5	SEM. 19	A15	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	05-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
16	MES 5	SEM. 19	A16	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
17	MES 5	SEM. 20	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	08-may-20	MES 7	
18	MES 5	SEM. 20	A18	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	16-mar-20	REV. 4	08-may-20	MES 7	****
19	MES 7	SEM. 25	A19	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	12-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
20	MES 7	SEM. 26	A20	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	13-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
21	MES 7	SEM. 26	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	13-may-20	REV. 1	09-jun-20	MES 8	***
22	MES 7	SEM. 26	A22	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	19-may-20	REV. 4	18-jun-20	MES 8	
23	MES 7	SEM. 27	A23	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	19-may-20	REV. 1	01-jun-20	MES 8	
24	MES 7	SEM. 27	A24	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	24-jun-20	REV. 4	25-jun-20	MES 8	*****
25	MES 8	SEM. 27	A24	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	03-jul-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	
26	MES 8	SEM. 29	A25	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	04-jun-20	REV. 2	07-jul-20	MES 9	
27	MES 8	SEM. 30	A26	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	08-jul-20	REV. 2	08-jul-20	MES 9	
21	MES 8	SEM. 31	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2y3	40,00	40,00	APROBADO	25-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	****
28	MES 8	SEM. 31	A27	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
29	MES 8	SEM. 31	A28	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	19-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	****
30	MES 8	SEM. 31	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	03-jul-20	MES 9	****
31	MES 8	SEM. 31	A30	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-jun-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	****
32	MES 8	SEM. 31	A32	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	03-jul-20	REV. 2	03-jul-20	MES 9	******
33	MES 8	SEM. 32	A33	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	14-jul-20	MES 9	
34	MES 8	SEM. 32	A34	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	26-jun-20	REV. 1	03-jul-20	MES 9	******
35	MES 9	SEM. 33	A35	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	10-jul-20	REV. 2	10-jul-20	MES 9	
36	MES 9	SEM. 34	A36	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	22-jul-20	REV. 3	22-jul-20	MES 9	
37	MES 9	SEM. 34	A37	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	10-ago-20	REV. 5	10-ago-20	MES 10	
38	MES 9	SEM. 34	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	13-ago-20	REV. 2	13-ago-20	MES 10	------- *
39	MES 9	SEM. 34	A39	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	11-ago-20	REV. 4	16-ago-20	MES 10	
40	MES 9	SEM. 35	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 4	17-ago-20	MES 10	
41	MES 9	SEM. 35	A41	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	05-ago-20	REV. 2	05-ago-20	MES 10	
42	MES 9	SEM. 36	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	18-ago-20	REV. 4	18-ago-20	MES 10	
43	MES 9	SEM. 36	A43	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	17-ago-20	MES 10	
44	MES 10	SEM. 37	A44	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	13-ago-20	MES 10	*******
45	MES 10	SEM. 37	A45	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	17-ago-20	REV. 3	18-ago-20	MES 10	
46	MES 10	SEM. 37	A46	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	14-ago-20	REV. 2	17-ago-20	MES 10	
47	MES 10	SEM. 38	A47	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 2	18-ago-20	MES 10	
48	MES 12	SEM. 48	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
49	MES 12	SEM. 48	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
50	MES 12	SEM. 48	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 3	04-nov-20	MES 13	
51	MES 12	SEM. 48	A51	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	04-nov-20	REV. 2	04-nov-20	MES 13	
52	MES 12	SEM. 49	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	05-nov-20	REV. 2	05-nov-20	MES 13	
53	MES 13	SEM. 51	A53	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	27-nov-20	REV. 4	27-nov-20	MES 13	
54	MES 13	SEM. 51	A54	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	27-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
55	MES 13	SEM. 51	A55	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	26-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
56	MES 13	SEM. 52	A56	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	08-dic-20	REV. 5	08-dic-20	MES 14	
57	MES 13	SEM. 54	A57	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	CONTRATISTA	25-nov-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
58	MES 13	SEM. 54	A58	MV_08_261_1244_11_V2	20,80	20,80	CONTRATISTA	25-nov-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
59	MES 13	SEM. 54	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	MOVILIDAD	26-nov-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
60	MES 13	SEM. 54	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	INTERVENTORIA	27-nov-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
61	MES 14	SEM. 56	A61	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	INTERVENTORIA	14-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
62	MES 14	SEM. 57	A62	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	INTERVENTORIA	18-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
63	MES 14	SEM. 57	A63	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	INTERVENTORIA	18-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
64	MES 14	SEM. 57	A64	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	INTERVENTORIA	18-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
65	MES 14	SEM. 57	A65	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	INTERVENTORIA	21-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	
66	MES 14	SEM. 57	A66	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	INTERVENTORIA	22-dic-20	REV. 1	22-dic-20	MES 14	

INFORME ESTADO DE DISEÑOS. ZONA SW

* El contratista no lo cobró en el segundo mes
** Aprobado por interventoría; falta VoBo de SDM.
*** Aprobación parcial de 113Ha; no se puede facturar
**** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba) Falta VoBo de la SDM
La meta cambió de 70,5Ha a 73,0Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba)
***** La meta cambió de la originalmente presentada y de 4,18Ha a 4,30Ha
****** La meta cambió de la originalmente presentada en Inventario y pasa de 15,20Ha a 14,90Ha
******* La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 32,20Ha a 32,25Ha
******** La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 11,75Ha a 12,00Ha
NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
META CONTRATO INICIAL: 690,991 Ha
META ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 AL CONTRATO INICIAL: 347,37 Ha
META FINAL CONTRATO: 1038,61 Ha

ESTADISTICAS SEMANA 57 CORTE 22 Dic./2020

DISEÑOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**66**	**977,06**
DISEÑOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**56**	849,13
DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	10	127,93

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	2	59,20	59,20	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	7	54,32	54,32	0,00	0,00	**849,13**
EN PODER DE MOVILIDAD	1	14,41	14,41	0,00	0,00	
	10	**127,93**	**127,93**	**0,00**	**0,00**	


INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 57 **CORTE** 22 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha DISEÑADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		DISEÑADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	2,55	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	5,1	0,7%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	7,65	1,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
4	19 NOV - 25 NOV	10,2	1,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	14,4	2,1%	2,50	2,50	0,4%	2,50	2,50	0,4%
6	03 DIC - 09 DIC	18,6	2,7%	7,50	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,8	3,3%	-	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	27	3,9%	19,28	29,28	4,2%	-	2,50	0,4%
9	24 DIC - 30 DIC	31,2	4,5%	5,00	34,28	5,0%	10,00	12,50	1,8%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,2	6,3%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	55,3	8,0%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	67,3	9,7%	-	34,28	5,0%	21,78	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	79,3	11,5%	21,50	55,78	8,1%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	99,5	14,4%	37,75	93,53	13,5%	-	55,78	8,1%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	119,7	17,3%	-	93,53	13,5%	29,45	85,23	12,3%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	139,9	20,2%	26,50	120,03	17,4%	2,50	87,73	12,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	160,1	23,2%	31,80	151,83	22,0%	5,80	93,53	13,5%
18	25 FEB/20 -02 MAR/20	180,3	26,1%	20,57	172,40	24,9%	29,00	122,53	17,7%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	216,2	31,3%	5,00	177,40	25,7%	29,30	151,83	22,0%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	252,2	36,5%	60,61	238,01	34,4%	20,57	172,40	24,9%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	288,1	41,7%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	315,2	45,6%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	342,4	49,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	369,5	53,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	396,6	57,4%	13,10	251,11	36,3%	65,61	238,01	34,4%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	422,5	61,1%	87,30	338,41	49,0%	-	238,01	34,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	448,5	64,9%	-	338,41	49,0%		238,01	34,4%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	474,4	68,7%	5,30	343,71	49,7%	18,10	256,11	37,1%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	500,3	72,4%	5,00	348,71	50,5%	73,00	329,11	47,6%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	523,3	75,7%	2,50	351,21	50,8%	-	329,11	47,6%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	546,2	79,0%	88,98	440,19	63,7%	5,00	334,11	48,4%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	562,6	81,4%	12,50	452,69	65,5%	44,30	378,41	54,8%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	592,1	85,7%	7,00	459,69	66,5%	61,78	440,19	63,7%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	606,4	87,8%	59,65	519,34	75,2%	19,50	459,69	66,5%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	620,7	89,8%	56,88	576,22	83,4%	18,50	478,19	69,2%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	635,0	91,9%	-	576,22	83,4%	-	478,19	69,2%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	649,3	94,0%	86,58	662,80	95,9%	-	478,19	69,2%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	663,6	96,0%	28,45	691,25	100,04%	5,15	483,34	69,9%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	669,0	96,8%	-	691,25	100,04%	207,91	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	676,9	97,96%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	680,02	98,41%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	685,5	99,21%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	694,741	100,54%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	698,491	101,09%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	702,241	101,63%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
47	06 OCT/20 - 13 OCT/20	705,991	102,17%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	720,991	104,34%	25,20	716,45	103,68%	-	691,25	100,04%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	735,991	106,51%	14,60	731,05	105,80%	9,20	700,45	101,37%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	750,991	108,68%	-	731,05	105,80%	-	700,45	101,37%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	765,991	110,85%	47,70	778,75	112,70%	30,60	731,05	105,80%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	780,991	113,02%	70,38	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	804,741	116,46%	-	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	828,491	119,90%	83,61	932,74	134,99%	64,90	795,95	115,19%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	852,241	123,34%	-	932,74	134,99%	53,18	849,13	122,89%
56	09 DIC/20 - 15 DIC/20	875,991	126,77%	8,50	941,24	136,22%	-	849,13	122,89%
57	16 DIC/20 - 22 DIC/20	902,241	130,57%	35,82	977,06	141,40%	-	849,13	122,89%

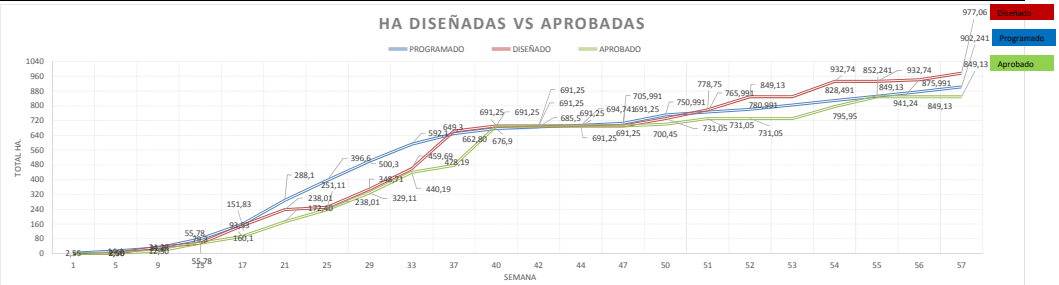

FACTURACION VALOR HA $ 610.876,00

FACTURACION	Ha DISEÑADAS	Ha APROB. EN FISICO	Ha APROB. DIG. INTERV.	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	VALOR MENSUAL		VALOR ACUMULADO	
					Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM
MES 1	2,50	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 2	10,00	12,50	-	-	$ 7.635.950,00	$ -	$ 7.635.950,00	$ -
MES 3	43,28	43,28	-	-	$ 26.438.713,00	$ -	$ 34.074.663,00	$ -
MES 4	116,62	66,75	-	-	$ 40.775.973,00	$ -	$ 74.850.636,00	$ -
MES 5	65,61	49,87	-	-	$ 30.464.386,12	$ -	$ 105.315.022,12	$ -
MES 6	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 7	100,40	65,61	-	-	$ 40.079.574,36	$ -	$ 145.394.596,48	$ -
MES 8	114,28	140,40	-	-	$ 85.766.990,40	$ -	$ 231.161.586,88	$ -
MES 9	123,53	99,78	-	-	$ 60.953.207,28	$ -	$ 292.114.794,16	$ -
MES 10	115,03	213,06	-	-	$ 130.153.240,56	$ -	$ -	$ -
MES 11	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 12	39,80	9,20	-	-	$ 5.620.059,20	$ -	$ -	$ -
MES 13	201,69	95,50	-	-	$ 58.338.658,00	$ -	$ -	$ -
MES 14	44,32	53,18	-	-	$ 32.486.385,68	$ -	$ -	$ -
SUB-TOTAL CONTRATO	**977,06**	**849,13**	**0,00**	**0,00**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 57 **DEL** 15/12/2020 **AL** 21/12/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1782-2019 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Revisión SDM_318531_2019 despues de transcurrido 50 % de implementación



Descripción Foto 2.

Revisión SDM_318531_2019 despues de transcurrido 50 % de implementación



Descripción Foto 3.

Revisión CLM-180323_000003 visita 20%_50% y 70%se evidencia desprendimiento de pintura



Descripción Foto 4.

Revisión CLM-180323_000003 visita 20%_50% y 70%se evidencia desprendimiento de pintura



Descripción Foto 5.

Revisión 50% en compromiso CLM-181114-000025, en donde se evidencia falta de EP



Descripción Foto 6.

Revisión 50% en compromiso CLM-181114-000025

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 57 (consecutivo) **DEL** 15/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 21-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra con IVA)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		-
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	-
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

FRENTES TERMINADOS PARA APLICACIÓN GARANTIAS

No	ID	CP	UPZ	LOCALIDAD	Tipo de implementación	SEÑALES VERTICALES			SEÑALES horizontales																										
						Dias de garantia	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	M2 (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	ML (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	bordillos trasnsmilicos (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Techos (Dias garantias)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Tacheones (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Hitos (Dias garantias)	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	Boyas(Dias garan	Fecha implementacion	Porcentaje a la fecha	AGREBADO (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	RESALTOS (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	Estopariras (Dias garantias)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha
1	EX_02_038_1556_10	ID 82	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	27/11/2019	128,22%	304	27/11/2019	128,22%	426	27/11/2019	91,59%	633	27/11/2019	61,64%	426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,6%								
2	EX_02_201_1881_12	ID 162	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal				304	15/11/2019	132,16%	304	15/11/2019	132,16%				593	0/01/1900	67,78%				426	15/11/2019	94,40%	426	15/11/2019	94,4%								
3	EX_02_201_1881_12	ID 163	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	22/11/2019	129,86%	304	22/11/2019	129,86%				633	0/01/1900	62,43%				426	22/11/2019	92,76%	426	22/11/2019	92,8%								
4	EX_02_201_1881_12	ID16	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	24/11/2019	129,21%	304	24/11/2019	129,21%				633	0/01/1900	62,12%				426	24/11/2019	92,29%	426	24/11/2019	92,3%								
5	EX_02_201_1881_12	ID 15	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	19/11/2019	130,85%	304	19/11/2019	130,85%				633	0/01/1900	62,91%				426	19/11/2019	93,48%	426	19/11/2019	93,5%								
6	MV_09_048_1556_10	CARRA 13	90- Fontibón	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	21,48%																												
7	MV_09_024_1249_11	CARRA 13	16-puente aranda 112-granjaripjas techo 113-Bavaria 111- Puente aranda	75 - Fontibón16-Puente	Vertical	1825	25/11/2019	21,48%																												
8	MV_09_189_1556_10	CARRA 13	76- Fontibon san pablo	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	21,48%																												
9	EX_02_201_1881_12	ID 19	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	25/11/2019	128,88%	304	25/11/2019	128,88%				633	25/11/2019	61,96%				426	25/11/2019	92,05%	426	25/11/2019	92,1%								
10	EX_02_192_1881_12	ID 18	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	27/11/2019	128,22%	304	27/11/2019	128,22%				633	27/11/2019	61,64%	426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,6%								
11	EX_02_201_1881_12	ID 97	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	27/11/2019	128,22%	304	27/11/2019	128,22%				633	27/11/2019	61,64%				426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,6%								
12	EX_02_180_1881_12	ID 23	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	24/11/2019	129,21%	304	24/11/2019	129,21%				633	24/11/2019	62,12%				426	24/11/2019	92,29%	426	24/11/2019	92,3%								
13	EX_02_038_1556_10	ID 26	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	30/11/2019	21,21%	304	27/11/2019	128,22%	304	27/11/2019	128,22%				633	27/11/2019	61,64%				426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,6%	487	27/11/2019	80%						
14	EX_02_201_1881_12	ID 10	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	27/11/2019	128,22%	304	27/11/2019	128,22%				633	27/11/2019	61,64%				426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,6%								
15	EX_02_192_1881_12	ID 186	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	27/11/2019	128,22%	304	27/11/2019	128,22%				633	27/11/2019	61,64%				426	27/11/2019	91,59%	426	27/11/2019	91,6%								
16	EX_02_038_1556_10	ID 159	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,48%	304	27/11/2019	128,22%	304	29/11/2019	128,22%				633	27/11/2019	61,64%				426	27/11/2019	91,59%	426	21/11/2019	93,0%								
17	MV_09_019_1249_11	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	27/11/2019	106,85%																						
18	EX_09_200_1881_12	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	15/11/2019	110,14%																						
19	EX_09_031_1556_10	ATAHUALPA	0	09_Fontibon	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	821	26/12/2019	43,96%	821	26/12/2019	43,96%				554	26/12/2019	65,21%																	
20	MV_09_424_947_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	106,85%																						
21	EX_13_002_1556_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	100,55%																						
22	EX_02_185_1881_12	ID 182	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	213	12/12/2019	176,13%	213	12/12/2019	176,13%				514	12/12/2019	72,95%				335	12/12/2019	112,08%	335	12/12/2019	112,1%								
23	EX_02_038_1556_10	ID 110	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	365	12/12/2019	102,74%	365	12/12/2019	102,74%				949	12/12/2019	39,52%				548	12/12/2019	68,49%	548	12/12/2019	68,5%								
24	EX_02_038_1556_10	ID 167	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	213	12/12/2019	176,13%	213	12/12/2019	176,13%				514	12/12/2019	72,95%				335	12/12/2019	112,08%	335	12/12/2019	112,1%								
25	EX_02_038_1556_10	ID 30	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	213	12/12/2019	176,13%	213	12/12/2019	176,13%				475	12/12/2019	79,03%				304	12/12/2019	123,29%	304	12/12/2019	123,3%								
26	EX_02_201_1881_12	ID 160	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	274	12/12/2019	136,99%	274	12/12/2019	136,99%				593	12/12/2019	63,22%				304	12/12/2019	123,29%	304	12/12/2019	123,3%								
27	EX_02_185_1881_12	ID 29	Chico lago	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	243	16/12/2019	152,47%	243	16/12/2019	152,47%				475	16/12/2019	78,19%				365	16/12/2019	101,64%	365	16/12/2019	101,6%								
28	MV_13_168_1249_11	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	100,55%																						
29	EX_13_001_1556_10	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	100,55%																						
30		ATAHUALPA	Fontibon	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,27%	821	26/12/2019	43,96%	821	26/12/2019	43,96%				554	26/12/2019	65,21%																335	16/12/2019	111%
31	EX_02_033_1556_001	ID13	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	365	3/01/2020	96,71%	365	3/01/2020	96,71%				870	3/01/2020	40,58%				517	3/01/2020	68,27%	517	3/01/2020	68,3%								
32	sc_02_166_v1	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	horizontal							365	3/01/2020	96,71%										548	29/12/2019	65,39%										
33	EX_02_356_946_10	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	335	3/01/2020	105,50%	335	3/01/2020	105,50%				909	3/01/2020	38,81%				487	3/01/2020	72,53%	487	3/01/2020	72,5%								
34	EX_18_158_1244_11	0	Rafael uribe	0	horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	335	20/01/2020	100,42%	335	20/01/2020	100,42%																						
35	EX_09_214_1881_12_V2	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							350	8/01/2020	99,49%																						
36	CLM-181002-000006	0	0	Tunjuelito	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	578	20/01/2020	58,14%	548	20/01/2020	61,37%																						
37	CP_CLM-181114-000025	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	882	27/01/2020	37,30%	852	27/01/2020	38,63%																				633	27/01/2020	52%
38	CP_CLM-181114-000013	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,03%	821	27/01/2020	40,06%	1095	27/01/2020	30,05%																				913	27/01/2020	36%
39	CP_SDM-236118-19	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	213	27/02/2020	139,96%	335	27/02/2020	89,07%																				274	27/02/2020	109%
40	MV_AV_CALI_941_09_ AMERICAS Y ESPERANZA	0	Kennedy	Castilla	horizontal				365	27/02/2020	81,64%	365	27/02/2020	81,64%																						
41	SDM-299509-18	0	Kennedy	Castilla	horizontal				578	27/02/2020	51,56%	578	27/02/2020	51,56%																						
42	Solicitud gerente localidad	0	tunjuelito	Tunjuelito	horizontal				730	21/01/2020	45,89%	669	21/01/2020	50,06%																				633	14/01/2020	54%
43	MV_08_001_1703_10	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	487	27/02/2020	61,23%	335	27/02/2020	89,07%				304	27/02/2020	97,97%	304	27/02/2020	97,97%	213	27/02/2020	139,96%								304	27/02/2020	98%
44	CP_SDM-DSC-136240-18	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	28/02/2020	16,27%																												
45	CP_SDM-76913-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	17,37%	669	27/02/2020	44,53%	608	27/02/2020	48,99%																				633	4/02/2020	51%	395	27/02/2020	75%

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 57 (Consecutivo) **DEL** 15/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 21-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 7.957.500.000
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 7.957.500.000
Plazo Inicial	15 MESES
Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15 MESES
Fecha de Iniciación	29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial	15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.061.619.391
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 2.061.619.391
Plazo Inicial	16MESES
Plazo Prorroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15MESES
Fecha de Iniciación	29/10/2019
Fecha de Terminación	16/03/2021

2. GARANTIAS

46	CP_SDM-29716-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	17,37%																			791	27/05/2020	26%				
47	CP_SQDS-1387272019	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	578	27/02/2020	51,56%	730	27/02/2020	44,52%													578	14/01/2020	59%				593	14/01/2020	58%
48	EX_08_338_1867_12_V4	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	548	27/02/2020	54,43%	548	27/02/2020	54,43%																			395	27/02/2020	75%
49	SDQS 18919622018	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	213	27/02/2020	139,96%	213	27/02/2020	139,96%																			395	31/01/2020	82%
50	CP_SDM-DSVCT-7089-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	183	27/02/2020	163,29%	183	27/02/2020	163,29%				243	27/02/2020	122,47%	183	27/02/2020	163,29%											
51	EM_08_124	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/05/2020	11,40%	578	27/05/2020	35,99%	456	27/05/2020	45,59%													213	4/05/2020	108%				426	4/05/2020	54%
52	EX_09_200_1881_12_V2	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	426	27/02/2020	69,98%	426	27/02/2020	69,98%				183	27/02/2020	163,29%	304	27/02/2020	97,97%	243	27/02/2020	122,47%				304	27/02/2020	98%				243	27/02/2020	122%
53	SSDQS-1383742018	0	Fontibon	0	horizontal																											304	27/02/2020	98%
54	EX_08_323_1867_12	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,33%	365	27/02/2020	81,64%	426	27/02/2020	69,98%																			277	27/02/2020	108%
55	EX_08_042_1556_10	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	28/03/2020	14,68%	669	28/03/2020	40,05%																							
56	EX_08_327_1867_10	ZONA ESCOLAR	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	7/03/2020	15,84%	213	28/03/2020	125,87%	213	28/03/2020	125,87%																			277	28/03/2020	97%
57	EX_08_329_1867_12	ZONA ESCOLAR	patio bonito	Kennedy	Vertical horizontal	1825	28/04/2020	12,99%	426	28/04/2020	55,66%	426	28/04/2020	55,66%																					
58	SDM_DSC_83051_18	0	Carvajal	Kennedy	horizontal	1825	23/03/2020	14,96%																			514	23/03/2020	53%						
59	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y AMERICAS)	0	Kennedy	0	horizontal							365	24/04/2020	66,03%																				
60	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y CALLE 59S)	0	Kennedy	0	horizontal							365	26/04/2020	65,48%																				
61	SDM-294379-18	0	Kennedy	0	horizontal				183	29/04/2020	129,31%																							
62	SDM_316509_18	0	Kennedy	0	horizontal																						487	27/04/2020	49%					
63	SDQS_2725482019	0	Fontibon	San pablo	horizontal				213	28/05/2020	97,22%																							
64	SDM-261374-2019	0	Capellania	Fontibon	horizontal				517	28/05/2020	40,03%	517	28/05/2020	40,03%																				
65	SDM-SCTT-225169-2019	Zona Escolar	0	kennedy	horizontal				517	27/05/2020	40,23%	517	27/05/2020	40,23%																				
66	SDM-318531-2019	Zona escolar	0	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	11,40%	517	27/05/2020	40,23%	517	27/05/2020	40,23%																				
67	ZE_06_269_1561_10	Zona escolar	0	Tunjuelito	horizontal	1825	27/04/2020	13,04%	669	27/03/2020	40,20%	548	27/03/2020	49,13%				544	27/03/2020	49,41%	335	27/03/2020	80,40%							487	27/03/2020	55%				395	27/03/2020	68%
68	ZE_06_168_151_10	Zona escolar	modelia	fontibon	horizontal				639	27/04/2020	37,26%																			487	27/04/2020	49%					
69	SDQS_272490-2019	Zona escolar	FONTIBON	fontibon	horizontal				213	28/05/2020	97,22%	213	28/05/2020	97,22%																				
70	MV_AV_BOYACA_941_09_V27	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal				365	23/05/2020	58,08%	365	23/05/2020	58,08%				544	23/05/2020	38,94%															
71	SDM-15023-2020	N/A	castilla	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	11,40%	669	27/05/2020	31,08%	669	27/05/2020	31,68%																			426	27/05/2020	49%
72	CLM-180320-000001	N/A	0	0	horizontal				760	27/05/2020	27,35%	700	27/05/2020	29,73%																			395	27/05/2020	53%
73	SDM-265092	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	23/05/2020	99,57%	213	23/05/2020	99,57%																			487	27/05/2020	43%
74	SDM-242548	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	27/05/2020	97,69%	213	27/05/2020	97,69%																			395	27/05/2020	53%
75	SDM-316519-2018	N/A	Americas	Kennedy	horizontal	1825	27/06/2020	9,70%	213	27/06/2020	83,13%	213	27/06/2020	83,13%																			517	27/06/2020	34%
76	SDM-554-20	N/A	margaritas	kennedy	horizontal				700	23/05/2020	30,30%	700	23/05/2020	30,30%																			487	27/05/2020	43%
77	SDM_SGV_281345_19	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal										304	28/05/2020	68,05%	304	28/05/2020	68,05%															
78	SDQS_176846-2019	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal																											456	27/05/2020	46%
79	CLM_181123-00032	N/A	venecia	Tunjuilito	horizontal	1825	28/06/2020	9,64%	548	28/06/2020	32,15%	548	28/06/2020	32,15%																304	26/06/2020	59%				517	26/06/2020	34%
80	SDQS_2672752019	N/A	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																									304	3/06/2020	66%				517	28/06/2020	34%
81	SDQS_237461	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	11,40%																						304	27/05/2020	68%						
82	SDQS_237461	N/A	CAPELLANIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	11,40%																						213	27/05/2020	98%						
83	EX_06_93_1244_11	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	9,75%	578	26/06/2020	30,80%	456	26/06/2020	39,01%																304	26/06/2020	59%				274	26/06/2020	65%
84	CLM_180405-000032	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	9,64%	395	28/06/2020	44,51%	517	28/06/2020	34,04%																365	26/06/2020	49%				274	28/06/2020	64%
85	SDM_229731_18	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	9,64%	487	26/06/2020	36,58%	335	26/06/2020	53,20%																			435	26/06/2020	41%
86	SDM_229731	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	9,75%																						213	26/06/2020	84%						
87	SDM_DCV_293492_18	N/A	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal																									213	10/07/2020	77%						

Consorcio InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 57 (Consecutivo) **DEL** 15/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 21-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de interventoria)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre y razon social del contratista)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 7.957.500.000
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 7.957.500.000
Plazo Inicial	15 MESES
Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15 MESES
Fecha de Iniciación	29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial	15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.061.619.391
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 2.061.619.391
Plazo Inicial	16MESES
Plazo Prorroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15MESES
Fecha de Iniciación	29/10/2019
Fecha de Terminación	16/03/2021

2. GARANTIAS

88	CLM_181008_000042	N/A	FONTIBON	FONTIBON	horizontal	1825	10/07/2020	8,99%																						475	10/07/2020	35%			
89	SDQS_280824-2018	N/A	LA CABAÑA	FONTIBON	horizontal																		243	10/07/2020	67,40%										
90	EX_09_001_1214_15_V4	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	8,60%	213	27/07/2020	69,04%	213	27/07/2020	69,04%	304	27/07/2020	48,33%				335	17/07/2020	46,92%										183	27/07/2020	81%
91	EX_09_203_1881_12_V44	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	8,60%	487	17/07/2020	32,26%	335	17/07/2020	46,92%																		435	17/07/2020	36%
92	EX_08_338_1867_12	N/A	Americas	KENNEDY	horizontal	1825	28/02/2020	16,27%	548	27/02/2020	54,43%	548	27/02/2020	54,43%																					
93	EX_09_201_1881_12	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal	1825	28/04/2020	12,99%	578	28/03/2020	46,37%	821	28/03/2020	32,63%																			487	28/05/2020	43%
94	clm_180517-000083	N/A	N/A	tunjuelito	horizontal																									365	28/06/2020	48%			
95	SDQS_1772412019	SDQS_1772412019	ciudad salitre	fontibon	horizontal										304	27/07/2020	48,33%																		
96	MV_08_001_1214	2808242018	la cabaña	fontibon	horizontal																		243	27/07/2020	60,41%										
97	EX_09_185_1249	181008_000042	FONTIBON	fontibon	horizontal																											365	27/07/2020	40%		
98	SDM_394713_18	SDM_394713_18	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																													730	28/07/2020	20%
99	ze_06_163_1561_10	CP_SDM-OGS-227601-19	CASTILLA	KENNEDY	horizontal				548	6/08/2020	25,02%	548	6/08/2020	25,02%																					395	6/08/2020	35%
100	CLM-181116-000006	CLM-181116-000006	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal	1825	27/07/2020	8,05%	183	27/07/2020	80,56%																							183	6/08/2020	75%
101	CLM_180823_000003	CLM_180823_000003	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal				548	27/08/2020	21,19%							274	27/08/2020	42,37%			243	27/08/2020	47,67%								213	27/08/2020	54%		
102	EM-08_073	SDM_316511_18	AMERICAS	KENNEDY	horizontal				669	27/07/2020	21,97%	669	27/07/2020	21,97%				395	27/07/2020	37,18%	243	27/07/2020	60,41%	304	27/07/2020	48,33%								213	27/07/2020	69%	395	6/08/2020	35%
103	bote	N/A	AMERICAS	ENGATIVA	horizontal	1825	6/09/2020	5,81%	548	6/09/2020	19,36%	365	6/09/2020	29,04%				243	6/09/2020	43,56%	243	6/09/2020	43,56%	243	27/07/2020	60,41%				304	6/09/2020	35%				243	6/09/2020	44%
104	CLM_180823_000004	N/A	castilla	kennedy	horizontal				487	28/07/2020	30,00%	335	28/07/2020	43,64%				335	28/07/2020	43,64%																	
105	EX_09_200_1881_12	SDQS_2108342019	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				517	28/08/2020	22,24%	517	28/08/2020	22,24%																					395	28/08/2020	29%
106	MV_09_ 048_ 1556_10 y MV-09-189-1556-10	0	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				183	28/08/2020	63,01%	183	28/08/2020	63,01%				183	28/08/2020	63,01%				183	28/08/2020	63,01%											
107	mv_08_435_676_09	SDM_275666-18	TIMIZA	KENNEDY	horizontal													243	28/09/2020	34,52%				243	28/08/2020	47,26%				304	28/09/2020	28%						
108	EX_10_006_1560_10	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	4,60%	335	28/09/2020	25,11%	335	28/09/2020	25,11%				243	28/09/2020	34,52%	213	28/09/2020	39,45%	213	28/09/2020	39,45%								243	28/09/2020	35%
109	EX_10_372_1842_12	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	4,60%	335	28/09/2020	25,11%	335	28/09/2020	25,11%				243	28/09/2020	34,52%	213	28/09/2020	39,45%	213	28/09/2020	39,45%				304	28/09/2020	28%		243	28/09/2020	35%
110	EX_10_008_1560_10	0	FERIAS	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	4,60%	365	28/09/2020	23,01%	365	28/09/2020	23,01%																				395	28/09/2020	21%
111	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78B	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	3,62%	365	16/10/2020	18,08%	274	16/10/2020	24,11%				243	28/10/2020	22,19%	213	16/10/2020	31,00%	213	16/10/2020	31,00%										
112	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 75	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	3,62%	365	28/10/2020	14,79%	274	28/10/2020	19,73%				243	28/10/2020	22,19%	213	16/10/2020	31,00%	213	28/10/2020	25,36%										
113	EX_13_003_1556_10	0	CUIDAD SALITRE	TEUSAQUILLO	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	2,96%	487	28/10/2020	11,10%	335	28/10/2020	16,14%				243	28/10/2020	22,19%	243	16/10/2020	27,12%	243	28/10/2020	22,19%				243	28/10/2020	22%	243	28/10/2020	22%
114	MV_09_048_1556_10	0	fontibon	fontibon	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	2,96%	183	28/10/2020	29,59%	183	28/10/2020	29,59%																						
115	MV_12_281	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	2,96%	335	28/10/2020	16,14%	335	28/10/2020	16,14%				243	28/10/2020	22,19%																
116	TPD_PL_2342	0	0	SANTAFE	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	2,96%	426	28/10/2020	12,68%	426	28/10/2020	12,68%				243	28/10/2020	22,19%	243	28/10/2020	22,19%	243	28/10/2020	22,19%				304	28/10/2020	18%				
117	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78k	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	3,62%	365	5/11/2020	12,60%	274	5/11/2020	16,80%				243	28/10/2020	22,19%	213	16/10/2020	31,00%	213	5/11/2020	21,60%										

3. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
Se relacionan actividades que a la fecha hanterminado sus labores .
Se registran tambien actividades que estan en ejecución.


4. ANEXOS

	SI	NO
1. Registro Fotográfico	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los _____ (Día en letras) 21 (Día en número) días del mes de Diciembre (Mes en letras)

(Nombre) Firma de Ing. RESIDENTE

(Nombre) Firma del Residente auxiliar de gestión de obras
RESIDENTE LEIDY JOHANA ROJAS

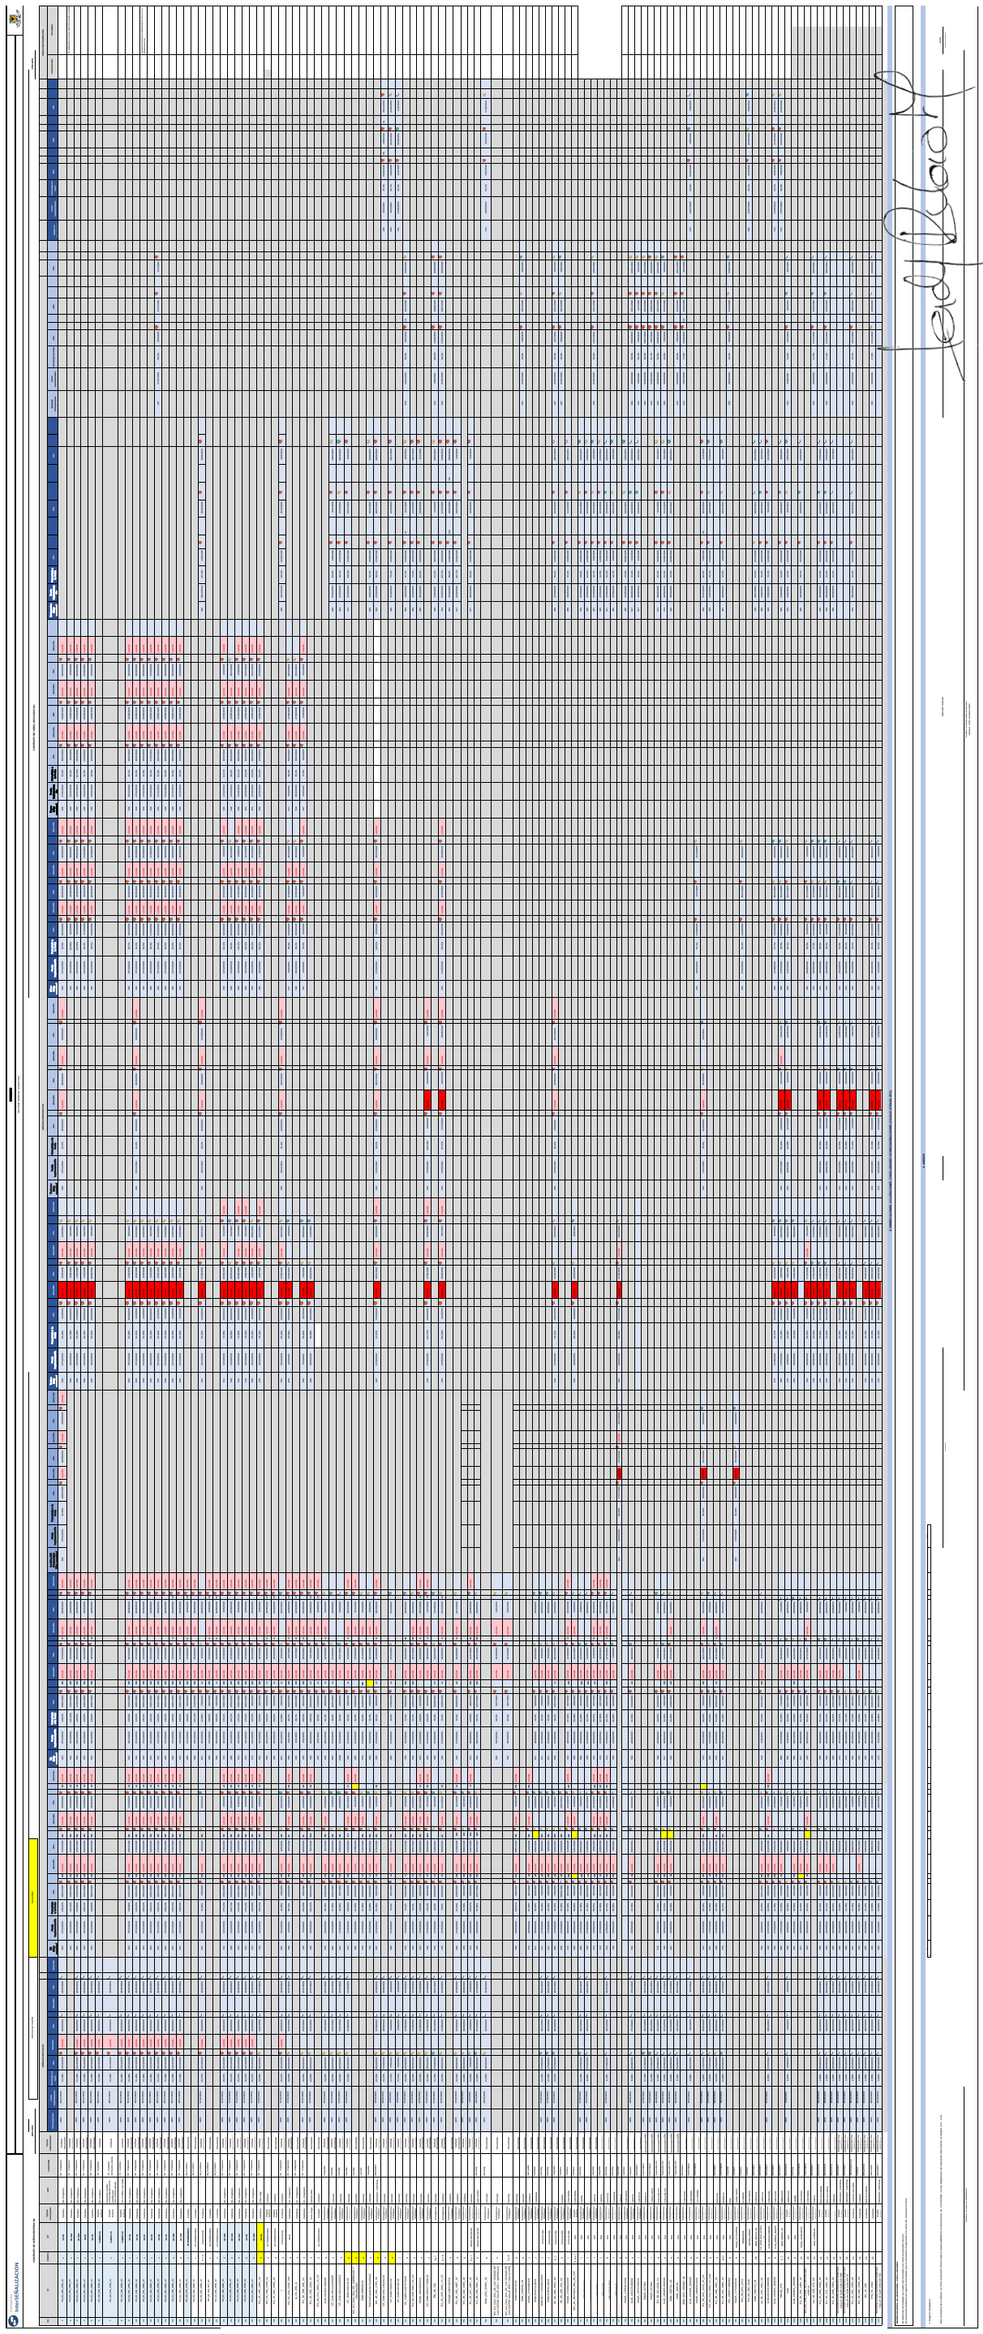

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 30 de 2020.	HORA: 10:20 a.m. a 11:00 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos.
2. Informe de Consultoría.
3. Informe de Georreferenciación.
4. Informe de Garantías.
5. Informe de Obra y varios.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS

1. Consulta facturación para el acta de diciembre, comenta el Ing. Nicolai Wilches que por parte de la subdirección financiera no se obtuvo respuesta, por lo cual comenta que la facturación se realizara en el mes de enero de 2021.

2. Asignación de nuevo ID en el componente de obra para convenio IDU-SDM, interviene la Ing. Marcela Neira sobre el ID calle 40 sur, en la reunión de ayer la UMV comentó en reunión que iban a comenzar implementación, es probable que se pueda intervenir y no hace otro ID, el Ing. Sergio Valderrama comenta que estarán pendientes; adicionalmente pregunta sobre la intervención de la cicloruta Kr 96 con calle 80, comenta la Ing. Marcela Neira que no hablaron sobre este, pero lo consultará.

INFORME CONSULTORIA

Interviene el Ing. Jorge Enrique, comenta el corte se hizo para el 28, respecto al tema de inventarios hectáreas entregadas por el contratista son 1041 correspondientes a 74 IDS, los inventarios aprobados en físico son 68 que corresponden a 1000 hectáreas, los inventarios en proceso son 6, con 41 hectáreas; en cuanto al tema de diseño total hectáreas entregadas por el contratista 977 que corresponde a 86 IDS, aprobados en físico 56, que corresponden a 849, y en revisión 10 que corresponden a 127 hectáreas, total de hectáreas programadas acorde al plan de trabajo debían ser 936 correspondiente al 135%, y los inventarios aprobados han sido 1000 hectáreas que corresponden al 144%, están por encima en aprobación de inventarios em 64 hectáreas que corresponde al 9,3%, en el tema de diseños total de hectáreas programadas deberían ser 876 que es el 127% y están en aprobados en 849 que corresponden a 122 hectáreas, lo cual significa que están por debajo 26 que corresponden al 3,89%, la idea es entregar inventarios hoy y mañana comenta el Ing. Jorge Enrique, el Ing. Jeison comenta estar de acuerdo,

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 30 de 2020.	HORA: 10:20 a.m. a 11:00 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

el Ing. Luis Eduardo pregunta que cuando estaría de vuelta, y el Ing. Jeison comenta que el día lunes, en control de diseños la idea es sacar 3 para la próxima semana comenta el Ing. Jorge Enrique.

INFORME GEOREFERENCIACION

Interviene la Ing. Anny, para la semana 58 con corte al 29 de diciembre, de la cuenta 6 a la cuenta 13 140 IDS de los cuales les han llegado 136, 3 en interventoría, 11 en revisión de contratista, 108 aprobados en SDM y en revisión por SDM 8, en este momento quedarían 10 para SDM, con corte al 29 tiene 53 que corresponde al mes 13, 54 diseños les han llegado, suman 795,95 hectáreas de los cuales 517,01 están aprobadas, en este momento la SDM tiene 160,03, el contratista tiene 125,25, interventoría tiene 8,01.

INFORME GARANTIAS

Interviene la Ing. Leidy, la interventoría a la semana 58 han revisado 101 diseños, diseños sin observación a la fecha son 25 equivalentes al 25%, garantías solicitadas a la fecha por Interventoria 76 equivalente al 76%, atendidas por el contratista y aceptadas por la Interventoria 72, atenciones rechazadas por interventoría 12 equivalente al 12%, pendientes por atender por el contratista 41 equivalente al 41%, en el transcurso de la semana la interventoría radico al contratista el comunicado 0912 en donde se adjuntan 3 comunicados en el área de garantías, se evidencio que el compromiso SQS26134219 que tenía observación en el 20% de implementación, sin embargo el contratista no ha llegado la atención de este compromiso, el Ing. Luis Eduardo comenta que en el comunicado recibieron dos informes nada más, el Ing. Sergio Valderrama solicita al contratista un cronograma teniendo en cuenta que falta mes y medio para la terminación del contrato, el Ing. Luis Eduardo comenta que revisan la solicitud y darán respuesta.

INFORME DE OBRA

Informe semana 58 al 27 de diciembre del 2020, el contratista tiene asignados en diseños normales 21, inspeccionados 21, en implementación 2, implementados totalmente 16, por implementar 3, suministros asignados 6, implementados 6, compromisos prioritarios asignados 189, inspeccionados 189, en implementación 1, implementados totalmente 181, por implementar 7, emergencias en patinetas asignadas 24, otras emergencias asignadas 28, inspeccionadas 28, en implementación 1, implementadas totalmente 26, pendientes por implementar 1, en la semana ejecutó obra por $50.453.382 equivalente al 0,69%, tiene obra por ejecutar por valor de $575.230.437, equivalente al 7,85%, se presentaron 2 jornadas de lluvia, una en horario diurno y otro en horario nocturno, se programaron 3 jornadas, 1 en horario diurno y tres en nocturno, para los días 22 y 26 de diciembre solo se programaron actividades en la noche, el diseño del convenio de la calle 41 sur con carrera 78k hasta la avenida 1 de mayo tiene un avance del 65% acorde a lo recomendado por la SDM el 27 de diciembre adoptando medidas sobre la final del futbol colombiano, en la gráfica el contratista debería presentar un avance de 132,96, presenta un avance de 138,20%, quiere decir que está por encima de la curva de programación 3,94%.

VARIOS

Comenta el Ing. Sergio Valderrama que hoy en la mañana recibió un correo del Ing. Nicolai para una posible

TEMA: Comité Técnico Zona Sur – Occidental-Contrato 2019-1782.		
FECHA: diciembre 30 de 2020.	HORA: 10:20 a.m. a 11:00 a.m.	LUGAR: Sesión virtual

intersección, a lo cual el Ing. Sergio Valderrama le respondió el contrato de obra está en su totalidad están pasados en el ID Tunjuelito.

El Ing. Jeison comenta que, si las vías locales se pueden aplicar en pintura acrílica para bajar el costo, el Ing. Sergio Valderrama comenta que lo están evaluando, el Ing. Luis Eduardo comenta que en spray tiene un poco más de durabilidad, el Ing. Jeison comenta que se debe verificar el volumen vehicular.

El Ing. Luis Eduardo pregunta sobre la Av. Boyacá con carrera 3, pregunta si hoy está lista por parte de semáforos, el Arq. Juan Camilo comenta que lo confirmará, y el otro punto es la calle 80 con carrera 96 el Arq. Juan Camilo comenta que no le han dado repuesta, el Ing. Luis Eduardo comenta que acorde al tiempo ya debería estar definido por el tema de finalización del contrato, comenta la Ing. Marcela Neira que lo trataran en la próxima reunión si continúan o cambiarían los puntos.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Solicitud a IDU, intervención ID Kr 96 por Cl 80	SDM.	4-01-2021
2. Confirmación intervención ID convenio IDU-SDM Av. Boyacá por Cl 3	SDM.	4-01-2021
3. Consulta a IDU por mantenimiento de pavimento, en Cl 40 sur por Kr 73.	SDM.	4-01-2021

APROBADO

_____ _____

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

ZONA 3 - SUR OCCIDENTE

PERIODO: DESDE 21/12/2020 A 27/12/2020 SEMANA: **58**

Consorcio InterSEÑALIZACION

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**	CONTRATO No.	**2019 - 1782**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 4.882.890.333,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 2.440.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMPONENTE OBRA:			$ 7.323.190.333,00

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS		TOTAL
					PATINETAS	OTROS	
ID ASIGNADOS	21	6	0	189	24	28	268
ID INSPECCIONADOS	21	0	0	189	24	28	262
ID POR INSPECCIONAR	0	0	0	0	0	0	0
ID EN IMPLEMENTACIÓN	2	0	0	1	0	1	4
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	16	6	0	181	24	26	253
ID POR IMPLEMENTAR	3	0	0	7	0	1	10

VALOR EJECUTADO MENSUAL

CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR POR SEPARADO		VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$28.987.700	$203.847.546	PATINETAS	$53.855.878	$301.601.550
			OBRA	$247.745.672	
MES 2	$15.694.587	$302.450.440	PATINETAS	$23.142.234	$435.540.543
			OBRA	$412.398.308	
MES 3	$50.906.552	$160.036.785	PATINETAS	$15.513.088	$289.222.050
			OBRA	$273.708.962	
MES 4	$26.177.750	$555.494.979	$581.672.728		
MES 5	$25.601.175	$521.865.954	$547.467.129		
MES 6	$50.453.865	$290.269.932	$444.376.468		
MES 7	$65.242.246	$615.557.486	$746.922.987		
MES 8	$69.446.196	$377.906.324	$447.352.519		
MES 9	$85.041.157	$576.008.263	$661.049.420		
MES 10	$25.874.362	$400.936.858	$427.684.940		
MES 11	$47.730.633	$313.109.721	$433.860.679		
MES 12	$66.066.057	$605.688.352	$671.754.409		
MES 13	$23.003.273	$249.345.363	$272.392.698		
MES 14	$200.332.579	$286.729.198	$487.061.777		
MES 15	$0	$0	$0		
MES 16	$0	$0	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A SEMANA		**58**	**$6.747.959.896**		

Valor programado	MES 1	$244.144.517	3,24%
Valor ejecutado		$301.601.550	4,12%
Valor programado Acumulado	MES 2	$634.775.743	8,42%
Valor ejecutado		$737.142.092	10,07%
Valor programado Acumulado	MES 3	$1.123.064.777	14,90%
Valor ejecutado		$1.026.364.142	14,02%
Valor programado Acumulado	MES 4	$1.660.182.713	22,03%
Valor ejecutado Acumulado		$1.608.036.871	21,96%
Valor programado Acumulado	MES 5	$2.141.736.725	28,42%
Valor ejecutado		$2.155.504.000	29,43%
SUSPENSION			
Valor programado Acumulado	MES 6	$2.418.958.886	32,10%
Valor ejecutado		$2.599.880.467	35,50%
Valor programado Acumulado	MES 7	$2.956.076.823	39,23%
Valor ejecutado		$3.346.803.454	45,70%
Valor programado Acumulado	MES 8	$3.493.194.759	46,36%
Valor ejecutado		$3.794.155.973	51,81%
Valor programado Acumulado	MES 9	$4.030.312.696	53,49%
Valor ejecutado		$4.455.205.394	60,84%
Valor programado Acumulado	MES 10	$4.567.430.633	60,61%
Valor ejecutado		$4.882.890.334	66,68%
Valor programado Acumulado	MES 11	$4.882.890.333	64,80%
Valor ejecutado		$5.316.751.012	72,60%
Valor programado Acumulado	MES 12	$5.413.390.333	71,84%
Valor ejecutado		$5.988.505.421	81,77%
Valor programado Acumulado	MES 13	$5.943.890.333	78,88%
Valor ejecutado		$6.260.898.119	85,49%
Valor programado Acumulado	MES 14	$6.474.390.333	85,92%
Valor ejecutado		$6.747.959.896	92,15%
Valor programado Acumulado	MES 15	$7.004.890.333	92,96%
Valor ejecutado		$6.747.959.896	92,15%
Valor programado Acumulado	MES 16	$7.535.390.333	100,00%
Valor ejecutado		$6.747.959.896	92,15%
Valor ejecutado semana	58	**$50.453.832**	0,69%
Valor Total Contrato de Obra		$7.323.190.333	100,00%
Valor por ejecutar		$575.230.437	7,85%

OBSERVACIONES

JORNADAS DE LLUVIA:	2	DIURNA	1	NOCTURNA	1		
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:			3	DIURNA	1	NOCTURNA	2

OBSERVACIONES:


Para los días 22 y 26 de Diciembre de 2020 solo se programan actividades en la noche.

• Diseño del Convenio IDU Calle 41 Sur entre KR 78K hasta Av 1 Mayo esta en un avance del 65%

• De acuerdo a lo recomendado por la SDM el 27 de se cancelan las actividades según el decreto no. 325 de 27 dic de 2020 el cual se adoptan medidas para conservar la seguridad y preservar el orden público como consecuencia de la final del fútbol colombiano

Dias transcurridos del contrato	425	Dias para terminar el contrato	50	Valor a ejecutar diario	$11.504.609


AVANCE INVERSION CONTRATO 2019-1782
ZONA SUR-OCCIDENTAL

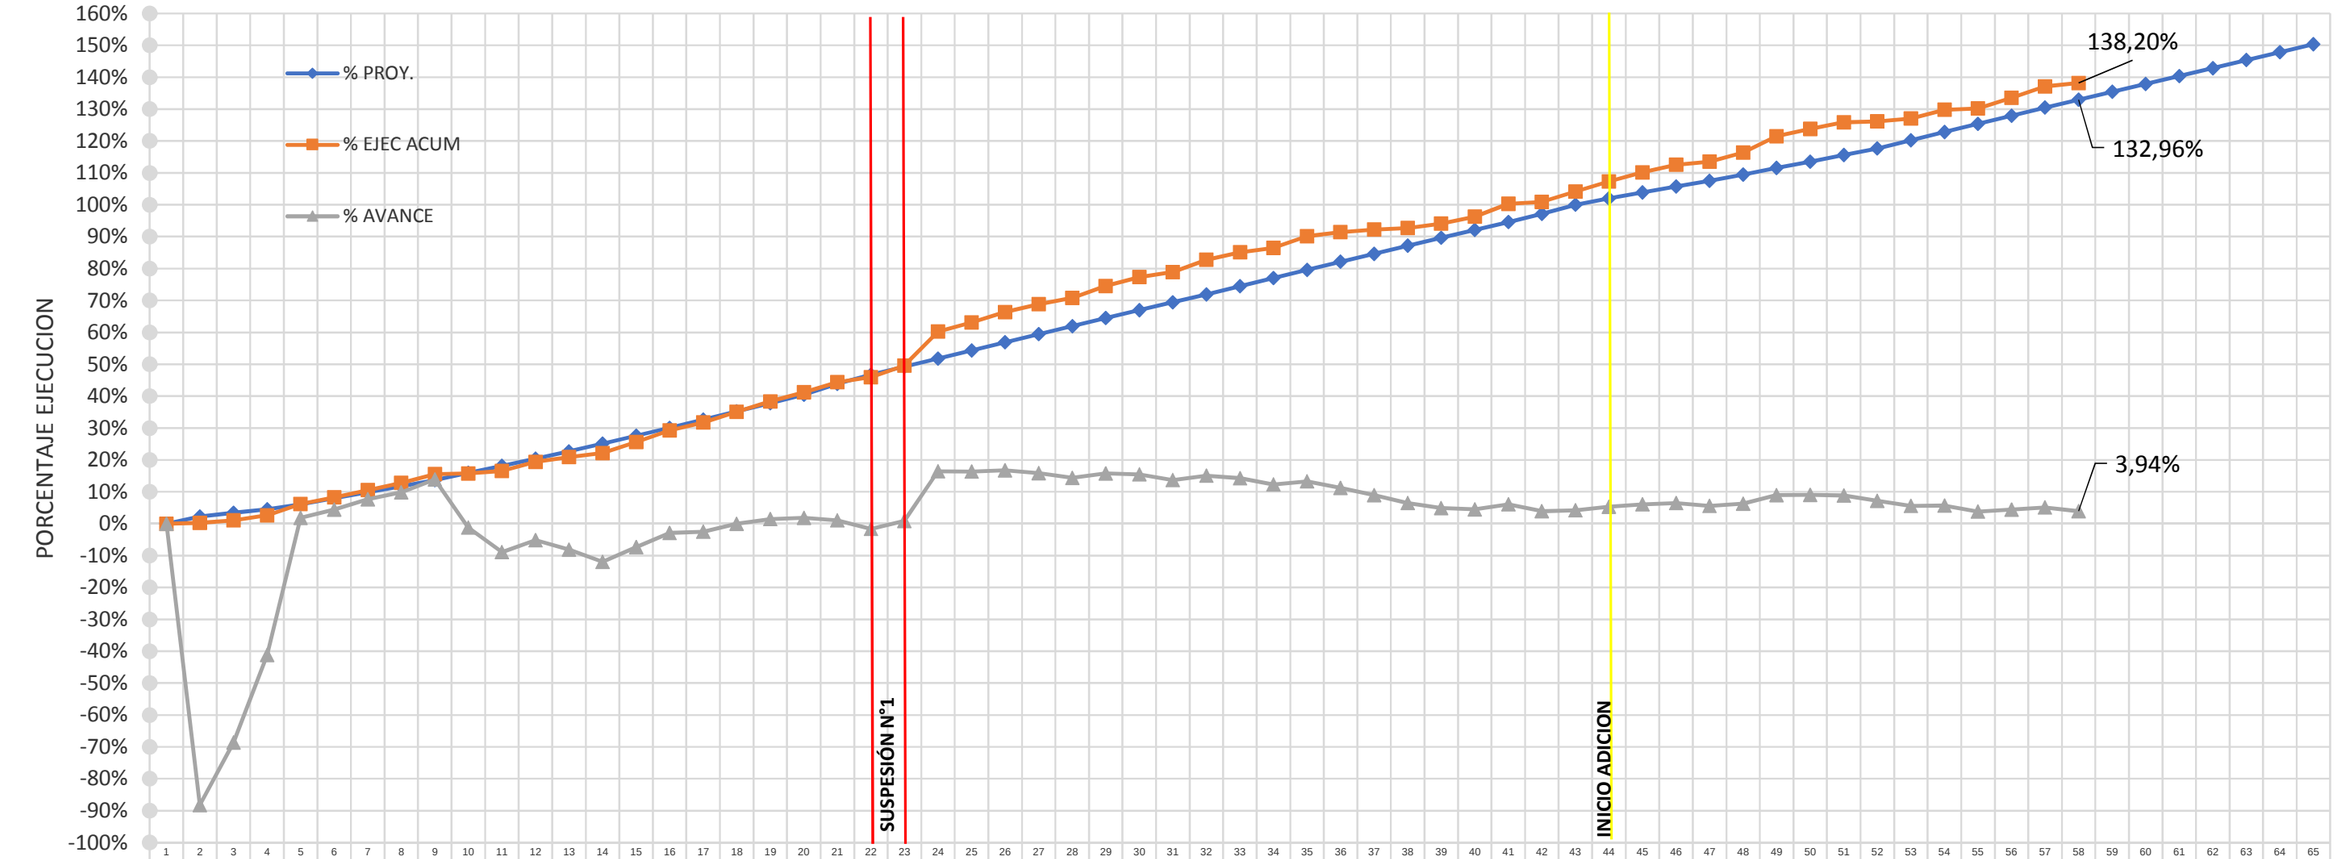

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
% PROY.	0,00%	2,26%	3,39%	4,52%	6,07%	7,93%	9,80%	11,67	13,65	15,90	18,16	20,42	22,68	25,13	27,61	30,10	32,58	35,14	37,79	40,45	43,86	46,70	49,18	51,74	54,31	56,87	59,44	61,96	64,44	66,93	69,41	71,91	74,47	77,04	79,61	82,17	84,67	87,15	89,64	92,12	94,62	97,13	100,0	101,9	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	115,6	117,7	120,2	122,8	125,4	127,9	130,4	132,9	135,4	137,9	140,4	142,8	145,3	147,8	150,3
% EJEC ACUM	0,00%	0,27%	1,06%	2,66%	6,18%	8,28%	10,55	12,82	15,54	15,71	16,54	19,35	20,83	22,12	25,59	29,22	31,77	35,12	38,34	41,20	44,33	45,93	49,62	60,26	63,15	66,38	68,86	70,84	74,60	77,29	78,93	82,73	85,12	86,53	90,16	91,40	92,24	92,76	94,05	96,23	100,3	100,8	104,1	107,3	110,1	112,5	113,5	116,3	121,5	123,8	125,8	126,1	127,0	129,7	130,2	133,6	137,1	138,2							
% AVANCE	0,00%	-88,2	-68,6	-41,1	1,81%	4,43%	7,67%	9,87%	13,88	-1,21	-8,95	-5,22	-8,13	-11,9	-7,33	-2,91	-2,48	-0,06	1,44%	1,86%	1,07%	-1,66	0,89%	16,46	16,29	16,71	15,85	14,33	15,75	15,49	13,72	15,06	14,30	12,32	13,25	11,23	8,94%	6,43%	4,93%	4,47%	6,04%	3,88%	4,19%	5,27%	6,11%	6,46%	5,54%	6,25%	8,93%	9,02%	8,84%	7,16%	5,63%	5,65%	3,85%	4,40%	5,13%	3,94%							

SEMANA 58

AVANCE INVERSION CONTRATO 2019-1782
ZONA SUR-OCCIDENTAL

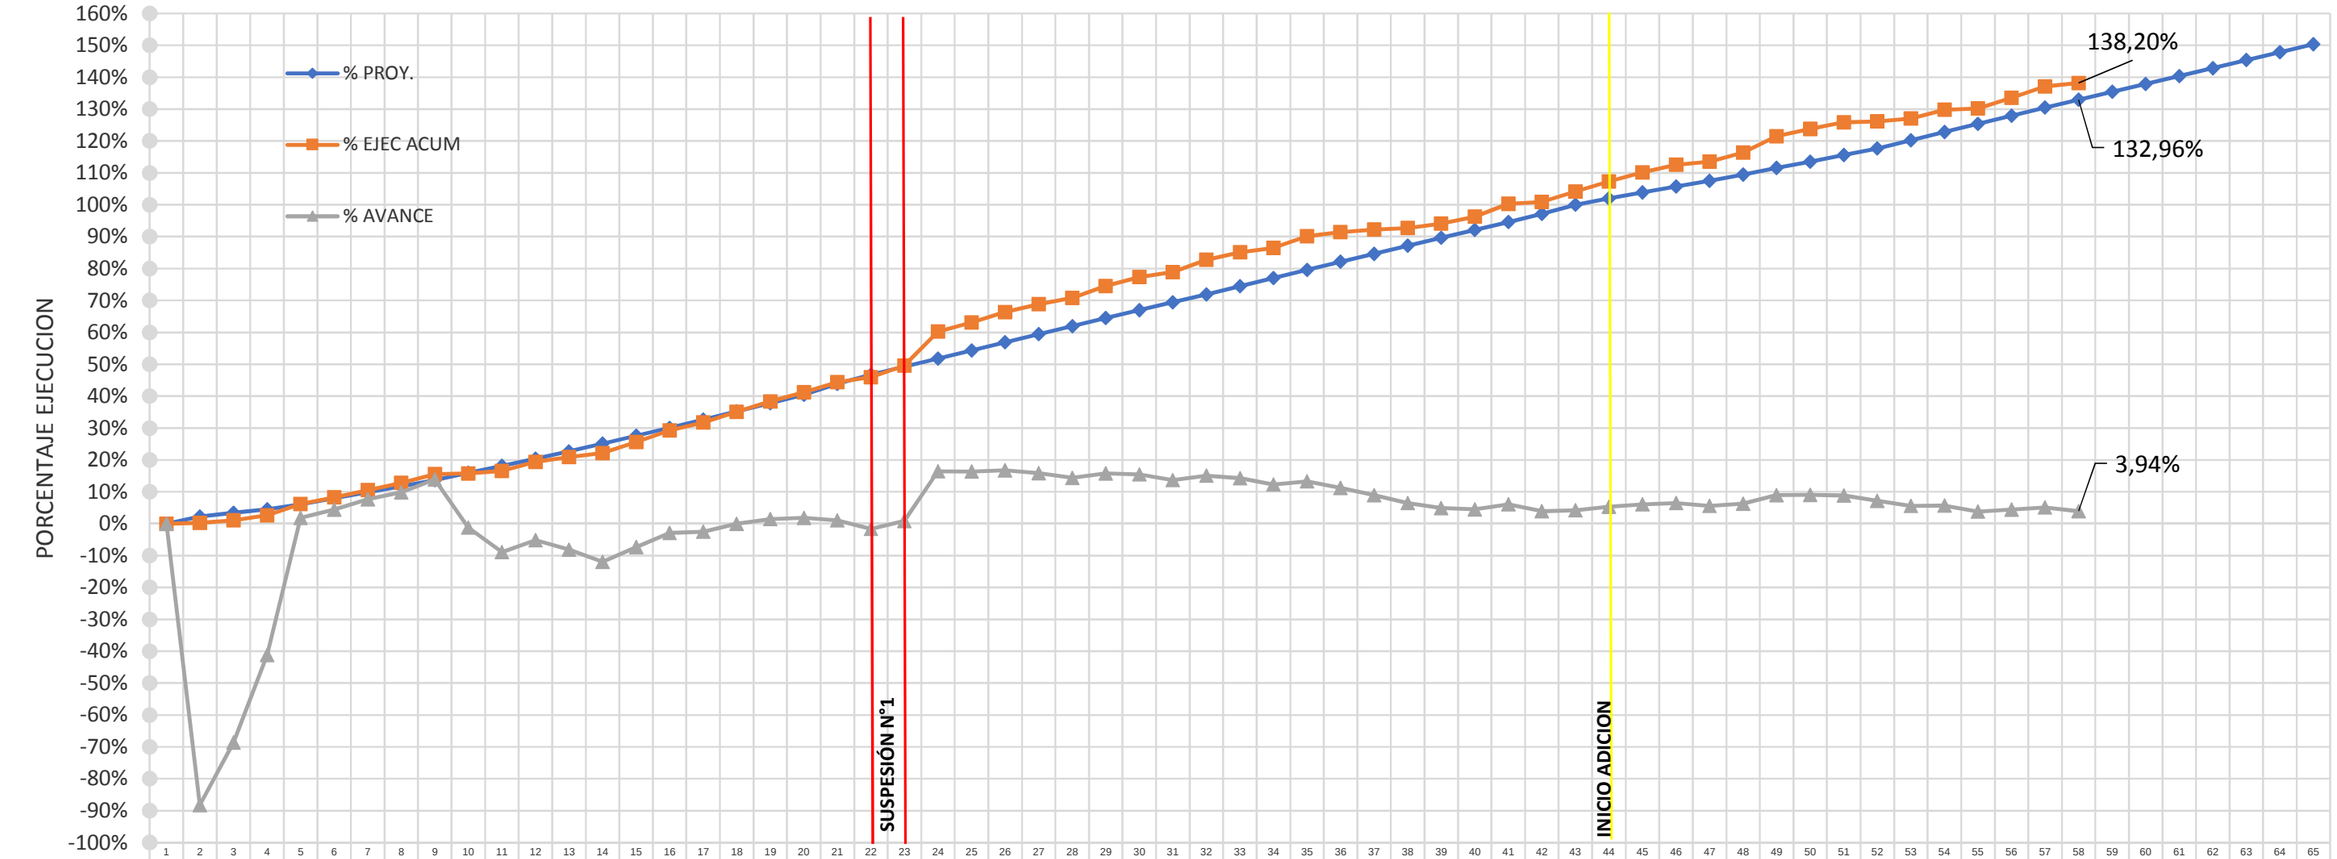

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
% PROY.	0,00%	2,26%	3,39%	4,52%	6,07%	7,93%	9,80%	11,67	13,65	15,90	18,16	20,42	22,68	25,13	27,61	30,10	32,58	35,14	37,79	40,45	43,86	46,70	49,18	51,74	54,31	56,87	59,44	61,96	64,44	66,93	69,41	71,91	74,47	77,04	79,61	82,17	84,67	87,15	89,64	92,12	94,62	97,13	100,0	101,9	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	115,6	117,7	120,2	122,8	125,4	127,9	130,4	132,9	135,4	137,9	140,4	142,8	145,3	147,8	150,3
% EJEC ACUM	0,00%	0,27%	1,06%	2,66%	6,18%	8,28%	10,55	12,82	15,54	15,71	16,54	19,35	20,83	22,12	25,59	29,22	31,77	35,12	38,34	41,20	44,33	45,93	49,62	60,26	63,15	66,38	68,86	70,84	74,60	77,29	78,93	82,73	85,12	86,53	90,16	91,40	92,24	92,76	94,05	96,23	100,3	100,8	104,1	107,3	110,1	112,5	113,5	116,3	121,5	123,8	125,8	126,1	127,0	129,7	130,2	133,6	137,1	138,2							
% AVANCE	0,00%	-88,2	-68,6	-41,1	1,81%	4,43%	7,67%	9,87%	13,88	-1,21	-8,95	-5,22	-8,13	-11,9	-7,33	-2,91	-2,48	-0,06	1,44%	1,86%	1,07%	-1,66	0,89%	16,46	16,29	16,71	15,85	14,33	15,75	15,49	13,72	15,06	14,30	12,32	13,25	11,23	8,94%	6,43%	4,93%	4,47%	6,04%	3,88%	4,19%	5,27%	6,11%	6,46%	5,54%	6,25%	8,93%	9,02%	8,84%	7,16%	5,63%	5,65%	3,85%	4,40%	5,13%	3,94%							

SEMANA 58

Consorcio InterSEÑALIZACION

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CUADRO CONTROL SEMANAL

GEORREFERENCIACION INTERVENTORIA CTO 1802 - 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

GEORREFERENCIACION OBRA • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 58 / CORTE A 29 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	REGISTRO VERTICAL	REGISTRO HORIZONTAL	OBSERVACIONES
1	10	10	0	10	0	10	10	0	0	117	542	APROBADA
2	20	20	0	20	0	20	20	0	0	48	1168	APROBADA
3	31	31	0	31	0	31	31	0	0	307	536	APROBADA
4	21	21	0	21	0	21	21	0	0	124	753	APROBADA
5	9	9	0	9	0	0	9	0	0	107	873	APROBADA
6	5	5	0	5	0	0	4	1	0	204	519	-
7	41	41	0	41	0	0	40	1	0	297	801	-
8	23	23	0	22	1	0	22	0	0	114	937	-
9	20	20	1	19	1	1	19	0	0	430	517	-
10	27	27	1	25	1	1	23	2	0	297	801	-
11	4	4	4	0	0	4	0	3	0	25	450	-
12	10	9	7	0	5	7	0	1	0	57	350	-
13	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	231	220	13	203	11	95	**199**	8	0	2127	8247	-

GEORREFERENCIACION DISEÑO • ZONA SUR OCCIDENTE CTO 1782 - 2019 • SEMANA 58 / CORTE A 29 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	EN REVISION INTERVENTORIA	APROBADOS INTERVENTORIA	ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM	APROBADOS SDM	REVISION SDM	ATENCION OBSERVACIONES SDM	HA (hectáreas) RECIBIDAS	HA (hectáreas) APROBADAS INTERVENTORIA	HA (hectáreas) APROBADAS SDM	HA (hectáreas) REVISION SDM	HA (hectáreas) REVISION CONTRATISTA	HA (hectáreas) REVISION INTERVENTORIA
MES 3	5	5	0	5	5	5	5	0	0	55,78	55,78	55,78	0	0	0
MES 4	6	6	0	6	0	6	5	1	0	66,75	66,75	42,75	24	0	0
MES 5	2	2	0	1	0	1	1	1	0	49,87	49,87	20,57	29,3	0	0
MES 7	4	4	0	3	0	3	1	2	1	65,61	65,61	53,11	2,5	0	0
MES 8	6	6	0	1	0	3	0	3	1	140,4	140,4	140,4	0	0	0
MES 9	12	12	0	0	0	0	6	5	0	99,78	87,68	71,58	24,6	0	0
MES 10	10	10	0	0	0	1	0	1	7	209,81	181,36	116,06	65,3	40,45	0
MES 12	3	3	0	1	0	0	0	-	-	12,45	3,25	3,25	0	9,2	0
MES 12	6	6	3	1	0	0	0	-	-	95,5	14,6	0	14,6	55,6	8,1
TOTAL	54	54	3	18	5	19	18	13	9	795,95	665,3	**503,5**	160,3	105,25	8,1

RESPONSABLE

Anny Lopez Fajardo
Georreferenciación Zona Sur Occidente Cto 1802

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 58 **CORTE** 28 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE INVENTARIOS DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 3	A01	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-nov-19	REV. 4	27-dic-19	MES 3	
2	MES 1	SEM. 3	A02	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	18-nov-19	REV. 3	24-dic-19	MES 3	
3	MES 1	SEM. 3	A03	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	18-nov-19	REV. 2	5-dic-19	MES 3	
4	MES 1	SEM. 4	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	25-nov-19	REV. 3	20-dic-19	MES 3	
5	MES 2	SEM. 5	A05	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 3	15-ene-20	MES 3	
6	MES 2	SEM. 7	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	12-dic-19	REV. 3	23-ene-20	MES 3	
7	MES 2	SEM. 8	A07	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	18-dic-19	REV. 2	31-ene-20	MES 4	
8	MES 2	SEM. 8	A08	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	18-dic-19	REV. 3	30-ene-20	MES 4	
9	MES 2	SEM. 8	A09	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	19-dic-19	REV. 2	10-feb-20	MES 4	
10	MES 2	SEM. 8	A10	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	3-feb-20	MES 4	
11	MES 3	SEM. 11	A11	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	9-ene-20	REV. 2	4-feb-20	MES 4	
12	MES 3	SEM. 11	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	9-ene-20	REV. 2	3-feb-20	MES 4	
13	MES 3	SEM. 12	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	17-ene-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
14	MES 3	SEM. 12	A14	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	20-ene-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
15	MES 4	SEM. 15	A15	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	7-feb-20	REV. 3	12-mar-20	MES 5	**
16	MES 4	SEM. 15	A16	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	10-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
17	MES 4	SEM. 16	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	12-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
18	MES 5	SEM. 18	A18	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	27-feb-20	REV. 2	11-may-20	MES 7	
19	MES 5	SEM. 18	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	2-mar-20	REV. 2	12-may-20	MES 7	
20	MES 5	SEM. 19	A20	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	6-mar-20	REV. 1	13-mar-20	MES 5	
21	MES 5	SEM. 20	A21	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	5-may-20	MES 7	
22	MES 5	SEM. 20	A22	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	11-mar-20	REV. 2	13-may-20	MES 7	****
23	MES 5	SEM. 20	A23	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	14-may-20	MES 7	
24	MES 5	SEM. 20	A24	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	12-mar-20	REV. 3	26-may-20	MES 7	
25	MES 5	SEM. 20	A25	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	13-mar-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	
26	MES 5	SEM. 21	A26	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-mar-20	REV. 3	28-may-20	MES 7	
27	MES 6	SEM. 23	A27	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	4-jun-20	MES 8	
28	MES 6	SEM. 23	A28	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	23-jun-20	MES 8	****
19	MES 6	SEM. 23	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2	20,00	20,00	APROBADO	22-abr-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
29	MES 6	SEM. 23	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	27-abr-20	REV. 4	9-jun-20	MES 8	
30	MES 6	SEM. 23	A30	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	27-abr-20	REV. 2	1-jun-20	MES 8	
31	MES 7	SEM. 25	A31	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	12-may-20	REV. 3	2-jun-20	MES 8	
32	MES 7	SEM. 26	A32	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	11-jun-20	REV. 4	16-jun-20	MES 8	****
33	MES 7	SEM. 26	A33	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	18-may-20	REV. 3	27-may-20	MES 7	*****
19	MES 7	SEM. 27	A19	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE3	20,00	20,00	APROBADO	20-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	
34	MES 7	SEM. 27	A34	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	21-may-20	REV. 2	16-jun-20	MES 8	****
35	MES 7	SEM. 27	A35	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	7-jul-20	REV. 3	7-jul-20	MES 9	*** y ****
36	MES 7	SEM. 27	A36	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	9-jul-20	REV. 4	10-jul-20	MES 9	
37	MES 7	SEM. 27	A37	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	24-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	
38	MES 8	SEM. 29	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	7-jul-20	REV. 3	7-jul-20	MES 9	
39	MES 8	SEM. 29	A39	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	29-jul-20	MES 10	
40	MES 8	SEM. 29	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	13-jul-20	MES 9	
41	MES 8	SEM. 29	A41	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	8-jul-20	REV. 3	10-jul-20	MES 9	***
42	MES 8	SEM. 29	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	17-jul-20	REV. 3	17-jul-20	MES 9	******
43	MES 8	SEM. 29	A43	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	14-jul-20	REV. 2	15-jul-20	MES 9	*******
44	MES 8	SEM. 29	A44	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	21-jul-20	REV. 3	21-jul-20	MES 9	********
45	MES 8	SEM. 29	A45	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	5-ago-20	REV. 4	6-ago-20	MES 10	********
46	MES 8	SEM. 31	A46	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	23-jul-20	REV. 3	24-jul-20	MES 9	
47	MES 8	SEM. 32	A47	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	27-jul-20	REV. 3	27-jul-20	MES 9	
48	MES 10	SEM. 37	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	1-oct-20	REV. 2	2-oct-20	MES 11	a
49	MES 11	SEM. 43	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	2-oct-20	REV. 2	2-oct-20	MES 11	
50	MES 11	SEM. 43	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	14-sep-20	REV. 3	14-oct-20	MES 11	
51	MES 11	SEM. 44	A51	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	9-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
52	MES 11	SEM. 45	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	20-oct-20	REV. 3	20-oct-20	MES 12	
53	MES 11	SEM. 45	A53	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	14-oct-20	REV. 2	14-oct-20	MES 11	
54	MES 11	SEM. 45	A54	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	APROBADO	20-nov-20	REV. 2	20-nov-20	MES 13	c
55	MES 12	SEM. 46	A55	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	4-nov-20	REV. 3	4-nov-20	MES 13	
56	MES 12	SEM. 46	A56	MV_08_261_1244_11_V2	19,80	19,80	APROBADO	19-nov-20	REV. 3	20-nov-20	MES 13	b
57	MES 12	SEM. 47	A57	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	9-nov-20	REV. 2	10-nov-20	MES 13	
58	MES 12	SEM. 47	A58	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	4-nov-20	REV. 3	4-nov-20	MES 13	
59	MES 12	SEM. 48	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	APROBADO	24-oct-20	REV. 3	24-nov-20	MES 13	
60	MES 12	SEM. 48	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	APROBADO	20-oct-20	REV. 2	23-nov-20	MES 13	
61	MES 12	SEM. 48	A61	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	APROBADO	21-dic-20	REV. 3	21-dic-20	MES 14	
62	MES 12	SEM. 49	A62	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	16-dic-20	REV. 2	16-dic-20	MES 14	
63	MES 12	SEM. 49	A63	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	APROBADO	16-dic-20	REV. 2	16-dic-20	MES 14	
64	MES 12	SEM. 49	A64	EX_08_333_1867_12_V3	7,50	7,50	APROBADO	10-dic-20	REV. 2	16-dic-20	MES 14	
65	MES 12	SEM. 49	A65	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	APROBADO	9-dic-20	REV. 2	11-dic-20	MES 14	
66	MES 13	SEM. 52	A66	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	APROBADO	16-dic-20	REV. 3	16-dic-20	MES 14	
67	MES 13	SEM. 53	A67	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	APROBADO	18-dic-20	REV. 4	18-dic-20	MES 14	
68	MES 13	SEM. 53	A68	EM_08_124_V11	16,80	16,80	APROBADO	18-dic-20	REV. 3	18-dic-20	MES 14	
69	MES 14	SEM. 55	A69	EX_08_305_1867_12_V2	8,30	8,30	INTERVENTORIA	3-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
70	MES 14	SEM. 55	A70	EX_08_315_1867_12_V1	4,00	4,00	INTERVENTORIA	4-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
71	MES 14	SEM. 55	A71	EX_09_218_1556_10_V4	4,00	4,00	INTERVENTORIA	4-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
72	MES 14	SEM. 56	A72	EX_09_185_1249_11_V7	10,67	10,67	INTERVENTORIA	9-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
73	MES 14	SEM. 56	A73	EX_08_212_1556_10_V5	2,50	2,50	INTERVENTORIA	9-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
74	MES 14	SEM. 56	A74	EX_09_219_1881_12_V6	11,90	11,90	INTERVENTORIA	9-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	

INFORME ESTADO DE INVENTARIO DE DISEÑOS. ZONA SW

* En la Revisión 1 se detecta que está incompleto el Registro Fotográfico-RF entregado en 3 CDs y el contratista entrega en Comité del 11/03/2020 3 CDs con este RF faltante; una vez aprobado y con VoBo de la SDM se le autorizó al contratista a presentar de manera parcial el Diseño

** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba)

**** Falta VoBo de la SDM

***** La meta cambió de 5,08Ha a 5,3Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba - Correo SDM del 28/05/2020)

*** Cambia la meta de 8,5Ha a 5,15Ha por disminución de ZI

****** La meta cambió de 20,10Ha a 20,18 Ha por nueva medición de la ZI

****** Cambia la meta de 3,20Ha a 3,25Ha por ampliación de ZI para empalmes

******** La meta cambió de 30,13Ha a 28,45 Ha por ajuste de la ZI

******** Cambia la meta de 6,60Ha a 7,00Ha por ajuste equivalencias

a Se ajustó la meta de 2,5Ha a 6,7Ha por ajuste de equivalencias

b Se ajustó la meta de 17,9Ha a 19,8 Ha por ajuste de equivalencias

c Se ajustó la meta de 38,9Ha a 38,4Ha por ajuste de la meta al no incluir el tramo de la KR73

INFORME ESTADO DE INVENTARIOS DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 58 **CORTE** 28 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICAS **SEMANA** 58 **CORTE** 28 Dic./2020

INVENTARIOS ENTREGADOS / APROBADOS


	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	74	1041,73
INVENTARIOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	68	1000,36
INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	6	41,37

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO INVENTARIOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	6	41,37	41,37	0,00	0,00	1000,36
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	41,37	41,37	0,00	0,00	

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha INVENTARIADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		INVENTARIADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	3,4	0,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	6,8	1,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	10,2	1,5%	12,50	12,50	1,8%	-	-	0,0%
4	18 NOV - 25 NOV	13,6	2,0%	19,28	31,78	4,6%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	16,72	2,4%	2,50	34,28	5,0%	-	-	0,0%
6	03 DIC - 09 DIC	19,84	2,9%	-	34,28	5,0%	2,50	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,96	3,3%	21,50	55,78	8,1%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	26,08	3,8%	40,25	96,03	13,9%	19,28	21,78	3,2%
9	24 DIC - 30 DIC	29,2	4,2%	-	96,03	13,9%	10,00	31,78	4,6%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,95	6,4%	-	96,03	13,9%	-	31,78	4,6%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	58,7	8,5%	26,50	122,53	17,7%	-	31,78	4,6%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	73,45	10,6%	31,80	154,33	22,3%	2,50	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	88,2	12,8%	-	154,33	22,3%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	112,06	16,2%	-	154,33	22,3%	40,25	96,03	13,9%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	135,92	19,7%	30,57	184,90	26,8%	26,50	122,53	17,7%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	159,78	23,1%	50,61	235,51	34,1%	-	122,53	17,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	183,64	26,6%	-	235,51	34,1%	2,50	125,03	18,1%
18	25 FEB/20 - 02 MAR/20	207,50	30,0%	86,10	321,61	46,5%	49,87	174,90	25,3%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	259,93	37,6%	2,50	324,11	46,9%	-	174,90	25,3%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	312,37	45,2%	16,80	340,91	49,3%	63,11	238,01	34,4%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	364,80	52,8%	12,10	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	397,35	57,5%	-	353,01	51,1%	-	238,01	34,4%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	429,90	62,2%	46,00	399,01	57,7%	-	238,01	34,4%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	462,45	66,9%	-	399,01	57,7%	2,50	240,51	34,8%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	495,00	71,6%	11,01	410,02	59,3%	86,10	326,61	47,3%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	515,35	74,6%	15,30	425,32	61,6%	7,50	334,11	48,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	535,70	77,5%	63,52	488,84	70,7%	24,20	358,31	51,9%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	556,05	80,5%	-	488,84	70,7%	16,01	374,32	54,2%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	576,40	83,4%	109,38	598,22	86,6%	18,50	392,82	56,8%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	594,43	86,0%	-	598,22	86,6%	57,37	450,19	65,2%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	612,47	88,6%	60,40	658,62	95,3%	2,50	452,69	65,5%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	625,35	90,5%	32,63	691,25	100,0%	7,00	459,69	66,5%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	648,53	93,9%	-	691,25	100,0%	17,15	476,84	69,0%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	656,18	95,0%	-	691,25	100,04%	68,95	545,79	79,0%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	663,82	96,1%	-	691,25	100,04%	30,43	576,22	83,4%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	671,47	97,2%	-	691,25	100,04%	54,33	630,55	91,3%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	679,11	98,3%	6,70	697,95	101,01%	32,25	662,80	95,9%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	686,76	99,4%	-	697,95	101,01%	28,45	691,25	100,04%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	687,61	99,5%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	688,82	99,69%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	689,30	99,76%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	690,14	99,88%	-	697,95	101,01%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	13,50	711,45	102,96%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	697,084	100,88%	72,78	784,23	113,49%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	703,176	101,76%	38,40	822,63	119,05%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	709,269	102,65%	59,40	882,03	127,65%	9,20	700,45	101,37%
47	07 OCT/20 - 13 OCT/20	715,361	103,53%	25,30	907,33	131,31%	-	700,45	101,37%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	734,161	106,25%	28,21	935,54	135,39%	30,60	731,05	105,80%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	752,961	108,97%	22,50	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	771,761	111,69%	-	958,04	138,65%	-	731,05	105,80%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	790,561	114,41%	-	958,04	138,65%	118,08	849,13	122,89%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	809,361	117,13%	14,72	972,76	140,78%	-	849,13	122,89%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	835,361	120,89%	27,60	1.000,36	144,77%	82,61	931,74	134,84%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	861,361	124,66%	-	1.000,36	144,77%	-	931,74	134,84%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	887,361	128,42%	16,30	1.016,66	147,13%	-	931,74	134,84%
56	09 DIC/20 - 15 DIC/20	913,361	132,18%	25,07	1.041,73	150,76%	8,50	940,24	136,07%
57	16 DIC/20 - 22 DIC/20	936,111	135,47%	-	1.041,73	150,76%	60,12	1.000,36	144,77%
58	23 DIC/20 - 28 DIC/20	958,861	138,77%	-	1.041,73	150,76%	-	1.000,36	144,77%

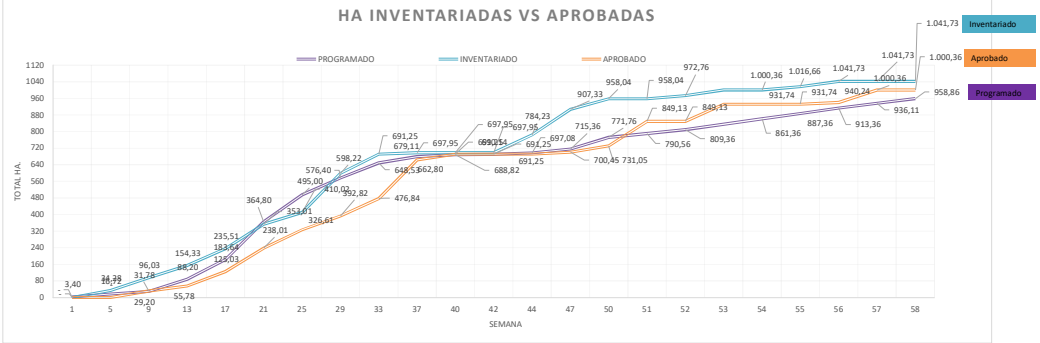

INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA **58** **CORTE** **28 Dic./2020**

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RELACION GENERAL DE DISEÑOS

No.	MES	SEM.	AREA	INTERNO DE DISEÑO	Equiv.	Ha	ESTADO	FECHA RADICACIÓN INICIAL	REVISION	FECHA REVISIÓN	MES FACTURACION	
0	MES 1	SEM. 1	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 2	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 3	A00	ninguno							MES 1	
0	MES 1	SEM. 4	A00	ninguno							MES 1	
1	MES 1	SEM. 5	A01	SC_09_078_V10	2,50	2,50	APROBADO	5-dic-19	REV. 2	5-dic-19	MES 2	
2	MES 2	SEM. 6	A02	EX_06_112_1867_12_V2	2,50	2,50	APROBADO	29-nov-19	REV. 1	15-ene-20	MES 3	
3	MES 2	SEM. 6	A03	EX_06_097_1561_10_V5	5,00	5,00	APROBADO	24-dic-19	REV. 3	24-dic-19	MES 2	
4	MES 2	SEM. 8	A04	EX_06_104_1867_12_V2	19,28	19,28	APROBADO	20-dic-19	REV. 2	20-ene-20	MES 3	
5	MES 2	SEM. 9	A05	ZE_06_027_1561_10_V3	5,00	5,00	APROBADO	27-dic-19	REV. 1	27-dic-19	MES 2	
6	MES 3	SEM. 13	A06	EX_06_389_1561_10_V4	21,50	21,50	APROBADO	23-ene-20	REV. 1	28-ene-20	MES 3	
7	MES 4	SEM. 14	A07	EX_08_053_670_11_V7	29,45	29,45	APROBADO	30-ene-20	REV. 1	10-feb-20	MES 4	
8	MES 4	SEM. 14	A08	EX_08_330_1867_12_V2	5,80	5,80	APROBADO	3-feb-20	REV. 2	21-feb-20	MES 4	
9	MES 4	SEM. 14	A09	EX_06_110_1867_12_V6	2,50	2,50	APROBADO	3-feb-20	REV. 2	28-feb-20	MES 4	
10	MES 4	SEM. 15	A10	EX_08_328_1867_12_V2	24,00	24,00	APROBADO	11-feb-20	REV. 2	27-feb-20	MES 4	
11	MES 4	SEM. 16	A11	EX_08_040_1556_10_V6	2,50	2,50	APROBADO	12-feb-20	REV. 1	17-feb-20	MES 4	
12	MES 4	SEM. 17	A12	MV_08_250_1744_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	19-feb-20	REV. 1	28-feb-20	MES 4	
13	MES 4	SEM. 17	A13	EX_08_338_1867_12_V5	29,30	29,30	APROBADO	24-feb-20	REV. 1	9-mar-20	MES 5	
14	MES 4	SEM. 18	A14	MV_09_179_1249_11_V5	20,57	20,57	APROBADO	25-feb-20	REV. 2	12-mar-20	MES 5	
15	MES 5	SEM. 19	A15	MV_08_234_1744_10_V1	2,50	2,50	APROBADO	5-mar-20	REV. 3	8-may-20	MES 7	
16	MES 5	SEM. 19	A16	ZE_06_027_1561_10_V4	2,50	2,50	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	8-may-20	MES 7	
17	MES 5	SEM. 20	A17	EX_09_031_1556_10_V8	50,61	50,61	APROBADO	16-mar-20	REV. 3	8-may-20	MES 7	
18	MES 5	SEM. 20	A18	EX_08_256_1244_11_V6	10,00	10,00	APROBADO	16-mar-20	REV. 4	8-may-20	MES 7	****
19	MES 7	SEM. 25	A19	EX_08_324_1867_12_V2	13,10	13,10	APROBADO	12-may-20	REV. 1	1-jun-20	MES 8	
20	MES 7	SEM. 26	A20	MV_08_331_943_10_V3	2,50	2,50	APROBADO	13-may-20	REV. 1	1-jun-20	MES 8	
21	MES 7	SEM. 26	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE1	73,00	73,00	APROBADO	13-may-20	REV. 1	9-jun-20	MES 8	***
22	MES 7	SEM. 26	A22	EX_09_035_1556_10_V6	5,00	5,00	APROBADO	19-may-20	REV. 4	18-jun-20	MES 8	
23	MES 7	SEM. 27	A23	ZE_08_052_1556_10_V2	2,50	2,50	APROBADO	19-may-20	REV. 1	1-jun-20	MES 8	
24	MES 7	SEM. 27	A24	CPS_676_EM_09_58_V4	4,30	4,30	APROBADO	24-jun-20	REV. 4	25-jun-20	MES 8	*****
25	MES 8	SEM. 27	A24	EX_08_342_1867_12_V3	5,30	5,30	APROBADO	3-jul-20	REV. 3	3-jul-20	MES 9	
26	MES 8	SEM. 29	A25	EX_08_299_1867_12_V1	5,00	5,00	APROBADO	4-jun-20	REV. 2	7-jul-20	MES 9	
27	MES 8	SEM. 30	A26	EX_09_187_1249_11_V4	2,50	2,50	APROBADO	8-jul-20	REV. 2	8-jul-20	MES 9	
21	MES 8	SEM. 31	A21	EX_08_284_1244_11_V5_PARTE2y3	40,00	40,00	APROBADO	25-jun-20	REV. 3	25-jun-20	MES 8	****
28	MES 8	SEM. 31	A27	EX_08_308_1867_12_V2	11,01	11,01	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	3-jul-20	MES 9	****
29	MES 8	SEM. 31	A28	MV_08_022_1747_10_V3	7,37	7,37	APROBADO	19-jun-20	REV. 1	3-jul-20	MES 9	****
30	MES 8	SEM. 31	A29	MV_08_270_1244_11_V2	3,60	3,60	APROBADO	19-jun-20	REV. 3	3-jul-20	MES 9	****
31	MES 8	SEM. 31	A30	MV_08_264_937_09_V4	12,10	12,10	APROBADO	19-jun-20	REV. 2	3-jul-20	MES 9	****
32	MES 8	SEM. 31	A32	EX_06_114_1867_12_V1	14,90	14,90	APROBADO	3-jul-20	REV. 2	3-jul-20	MES 9	******
33	MES 8	SEM. 32	A33	EX_09_032_1556_10_V9	10,00	10,00	APROBADO	13-jul-20	REV. 3	14-jul-20	MES 9	
34	MES 8	SEM. 32	A34	EX_09_034_1556_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	26-jun-20	REV. 1	3-jul-20	MES 9	******
35	MES 9	SEM. 33	A35	TC_08_330_909_12_V3	7,00	7,00	APROBADO	10-jul-20	REV. 2	10-jul-20	MES 9	
36	MES 9	SEM. 34	A36	EX_08_321_1867_12_V2	18,50	18,50	APROBADO	22-jul-20	REV. 3	22-jul-20	MES 9	
37	MES 9	SEM. 34	A37	MV_08_435_676_09_V7	5,15	5,15	APROBADO	10-ago-20	REV. 5	10-ago-20	MES 10	
38	MES 9	SEM. 34	A38	EX_08_100_1703_10_V11	12,00	12,00	APROBADO	13-ago-20	REV. 2	13-ago-20	MES 10	******* *
39	MES 9	SEM. 34	A39	MV_09_006_V9	24,00	24,00	APROBADO	11-ago-20	REV. 4	16-ago-20	MES 10	
40	MES 9	SEM. 35	A40	EX_09_219_1556_10_V11	26,45	26,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 4	17-ago-20	MES 10	
41	MES 9	SEM. 35	A41	MV_06_057_1703_10_V2	3,25	3,25	APROBADO	5-ago-20	REV. 2	5-ago-20	MES 10	
42	MES 9	SEM. 36	A42	EX_08_009_1445_14_V3	20,18	20,18	APROBADO	18-ago-20	REV. 4	18-ago-20	MES 10	
43	MES 9	SEM. 36	A43	MV_06_024_1561_10_V3	7,00	7,00	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	17-ago-20	MES 10	
44	MES 10	SEM. 37	A44	EX_09_199_1881_12_V3	32,25	32,25	APROBADO	12-ago-20	REV. 3	13-ago-20	MES 10	*******
45	MES 10	SEM. 37	A45	MV_08_014_V14	21,70	21,70	APROBADO	17-ago-20	REV. 3	18-ago-20	MES 10	
46	MES 10	SEM. 37	A46	EX_08_458_943_10_V1	32,63	32,63	APROBADO	14-ago-20	REV. 2	17-ago-20	MES 10	
47	MES 10	SEM. 38	A47	EX_08_039_1556_10_V6	28,45	28,45	APROBADO	17-ago-20	REV. 2	18-ago-20	MES 10	
48	MES 12	SEM. 48	A48	MV_08_257_1244_11_V12	6,70	6,70	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
49	MES 12	SEM. 48	A49	MV_08_002_1703_10_V5	2,50	2,50	APROBADO	22-oct-20	REV. 2	22-oct-20	MES 12	
50	MES 12	SEM. 48	A50	EX_08_311_1867_12_V1	11,00	11,00	APROBADO	4-nov-20	REV. 3	4-nov-20	MES 13	
51	MES 12	SEM. 48	A51	EX_08_331_1867_12_V3	5,00	5,00	APROBADO	4-nov-20	REV. 2	4-nov-20	MES 13	
52	MES 12	SEM. 49	A52	EX_08_288_1244_11_V3	14,60	14,60	APROBADO	5-nov-20	REV. 2	5-nov-20	MES 13	
53	MES 13	SEM. 51	A53	EX_09_217_1556_10_V8	39,60	39,60	APROBADO	27-nov-20	REV. 4	27-nov-20	MES 13	
54	MES 13	SEM. 51	A54	EX_08_320_1867_12_V1	8,10	8,10	APROBADO	27-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
55	MES 13	SEM. 51	A55	EX_08_322_1867_12_V3	17,20	17,20	APROBADO	26-nov-20	REV. 3	27-nov-20	MES 13	
56	MES 13	SEM. 52	A56	EX_08_312_1867_12_V2	53,18	53,18	APROBADO	8-dic-20	REV. 5	8-dic-20	MES 14	
57	MES 13	SEM. 54	A57	EX_08_341_1867_12_V6	38,40	38,40	CONTRATISTA	25-nov-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
58	MES 13	SEM. 54	A58	MV_08_261_1244_11_V2	20,80	20,80	CONTRATISTA	24-dic-20	REV. 2	28-dic-20	MES 15	
59	MES 13	SEM. 54	A59	EX_08_296_1867_12_V5	14,41	14,41	CONTRATISTA	26-nov-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
60	MES 13	SEM. 54	A60	EX_08_283_1244_11_V4	10,00	10,00	INTERVENTORIA	27-nov-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
61	MES 14	SEM. 56	A61	EX_08_171_1556_10_V3	8,50	8,50	INTERVENTORIA	14-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
62	MES 14	SEM. 57	A62	EX_08_351_1867_12_V1	14,72	14,72	INTERVENTORIA	18-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
63	MES 14	SEM. 57	A63	ZE_08_050_1556_10_V3	2,50	2,50	INTERVENTORIA	18-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
64	MES 14	SEM. 57	A64	EX_08_282_1244_11_V3	4,00	4,00	INTERVENTORIA	18-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
65	MES 14	SEM. 57	A65	MV_08_278_1244_11_V5	10,80	10,80	INTERVENTORIA	21-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	
66	MES 14	SEM. 57	A66	EX_09_018_1249_11_V3	3,80	3,80	INTERVENTORIA	22-dic-20	REV. 1	28-dic-20	MES 15	

INFORME ESTADO DE DISEÑOS. ZONA SW

* El contratista no lo cobró en el segundo mes
** Aprobado por interventoría; falta VoBo de SDM.
*** Aprobación parcial de 113Ha; no se puede facturar
**** La meta cambió de la originalmente presentada y de 18,65Ha a 10,0Ha por equivalencias (Esta última es la que se aprueba) Falta VoBo de la SDM La meta cambió de 70,5Ha a 73,0Ha por ampliación de la ZI (Esta última es la que se aprueba)
***** La meta cambió de la originalmente presentada y de 4,18Ha a 4,30Ha
****** La meta cambió de la originalmente presentada en Inventario y pasa de 15,20Ha a 14,90Ha
******* La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 32,20Ha a 32,25Ha
******** La meta cambió de la aprobada en inventario y por ajuste de la ZI y pasa de 11,75Ha a 12,00Ha
NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
META CONTRATO INICIAL: 690,991 Ha
META ADICIÓN Y PRORROGA 1 AL CONTRATO INICIAL: 347,37 Ha
META FINAL CONTRATO: 1038,61 Ha

ESTADISTICAS SEMANA 58 CORTE 28 Dic./2020

DISEÑOS ENTREGADOS / APROBADOS

	CANT. ID	TOTAL Ha
TOTAL Ha ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA	**66**	**977,06**
DISEÑOS APROBADOS EN FISICO (INT+SDM)	**56**	849,13
DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	10	127,93

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE APROBACION

ESTADO DISEÑOS EN PROCESO DE REVISION	CANT. ID	TOTAL Ha	REV. 1	REV. 2	REV. 3 o Más	APROB. INT.
EN PODER DEL CONTRATISTA	3	73,61	52,81	20,80	0,00	
EN PODER DE LA INTERVENTORIA	7	54,32	54,32	0,00	0,00	**849,13**
EN PODER DE MOVILIDAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	**127,93**	**107,13**	**20,80**	**0,00**	


INFORME ESTADO DE DISEÑOS ZONA SUR-OCCIDENTAL SEGUIMIENTO CTO No. 2019-1782

SEMANA 58 **CORTE** 28 Dic./2020

NOTA: EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO ENTRE EL 26/03/2020 y EL 12/04/2020 INCLUSIVE
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTADISTICA POR SEMANAS Y MESES

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		Ha DISEÑADAS			Ha APROBADAS		
		ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO		EN LA SEMANA	ACUMULADO	
		PROGRAMADO	%		DISEÑADO	%		APROBADO	%
1	28 OCT - 04 NOV	2,55	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
2	05 NOV - 11 NOV	5,1	0,7%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
3	12 NOV - 18 NOV	7,65	1,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
4	19 NOV - 25 NOV	10,2	1,5%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
5	26 NOV - 02 DIC	14,4	2,1%	2,50	2,50	0,4%	2,50	2,50	0,4%
6	03 DIC - 09 DIC	18,6	2,7%	7,50	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
7	10 DIC - 16 DIC	22,8	3,3%	-	10,00	1,4%	-	2,50	0,4%
8	17 DIC - 23 DIC	27	3,9%	19,28	29,28	4,2%	-	2,50	0,4%
9	24 DIC - 30 DIC	31,2	4,5%	5,00	34,28	5,0%	10,00	12,50	1,8%
10	31 DIC/19 - 06 ENE/20	43,2	6,3%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
11	07 ENE/20 - 13 ENE/20	55,3	8,0%	-	34,28	5,0%	-	12,50	1,8%
12	14 ENE/20 - 20 ENE/20	67,3	9,7%	-	34,28	5,0%	21,78	34,28	5,0%
13	21 ENE/20 - 28 ENE/20	79,3	11,5%	21,50	55,78	8,1%	21,50	55,78	8,1%
14	29 ENE/20 - 03 FEB/20	99,5	14,4%	37,75	93,53	13,5%	-	55,78	8,1%
15	04 FEB/20 - 10 FEB/20	119,7	17,3%	-	93,53	13,5%	29,45	85,23	12,3%
16	11 FEB/20 - 17 FEB/20	139,9	20,2%	26,50	120,03	17,4%	2,50	87,73	12,7%
17	18 FEB/20 - 24 FEB/20	160,1	23,2%	31,80	151,83	22,0%	5,80	93,53	13,5%
18	25 FEB/20 -02 MAR/20	180,3	26,1%	20,57	172,40	24,9%	29,00	122,53	17,7%
19	03 MAR/20 - 09 MAR/20	216,2	31,3%	5,00	177,40	25,7%	29,30	151,83	22,0%
20	10 MAR/20 - 17 MAR/20	252,2	36,5%	60,61	238,01	34,4%	20,57	172,40	24,9%
21	18 MAR/20 - 25 MAR/20	288,1	41,7%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
22	13 ABR/20 - 20 ABR/20	315,2	45,6%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
23	21 ABR/20 - 28 ABR/20	342,4	49,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
24	29 ABR/20 - 05 MAY/20	369,5	53,5%	-	238,01	34,4%	-	172,40	24,9%
25	06 MAY/20 - 12 MAY/20	396,6	57,4%	13,10	251,11	36,3%	65,61	238,01	34,4%
26	13 MAY/20 - 19 MAY/20	422,5	61,1%	87,30	338,41	49,0%	-	238,01	34,4%
27	20 MAY/20 - 28 MAY/20	448,5	64,9%	-	338,41	49,0%		238,01	34,4%
28	29 MAY/20 - 02 JUN/20	474,4	68,7%	5,30	343,71	49,7%	18,10	256,11	37,1%
29	03 JUN/20 - 09 JUN/20	500,3	72,4%	5,00	348,71	50,5%	73,00	329,11	47,6%
30	10 JUN/20 - 16 JUN/20	523,3	75,7%	2,50	351,21	50,8%	-	329,11	47,6%
31	17 JUN/20 - 23 JUN/20	546,2	79,0%	88,98	440,19	63,7%	5,00	334,11	48,4%
32	24 JUN/20 - 28 JUN/20	562,6	81,4%	12,50	452,69	65,5%	44,30	378,41	54,8%
33	29 JUN/20 - 07 JUL/20	592,1	85,7%	7,00	459,69	66,5%	61,78	440,19	63,7%
34	08 JUL/20 - 14 JUL/20	606,4	87,8%	59,65	519,34	75,2%	19,50	459,69	66,5%
35	15 JUL/20 - 21 JUL/20	620,7	89,8%	56,88	576,22	83,4%	18,50	478,19	69,2%
36	22 JUL/20 - 28 JUL/20	635,0	91,9%	-	576,22	83,4%	-	478,19	69,2%
37	29 JUL/20 - 04 AGO/20	649,3	94,0%	86,58	662,80	95,9%	-	478,19	69,2%
38	05 AGO/20 - 11 AGO/20	663,6	96,0%	28,45	691,25	100,04%	5,15	483,34	69,9%
39	12 AGO/20 - 18 AGO/20	669,0	96,8%	-	691,25	100,04%	207,91	691,25	100,04%
40	19 AGO/20 - 28 AGO/20	676,9	97,96%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
41	29 AGO/20 - 01 SEP/20	680,02	98,41%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
42	02 SEP/20 - 08 SEP/20	685,5	99,21%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
43	09 SEP/20 - 15 SEP/20	690,991	100,00%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
44	16 SEP/20 - 22 SEP/20	694,741	100,54%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
45	23 SEP/20 - 29 SEP/20	698,491	101,09%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
46	30 SEP/20 - 06 OCT/20	702,241	101,63%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
47	06 OCT/20 - 13 OCT/20	705,991	102,17%	-	691,25	100,04%	-	691,25	100,04%
48	14 OCT/20 - 20 OCT/20	720,991	104,34%	25,20	716,45	103,68%	-	691,25	100,04%
49	21 OCT/20 - 28 OCT/20	735,991	106,51%	14,60	731,05	105,80%	9,20	700,45	101,37%
50	29 OCT/20 - 03 NOV/20	750,991	108,68%	-	731,05	105,80%	-	700,45	101,37%
51	04 NOV/20 - 10 NOV/20	765,991	110,85%	47,70	778,75	112,70%	30,60	731,05	105,80%
52	11 NOV/20 - 17 NOV/20	780,991	113,02%	70,38	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
53	18 NOV/20 - 24 NOV/20	804,741	116,46%	-	849,13	122,89%	-	731,05	105,80%
54	25 NOV/20 - 01 DIC/20	828,491	119,90%	83,61	932,74	134,99%	64,90	795,95	115,19%
55	02 DIC/20 - 08 DIC/20	852,241	123,34%	-	932,74	134,99%	53,18	849,13	122,89%
56	09 DIC/20 - 15 DIC/20	875,991	126,77%	8,50	941,24	136,22%	-	849,13	122,89%
57	16 DIC/20 - 22 DIC/20	902,241	130,57%	35,82	977,06	141,40%	-	849,13	122,89%
58	23 DIC/20 - 28 DIC/20	928,491	134,37%	-	977,06	141,40%	-	849,13	122,89%

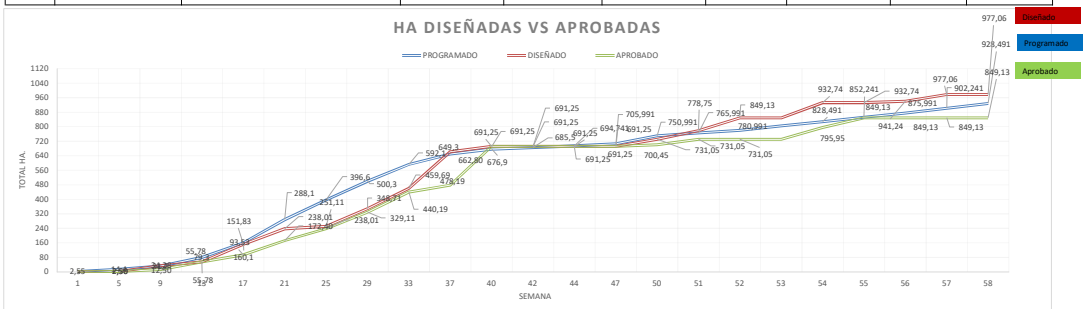

FACTURACION

VALOR HA $ 610.876,00

FACTURACION	Ha DISEÑADAS	Ha APROB. EN FISICO	Ha APROB. DIG. INTERV.	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	VALOR MENSUAL		VALOR ACUMULADO	
					Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM	Ha APROBADAS EN FÍSICO	Ha APROB. DIG. SIG. SDM
MES 1	2,50	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 2	10,00	12,50	-	-	$ 7.635.950,00	$ -	$ 7.635.950,00	$ -
MES 3	43,28	43,28	-	-	$ 26.438.713,00	$ -	$ 34.074.663,00	$ -
MES 4	116,62	66,75	-	-	$ 40.775.973,00	$ -	$ 74.850.636,00	$ -
MES 5	65,61	49,87	-	-	$ 30.464.386,12	$ -	$ 105.315.022,12	$ -
MES 6	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 7	100,40	65,61	-	-	$ 40.079.574,36	$ -	$ 145.394.596,48	$ -
MES 8	114,28	140,40	-	-	$ 85.766.990,40	$ -	$ 231.161.586,88	$ -
MES 9	123,53	99,78	-	-	$ 60.953.207,28	$ -	$ 292.114.794,16	$ -
MES 10	115,03	213,06	-	-	$ 130.153.240,56	$ -	$ -	$ -
MES 11	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
MES 12	39,80	9,20	-	-	$ 5.620.059,20	$ -	$ -	$ -
MES 13	201,69	95,50	-	-	$ 58.338.658,00	$ -	$ -	$ -
MES 14	44,32	53,18	-	-	$ 32.486.385,68	$ -	$ -	$ -
SUB-TOTAL CONTRATO	**977,06**	**849,13**	**0,00**	**0,00**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**	**$ 518.713.137,60**	**$ -**

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 58 **DEL** 22/12/2020 **AL** 28/12/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1782-2019 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Revisión SDQS-2613742019 despues de transcurrido 50 % , se evidencia atencion de observación emitida por la interventoria



Descripción Foto 2.

Revisión SDQS-2613742019 despues de transcurrido 50 % , se evidencia atencion de observación emitida por la interventoria



Descripción Foto 3.

Revisión ciclorruta calle 13 se evidencia falta de implementación.



Descripción Foto 4.

Revisión ciclorruta calle 13 se evidencia falta de implementación.



Descripción Foto 5.

Visita inicial al ZE_08_461_943



Descripción Foto 6.

Visita inicial al ZE_08_461_943

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 58 (consecutivo) **DEL** 22/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 28-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra cuando lo requiera)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		-
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación inicial		15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	-
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

FRENTES TERMINADOS PARA APLICACIÓN GARANTIAS

No	ID	CP	UPZ	LOCALIDAD	Tipo de implementación	SEÑALES VERTICALES			SEÑALES horizontales																												
						Días de garantía	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	M2 (Días garantías)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	ML (Días garantías)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	bordillos trasnsmisibles (Días garantías)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Techos (Días garantías)	Fecha implementación	Porcentaje a la fecha	Techos (Días garantías)	Fecha implemtacion	Porcentaje a la fecha	Hitos (Días garantías)	Fecha implemtacion	Porcentaje a la fecha	Boyas(Días garan	Fecha implemtacion	Porcentaje a la fecha	AGREGADO (Días garantías)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	RESALTOS (Días garantías)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha	Estepariras (Días garantías)	Fecha vencimiento (Garantía)	Porcentaje a la fecha
1	EX_02_038_1556_10	ID 82	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	27/11/2019	130,52%	304	27/11/2019	130,52%	426	27/11/2019	93,23%	633	27/11/2019	62,75%	426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,2%									
2	EX_02_201_1881_12	ID 162	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal				304	15/11/2019	134,47%	304	15/11/2019	134,47%				593	0/01/1900	68,96%				426	15/11/2019	96,05%	426	15/11/2019	96,0%									
3	EX_02_201_1881_12	ID 163	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	22/11/2019	132,16%	304	22/11/2019	132,16%				633	0/01/1900	63,54%				426	22/11/2019	94,40%	426	22/11/2019	94,4%									
4	EX_02_201_1881_12	ID16	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	24/11/2019	131,51%	304	24/11/2019	131,51%				633	0/01/1900	63,22%				426	24/11/2019	93,93%	426	24/11/2019	93,9%									
5	EX_02_201_1881_12	ID 15	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	19/11/2019	133,15%	304	19/11/2019	133,15%				633	0/01/1900	64,01%				426	19/11/2019	95,11%	426	19/11/2019	95,1%									
6	MV_09_048_1556_10	CARRA 13	90- Fontibón	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	21,86%																													
7	MV_09_024_1249_11	CARRA 13	16-puente aranda 112-granjaripjas techo 113-Bavaria 111- Puente aranda	75 - Fontibón16-Puente	Vertical	1825	25/11/2019	21,86%																													
8	MV_09_189_1556_10	CARRA 13	76- Fontibon san pablo	75 - Fontibón	Vertical	1825	25/11/2019	21,86%																													
9	EX_02_201_1881_12	ID 19	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	25/11/2019	131,18%	304	25/11/2019	131,18%				633	25/11/2019	63,07%				426	25/11/2019	93,70%	426	25/11/2019	93,7%									
10	EX_02_192_1881_12	ID 18	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	27/11/2019	130,52%	304	27/11/2019	130,52%				633	27/11/2019	62,75%	426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,2%									
11	EX_02_201_1881_12	ID 97	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	27/11/2019	130,52%	304	27/11/2019	130,52%				633	27/11/2019	62,75%				426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,2%									
12	EX_02_180_1881_12	ID 23	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	24/11/2019	131,51%	304	24/11/2019	131,51%				633	24/11/2019	63,22%				426	24/11/2019	93,93%	426	24/11/2019	93,9%									
13	EX_02_038_1556_10	ID 26	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	30/11/2019	21,59%	304	27/11/2019	130,52%	304	27/11/2019	130,52%				633	27/11/2019	62,75%				426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,2%	487	27/11/2019	82%						
14	EX_02_201_1881_12	ID 10	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	27/11/2019	130,52%	304	27/11/2019	130,52%				633	27/11/2019	62,75%				426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,2%									
15	EX_02_192_1881_12	ID 186	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	27/11/2019	130,52%	304	27/11/2019	130,52%				633	27/11/2019	62,75%				426	27/11/2019	93,23%	426	27/11/2019	93,2%									
16	EX_02_038_1556_10	ID 159	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	25/11/2019	21,86%	304	27/11/2019	130,52%	304	29/11/2019	130,52%				633	27/11/2019	62,75%				426	27/11/2019	93,23%	426	21/11/2019	94,6%									
17	MV_09_019_1249_11	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	27/11/2019	108,77%																							
18	EX_09_200_1881_12	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	Horizontal							365	15/11/2019	112,05%																							
19	EX_09_031_1556_10	ATAHUALPA	0	09_Fontibon	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	821	26/12/2019	44,81%	821	26/12/2019	44,81%				554	26/12/2019	66,48%																	
20	MV_09_424_947_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	108,77%																							
21	EX_13_002_1556_10	AV ESPERANZA	0	09_Fontibon	horizontal							365	0/01/1900	102,47%																							
22	EX_02_185_1881_12	ID 182	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	213	12/12/2019	179,41%	213	12/12/2019	179,41%				514	12/12/2019	74,31%				335	12/12/2019	114,17%	335	12/12/2019	114,2%									
23	EX_02_038_1556_10	ID 110	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	365	12/12/2019	104,66%	365	12/12/2019	104,66%				949	12/12/2019	40,25%				548	12/12/2019	69,77%	548	12/12/2019	69,8%									
24	EX_02_038_1556_10	ID 167	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	213	12/12/2019	179,41%	213	12/12/2019	179,41%				514	12/12/2019	74,31%				335	12/12/2019	114,17%	335	12/12/2019	114,2%									
25	EX_02_038_1556_10	ID 30	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	213	12/12/2019	179,41%	213	12/12/2019	179,41%				475	12/12/2019	80,51%				304	12/12/2019	125,59%	304	12/12/2019	125,6%									
26	EX_02_201_1881_12	ID 160	99- Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	274	12/12/2019	139,54%	274	12/12/2019	139,54%				593	12/12/2019	64,40%				304	12/12/2019	125,59%	304	12/12/2019	125,6%									
27	EX_02_185_1881_12	ID 29	Chico lago	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	243	16/12/2019	155,34%	243	16/12/2019	155,34%				475	16/12/2019	79,66%				365	16/12/2019	103,56%	365	16/12/2019	103,6%									
28	MV_13_168_1249_11	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	102,47%																							
29	EX_13_001_1556_10	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							365	0/01/1900	102,47%																							
30		ATAHUALPA	Fontibon	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	17/12/2019	20,66%	821	26/12/2019	44,81%	821	26/12/2019	44,81%				554	26/12/2019	66,48%																335	16/12/2019	113%
31	EX_02_033_1556_001	ID13	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	365	3/01/2020	98,63%	365	3/01/2020	98,63%				870	3/01/2020	41,38%				517	3/01/2020	69,62%	517	3/01/2020	69,6%									
32	sc_02_166_v1	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	horizontal							365	3/01/2020	98,63%										548	29/12/2019	66,67%											
33	EX_02_356_946_10	0	02 - Chapinero	02 - Chapinero	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	335	3/01/2020	107,60%	335	3/01/2020	107,60%				909	3/01/2020	39,58%				487	3/01/2020	73,97%	487	3/01/2020	74,0%									
34	EX_18_158_1244_11	0	Rafael uribe	0	horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	335	20/01/2020	102,52%	335	20/01/2020	102,52%																							
35	EX_09_214_1881_12_V2	AV ESPERANZA	Fontibon	0	horizontal							350	8/01/2020	101,49%																							
36	CLM-181002-000006	0	0	Tunjuelito	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	578	20/01/2020	59,35%	548	20/01/2020	62,65%																							
37	CP_CLM-181114-000025	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	882	27/01/2020	38,09%	852	27/01/2020	39,45%																					633	27/01/2020	53%
38	CP_CLM-181114-000013	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/01/2020	18,41%	821	27/01/2020	40,91%	1095	27/01/2020	30,68%																					913	27/01/2020	37%
39	CP_SDM-236118-19	0	Kennedy	Castilla	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	213	27/02/2020	143,25%	335	27/02/2020	91,16%																					274	27/02/2020	111%
40	MV_AV_CALI_941_09_ AMERICAS Y ESPERANZA	0	Kennedy	Castilla	horizontal				365	27/02/2020	83,56%	365	27/02/2020	83,56%																							
41	SDM-299509-18	0	Kennedy	Castilla	horizontal				578	27/02/2020	52,78%	578	27/02/2020	52,78%																							
42	Solicitud gerente localidad	0	tunjuelito	Tunjuelito	horizontal				730	21/01/2020	46,85%	669	21/01/2020	51,11%																					633	14/01/2020	55%
43	MV_08_001_1703_10	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	487	27/02/2020	62,67%	335	27/02/2020	91,16%				304	27/02/2020	100,27%	304	27/02/2020	100,27%	213	27/02/2020	143,25%									304	27/02/2020	100%
44	CP_SDM-DSC-136240-18	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	28/02/2020	16,66%																													
45	CP_SDM-76913-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	17,75%	669	27/02/2020	45,58%	608	27/02/2020	50,14%																				633	4/02/2020	52%	395	27/02/2020	77%

Consorcio
InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 58 (Consecutivo) **DEL** 22/12/2020 (dd/mm/aa) **AL** 28-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Incluya el nombre y razon social del contratista)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 7.957.500.000
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 7.957.500.000
Plazo Inicial	15 MESES
Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15 MESES
Fecha de Iniciación	29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial	15/02/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.061.619.391
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 2.061.619.391
Plazo Inicial	16MESES
Plazo Prorroga 1	N/A
Plazo Actualizado	15MESES
Fecha de Iniciación	29/10/2019
Fecha de Terminación	16/03/2021

2. GARANTIAS

46	CP_SDM-29716-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	8/02/2020	17,75%																				791	27/05/2020	27%			
47	CP_SQDS-1387272019	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	578	27/02/2020	52,78%	730	27/02/2020	45,48%														578	14/01/2020	60%				593	14/01/2020	59%
48	EX_08_338_1867_12_V4	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	548	27/02/2020	55,71%	548	27/02/2020	55,71%																			395	27/02/2020	77%
49	SDQS 18919622018	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	213	27/02/2020	143,25%	213	27/02/2020	143,25%																			395	31/01/2020	84%
50	CP_SDM-DSVCT-7089-19	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	183	27/02/2020	167,12%	183	27/02/2020	167,12%		243	27/02/2020	125,34%	183	27/02/2020	167,12%													
51	EM_08_124	0	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	27/05/2020	11,78%	578	27/05/2020	37,20%	456	27/05/2020	47,12%														213	4/05/2020	112%				426	4/05/2020	56%
52	EX_09_200_1881_12_V2	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	426	27/02/2020	71,62%	426	27/02/2020	71,62%		183	27/02/2020	167,12%	304	27/02/2020	100,27%	243	27/02/2020	125,34%				304	27/02/2020	100%				243	27/02/2020	125%
53	SSDQS-1383742018	0	Fontibon	0	horizontal																												304	27/02/2020	100%
54	EX_08_323_1867_12	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	27/02/2020	16,71%	365	27/02/2020	83,56%	426	27/02/2020	71,62%																			277	27/02/2020	110%
55	EX_08_042_1556_10	0	Fontibon	0	Vertical horizontal	1825	28/03/2020	15,07%	669	28/03/2020	41,10%																								
56	EX_08_327_1867_10	ZONA ESCOLAR	Kennedy	0	Vertical horizontal	1825	7/03/2020	16,22%	213	28/03/2020	129,16%	213	28/03/2020	129,16%																			277	28/03/2020	99%
57	EX_08_329_1867_12	ZONA ESCOLAR	patio bonito	Kennedy	Vertical horizontal	1825	28/04/2020	13,37%	426	28/04/2020	57,30%	426	28/04/2020	57,30%																						
58	SDM_DSC_83051_18	0	Carvajal	Kennedy	horizontal	1825	23/03/2020	15,34%																									514	23/03/2020	54%			
59	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y AMERICAS)	0	Kennedy	0	horizontal							365	24/04/2020	67,95%																					
60	MV_AV_CALI_941_09_(AV CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 46S Y CALLE 59S)	0	Kennedy	0	horizontal							365	26/04/2020	67,40%																					
61	SDM-294379-18	0	Kennedy	0	horizontal				183	29/04/2020	133,15%																								
62	SDM_316509_18	0	Kennedy	0	horizontal																							487	27/04/2020	50%						
63	SDQS_2725482019	0	Fontibon	San pablo	horizontal				213	28/05/2020	100,51%																								
64	SDM-261374-2019	0	Capellania	Fontibon	horizontal				517	28/05/2020	41,39%	517	28/05/2020	41,39%																					
65	SDM-SCTT-225169-2019	Zona Escolar	0	kennedy	horizontal				517	27/05/2020	41,58%	517	27/05/2020	41,58%																					
66	SDM-318531-2019	Zona escolar	0	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	11,78%	517	27/05/2020	41,58%	517	27/05/2020	41,58%																					
67	ZE_06_269_1561_10	Zona escolar	0	Tunjuelito	horizontal	1825	27/04/2020	13,42%	669	27/03/2020	41,25%	548	27/03/2020	50,41%		544	27/03/2020	50,69%	335	27/03/2020	82,49%							487	27/03/2020	57%				395	27/03/2020	70%
68	ZE_06_168_151_10	Zona escolar	modelia	fontibon	horizontal				639	27/04/2020	38,36%																	487	27/04/2020	50%						
69	SDQS_272490-2019	Zona escolar	FONTIBON	fontibon	horizontal				213	28/05/2020	100,51%	213	28/05/2020	100,51%																				395	28/05/2020	54%
70	MV_AV_BOYACA_941_09_V27	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal				365	23/05/2020	60,00%	365	23/05/2020	60,00%		544	23/05/2020	40,22%																	
71	SDM-15023-2020	N/A	castilla	kennedy	horizontal	1825	27/05/2020	11,78%	669	27/05/2020	32,13%	669	27/05/2020	32,73%																			426	27/05/2020	50%
72	CLM-180320-000001	N/A	0	0	horizontal				760	27/05/2020	28,27%	700	27/05/2020	30,73%																			395	27/05/2020	54%
73	SDM-265092	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	23/05/2020	102,86%	213	23/05/2020	102,86%														426	27/04/2020	58%				487	27/05/2020	44%
74	SDM-242548	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal				213	27/05/2020	100,98%	213	27/05/2020	100,98%																			395	27/05/2020	54%
75	SDM-316519-2018	N/A	Americas	Kennedy	horizontal	1825	27/06/2020	10,08%	213	27/06/2020	86,42%	213	27/06/2020	86,42%																			517	27/06/2020	36%
76	SDM-554-20	N/A	margaritas	kennedy	horizontal				700	23/05/2020	31,30%	700	23/05/2020	31,30%																			487	27/05/2020	44%
77	SDM_SGV_281345_19	N/A	venecia	tunjuelito	horizontal										304	28/05/2020	70,36%	304	28/05/2020	70,36%															
78	SDQS_176846-2019	N/A	FONTIBON	fontibon	horizontal																												456	27/05/2020	47%
79	CLM_181123-00032	N/A	venecia	Tunjuilito	horizontal	1825	28/06/2020	10,03%	548	28/06/2020	33,42%	548	28/06/2020	33,42%														304	26/06/2020	61%				517	26/06/2020	36%
80	SDQS_2672752019	N/A	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																							304	3/06/2020	68%				517	28/06/2020	35%
81	SDQS_237461	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	11,78%																				304	27/05/2020	71%						
82	SDQS_237461	N/A	CAPELLANIA	FONTIBON	horizontal/VERICAL	1825	27/05/2020	11,78%																				213	27/05/2020	101%						
83	EX_06_93_1244_11	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	10,14%	578	26/06/2020	32,01%	456	26/06/2020	40,55%														304	26/06/2020	61%				274	26/06/2020	68%
84	CLM_180405-000032	N/A	TUNJUELITO	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	10,03%	395	28/06/2020	46,28%	517	28/06/2020	35,39%														365	26/06/2020	51%				274	28/06/2020	67%
85	SDM_229731_18	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	28/06/2020	10,03%	487	26/06/2020	38,01%	335	26/06/2020	55,29%																			435	26/06/2020	43%
86	SDM_229731	N/A	0	TUNJUELITO	horizontal/VERICAL	1825	26/06/2020	10,14%																				213	26/06/2020	87%						
87	SDM_DCV_293492_18	N/A	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal																							213	10/07/2020	80%						

Consorcio InterSEÑALIZACION

FORMATO

INFORME SEMANAL GARANTIAS

SEMANA No. 58 (Consecutivo) **DEL** 22/12/2020 (dd-mm-aa) **AL** 28-dic (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1802-2019 (Numero de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.**

1. DATOS GENERALES

OBJETO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SDM-LP-026-2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – ZONA 3 SUR-OCCIDENTE QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, KENNEDY Y FONTIBON.

(Indique el objeto del contrato de obra tal cual lo dice)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DESEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA		
Valor	$	7.957.500.000
Valor Adicional 1		
Valor Actualizado	$	7.957.500.000
Plazo Inicial		15 MESES
Plazo Prórroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15 MESES
Fecha de Iniciación		29/09/2019
Fecha de Terminación Inicial		15/02/2020

(Incluya el dinero y fecha como se indica en el contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Valor Inicial	$	2.061.619.391
Valor Adicional 1	$	
Valor Actualizado	$	2.061.619.391
Plazo Inicial		16MESES
Plazo Prorroga 1		N/A
Plazo Actualizado		15MESES
Fecha de Iniciación		29/10/2019
Fecha de Terminación		16/03/2021

2. GARANTIAS

88	CLM_181008_000042	N/A	FONTIBON	FONTIBON	horizontal	1825	10/07/2020	9,37%																						475	10/07/2020	36%			
89	SDQS_280824-2018	N/A	LA CABAÑA	FONTIBON	horizontal																	243	10/07/2020	70,27%											
90	EX_09_001_1214_15_V4	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	8,99%	213	27/07/2020	72,33%	213	27/07/2020	72,33%	304	27/07/2020	50,63%				335	17/07/2020	49,02%										183	27/07/2020	84%
91	EX_09_203_1881_12_V44	N/A	0	0	horizontal	1825	17/07/2020	8,99%	487	17/07/2020	33,70%	335	17/07/2020	49,02%																		435	17/07/2020	38%
92	EX_08_338_1867_12	N/A	Americas	KENNEDY	horizontal	1825	28/02/2020	16,66%	548	27/02/2020	55,71%	548	27/02/2020	55,71%																				
93	EX_09_201_1881_12	N/A	MODELIA	FONTIBON	horizontal	1825	28/04/2020	13,37%	578	28/03/2020	47,58%	821	28/03/2020	33,49%																		487	28/05/2020	44%
94	clm_180517-000083	N/A	N/A	tunjuelito	horizontal																							365	28/06/2020	50%					
95	SDQS_1772412019	SDQS_1772412019	ciudad salitre	fontibon	horizontal										304	27/07/2020	50,63%																	
96	MV_08_001_1214	2808242018	la cabaña	fontibon	horizontal																	243	27/07/2020	63,29%											
97	EX_09_185_1249	181008_000042	FONTIBON	fontibon	horizontal																									365	27/07/2020	42%			
98	SDM_394713_18	SDM_394713_18	CASTILLA	KENNEDY	horizontal																											730	28/07/2020	21%
99	ze_06_163_1561_10	CP_SDM-OGS-227601-19	CASTILLA	KENNEDY	horizontal				548	6/08/2020	26,30%	548	6/08/2020	26,30%																		395	6/08/2020	36%
100	CLM-181116-000006	CLM-181116-000006	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal	1825	27/07/2020	8,44%	183	27/07/2020	84,38%																					183	6/08/2020	79%
101	CLM_180823_000003	CLM_180823_000003	CARVAJAL	KENNEDY	horizontal				548	27/08/2020	22,47%							274	27/08/2020	44,93%		243	27/08/2020	50,55%							213	27/08/2020	58%			
102	EM-08_073	SDM_316511_18	AMERICAS	KENNEDY	horizontal				669	27/07/2020	23,01%	669	27/07/2020	23,01%				395	27/07/2020	38,95%	243	27/07/2020	63,29%	304	27/07/2020	50,63%						213	27/07/2020	72%	395	6/08/2020	36%
103	bote	N/A	AMERICAS	ENGATIVA	horizontal	1825	6/09/2020	6,19%	548	6/09/2020	20,64%	365	6/09/2020	30,96%				243	6/09/2020	46,44%	243	6/09/2020	46,44%	243	27/07/2020	63,29%				304	6/09/2020	37%			
104	CLM_180823_000004	N/A	castilla	kennedy	horizontal				487	28/07/2020	31,44%	335	28/07/2020	45,73%				335	28/07/2020	45,73%														243	6/09/2020	46%
105	EX_09_200_1881_12	SDQS_2108342019	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				517	28/08/2020	23,59%	517	28/08/2020	23,59%																		395	28/08/2020	31%
106	MV_09_ 048_1556_10 y MV-09-189-1556-10	0	FONTIBON	FONTIBON	horizontal				183	28/08/2020	66,85%	183	28/08/2020	66,85%				183	28/08/2020	66,85%				183	28/08/2020	66,85%									
107	mv_08_435_676_09	SDM_275666-18	TIMIZA	KENNEDY	horizontal													243	28/09/2020	37,40%				243	28/08/2020	50,14%				304	28/09/2020	30%			
108	EX_10_006_1560_10	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	4,99%	335	28/09/2020	27,20%	335	28/09/2020	27,20%				243	28/09/2020	37,40%	213	28/09/2020	42,74%	213	28/08/2020	42,74%							243	28/09/2020	37%
109	EX_10_372_1842_12	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	4,99%	335	28/09/2020	27,20%	335	28/09/2020	27,20%				243	28/09/2020	37,40%	213	28/09/2020	42,74%	213	28/09/2020	42,74%				304	28/09/2020	30%	243	28/09/2020	37%
110	EX_10_008_1560_10	0	FERIAS	ENGATIVA	horizontal	1825	28/09/2020	4,99%	365	28/09/2020	24,93%	365	28/09/2020	24,93%																		395	28/09/2020	23%
111	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78B	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	4,00%	365	16/10/2020	20,00%	274	16/10/2020	26,67%				243	28/10/2020	25,07%	213	16/10/2020	34,29%	213	16/10/2020	34,29%									
112	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 75	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	4,00%	365	28/10/2020	16,71%	274	28/10/2020	22,28%				243	28/10/2020	25,07%	213	16/10/2020	34,29%	213	28/10/2020	28,65%									
113	EX_13_003_1556_10	0	CUIDAD SALITRE	TEUSAQUILLO	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	3,34%	487	28/10/2020	12,53%	335	28/10/2020	18,23%				243	28/10/2020	25,07%	243	16/10/2020	30,00%	243	28/10/2020	25,07%				243	28/10/2020	25%	243	28/10/2020	25%
114	MV_09_048_1556_10	0	fontibon	fontibon	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	3,34%	183	28/10/2020	33,42%	183	28/10/2020	33,42%																						
115	MV_12_281	0	BOYACA REAL	ENGATIVA	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	3,34%	335	28/10/2020	18,23%	335	28/10/2020	18,23%				243	28/10/2020	25,07%																
116	TPD_PL_2342	0	0	SANTAFE	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	28/10/2020	3,34%	426	28/10/2020	14,32%	426	28/10/2020	14,32%				243	28/10/2020	25,07%	243	28/10/2020	25,07%	243	28/10/2020	25,07%				304	28/10/2020	20%			
117	INTERSECCIÓN CONVENIO SDM-IDU CALLE 26 SUR CON KR 78k	0	KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/10/2020	4,00%	365	5/11/2020	14,52%	274	5/11/2020	19,36%				243	28/10/2020	25,07%	213	16/10/2020	34,29%	213	5/11/2020	24,89%									
118	ZE_08_461_943_10	0	TIMIZA	KENNEDY	HORIZONTAL/VERTICAL	1825	16/12/2020	0,66%	548	16/12/2020	2,19%	548	16/12/2020	2,19%																		395	16/12/2020	3%

3. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
Se relacionan actividades que a la fecha hantterminado sus labores .
Se registran tambien actividades que estan en ejecución.


4. ANEXOS

	SI	NO
1. Registro Fotográfico	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los _____ (Día en letras) 28 (Día en números) días del mes de Diciembre (Mes en letras)

(Nombre) Firma de Ing. RESIDENTE

(Nombre) Firma de auxiliar de garantias
(Nombre) LEIDY JOHANA RUBIO

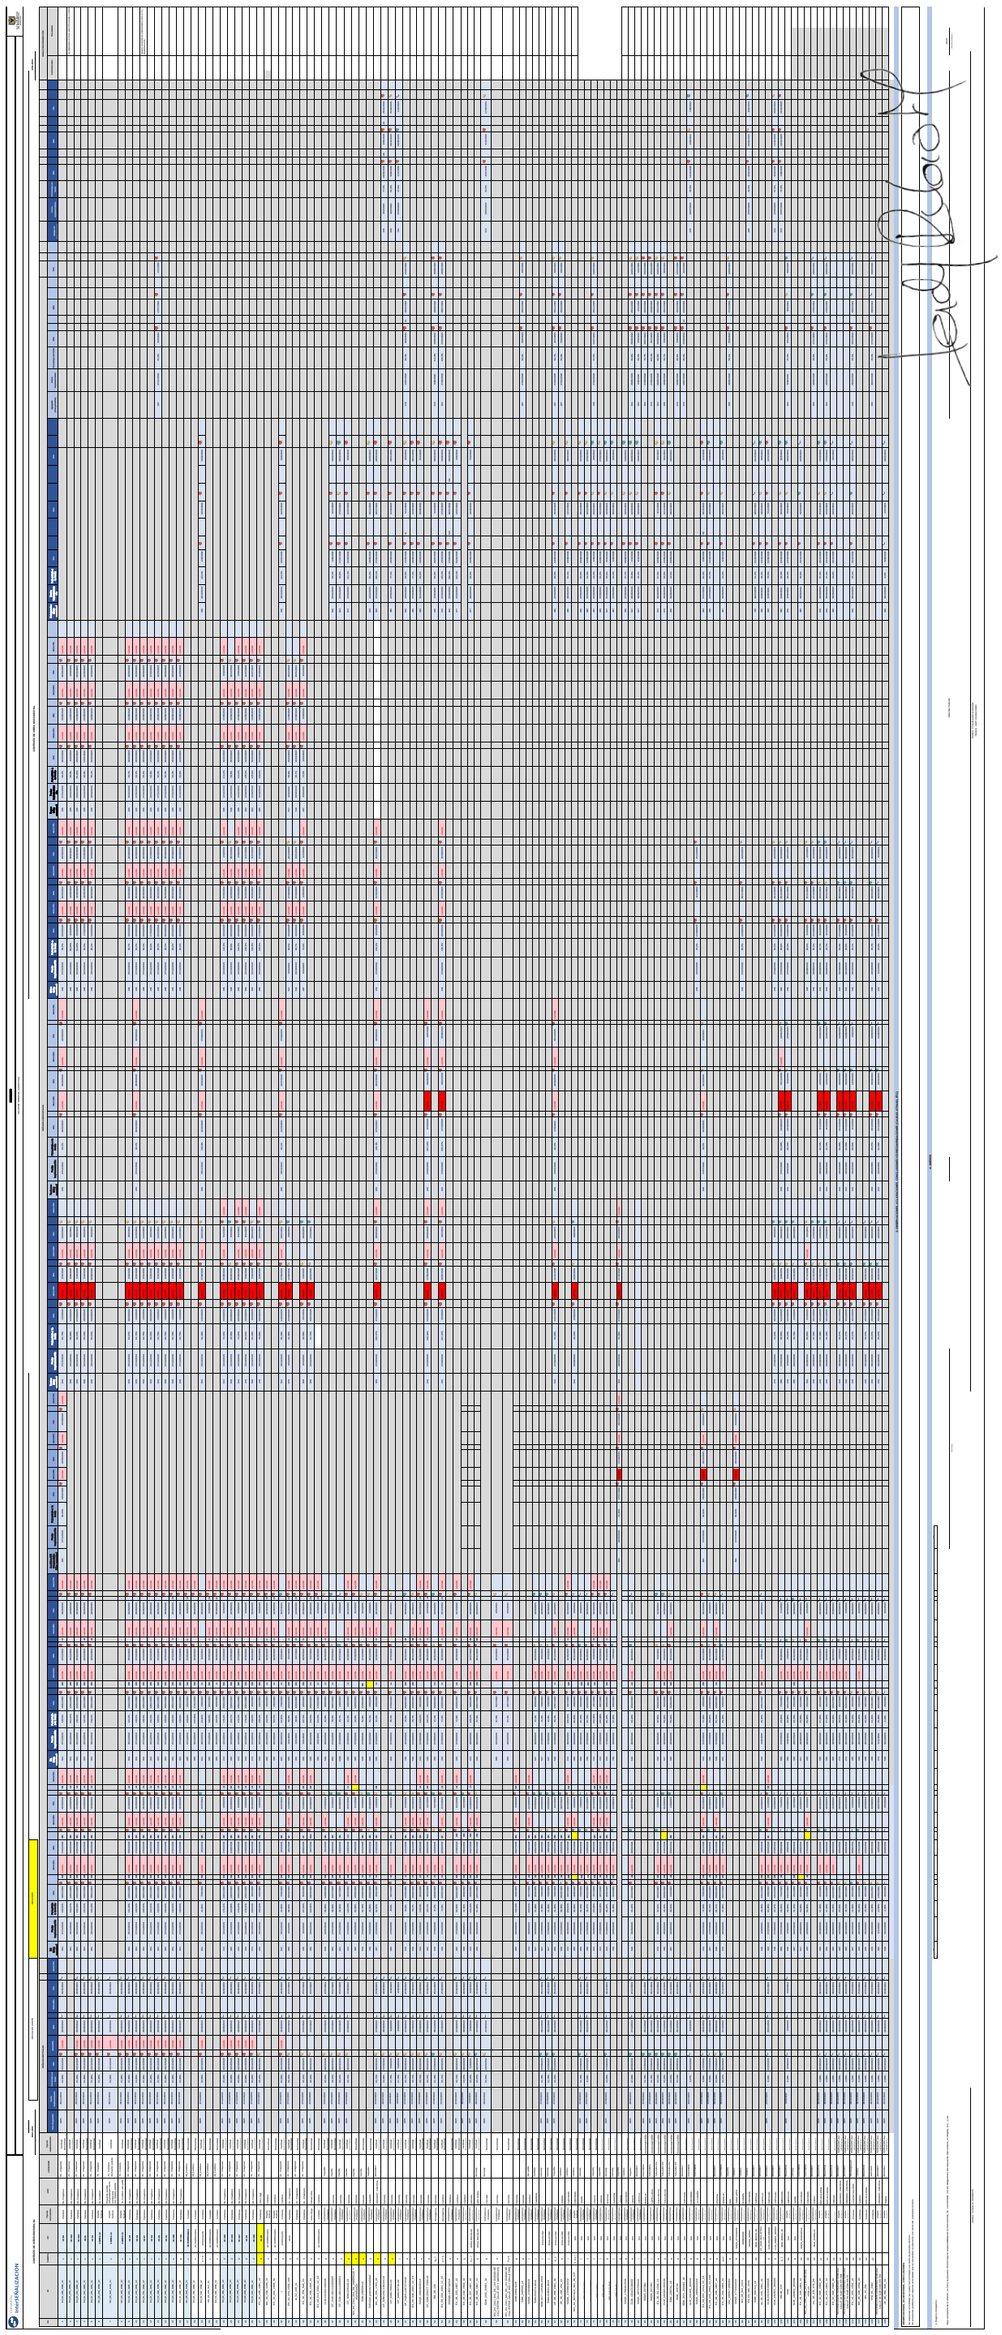

ANEXO 9

RELACION DE SEÑALES SUMINISTRADAS

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO REQUERIMIENTO A ALMACÉN Y POSTERIOR ENTREGA DEL ALMACÉN A QUIEN REQUIERE	
	Código: PA01-PR12-F02	Versión 2.0

FECHA DE SOLICITUD 10 12 2020 **FECHA DE ENTREGA** 28 12 2020

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCION TÉCNICA DE SEÑALIZACIÓN

FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE RECIBIR EL BIEN ING. SERGIO VALDERRAMA CAMARGO. DIRECTOR DE INTERVENTORIA **No. CÉDULA** 79.330.277

NÚMERO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en caso de que quien reciba los elementos sea contratista)

NOMBRE Y CÉDULA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (en caso de que quien reciba los elementos sea contratista) CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN VIAL 1802-2019

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente. ITEM 2	19,00	19,00
2	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente. ITEM 5	72,00	72,00
3	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente. ITEM 6	27,00	27,00
4	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente. ITEM 7	15,00	15,00
5	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV o Superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente. ITEM 8	6,00	6,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - SP cumpliendo con normatividad vigente. ITEM 10	9,00	9,00
7	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente. ITEM 18	14,00	14,00
8	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente. ITEM 19	2,00	2,00
10	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). ITEM 20	5,00	5,00

11	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). ITEM 21	1,00	1,00
12	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente. ITEM 28	19,00	19,00
13	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños). ITEM 29	4.220,00	4.220,00
14	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex). ITEM 30	52,00	52,00
15	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). ITEM 73	1.534,00	1.534,00
16	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. ITEM 75	8.160,00	8.160,00
17	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. ITEM 78	290,00	290,00
18	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. ITEM 80	95,00	95,00
19	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. ITEM 83	69,00	69,00
20	Instalación de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. ITEM NP 1	25,00	25,00
21	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación). ITEM 1	4.239,00	4.239,00
22	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica. ITEM 86	13,00	13,00

23	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica. ITEM 87	7,00	7,00
24	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval. ITEM 95	6,00	6,00

NOTAS

1. Para los contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el supervisor del contrato, de igual forma el Supervisor y/o Interventor es el encargado de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al Contratista.
2. El(los) funcionario(s) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del supervisor del contrato mediante el cual esta vinculado el contratista

MARIO GABRIEL CARBONEL	**SERGIO VALDERRAMA CAMARGO**
NOMBRE JEFE DEPENDENCIA QUE AUTORIZA	**NOMBRE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE EL BIEN**
FIRMA **CÉDULA: 7228778**	**FIRMA** **CÉDULA: 79330277**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 14

CONTRATO DE OBRA: 2019-1782

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2019-1802

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron el ingeniero Luis Eduardo Acosta, en calidad de Director del Contrato de Obra 2019-1782, el ingeniero Hugo Aponte López, en calidad de residente del Contrato de Obra 2019-1782, el ingeniero Sergio Valderrama Camargo, en calidad de Director del Contrato de Interventoría 2019-1802 y el ingeniero Julián Andrés Alvares, en calidad de Residente del Contrato de Interventoría 2019-1802, con el fin de revisar y recibir a satisfacción el suministro de SEÑALIZACIÓN VERTICAL IMPLEMENTADA Y LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL AL TRÁNSITO IMPLEMENTADOS (QUE SON DIFERENTES A LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL) en el marco del contrato 2019-1782 para el período comprendido entre el veintinueve (29) de noviembre de 2020 y el Veintiocho (28) de diciembre de 2020.

A continuación, se relacionan la señalización implementada y que es objeto de recibo a través de la presente ACTA:

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO (INCLUYE COSTO DIRECTO + AIU)	CANT.	SUBTOTAL
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 84.725	19,00	$ 1.609.775

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 228.520	72,00	$ 16.453.440
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 307.926	27,00	$ 8.314.002
7	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 378.754	15,00	$ 5.681.310
8	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV o Superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	$ 256.972	6,00	$ 1.541.832
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm,	$ 311.849	9,00	$ 2.806.641

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

		reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - SP cumpliendo con normatividad vigente.			
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 194.499	14,00	$ 2.722.986
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	$ 180.212	2,00	$ 360.424
20	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	$ 295.095	5,00	$ 1.475.475

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

21	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	$ 342.762	1,00	$ 342.762
28	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	$ 41.453	19,00	$ 787.607
29	UND	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	$ 18.941	4.220,00	$ 79.931.020
30	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 18.612	52,00	$ 967.824
73	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad	$ 12.331	1.534,00	$ 18.915.754

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

		luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).			
75	UND	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	$ 8.432	8.160,00	$ 68.805.120
78	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	$ 71.901	290,00	$ 20.851.290
80	UND	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	$ 93.704	95,00	$ 8.901.880

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

83	UND	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	$ 66.130	69,00	$ 4.562.970
NP1	UND	Instalación de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	$ 36.639	25,00	$ 915.975
TOTAL (A)					$ 245.948.087

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

Adicional, en los ITEMS relacionados en el siguiente cuadro se incluyen los elementos cuya unidad de medida es M2 y/o ML para el ACTA

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UND) A INGRESAR	VALOR INCLUYE COSTO DIRECTO + AIU
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	4239	$ 42.662.465
86	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	13	$ 8.373.450
87	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	7	$ 16.540.515
95	M2	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	6	$ 7.551.990
TOTAL (B)				$ 75.128.420

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

TOTAL (A) + (B)	**$ 321.076.507**
VALOR EN LETRAS	**TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE**

NOTA: Los elementos de señalización indicados en el cuadro anterior hacen parte del acta de recibo parcial MES 14 para el contrato de obra 2019-1782.

Los anteriores elementos fueron instalados por el Contrato de Obra 2019-1782 en los siguientes puntos:

No.	ID	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	MV_08_260_1244_11 INTERSECCION IDU	DISPOSITIVOS / VERTICAL	KENNEDY	CL 41SUR CON KR 78
2	new jersey CALLE 13	VERTICAL	FONTIBON	CALLE 13 ENTRE KR 104 Y KR 135
3	EX_08_043_1556_10	DISPOSITIVOS / VERTICAL	KENNEDY	CALLE 42B SUR CON KR 72Q
4	ZE_08_461_943_10	DISPOSITIVOS / VERTICAL	KENNEDY	ENTRE KR 75 Y KR 73 DESDE LA AC 5A HASTA LA CL 6
5	EMERGENCIA KM 1 CALERA	VERTICAL	CHAPINERO	KM 1 VÍA A LA CALERA
6	EMERGENCIA KR 1E CL 77	VERTICAL	CHAPINERO	KR 1E CL 77
7	MV_AV_BOYACA_941_09	VERTICAL	CIUDAD BOLIVAR	Av. BOYACA CON CL 71B BIS

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

8	MV_03_001_1783_19	VERTICAL	SANTA FE	señales vía choachi
9	PASACALLES	VERTICAL	FONTIBON	CALLE 13

Los suministros descritos en los cuadros de la presente acta cumplen con las especificaciones técnicas vigentes y establecidas en el Manual de Señalización Vial (Resolución 1885 de 2015), los requisitos contractuales y demás normas vigentes y se reciben a satisfacción instaladas en vía.

En consecuencia, a través del presente documento se hace entrega al almacén de la Secretaria Distrital de Movilidad de los **elementos de señalización** precitados.

LUIS EDUARDO ACOSTA MEDINA
Director de Contrato de Obra 2019-1782

HUGO FRANCISCO APONTE LOPEZ
Residente Contrato de obra 2019-1782

SERGIO VALDERRAMA CAMARGO
Director de Interventoría Contrato 2019-1802

JULIAN ANDRES ALVAREZ
Residente de Interventoría Contrato 2019-1802

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

ANEXO 10

SEÑALES RETIRADAS ENTREGADAS A PATIO 4

PARA EL PRESENTE INFORME NO SE HACE ENTREGA DE SEÑALES VERTICALES RETIRADAS A PATIO 4

ANEXO 11

INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN

INTRODUCCIÓN

Para permitir una adecuada administración y manejo de las señales implementadas, se genera la georreferenciación de obra, de manera que sea posible visualizar las señales tanto en horizontal y vertical implementadas para un correcto seguimiento por parte de la secretaria de Movilidad.

Esta georreferenciación debe estar asociada a una planilla de vinculación la cual especifica la fase y acción de la entidad espacial, reflejando un conjunto de eventos históricos de dicha obra.

Para la optimización de los recursos la secretaria de Movilidad, suministra a la parte de obra los diseños ya vinculados para la correcta ejecución en la parte de obra con los parámetros estipulados en el respectivo manual de Georreferenciación.

EJECUCIÓN

Para efectos de estandarización de la información, la interventoría del contrato suministró una planilla de vinculación donde va la información de la obra ejecutada tanto de vertical como horizontal por ID ejecutado.

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en esta cuenta.

ID	PROCESO
EX_08_043_1556_10	ENTREGADO
KM 1 CALERA	ENTREGADO
KR 1E CL 77	ENTREGADO
MV_03_001_1783_19	ENTREGADO
MV_08_260_1244_11	ENTREGADO
MV_09_048_1556_10	ENTREGADO
MV_AV_BOYACA_941_09	ENTREGADO
ZE_08_461_943_10	ENTREGADO

Se hace entrega de los Id mencionados de la siguiente forma:

- Un plano record en archivo DWG que contiene información georreferenciada del proyecto de señalización.
- Una base de datos en Excel diligenciada con la información alfanumérica de las acciones realizadas, vinculada en el plano record la cual se llama planilla de vinculación.
- Un archivo PDF que contiene información del plano record.
- Planillas de obra en forma digital
- Planillas de obra escaneadas con la firma de la interventoría.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la elaboración de esta metodología, se llega a establecer que no es posible abordar una tarea tan compleja como la georreferenciación de los elementos ejecutados en obra, sin tener un marco metodológico común para toda la localización de dichos elementos y no puede ser abordada a través de una sola herramienta, puesto que los componentes que conforman la señalización deben ser vinculados, por lo que se tiene un plano y una base de datos en Excel. Con una carga de información tan abundante y variada, es necesario realizar una organización de los datos de acuerdo a características en común, el hecho que la base de datos, cuente con información georreferenciada proveniente de una sola fuente, dio origen a una información enfocada y con un único resultado.

El proceso de georreferenciación permite tener la información geográfica con un sistema coordenado y una base de datos, con la cual se conoce el histórico de cada señal.

Uno de los problemas más visibles en el proceso de georreferenciación consiste en que la persona que está realizando el trabajo, debe tener mucho cuidado al completar la base de datos para evitar un error excesivo que pueda causar que se tenga que repetir este proceso.

ANEXO 12

INFORME DE SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INFORME N° 14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Programa de higiene y seguridad industrial

El presente documento plantea herramientas básicas obtenidas en la planeación de la seguridad y salud en el trabajo a implementar para el proyecto “Consorcio Señalización D.C.” Contrato No. 20191782, teniendo en cuenta el tiempo que dura la obra, correspondiente al mes de diciembre de 2020

1.1. Objetivo

El contratista deberá cumplir con las disposiciones que sobre seguridad industrial haya expedido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tendrá especial cuidado en salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público en general.

1.2. Objetivos específicos

- ✓ Suministrar dotación de prendas de seguridad y protección a los trabajadores aplicables a la labor desempeñada (casco, botas, cinturones de seguridad, guantes, entre otros elementos). Para el caso del uniforme del personal el contratista cumplirá con las exigencias de la Alcaldía Distrital.

- ✓ Durante los trabajos nocturnos, se proveerá de los elementos de señalización e iluminación necesarias y suficientes. Se deberá garantizar la implementación de los PMT aprobados para cada punto de intervención.

- ✓ Los niveles de ruido serán los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad y de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad vigente a nivel distrital y/o nacional.

- ✓ El Contratista será el responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de obras, de acuerdo con lo indicado en el presente documento y a las normas vigentes de seguridad industrial y salud ocupacional.

- ✓ Se tomarán las medidas de seguridad para el control permanente de factores de riesgo que puedan afectar la salud tanto de los habitantes y transeúntes del sector como de los trabajadores, enfatizando en la mitigación adecuada del impacto urbano.

2. Generalidades del proyecto

- **Nombre de la obra:** Realizar en forma íntegra las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad en la zona 3, sur occidente de la ciudad de Bogotá D.C, de conformidad con las cantidades y características establecidas en los estudios previos.

- **Dirección de la obra:** Zona (3) Sur Occidente de la ciudad de Bogotá.

3. Actividades en ejecución

3.1. Seguridad Social Integral

Toda persona que ingrese a la obra debe presentar la planilla de afiliación y aportes a seguridad social, este documento debe ser disponible todo el tiempo por cada una de las personas que intervienen en el contrato de ejecución para la Secretaria de Movilidad. (Listado de personal y planillas de aportes del mes de diciembre de 2020 del personal que interviene el proyecto No 20191782) así.

CUADRILLAS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Álvaro Vargas	CC: 79561846
Freddy Hernández	CC: 78028119
Víctor Montaño	CC: 16862357
Xavier López	CC: 1064711849
Italo Guerrero	CC: 1087185381
Junior García	CC: 1034309527
Henrol Pinto	PEP-931922219071987
Diego Manzano	PEP-809084312071995
Víctor Lima	PEP-944412631051995
Luis Alejandro López	CC: 80747563
Domingo José Poveda	PEP-935911723041978
Eber David Ramírez	PEP-980677411091990
Juan Gabriel Romero	CE-855599
Asdrubal Torres	PEP-960810621101973
Alvarino Romero	CC: 1022346321
Jonathan Hernández	CC: 12152556
Arnulfo Cetina	CC: 1071914651
Javier Pérez	PEP- 936765414071987
Junior Camacaro	PEP- 932554210091991
Miguel Gómez	CC: 1033741928
John Berrio	CC: 1072427701

Rubén Camacaro	PEP-933670917121996
Juan Varela	PEP-951465901021990
Beiker Sira	PEP-940995221121994
Yonathan Terán	PEP-907862131011995
Miguel Gómez	CC:1033741928
José Aristóbulo Cetina	CC:1071914424
Elkin Zubieta	CC:1071914609
Daniel Cubillos	CC: 1000586443
Ernesto Quiñones	CC: 16189457
William Quiñones	CC: 16186305
Yuliana Blanco	CC: 119303181

3.1.1. Señalización

Se mantiene el seguimiento mediante inspecciones planeadas para todas las cuadrillas en los diferentes frentes de trabajo en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta la mitigación a los riegos a los cuales están expuestos los trabajadores en sus actividades.

PMT Permiso de manejo de transito aprobado e implementado por los frentes de trabajo.

3.1.2. Equipo de emergencias

Teniendo en cuenta la importancia del kit de emergencias y agentes desinfectantes, se realiza Inspecciones diarias a vehículos donde se revisa los extintores, camillas, botiquines, gel antibacterial, alcohol, agua potable, jabón y agua para el lavado de manos, toma diaria de temperatura corporal y limpieza en general cumpliendo con los protocolos exigidos por la alcaldía mayor, junto a la verificación del estado de equipos y elementos donde estos se encuentren completamente vigentes, con el fin de garantizar la atención oportuna en primeros auxilios o poder mitigar un conato de incendio en caso de una emergencia. Además se realiza la revisión de la documentación de los vehículos para estar al día con el tema de SOAT y la revisión Técnico-mecánica.

3.2. Inspección ambiental

Seguimiento en sitio de trabajo para determinar el mantenimiento el orden y el aseo y la separación de residuos en la fuente generadora, donde se encuentra el cumplimiento de los estándares de orden y aseo en todos los frentes de trabajo.

3.3. Dotación de ropa de trabajo y elementos de protección personal

Se hace verificación del uso de ropa de trabajo y cumplimiento con las condiciones de seguridad requeridas, acorde con especificaciones solicitadas para el contrato 20191782. De igual forma se verifica el suministro y utilización de los elementos de protección personal. Se les hace la recomendación de la importancia de este requisito en estos momentos de pandemia a todo el personal.

Todos los trabajadores del consorcio cuentan con la dotación completa y el uso obligatorio (TAPABOCAS, GUANTES Y MONOGAFAS) Siguiendo los protocolos emitidos debido a la contingencia presentada a nivel mundial por motivo del nuevo corona virus COVID-19

3.4. Capacitación

Se dictan charlas y capacitaciones a los trabajadores sobre la importancia del uso de los EPP (TAPABOCAS, GUANTES, MONOGAFAS, OVEROLES, BOTAS) y la obligatoriedad de los mismos, generando conciencia sobre el auto cuidado y de los demás para la prevención del COVID-19, siguiendo los protocolos del lavado de manos y limpieza en general, junto con los cuidados que se deben tener en nuestro entorno para evitar el contagio y la propagación del virus.

3.5. Reporte de accidentalidad

El Consorcio Señalización D.C. al momento de la elaboración del presente informe no reporta accidente de trabajo.

3.6. Disposición de residuo

El Consorcio Señalización D.C., es considerado como Pequeño Generador, porque residuos peligrosos generados están en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo. Por lo anterior durante el periodo de iniciación del proyecto a la fecha no se cuenta con la cantidad requerida por el proveedor del servicio para hacer la disposición final.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

		
Inspección PMT	**Seguimiento PMT**	**Seguimiento PMT**
		
Seguimiento PMT	**Inspección de Extintores**	**Inspección de Botiquines**
		
Manejo de productos químicos	**Orden y Aseo**	**Manejo de Residuos**

Consorcio Señalización D.C.

2020

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

		
Camillas	**Gel Antibacterial**	**Agua Mineral**
		
Lavado de manos	**Lavado de manos**	**Uso de EPP**
		
Uso de EPP	**Uso de EPP**	**Uso de EPP**

Consorcio Señalización D.C.

2020

CONCLUSIONES.

- ✓ Cumpliendo a la normatividad vigente y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, los trabajadores cuentan con su seguridad social al día, con su dotación completa, sus tapabocas, guantes, monogafas, overoles, calzado y PMT para brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito necesarios como: los conos reflectivos exigidos y señalización necesarias para el correcto desarrollo de las actividades

- ✓ Los trabajadores conocen y saben cómo utilizar sus elementos de protección personal EPP, y en esta época de pandemia conocen y entienden la importancia de portar siempre los elementos de protección personal para su autocuidado y bienestar.

- ✓ Se dictan recomendaciones a los trabajadores por motivos del virus COVIT-19 su auto cuidado y el de sus familias; si alguno cuenta con síntomas de gripa o cualquier otro síntoma asociado al virus comunicarlo de inmediato a la empresa y seguir los protocolos.

- ✓ Se continúan los protocolos de mantener su distanciamiento, hacerse el lavado de manos mínimo cada 3 horas, usar gel antibacterial, utilizar guantes y sobre todo cumplir con el uso obligatorio del tapabocas.

- ✓ Se refuerza la socialización del autocuidado en los lugares públicos y en nuestras casas, también con las personas con quien convivimos diariamente, junto a nuestros familiares y allegados, teniendo en cuenta que el contagio se puede presentar de un lugar distinto a nuestro lugar de trabajo y siento transportadores del mismo.

- ✓ Se toman medidas de seguridad permanente de factores de riesgo que puedan afectar la salud tanto de habitantes – transeúntes- trabajadores haciendo hincapié en la mitigación adecuada del impacto urbano.

- ✓ Se presentan lluvias frecuentes en la ciudad por este motivo se desarrollan actividades en horarios diurnos, sin afectar el normal tránsito y circulación de vehículos por los sectores de implementación

Consorcio Señalización D.C.

2020

- ✓ Para la seguridad de nuestros trabajadores se les recomienda estar muy alerta ante cualquier situación que pueda interferir en el normal desarrollo de nuestras actividades.

- ✓ En conclusión, los avances planteados para el proyecto “Consorcio Señalización D.C.” Contrato No. 20191782, se están desarrollando acorde a la planeación propuesta.

FABIO ENRIQUE MARTINEZ

CC 17594602 LIC- 7041

SG-SST

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232408-5	MAS SOLUCIONES INTEGRALES SEÑALIZACION VIAL Y CAL		CALLE 33 N 20 ESTE TO 18 APT 472	3144556806	msenalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	20/11/2020	46763529	$494.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	16.400	0		0		0	0	0	0	16.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.600	0		0		0	0	0	0	3.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	8.200	0		0		0	0	0	0	8.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	14.100	0	0	0	0	0	0		14.100	1
230301	Porvenir	800224808-6	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	113.600	0	0	0	0	0	0		113.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	113.600	0	0	0	0	0	0		113.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	49.100				49.100	0	0	49.100			491	49.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	35.600	0	0	35.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	28.200	28.200
Pensión	4	381.800	381.800
Riesgos Laborales	1	49.100	49.100
CCF	1	35.600	35.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	494.700	494.700

PAGADA 4676352

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232408-5	MAS SOLUCIONES INTEGRALES SEÑALIZACION VIAL Y CAL		CALLE 33 N 20 ESTE TO 18 APT 472	3144556806	msenalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	20/11/2020	46763528	$494.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Extranjero Residente en el Exterior	Colombiano Residente en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DEVOLUCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000586443	CUBILLOS AVILA DANIEL DAVID	1	0			S	x																238201	87.781	14,100	0	0	0	0	EPS008	87,781	3,600	14-11	87,781	5	6,200	CCF21	273,352	11,000	0	0	0	0	0
2	CC	1193031810	BLANCO PADRON YULIANA ANDREA	1	0			S																	231001	204,821	32,800	0	0	0	0	EPS002	204,821	8,200	14-11	204,821	5	14,300	CCF21	204,821	8,200	0	0	0	0	0
3	CC	1193031810	BLANCO PADRON YULIANA ANDREA	1	0			S									x								231001	672,983	80,800	0	0	0	0	EPS002	672,983	0	14-11	672,983	5	0	CCF21	672,983	0	0	0	0	0	0
4	CC	16186205	QUIÑONEZ CUBILLOS WILLIAN	1	0			S																	238301	204,821	32,800	0	0	0	0	EPS010	204,821	8,200	14-11	204,821	5	14,300	CCF21	204,821	8,200	0	0	0	0	0
5	CC	16186205	QUIÑONEZ CUBILLOS WILLIAN	1	0			S									x								238301	672,983	107,700	0	0	0	0	EPS010	672,983	0	14-11	672,983	5	0	CCF21	672,983	0	0	0	0	0	0
6	CC	16186457	QUIÑONEZ CUBILLOS ERNESTO	1	0			S																	25-14	204,821	32,800	0	0	0	0	EPS002	204,821	8,200	14-11	204,821	5	14,300	CCF21	204,821	8,200	0	0	0	0	0
7	CC	16186457	QUIÑONEZ CUBILLOS ERNESTO	1	0			S									x								25-14	672,983	80,800	0	0	0	0	EPS002	672,983	0	14-11	672,983	5	0	CCF21	672,983	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS	Carrera 80 H Numero 54 B- 19 Sur	4540132	miyermorales@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	04/12/2020	47146264	$6.363.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.400	0		0		0	0	0	0	92.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	556.100	0		0		0	0	0	0	556.100	13
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	122.200	0		0		0	0	0	0	122.200	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	45.800	0		0		0	0	0	0	45.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.176.000	0	0	0	0	0	0		1.176.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.097.800	0	0	0	0	0	0		2.097.800	16
231001	Colfondos	800227940-6	289.300	0	0	0	0	0	0		289.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.017.200				1.017.200	0	0	1.017.200			10.172	1.017.200	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	891.700	0	0	891.700	24

PAGADA
47146264

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS		Carrera 80 H Numero 54 B- 19 Sur	4540132	miyermorales@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					24	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2020-12	2020-11	E	04/12/2020	47146264	$6.363.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	891.700	891.700
Pensión	3	3.563.100	3.563.100
Riesgos Laborales	1	1.017.200	1.017.200
CCF	1	891.700	891.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.363.700	6.363.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS	Carrera 80 H Numero 54 B- 19 Sur	4540132	miyermorales@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	04/12/2020	47146264	$6.363.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001349167	MORALES ROMERO JHONATAN ANDRES	1	0			S																	230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-4	900.000	3	22.000	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006658291	GALINDO ACOSTA LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
3	CC	1010242344	MORALES ROMERO DAVID STIVEN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013618084	MOJICA REYES INGRID ELIANA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPSC34	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
5	CC	1016076173	CRISTANCHO CRISTANCHO SINDY TATIANA	1	0			S																	230301	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS005	960.000	38.400	14-4	960.000	3	23.400	CCF24	960.000	38.400	0	0	0	0	0
6	CC	1022346321	ROMERO MORALES ALVARINO	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS008	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
7	PE	932554210091991	CAMACARO SALON JUNIOR JOSE	1	0			S		X															230201	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS008	468.162	18.800	14-4	468.162	5	32.600	CCF24	468.162	18.800	0	0	0	0	0
8	PE	933670917121996	CAMACARO SALON RUBEN DARIO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
9	PE	934299231121996	TERAN HERNANDEZ YOHAIKER ALEXANDER	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
10	PE	936765414071987	PEREZ GARCIA JAVIER ANTONIO	1	0			S		X															230301	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS005	468.162	18.800	14-4	468.162	5	32.600	CCF24	468.162	18.800	0	0	0	0	0
11	PE	940995221121994	SIRA RANGEL BEIKER ERNESTO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
12	PE	951465901021990	VALERA VELIZ JUAN JOSE	1	0			S		X															230301	321.862	51.500	0	0	0	0	EPS008	321.862	12.900	14-4	321.862	5	22.500	CCF24	321.862	12.900	0	0	0	0	0
13	CC	1072427701	BERRIO MOYA JOHN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
14	CC	52839652	ROMERO MORALES ROCIO	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
15	CC	52989063	ROMERO MORALES SONIA	1	0			S																	230201	938.000	150.100	0	0	0	0	EPS008	938.000	37.600	14-4	938.000	3	22.900	CCF24	938.000	37.600	0	0	0	0	0
16	CC	79559267	CAVIEDES RIAÑO RICARDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
17	CC	80154319	MORALES MEDINA MIYER	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
18	PE	907862131011995	TERAN HERNANDEZ YONATHAN JOSE	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
19	CC	1030688961	SEDAS CAVIEDES KEVIN ARTURO	1	0			S		X															230301	263.341	42.200	0	0	0	0	EPSC34	263.341	10.600	14-4	263.341	5	18.400	CCF24	263.341	10.600	0	0	0	0	0
20	CC	1031182534	ROMERO MEDINA JONATHAN ALEXANDER	1	0			S		X															231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
21	CC	1033741928	GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S		X															230201	292.601	46.900	0	0	0	0	EPS017	292.601	11.800	14-4	292.601	5	20.400	CCF24	292.601	11.800	0	0	0	0	0
22	CC	1071914424	CETINA JIMENEZ JOSE ARISTOBULO	1	0			S																	230201	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-4	950.000	5	66.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
23	CC	1071914609	ZUBIETA LOPEZ ELKIN DOMINGO	1	0			S																	230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS008	950.000	38.000	14-4	950.000	5	66.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
24	CC	1071914651	CETINA JIMENEZ JOSE ARNULFO	1	0			S																	231001	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS017	930.000	37.200	14-4	930.000	5	64.800	CCF24	930.000	37.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	PE-960810621101973
NOMBRE EMPLEADO	ASDRUBAL RAFAEL TORRES VARGAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	CE-855599
NOMBRE EMPLEADO	JUAN GABRIEL ROMERO GOYO
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	PE-980677411091990
NOMBRE EMPLEADO	EBER DAVID RAMIREZ BORREGALES
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	PE-935911723041978
NOMBRE EMPLEADO	DOMINGO JOSE POVEDA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	PE-931922219071987
NOMBRE EMPLEADO	HENROL ALBERTI PINTO MORALES
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	PE-809084312071995
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ALEJANDRO MANZANO CASTILLO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-80747563
NOMBRE EMPLEADO	LUIS ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	PE-944412631051995
NOMBRE EMPLEADO	VICTOR DANIEL LIMA JIMENEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JANA CALL REPRESENTACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901234422
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2020-12-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1034309527
NOMBRE EMPLEADO	ENRIQUE JUNIOR GARCIA CEBALLOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	19349717
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2020-11
PERIODO SALUD	2020-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0243600	$ 21.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0,0400000	$ 35.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 35.200	$ 21.400	$ 35.200	$ 91.800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900736863	3	CYS SEÑALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VARGAS	AC 31 SUR N 12 ESTE 55 BL INTE 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	9414029140	9414029140	E	2020/12/15	2020/12/17	BANCO BOGOTA	1	$1,360,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1087185382	GUERRERO ITALO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
2	CC	78028119	HERNANDEZ FREDDY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
3	CC	1064711849	LOPEZ XAVIER																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
4	CC	16862357	MONTAÑO VICTOR																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
5	CC	79561846	VARGAS ALVARO																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total	**Afiliados(5)**																						$4,389,015	$702,500			$4,389,015	$176,000			$4,389,015	$176,000			$4,389,015	$305,500		$0	$0		$1,360,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900736863	3	CYS SEÑALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VARGAS	AC 31 SUR N 12 ESTE 55 BL INTE 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	9414029140	9414029140	E	2020/12/15	2020/12/17	BANCO BOGOTA	1	$1,360,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$702,500	$0	$0	$702,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$421,500	$0	$0	$421,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$305,500	$0	$0	$305,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$305,500	$0	$0	$305,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$176,000	$0	$0	$176,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$176,000	$0	$0	$176,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$176,000	$0	$0	$176,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,400	$0	$0	$70,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**5**	**$1,360,000**	**$0**	**$0**	**$1,360,000**

ANEXO 13

INFORME DE TRABAJO SOCIAL

INFORME DE GESTION SOCIAL

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por la trabajadora social del contrato en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2020

Las Actividades de la gestión social se describen a continuación:

- **SOCIALIZACIONES**

Durante el periodo de presentación del informe se realizaron socializaciones con la comunidad con el fin que la población se informe sobre las señales a instalar; para realizar esta actividad la Trabajadora social junto con la Información del área técnica realizo los recorridos en los frentes en la zona en los cuales se instalarían señales.

Debido a la pandemia del covid19, y en vista que no es posible hacer reuniones con las comunidades, para informar las intervenciones que producen impacto en la ciudad; el consorcio presento ante la Interventoria, una propuesta en la cual se incluyeron estrategias de información y divulgación del proyecto con las cuales se reemplazaran las socializaciones presenciales; como se ha dicho estas corresponde a:

- Medios masivos de publicidad (Guiones publicitarios, a través de publicidad móvil, con el propósito de difundir las intervenciones a realizar- Población en general

TABLA N° 1 SOCIALIZACION INSTALACION DE SEÑALIZACION CON COMUNIDAD

ID,S	LOCALIDAD	DIRECCION/ SOCIALIZACION	FECHA DE SOCIALIZACION	ACTIVIDAD/SEÑALES A INSTALAR	ANEXOS
ID_ZE_08_461_943_10	KENNEDY	CALLES 5B Y 5C CON CARRERAS 73B, 73C Y 74	14 DE DICIEMBRE DE 2020	ZONAS ESCOLARES Y BANDAS EN AGREGADO	1. AUDIO DE PUBLICIDAD MOVIL 2.VOLANTE INFORMATIVO
ID_EX_08_043_1556_10	KENNEDY	42B SUR CON CARRERAS 72Q Y 72R	14 DE DICIEMBRE DE 2020	BANDAS EN AGREGADO	1. AUDIO DE PUBLICIDAD MOVIL 2.VOLANTE INFORMATIVO

Los soportes de las socializaciones realizadas están en el anexo N°1

- **VINCULACION DE POBLACION VULNERABLE**

Durante el periodo de ejecución del informe el Consorcio señalización D.C está gestionando ante las Secretaria de Desarrollo Económico, la base de datos de la población vulnerable.

Elaboro

TRABAJADORA SOCIAL
ADRIANA ISABEL NUÑEZ CAMELO



EN BOGOTÁ NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

BogotáSolidariaEnCasa

El Contratista **CONSORCIO SEÑALIZACION D.C;** quien está ejecutando el contrato de obra N°-20191782, suscrito con la Secretaria Distrital de Movilidad.

INFORMA A LA COMUNIDAD

De Residentes del sector ubicado en la Calle 5B y 5C con Cra 73B, 73C, y 74, se complementaran la señalización de Zonas Escolares a nivel general en el sector, además se instalaran bandas en agregado.

Con la implementación de bandas en agregado y demás señalización se busca , evitar que se presenten accidentes , y mejorar la movilidad





EN BOGOTÁ NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

BogotáSolidariaEnCasa

El Contratista **CONSORCIO SEÑALIZACION D.C;** quien está ejecutando el contrato de obra N°-20191782, suscrito con la Secretaria Distrital de Movilidad.

INFORMA A LA COMUNIDAD

De Residentes del sector ubicado en la Calle 5B y 5C con Cra 73B, 73C, y 74, se complementaran la señalización de Zonas Escolares a nivel general en el sector, además se instalaran bandas en agregado

Con la implementación de bandas en agregado y demás señalización se busca , evitar que se presenten accidentes , y mejorar la movilidad





EN BOGOTÁ NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

BogotáSolidariaEnCasa

El Contratista **CONSORCIO SEÑALIZACION D.C;** quien está ejecutando el contrato de obra N°-20191782, suscrito con la Secretaria Distrital de Movilidad.

INFORMA A LA COMUNIDAD

De Residentes del sector ubicado en la Calle 42 B sur Cra 72Q y 72R sobre la instalación de Bandas en agregado que corresponde a reductores de velocidad.

Con la implementación de bandas en agregado y demás señalización se busca , evitar que se presenten accidentes , y mejorar la movilidad



EN BOGOTÁ NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

BogotáSolidariaEnCasa

El Contratista **CONSORCIO SEÑALIZACION D.C;** quien está ejecutando el contrato de obra N°-20191782, suscrito con la Secretaria Distrital de Movilidad.

INFORMA A LA COMUNIDAD

De Residentes del sector ubicado en la Calle 42 B sur Cra 72Q y 72R sobre la instalación de Bandas en agregado que corresponde a reductores de velocidad.

Con la implementación de bandas en agregado y demás señalización se busca , evitar que se presenten accidentes , y mejorar la movilidad

