ANEXOS

Resumen Mensual Estado General del Proyecto
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **31/05/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** MAYO DE 2024

CONVENIO No.: 3586 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO - MUNICIPIO DE SANTA ANA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 1/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024

VALOR INICIAL : $ 198.221.974,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 197.221.974,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ABANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	Ml	12,0
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,4
Estructuras	Box Culvert	Und	1,0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Mantenimiento	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	Ml	0	0
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0	0
Estructuras	Box Culvert	Und	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 124.871.756
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.381.657
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 67.968.561
APORTE DE HERRAMIENTAS MENORES (OAC)	$ 1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 198.221.974**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 18.362.823	$ 18.362.823
APORTE DE HERRAMIENTAS MENORES (OAC)	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 18.362.823**	**$ 18.362.823**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 8.901.792,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -7,13%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación manual



Excavación manual



Cerramiento con cinta de peligro a Alcantarilla existente.



Figuración de Acero



Figuración de Acero



Figuración de Acero

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N.A.

Firma
Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Informe Semanal
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 15

FECHA: **2/05/2024** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **22** del **26/04/2024** al **2/05/2024** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Limpieza a mano de alcantarillas = 12 Ml
Desmonte y Limpieza de zonas no boscosas = 0,40 Ha
Construcción de Placa Huella = 114,90 Ml
Construcción de Alcatarilla = 1 Und
Construcción de Box Culvert = 1 Und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de drenaje de baja complejidad en los sectores priorizados.
Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, entre otras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JAC\ DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO - SANTA ANA**

CONVENIO No.	**3586 DE 2023**	VALOR INICIAL:	**$ 198.221.974**
FECHA DE INICIO:	**1/12/2023**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31/12/2023**	VALOR ACUMULADO:	**$ 198.221.974**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**30/04/2024**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
INTEGRANTES: **N/A**

CONTRATO No.	**4472 DE 2023**	VALOR INICIAL:	**$ 71.493.538**
FECHA DE INICIO:	**30/11/2023**	VALOR ADICIONES:	**$ 22.874.047**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31/12/2023**	VALOR ACUMULADO:	**$ 94.367.585**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**22/05/2024**	VALOR ANTICIPO:	**$ -**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ -**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ -**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.221.974	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.362.823	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 178.859.151	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 94.367.585	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.398.224	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 72.969.361	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.055.246	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.362.823	9,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0%

Observaciones:
El valor total del convenio $ 198,221,974 contempla $ 146,055,246 para ejecución física de la obra, $ 46,785,071 para gastos administrativos y $ 4,381,657 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.398.224	29,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.398.224	29,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,77%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % **0%** Avance o Atraso Físico % **0%**
Meta Física Ejecutada % **0%**

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	Ha	12,00
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ml	0,40
* PLACA HUELLA	Und	114,90
* CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	Und	1,00
* CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	Und	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	SALIDA DE SAN FERNANDO A SAN ZENÓN	Total	%
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **SALIDA DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE SAN ZENON** TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1,00	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	1,00	-
Cizalla manual de 90 cm.	1,00	-
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1,00	-
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10	1,00	-
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de	1,00	-
Ruteadora	1,00	-
Compresor (barrido y soplado)	1,00	-
Camioneta D – 300	1,00	-
Retroexcavadora sobre llantas	1,00	-
Compresor 120	1,00	
Vibrador de concreto	1,00	-
Aspersor manual	1,00	-
Total	**13,00**	**-**

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico
N/A

FECHA: **2/05/2024** (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio, de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio , de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

OBSERVACIONES:
N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2,00**	**3,00**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,00	3,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **5,00**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **1,00**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **-**

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: **-**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO CALLE PRINCIPAL

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Respuesta a Observaciones Informes Hidrológicos, Hidráulicos y Diseño Estructural Box Coulvert
2. Comité de Obra en el sitio de los trabajos con la presencia del Residente de Obra, Residente de Interventoría e inspectora de interventoría.
3. Envío de oficio a la interventoría solicitado prorroga del convenio.
4. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
5. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Inicio de las actividades en obra.
2. Entrega de la programación de obra.
3. Aprobación de cotización de suministro de señales de obra
4. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores, estudios y diseños.
5. La interventoría llevará el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

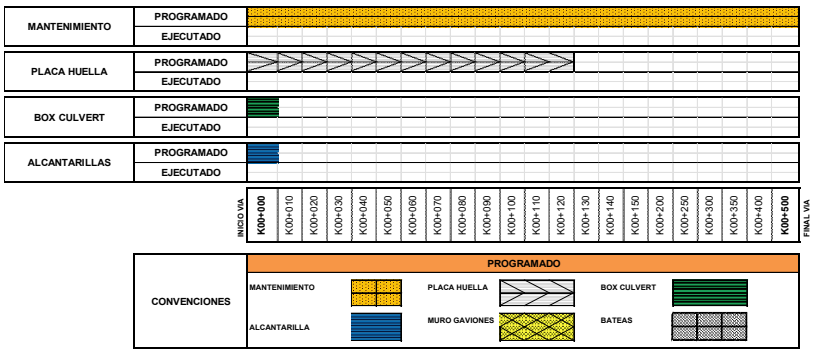

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

Nota: Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo a intervenir.



Comité de Obra



Tramo a intervenir.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS. Oficio N° CE-I-MAG 008-2023 (07 de diciembre de 2023) - Segunda Solicitud de entrega de Hojas de Vida personal JAC. Comité Operativo N° 1 (09 de diciembre de 2023) Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros. Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Oficio N° CE-I-MAG 022 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "REQUERIMIENTO REVISIÓN DE GUÍAS". Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO". Oficio N° CE-I-MAG 026 (18 de enero de 2024) - CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité. Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC. Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 de febrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS. Oficio N° CE-I-MAG 042 (12 de febrero de 2024) - Solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO. COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (17 de febrero de 2024) Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES. Oficio N° CE-I-MAG 053 (18 de febrero de 2024) - ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA. Oficio N° CE-I-MAG 056 (22 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 058 (26 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT) Oficio N° CE-I-MAG 070 (16 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 073 (19 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso. Oficio N° CE-I-MAG 080 (27 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 084 (02 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 085 (05 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 089 (09 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC. Oficio N° CE-I-MAG 096 (16 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 097 (20 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños	FIRMA  NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

FECHA **9/05/2024** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **23** del **3/05/2024** al **9/05/2024** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Limpieza a mano de alcantarillas = 12 Ml
Desmonte y Limpieza de zonas no boscosas = 0,40 Ha
Construcción de Placa Huella = 114,90 Ml
Construcción de Alcatarilla = 1 Und
Construcción de Box Culvert = 1 Und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de drenaje de baja complejidad en los sectores priorizados.
Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, entre otras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JAC\ DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO - SANTA ANA**

CONVENIO No.	**3586 DE 2023**	VALOR INICIAL:	**$ 198.221.974**
FECHA DE INICIO:	**1/12/2023**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31/12/2023**	VALOR ACUMULADO:	**$ 198.221.974**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**30/04/2024**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
INTEGRANTES: **N/A**

CONTRATO No.	**4472 DE 2023**	VALOR INICIAL:	**$ 71.493.538**
FECHA DE INICIO:	**30/11/2023**	VALOR ADICIONES:	**$ 22.874.047**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31/12/2023**	VALOR ACUMULADO:	**$ 94.367.585**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**22/05/2024**	VALOR ANTICIPO:	**$ -**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ -**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ -**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.221.974	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.362.823	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 178.859.151	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 94.367.585	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.960.261	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 72.407.324	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.055.246	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.362.823	9,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0%

Observaciones:
El valor total del convenio $ 198,221,974 contempla $ 146,055,246 para ejecución física de la obra, $ 46,785,071 para gastos administrativos y $ 4,381,657 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.960.261	30,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.960.261	30,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: **$ -**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % **0%** Avance o Atraso Físico % **0%**
Meta Física Ejecutada % **0%**

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	Ha	12,00
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ml	0,40
*	PLACA HUELLA	Und	114,90
*	CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	Und	1,00
*	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	Und	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	SALIDA DE SAN FERNANDO A SAN ZENÓN	Total	%
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **SALIDA DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE SAN ZENON** TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1,00	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	1,00	-
Cizalla manual de 90 cm.	1,00	-
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1,00	-
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10	1,00	-
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de	1,00	-
Ruteadora	1,00	-
Compresor (barrido y soplado)	1,00	-
Camioneta D – 300	1,00	-
Retroexcavadora sobre llantas	1,00	-
Compresor 120	1,00	
Vibrador de concreto	1,00	-
Aspersor manual	1,00	-
Total	**13,00**	**-**

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico
N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio, de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio , de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2,00	3,00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,00	3,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5,00

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,00

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: -

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO CALLE PRINCIPAL

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Respuesta a Observaciones Informes Hidrológicos, Hidráulicos y Diseño Estructural Box Coulvert
2. Comité de Obra en el sitio de los trabajos con la presencia del Residente de Obra, Residente de Interventoría e inspectora de interventoría.
3. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
4. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Entrega de presupuesto.
2. Entrega de la programación de obra.
3.Aprobación de cotización de suministro de señales de obra
4. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores, estudios y diseños.
5. La interventoría llevará el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

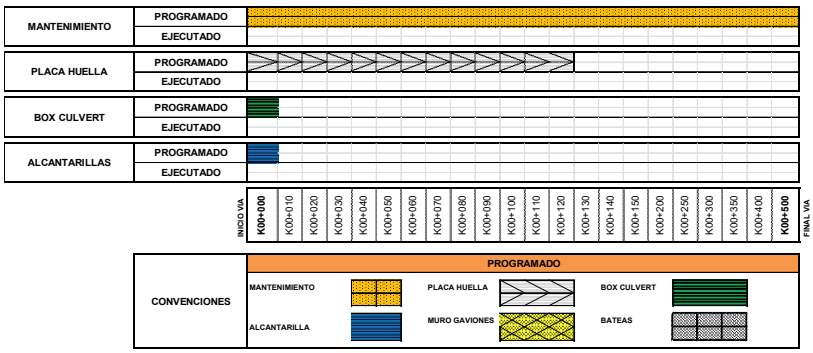

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

Nota: Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo a intervenir.



Tramo a intervenir.



Tramo a intervenir.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

	FECHA	9/05/2024 (Día / Mes / Año)

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS. Oficio N° CE-I-MAG 008-2023 (07 de diciembre de 2023) - Segunda Solicitud de entrega de Hojas de Vida personal JAC. Comité Operativo N° 1 (09 de diciembre de 2023) Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros. Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Oficio N° CE-I-MAG 022 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "REQUERIMIENTO REVISIÓN DE GUÍAS". Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO". Oficio N° CE-I-MAG 026 (18 de enero de 2024) - CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité. Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC. Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 de febrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS. Oficio N° CE-I-MAG 042 (12 de febrero de 2024) - Solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO. COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (17 de febrero de 2024) Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES. Oficio N° CE-I-MAG 053 (18 de febrero de 2024) - ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA. Oficio N° CE-I-MAG 056 (22 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 058 (26 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT) Oficio N° CE-I-MAG 070 (16 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 073 (19 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso. Oficio N° CE-I-MAG 080 (27 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 084 (02 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 085 (05 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 089 (09 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC. Oficio N° CE-I-MAG 096 (16 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 097 (20 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 105 (07 de mayo de 2024) - Preocupación por el estado del Convenio Solidario N° 3586-2023. Oficio N° CE-I-MAG 106 (08 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023. Oficio N° CE-I-MAG 109 (09 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023.	FIRMA  NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **24** del **10/05/2024** al **16/05/2024** Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Limpieza a mano de alcantarillas = 12 Ml
Desmonte y Limpieza de zonas no boscosas = 0,40 Ha
Construcción de Placa Huella = 114,90 Ml
Construcción de Alcatarilla = 1 Und
Construcción de Box Culvert = 1 Und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de drenaje de baja complejidad en los sectores priorizados.
Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, entre otras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JAC\ DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO - SANTA ANA**

CONVENIO No.	**3586 DE 2023**	VALOR INICIAL:	**$ 198.221.974**
FECHA DE INICIO:	**1/12/2023**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31/12/2023**	VALOR ACUMULADO:	**$ 198.221.974**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**30/04/2024**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
INTEGRANTES: **N/A**

CONTRATO No.	**4472 DE 2023**	VALOR INICIAL:	**$ 71.493.538**
FECHA DE INICIO:	**30/11/2023**	VALOR ADICIONES:	**$ 22.874.047**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31/12/2023**	VALOR ACUMULADO:	**$ 94.367.585**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**22/05/2024**	VALOR ANTICIPO:	**$ -**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ -**
		SALDO POR AMORTIZAR:	**$ -**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.221.974	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.362.823	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 178.859.151	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 94.367.585	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 22.522.298	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 71.845.287	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.055.246	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.362.823	9,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0%

Observaciones:
El valor total del convenio $ 198,221,974 contempla $ 146,055,246 para ejecución física de la obra, $ 46,785,071 para gastos administrativos y $ 4,381,657 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.522.298	31,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.522.298	31,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % **0%** Avance o Atraso Físico % **0%**
Meta Física Ejecutada % **0%**

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	Ha	12,00
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ml	0,40
*	PLACA HUELLA	Und	114,90
*	CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	Und	1,00
*	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	Und	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	SALIDA DE SAN FERNANDO A SAN ZENÓN	Total	%
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **SALIDA DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE SAN ZENON** TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1,00	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	1,00	-
Cizalla manual de 90 cm.	1,00	-
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1,00	-
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10	1,00	-
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de	1,00	-
Ruteadora	1,00	-
Compresor (barrido y soplado)	1,00	-
Camioneta D – 300	1,00	-
Retroexcavadora sobre llantas	1,00	-
Compresor 120	1,00	
Vibrador de concreto	1,00	-
Aspersor manual	1,00	-
Total	**13,00**	**-**

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico
N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio, de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio , de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2,00	3,00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,00	3,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5,00

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,00

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: -

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO CALLE PRINCIPAL

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Entrega de presupuesto.
2. Comité de Obra en el sitio de los trabajos con la presencia del Residente de Obra, Residente de Interventoría e inspectora de interventoría.
3. Comité de Obra en el sitio de los trabajos el día 15 de Abril con la presencia del Residente de Obra y Residente de Interventoría e Inspectora de Interventoría
4. Asistencia al Comité de Seguimiento Convenios Solidarios, 15 abr 2024 09:00 a. m.
5. Respuesta a Observaciones Informes Hidrológicos, Hidráulicos y Diseño Estructural Box Coulvert
6. Respuesta a Observaciones Diseño Estructural Box Coulvert, 9 de abril 2024
7. Comité de Seguimiento el día 10 de mayo del 2024 10:00 a.m.
8. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
9. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Entrega de la programación de obra.
2 .Aprobación de cotización de suministro de señales de obra
3. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores, estudios y diseños.
4. La interventoría llevará el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

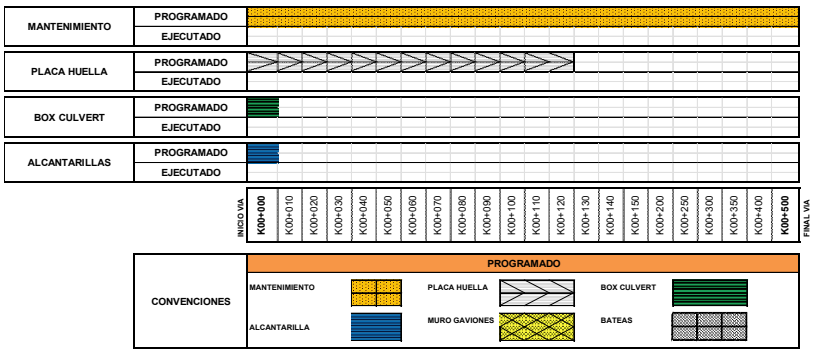

Nota: Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo a intervenir.



Tramo a intervenir.



Tramo a intervenir.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

	FECHA	16/05/2024 (Día / Mes / Año)

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS. Oficio N° CE-I-MAG 008-2023 (07 de diciembre de 2023) - Segunda Solicitud de entrega de Hojas de Vida personal JAC. Comité Operativo Nº 1 (09 de diciembre de 2023) Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros. Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Oficio N° CE-I-MAG 022 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "REQUERIMIENTO REVISIÓN DE GUÍAS". Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO". Oficio N° CE-I-MAG 026 (18 de enero de 2024) - CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité. Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC. Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 de febrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS. Oficio N° CE-I-MAG 042 (12 de febrero de 2024) - Solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO. COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (17 de febrero de 2024) Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES. Oficio N° CE-I-MAG 053 (18 de febrero de 2024) - ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA. Oficio N° CE-I-MAG 056 (22 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 058 (26 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT) Oficio N° CE-I-MAG 070 (16 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 073 (19 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso. Oficio N° CE-I-MAG 080 (27 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 084 (02 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 085 (05 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 089 (09 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC. Oficio N° CE-I-MAG 096 (16 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 097 (20 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 105 (07 de mayo de 2024) - Preocupación por el estado del Convenio Solidario N° 3586-2023. Oficio N° CE-I-MAG 106 (08 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023.	FIRMA NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	10 de 15

FECHA: **23/05/2024** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **25** del **17/05/2024** al **23/05/2024** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Limpieza a mano de alcantarillas = 12 Ml
Desmonte y Limpieza de zonas no boscosas = 0,40 Ha
Construcción de Placa Huella = 114,90 Ml
Construcción de Alcatarilla = 1 Und
Construcción de Box Culvert = 1 Und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de drenaje de baja complejidad en los sectores priorizados.
Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, entre otras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JAC\ DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO - SANTA ANA**

CONVENIO No.	3586 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.221.974
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.221.974
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
INTEGRANTES: **N/A**

CONTRATO No.	4472 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.493.538
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 22.874.047
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 94.367.585
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.221.974	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.362.823	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 178.859.151	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 94.367.585	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 23.084.335	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 71.283.250	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.055.246	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.362.823	9,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0%

Observaciones:
El valor total del convenio $ 198,221,974 contempla $ 146,055,246 para ejecución física de la obra, $ 46,785,071 para gastos administrativos y $ 4,381,657 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.084.335	32,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.084.335	32,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % **0%** Avance o Atraso Físico % **0%**
Meta Física Ejecutada % **0%**

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	Ha	12,00
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ml	0,40
* PLACA HUELLA	Und	114,90
* CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	Und	1,00
* CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	Und	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	SALIDA DE SAN FERNANDO A SAN ZENÓN	Total	%
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **SALIDA DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE SAN ZENON** TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1,00	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	1,00	-
Cizalla manual de 90 cm.	1,00	-
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1,00	-
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10	1,00	-
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de	1,00	-
Ruteadora	1,00	-
Compresor (barrido y soplado)	1,00	-
Camioneta D – 300	1,00	-
Retroexcavadora sobre llantas	1,00	-
Compresor 120	1,00	
Vibrador de concreto	1,00	-
Aspersor manual	1,00	-
Total	**13,00**	**-**

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico
N/A

FECHA: **23/05/2024** (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio, de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio , de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

OBSERVACIONES:
N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2,00**	**3,00**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,00	3,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **5,00**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	**1,00**
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	-

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO CALLE PRINCIPAL

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Revisión y ajuste de presupuesto, memoria de cantidades y APU.
2. Comité de Obra en el sitio de los trabajos con la presencia del Residente de Obra, Residente de Interventoría e inspectora de interventoría.
3. Cargue de información de los pagos en el Drive.
4. Elaboración de contratos a proveedores y personal de obra.
5. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
6. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Entrega de la programación de obra.
2 .Inicio de actividades.
3. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores, estudios y diseños.
4. La interventoría llevará el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

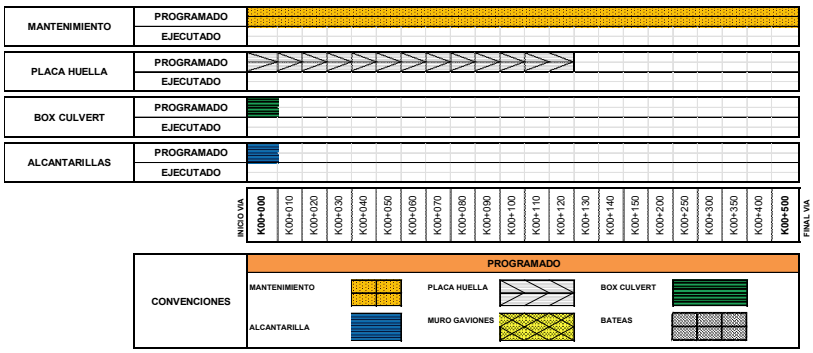

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

Nota: Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo a intervenir.



Tramo a intervenir.



Tramo a intervenir.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

FECHA	**23/05/2024** (Día / Mes / Año)

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS. Oficio N° CE-I-MAG 008-2023 (07 de diciembre de 2023) - Segunda Solicitud de entrega de Hojas de Vida personal JAC. Comité Operativo Nº 1 (09 de diciembre de 2023) Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros. Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Oficio N° CE-I-MAG 022 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "REQUERIMIENTO REVISIÓN DE GUÍAS". Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO". Oficio N° CE-I-MAG 026 (18 de enero de 2024) - CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité. Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC. Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 de febrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS. Oficio N° CE-I-MAG 042 (12 de febrero de 2024) - Solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO. COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (17 de febrero de 2024) Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES. Oficio N° CE-I-MAG 053 (18 de febrero de 2024) - ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA. Oficio N° CE-I-MAG 056 (22 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 058 (26 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT) Oficio N° CE-I-MAG 070 (16 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 073 (19 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños. Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso. Oficio N° CE-I-MAG 080 (27 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 084 (02 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 085 (05 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 089 (09 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC. Oficio N° CE-I-MAG 096 (16 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 097 (20 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños Oficio N° CE-I-MAG 105 (07 de mayo de 2024) - Preocupación por el estado del Convenio Solidario N° 3586-2023. Oficio N° CE-I-MAG 106 (08 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023. Oficio N° CE-I-MAG 109 (09 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023. Oficio N° CE-I-MAG 118 (23 de mayo de 2024) - Acta de Aprobación de Estudios y Diseños Definitivo. C-3586 DE 2023. Oficio N° CE-I-MAG 119 (23 de mayo de 2024) - Solicitud de Programación de Obra Convenio Solidario N° 3586-2023.	FIRMA  NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	13 de 15

FECHA: **30/05/2024** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** SEMANA No.: **26** del **24/05/2024** al **30/05/2024** Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **JUAN PABLO GONZÁLEZ VELANDÍA**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Limpieza a mano de alcantarillas = 12 Ml
Desmonte y Limpieza de zonas no boscosas = 0,40 Ha
Construcción de Box Culvert = 3 Und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste en realizar los ajustes a estudios y diseños mediante la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar el mejoramiento de la vía con la construcción de obras de placa huella y/o construcción de obras de drenaje de baja complejidad en los sectores priorizados.
Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, entre otras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JAC\ DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO - SANTA ANA**

CONVENIO No.: **3586 DE 2023** VALOR INICIAL: **$ 198.221.974**
FECHA DE INICIO: **1/12/2023** VALOR ADICIONES: **$ -**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/12/2023** VALOR ACUMULADO: **$ 198.221.974**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30/04/2024**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
INTEGRANTES: **N/A**

CONTRATO No.: **4472 DE 2023** VALOR INICIAL: **$ 71.493.538**
FECHA DE INICIO: **30/11/2023** VALOR ADICIONES: **$ 22.874.047**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/12/2023** VALOR ACUMULADO: **$ 94.367.585**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **22/05/2024** VALOR ANTICIPO: **$ -**
VALOR AMORTIZADO: **$ -**
SALDO POR AMORTIZAR: **$ -**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.221.974	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.362.823	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 178.859.151	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 94.367.585	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 23.646.372	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 70.721.213	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 124.871.756	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.901.792	7,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.362.823	9,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0%

Observaciones:
El valor total del convenio $ 198,221,974 contempla $ 124,871,756 para ejecución física de la obra, $ 67,968,561 para gastos administrativos y $ 4,381,657 PAGA, y $ 1,000,000 como aporte de herramienta menor por parte del OAC.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.646.372	33,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.646.372	33,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 562.037	0,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: **$ -**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: **7,13%** Avance o Atraso Físico %: **-7,13%**
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	Ha	12,00
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ml	0,40
* CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	Und	3,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	SALIDA DE SAN FERNANDO A SAN ZENÓN	Total	%
Prog	12,00	12,00	
Ejec			
Prog	0,40	0,40	
Ejec			
Prog	0,22	0,22	
Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1,00	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	1,00	-
Cizalla manual de 90 cm.	1,00	-
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1,00	-
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10	1,00	-
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de	1,00	-
Ruteadora	1,00	-
Compresor (barrido y soplado)	1,00	-
Camioneta D – 300	1,00	-
Retroexcavadora sobre llantas	1,00	-
Compresor 120	1,00	-
Vibrador de concreto	1,00	-
Aspersor manual	1,00	-
Total	**13,00**	**-**

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **SALIDA DE SAN FERNANDO AL MUNICIPIO DE SAN ZENON** TRAMO Y/O SECTOR 2: **N/A**

FECHA: **30/05/2024** (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio, de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
El Convenio establece que la OAC debe contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio , de momento la OAC, no ha entregado a Interventoria información sobre la fuentes de materiales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORIA**

OBSERVACIONES:
N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13,00**	**3,00**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10,00	3,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3,00	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **16,00**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **1,00**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **-**

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: **-**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO CALLE PRINCIPAL

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Revisión y ajuste de presupuesto, memoria de cantidades y APU.
2. Comité de Obra en el sitio de los trabajos con la presencia del Residente de Obra, Residente de Interventoría e inspectora de interventoría.
3. Cargue de información de los pagos en el Drive.
4. Elaboración de contratos a proveedores y personal de obra.
5. La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones y cuadros comparativos para definir proveedores.
6. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.
7. Aprobación de Estudios y Diseños
8. Inicio de Actividades de Obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Entrega de la programación de obra.
2 . Continuar con la ejecución de actividades.
3. Corte, figurado y armado del acero para los Box Coulvert.
4. excavación mecánica para la construcción de los Box Coulvert.
5. La interventoría realizará el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas para la entrega de los documentos, cotizaciones, cuadros comparativos para definir proveedores, estudios y diseños.
6. La interventoría llevará el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

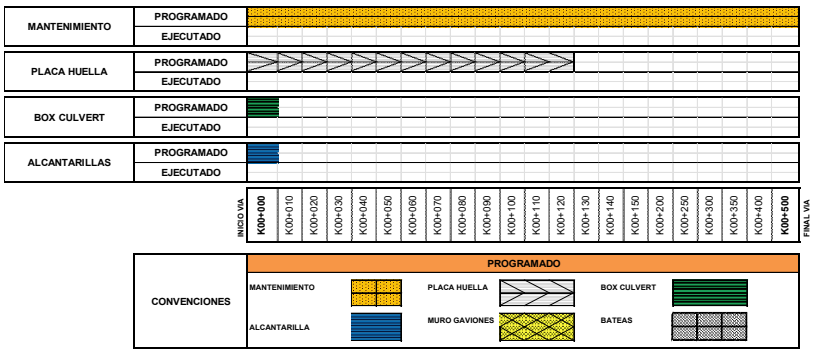

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

Nota: Las metas físicas aquí planteadas, corresponden a las establecidas en Levantamiento Técnico Inicial, realizada con los representantes de las organizaciones de acción comunal, y el personal técnico de Caminos Comunitarios de la Paz Total, para la postulación del tramo a Intervenir.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación manual



Excavación manual



Cerramiento con cinta de peligro a Alcantarilla existente.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Oficio N° CE-I-MAG 005-2023 (05 de diciembre de 2023) - Plazo de Ejecución. ETAPA DE REVISIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS.
Oficio N° CE-I-MAG 008-2023 (07 de diciembre de 2023) - Segunda Solicitud de entrega de Hojas de Vida personal JAC.
Comité Operativo Nº 1 (09 de diciembre de 2023)
Oficio N° CE-I-MAG 009-2023 (09 de diciembre de 2023) - Instructivo Manejo de Desembolso y otros.
Oficio N° CE-I-MAG 012-2023 (09 de diciembre de 2023) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Oficio N° CE-I-MAG 022 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "REQUERIMIENTO REVISIÓN DE GUÍAS".
Oficio N° CE-I-MAG 023 (17 de enero de 2024) - ENTREGA DE DOCUMENTO "MANEJO DEL DESEMBOLSO".
Oficio N° CE-I-MAG 026 (18 de enero de 2024) - CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.
Oficio N° CE-I-MAG 028 (20 de enero de 2024) - SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
Comite Operativo N° 02 (25 de enero de 2024) - Solicitud de cotizaciones recibidas en el periodo que se requieran aprobar en el comité.
Oficio N° CE-I-MAG 033 (27 de enero de 2024) - SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA JAC.
Oficio N° CE-I-MAG 040 (12 de febrero de 2024) - SOLICITUD FORMAL ENTREGA DE CONTRATOS.
Oficio N° CE-I-MAG 042 (12 de febrero de 2024) - Solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños.
Oficio N° CE-I-MAG 047 (15 defebrero de 2024) - SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO SOLIDARIO.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (17 de febrero de 2024)
Oficio N° CE-I-MAG 050 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.
Oficio N° CE-I-MAG 051 (16 de febrero de 2024) - SOLICITUD DE COTIZACIÓNES.
Oficio N° CE-I-MAG 053 (18 de febrero de 2024) - ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA.
Oficio N° CE-I-MAG 056 (22 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños.
Oficio N° CE-I-MAG 058 (26 de febrero de 2024) - Reiteración de solicitud de Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños.
Oficio N° CE-I-MAG 060 (27 de febrero de 2024) - Entrega del diseño de la valla informativa
Oficio N° CE-I-MAG 063 (04 de marzo de 2024) - SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Oficio N° CE-I-MAG 064 (04 de marzo de 2024) - Solicitud de plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito (PMT)
Oficio N° CE-I-MAG 070 (16 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños.
Oficio N° CE-I-MAG 073 (19 de marzo de 2024) - Preocupación por Entrega de Ajustes a Estudios y Diseños.
Oficio N° CE-I-MAG 076 (20 de marzo de 2024) - Reunión para aclarar inquietudes de informes mensuales inversión y buen desembolso.
Oficio N° CE-I-MAG 080 (27 de marzo de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños
Oficio N° CE-I-MAG 084 (02 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños
Oficio N° CE-I-MAG 085 (05 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños
Oficio N° CE-I-MAG 089 (09 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños
Oficio N° CE-I-MAG 094 (15 de abril de 2024) - ENTREGA DE FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC.
Oficio N° CE-I-MAG 096 (16 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños
Oficio N° CE-I-MAG 097 (20 de abril de 2024) - Observaciones a Ajustes a Estudios y Diseños

Oficio N° CE-I-MAG 105 (07 de mayo de 2024) - Preocupación por el estado del Convenio Solidario N° 3586-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 106 (08 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 109 (09 de mayo de 2024) - INVITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 118 (23 de mayo de 2024) - Acta de Aprobación de Estudios y Diseños Definitivo. C-3586 DE 2023.
Oficio N° CE-I-MAG 119 (23 de mayo de 2024) - Solicitud de Programación de Obra Convenio Solidario N° 3586-2023.
Oficio N° CE-I-MAG 128 (31 de mayo de 2024) - SOLICITUD DEL PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA, PROGRAMA DE INVERSIÒN.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA



NOMBRE: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**

Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Maquinaria y Equipo
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3586 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4472 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El Convenio a corte del presente informe debe realizar los ajustes a los estudios y diseños antes de dar inicio a las obras.

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Lizardo Capera

Firma
Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-61888ATL**

Betssy De Piñeres A.

Firma
Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No: 3586 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

NOMBRE ARL: PORVENIR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** NINGUNA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	*LIZARDO CAPERA JIMENEZ	85201642	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	$1.400.000	$ 7.500	1	MUTUAL SER	9464484298	$ 175.000	PORVENIR	9464484298	$ 224.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2	*ALVARADO RICO PABLO CESAR	85202625	CONTADOR PUBLICO	$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	$ 693.334	$ 31.700	1	NUEVA EPS MOVILIDAD	9462714679	$ 162.500	PORVENIR	9462714679	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	N/A
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El Residente de Obra y Contador Publico deben anexar la planilla de seguridad social del mes de amayo de 2024.

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Lizardo Capera

Firma
Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-61888ATL**

Firma
Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Informe Financiero y Presupuestal
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 3586 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2024

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4472 DE 2023

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1221123	ADQUISICION DE SERVICIOS - VIA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 197.221.974	$ 197.221.974
2023	N/A	APORTE HERRAMIENTAS MENORES JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA	N/A	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA	PRINCIPAL	$ 1.000.000	$ 1.000.000
				TOTAL		**$ 198.221.974**	**$ 198.221.974**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.221.974,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	MARZO 2024	$ 7.073.173	$ -	$ 7.073.173	N/A	N/A	N/A	1221123 DEL 31/10/2023	$ 190.148.801	$ 191.148.801	N/A		X	MARZO 2024
1A	Parcial	MARZO 2024	$ 11.289.650	$ -	$ 11.289.650	N/A	N/A	N/A	1221123 DEL 31/10/2023	$ 178.859.151	$ 179.859.151	N/A		X	MARZO 2024
TOTALES			**$ 18.362.823**	**$ -**	**$ 18.362.823**					**$ 178.859.151**	**$ 179.859.151**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-61888ATL**

Firma
Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Estado General del Tiempo
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1 1 de 1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No: 3586 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24		**717**
Lluvias moderadas																					3											**3**
Lluvias intensas																																**0**
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se lleva el registro del estado general del tiempo, sin embargo aún no trabaja en los frentes de obras.



Firma
Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-61888ATL**



Firma
Nombre: **ANGEL ORTIZ ARQUEZ**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-313986 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Resumen Ensayo de Laboratorio
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	1 DE 1 1 de 1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No.: 3586 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN FERNANDO - SANTA ANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Durante el periodo no se han iniciado las actividades en los frentes de obras.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-61888ATL**



Firma

Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Seguimiento Garantías y Seguros
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No. 3586 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL BARRIO CENTRO DEL CORR. DE SAN FERNANDO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 1/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.221.974,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.221.974,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4472 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.644.394,8	27	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.911.098,7	27	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.466.592,2	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100286917

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,0	27	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NQ-100070116 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.644.394,8	27	9	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.911.098,7	27	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.466.592,2	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100286917

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE DE CARGUE A SECOP Y APROBACIÓN

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	131%	$ 260.000.000,0	27	9	2023	30	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NQ-100070116 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE DE CARGUE A SECOP Y APROBACIÓN

OBSERVACIONES:

Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual deben ser actualizadas según prorrogas N° 01 y 02 y cargadas en SECOP 2 por parte de la OAC.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Seguimiento a la inversión del desembolso
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO		
		VERSIÓN		
		PÁGINA		

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3586 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4772 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** Ing. Betssy De Piñeres A.

JUSTIFICACIÓN:
Según prorroga N° 02, nueva fecha de terminación 30 de junio de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 - DICIEMBRE	VR. MES 2 - ENERO	VR. MES 3 - FEBRERO	VR. MES 4 - MARZO	VR. MES 5 - ABRIL	VR. MES 6 - MAYO	VR. MES 5 - JUNIO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	BASICO OBRA						$ 73.027.623	$ 73.027.623	$ 146.055.246	74%
2	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)							$ 4.381.657	$ 4.381.657	2%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 18.362.823		$ 14.211.124	$ 14.211.124	$ 46.785.071	24%
TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ 18.362.823**	**$ -**	**$ 87.238.747**	**$ 91.620.404**	**$ 197.221.974**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **MIRITH PUERTA PEREZ**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Firma:
Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **08202-61888 ATL**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

Informe Buen Manejo de Anticipo
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3586 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 197.142.928,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4772 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: Ing. Betssy De Piñeres A.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	52	31-may-24	BANCO AV VILLAS	$ 4.718,80	3	GASTOS BANCARIOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	BASICO OBRA	146.055.246,00	$ 12.809.650,00	$ -	$ 12.809.650,00	$ 133.245.596,00
2	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.381.657,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.381.657,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.785.071,00	$ 5.659.419,02	$ 4.718,80	$ 5.664.137,82	$ 41.120.933,18
	TOTALES	$ 197.221.974,00	$ 18.469.069,02	$ 4.718,80	$ 18.473.787,82	$ 178.748.186,18

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ABRIL) : $ 1.469,88
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 9.689,60
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
6	$ 178.748.186,18	$ -	$ 1.514,07	31/05/2024	$ 178.749.700,25

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
INTERESES SOBRE DEPOSITO

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: **MIRITH PUERTA PEREZ**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Firma:
Nombre: **LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **08202-61888 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO

NIT 901723278-1
CORR SAN FERNANDO CRA 2 865 - Santa Ana
3106227931
jac.centrosanfernandomagd@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 52

SEÑOR(ES)				**FECHA**
DIRECCIÓN				
CIUDAD				31/05/2024
TELÉFONO		**MÉTODO DE PAGO**		
NIT		**CUENTA**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL	INSTITUTO NACIONAL D

CONCEPTO	VALOR
Gastos por Intereses financieros	$4,718.8000

Subtotal	$4,718.8000
Total	$4,718.8000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Extractos Bancarios
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JAC BARRIO CENTRO CORREGIMIENT

PERÍODO	2024/05/01	**A**	2024/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	741-00084-8		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CC BUENAVISTA SANTA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$178,761,080.51
+ Movimiento crédito:	$1,514.07
- Movimiento débito:	$4,718.80
Saldo final período:	$178,757,875.78

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$178,756,563.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/05/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240502	$3,950.00	$178,757,130.51
2024/05/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$178,756,380.51
2024/05/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$178,756,361.71
2024/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,514.07	$178,757,875.78

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

Conciliación Bancaria
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

Reporte de conciliación

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO
901723278-1

Banco	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL D	Fecha de creación	2024-05-31
Tipo de cuenta	Banco	Estado	Conciliada

Resumen

Gastos bancarios	Impuestos bancarios	Entradas bancarias	Saldo final
$4,718.800	$0.000	$1,514.070	$178,757,875.780

Fecha	Contacto	Detalle	Número	Entrada	Salida
2024-05-31	-	-	52	-	$4,718.800
2024-05-31	Banco AV Villas	RENDIMEINTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2024	8	$1,514.070	-

Gastos bancarios	$4,718.800
Impuestos bancarios	$0.000
Entradas bancarias	$1,514.070
Total	$178,757,875.780

REVISADO POR

Seguimiento Programa de Obras
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

CRONOGRAMA ESTIMADO DE REFERENCIA

PROGRAMACIÓN INICIAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
MAGDALENA	SANTA ANA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	0,50	MAGDALENA	24/05/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYO							JUNIO																							
		GENERAL 2013	PARTICULAR						SEMANA N° 1							SEMANA N° 2							SEMANA N° 3							SEMANA N° 4							SEMANA N° 5							SEMANA N° 6		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE									24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00	$ 67.939,00	$ 815.268	$ 815.268																																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																													
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,40	$ 276.120,00	$ 110.448	$ 110.448																																					
TERRAPLENES																																													
3	201.7	220-13		Demolición de Estructuras	M3	3,58	$ 181.093,00	$ 648.313	$ 648.313																																					
TERRAPLENES																																													
4	220.1	220-13		Terraplenes	M3	298,10	$ 140.857,00	$ 41.988.779																																$ 29.392.145						$ 12.596.634		
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT																																													
5	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	37,76	$ 75.678,00	$ 2.857.552	$ 1.428.776							$ 1.428.776																															
6	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla n situ	M3	3,56	$ 532.174,00	$ 1.892.797								$ 1.892.797																															
7	630.1.3.1	630-13		Concreto Clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI)	M3	59,82	$ 681.644,00	$ 40.773.695																	$ 10.193.424							$ 10.193.424							$ 13.591.232						$ 6.795.616		
8	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	4.344,52	$ 6.789,00	$ 29.494.936					$ 5.898.987			$ 7.865.316							$ 7.865.316							$ 7.865.316															
9	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	44,68	$ 140.788,00	$ 6.289.968																																					$ 6.289.968		
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								**$ 124.871.756**	$ 8.901.792							$ 11.186.889							$ 18.058.740							$ 18.058.740							$ 42.983.377						$ 25.682.218		
ACUMULADO SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA									$ 8.901.792							$ 20.088.681							$ 38.147.421							$ 56.206.162							$ 99.189.538						$ 124.871.756		
PORCENTAJE ACUMULADO SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA									7,13%							16,09%							30,55%							45,01%							79,43%						100,00%		

Elaboro: Firma Residente de Obra
Nombre: **LIZARDO IVÁN CAPERA JIMÉNEZ**
Cargo: Ingeniero Residente
Matrícula Profesional: 08202-61888 ATL

Actas comité operativo
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	**Dirección Territorial INVIAS:**	**Fecha:**
6	**MAGDALENA**	**MAYO 21 2024**

Vereda – Municipio - Departamento:	CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
No. Convenio(s) Solidario(s):	3586 – 2023
Ejecutor(es):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO NIT. 901.723.278-1

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
MIRITH PUERTA PEREZ	JAC BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	PRESIDENTE
YOLIMA MARTINEZ SIADO	JAC BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	TESORERO(A)
PABLO CESAR ALVARADO RICO	JAC BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	CONTADOR
LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ	JAC BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	RESIDENTE DE OBRA
ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA	COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	REPRESENTANTE PRINCIPAL
BETSSY DE PIÑERES ALGARIN	INTERVENTORIA	DIRECTOR(A) DE INTERVENTORIA

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Lectura de compromisos anteriores.
2. Evaluación y Aprobación de los Cuadros Comparativos Entregados por la JAC a Interventoría para revisión.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución	Verificación del Cumplimiento
Entregar a Interventoría copia del contrato del Servicio de Topografía Inicial.	Residente de Obras Contador Presidente del OAC	Enero 17 2024	Pendiente por entregar
Entregar a Interventoría copia del contrato del Servicio de Estudios y Diseños.	Residente de Obras Contador Presidente del OAC	Enero 17 2024	Pendiente por entregar
Informe Nº 4 (Extracto Enero 2024) y Informe Nº 5 (Extracto Febrero 2024) del buen manejo de inversión con sus anexos. .	Residente de Obras Contador Presidente del OAC	Febrero 10 2024	Pendiente por entregar
Interventoría solicita entregar las cotizaciones de materiales de ferreterías (cemento, aceros), canteras (arena, triturados, piedra ciclópea), elementos de protección personal, señalizaciones, uniformes, exámenes ocupaciones de ingreso, vallas, alquiler de equipos línea amarilla, transportes, carrotanque, rieles para pavimento, mezcladora, laboratorio para control de materiales. Vibro para concreto, y todos los demás necesarios para la correcta ejecución de la obra	Contador Residente de Obras Presidente OAC	Febrero 23 2024	Abril 05 2024

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución	Verificación del Cumplimiento
Entregar los Estudios y diseños y topografía inicial para revisión por Interventoría	Residente de Obras Presidente del OAC	Enero 30 2024	Mayo 04 2024 (Se aprueba obras de arte)
Compromiso de entrega de informes semanales a Interventoría.	Residente de Obras Presidente OAC	Todos los miércoles	Mayo 16 2024

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

<table>
<tr><th>Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>
Evaluación de los Cuadros Comparativos Entregados por la JAC a Interventoría para revisión.

Aprobar cuadros comparativos revisados por Interventoría:
<table>
<tr><th>Cuadro Comparativo Nº Aprobado en Comité Nº 6 – 05-04-2024</th><th>Nº Corregida a partir de mayo 9 2024</th><th>Proveedor Seleccionado</th></tr>
<tr><td>1</td><td>06. (ARENA LAVADA PUESTA EN OBRA)</td><td>No se aprueba, debido a que el valor es superior a los del mercado, con observaciones</td></tr>
<tr><td>2</td><td>07. (SUB-BASE CLASE C PUESTA EN OBRA)</td><td>MINTRANSMAQ SAS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>08. (TRITURADO PUESTO EN OBRA)</td><td>MINTRANSMAQ SAS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>08. (PIEDRA PUÑO PUESTO EN OBRA)</td><td>MINTRANSMAQ SAS</td></tr>
<tr><td>5</td><td>09. (DEMARCACIÓN PREVENTIVA)</td><td>AGROFARBET LTDA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>10. (FERRETERIA)</td><td>DISTRITODO VS S.A.S.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>11. (SEÑALIZACIÓN DE OBRA)</td><td>AGROFARBEF</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

<table>
<tr><td></td><td>Resumen de cuadros comparativos sometidos a votación:

<table>
<tr><th>Cuadro Comparativo Nº</th><th>Proveedor Seleccionado</th><th>Votación</th></tr>
<tr><td>07. (SUB-BASE CLASE C PUESTA EN OBRA)</td><td>MINTRANSMAQ S.A.S.</td><td><u>Tres votos por unanimidad a favor</u></td></tr>
<tr><td>08. (TRITURADO PUESTO EN OBRA)</td><td>MINTRANSMAQ S.A.S.</td><td><u>Tres votos por unanimidad a favor</u></td></tr>
<tr><td>08. (PIEDRA PUÑO PUESTO EN OBRA)</td><td>MINTRANSMAQ S.A.S.</td><td><u>Tres votos por unanimidad a favor</u></td></tr>
<tr><td>09. (DEMARCACIÓN PREVENTIVA)</td><td>AGROFARBET LTDA.</td><td><u>Tres votos por unanimidad a favor</u></td></tr>
<tr><td>10. (FERRETERIA)</td><td>DISTRITODO VS S.A.S.</td><td><u>Tres votos por unanimidad a favor</u></td></tr>
<tr><td>11. (SEÑALIZACIÓN DE OBRA)</td><td>SERVICIOS Y SUMINISTROS EYD</td><td><u>Tres votos por unanimidad a favor</u></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Proposiciones y Varios.
Observaciones proveedores.</td></tr>
</table>

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	• **Contratar la SUB-BASE (INCLUYE TRANSPORTE) con MINTRANSMAQ S.A.S.** • **Contratar el TRITURADO (INCLUYE TRANSPORTE) con MINTRANSMAQ S.A.S.** • **Contratar la PIEDRA PUÑO (INCLUYE TRANSPORTE) con MINTRANSMAQ S.A.S.** • **Contratar la DEMARCACIÓN PREVENTIVA con AGROFARBET LTDA.**

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

	• **Contratara los insumos de FERRETERIA (PPRECIOS PUESTOS EN OBRA) con DISTRITODO VS S.A.S.** • **Contratar los elementos de SEÑALIZACIÓN DE OBRA con SERVICIOS Y SUMINISTROS EYD.**
2.	Una vez suscritos y legalizados los contrato deben ser compartidos la Interventoría.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO_X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Elaborar los contratos resultantes de los cuadros comparativos aprobados en el presente comité, entregar a Interventoría la copia respectiva.	Contador Residente de Obra Presidente JAC	Mayo 22 2024
Subsanar documentos proveedores pendientes	Contador Residente de Obra Presidente JAC	Mayo 22 2024
Socializar la información con la comunidad	Representante del Comité de Participación Comunitaria	Mayo 22 2024

DS BCDPA

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N/A	N/A	N/A

FIRMAS DE ASISTENTES:

Firma: DocuSigned by: FE9A6CCDE78C419... Nombre: MIRITH PUERTA PEREZ Cargo: **Presidente JAC**	Firma: DocuSigned by: A2CB1F92B812402... Nombre: BETSSY DE PIÑERES ALGARIN Cargo: **Interventor**
Firma: DocuSigned by: 2B1C18286AF142F... Nombre: ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA Cargo: **Rep. Comité de Participación Comunitaria**	Firma: DocuSigned by: C475751DA67C4BA... Nombre: PABLO CESAR ALVARADO RICO Cargo: **Contador del Convenio**
Firma: DocuSigned by: F151121CF7224E3... Nombre: LIZARDO CAPERA JIMENEZ Cargo: **Residente de Obra del Convenio**	Nombre: YOLIMA MARTINEZ SIADO Cargo: **Tesorero JAC**

<<FIN DE DOCUMENTO>>

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

JUNTA DE ACCCIÓN COMUNAL "DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA" NIT.: 901723278-1	**ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** "SELECCIÓN DE PROVEEDORES"

Fecha:	viernes, 5 de abril de 2024	Consecutivo:	7

INFORMACION GENERAL

Convenio Solidario Nº:	3586 DE 2023	**Objeto:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	PROVEEDOR 1	**PROVEEDOR 2**	**PROVEEDOR 3**
	Persona Juridica: RUT, Registro Mercartil, Cuenta Bancaria, Facturador Electrónico. **Proveedores de materiales de canteras**: Adicional a lo anterior Licencia Ambiental, Permiso Minero, RUCOM Vigentes. (Siempre sujeto a cumplimiento de la Calidad con Ensayos de Laboratorios Acreditados).	**Persona Natural:** C.C. Certificacion Bancaria, Cuenta de Cobro (Documento soporte).	
Nombre y/o Razòn Social	**TRANSPORTES CANTILLO AYALA NA**	**TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE SAS**	**MINTRANSMAQ SAS**
C.C. y/o Nit	**12685153 - 1**	**900359615-6**	**901563824-6**
Telefono de Contacto	**3165383505**	**3147650726**	**3102771270**
Correo electrónico	fernanda14@hotmail.com	trituradosyagregadosdelcaribe@hotmail.com	mintransmaqsas@gmail.com

Nota Importante: Los valores de los insumos siempre incluyen I.V.A.

INFORMACION DEL PLAN DE COMPRAS						PLAN DE CUADROS COMPARATIVOS							
						PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		MINIMOS POR INSUMOS	
Item	**Nombre del Insumo**	**Und**	**Cant. Total**	**Valor Insumo**	**Valor Total**	**Unitario Prov. 1**	**Valor Total Prov. 1**	**Unitario Prov. 2**	**Valor Total Prov. 2**	**Unitario Prov. 3**	**Valor Total Prov. 3**	**Unitario mínimo**	**Valor Total mínimo**	**S**
1	Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50 - PUESTO EN OBRA	M3	1	$ 192.035	$ 192.035,41	$ 135.750	$ 135.750	$ 138.000	$ 138.000	$ 116.800	$ 116.800	$ 116.800	$ 116.800	3
	TOTAL PRESUPUESTO CUADRO COMPARATIVO				**192.035**	**TOTAL 1:**	**135.750**	**TOTAL 2:**	**138.000**	**TOTAL 3:**	**116.800**	**TOTAL M:**	**116.800**	

DECISIONES TOMADAS	**Con la presente se escoje el PROVEEDOR Nº 3**	**MINTRANSMAQ SAS**	**12685153 - 1**

COMITÉ OPERATIVO						**Acta No.:**	**5**	**Fecha:**	**21/03/2024**
La **ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** fue elaborada, revisado y válidado en el presente comité a continuación firman los que aquí intervinieron, con nombre y cargo para constancia, se sucribe en acta.									
Nombre Completo:	**LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**	**Firma:**	DocuSigned by: F1511217CF7224E...	**Correo:**	lizacaji@gmail.com	**Ingeniero residente de Obra**	
Nombre Completo:	**PABLO CESAR ALVARADO RICO**	**Firma:**	DocuSigned by: C475751DA67C4BA...	**Correo:**	pccontadorsantaana@gmail.com	**Contador OAC**	
Nombre Completo:	**ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA**	**Firma:**	DocuSigned by: 2B1C1B2B0AF142F...	**Correo:**	isidroantoniovergaraecheverria@gmail.com	**Representante de la veeduría**	
Nombre Completo:	**YOLIMA MARTINEZ SIADO**	**Firma:**		**Correo:**	yolimamartinezsiado@gmail.com	**Tesorero**	
Nombre Completo:	**MIRITH PUERTA PEREZ**	**Firma:**	DocuSigned by: FE0A6CCDE78C419...	**Correo:**	jac.centrosanfernandomagd@gmail.com	**Representante Legal del OAC**	
REVISADO Y APROBADO							
Nombre Completo	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**	**Firma**	DocuSigned by: A2CB1F92B812402...	**Correo:**	gerencia@obyproltda.com.co	**Interventoría**	

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

JUNTA DE ACCCIÓN COMUNAL "DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA" NIT.: 901723278-1	**ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** "SELECCIÓN DE PROVEEDORES"

Fecha:	viernes, 5 de abril de 2024	Consecutivo:	8

INFORMACION GENERAL

Convenio Solidario Nº:	3586 DE 2023	**Objeto:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
	Persona Jurídica: RUT, Registro Mercartil, Cuenta Bancaria, Facturador Electrónico. **Persona Natural:** C.C. Certificacion Bancaria, Cuenta de Cobro (Documento soporte). **Proveedores de materiales de canteras**: Adicional a lo anterior Licencia Ambiental, Permiso Minero, RUCOM Vigentes. (Siempre sujeto a cumplimiento de la Calidad con Ensayos de Laboratorios Acreditados).		
Nombre y/o Razòn Social	**TRANSPORTES CANTILLO AYALA NA**	**BMR CONSTRUCCIONES Y MINERIA SAS**	**MINTRANSMAQ SAS**
C.C. y/o Nit	**12685153 - 1**	**901427337-9**	**901563824-6**
Telefono de Contacto	**3165383505**	**302 4878913**	**3102771270**
Correo electrónico	fernanda14@hotmail.com	construccionesbmr@gmail.com	mintransmaqsas@gmail.com

Nota Importante: Los valores de los insumos siempre incluyen I.V.A.

INFORMACION DEL PLAN DE COMPRAS						PLAN DE CUADROS COMPARATIVOS								
						PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		MINIMOS POR INSUMOS		
Item	**Nombre del Insumo**	**Und**	**Cant. Total**	**Valor Insumo**	**Valor Total**	**Unitario Prov. 1**	**Valor Total Prov. 1**	**Unitario Prov. 2**	**Valor Total Prov. 2**	**Unitario Prov. 3**	**Valor Total Prov. 3**	**Unitario mínimo**	**Valor Total mínimo**	**S**
1	Agregado grueso (3/4" o 1" según diseño de maezcla) - PUESTO EN OBRA	M3	1	$ 246.339	$ 246.338,53	$ 153.600	$ 153.600	$ 162.830	$ 162.830	$ 148.200	$ 148.200	$ 148.200	$ 148.200	3
2	Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) - PUESTO EN OBRA	M4	1	$ 193.271	$ 193.270,96	$ 129.800	$ 129.800	$ 136.650	$ 136.650	$ 124.400	$ 124.400	$ 124.400	$ 124.400	3
	TOTAL PRESUPUESTO CUADRO COMPARATIVO				**246.339**	**TOTAL 1:**	**153.600**	**TOTAL 2:**	**162.830**	**TOTAL 3:**	**148.200**	**TOTAL M:**	**148.200**	

DECISIONES TOMADAS	**Con la presente se escoje el PROVEEDOR Nº 3**	**MINTRANSMAQ SAS**	**12685153 - 1**

COMITÉ OPERATIVO					**Acta No.:**	**5**	**Fecha:**	**21/03/2024**
La **ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** fue elaborada, revisado y válidado en el presente comité a continuación firman los que aquí intervinieron, con nombre y cargo para constancia, se sucribe en acta.								
Nombre Completo:	**LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**	**Firma:**	DocuSigned by: F151121CF7224E...	**Correo:**	lizacaji@gmail.com	**Ingeniero residente de Obra**		
Nombre Completo:	**PABLO CESAR ALVARADO RICO**	**Firma:**	DocuSigned by: C475751DA67C4BA...	**Correo:**	pccontadorsantaana@gmail.com	**Contador OAC**		
Nombre Completo:	**ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA**	**Firma:**	DocuSigned by: 2B1C18286AF142F...	**Correo:**	isidroantoniovergaraecheverria@gmail.com	**Representante de la veeduría**		
Nombre Completo:	**YOLIMA MARTINEZ SIADO**	**Firma:**		**Correo:**	yolimamartinezsiado@gmail.com	**Tesorero**		
Nombre Completo:	**MIRITH PUERTA PEREZ**	**Firma:**	DocuSigned by:	**Correo:**	jac.centrosanfernandomagd@gmail.com	**Representante Legal del OAC**		
REVISADO Y APROBADO								
Nombre Completo	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**	**Firma**	DocuSigned by: A2CB1F92B812402...	**Correo:**	gerencia@obyproltda.com.co	**Interventoría**		

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

JUNTA DE ACCCIÓN COMUNAL "DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA" NIT.: 901723278-1	**ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** "SELECCIÓN DE PROVEEDORES"		
Fecha:	viernes, 5 de abril de 2024	Consecutivo:	9

INFORMACION GENERAL

Convenio Solidario Nº:	3586 DE 2023	**Objeto:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
	Persona Juridica: RUT, Registro Mercartil, Cuenta Bancaria, Facturador Electrónico. **Persona Natural:** C.C. Certificacion Bancaria, Cuenta de Cobro (Documento soporte). **Proveedores de materiales de canteras**: Adicional a lo anterior Licencia Ambiental, Permiso Minero, RUCOM Vigentes. (Siempre sujeto a cumplimiento de la Calidad con Ensayos de Laboratorios Acreditados).		
Nombre y/o Razòn Social	**SERVICIOS Y SUMINISTRO EYD**	**AGROFARBET LTDA**	**CEDICOL**
C.C. y/o Nit	**85204636-1**	**901723278**	**901152186**
Telefono de Contacto	**3025583586**	**3134928118**	**3243046835**
Correo electrónico	emirocampo345@gmail.com	agrofarbet@gmail.com	mostrador@cedicol.com.co

Nota Importante: Los valores de los insumos siempre incluyen I.V.A.

INFORMACION DEL PLAN DE COMPRAS						PLAN DE CUADROS COMPARATIVOS								
						PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		MINIMOS POR INSUMOS		
Item	**Nombre del Insumo**	**Und**	**Cant. Total**	**Valor Insumo**	**Valor Total**	**Unitario Prov. 1**	**Valor Total Prov. 1**	**Unitario Prov. 2**	**Valor Total Prov. 2**	**Unitario Prov. 3**	**Valor Total Prov. 3**	**Unitario mínimo**	**Valor Total mínimo**	**S**
1	Cinta de demarcación L=500 M	und	2	$ 47.000	$ 94.000	$ 32.000	$ 64.000	$ 29.000	$ 58.000	$ 28.440	$ 56.880	$ 28.440	$ 56.880	3
2	Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado	Und	2	$ 50.000	$ 100.000	$ 54.145	$ 108.290	$ 54.900	$ 109.800	$ 54.145	$ 108.290	$ 54.145	$ 108.290	1
3	Paleta de señalización PARE-SIGA	Und	2	$ 30.000	$ 60.000	$ 67.830	$ 135.660	$ 25.000	$ 50.000	$ 69.020	$ 138.040	$ 25.000	$ 50.000	2
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
	TOTAL PRESUPUESTO CUADRO COMPARATIVO				**254.000**	**TOTAL 1:**	**307.950**	**TOTAL 2:**	**217.800**	**TOTAL 3:**	**303.210**	**TOTAL M:**	**215.170**	

DECISIONES TOMADAS	**Con la presente se escoje el PROVEEDOR Nº 2**	**AGROFARBET LTDA**	**901723278**

COMITÉ OPERATIVO						**Acta No.:**	**4**	**Fecha:**	**27/02/2024**
La **ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** fue elaborada, revisado y válidado en el presente comité a continuación firman los que aquí intervinieron, con nombre y cargo para constancia, se sucribe en acta.									
Nombre Completo:	**LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**	**Firma:**	DocuSigned by: F151121CF7224E...	**Correo:**	lizacaji@gmail.com	**Ingeniero residente de Obra**			
Nombre Completo:	**PABLO CESAR ALVARADO RICO**	**Firma:**	DocuSigned by: C475751DA67C4BA...	**Correo:**	pccontadorsantaana@gmail.com	**Contador OAC**			
Nombre Completo:	**ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA**	**Firma:**	DocuSigned by: 2B1C18286AF142F...	**Correo:**	isidroantoniovergaraecheverria@gmail.com	**Representante de la veeduría**			
Nombre Completo:	**YOLIMA MARTINEZ SIADO**	**Firma:**		**Correo:**	yolimamartinezsiado@gmail.com	**Tesorero**			
Nombre Completo:	**MIRITH PUERTA PEREZ**	**Firma:**	DocuSigned by:	**Correo:**	jac.centrosanfernandomagd@gmail.com	**Representante Legal del OAC**			
REVISADO Y APROBADO									
Nombre Completo	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**	**Firma**	DocuSigned by: A2CB1F92B81240Z...	**Correo:**	gerencia@obyproltda.com.co	**Interventoría**			

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

JUNTA DE ACCCIÓN COMUNAL "DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA" NIT.: 901723278-1	**ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** "SELECCIÓN DE PROVEEDORES"

Fecha:	viernes, 5 de abril de 2024	Consecutivo:	10

INFORMACION GENERAL

Convenio Solidario Nº:	3586 DE 2023	**Objeto:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	PROVEEDOR 1	**PROVEEDOR 2**	**PROVEEDOR 3**
	Persona Juridica: RUT, Registro Mercartil, Cuenta Bancaria, Facturador Electrónico. **Proveedores de materiales de canteras**: Adicional a lo anterior Licencia Ambiental, Permiso Minero, RUCOM Vigentes. (Siempre sujeto a cumplimiento de la Calidad con Ensayos de Laboratorios Acreditados).	**Persona Natural:** C.C. Certificacion Bancaria, Cuenta de Cobro (Documento soporte).	
Nombre y/o Razòn Social	**DISTRITODO VS S.A.S.**	**FERRETERIA SAMIR**	**FERRETERIA Y LAMINAS SAS**
C.C. y/o Nit	**830506751-7**	**802014471**	**85202918-2**
Telefono de Contacto	**3218621471**	**(5) 3717800 - 3174013662**	**3114034451**
Correo electrónico	comercial@distritodovs.com.co	ventas@ferreteriasamir.com	ventas@ferreteriaylaminasjl.com

Nota Importante: Los valores de los insumos siempre incluyen I.V.A.

INFORMACION DEL PLAN DE COMPRAS						PLAN DE CUADROS COMPARATIVOS								
						PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		MINIMOS POR INSUMOS		
Item	**Nombre del Insumo**	**Und**	**Cant. Total**	**Valor Insumo**	**Valor Total**	**Unitario Prov. 1**	**Valor Total Prov. 1**	**Unitario Prov. 2**	**Valor Total Prov. 2**	**Unitario Prov. 3**	**Valor Total Prov. 3**	**Unitario mínimo**	**Valor Total mínimo**	**S**
1	Sika Antisol Rojo Base Agua 20 Kg	Und	1	$ 150.494,90	$ 150.494,90	$ 229.200	$ 229.200	$ 573.535	$ 573.535	$ 573.920	$ 573.920	$ 229.200	$ 229.200	1
2	Formaleta de madera para concreto	m^2	1	$ 25.875,80	$ 25.875,80		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	1
3	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG	Und	1	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 34.000	$ 34.000	$ 36.800	$ 36.800	$ 37.128	$ 37.128	$ 34.000	$ 34.000	1
4	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 - Varillas 1/2"	Und	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00	$ 31.600	$ 31.600	$ 34.873	$ 34.873	$ 36.514	$ 36.514	$ 31.600	$ 31.600	1
5	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 - Varillas 3/8"	Und	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00	$ 18.080	$ 18.080	$ 19.792	$ 19.792	$ 19.992	$ 19.992	$ 18.080	$ 18.080	1
6	Alambre negro para amarre calibre 18	Kg	1	$ 9.850,00	$ 9.850,00	$ 7.000	$ 7.000	$ 7.438	$ 7.438	$ 7.735	$ 7.735	$ 7.000	$ 7.000	1
7	Tela polipropileno para cerramiento H=2,10 Mts	ml	30	$ 6.700,00	$ 201.000,00	$ 2.200	$ 66.000	$ 2.900	$ 87.000	$ 2.975	$ 89.250	$ 2.200	$ 66.000	1
8	Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de agregados	ml	40	$ 7.200,00	$ 288.000,00	$ 4.300	$ 172.000	$ 9.200	$ 368.000	$ 9.282	$ 371.280	$ 4.300	$ 172.000	1
9	Caneca Plástica 55 gal para residuos	Unid	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00		$ -	$ 179.900	$ 179.900	$ 179.928	$ 179.928	$ 179.900	$ 179.900	2
	TOTAL PRESUPUESTO CUADRO COMPARATIVO				**846.221**	**TOTAL 1:**	**557.880**	**TOTAL 2:**	**1.307.338**	**TOTAL 3:**	**1.315.747**	**TOTAL M:**	**737.780**	

DECISIONES TOMADAS	**Con la presente se escoje el PROVEEDOR Nº 2**

COMITÉ OPERATIVO						**Acta No.:**		**Fecha:**	
La **ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** fue elaborada, revisado y válidado en el presente comité a continuación firman los que aquí intervinieron, con nombre y cargo para constancia, se sucribe en acta.									
Nombre Completo:	**LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**	**Firma:**	DocuSigned by: F151121CF7224E3...		**Correo:**	lizacaji@gmail.com		**Ingeniero residente de Obra**	
Nombre Completo:	**PABLO CESAR ALVARADO RICO**	**Firma:**	DocuSigned by: C475751DA67C4BA...		**Correo:**	pccontadorsantaana@gmail.com		**Contador OAC**	
Nombre Completo:	**ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA**	**Firma:**	DocuSigned by: 2B1C18286AF142F...		**Correo:**	isidroantoniovergaraecheverria@gmail.com		**Representante de la veeduría**	
Nombre Completo:	**YOLIMA MARTINEZ SIADO**	**Firma:**			**Correo:**	yolimamartinezsiado@gmail.com		**Tesorero**	
Nombre Completo:	**MIRITH PUERTA PEREZ**	**Firma:**	DocuSigned by:		**Correo:**	jac.centrosanfernandomagd@gmail.com		**Representante Legal del OAC**	
REVISADO Y APROBADO									
Nombre Completo	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**	**Firma**	DocuSigned by: A2CB1F92B812402...		**Correo:**	gerencia@obyproltda.com.co		**Interventoría**	

DocuSign Envelope ID: 5C827AB6-08BC-4B2C-8B46-033593403E94

JUNTA DE ACCCIÓN COMUNAL "DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA" NIT.: 901723278-1	**ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** "SELECCIÓN DE PROVEEDORES"

Fecha:	viernes, 5 de abril de 2024	Consecutivo:	11

INFORMACION GENERAL

Convenio Solidario Nº:	3586 DE 2023	**Objeto:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
	Persona Juridica: RUT, Registro Mercartil, Cuenta Bancaria, Facturador Electrónico. **Persona Natural:** C.C. Certificacion Bancaria, Cuenta de Cobro (Documento soporte). **Proveedores de materiales de canteras**: Adicional a lo anterior Licencia Ambiental, Permiso Minero, RUCOM Vigentes. (Siempre sujeto a cumplimiento de la Calidad con Ensayos de Laboratorios Acreditados).		
Nombre y/o Razòn Social	**SEÑALIZACION VIAL**	**AGROFARBEF**	**SERVICIOS Y SUMINISTROS EYD**
C.C. y/o Nit	**901507675-7**	**900151786-2**	**85204636-1**
Telefono de Contacto	**304 4170310**	**3134928118**	**3025583586**
Correo electrónico	recsenalizacionvial@gmail.com	agrofarbef@gmail.com	emirocampo345@gmail.com

Nota Importante: Los valores de los insumos siempre incluyen I.V.A.

INFORMACION DEL PLAN DE COMPRAS						PLAN DE CUADROS COMPARATIVOS								
						PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		MINIMOS POR INSUMOS		
Item	**Nombre del Insumo**	**Und**	**Cant. Total**	**Valor Insumo**	**Valor Total**	**Unitario Prov. 1**	**Valor Total Prov. 1**	**Unitario Prov. 2**	**Valor Total Prov. 2**	**Unitario Prov. 3**	**Valor Total Prov. 3**	**Unitario mínimo**	**Valor Total mínimo**	**S**
1	SPO-01 Trabajos en la vía 60x60 cm	Unid	1			$ 213.010	$ 213.010	$ 180.000	$ 180.000	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	3
2	SPO-02 Maquinaria en la vía 60x60 cm	Unid	1			$ 213.010	$ 213.010	$ 180.000	$ 180.000	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	3
3	SPO-03 Auxiliar de transito 60x60 cm	Unid	0			$ 213.010	$ -	$ 180.000	$ -	$ 166.600	$ -	$ 166.600	$ -	3
4	SIO-03 Fin de obra 60x60 cm	Unid	1			$ 299.880	$ 299.880	$ 180.000	$ 180.000	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	3
5	SPO-05 Angostamiento a la derecha 60x60 cm	Unid	1			$ 213.010	$ 213.010	$ 180.000	$ 180.000	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	3
6	SPO-06 Angostamiento a la izquierda 60x60 cm	Unid	1			$ 213.010	$ 213.010	$ 180.000	$ 180.000	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	3
7	SIO- Inicio de obra 60x60 cm	Unid	1			$ 299.880	$ 299.880	$ 180.000	$ 180.000	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	$ 166.600	3
8	Barricada metalica con rotulo de vía cerrada	Unid	0			$ 711.620	$ -	$ 570.000	$ -	$ 460.000	$ -	$ 460.000	$ -	3
	TOTAL PRESUPUESTO CUADRO COMPARATIVO				-	**TOTAL 1:**	**1.451.800**	**TOTAL 2:**	**1.080.000**	**TOTAL 3:**	**999.600**	**TOTAL M:**	**999.600**	

DECISIONES TOMADAS	**Con la presente se escoje el PROVEEDOR Nº 2**

COMITÉ OPERATIVO						**Acta No.:**		**Fecha:**	
La **ACTA APROBACIÓN CUADRO COMPARATIVO** fue elaborada, revisado y válidado en el presente comité a continuación firman los que aquí intervinieron, con nombre y cargo para constancia, se sucribe en acta.									
Nombre Completo:	**LIZARDO IVAN CAPERA JIMENEZ**	**Firma:**	DocuSigned by: F151121CF7224E2...	**Correo:**	lizacaji@gmail.com	**Ingeniero residente de Obra**	
Nombre Completo:	**PABLO CESAR ALVARADO RICO**	**Firma:**	DocuSigned by: C475751DA67C4BA...	**Correo:**	pccontadorsantaana@gmail.com	**Contador OAC**	
Nombre Completo:	**ISIDRO VERGARA ECHEVERRIA**	**Firma:**	DocuSigned by: 2B1C18286AF142F...	**Correo:**	isidroantoniovergaraecheverria@gmail.com	**Representante de la veeduría**	
Nombre Completo:	**YOLIMA MARTINEZ SIADO**	**Firma:**		**Correo:**	yolimamartinezsiado@gmail.com	**Tesorero**	
Nombre Completo:	**MIRITH PUERTA PEREZ**	**Firma:**	DocuSigned by:	**Correo:**	jac.centrosanfernandomagd@gmail.com	**Representante Legal del OAC**	
REVISADO Y APROBADO							
Nombre Completo	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**	**Firma**	DocuSigned by: A2CB1F92B812402...	**Correo:**	gerencia@obyproltda.com.co	**Interventoría**	

Actas comité de obras
C-3586 F-CCPT

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4508 DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 6/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No. 3586 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA

0
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4298 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Inicio de actividades - No cumplió
2. Entrega de programación de obra - Pendiente
3. Informe semanal - Pendiente
4. Entrega de programación de obra - Pendiente
5. Diseño estructural - Pendiente.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Diseño estructural de box culvert
2. Entrega de programación de obra.
3. Informes semanales.
4. Entrega de presupuesto.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1.La interventoría le solicita a la OAC y al residente de obra, realizar la entrega de los estudios estructurales de los box coulvert, ya que a la fecha no han sido entregados completamente, el residente manifiesta que el día jueves 9 de mayo estaría realizando el envío correspondiente.
2. La interventoría le reitera al profesional residente realizar la entrega de la programación de la obra, este manifiesta que el día jueves 9 de mayo de 2024 estaría realizando el envío correpondiente.
3. La interventoría le recuerda al residente de obra, que el envío de los informes semanales deben ser los días miércoles de cada semana, por lo que se requiere cumplir con el envío en la fecha requerida, ya que estos serán enviados a la unidad ejecutora para su respectiva validación y aprobación.
4. La interventoría le recuerda el envío del presupuesto de obra, el residente manifiesta realizar el envío el día jueves 9 de mayo de 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Envío de estudios estructurales de box coulvert	jueves, 9 de mayo de 2024	Residente de Obra
Enviar programación de obra	jueves, 9 de mayo de 2024	Residente de Obra
Enviar informe semanal - miercoles	jueves, 9 de mayo de 2024	Residente de Obra
Entrega del presupuesto de obra.	jueves, 9 de mayo de 2024	Residente de Obra

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 13/05/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Lizardo Capera	Residente de Obra	Barrio Centro del Corregimiento de San Fernando Magdalena	
Angel Ortiz Arquez	Residente de Interventoría	Obras y Proyectos Integrales	
Betssy de Piñeres	Directora de Interventoría	Obras y Proyectos Integrales	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 13/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No. 3586 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA

0
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4298 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Diseño estructural de box culvert - Cumplió
2. Entrega de programación de obra - Pendiente
3. Informes semanales- Cumplió
4. Entrega de presupuesto - Pendiente

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Entrega de programación de obra.
2. Informes semanales.
3. Entrega de presupuesto.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. La interventoría le reitera al profesional residente realizar la entrega de la programación de la obra, este manifiesta que el día jueves 18 de mayo de 2024 estaría realizando el envío correpondiente.
2. La interventoría le recuerda al residente de obra, que el envío de los informes semanales deben ser los días miércoles de cada semana, por lo que se requiere cumplir con el envío en la fecha requerida, ya que estos serán enviados a la unidad ejecutora para su respectiva validación y aprobación.
3. La interventoría le reitera el envío del presupuesto de obra, el residente manifiesta realizar el envío el día sábado 18 de mayo de 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 13/05/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Enviar programación de obra	sábado, 18 de mayo de 2024	Residente de Obra
Enviar informe semanal - miercoles	miércoles, 15 de mayo de 2024	Residente de Obra
Entrega del presupuesto de obra.	sábado, 18 de mayo de 2024	Residente de Obra

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 20/05/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Lizardo Capera	Residente de Obra	Barrio Centro del Corregimiento de San Fernando Magdalena	
Angel Ortiz Arquez	Residente de Interventoría	Obras y Proyectos Integrales	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 20/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No. 3586 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA

0
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4298 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Entrega de programación de obra. - cumplió
2. Informes semanales. cumplió
3. Entrega de presupuesto. Cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Revisión y ajuste de presupuesto de obra.
2. Informes semanales.
3. Inicio de actividades.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. La interventoría solicita realizar cuentas de cobros y organizar los respectivos pagos a los proveedores para el suministro de materiales y dar inicio a las actividades en obra.
2. La interventoría le recuerda al residente de obra, que el envío de los informes semanales deben ser los días miércoles de cada semana, por lo que se requiere cumplir con el envío en la fecha requerida, ya que estos serán enviados a la unidad ejecutora para su respectiva validación y aprobación.
3. El profesional residente de obra, manifiesta que el día 27 de mayo estaría dando inicio a las actividades de obra.

FECHA 20/05/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar informe semana	miércoles, 22 de mayo de 2024	Residente de Obra
Inicio de actividades	lunes, 27 de mayo de 2024	Residente de Obra

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 27/05/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Lizardo Capera	Residente de Obra	Barrio Centro del Corregimiento de San Fernando Magdalena	
Angel Ortiz Arquez	Residente de Interventoría	Obras y Proyectos Integrales	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 27/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONVENIO No. 3586 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO MAGDALENA

0
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4298 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Revisión y ajuste de presupuesto de obra. Cumplido.
2. Informes semanales. Cumplió
3. Inicio de actividades. No cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Correción de la programación de obra.
2. Informes semanales.
3. Inicio de actividades.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. La interventoría solicita realizar la corrección de la programación de obra ajustada a la realidad, el residente de obra manifiesta que el día 30 de mayo de 2024, estaría realizando el envío correspondiente.
2. La interventoría le recuerda al residente de obra, que el envío de los informes semanales deben ser los días miércoles de cada semana, por lo que se requiere cumplir con el envío en la fecha requerida, ya que estos serán enviados a la unidad ejecutora para su respectiva validación y aprobación.
3. La interventoría le solicita dar inicio a las actividades de obra, teniendo en cuenta que ya tiene todo lo requerido para dar inicio, El profesional residente de obra, manifiesta que el día 29 de mayo estaría dando inicio a las respectivas actividades.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 27/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Programación de obra	jueves, 30 de mayo de 2024	Residente de Obra
Informe semanal.	miércoles, 29 de mayo de 2024	Residente de Obra
Inicio de actividades	miércoles, 29 de mayo de 2024	Residente de Obra

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 3/06/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Lizardo Capera	Residente de Obra	Barrio Centro del Corregimiento de San Fernando Magdalena	
Angel Ortiz Arquez	Residente de Interventoría	Obras y Proyectos Integrales	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
