	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidario No. 3574 DE 2023, 3586 DE 2023, 3846 DE 2023, 4799 DE 2023

OAC: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO (SANTA ANA)
JAC DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA
ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES

Contrato de Interventoría No. 4472 DE 2023

Interventoría: BETSSY DE PIÑERES ALGARIN

Objeto:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** JUNIO 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		19
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA C-3574**		20
3.1	Información general del contrato		20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		21
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		23
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA C-3574**		24
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		24
4.2	Informe Semanal		24
4.3	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	24
4.4	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	24
4.5	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	25
4.6	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	25
4.7	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	25
4.8	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	25
4.9	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		25
4.10	Otros documentos seguimiento mensual		26
	• Seguimiento a la inversión del Desembolso.		
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de comité Operativo		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
	• Actas Mensual de Pago		
	• Actas de Suspensión		
	• Actas de Reinicio		
	• Informe de programa anual de caja - PAC		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA C-3586**		29

5.1	Información general del contrato		29
5.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		30
5.3	Seguimiento Ítems no previstos		32
5.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		33
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA C-3586**		34
6.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		34
6.2	Informe Semanal		34
6.3	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	34
6.4	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	35
6.5	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35
6.6	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	35
6.7	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	35
6.8	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	36
6.9	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		36
6.10	Otros documentos seguimiento mensual		36
	• Seguimiento a la inversión del Desembolso.		
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de comité Operativo		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
	• Actas Mensual de Pago		
	• Actas de Suspensión		
	• Actas de Reinicio		
	• Informe de programa anual de caja - PAC		
7	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA C-3846**		39
7.1	Información general del contrato		40
7.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		40
7.3	Seguimiento Ítems no previstos		42
7.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		42
8	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA C-3846**		44
8.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		44
8.2	Informe Semanal		44
8.3	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	44
8.4	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	45
8.5	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	45
8.6	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	45
8.7	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	45
8.8	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	45
8.9	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		46
8.10	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Desembolso.		
	• Seguimiento Programa de Obra		

	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de comité Operativo		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
	• Actas Mensual de Pago		
	• Actas de Suspensión		
	• Actas de Reinicio		
	• Informe de programa anual de caja - PAC		
9	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA C-4799**		49
9.1	Información general del contrato		49
9.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		50
9.3	Seguimiento Ítems no previstos		52
9.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		52
10	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA C-4799**		54
10.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		54
10.2	Informe Semanal		54
10.3	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	54
10.4	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	55
10.5	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	55
10.6	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	55
10.7	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	55
10.8	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	53
10.9	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		56
10.10	Otros documentos seguimiento mensual		56
	• Seguimiento a la inversión del Desembolso.		
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de comité Operativo		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
	• Actas Mensual de Pago		
	• Actas de Suspensión		
	• Actas de Reinicio		
	• Informe de programa anual de caja - PAC		
11	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		59
11.1	Información general del contrato		59
11.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		60
11.3	Informes especialistas y profesionales		60
11.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		60
11.5	Informe matriz de riesgos.		61
11.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		61
12	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR)**		61
12.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	61

12.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	61
12.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	61
12.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	61
12.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	62
12.6	Otros documentos seguimiento mensual		62
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
	• Acta de costos	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
13	**Conclusiones y recomendaciones**		75
14	**Anexos Reportes Ejecución Mensual Contrato de Interventoría C-4298**		78
14.1	**Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo**		78
14.2	**Registro fotográfico y video del avance de las obras**		78
14.3	**Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas**		78
14.4	**Copia de la Bitácora del mes correspondiente**		78

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Interventor: Ing. Betssy De Piñeres A.

Enero 2024



Visita Tecnica Inicial. Corregimiento de San Fernando. Municipio de Santa Ana
Convenio N° 3586 de 2023

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N° 4472 DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9

2.1. LOCALIZACIÓN 9

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 13

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 18

3. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3574 19

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO C-3574. 19

3.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES C-3574. 20

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS C-3574. 21

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE E INTERVENTORÍA C-3574. 22

4. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 3574 23

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO C-3574. F-CCPT 23

4.2. INFORME SEMANAL C-3574. F-CCPT 23

4.1. MAQUINARIA Y EQUIPO C-3574. 23

4.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL C-3574 23

4.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL C-3574. 24

4.4. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO C-3574. F-CCPT 24

4.5. RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO C-3574. F-CCPT 24

4.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS C-3574. F-CCPT 24

4.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD C-3574 25

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL C-3574 25

5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO Nº 3586 28

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO C-3586. 28

5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES C-3586. 29

5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS C-3586. 31

5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE E INTERVENTORÍA C-3586. 32

6. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 3586 33

6.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-3586. F-CCPT 33
6.2. Informe Semanal C-3586. F-CCPT 33
6.3. Maquinaria y Equipo C-3586. 33
6.4. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-3586 34
6.5. Informe Financiero y Presupuestal C-3586. 34
6.6. Estado General del Tiempo C-3586. F-CCPT 34
6.7. Resumen Ensayo de Laboratorio C-3586. F-CCPT 34
6.8. Seguimiento Garantías y Seguros C-3586. F-CCPT 34
6.9. Seguimiento al Plan de Calidad C-3586 35
6.10. Otros documentos seguimiento mensual C-3586. 35

7. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3846 38

7.1. Información general del convenio C-3846. 38
7.2. Descripción de actividades ejecutadas en el mes C-3846. 39
7.3. Seguimiento ítems no previstos C-3846. 41
7.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría C-3846. 41

8. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 3846 42

8.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-3846. F-CCPT 42
8.2. Informe Semanal C-3846. F-CCPT 42
8.3. Maquinaria y Equipo C-3846. 43
8.4. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-3846 43
8.5. Informe Financiero y Presupuestal C-3846. 43
8.6. Estado General del Tiempo C-3846. F-CCPT 43
8.7. Resumen Ensayo de Laboratorio C-3846. F-CCPT 44
8.8. Seguimiento Garantías y Seguros C-3846. F-CCPT 44
8.9. Seguimiento al Plan de Calidad C-3846 44
8.10. Otros documentos seguimiento mensual C-3846. 44

9. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 4799 47

9.1. Información general del convenio C-4799. 47
9.2. Descripción de actividades ejecutadas en el mes C-4799. 48
9.3. Seguimiento ítems no previstos C-4799. 51
9.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría C-3846. 51

caminoscomunitarios.invias.gov.co

10. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 4799 52

10.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-4799. F-CCPT 52
10.2. Informe Semanal C-4799. F-CCPT 53
10.3. Maquinaria y Equipo C-4799. 53
10.4. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-4799 53
10.5. Informe Financiero y Presupuestal C-4799. 54
10.6. Estado General del Tiempo C-4799. F-CCPT 54
10.7. Resumen Ensayo de Laboratorio C-4799. F-CCPT 54
10.8. Seguimiento Garantías y Seguros C-4799. F-CCPT 54
10.9. Seguimiento al Plan de Calidad C-4799. 54
10.10. Otros documentos seguimiento mensual C-4799. 55

11. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 58

11.1. Información general del contrato 58
11.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 59
11.3. Informes de especialistas y profesionales 59
11.4. Informe de programa anual de caja – PAC 59
11.5. Informe matriz de riesgos 60

12. EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA 60

12.1. Equipo y vehículo Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 60
12.2. Personal, Control Aportes Legales y Social. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 60
12.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 61
12.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13 61
12.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 61
12.6. Plan de Cargas o reprogramación aprobado. MEPI-MN-IN-9-FR-2 61
12.7. Seguimiento al Plan de Cargas. MEPI-MN-IN-9-FR-3 61
12.1. Acta de Costos. MEPI-MN-IN-9-FR-3 62

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 74

14. ANEXOS 77

14.1. Relación de la correspondencia 77
14.2. Registro Fotográfico del avance de obras 77

caminoscomunitarios.invias.gov.co

14.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS 77
14.4. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE. 77

caminoscomunitarios.invias.gov.co

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA..... 9
ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA..... 10
ILUSTRACIÓN 3 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE BARRO BLANCO 14
ILUSTRACIÓN 3 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE BARRO BLANCO 14
ILUSTRACIÓN 5 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO..... 15
ILUSTRACIÓN 6 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO..... 15
ILUSTRACIÓN 7 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PREVENCIÓN..... 16
ILUSTRACIÓN 8 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PREVENCIÓN..... 16
ILUSTRACIÓN 9 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA A VEREDA EL PURGATORIO 17
ILUSTRACIÓN 10 TRAMO A INTERVENIR VÍA QUE COMUNICA A VEREDA EL PURGATORIO..... 17

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO N.º 3574 DE 2023. 19
TABLA 2 DIRECTORIO CONVENIO SOLIDARIO 3574 DE 2023. 20
TABLA 3 CONTROL DE VALORES EJECUTADOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 3574 DE 2023. 21
TABLA 4 ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONVENIO SOLIDARIO 3574 DE 2023. 21
TABLA 5 REPORTE DETALLADO DEL AVANCE DEL CONVENIO Nº 3574 DE 2023. 22
TABLA 6 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES DEL PERIODO DEL CONVENIO Nº 3574 DE 2023. 23
TABLA 7 RELACIÓN DE COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO Nº 3574 DE 2023. 25
TABLA 8 RELACIÓN DE COMITÉ OBRAS DEL CONVENIO Nº 3574 DE 2023. 26
TABLA 9 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DEL CONVENIO Nº 3574 DE 2023. 26
TABLA 10 PROGRAMA ANUAL DE CAJA DEL PERÍODO DEL CONVENIO 3574 DE 2023. 27
TABLA 11 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO N.º 3586 DE 2023. 28
TABLA 12 DIRECTORIO CONVENIO SOLIDARIO 3586 DE 2023. 29
TABLA 13 CONTROL DE VALORES EJECUTADOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 3586 DE 2023. 31
TABLA 14 ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONVENIO SOLIDARIO 3586 DE 2023. 31
TABLA 15 REPORTE DETALLADO DEL AVANCE DEL CONVENIO Nº 3586 DE 2023. 32
TABLA 16 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES DEL PERIODO DEL CONVENIO Nº 3586 DE 2023. 33
TABLA 17 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO Nº 3586 DE 2023. 35
TABLA 18 RELACIÓN DE COMITÉ OBRAS DEL CONVENIO Nº 3586 DE 2023. 36
TABLA 19 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DEL CONVENIO Nº 3586 DE 2023. 36
TABLA 20 RELACIÓN DE ACTAS DE MENSUAL DE PAGO DEL CONVENIO Nº 38586 DE 2023. 36
TABLA 21 PROGRAMA ANUAL DE CAJA DEL PERÍODO DEL CONVENIO Nº 3586 DE 2023. 37
TABLA 22 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO N.º 3846 DE 2023. 38
TABLA 23 DIRECTORIO CONVENIO SOLIDARIO 3846 DE 2023. 39
TABLA 24 CONTROL DE VALORES EJECUTADOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 3846 DE 2023. 41
TABLA 25 ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONVENIO SOLIDARIO 3846 DE 2023. 41
TABLA 26 REPORTE DETALLADO DEL AVANCE DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 42
TABLA 27 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES DEL PERIODO DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 43
TABLA 28 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 45
TABLA 29 RELACIÓN DE COMITÉ OBRAS DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 45
TABLA 30 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 45
TABLA 31 RELACIÓN DE ACTAS DE MENSUAL DE PAGO DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 45
TABLA 32 PROGRAMA ANUAL DE CAJA DEL PERÍODO DEL CONVENIO Nº 3846 DE 2023. 46

TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO N.º 4799 DE 2023..... 47
TABLA 34 DIRECTORIO CONVENIO SOLIDARIO 4799 DE 2023..... 48
TABLA 35 CONTROL DE VALORES EJECUTADOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 4799 DE 2023..... 51
TABLA 36 ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONVENIO SOLIDARIO 4799 DE 2023..... 51
TABLA 37 REPORTE DETALLADO DEL AVANCE DEL CONVENIO Nº 4799 DE 2023. 52
TABLA 38 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES DEL PERIODO DEL CONVENIO Nº 4799 DE 2023..... 53
TABLA 39 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO Nº 4799 DE 2023..... 55
TABLA 40 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO Nº 4799 DE 2023..... 56
TABLA 41 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DEL CONVENIO Nº 4799 DE 2023..... 56
TABLA 42 PROGRAMA ANUAL DE CAJA DEL PERÍODO DEL CONVENIO Nº 4799 DE 2023..... 57
TABLA 43 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4472 DE 2023. 58
TABLA 36 INFORME PAC CONTRATO 4472 DE 2023..... 60

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), implementó el programa de La Paz Total y la Justicia Social, suscribiendo convenios solidarios con las Juntas u OAC en los municipios de **Santa Ana** y **Pijiño del Carmen**, del departamento del Magdalena, una vez llevado a cabo un proceso de contratación directa, a cargo de la subdirección de vías regionales siendo los procesos No.: SPSC-CD-CS-340-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 3574 de 2023, SPSC-CD-CS-349-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 3586 de 2023, SPSC-CD-CS-526-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 3846 de 2023, SPSC-CD-CS-1113-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 4799 de 2023, así mismo contrato la interventoría con el proceso de selección Nº IP-DT-MAG-026-2023 y suscribiendo el contrato de interventoría N.º 4472 de 2023 cuyo objeto es realizar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" con la ingeniera BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN, para que verifique el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios, además de dar instrucciones, asesorías, y recomendaciones para la correcta ejecución, acompañar y lograr de los objetivos contractuales, todo esto bajo la supervisión de la dirección de la territorial magdalena a cargo del ingeniero Fabian Ernesto Arango Pineda debidamente facultado según Resolución No. 3309 de 2021 modificada por la Resolución No. 3429 del 5 de noviembre de 2021.

Expuesto lo anterior, el presente informe muestra el avance de actividades desarrolladas de los convenios **corte a 30 de junio 2024**, en el marco del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

La localización del Municipio de **Santa Ana** en el departamento del **Magdalena** se encuentra en las siguientes coordenadas, Latitud: 9°19′10″N; Longitud: 74°34′14″W.

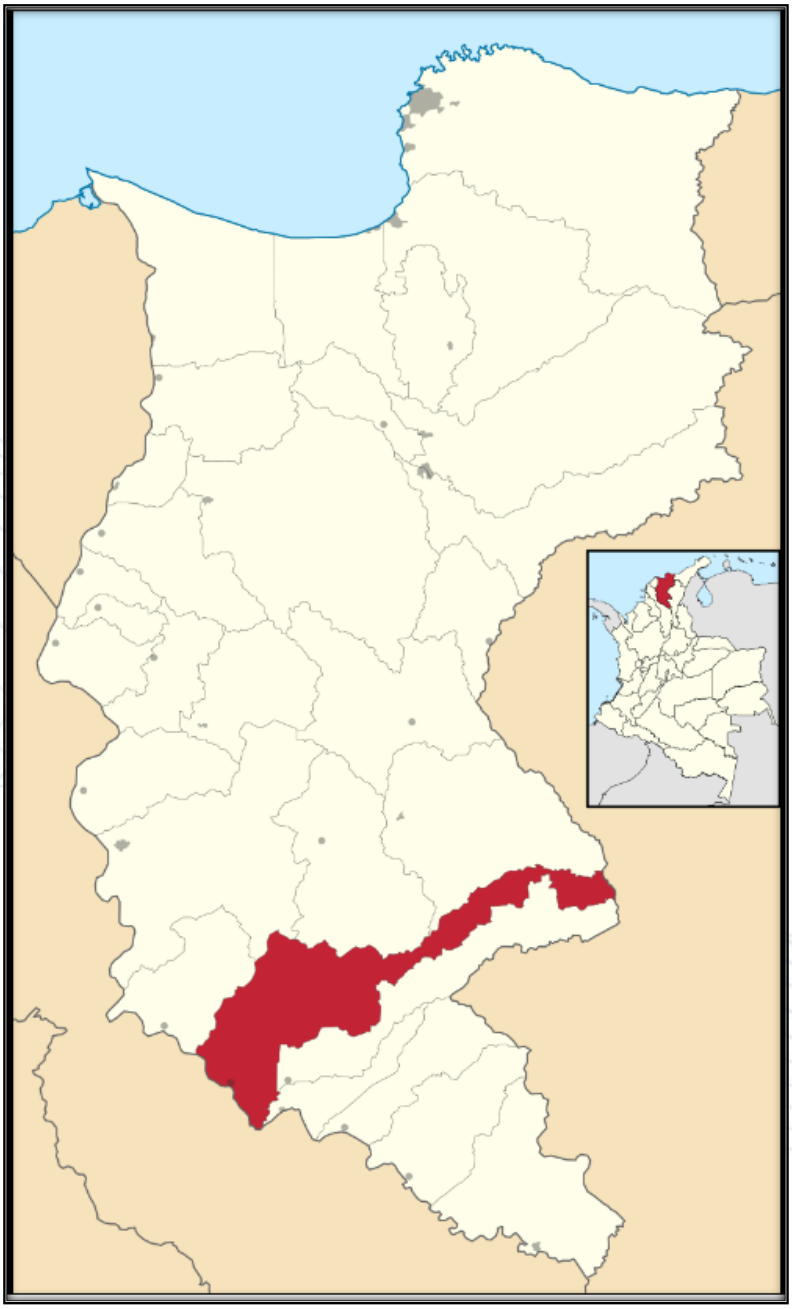


Ilustración 1 Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena

caminoscomunitarios.invias.gov.co

La localización del Municipio de Pijiño del Carmen en el departamento del **Magdalena** se encuentra en las siguientes coordenadas, Latitud: 9°19′53″N, Longitud: 74°27′30″W.

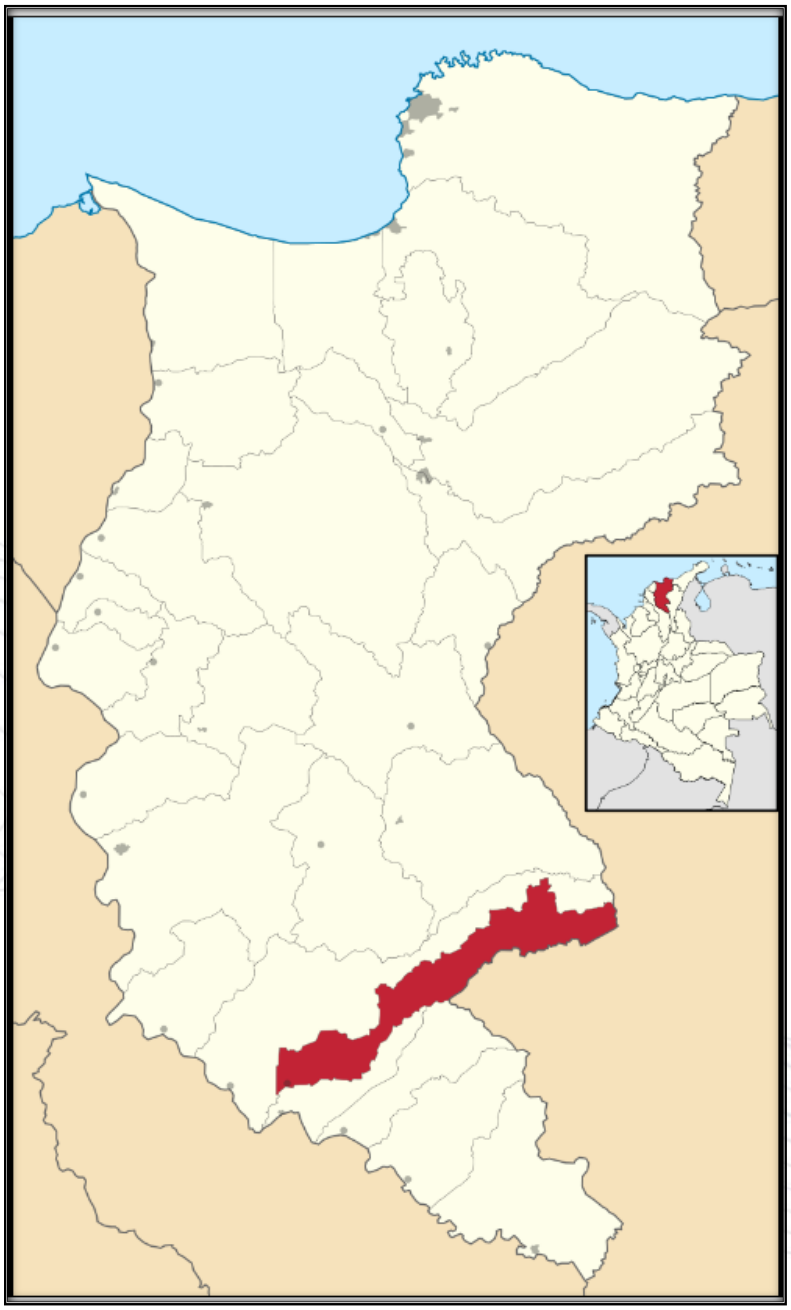


Ilustración 2 Municipio de Pijiño del Carmen, Departamento del Magdalena.

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Las zonas de influencia están delimitadas por la jurisdicción del organismo de acción comunal, para el caso que compete están distribuidas de la siguiente manera:

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Ana del departamento del Magdalena, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas 9°19'23.1"N 74°34'35.4"W y punto de referencia final la intersección con la vía principal Santa Ana – Santa Bárbara de Pinto en las coordenadas 9°19'28.8"N 74°34'57.5"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Ana del departamento del Magdalena, en el corregimiento de San Fernando, ubicado a 11 KM de la cabecera municipal, teniendo como punto de referencia inicial la salida del corregimiento hacia la cabecera municipal con coordenadas 9°16'23.5"N 74°32'03.5"W y punto de referencia final las coordenadas 9°15'41.1"N 74°31'40.3"W de la vía que conduce hacia el municipio de San Zenón, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Pijiño del Carmen del departamento del Magdalena, en el corregimiento de Nueva Holanda, con una distancia aproximada de 40 kilómetros de la cabecera, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas 9°30'24.1"N 74°11'39.6"W y punto de referencia final las coordenadas 9°30'48.5"N 74°11'24.3"W, de la vía principal que conduce del Municipio de Pijiño del Carmen al corregimiento de Nueva Holanda, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pijiño del Carmen del departamento del Magdalena, en la vereda el Purgatorio, ubicado a 18 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal del municipio de Pijiño del Carmen, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas 9°22'11.29"N 74°24'23.96"W y punto de referencia final las coordenadas 9°22'2.62"N 74°20'16.52"W de la vía que conduce a la vereda El Purgatorio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

Los beneficios que se podrán obtener al ejecutar el proyecto de **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, son los siguientes:

- Descongestionar en las vías por pasos restringidos, junto con la disminución de los tiempos de viaje que implica contribuir al derecho a la libre circulación.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

- Aumento de la comercialización de productos y ayudando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos.

- Se realizan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud.

- Aumento de la asistencia de estudiantes a escuelas y colegios contribuyendo al derecho a la educación.

- Disminución de precios de los productos de la región debido a la disminución en los costos de transporte de carga y pasajeros.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

Como inventario y estado inicial de la vía, se tiene el documento: levantamiento técnico realizado entre la territorial de INVIAS, Magdalena con el profesional de caminos comunitarios para para la paz total, y los representantes de las OAC, sin embargo, se adjunta registro fotográfico del estado actual de las vías a intervenir a corte del presente periodo:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALEN.



Ilustración 3 Tramo a Intervenir Vía que comunica al Corregimiento de Barro Blanco



Ilustración 4 Tramo a Intervenir Vía que comunica al Corregimiento de Barro Blanco

caminoscomunitarios.invias.gov.co

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.



Ilustración 5 Tramo a Intervenir Vía que comunica al Municipio de Santa Barbara de Pinto



Ilustración 6 Tramo a Intervenir Vía que comunica al Municipio de Santa Barbara de Pinto

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.



Ilustración 7 Tramo a Intervenir Vía que comunica al Corregimiento San José de Prevención



Ilustración 8 Tramo a Intervenir Vía que comunica al Corregimiento San José de Prevención

ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.



Ilustración 9 Tramo a Intervenir Vía que comunica a vereda El Purgatorio



Ilustración 10 Tramo a Intervenir Vía que comunica a vereda El Purgatorio

2.4. Características técnicas del proyecto

En el desarrollo de convenio se pretende atender las vías rurales, se adelantarán obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento, siendo en definitiva las que arroje la revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños para cada caso particular, sin embargo, dentro del marco de las especificaciones de los proyectos a manera general prevalecieron las siguientes actividades:

- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
- Construcción de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert (entre otros).
- Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella.
- Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la Cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO.

Una de vez que la junta de acción comunal u OAC, radique a Interventoría la revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños, y esta a su vez revise, apruebe o solicite correcciones y estas sean contestadas en el plazo establecido, Interventoría formalizará el Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños (MEPI-MN1-IN-1FR-5), con esto se determinará los parámetros de diseños, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y se dará la tipificación de los sectores a intervenir, así como se tendrán las metas físicas de las obras derivada del convenio.

3. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3574

3.1. Información general del convenio C-3574.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-340-2023**
CONVENIO N.º:	**3574 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**SEPTIEMBRE 27 DE 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**
NIT:	**901.637.945-9**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 198.379.461,00)**
PRORROGA 01:	**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA 02:	**HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024**
PRORROGA 03:	**HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024**
SUSPENSION:	**DICIEMBRE 28 DE 2023**
REINICIO:	**ENERO 16 DE 2024**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 27 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CARERRA 2A N°1A - 125 BARRIO ABAJO, SANTA ANA**
Nº TELEFONO:	**323 4719269**

Tabla 1 Información general del convenio solidario N.º 3574 de 2023.

3.1.1. Directorio telefónico actualizado C-3574.

OAC	
PRESIDENTE JAC	**ROSA ELENA SIERRA FONSECA** Cel.: 323 4719269; Correo: rosaelenasierrafonseca@gmail.com
TESORERO JAC	**DELMIS MEJIA** Cel.: No se recibió información; Correo: No se recibió información
INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Cel.: 320 4609451 Correo: gerencia@obyproltda.com
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** Cel.: 301 3630294 Correo: farango@invias.gov.co

Tabla 2 Directorio Convenio Solidario 3574 de 2023.

3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el mes C-3574.

En el presente periodo no se realizaron actividades en cuanto a ejecución de obra, por parte de la junta de acción comunal, ya que se encuentra en ejecución la Etapa 1: de Revisión, Estudios y/o Diseños, a pesar de contar con recursos la JAC no ha atendido a corte del presente informe las observaciones presentadas.

La OAC cuenta con el personal de apoyo Residente de Obra y Contador, así como también ya se aprobó el maestro de obra para la ejecución de las actividades físicas del presente convenio, en cuanto al personal obrero la OAC realizo una convocatorio abierta para la recepción de las hojas del personal.

A continuación, en la siguiente tabla se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo:

Otro aspecto importante llevado por esta interventoría se muestra en la siguiente tabla de control de valores discriminados de ejecución del convenio, donde no se evidencia ejecución alguna por falta de giro de los recursos:

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	$ 146.207.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.207.554,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.386.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.386.227,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.785.680,00	$ 0,00	$ 7.694.526,00	$ 39.091.154,00
APORTE COMUNIDAD	$ 1.000.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
TOTAL	**$ 198.379.461,00**	**$ 0,00**	**$ 7.694.526,00**	**$ 190.684.935,00**

Tabla 3 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3574 de 2023.

3.3. Seguimiento ítems no previstos C-3574.

En el presente periodo no se tienen ítems no previstos, el convenio se encuentra en la primera etapa de Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO, por tanto, no se registran valores en la siguiente tabla.

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____							
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% INCIDENCIA SOBRE EL VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Tabla 4 Acta de fijación de Ítems no previstos Convenio Solidario 3574 de 2023.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría C-3574.

Desde la Interventoría se le ha brindado acompañamiento continuo a la OAC, recomendando acatar las exigencias del convenio solidario.

En el presente periodo no se ejecutaron obras, pero se encuentra en proceso de aprobación los estudios y diseños.

Dentro de las recomendadas más esenciales y que considera la Interventoría relevante para que la OAC es que debe contratar con proveedores sea de bienes o servicios con empresas recocidas en cada sector, para garantizar idoneidad y que cuando se pretenda dar anticipo no sea necesario la constitución de pólizas.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance en recursos y tiempo, pero no se cuentan con ningún avance debido al de giro de los recursos por parte de la nación que se efectúo solo hasta el 20 de mayo del presente año, lo que ha generado dificultades al presidente con la comunidad.

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**30/06/2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**166**	**84,69%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 7.694.526,00**	**3,90%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 189.684.935,00**	**96,10%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**EN EJECUCIÓN**	

Tabla 5 Reporte detallado del avance del Convenio Nº 3574 de 2023.

4. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 3574

4.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-3574. F-CCPT

El Resumen Mensual del Estado General del Proyecto se elabora en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

4.2. Informe Semanal C-3574. F-CCPT

El Interventor con el presente informe adjunta los originales de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes para el convenio solidario, se entregan debidamente firmados por el director de Interventoría con corte a jueves de cada semana. Con este informe semanal se realizó el seguimiento periódico por parte de Interventoría en cumplimiento de la ejecución del convenio solidario (Ver Anexos).

Para este periodo se entregan los siguientes informes semanales:

Informe Semanal	Fecha
Informe Semanal Nº 21 del convenio solidario Nº 3574	Junio 06 de 2024
Informe Semanal Nº 22 del convenio solidario Nº 3574	Junio 13 de 2024
Informe Semanal Nº 23 del convenio solidario Nº 3574	Junio 20 de 2024
Informe Semanal Nº 24 del convenio solidario Nº 3574	Junio 27 de 2024

Tabla 6 Relación de Informes Semanales del periodo del Convenio Nº 3574 de 2023.

4.1. Maquinaria y Equipo C-3574.

En el presente periodo no se tienen maquinarias y equipos dispuesto en el sitio de las obras del convenio solidario**,** sin embargo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, con esta observación (Ver Anexos).

4.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-3574.

En este periodo la JAC tuvo a su cargo por prestación de servicios al Contador Público e Ingeniero Residente de Obra, este último desde el 20 de mayo del presente año, en

cuanto al Maestro de Obra se encuentra debidamente aprobado a espera de iniciar las actividades de obra, por lo que se anexan las planillas de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios a corte del presente mes y formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Ver Anexos).

4.3. Informe Financiero y Presupuestal C-3574.

Se lleva el control financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Ver Anexos).

4.4. Estado General del Tiempo C-3574. F-CCPT

El estado general del tiempo se registrará en el formato entregado para los convenios solidarios en el programa de CCPT, que muestra el registro diario del estado general del tiempo (Ver Anexos).

4.5. Resumen Ensayo de Laboratorio C-3574. F-CCPT

En el presente periodo no se tienen ensayos de laboratorios realizados en el desarrollo del convenio solidario**,** sin embargo, se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT, con esta observación (Ver Anexos).

4.6. Seguimiento Garantías y Seguros C-3574. F-CCPT

El Interventor realizó el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario y verificó que se encuentran pendientes por cargar por parte de la OAC en SECOP II, así como la aprobación en la misma plataforma por parte del INVIAS. Se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT (Ver Anexos).

4.7. Seguimiento al Plan de Calidad C-3574.

El Plan de Calidad debe ser aportado por OAC, para así realizar seguimiento y verificación de su cumplimiento mensual, se llevará el control de calidad con el resumen de ensayos utilizando el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 (No aplica).

4.8. Otros documentos seguimiento mensual C-3574.

4.8.1. Seguimiento a la inversión del desembolso C-3574. F-CCPT

En el presente periodo se tiene plan de inversiones entregada por parte del ejecutor del convenio solidario (Ver Anexos).

4.8.2. Seguimiento Programa de Obras C-3574.

En el presente periodo no se tiene programación de obras entregada por parte del ejecutor la OAC para el convenio solidario (No aplica).

4.8.3. Seguimiento Programa de Inversiones C-3574.

En el presente periodo se tiene plan de inversiones entregada por parte del ejecutor del convenio solidario (Ver Anexos).

4.8.4. Actas comité operativo. F-CCPT C-3574.

En el presente periodo se han realizado los siguientes Comités Operativos para el convenio solidario (No aplica).

Nº	Fecha
N/A	

Tabla 7 Relación de Comité Operativo del Convenio Nº 3574 de 2023.

4.8.5. Actas de comité de obras C-3574.

En el presente periodo no se realizó Comité de Obra para el convenio solidario (No aplica).

Nº	Fecha
N/A	

Tabla 8 Relación de Comité Obras del Convenio Nº 3574 de 2023.

4.8.6. Actas de Reunión C-3574. F-CCPT

En el presente periodo para el convenio solidario, se han realizado las siguientes actas de reunión (No aplica).

OBJETO DE REUNIÓN	Fecha
N/A	

Tabla 9 Relación de Actas de Reunión del Convenio Nº 3574 de 2023.

4.8.7. Acta Mensual de Pago C-3574. F-CCPT

En el presente periodo se realizaron Actas Mensual de Pago para el convenio solidario (No aplica).

4.8.1. Acta de Suspensión C-3574.

En el presente periodo no se ha realizado Acta de Suspensión para el convenio solidario (No aplica).

4.8.1. Acta de Reinicio C-3574.

En el presente periodo no se ha realizado Acta de Reinicio para el convenio solidario (No aplica).

4.8.2. Prorrogas C-3574.

En el presente periodo se realizó Prorrogas para el convenio solidario (Ver Anexos).

4.8.3. Informe de programa anual de caja – PAC C-3574.

INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA					
RUBRO	**PAC PROGRAMADO 2023**	**PAC EJECUTADO**	**% EJEUCIÓN**	**PAC NO UTILIZADO**	**% PAC NO EJECUTADO**
C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJOR, MANT. Y REHAB. DE CCPT	$ 197.379.461	$ 7.694.526,00	3,90%	$ 189.684.935	96,10%
TOTAL	**$ 197.379.461**	**$ 7.694.526**	**3,90%**	**$ 189.684.935**	**96,10%**

Tabla 10 Programa anual de caja del período del Convenio 3574 de 2023.

5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO Nº 3586

5.1. Información general del convenio C-3586.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-349-2023**
CONVENIO N.º:	**3586 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**SEPTIEMBRE 29 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO (SANTA ANA – MAGDALENA)**
NIT:	**901.723.278-1**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($198.221.974) MONEDA CORRIENTE.**
PRORROGA 1:	**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA 2:	**HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024**
PRORROGA 3:	**HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024**
SUSPENSION:	**N/A**
REINICIO:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 01 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024**
DIRECCIÓN:	**BARRIO CENTRO SAN FERNANDO MAGDALENA**
Nº TELEFONO:	**310 6227931**

Tabla 11 Información general del convenio solidario N.º 3586 de 2023.

5.1.1. Directorio telefónico actualizado C-3586.

OAC	
PRESIDENTE JAC	**MIRITH PUERTA PEREZ** Correo: jac.centrosanfernandomagd@gmail.com;Cel..: **310 6227931**
TESORERO JAC	**YOLIMA MARTINEZ SIADO** Coreo: sin información; Cel: sin información.
INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Correo: gerencia@obyproltda.com, Cel.: 320 4609451
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** Correo: farango@invias.gov.co, Cel.: 301 3630294

Tabla 12 Directorio Convenio Solidario 3586 de 2023.

5.2. Descripción de actividades ejecutadas en el mes C-3586.

En el presente periodo se continuo con las actividades de ejecución de obras entre las que podemos mencionar:

1. Armado del acero para placa superior del box coulvert 1.
2. Armado del acero para placa superior de los box coulvert 2.
3. Fundida de las placas superiores del box coulvert 1.
4. Fundida de las placas superiores del box coulvert 2.
5. Comité de Obra en el sitio de los trabajos con la presencia del Residente de Obra, Residente de Interventoría e inspectora de interventoría.
6. La interventoría lleva el registro fotográfico y escrito de cada una de las actividades realizadas en obra diariamente

A continuación, en la siguiente tabla se relacionan las actividades administrativas ejecutadas en el presente periodo:

Comité Operativo N° 07, donde se aprueba lo siguiente:

Aprobar acta parcial de pagos por Interventoría:

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	PROVEEDOR	VALOR APROBADO PARA EL ACTA N° 03
PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACION Y PROTECCION PERSONAL N° 005-2024	**EMIRO CRISTOBAL CAMPO VILLAMIZAR**	$ 1.109.650
PAGO DE SEÑALES DE OBRA (SEÑALES TIPO TIRIPODE 60X60) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 06	**EMIRO CRISTOBAL CAMPO VILLAMIZAR**	$ 999.600
PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MANEJO DE TRANSITO PARA LOS TRABAJADORES A REALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 3586 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 07	**FERREAGROFARBET**	$ 217.800
PAGO DE MODIFICACION DE POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y RCE (PRORROGA N° 02)	**COMPAÑÍA MUNDIALES DE SEGURO**	$ 141.349
PAGO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 30M3 A DE TRASNPORTE Y ARENA LAVADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 08	**TRITURADORAS Y ARENAS INDUSTRIALES DE EL COPEY S.A.S**	$3.789.000
PAGO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 30M3 DE MATERIAL TRITURADO PARA MEZCLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 03	**MINTRANSMAQ S.A.S.**	$4.446.000

Comité Operativo N° 08, donde se aprueba lo siguiente:

Aprobar acta parcial de pagos por Interventoría:

	PROVEEDOR	VALOR APROBADO PARA EL ACTA N° 3A
SUMINISTRO DE FORMALETA EN MADERA PARA CONCRETO	SANDRA MILENA JIMÉNEZ OLIVERO	**$541.000**
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	SANDRA MILENA JIMÉNEZ OLIVERO	**$23.781.500**

Otro aspecto importante llevado por esta interventoría se muestra en la siguiente tabla de control de valores discriminados de ejecución del convenio, donde efectivamente se evidencia que en el presente periodo se ejecutaron los siguientes recursos:

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	**$ 124.871.756**	$ 24.322.500,00	$ 24.322.500,00	**$ 100.549.256**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.381.657**	$ -		**$ 4.381.657**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 67.968.561**	**$ -**	**$ 20.831.222,00**	**$ 47.137.339**
APORTES DE HERRAMIENTAS MENORES OAC	$ 1.000.000	$ -		**$ 1.000.000**
TOTAL	**$ 198.221.974,0**	**$ 24.322.500,0**	**$ 45.153.722,00**	**$ 153.068.252,0**

Tabla 13 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3586 de 2023.

5.3. Seguimiento ítems no previstos C-3586.

En el presente periodo no se tienen ítems no previstos, el convenio se encuentra en la primera etapa de Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO, por tanto, no se registran valores en la siguiente tabla.

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____							
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% INCIDENCIA SOBRE EL VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Tabla 14 Acta de fijación de Ítems no previstos Convenio Solidario 3586 de 2023.

5.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría C-3586.

Desde la Interventoría se le ha brindado acompañamiento continuo a la OAC, recomendando acatar las exigencias del convenio solidario.

En el presente periodo no se ejecutaron obras relacionadas con la Intervención de 2 Box..

La metodología de trabajo fue hacerle un desglose de las obligaciones contraídas con la firma del convenio, a modo de tareas, donde se les muestra el estado en que se encuentran, el porcentaje completado, acompañado de las observaciones que interventoría considero relevantes para su cumplimiento.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance, el cual a corte del presente informe:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I.	**DETALLES DEL PROYECTO**	
FECHA DE CORTE	**JUNIO 30 DE 2024**	
II.	**PROGRESO DEL PROYECTO**	
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**180,00**	**85,71%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 45.153.722,00**	**22,78%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 153.068.252,00**	**77,22%**
III.	**ESTADO DEL CONVENIO**	
CONVENIO SOLIDADIO	**EN EJECUCIÓN**	

Tabla 15 Reporte detallado del avance del Convenio Nº 3586 de 2023.

6. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 3586

6.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-3586. F-CCPT

El Resumen Mensual del Estado General del Proyecto se elabora en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

6.2. Informe Semanal C-3586. F-CCPT

El Interventor con el presente informe adjunta los originales de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes para el convenio solidario, se entregan debidamente firmados por el director de Interventoría con corte a jueves de cada semana. Con este informe semanal se realizó el seguimiento periódico por parte de Interventoría en cumplimiento de la ejecución del convenio solidario (Ver Anexos).

Para este periodo se entregan los siguientes informes semanales:

Informe Semanal	Fecha
Informe Semanal Nº 27 del convenio solidario Nº 3586	Junio 06 de 2024
Informe Semanal Nº 28 del convenio solidario Nº 3586	Junio 13 de 2024
Informe Semanal Nº 29 del convenio solidario Nº 3586	Junio 20 de 2024
Informe Semanal Nº 30 del convenio solidario Nº 3586	Junio 27 de 2024

Tabla 16 Relación de Informes Semanales del periodo del Convenio Nº 3586 de 2023.

6.3. Maquinaria y Equipo C-3586.

En el presente periodo no se tienen maquinarias y equipos dispuesto en el sitio de las obras del convenio solidario**,** sin embargo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, con esta observación (Ver Anexos).

6.4. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-3586

En este periodo la JAC tuvo a su cargo por prestación de servicios al Ingeniero Residente de Obra, Contador, Maestro de Obra y personal obrero para la ejecución del convenio. Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Ver Anexos).

6.5. Informe Financiero y Presupuestal C-3586.

Se lleva el control financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Ver Anexos).

6.6. Estado General del Tiempo C-3586. F-CCPT

El estado general del tiempo se registrará en el formato entregado para los convenios solidarios en el programa de CCPT, que muestra el registro diario del estado general del tiempo (Ver Anexos).

6.7. Resumen Ensayo de Laboratorio C-3586. F-CCPT

En el presente periodo no se tienen ensayos de laboratorios realizados en el desarrollo del convenio solidario**,** sin embargo, se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT, con esta observación (Ver Anexos).

6.8. Seguimiento Garantías y Seguros C-3586. F-CCPT

El Interventor realizó el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario y verificó la aprobación de estas por parte de INVIAS en la plataforma del SECOP. Se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT (Ver Anexos).

6.9. Seguimiento al Plan de Calidad C-3586.

El Plan de Calidad debe ser aportado por OAC, para así realizar seguimiento y verificación de su cumplimiento mensual, se llevará el control de calidad con el resumen de ensayos utilizando el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 (No Aplica).

6.10. Otros documentos seguimiento mensual C-3586.

6.10.1. Seguimiento a la inversión del desembolso C-3586. F-CCPT

En el presente periodo se tiene plan de inversiones entregada por parte del ejecutor del convenio solidario (Ver Anexos).

6.10.2. Seguimiento Programa de Obras C-3586.

En el presente periodo se tiene programación de obras entregada por parte del ejecutor la OAC para el convenio solidario (Ver Anexos).

6.10.3. Seguimiento Programa de Inversiones C-3586.

En el presente periodo se le realizo seguimiento al plan de inversiones entregado por parte del ejecutor del convenio solidario (Ver Anexos).

6.10.4. Actas comité operativo. F-CCPT C-3586.

En el presente periodo se ha realizado Comité Operativo para el convenio solidario (Ver Anexos).

Nº	Fecha
7	03/06/2024
8	11/06/2024

Tabla 17 Relación de Actas de Comité Operativo del Convenio Nº 3586 de 2023.

6.10.5. Actas de comité de obras C-3586.

En el presente periodo se han realizado los siguientes Comité de Obra para el convenio solidario (No Aplica).

Nº	Fecha
N/A	

Tabla 18 Relación de Comité Obras del Convenio Nº 3586 de 2023.

6.10.6. Actas de Reunión C-3586. F-CCPT

En el presente periodo para el convenio solidario, se han realizado las siguientes actas de reunión (No Aplica).

OBJETO DE REUNIÓN	Fecha
N/A	

Tabla 19 Relación de Actas de Reunión del Convenio Nº 3586 de 2023.

6.10.7. Acta Mensual de Pago C-3586. F-CCPT

En el presente periodo se han realizado las siguientes Actas Mensuales de Pago para el convenio solidario (Ver Anexos).

Nº	Fecha
3	03/06/2024
3A	11/06/2024

Tabla 20 Relación de Actas de Mensual de Pago del Convenio Nº 38586 de 2023.

6.10.8. Acta de Suspensión C-3586.

En el presente periodo no se ha realizado Actas de Suspensión para el convenio solidario (No Aplica).

6.10.9. Acta de Reinicio C-3586.

En el presente periodo no se ha realizado Actas de Reinicio para el convenio solidario (No Aplica).

6.10.10. Prorrogas C-3586.

En el presente periodo se realizó Prorrogas para el convenio solidario (Ver Anexos).

6.10.11. Informe de programa anual de caja – PAC

INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA					
RUBRO	PAC PROGRAMADO 2023	PAC EJECUTADO	% EJEUCIÓN	PAC NO UTILIZADO	% PAC NO EJECUTADO
C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJOR. MANT. Y REH. E CCPT.	$ 197.221.974	$ 45.153.722,00	22,89%	$ 152.068.252	77,11%
TOTAL	**$ 197.223.997,00**	**$ 45.153.722,00**	**22,89%**	**$ 152.068.252,00**	**77,11%**

Tabla 21 Programa anual de caja del período del Convenio Nº 3586 de 2023.

7. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3846

7.1. Información general del convenio C-3846.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-526-2023**
CONVENIO N.º:	**3846 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**OCTUBRE 12 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA**
NIT:	**901.707.685-9**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($197.425.082,00).**
PRORROGA 1:	**HASTA ABRIL 30 DE 2024**
PRORROGA 2:	**HASTA JUNIO 30 DE 2024**
PRORROGA 3:	**HASTA JULIO 31 DE 2024**
SUSPENSION:	**N/A**
REINICIO:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 01 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA JULIO 31 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CORREGIMIENTO DE NUEVA HOLANDA FINCA EL DESCANSO**
Nº TELEFONO:	**310 2615528**

Tabla 22 Información general del convenio solidario N.º 3846 de 2023.

7.1.1. Directorio telefónico actualizado C-3846.

OAC	
PRESIDENTE JAC	**ELVIRA SALAS HERRERA** Cel.: 310 2615528; Correo: elvisahe@gmail.com
TESORERO JAC	**ALFONSO HERRERA GOMEZ** Cel.: Sin Información; Correo: Sin Información.
INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Cel.: 320 4609451 Correo: gerencia@obyproltda.com
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** Cel.: 301 3630294 Correo: farango@invias.gov.co

Tabla 23 Directorio Convenio Solidario 3846 de 2023.

7.2. Descripción de actividades ejecutadas en el mes C-3846.

En el presente periodo se continua con las actividades de ejecución de obras.

En la siguiente tabla se relacionan las actividades adicionales ejecutadas en el presente periodo:

Comité Operativo N° 06, donde se aprueba lo siguiente:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	PROVEEDOR	VALOR A PAGAR
1	PAGO 32 MTS CUBICOS DE TRITUDADO VR. UNITARIO $50,420.	TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE SAS	$ 1.920.006
2	PAGO 32 MTS CUBICOS DE ARENA VR. UNITARIO $30,000.	TRITURADOS Y ARENAS INDUSTRIALES DE EL COPEY S.A.S	$ 1.142.400
3	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR MES ABRIL 2024.	LUIS ALBERTO ANGULO CONDE	$ 1.200.000
4	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - AYUDANTE	OLMAN TORREJANO GOMEZ	$ 679.000
5	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - AYUDANTE	CARMELO SALAS HERRERA	$ 679.000
6	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - AYUDANTE	JOSE DAVID BOLAÑOS DAVILA	$ 679.000

Nº	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	PROVEEDOR	VALOR A PAGAR
7	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - AYUDANTE	ERIKA PATRICIA HERRERA DURAN	$ 679.000
8	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - AYUDANTE	CRISTIAN CALEB PEREIRA DAVILA	$ 679.000
9	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - AYUDANTE	LIBARDO JESUS LOPEZ HERRERA	$ 679.000
10	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - OFICIAL	JUAN MANUEL ORTIZ OREJUELA	$ 771.000
11	PAGO NOMINA MES ABRIL 2024 – RESIDENTE DE OBRA	JAIRO MATUTE GOMEZ	$ 771.000
12	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 21 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024 - MAESTRO DE OBRA	MANUEL IGNACIO CASTRO ALVAREZ	$ 1.139.000
13	PAGO DE PLANILLA MES ABRIL TRABAJADORES	ELVIRA SALAS HERRERA	$3.795.100

En el presente periodo se logró realizar los siguientes pagos:

Acta de pago N° 03:

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE SAS	900.359.615	2	3/05/2024	$ 1.613.450	$ 306.556	$ 1.920.006
2	TRITURADOS Y ARENAS INDUSTRIALES DE EL COPEY S.A.S	901.482.014	2	3/05/2024	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400
3	LUIS ALBERTO ANGULO CONDE	1.118.836.122	4	9/04/2024	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
4	OLMAN TORREJANO GOMEZ	19.768.909	46 Comprobante	7/05/2024	$ 679.000	$ 0	$ 679.000
5	CARMELO SALAS HERRERA	1.082.370.442	47 Comprobante	7/05/2024	$ 679.000	$ 0	$ 679.000
6	JOSE DAVID BOLAÑOS DAVILA	1.002.377.232	48 Comprobante	7/05/2024	$ 679.000	$ 0	$ 679.000
7	ERIKA PATRICIA HERRERA DURAN	26.905.488	49 Comprobante	7/05/2024	$ 679.000	$ 0	$ 679.000
8	CRISTIN CALEB PEREIRA DAVILA	1.192.714.929	50 Comprobante	7/05/2024	$ 679.000	$ 0	$ 679.000
9	LIBARDO JESUS LOPEZ HERRERA	1.192.788.661	51 Comprobante	7/05/2024	$ 679.000	$ 0	$ 679.000
10	JUAN MANUEL ORTIZ OREJUELA	1.082.371.043	52 Comprobante	7/05/2024	$ 771.000	$ 0	$ 771.000
11	JAIRO ENRIQUE MATUTE GOMEZ	19.768.456	53 Comprobante	9/04/2024	$ 2.024.000	$ 0	$ 2.024.000
12	MANUEL IGNACIO CASTRO ALVAREZ	1.082.370.065	45 Comprobante	7/05/2024	$ 1.139.000	$ 0	$ 1.139.000
13	ELVIRA SALAS HERRERA	1.004.320.377	7	14/05/2024	$ 3.795.100	$ 0	$ 3.795.100

Otro aspecto importante llevado por esta interventoría se muestra en la siguiente tabla de control de valores discriminados de ejecución del convenio, donde efectivamente se evidencia que en el presente periodo se ejecutaron los siguientes recursos:

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	**$ 145.284.557**	**$ 12.841.506**	**$ 110.752.185**	**$ 34.532.372**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.358.537**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.358.537**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 46.781.988**	**$ 3.224.000**	**$ 27.661.335**	**$ 19.120.653**
APORTES DE HERRAMIENTAS MENORES OAC	$ 1.000.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.000.000**
TOTAL	**$ 197.425.082**	**$ 16.065.506**	**$ 138.413.520**	**$ 59.011.562**

Tabla 24 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3846 de 2023.

7.3. Seguimiento ítems no previstos C-3846.

En el presente periodo no se tienen ítems no previstos, el convenio se encuentra en la primera etapa de Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO, por tanto, no se registran valores en la siguiente tabla.

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____							
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% INCIDENCIA SOBRE EL VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Tabla 25 Acta de fijación de Ítems no previstos Convenio Solidario 3846 de 2023.

7.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría C-3846.

Esta Interventoría ha dado el acompañamiento necesario a la junta de acción comunal para cumplir con cada una de las obligaciones contraídas en el clausulado del convenio y sus especificaciones técnicas.

La metodología de trabajo fue hacerle un desglose de las obligaciones contraídas con la firma del convenio, a modo de tareas, donde se les muestra el estado en que se encuentran, el porcentaje completado, acompañado de las observaciones que interventoría considero relevantes para su cumplimiento.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance, así como las acciones a seguir para dar cumplimiento a cada una de ellas:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**MAYO 31 DE 2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**180**	**85,71%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 138.413.520**	**70,47%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 58.011.562**	**29,53%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**EN EJECUCIÓN**	

Tabla 26 Reporte detallado del avance del Convenio Nº 3846 de 2023.

8. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 3846

8.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-3846. F-CCPT

El Resumen Mensual del Estado General del Proyecto se elabora en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

8.2. Informe Semanal C-3846. F-CCPT

El Interventor con el presente informe adjunta los originales de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes para el convenio solidario, se entregan debidamente firmados por el director de Interventoría con corte a jueves de cada semana. Con este informe semanal se realizó el seguimiento periódico por parte de Interventoría en cumplimiento de la ejecución del convenio solidario (Ver Anexos).

Para este periodo se entregan los siguientes informes semanales:

Informe Semanal	Fecha
Informe Semanal Nº 22 del convenio solidario Nº 3846	Mayo 02 de 2024
Informe Semanal Nº 23 del convenio solidario Nº 3846	Mayo 09 de 2024
Informe Semanal Nº 24 del convenio solidario Nº 3846	Mayo 16 de 2024
Informe Semanal Nº 25 del convenio solidario Nº 3846	Mayo 23 de 2024
Informe Semanal Nº 26 del convenio solidario Nº 3846	Mayo 30 de 2024

Tabla 27 Relación de Informes Semanales del periodo del Convenio Nº 3846 de 2023.

8.3. Maquinaria y Equipo C-3846.

En el presente periodo no se tienen maquinarias y equipos dispuesto en el sitio de las obras del convenio solidario ya que se culminaron las actividades donde se requerían. (No aplica).

8.4. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-3846.

En este periodo la JAC tuvo a su cargo por prestación de servicios al Ingeniero Residente de Obra y al Contador, además del Maestro de Obra y todo el personal obrero para la ejecución del convenio por lo que se anexan las planillas de seguridad social a corte del presente mes y formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Ver Anexos).

8.5. Informe Financiero y Presupuestal C-3846.

Se lleva el control financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Ver Anexos).

8.6. Estado General del Tiempo C-3846. F-CCPT

El estado general del tiempo se registrará en el formato entregado para los convenios solidarios en el programa de CCPT, que muestra el registro diario del estado general del tiempo (Ver Anexos).

8.7. Resumen Ensayo de Laboratorio C-3846. F-CCPT

El control de ensayos de laboratorios se registrará en el formato entregado para los convenios solidario (Ver Anexos).

8.8. Seguimiento Garantías y Seguros C-3846. F-CCPT

El Interventor realizó el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario y verificó que se encuentran pendientes por cargar por parte de la OAC en SECOP II, así como la aprobación en la misma plataforma por parte del INVIAS. Se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT (Ver Anexos).

8.9. Seguimiento al Plan de Calidad C-3846.

El Plan de Calidad debe ser aportado por OAC, para así realizar seguimiento y verificación de su cumplimiento mensual, se llevará el control de calidad con el resumen de ensayos utilizando el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 (No Aplica).

8.10. Otros documentos seguimiento mensual C-3846.

8.10.1. Seguimiento a la inversión del desembolso C-3846. F-CCPT

El seguimiento de la inversión del desembolso se realizó con el formato establecido para el programa de CCPT (Ver Anexos).

8.10.2. Seguimiento Programa de Obras C-3846.

En el presente periodo se tiene programación de obras entregada por parte del ejecutor del convenio solidario. (Ver anexos).

8.10.3. Seguimiento Programa de Inversiones C-3846.

En el presente periodo se tiene el plan de inversiones aprobado por parte del ejecutor del convenio solidario (Ver Anexos).

8.10.4. Actas comité operativo. F-CCPT C-3846.

En el presente periodo se realizó el Comité Operativo para el convenio solidario:

Nº	Fecha
09	14/05/2024

Tabla 28 Relación de Actas de Comité Operativo del Convenio Nº 3846 de 2023.

8.10.5. Actas de comité de obras C-3846.

En el presente periodo se han realizado los siguientes Comité de Obra para el convenio solidario:

Nº	Fecha
011	07/05/2024
012	14/05/2024
013	21/05/2024
014	28/05/2024

Tabla 29 Relación de Comité Obras del Convenio Nº 3846 de 2023.

8.10.6. Actas de Reunión C-3846. F-CCPT

En el presente periodo para el convenio solidario, se han realizado las siguientes actas de reunión (Ver Anexos).

OBJETO DE REUNIÓN	Fecha
N/A	

Tabla 30 Relación de Actas de Reunión del Convenio Nº 3846 de 2023.

8.10.7. Acta Mensual de Pago C-3846. F-CCPT

En el presente periodo se han realizado Actas Mensual de Pago para el convenio solidario (Ver Anexos).

Nº	Fecha
03	14/05/2024

Tabla 31 Relación de Actas de Mensual de Pago del Convenio Nº 3846 de 2023.

8.10.8. Acta de Suspensión C-3846.

En el presente periodo no se han realizado Actas de Suspensión (No Aplica).

8.10.9. Acta de Reinicio C-3846.

En el presente periodo no se ha realizado Actas de Reinicio para el convenio solidario (No Aplica).

8.10.10. Prorrogas C-3846.

En el presente periodo no se ha prorrogas para el convenio solidario (No Aplica).

8.10.11. Informe de programa anual de caja – PAC 3846.

INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA					
RUBRO	**PAC PROGRAMADO 2023**	**PAC EJECUTADO**	**% EJEUCIÓN**	**PAC NO UTILIZADO**	**% PAC NO EJECUTADO**
C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJOR. MANT. Y REH. E CCPT.	$ 196.425.082	$ 138.413.520	70,47%	$ 58.011.562	29,53%
TOTAL	**$ 196.425.082**	**$ 138.413.520**	**70,47%**	**$ 58.011.562**	**29,53%**

Tabla 32 Programa anual de caja del período del Convenio Nº 3846 de 2023.

9. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 4799

9.1. Información general del convenio C-4799.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-1113-2023**
CONVENIO N.º:	**4799 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**DICEIMBRE 1 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES**
NIT:	**901.753.601-6**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($198.142.928,00).**
PRORROGA 1:	**HASTA ABRIL 30 DE 2024**
PRORROGA 2:	**HASTA JUNIO 30 DE 2024**
SUSPENSION:	**DICIEMBRE 28 DE 2023**
REINICIO:	**ENERO 16 DE 2024**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 22 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA JUNIO 30 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CARERRA 12 N° 9-65 BARRIO LOS ALMENDROS – PIJIÑO DEL CARMEN**
Nº TELEFONO:	**301 5806050**

Tabla 33 Información general del convenio solidario N.º 4799 de 2023.

9.1.1. Directorio telefónico actualizado C-4799.

OAC	
PRESIDENTE JAC	**ALVARO JOSÉ GUTIERREZ NOGUERA** Cel.: 301 5806050; Correo: alvarojosegnz@gmail.com
TESORERO JAC	**KELLYS CARO RODRIGUEZ**
INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**BETSSY DE PIÑERES ALGARIN** Cel.: 320 4609451 Correo: gerencia@obyproltda.com
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** Cel.: 301 3630294 Correo: farango@invias.gov.co

Tabla 34 Directorio Convenio Solidario 4799 de 2023.

9.2. Descripción de actividades ejecutadas en el mes C-4799.

En el presente periodo se realizó la aprobación de los Estudios y/o Diseños y se dio inició a la ejecución de las actividades.

A continuación, en la siguiente tabla se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo:

Comité Operativo N° 05, donde se aprueba lo siguiente:

Aprobar cuadros comparativos revisados por Interventoría:

CUADRO COMPARATIVO Nº	PROVEEDOR SELECCIONADO	VOTACIÓN
3. (EXAMENES MEDICOS)	UNIÓN MÉDICA DEL RÍO I.P.S S.A.S.	**Tres votos por unanimidad a favor**
4. MAQUINARIA LINEA AMARILLA	ELIAS ALBERTO LISSA SARQUIS	**Tres votos por unanimidad a favor**

5. (FERRETRIA)	KEVIN GOMEZ (FERRETERÍA LA PRINCIPAL PIJIÑO)	**Tres votos por unanimidad a favor**
6. (SUB-BASE, ARENA LAVADA, PIEDRA PUÑO Y TRITURADO)	TRITURADO Y ARENAS INDUSTRIALES DEL COPEY S.A.S.	**Tres votos por unanimidad a favor**
7. (DOTACIÓN EPP)	EMIRO CAMPO VILLAMIZAR (SERVICIOS Y SUMINISTROS E Y D VALLEDUPAR)	**Tres votos por unanimidad a favor**
8. (SERVICIOS DE TOPOGRAFIA)	HECTOR ERAZO OSPINA	**Tres votos por unanimidad a favor**
9. (VALLA INFORMATIVA)	OK PUBLICIDAD S.A.S.	**Tres votos por unanimidad a favor**
10. (TRANSPORTE DE AGREGADOS)	TRITURADO Y ARENAS INDUSTRIALES DEL COPEY S.A.S.	**Tres votos por unanimidad a favor**

Comité Operativo N° 06, donde se aprueba lo siguiente:

Aprobar cuadros comparativos revisados por Interventoría:

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	PROVEEDOR	VALOR APROBADO PARA EL ACTA
Reembolso por concepto de pago de pólizas de Cumplimiento (NB-100298783) y póliza de RCE (NB-100073962) correspondiente a Pólizas Iniciales y Prorroga N° 001-2024 del Convenio Solidario N° 4799-2023.	**ALVARO JOSE GUTIERREZ NOGUERA**	$ 1.645.048
Pago N° 1 del contrato de prestaciones de servicios profesionales N° 001-2024 como contador del convenio solidario N° 4799 entre la JAC e INVIAS	**LUIS ALBERTO ANGULO CONDE**	$ 1.344.000

(Periodo N° 01 del 01 al 30 de abril de 2024)		
Reembolso pago de transporte presidente de la asociación de la junta de acción comunal en los meses de diciembre 2023, enero, febrero, marzo y abril del 2024	**ALVARO JOSE GUTIERREZ NOGUERA**	$ 1.175.000
Pago único por conceptos de levantamiento topográfico de precisión para determinar la planimetría y altimetría en la construcción de 160mts de placa huella en el camino que conduce a la vereda el purgatorio del municipio de Pijiño del Carmen	**HECTOR HERAZO OSPINA**	$ 1.440.000
Pago N° 1 del contrato de prestaciones de servicios profesionales N° 002-2024 como Residente de Obra del convenio solidario N° 4799 entre la JAC e INVIAS (Periodo N° 01 del 01 al 30 de abril de 2024)	**WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA**	$ 3.840.000
Pago del 50% del contrato de Suministro CS 005-2024 cuyo objeto es DOTACION PARA OBREROS	**EMIRO CRISTOBAL CAMPO VILLAMIZAR**	$ 1.879.482
Pago del 100% del Material de Sub-Base (152 M3 - 9 Viajes de doble troque)	**TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S.**	$ 6.079.919

En el presente periodo se logró realizar los siguientes pagos:

Acta de pago N° 01:

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	ALVARO JOSE GUTIERREZ NOGUERA	9.274.818	1	13/05/2024	$ 1.645.048,00	$ 0,00	$ 1.645.048,00
2	LUIS ALBERTO ANGULO CONDE	1.118.836.122	2	10/05/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00
3	ALVARO JOSE GUTIERREZ NOGUERA	9.274.818	3	10/05/2024	$ 1.175.000,00	$ 0,00	$ 1.175.000,00
4	HECTOR HERAZO OSPINA	7.547.838	4	23/05/2024	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00
5	WILLIAM ROLANDO TERRAZA SEQUEA	7.641.068	1	25/05/2024	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
6	EMIRO CRISTOBAL CAMPO VILLAMIZAR	85.204.636	1	25/05/2024	$ 1.879.482,00	$ 0,00	$ 1.879.482,00
7	TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S.	900.359.615	7	29/05/2024	$ 5.109.176,00	$ 970.743,44	$ 6.079.919,44

Otro aspecto importante llevado por esta interventoría se muestra en la siguiente tabla de control de valores discriminados de ejecución del convenio, aunque se deja constancia que el presente convenio no cuenta con giro de recursos hasta la fecha:

caminoscomunitarios.invias.gov.co

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	$ 145.284.557	$ -	$ -	$ 145.284.557
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.358.537	$ -	$ -	$ 4.358.537
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.781.988	$ 17.679.449	$ 17.679.449	$ 29.102.539
APORTES DE HERRAMIENTAS MENORES OAC	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000
TOTAL	$ 197.425.082	$ 17.679.449	$ 17.679.449	$ 179.745.633

Tabla 35 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 4799 de 2023.

9.3. Seguimiento ítems no previstos C-4799.

En el presente periodo no se tienen ítems no previstos, el convenio se encuentra en la primera etapa de Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO, por tanto, no se registran valores en la siguiente tabla.

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____							
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% INCIDENCIA SOBRE EL VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 36 Acta de fijación de Ítems no previstos Convenio Solidario 4799 de 2023.

9.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría C-3846.

Desde la Interventoría se le ha brindado acompañamiento continuo a la OAC, recomendando acatar las exigencias del convenio solidario.

En el presente periodo no se ejecutaron obras, pero se aprobaron los estudios y diseños, mediante acta de fecha del 21 de mayo del año en curso.

La metodología de trabajo fue hacerle un desglose de las obligaciones contraídas con la firma del convenio, a modo de tareas, donde se les muestra el estado en que se encuentran, el porcentaje completado, acompañado de las observaciones que interventoría considero relevantes para su cumplimiento.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance, el cual a corte del presente informe:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**MAYO 31 DE 2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**139**	**82,25%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 17.679.449**	**8,97%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 179.463.479**	**91,03%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**EN EJECUCIÓN**	

Tabla 37 Reporte detallado del avance del Convenio Nº 4799 de 2023.

10. EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO Nº 4799

10.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto C-4799. F-CCPT

El Resumen Mensual del Estado General del Proyecto se elabora en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

10.2. Informe Semanal C-4799. F-CCPT

El Interventor con el presente informe adjunta los originales de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes para el convenio solidario, se entregan debidamente firmados por el director de Interventoría con corte a jueves de cada semana. Con este informe semanal se realizó el seguimiento periódico por parte de Interventoría en cumplimiento de la ejecución del convenio solidario (Ver Anexos).

Para este periodo se entregan los siguientes informes semanales:

Informe Semanal	Fecha
Informe Semanal Nº 16 del convenio solidario Nº 4799	Mayo 02 de 2024
Informe Semanal Nº 17 del convenio solidario Nº 4799	Mayo 09 de 2024
Informe Semanal Nº 18 del convenio solidario Nº 4799	Mayo 16 de 2024
Informe Semanal Nº 19 del convenio solidario Nº 4799	Mayo 23 de 2024
Informe Semanal Nº 20 del convenio solidario Nº 4799	Mayo 30 de 2024

Tabla 38 Relación de Informes Semanales del periodo del Convenio Nº 4799 de 2023.

10.3. Maquinaria y Equipo C-4799.

En el presente periodo no se tienen maquinarias y equipos dispuesto en el sitio de las obras del convenio solidario**,** sin embargo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, con esta observación (Ver Anexos).

10.4. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social C-4799.

En este periodo la JAC tiene a su cargo por prestación de servicios al Ingeniero Residente de Obra y al Contador, estando pendiente por contratar el Maestro de Obra para completar el personal dispuesto requerido en las especificaciones técnicas del programa de caminos comunitarios para la paz total, sin embargo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Ver Anexos).

10.5. Informe Financiero y Presupuestal C-4799.

Se lleva el control financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Ver Anexos).

10.6. Estado General del Tiempo C-4799. F-CCPT

El estado general del tiempo se registrará en el formato entregado para los convenios solidarios en el programa de CCPT, que muestra el registro diario del estado general del tiempo (Ver Anexos).

10.7. Resumen Ensayo de Laboratorio C-4799. F-CCPT

En el presente periodo no se tienen ensayos de laboratorios realizados en el desarrollo del convenio solidario**,** sin embargo, se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT, con esta observación (Ver Anexos).

10.8. Seguimiento Garantías y Seguros C-4799. F-CCPT

El Interventor realizó el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario y verificó la aprobación de estas por parte de INVIAS en la plataforma del SECOP. Se anexa el formato dispuesto por el programa CCPT (Ver Anexos).

10.9. Seguimiento al Plan de Calidad C-4799.

El Plan de Calidad debe ser aportado por OAC, para así realizar seguimiento y verificación de su cumplimiento mensual, se llevará el control de calidad con el resumen de ensayos utilizando el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 (No Aplica).

10.10. Otros documentos seguimiento mensual C-4799.

10.10.1. Seguimiento a la inversión del desembolso C-4799. F-CCPT

El seguimiento de la inversión del desembolso se realizó con el formato establecido para el programa de CCPT, pero se deja constancia que la OAC se encuentra a la espera del giro de los recursos (Ver Anexos).

10.10.2. Seguimiento Programa de Obras C-4799.

En el presente periodo se tiene programación de obras entregada por parte del ejecutor del convenio solidario. (Ver anexos).

10.10.3. Seguimiento Programa de Inversiones C-4799.

En el presente periodo se tiene plan de inversiones entregada por parte del ejecutor del convenio solidario (Ver Anexos).

10.10.4. Actas comité operativo. F-CCPT C-4799.

En el presente periodo se realizó el Comité Operativo para el convenio solidario (Ver Anexos).

Nº	Fecha
05	22/05/2024
06	29/05/2024

Tabla 39 Relación de Actas de Comité Operativo del Convenio Nº 4799 de 2023.

10.10.5. Actas de comité de obras C-4799.

En el presente periodo se realizó el Comité Operativo para el convenio solidario (Ver Anexos).

Nº	Fecha
010	14/05/2024

011	21/05/2024
012	28/05/2024

Tabla 40 Relación de Actas de Comité Operativo del Convenio Nº 4799 de 2023.

10.10.6. Actas de Reunión C-4799. F-CCPT

En el presente periodo para el convenio solidario, se han realizado las siguientes actas de reunión (Ver Anexos).

OBJETO DE REUNIÓN	Fecha
N/A	15/04/2024

Tabla 41 Relación de Actas de Reunión del Convenio Nº 4799 de 2023.

10.10.7. Acta Mensual de Pago C-4799. F-CCPT

En el presente periodo se han realizado Actas Mensual de Pago para el convenio solidario (Ver Anexos).

10.10.8. Acta de Suspensión C-4799.

En el presente periodo no se ha realizado Acta de Suspensión para el convenio solidario (No Aplica).

10.10.9. Acta de Reinicio C-4799.

En el presente periodo no se ha realizado Acta de Reinicio para el convenio solidario (No Aplica).

10.10.1. Prorrogas C-4799.

En el presente periodo no se ha Prorrogas para el convenio solidario (No Aplica).

10.10.2. Informe de programa anual de caja – PAC C-4799.

INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA					
RUBRO	**PAC PROGRAMADO 2023**	**PAC EJECUTADO**	**% EJEUCIÓN**	**PAC NO UTILIZADO**	**% PAC NO EJECUTADO**
C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJOR. MANT. Y REH. E CCPT.	$ 197.142.928	$ 17.679.449,00	8,97%	$ 179.463.479	91,03%
TOTAL	**$ 197.142.928,00**	**$ 17.679.449,00**	**8,97%**	**$ 179.463.479,00**	**91,03%**

Tabla 42 Programa anual de caja del período del Convenio Nº 4799 de 2023.

11. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

11.1. Información general del contrato

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**IP-DT-MAG-026-2023**
CONTRATO N.º:	**4472 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**NOVIEMBRE 17 DE 2023**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
CONTRATISTA:	**BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
NIT:	**22.657.308 – 3**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONDEA CORRIENTE ($71.493.538 MC)**
ADICIÓN N° 01	**Nº 1 DE DICIEMBRE 14 2023 - POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE-IVA INCLUIDO ($22.874.047 MC)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO M/CTE ($ 94.367.585,00)**
PRORROGA N° 01	**HASTA MARZO 15 DE 2024**
PRORROGA N° 02	**HASTA ABRIL 30 DE 2024**
PRORROGA N° 03	**HASTA MAYO 22 DE 2024**
PRORROGA N° 04	**HASTA JUNIO 04 DE 2024**
SUSPENSION:	**N/A**
REINICIO:	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**HASTA 31 DE DICIEMBRE 203**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**NOVIEMBRE 30 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA JUNIO 04 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CALLE 77 N° 65-37**
Nº TELEFONO:	**320 4609451**

Tabla 43 Información general del contrato 4472 de 2023.

11.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Las actividades de interventoría en este periodo han cumplido con los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, brindando instrucciones, asesoría y recomendaciones para la adecuada ejecución de las obras.
- Acompañar y asegurar el logro de los objetivos contractuales mediante informes, visitas, actas y aclaraciones.
- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios.
- Dar instrucciones, asesoría y recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.
- Acompañar la ejecución y el logro de los objetivos contractuales y para ello se apoya en informes, visitas, actas, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

11.3. Informes de especialistas y profesionales

En el presente periodo se han presentado observaciones, recomendaciones y aprobaciones de los estudios y diseños por parte de los especialistas a la etapa 1, los cuales anexamos al presente informe (Ver Anexos).

11.4. Informe de programa anual de caja – PAC

INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA					
RUBRO	**PAC PROGRAMADO 2023**	**PAC EJECUTADO**	**% EJECUCIÓN**	**PAC NO UTILIZADO**	**% PAC NO EJECUTADO**
C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 71.493.538	$ 0,00	0%	$ 71.493.538	100%

INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA					
RUBRO	**PAC PROGRAMADO 2023**	**PAC EJECUTADO**	**% EJECUCIÓN**	**PAC NO UTILIZADO**	**% PAC NO EJECUTADO**
C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 22.874.047	$ 0,00	0%	$ 22.874.047	100%
TOTAL	**$ 94.367.585**	**$ 0,00**	**0%**	**$ 94.367.585**	**100%**

Tabla 44 Informe PAC contrato 4472 de 2023.

11.5. Informe matriz de riesgos

Matriz de Control (No aplica).

12. EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERNVENTORÍA

12.1. Equipo y vehículo Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-5

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, que se anexa al presente informe, se relaciona el control diario del equipo de la Interventoría para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

12.2. Personal, Control Aportes Legales y Social. MEPI-MN1-IN-15-FR-7

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, que se anexa al presente informe, se relaciona el personal empleado y se detalla la relación de los aportes de la seguridad social y parafiscal de la Interventoría (Ver Anexos).

caminoscomunitarios.invias.gov.co

12.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-9

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9, que se anexa al presente informe, se entrega la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

12.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, el cual se anexa al presente informe, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato de la Interventoría (Ver Anexos).

12.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. MEPI-MN1-IN-15-FR-15

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA", se realiza el seguimiento y verificación al cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría (No aplica).

12.6. Plan de Cargas o reprogramación aprobado. MEPI-MN-IN-9-FR-2

En el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, el cual se anexa al presente informe, se establece el plan de carga inicial para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

12.7. Seguimiento al Plan de Cargas. MEPI-MN-IN-9-FR-3

En el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3, el cual se anexa al presente informe, se realiza el seguimiento al plan de carga para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones

contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

12.1. Acta de Costos. MEPI-MN-IN-9-FR-3

En el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3, el cual se anexa al presente informe, se realiza el seguimiento al plan de carga para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

Informes de especialistas y profesionales

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Informes de especialistas y profesionales
C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Informes de especialistas y profesionales
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Informes de especialistas y profesionales
C-3846

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Informes de especialistas y profesionales
C-4799

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Equipos y vehículos
Contrato de Interventoría

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Seguimiento Garantías
Contrato de Interventoría

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Plan de Cargas y/o reprogramación aprobada

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Acta de Costos del Periodo

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se detallan las siguientes observaciones y recomendaciones:

I. CONVENIO SOLIDARIO N° 3574-2023 (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA).

En cuanto al Convenio Solidario N° 3574-2023 se encuentra en ejecución, la OAC a corte del presente informe cuenta con Contador Público y Residente de Obra, se encuentra en avance la etapa de estudios y diseños a espera de aprobación, con observaciones presentadas a los componentes de diseño estructural y estudios hidrológico e hidráulico.

Presenta muchos atrasos en el cumplimiento de las obligaciones administrativas, principalmente en la entrega de extractos, conciliaciones bancarias, rendimientos financieros, plan de manejo de recursos y informe buen manejo de recursos.

No se evidencia la expedición y cargue de las pólizas según prorrogas N° 01 y 02.

La Interventoría aspira que a corte del próximo periodo sean aprobados los estudios y diseños y poder iniciar las obras.

II. CONVENIO SOLIDARIO N° 3586-2023 (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO).

En cuanto al Convenio Solidario N° 3586-2023 se encuentra en ejecución las actividades de figuración de acero, trazado y replanteo de las obras de arte, así como las actividades de excavación.

En cuanto a las actividades administrativas se encuentran muchos pendientes principalmente en cuanto a los informes financieros, por lo que se oficiado, pero sin respuesta hasta la fecha.

No se evidencia la expedición y cargue de las pólizas según prorrogas N° 01 y 02.

III. CONVENIO SOLIDARIO N° 3846-2023 (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA).

En cuanto al Convenio Solidario N° 3846-2023 se encuentra en ejecución las actividades de obras:

- Concreto Reforzado
- Concreto Ciclópeo
- Figuración de acero

Presenta muchos atrasos en el cumplimiento de las obligaciones administrativas, principalmente en la entrega de extractos, conciliaciones bancarias, rendimientos financieros, plan de manejo de recursos y informe buen manejo de recursos.

No se evidencia la expedición y cargue de las pólizas según prorrogas N° 01 y 02.

El atraso en el presente periodo según programación de obras es cercano al 11,20%.

IV. CONVENIO SOLIDARIO N° 4799-2023 (ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN).

En cuanto al Convenio Solidario N° 4799-2023 en el presente periodo se ordenó el inicio de las actividades, pero hasta la presente se continuo con la aprobación de proveedores y muchos insumos y servicios sin definir.

El presidente de la OAC, no acata recomendaciones emitidas por parte de la Interventoría, mucho menos de su equipo de trabajo tanto residente de obra como contador.

En cuanto a las actividades administrativas se encuentran muchos pendientes principalmente en cuanto a los informes financieros, por lo que se oficiado, pero sin respuesta hasta la fecha.

No se evidencia la expedición y cargue de las pólizas según prorrogas N° 01 y 02.

El atraso en el presente periodo según programación de obras es cercano al 11,56%.

Atentamente,

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Director de Interventoría
M.P.: 08202-141927 ATL

14. ANEXOS

14.1. Relación de la correspondencia

En la relación de correspondencia entre el Contratista e Interventor, que se anexa al presente informe, se relaciona en documento anexo en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

14.2. Registro Fotográfico del avance de obras

El registro fotográfico del avance de obras entre el Contratista e Interventor, que se anexa al presente informe, se relaciona en documento anexo en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (Ver Anexos).

14.3. Registro Fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

El registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas por el OAC, que se anexa al presente informe, se relaciona en documento anexo en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente (No Aplica)

14.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

Para el presente periodo no se generó registro en Bitácora (Ver Anexos).

Relación de la correspondencia

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Registro Fotográfico y/ video del avance de las obras

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Registro Fotográfico y/ video actividades ambientales y sociales

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Registro Fotográfico y/ video actividades ambientales y sociales C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Registro Fotográfico y/ video actividades ambientales y sociales C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Registro Fotográfico y/ video actividades ambientales y sociales C-3846

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Registro Fotográfico y/ video actividades ambientales y sociales C-4799

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Copia de la Bitácora de Obras

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Copia de la Bitácora de Obras
C-3574

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Copia de la Bitácora de Obras
C-3586

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Copia de la Bitácora de Obras
C-3846

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Copia de la Bitácora de Obras
C-4799

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023
