INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Interventor: Ing. Betssy De Piñeres A.

INFORME FINAL



Socialización Inicial. Vereda El Purgatorio. Municipio de Pijiño del Carmen
Convenio N° 4799 de 2023

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N° 4472 DE 2023

INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), implementó el programa de La Paz Total y la Justicia Social, suscribiendo convenios solidarios con las Juntas u OAC en los municipios de **Santa Ana** y **Pijiño del Carmen**, del departamento del Magdalena, una vez llevado a cabo un proceso de contratación directa, a cargo de la subdirección de vías regionales siendo los procesos No.: SPSC-CD-CS-340-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 3574 de 2023, SPSC-CD-CS-349-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 3586 de 2023, SPSC-CD-CS-526-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 3846 de 2023, SPSC-CD-CS-1113-2023 suscribiendo el convenio solidario No. 4799 de 2023, así mismo contrato la interventoría con el proceso de selección Nº IP-DT-MAG-026-2023 y suscribiendo el contrato de interventoría Nº 4472 de 2023 cuyo objeto es realizar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" con la ingeniera BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN, para que verifique el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios, además de dar instrucciones, asesorías, y recomendaciones para la correcta ejecución, acompañar y lograr de los objetivos contractuales, todo esto bajo la supervisión de la dirección de la territorial magdalena a cargo del ingeniero Fabian Ernesto Arango Pineda debidamente facultado según Resolución No. 3309 de 2021 modificada por la Resolución No. 3429 del 5 de noviembre de 2021.

Expuesto lo anterior, el presente informe representa el **Informe Final** que muestra los avances de las actividades desarrolladas de los convenios, en el marco del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Localización

La localización del Municipio de **Santa Ana** en el departamento del **Magdalena** se encuentra en las siguientes coordenadas, Latitud: 9°19′10″N; Longitud: 74°34′14″W.

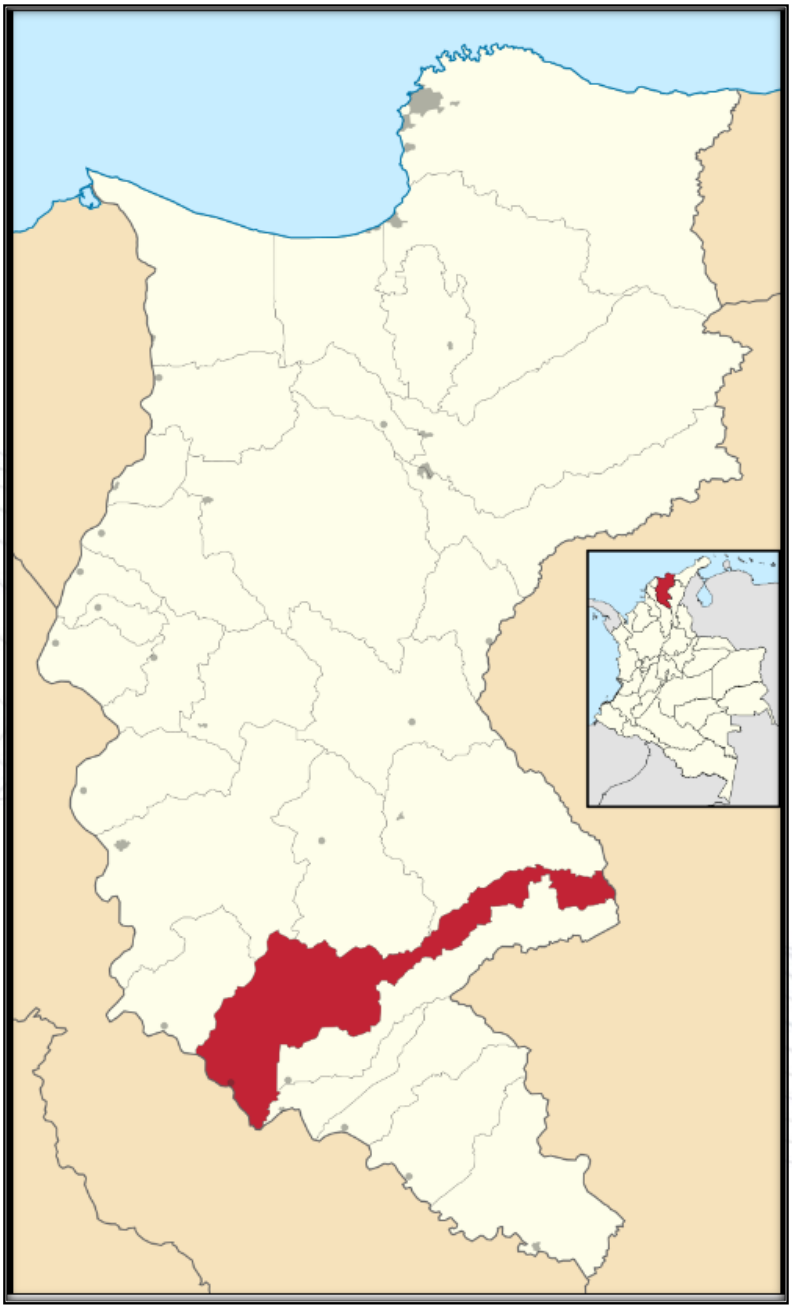


Ilustración 1 Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena

caminoscomunitarios.invias.gov.co

La localización del Municipio de Pijiño del Carmen en el departamento del **Magdalena** se encuentra en las siguientes coordenadas, Latitud: 9°19′53″N, Longitud: 74°27′30″W.

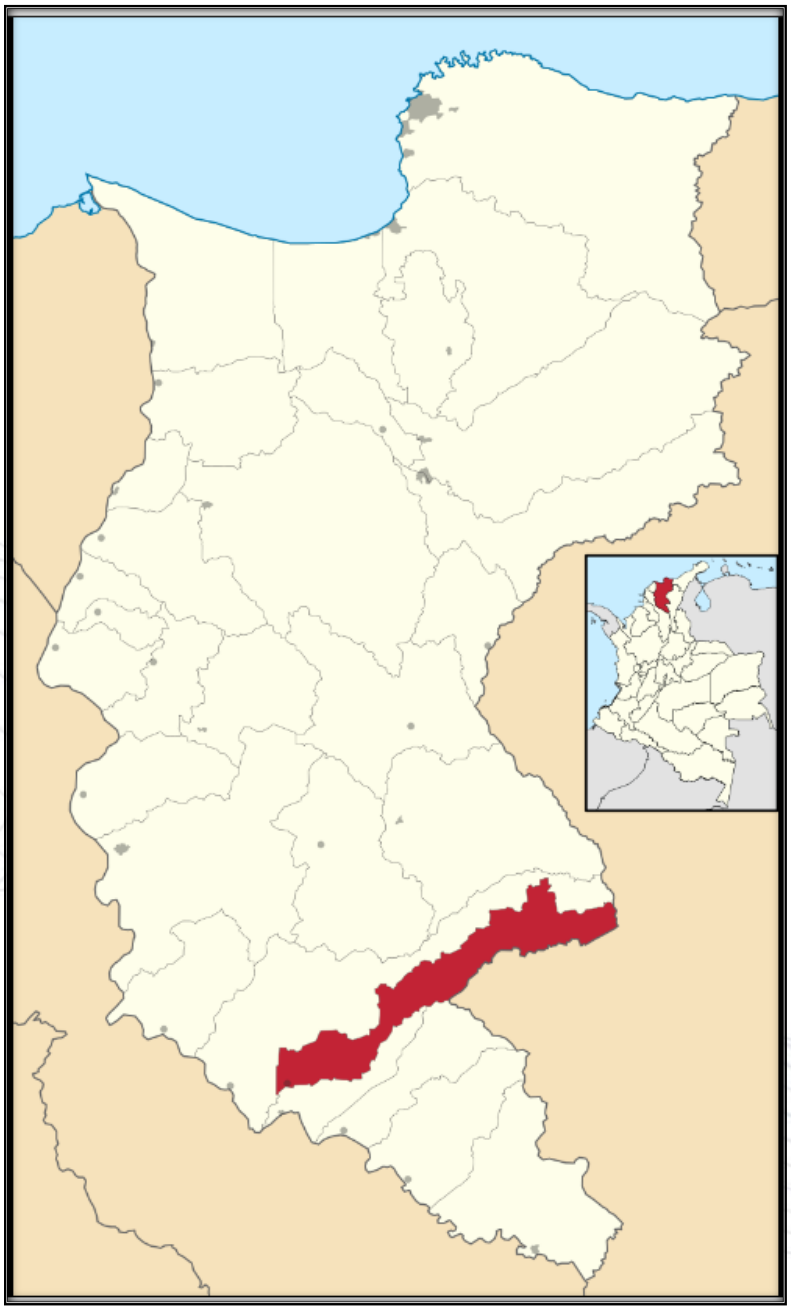


Ilustración 2 Municipio de Pijiño del Carmen, Departamento del Magdalena.

1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Las zonas de influencia están delimitadas por la jurisdicción del organismo de acción comunal, para el caso que compete están distribuidas de la siguiente manera:

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Ana del departamento del Magdalena, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas 9°19'23.1"N 74°34'35.4"W y punto de referencia final la intersección con la vía principal Santa Ana – Santa Bárbara de Pinto en las coordenadas 9°19'28.8"N 74°34'57.5"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Ana del departamento del Magdalena, en el corregimiento de San Fernando, ubicado a 11 KM de la cabecera municipal, teniendo como punto de referencia inicial la salida del corregimiento hacia la cabecera municipal con coordenadas 9°16'23.5"N 74°32'03.5"W y punto de referencia final las coordenadas 9°15'41.1"N 74°31'40.3"W de la vía que conduce hacia el municipio de San Zenón, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Pijiño del Carmen del departamento del Magdalena, en el corregimiento de Nueva Holanda, con una distancia aproximada de 40 kilómetros de la cabecera, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas 9°30'24.1"N 74°11'39.6"W y punto de referencia final las coordenadas 9°30'48.5"N 74°11'24.3"W, de la vía principal que conduce del Municipio de Pijiño del Carmen al corregimiento de Nueva Holanda, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pijiño del Carmen del departamento del Magdalena, en la vereda el Purgatorio, ubicado a 18 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal del municipio de Pijiño del Carmen, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas 9°22'11.29"N 74°24'23.96"W y punto de referencia final las coordenadas 9°22'2.62"N 74°20'16.52"W de la vía que conduce a la vereda El Purgatorio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

Los beneficios que se podrán obtener al ejecutar el proyecto de **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, son los siguientes:

- Descongestionar en las vías por pasos restringidos, junto con la disminución de los tiempos de viaje que implica contribuir al derecho a la libre circulación.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

- Aumento de la comercialización de productos y ayudando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos.

- Se realizan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud.

- Aumento de la asistencia de estudiantes a escuelas y colegios contribuyendo al derecho a la educación.

- Disminución de precios de los productos de la región debido a la disminución en los costos de transporte de carga y pasajeros.

1.3. Inventario y estado inicial de la vía

Como inventario y estado inicial de la vía, se tiene el documento: levantamiento técnico realizado entre la territorial de INVIAS, Magdalena con el profesional de caminos comunitarios para para la paz total, y los representantes de las OAC, sin embargo, se adjunta registro fotográfico del estado actual de las vías a intervenir a corte del presente periodo:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALEN.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración

Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG

Visita ID: 657

- **Fecha:** 15/6/2023
- **Organización / Entidad:** Organización de Acción Comunal (OAC)
- **Subtipo de organización:** Juntas de Acción Comunal
- **Dirección territorial:** Magdalena
- **Departamento:** Magdalena
- **Municipio:** Santa Ana
- **Vereda:** No diligenciado
- **Código de la vía:** 78MG01
- **Nombre de la vía:** Santa Ana-Santa Bárbara De Pinto
- **Abscisa Inicial (Km + M):** 0 + 0
- **Abscisa Final (Km + M):** 1
- **Observaciones generales:** Presidenta indica que se necesita realce de la vía y nivelarlo con la vía hacia Pinto
- **Usuario Survey123:** territorial.magdalena

Recolector

Nombre: Jorge Garizao
Cargo: Contratista

Dignatario o delegado

Nombre: Rosa Elena Sierra Fonseca
Cédula: 22446986
Celular: 3234719269

caminoscomunitarios.invias.gov.co

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 1
- **Ancho Carriles (m):** 3.5
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



Inventario – Sitios críticos

- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** Se requiere nivelar la via y colocar cuneta para evacuar las aguas.



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado

caminoscomunitarios.invias.gov.co



Mantenimiento – Rocería

- **Margen de la vía:** Margen derecho on sentido definido de la vía
- **Longitud roceria derecha (m):** 1000
- **Ancho roceria derecha (m):** 5
- **Longitud roceria izquierda (m):** No diligenciado
- **Ancho roceria izquierda (m):** No diligenciado



Mantenimiento – Bacheo

- **Longitud bacheo (m):** 1000
- **Ancho bacheo (m):** 5
- **Espesor bacheo (m):** 0.5





- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado

caminoscomunitarios.invias.gov.co

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA


Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración

Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG

Visita ID: 658

- **Fecha:** 15/6/2023
- **Organización / Entidad:** Organización de Acción Comunal (OAC)
- **Subtipo de organización:** Juntas de Acción Comunal
- **Dirección territorial:** Magdalena
- **Departamento:** Magdalena
- **Municipio:** Santa Ana
- **Vereda:** San Fernando- San Zenon
- **Código de la vía:** 78MG01
- **Nombre de la vía:** San Fernando-San Zenon
- **Abscisa Inicial (Km + M):** 1 + 100
- **Abscisa Final (Km + M):** 501
- **Observaciones generales:** Se sugiere box de 2*2
- **Usuario Survey123:** territorial.magdalena

Recolector



Nombre: Jorge Garizao
Cargo: Contratista

Dignatario o delegado



Nombre: Mirith Puerta
Cédula: 4544948
Celular: 3106227931

caminoscomunitarios.invias.gov.co

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 1
- **Ancho Carriles (m):** 3.5
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



Inventario – Obras de drenaje

- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 5
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.9
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 5
- **Número de secciones:** 2
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.6
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado

caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 5
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 4
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** No





Inventario – Puentes

- **Longitud:** 5
- **Nombre:** Puente Carvajal
- **Ancho Tablero:** 4
- **Número de Luces:** 1
- **Estado Superficie:** No diligenciado
- **Estado Estructura:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



Mejora – Placa huella

- **Longitud placa huella (m):** 500
- **Ancho placa huella (m):** 5



caminoscomunitarios.invias.gov.co

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración

Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG

Visita ID: 852

- **Fecha:** 16/6/2023
- **Organización / Entidad:** Organización de Acción Comunal (OAC)
- **Subtipo de organización:** Juntas de Acción Comunal
- **Dirección territorial:** Magdalena
- **Departamento:** Magdalena
- **Municipio:** Pijiño Del Carmen
- **Vereda:** Nueva Holanda
- **Código de la vía:** 78MG02-0
- **Nombre de la vía:** Nueva Holanda-Casa Blanca Vía Casa Blanca
- **Abscisa Inicial (Km + M):** 0 + 0
- **Abscisa Final (Km + M):** 701
- **Observaciones generales:**
- **Usuario Survey123:** territorial.magdalena

Recolector



Nombre: Jorge Garizao
Cargo: Contratista

Dignatario o delegado



Nombre: Elvira Salas
Cédula: 1004320377
Celular: 3102615528

caminoscomunitarios.invias.gov.co

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 2
- **Ancho Carriles (m):** 2.5
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPORTE DE VISITA
Instituto Nacional de Vías - INVIAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG

Inventario – Obras de drenaje

- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 6
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 1
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPORTE DE VISITA
Instituto Nacional de Vías - INVIAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** Reconstrucción
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 6
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.3
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPORTE DE VISITA
Instituto Nacional de Vías - INVIAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG





caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

Mantenimiento – Rocería

- **Margen de la vía:** Margen derecho en sentido definido de la vía
- **Longitud roceria derecha (m):** 2000
- **Ancho roceria derecha (m):** 5
- **Longitud roceria izquierda (m):** No diligenciado
- **Ancho roceria izquierda (m):** No diligenciado



Mejora – Placa huella

- **Longitud placa huella (m):** 2000
- **Ancho placa huella (m):** 5



Mejora – Obras de drenaje

- **Obras:** Alcantarilla
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** 6
- **Diametro Alcantarilla (m):** 0.9
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



caminoscomunitarios.invias.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nº 4472 DE 2023

ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración

Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG

Visita ID: 851

- **Fecha:** 15/6/2023
- **Organización / Entidad:** Organización de Acción Comunal (OAC)
- **Subtipo de organización:** Asociación de Juntas de Acción Comunal
- **Dirección territorial:** Magdalena
- **Departamento:** Magdalena
- **Municipio:** Pijiño Del Carmen
- **Vereda:** No diligenciado
- **Código de la vía:** 78MG02-2
- **Nombre de la vía:** El Delirio-El Purgatorio
- **Abscisa Inicial (Km + M):** 7 + 100
- **Abscisa Final (Km + M):** 914
- **Observaciones generales:**
- **Usuario Survey123:** territorial.magdalena

Recolector



Nombre: Jorge Garizao
Cargo: Contratista

Dignatario o delegado



Nombre: Alvaro Gutierrez Noguera
Cédula: 9274818
Celular: 3015806050

caminoscomunitarios.invias.gov.co

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 1
- **Ancho Carriles (m):** 3.9
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado

Inventario – Sitios críticos

- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



Inventario – Obras de drenaje

- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 10
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.9
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** No



caminoscomunitarios.invias.gov.co



- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 6
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 1
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** No





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado

- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 4
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 1
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** No diligenciado



caminoscomunitarios.invias.gov.co

2.1. Características técnicas del proyecto

En el desarrollo de convenio se pretende atender las vías rurales, se adelantarán obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento, siendo en definitiva las que arroje la revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños para cada caso particular, sin embargo, dentro del marco de las especificaciones de los proyectos a manera general prevalecieron las siguientes actividades:

- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
- Construcción de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert (entre otros).
- Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella.
- Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la Cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO.

Las Juntas de Acción Comunal u OAC, radicaron a Interventoría la revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños, y los mismos fueron debidamente aprobados según Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños (MEPI-MN1-IN-1FR-5), con esto se determinó los parámetros de diseños, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento y tipifico los sectores a intervenir, así como las metas físicas de las obras derivada del convenio, sin embargo vale aclarar que de acuerdo a las características atípicas del presente convenio debieron ajustarse algunas metas durante la ejecución.

3. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3574

3.1. Información general del convenio C-3574.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-340-2023**
CONVENIO N.º:	**3574 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**SEPTIEMBRE 27 DE 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**
NIT:	**901.637.945-9**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 198.379.461,00)**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
PRORROGA 01:	**17 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)**
PRORROGA 02:	**30 DE ABRIL DE 2024 (HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024)**
PRORROGA 03:	**27 DE JUNIO DE 2024 (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024)**
PRORROGA 04:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2024)**
SUSPENSION N° 01:	**DICIEMBRE 28 DE 2023**
REINICIO N° 01:	**ENERO 16 DE 2024**
SUSPENSION N° 02:	**JULIO 10 DE 2024**
REINICIO N° 02:	**SEPTIEMBRE 03 DE 2024**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 27 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA EL OCTUBRE 30 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CARERRA 2A N°1A - 125 BARRIO ABAJO, SANTA ANA**
Nº TELEFONO:	**323 4719269**

Tabla 1 Información general del convenio solidario N.º 3574 de 2023.

3.2. Metas y alcance físico del proyecto C-3574 de 2023.

Para el convenio solidario N° 3574 de 2023 se estableció referencialmente un presupuesto que fue estructurado para el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde se plantea la intervención de un corredor vial que cuenta con una longitud de 1,0 km a través de la ejecución de un tramo de placa huella y una alcantarilla.

A continuación, se muestra el presupuesto de referencia de acuerdo con las estructuras planteadas, la metafísica establecida, el cálculo de cantidades y valores unitarios realizado en el proceso de licitación por la entidad de contratante:

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
MAGDALENA	SANTA BARBARA DE PINTO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO	1,00	MAGDALENA	24/08/2023

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,60	$ 89.835,00	$ 413.241,00
2	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	117,8	$ 105.392,20	$ 12.415.201,00
3	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	82,5	$ 836.483,40	$ 69.009.881,00
4	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	36,4	$ 350.955,60	$ 12.774.784,00
5	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.816	$ 7.013,00	$ 26.761.608,00
							SUB-TOTAL	$ 121.374.715,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
6	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,5	$ 25.757,00	$ 1.197.701,00
7	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8,2	$ 66.207,00	$ 542.897,00
8	201.7	201-13		Demolición de Estructures	M3	25	$ 232.220,00	$ 5.805.388,00
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,5	$ 536.974,00	$ 268.487,00
10	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,8	$ 689.701,00	$ 6.821.130,00
11	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579	$ 8.846,00	$ 5.121.834,00
12	610.1	610-13		Relleno para Estructures con Suelo	M3	25,4	$ 55.910,00	$ 1.420.114,00
13	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,0	$ 627.048,00	$ 3.762.288,00
							SUB-TOTAL	$ 24.892.839,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 146.267.554,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.386.227,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.786.680,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 197.379.461,00

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JAVIER DAMIAN GARCIA GONZALES
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-MAGDALENA
Matricula Profesional: 08202-151180 ATL

Revisó: Firma Lider Zona Programa
Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Cargo: Líder Estructuración zona Norte
Matricula Profesional: 15202-195276 BYC

Tabla 2 Presupuesto Estimado Referencia del Convenio Solidario 3574 de 2023.

3.3. Estado de avance C-3574 de 2023.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**30/10/2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**234 DÍAS**	**100,00%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 193.993.234,00**	**97,79%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 4.386.227,00**	**2,21%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**FINALIZADO**	

Tabla 3 Reporte detallado del avance del Convenio Solidario 3574 de 2023.

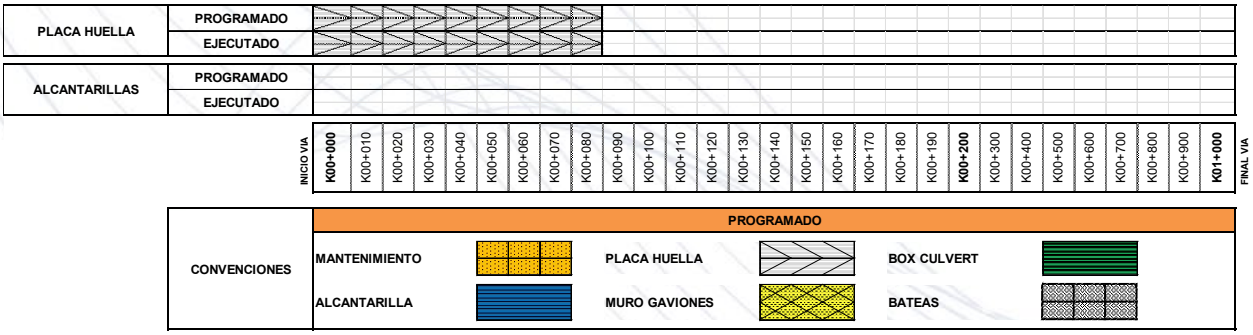


Tabla 4 Esquema de avance físico ejecutado del Convenio Solidario 3574 de 2023.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

3.4. Control Financiero C-3574 de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	$ 147.177.405	$ 147.177.405	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.386.227	$ -	$ 4.386.227
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.815.829	$ 45.815.829	$ -
APORTE COMUNIDAD	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
TOTAL	**$ 198.379.461**	**$ 193.993.234**	**$ 4.386.227**

Tabla 5 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3574 de 2023.

3.5. Control Legal C-3574 de 2023.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.675.892,2	30	4	2024	30	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.918.973,05	30	4	2024	30	10	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.513.838,3	30	6	2024	30	10	2029

Tabla 6 Relación de pólizas de Cumplimiento Convenio Solidario 3574 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 06 corresponden a la póliza de cumplimiento No. NB-100286812 Anexo 4 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	131%	$ 260.000.000,0	27	9	2023	30	10	2024

Tabla 7 Relación de pólizas de RCE Convenio Solidario 3574 de 2023.


Los datos relacionados en la Tabla 07 corresponden a la póliza de RCE No. NB-100070085 Anexo 4 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.


3.6. Acciones y seguimiento por parte de Interventoría C-3574 de 2023.

Las actividades de interventoría durante el desarrollo de sus labores siguieron los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, brindando instrucciones, asesoría y recomendaciones para la adecuada ejecución de las obras.
- Acompañar y asegurar el logro de los objetivos contractuales mediante informes semanales, informes mensuales, visitas, comités operativos, comités de obras, reuniones, actas y aclaraciones.
- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios.
- Dar instrucciones, asesoría y recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.
- Acompañar la ejecución y el logro de los objetivos contractuales y para ello se apoya en informes, visitas, actas, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

3.7. Informe fotográfico del proyecto (antes y después) C-3574 de 2023.

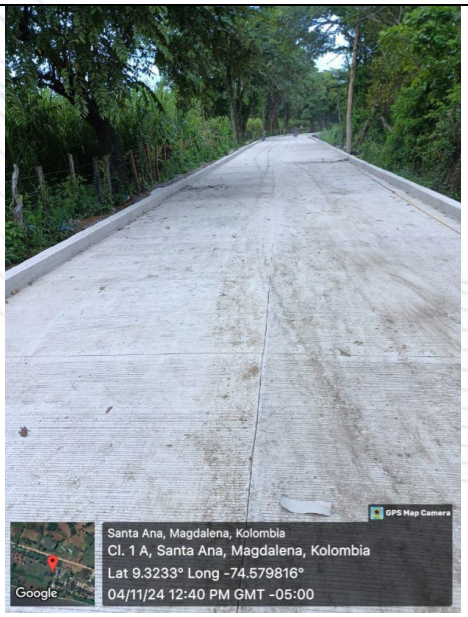ANTES	DESPUES
	
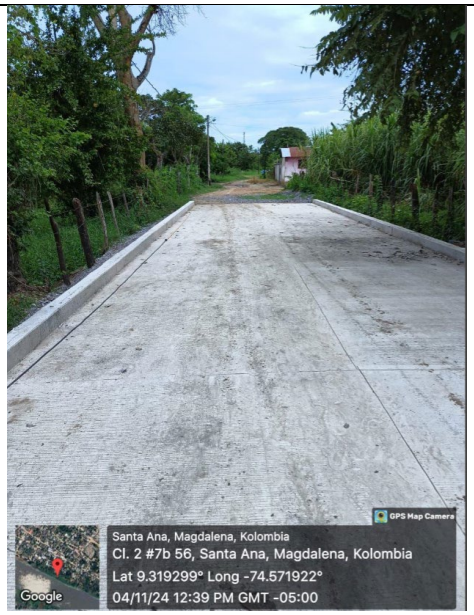
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

3.8. Anexos C-3574 de 2023.

Se adjunta ENLACE de Google Drive donde se anexan carpetas con formatos adicionales de informe final para el convenio solidario N° 3574 de 2023.

4. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO Nº 3586

4.1. Información general del convenio C-3586.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-349-2023**
CONVENIO N.º:	**3586 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**SEPTIEMBRE 29 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO (SANTA ANA – MAGDALENA)**
NIT:	**901.723.278-1**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($198.221.974) MONEDA CORRIENTE.**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 01 DE 2023**
PRORROGA 1:	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)**
PRORROGA 2:	**30 DE ABRIL DE 2024 (HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024)**
PRORROGA 3:	**28 DE JUNIO DE 2024 (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024)**
PRORROGA 4:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2024)**
SUSPENSION N° 01:	**10 DE JULIO DE 2024**
SUSPENSION N° 01:	**SEPTIEMBRE 03 DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2024**
DIRECCIÓN:	**BARRIO CENTRO SAN FERNANDO MAGDALENA**
Nº TELEFONO:	**310 6227931**

Tabla 8 Información general del convenio solidario N.º 3586 de 2023.

4.2. Metas y alcance físico del proyecto C-3586 de 2023.

Para el convenio solidario N° 3586 de 2023 se estableció referencialmente un presupuesto que fue estructurado para el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde se plantea la intervención de un corredor vial que cuenta con una longitud de 0,50 kms a través de la ejecución de un tramo de placa huella, un box culvert y una alcantarilla.

A continuación, se muestra el presupuesto de referencia de acuerdo con las estructuras planteadas, la metafísica establecida, el cálculo de cantidades y valores unitarios realizado en el proceso de licitación por la entidad de contratante:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
MAGDALENA	SANTA ANA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO	0,50	MAGDALENA	24/09/2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	600.1P	600-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00	$ 113.672,70	$ 1.364.084,00
							SUB-TOTAL	$ 1.364.084,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,40	$ 227.536,00	$ 91.014,00
							SUB-TOTAL	$ 91.014,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,80	$ 89.835,00	$ 341.373,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	98,7	$ 125.392,20	$ 10.191.426,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	67,6	$ 836.463,40	$ 56.546.270,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	29,7	$ 350.955,80	$ 10.423.391,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.430	$ 7.913,00	$ 21.950.590,00
							SUB-TOTAL	$ 99.453.146,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,5	$ 25.757,00	$ 1.197.701,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	6,2	$ 89.207,00	$ 542.937,00
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	25	$ 232.200,00	$ 5.868.300,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,5	$ 536.974,00	$ 268.487,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,6	$ 836.704,00	$ 8.021.130,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579	$ 8.946,00	$ 5.121.834,00
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,4	$ 55.910,00	$ 1.420.114,00
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,0	$ 627.046,00	$ 3.762.276,00
							SUB-TOTAL	$ 24.802.809,00
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT								
16	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	12,00	$ 89.835,00	$ 1.078.020,00
17	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	12,00	$ 124.421,50	$ 1.493.058,00
18	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1,20	$ 108.900,70	$ 130.681,00
19	630.4	630-13		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	10,50	$ 836.463,40	$ 8.783.076,00
20	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,76	$ 466.126,70	$ 356.321,00
21	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1203,48	$ 7.913,00	$ 9.440.005,00
							SUB-TOTAL	$ 25.314.161,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 149.660.346,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.391.657,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.795.971,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 197.221.974,00

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JAVIER DAMIAN GARCIA GONZALES
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-MAGDALENA
Matrícula Profesional: 08202-151180 ATL

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Cargo: Líder Estructuración zona Norte
Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC

Tabla 9 Presupuesto Estimado Referencia del Convenio Solidario 3586 de 2023.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

4.3. Estado de avance C-3586 de 2023.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**30/10/2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**277 DÍAS**	**100,00%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 193.840.317,00**	**97,79%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 4.381.657,00**	**2,21%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**FINALIZADO**	

Tabla 10 Reporte detallado del avance del Convenio Solidario 3586 de 2023.

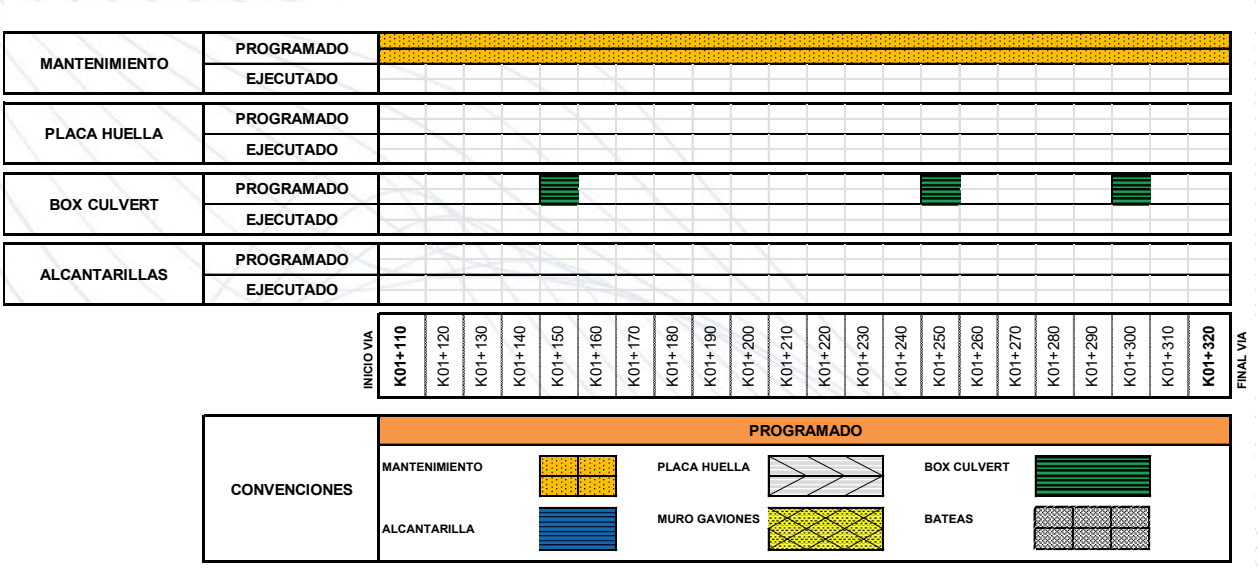


Tabla 11 Esquema de avance físico ejecutado del Convenio Solidario 3586 de 2023.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

4.4. Control Financiero C-3586 de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	$ 136.132.393	$ 136.132.393	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.381.657	$ -	$ 4.381.657
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 56.707.924	$ 56.707.924	$ -
APORTE COMUNIDAD	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
TOTAL	**$ 198.221.974**	**$ 193.840.317**	**$ 4.381.657**

Tabla 12 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3586 de 2023.

4.5. Control Legal C-3586 de 2023.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.644.394,8	27	9	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.911.098,7	27	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.466.592,2	30	4	2024	30	4	2029

Tabla 13 Relación de pólizas de Cumplimiento Convenio Solidario 3586 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 13 corresponden a la póliza de cumplimiento No. NB-100286917 Anexo 1 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	131%	$ 260.000.000,0	27	9	2023	30	4	2024

Tabla 14 Relación de pólizas de RCE Convenio Solidario 3586 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 14 corresponden a la póliza de RCE No. NQ-100070116 Anexo 1 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

4.6. Acciones y seguimiento por parte de Interventoría C-3586 de 2023.

Las actividades de interventoría durante el desarrollo de sus labores siguieron los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, brindando instrucciones, asesoría y recomendaciones para la adecuada ejecución de las obras.
- Acompañar y asegurar el logro de los objetivos contractuales mediante informes semanales, informes mensuales, visitas, comités operativos, comités de obras, reuniones, actas y aclaraciones.
- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios.
- Dar instrucciones, asesoría y recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.
- Acompañar la ejecución y el logro de los objetivos contractuales y para ello se apoya en informes, visitas, actas, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

4.7. Informe fotográfico del proyecto (antes y después) C-3586 de 2023.

ANTES	DESPUES
	

4.8. Anexos C-3586 de 2023.

Se adjunto ENLACE de Google Drive donde se anexan carpetas con formatos adicionales de informe final para el convenio solidario N° 3586 de 2023:

5. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3846

5.1. Información general del convenio C-3846.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-526-2023**
CONVENIO N.º:	**3846 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**OCTUBRE 12 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA**
NIT:	**901.707.685-9**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($197.425.082,00).**
PRORROGA 1:	**26 DE DICIEMBRE DE 2023 (HASTA ABRIL 30 DE 2024)**
PRORROGA 2:	**30 DE ABRILD E 2024 (HASTA JUNIO 30 DE 2024)**
SUSPENSION:	**N/A**
REINICIO:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 01 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA JUNIO 30 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CORREGIMIENTO DE NUEVA HOLANDA FINCA EL DESCANSO**
Nº TELEFONO:	**310 2615528**

Tabla 15 Información general del convenio solidario N.º 3846 de 2023.

5.2. Metas y alcance físico del proyecto C-3846 de 2023.

Para el convenio solidario N° 3846 de 2023 se estableció referencialmente un presupuesto que fue estructurado para el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde se plantea la intervención de un corredor vial que cuenta con una longitud de 2,50 kms a través de la ejecución de un tramo de placa huella y una alcantarilla.

A continuación, se muestra el presupuesto de referencia de acuerdo con las estructuras planteadas, la metafísica establecida, el cálculo de cantidades y valores unitarios realizado en el proceso de licitación por la entidad de contratante:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE LA LUCHA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
MAGDALENA	PIJIÑO DE CARMEN	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA HOLANDA, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN	2,50	MAGDALENA	24/09/2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza e retiro de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00	$ 113.673,70	$ 1.364.084,00
							SUB-TOTAL	$ 1.364.084,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 227.535,80	$ 227.536,00
							SUB-TOTAL	$ 227.536,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,50	$ 89.835,00	$ 404.258,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	116,1	$ 105.392,20	$ 12.236.034,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	80,7	$ 836.483,40	$ 67.504.210,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35,5	$ 350.955,60	$ 12.458.924,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.744	$ 7.013,00	$ 26.256.672,00
							SUB-TOTAL	$ 118.860.096,00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,5	$ 25.757,00	$ 1.197.701,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8,2	$ 66.207,00	$ 542.897,00
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	25	$ 232.220,00	$ 5.805.388,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,5	$ 536.974,00	$ 268.487,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,6	$ 689.701,00	$ 6.621.130,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579	$ 8.846,00	$ 5.121.834,00
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,4	$ 55.910,00	$ 1.420.114,00
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,0	$ 627.048,00	$ 3.762.288,00
							SUB-TOTAL	$ 24.852.839,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 145.284.557,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.356.537,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.781.988,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 196.425.082,00

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JAVIER DAMIAN GARCIA GONZALES
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-MAGDALENA
Matrícula Profesional: 08202-151180 ATL

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Cargo: Líder Estructuración zona Norte
Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC

Tabla 16 Presupuesto Estimado Referencia del Convenio Solidario 3846 de 2023.

5.3. Estado de avance C-3846 de 2023.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**30/10/2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**210 DÍAS**	**100,00%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 193.066.545,00**	**97,79%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 4.358.537,00**	**2,21%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**FINALIZADO**	

Tabla 17 Reporte detallado del avance del Convenio Solidario 3846 de 2023.

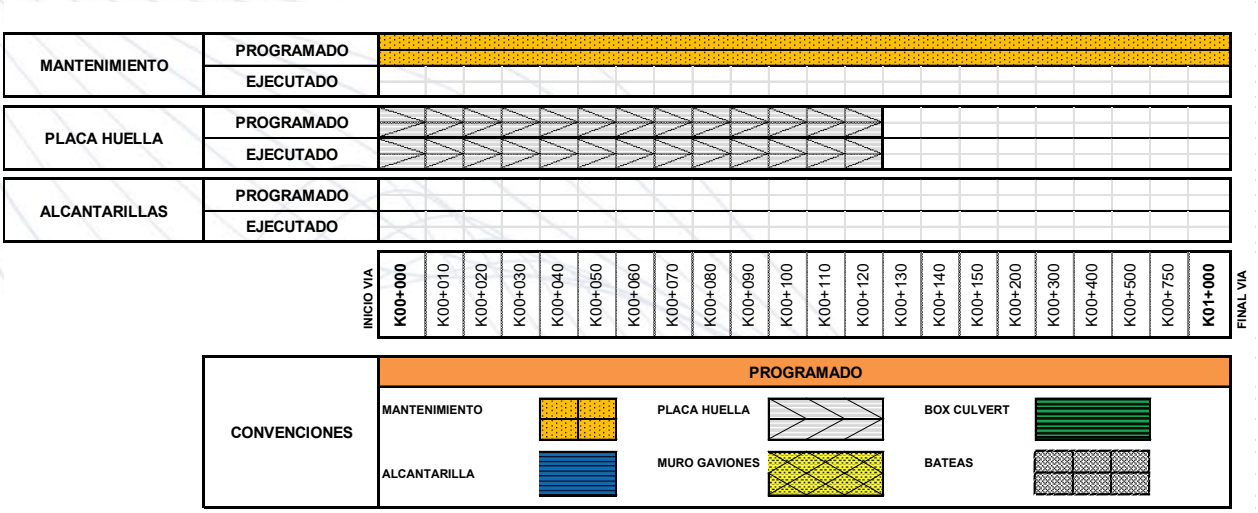


Tabla 18 Esquema de avance físico ejecutado del Convenio Solidario 3846 de 2023.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

5.4. Control Financiero C-3846 de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	$ 153.212.274	$ 153.212.274	$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.358.537	$ -	$ 4.358.537
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 38.854.271	$ 38.854.271	$ -
APORTE COMUNIDAD	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
TOTAL	**$ 197.425.082**	**$ 193.066.545**	**$ 4.358.537**

Tabla 19 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3846 de 2023.

5.5. Control Legal C-3846 de 2023.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.485.016,4	30	4	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.871.254,1	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.227.524,6	30	4	2024	30	6	2029

Tabla 20 Relación de pólizas de Cumplimiento Convenio Solidario 3846 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 20 corresponden a la póliza de cumplimiento No. NB-100288717 Anexo 3 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	131%	$ 260.000.000,0	12	10	2023	30	6	2024

Tabla 21 Relación de pólizas de RCE Convenio Solidario 3846 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 21 corresponden a la póliza de RCE No. NB-100070874 Anexo 3 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

5.6. Acciones y seguimiento por parte de Interventoría C-3846 de 2023.

Las actividades de interventoría durante el desarrollo de sus labores siguieron los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, brindando instrucciones, asesoría y recomendaciones para la adecuada ejecución de las obras.
- Acompañar y asegurar el logro de los objetivos contractuales mediante informes semanales, informes mensuales, visitas, comités operativos, comités de obras, reuniones, actas y aclaraciones.
- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios.
- Dar instrucciones, asesoría y recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.
- Acompañar la ejecución y el logro de los objetivos contractuales y para ello se apoya en informes, visitas, actas, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

5.7. Informe fotográfico del proyecto (antes y después) C-3846 de 2023.

ANTES	DESPUES
	









5.8. Anexos C-3846 de 2023.

Se adjunto ENLACE de Google Drive donde se anexan carpetas con formatos adicionales de informe final para el convenio solidario N° 3846 de 2023:

6. INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 4799

6.1. Información general del convenio C-4799.

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**SPSC-CD-CS-1113-2023**
CONVENIO N.º:	**4799 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**DICEIMBRE 01 DE 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
EJECUTOR:	**ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES**
NIT:	**901.753.601-6**
VALOR DEL CONVENIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($198.142.928,00).**
PLAZO INICIAL:	**HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**DICIEMBRE 22 DE 2023**
PRORROGA 1:	**17 DE ENERO DE 2024 (HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)**
PRORROGA 2:	**30 DE ABRIL DE 2024 (HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024)**
PRORROGA 3:	**27 DE JUNIO DE 2024 (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024)**
PRORROGA 4:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2024)**
SUSPENSION N° 01:	**DICIEMBRE 28 DE 2023**
REINICIO N° 01:	**ENERO 16 DE 2024**
SUSPENSION N° 02:	**JULIO 10 DE 2024**
REINICIO N° 02:	**SEPTIEMBRE 03 DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA OCTUBRE 30 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CARERRA 12 N° 9-65 BARRIO LOS ALMENDROS – PIJIÑO DEL CARMEN**
Nº TELEFONO:	**301 5806050**

Tabla 22 Información general del convenio solidario N.º 4799 de 2023.

6.2. Metas y alcance físico del proyecto C-4799 de 2023.

Para el convenio solidario N° 4799 de 2023 se estableció referencialmente un presupuesto que fue estructurado para el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde se plantea la intervención de un corredor vial que cuenta con una longitud de 8,00 kms a través de la ejecución de un tramo de placa huella.

A continuación, se muestra el presupuesto de referencia de acuerdo con las estructuras planteadas, la metafísica establecida, el cálculo de cantidades y valores unitarios realizado en el proceso de licitación por la entidad de contratante:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	ASOCOMUNAL PIJIÑO, DEL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	8,00	MAGDALENA	24/08/2023

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,50	$ 89.835,00	$ 494.093,00
2	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	141,4	$ 105.392,20	$ 14.902.457,00
3	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	99,3	$ 836.483,40	$ 83.062.802,00
4	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	43,8	$ 350.955,60	$ 15.371.855,00
5	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.584	$ 7.013,00	$ 32.147.592,00
							SUB-TOTAL	$ 145.978.799,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 145.978.799,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.379.364,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.784.765,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 197.142.928,00

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: Carlos Alberto Eljadue Carreño
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-MAGDALENA
Matrícula Profesional: 08202- 124606 ATL

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Cargo: Líder Estructuración zona Norte
Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC

Tabla 23 Presupuesto Estimado Referencia del Convenio Solidario 4799 de 2023.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

6.3. Estado de avance C-4799 de 2023.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance:

REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO		
I. DETALLES DEL PROYECTO		
FECHA DE CORTE	**30 de octubre de 2024**	
II. PROGRESO DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN		**%**
TIEMPO TRANSCURRIDO:	**256**	**100,00%**
PRESUPUESTO GASTADO	**$ 193.269.564**	**97,54%**
PRESUPUESTO REMANENTE	**$ 4.873.364**	**2,46%**
III. ESTADO DEL CONVENIO		
CONVENIO SOLIDADIO	**EJECUTADO 100%**	

Tabla 24 Reporte detallado del avance del Convenio Solidario 4799 de 2023.

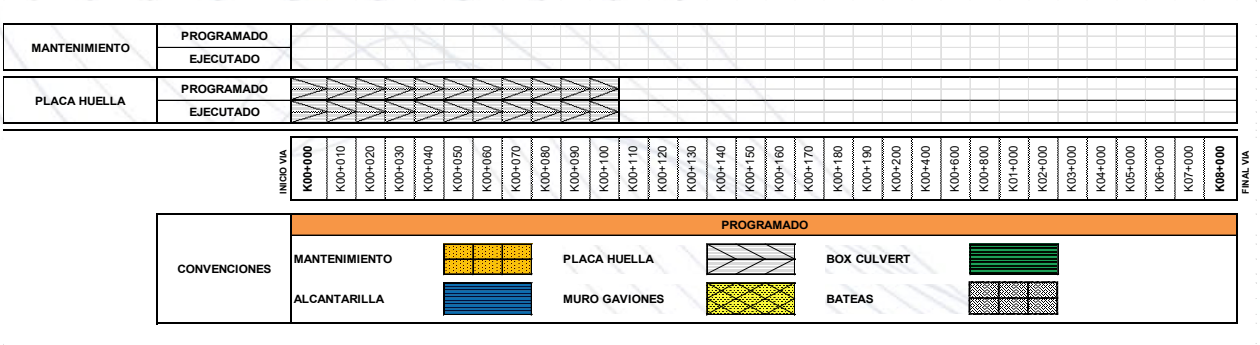


Tabla 25 Esquema de avance físico ejecutado del Convenio Solidario 4799 de 2023.

caminoscomunitarios.invias.gov.co

6.4. Control Financiero C-4799 de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONVENIO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
BÀSICO DE OBRA	$ 146.346.316	$ 146.346.316	$ 0
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.379.364	$ 0	$ 4.379.364
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.923.248	$ 45.923.248	$ 0
APORTE COMUNIDAD	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0
VALOR NO EJECUTADO	$ 494.000	$ 0	$ 494.000
TOTAL	**$ 198.142.928**	**$ 193.269.564**	**$ 4.873.364**

Tabla 26 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 4799 de 2023.

6.5. Control Legal C-4799 de 2023.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.485.016,4	1	12	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.871.254,1	1	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.227.524,6	30	4	2024	30	4	2029

Tabla 27 Relación de pólizas de Cumplimiento Convenio Solidario 4799 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 27 corresponden a la póliza de cumplimiento No. NB-100298783 Anexo 1 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	131%	$ 260.000.000,0	1	12	2023	30	4	2024

Tabla 28 Relación de pólizas de RCE Convenio Solidario 4799 de 2023.

Los datos relacionados en la Tabla 28 corresponden a la póliza de RCE No. NB-100073962 Anexo 1 expedidas por SEGUROS MUNDIAL.

6.6. Acciones y seguimiento por parte de Interventoría C-4799 de 2023.


Las actividades de interventoría durante el desarrollo de sus labores siguieron los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, brindando instrucciones, asesoría y recomendaciones para la adecuada ejecución de las obras.
- Acompañar y asegurar el logro de los objetivos contractuales mediante informes semanales, informes mensuales, visitas, comités operativos, comités de obras, reuniones, actas y aclaraciones.
- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios.
- Dar instrucciones, asesoría y recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.
- Acompañar la ejecución y el logro de los objetivos contractuales y para ello se apoya en informes, visitas, actas, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

6.7. Informe fotográfico del proyecto (antes y después) C-4799 de 2023.

ANTES	DESPUES
	

caminoscomunitarios.invias.gov.co

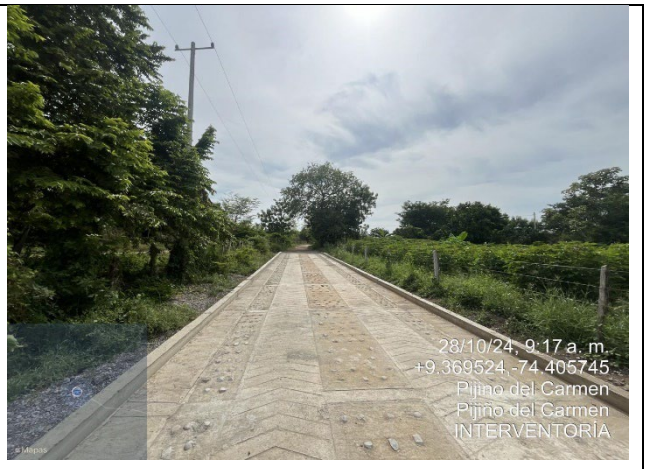6.8. Anexos C-4799 de 2023.

Se adjunto ENLACE de Google Drive donde se anexan carpetas con formatos adicionales de informe final para el convenio solidario N° 4799 de 2023.

7. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1. Información general del contrato

Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	**IP-DT-MAG-026-2023**
CONTRATO N.º:	**4472 DE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**NOVIEMBRE 17 DE 2023**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
CONTRATISTA:	**BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
NIT:	**22.657.308 – 3**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONDEA CORRIENTE ($71.493.538 MC)**
ADICIÓN N° 01	**VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE-IVA INCLUIDO ($22.874.047 MC)**
ADICIÓN N° 02	**VEINTE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($20.037.353 MC)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (114.404.938 MC)**
PRORROGA N° 01	**HASTA MARZO 15 DE 2024**
PRORROGA N° 02	**HASTA ABRIL 30 DE 2024**
PRORROGA N° 03	**HASTA MAYO 22 DE 2024**
PRORROGA N° 04	**HASTA JUNIO 04 DE 2024**
PRORROGA N° 05	**HASTA JUNIO 14 DE 2024**
PRORROGA N° 06	**HASTA JUNIO 30 DE 2024**
PRORROGA N° 07	**HASTA JULIO 10 DE 2024**
PRORROGA N° 08	**HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2024**
PRORROGA N° 09	**HASTA OCTUBRE 30 DE 2024**
SUSPENSION N° 01:	**JULIO 10 DE 2024**
REINICIO N° 01:	**SEPTIEMBRE 03 DE 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**HASTA 31 DE DICIEMBRE 203**
FECHA ORDEN DE INICACIÓN:	**NOVIEMBRE 30 DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**HASTA OCTUBRE 31 DE 2024**
DIRECCIÓN:	**CALLE 77 N° 65-37**
Nº TELEFONO:	**320 4609451**

Tabla 29 Información general del contrato 4472 de 2023.

7.2. Control Financiero

7.2.1. Estado presupuestal del contrato

Vigencia Fiscal	Registro No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1288523	NACION	PRINCIPAL	$ 71.493.538,00	$ -
2023	1288523	NACION	ADICIONAL	$ 22.874.047,00	$ -
2024	903424	NACION	ADICIONAL	$ 20.037.353,00	$ 20.037.353
TOTAL				**$ 114.404.938,00**	**$ 20.037.353**

Tabla 30 Estado presupuestal del contrato

7.2.2. Relación de actas de costos tramitadas

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE 2023	$ 0	$ 0	$ 0	No. 1288523 De fecha 23/11/2023	$ 71.493.538	$ 94.367.585		DICIEMBRE 2023
2	ENERO 2024	$ 10.792.000	$ 2.050.480	$ 12.842.480	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 58.651.058	$ 81.525.105		ENERO 2024
3	FEBRERO 2024	$ 9.216.000	$ 1.751.040	$ 10.967.040	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 47.684.018	$ 70.558.065		FEBRERO 2024
4	MARZO 2024	$ 23.556.802	$ 4.475.792	$ 28.032.594	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 19.651.424	$ 42.525.471		MARZO 2024
5	ABRIL 2024	$ 21.076.802	$ 4.004.592	$ 25.081.394	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 17.444.077	$ 17.444.077		ABRIL 2024
6	MAYO 2024	$ 9.446.000	$ 1.794.740	$ 11.240.740	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 6.203.337	$ 6.203.337		MAYO 2024
7	JUNIO 2024	$ 3.330.000	$ 632.700	$ 3.962.700	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 2.240.637	$ 2.240.637		JUNIO 2024
8	JULIO 2024	$ 1.872.000	$ 355.680	$ 2.227.680	No. 1287823 De fecha 23/11/2023	$ 12.957	$ 20.050.310		JULIO 2024
9	SEPTIEMBRE 2024	$ 8.456.200	$ 1.606.678	$ 10.062.878	No. 1903424 De fecha 16/09/2024	$ 9.987.432	$ 9.987.432		SEPTIEMBRE 2024
TOTALES		**$ 87.745.804**	**$ 16.671.702**	**$ 104.417.506**		**$ 9.987.432**	**$ 9.987.432**		

Tabla 31 Relación de actas de costos tramitadas

7.3. 7.3. Control Legal

7.3.1. Relación de pólizas

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.436.758,50	17	11	23	30	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 18.873.517,00	17	11	23	30	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 28.310.275,50	17	11	23	30	10	2025

Tabla 32 Relación de pólizas de Cumplimiento Contrato de Interventoría 4472 de 2023.

8. CONCLUSIONES

8.1. Convenio Solidario No. 3574 de 2023

El **Convenio Solidario No. 3574 de 2023** ha cumplido su objetivo al **ejecutar el 100%** de la meta física de **84 metros** de obra. Con corte al **30 de octubre de 2024**, el proyecto se encuentra oficialmente **finalizado**.

La ejecución se llevó a cabo dentro del plazo establecido, utilizando el **100% de los 234 días**.

En cuanto al presupuesto, se ha gastado el **97.79% ($193.993.234)**. El saldo remanente de **$4.386.227 (2.21%)** corresponde a recursos no ejecutados del **Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)** que fueron reintegrados a la Nación.

8.2. Convenio Solidario No. 3586 de 2023

El **Convenio Solidario No. 3586 de 2023** ha concluido con éxito la ejecución del **100%** de la meta planteada, que incluyó la **construcción de 3 box culvert**. Estas obras, realizadas tras los ajustes a los estudios y diseños, garantizan la accesibilidad al tramo vial. Con fecha de corte al **30 de octubre de 2024**, el convenio se encuentra **finalizado**.

El proyecto se completó dentro del tiempo previsto, habiendo transcurrido el **100% de los 277 días** estipulados.

En el aspecto financiero, se ha **gastado el 97.79%** del presupuesto, totalizando **$193.840.317**. El saldo remanente de **$4.381.657**, corresponde a recursos no ejecutados del **Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)** que fueron reintegrados a la Nación.

8.3. Convenio Solidario No. 3846 de 2023.

El **Convenio Solidario No. 3846 de 2023** se destaca como un caso sobresaliente de gestión. A corte del **30 de octubre de 2024**, este convenio se encuentra **finalizado**, habiendo ejecutado el **100%** de la meta física propuesta de **121.60 metros lineales de placa huella**. Este logro se alcanzó en el menor tiempo posible, demostrando la eficiencia de la Junta de Acción Comunal involucrada.

La obra se completó dentro del plazo previsto, con el **100%** de los 210 días transcurridos**.**

En el ámbito financiero, el **97.79%** del presupuesto **($193.066.545)** fue gastado**.** El saldo remanente de **$4.358.537 (2.21%)** corresponde a **recursos no ejecutados del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)** que fueron reintegrados a la Nación**.**

8.4. Convenio Solidario No. 4799 de 2023.

El **Convenio Solidario No. 4799 de 2023** ha concluido su ejecución física, alcanzando el **100% de la meta replanteada de 90 metros de placa huella**. El proyecto se dio por terminado con el 100% del tiempo transcurrido (256 días).

Sin embargo, a pesar de la finalización de las obras, este convenio enfrenta una situación crítica en su cierre financiero y administrativo. Si bien el 97.54% del presupuesto **($193.269.564)** fue gastado, persiste un saldo remanente de **$4.873.364 (2.46%)**. Más preocupante aún, y a pesar de las reiteradas solicitudes de la Interventoría, la Junta de Acción Comunal (JAC) responsable:

° No ha reintegrado los recursos correspondientes al **Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)** a la Nación.
° No ha reintegrado los rendimientos financieros generados por el convenio.
° Existe un **valor adicional de $494.000** de recursos no ejecutados que tampoco han sido devueltos.
° La JAC no ha manifestado ningún interés en realizar dichas actuaciones ni en liquidar el convenio, lo que genera un grave obstáculo para el cierre legal y transparente de los recursos públicos.

Recomendación: Urge Intervención de INVÍAS y Fortalecimiento de Capacidades para Futuros Convenios.

Dada la persistencia de estos incumplimientos y la clara falta de interés de la JAC en resolverlos, es urgente que INVÍAS intervenga directamente. Necesitamos que brinden el acompañamiento y las herramientas necesarias para asegurar que la Junta cumpla con sus obligaciones de reintegro de fondos y liquidación del convenio.

Para evitar situaciones similares en el futuro, es crucial implementar capacitaciones mucho más robustas para los presidentes de las JAC. Estas formaciones deben asegurar que comprendan y cumplan efectivamente con todas las fases de los convenios, especialmente el manejo financiero y los complejos procesos de liquidación.

BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Director de Interventoría
M.P.: 08202-141927 ATL
