

Id	EDT	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	**0**		**Contrato Aerocivil 24001291 H4 Lote 1**	**455 días**	**23/01/2025**	**21/10/2026**	**$ 8.637.492.312,00**
1	1		Preliminares	27 días	23/01/2025	28/02/2025	$ 0,00
2	*2*		*Inicio de Obra*	*0 días*	*28/02/2025*	*28/02/2025*	*$ 0,00*
3	**3**		**AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE, TOLIMA**	**428 días**	**28/02/2025**	**21/10/2026**	**$ 4.004.598.577,00**
4	**3.1**	**1.1**	**CONDICIONES CONTRACTUALES A PLAZO 31 DE JULIO 2026**	**370 días**	**28/02/2025**	**31/07/2026**	**$ 3.803.903.258,68**
5	*3.1.1*		*Inicio de Condiciones Contractuales Plazo a 31 de Julio de 2026*	*0 días*	*28/02/2025*	*28/02/2025*	*$ 0,00*
6	**3.1.2**	**1.1**	**LOCALIZACIÓN**	**175 días**	**3/03/2025**	**31/10/2025**	**$ 156.755.942,35**
7	**3.1.2.1**	**1.1**	**Ciclo 1**	**175 días**	**3/03/2025**	**31/10/2025**	**$ 156.755.942,35**
8	3.1.2.1.1	1.1	ZONA DE PISTA	21 días	3/03/2025	31/03/2025	$ 78.379.122,40
9	3.1.2.1.2	1.1	ZONA DE PISTA	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 15.361.315,24
10	3.1.2.1.3	1.1	ZONA DE PLATAFORMA	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 31.997.606,92
11	3.1.2.1.4	1.1	ZONA DE PLATAFORMA 2	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 11.344.744,04
12	3.1.2.1.5	1.1	ZONA CALLE DE RODAJE ALPA	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 8.906.355,55
13	3.1.2.1.6	1.1	ZONA CALLE DE RODAJO BRAVO	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 4.792.737,41
14	3.1.2.1.7	1.1	ZONA CALLE DE RODAJE CHARLIE	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 2.620.446,82
15	3.1.2.1.8	1.1	ZONA CALLE DE RODAJE SSEI	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 3.353.613,96
16	**3.1.3**	**2**	**ROCERÍA**	**369 días**	**3/03/2025**	**30/07/2026**	**$ 808.151.672,89**
17	**3.1.3.1**	**2.1**	**ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).**	**365 días**	**3/03/2025**	**24/07/2026**	**$ 234.844.579,34**
18	**3.1.3.1.1**	**2.1**	**Ciclo 1**	**86 días**	**3/03/2025**	**30/06/2025**	**$ 51.403.784,16**
19	3.1.3.1.1.1	2.1	Ciclo 1.1	43 días	3/03/2025	30/04/2025	$ 41.925.423,32
20	3.1.3.1.1.2	2.1	Ciclo 1.2	22 días	1/05/2025	30/05/2025	$ 3.230.826,60
21	3.1.3.1.1.3	2.1	Ciclo 1.3	21 días	2/06/2025	30/06/2025	$ 6.247.534,24
22	3.1.3.1.2	2.1	Ciclo 2	20 días	3/11/2025	28/11/2025	$ 23.771.444,62
23	3.1.3.1.3	2.1	Ciclo 3	42 días	2/02/2026	31/03/2026	$ 55.293.752,28
24	3.1.3.1.4	2.1	Ciclo 4	43 días	1/04/2026	29/05/2026	$ 55.293.752,28
25	3.1.3.1.5	2.1	Ciclo 5	40 días	1/06/2026	24/07/2026	$ 49.081.846,00
26	**3.1.3.2**	**2.2**	**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).**	**369 días**	**3/03/2025**	**30/07/2026**	**$ 573.307.093,55**
27	**3.1.3.2.1**	**2.1**	**Ciclo 1**	**65 días**	**3/03/2025**	**30/05/2025**	**$ 34.857.228,86**
28	3.1.3.2.1.1	2.2	Ciclo 1.1	21 días	3/03/2025	31/03/2025	$ 7.172.016,40
29	3.1.3.2.1.2	2.2	Ciclo 1.2	22 días	1/04/2025	30/04/2025	$ 6.050.507,82
30	3.1.3.2.1.3	2.2	Ciclo 1.2	22 días	1/05/2025	30/05/2025	$ 21.634.704,64
31	3.1.3.2.2	2.2	Ciclo 2	21 días	2/06/2025	30/06/2025	$ 18.316.086,85
32	3.1.3.2.3	2.2	Ciclo 3	23 días	1/07/2025	31/07/2025	$ 21.533.744,30
33	3.1.3.2.4	2.2	Ciclo 4	22 días	1/09/2025	30/09/2025	$ 42.726.954,52
34	3.1.3.2.5	2.2	Ciclo 5	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 31.965.976,11
35	3.1.3.2.6	2.2	Ciclo 6	20 días	3/11/2025	28/11/2025	$ 9.062.426,86
36	3.1.3.2.7	2.2	Ciclo 7	23 días	1/12/2025	31/12/2025	$ 32.573.229,97
37	3.1.3.2.8	2.2	Ciclo 8	22 días	1/01/2026	30/01/2026	$ 71.792.691,50
38	3.1.3.2.9	2.2	Ciclo 9	20 días	2/02/2026	27/02/2026	$ 75.214.029,52
39	3.1.3.2.10	2.2	Ciclo 10	22 días	2/03/2026	31/03/2026	$ 27.771.178,41
40	3.1.3.2.11	2.2	Ciclo 11	22 días	1/04/2026	30/04/2026	$ 51.873.378,12
41	3.1.3.2.12	2.2	Ciclo 12	21 días	1/05/2026	29/05/2026	$ 51.873.378,12
42	3.1.3.2.13	2.2	Ciclo 13	22 días	1/06/2026	30/06/2026	$ 51.873.379,19
43	3.1.3.2.14	2.2	Ciclo 14	22 días	1/07/2026	30/07/2026	$ 51.873.411,23
44	**3.1.4**	**3**	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**327 días**	**1/05/2025**	**31/07/2026**	**$ 347.798.667,54**
45	**3.1.4.1**	**3.1**	**LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE**	**317 días**	**1/05/2025**	**17/07/2026**	**$ 283.570.433,26**
46	**3.1.4.1.1**	**3.1**	**Ciclo 1**	**65 días**	**1/05/2025**	**30/07/2025**	**$ 91.386.581,14**
47	3.1.4.1.1.1	3.1	Ciclo 1.1	22 días	1/05/2025	30/05/2025	$ 74.393.838,63
48	3.1.4.1.1.2	3.1	Ciclo 1.2	22 días	2/06/2025	1/07/2025	$ 12.534.342,15
49	3.1.4.1.1.3	3.1	Ciclo 1.3	21 días	2/07/2025	30/07/2025	$ 4.458.400,36
50	3.1.4.1.2	3.1	Ciclo 2	22 días	1/01/2026	30/01/2026	$ 84.136.482,94
51	3.1.4.1.3	3.1	Ciclo 3	22 días	18/06/2026	17/07/2026	$ 108.047.369,18
52	**3.1.4.2**	**3.2**	**LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).**	**305 días**	**2/06/2025**	**31/07/2026**	**$ 2.509.563,15**
53	3.1.4.2.1	3.2	Ciclo 1	21 días	2/06/2025	30/06/2025	$ 334.608,42
54	3.1.4.2.2	3.2	Ciclo 2	20 días	3/11/2025	28/11/2025	$ 334.608,42
55	3.1.4.2.3	3.2	Ciclo 3	20 días	2/02/2026	27/02/2026	$ 278.840,35
56	3.1.4.2.4	3.2	Ciclo 4	22 días	1/04/2026	30/04/2026	$ 334.608,42

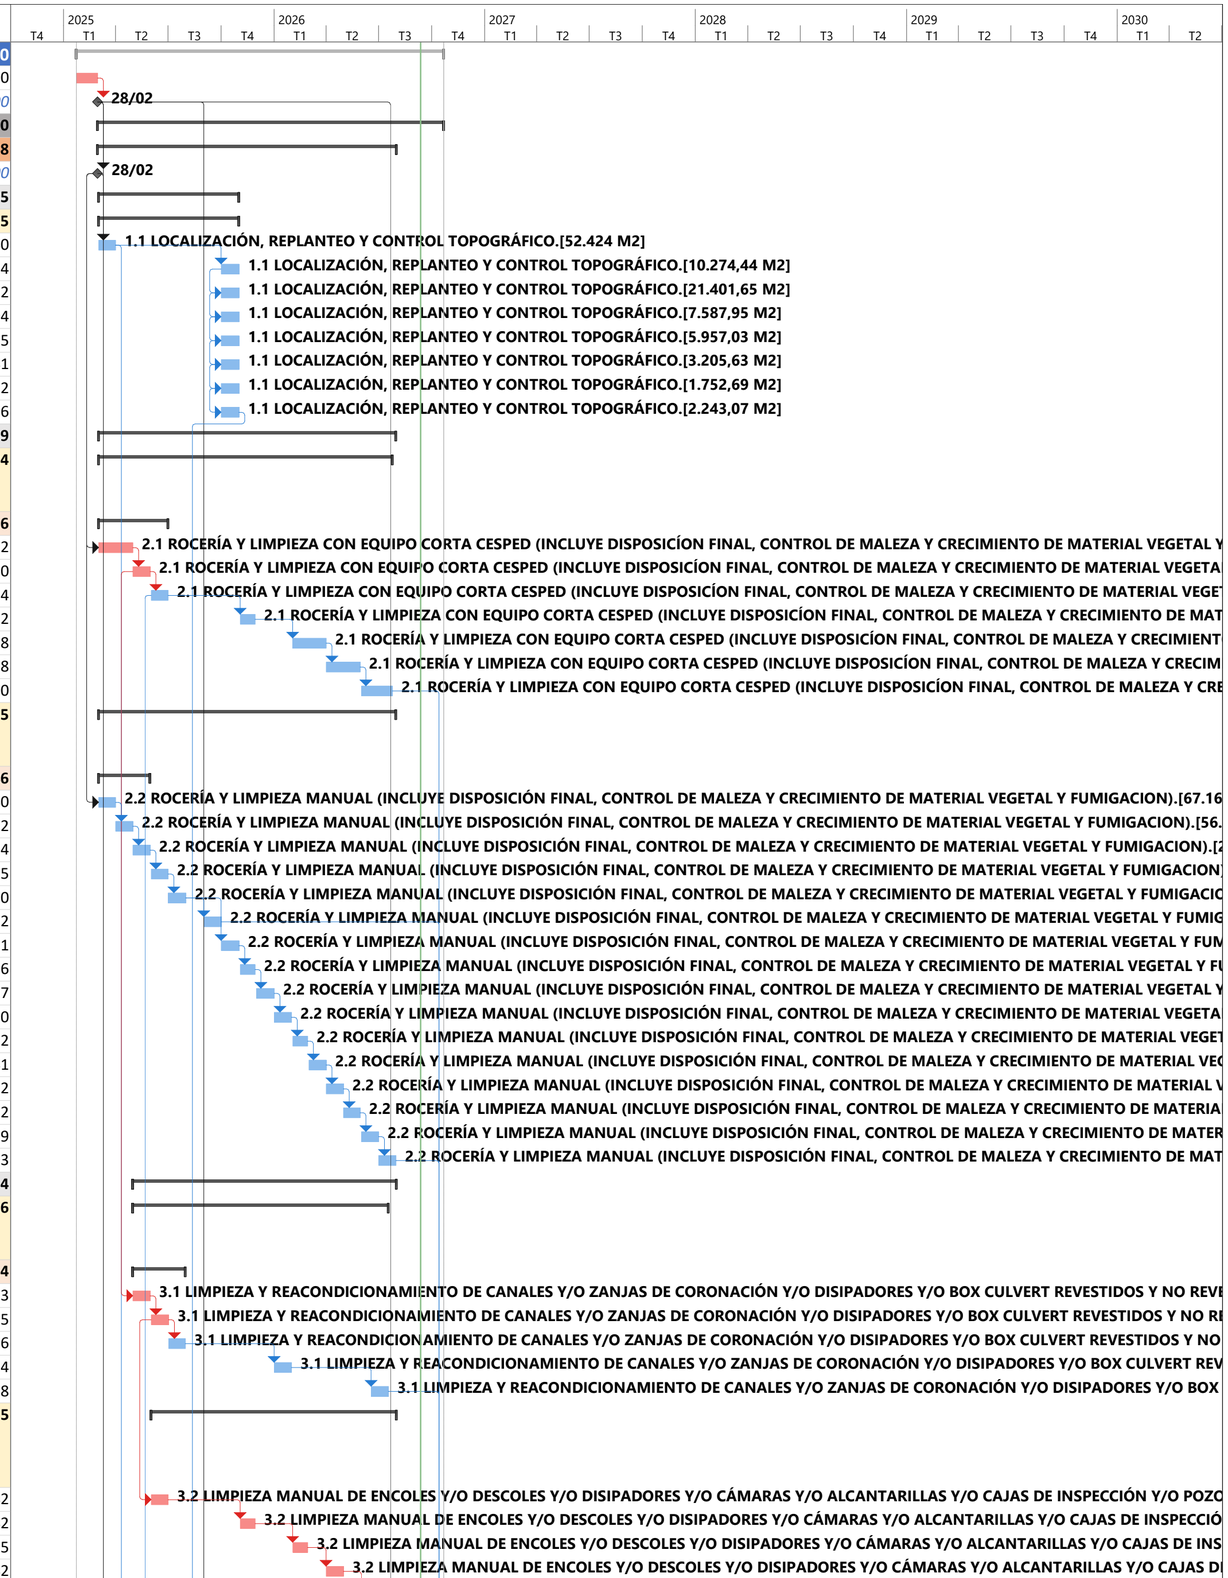

Proyecto: Contrato Aerocivil 24
Fecha: 12/09/2026

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id		EDT	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
57		3.1.4.2.5	3.2	Ciclo 5	22 días	1/06/2026	30/06/2026	$ 334.608,42
58		3.1.4.2.6	3.2	Ciclo 6	23 días	1/07/2026	31/07/2026	$ 892.289,12
59		**3.1.4.3**	**3.3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.**	**240 días**	**1/09/2025**	**31/07/2026**	**$ 61.661.913,72**
60		3.1.4.3.1	3.3	Ciclo 1	22 días	1/09/2025	30/09/2025	$ 56.752.796,80
61		3.1.4.3.2	3.3	Ciclo 2	23 días	1/07/2026	31/07/2026	$ 4.909.116,92
62		3.1.4.4	3.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y	23 días	1/07/2026	31/07/2026	$ 56.757,41
63		**3.1.5**	**4**	**PAVIMENTOS**	**298 días**	**11/06/2025**	**31/07/2026**	**$ 122.390.439,18**
64		**3.1.5.1**	**4**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**80 días**	**11/06/2025**	**30/09/2025**	**$ 26.203.181,97**
65		3.1.5.1.1	4.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	54 días	17/07/2025	30/09/2025	$ 14.705.200,00
66		3.1.5.1.2	4.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	44 días	11/06/2025	11/08/2025	$ 2.537.823,69
67		3.1.5.1.3	4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y	44 días	11/06/2025	11/08/2025	$ 8.960.158,27
68		**3.1.5.2**	**4**	**Ciclo 2 (Provisión)**	**56 días**	**15/05/2026**	**31/07/2026**	**$ 96.187.257,21**
69		3.1.5.2.1	4.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA	15 días	18/06/2026	8/07/2026	$ 76.479,85
70		3.1.5.2.2	4.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	7 días	16/07/2026	24/07/2026	$ 5.026.320,00
71		3.1.5.2.3	4.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	54 días	15/05/2026	29/07/2026	$ 1.493.680,69
72		3.1.5.2.4	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	20 días	25/06/2026	22/07/2026	$ 1.465.809,30
73		3.1.5.2.5	4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	12 días	9/07/2026	24/07/2026	$ 6.075.402,50
74		3.1.5.2.6	4.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	14 días	1/07/2026	20/07/2026	$ 6.132.958,55
75		3.1.5.2.7	4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y	7 días	15/07/2026	23/07/2026	$ 27.045.504,82
76		3.1.5.2.8	4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	5 días	17/07/2026	23/07/2026	$ 1.177.180,30
77		3.1.5.2.9	4.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	7 días	21/07/2026	29/07/2026	$ 1.356.950,05
78		3.1.5.2.10	4.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	3 días	15/07/2026	17/07/2026	$ 46.261.534,06
79		3.1.5.2.11	4.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602,	15 días	22/06/2026	10/07/2026	$ 37.901,40
80		3.1.5.2.12	4.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	10 días	20/07/2026	31/07/2026	$ 37.535,69
81		**3.1.6**	**5**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**286 días**	**27/06/2025**	**31/07/2026**	**$ 679.320.637,78**
82		**3.1.6.1**	**5**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**68 días**	**27/06/2025**	**30/09/2025**	**$ 372.618.620,34**
83		3.1.6.1.1	5.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	68 días	27/06/2025	30/09/2025	$ 10.753.548,12
84		3.1.6.1.2	5.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	60 días	27/06/2025	18/09/2025	$ 361.865.072,22
85		**3.1.6.2**	**5**	**Ciclo 2 (Provisión Por Ejecutar)**	**120 días**	**16/02/2026**	**31/07/2026**	**$ 306.702.017,44**
86		3.1.6.2.1	5.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	68 días	16/02/2026	20/05/2026	$ 84.502.328,57
87		3.1.6.2.2	5.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	60 días	26/02/2026	20/05/2026	$ 221.969.669,03
88		3.1.6.2.3	5.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTF	15 días	13/07/2026	31/07/2026	$ 230.019,84
89		**3.1.7**	**6**	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	**286 días**	**17/06/2025**	**21/07/2026**	**$ 1.386.863.767,49**

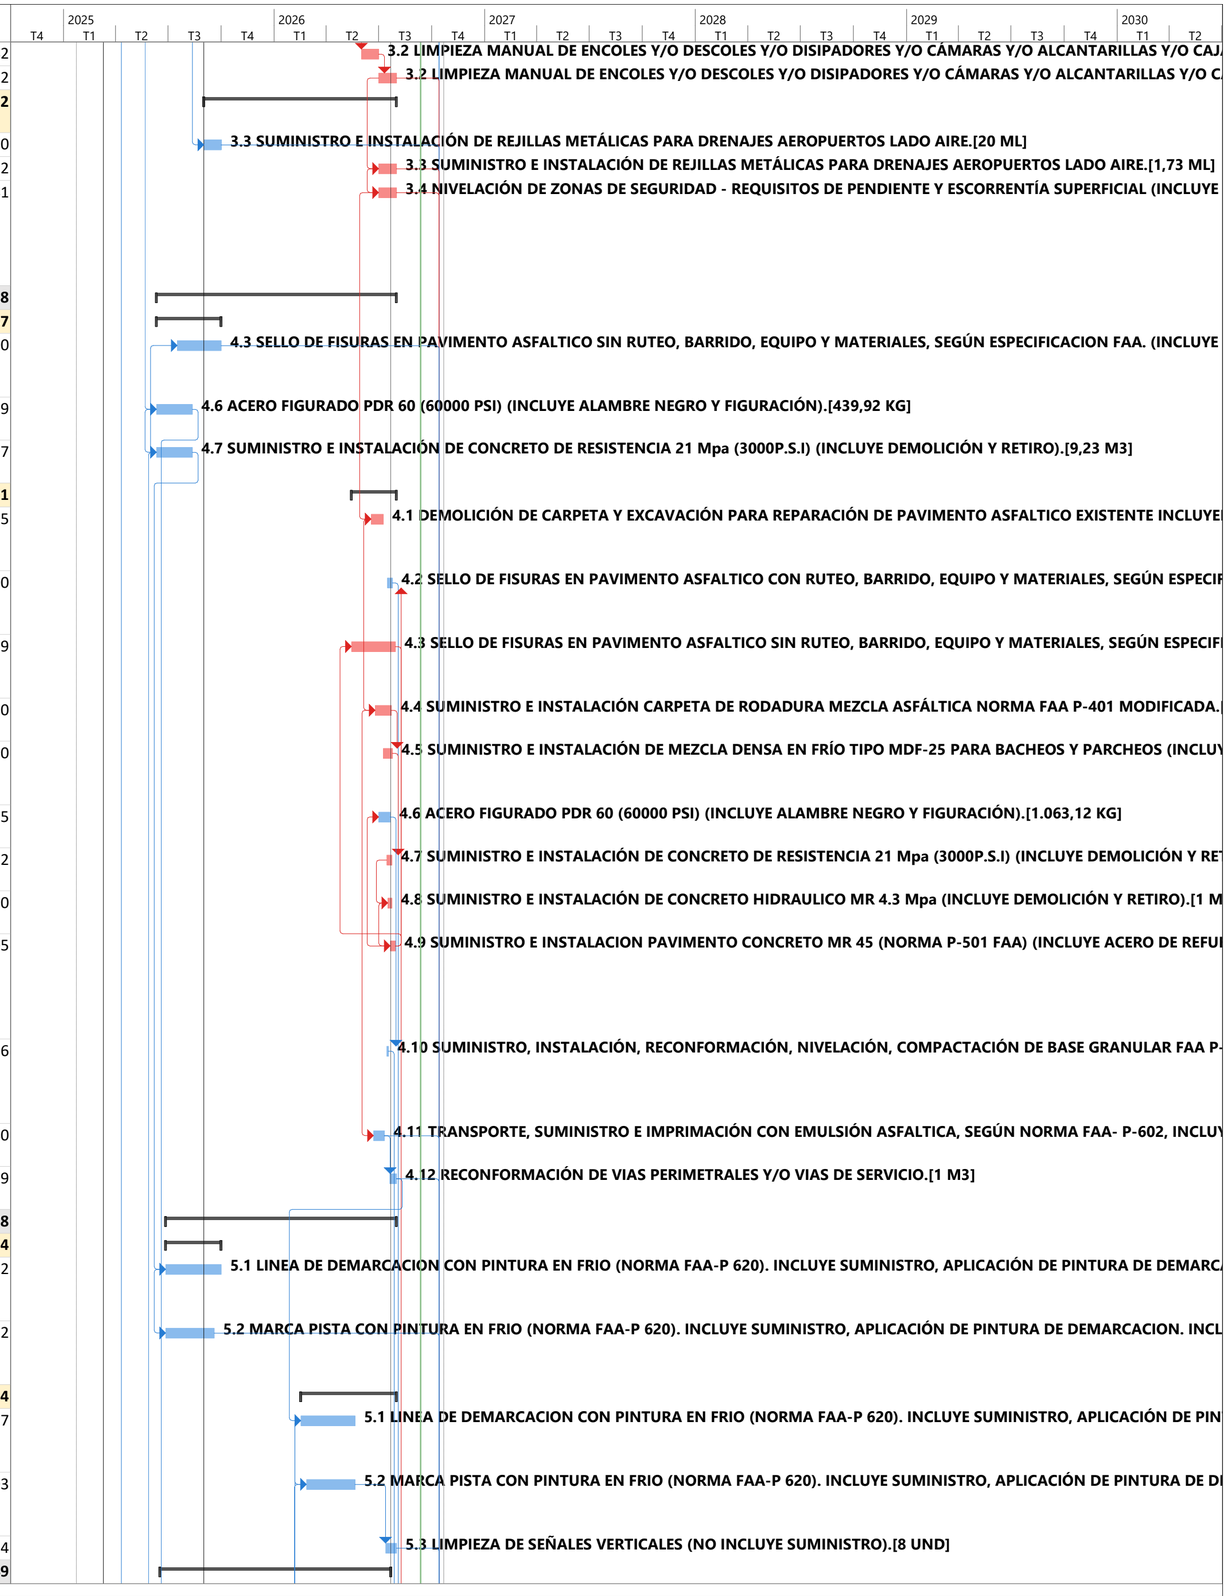

Proyecto: Contrato Aerocivil 24
Fecha: 12/09/2026

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id		EDT	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
90		**3.1.7.1**	**6**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**86 días**	**17/06/2025**	**14/10/2025**	**$ 1.331.172.815,34**
91		3.1.7.1.1	6.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	60 días	9/07/2025	30/09/2025	$ 1.296.571.775,34
92		3.1.7.1.2	6.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS	86 días	17/06/2025	14/10/2025	$ 34.601.040,00
93		**3.1.7.2**	**6**	**Ciclo 2 (Provisión)**	**60 días**	**29/04/2026**	**21/07/2026**	**$ 55.690.952,15**
94		3.1.7.2.1	6.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	60 días	29/04/2026	21/07/2026	$ 55.690.952,15
95		**3.1.8**	**7**	**CERRAMIENTO**	**348 días**	**1/04/2025**	**30/07/2026**	**$ 302.622.131,45**
96		**3.1.8.1**	**7**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**131 días**	**1/04/2025**	**30/09/2025**	**$ 130.886.382,68**
97		3.1.8.1.1	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS	88 días	1/04/2025	31/07/2025	$ 30.744.335,04
98		3.1.8.1.2	7.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	48 días	2/06/2025	6/08/2025	$ 267.874,66
99		3.1.8.1.3	7.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	48 días	2/06/2025	6/08/2025	$ 3.857.797,70
100		3.1.8.1.4	7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINIS	50 días	23/07/2025	30/09/2025	$ 96.016.375,28
101		**3.1.8.2**	**7**	**Ciclo 2 (Provisión)**	**112 días**	**25/02/2026**	**30/07/2026**	**$ 171.735.748,76**
102		3.1.8.2.1	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS	112 días	25/02/2026	30/07/2026	$ 142.563.856,24
103		3.1.8.2.2	7.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	15 días	10/07/2026	30/07/2026	$ 2.437.499,66
104		3.1.8.2.3	7.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	15 días	10/07/2026	30/07/2026	$ 3.723.742,95
105		3.1.8.2.4	7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINIS	20 días	3/07/2026	30/07/2026	$ 22.986.922,50
106		3.1.8.2.5	7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	20 días	3/07/2026	30/07/2026	$ 23.727,41
107		*3.1.9*		*Fin de Condiciones Contractuales Plazo a 31 de Julio de 2026*	*0 días*	*29/07/2026*	*29/07/2026*	*$ 0,00*
108		*3.2*		*Inicio Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*29/07/2026*	*29/07/2026*	*$ 0,00*
109		*3.3*		*Fin Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*10/08/2026*	*10/08/2026*	*$ 0,00*
110		*3.4*		*Inicio de Prorroga No. 1 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*10/08/2026*	*10/08/2026*	*$ 0,00*
111		*3.5*		*Fin de Prorroga No. 1 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*25/08/2026*	*25/08/2026*	*$ 0,00*
112		*3.6*		*Inicio de Prorroga No. 2 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*26/08/2026*	*26/08/2026*	*$ 0,00*
113		*3.7*		*Fin de Prorroga No. 2 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*8/09/2026*	*8/09/2026*	*$ 0,00*
114		*3.8*		*Inicio de Prorroga No. 3 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*9/09/2026*	*9/09/2026*	*$ 0,00*
115		*3.9*		*Fin de Prorroga No. 3 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*21/09/2026*	*21/09/2026*	*$ 0,00*
116		**3.10**	**1.1**	**PRORROGA No. 1**	**21 días**	**22/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 200.695.318,32**
117		*3.10.1*		*Inicio de Prorroga No. 1*	*0 días*	*22/09/2026*	*22/09/2026*	*$ 0,00*
118		**3.10.2**	**2**	**ROCERÍA**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 83.927.040,83**
119		**3.10.2.1**	**2.1**	**ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 32.022.886,90**
120		3.10.2.1.1	2.1	Ciclo 1	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 32.022.886,90
121		**3.10.2.2**	**2.2**	**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 51.904.153,93**
122		3.10.2.2.1	2.2	Ciclo 1	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 51.904.153,93
123		**3.10.3**	**3**	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 116.768.277,49**

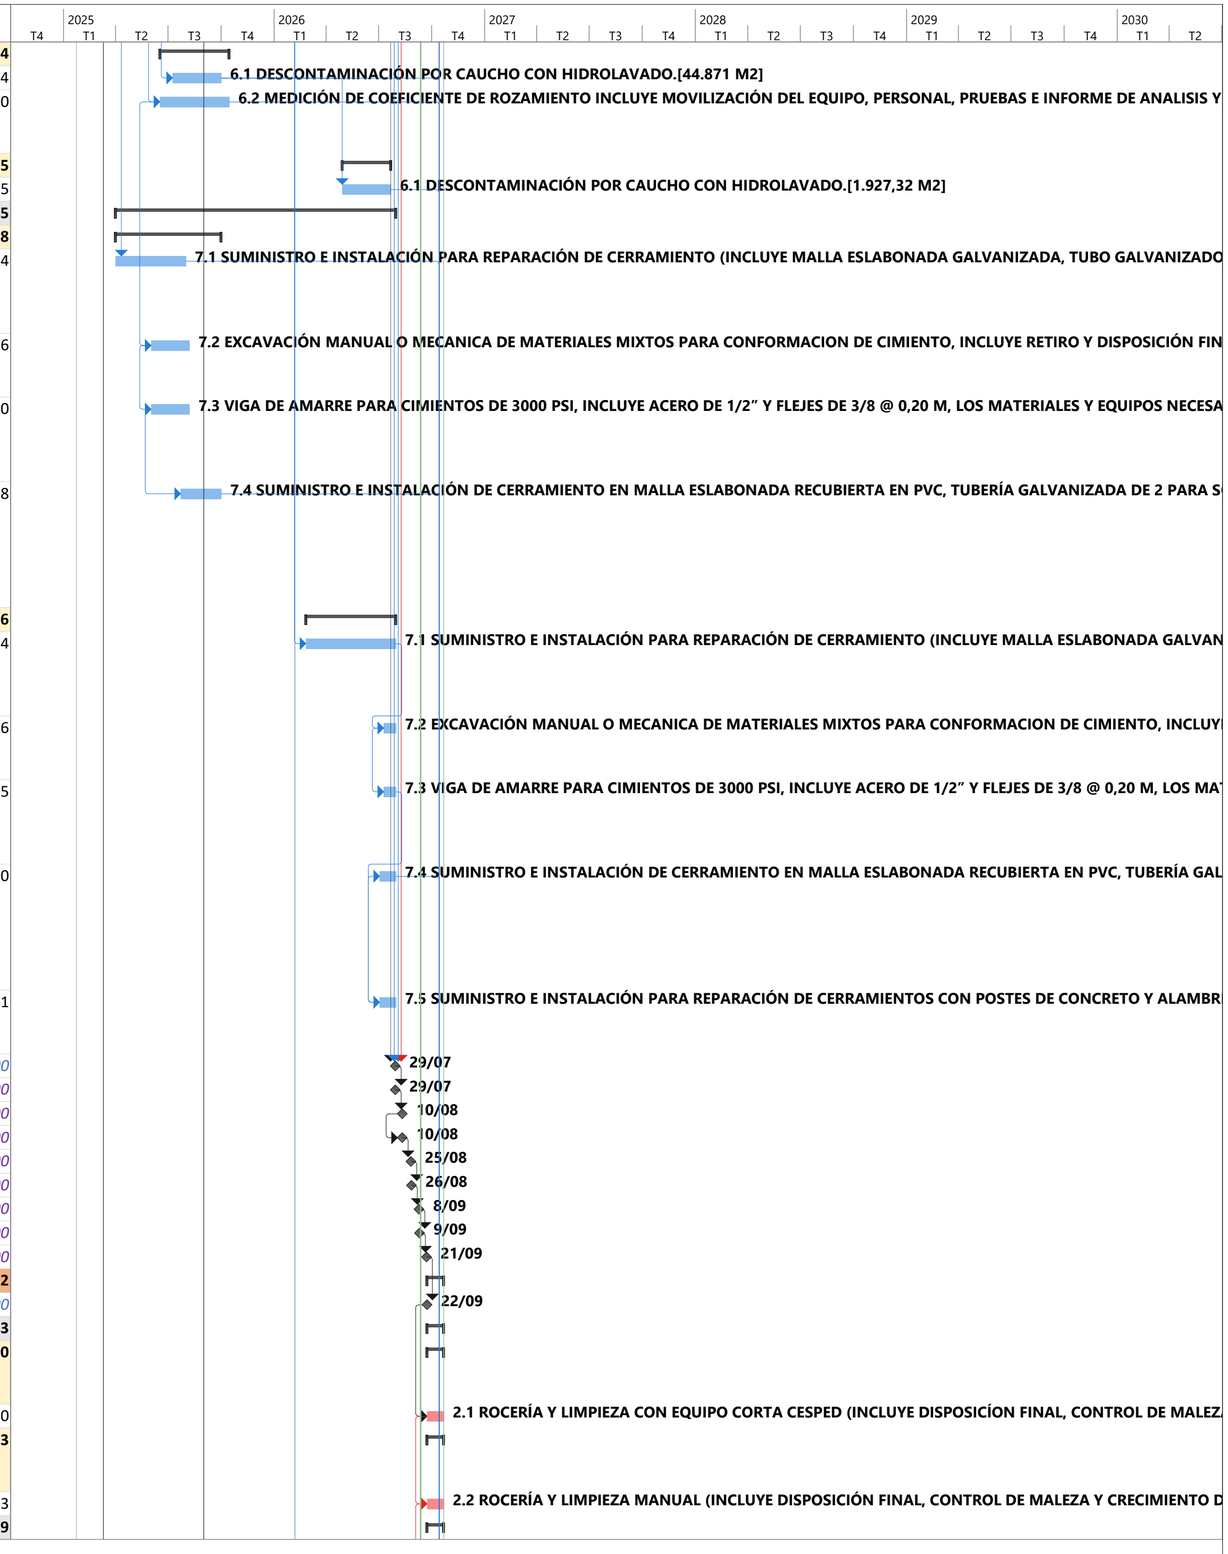

Proyecto: Contrato Aerocivil 24
Fecha: 12/09/2026

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id		EDT	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
124		**3.10.3.1**	**3.1**	**LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 116.768.277,49**
125		3.10.3.1.1	3.1	Ciclo 1	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 116.768.277,49
126		*3.10.4*		*Fin de Prorroga No. 1*	*0 días*	*21/10/2026*	*21/10/2026*	*$ 0,00*
127		**4**		**AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA, HUILA**	**428 días**	**28/02/2025**	**21/10/2026**	**$ 4.367.422.139,01**
128		**4.1**	**1.1**	**CONDICIONES CONTRACTUALES A PLAZO 31 DE JULIO 2026**	**370 días**	**28/02/2025**	**31/07/2026**	**$ 3.519.595.603,99**
129		*4.1.1*		*Inicio de Condiciones Contractuales Plazo a 31 de Julio de 2026*	*0 días*	*28/02/2025*	*28/02/2025*	*$ 0,00*
130		**4.1.2**	**8.1**	**LOCALIZACIÓN**	**175 días**	**3/03/2025**	**31/10/2025**	**$ 187.796.520,80**
131		**4.1.2.1**	**8.1**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**20 días**	**3/03/2025**	**28/03/2025**	**$ 93.899.755,50**
132		4.1.2.1.1	8.1	ZONA DE PISTA	20 días	3/03/2025	28/03/2025	$ 93.899.755,50
133		**4.1.2.2**	**8.1**	**Ciclo 2 (Ejecutado - Por Cobrar)**	**23 días**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**$ 93.896.765,30**
134		4.1.2.2.1	8.1	ZONA DE PISTA	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 44.184.690,30
135		4.1.2.2.2	8.1	ZONA CALLES DE RODAJE	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 5.919.100,90
136		4.1.2.2.3	8.1	ZONA CALLES DE RODAJE SSEI	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 3.041.033,40
137		4.1.2.2.4	8.1	ZONA DE PLATAFORMA	23 días	1/10/2025	31/10/2025	$ 40.751.940,70
138		**4.1.3**	**9**	**ROCERÍA**	**370 días**	**3/03/2025**	**31/07/2026**	**$ 869.022.255,95**
139		**4.1.3.1**	**9.1**	**ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).**	**10 días**	**20/07/2026**	**31/07/2026**	**$ 108.302,51**
140		4.1.3.1.1	9.1	Ciclo 1	10 días	20/07/2026	31/07/2026	$ 108.302,51
141		**4.1.3.2**	**9.2**	**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).**	**370 días**	**3/03/2025**	**31/07/2026**	**$ 868.913.953,44**
142		**4.1.3.2.1**	**2.1**	**Ciclo 1**	**43 días**	**3/03/2025**	**30/04/2025**	**$ 68.282.487,11**
143		4.1.3.2.1.1	9.2	Ciclo 1.1	21 días	3/03/2025	31/03/2025	$ 30.873.950,11
144		4.1.3.2.1.2	9.2	Ciclo 1.2	22 días	1/04/2025	30/04/2025	$ 37.408.537,00
145		4.1.3.2.2	9.2	Ciclo 2	22 días	1/05/2025	30/05/2025	$ 40.235.802,25
146		4.1.3.2.3	9.2	Ciclo 3	21 días	2/06/2025	30/06/2025	$ 407.510,64
147		4.1.3.2.4	9.2	Ciclo 4	22 días	1/09/2025	30/09/2025	$ 130.370.357,57
148		4.1.3.2.5	9.2	Ciclo 5	23 días	20/10/2025	19/11/2025	$ 65.185.178,78
149		4.1.3.2.6	9.2	Ciclo 6	20 días	20/11/2025	17/12/2025	$ 62.534.371,19
150		4.1.3.2.7	9.2	Ciclo 7	23 días	18/12/2025	19/01/2026	$ 62.737.280,74
151		4.1.3.2.8	9.2	Ciclo 8	22 días	20/01/2026	18/02/2026	$ 62.737.280,74
152		4.1.3.2.9	9.2	Ciclo 9	20 días	19/02/2026	18/03/2026	$ 62.737.280,74
153		4.1.3.2.10	9.2	Ciclo 10	22 días	19/03/2026	17/04/2026	$ 62.737.280,74
154		4.1.3.2.11	9.2	Ciclo 11	22 días	20/04/2026	19/05/2026	$ 62.737.280,74
155		4.1.3.2.12	9.2	Ciclo 12	21 días	20/05/2026	17/06/2026	$ 62.737.280,74
156		4.1.3.2.13	9.2	Ciclo 13	22 días	18/06/2026	17/07/2026	$ 62.737.280,74
157		4.1.3.2.14	9.2	Ciclo 14	10 días	20/07/2026	31/07/2026	$ 62.737.280,74
158		**4.1.4**	**10**	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**369 días**	**3/03/2025**	**30/07/2026**	**$ 395.107.162,82**
159		**4.1.4.1**	**10.1**	**LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE**	**325 días**	**3/03/2025**	**29/05/2026**	**$ 390.930.099,96**
160		**4.1.4.1.1**	**2.1**	**Ciclo 1**	**152 días**	**3/03/2025**	**30/09/2025**	**$ 130.481.439,18**
161		4.1.4.1.1.1	10.1	Ciclo 1.1	21 días	3/03/2025	31/03/2025	$ 44.260.596,32
162		4.1.4.1.1.2	10.1	Ciclo 1.2	22 días	1/04/2025	30/04/2025	$ 65.948.519,52
163		4.1.4.1.1.3	10.1	Ciclo 1.3	23 días	1/07/2025	31/07/2025	$ 2.739.028,66
164		4.1.4.1.1.4	10.1	Ciclo 1.4	22 días	1/09/2025	30/09/2025	$ 17.533.294,68
165		4.1.4.1.2	10.1	Ciclo 2	22 días	1/01/2026	30/01/2026	$ 130.481.439,18
166		4.1.4.1.3	10.1	Ciclo 3	43 días	1/04/2026	29/05/2026	$ 129.967.221,60
167		**4.1.4.2**	**10.2**	**LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).**	**304 días**	**2/06/2025**	**30/07/2026**	**$ 1.282.665,61**
168		4.1.4.2.1	10.2	Ciclo 1	21 días	2/06/2025	30/06/2025	$ 836.521,05
169		4.1.4.2.2	10.2	Ciclo 2	23 días	1/07/2025	31/07/2025	$ 223.072,28
170		4.1.4.2.3	10.2	Ciclo 3	22 días	1/07/2026	30/07/2026	$ 223.072,28
171		4.1.4.3	10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	13 días	14/07/2026	30/07/2026	$ 2.837.639,84
172		4.1.4.4	10.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y	25 días	26/06/2026	30/07/2026	$ 56.757,41
173		**4.1.5**	**11**	**PAVIMENTOS**	**290 días**	**23/06/2025**	**31/07/2026**	**$ 219.718.367,86**
174		**4.1.5.1**	**11**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**72 días**	**23/06/2025**	**30/09/2025**	**$ 96.349.567,10**



Proyecto: Contrato Aerocivil 24
Fecha: 12/09/2026

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id		EDT	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
175		4.1.5.1.1	11.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA	19 días	7/07/2025	31/07/2025	$ 3.046.957,22
176		4.1.5.1.2	11.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	7 días	22/09/2025	30/09/2025	$ 59.953.100,40
177		4.1.5.1.3	11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	10 días	23/06/2025	4/07/2025	$ 33.293.205,70
178		4.1.5.1.4	11.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	13 días	12/09/2025	30/09/2025	$ 56.303,78
179		**4.1.5.2**		**Ciclo 2 (Provisión)**	**182 días**	**20/11/2025**	**31/07/2026**	**$ 123.368.800,75**
180		4.1.5.2.1	11.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA	40 días	2/06/2026	27/07/2026	$ 40.423.424,72
181		4.1.5.2.2	11.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	7 días	20/07/2026	28/07/2026	$ 5.026,32
182		4.1.5.2.3	11.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	7 días	20/11/2025	28/11/2025	$ 29.392.018,50
183		4.1.5.2.4	11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	20 días	24/06/2026	21/07/2026	$ 1.465.809,30
184		4.1.5.2.5	11.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	13 días	23/06/2026	9/07/2026	$ 692,26
185		4.1.5.2.6	11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y	7 días	7/07/2026	15/07/2026	$ 10.678.411,81
186		4.1.5.2.7	11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	5 días	16/07/2026	22/07/2026	$ 588.590,15
187		4.1.5.2.8	11.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	7 días	23/07/2026	31/07/2026	$ 678.475,03
188		4.1.5.2.9	11.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	7 días	19/06/2026	29/06/2026	$ 73.103,78
189		4.1.5.2.10	11.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602,	7 días	23/06/2026	1/07/2026	$ 19.343.548,01
190		4.1.5.2.11	11.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/0 VIAS DE SERVICIO.	10 días	9/07/2026	22/07/2026	$ 20.719.700,88
191		**4.1.6**	**12**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**196 días**	**22/10/2025**	**22/07/2026**	**$ 594.468.309,93**
192		**4.1.6.1**	**12**	**Ciclo 1 (Por Ejecutar Pista)**	**28 días**	**22/10/2025**	**28/11/2025**	**$ 392.547.075,00**
193		4.1.6.1.1	12.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	28 días	22/10/2025	28/11/2025	$ 392.547.075,00
194		**4.1.6.2**	**12**	**Ciclo 2 (Provisión Por Ejecutar Plataformas)**	**28 días**	**15/06/2026**	**22/07/2026**	**$ 201.921.234,93**
195		4.1.6.2.1	12.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	15 días	15/06/2026	3/07/2026	$ 88.524.887,19
196		4.1.6.2.2	12.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	28 días	15/06/2026	22/07/2026	$ 113.367.595,26
197		4.1.6.2.3	12.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	5 días	16/07/2026	22/07/2026	$ 28.752,48
198		**4.1.7**	**13**	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	**95 días**	**23/06/2025**	**31/10/2025**	**$ 751.648.224,64**
199		**4.1.7.1**	**13**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**95 días**	**23/06/2025**	**31/10/2025**	**$ 751.648.224,64**
200		4.1.7.1.1	13.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	50 días	23/07/2025	30/09/2025	$ 705.513.504,64
201		4.1.7.1.2	13.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	95 días	23/06/2025	31/10/2025	$ 46.134.720,00
202		**4.1.8**	**14**	**CERRAMIENTO**	**300 días**	**26/05/2025**	**17/07/2026**	**$ 501.834.762,00**
203		**4.1.8.1**	**14**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**280 días**	**26/05/2025**	**19/06/2026**	**$ 465.140.744,27**
204		4.1.8.1.1	14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	21 días	3/07/2025	31/07/2025	$ 15.926.442,08
205		4.1.8.1.2	14.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	67 días	30/06/2025	30/09/2025	$ 798.831,00

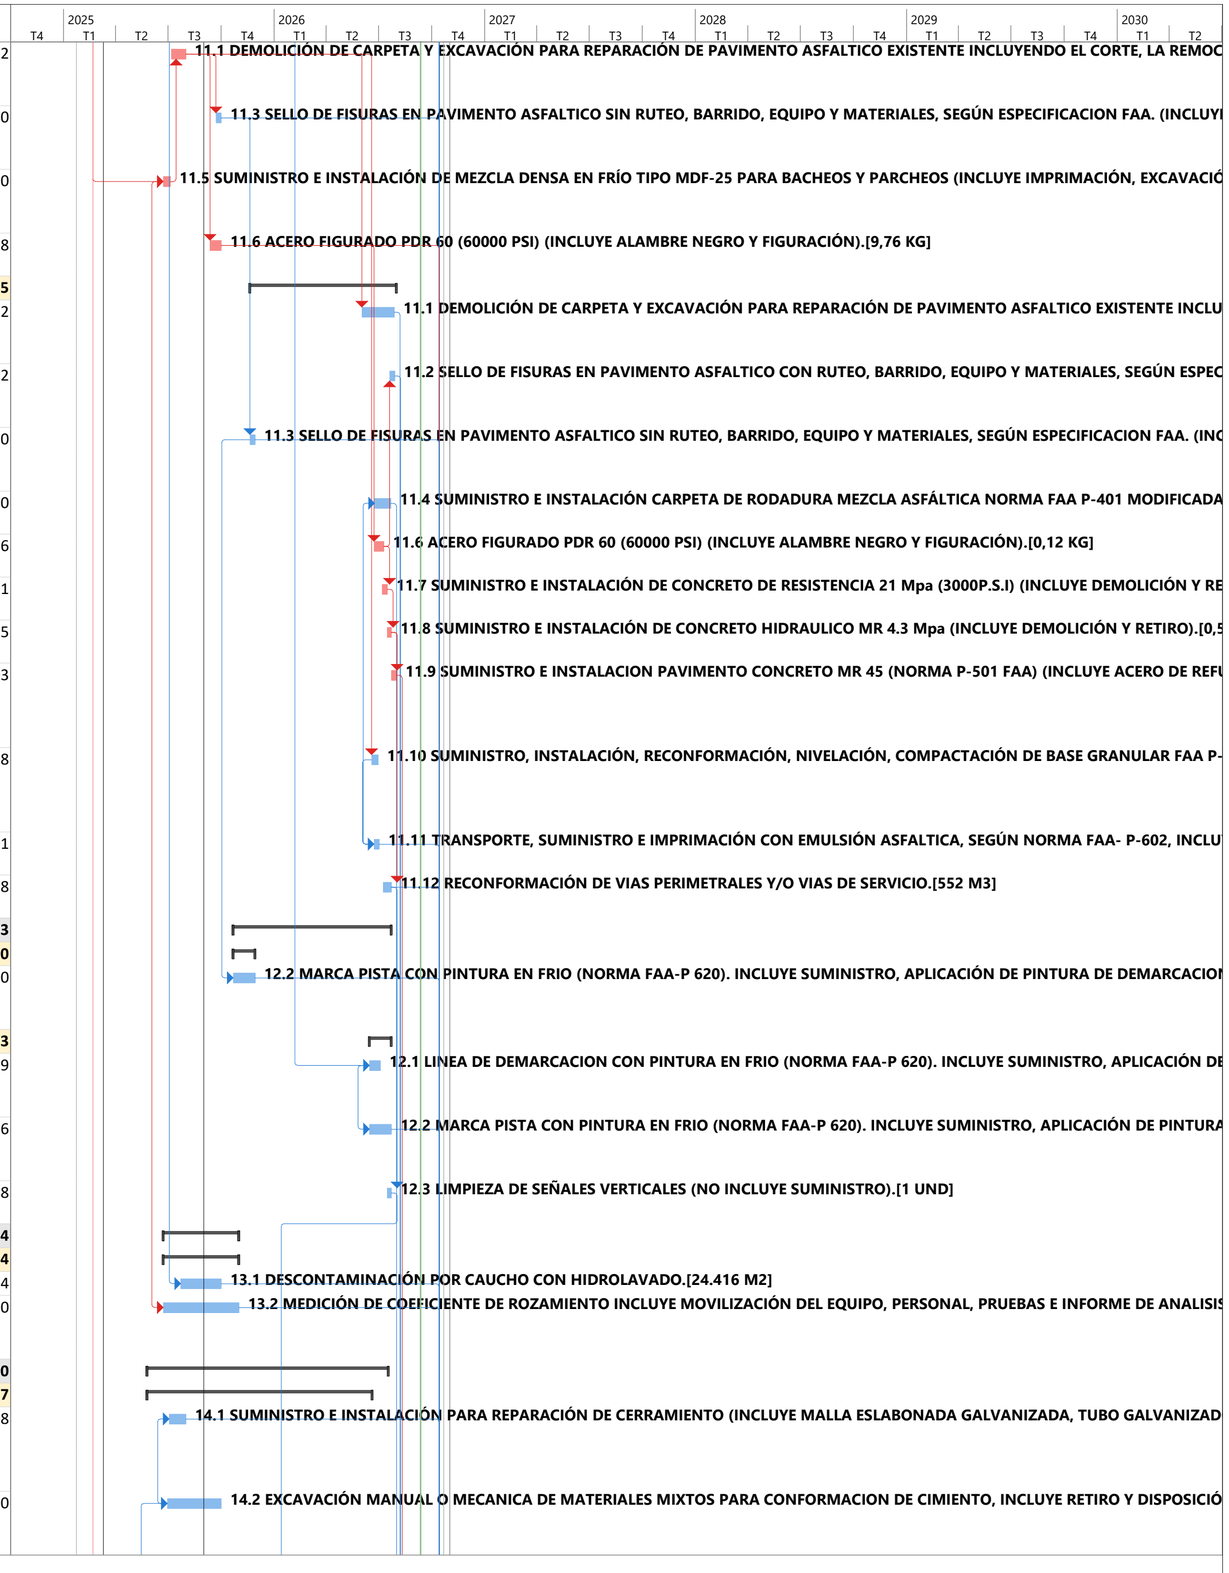

Proyecto: Contrato Aerocivil 24
Fecha: 12/09/2026

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id		EDT	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
206		4.1.8.1.3	14.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	280 días	26/05/2025	19/06/2026	$ 39.248.250,69
207		4.1.8.1.4	14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINIS	280 días	26/05/2025	19/06/2026	$ 409.167.220,50
208		**4.1.8.2**		**Ciclo 2 (Provisión)**	**120 días**	**2/02/2026**	**17/07/2026**	**$ 36.694.017,72**
209		4.1.8.2.1	14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	90 días	2/02/2026	5/06/2026	$ 36.675.867,96
210		4.1.8.2.2	14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	20 días	22/06/2026	17/07/2026	$ 18.149,76
211		*4.1.9*		*Fin de Condiciones Contractuales Plazo a 31 de Julio de 2026*	*0 días*	*31/07/2026*	*31/07/2026*	*$ 0,00*
212		*4.2*		*Inicio Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*29/07/2026*	*29/07/2026*	*$ 0,00*
213		*4.3*		*Fin Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*10/08/2026*	*10/08/2026*	*$ 0,00*
214		*4.4*		*Inicio de Prorroga No. 1 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*10/08/2026*	*10/08/2026*	*$ 0,00*
215		*4.5*		*Fin de Prorroga No. 1 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*25/08/2026*	*25/08/2026*	*$ 0,00*
216		*4.6*		*Inicio de Prorroga No. 2 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*26/08/2026*	*26/08/2026*	*$ 0,00*
217		*4.7*		*Fin de Prorroga No. 2 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*8/09/2026*	*8/09/2026*	*$ 0,00*
218		*4.8*		*Inicio de Prorroga No. 3 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*9/09/2026*	*9/09/2026*	*$ 0,00*
219		*4.9*		*Fin de Prorroga No. 3 a Suspensión Temporal No. 1*	*0 días*	*21/09/2026*	*21/09/2026*	*$ 0,00*
220		**4.10**	**1.1**	**PRORROGA No. 1**	**21 días**	**22/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 847.826.535,01**
221		*4.10.1*		*Inicio de Prorroga No. 1*	*0 días*	*22/09/2026*	*22/09/2026*	*$ 0,00*
222		**4.10.2**	**11**	**PAVIMENTOS**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 770.766.299,27**
223		4.10.2.1	NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 770.766.299,27
224		**4.10.3**	**14**	**CERRAMIENTO**	**21 días**	**23/09/2026**	**21/10/2026**	**$ 77.060.235,74**
225		4.10.3.1	NP-02	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 17.073.960,55
226		4.10.3.2	NP-03	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 26.762.423,89
227		4.10.3.3	NP-04	DESMONTE PARTE METÁLICA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	21 días	23/09/2026	21/10/2026	$ 33.223.851,30
228		*4.10.4*		*Fin de Prorroga No. 1*	*0 días*	*21/10/2026*	*21/10/2026*	*$ 0,00*
229		**5**	**15**	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO IBAGUE**	**370 días**	**3/03/2025**	**31/07/2026**	**$ 132.735.798,00**
230		5.1	15.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	370 días	3/03/2025	31/07/2026	$ 132.735.798,00
231		**6**	**16**	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO NEIVA**	**227 días**	**1/09/2025**	**14/07/2026**	**$ 132.735.798,00**
232		**6.1**	**14**	**Ciclo 1 (Ejecutado - Cobrado)**	**22 días**	**1/09/2025**	**30/09/2025**	**$ 31.856.591,52**
233		6.1.1	16.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	22 días	1/09/2025	30/09/2025	$ 31.856.591,52
234		**6.2**	**14**	**Ciclo 2 (Provisión)**	**40 días**	**20/05/2026**	**14/07/2026**	**$ 100.879.206,48**
235		6.2.1	16.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	40 días	20/05/2026	14/07/2026	$ 100.879.206,48
236		*7*		*Fin de Obra*	*0 días*	*21/10/2026*	*21/10/2026*	*$ 0,00*

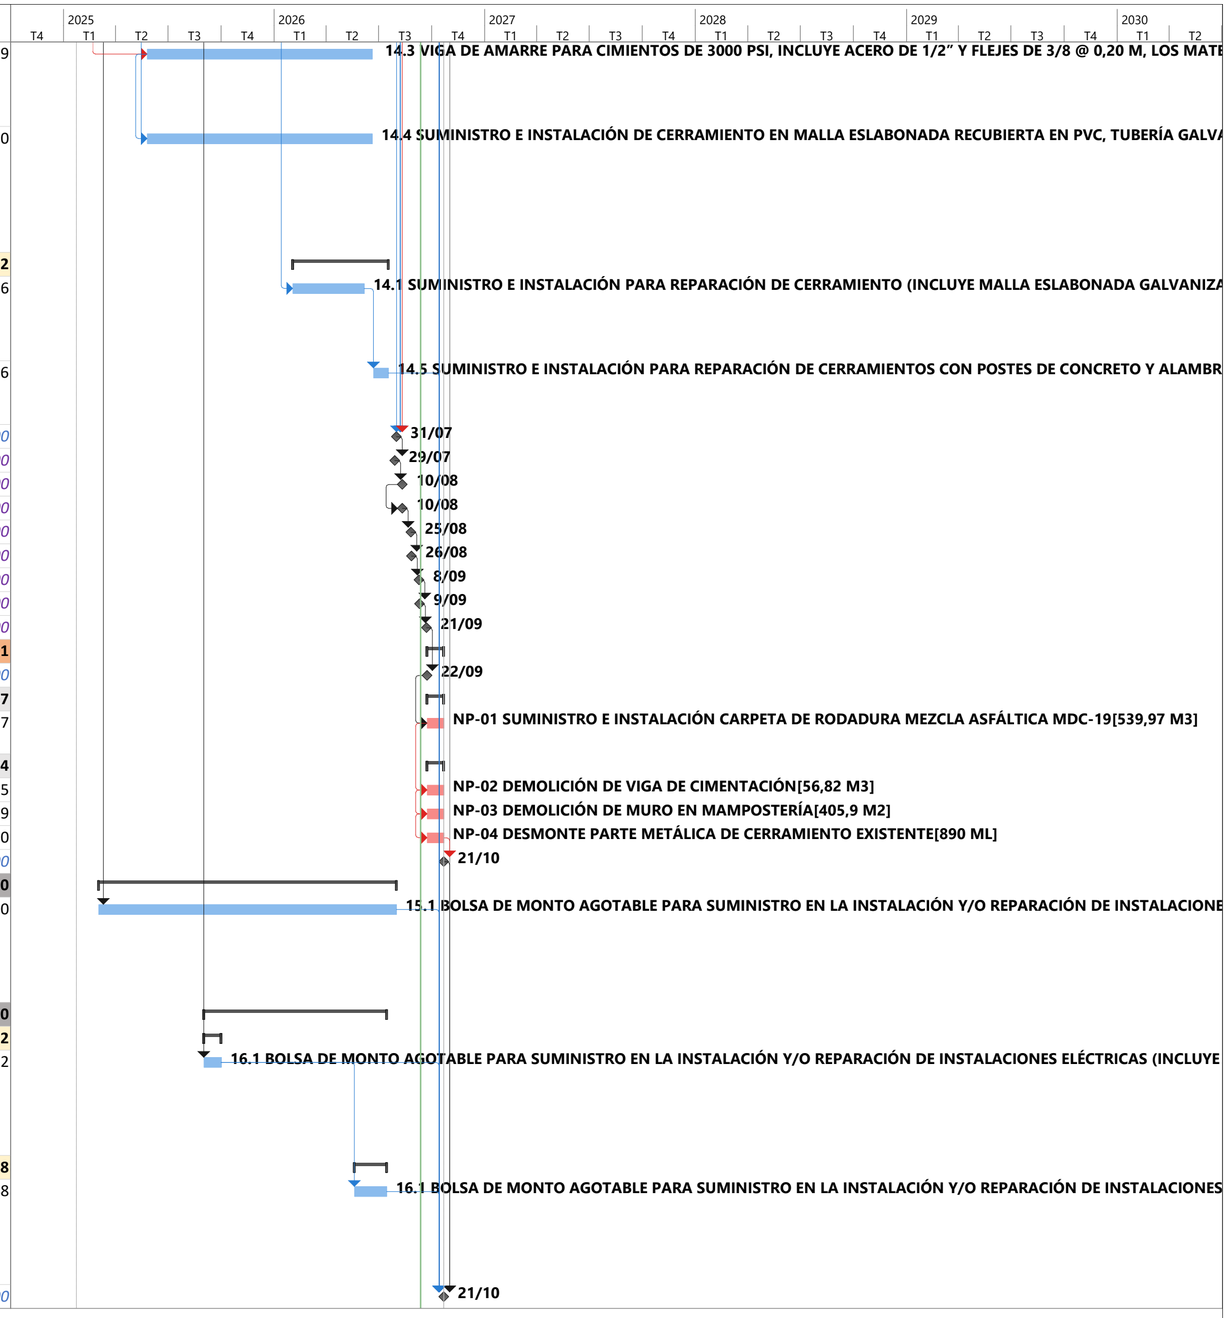

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

Ing. Juan Felipe Martinez Plata
Director de Interventoria

Vo. Bo. Residente Interventoria

Proyecto: Contrato Aerocivil 24
Fecha: 12/09/2026

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
