
PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA**	**$ 1.096.543.354,38**	**321,75 días**	**mié 24/12/25**	**lun 23/11/26**
2		**INICIO DE CONTRATO DE OBRA**	**$ 1.096.543.354,38**	**256,5 días**	**mié 24/12/25**	**mié 16/09/26**
3		FIRMA ACTA DE INICIO	$ 0,00	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25
4		ENTREGA DE ESPACIOS A INTERVENIR	$ 0,00	3 días	mié 24/12/25	lun 29/12/25
5		**FRENTE DE OBRA**	**$ 1.096.543.354,38**	**256,5 días**	**mié 24/12/25**	**mié 16/09/26**
6		Elaboracion de balance de obra	**$ 0,00**	15 días	mié 31/12/25	jue 15/01/26
7		UTILIDAD	$ 41.078.173,13	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25
8		INICIO DE OBRA	$ 0,00	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26
9		Proceso de contratación	$ 0,00	8 días	lun 2/03/26	mar 10/03/26
10	**1**	**DISEÑOS**	**$ 20.706.000,00**	**27 días**	**mar 10/02/26**	**mar 10/03/26**
11	1.1	Ajuste de diseño arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico y voz y datos	$ 9.401.000,00	7 días	mar 10/02/26	mié 18/02/26
12	NP-01	Ajuste de diseño arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico y voz y datos requeridos del proyecto	$ 11.305.000,00	20 días	mié 18/02/26	mar 10/03/26
13	**2**	**PRELIMINARES**	**$ 672.925.809,95**	**204,5 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 10/10/26**
14	2.1	Localización y replanteo.	$ 3.139.652,84	9 días	jue 12/03/26	sáb 21/03/26
15	NP-02	Cerramiento provisional en madera y polisombra H=2m LIBRE (Incluye excavaciones, hincado de varas, rellenos, suministro, transporte e instalación de varas, lona, fijaciones y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento<Tarea nueva>	$ 2.735.618,89	4 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26
16	NP-03	Desmonte manual de cubierta en membrana arquitectónica. Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición final de residuos en botadero autorizado.	$ 4.845.472,83	8 días	sáb 21/03/26	lun 30/03/26
17	NP-04	Desmonte manual de estructura metálica, incluye columnas, vigas, tensores y demás elementos. Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición finalTarea nueva>	$ 6.935.965,74	7 días	lun 30/03/26	lun 6/04/26

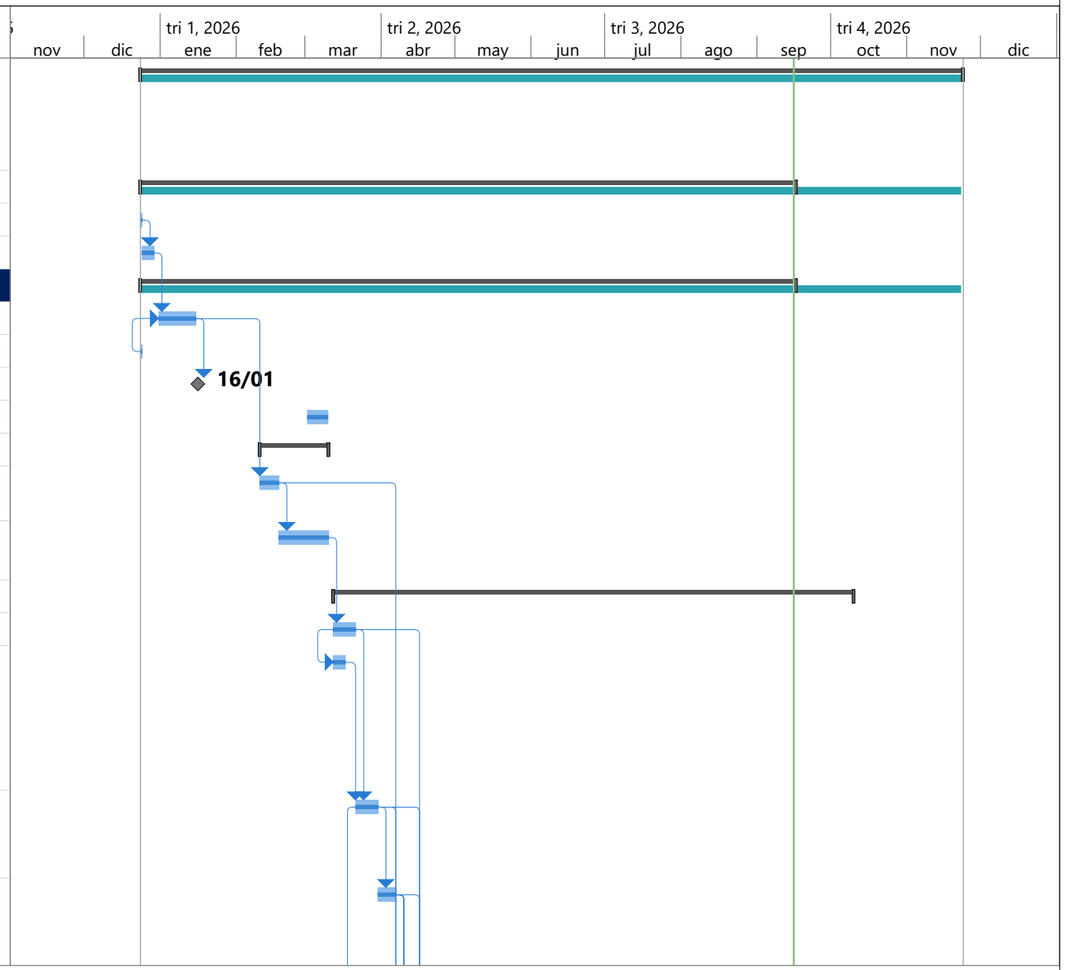


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	Atraso
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
18	NP-07	Demolición de pedestales en concreto 0,60 x 0.60 x 0.60. m. Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición final de residuos en botadero autorizado. nueva>	$ 894.569,95	10 días	mar 7/04/26	jue 16/04/26
19	2.3	Descapote manual e Max=0.20m (Incluye descapote, nivelación de terreno, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción).	$ 1.286.699,41	10 días	jue 16/04/26	lun 27/04/26
20	2.4	Excavación en material común (Incluye excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	$ 1.988.967,64	10 días	lun 27/04/26	jue 7/05/26
21	NP-10	Construcción de pedestales en concreto de 3000 PSI de (0,3 X 0,3 X 0,3 m); incluye, anclaje a placa existente; acero de refuerzo, platina de 0,3 x 0,3 m de 12 mm, anclajes de 3/4" de 40 cm en L incluye rosca y tuercas; adherentes epóxico y demás elementos	$ 8.957.060,20	10 días	jue 7/05/26	lun 18/05/26
22	NP-11	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta; incluye acero estructural, corte, soldadura, tornillería estructural, imprimación anticorrosiva y pintura (de acuerdo con la Norma ISO 12944.), transporte, montaje, planos de taller y certific	$ 250.015.255,00	29 días	lun 8/06/26	mar 7/07/26
23	NP-13	Suministro e instalación de sistema de pasarela estructural para mantenimiento de la cubierta	$ 14.547.225,00	5 días	mar 6/10/26	sáb 10/10/26
24	NP-14	Suministro e instalación canal acero galvanizado cal 18 x 6" en U. Incluye: Tapa izquierda y derecha. Soscos de 5 CMS. Tornillos. Soportes y anclajes y pintura	$ 12.171.072,45	1 día	mar 8/09/26	mar 8/09/26
25	NP-15	Suministro e instalación bajantes aguas lluvias D = 4". Tubería PVC Sanitaria. Incluye anclajes.	$ 4.408.250,00	3 días	mar 15/09/26	jue 17/09/26
26	NP-12	Suministro e instalación de cubierta en vidrio laminado en escala de grises (4+4mm), dos vidrios flotantes termoendurecidos y una (1) capa de burital de polivinilo, incluye instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo SIKA SG-20 de Sika	$ 361.000.000,00	15 días	lun 10/08/26	mar 25/08/26

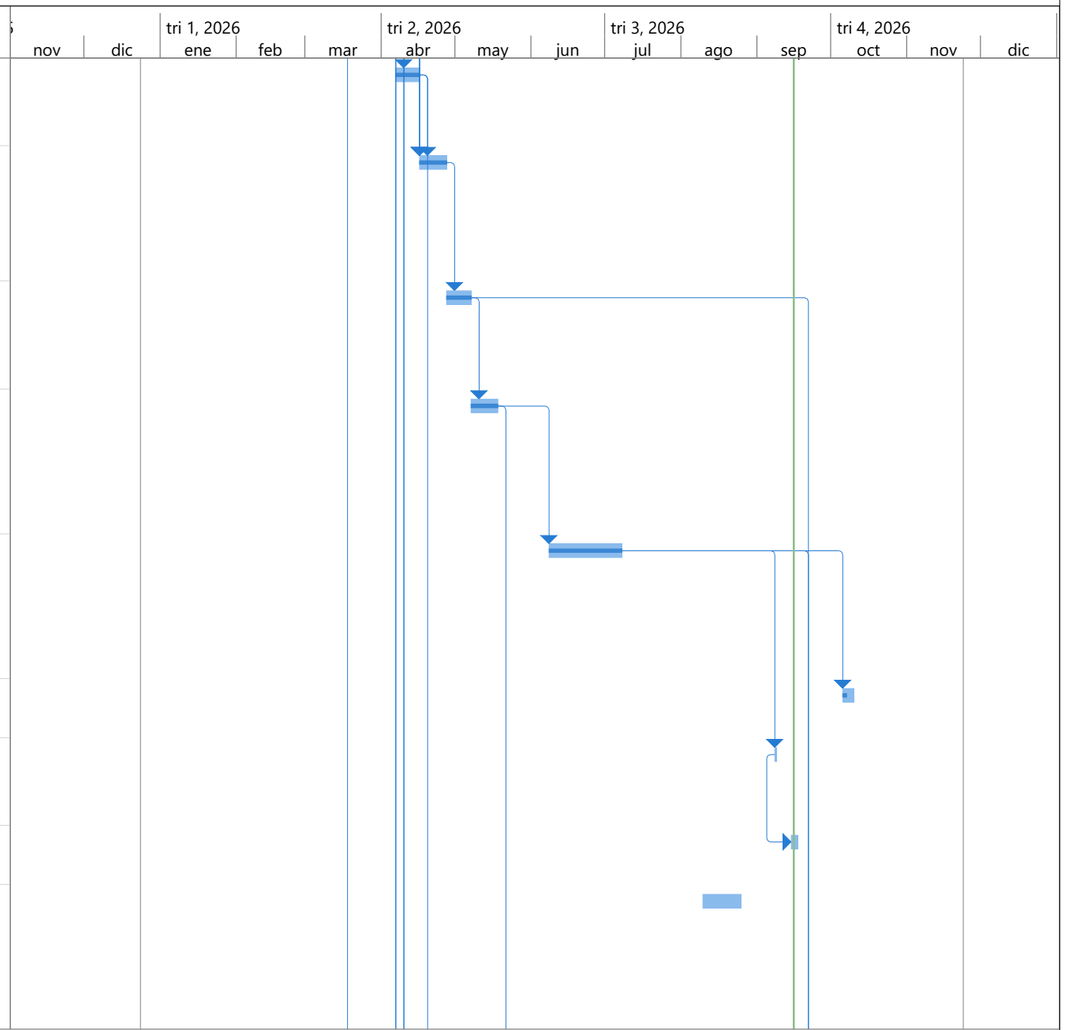


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
27	**3**	**PISOS Y DIVISIONES**	**$ 280.400.149,90**	**146,38 días**	**jue 16/04/26**	**mar 15/09/26**
28	NP-05	Desmonte de piso en Deck madera plástica, y estructura metálica de soporte Deck. Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición final	$ 3.797.392,50	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26
29	NP-16	Suministro e instalación de membrana de pvc (policloruro de vinilo,) resistencia a los rayos uv. Incluye elementos de fijación a placa existente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación<Tarea nueva>	$ 45.131.726,48	15 días	lun 18/05/26	mar 2/06/26
30	NP-06	Suministro e instalación de alistado de piso en mortero de 1:4 psi e=0.05 mts. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.ueva>	$ 6.962.321,00	8 días	mar 2/06/26	mié 10/06/26
31	3.1	Suministro e instalación de estructura de soporte piso Deck en tubulares de acero galvanizado .04 x .04 cal. 16 c/.40 incluye elementos de fijación y nivelación.	$ 49.697.770,33	10 días	mar 22/09/26	jue 1/10/26
32	3.2	Suministro e instalación de piso tipo Deck en WPC sólido, estilo Deck Antigüedad Romana (Acabado tipo madera natural, con protección UV); incluye todos los componentes de fijación y terminación.	$ 122.160.193,34	40 días	jue 1/10/26	jue 12/11/26
33	3.3	Construcción de muro en lámina de fibrocemento 8 mm - 2 caras (Incluye estructura en lámina galvanizada cal. 24, tornillos, accesorios de fijación, remates, dilataciones, ranuras, filos, masillado, lijado, y todo lo requerido para la correcta ejecución y	$ 7.432.511,02	9 días	jue 1/10/26	sáb 10/10/26
34	3.4	Suministro e instalación de deco panel para pared, estilo Madera Nature XXL Roble, incluye accesorios de fijación, remates y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	$ 9.706.683,11	4 días	sáb 10/10/26	jue 15/10/26
35	3.5	suministro, transporte, preparación del terreno e instalación de gramoquín decorativo, asegurando la correcta nivelación, drenaje, anclaje y acabado final, conforme a planos, especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.	$ 10.795.124,12	5 días	sáb 10/10/26	vie 16/10/26

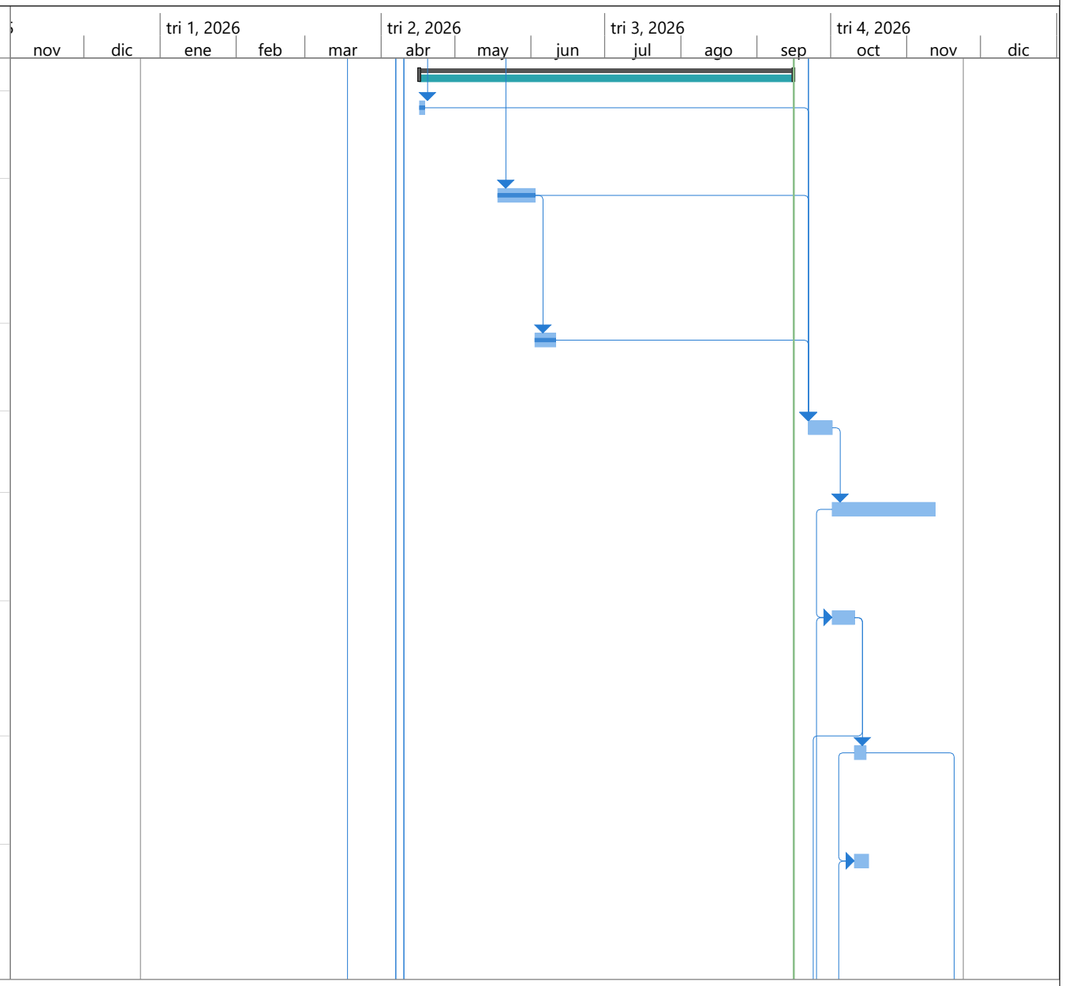


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
36	3.6	Suministro e instalación de divisiones fijas en vidrio templado incoloro de seguridad, de 2 m de altura y 10 mm de espesor, con base conformada por jardinera en cemento Portland Tipo I, reforzada con malla semiacerada; impermeabilizada en su interior con	$ 24.716.428,00	5 días	sáb 10/10/26	vie 16/10/26
37	~~3.7~~	~~Suministro e instalación de lámina microperforada con láser, en aluminio calibre 16, acabado en pintura electrostática según diseño D02; incluye estructura de soporte y elementos de fijación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisf~~	~~$ 14.811.608,91~~	~~2 días~~	~~vie 16/10/26~~	~~lun 19/10/26~~
38	**4**	**COMPONENTE ELÉCTRICO**	**$ 46.477.880,11**	**22,5 días**	**mar 25/08/26**	**mié 16/09/26**
39	NP-09	Desmonte de luminarias de techo y de piso. Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición final de residuos en botadero autorizado.	$ 418.637,65	3 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26
40	4.1	Construcción de salida para luminaria en tubería EMT de 1/2" Incluye 5 metros; cable aislado THHN AWG (2 No 12+1 No 12 T) 7,5 metros, caja metálica 2400 con suplemento, codos, uniones, terminales, toma de 15 AMP. con polo a tierra y demás accesorios neces	$ 2.155.923,94	2 días	jue 1/10/26	sáb 3/10/26
41	4.2	Construcción de salida para luminaria por piso en tubería PVC de 1/2 Incluye 5 metros Cable aislado THHN AWG (2 No 12+1 No 12 T) 7,5 metros, caja PVC 2400 , curvas, uniones, terminales, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	$ 1.374.731,66	2 días	sáb 3/10/26	mar 6/10/26
42	4.3	Construcción de salida monofásica microondas industrial 1200 W, incluye: Tubería EMT 3/4" (4 metros), Cable aislado THHN AWG (2 No 10+1 No 10 T) 5,5 metros, caja metálica 5800 , codos, uniones, terminales, toma de 20 AMP. monofásica y polo a tierra y dem	$ 3.033.241,26	1 día	sáb 3/10/26	lun 5/10/26

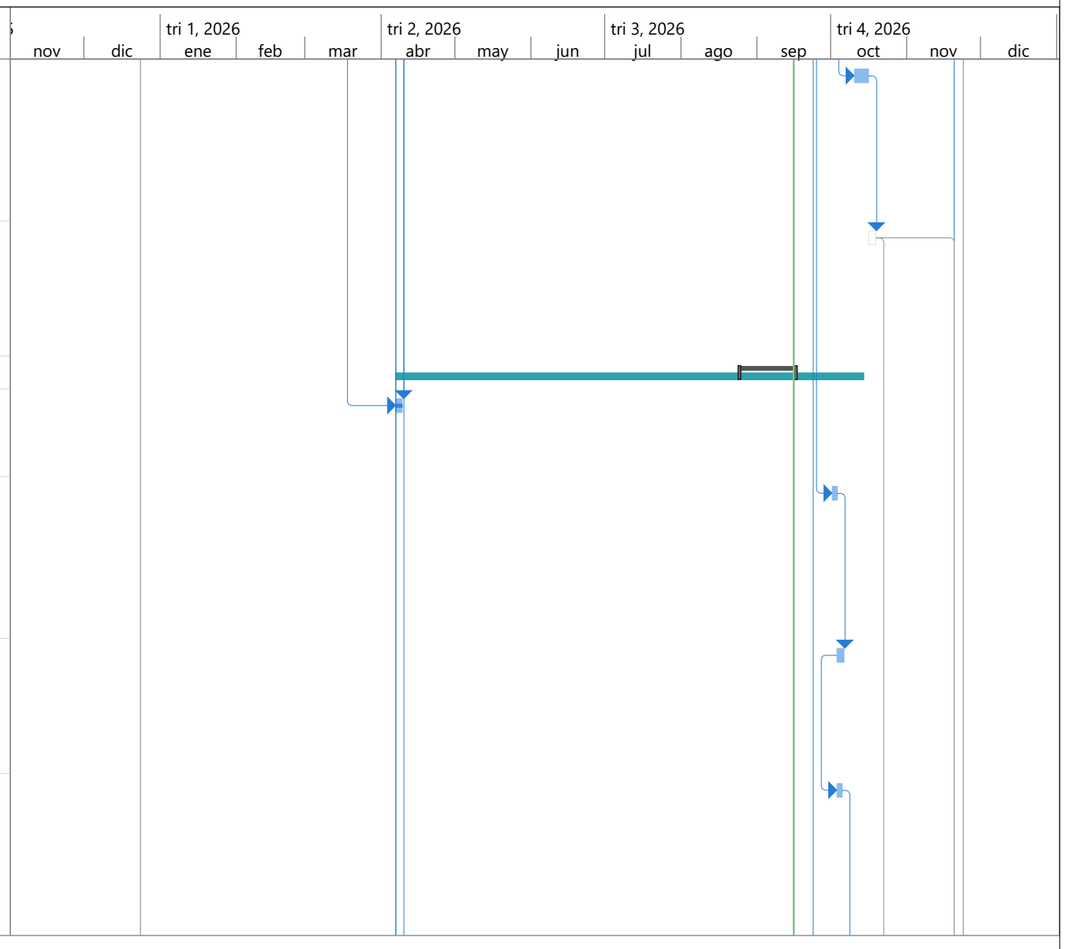


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
43	4.4	Construcción de salida para toma monofásica en barra de coworking, incluye tubería EMT 3/4" (5 metros), Cable aislado THHN AWG (2 No 12+1 No 12 T) 7,5 metros, caja metálica 5800, codos, uniones, terminales, toma de 20 AMP. monofásica con polo a tierra y	$ 3.639.889,51	1 día	lun 5/10/26	mar 6/10/26
44	4.5	Suministro e instalación de lámparas de descolgar (2m), referencia Mini Titania Suspender high Ligh de 228 cm; material de carcasa en aluminio extruido y con un acabado en pintura electrB29:B30; clavija en PVC Con polo a tierra tipo halux; incluye todos l	$ 13.378.182,29	1 día	mar 6/10/26	mié 7/10/26
45	4.6	Suministro e instalación de lámparas de descolgar (2m), referencia Mini Titania Curva 377 cm; material de carcasa en aluminio extruido y con un acabado en pintura electrB29:B30; clavija en PVC Con polo a tierra tipo halux; incluye todos los accesorios y e	$ 12.309.861,80	2 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26
46	4.7	Construcción de salida para toma monofásica maquina de café, incluye: Tubería EMT 3/4" (8 metros), Cable aislado THHN AWG (2 No 12+1 No 12 T) 10 metros, caja metálica 5800 , codos, uniones, terminales, toma de 20 Amp. monofásica con polo a tierra tipo G	$ 325.743,23	2 días	vie 9/10/26	sáb 10/10/26
47	4.8	Construcción de salida para toma monofásica máquina de helado, incluye: tubería EMT 3/4" (8 metros), Cable aislado THHN AWG (2 No 12+1 No 12 T) 10 metros, caja metálica 5800, codos, uniones, terminales, toma de 20 Amp. monofásica con polo a tierra tipo GF	$ 325.743,23	2 días	vie 9/10/26	sáb 10/10/26
48	4.9	Construcción de salida para toma monofásica nevera, incluye: Tuberia EMT 3/4" (8 metros), Cable aislado THHN AWG (2 No 12+1 No 12 T) 10 metros, caja metálica 5800 , codos, uniones, terminales, toma de 20 Amp monofásica con polo a tierra tipo GFCI y demá	$ 325.743,23	2 días	sáb 10/10/26	mar 13/10/26

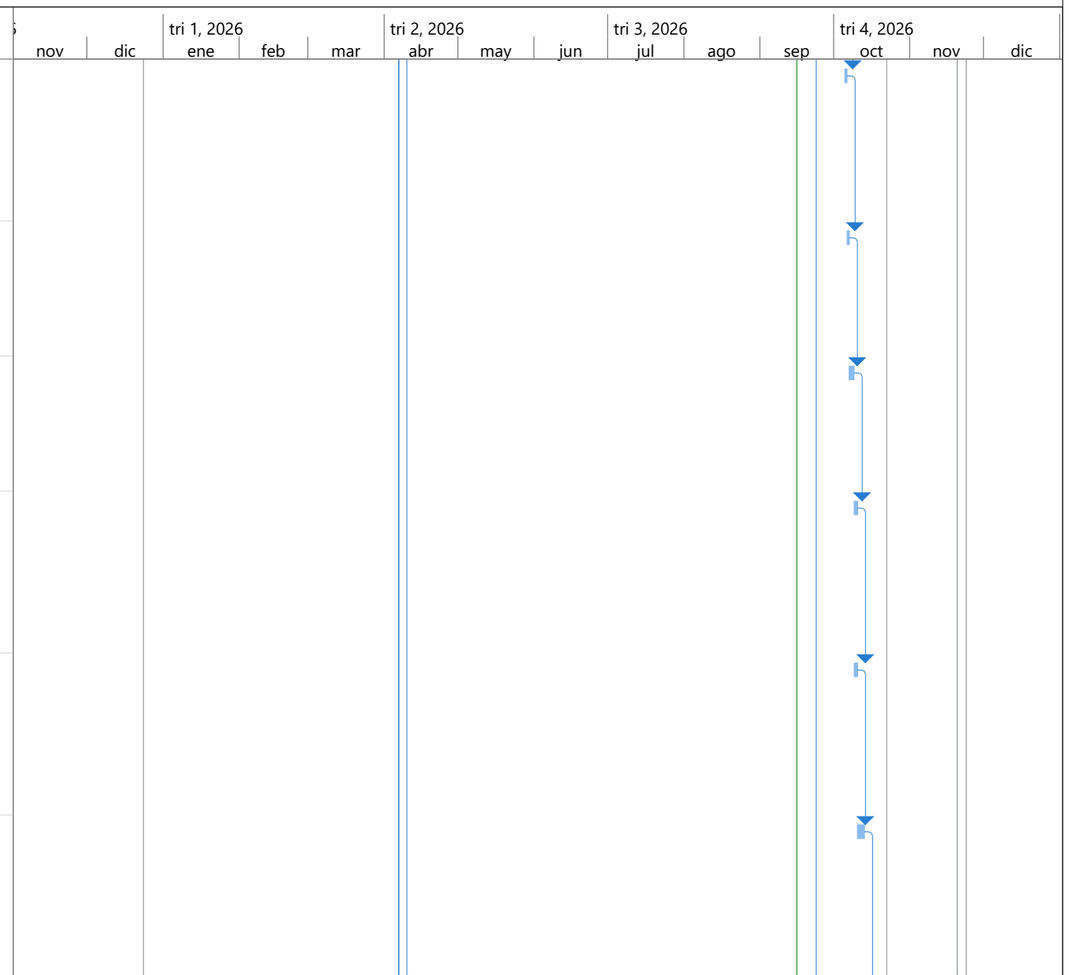


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
49	4.10	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, tapa y chapa, incluir marquilla de identificación del tablero y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	$ 954.867,25	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
50	4.11	Suministro e instalación de Breaker enchufable monopolar de 1x20 Amp.	$ 626.626,44	2 días	sáb 10/10/26	mar 13/10/26
51	4.12	Suministro e instalación de interruptor industrial fijo de 3x75 Amp	$ 358.880,67	1 día	lun 12/10/26	mar 13/10/26
52	4.13	Suministro e instalación de acometida en cable cobre AWG THHN 3x4F+4N+6T en tubería EMT de 1 1/4", la medida total del cable se determinará de acuerdo a la distancia del tablero de circuitos al tablero del punto de conexión.	$ 7.249.807,95	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
53	**5**	**COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y GAS**	**$ 10.543.545,29**	**14 días**	**vie 11/09/26**	**vie 25/09/26**
54	5.1	Suministro e instalación red distribución hidráulica D = 3/4". Incluye tubería de presión de 11-400 PSI y accesorios	$ 1.227.735,41	2 días	mié 30/09/26	jue 1/10/26
55	5.2	Construcción punto hidráulico de agua fría de 1/2" con tubería Presión 9-500 PSI (Incluye suministro, transporte, instalación de tuberías (2 m), registros, accesorios, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento).	$ 304.668,01	1 día	jue 1/10/26	vie 2/10/26
56	5.3	Construcción punto hidráulico para registro de 3/4" tipo Red White. Con tubería Presión 9-500 Psi (Incluye suministro, transporte, instalación de tuberías (2 m), accesorios y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)	$ 643.690,15	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26
57	5.4	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria D = 3". Incluye accesorios y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)	$ 2.082.479,97	1 día	lun 5/10/26	mar 6/10/26
58	5.5	Salida sanitaria PVCS 2" (Incluye suministro, transporte, instalación de tuberías (10 m.), registros, accesorios, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)	$ 388.876,92	1 día	mar 6/10/26	mié 7/10/26

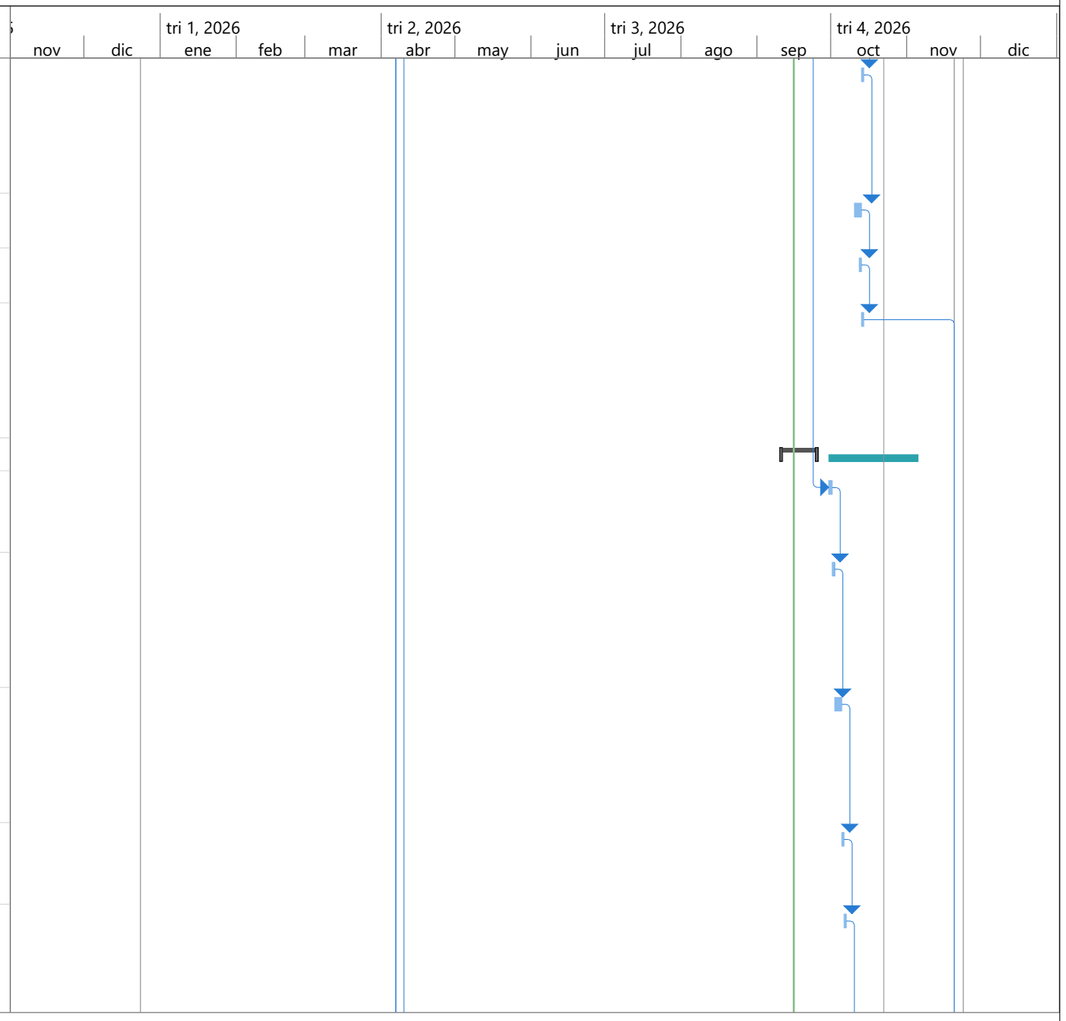


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	Atraso
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
59	5.6	Construcción Trampa de Grasas 60x80 en mampostería. Incluye excavación y rellenos; pañete impermeabilizado, tubería sanitaria de 2" (2 metros); incluye tapa en marco en ángulo de 3/4" y tapa en concreto.	$ 845.373,88	2 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26
60	5.7	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria D = 4". Incluye anclajes y rellenos .	$ 3.720.170,04	2 días	vie 9/10/26	sáb 10/10/26
61	5.8	Suministro e instalación codo PVCS 90° 4"	$ 125.113,69	1 día	sáb 10/10/26	lun 12/10/26
62	5.9	Suministro e instalación codo PVCS 45° 4"	$ 132.852,06	1 día	sáb 10/10/26	lun 12/10/26
63	5.10	Suministro e instalación YEE PVCS 4X4"	$ 293.251,90	1 día	sáb 10/10/26	lun 12/10/26
64	5.11	Suministro e instalación tapón de inspección PVCS 4"	$ 18.355,95	1 día	sáb 10/10/26	lun 12/10/26
65	5.12	Construcción cajas de inspección 60x60 en mampostería. Incluye excavación y rellenos.	$ 760.977,31	3 días	mar 3/11/26	jue 5/11/26
66	**6**	**MOBILIARIO FIJO**	**$ 22.800.981,15**	**13 días**	**mié 4/11/26**	**mar 17/11/26**
67	~~6.1~~	~~Fabricación, suministro e instalación de mueble para hornos microondas en tubo cuadrado 40 x 40 mm., cal. 16 , de 4,00 x 1,90 x 0,60 metros, acabado en pintura electrostática color negro, con 3 entrepaños (h=0,60, 0,90 y 1,40) y tapa en tablero melamínico~~	~~$ 5.643.078,91~~	~~2 días~~	~~lun 19/10/26~~	~~mar 20/10/26~~
68	6.2	Fabricación, suministro e instalación de mueble bajo en tablero melamínico RH 15 mm, 2.00 x 0.60, h =0.90, con 1 entrepaño; puertas con canto rígido y herrajes cierre lento. Incluye mesón en piedra sinterizada (color a elegir), espesor de placa mínimo 12	$ 9.173.510,31	4 días	vie 13/11/26	mar 17/11/26
69	~~6.3~~	~~Fabricación, suministro e instalación de barra para café en L, frente de 4 m. y lateral derecho de 2 m.; altura de 1,1m. en estructura metálica (perfil cuadrado 40×40x0,15mm). Revestimiento panel en madera MDF enchapada o melamina (18 mm) por ambos lados.~~	~~$ 38.698.740,93~~	~~2 días~~	~~lun 19/10/26~~	~~mar 20/10/26~~
70	6.4	Fabricación, suministro e instalación complemento en barra café, en L de 3,35 m. y lateral izquierdo de 1,41 m.; altura de 0,95 m. con encimera en piedra sinterizada tipo Altea calacatta Royal 0,6 m de ancho; salpicadero de 0,6 m. en piedra siterizada cal	$ 13.627.470,84	7 días	mié 4/11/26	mié 11/11/26

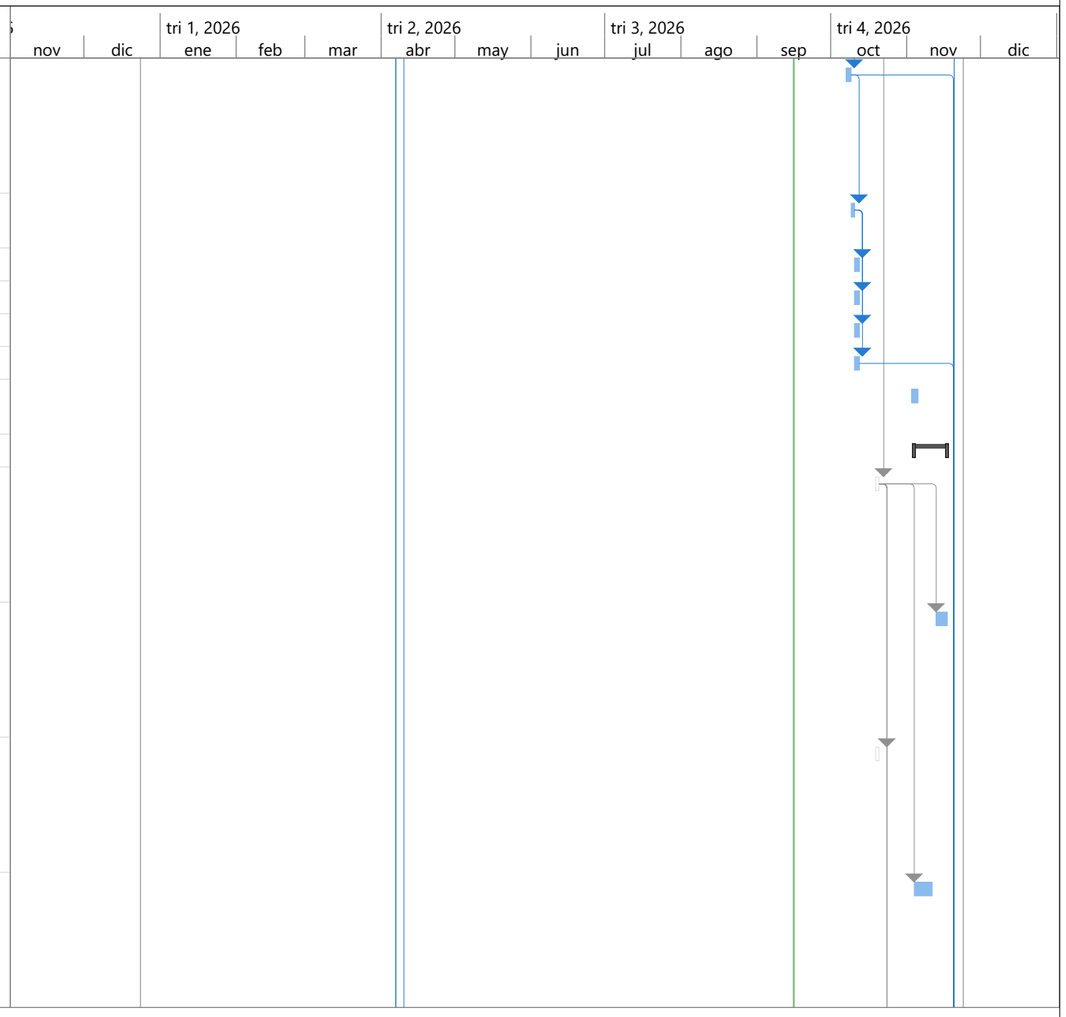


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
71	~~6.5~~	~~Fabricación, suministro e instalación de una barra de trabajo tipo coworking de 4,50 m de ancho y de 055 m. con capacidad para 6 estaciones de trabajo (ancho por estación: 0,75 m), con tablero de trabajo, estructura metálica portante, faldón/modesty panel~~	~~$ 2.959.727,39~~	~~2 días~~	~~lun 19/10/26~~	~~mar 20/10/26~~
72	~~6.6~~	~~Fabricación, suministro e instalación de barra metálica tipo comedor institucional, modular de 1,2 de ancho y 1,1 de altura, con cubierta superior en tablero postformado o HPL de 25 mm, estructura portante en tubo cuadrado 40×40×1.5 mm, con tablero contra~~	~~$ 11.782.483,96~~	~~2 días~~	~~lun 19/10/26~~	~~mar 20/10/26~~
73	~~6.7~~	~~Suministro e instalación de señalética, de acuerdo con el diseño, tipología, cantidades, materiales y ubicación definidos por la Supervisión.~~	~~$ 3.715.525,00~~	~~2 días~~	~~lun 19/10/26~~	~~mar 20/10/26~~
74	**7**	**ADECUACIONES ESPACIO DE MEDITACIÓN**	**$ 659.373,44**	**128,25 días**	**mar 7/04/26**	**lun 17/08/26**
75	7.1	Desmonte de divisiones en vidrio existente, incluye perfilería y accesorios; Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición en sitio definido por la supervisión.	$ 659.373,44	10 días	mar 7/04/26	jue 16/04/26
76	~~7.2~~	~~Desmonte de pisos granulados en epdm, incluye base de soporte; Incluye trasiego, cargue, retiro y disposición final de residuos en botadero autorizado.~~	~~$ 287.135,77~~	~~10 días~~	~~sáb 25/07/26~~	~~mar 4/08/26~~
77	~~7.3~~	~~Suministro, e instalación de perfilería estructural en aluminio anodizado rectangular de 5 cm x 12 cm, calibre o espesor mínimo de 2 mm, conforme a lo indicado por la supervisión, incluye anclajes mecánicos de acero inoxidable, escuadras de fijación, tapo~~	~~$ 1.766.285,02~~	~~3 días~~	~~mar 4/08/26~~	~~vie 7/08/26~~
78	~~7.4~~	~~Suministro e instalación de división muro en vidrio templado e= 1,0 cm, incluye las perforaciones para soportes, también las chapetas en acero, pivotes, bisagra, etc. y los bujes y elementos de acero. incluye cordón de silicona y película tipo sand blasti~~	~~$ 14.435.784,44~~	~~3 días~~	~~vie 7/08/26~~	~~mar 11/08/26~~
79	~~7.5~~	~~Suministro, e instalación de una puerta de acceso en vidrio templado incoloro de seguridad, conformada por dos hojas batientes de 0,61 m de ancho cada una, con una altura total de 2,50 m. El sistema incluye todos los herrajes en acero inoxidable, cerradur~~	~~$ 2.564.712,29~~	~~3 días~~	~~mar 11/08/26~~	~~jue 13/08/26~~

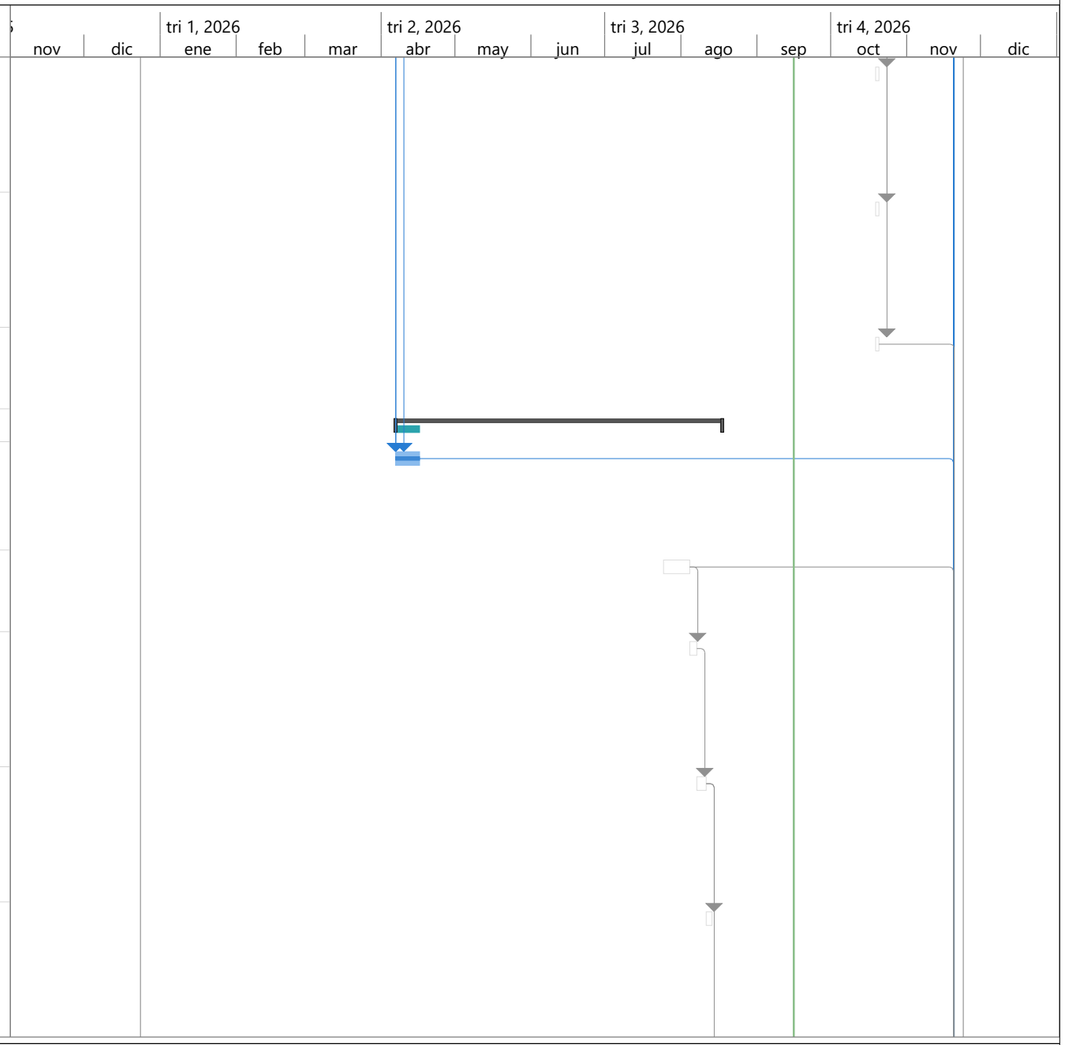


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

PROGRAMACIÓN DE OBRA CTO CO1.PCCNTR.8724607 de 2025 de 2025

CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARA EL COMEDOR, PASILLOS, ESPACIO DE MEDITACIÓN Y DEMÁS ZONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
80	~~7.6~~	~~Suministro, e instalación de una puerta de acceso en vidrio templado incoloro de seguridad, conformada por una hoja batiente de 0,8 m. de ancho, con una altura de 2,50 m. El sistema incluye todos los herrajes en acero inoxidable, cerradura de embutir o ti~~	~~$ 1.440.462,44~~	~~3 días~~	~~mar 11/08/26~~	~~jue 13/08/26~~
81	~~7.7~~	~~Suministro e instalación de estructura de soporte piso Deck en tubulares de acero galvanizado .04 x .04 cal. 16 c/.40 incluye elementos de fijación.~~	~~$ 4.056.887,79~~	~~2 días~~	~~jue 13/08/26~~	~~sáb 15/08/26~~
82	~~7.8~~	~~Suministro e instalación de piso tipo Deck en WPC sólido, estilo Deck Antigüedad Romana (Acabado tipo madera natural, con protección UV); incluye todos los componentes de fijación y terminación.~~	~~$ 10.156.608,00~~	~~2 días~~	~~jue 13/08/26~~	~~sáb 15/08/26~~
83	~~7.9~~	~~Suministro e instalación de cielorraso en Drywall RH, incluye estructura en aluminio, pintura y dilataciones, en donde lo indique la supervisión.~~	~~$ 7.191.682,03~~	~~2 días~~	~~sáb 15/08/26~~	~~mar 18/08/26~~
84	~~7.10~~	~~suministro e instalación de luminarias led de 50 x 50 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 3200 Lumenes 40w Luz fría).~~	~~$ 1.246.905,00~~	~~1 día~~	~~sáb 15/08/26~~	~~lun 17/08/26~~
85	~~7.11~~	~~Suministro y montaje de matera ornamental en Cemento Portland Tipo I, reforzada con malla semiacerada; impermeabilizada en su interior con Sika y con recubrimiento para unificación de color. Apariencia acanalada con dimensiones de 1 m de longitud, 0.30 m~~	~~$ 3.778.500,00~~	~~1 día~~	~~sáb 15/08/26~~	~~lun 17/08/26~~
86	**8**	**ASEO GENERAL**	**$ 951.441,41**	**2 días**	**vie 20/11/26**	**sáb 21/11/26**
87	8.1	Aseo general en todas las áreas intervenidas de la ob	$ 951.441,41	2 días	vie 20/11/26	sáb 21/11/26
88		FIN DE ACTIVIDADES	$ 0,00	0 días	lun 23/11/26	lun 23/11/26

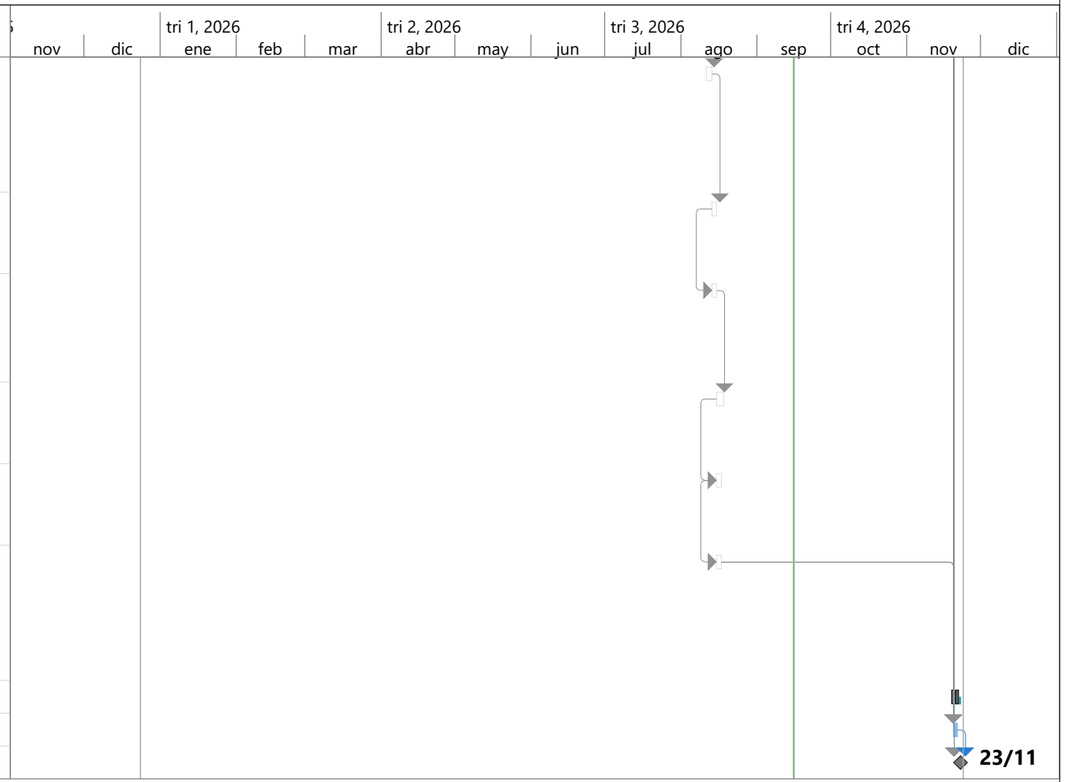

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	Atraso
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
