INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGÚN ACTA DE RECIBO

1. DATOS PERSONALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	FECHA INICIO: 02/07/2026 FECHA FINAL: 21/08/2026	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%
EL CONTRATISTA PRESENTA INFORME	SI [X]	NO [ ]

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO No:	MS-SAMC-008-2026
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	26 DE JUNIO DEL 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ NIT No. 800.019.846-1 R/L HECTOR DAVID AMADO SIERRA C.C No 1.056.482.015 de Sáchica.
CONTRATISTA	INGECOM S&D S.A.S 901366179-9 NEIDER SUAREZ ALVARADO 23.292.660 expedida en Sora
OBJETO:	CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA- BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y TRES CENTAVOS ($96.700.087,33) M/cte
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y TRES CENTAVOS ($96.700.087,33) M/cte
PLAZO INCIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
PRÓRROGA 001	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO:	02 DE JULIO DEL 2026
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN 2024-2027	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se realizaron modificaciones a las cantidades iniciales contratadas para quedar de la siguiente manera.

CANTIDADES CONTRACTUALES

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES				
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1		**DESMONTE Y EXCAVACIÓN**				
1.1	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	202,80	$ 34.941,70	$ 7.086.176,76
2		**INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO**				
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	40,00	$ 98.804,56	$ 3.952.182,40
2.2	2.05.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	72,00	$ 287.285,25	$ 20.684.538,00
2.3	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	10,00	$ 168.262,39	$ 1.682.623,90
3		**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**				
3.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	71,14	$ 161.448,48	$ 11.485.444,87
3.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	125,68	$ 155.896,79	$ 19.593.108,57
4		**TRANSPORTE**				
4.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	1574,56	$ 3.494,63	$ 5.502.504,61
5		**PAVIMENTO**				
5.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	135,20	$ 197.585,12	$ 26.713.508,22
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 96.700.087,33**
		ADMINISTRACION		**A**	**20%**	
		IMPREVISTOS		**I**	**5%**	
		UTILIDAD		**U**	**5%**	
		VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 96.700.087,33**

CANTIDADES MODIFICADAS

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. TOTAL	
1		**DESMONTE Y EXCAVACIÓN**				
1.1	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	116,32	$	4.064.418,54
2		**INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO**				
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	51,10	$	5.048.913,02
2.2	2.05.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	73,00	$	20.971.823,25
2.3	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	9,00	$	1.514.361,51
3		**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**				
3.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	49,51	$	7.993.314,24
3.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	97,90	$	15.262.295,74
4		**TRANSPORTE**				
4.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	1179,28	$	4.121.147,27
5		**PAVIMENTO**				
5.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	140,29	$	27.719.216,48
6		**ITEMS NO PREVISTOS**				
6,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	53,40	$	4.899.853,77
6,2	2.02.02	CAJAS DE ISPECCION EN LADRILLO DE 0.6*0.6*0.6 M. (NO INCLUYE TAPA)	UND	6,00	$	3.316.772,40
6,3	2.02.41	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	6,00	$	864.052,50
6,4	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	$	732.633,53
6,5	2.02.42	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	1,00	$	191.285,08
		TOTAL COSTO DIRECTO			**$**	**96.700.087,33**
		ADMINISTRACION	**A**	**20%**		
		IMPREVISTOS	**I**	**5%**		
		UTILIDAD	**U**	**5%**		
		VALOR TOTAL DE LA OBRA			**$**	**96.700.087,33**

4. DINEROS CANCELADOS AL CONTRATISTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.700.087,33	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 96.700.087,33	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 96.528.158,47
VALOR NO EJECUTADO		$ 171.928,86
VALOR ACTAS ANTERIORES		$0,00

5. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La contratista anexa pago de seguridad social con planillas

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se relacionan las actividades recibidas según acta de recibo.

CANTIDADES RECIBO

ITEM	PRECIO GOBERNAC	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1		**DESMONTE Y EXCAVACIÓN**				
1.1	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	116,32	$ 34.941,70	$ 4.064.418,54
2		**INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO**				
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	51,10	$ 98.804,56	$ 5.048.913,02
2.2	2.05.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	73,00	$ 287.285,25	$ 20.971.823,25
2.3	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	9,00	$ 168.262,39	$ 1.514.361,51
3		**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**				
3.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	49,51	$ 161.448,48	$ 7.993.314,24
3.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	97,90	$ 155.896,79	$ 15.262.295,74
4		**TRANSPORTE**				
4.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	1179,28	$ 3.494,63	$ 4.121.147,27
5		**PAVIMENTO**				
5.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	140,29	$ 197.585,12	$ 27.719.216,48
6,0		**ITEMS NO PREVISTOS**				
6,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	51,53	$ 91.750,92	$ 4.727.924,91

6,2	2.02.02	CAJAS DE ISPECCION EN LADRILLO DE 0.6*0.6*0.6 M. (NO INCLUYE TAPA)	UND	6,00	$ 552.795,40	$ 3.316.772,40
6,3	2.02.41	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	6,00	$ 144.008,75	$ 864.052,50
6,4	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	$ 732.633,53	$ 732.633,53
6,5	2.02.42	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	1,00	$ 191.285,08	$ 191.285,08
		VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 96.528.158,47**

1. DESMONTE Y EXCAVACIÓN

1.1 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
Se realizaron las excavaciones mecánicas para la red principal a lo largo del tramo reconstruido. 116.32 m3





2. INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"
Se realizo el suministro e instalación de tubería de 6 pulgadas para las zonas de conexión de cometidas. 51.10 ML





2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"
Se realiza la instalación de tubería de 12 pulgadas como red principal de red de alcantarillado. 73 ML




2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"
Se realizo la instalación de sillas yee de 12 a 6 pulgadas en las acometidas de cada una de los beneficiarios. 9 UND




3. AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.1 RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.
Se realizo el relleno de arena de peña con el fin de realizar el atraque de la red principal y acometidas. 49.51 m3




3.2 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
Se realizo el relleno con material de afirmado y compactado con el fin de realizar la nivelacion de la red principal y acometidas. 97.90 Ml




4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.


Se realizo el transporte de material de agregado desde la cantera a la zona de construcción. 1179,28 M3




5. PAVIMENTO

5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)


Se realizo suministro de adoquín para Re parcheo de la malla vial de la zona del proyecto. 140.29 m2

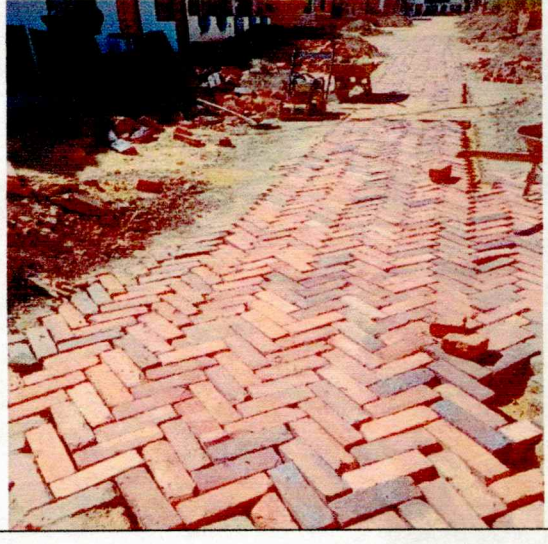



6. ITEMS NO PREVISTOS

6.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

Se realizo las excavaciones manuales de material común en las zonas de acometidas domiciliarias.51.53m3

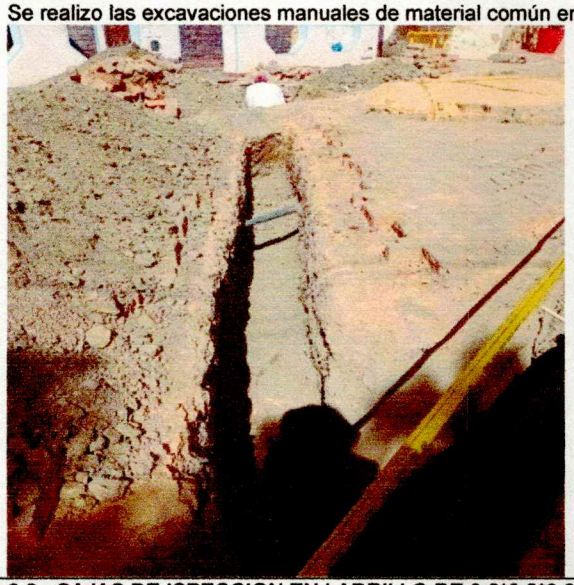

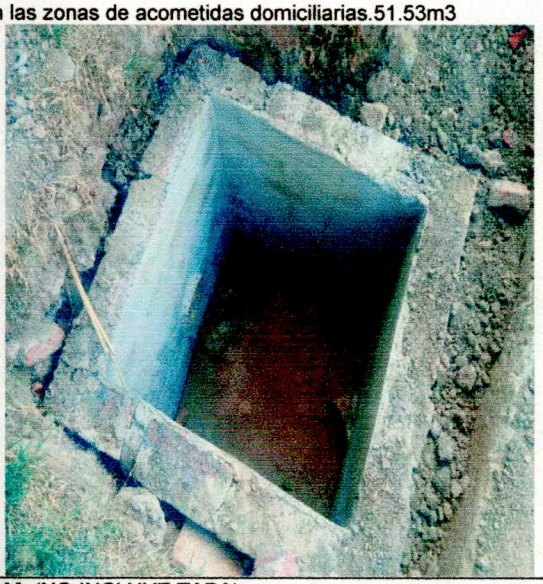

6.2 CAJAS DE ISPECCION EN LADRILLO DE 0.6*0.6*0.6 M. (NO INCLUYE TAPA)

Se realizo la construcción de cajas de inspección en cada una de las acometidas. 6 unds





6.3 TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

Se realizó la construcción de tapas para cajas de inspección, construidas en concreto. 6 unds





6.4 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
Se realizo la construcción de cajas de inspección en cada una de las acometidas. 1 unds



6.5 TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"
Se realizó la construcción de tapas para cajas de inspección, construidas en concreto. 1 unds



7. CUMPLIMIENTO

No se realizaron llamados de atención, ni requerimientos por posibles incumplimientos de las actividades contratadas por el profesional.

8. CONCLUSIÓN

El supervisor del contrato determina el cumplimiento del contrato por parte del contratista en el Acta de Recibo
Teniendo en cuenta el balance realizado, quedo saldo a favor al municipio por actividades no realizadas en su totalidad

El presente informe se realiza en Sáchica, a los Diez (10) días del mes de Septiembre de 2026

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
(SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS)
Supervisor

Proyectó: Hugo Nicolas Medina Rodriguez- Apoyo Secretaria de Planeación y obras Públicas
Revisó: Robinson German Nova Jerez- Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó: Robinson German Nova Jerez- Secretario de Planeación y obras Públicas

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SECRETARIO ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ de Sáchica Boyacá, y actuando como Supervisor del contrato de obra Nº **MS-SAMC-008-2026** ***cuyo*** objeto es **CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA- BOYACÁ**

CERTIFICA

Que el contratista INGECOM S&D S.A.S con Nit 901366179-9 y su representante legal NEIDER SUAREZ ALVARADO identificada con Cc. 23.292.660 expedida en Sora en Calidad de Contratista, ejecutó el contrato de **CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA- BOYACÁ** en modalidad de Contratación de selección abreviada, en el periodo comprendido el día 02 DE JULIO DE 2026 A 21 DE AGOSTO DE 2026, realizando a satisfacción cada uno de los ítems contratados.

Esta certificación se expide a los DIEZ (10) días del mes de septiembre del 2026, en el municipio de Sáchica (Boyacá).

Cordialmente,

ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas
