# INFORME DE INTERVENTORIA No. 40

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

## CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

## PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

## INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

## CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

## FECHA: AGOSTO 31 DE 2026

**INFORME DE INTERVENTORIA No. 40**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022**

**CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

**INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI**

**CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**

**FECHA: AGOSTO 31 DE 2026**

**NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**

**FIRMA: _____**
**Representante de la Interventoria**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **AGOSTO 31 DE 2026** | **PERIODO:** | **01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026** |
| **INFORME No.** | **40** | | |
| **CONTRATO: 2000.13.12.005-2022** | | | |

**CONTENIDO**

| ÍTEM | DESCRIPCION | SE REQUIERE S/N | CUMPLE S/N | OBSERVACIONES | ACCIONES A SEGUIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMACION GENERAL | S | S | | |
| 1.1 | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | S | S | | |
| 2 | CONTROL DE GARANTIAS | S | S | | |
| 2.1 | SANCIONES | N | N | | |
| 3 | CONTROL FINANCIERO | S | S | | |
| 4 | CONTROL DE EJECUCION | S | S | | |
| 4,1 | CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO | s | S | | |
| 5 | ANEXOS | S | S | | |
| 5.1 | ASPECTOS TECNICOS | S | S | | |
| 5.2 | CONTROL DE CALIDAD | S | S | | |
| 5.3 | ASPECTOS AMBIENTALES | S | S | | |
| 5.4 | ASPECTOS SOCIALES | S | S | | |
| 5.5 | PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS | S | S | | |
| 5.6 | RECURSO HUMANO | S | S | | |
| 5.7 | MAQUINARIA Y EQUIPO | S | S | | |
| 5.8 | REGISTRO FOTOGRAFICO | S | S | | |
| 5.9 | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | S | S | | |
| 5.10 | INFORME DEL CONTRATISTA | S | S | | |
| 6 | ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO | S | S | | |
| 7 | CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES | S | S | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |

| | |
|---|---|
| INFORME No. 40 | PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | OBRA | X | OTRO | ESPECIFIQUE: |

## 1. INFORMACION GENERAL

| 1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA | 1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA |
|---|---|
| CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022 | CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO:REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA | OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA." |
| CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI | CONTRATISTA:CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE |
| REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ | REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL |
| PLAZO INICIAL: 16 MESES | PLAZO INICIAL: 13 MESES |
| ACTA DE INICIO:01-DICIEMBRE-2022 | ACTA DE INICIO:01 DICIEMBRE 2022 |
| VALOR INICIAL: $ 1.502.246.766 | VALOR INICIAL: $ 29.432.080.933 |
| CDR INICIAL No. 13041 | CDR INICIAL No. 13039 - 13040 |
| FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024 | FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024 |
| FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023 |
| VALOR ADICION (ES): $ 131.126.000 | VALOR ADICION (ES): $N/A |
| CDR OTRO SI (1) No.16431 | CDR OTRO SI (1) No.N/A |
| VALOR ACTUAL:$ 1.633.372.766 | VALOR ACTUAL: $29.432.080.933 |
| PLAZO ADICIONAL: N/A | PLAZO ADICIONAL: N/A |
| FECHA DE TERMINACION: N/A | FECHA DE TERMINACION: N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A |
| VALOR ADICION (ES): $ N/A | VALOR ADICION (ES): $2.571.146.616 |
| CDR OTRO SI (2) No.N/A | CDR OTRO SI (2) No.16430 |
| VALOR ACTUAL: $N/A | VALOR ACTUAL: $32.003.227.549 |
| PLAZO ADICIONAL: N/A | PLAZO ADICIONAL: N/A |
| FECHA DE TERMINACION: N/A | FECHA DE TERMINACION: |
| FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 10 JULIO 2025 | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 08 JULIO 2025 |
| VALOR ADICION (ES): $ 690.624.799 | VALOR ADICION (ES): $ 13.531.646.339 |
| CDR OTRO SI (3) No.N/A | CDR OTRO SI (3) No. |
| VALOR ACTUAL: $ 2.323.997.565 | VALOR ACTUAL: $45.534.873.888 |
| PLAZO ADICIONAL: SIETE MESES | PLAZO ADICIONAL: NUEVE MESES |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-SEPTIEMBRE-2024 | FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024 |
| FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023 | FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023 |
| FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024 | FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024 |
| PLAZO ADICIONAL No. 01: 15-ABRIL-2025 | PLAZO ADICIONAL No. 01: 14-MARZO-2025 |
| PLAZO ADICIONAL No. 02: 22 DE FEBRERO DE 2026 | PLAZO ADICIONAL No. 02: 22-ENERO-2026 |
| PLAZO ADICIONAL No. 03: 22 DE AGOSTO DE 2026 | PLAZO ADICIONAL No. 03: 22-JULIO-2026 |
| PLAZO ADICIONAL No. 04: 22 DE FEBRERO DE 2027 | PLAZO ADICIONAL No. 04: 22-ENERO-2027 |

## DATOS DE LA SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando | DIEGO JOSÉ CALDERÓN VILLANUEVA |
| Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. que conoció de la ejecución del contrato | HOLMES ZUÑIGA GARCIA |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORÍA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| INFORME No. 40 | | PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | OBRA | X | OTRO | | ESPECIFIQUE: |

## 1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|
| **Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.** | **SI** | | |
| **Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.** | **SI** | | |
| **Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria.** | **SI** | | |

| Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. | SI | | |
| 2. | Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación | SI | | |
| 3. | Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. | SI | | |
| 4. | Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. | SI | | |
| 5. | Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | SI | | |
| 6. | Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique intervenciones). | SI | | |
| 7. | Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selecci6n en los plazos acordados con la Entidad. | SI | | |
| 8. | Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. | SI | | |
| 9. | Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. | SI | | |
| 10. | Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. | SI | | |
| 11. | Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. | N/A | | |
| 12. | Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. | SI | | |
| 13. | Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). | SI | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la informacion relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. | SI | | |
| 15. | Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. | SI | | |
| 16. | Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. | N/A | | |
| 17. | El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripcion del contrato. | SI | | |
| 18. | El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de obra contratada por la entidad. | SI | | |
| 19. | El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos par la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. | SI | | |
| 20. | Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisicion de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| 21. | Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. | SI | | |
| 22. | Estar en permanente comunicaci6n con el interventor del contrato. | SI | | |
| 23. | Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. | SI | | |
| 24. | Disponer del personal idóneo, así coma de las recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. | SI | | |
| 25. | Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido par el contratante. | SI | | |
| 26. | Cumplir con las normas de gestión ambiental, así coma con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27. | Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. | SI | | |
| 28. | Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. | SI | | |
| 29. | Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante. | SI | | |
| 30. | Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. | SI | | |
| Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i) | | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv) |
| OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRA TIVO: | | | | |
| 1. informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o case fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato. | | SI | | |
| 2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. | | SI | | |
| 3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes. | | SI | | |
| 4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual. | | SI | | |
| 5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelacion al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepcion de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad. | | SI | | |
| 6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato. | | SI | | |
| 7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). | | SI | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. | SI | | |
| 9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo. | SI | | |
| 10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasion del contrato. | N/A | | |
| 11. Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contratacion. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio para el pago del RETEICA | SI | | |
| OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. | | | |
| 1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente. | SI | | |
| 2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista. | SI | | |
| 3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista. | SI | | |
| 4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). | SI | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. | SI | | |
| 6. También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. | N/A | | |
| 7. De presentarse atraso en la programaci6n inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañadas y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras. | N/A | | |
| 8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. | SI | | |
| 9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluacion de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| 10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, yen general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| 11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) das siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| 12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y)o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| 13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados fines y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.** | **N/A** | | |
| **15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.** | **SI** | | |
| **16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizara y validara, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sino existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.** | **N/A** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande. | SI | | |
| 18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista. | N/A | | |
| 19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier memento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | SI | | |
| 20. No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato. | SI | | |
| 21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.requeridos para la construccion de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realizacion de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoria, el contratante o sus representantes. | N/A | | |
| 22. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | SI | | |
| 23. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfeccion de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | N/A | | |
| 24. Entregar al contratante los planos record de la obra. | N/A | | |
| 25. Entregar las instalaciones construidas y funcionando. | N/A | | |
| 26. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| 27. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratacion el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región. | SI | | |
| 28. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa. | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro: | SI | | |
| PLAN DE TRABAJO DE OBRA | | | |
| VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO | SI | | |
| PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SI | | |
| PLAN DE GESTIÓN SOCIAL | SI | | |
| INFORME DE LABORES | SI | | |
| BITÁCORA | SI | | |
| ÍTEMS NO PREVISTOS | SI | | |
| INFORME FINAL | N/A | | |
| Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuacion se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serializacion Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales. | SI | | |
| Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente. | N/A | | |
| Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia. | SI | | |
| En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliacion y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato.. | N/A | | |
| Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante | SI | | |
| En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia. | SI | | |
| La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas. | SI | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía. | SI | | |
| Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de transito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado tecnico-mecanico. | SI | | |
| Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista. | SI | | |
| Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitacion que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada | SI | | ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN |
| El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevenci6n. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las serial luminosas deben ser de luz opaca. | SI | | |
| Apoyar en el tramite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato. | SI | | |
| Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc. | SI | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.** | **SI** | | |
| **Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de direccion del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicacion a la comunidad.** | **SI** | | |
| **EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Municipal o a terceros** | **SI** | | |

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |

INFORME No. 40 | PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

## 2. CONTROL DE GARANTIAS

### 2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

| Amparo | Valor Asegurado | No. Poliza | Compañia Aseguradora | Vigencia | | Amparo | Valor Asegurado | No. Poliza | Compania Aseguradora | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta | | | | | Desde | Hasta |
| **Cumplimiento** | $ 150.224.676,60 | C-100050628 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 24-Sep-24 | **Cumplimiento** | $ 5.886.416.186,60 | C-100050102 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 31-May-24 |
| SUSPENSION 1 | $ 150.224.676,60 | C-100050628 ANEXO 1 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Jul-23 | 30-Nov-24 | SUSPENSION 1 | $ 5.886.416.186,60 | C-100050102 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Jul-23 | 1-Sep-24 |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 150.224.676,60 | C-100050628 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Sep-23 | 31-Dec-24 | AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 5.886.416.186,60 | C-100050102 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Sep-23 | 1-Oct-24 |
| AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 150.224.676,60 | C-100050628 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Oct-23 | 31-Jan-25 | AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 5.886.416.186,60 | C-100050102 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Oct-23 | 1-Nov-24 |
| AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 150.224.676,60 | C-100050628 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 14-Mar-25 | AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 5.886.416.186,60 | C-100050102 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 14-Dec-24 |
| REINICIO | $ 150.224.676,60 | C-100050628 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Mar-25 | REINICIO | $ 5.886.416.186,60 | C-100050102 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Dec-24 |
| ADICIONAL EN VALOR | $ 163.337.276,00 | C-100050628 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 5-Feb-24 | 14-Mar-25 | ADICIONAL EN VALOR | $ 6.400.645.515,80 | C-100050102 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 2-Feb-24 | 14-Dec-24 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 163.337.276,00 | C-100050628 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 6-Sep-24 | 15-Oct-25 | PLAZO ADICIONAL | $ 6.400.645.515,80 | C-100050102 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Jun-24 | 14-Sep-25 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 163.337.276,60 | C-100050628 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 25-Mar-25 | 22-Aug-26 | PLAZO ADICIONAL | $ 6.400.645.509,80 | C-100050102 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Mar-25 | 22-Jul-26 |
| ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 232.399.756,50 | C-100050628 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 9-Jul-25 | 22-Aug-26 | ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 9,106,974,777,60 | C-100050102 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 4-Jul-25 | 22-Jul-26 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 232.399.756,50 | C-100050628 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Feb-26 | 22-Feb-27 | PLAZO ADICIONAL | $ 9,106,974,777,60 | C-100050102 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 21-Jan-26 | 22-Jan-27 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 232.399.756,50 | C-100050628 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 4-Aug-26 | 22-Aug-27 | PLAZO ADICIONAL | $ 9,106,974,777,60 | C-100050102 ANEXO 12 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jul-26 | 22-Jul-27 |
| **Buen Manejo del Anticipo** | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 24-Sep-24 | **Buen Manejo del Anticipo** | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 31-May-24 |
| SUSPENSION 1 | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 1 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 30-Nov-24 | SUSPENSION 1 | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Jul-23 | 1-Sep-24 |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Sep-23 | 31-Dec-24 | AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Sep-23 | 1-Oct-24 |
| AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Oct-23 | 31-Jan-25 | AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Oct-23 | 1-Nov-24 |
| AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 14-Mar-25 | AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 14-Dec-24 |
| REINICIO | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Mar-25 | REINICIO | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Dec-24 |
| ADICIONAL EN VALOR | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 5-Feb-24 | 14-Mar-25 | ADICIONAL EN VALOR | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 2-Feb-24 | 14-Dec-24 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 450.674.030,80 | C-100050628 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 6-Sep-24 | 15-Oct-25 | PLAZO ADICIONAL | $ 8.829.624.297,90 | C-100050102 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Jun-24 | 14-Sep-25 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 450.647.029,80 | C-100050628 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 25-Mar-25 | 22-Aug-26 | PLAZO ADICIONAL | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Mar-25 | 22-Jul-26 |
| ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 450.647.029,80 | C-100050628 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 9-Jul-25 | 22-Aug-26 | ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 4-Jul-25 | 22-Jul-26 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 450.647.029,80 | C-100050628 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Feb-26 | 22-Feb-27 | PLAZO ADICIONAL | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 21-Jan-26 | 22-Jan-27 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 450.647.029,80 | C-100050628 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 4-Aug-26 | 22-Aug-27 | PLAZO ADICIONAL | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 12 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jul-26 | 22-Jul-27 |
| **Salarios y Prestaciones Sociales** | $ 75.112.338,30 | C-100050628 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 24-Mar-27 | **Salarios y Prestaciones Sociales** | $ 1.471.604.046,65 | C-100050102 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 30-Nov-26 |
| SUSPENSION 1 | $ 75.112.338,30 | C-100050628 ANEXO 1 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Jul-23 | 31-May-27 | SUSPENSION 1 | $ 1.471.604.046,65 | C-100050102 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Jul-23 | 1-Sep-27 |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 75.112.338,30 | C-100050628 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Sep-23 | 30-Jun-27 | AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 1.471.604.046,65 | C-100050102 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Sep-23 | 1-Apr-27 |
| AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 75.112.338,30 | C-100050628 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Oct-23 | 31-Jul-27 | AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 1.471.604.046,65 | C-100050102 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Oct-23 | 1-May-27 |
| AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 75.112.338,30 | C-100050628 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 14-Sep-27 | AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 1.471.604.046,65 | C-100050102 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 27-Nov-23 | 14-Jun-27 |
| REINICIO | $ 75.112.338,30 | C-100050628 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Sep-27 | REINICIO | $ 1.471.604.046,65 | C-100050102 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Jun-27 |
| ADICIONAL EN VALOR | $ 81.668.638,00 | C-100050628 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 5-Feb-24 | 14-Sep-27 | ADICIONAL EN VALOR | $ 1.600.161.378,95 | C-100050102 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 2-Feb-24 | 14-Jun-27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO ADICIONAL | $ 81.668.639,00 | C-100050628 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 6-Sep-24 | 15/94/2028 | PLAZO ADICIONAL | $ 1.600.161.378,95 | C-100050102 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Jun-24 | 14-Mar-28 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 81.668.638,30 | C-100050628 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 25-Mar-25 | 22-Feb-29 | PLAZO ADICIONAL | $ 1.600.161.377,45 | C-100050102 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Mar-25 | 22-Jan-29 |
| ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 116.199.878,25 | C-100050628 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 9-Jul-25 | 22-Aug-26 | ADICIONAL EN VALOR 2 | $2,276,743,694,40 | C-100050102 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 4-Jul-25 | 22-Jan-29 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 116.199.878,25 | C-100050628 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Feb-26 | 22-Aug-29 | PLAZO ADICIONAL | $ 2.276.743.694,40 | C-100050102 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 21-Jan-26 | 22-Jul-29 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 116.199.878,25 | C-100050628 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 4-Aug-26 | 22-Feb-30 | PLAZO ADICIONAL | $ 2.276.743.694,40 | C-100050102 ANEXO 12 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jan-27 | 22-Jan-30 |
| **Calidad del Servicio** | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Mar-24 | 24-Mar-29 | **Estabilidad** | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 30-Nov-23 | 30-Nov-28 |
| SUSPENSION 1 | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 1 | SEGUROS MUNDIAL | 31-May-24 | 31-May-29 | SUSPENSION 1 | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 1-Mar-24 | 1-Mar-29 |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 30-Jun-24 | 30-Jun-29 | AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 1-Apr-24 | 1-Apr-29 |
| AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Jul-24 | 31-Jul-29 | AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 1-May-24 | 1-May-29 |
| AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Sep-24 | 14-Sep-29 | AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Jun-24 | 14-Jun-29 |
| REINICIO | $ 450.674.029,80 | C-100050628 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Sep-24 | 14-Sep-29 | REINICIO | $ 8.829.624.279,90 | C-100050102 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Jun-24 | 14-Jun-29 |
| ADICIONAL EN VALOR | $ 490.011.829,00 | C-100050628 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Sep-24 | 14-Sep-29 | ADICIONAL EN VALOR | $ 9.600.958.273,70 | C-100050102 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Jun-24 | 14-Jun-29 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 490.011.830,00 | C-100050628 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 15-Apr-24 | 15-Apr-30 | PLAZO ADICIONAL | $ 9.600.958.273,70 | C-100050102 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 14-Mar-25 | 14-Mar-30 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 490.011.829,80 | C-100050628 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Feb-26 | 22-Feb-31 | PLAZO ADICIONAL | $ 9.600.968.264,70 | C-100050102 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jan-26 | 22-Jan-31 |
| ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 697.199.269,50 | C-100050628 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Feb-26 | 22-Feb-31 | ADICIONAL EN VALOR 2 | $13,660,462,166,40 | C-100050102 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jan-26 | 22-Jan-31 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 697.199.269,50 | C-100050628 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Aug-26 | 22-Aug-31 | PLAZO ADICIONAL | $ 13.660.462.166,40 | C-100050102 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jul-26 | 22-Jul-31 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 697.199.269,50 | C-100050628 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Feb-27 | 22-Feb-32 | PLAZO ADICIONAL | $ 13.660.462.166,40 | C-100050102 ANEXO 12 | SEGUROS MUNDIAL | 22-Jan-27 | 22-Jan-32 |
| **Responsabilidad Civil extracontractual** | $ 348.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 24-Mar-24 | **Responsabilidad Civil extracontractual** | $ 1.471.604.046,65 | C-100012551 ANEXO 0 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 30-Nov-23 |
| SUSPENSION 1 | $ 348.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 1 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 31-May-24 | SUSPENSION 1 | $ 1.471.604.046,65 | C-100012551 ANEXO 1 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 1-Mar-24 |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 348.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 30-Jun-24 | AMPLIACION 1 SUSPENSION | $ 1.471.604.046,65 | C-100012551 ANEXO 2 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 1-Apr-24 |
| AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 348.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 31-Jul-24 | AMPLIACION 2 SUSPENSION | $ 1.471.604.046,65 | C-100012551 ANEXO 3 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 1-May-24 |
| AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 348.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 14-Sep-24 | AMPLIACION 3 SUSPENSION | $ 1.471.604.046,65 | C-100012551 ANEXO 4 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 14-Jun-24 |
| REINICIO | $ 348.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 10-Jan-24 | 14-Sep-24 | REINICIO | $ 1.471.604.046,65 | C-100012551 ANEXO 5 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 14-Jun-24 |
| ADICIONAL EN VALOR | $ 390.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 14-Sep-24 | ADICIONAL EN VALOR | $ 1.600.161.377,00 | C-100012551 ANEXO 6 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 14-Jun-24 |
| ADICIONAL EN VALOR | $ 390.000.000,00 | C-100012719 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 15-Apr-25 | ADICIONAL EN VALOR | $ 1.600.161.377,00 | C-100012551 ANEXO 7 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 14-Mar-25 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 427.050.000,00 | C-100012719 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 22-Feb-26 | PLAZO ADICIONAL | $ 1.600.161.377,00 | C-100012551 ANEXO 8 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 22-Jan-26 |
| ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 427.050.000,00 | C-100012719 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 22-Feb-26 | ADICIONAL EN VALOR 2 | $ 2.276.743.694,40 | C-100012551 ANEXO 9 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 22-Jan-26 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 427.050.000,00 | C-100012719 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 22-Aug-26 | PLAZO ADICIONAL | $ 2.276.743.694,40 | C-100012551 ANEXO 10 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 22-Jul-26 |
| PLAZO ADICIONAL | $ 427.050.000,00 | C-100012719 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 24-Nov-22 | 22-Feb-27 | PLAZO ADICIONAL | $ 2.276.743.694,40 | C-100012551 ANEXO 11 | SEGUROS MUNDIAL | 31-Oct-22 | 22-Jan-27 |

| **2.1 SANCIONES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Sancion** ( seleccionar con una x) | | **Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso** | **valor de la sanción impuesta** |
| Multa | | | |
| Cláusula Penal | | | |
| Caducidad | | | |
| Ninguna | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

INFORME No. 40 PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

## 3. CONTROL FINANCIERO

### 3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

| Concepto | Fecha d/m/a Acta | Valor del Acta | % Acumulado Acta | Amortización Anticipo | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo (30%) | 26/12/2022 | | % | | $ 450.674.029,8 |
| Acta No. 1 | 31-May-23 | $ 427.238.980 | 26,16% | $ 128.171.694 | $ 299.067.286 |
| Acta No. 2 | 30-Jun-23 | $ 45.217.628 | 2,77% | $ 13.565.288 | $ 31.652.340 |
| Acta No. 3 | 30-Mar-24 | $ 72.195.076 | 4,42% | $ 21.658.523 | $ 50.536.553 |
| Acta No. 4 | 14-Jun-24 | $ 18.783.787 | 1,15% | $ 5.635.136 | $ 13.148.651 |
| Acta No. 5 | 20-Jun-24 | $ 376.165.748 | 23,03% | $ 112.849.724 | $ 263.316.024 |
| Acta No. 6 | 16-Aug-24 | $ 30.870.745 | 1,89% | $ 9.261.224 | $ 21.609.521 |
| Acta No. 7 | 13-Sep-24 | $ 19.658.237 | 1,20% | $ 5.897.471 | $13.760.766 |
| Acta No. 8 | 30-Sep-24 | $ 35.139.507 | 2,15% | $ 10.541.852 | $24.597.655 |
| Acta No. 9 | 12-Nov-24 | $ 62.044.616 | 3,80% | $ 18.613.385 | $43.431.231 |
| Acta No. 10 | 2-Dec-24 | $ 105.486.042 | 6,46% | $ 31.645.813 | $73.840.229 |
| Acta No. 11 | 1-Feb-25 | $ 35.207.836 | 2,16% | $ 10.562.351 | $24.645.485 |
| Acta No. 12 | 13-Mar-25 | $ 117.987.100 | 7,22% | $ 35.396.130 | $82.590.970 |
| Acta No 13 | 15-Jul-25 | $ 84.651.904 | 3,64% | $ 25.395.571 | $59.256.333 |
| Acta No.14 | 13-Aug-25 | $ 215.730.600 | 9,28% | $ 21.479.868 | $194.250.732 |
| Acta No. 15 | 16/10/2025 | 27.254.704 | 1.17% | $ - | $27.254.704 |
| Acta No. 16 | 18/11/2025 | 37.648.761 | 1.62% | $ - | $37.648.761 |
| Acta No. 17 | 4/12/2025 | 22.020.655 | 0.95% | $ - | $22.020.655 |
| Acta No. 18 | 11/03/2026 | 36.826.266 | 1.59% | $ - | $36.826.266 |
| Acta No. 19 | 20/04/2026 | 25.602.869 | 1.1% | $ - | $25.602.869 |
| Acta No. 20 | 17/06/2026 | 23.478.627 | 1,01% | | |
| | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 1.819.209.688** | **78,30%** | **$ 450.674.029,8** | **$1.819.209.688** |

### 3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

| Concepto | Fecha d/m/a Acta | Valor Acta | % Acumulado Acta | Amortización Anticipo | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo ( 30 %) | 23/12/2022 | $N/A | % | | $ 8.829.624.297,9 |
| Acta No. 1 | 31-May-23 | $8.371.066.842 | 26,16% | $2.511.320.053 | $5.859.746.789 |
| Acta No. 2 | 30-Jun-23 | $886.015.856 | 2,77% | $265.804.757 | $620.211.099 |
| Acta No. 3 | 31-Jan-24 | $907.712.127 | 2,84% | $272.313.639 | $635.398.488 |
| Acta No. 4 | 30-Mar-24 | $503.892.952 | 1,57% | $151.167.886 | $352.725.066 |
| Acta No. 5 | 30-Apr-24 | $369.286.058 | 1,15% | $110.785.818 | $258.500.240 |
| Acta No. 6 | 31-May-24 | $7.371.115.364 | 23,03% | $2.211.334.610 | $5.159.780.754 |
| Acta No. 7 | 31-Jul-24 | $604.131.566 | 1,89% | $181.239.470 | $422.892.096 |
| Acta No. 8 | 31-Aug-24 | $385.455.620 | 1,20% | $115.636.686 | $269.818.934 |
| Acta No. 9 | 30-Sep-24 | $689.009.943 | 2,15% | $206.702.983 | $482.306.960 |
| Acta No. 10 | 8-Nov-24 | $1.216.561.098 | 3,80% | $364.968.330 | $851.592.768 |
| Acta No. 11 | 30-Nov-24 | $2.068.353.769 | 6,46% | $620.506.131 | $1.447.847.638 |
| Acta No. 12 | 28-Feb-25 | $690.349.724 | 2,16% | $207.104.917 | $483.244.807 |
| Acta No. 13 | 10-Mar-25 | $2.313.472.543 | 7,23% | $694.041.763 | $1.619.430.780 |
| Acta No. 14 | 15-Jul-25 | $ 1.659.841.253,00 | #¡DIV/0! | $497.952.376 | $1.161.888.877 |
| Acta No. 15 | 13-Aug-25 | $ 4.230.011.773,00 | 9,29% | $418.744.861 | $3.811.266.912 |
| Acta No. 16 | 30/09/2025 | $ 534.405.953 | 1.17% | $0 | $534.405.953 |
| Acta No. 17 | 18/11/2025 | $ 736.963.238 | 1.62% | $0 | $736.963.238 |
| Acta No. 18 | 25/11/2025 | $ 431.777.557 | 0,95% | $0 | $431.777.557 |
| Acta No. 19 | 11/03/026 | $ 722.083.648 | 1,59% | $0 | $722.083.648 |
| Acta No. 20 | 20/04/2026 | $ 502.017.049 | 1,10% | $0 | $502.017.049 |
| Acta No. 21 | 17/06/2026 | $ 460.365.240 | 1,01% | $0 | $460.365.240 |
| | | **$35.653.889.173** | **78,30%** | **$ 8.829.624.279,9** | **$26.824.264.893** |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |

INFORME No. 40 | PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

## 4. CONTROL DE EJECUCION

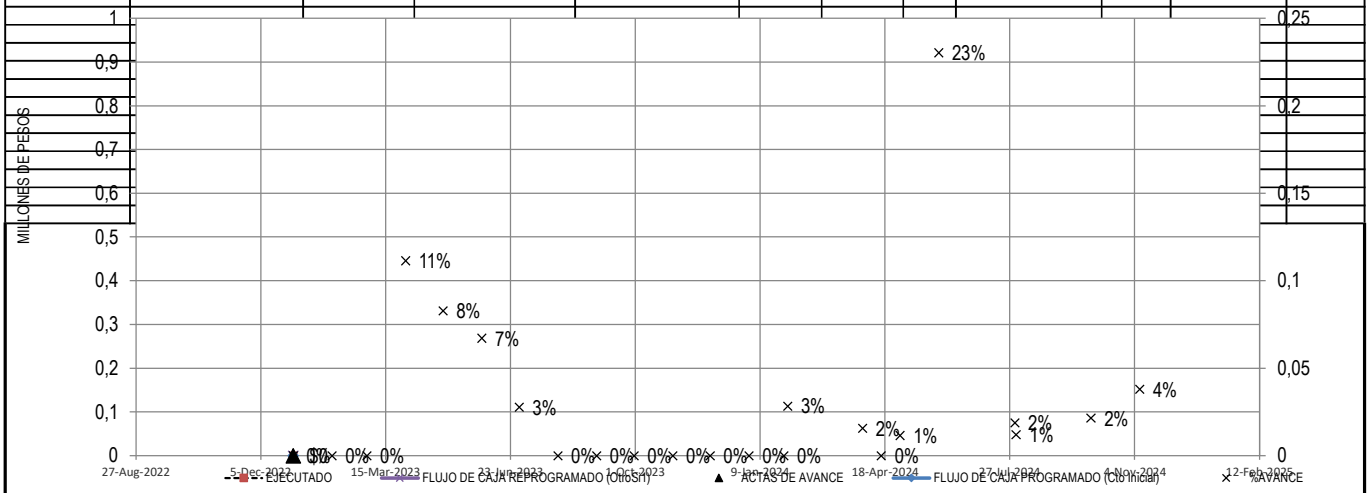


| FECHA | FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial) | FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1) | EJECUTADO | ACTAS DE AVANCE | %AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-22 | $ - | | | $ - | 0,00% |
| 31-Jan-23 | $ - | | $ - | | 0,00% |
| 28-Feb-23 | $ 62.322.903,31 | | $ - | | 0,00% |
| 31-Mar-23 | $ 111.845.778,94 | | $ 3.568.952.062,00 | | 11,15% |
| 30-Apr-23 | $ 161.373.885,25 | | $ 2.651.489.752,00 | | 8,29% |
| 31-May-23 | $ 2.705.571.148,99 | | $ 2.150.625.028,00 | $ 8.371.066.842,00 | 6,72% |
| 30-Jun-23 | $ 2.779.758.170,91 | | $ 886.015.856,00 | $ 886.015.856,00 | 2,77% |
| 31-Jul-23 | $ - | | $ - | $ - | 0,00% |
| 31-Aug-23 | $ - | | $ - | | 0,00% |
| 30-Sep-23 | $ - | | $ - | | 0,00% |
| 31-Oct-23 | $ - | | $ - | $ - | 0,00% |
| 30-Nov-23 | $ - | | $ - | | 0,00% |
| 31-Dec-23 | $ - | | $ - | | 0,00% |
| 28-Jan-24 | $ 3.291.610.390,55 | | | | 0,00% |
| 31-Jan-24 | $ 4.602.351.753,97 | | $ 907.712.127,00 | $ 907.712.127,00 | 2,84% |
| 31-Mar-24 | $ 5.056.692.137,71 | | $ 503.892.952,00 | $ 503.892.952,00 | 1,57% |
| 15-Apr-24 | $ 7.113.749.748,65 | | | | 0,00% |
| 30-Apr-24 | $ 5.630.651.827,13 | | $ 369.286.058,00 | $ 369.286.058,00 | 1,15% |
| 31-May-24 | $ 487.299.803,59 | | $ 7.371.115.364,00 | $ 7.371.115.364,00 | 23,03% |
| 31-Jul-24 | | | $ 604.131.566,00 | $ 604.131.566,00 | 1,89% |
| 1-Aug-24 | | | $ 385.455.620,00 | $ 385.455.620,00 | 1,20% |
| 30-Sep-24 | | | $ 689.009.943,00 | $ 689.009.943,00 | 2,15% |
| 8-Nov-24 | | | $ 1.216.561.098,00 | $ 1.216.561.098,00 | 3,80% |
| 30-Nov-24 | | | $ 2.068.353.769,00 | $ 2.068.353.769,00 | 6,46% |
| 28-Feb-25 | | | $ 690.349.724,00 | $ 690.349.724,00 | 2,16% |
| 31-Mar-25 | | | $ 2.313.472.543,00 | $ 2.313.472.543,00 | 7,23% |
| 31-Jul-25 | | | $ 1.659.841.253,00 | $ 1.659.841.253,00 | 3,22% |
| 31-Aug-25 | | | $ 4.230.011.773,00 | $ 4.230.011.773,00 | 9,29% |
| 30-Sep-25 | | | $ 534.405.953 | $ 534.405.953 | 1.17% |
| 30-Nov-25 | | | $ 736.963.238 | $ 736.963.238 | 1.62% |
| 30-Nov-25 | | | $ 431.777.557 | $ 431.777.557 | 0,95 |
| 11-Mar-26 | | | $ 722.083.648 | $ 722.083.648 | 1,59% |
| 20-Apr-26 | | | $ 502.017.049 | $ 502.017.049 | 1,10% |
| 17-Jun-26 | | | $ 460.365.240 | $ 460.365.240 | 1.01% |
| | $ 32.003.227.549,00 | | $ 45.534.873.888 | $ 45.534.873.888 | 78,30% |

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

1

**NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 78,3 % (CONSTRUCCION TANQUE PTAP GINEBRA, CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA , INTERVENCIONES FLOCULADORES , SEDIMENTADORES, UNIDADES DE FILTRACION , SOPLADORES, SISTEMA ELECTRICO EN LA PTAP GINEBRA Y FLOCULADORES , SEDIMENTADORES , UNIDADES FILTRACION MODULO B, SOPLADORES MODULOS A - B Y SISTEMA ELECTRICO EN LA PTAP DE GUACARÍ, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 14" TRAMO 3, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 10" TRAMO 2 , SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 18" TRAMO 1, CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA VALVULAS DE PURGA , VENTOSAS Y QUIEBRE DE PRESION EN EL TRAMO 3 )**

| | |
|---|---|
| INFORME No. 40 | PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |

## 5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Angela Rosa Chavez Martinez, con número de tarjeta profesional 273857-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

**Firma del Interventor Contrato No. _____**

| | |
|---|---|
| INFORME No 40 | PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |

## 6. ANEXOS

6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).

6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.

6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.

6.6 Recurso Humano ( interventoría , contratista ) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo ( interventoría , contratista ) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .

6.9 Informe del Contratista

## 6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO

Se continua en la instalacion de tuberia PEAD de 18 " Tramo 1 , entre las abcisas K2+600 a K2+910, durante las excavaciones hay presencia de material rocoso con medianos rendimientos en la instalacion , se debe solucionar con la Comunidad de Puente Rojo - Proterritorio, la continuidad con la instalacion de tuberia PEAD de 10" entre Villa Indigo (Alto ) a Puente Rojo y Cadica. Se encuentra en etapa de revision por parte de Vallecaucana de Aguas y la Interventoria el diseño del Ing. Carlos Valencia donde se va a implementar la malla Coanda, para evitar la construcción del desarenador.
Se encuentra en etapa final el presupuesto de la bocatoma.

## 7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

• Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

- PTAP de Guacarí: Filtración Modulo A con la intervencion de un filtro faltando dos filtros por intervenir , hay aprobacion Retie.
- PTAP de Ginebra: Esta en proceso el suministro de las valvulas para iniciar la instalacion de la tuberia de entrega y salida al tanque de almacenamiento
- Frente Familia Blum – Saavedra: A la espera de que la Comunidad deje laborar para continuar con la instalación tubería PEAD 10 “, desde Villa Indigo ( El Alto ) hasta llegar a la CADICA Tramo No. 02

• Con relación a los diseños de la Bocatoma, el contratista ya hizo entrega de los Estudios de Geología y Geotecnia, Diseño Hidráulico y Estructural de la Captación, Hidrulica Fluvial, Rediseño de Bocatoma, Vallecaucana de Aguas y la Interventoria Consorcio Interguacari termino de revisar los diseños estructurales con el Vo.Bo.
• Pendiente por entregar: Presupuesto de la Bocatoma y Malla Coanda

• El frente del Tramo 3 se continua con la construccion de camaras en concreto para valvulas de ventosas , purgas y quiebre de presion. Ademas se continua con pruebas hidrostaticas
• En el predio de la Familia Saavedra - Blum falta la prueba hidrulica en la Tubería PEAD 10” en una L: 600 ml.

• Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato
• Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado y permisos de demoliciones de pavimento ya hay resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra

• Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
• Continua suspendido por parte de la Comunidad desde el 20 de Enero 2026 la ejecucion de la obra en el tramo de Villa Indigo a Puente Rojo y no permitieron realizar ningun tipo de intervencion en la via a pesar que ya cuenta con la resolucion de la Alcaldia de Ginebra. El dia 06 de Mayo de 2026 ,integrantes de Proterritorio suspendio las labores de excavacion a maquina en el tramo No. 01 desde Batea Bananos a Puente Amarillo manifestando que Vallecaucana ha incumplido unos acuerdos que nada tiene que ver con el contrato de obra en ejecucion.

• Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
• Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

• Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 31 de Agosto de 2026:

AVANCE ( %)
FISICO : 81,0
FINANCIERO : 78,3

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

**ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME No. 40**

**I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| | **SEDIMENTADOR No. 3 - PTAP GINEBRA** | En servicio |
| | **SEDIMENTADOR No. 2 - PTAP GINEBRA** | En servicio |
| | **SEDIMENTADOR No. 1 - PTAP GINEBRA** | En servicio |
| | **Tanque de almacenamiento La Albania y Tanque Planta PTAP GINEBRA:** | Rellenos perimetrales en etapa de culminacion.<br>Actividades por ejecutar:<br><br>• Losa superior de cámaras de entrada y salida<br>• Instalación de sistema de válvulas<br>• Instalación tubería de desagüe<br>• Conexión al sistema existente |
| | **FILTRACION PTAP GINEBRA:** | Filtros: No. 1 , No. 02 y No. 03 se encuentran en servicio |
| | **CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GINEBRA:** | En servicio |
| | **MURO DE CONTENCIÓN - PTAP GINEBRA:** | En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo. El terreno es estable y no hay nigún tipo de riesgo en esta zona |
| | **LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 2** | Se termina la instalación tubería PEAD 10 ", en predio otorgado mediante Servidumbre por parte de la Familia Saavedra - Blum. Falta la prueba hidrostatica. Ademas falta tramo por instalar desde Villa Indigo hasta la CADICA |
| | **LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 3** | Se continua con la construccion de camaras en concreto para valvulas de ventosas , purgas y quiebre de presion<br>Estado General Tramo 3: se han instalado 7.567 ml en Tubería PEAD diámetro 14" |
| | **LINEA DE CONDUCCION - TRAMO 1** | Se continua la instalacion de tuberia PEAD 18 " entre las abscisas K2+600 y K2+910. Se continua con la construccion del carcamo en una longuitud de 24 ml como prueba piloto. Hay acceso vehicular en este sector. |
| | **CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GUACARÍ:** | Se ejecutaron las siguientes actividades:<br>- Instalación de la estructura metálica y cubierta<br>- Instalación de los dos sistemas de sopladores<br>- Instalación del sistema de tubería en acero inoxidable de 3 "para la inyección del aire a los filtros Modulos A y B |
| | **SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GUACARÍ:** | En servicio |
| | **SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GUACARÍ:** | En servicio |
| | **SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GUACARÍ:** | En servicio |
| | **SISTEMA ELECTRICO GUACARI** | La prueba Retie salio positiva. Esta a la espera de Celsia para conectar el sistema en definitivo a la red existente. |
| | **FILTRACION PTAP GUACARÍ:** | Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - Salieron positivas las pruebas con Acuavalle y estan en servicio<br><br>Acuavalle ya libero los filtros del Modulo A , se termino en el Filtro No. 01 las demoliciones de canaletas en concreto y retiro de material de filtracion: antracita y gravas, se instalo los falsos fondos |

**II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES ( ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)**

| No. | DESCRIPCION | | CONTENIDO |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. | 40 | SE ANEXA DOCUMENTO |
| 2 | INFORME No 40 DE INTERVENTORIA INCLUYE INFORME DE SST Y COMPONENTE SOCIAL | | SE ANEXA DOCUMENTO |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

**ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | AGOSTO 31 DE 2026 |
| **MATERIAL:** | |
| **CANTIDAD PARA PRUEBA:** | |
| **NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:** | |
| **LOCALIZACION:** | |
| **LABORATORIO:** | |
| **NORMA - ESPECIFICACION:** | |

| ÍTEM | ENSAYO REALIZADO | RESULTADO (Mpa) | ANALISIS RESULTADO | CUMPLE S/N | OBSERVACIONES | DECISIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Control de asentamiento (Tanque Ginebra) | | | | | |
| | Control de asentamiento (Tanque Albania) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

**ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES** **PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

**I. LICENCIAS AMBIENTALES**

| ITEM | DESCRIPCION | DETALLE |
|---|---|---|
| | INFORME AMBIENTAL | INFORMACION CONSIGNADA DENTRO DE LOS INFORMES DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA ANEXOS |
| | | |
| | | |

**II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS**

| No. | DESCRIPCION | DETALLE |
|---|---|---|
| 1 | SOLICITANTE: | |
| 2 | FUENTE RECEPTORA: | |
| 3 | PTAR: | |
| 4 | ESTADO: | |
| 5 | VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN): | |

**III.CONCESION DE AGUAS**

| No. | DESCRIPCION | DETALLE |
|---|---|---|
| 1 | SOLICITANTE: | |
| 2 | FUENTE DE ABASTECIMIENTO: | |
| 3 | PTAP: | |
| 4 | ESTADO: | |
| 5 | VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN): | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA.2.1-4<br>Versión: 4<br>Fecha de Vigencia:<br>01/02/2019 |

## ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

### I. ASPECTOS SOCIALES

| ITEM | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto | El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social. |
| 2 | Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto | En el mes de agosto de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 78.57%<br>.• Se realizó seguimiento a las gestiones adelantadas ante las alcaldías de Ginebra y Guacarí para la recuperación del espacio público y la ocupación de predios requeridos para el proyecto. A la fecha de corte, la Alcaldía de Guacarí informó que el caso fue remitido a la Inspección de Policía, sin que se registraran actuaciones posteriores, tampoco se tiene respuesta oficial de la Alcaldía de Ginebra. Asimismo, se verificó que ni el contratista, ni la Administración Municipal, ni la Inspección de Policía realizaron la presunta demolición del predio del señor Luis Fernando Marmolejo. Finalmente, la Inspección de Policía informó que promoverá un espacio de diálogo entre las partes y que el caso del predio del señor Danilo Bermúdez deberá ser atendido por la Administración Municipal debido a su uso espiritual y ancestral. |
| 3 | Programa de Información a la Comunidad | La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad. |
| 4 | Programa de divulgación a la comunidad | En el mes de agosto el contratista realizó la actualización de la información de la cartelera informativa en la Personería Municipal De Guacarí para la divulgación de los avances de obra a la comunidad. |
| 5 | Reuniones con la comunidad | La interventoría evidencia que el contratista ha dado cumplimiento a la actividad de reuniones con la comunidad establecida en el Plan de Gestión Social, mediante la realización de reuniones informativas y de concertación con las comunidades del área rural de los municipios de Ginebra y Guacarí, así como con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de ambos municipios. |
| 6 | Programa de atención a la comunidad | • Se mantiene habilitado el espacio del PAC con los formatos de PQRS, garantizando el acceso de la comunidad para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.<br>• Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias ubicados en la Personería de Guacarí y la Personería de Ginebra, sin evidenciarse PQRS radicadas por la comunidad durante el periodo evaluado.<br>• Se efectuó seguimiento a las vallas informativas instaladas en las principales vías de acceso a los municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales contienen información del contrato. Se evidenció que la valla ubicada en el municipio de Guacarí presenta actos de vandalismo, con daños visibles como roturas y grafitis. |
| 7 | Programa de atención al ciudadano | El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:<br>Martes de 08:00 am a 12m<br>Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,<br>Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - Corregimiento de Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca.<br><br>Existen dos buzones de sugerencias ubicados en:<br><br>1. Personería de Guacarí.<br>2.Personería de Ginebra. |
| 8 | Recorridos por la Obra | Durante el mes de agosto no se realizó recorrido de obra, se programará para el mes de septiembre de 2026. |
| 9 | Reunión de Avance de Obra | Se evidenció que el 20 de agosto de 2026 el componente social del contratista llevó a cabo la reunión informativa sobre el avance de obra con los integrantes de las veedurías ciudadanas de los dos municipios Guacari y Ginebra, por petición de los veedores en el anterior comité.<br>Se contó con la participación presencial y virtual de los veedores de los dos municipios. |
| 10 | Conformación del comité de veeduría ciudadana | • Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto No. 10 del Plan de Gestión Social, mediante la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana en los municipios de Guacarí y Ginebra.<br>• La interventoría social participó y verificó que el 20 de agosto de 2026 se realizó la reunión en conjunto de los dos comités de veedurías de los municipios de Guacari y Ginebra. |
| 11 | Vinculación de mano de obra calificada y no calificada | Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 31 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 6 son mujeres, lo que representa el 19 % del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación con enfoque de género.<br>Así mismo, se verificó que 18 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 7 pertenecen al municipio de Ginebra y 11 al municipio de Guacarí, equivalente al 60% del total del personal, dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona.<br>El contratista informó que durante el mes de agosto no se realizaron contrataciones nuevas. |

### II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

| No. | DESCRIPCION | DETALLE |
|---|---|---|
| 1 | ACTAS | |
| 2 | CORRESPONDENCIA | |
| 3 | VARIOS | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |
|---|---|---|

**ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 40**

| ITEM | LOCALIZACION | DESCRIPCION | ESTADO DE LA GESTION (AVANCE) |
|---|---|---|---|
| **I. PREDIOS** | | | |
| | N/A | | |
| **II. SERVIDUMBRES** | | | |
| **No.** | **LOCALIZACION** | **DESCRIPCION** | **ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)** |
| | Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a K6+850<br>Matricula inmobiliaria N° 373-112779 | Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y replanteo del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del trazado de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del predio identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ingenio Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que para continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 500 ml para la instalacion de tuberpia PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad promedio de 1.45 mt. | FINALIZADO |
| | Vía acceso planta de Ginebra | Permiso de intervención instalación tubería diámetro PEAD 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra ejecutado. | FINALIZADO |
| | | | |
| **III. PERMISOS** | | | |
| **No.** | **ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO** | **DESCRIPCION** | **ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)** |
| 1 | **CVC** | • Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma desarenador, macromedidor y aducción. | **Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024**<br>**OTORGADO**<br>Resolución 740 No. 0741 0678<br>23-07-2024<br>"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en juridiscción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" |
| 2 | **CVC** | • Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, d acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. | **AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN** |
| 3 | CVC | **PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES**<br>El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo.<br>Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo.<br>Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024.<br>Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto) | **AMBIENTAL PARA PRÓRROGA**<br>Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024.<br>Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año)<br>Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga.<br>Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce<br>RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024 |
| 4 | CVC | Permiso de Concesión de aguas superficiales | **OTORGADO**<br>**Resolución 0740 No. 0741 0000576**<br>**10-07-2020**<br>"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca"<br>**VIGENTE** |
| 5 | CVC | Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra | **OTORGADO**<br>**Resolución 740 No. 0741 0381**<br>**29-04-2024**<br>Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Planeación Municipal Ginebra | Licencia de Espacio Público | **OTORGADO**<br>**Resolución No. 004-01 2023**<br>**26-01-2023**<br>"Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público"<br>**VIGENCIA 26-01-2025**<br>**VIGENTE** |
| 7 | Planeación Municipal Guacarí | Licencia de Espacio Público | **OTORGADO**<br>**Resolución No. 004-01 2023**<br>**26-01-2023**<br>Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto"<br>**VIGENCIA 03-02-2025**<br>**VIGENTE** |
| 8 | Secretaria de Movilidad de Ginebra | Plan de Manejo de tránsito | **OTORGADO**<br>**Resolución No. 900-50-020**<br>**20-03-2023**<br>"Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle"<br>**VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP**<br>**VIGENTE** |
| 9 | Secretaria de Movilidad y transporte de Guacarí | Plan de Manejo de tránsito | **OTORGADO**<br>"Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle"<br>**VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP**<br>**VIGENTE** |
| 10 | Planeación Municipal Ginebra | Permiso de rotura de pavimento<br>Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:<br>Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.<br>Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra | **FINALIZADO** |
| 11 | Planeación Municipal Guacarí | Permiso de rotura de pavimento<br>Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo:<br>Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí. | **FINALIZADO** |
| 12 | CVC | Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA<br>En el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se sembro 19 especias arboreas en la Finca La Maria. | **FINALIZADO** |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

**ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 40**

**I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA**

| No. | NOMBRE | FORMACION ACADEMICA | CARGO | FUNCIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL | ING. CIVIL | DIR. DE OBRA | • Planificar la organización de la obra.<br>• Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto.<br>• Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución.<br>• Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido.<br>• Controlar la documentación oficial de la obra.<br>• Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados. |
| 2 | WILLIAM MORA JARAMILLO | ING. CIVIL | APOYO AL COORDINADOR DE PROYECTOS | • Planificar la organización de la obra.<br>• Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto.<br>• Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución.<br>• Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido.<br>• Controlar la documentación oficial de la obra.<br>• Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados. |
| 3 | DIEGO MONROY | ING. SANITARIO | APOYO A RESIDENTE DE OBRA HIDRAULICA | • Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.<br>• Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra.<br>• Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.<br>• Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo.<br>• Solicitar los materiales requeridos oportunamente.<br>• Elaborar los reportes y avances de obra.<br>• Calcular las cantidades de obra ejecutada. |
| 4 | DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS | ING. AMBIENTAL | ING. AMBIENTAL | • Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto.<br>• Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente.<br>• Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra<br>• Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto.<br>• Realizar el seguimiento a la implementación del PMA. |
| 5 | JENNIFER ALEXANDRA CABRERA VIVEROS | INGENIERA CIVIL<br><br>ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y AMBIENTAL | RESIDENTE DE OBRA | • Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.<br>• Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra.<br>• Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.<br>• Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo.<br>• Solicitar los materiales requeridos oportunamente.<br>• Elaborar los reportes y avances de obra.<br>• Calcular las cantidades de obra ejecutada. |
| 6 | MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO | TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL | PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL. | • Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto.<br>• Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán.<br>• Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población.<br>• Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos.<br>• Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ | TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA | TOPOGRAFO | Altimetria - Planimetria- Carteras Topográficas |
| 8 | GLORIES ZULUAGA LOPEZ | Profesional-SST | PROFESIONAL-SST ( E ) | • Responsable de la ejecucion del plan de gestión SST |
| 9 | ANA FERNANDA ROSERO | Ingeniera Sanitaria y Ambiental | Apoyo al Residente de Obra | • Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.<br>• Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. |
| **II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA** | | | | |
| **No.** | **NOMBRE** | **FORMACION ACADEMICA** | **CARGO** | **FUNCIONES** |
| 1 | ALEJANDRO ESTRADA RAMIREZ | INGENIERO SANITARIO | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO |
| 2 | JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES | INGENIERO SANITARIO | RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL | VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL |
| 4 | JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ | TOPOGRAFO | TOPÓGRAFO | VERIFICACIÓN CONTROLTOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS |
| 5 | NEISLER ABADIA LONDOÑO | TRABAJORA SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL |
| 6 | JULIANA IZQUIERDO MARULANDA | PROFESIONAL SST | PROFESIONAL SST | REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST |
| 6 | RODRIGO OBONAGA GAITAN | INGENIERO SANITARIO | APOYO AL DIRECTOR DE INTERVENTORIA | VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE HIDRAULICO |
| 6 | LUIS ARSENIO CUERO MURILLO | TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES | TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES | INSPECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA |
| 7 | JULIAN ANDRADE | INGENIERO CIVIL | APOYO A LA DIRECCIÓN | REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA |

| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |
|---|---|---|

**ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

**7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO**

| EQUIPO | PROGRAMADO | UTILIZADO | PROPIO | ALQUILADO | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA ELECTRICA | SI | SI | SI | | TRAMO 3 | FUNDICION CONCRETO EN CONSTRUCCION DE CAMARAS EN CONCRETO PARA VAVULAS DE PURGA , VENTOSAS Y QUIEBRE DE PRESION | |
| PULIDORA | SI | SI | SI | | PTAP GUACARI | FILTROS MODULO B | |
| TALADRO | SI | SI | SI | | TRAMO 1 | COLOCACION CEMENTO EXPANSIVO | |
| VIBRADOR | SI | SI | SI | | TRAMO 3 | CONSTRUCCION DE CAMARAS EN CONCRETO PARA VAVULAS DE PURGA , VENTOSAS Y QUIEBRE DE PRESION | |
| EQUIPO TERMOFUSION | SI | S | | SI | LINEA CONDUCCION TRAMO 1 | TUBERIA PEAD 18" | |
| RETROEXCAVADORAS DE LLANTA y ORUGA | SI | SI | | SI | TRAMO 1 - TRAMO 3 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | |
| VOLQUETAS | SI | SI | | SI | TRAMO 1 - TRAMO 3 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARENA , GRAVA, ROCA MUERTA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION | |

**7.2 EQUIPOS DE MEDICION**

| ITEM | ACTIVIDAD | EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA | | | | | EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precisión | Equipo | Certificado Calibración No. | Vigencia certi. | No. Serie / ID | Precisión | Equipo | Certificado Calibración No. | Vigencia certi. | No. Serie / ID |
| 1 | LOCALIZACION TOPOGRAFICA | ESTACIÓN TOTAL | ESTACION TOTAL | 3866 | nov-26 | 025108 | | | | | |
| 2 | LOCALIZACION TOPOGRAFICA | NIVEL AUTOMATICO | NIVEL AUTOMATICO | 3830 | nov-26 | M312467 | | | | | |
| 3 | LOCALIZACION TOPOGRAFICA | NIVEL AUTOMATICO | NIVEL AUTOMATICO | 3831 | nov-26 | QS1667 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |

| | |
|---|---|
| **ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO** | **PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026** |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. :** | 2000.13.05.003-2022 | |
| **OBJETO:** | EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA." | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** | $ | 29.432.080.933,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTERGUACARI | |
| **PLAZO:** | 22 MESES | |
| **VALOR ANTICIPO :** | 30% $ | 8.829.624.279,80 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMA APROBADO | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE RELACIÓN | ACUMULADO TOTAL | SALDO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | | | | - | - |
| 2 | EQUIPOS | **$ 1.744.905.661,00** | **$ -** | | $ 1.744.905.661,00 | $ - |
| 3 | TRANSPORTES | | | | $ - | $ - |
| 4 | MATERIALES | **$ 6.125.300.150,00** | **$ -** | | $ 6.125.300.150,00 | $ - |
| 5 | OTROS | **$ 959.418.469,00** | **$ -** | | $ 959.418.469,00 | $ - |
| 6 | OTROS | **$ 10.542.663,00** | | | $ 10.542.663,00 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 8.829.624.279,80** | **8.829.624.279,80** | | **8.829.624.279,80** | **-** |

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |

**FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 40 AGOSTO DE 2026**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | DÍA | MES | AÑO | HORA DE INICIO: | |
| | 31 | 8 | 2026 | HORA DE FINALIZACIÓN : | |
| VEREDA/ CORREGIMIENTO: | PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS | | | MUNICIPIO: | GINEBRA/GUACARI |
| TRAMO/FRENTE DE OBRA: | | | | LONGITUD/ÁREA : | |
| CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE | | | | AVANCE DE OBRA (%) | 79,20% |

**DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA**

| **COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL** | **SI** | **NO** | **N/A** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|
| **AIRE** | | X | | |
| EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO | | X | | |
| EMISIONES DE RUIDO | | X | | |
| EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS | | | | |
| OTROS: | | | | |
| **SUELO** | **SI** | **NO** | **N/A** | |
| AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA | | X | | |
| PROCESOS EROSIVOS | | X | | |
| DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | X | | |
| DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS ) | | X | | |
| DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD | | X | | |
| OTROS: | | | | |
| **AGUA** | **SI** | **NO** | **N/A** | |
| DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA | | X | | |
| VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | | X | | |
| VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES | | X | | |
| MALAS INSTALACIONES SANITARIAS | | X | | |
| OTROS: | | | | |
| **FLORA Y FAUNA** | **SI** | **NO** | **N/A** | |
| DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL | X | | | |
| INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES | | X | | |
| EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS | | X | | |
| AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS | | X | | |
| AFECTACIÓN A HÁBITATS | | X | | |
| ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS | | X | | |
| OTROS: | | | | |
| **PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES** | **SI** | **NO** | **N/A** | |
| CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS) | X | | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | X | | | EN IMPLEMENTACION |
| PERMISO DE VERTIMIENTOS | | X | | |
| PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | X | | | PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA BOCATOMA |
| PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS | | X | | |
| OTROS: | | | | |
| **SOCIOECONÓMICO** | **SI** | **NO** | **N/A** | |
| PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | X | | | |
| ACTAS DE VECINDAD | X | | | |
| ACTAS DE RECIBO | | X | | |
| DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES | X | | | |
| PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS | | X | | |
| PREDIOS AFECTADOS | | X | | |
| AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | | X | | |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA | | X | | |
| PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | X | | | |
| MANO DE OBRA LOCAL | X | | | |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS | | X | | |
| PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL | | X | | |
| GESTIÓN SOCIO -PREDIAL | X | | | |
| OTROS: | | | | |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia: 01/09/2025 |

**FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | DÍA | MES | AÑO | HORA DE INICIO: | 10 |
| | 31 | 8 | 2026 | HORA DE FINALIZACIÓN : | 12 |
| VEREDA/ CORREGIMIENTO: | PUENTE ROJO | | | MUNICIPIO: | GINEBRA-GUACARI |
| TRAMO/FRENTE DE OBRA: | | | | LONGITUD/ÁREA : | |
| CONSORCIO : | CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE | | | AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%) | 100% |
| NOMBRE PROFESIONAL SST: | GLORIES ZULUAGA LOPEZ | | | NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA: | JULIANA IZQUIERDO M. |

**DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA**

| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE AFILIACION Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA | 1 | | | Se anexan soportes de pago de seguridad social |
| REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA. | 1 | | | |
| INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | 1 | | | En el mes de Agosto no se presentaron accidentes. |
| PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES | 1 | | | Se programa plan de trabajo para el año 2026. |
| POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS | 1 | | | Se adjunta registro fografico de las inducciones en las que se tratan los temas de politicas y objetivos SST. |
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO | 1 | | | Se adjuntas formatos AROS para actividades de alto riesgo. |
| PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS) | 1 | | | Se realizan inspecciones de equipos de emergencia y se mantiene en lugares estrategicos para su utilizacion. |
| BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA | 1 | | | Capacitar al personal brigadista en habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y coordinación durante emergencias, con el fin de fortalecer su capacidad de guía y respuesta ante una evacuación. |
| SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS | 1 | | | Se delimita la zona de excavacion |
| CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO | 1 | | | Se implementa y se deja registro fotografico |
| EXTINTORES | 1 | | | Se implementa y se deja registro fotografico |
| BOTIQUIN | 1 | | | Se implementa y se deja registro fotografico |
| KIT DE DERRAMES | 1 | | | No hay uso de sustancias toxicas |
| COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP). | 1 | | | Anexo del informe |
| LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC) | 1 | | | Cartelera informativa SST |
| EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL | 1 | | | |
| ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 1 | | | Se programa conformacion para COPASST Y COCOLA |
| CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS. | 1 | | | Aun no adjunta la certificacion por parte de la ARL y el ministerio de trabajo del porcentaje de cumplimiento del sisteme de gestion. |
| INFORME DE ASESORIA DE LA ARL | 1 | | | |
| EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS | 1 | | | Se adjunta registro fotografico |
| EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y/O PLAN DE FORMACIÓN | 1 | | | |
| PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN | 1 | | | Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo |
| EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS | 1 | | | Se divulga las politicas SST al personal operativo subcontratista y al personal |
| PUNTO ECOLOGICO | 1 | | | |
| **TOTAL** | **24** | **0** | **0** | |
| **CUMPLIMIENTO** | **100%** | | | |

**OTROS:**

OBSERVACIONES:

**RECOMENDACIONES PARA LOS INTERVENTORES**

1.- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el CONTRATISTA y/o INTERVENTORIA, requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor deberá aprobar previamente el reemplazo.

En tal sentido se reitera verificar y evidenciar en los informes mensuales, el personal profesional presentado por el Contratista y/o Interventoria (equipo de trabajo) con su cargo, formación académica, y porcentaje de dedicación propuesto.

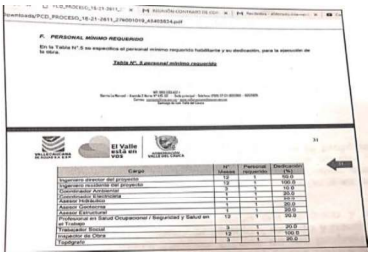

F. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

En la Tabla N° 5 se especifica el personal mínimo requerido habilitante y su dedicación, para la ejecución de la obra.

Tabla N°. 5 personal mínimo requerido

El Valle está en vos

| Cargo | N° Meses | Personal requerido | Dedicación (%) |
|---|---|---|---|
| Ingeniero director del proyecto | 12 | 1 | 50.0 |
| Ingeniero residente del proyecto | 12 | 1 | 100.0 |
| Coordinador Ambiental | 3 | 1 | 10.0 |
| Coordinador Electricista | 1 | 1 | 20.0 |
| Asesor Hidráulico | 1 | 1 | 20.0 |
| Asesor Contractual | 1 | 1 | 20.0 |
| Asesor Estructural | 1 | 1 | 20.0 |
| Profesional en Salud Ocupacional / Seguridad y Salud en el Trabajo | 12 | 1 | 20.0 |
| Trabajador Social | 3 | 1 | 20.0 |
| Inspector de Obra | 12 | 1 | 100.0 |
| Topógrafo | 3 | 1 | 20.0 |

**Ejemplo de una propuesta de personal mínimo requerido presentado por el Contratista a Vallecaucana de Aguas.**

**En relación con el Coordinador Ambiental esté deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:**
1.- Identificación de aspectos e impactos ambientales
2.- Plan de manejo para la mitigación de impactos ambientales identificados y generados en el desarrollo de la obra.
3.- Orden, limpieza y aseo en la obra.
4.- Informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique una intervención inmediata que genere impactos al ambiente y/o los recursos naturales.

**En relación con el Coordinador Social este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:**
1.- Acta de reunión con los comités de veeduría y /o ciudadanos que soliciten en el punto de atención a la comunidad
2.- Relación de PQRS, en cuadro indicar el número de quejas, inquietudes, reclamos y solicitudes que se presenten en el mes, con su respuesta y/o tratamiento a la misma, en caso de no presentarse indicar.
3.- Abrir y cerrar las Actas de Vecindad, que sean necesario tramitar, en los frentes de obra a intervenir por el contratista
4.- Fijar horario de atención a la comunidad, colocándolo en una cartelera visible.
5.- Participar de los comités de técnico de obra, veeduría y comités sociales en Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P cuando se programen.

**En relación con el Coordinador de seguridad y salud en el trabajo este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:**
1. Porcentaje de avance mensual de plan de trabajo SST.
2. Evidencias del desarrollo del plan de emergencia y su brigada.
3. Indicadores de EP, EG, IT, AT.
4. Evidencia de entrega de Elementos de Protección Personal.
5. Evidencia del desarrollo del programa de Capacitación.
6. Evidencia de participación y consulta de los trabajadores en actividades del SG-SST.
7. Seguridad Social Vigente de los trabajadores vinculados.
8. Otros Hallazgos, así como informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique influyan en la Seguridad y Salud de los trabajadores.

| | | |
|---|---|---|
| VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>SGC - MECI<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA** | Código: FO-PDA-4<br>Versión: 1<br>Fecha de Vigencia:<br>01/09/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO** | **INFORME N° 40** | **PERIODO:** | **01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026** |

INSPECCION RETIE PARTE ELECTRICA PTAP GUACARI

INSPECCION RETIE PARTE ELECTRICA PTAP GUACARI

INSPECCION RETIE PARTE ELECTRICA PTAP GUACARI

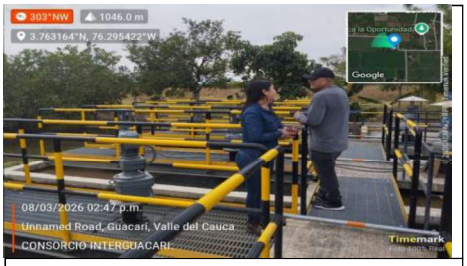


INSPECCION RETIE PARTE ELECTRICA PTAP GUACARI

INSPECCION TRAMO No. 01 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS

INSTALACCION FALSOS FONDOS MODULO A FILTRO 1 PTAP GUACARI

RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION TRAMO 1

SE OBSERVA ALCANTARILLAS PLUVIALES EXISTENTES COMPLETAMENTE COLMATADAS

ROCA EXTRAIDA DURANTE LA EXCAVACION TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS

INSTALACION TUBERIA PEAD 18 PULGADAS TRAMO 1

INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ALBANIA

INSPECCION FILTROS PTAP GINEBRA

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION TRAMO 1 PEAD 18 PULGADAS

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION TRAMO 1 PEAD 18 PULGADAS

RETIRO DE FORMALETA EN MADERA CAMARA DE VENTOSA TRAMO 3 PEAD 14 PULGADAS

RETIRO DE FORMALETA EN MADERA CAMARA DE VENTOSA TRAMO 3 PEAD 14 PULGADAS

INSPECCION SEDIMENTADORES PTAP GINEBRA

PRUEBA HIDROSTATICA TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14 PULGADAS

PRUEBA HIDROSTATICA TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14 PULGADAS

PASE DE TUBERIA PEAD 18 PULGADAS POR DEBAJO DE ALCANTARILLA PLUVIAL TRAMO 1

CONSTRUCCION CARCAMO DE ALCANTARILLA PLUVIAL TRAMO 1

RECORRIDO CON FUNCIONARIOS DE ACUAVALLE PARA COORDINAR LOS EMPALMES DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PTAP GINEBRA

RECORRIDO CON FUNCIONARIOS DE ACUAVALLE PARA COORDINAR LOS EMPALMES DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PTAP GINEBRA

INSPECCION PARTE ELECTRICA PTAP GINEBRA

UNIONES TUBERIA PEAD 14 PULGADAS DESPUES DE LA PRUEBAS HIDROSTATICAS

UNIONES TUBERIA PEAD 14 PULGADAS DESPUES DE LA PRUEBAS HIDROSTATICAS

UNIONES TUBERIA PEAD 14 PULGADAS DESPUES DE LA PRUEBAS HIDROSTATICAS

PRUEBA HIDROSTATICA TRAMO 3 PEAD 14 PÚLGADAS

INSPECCION RETIE PARTE ELECTRICA PTAP GUACARI

INSPECCION RETIE PARTE ELECTRICA PTAP GUACARI

# GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

## VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

### INFORME No. 40 DE INTERVENTORIA

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022**

**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRA PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOSDE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"**

**AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022**

**EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE INEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"**

**CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**
**REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**

**INTERVENTOR**
**CONSORCIO INTERGUACARI**
**REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**SUPERVISOR**
**VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.**
**INGENIERO DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA**

**DISTRITO SANTIAGO DE CALI – AGOSTO 2026**

# INFORMACION GENERAL

## 1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| Contrato No. | 2000.13.05.003- 2022 |
| Objeto: | EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA" |
| Valor del Contrato: | VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933.oo) M/CTE |
| Valor inicial | $ 29.432.080.933.oo |
| Valor Adición No.01 | $ 2.571.146.616.oo |
| Valor Adición No. 02 | $ 13.531.646.339.oo |
| Valor Total del Contrato | $ 45.534.873.888.oo |
| Contratista: | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE |
| Interventor: | CONSORCIO INTERGUACARÍ |
| Fecha de Inicio: | Diciembre 1 de 2022 |
| Plazo de ejecución delproyecto | Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio |
| Fecha de Terminación: | Enero 1 de 2024 |
| Fecha de suspensión No.01: | Dos meses a partir de Julio 27 de 2023 |
| Prorroga No. 01 a la Suspensión No.01 | Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023 |
| Prorroga No. 02 a la Suspensión No.01 | Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023 |
| Prorroga No. 03 a la Suspensión No.01 | 45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023 |
| Fecha de reinicio: | Enero 10 de 2024 |
| Nueva fecha de terminación: | Junio 14 de 2024 |
| Adicional en Tiempo No.01 | Nueve ( 09) meses |
| Fecha de terminación prorroga | Marzo 14 de 2025 |
| Adicional en Tiempo No.02 | Diez ( 10) meses |
| Fecha de terminación prorroga | Enero 22 de 2026 |
| Adicional en Tiempo No.03 | Seis ( 06) meses |
| Fecha de terminación prorroga | Julio 22 de 2026 |
| Adicional en Tiempo No.04 | Seis ( 06) meses |
| Fecha de terminación prorroga | Enero 22 de 2027 |

# 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026.

## 2.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este mes se realizó un comité de obra, al cual asistieron funcionario de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari.

### 2.1.1 – Agosto 12 de 2026

Se realiza comité de obra en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P., con la asistencia de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P , contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, durante este comité se tratan temas generales de cada una de la PTAP´s, tanto en Ginebra como en Guacarí y redes de conducción en los tramos 1 y 3.

## 2.2 OTRAS REUNIONES

### 2.2.1 – Agosto 03 de 2026

Se realiza la reunión en las instalaciones la PTAP de Guacari con la asistencia del contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, para verificar el estado del RETIE en dicha planta.

## 2.2.2 – Agosto 26 de 2026

Se realiza un recorrido en los lugares donde están ubicados los tanques de almacenamiento I de la PTAP de Ginebra y La Albania con la asistencia del Ing. Diego Navarro de Acuavalle , contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, para revisar los empalmes a la red existente de los tanques de almacenamiento.

## 2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

**OBRA:**

A la fecha se han tramitado veintiún actas parciales de obra, relacionadas así:

| Descripción | Valor ejecutado | Valor contrato | Porcentaje % ejecución |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato: | | $ 29.432.080.933 | |
| Valor adicionado No. 01: | | $ 2.571.146.616 | |
| Valor adicionado No. 02: | | $ 13.531.646.339 | |
| Valor total del contrato: | | $ 45.534.873.888 | |
| Valor Acta Parcial No. 1: | $ 8.371.066.842 | | 18,38% |
| Valor Acta Parcial No. 2: | $ 886.015.856 | | 1.95% |
| Valor Acta Parcial No. 3: | $ 907.712.127 | | 1.99% |
| Valor Acta Parcial No. 4: | $ 503.892.952 | | 1.11% |
| Valor Acta Parcial No. 5: | $ 369.286.058 | | 0.81% |
| Valor Acta Parcial No. 6: | $ 7.371.115.364 | | 16.19% |
| Valor Acta Parcial No. 7: | $ 604.131.566 | | 1,33% |
| Valor Acta Parcial No. 8: | $ 385.455.620 | | 0,85% |
| Valor Acta Parcial No. 9: | $ 689.009.943 | | 1,51% |
| Valor Acta Parcial No. 10: | $ 1.216.561.098 | | 2,67% |
| Valor Acta Parcial No. 11: | $ 2.068.353.769 | | 4,54% |
| Valor Acta Parcial No.12 | $ 690.349.724 | | 1.52% |
| Valor Acta Parcial No.13 | $ 2.313.472.543 | | 5.08% |
| Valor Acta Parcial No.14 | $ 1.659.841.253 | | 3.65% |
| Valor Acta Parcial No. 15 | $ 4.230.011.773 | | 9.29% |
| Valor Acta Parcial No.16 | $ 534.405.953 | | 1.17% |
| Valor Acta Parcial No. 17 | $ 736.963.238 | | 1.62% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Acta Parcial No. 18 | $ 431.777.557 | | 0.95% |
| Valor Acta Parcial No. 19 | $ 722.083.648 | | 1.59% |
| Valor Acta Parcial No. 20 | $ 502.017.049 | | 1.10% |
| Valor Acta Parcial No. 21 | $ 460.365.240 | | 1.01% |
| Total, cancelado a la fecha: | **$ 35.653.889.173** | | 78.3% |
| Saldo por ejecutar: | $ 9.880.984.715 | | 21.7% |
| Sumas iguales: | $ 45.534.873.888 | $ 45.534.873.888 | 100,00% |

Tabla No. 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista

En este periodo el contratista no tramito acta parcial de obra

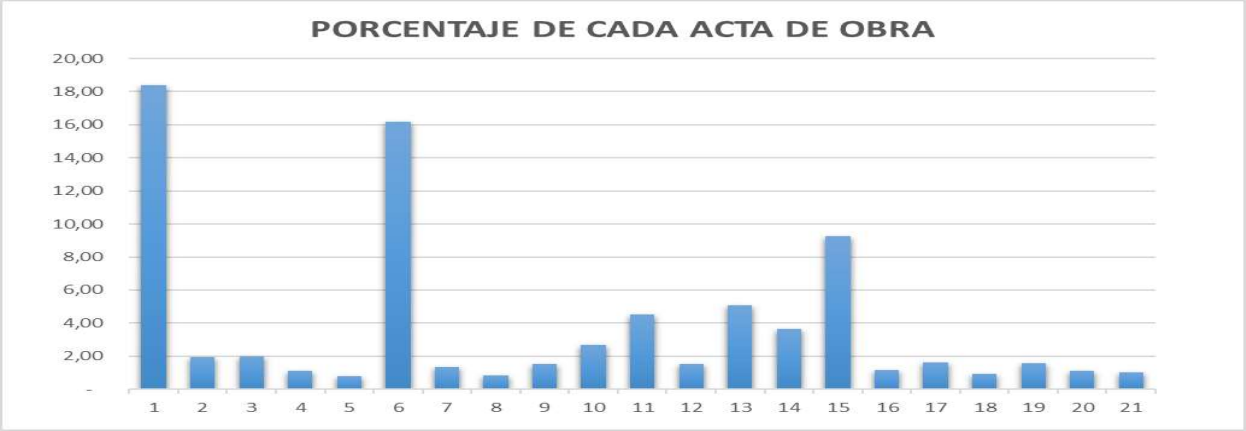


Figura No, 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales de obra

| Descripción | Fecha | Valor amortizado | Valor anticipo 30% | % amortización |
|---|---|---|---|---|
| Valor anticipo del contrato ( 30 %): | | | $ 8.829.624.279.90 | |
| Amortización acta Parcial N° 1: | 31/05/2023 | $ 2.511.320.053 | | 28,44% |
| Amortización acta Parcial N° 2: | 30/06/2023 | $ 265.804.757 | | 3,01% |
| Amortización acta Parcial N° 3: | 31/01/2024 | $ 272.313.639 | | 3,08% |
| Amortización acta Parcial N° 4: | 31/03/2024 | $ 151.167.886 | | 1,71% |
| Amortización acta Parcial N° 5: | 30/04/2024 | $ 110.785.818 | | 1,25% |
| Amortización acta Parcial N° 6: | 31/05/2024 | $ 2.211.334.610 | | 25,04% |
| Amortización acta Parcial N° 7: | 31/07/2024 | $ 181.239.470 | | 2,05% |
| Amortización acta Parcial N° 8: | 31/08/2024 | $ 115.636.686 | | 1,31% |
| Amortización acta Parcial N° 9: | 30/09/2024 | $ 206.702.983 | | 2,34% |
| Amortización acta Parcial N° 10: | 08/11/2024 | $ 364.968.330 | | 4,13% |
| Amortización acta Parcial N° 11: | 30/11/2024 | $ 620.506.131 | | 7,03% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amortización acta Parcial N° 12: | 31/01/2025 | $ 207.104.917 | | 2,35% |
| Amortización Acta Parcial No.13 | 10/02/2025 | $ 694.041.763 | | 7.86% |
| Amortización Acta Parcial No.14 | 10/07/2025 | $ 497.952.376 | | 5.62% |
| Amortización Acta Parcial No.15 | 13/08/2025 | $ 418.744.860.90 | | 4.76% |
| **Valor amortizado** | | **$ 8.829.624.279.90** | | **100.00 %** |
| Saldo por amortizar: | | $ 0.00 | | **0.00%** |
| **Sumas iguales:** | | **$ 8.829.624.279.90** | **$ 8.829.624.279.90** | **100,00%** |

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo

**Nota:** Ya se amortizó la totalidad del Anticipo

**INTERVENTORIA**

A la fecha se han tramitado 20 actas parciales de interventoría, relacionadas así:

| Descripción | Valor ejecutado | Valor contrato | Porcentaje % ejecución |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato: | | $ 1.502.246.766 | |
| Valor adicionado No. 01: | | $ 131.126.000 | |
| Valor adicionado No. 02: | | $ 690.624.799 | |
| Valor total del contrato: | | $ 2.323.997.565. | |
| Valor Acta Parcial No. 1: | $ 427.238.980 | | 18.38% |
| Valor Acta Parcial No. 2: | $ 45.217.628 | | 1.95% |
| Valor Acta Parcial No. 3: | $ 72.195.076 | | 3.1% |
| Valor Acta Parcial No. 4: | $ 18.783.787 | | 0.81% |
| Valor Acta Parcial No. 5: | $ 376.165.748 | | 16.17% |
| Valor Acta Parcial No. 6: | $ 30.870.745 | | 1.33% |
| Valor Acta Parcial No. 7: | $ 19.658.237 | | 0,85% |
| Valor Acta Parcial No. 8: | $ 35.139.507 | | 1.52% |
| Valor Acta Parcial No. 9: | $ 62.044.616 | | 2.67% |
| Valor Acta Parcial No. 10: | $ 105.486.042 | | 4.54% |
| Valor Acta Parcial No. 11 | $ 35.207.836 | | 1.51% |
| Valor Acta Parcial No. 12 | $ 117.987.100 | | 5.08% |
| Valor Acta Parcial No. 13 | $ 84.651.904 | | 3.64% |
| Valor Acta Parcial No. 14 | $ 215.730.600 | | 9.28% |
| Valor Acta Parcial No. 15 | $ 27.254.704 | | 1.17% |
| Valor Acta Parcial No. 16 | $ 37.648.761 | | 1.62% |
| Valor Acta Parcial No. 17 | $ 22.020.655 | | 0.95% |
| Valor Acta Parcial No. 18 | $ 36.826.266 | | 1.59% |
| Valor Acta Parcial No. 19 | $ 25.602.869 | | 1.10% |
| Valor Acta Parcial No. 20 | $ 23.478.627 | | 1.01% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total, cancelado a la fecha: | **$ 1.819.209.688.oo** | | **78.3%** |
| Saldo por ejecutar: | $ 504.787.877.oo | | 21.7% |
| Sumas iguales: | $ 2.323.997.565 | $ 2.323.997.565 | 100,00% |

Tabla No. 3. Relación de pagos actas parciales interventoría

En este periodo la interventoría no tramito acta parcial debido a que el contratista de obra no presento acta de parcial.

Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría:

| Descripción | Fecha | Valor amortizado | Valor anticipo 30% | Porcentaje % amortización |
|---|---|---|---|---|
| Valor anticipo del contrato ( 30 %): | | | $ 450.674.029.80 | |
| Amortización acta Parcial N° 1: | 31/05/2023 | $ 128.171.694 | | 28,44% |
| Amortización acta Parcial N° 2: | 30/06/2023 | $ 13.565.288 | | 3,01% |
| Amortización acta Parcial N° 3: | 31/01/2024 | $ 21.658.523 | | 4,81% |
| Amortización acta Parcial N° 4: | 31/03/2024 | $ 5.635.136 | | 1,25% |
| Amortización acta Parcial N° 5: | 30/04/2024 | $ 112.849.724 | | 25,04% |
| Amortización acta Parcial N° 6: | 31/05/2024 | $ 9.261.224 | | 2,05% |
| Amortización acta Parcial N° 7: | 13/09/2024 | $ 5.897.471 | | 1,31% |
| Amortización acta Parcial N° 8: | 30/09/2024 | $ 10.541.852 | | 2,33% |
| Amortización acta Parcial N° 9: | 12/11/2024 | $ 18.613.385 | | 4,13% |
| Amortización acta Parcial N° 10: | 02/12/2024 | $ 31.645.813 | | 7,02% |
| Amortización acta Parcial N° 11: | 01/31/2025 | $ 10.562.351 | | 2,34% |
| Amortización Acta Parcial No. 12: | 11/03/2025 | $ 35.396.130 | | 7,86% |
| Amortización Acta Parcial No. 13: | 10/07/2025 | $ 25.395.571 | | 5.63% |
| Amortización Acta parcial No. 14 | 13/08/2025 | $ 21.479.867.80 | | 4.76% |
| **Valor amortizado** | | **$ 450.674.029.80** | | **100.00%** |
| Saldo por amortizar: | | $ 0.00 | | |
| **Sumas iguales:** | | $ 450.674.029.80 | $ 450.674.029.80 | **100,00%** |

Tabla No. 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría

**Nota:** Ya se amortizó la totalidad del Anticipo

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano para los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras a construir son:

- Bocatoma Tipo Coanda sobre el Rio Guabas
- Línea de Aducción
- Desarenador (No se va a construir. se está desarrollando un proyecto para construir la versión de Malla Coanda)
- Cámara de distribución de caudal – CADICA
- Viaductos en Puente Amarillo sobre el Rio Guabas, Puente Rojo sobre el Rio Guabas y Puente La Magdalena sobre la Quebrada La Magdalena.
- Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18 pulgadas entre la Bocatoma y CADICA – Tramo 2 en 10 " entre CADICA y PTAP de Ginebra y Tramo 3 en 14" entre CADICA y PTAP de Guacarí.
- Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí´ en floculación, sedimentación filtración, sistema eléctrico en las nuevas unidades instaladas y tanques de almacenamiento.

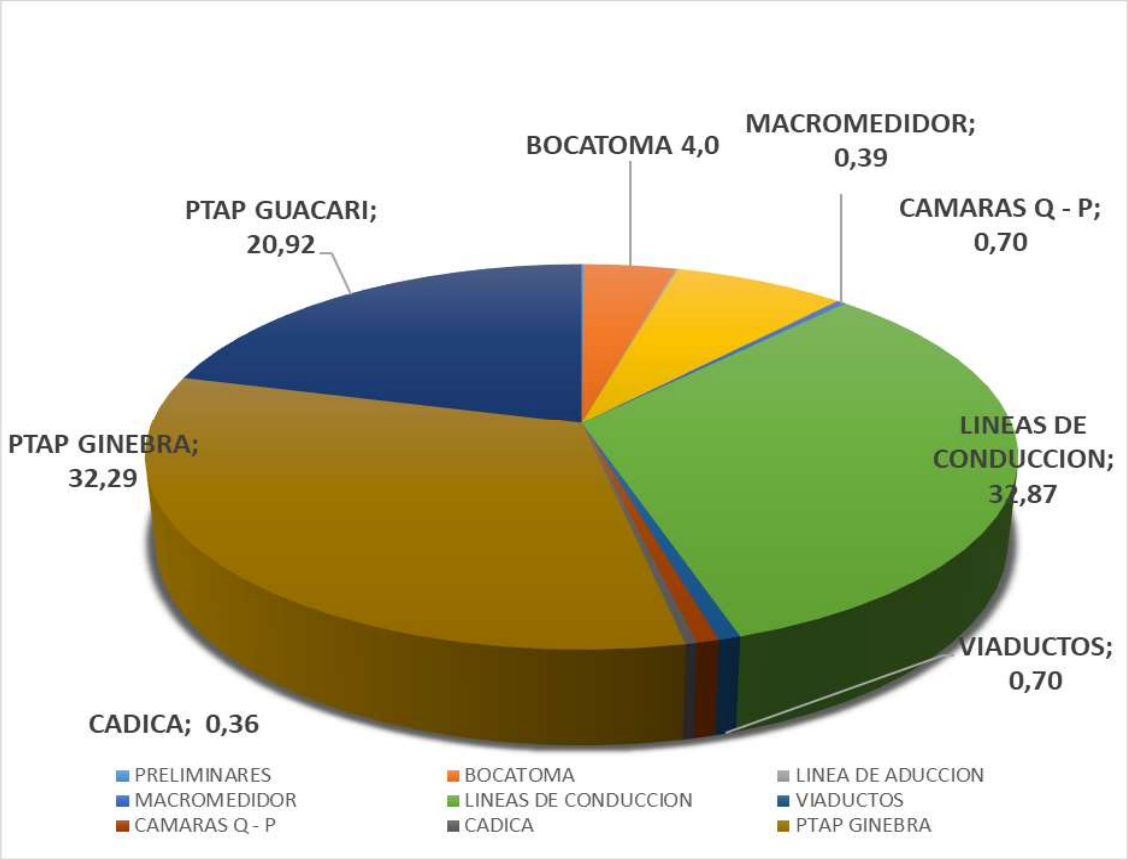

## 2.3 COMPONENTE TECNICO

Durante el mes de Agosto de 2026, se desarrollan actividades en:

### A. BOCATOMA

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas
2. Caudal de Captación: 233 Lps
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps

Estado del Nuevo Diseño Bocatoma: Se contrato con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador.

El diseño estructural ya tuvo concepto favorable por parte de la Interventoría

Nota: Se encuentra en etapa de elaboración de presupuesto por parte del Contratista.

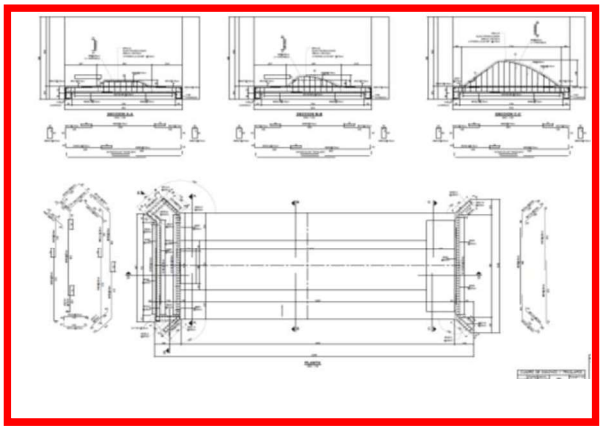

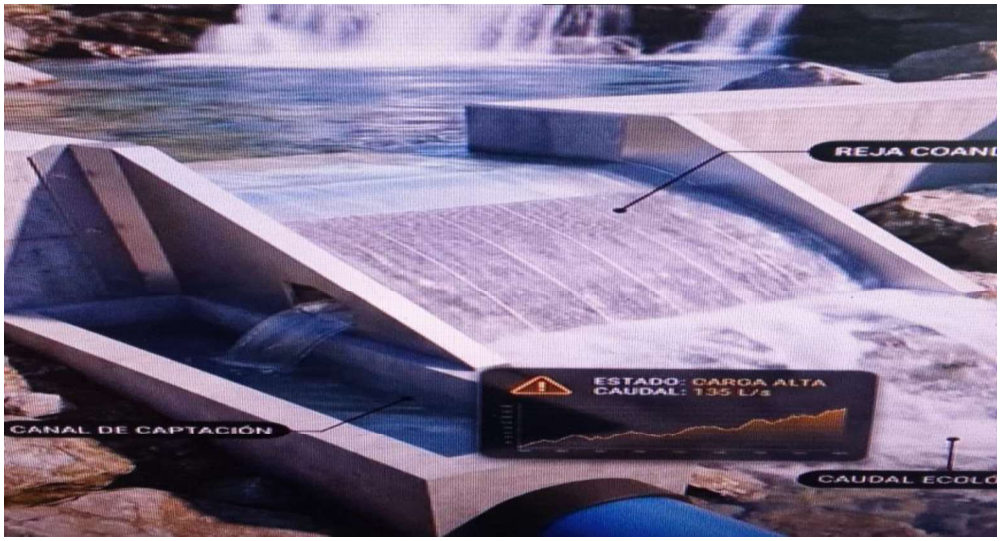


**Sin ejecución**

## B. ADUCCIÓN

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18 pulgadas: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps

**Estado Actual Línea de Aducción:** Se contrato nuevo diseño con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador.
Se encuentra en la última etapa de revisión presupuestal por parte del contratista

**Sin ejecución**

## C. DESARENADOR

1. Caudal de diseño: No aplica

Estado Actual: Según el nuevo diseño **NO** se va a construir, se va a reemplazar por la malla Coanda

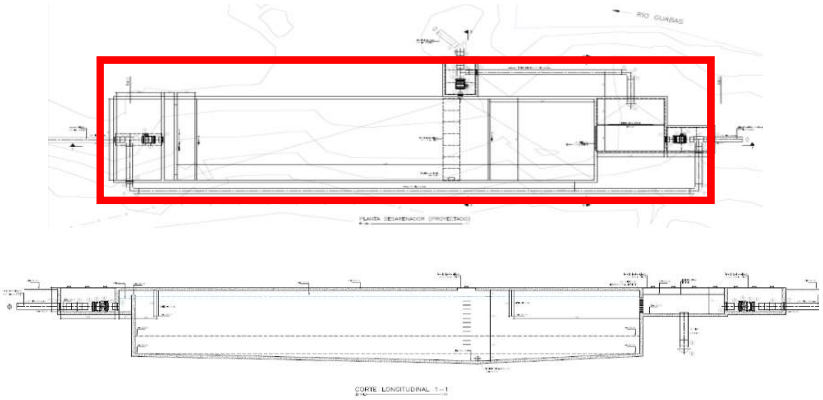

### 1.1 Dimensiones Exteriores ( No aplica)

Largo: 38 mts
Ancho: 8 mts
Profundidad: 5 mts

**Sin ejecución**

## D. MACROMEDIDOR

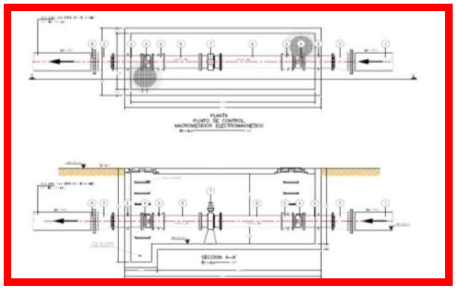

**Sin ejecución.**

## 2. CONDUCCIÓN

**2.1 Tramo 1** Macromedidor – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD DN 18 pulgadas L=3450ml

**Estado Actual Tramo 1: En ejecución.**

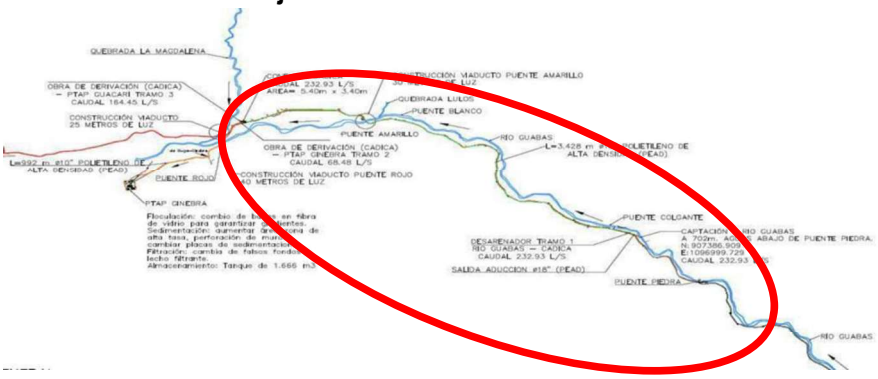


Se termina la fundición de los muros del piloto de cárcamo entre las abscisas K1+170 a K1+194

**Porcentaje de Ejecución: 60 %**

**Tramo entre abscisas K2+600 a K2+910**

3 ago 2026 11:10:06 a.m.
Ginebra
#ConsorcioInterguacari
426

6 ago 2026 3:29:47 p.m.
#Consorcio Interguacari

6 ago 2026 3:17:23 p.m.
#Consorcio Interguacari

11 ago 2026 10:40:36 a.m.
#Consorcio Interguacari
HITACHI
HITACHI
PART QUIPOS
ZAXIS
135

11 ago 2026 10:40:51 a.m.
#Consorcio Interguacari
PART QUIPOS
HITACHI

**D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales**

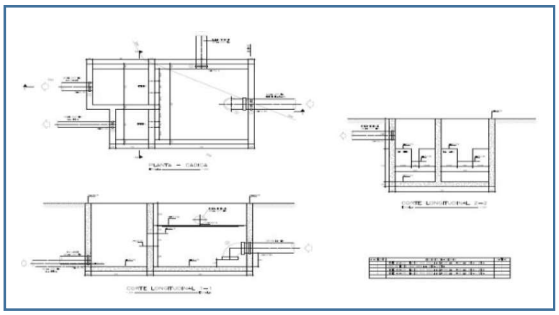

**D 2.1 Dimensiones Exteriores**
Largo: 5.4 mts
Ancho: 3.4 mts
Profundidad: 3 mts

**Estado Actual CADICA: Sin ejecución.**

**Nota:**

Se aprobó el cambio de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López – encargada de la revisión hidráulica por parte del Contratista, se va a ubicar aguas arriba donde está proyectada, 81 ml aguas arriba donde estaba proyectada.

La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable.

**D.3 Tramo 2** CADICA en Puente Rojo a PTAP Ginebra: Tubería PEAD diámetro 10" – L=1000ml

Estado Actual Tramo 2: **Sin ejecución.**

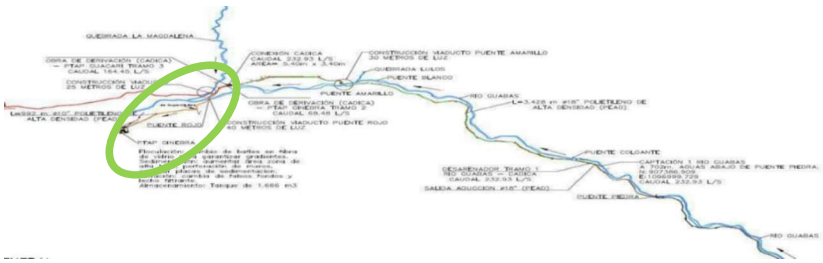

**Nota:** Continua sin ejecución desde el 20 de Enero de 2026 porque la Comunidad **NO** dejo realizar ningún tipo de intervención sobre la vía.

Los permisos dados por la Alcaldía de Ginebra para ruptura están vigentes.

**Porcentaje de Ejecución: 64 %**

**D.4 Tramo 3** CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD DN 14”



L total =8000ml




**Porcentaje de Ejecución: 97 %**

Se hacen pruebas hidrostáticas con resultado positivo entre las abscisas

K 4+560 a K 4+060
K4+060 a K 3+560

.

## PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

## PTAP GINEBRA

**Floculadores:** Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio
**Concluido**

**Sedimentadores 1 – 2 – 3 : Concluido y en Servicio**

**Actividades ejecutadas:**

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

**FILTRACION**

**Actividades ejecutadas en Módulos de Filtración:**

Demolición de canales en concreto
Retiro de material filtrante
Demolición de falso fondo
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de aireación en tubería proveniente de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable
Canal Falso Fondo - Leopold

**Estado Actual Filtración:**

**Filtros No. 01 – 02 y 03:** Terminados y en servicio

**En funcionamiento, las tasas de lavado pasaron de 36 horas paso a 70 horas**

## Tanques de Almacenamiento

**Tanque de Almacenamiento Planta**

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

**Estado Actual: En ejecución 96 %**

**Actividades por ejecutar:**

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Rellenos perimetrales
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente

Actividades ejecutadas:

- Se termina los rellenos perimetrales
- Presentación tubería PEAD 10 " Entrada tanque

**Caseta eléctrica**

**Estado Actual: En ejecución 100 % obra civil**

**Caseta de Sopladores**: En operación los dos equipos de sopladores

**Sistema Streaning Current**

**Por instalar**: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante

**Tanque de almacenamiento La Albania**

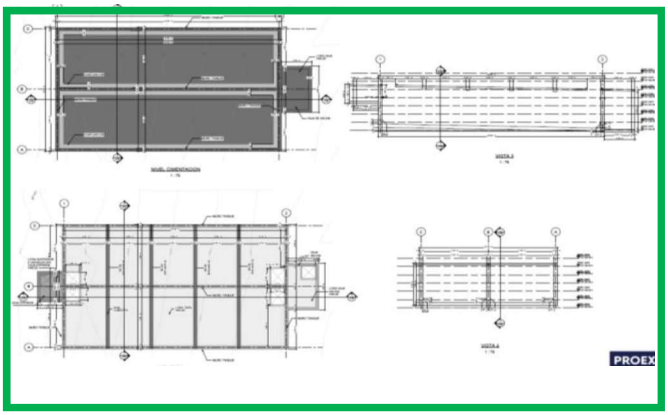


**Dimensiones exteriores**

Largo: 25 mts
Ancho: 15 mts
Profundidad: 5 mts

**Actividades por ejecutar:**

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Rellenos perimetrales
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente

**Actividades ejecutadas en este periodo:**

- Se termina con rellenos perimetrales

Area resaltada en rojo significa fundicion en concreto

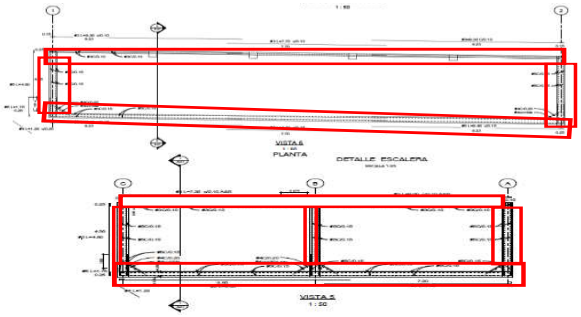

## PTAP GUACARI

**Floculadores:** Sistema nuevo de seis paletas mecánicas para el primer circuito

**Estado Actual Floculadores Línea 3 : En servicio**

Se instalaron 6 moto reductores, pero hay en servicio 4 por poca capacidad eléctrica de la planta.

### Sedimentadores 1 – 2- 3:

Se efectuaron las siguientes actividades en general:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

En Operación

**Proceso de Filtración:**

Actividades a ejecutar:

Canal Falso Fondo - Leopold
Ajuste Losa de Fondo
Sistema tubería proveniente de los sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable

Estado Actual Filtración: Modulo A Son tres filtros - En ejecución,

Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - En operación

Suministro e Instalación de sopladores -Son dos unidades y en operación para las pruebas de los filtros

**Caseta eléctrica**

**Estado Actual: Obra civil terminada**

**Sistema Streaning Current**

**Por instalar**: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante

**Registro Fotográfico Inspección Interventoría Seguimiento Normalización NC RETIE PTAP de Guacarí**.

-

| | | |
|---|---|---|
| 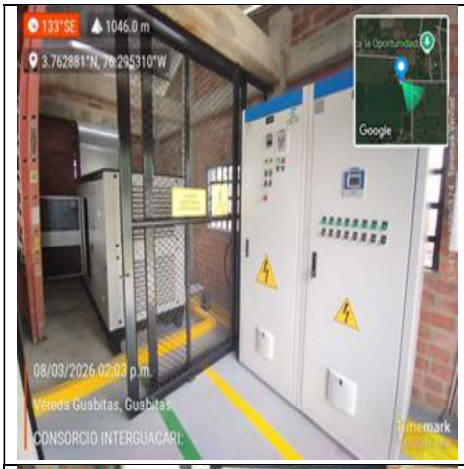  | | -Cuartos electrico y de Planta Generadora GEN de emergen cia Cumplen RETIE.<br>puerta Divisora, distancias de seguridad, piso pintado con distancias de trabajo según el Reglamento RETIE.<br><br>-Se verifican Tablero de Distibucion Instalaciones de Uso Final Marcado, ademas tapa de lamina alfajor instlada en el cárcamo.<br>-CUMPLE. |
| | | -Cuarto Planta GEN de Emergencia termiando obras de metalmecanica terminada con Puerta Divisoria, Ducto metalico conducir al exterior salida de Aire Caliente producio por la conmbustion del motor; instalada la ventana que acopla el ducto e instalado el aislamiento Térmico al Tubo de escape de Monoxido de Carbono CO.<br><br>-CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 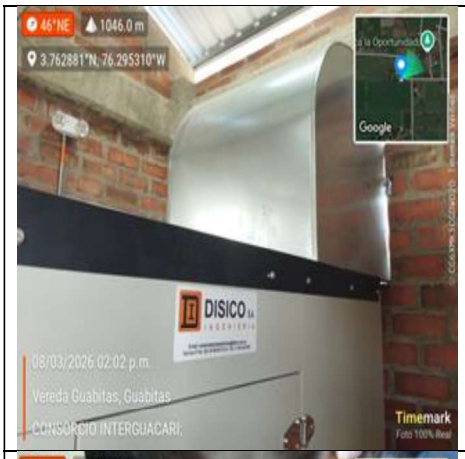 | 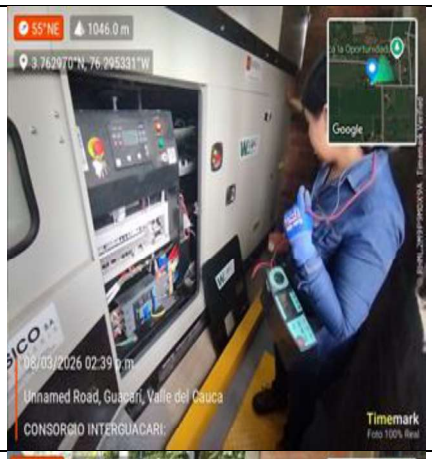 | -La inpectora RETIE, adelanta pruebas de Aislamiento a la Acometida o alimentador de la Planta GEN. siendo positivas los test realizados.<br><br>-La Planta GEN se le realizaron según el contratista pruebas de arranque en vacio con resultado positivo.<br><br>-CUMPLE. |
| | | -Inspeccion por parte de la Ing. del Organismo RETIE verifica la Normalización de C/u de las No Conformidades NC debidamante subsanadas.<br><br>-Se verifica Tableros DE Fuerza ay Control Marquillados, con sus Diagrmas Unifilares fijados, barrajes de puesta a tierra instalados, tierras independien-tes según el RETIE. CUMPLE. |
| | | -Inspecciaon a las Camaras de Registro ya de acuerdo al Re-glamento, debidamente Marqui-lladas , con Faseo y tubos PVC sellados con espuma expansiva.<br><br>-Se realñiza inspeccion a todas las camaras de paso o registro siendo aparobadas y levantada su NC.<br><br>-Los Alimentadores se verifica buclas de reserva tecnica.<br><br>-CUMPLE.<br>. |

| | | |
|---|---|---|
| | 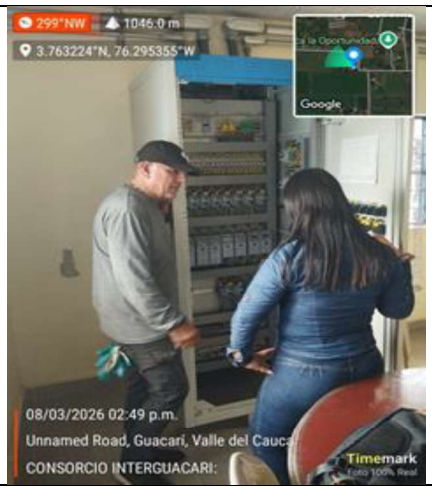  | -Inspeccion al Area tencinca de operación equipos de Fluocula-ladores, tierras barrajes, marqui-llado debidamante instalados y marcados codigo de colores.<br><br>-Solicitar al Contratista el Retiro de todo material excedente, tuberias y demas accesorios.<br><br>-CUMPLE. |

**Registro Fotografico Inspeccion Interventoría Seguimiento y Avance Obra Electrica PTAP de Ginebra.**

| | | |
|---|---|---|
| 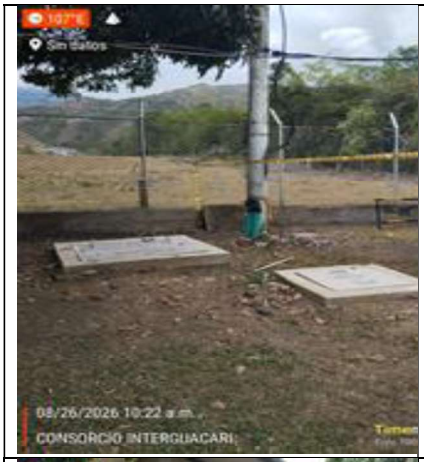  | | -Punto de Montaje Transformador de Potencia.<br><br>-Nodo o apoyo a retirar y montar el aprobado por el OR Celsia.<br><br>Red subterranea por rematar en este costado del Nodo del Trafo. las camaras de registro estan OK.<br><br>- |
| 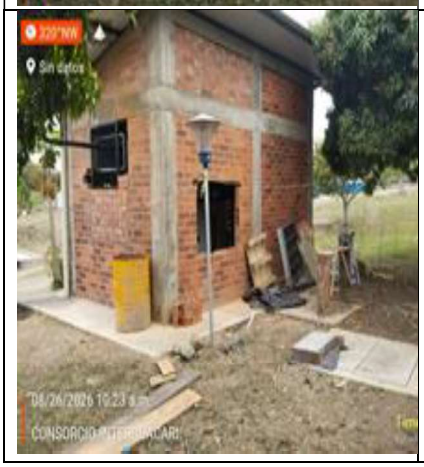  | | -Cuarto Electrico esteriores, pendiente remates de obra civil.<br><br>-montar la Ventana de Ventilación nartural y remates de mampsoteria.<br><br>.Falta por instlar en el tubo de escapae de Monoxido de Cartbono CO el Aislamiento termico.<br><br>.-Rertirar material excenete o siobrante de las isntalaciones teminadas. |

| | | |
|---|---|---|
| 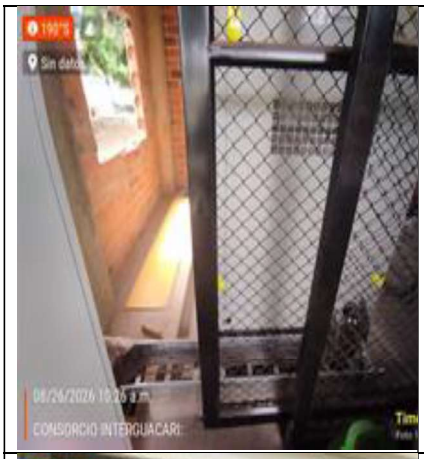 | 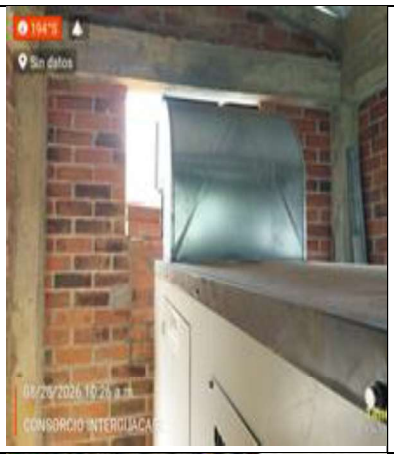 | -Puerta de division cuartop electrico del area de la Planta GEN.<br><br>-Se observa el montaje de las tapas de los caracamos en lamina alfajor de acuerdo a las norma de cosntruccion.<br><br>-Ducto metalico de salida de Aire Caliente al extreriror del radiador de la Planta, debidamante isntalado. |
| | | -Tablero de Potencia en Cuarto Electrico debidamante cableado internamante,<br><br>-Pendiente fijar los disagrmas Unifilres de fuierza y control.<br><br>-aun por interconectar a la Acoemtada del Transformador e intercoenxiones ionternas.<br>. |
| 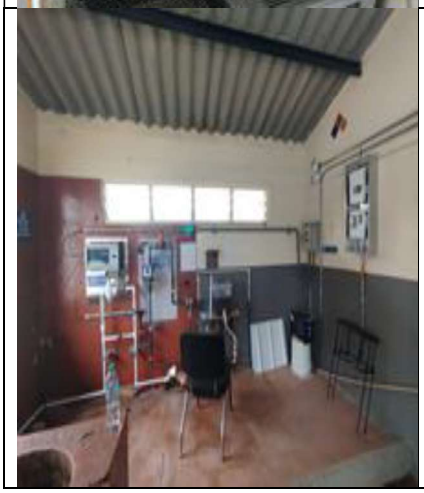 | | -Area o cuato de Claoracionm o Stream Current se observa Tablero de distribusion ianrtalado.<br><br>-Pendioente teminar de cablear aya rmar tablero con sus respectivas protecciones termomagenticas.<br><br>-pendienmte coordianr la reubicacionde la UPS que por seguridad no debe estar operando dendo de esta area de gases. |

| | | |
|---|---|---|
| 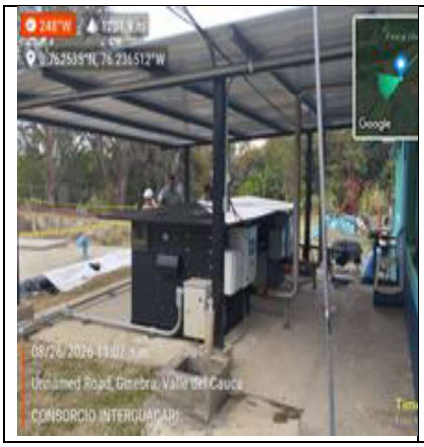 | | -Area ao caseta de sopladores pendiente por temrinar lñas instalcioens de Uso final.<br><br>-Se deber isntlar Tablero de Distribusion para control de cusircuitos de Ilumiancion y fuerza.<br><br>-Instlar Lumianrias hermeticas y lumianria de enmergiencia coamo lo exige el Reglamento RETIE. |
| | | -Cuarto de Sedimentacion se observa aya aisntalado el Tablero de Fluoculadores.<br><br>-Pendiente remates de Aliemtnadores a motores exteriores.<br><br>.Pendiente conexiones fianles y pruebas de operación, del sistema definitivo. |
| | | -Pendienta calbeado a also motores de area exterior de sedimentacion.<br><br>-Instlaciones lectricas sobrepuestas en areas exoeriores deben ser en tubeia metalica tipo IMC, marcadas cada 3 metros con cinta coalor naranja que uidentifica las redes electricas. |

## 2.4 COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

- Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma ubicada en el Municipio de Ginebra, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta: Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025 y en Proceso de Prorroga.

  - Permiso Resolución No.PM.300-42-2-028 18-11-2024 para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, con vigencia al 18 de Noviembre de 2026.

- Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

  - Permiso de rotura con resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

    Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
    Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

  - Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

    En el siguiente cuadro se registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los que estan en proceso de ejecución:

| COMPONENTE AMBIENTAL 2025 | CONSOLIDADO DE PERMISOS/ACTIVIDADES | ESTADO/VIGENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC | Permiso de Ocupación de Cauce | Otorgado: Vigente hasta 18- de noviembre 2026 | "Por medio de la cual se prórroga un permiso de ocupación de cauce y obras hidráulicas en el predio denominado PTAP, ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, departamento del Valle del cauca" |
| | Permiso de Aprovechamiento Forestal PTAP Acuavalle Ginebra | Otorgado: Vigente hasta 08 de junio de 2026 | Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad. |
| | Permiso de Aprovechamiento Forestal BOCATOMA Ginebra | Otorgado: Vigente hasta 22 de abril de 2026 | **Resolución 740 No. 0741 13191 22-10-2025** |
| Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP Acuavalle GINEBRA | Ejecución de Actividades Silviculturales (Erradicación y Poda) PTAP GINEBRA | Ejecutado | Se realiza la Tala y Poda de los individuos autorizados por la autoridad ambiental CVC. |
| Alcaldía Municipal GINEBRA | Permiso de rotura de vía | Otorgado: Vigente hasta el año 2027 | **Resolución No. 014- 09-2025** |
| Alcaldía Municipal GUACARI | Permiso de rotura de vía | Otorgado: Vigentes hasta el 18 de noviembre de 2026. | **Resolución No. PM.300-42-2-028 del 18 de Noviembre de 2024.** |
| Alcaldía Municipal GINEBRA | Licencia de Espacio Público | Otorgado: Vigentes hasta el año 2028. | Se recibe autorización de prórroga: **Resolución No. 0015-04-12-2025** |
| Alcaldía Municipal GUACARI | Licencia de Espacio Público | Otorgado: Vigentes hasta el año 2027. | Se recibe autorización de prórroga: **Resolución No. 140-23-3-001 del 13 de Enero de 2026.** |

### 2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra:

El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos:

- El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CVC
- Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición final de RCD avalado por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y se está aprovechando este material para hacer el relleno.

## 3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

### 1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto
Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la Comunidad
Aspecto No. 5: Reuniones con la Comunidad
Aspecto No. 6: Programa de atención a la Comunidad
Aspecto No. 7: Programa de atención al Ciudadano
Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra
Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra
Aspecto No. 10: Conformación del comité de Veeduría Ciudadana
Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la Comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el Consorcio Redes y Ptaps Valle.

- **ASPECTO No. 01: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.**

**Objetivo:** Realizar el diagnóstico de la zona de influencia del proyecto mediante la identificación y análisis de las características sociales, comunitarias, territoriales y de servicios presentes en el área de intervención, con el fin de reconocer las condiciones actuales de la comunidad y orientar adecuadamente las actividades del proyecto.

**Acciones Desarrolladas:**

El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social.

- **ASPECTO No. 02: CENSOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PROYECTO**

**Objetivo:** Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

**Acciones Desarrolladas:**

En el mes de agosto de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 78.57%

.
Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:

Regaderos - Ginebra: 15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo: 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda: 23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra: 7 actas de inicio
Sector Albania: 2 actas de vecindad
1 acta de entorno
Sector Planta de Guacarí Hacienda La Tesalia Guabitas 1 acta de entorno

| ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | PENDIENTE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura | 70 | 55 | 15 | 78.57% |

*Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado*

- **ASPECTO No. 03 : PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD**

**Objetivo:** Informar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto**,** facilitando la generación de un clima de confianza, compresión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

**Acciones Desarrolladas:**

La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.

- **ASPECTO No. 04 : PROGRAMA DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD**

**Objetivo:** Implementar un programa de divulgación dirigido a la comunidad del área de influencia del proyecto, con el fin de informar de manera clara y oportuna sobre el alcance, avances, actividades y posibles impactos de la obra, promoviendo la participación, el acceso a la información y la adecuada relación entre la comunidad y el proyecto.

**Acciones Desarrolladas:**

En el mes de agosto el contratista realizó la actualización de la información de la cartelera informativa en la Personería Municipal De Guacarí para la divulgación de los avances de obra a la comunidad.

*Foto N°1 Cartelera Informativa en la Personería de Guacarí*

- **ASPECTO No. 05: REUNIONES CON LA COMUNIDAD**

**Objetivo:** Realizar reuniones con la comunidad del área de influencia del proyecto con el fin de socializar información sobre el desarrollo de la obra, presentar avances, resolver inquietudes y promover la participación comunitaria.

**Acciones Desarrolladas:**

La interventoría evidencia que el contratista ha dado cumplimiento a la actividad de reuniones con la comunidad establecida en el Plan de Gestión Social, mediante la realización de reuniones informativas y de concertación con las comunidades del área rural de los municipios de Ginebra y Guacarí, así como con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de ambos municipios.

- **ASPECTO No. 06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

**Objetivo:** Brindar atención oportuna y permanente a la comunidad del área de influencia del proyecto, mediante la recepción, orientación y gestión de inquietudes, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, con el fin de contribuir a la adecuada ejecución del proyecto

**Acciones Desarrolladas:**

- Se mantiene habilitado el espacio del PAC con los formatos de PQRS, garantizando el acceso de la comunidad para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.
- Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias ubicados en la Personería de Guacarí y la Personería de Ginebra, sin evidenciarse PQRS radicadas por la comunidad durante el periodo evaluado.
- Se efectuó seguimiento a las vallas informativas instaladas en las principales vías de acceso a los municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales contienen información del contrato. Se evidenció que la valla ubicada en el municipio de Guacarí presenta actos de vandalismo, con daños visibles como roturas y grafitis.

*Foto N°2. Punto de Atención a la Comunidad* *Foto N°3. Cartelera informativa*

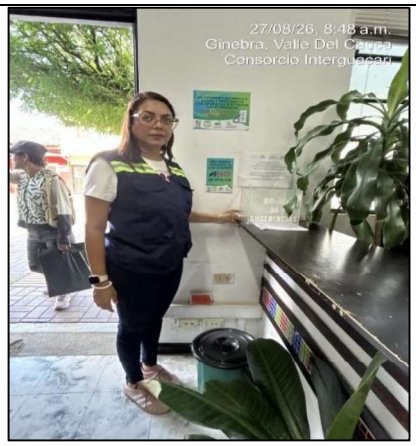

*Foto N°4. Seguimiento Buzón de Ginebra* *Foto N°5. Seguimiento Buzón de la Personería Guacarí*

*Foto N°6. Valla Informativa Ginebra* *Foto N°7. Valla informativa en Guacarí*

**ASPECTO No. 07 : PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Objetivo:** Crear y mantener un sistema de atención al ciudadano que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

**Acciones Desarrolladas:**

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:
Martes de 08:00 am a 12m
Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,
Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - Corregimiento de Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca.

Existen dos buzones de sugerencias ubicados en:
1. Personería de Guacarí.
2.Personería de Ginebra.

| NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO | TELÉFONO | CORREO | DIRECCIÓN OFICINA |
|---|---|---|---|
| María Fernanda Martínez | 3218673230 | redes.pqr@gmail.com | calle 11 # 4-37 tercer piso. edificio La Piscina barrio El Centro Corregimiento Costa Rica Municipio Ginebra. |

*Tabla N° 2 Información atención a la comunidad*

- **ASPECTO No. 08: RECORRIDOS POR LA OBRA**

**Objetivo:** Realizar recorridos por la obra con la comunidad, veeduría ciudadana y demás actores interesados, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto, las actividades que se ejecutan en campo y resolver inquietudes, promoviendo la transparencia, la participación y el seguimiento comunitario al desarrollo de la obra.

**Acciones Desarrolladas:**

Durante el mes de agosto no se realizó recorrido de obra, se programará para el mes de septiembre de 2026.

- **ASPECTO No. 09. REUNIÓN DE AVANCES DE OBRA**

**Objetivo:** Realizar reuniones de avances de obra con la comunidad y los actores involucrados, con el fin de socializar el estado de ejecución del proyecto, informar sobre las actividades desarrolladas y programadas, y atender inquietudes de la comunidad, promoviendo la transparencia y el seguimiento al desarrollo de la obra.

**Acciones Desarrolladas:**

Se evidenció que el 20 de agosto de 2026 el componente social del contratista llevó a cabo la reunión informativa sobre el avance de obra con los integrantes de las veedurías ciudadanas de los dos municipios Guacari y Ginebra, por petición de los veedores en el anterior comité.

Se contó con la participación presencial y virtual de los veedores de los dos municipios.

*Ilustración N°1 . Convocatoria reunión Comité de Veeduría Ginebra y Guacari*

Durante la reunión, el señor Jesús Herney Plaza informó que no podrá continuar ejerciendo como veedor ciudadano, debido a su reciente nombramiento como concejal del municipio de Ginebra.

La ingeniera Ana Fernanda Rosero informó que el ingeniero Darío Flórez ya no hace parte del consorcio. En relación con el avance de obra, indicó que el componente técnico presenta un avance del 32%, mientras que la instalación de tubería presenta un avance del 18% en el tramo entre Puente Amarillo y Sky Blue. Para este tramo se implementará un método de trabajo sobre un costado de la vía, con el propósito de minimizar la intervención sobre la misma. Asimismo, informó que el consorcio se encuentra analizando la posibilidad de realizar excavación manual en el tramo 2, comprendido entre Puente Rojo y el acceso a la PTAP de Ginebra.

Respecto al tramo 3, se informó que la instalación de tubería presenta un avance del 93%. Se encuentra pendiente hacer de un empalme de tubería en la glorieta del Ingenio Pichichí, así como la intervención en el tramo entre La Magdalena y el puente.

En cuanto a la planta de Guacarí, se reportó un avance del 85%. La última actividad será la intervención de un filtro en la batería A. Adicionalmente, se adelanta el proceso de certificación RETIE, requerido para terminar con las actividades del componente eléctrico.

La ingeniera Ana Fernanda Rosero se refirió a la PQRS presentada por la señora Anyileni Henao, sobre las intervenciones ejecutadas en el tramo 1. Manifestando en representación de la comunidad su preocupación frente a una posible reducción del diámetro de las tuberías de las alcantarillas durante las actividades de obra.

Ante esta inquietud, la ingeniera Ana Fernanda Rosero explicó que, durante las intervenciones, se ha evidenciado que algunas tuberías de alcantarillado presentan condiciones de colmatación debido a la falta de mantenimiento periódico. Precisaron que el consorcio no puede reducir el área de las tuberías y que, cuando se encuentran completamente obstruidas o deterioradas, se procede con su reposición, informó que durante la ejecución de las actividades se procura evitar afectaciones a la infraestructura existente y en algunos casos, se han realizado labores de limpieza de las alcantarillas.

En este sentido, se recomendó al Comité de Veeduría Ciudadana gestionar un oficio dirigido a las administraciones municipales de Ginebra y Guacarí, solicitando el mantenimiento periódico de las alcantarillas y demás elementos del sistema de drenaje vial.

Asimismo, se informó que para las reuniones del proyecto se extiende invitación a las administraciones municipales de Ginebra y Guacarí; sin embargo, a la fecha no se ha contado con la participación de representantes de dichas entidades.

En relación con la obra piloto del cárcamo, que se planteó como alternativa para evaluar un método constructivo que permitiera evitar la intervención de la vía en placa huella, la ingeniera Ana Fernanda Rosero informó que, al momento de tramitar el cobro correspondiente a los 24 metros inicialmente ejecutados, Vallecaucana de Aguas no autorizó el pago, debido a los sobrecostos asociados a la construcción del cárcamo.

Explicó que, en caso de ejecutarse los 80 metros inicialmente contemplados mediante este sistema constructivo, sería necesario realizar una compensación presupuestal mediante la disminución de actividades en otros frentes de obra. En consecuencia, se determinó como alternativa la instalación de la tubería mediante un sistema de anclajes. Para la próxima semana se tiene prevista la instalación de los 24 metros correspondientes al cárcamo piloto, mientras que el tramo restante será ejecutado mediante el sistema de anclajes.

El concejal Brayan Rodríguez había manifestado su interés en participar en la reunión, teniendo en cuenta que la comunidad y Proterritorio han expresado su interés en conocer el estado y continuidad del proceso del cárcamo.

Asimismo, señaló que la comunidad ha solicitado que no se intervenga el tramo 1, argumentando que aún se encuentran pendientes compromisos establecidos entre Vallecaucana de Aguas y Proterritorio.

Frente a esta manifestación, la ingeniera Ana Fernanda Rosero aclaró que la comunidad había solicitado específicamente que no se interviniera el tramo correspondiente a la placa huella y que no se había planteado la misma solicitud respecto del tramo 1.

De igual manera, María Fernanda Martínez precisó que las actividades y decisiones técnicas relacionadas con el proyecto no están condicionadas por los compromisos que Vallecaucana de Aguas haya establecido con Proterritorio, por corresponder a asuntos independientes del desarrollo contractual de la obra.

Finalmente, se acordó realizar una reunión con la comunidad y representantes de Proterritorio en el sitio donde se ejecutó la obra piloto del cárcamo, con el propósito de socializar las actividades desarrolladas, explicar las actividades que se tienen previstas y generar un espacio de diálogo que permita conciliar las inquietudes planteadas por la comunidad.

*Foto 8 y 9.. Reunión informativa de avance de obra con los Comités de Veeduría de Guacarí y Ginebra*

- **ASPECTO No.10: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA.**

**Objetivo:** Promover la conformación del comité de veeduría ciudadana en el área de influencia del proyecto, con el fin de fortalecer la participación comunitaria, el control social y el seguimiento a la ejecución de la obra, garantizando la transparencia y el adecuado desarrollo del proyecto.

**Acciones Desarrolladas:**

- Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto No. 10 del Plan de Gestión Social, mediante la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana en los municipios de Guacarí y Ginebra.

- La interventoría social participó y verificó que el 20 de agosto de 2026 se realizó la reunión en conjunto de los dos comités de veedurías de los municipios de Guacari y Ginebra.

- **ASPECTO No.11: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA**

**Objetivo:** Promover la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, priorizando la contratación de personal residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de generar oportunidades de empleo local, fortalecer la participación de la comunidad y contribuir al desarrollo social y económico de la zona.

| DETALLE | NOMBRE COMPLETO | CARGO | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO PROFESIONAL | | | | | |
| 1 | Willian Mora | Coordinador de proyectos | Cali | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 17/02/2026 | |
| 2 | Carlos Andres Leyva | Director de Obra | Cali | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | | |
| 3 | Aldo Gutierrez | Consorciado | Cali | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | | |
| 4 | Ana Fernanda Rosero Cajigas | Ing. Presupuesto | Ginebra | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 15/01/2024 | |
| 5 | Jennifer Alexandra Cabrera | Residente Obra | Ginebra | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 27/07/26 | |
| 6 | María Fernanda Martínez | Profesional social | Buga | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 10/01/1023 | |
| 7 | Carolina mora duarte | Aux. Administrativa | Ginebra | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 10/02/2026 | |
| | | | | | | |
| | GRUPO OPERATIVO | | | | | |
| 8 | Jorge Aponte | Ayudante de obra | Ginebra | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 2/9/2024 | |
| 9 | Mauricio Fernando Soto | Ayudante obra | Puente rojo | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 14/11/24 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jorge Hernán Ocampo Cortez | Ayudante obra | Ginebra | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 26/11/24 | |
| 11 | Rodrigo Rodríguez | Ayudante obra | Puente rojo | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 02/07/25 | |
| 12 | Saray Tonuzco | Aux vial | Guacarí | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 03/07/25 | |
| 13 | Angelica Maria Gonzalez | Aux. Vial | Costa Rica | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 27/03/2026 | |
| 14 | John Jairo Viveros | Ayudante de obra | Guacarí | CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | 14/07/25 | |
| 15 | Guillermo Gonzalez | Topógrafo | Cali | TOPOGRAFIA | 05/03/2026 | |
| 16 | Jimmy Sinisterra | Topografo | Cali | YIMMY SINISTERRA | 08/10/2025 | |
| 17 | Jose Espinosa | Cadenero | Cali | CADENERO | 05/03/2026 | |
| 18 | Nelson Blanco | Electricista | Cali | ELECTROMONTAJES BS | 15/10/2025 | |
| 19 | Andrés Felipe Gómez | Ayudante | Guacarí | ELECTROMONTAJES BS | 11/11/2025 | |
| 20 | Ricardo Villegas | Ayudante | Cali | ELECTROMONTAJES BS | 02/03/2026 | |
| 21 | Iván Camilo Caicedo | Oficial | Guabitas | A7 | 15/07/25 | |
| 22 | Alexander Araujo | Oficial | Guabitas | A7 | 31/05/25 | |
| 23 | Olegario Cobo | Ayudante | Guabitas | ABRAHAM CAICEDO | 10/01/2026 | |
| 24 | Eduardo Garcia | Ayudante | Guabitas | ABRAHAM CAICEDO | 10/03/2026 | |
| 25 | Abraham Caicedo | Maestro | Guabitas | ABRAHAM CAICEDO | 07/03/2026 | |
| 26 | Alvaro Javier Corrales | Ayudante | Guabitas | ABRAHAM CAICEDO | 02/04/2026 | |
| 27 | David Lozano | Ingeniero | Cali | INGENIERIA Y SOLUCIONES | 19/08/2025 | |
| 28 | Maicol Caicedo | Maestro | Cali | INGENIERIA Y SOLUCIONES | 19/08/2025 | |
| 29 | Orley Gomez | Conductor | Costa Rica | INGENIERIA Y SOLUCIONES | 19/08/2025 | |
| 30 | Brayan Navarrete | Ayudante | Costa rica | INGENIERIA Y SOLUCIONES | 20/01/2026 | |
| 31 | Guillermo Alvarez | Operario | Cali | INGENIERIA Y SOLUCIONES | 01/11/2025 | |

*Tabla N° 3. Información personal contratado por el contratista*

| SECTOR / MUNICIPIO | CARGO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| GUACARÍ | Ayudante de obra | 1 |
| GUACARÍ | Ayudante | 3 |
| GUACARÍ | Maestro | 1 |
| GUACARÍ – Guabitas | Ayudante | 4 |
| GUACARÍ – Guabitas | Oficial | 2 |
| **TOTAL GUACARÍ** | | **11** |
| **GINEBRA** | | |
| GINEBRA | Ayudante de obra | 2 |
| GINEBRA | Ingeniera ambiental | 1 |
| GINEBRA | Auxiliar administrativa | 1 |
| GINEBRA | Auxiliar vial | 2 |
| GINEBRA | Ingeniero de presupuesto | 1 |
| GINEBRA -Costa Rica | Almacenista | 1 |
| GINEBRA | Residente obra | 1 |
| **TOTAL GINEBRA** | | **8** |

*Tabla N° 4. Mano de obra contratada por municipio.*

| GRUPO PROFESIONAL | FEMENINO | MASCULINO |
|---|---|---|
| | 4 | 3 |
| **PERSONAL OPERATIVO** | 2 | 22 |
| **TOTAL** | 6 | 25 |

*Tabla N°5. Personal por genero*

**TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA ZONA**

| MUNICIPIO | # PERSONAS CONTRATADAS |
|---|---|
| Ginebra | 7 |
| Guacari: | 11 |
| Otros municipios | 13 |
| TOTAL | 31 |

*Tabla N° 6. Total, personal activo en la zona*

| % | FORMULA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **PORCENTAJE DE MUJERES** | Mujeres contratadas/ Personal activo*100% | 19% |
| **PORCENTAJE DEL AREA DE INFLUENCIA** | Personas de la zona de influencia contratada/Personal *100% | 58% |

*Tabla N°7. Porcentaje personal contratado*

**Acciones Desarrolladas:**

El contratista promueve y fortalece la vinculación laboral de personal proveniente del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región, mediante la generación de empleo directo e indirecto durante la ejecución de la obra y el aporte a la disminución del desempleo.

Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 31 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 6 son mujeres, lo que representa el 19 % del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación con enfoque de género.

Así mismo, se verificó que 18 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 7 pertenecen al municipio de Ginebra y 11 al municipio de Guacarí, equivalente al 60% del total del personal, dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona.

El contratista informó que durante el mes de agosto no se realizaron contrataciones nuevas.

**COMITÉS DE OBRA**

- En el mes de agosto se realizó un comité técnico de obra el día 12 de agosto de 2026.
- Se informó las actividades realizadas desde todas las áreas: Técnica, SST, Ambiental y social.

*Foto N°10. Comité técnico de obra 12 de agosto de 2026*

**REUNIONES DE SEGUIMENTO DE ACTIVIDADES EN GESTION SOCIAL**

Se realizó reunión de seguimiento al componente de Gestión Social, con la participación de María Fernanda Martínez - profesional social del contratista y Neisler Abadía- profesional social de la interventoría, el día 4 de agosto de 2026, con el propósito de revisar el avance de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social y efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos.

Durante la reunión se abordaron los siguientes aspectos:

- Se verificó el funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), evidenciando que continúa prestando atención a la comunidad de manera continua y conforme a los horarios establecidos, garantizando un canal permanente para la atención de inquietudes, solicitudes y requerimientos de la población.
- La profesional social Neisler Abadía sugirió a la profesional social María Fernanda Martínez gestionar ante el Dr. Moisés Cepeda - Gerente de Vallecaucana de Aguas, la solicitud de una reunión de seguimiento a los compromisos adquiridos con la Dra. Leonor Abadia – Alcaldesa de Guacari y Dr. Jesus Fernando Martinez- alcalde de Ginebra, en la reunión sostenida en el mes de mayo de 2026.

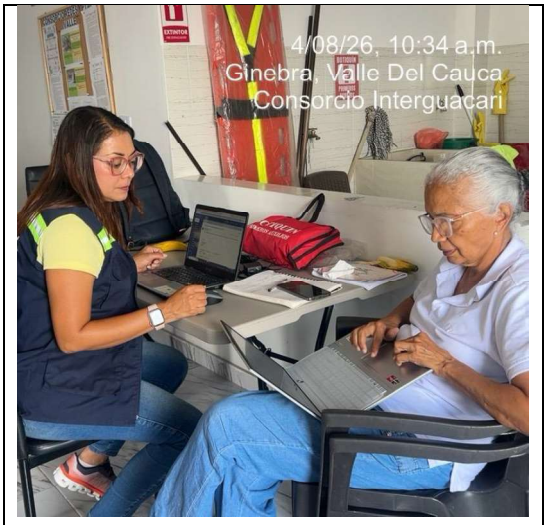


*Foto N°11. Reunión de seguimiento del componente social*

**OTRAS ACTIVIDADES**

Atendiendo la solicitud realizada por el concejal Brayan Rodriguez de socializar con la comunidad y Proterritorio las actividades a realizar e informar el avance de las obras, se programó reunión el 26 de agosto de 2026 en el lugar de la obra, esta reunión se tuvo que aplazar por inasistencia de la comunidad.

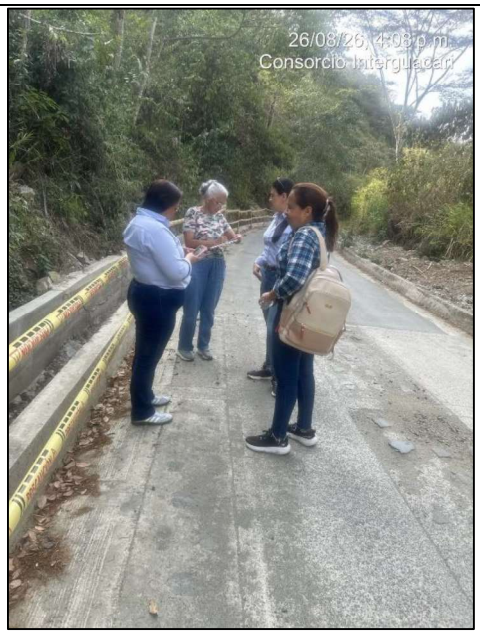


*Fotos N°12 y 13. Reunión cancelada con la comunidad*

**CONCLUSIONES**

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en este componente durante el mes de agosto de 2026.
- Durante el mes de agosto de 2026 se evidenció la continuidad en la implementación y el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social, garantizando el adecuado funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), el seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana y la actualización oportuna de los canales de información dirigidos a la comunidad del área de influencia del proyecto.
- Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 31 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 6 son mujeres, lo que representa el 19 % del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación con enfoque de género.
- Se verificó que 18 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 7 pertenecen al municipio de Ginebra y 11 al municipio de Guacarí, equivalente al 60% del total del personal, dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona.
- Se espera respuesta por parte del Dr. Moises Cepeda para la realización de la reunión de seguimiento con los alcaldes de Ginebra y Guacari referente a los predios de ocupación irregular.
- Se evidencia que la comunidad y Proterritorio continúan condicionando la continuidad de las actividades de obra al cumplimiento de los compromisos adquiridos por Vallecaucana de Aguas.

## 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **CONSORCIO INTERGUACARI**, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo.
- Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales.

### 4.1 OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, referente a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.**

### 4.2 ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución en los diferentes puntos de trabajo.

### 4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

#### 4.3.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES DIARIAS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| Verificación de condiciones de salud | Se mantienen controladas las condiciones de salud, dando cumplimiento a las recomendaciones y acciones implementadas por parte del contratista con el fin de evitar la propagación del caso de tuberculosis. De igual manera, se realiza seguimiento permanente a las condiciones de salud de todo el personal frente a la aparición de cualquier virosis. |
| Verificación de la zona de trabajo y herramientas | Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las herramientas a utilizar. |
| Uso de Elementos de Protección personal | Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, en este periodo se entrega dotación al personal nuevo. |

| | |
|---|---|
| Delimitación del área de trabajo, orden y aseo | Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar cualquier caída en las excavaciones. |

| | |
|---|---|
| Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo en alturas | Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las actividades que lo requieran. |

| | |
|---|---|
| Exámenes médicos ocupacionales | Durante el mes de Julio se verifica el cumplimiento del programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar el estado integral de todos los colaboradores. |

| | |
|---|---|
| Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias | En el periodo de Julio se mantienen las condiciones óptimas de los elementos de atención a emergencias, las señalizaciones en oficina y obra, se realizó cambio y se encuentran en buen estado, se mantienen rutas de evacuación y puntos de encuentro.<br>Se realiza un simulacro de emergencia en cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de gestión del riesgo y atención de emergencias. |

| | |
|---|---|
| Política y objetivos del SG-SST. | En este periodo de Julio se realizan inducción y reinducción sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro. |

| | |
|---|---|
| Actualización curso de trabajo en alturas | En este periodo no se realiza actualización de curso de alturas. |

Las charlas realizadas en el mes se describen a continuación:

### 4.3.2 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

| DESCRIPCIÓN | Número de asistentes/ Capacitaciones | Dirigido a |
|---|---|---|
| Posturas Forzadas y Repetidas | | TRABAJADORES |
| Caídas a distinto nivel | | TRABAJADORES |

| DESCRIPCIÓN | Número de asistentes/ Capacitaciones | Dirigido a |
|---|---|---|
| Levantamiento de cargas | | TRABAJADORES |
| Inspección EPCC | | TRABAJADORES |

### 4.3.3 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

| ITEM | INSPECCIÓN | HALLAZGOS | No. INSPECCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADAS | REALIZADAS |
| 1 | Inspección de EPP | Revisión de las condiciones y el estado de los elementos de protección personal | Por actividad | 07-2026 |
| 2 | Inspecciones locativas (contenedores, excavaciones campamento y oficina) | Sin hallazgos | Por actividad | 07-2026 |
| 3 | Inspección de herramientas (Pulidora, taladro de mano, mezclador) | Sin hallazgos | Por actividad | 07-2026 |
| 4 | Inspecciones de extintores, botiquín y camillas | Sin hallazgos | or actividad | 07-2026 |

**INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

| INDICADOR | |
|---|---|
| • Número de atenciones médicas comunes reportadas | 0 |
| • Días perdidos | 0 |
| • Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas | 0 |
| • Días perdidos | 0 |
| Incidentes | 0 |
| Accidentes | 0 |

## a. VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.

| PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE | No. CÉDULA | FECHA (dd-mm-aa) | | CARGO | SGSS | | |
| | | | Ingreso | Retiro | | EPS | ARL | AFP |
| 1 | Aldo Gutiérrez | 79.699.673 | N/A | | Consorciado | Sura | Sura | Colpensiones |
| 2 | Carlos Andrés Leyva | 89.008.184 | N/A | | Director de la Obra | Sura | Sura | Protección |
| 3 | Ana Fernanda Rosero Cajigas | 36.759.739 | 17/01/24 | | Ing. Presupuesto | Sanitas | Sura | Colpensiones |
| 4 | Darío Enrique Flórez | 1.026.277.221 | 05/02/24 | 24/07/2026 | Residente Obra | Sura | Sura | Colfondos |
| 5 | Carolina Mora Duarte | 1.082.976.100 | 10/02/2026 | | Aux administrativa | Sanitas | Sura | Colpensiones |
| 6 | María Fernanda Martinez | 38.856.496 | 05/01/23 | | Profesional social | Sura | Sura | Colpensiones |
| 7 | Diana Marcela Echavarría | 31.658.574 | 01-02-23 | | Ing. Ambiental | N. EPS | sura | Colpensiones |
| 8 | Jorge Aponte | 1.112.098.988 | 02/09/24 | | Ayudante de obra | N EPS | Sura | Porvenir |
| 9 | Mauricio Fernando Soto | 14.652.613 | 14/11/24 | | Ayudante obra | SOS | Sura | Porvenir |
| 10 | Jorge Hernán Ocampo Cortez | 9.858.689 | 26/11/24 | | Ayudante obra | Emssanar | Sura | Porvenir |
| 11 | Rodrigo Rodríguez | 16.860.355 | 02-07-25 | | Ayudante obra | Salud Total | Sura | Porvenir |
| 12 | Saray Tonuzco | 1.005.870.273 | 03-07-25 | | Auxiliar Vial | Emssanar | Sura | Colpensiones |
| 13 | Ronald Andrés Gómez | 1.112.958.420 | 16-01-26 | | Ayudante obra | Salud Total | Sura | Porvenir |
| 14 | Glories Zuluaga López | 39.282.330 | 15-07-2026 | | SST ( E) | Sura | Sura | Porvenir |

| PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE | No. CÉDULA | FECHA (dd-mm-aa) | | CARGO | SGSS | | |
| | | | Ingreso | Retiro | | EPS | ARL | AFP |
| 1 | IVAN CAMILO CAICEDO | 1.114.457.595 | 15/07/25 | | MAESTRO | S TOTAL | SURA | PORVENIR |

| PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE | No. CÉDULA | FECHA (dd-mm-aa) | | CARGO | SGSS | | |
| | | | Ingreso | Retiro | | EPS | ARL | AFP |
| 1 | DAVID LOZANO | 16.932.279 | 19/08/25 | | ING. ENCARGADO | EMSSANAR | SURA | PORVENIR |
| 2 | MAICOL CAICEDO | 1.143.938.113 | 19/08/25 | | INSPECTOR | SURA | SURA | PORVENIR |
| 3 | WALTER ASPRILLA | 16.789.876 | 19/08/25 | | AYUDANTE | N EPS | SURA | PORVENIR |
| 4 | ORLEY GOMEZ | 94.301.373 | 19/08/25 | | CONDUCTOR | COLPENSIONES | SURA | SANITAS |
| 5 | JOSE ALBERTO MELENDEZ | PT5523201 | 19/08/25 | | OPERADOR MAQUINA | ASMET SALUD | SURA | PORVENIR |
| 6 | ALBEIRO ARANGO | 94.474.251 | 01/11/25 | | OPERADOR MAQUINA | SOS EPS | COLMENA | COLPENSIONES |

| PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE | No. CÉDULA | FECHA (dd-mm-aa) | | CARGO | SGSS | | |
| | | | Ingreso | Retiro | | EPS | ARL | AFP |
| 1 | NELSON BLANCO | 91.272.299 | 03/10/25 | | ELECTRICISTA | N EPS | SURA | COLPENSIONES |
| 2 | ANDRÉS FELIPE GOMEZ | 1.007.555.715 | 03/10/25 | | AYUNDANTE | S TOTAL | SURA | PROTECCION |
| 3 | LORENA GOMEZ | 38.595.100 | 27/10/25 | | INSP SST | N EPS | SURA | PORVENIR |

Fuente de elaboración: Informe de contratista, Glories Zuluaga SST

## CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

| | |
|---|---|
| Personal Consorcio | 13 |
| Personal topografía | 2 |

| | |
|---|---|
| Personal Operativo A7 Construcciones | 3 |
| Personal Electro montajes | 3 |
| Personal Operativo Ingeniería y Soluciones Civiles | 6 |
| Personal Renovando Ingeniería SAS | 4 |
| **TOTAL** | **31** |

**REALIZACIÓN DE SIMULACROS**

No se realizaron simulacros este mes.

## 5. MANEJO AMBIENTAL

### 5.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD

El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser utilizado.

Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos:

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica
- Póliza daños a terceros

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD | CERTIFICADO |
|---|---|---|
| Madera | No reporta | N/A |
| Chatarra | No reporta | N/A |
| Material de Excavación RCD | | |
| Residuos Aprovechables y no Aprovechables | No reporta | N/A. |
| Teja PVC otros | No se genera | N/A |

## 5.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO:

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos.

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.

- Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo.

## 5.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

| TIPO DE MATERIAL | FECHA | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Inspección de seguridad y ambiente (orden y aseo) | Semanal | |

## 5.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

| MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA | CANTIDAD | MARCA SERIE - PLACA |
|---|---|---|
| Equipos de topografía | Estación – Nivel | NIKON SNDWAY |
| Retroexcavadora Llantas | 1 | CAT |
| Retroexcavadora Oruga | 1 | Hitachi |
| Volquetas | 1 | (UFK231) |
| Taladro demoledor | 3 | |
| Pulidora | 2 | DELWAT |
| Sierra circular para corte de madera | 1 | DELWAT |
| Planta Generadora 6.5 | 2 | ELITE- NUEVA |
| Motobomba 2 pulgadas | 1 | BARNES |
| Motobomba 3 pulgadas | 1 | |
| Mezcladora de concreto | 2 | TOOLCRAFT |
| Vibrador eléctrico | 3 | BOSCH 2.8 HP-NUEVO |
| Taladros manuales | 3 | |
| Martillo demoledor | 1 | SIEFKEN |
| Rotomartillo | 1 | SIEFKEN |

| | | |
|---|---|---|
| Buggy | 7 | Herragro- Toolcraft |
| Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate) | | |

## 6. RECOMENDACIONES DEL COMPÓNENTE EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- ✓ Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- ✓ Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- ✓ Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

**PTAP de Guacarí**:

- Se continua con la intervención del Módulo A con colocación de falsos fondos

**PTAP de Ginebra**:

- Floculación: Terminado
- Sedimentación: Terminado
- Filtración: terminado

**Tanques de Almacenamiento**

- Planta: falta las conexiones al sistema existente de suministro

- La Albania: falta las conexiones al sistema existente de suministro

**Frente Tramo 3**:

Se continua con la construcción de estructuras en concreto reforzado para válvulas de purga, ventosas y quiebre de presión,
Se realizo el empalme de los tramos que se realizaron las pruebas hidrostáticas entre las abscisas K4+060 a K 3+560 y K4+560 a K4+060

- **Frente Tramo No. 01:**

Se continua en la construcción del piloto de cárcamo en concreto entre batea Bananos a Puente Amarillo.

- Se continua con la excavación , para la instalación de tubería en el tramo entre las abscisas

K2+600 a K2+910 en tubería PEAD 18 "

**Otros**

- Con relación a los diseños de la Bocatoma, el contratista ya hizo entrega de los Estudios de Geología y Geotecnia, Diseño Hidráulico de la Captación, Hidráulica Fluvial, Rediseño de Bocatoma y diseño estructural.

- Pendiente por entregar: Presupuesto de la Bocatoma, Malla Coanda y especificaciones técnicas

- Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato

- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento ya fueron dados por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.

- Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.

- Continua la situación de orden social ya que los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio suspendieron los trabajos en el sector de Villa Indigo a Puente Rojo, al no permitir que se ejecute ningún tipo de intervención en la vía.

- Esta pendiente que la Alcaldía de Ginebra solucione con tres personas la invasión que hicieron en el área donde se va a construir la bocatoma, recalcando que invasores están en área de protección del Rio Guabas.

- Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.

- Se siguen los lineamientos de medicina preventiva.

- Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 31 de Agosto de 2026:

| AVANCE | ( %) |
|---|---|
| FISICO | 81.0 |
| FINANCIERO | 78.3 |

Atentamente,

**EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**
Representante Legal
Consorcio Interguacarí
Interventoría

# ANEXO 1

# SEGURIDAD SOCIAL

# CONSORCIO INTERGUACARI

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-12, 02:47:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084130629

**Periodo Cotización:** agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

## PAGADO 10/08/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EDUARDO CARDENAS | | |
| **Documento** | CC16254057 | **Dirección** | CL 0 #0 - 0 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 5560163 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | VSP | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 16254057 | EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ | 57 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS018) S.O.S EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 340.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 121.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 340.800 | $ 0 | $ 340.800 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-09-04, 02:44:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084843575

**Periodo Cotización:** agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

## PAGADO 03/09/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EDUARDO CARDENAS | | |
| **Documento** | CC16254057 | **Dirección** | CL 0 #0 - 0 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 5560163 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 4 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | VSP | TDE | TAE | TDP | TAP | VSN | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 31522120 | NANCY RAMIREZ CASTRILLON | 01 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 149.400 |
| CC 38460488 | SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS018) S.O.S EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.600 |
| CC 6183718 | EINAR MARINO JIMENEZ SOTO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 66811813 | LUZ AMERICA MONTAÑO SERNA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.600 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 5.252.715 | $ 7.003.620 | $ 7.003.620 | $ 7.003.620 | $ 840.600 | $ 280.400 | $ 149.500 | $ 280.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.550.900 | $ 0 | $ 1.550.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 66658922 | | ABADIA LONDOÑO NEISLER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 8 N 9 - 60 | EL CERRITO-VALLE | 2589110 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 641280936 | 9509802064 | I | 2026/09/07 | 2026/09/10 | BANCO DE BOGOTA | 3 | $620,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 66658922 | ABADIA NEISLER | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS002 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $48,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |





Scanned with CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 66658922 | | ABADIA LONDOÑO NEISLER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 8 N 9 - 60 | EL CERRITO-VALLE | 2589110 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 641280936 | 9509802064 | I | 2026/09/07 | 2026/09/10 | BANCO DE BOGOTA | 3 | $620,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $800 | | | | | $0 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $320,000 | $800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $48,800 | $200 | | | | | $0 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $48,800 | $200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $600 | | | | | $0 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $250,000 | $600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$618,800** | **$1,600** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | |

Scanned with CamScanner

## Resumen General de Pago

| LOR A PAGAR |
|---|
| $320,800 |
| $320,800 |
| $49,000 |
| $49,000 |
| $250,600 |
| $250,600 |
| $620,400 |

Scanned with CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 16865991 | | CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 18 3N 70 | CALI-VALLE | 6530679 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 618376104 | 9510568399 | I | 2026/09/21 | 2026/09/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $3,832,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $12,000,000 | $2,040,000 | | | $12,000,000 | $1,500,000 | | | $0 | $0 | | | $12,000,000 | | $292,400 | | $0 | $0 | | $3,832,400 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $12,000,000 | $2,040,000 | | | $12,000,000 | $1,500,000 | | | $0 | $0 | | | $12,000,000 | | $292,400 | | $0 | $0 | | $3,832,400 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | $12,000,000 | $2,040,000 | | | $12,000,000 | $1,500,000 | | | $0 | $0 | | | $12,000,000 | | $292,400 | | $0 | $0 | | $3,832,400 |
| 1 | CC 16865991 | CARDENAS OSCAR | | 23030 1 | 30 | $12,000,000 | $2,040,000 | EP5005 | 30 | $12,000,000 | $1,500,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $12,000,000 | 2.436% | $292,400 | 0 | $0 | $0 | No | $3,832,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $12,000,000 | $2,040,000 | | | $12,000,000 | $1,500,000 | | | $0 | $0 | | | $12,000,000 | | $292,400 | | $0 | $0 | | $3,832,400 |

## Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,040,000 | $0 | $0 | $2,040,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $2,040,000 | $0 | $0 | $2,040,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $292,400 | $0 | $0 | $292,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $292,400 | $0 | $0 | $292,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$3,832,400** | **$0** | **$0** | **$3,832,400** |

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-04, 05:19:40 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87246609

**Periodo Cotización:** agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

## PAGADO 03/08/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES | | |
| **Documento** | CC16267590 | **Dirección** | CL 47A #42 C - 78 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6669047 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | VSP | TDE | TAE | TDP | TAP | VTE | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 16267590 | JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES | 57 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 295.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 76.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 295.100 | $ 0 | $ 295.100 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 16257466 | JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ | | CL 31 33 93 | 3960341 | jorgebarona2009@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94862322 | 03/09/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-08 | I | $0 | $261.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 218.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.900 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 42.700 | | | | 42.700 | 0 | 0 | 42.700 | | | 427 | 42.700 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 218.900 | 218.900 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 42.700 | 42.700 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 261.600 | 261.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 16257466 | JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ | | CL 31 33 93 | 3960341 | jorgebarona2009@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94862322 | 03/09/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-08 | I | $0 | $261.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. x exterior | Excepción | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 16257466 | BARONA FLOREZ JORGE ENRIQUE | 57 | 2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 3 | 42.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-12, 03:44:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084131141

**Periodo Cotización:** agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

## PAGADO 10/08/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | RODRIGO OBONAGA GAITAN | | |
| **Documento** | CC16608775 | **Dirección** | CL 13B #66 B - 56 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3163384677 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | VSP | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 16608775 | RODRIGO OBONAGA GAITAN | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 621.000 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 121.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 621.000 | $ 0 | $ 621.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1107071993 | | IZQUIERDO MARULANDA JULIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 23 No 56-15 | CALI-VALLE | 3701768 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-07 | 581764269 | 9507351676 | I | 2026/08/25 | 2026/08/20 | NEQUI | 0 | $576,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1107071993 | IZQUIERDO JULIANA | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS010 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF57 | 30 | $1,750,905 | $35,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1107071993 | | IZQUIERDO MARULANDA JULIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 23 No 56-15 | CALI-VALLE | 3701768 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-07 | 581764269 | 9507351676 | I | 2026/08/25 | 2026/08/20 | NEQUI | 0 | $576,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | | | | | $0 | $280,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | | | | | $0 | $42,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,100 | $0 | | | | | $0 | $35,100 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | $35,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | | | | | $0 | $218,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $576,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $576,900 |

PLANILLA PAGADA

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | LUIS MARIO DAVILA ROCHE |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-16274754 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-08-14 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-08-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-08-14 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 38087733 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 38087733 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87.000 | $ 87.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 657.000 | $ 657.000 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/09/2026 |
