

INFORME DE VISITA TECNICA

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MANI DAPARTAMENTO DE CASANARE".

APROBACIÓN

ELABORÓ	**FIRMA**	
	NOMBRE	LESLYE FERNANDO WALTEROS FLOREZ
	CARGO	Profesional de apoyo S.O.P.T-Componente civil
ELABORÓ	**FIRMA**	
	NOMBRE	EFRAIN NOSSA PARRA
	CARGO	Supervisor – Secretario de Obras publicas
OBSERVACIONES		

INFORME DE VISITA TÉCNICA.

LUGAR DE VISITA

CAMPOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA, DE LA SEDE ONESIMO ADAN SOLER Y CENTRO DE INTEGRACION COMUNAL DE SANTA ELENA.

SUPERVISION

EFRAIN NOSSA PARRA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

MANI – AGOSTO DE 2026

INTRODUCCION

La Administración Municipal de Maní, en desarrollo de su programa de atención a las comunidades, prioriza la mejora oportuna de la infraestructura deportiva en los sectores urbano y rural. La práctica del deporte es un pilar fundamental para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el bienestar y la prevención de riesgos sociales en jóvenes y adultos. Por ello, resulta prioritario apropiar los recursos necesarios para el mantenimiento, adecuación y conservación de los escenarios deportivos del municipio.

Villa Olímpica (Zona Urbana)

Con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad, movilidad y funcionalidad para los deportistas, se contempla ejecutar las siguientes obras:

- Iluminación: Instalación y adecuación del sistema de alumbrado en la cancha de fútbol de grama natural y en las canchas sintéticas de fútbol 5 y fútbol 11.
- Obras civiles y senderos: Construcción e instalación de placas de concreto para el tránsito peatonal de los deportistas. Esto evitará la dispersión del material triturado hacia la superficie sintética, eliminando riesgos de lesiones y previniendo el deterioro prematuro del césped artificial.
- Adecuación del sistema eléctrico: Elevación (entre 30 y 40 cm) y reconstrucción de las cajas eléctricas de distribución que presentan deterioro o riesgo de inundación durante la temporada de lluvias, garantizando un sistema seguro y estanco.
- Cerramiento perimetral: Mantenimiento correctivo al cerramiento en alambre de púa y postes de concreto, incluyendo el tensionado de hilos, reposición de postes faltantes e instalación de portones en los dos accesos principales para controlar el ingreso y proteger el escenario.
- Vereda Santa Elena (Centro de Integración Comunitario)

Para brindar mayor confort y seguridad en la práctica deportiva y en eventos comunitarios, se realizarán las siguientes actividades:

- Demarcación y pintura de la cancha multifuncional.
- Mantenimiento y pintura de barandas de protección.
- Suministro e instalación de reflectores de iluminación.

Vereda Belgrado (Campo Deportivo)

En preparación para los próximos Juegos Inter veredales del Alto y Bajo Cusiana, se requiere la puesta a punto de la infraestructura deportiva mediante:

- Demarcación y pintura de la cancha multifuncional.
- Suministro e instalación de reflectores con tecnología LED.
- Mantenimiento y pintura de marcos y barandas perimetrales que actualmente presentan deterioro

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS 6
INFORMACION GENERAL 8
1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 9
1.1 LOCALIZACION 9
COMPONENTE TECNICO 12
2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Es poder identificar las afectaciones prioritarias que bien afectando el tema de iluminación en las en los campos deportivos de la Villa Olímpica e igualmente las canchas multinacionales de las áreas Rurales de Santa Elena y de la escuela de Belgrado
- Mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva y garantizar un buen servicio a la comunidad.
- Colocar al servicio de la comunidad Campos deportivos que reúnan las condiciones para generar un mayor esparcimiento entre los participantes.
- Fortalecer la actividad física de jóvenes niños adultos con el fin de mejorar la salud sana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Con objetivo específico tenemos adecuación y mejoramiento de la cancha de fútbol 5 y fútbol 11 teniendo en cuenta que se requiere una actividad que es instalación de placa base en concreto 3000 PSI y el suministro e instalación de reflectores le marca Jetta para iluminación de la cancha sintética:

- La adecuación de la cancha de fútbol se tiene previsto hacer el suministro de reflectores instalación de tableros de control con sus respectivas Varillas Coperwell acometida de cable suministro de un tablero de control la reparación de algunas cajas sanitarias y instalación de placa base en concreto de 3000 PSI.

Adecuación del campo deportivo de Santa Elena

- Dentro de las actividades pendientes se tiene la pintura sobre el área de la cancha el área de juegos en la demarcación de la cancha multifuncional
- Pintura de barandas
- Instalación de lámpara led hay Bay para generar una mayor iluminación

Adecuación del campo deportivo de la cancha multifuncional vereda de Belgrado

- Instalación de lámparas led High - bay
- se hará la demarcación de la cancha multifuncional y se pintarán las barandas y arcos de los campos deportivos
- Además, el proyecto contempla la construcción de dos portones principales de ingreso a la Villa Olímpica —con sus correspondientes zapatas, columnas y estructura en acero de refuerzo— así como el mejoramiento y mantenimiento correctivo de la cerca de postes de concreto y alambre de púas.
- Retiro de espaldares metálicos en bancas Banca M-30 tipo IDU en concreto

CAPÍTULO I
INFORMACION GENERAL

1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

1.1 LOCALIZACION

El municipio de Maní está ubicado en la zona Sur occidental del Departamento del Casanare, entre los 4º 25´ a 4º de Latitud Norte y entre los 71º 51´ a 72º 26´ de Longitud Oeste de Greenwich, se encuentra a una distancia de la capital departamental Yopal 81 km y de Bogotá 440 km. Tiene una población de 11.123 habitantes y una extensión de 3.860 km2, con una altitud media de 200msnm.

Maní limita por el norte, con los municipios de Aguazul y Yopal; por el este con caño Guari amena como línea divisoria con Orocué; al sur con el Departamento del Meta y delimitado por la margen del cauce del Río Meta; por el oeste con Caño Güira separado del municipio de Tauramena.

Figura No. 1. Localización general del municipio



En el presente informe se realiza la ubicación de cada una de las áreas o infraestructura a intervenir.
La infraestructura la infraestructura del Coliseo de la Villa Olímpica del municipio de maní se encuentra ubicada en la siguiente dirección:

Localización villa olímpica

Entre CRA 9 y CRA 8 CON CALLE 8 Y CALLE 5





Localización Cancha multifuncional vereda de Belgrado





Localización Cancha multifuncional Corregimiento santa elena



CAPÍTULO 2
COMPONENTE TECNICO

2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El presente registro fotográfico evidencia el estado actual de las afectaciones encontradas en las áreas a intervenir.

Villa olímpica

Fotografía 1.	*Fotografía 2.*
	
En esta imagen se evidencia la necesidad de colocarle concreto para evitar la diseminación del triturado a la cancha sintética.	*En esta imagen se evidencia los reflectores que se les debe realizar el cambio.*
Fotografía 3.	*Fotografía 4.*
	
En esta imagen se evidencia la necesidad de cambiar el material existente que corresponde triturado por concreto reforzado de 3000 psi.	*Aquí se evidencian la estructura que posee los reflectores los cuales son objeto de reposición.*

Fotografía 5	*Fotografía 6*
	
Ahí se evidencia la cerca perimetral en alambre con postadura de cemento la cual se debe reparar.	*En la cancha de fútbol se va a instalar concreto reforzado en el área donde se encuentra la cubierta.*
Fotografía 7	*Fotografía 8*
	
Esta es una de las entradas principales a la Villa Olímpica la cual se le va a instalar un portón.	*Como se evidencia en esta imagen se ve la ductería eléctrica la cual se le va a instalar el cableado e igualmente darle solución a la tapa porque se encuentra destruida.*

Fotografía 9	*Fotografía 10*
	
Las cajas de inspección eléctricas se les debe hacer una remodelación porque se encuentran muy bajas y cada vez que llueva el nivel del agua supera y éstas se llenan de agua afectando el circuito eléctrico cubierta de la cancha sintética que se debe aplicar concreto reforzado en la placa.	
Fotografía 11	*Fotografía 12*
	
En el área donde esta la cubierta se le debe aplicar concreto de 3000 psi con el fin de evitar la diseminación del triturado.	*Cerramiento perimetral el cual se debe ajustar tensionar y adecuar*



Fotografía 13	*Fotografía 14*
	
Se evidencia que faltan algunos postas los cuales se deben instalar y tensionar las cuerdas de acuerdo a las especificaciones técnicas.	

Cancha multifuncional vereda de Belgrado

Fotografía 49	*Fotografía 50*
	
Esta imagen corresponde a la cancha cubierta de belgrado donde también se hará mantenimiento eléctrico reemplazando la lámpara led.	*Esta imagen corresponde a los marcos multifuncionales los cual serán pintados con pintura de aceite.*

Fotografía 49	*Fotografía 50*
	
Esta imagen corresponde a la cancha cubierta del coliseo de donde también se hará mantenimiento marcos de las canchas multifuncionales.	*Esta imagen corresponde a los marcos multifuncionales los cual serán pintados con pintura de aceite.*
Fotografía 49	*Fotografía 50*
	
Esta imagen corresponde a la cancha cubierta del Carmen donde también se hará mantenimiento eléctrico reemplazando la lámpara led.	*Esta imagen corresponde a los marcos multifuncionales los cual serán pintados con pintura de aceite.*

Cancha Multifuncional santaelena

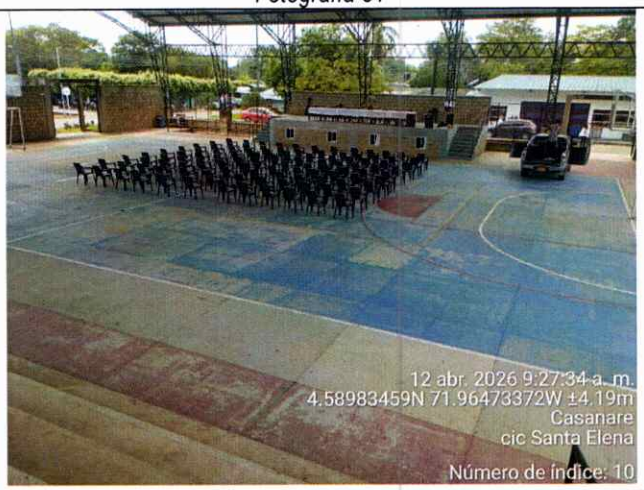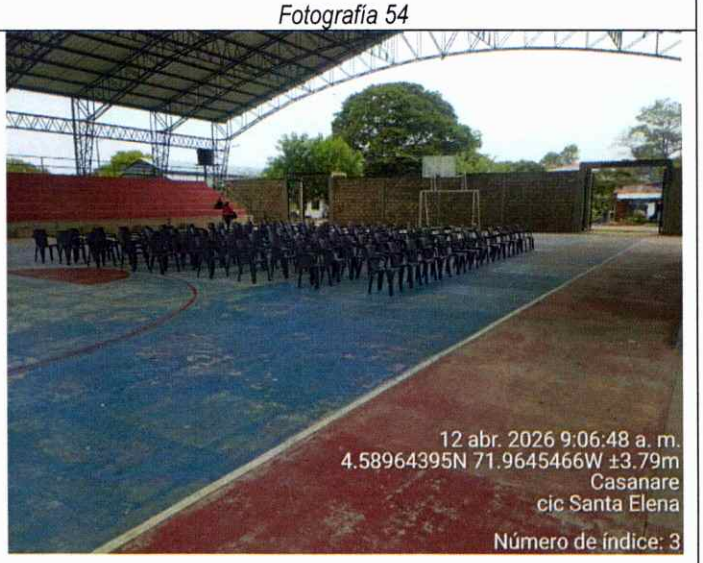Fotografía 51	*Fotografía 52*
	
Esta imagen corresponde a la cancha del cdi donde evidenciamos la tarima la cual requiere mantenimiento en pintura y lavado.	*Imagen de la placa de piso, la cual se debe pintar.*
Fotografía 53	*Fotografía 54*
	
En esta imagen se evidencia las barandas que se debe pintar.	*Imagen de cancha multifuncional de santa elena la cal se debe pintar con esmalte sintético.*
Fotografía 55	*Fotografía 56*

	
. Arcos multifuncionales para pintar y placa de piso de la cancha cubierta que también se va a pintar	*Arcos multifuncionales para pintar y placa de piso de la cancha cubierta.*

Con el presente informe se permite demostrar las condiciones de la infraestructura de los campos deportivos de la villa olímpica coliseo de la villa olímpica e igualmente todas las canchas multifuncionales que serán intervenidas y así mejorar las condiciones de los campos deportivos que permitan normalizar las condiciones para el buen desempeño de las actividades deportivas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Como podemos evidenciar los campos deportivos de la vía olímpica requieren mantenimiento oportuno y preventivo, la intervención que se realiza ahora de adecuar las placas en concreto eliminando el triturado es favorable porque ayuda a mitigar los riesgos de los deportistas cuando el titulado queda en la cancha sintética.

Con esta intervención se busca garantizar que los deportistas tengan unas condiciones más apropiadas para ejercer el deporte y evitar accidentes e igualmente al espectador darle unas condiciones más adecuadas y acordes al escenario que permitan el disfrute de la actividad.

Se recomienda continuar con las intervenciones oportunas como el mantenimiento al césped sintético, la limpieza permanente y protegerla de extraños que actúan inescrupulosamente.

Se recomienda realizar mantenimiento al césped sintético, mantener la vigilancia sobre el mobiliario de la villa olímpica.

Reviso: EFRAIN NOSSA PARRA
Secretaria de obras públicas y transporte.
Supervisor

Elaboró: Arq. Leslye Fernando Walteros Flórez
Profesional de apoyo S.O.P.T
