	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026	SEMANA No.	28	DEL	30-jul-26	AL	6-ago-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	192 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	192 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de figurado de acero para construcción de alcantarillas ubicadas en la abscisas K0+925 y K1+258 del tramo 2.
-Se realizó actividades de vaciado de concreto para construcción de descole en la alcantarilla ubicada en la abscisa K1+061 del tramo 2.
-Se realizó actividades de excavación para subrasante desde el K1+060 a K1+418 del tramo 2.
-Se realizó actividades de instalación de geotextil para colocación de subbase granular entre las abscisas K1+060 a K1+258 del tramo 2.
-Se realizó actividades de armado de acero vertical para construcción de vastago en muro 2, tramo 2 entre las abscisas K0+280 a K0+310.
-Se realizó actividades de construcción de filtro en el costado izquierdo de la vía entre las abscisas K1+290 a K1+328 en tramo 2.

-De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de: Instalación de tubería de concreto 36", Instalación NT2500, Tubería drenaje PVC 110, Material granular filtrante y Rajón para mejoramiento de la subrasante. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 14,28% y un avance acumulado ejecutado del 52,51%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 38,23%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson y fresado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 55,56% y un avance acumulado ejecutado del 29,72%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 25,84%.

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 45,43% que corresponde a $ 3.608.555.358, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 39,41% que corresponde a $ 3.119.105.741 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 6,02% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Instalación de tubería de concreto 36", Instalación NT2500, Tubería drenaje PVC 110, Material granular filtrante y Rajón para mejoramiento de la subrasante.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-290-2026 del 31 de julio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.27 – Actividades realizadas del 23 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-291-2026 del 1 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-246 Entrega del personal de mano de obra no calificada - Aprobación del personal presentado.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-292-2026 del 4 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a sus comunicados OFC-ICCU-1586-2025-247 y OFC-ICCU-1586-2025-248 - Observaciones a la solicitud de firma del formato 13 – Modelo de cálculo de IBC y aportes – Meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-293-2026 del 6 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-233 Entrega de la programación actualizada V7_2 – Observaciones programación de obra.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-294-2026 del 6 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Acta de obra parcial N.1.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-295-2026 del 6 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-251 - Entrega del Informe Social No.6.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-296-2026 del 6 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-250 - Observaciones a la solicitud de firma del formato 13 – Modelo de cálculo de IBC y aportes – Meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-247 del 30 de julio de 2026, remitió Solicitud de firma de Formato 13 (Modelo de cálculo de IBC y aportes) – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-257-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-248 del 30 de julio de 2026, remitió Solicitud de firma de Formato 13 (Modelo de cálculo de IBC y aportes) - Junio.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-249 del 5 de agosto de 2026, remitió Entrega del Informe Técnico No. 5 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-268-2026 - Remisión de Certificados de Calidad, Fichas Técnicas y Ensayos de Laboratorio.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-250 del 6 de agosto de 2026, remitió Solicitud de firma del Formato 13 (Modelo de cálculo de IBC y aportes) – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-292-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-251 del 6 de agosto de 2026, remitió Entrega del Informe Social No. 6.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 129 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	40,96%	38,22%	-2,74%
Durante el periodo	4,47%	1,19%	-3,28%
Acumulado Actual	45,43%	39,41%	-6,02%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	193,00	79 días	-16,37

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.253.443.725	$ 3.024.488.966	93%
Durante el periodo	$ 3.608.555.358	$ 3.119.105.741	86%
Acumulado Actual	$ 6.861.999.083	$ 6.143.594.707	90%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-10%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

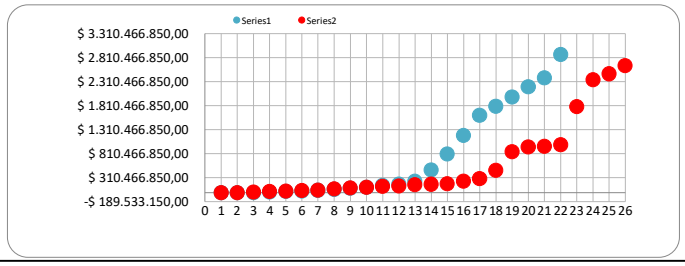


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.544.197.667	$ -	0%
Durante el periodo	$ 1.601.390.174	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 3.145.587.841	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

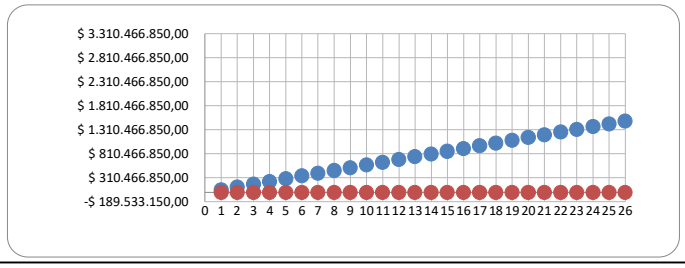

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, revisión documental y control del componente ambiental del proyecto, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los lineamientos establecidos por la Supervisión Ambiental del ICCU, así:

- Durante la semana reportada, la Interventoría participó en el Comité Integral del Proyecto, espacio en el cual se presentaron los avances y el estado actual del componente ambiental. En el desarrollo del comité se informó que continúa pendiente por parte del contratista la subsanación y presentación del procedimiento técnico para la tala de individuos arbóreos, documento indispensable para la evaluación, autorización y posterior ejecución de cualquier intervención que implique aprovechamiento forestal dentro del proyecto.

- Así mismo, durante el comité se expuso la necesidad de definir una solución técnica para el manejo del material fresado generado en obra, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las condiciones identificadas durante la ejecución del proyecto, dicho material no reúne las características requeridas para su reincorporación en las actividades constructivas previstas. En este sentido, se solicitó al contratista gestionar las alternativas técnicas y ambientales correspondientes para su adecuada disposición o aprovechamiento, conforme a la normatividad ambiental vigente.

- De igual manera, la Interventoría realizó un llamado al contratista para coordinar una jornada de orden y aseo a lo largo del frente de obra, toda vez que durante los recorridos de seguimiento efectuados se evidenció la presencia de residuos, materiales y elementos dispersos que requieren una adecuada gestión, almacenamiento y disposición, con el fin de mantener condiciones ambientales apropiadas y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

- Durante el periodo reportado, la Interventoría adelantó la estructuración y elaboración del Informe Mensual Ambiental N.° 6, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, desarrollando la recopilación y consolidación de la información del componente ambiental. A la fecha de elaboración del presente informe, la Interventoría se encuentra a la espera de la radicación del informe mensual del contratista para efectuar la correspondiente revisión técnica y emitir el concepto de aprobación.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

El 6 de agosto de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-251 con la entrega del Informe Social No. 6 del contratista, el cual fue revisado y observado por interventoría mediante el comunicado DON-1624-ICCU-295-2026.

Subprograma de información y divulgación:
A la fecha los Psi del contrato se encuentran activos y actualizados.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: a la fecha se han recibido 3 PQRSD, de las cuales dos se encuentra cerradas y una abierta.

Con relación a la PQRSD de la señora Alcira Fernández de León, propietaria del predio ubicado en la finca la Esperanza sector chatarrería el mono y quien reporto fisuras en predio. El 4 de agosto de 2026, el contratista y la interventoría en su predio, identificándose fisuras preexistentes y nuevas, como consecuencia de problemas estructurales de la vivienda y que la misma fue construida sobre relleno, a lo anterior, el contratista se encuentra evaluando la respuesta del derecho de petición de la ciudadana.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 31% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 18% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración- ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
A la fecha, se han realizado 4 reuniones con el comité de participación y 1 taller de cultura vial.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO
Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así: **Reporte de Accidentalidad:** Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista. **Personal de interventoría:** Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU. **Personal de contratista:** -29. trabajadores en obra, aprobados por interventoría. A la fecha se encuentra pendiente el allego de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla minima para revisión y aprobación. - El día 30 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-246, el contratista remitió a la Interventoría la documentación correspondiente al ingreso de personal de mano de obra no calificada para el cargo de auxiliar de obra, con el fin de surtir el proceso de revisión documental y aprobación previa a su vinculación al proyecto. - Una vez efectuada la revisión de la documentación presentada, la Interventoría verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos exigidos para el ingreso del personal, emitiendo concepto de aprobación mediante comunicado DON-1624-ICCU-291-2026 del 01 de agosto de 2026, el cual fue remitido al contratista para los fines correspondientes. - Mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-247 del 30 de julio de 2026, el contratista solicitó a la Interventoría la revisión y firma del Formato 13 – Modelo de cálculo de IBC y aportes, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026, aportando los soportes de seguridad social integral para su validación. - Así mismo, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-248 del 30 de julio de 2026, el contratista remitió la solicitud de revisión y firma del Formato 13 correspondiente al mes de junio de 2026, para su respectiva verificación por parte de la Interventoría. - Una vez realizada la revisión integral de los Formatos 13 y de la totalidad de los soportes de Seguridad Social Integral allegados por el contratista para los meses comprendidos entre febrero y junio de 2026, la Interventoría evidenció inconsistencias relacionadas con soportes documentales, valores de IBC, tarifas de ARL, periodos de cotización y demás aspectos que impedían otorgar el concepto favorable de aprobación. En consecuencia, mediante comunicado DON-1624-ICCU-292-2026 del 04 de agosto de 2026, se remitieron las observaciones correspondientes y se solicitó la respectiva subsanación. - El día 05 de agosto de 2026, la Interventoría participó en el Comité Integral del Proyecto, espacio en el cual se presentaron los avances, actividades ejecutadas y estado actual del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el seguimiento a los compromisos y requerimientos pendientes del contratista. - Mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-250 del 06 de agosto de 2026, el contratista remitió la subsanación de las observaciones formuladas por la Interventoría respecto a la información presentada para la firma del Formato 13, correspondiente a los meses de febrero a junio de 2026. - Posteriormente, una vez revisada la documentación corregida y los soportes aportados por el contratista, la Interventoría evidenció que aún persistían inconsistencias que impedían emitir concepto favorable para la firma de los formatos. En consecuencia, mediante comunicado DON-1624-ICCU-296-2026 del 06 de agosto de 2026, se remitieron nuevas observaciones relacionadas con los soportes de Seguridad Social Integral y el diligenciamiento del Formato 13, solicitando nuevamente su corrección.
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD
El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
Durante la semana no se presentaron situaciones problematicas
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
N/A
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
N/A
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
N/A
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
N/A
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)
N/A
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)
N/A
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)
N/A
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)
N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo construcción de alcantarillas, excavación para subrasante, construcción del vastago del muro 2 del tramo 2, construcción de filtro e instalación de geotextil para colocación de subbase granular.

- Durante la semana se realizó seguimiento al componente ambiental mediante la participación en el Comité Integral del Proyecto, reiterando la necesidad de que el contratista presente el procedimiento técnico para la tala de individuos arbóreos y defina la alternativa de manejo del material fresado. Igualmente, se solicitó fortalecer las actividades de orden y aseo en el frente de obra y se avanzó en la elaboración del Informe Mensual Ambiental N.° 6, quedando pendiente la recepción del informe del contratista para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

- A la fecha los informes mensuales sociales del 1 al 5 del contratista e interventoría se encuentran aprobados y se encuentra observado el informe mensual social N.º 6 del contratista. En cuanto a las PQRSD se informa que a la fecha se han recibido 3 PQRSD, de las cuales 2 se encuentran cerradas y 1 abierta. Asimismo, se informa que se elaboró, aprobó y distribuyo el volante de cierre vial con ampliación de la fecha hasta el 15 de agosto de 2026 con alcaldías de Nocaima y Vergara Cundinamarca, predio a predio, en las empresas intermunicipales, con el grupo de WhatsApp del comité de participación y a través de la emisora comunitaria del municipio de Vergara. Igualmente se informa que se desarrolló a satisfacción el cuarto comité de participación del contrato.

- Durante la semana se efectuó el seguimiento al proceso de validación de la Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto, realizando la revisión de los Formatos 13 correspondientes a los meses de febrero a junio de 2026 y formulando las observaciones necesarias para garantizar la consistencia de la información presentada previo a su aprobación. Así mismo, se adelantó la revisión y aprobación de personal de ingreso, se participó en el Comité Integral del proyecto y se continuó con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 14,28% y un avance acumulado ejecutado del 52,51%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 38,23%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson y fresado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 55,56% y un avance acumulado ejecutado del 29,72%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 25,84%.

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 45,43% que corresponde a $ 3.608.555.358, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 39,41% que corresponde a $ 3.119.105.741 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 6,02% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Instalación de tubería de concreto 36", Instalación NT2500, Tubería drenaje PVC 110, Material granular filtrante y Rajón para mejoramiento de la subrasante.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Construcción de alcantarillas K0+925, K1+061 y K1+258 en tramo 2.



Imagen 2. Instalación de geotextil para colocación de subbase granular en tramo 2.



Imagen 3. Excavación para subrasante en tramo 2.



Imagen 4. Armado de acero para vastago de muro 2 en tramo 2.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
