ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 3 de septiembre de 2026	**SEMANA No.**	**32**	DEL	**27-ago-26**	AL	**3-sep-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	220 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	220 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de excavación, instalación de tubería PVC de 12", losa reforzada para pozo y relleno para red de alcantarillado en tramo 1.
-Se realizó actividades de conformación de terreno para construcción de disipador de energía en la alcantarilla ubicada en la abscisa K0+925 del tramo 2.
-Se realizó actividades de conformación de terreno para construcción de disipador de energía en la alcantarilla ubicada en la abscisa K1+345 del tramo 2.
-Se realizó actividades de instalación tubería de 36" y construcción de descole para la extensión de alcantarilla ubicada en la abscisa K1+258 del tramo 2.
-Se realizó actividades de instalación de segunda capa de subbase granular entre las abscisas K1+110 a K1+419 del tramo 2.

-De acuerdo con la programación V8 aprobada por la interventoría, se tiene un avance acumulado programado del 75% y un avance acumulado ejecutado del 48%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 27%,

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 62,17% que corresponde a $ 4.938.195.719, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 43,26% que corresponde a $ 3.425.153.520 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 18,90% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Instalación de tubería drenaje PVC 110 y relleno para estructuras.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-319-2026 del 31 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Aval de formatos MS-GC-FR-013 – Modelo de cálculo de IBC y aportes meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 - Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-272.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-320-2026 del 27 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-274 Entrega del personal de mano de obra no calificada – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-286-2026 - Aprobación del personal presentado.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-321-2026 del 28 de agosto de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.31 – Actividades realizadas del 20 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-322-2026 del 28 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-249 “Entrega del informe técnico No. 5 V2” Aprobación – Contrato de obra 1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-323-2026 del 28 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-255 “Entrega del informe técnico No.6 V1” Aprobación – Contrato de obra 1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-324-2026 del 28 de agosto de 2026 remitió al ICCU Remisión solicitud ajuste del plan de cargas contrato ICCU-CTO-1624-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-325-2026 del 31 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Remisión Hoja de vida del profesional Ingeniero Residente.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-326-2026 del 31 de agosto de 2026 remitió al ICCU Remisión de acta de costos No.4 – Contrato de interventoría No. ICCU-CTO-1624-2025 por el periodo comprendido del 1 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-327-2026 del 31 de agosto de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Aprobación del informe mensual ambiental N°6 V2 del contratista - Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-275 Entrega del Informe Ambiental No. 6 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-306-2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-328-2026 del 31 de agosto de 2026 remitió al ICCU Remisión informe mensual ambiental N.6 V1 de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-329-2026 del 31 de agosto de 2026 remitió al ICCU Alcance a oficio DON-1624-ICCU-324-2026 Remisión solicitud ajuste del plan de cargas contrato ICCU-CTO-1624-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-330-2026 del 2 de septiembre de 2026 remitió al ICCU Remisión informe técnico mensual N.6 de las gestiones realizadas por la interventoría durante el periodo del 1 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-274 del 27 de agosto de 2026, remitió Entrega del personal de mano de obra no calificada – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-286-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-275 del 27 de agosto de 2026, remitió Entrega del Informe Ambiental No. 6 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-306-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-276 del 28 de agosto de 2026, remitió Solicitud de firma de Formato 13 (Modelo de cálculo de IBC y aportes) - Julio.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-277 del 28 de agosto de 2026, remitió Certificados de calidad y ensayos de materiales - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-308-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-278 del 28 de agosto de 2026, remitió Solicitud de cambio del profesional Ingeniero Residente de Obra.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-279 del 31 de agosto de 2026, remitió Modulación de Losas K0+000 Corredor vial Vergara – Nocaima.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-280 del 1 de septiembre de 2026, remitió Entrega del personal de mano de obra calificada.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-281 del 2 de septiembre de 2026, remitió Entrega del Informe Social No.7.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 1.1-EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5-ago-26	15-ago-26	11			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 2.4-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	18-ago-26	31-ago-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 2.6-SUBBASE GRANULAR	18-ago-26	31-ago-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 2.7-RIEGO DE IMPRIMACION	28-sep-26	3-oct-26	6					
5	TRAMO 1 2.9-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	28-sep-26	3-oct-26	6					
6	TRAMO 1 4.2-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (BASES)	18-ago-26	26-ago-26	9			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 4.3-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES)	21-ago-26	5-sep-26	16			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 4.4-SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	13-ago-26	30-sep-26	49			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 4.5-RELLENO PARA ESTRUCTURAS (AFIRMADO)	14-ago-26	18-ago-26	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 4.6-MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 4.8-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 4.9-TUBERÍA DRENAJE PVC 110	3-ago-26	8-ago-26	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 5.2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	6-ago-26	6-ago-26	1			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	TRAMO 1 5.3-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (BASES)	13-ago-26	15-ago-26	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	TRAMO 1 5.4-CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES)	18-ago-26	22-ago-26	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	TRAMO 1 5.5-SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	10-ago-26	12-ago-26	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	TRAMO 1 5.7-CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	16-sep-26	30-sep-26	15					
18	TRAMO 1 5.8-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
19	TRAMO 1 5.9-TUBERÍA DRENAJE PVC 110	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
20	TRAMO 1 5.10-MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	8-ago-26	15-ago-26	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	TRAMO 1 6.1-LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	13-oct-26	24-oct-26	12					
22	TRAMO 1 6.2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	13-oct-26	24-oct-26	12					
23	TRAMO 1 6.6-DEFENSA METÁLICA	13-oct-26	24-oct-26	12					
24	TRAMO 1 6.7-SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	13-oct-26	24-oct-26	12					
25	TRAMO 1 NP-01-CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	18-ago-26	9-oct-26	53			no iniciado	no iniciado	no iniciado
26	TRAMO 1 NP-02-DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4"	5-ago-26	14-ago-26	10			no iniciado	no iniciado	no iniciado
27	TRAMO 1 NP-06-CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	14-sep-26	30-sep-26	17					
28	TRAMO 1 NP-07-BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	31-ago-26	21-sep-26	22					
29	TRAMO 1 NP-10-PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	18-ago-26	19-ago-26	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
30	TRAMO 1 NP-11-CUBIERTA POZO D=1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	28-ago-26	29-ago-26	2					
31	TRAMO 1 NP-12-CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	20-ago-26	26-ago-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
32	TRAMO 1 NP-13-PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	27-abr-26	11-jul-26	76	6-may-26	11-jul-26	66	10	0
33	TRAMO 1 NP-20-SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS ESCALONADAS Y COLCHONES DE ENROCADO COMO ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN LOS DESCOLES	18-ago-26	24-oct-26	68			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 81 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	55,93%	43,89%	-12,04%
Durante el periodo	6,24%	-0,62%	-6,86%
Acumulado Actual	62,17%	43,26%	-18,90%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

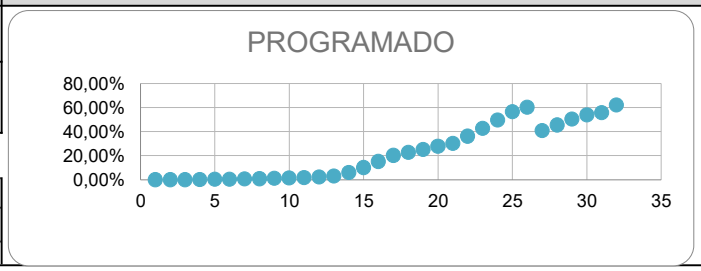

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	221,00	51 días	-51,42

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4.442.435.796	$ 3.474.652.558	78%
Durante el periodo	$ 4.938.195.719	$ 3.425.153.520	69%
Acumulado Actual	$ 9.380.631.515	$ 6.899.806.078	74%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

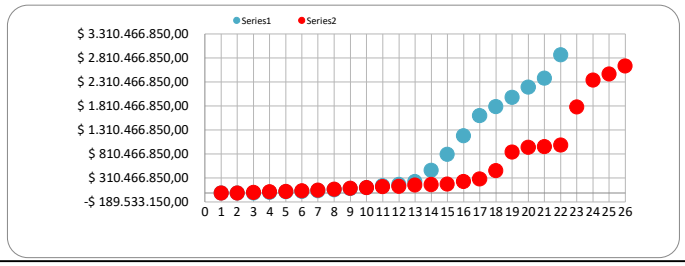


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-26%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.772.967.692	$ -	0%
Durante el periodo	$ 1.830.160.198	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 3.603.127.891	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

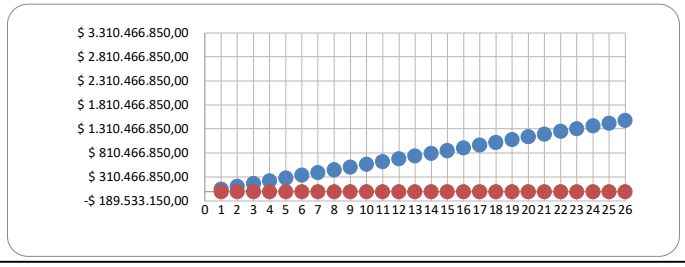

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, revisión documental y control del componente ambiental del proyecto, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los lineamientos establecidos por la Supervisión Ambiental del ICCU, así:

- Mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-275 del 27 de agosto de 2026, el contratista remitió a la Interventoría la subsanación de las observaciones previamente realizadas al Informe Mensual Ambiental N.° 6, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, presentando para su revisión la Versión 2 del documento.

- Una vez realizada la revisión técnica e integral del Informe Mensual Ambiental N.° 6 – Versión 2, junto con sus respectivos soportes y anexos, la Interventoría verificó la atención de las observaciones formuladas y emitió concepto de aprobación mediante el comunicado DON-1624-ICCU-327-2026 del 31 de agosto de 2026.

- Durante el período reportado, la Interventoría realizó la estructuración y elaboración del Informe Mensual Ambiental N.° 6 – Versión 1 de Interventoría, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Una vez finalizado el documento, este fue remitido a la Supervisión Ambiental del ICCU mediante el comunicado DON-1624-ICCU-328-2026 del 31 de agosto de 2026, para su correspondiente revisión y emisión del concepto respectivo.

- Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2026, la Supervisión Ambiental del ICCU remitió a la Interventoría el concepto de aprobación del Informe Mensual Ambiental N.° 6 – Versión 1 de Interventoría, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, culminando satisfactoriamente el proceso de revisión y aprobación del documento.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

El 2 de septiembre de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-281, con la remisión del informe mensual social N.º 7 del contratista, informe que fue revisado y devuelto con observaciones de interventoría el 3 de septiembre de 2026 a través de comunicado DON-1624-ICCU-331-2026.

Subprograma de información y divulgación:

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: a la fecha se han recibido 3 PQRSD, la última reiterada nuevamente por la ciudadana y tramite por parte del contratista.

Con relación a la PQRSD de la señora Alcira Fernández de León, propietaria del predio ubicado en la finca la Esperanza, sector chatarrería del mono, quien reitero novedades en su predio, se informa que la especialista en estructuras del contratista realizó visita al predio en acompañamiento de la interventoría, a fin de evidenciar las condiciones estructurales del predio. A lo anterior, el 2 de septiembre de 2026, la interventoría recibió del contratista la proyección de la respuesta al derecho de petición de la señora Alcira, anexando el concepto técnico de la especialista de estructuras, respuesta que fue revisada por interventoría y devuelta con observaciones el mismo día.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 50% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 13.6% sobre el 21% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
El 27 de agosto de 2026, la interventoría recibió del contratista la presentación para la reunión del comité de participación N°5, presentación que fue revisada y observada por interventoría y subsanada el mismo día por el contratista.

El 28 de agosto de 2026, la interventoría participo en la reunión del comité de participación N.º 5, en la cual se socializaron los avances de cada uno de los componentes y se atendieron las dudas e inquietudes de los participantes.

El 31 de agosto de 2026, el contratista recibió oficio del gerente de seguridad vial y comportamiento de transito de la gobernación de Cundinamarca, a través del cual confirmo su apoyo, para los talleres de cultura ciudadana del contrato, a realizar el 14 y 15 de octubre de 2026.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO
Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así: **Reporte de Accidentalidad:** Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista. **Personal de interventoría:** Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU. **Personal de contratista:** -37. trabajadores en obra, aprobados por interventoría. Durante el presente periodo el contratista allega de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla minima para revisión y aprobación, la cual se encuentra en revision por la interventoría. - Mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-274 del 27 de agosto de 2026, el contratista remitió a la Interventoría la atención y subsanación de las observaciones previamente realizadas a la documentación correspondiente al personal de mano de obra no calificada, para su respectiva revisión. - Una vez realizada la revisión de la documentación soporte relacionada con la vinculación laboral y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal presentado, la Interventoría verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos y emitió concepto de aprobación del personal de mano de obra no calificada. Dicha aprobación fue comunicada al contratista mediante el oficio DON-1624-ICCU-320-2026 del 27 de agosto de 2026. - Mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-276 del 28 de agosto de 2026, el contratista remitió a la Interventoría la solicitud de revisión y firma del formato MS-GC-FR-013 – Modelo de cálculo de IBC y aportes, correspondiente al personal vinculado al proyecto durante el período del mes de julio de 2026. A la fecha de elaboración del presente informe, la documentación y sus respectivos soportes se encuentran en proceso de revisión por parte de la Interventoría. - Mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-280 del 1 de septiembre de 2026, el contratista remitió a la Interventoría la documentación que se encontraba pendiente correspondiente al personal de mano de obra calificada y personal de plantilla mínima vinculado al proyecto. A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría se encuentra realizando la revisión técnica y documental de la información allegada, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las condiciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la semana no se presentaron situaciones problematicas

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo construcción de alcantarillas y disipadores de energía en tramo 2, instalación de subbase granular en tramo 2 y construcción de red de alcantarillado en tramo 1.

- Durante la semana reportada se adelantó la revisión y aprobación del Informe Mensual Ambiental N.° 6 presentado por el contratista, así como la elaboración y posterior presentación del informe correspondiente por parte de la Interventoría ante la Supervisión Ambiental del ICCU. Finalmente, se obtuvo el concepto de aprobación por parte de la Supervisión, dando cumplimiento al proceso de revisión y seguimiento documental del componente ambiental para el período correspondiente al mes de julio de 2026.

- Al corte de este semanal la interventoría recibió, revisó y objeto el informe mensual social No 7 del contratista. Asimismo, se realizó el comité de participación N° 5 y se avanzó en la proyección de la respuesta de la PQRSD N.º 3, de la señora Alcira Fernández, para lo cual fue necesario visita al predio de la ciudadana por parte de la especialista de estructuras quien elaboro su informe correspondiente. A la fecha el contratista cumple con el porcentaje de mano de obra no calificada local y de mujeres.

- Durante la semana reportada se adelantó la revisión y aprobación de la documentación subsanada correspondiente al personal de mano de obra no calificada. Asimismo, se inició la revisión de la solicitud de firma del Formato MS-GC-FR-013 correspondiente al mes de julio y de la documentación pendiente del personal de mano de obra calificada y plantilla mínima, verificando el cumplimiento de los requisitos contractuales, laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la emisión de los respectivos conceptos por parte de la Interventoría.

-De acuerdo con la programación V8 aprobada por la interventoría, se tiene un avance acumulado programado del 75% y un avance acumulado ejecutado del 48%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 27%,

-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 62,17% que corresponde a $ 4.938.195.719, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 43,26% que corresponde a $ 3.425.153.520 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 18,90% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de: Instalación de tubería drenaje PVC 110 y relleno para estructuras.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Construcción red de alcantarillado tramo 1



Imagen 2. Construcción de disipadores de energía en tramo 2.



Imagen 3. Construcción de extensión de alcantarilla ubicada en la abscisa K1+258 en tramo 2.

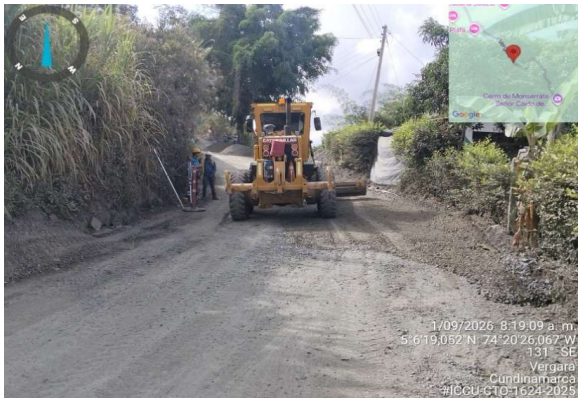


Imagen 4. Instalación de capa 2 de subbase granular en tramo 2.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
