FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	09 SEP 2026
CONVENIO O CONTRATO No.:	20254110
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLÍVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO". dentro del plan anual de compras públicas (sud 0033-013).
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	Pasto, 25 de agosto de 2025
CONTRATANTE:	Municipio de Pasto NIT: 891.280.000-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN	Nicolas Martín Toro Muñoz, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.986.382
CONTRATISTA:	Oscar Alirio Bravo Villota, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.988.147 de Pasto
IDENTIFICACION:	C.C. 12.988.147
INTERVENTOR:	N/A
IDENTIFICACION:	N/A

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
Ing. Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja	C.C. 1.085.317.099	Secretaria de Infraestructura y Valorización.

No. CDP:

Fecha	Numero
17/06/2025	2025002700

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
27/08/2025	2025004520

AMPAROS – GARANTIAS (hasta última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Riesgos amparados	Desde	Hasta	Suma asegurada
MUNDIAL DE SEGUROS 41-40-101057061	Predios, labores y operaciones	2025-08-25	2025-12-31	$284,700,000.00
	Daño emergente y lucro cesante	2025-08-25	2025-12-31	$284,700,000.00
	Perjuicios extrapatrimoniales	2025-08-25	2025-12-31	$284,700,000.00
SEGUROS DEL ESTADO 41-44-101296641	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-08-25	2026-06-30	$239,003,270.97
	Cumplimiento del contrato	2025-08-25	2026-06-30	$119,501,635.48
	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2025-08-25	2028-12-31	$59,750,817.74
	Calidad y estabilidad de la obra	2025-08-25	2028-08-25	$59,750,817.74
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-09-22	2026-07-28	$239,003,270.97
	Cumplimiento del contrato	2025-09-22	2026-07-28	$119,501,635.48
	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2025-09-22	2029-01-28	$59,750,817.74

	Calidad y estabilidad de la obra	2025-09-22	2028-09-22	$59,750,817.74
MUNDIAL DE SEGUROS 41-40-101057061	Predios, labores y operaciones	2025-08-25	2025-12-31	$284,700,000.00
	Daño emergente y lucro cesante	2025-08-25	2025-12-31	$284,700,000.00
	Perjuicios extrapatrimoniales	2025-08-25	2025-12-31	$284,700,000.00
SEGUROS DEL ESTADO, 41-44-101296641	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-08-25	2026-06-30	$239,003,270.97
	Cumplimiento del contrato	2025-08-25	2026-06-30	$119,501,635.48
	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2025-08-25	2028-12-31	$59,750,817.74
	Calidad y estabilidad de la obra	2025-08-25	2028-08-25	$59,750,817.74

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	2025-09-22	Se inicio a la obra	2025-12-31
Suspensión N° 1	N/A	N/A	N/A
Reinicio N° 1	N/A	N/A	N/A
Prorroga N° 1	N/A	N/A	N/A
Adición No. 1	N/A	N/A	N/A
Fecha finalización actualizada	2025-12-31	Se da por finalizo la obra 100% ejecutado.	

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	25-08-2025	$597.508.177,42	$597.508.177,42
Adición No. 1	N/A		N/A
Adición No.	N/A		N/A
Valor total contratado	25-08-2025	$597.508.177,42	$597.508.177,42

RELACION PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA O COOPERANTE

Fecha	Valor	Detalle/concepto
20-10-2025	$ 239.003.270,97	Anticipo 40%
26-12-2025	$ 262.857.315,57	Acta parcial No. 1
31-12-2025	$ 95.647.590,88	Acta final

Entre los suscritos, **DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE**, Directora del Departamento de Contratación Pública, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.247.609 de Pasto, en uso de sus facultades y funciones contenidas en el Decreto 0348 de 11 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto 0184 del 13 de mayo de 2022, y Decreto de nombramiento 0013 de 01 de enero de 2024; **MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES** identificada con cedula de ciudadanía No. 59.836.235, Secretaria de infraestructura y valorización nombrada mediante Decreto 0107 del 9 de julio del 2026, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto, en calidad de supervisor, y por otra **OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.988.147 de Pasto, en calidad de contratista de obra, con el fin de realizar, de común acuerdo, la liquidación del contrato número 20254110, conforme a las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Primera: que a la diligencia se hace presente las personas suscritas en la presente Acta.

Segunda: que **EL MUNICIPIO DE PASTO Y OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.988.147 de Pasto, celebraron el día 25 de agosto de 2025 el contrato con Nº 20254110, cuyo objeto fue: El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLÍVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO". dentro del plan anual de compras públicas (sud 0033-013).

Tercera: que de común acuerdo se verificó mediante Acta de Fecha treinta y uno (31) de diceimbre de 2025, la terminación del contrato, con avance físico y financiero del 100% de conformidad con el informe final de supervisión que reposa en el expediente contractual.

Cuarta: que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.
que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

La presente liquidación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Manual de Contratación del Municipio de Pasto, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en razón a la oportunidad del ejercicio del medio de control de controversias contractuales término dentro del cual es también admisible la discusión sobre la liquidación del contrato.

Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad Estatal procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad Estatal podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad Estatal con anterioridad a la liquidación.

Quinta: que en la cláusula N° 28 del contrato N°. 20254110, se estipuló: "**LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción del plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo.

PARÁGRAFO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo previsto y los subsiguientes dos (2) meses, será practicada directa y

unilateralmente por EL MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.

Sexta: Que según los numerales 2.3.1 y 2.3.2 del Manual de Contratación del Municipio de Pasto, aprobado mediante Decreto 0515 de 20 de diciembre del 2022, establece: "*Con base a la revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará el acta de liquidación, en la que costarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar para poder decretarse a paz y salvo*".

Séptima: Teniendo en cuenta que, la cláusula décima sexta.**16. FORMA DE PAGO.** Estipula:

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera:

El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo que, en ningún caso se considera pago y estará sujeto al cumplimiento de requisitos que EL MUNICIPIO requiera al momento de la Suscripción del Contrato.

El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra ejecutada, acta final de obra, incluyendo acta de liquidación, con cargo a las cuales se amortizará el anticipo en forma proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas y visto bueno del Supervisor y/o Interventor; y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo.

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato ***NO ESTARÁ SUPEDITADO*** *al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente.*

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la Supervisión y/o Interventoría y del Municipio, junto con los requisitos establecidos para pago.

Parágrafo primero: *Cuando finalice el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos. El contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Municipio, para realizar los pagos o saldos pendientes por cancelar, las*

amortizaciones, deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo.

Plan de inversión del Anticipo: *Para el desembolso del anticipo El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor y/o Interventor y visto bueno del Municipio.*

Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, razón en ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.

Los fondos de la cuenta del anticipo solo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato. Conforme a lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor y/o Interventor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.

Octava: Balance financiero del contrato:

I. Valor contratado:

VALOR CONTRATO: $ 597.508.177,42
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 597.508.177,42

II. Valor anticipo: $ 239.003.270,97
III. Valor final ejecutado: ***$ 597.508.177,42***

VALOR EJECUTADO CONTRATO INICIAL: $ 597.508.177,42
VALOR EJECUTADO CONTRATO ADICIONAL: $ N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO: ***$ 597.508.177,42***

VALOR TOTAL EJECUTADO EN LETRAS: **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.**

IV. Pagos efectuados al contratista:

VALOR ANTICIPO: $ 239.003.270,97
VALOR ACTA PARCIAL No1: $ 262.857.315,57
VALOR ACTA FINAL: $ 95.647.590,88
SUMA TOTAL ***$ 597.508.177,42***

V. Amortizaciones al anticipo:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.1: $ 95.601.308,39
AMORTIZACIÓN ACTA FINAL: $ 143.401.962,58

TOTAL, VALOR AMORTIZADO: $ 239.003.270,97

VI. Valor de reajustes o actualizaciones:
Relación: _____ ($ 0,00)
Subtotal: _____ ($ 0,00)

VII. Resultados:
Saldo a favor del contratista: $ 0,00
Saldo a favor de la Entidad para reversar: $ 0,00

Frente a este informe otorgado por parte de El Municipio de Pasto el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración del Contratista, **OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.988.147 de Pasto, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción de presente acuerdo.

Novena: De conformidad con lo anterior las partes contratantes imparten su aprobación a la presente liquidación.

Decima: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato y **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del **MUNICIPIO DE PASTO** y/o cualquier otra autoridad administrativa y dan por liquidado el contrato de obra No. 20254110, cuyo objeto es: "El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLÍVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO". dentro del plan anual de compras públicas (sud 0033-013).", declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Décima primera: Que la Secretaría de Hacienda Municipal expidió el estado de cuenta del mencionado contrato o convenio, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista, el cual se anexa y hacen parte integral de la presente liquidación.

Décima segunda: De conformidad con lo anterior y las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Décima Tercera: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el Contrato de Obra No 20254110, cuyo objeto es: "El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLÍVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO", dentro del plan anual de compras públicas (sud 0033-013)., declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones y EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del MUNICIPIO DE PASTO y/o cualquier otra autoridad administrativa.

El presente documento se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS:

Primera. -Liquidación. Las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el contrato No 20254110, suscrito entre el **MUNICIPIO DE PASTO** y **OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.988.147 de Pasto, de conformidad con la información contenida en el estado de cuenta y concepto expedido por el supervisor del contrato, en los siguientes términos:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 597.508.177,42
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	$ 597.508.177,42
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00

Segunda.- Documentos. Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta, solicitud expedida por el supervisor del contrato y todos los documentos que reposan en el contrato y los allegados para realizar el trámite de liquidación de este.

Tercera.- Paz y Salvo. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato y **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del **MUNICIPIO DE PASTO** y/o cualquier otra autoridad administrativa.

Cuarta.- Manifestación. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron: 09 SEP 2026

OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
Contratista

MARÍA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Supervisor

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora DACP
Delegado para contratar

Elaboro: Ing. Hamilton Riascos.
Apoyo a la Supervisión – Contratista SIVM

Revisó: Abg. Daniela Bolaños
Contratista Oficina Jurídica SIVM

Revisó: Yuli Marisol Enriquez
Contratista Abogada - S.I.V.M

Nancy Guerra - Apoyo Financiero SIVM

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO
	07-Abr-14	02	CO-F-023	

LA SUSCRITA INGENIERA MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que el señor **OSCAR AURELIO BRAVO VILLOTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **12.988.147** de Pasto, con fundamento en los documentos que reposan en el expediente contractual, particularmente en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato No. 20254110 de fecha 25 de agosto de 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

ING. MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Supervisor

Elaboro: Ing. Hamilton Riascos.
Apoyo a la Supervisión – Contratista SIVM

Revisó: Abg. Daniela Bolaños
Oficina Jurídica SIVM

Reviso: Abg: Yuli Marisol Enríquez
Contratista SIVM

Reviso: Ing. Antony Dias Gomez.
Contratista SIVM

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO
NIT: 891280000
FAX: 7222624

No. 2025012799
Fecha: 27/oct./2025

A Favor de BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO **CC. O Nit:** 12988147

Dirección: CL 10 NO. 14-05 BRR SAN MIGUEL **Telefonos:** 7214274

Código Postal 999999

Banco: BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 221,675,070.97

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS.MC.

Detalle: O.P. No. 20250123 14-CO 20254110 ANTICIPO REALIZAR OBRA CONSTRUCC

Concepto:URBANA -ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR VIGENCIA 2025 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025002700	2025004520	2 3 2.02 02 005 18 124301. 2024520010033 43 4301 1604 4301015 046	Servicios de la construcción / Nivel Central / SGP/P. G. Deporte / / DEPORTEYRECREACIÓN / DEPORTEYRECREACIONFOMENTOALARECREACION,LAACTIVIDADFISICAYELDEPORTEPARADESARROLLAREN / RECREACIÓN Y DEPORTE / CANCHASMULTIFUNCIONALESCONSTRUIDASYDOTADAS / INFRAESTRU	54122	239,003,270.97
			TOTAL		239,003,270.97

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	239,003,270.97	00.00
1110060306	Bancolombia 07460284541 SGP Proposito General / Nivel Central / BRAV	00.00	221,675,070.97
24072203	Estampilla Udenar / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	2,988,000.00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	11,950,200.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreacion / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR	00.00	2,390,000.00
	TOTAL	239,003,270.97	239,003,270.97

Elaboro:WPEREZ

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRONICO
BANCO:
Nº AUTORIZACION: 29 OCT 2025
FECHA: 31/oct/25
FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA
TESORERO (A)

31 OCT 2025
PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2025012314

Fecha: 23/oct./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO

CC o Nit: 12988147 **Teléfonos:** 7214274

Dirección: CL 10 No. 14-05 BRR SAN MIGUEL

Detalle: CO 20254110 ANTICIPO REALIZAR OBRA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA

Concepto: URBANA -ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR VIGENCIA 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025002700	2025004520	2.3.2.02.02.005 18 124301. 2024520010033 43 4301 1604 4301015 045	Servicios de la construcción / SGP/P. G. Deporte	239,003,270.97
			TOTAL	239,003,270.97

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
19060403	Anticipos para construccion de Infraestructura / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	239,003,270.97	00.00
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	00.00	239,003,270.97
		Sumas Iguales	239,003,270.97	239,003,270.97

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 239,003,270.97

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO DOMINGUEZ - SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO
	02-Ene-19	04	GF-F-007	

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. El (La) suscrito (a) secretario de Infraestructura y Valorización.

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Escenarios Deportivos Urbanos y Rurales, con equidad para entornos de Paz y sana convivencia 2025. Municipio de Pasto.

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20254110
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA	6. C.C. /NIT. : 12.988.147
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.	8. $ 597.508.177,42
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 597.508.177,42
(valor en letras)	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
22/09/2025	31/12/2025		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, construcción de estructura metálica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo Parque Bolívar, vigencia 2025. construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de Pasto. dentro del plan anual de compras públicas (SUD-0033-013)

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
20/10/2025	ANTICIPO	$ 239.003.270,97	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CERTIFICACION PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA	VERSION	CODIGO	CONSECUTIVO
	02-Ene-19	04	GF-F-007	

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 239.003.270,97	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.
SALDO POR EJECUTAR	$ 358.504.906,45	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2025002700**	DE FECHA: 17/06/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025004520	DE FECHA: 27/08/2025	VALOR: $ 597.508.177,42
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. [illegible]	VALOR A AFECTAR: $ [illegible]	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y valorización
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2025.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaría de Hacienda

Reviso: _____

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2025018489

Fecha: 30/dic./2025

A Favor de BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO **CC. O Nit:** 12988147

Dirección: CL 10 NO. 14-05 BRR SAN MIGUEL **Telefonos:** 7214274

Código Postal 999999

Banco: BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 235,972,915.57

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2025017977-CO 20254110 1 PAGO REALIZAR OBRA, CONSTRUCCIÓ

Concepto:URBANA -ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR VIGENCIA 2025 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025002700	2025004520	2.3.2.02.02.005 18 124301. 2024520010033 43 4301 1604 4301015 045	Servicios de la construcción / Nivel Central / SGP/P. G. Deporte / / DEPORTEYRECREACIÓN / DEPORTEYRECREACIONFOMENTOALARECREACION,LAACTIVIDADFISICAYELDEPORTEPARADESARROLLAREN / RECREACIÓN Y DEPORTE / CANCHASMULTIFUNCIONALESCONSTRUIDASYDOTADAS / INFRAESTRU	54122	262,857,315.57
			TOTAL		262,857,315.57

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	262,857,315.57	00.00
11100505	Bancolombia 07460284541 SGP Proposito General / Nivel Central / BRAV	00.00	235,972,915.57
24360501	Servicios / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	7,165,200.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / BRAVO VIL	00.00	2,151,000.00
24369801	Impuesto de Timbre / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	1,763,365.00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	13,142,950.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreacion / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR	00.00	2,629,000.00

TESORERIA
PAGO ELECTRONICO
BANCO:
Nº APROB. 3 0 DIC 2025
TESORERO PAGO

FANNY YOLANDA PAZ OVEDA.
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

19 10:19:56 ASOPAGOS SA -

TOTAL	262,857,315.57	262,857,315.57

Elaboro:WPEREZ

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2025017977

Fecha: 30/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO

CC o Nit: 12988147 **Teléfonos:** 7214274

Dirección: CL 10 No. 14-05 BRR SAN MIGUEL

Detalle: CONTRATO PARA REALIZAR OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA

Concepto: URBANA -ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR VIGENCIA 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025002700	2025004520	2.3.2.02.02.005 18 124301. 2024520010033 43 4301 1604 4301015 045	Servicios de la construcción / SGP/P. G. Deporte	262,857,315.57
			TOTAL	262,857,315.57

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
17050090	Otros bienes de uso público en construcción / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	358,458,623.96	00.00
19060403	Anticipos para construccion de infraestructura / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	00.00	95,601,308.39
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	00.00	262,857,315.57
		Sumas Iguales	358,458,623.96	358,458,623.96

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 262,857,315.57

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. - SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA 29-Oct-25	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-007	PAGINA 1 de 2

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización.

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: "Fortalecimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales, con equidad para entornos de Paz y sana convivencia vigencia 2025 en el municipio de Pasto."

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:

TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20254110

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA / BENEFICIARIO: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA		6. C.C. /NIT. : 12.988.147	
7. VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.		8. APORTES MUNICIPIO: **$ 597.508.177,42** APORTES CONTRATISTA: $	
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $		10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 597.508.177,42**	
(valor en letras)		QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.	
11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
22/09/2025	31/12/2025		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, construcción de estructura metálica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo Parque Bolivar, vigencia 2025. construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de Pasto. dentro del plan anual de compras públicas (SUD-0033-013)

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR (valor en letras)
22/09/2025- 12/12/2025	ACTA PARCIAL No. 1	$ 262.857.315,57	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS

			CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 501.860.586,54	QUINIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.	
SALDO POR EJECUTAR	$ 95.647.590,88	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.	

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2025002700**	DE FECHA: 17/06/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025004520	DE FECHA: 27/08/2025	VALOR: $ **597.508.177,42**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.	DE FECHA:	VALOR: $
REGISTRO DE OBLIGACIÓN (VIATICOS)	DE FECHA:	VALOR: $
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $ 262.857.315,57	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
Para los efectos legales el (la) contratista declara bajo gravedad de juramento: que los documentos soportes de pago de aportes al sistema general contienen el pago de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y/o aportes parafiscales, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago. (cuando el contrato lo amerite)	OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO	

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y valorización
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2026001536

Fecha: 10/mar./2026

A Favor de	BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	**CC. O Nit:**	12988147
Dirección:	CL 10 NO. 14-05 BRR SAN MIGUEL	**Telefonos:**	7214274
Código Postal	999999		
Banco:	BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	ELECTRONICO	**Por valor de: $**	82,498,990.88

Valor en letras: OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 20250108130-CO 20254110 PAGO FINAL REALIZAR OBRA, CONSTRU

Concepto: URBANA ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR-VIGENCIA-2025.

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025002700	2025004520	4.3.2.02.02.005 18 124301, 2024520010033 43 4301 1804 4301015 045	Servicios de la construcción / Nivel Central / SGP/P. G. Deporte / / DEPORTEYRECREACIÓN / DEPORTEYRECREACIONFOMENTOALARECREACION,LAACTIVIDADFISICAYELDEPORTEPARADESARROLLAREN / RECREACIÓN Y DEPORTE / CANCHASMULTIFUNCIONALESCONSTRUIDASYDOTADAS / INFRAESTRU	54122	95,647,590.88
			TOTAL		95,647,590.88

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	95,647,590.88	00.00
1110060306	Bancolombia 07460284541 SGP Proposito General / Nivel Central / BRAV	00.00	82,498,990.88
24360501	Servicios / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	4,781,000.00
24362701	Retención de Impuesto de industria y comercio / Nivel Central / BRAVO VIL	00.00	1,434,000.00
24369801	Impuesto de Timbre / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	1,195,200.00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	4,782,400.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreacion / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR	00.00	956,000.00

BANCO: 11 MAR 2026

FECHA

TESORERO

MARIA VICTORIA MARTINEZ. TESORERA (E)	PAGADOR	**Firma Beneficiario** c.c ó Nit:

TOTAL	95,647,590.88	95,647,590.88

Elaboro:WPEREZ

MARIA VICTORIA MARTINEZ. TESORERA (E)	PAGADOR	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2025018130

Fecha: 31/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO

CC o Nit: 12988147 **Teléfonos:** 7214274

Dirección: CL 10 No. 14-05 BRR SAN MIGUEL

Detalle: CO 20254110 PAGO FINAL REALIZAR OBRA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA

Concepto: URBANA -ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR VIGENCIA 2025.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025002700	2025004520	2.3.2.02.02.005 18 124301. 2024520010033 43 4301 1604 4301015 045	Servicios de la construcción / SGP/P. G. Deporte	95,647,590.88
			TOTAL	95,647,590.88

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
29010190	Pasivo para Interfaz / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	597,508,177.42	00.00
17059090	Otros bienes de uso público en construcción / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	00.00	358,458,623.96
19060403	Anticipos para construccion de infraestructura / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	00.00	143,401,962.58
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	18	00.00	95,647,590.88
		Sumas Iguales	597,508,177.42	597,508,177.42

Elaboro: oscarg

Neto a Pagar : $ 95,647,590.88

Valor Neto a pagar en letras: NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. / SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA 29-Oct-25	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-007	PAGINA 1 de 2

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización.

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: "Fortalecimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales, con equidad para entornos de Paz y sana convivencia vigencia 2025 en el municipio de Pasto."

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:

TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20254110

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA / BIENEFICIARIO: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA	6. C.C. /NIT. : 12.988.147	
7. VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.	8. APORTES MUNICIPIO: **$ 597.508.177,42**	APORTES CONTRATISTA: $
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 597.508.177,42**	
(valor en letras)	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.	

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
22/09/2025	31/12/2025		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, construcción de estructura metálica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo Parque Bolívar, vigencia 2025. construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de Pasto. dentro del plan anual de compras públicas (SUD-0033-013)

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR (valor en letras)
13/12/2025-31/12/2025	ACTA FINAL	$ 95.647.590,88	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

		CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 597.508.177,42	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.
SALDO POR EJECUTAR	$ 0	CERO PESOS M/CTE.

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2025002700**	DE FECHA: 17/06/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025004520	DE FECHA: 27/08/2025	VALOR: **$ 597.508.177,42**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.	DE FECHA:	VALOR: $
REGISTRO DE OBLIGACIÓN (VIATICOS)	DE FECHA:	VALOR: $
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $ 95.647.590,88	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

Para los efectos legales el (la) contratista declara bajo gravedad de juramento: que los documentos soportes de pago de aportes al sistema general contienen el pago de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y/o aportes parafiscales, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago. (cuando el contrato lo amerite)	OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. JESIKA JERALDÍN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y valorización
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025.

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Entre Cuentas 29010190 y 29010190

31/12/2025	03:21:42 PM	CDC	2025000146		RECLASIFICACION SEGUIMIENTO MATRIZ DE PASIVO GENERAL ADJUNTA SE OBSERVA QUE SE INGRESO A NOMBRE DE AVANTEL EN ALMACEN CORRESPONDE A LOTES DE AVANTE CARRERA 27 ENTREGADOS AL MUNICIPIO SE REGISTRAN RECLASIFICACION DE ENTRADAS REVISADO LA PLATAFORMA DE	BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	00.00	00.42	597,508,177.42
						Total	0.00	0.42	
31/12/2025	05:10:30 PM	COM	2025018130		CO 20254110 PAGO FINAL REALIZAR OBRA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA	BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO	597,508,177.42	00.00	00.00
						Total	597,508,177.42	0.00	
						Total por cuenta con movimiento de auxiliares suministrados	597,508,177.42	597,508,177.42	

Código Cuenta: 29010190 18 12989034 001 Pasivo para Interfaz **Saldo Inicial Cuenta: 236,958,978.12**

Fecha	Hora	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	S. Acumulado
						ERASO HIDALGO LIBARDO++++++	00.00	00.00	236,958,978.12
						Total	0.00	0.00	
01/09/2025	11:29:35 AM	CDC	2025000081		AJUSTE COM 2024003227 DEL 25/04/2024 - 2023012702 DEL 03/10/2023 - 2024016350 DEL 31/12/2024	ERASO HIDALGO LIBARDO++++++	118,479,489.06	00.00	118,479,489.06
						Total	118,479,489.06	0.00	
31/12/2025	03:21:42 PM	CDC	2025000146		RECLASIFICACION SEGUIMIENTO MATRIZ DE PASIVO GENERAL ADJUNTA SE OBSERVA QUE SE INGRESO A NOMBRE DE AVANTEL EN ALMACEN CO	ERASO HIDALGO LIBARDO++++++	118,479,489.06	00.00	00.00
						Total	118,479,489.06	0.00	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre
CONTRATO No.:	20254110
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, Construcción de estructura metálica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo parque Bolívar, vigencia 2025. construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de pasto. dentro del plan anual de compras públicas (sud-0033-013)
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	San Juan de Pasto, 25 de Agosto de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	Diana Carolina Mosquera Calongue 1.085.247.609
CONTRATISTA:	Oscar Alirio Bravo Villota
IDENTIFICACION:	12.988.147

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja	1.085.317.099	Secretaria de Infraestructura y Valorización

No. CDP:

Fecha	Numero
17/06/2025	2025002700

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
27/08/2025	2025004520

AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
41-40101057061	Póliza de responsabilidad contraactual	2025-02-25		

41-4010101296641	Póliza de cumplimiento	2025-08-25		
AMPAROS				
41-40-101057061	Predios, laborales y operacionales	2025-08-25	2025-12-31	$ 284.700.000,00
41—40-101057061	Daños emergentes y lucro cesante	2025-08-25	2025-12-31	$ 284.700.000,00
41—40-101057061	Perjuicios extrapatrimoniales	2025-08-25	2025-12-31	$ 284.700.000,00
41-44-101296641	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-08-25	2026-06-30	$ 239.003270,97
41-44-101296641	Cumplimiento del contrato	2025-08-25	2026-06-30	$ 119.501.635,48
41-44-101296641	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2025-08-25	2028-12-31	$ 59.750.817,74
41-44-101296641	Calidad y estabilidad de la obra	2025-08-25	2028-08-25	$ 59.750.817,74

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	22-09-2025		31/12/2025
Suspensión N° ..			N/A
Reinicio N° ..			N/A
Prorroga N° ..			N/A
Adición No. ..			N/A
Fecha finalización actualizada	**31/12/2025**		N/A

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	25/08/2025	$597.508.177,42	(si aplica)
Adición No. 1			(si aplica)
Adición No.			(si aplica)
Valor total contratado	25/08/2025	$597.508.177,42	(si aplica)

ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	$597.508.177,42
Valor pendiente por pagar	$ 95.647.590,88

Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%

En la presente fecha, en la Secretaria de Infraestructura y Valorización, se reunieron de manera presencial): Ing. Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja, Secretaria de Infraestructura y Valorización y supervisor de la obra , y Oscar Alirio Bravo Villota en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de obra numero 20254110, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el contrato, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

Oscar Alirio Bravo Villota
Contratista

Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja
Interventor o Supervisor

Elaboró: Andrés Dario Velasco Cadena
Apoyo a la supervisión SIVM

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO: PROCESO INFRAESTRUCTURA CUADRO ANEXO ACTA FINAL			
	FECHA 20-Ene-23	VERSIÓN 04	CÓDIGO INF-F-011	PÁGINA 2 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 20234110		FECHA:	
OBJETO CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "construcción de estructura metálica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo parque bolívar, vigencia 2023, construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de pasto, dentro del plan anual de compras públicas (uid-0033-013)"		VALOR TOTAL CONTRATADO: $97.508.177,42	
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
		PLAZO ADICIONAL No.:	
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN: Oscar Alirio Ibarra Valoria - 12.993.147		FECHA DE SUSPENSIÓN No.:	
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN: Diana Carolina Mosquera Calderón - 1.085.247.609		FECHA DE REINICIO No.:	
SUPERVISOR/INTERVENTOR: Jesika Jeraldin Ceballos Portilla - 1.085.317.099		FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2023	
VALOR CONTRATO INICIAL: $97.508.177,42			
FECHA DE INICIO: 22/09/2023			
PLAZO INICIAL: 31/12/2023			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANIDAD	VR. PARCIAL
1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1	Replanteo general (área menor a 1000m2)	m2	622,05	1.657,00	1.030.734,85			622,05	1.030.734,85			622,05	1.030.736,85
1.2	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramento h=2 m	ml	150,00	12.707,00	1.906.050,00			150,00	1.906.050,00			150,00	1.906.050,00
1.3	Demolición concreto hidraulico	m3	5,00	220.127,00	1.100.635,00			5,00	1.100.635,00	1,29	284.844,34	6,29	1.385.479,34
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
2.1	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	59,13	28.007,00	1.656.053,91			52,25	1.463.332,14	31,52	882.906,67	83,77	2.346.238,81
2.2	Relleno con material de sitio, compactación manual	m3	18,00	28.057,00	504.126,00			14,10	504.126,00	32,57	912.089,97	50,67	1.416.215,97
2.3	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con bogo de escombrera.	m3	60,00	39.144,00	2.348.640,00			60,00	2.348.640,00	34,00	1.330.896,00	94,00	3.679.536,00
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO												
3.1	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17,2 Mpa	m3	124,00	490.107,00	85.573.368,00			3,69	2.547.322,96			3,69	2.547.322,96
3.2	Cimentación tipo Ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17,5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra	m3	6,00	515.007,00	3.090.042,00			6,00	3.090.042,00	11,44	5.891.660,08	17,44	8.981.722,08
3.3	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	8,00	1.833.333,00	10.666.664,00			8,00	10.666.664,00			8,00	10.666.664,00
3.4	Cimentación tipo zapata, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	9,07	1.105.194,00	10.024.109,58			5,12	5.658.593,28			5,12	5.658.593,28
3.5	Concreto de 21 Mpa para refuerzo de cimentación de cubierta (pedestales)	m3	3,00	1.529.144,00	4.587.432,00			2,93	4.478.098,20			2,93	4.478.098,20
3.6	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	1.578,00	9.577,00	15.113.304,00			1.578,00	15.113.304,00	18,44	176.553,91	1.596,44	15.289.059,91
3.7	Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	m2	20,00	113.194,00	2.263.880,00			9,54	1.079.870,76	1,00	113.194,00	10,54	1.193.064,76
3.8	Suministro e instalación de grouting de relleno en pedestales e= 3cm	m2	1,50	584.333,00	876.499,50					1,50	876.499,50	1,50	876.499,50
4	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA												
4.1	Suministro e instalación de perfil PHE según especificación	kg	13.510,39	18.627,00	251.658.049,08			13.510,39	251.658.049,08	2.230,87	41.554.440,19	15.741,26	293.212.489,27
4.2	Suministro e instalación de platina según especificación, incluye pernos de anclaje según especificación y adhesivo	kg	2.652,26	21.111,00	55.991.560,86			2.643,63	55.813.957,69	343,52	7.252.050,73	2.987,35	63.066.008,41
4.3	Suministro e instalacion de cubierta termoacustica A-360.	m2	719,04	156.888,00	112.828.747,52					850,00	133.354.800,00	850,00	133.354.800,00
4.4	Suministro e instalación de canal tipo galvanizado c -24 (pecho paloma)	ml	73,76	57.144,00	4.215.205,89					68,00	3.885.792,00	68,00	3.885.792,00
4.5	Montaje de estructura metalica, elementos estructurales, teja termoacustica de acuerdo a especificacion tecnica	und	3,00	2.293.333,00	6.879.999,00					3,00	6.879.999,00	3,00	6.879.999,00

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
		CUADRO ANEXO ACTA FINAL			
	FECHA 20-Ene-22	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-011		PÁGINA 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 20254113	FECHA:
OBJETO CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "construccion de estructura metalica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo parque bolivar, vigencia 2025, construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de pasto, dentro del plan anual de compras públicos (ips-0033-013)	VALOR TOTAL CONTRATADO: 597.508.177,42 VALOR CONTRATO ADICIONAL: PLAZO ADICIONAL No.:
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN: Oscar Alirio Bravo Villota - 17.958.147	FECHA DE SUSPENSIÓN No.:
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN: Diana Carolina Mosquera Colongue - 1.085.247.629	FECHA DE REINICIO No.:
SUPERVISOR/INTERVENTOR: Jesika Jeraldin Caballos Pantoja - 1.085.317.099	FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2025
VALOR CONTRATO INICIAL: 597.508.177,42	
FECHA DE INICIO: 30/09/2025	
PLAZO INICIAL: 31/12/2025	

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADO ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
5	INSTALACIONES PLUVIALES												
5.1	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias tipo cuadrado	ml	60,00	64.144,00	3.848.640,00					-	-	-	-
5.2	Suministro e instalación de tubería pvcs 6" incluye accesorios	ml	20,00	84.007,00	1.680.140,00					90,00	7.560.630,00	90,00	7.560.630,00
5.3	Suministro e instalación de tubería pvcs 4" incluye accesorios	ml	30,00	56.007,00	1.680.210,00					40,00	2.240.280,00	40,00	2.240.280,00
5.4	Suministro e instalacion de caja de inspección 0,7 X 0, X 0,7 m en mampostería incluye tapa en concreto con refuerzo	und	2,00	825.333,00	1.650.666,00					4,00	3.301.332,00	4,00	3.301.332,00
5.5	Conexión a alcantarillado (incluye silla yee 6" x 8")	und	1,00	468.887,00	468.887,00					2,00	937.774,00	2,00	937.774,00
6	ACABADOS												
6.1	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1,5 cm, mezcla 1:4.	m2	45,53	31.868,00	1.451.979,23					3,25	103.636,00	3,25	103.636,00
6.2	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	m2	60,00	18.887,00	1.133.220,00					60,00	1.133.220,00	60,00	1.133.220,00
6.3	Pintura antideslizante para canchas y pisos incluye líneas internas	m2	630,00	21.111,00	13.299.930,00					630,00	13.299.930,00	630,00	13.299.930,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1	Poda de arbolado existente y demolición	und		242.017,78						1,00	242.017,78	1,00	242.017,78
NP 2	Corte y sello de juntas concreto reciclado	m		43.354,23						108,68	4.929.097,33	108,68	4.929.097,33
NP 3	Aseo general	m2		3.025,22						630,00	1.905.889,99	630,00	1.905.889,99
	VALOR TOTAL:				$ 597.508.177,42		0,00		$ 358.458.623,96		239.049.553,46		597.508.177,42

Administración:	24%	$ 143.401.962,58		$		$		$ 57.371.892,83		$ 143.401.962,58
Imprevistos:	3%	$ 17.925.245,32		$		$		$ 7.171.486,60		$ 17.925.245,32
Utilidad:	5%	$ 29.875.408,87		$		$		$ 11.950.477,67		$ 29.875.408,87
TOTAL AIU:	32%	$ 191.202.616,78		$		$		$ 76.493.857,11		$ 191.202.616,78

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 597.508.177,42	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 239.049.553,46	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA:	$ 142.401.962,58
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):	$ 0,00	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	$ 93.647.590,88	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO:	$ 93.601.308,39
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 597.508.177,42	% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	40,01%	SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	$ 239.003.270,97	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 597.508.177,42		
		% FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100%		
		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO:	0%		

Valor a cancelar presente acta (letras): Noventa y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos noventa pesos con ochenta y ocho centavos M/CTE

OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
Contratista de obra

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Supervisor

Elaboró:

NOTAS:
1. El recibo por parte de la interventoría de las obras ejec, todas no exime al contratista de su responsabilidad y de las corporaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
2. El interventor Certifica que revisó, verificó y constató el cago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan, las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
4. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratista por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar donde sea necesario si se trata de convenio o contrato
5. En caso se hubiere contratado la interventoría, se debe incluirlo en el encabezado.
6. En el encabezado, después de la fecha de inicio se incluirá, si es el caso, todas las fechas de suspensión y de reinicio hasta la fecha de la presente acta.
7. Cuando el contrato tiene interventoría se debe anexar la firma de revisión por parte de la supervisión de la interventoría

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	VIGENCIA 01-Jun-17	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-098	CONSECUTIVO

1. Acta de Amortización del Anticipo No. 1	
2. Contrato No.:	20254110
3. Contratista:	Oscar Alirio Bravo Villota
4. Identificación:	12.988.147
5. Objeto:	El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "construccion de estructura metalica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo parque bolivar, vigencia 2025. construcciÓn de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de pasto. dentro del plan anual de compras públicas (sud-0033-013)
6. Supervisor:	Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja
7. Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización
8. Cargo:	Secretaria de Infraestructura y Valorización

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor Total del Contrato	$ 597.508.177,42
10. Anticipo %	$ 239.003.270,97
11. Valor Amortización Acumulada	$ 95.601.308,39
12. Valor Ejecutado Presente Acta	$ 239.049.553,46
13. Amortización	$ 143.401.962,58
14. Valor A Pagar	$ 95.647.590,88

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 31 días del mes de Diciembre de 2025.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO.

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
C.C 1.085.317.099
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Informe N° 4

1 de diciembre de 2025 ? 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

OBJETO DEL CONTRATO	El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "construccion de estructura metalica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo parque bolivar, vigencia 2025. construcción de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de pasto. dentro del plan anual de compras públicas (sud-0033-013)		
CONTRATISTA:	Oscar Alirio Bravo Villota		
VALOR TOTAL APORTES PARA EL CONTRATO	TOTAL DEL CONTRATO		$597.508.177,42
	FUENTE 1 MUNICIPIO DE PASTO		$597.508.177,42
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	31-12-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-08-2025		
ADICIÓN DE RECURSOS	N/A		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Jesika Jeraldin Caballos Pantoja		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	2025004520		
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	22-09-2025		
FECHA TERMINACION EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31-12-2025		
FECHA TERMINACIÓN EJECUCION REPROGRAMADA DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGA	N/A		
VALOR CONTRATO DERIVADO OBRA MODIFICADO SEGÚN ACTA DE ADICIÓN EN TIEMPO Y EN VALOR	N/A		
VALOR CONTRATO DERIVADO INTERVENTORIA MODIFICADO SEGÚN ACTA DE ADICIÓN EN TIEMPO Y EN VALOR	N/A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO (Describir individual según fuentes de financiación)

2.1 fuente de financiación N° 1

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO (Anticipo si aplica)	20/10/2025	40%	27/10/2025	$ 239.003.270,97
SEGUNDO DESEMBOLSO	N/A	N/A	N/A	N/A
TERCER DESEMBOLSO	N/A	N/A	N/A	N/A
ÚLTIMO DESEMBOLSO	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 597.508.177,42

3. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 20254110	El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, 'construccion de estructura metalica para cubierta de la zona urbana - escenario deportivo parque bolivar, vigencia 2025. construcciÓn de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de pasto, dentro del plan anual de compras públicas (sud-0033-013)	$ 597.508.177,42
Nombre contratista	Oscar Alirio Bravo Villota	
NIT O C.C:	12.988.147	
Valor Contrato Inicial	$ 597.508.177,42	
Valor Contrato Adicional 1	N/A	
Valor Contrato Adicional N/A	N/A	
Valor Contrato Total	$ 597.508.177,42	
Fecha Firma del contrato	25 de Agosto de 2025	
Plazo contractual	31 de Diciembre de 2025	
Plazo adicional 1	N/A	
Plazo adicional N/A	N/A	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 de Octubre de 2025	
Fecha de Terminación del contrato	31 de Diciembre de 2025	
Fecha de Suspensión 1	N/A	
Fecha de Reinicio N/A	N/A	
Fecha de Terminación reprogramada 1	N/A	

Fecha de Suspensión N/A	N/A
Fecha de Reinicio N/A	N/A
Fecha de Terminación reprogramada N/A	N/A

RECURSOS: SGP DEPORTES MUNICIPIO DE PASTO

CONCEPTO	%REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	40%	40%	$ 239.003.270,97	27	29/10/2025
PRIMER DESEMBOLSO					
SEGUNDO DESEMBOLSO					
TERCER DESEMBOLSO					
ULTIMO DESEMBOLSO					
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	100%	100%	$ 597.508.177,42		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
41-44-101296641	Cumplimiento	$ 119.501.635,48	22/09/2025	28/07/2026
	Salarios y prestaciones	$ 59.750.817,74	22/09/2025	28/01/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 59.750.817,74	22/09/2025	22/09/2028
	Manejo del anticipo	$ 597.508.177,42	22/09/2025	28/07/2026
41-40-101057061	Responsabilidad Civil	$ 284.700.000,00	25/08/2025	31/12/2025

VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS	$ 597.508.177,42
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO – DEL PROYECTO	100%
ESTADO DEL C	TERMINADO ? 100% DE EJECUCIÓN

4. INFORME DEL SUPERVISOR MES ACTUAL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

Aspectos Jurídicos: (Resumen ejecutivo: breve descripción de las actividades jurídicas adelantadas en el mes objeto del informe)

N/A

Aspectos financieros: (Resumen ejecutivo: breve descripción de las actividades financieras adelantadas en el mes objeto del informe)

EJECUCIÓN FINANCIERA: 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, POR $597.508.177,42.

Aspectos técnicos: Cumplimiento de Metas del Contrato

META	PORCENTAJE DE AVANCE
Meta N°.1	
Avance de acuerdo al cronograma:	100%

? Avance físico

Durante el periodo correspondiente al informe final se culminó la totalidad de las actividades previstas en el contrato, alcanzando un avance físico acumulado del 100%.

Se finalizaron las actividades de cimentación, pedestales, vigas de cimentación y placa de piso, así como el suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la estructura metálica de la cubierta. De igual manera, se culminó la instalación de la cubierta termoacústica, canales y demás elementos contemplados en las especificaciones técnicas y diseños del proyecto.

Las actividades ejecutadas fueron objeto de seguimiento y verificación por parte de la supervisión, evidenciándose la culminación de los componentes previstos y la disposición de la obra para su recibo, conforme a las condiciones contractuales, técnicas y de calidad aplicables.

En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, el contrato presenta una ejecución física del 100%.

Durante el periodo final se concluyeron las actividades restantes de ejecución y se verificó la terminación de los componentes previstos para la cubierta del escenario deportivo Parque Bolívar.

Se culminaron los trabajos de fabricación y montaje de los elementos estructurales, incluyendo columnas, vigas, cerchas, platinas, elementos de conexión y demás componentes metálicos. Asimismo, se realizaron las laboros de ajuste, alineación, soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y acabado de los elementos, de acuerdo con los planos, especificaciones y procedimientos establecidos.

Finalmente, se completaron las actividades asociadas a la instalación de la cubierta y sus elementos complementarios, dejando ejecutadas las partidas previstas en el contrato. La supervisión realizó el seguimiento a las cantidades, calidad y condiciones de ejecución, constatando la culminación física del objeto contractual.

Como resultado del seguimiento realizado, se verificó que las actividades previstas fueron ejecutadas de manera integral, incluyendo los trabajos de cimentación, estructura metálica y componentes de cubierta. La obra queda culminada y con las condiciones necesarias para su recibo, de conformidad con el alcance contractual.

Item	Detalle	% de avance
1	**OBRAS PRELIMINARES**	100%
1.1	Replanteo general (área menor a 1000m2)	100%
1.2	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m	100%
1.3	Demolición concreto hidráulico	100%
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	100%
2.1	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en sitio	100%
2.2	Relleno con material de sitio, compactación manual	100%
2.3	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	100%

3	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	100%
3.1	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17.2 Mpa	100%
3.2	Cimentación tipo Ciclópeo de proporción 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa,(2500 PSI) y 40% piedra	100%
3.3	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	100%
3.4	Cimentación tipo zapata, en concreto de resistencia 21 Mpa	100%
3.5	Concreto de 21 Mpa para refuerzo de cimentación de cubierta (pedestales)	100%
3.6	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	100%
3.7	Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	100%
3.8	Suministro e instalación de grouting de relleno en pedestales e= 3cm	100%
		100%
4	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	100%
4.1	Suministro e instalación de perfil PHR según especificación	100%
4.2	Suministro e instalación de platina según especificación, incluye pernos de anclaje según especificación y adhesivo	100%
4.3	Suministro e instalación de cubierta Termoacustica A-360.	100%
4.4	Suministro e instalación de canal tipo galvanizado c -24 (pecho paloma)	100%
4.5	Montaje de estructura metálica, elementos estructurales, teja termoacústica de acuerdo a especificación técnica.	100%
	Porcentaje total acumulado:	100%

- **Relleno con material de sitio, compactación manual**

Durante este periodo se ejecutaron las actividades de relleno en los vacios generados por las excavaciones realizadas para la construcción de las zapatas, para este proceso se empleó material de sitio previamente seleccionado, complementado con grava, con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas del suelo, incrementar su capacidad de soporte y garantizar una base estable para la losa de piso que se repondrá en la cancha.

El relleno se aplicó en capas sucesivas, distribuidas de manera homogenea, en cada una de ellas se realizo compactación manual mediante el uso de un pisón, asegurando la adecuada densificación del material y evitando la aparición de asentamientos diferenciales que pudieran afectar la estabilidad de la placa de piso.

Estos trabajos permitieron restituir las condiciones de soporte y nivelación requeridas, dejando el terreno en estado óptimo para la posterior fundición de la placa de piso, para el desarrollo de las siguientes fases constructivas del proyecto.

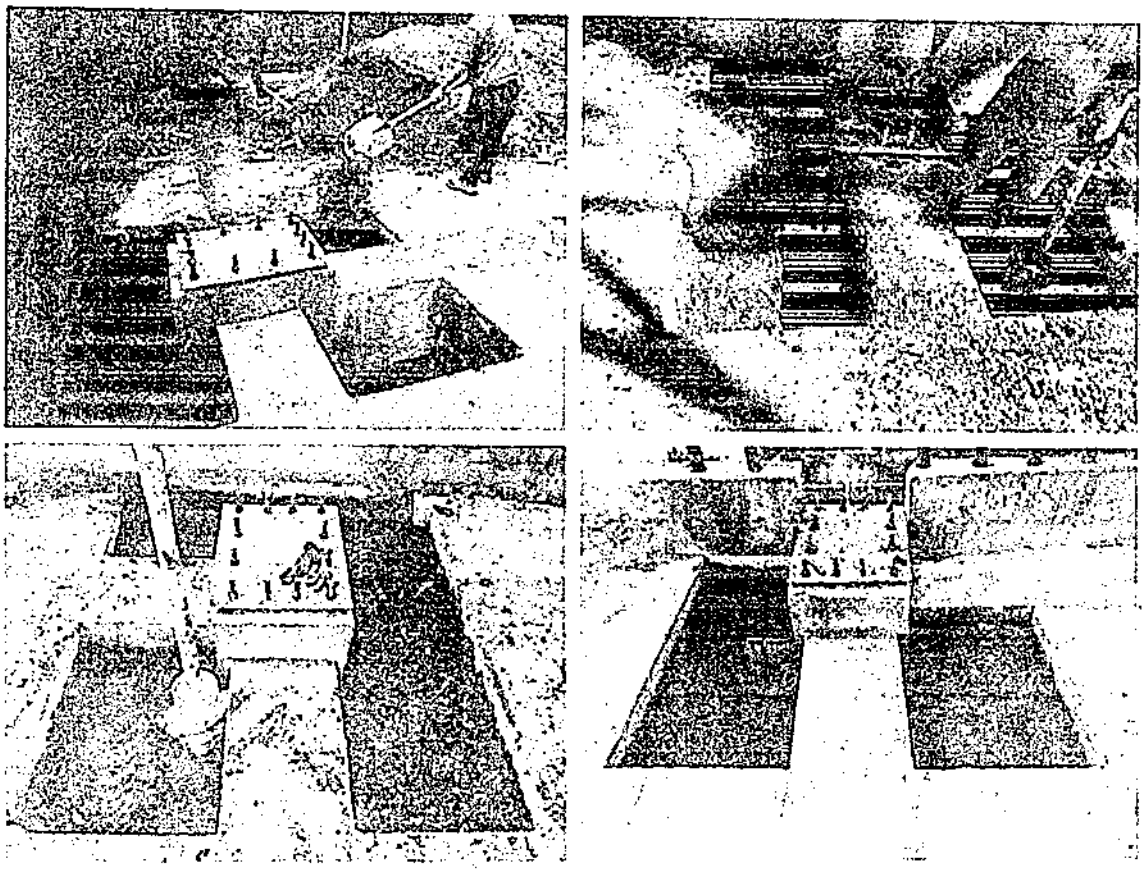


Ilustración 1. Relleno con material de sitio

- **Cimentación tipo Ciclópeo de proporción 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra**

Durante este periodo se ejecutó la fundición de los contrapesos en concreto ciclópeo de proporción 60% de concreto resistencia 17.5 mpa y 40% piedra, conforme a las especificaciones establecidas en los estudios y diseños del proyecto.

El concreto fue adecuadamente consolidado mediante vibrado interno, garantizando su compactación y la eliminación de posibles vacíos dentro de la sección.

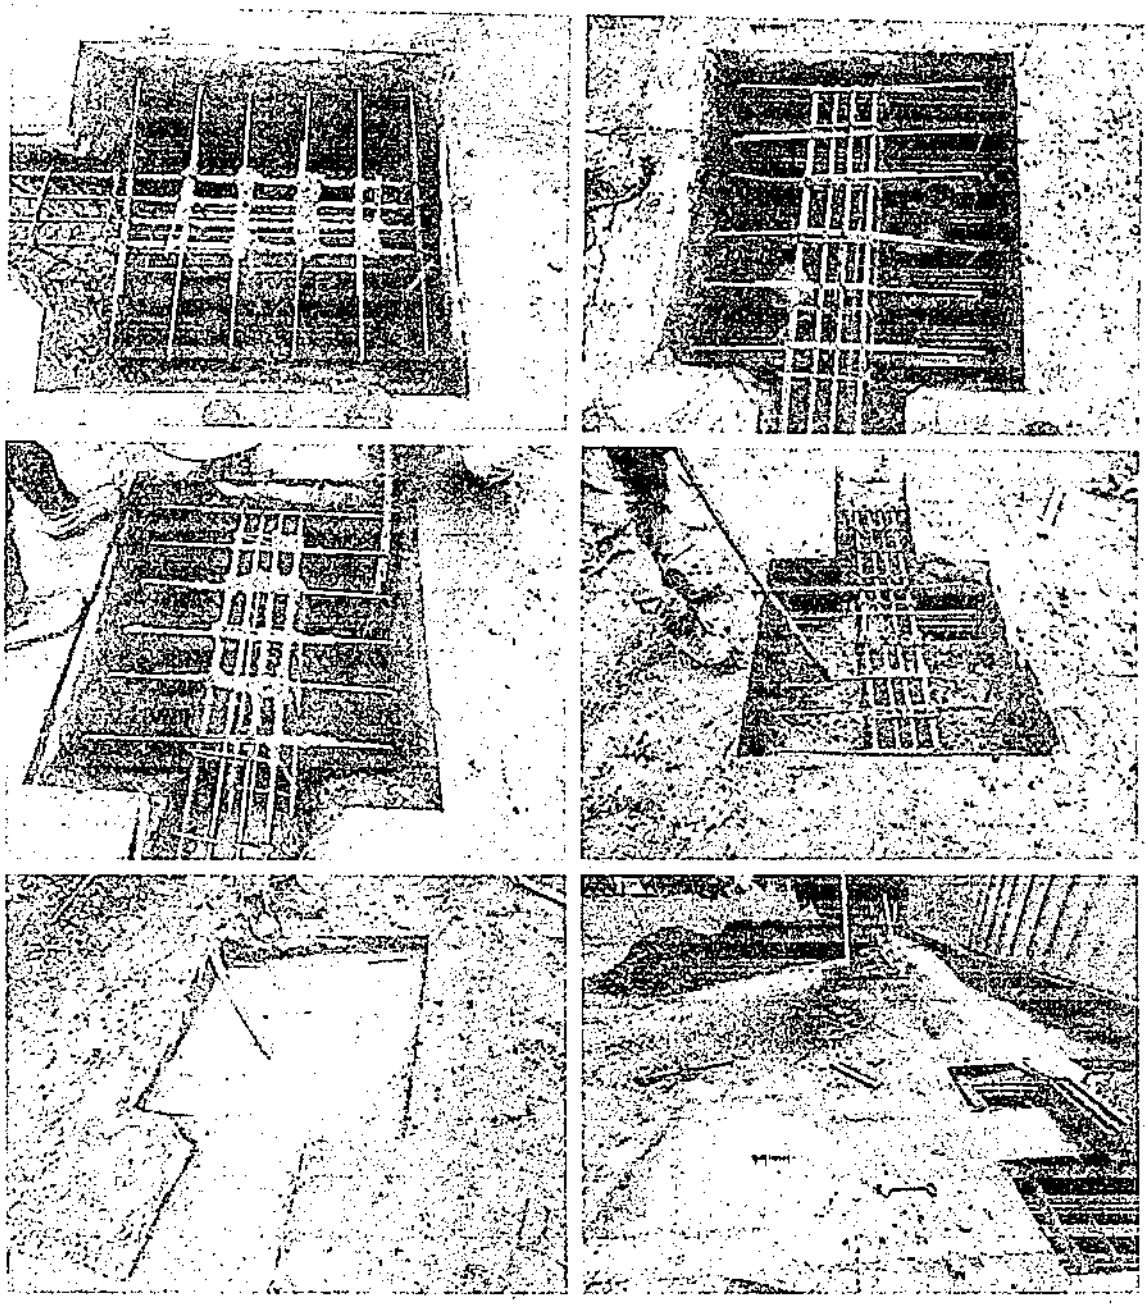



Ilustración 2. Contrapesos en concreto ciclópeo (60-40) 17.5 Mpa


La fundición de las contrapasos se desarrolló de manera simultánea con las vigas de cimentación y los pedestales, asegurando un comportamiento monolítico del sistema estructural. Este procedimiento garantiza una integración adecuada entre las distintas partes de la cimentación, favoreciendo su desempeño y estabilidad frente a las cargas proyectadas.


Cimentación tipo vigas de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa


Durante este periodo se llevó a cabo la fundición de las vigas de cimentación, en concreto de resistencia 21 MPa, conforme a las especificaciones establecidas en los estudios y diseños estructurales del proyecto.

El concreto fue adecuadamente consolidado mediante vibrado interno, garantizando su compactación y la eliminación de posibles vacíos dentro de la sección.

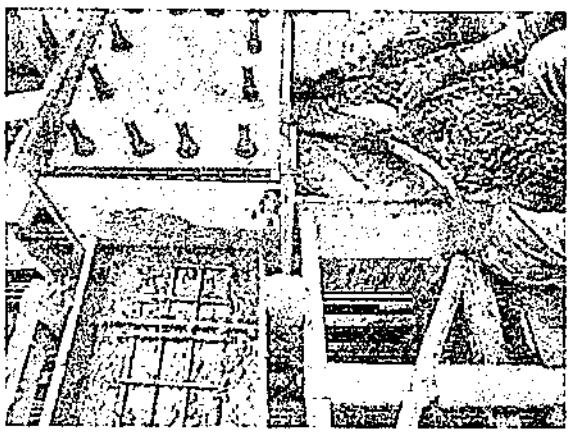

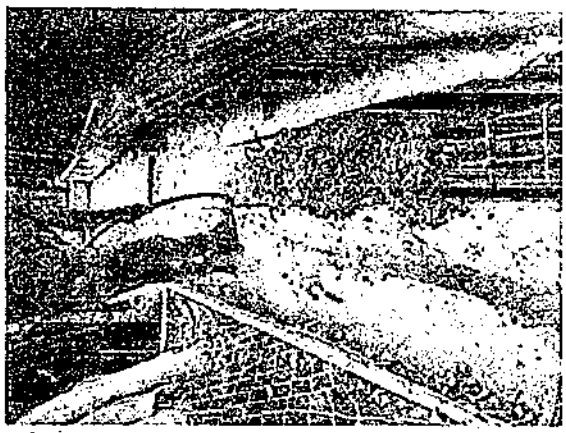

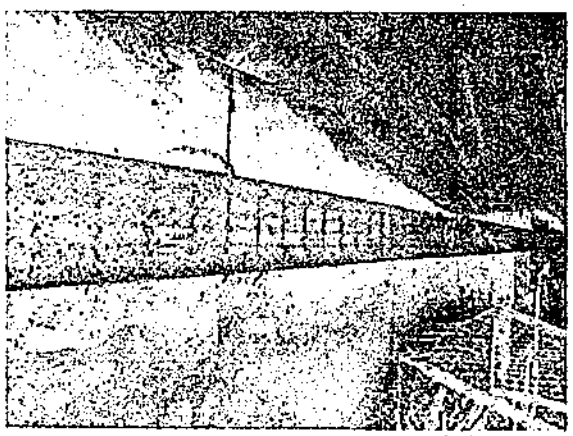

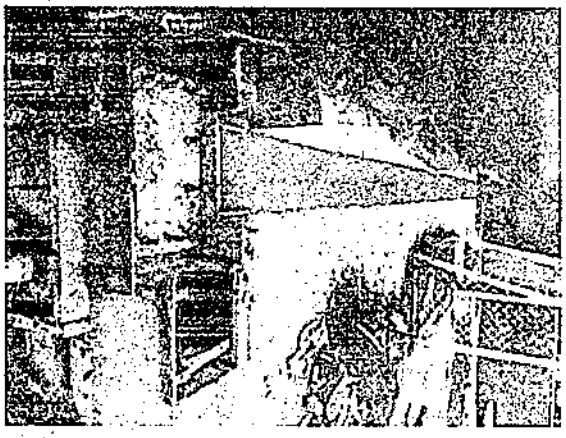

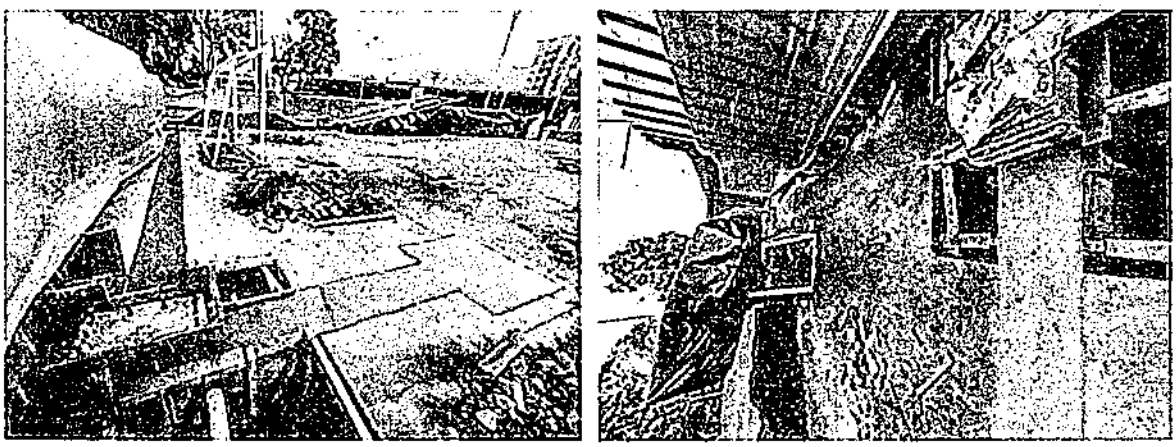


Ilustración 3. Vigas de cimentación en concreto 21 Mpa


La fundición de las vigas de cimentación se ejecutó de manera simultánea con la de los pedestales y contrapesos, con el propósito de asegurar la continuidad del concreto fresco entre los distintos elementos y promover un comportamiento monolítico del sistema de cimentación.

Estos elementos fueron construidos respetando rigurosamente las cotas, alineamientos, niveles y secciones definidas en los planos, asegurando así su correcta geometría y desempeño estructural.

- **Concreto de 21 Mpa para refuerzo de cimentación de cubierta (pedestales)**

Durante este periodo se llevó a cabo la fundición de los pedestales en concreto de resistencia 21 MPa, elementos encargados de transferir las cargas verticales provenientes de la estructura metálica hacia el sistema de cimentación. Estos pedestales fueron construidos conforme a las cotas, dimensiones y alineamientos establecidos en los planos estructurales, garantizando su adecuada integración dentro del sistema de soporte de la cubierta.

Previo al vaciado, se verificaron las condiciones de la armadura, recubrimientos, verticalidad y posición de las platinas y pernos de anclaje embebidos, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y la correcta preparación del elemento. El concreto fue consolidado mediante vibrado interno, garantizando su adecuada compactación y evitando la formación de vacíos.

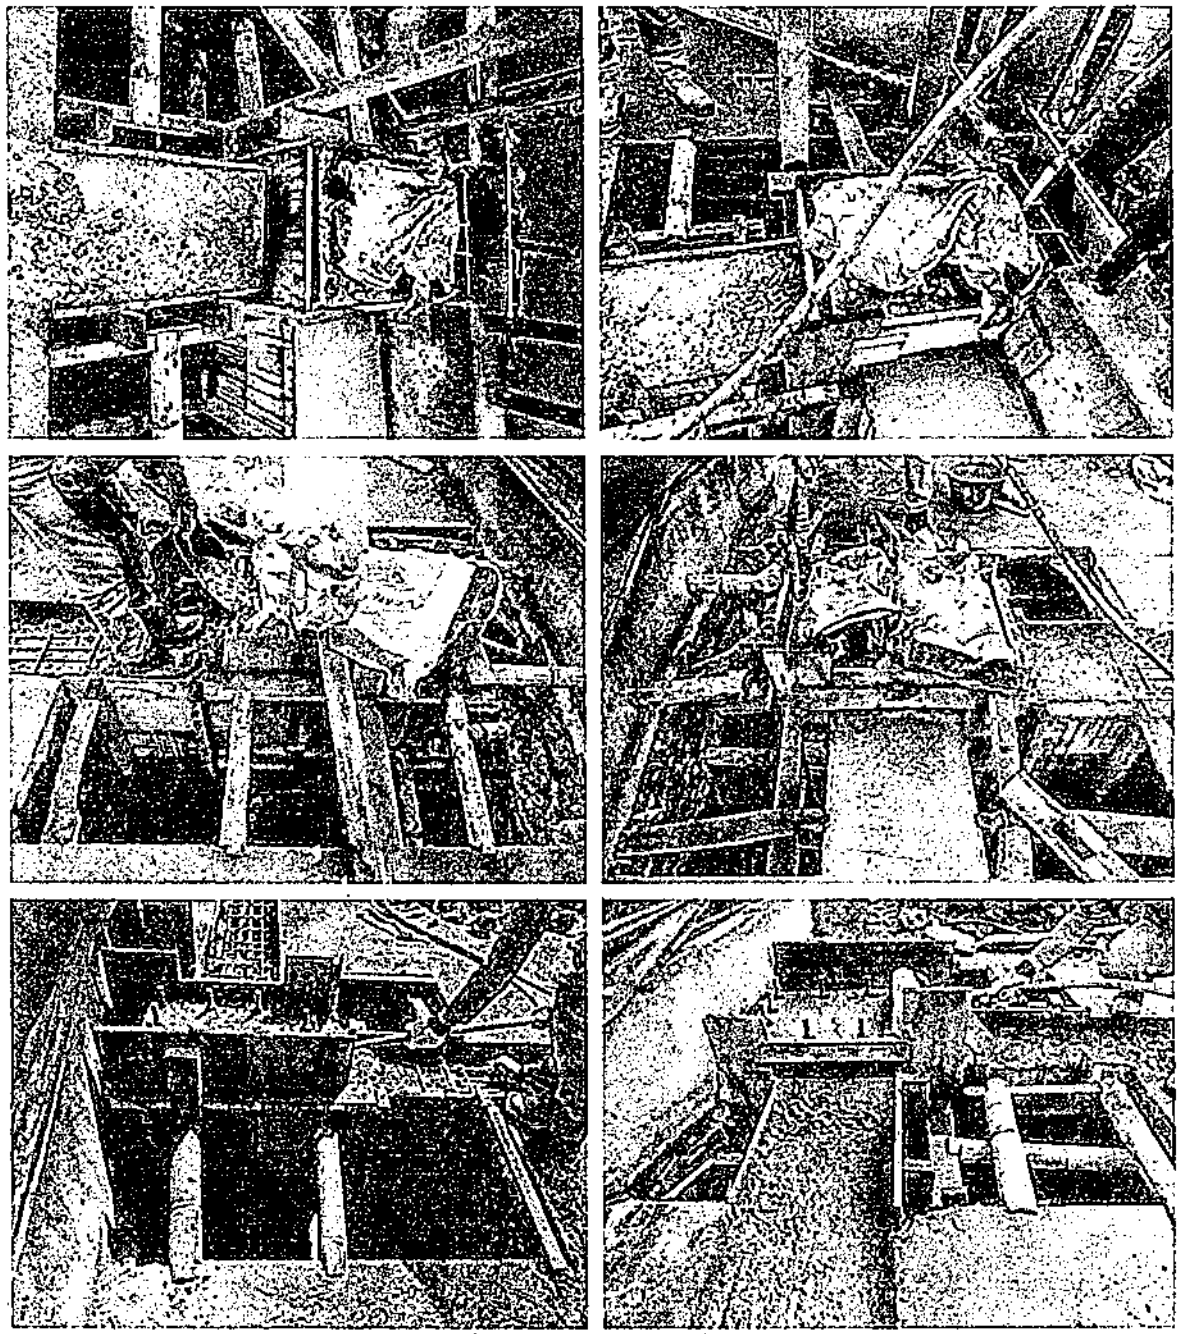

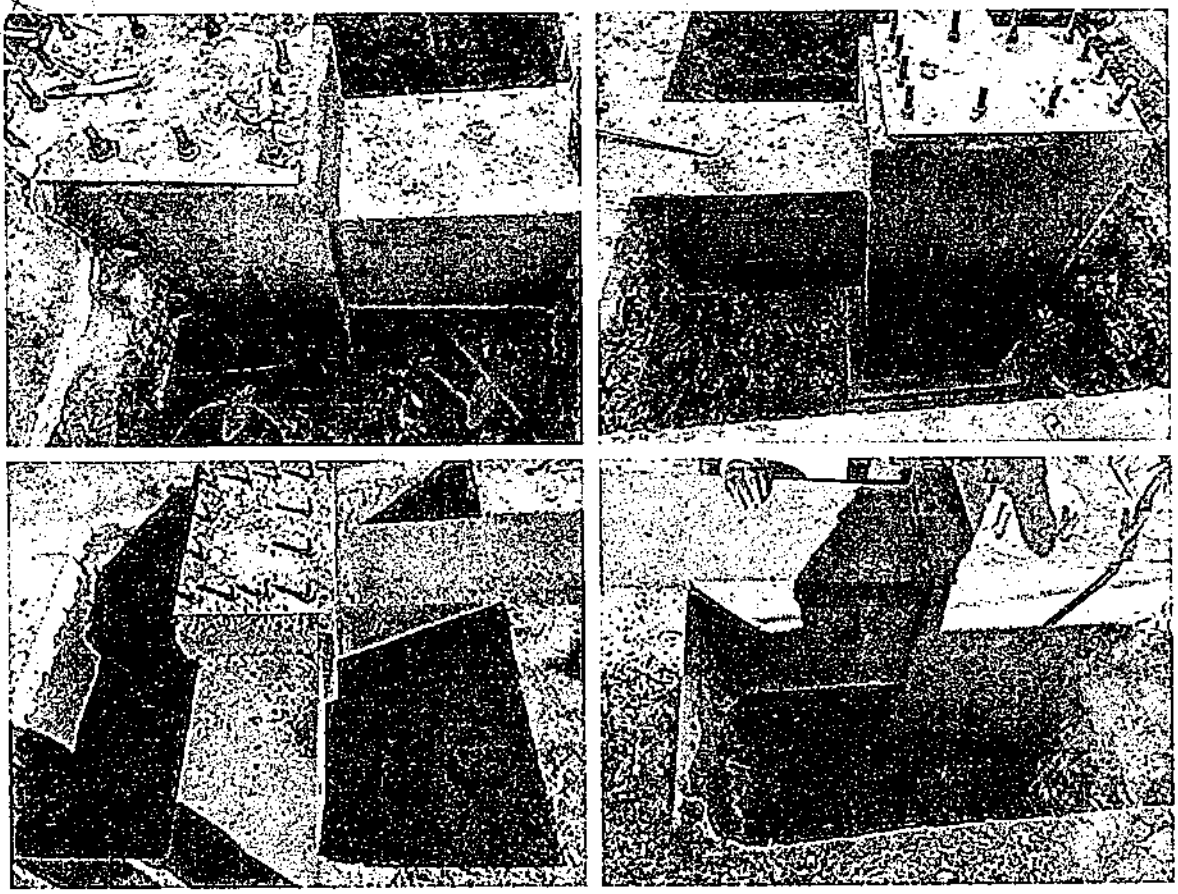


Ilustración 4. Pedestales en concreto 21 Mpa

La fundición de los pedestales se realizó de manera simultánea con las vigas de cimentación y los contrapesos, asegurando que el conjunto trabaje de forma monolítica, reforzando la capacidad estructural del sistema y mejorando su desempeño frente a las cargas transmitidas por la estructura metálica.

- **Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.**

Durante este periodo se llevó a cabo la fundición de la placa de piso en las áreas intervenidas, destinada a restituir la superficie de la cancha afectada por las excavaciones y labores de cimentación. La placa fue construida en concreto rígido de resistencia 21 MPa y con un espesor uniforme de 10 cm, incorporando malla electrosoldada como refuerzo principal, conforme a los estudios y diseños estructurale del proyecto.

Posteriormente al relleno, compactación y nivelación del terreno, se instaló la malla electrosoldada en la posición y altura requeridas para garantizar el recubrimiento adecuado y la correcta distribución de esfuerzos dentro de la losa.

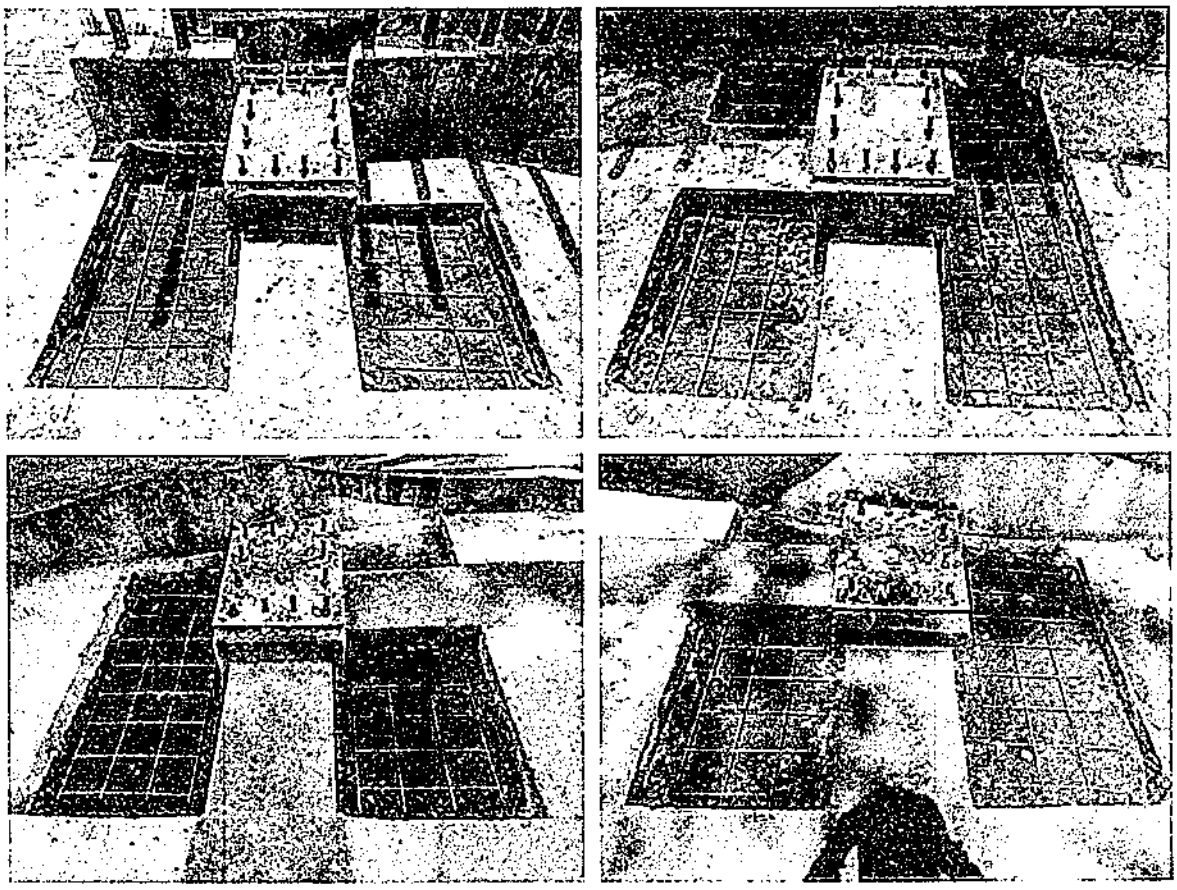


Ilustración 5. Malla electrosoldada para placa de piso

El vaciado del concreto se ejecutó de forma continua, cuidando la correcta colocación, nivelación, y acabado de la superficie. El material fue consolidado mediante vibrado interno para evitar vacíos y asegurar su adecuada compactación. Finalmente, se realizaron los trabajos de afinado y terminación de la losa, logrando una superficie uniforme y acorde con las especificaciones del diseño.

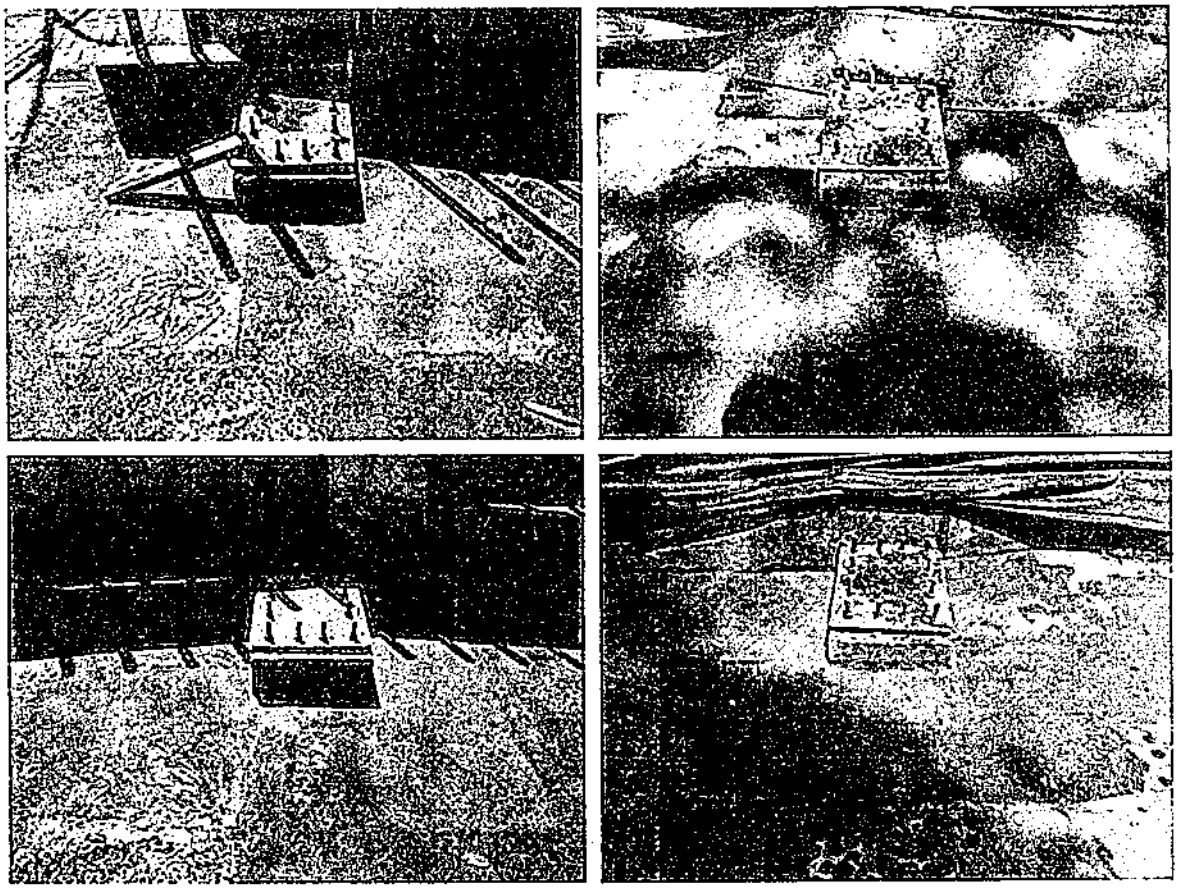


Ilustración 6. Placa de piso en concreto 21 Mpa

- **Suministro e instalación de perfil PHR según especificación**

Durante este periodo se avanzaron los trabajos en taller asociados a la construcción de la estructura metálica de la cubierta, incluyendo el suministro de perfiles, el corte, la soldadura y el ensamblaje de columnas, vigas y cerchas, actividades que se desarrollaron conforme a los planos, especificaciones y procedimientos establecidos en los diseños estructurales. Paralelamente, se llevaron a cabo controles dimensionales y verificaciones de calidad en las uniones y cordones de soldadura, con el fin de asegurar la correcta configuración geométrica y el adecuado comportamiento estructural de cada componente.

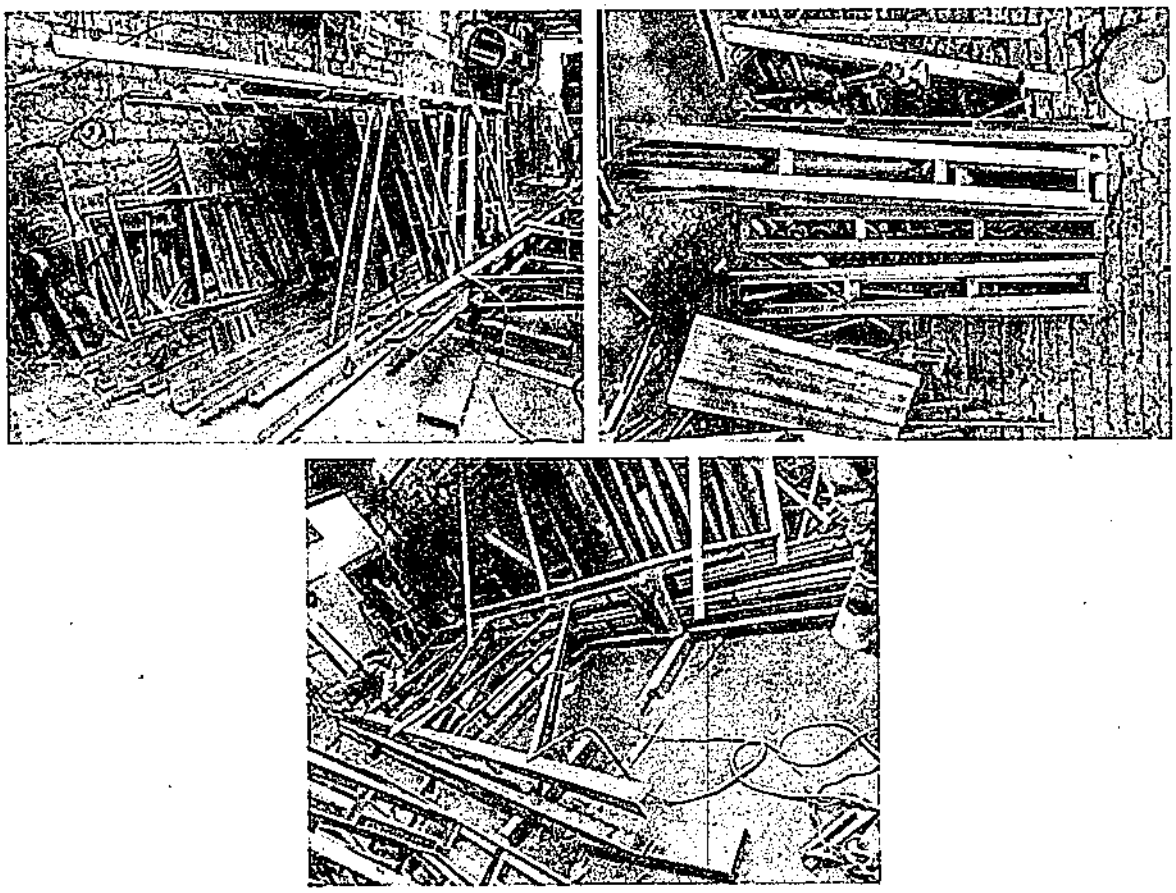


Ilustración 7. Ensamblaje de estructura metálica en taller

A medida que los diferentes elementos fueron completados, se ejecutó su traslado progresivo hacia el frente de obra, donde, en la fase final del mes, se realizaron actividades de preparación superficial tales como el pulido de imperfecciones, remoción de residuos de soldadura y limpieza general. Posteriormente, se aplicó pintura anticorrosiva, garantizando la resistencia, durabilidad y correcta condición de las piezas previo a su montaje definitivo.

De manera paralela, se avanzó en las labores de soldadura y ensamblaje de las vigas metálicas principales. Debido a su gran envergadura, dichas vigas fueron fabricadas y transportadas en segmentos, los cuales están siendo alineados, fijados y soldados en obra, asegurando la continuidad estructural, la precisión geométrica y el estricto cumplimiento de los planos y diseños del proyecto.

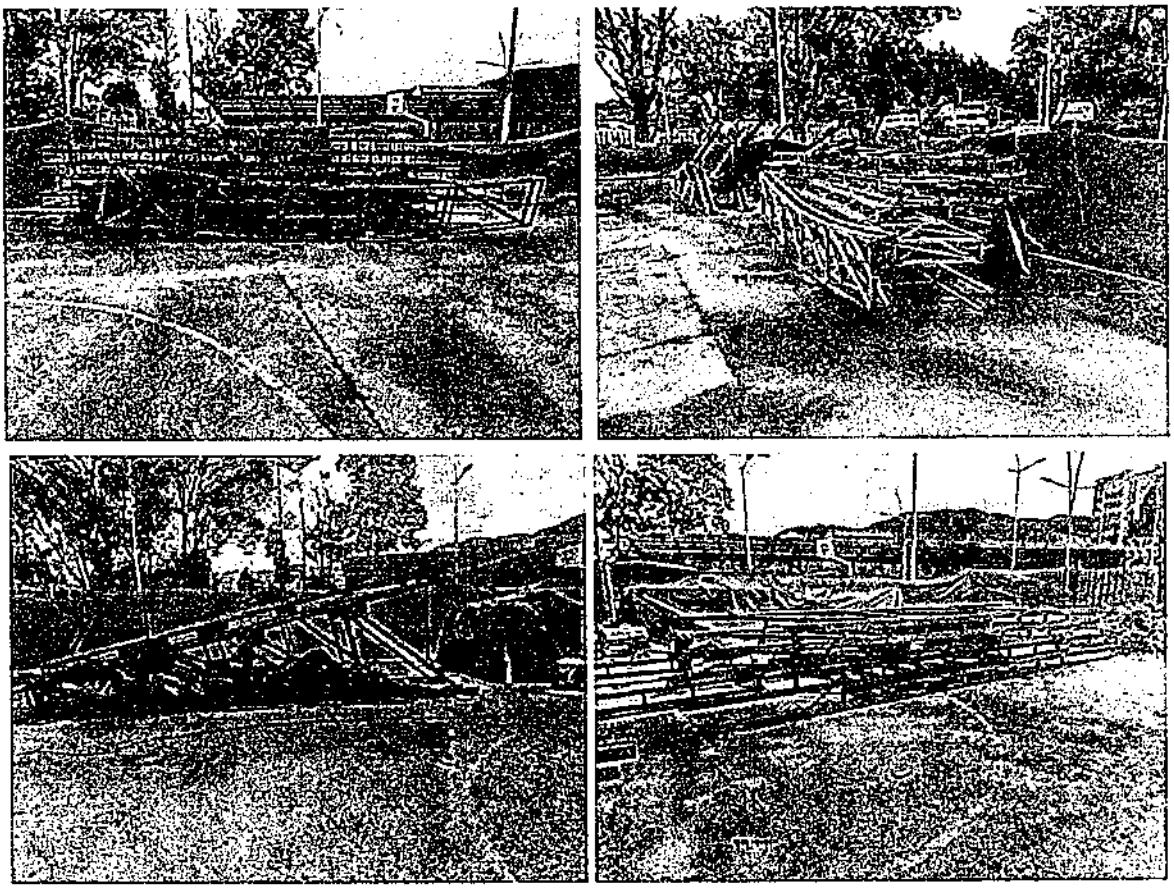


Ilustración 8. Disposición y aplicación de anticorrosivo de estructura metálica

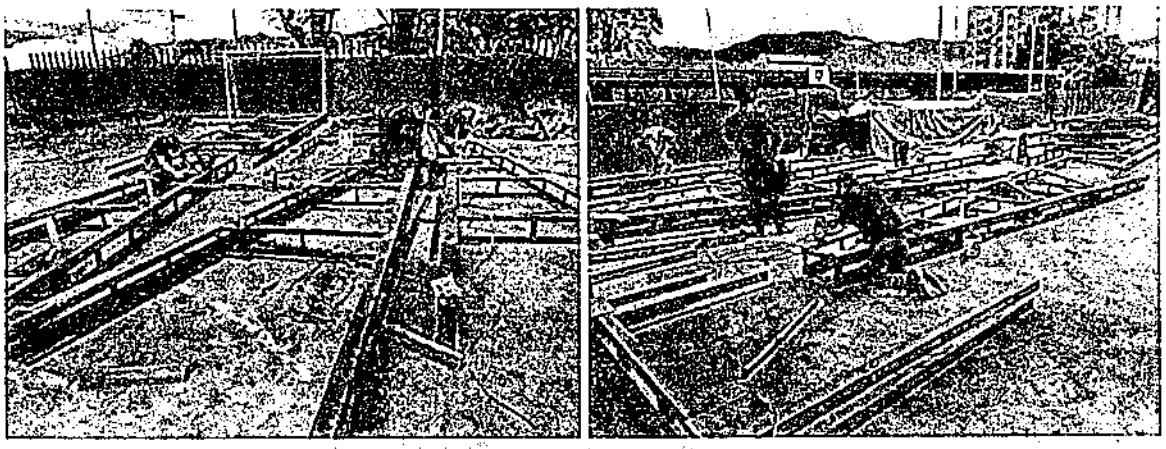


Ilustración 9. Ensamblaje de estructura metálica en obra

Durante el periodo final se culminaron las actividades de preparación, ajuste, unión y montaje de los componentes estructurales, completando la estructura metálica y los elementos asociados a la cubierta. Con estas actividades se alcanza la ejecución física total prevista en el contrato.

- **Suministro e instalación de platina según especificación, incluye pernos de anclaje según especificación y adhesivo de refuerzo de resistencia 420 Mpa**

Durante este periodo se llevó a cabo la instalación de las platinas estructurales definidas en los planos y diseños del proyecto. Estas piezas fueron soldadas en las uniones especificadas, con el propósito de reforzar los puntos críticos de conexión entre columnas, vigas y demás componentes metálicos, asegurando la adecuada transferencia de cargas y el incremento de la capacidad resistente de los elementos principales. El proceso incluyó el corte, la alineación y la fijación preliminar de cada platina, garantizando su correcta posición antes de la ejecución de los cordones de soldadura.

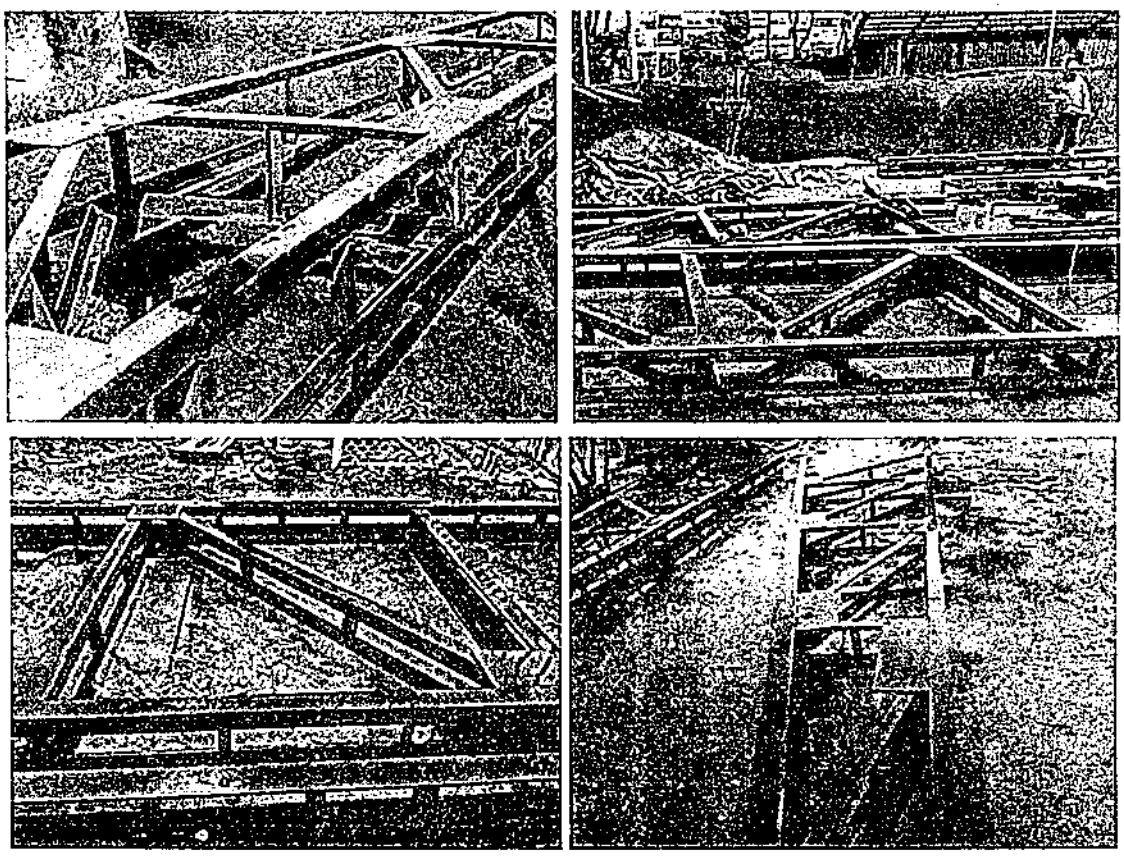


Ilustración 10. Fijación de platinas estructurales

- Resumen:

PERIODO DEL INFORME:	DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO ? RECURSOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN:	100%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100%
VIGENCIA DEL CONTRATO	DESDE EL 25 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

5. Anexos

5.1. Anexos aspectos jurídicos.

- Pólizas

5.2. Anexos aspectos financieros

- Extractos bancarios
- Rendimientos financieros

5.3. Cronogramas

- Cronograma de obra
- Cronograma de personal
- Cronograma de equipos

5.4. Ensayos de laboratorio

- Diseño de mezclas

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
C.C 1.085.317.099
Secretaria de Infraestructura y Valorización

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA - CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA No. 20254110

OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA – ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLÍVAR, VIGENCIA 2025, CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO, DENTRO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS PÚBLICAS (SUD-0033-013)".

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización.

Contratista: Oscar Alirio Bravo Villota.

Contrato de Obra: No. 20254110.

Fecha de suscripción: 25 de agosto de 2025.

Acta de inicio: 22 de octubre de 2025.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025.

Valor inicial del contrato: $597.508.177,42.

Valor final del contrato: $597.508.177,42.

Adiciones: No se realizaron.

Prórrogas: No se realizaron.

Suspensiones: No se presentaron.

Estado del contrato: Terminado y ejecutado al 100%.

2. OBJETO EJECUTADO

El Contratista ejecutó en su totalidad el objeto contractual consistente en la construcción de la estructura metálica para cubierta del Escenario Deportivo Parque Bolívar del Municipio de Pasto, incluyendo el suministro de materiales, transporte, fabricación, montaje, instalación, aplicación de sistemas de protección, ejecución de actividades complementarias y demás labores necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura entregada.

Las actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas del contrato, los planos aprobados, las recomendaciones de la supervisión y la normatividad vigente aplicable para este tipo de estructuras.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución contractual se desarrollaron integralmente las actividades previstas dentro del alcance del proyecto, entre las cuales se destacan las siguientes:

3.1 Actividades Preliminares

- Revisión de estudios, diseños y especificaciones técnicas.
- Localización y replanteo del proyecto.
- Verificación de condiciones existentes del escenario deportivo.
- Organización y adecuación inicial del área de trabajo.
- Instalación de señalización preventiva y medidas de seguridad.

3.2 Suministro de Materiales

Se realizó el suministro oportuno de todos los materiales requeridos para la ejecución de la estructura metálica, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas contractualmente.

Los materiales suministrados fueron objeto de verificación y control de calidad antes de su incorporación a la obra.

3.3 Fabricación de Elementos Metálicos

Se ejecutaron los procesos de fabricación de los diferentes elementos estructurales requeridos para la cubierta, incluyendo:

- Columnas metálicas.
- Vigas principales.
- Vigas secundarias.

- Correas.
- Elementos de rigidización.
- Platinas y conexiones estructurales.
- Elementos de anclaje.

La fabricación se realizó cumpliendo las dimensiones, geometrías y características establecidas en los diseños estructurales.

3.4 Montaje de Estructura Metálica

Se ejecutó el transporte, izaje, montaje, alineación y fijación de todos los elementos estructurales contemplados dentro del proyecto.

Las labores desarrolladas incluyeron:

- Instalación de columnas.
- Montaje de vigas principales.
- Instalación de vigas secundarias.
- Colocación de correas.
- Instalación de arriostramientos.
- Verificación de alineación y verticalidad.
- Ajuste y nivelación estructural.

3.5 Soldadura y Conexiones

Se ejecutaron los trabajos de soldadura estructural y conexiones requeridas para garantizar la estabilidad de la cubierta.

Se efectuaron inspecciones permanentes a las uniones ejecutadas verificando la calidad y resistencia de cada elemento instalado.

3.6 Protección Anticorrosiva

Con el propósito de garantizar la durabilidad de la estructura metálica se realizaron actividades de:

- Limpieza de superficies.
- Preparación mecánica.
- Aplicación de pintura anticorrosiva.
- Aplicación de acabados finales.

Estas actividades permitieron proteger adecuadamente la estructura frente a condiciones ambientales y agentes externos.

3.7 Instalación de Cubierta

Se realizó el suministro e instalación de la cubierta proyectada para el escenario deportivo, incluyendo accesorios, fijaciones y elementos complementarios necesarios para su correcto funcionamiento.

La instalación fue ejecutada garantizando estabilidad, impermeabilidad y seguridad estructural.

3.8 Actividades Complementarias

Se ejecutaron además las siguientes actividades:

- Ajustes finales de estructura.
- Corrección de observaciones realizadas durante la ejecución.
- Limpieza general de la obra.
- Retiro de materiales sobrantes.
- Desmonte de instalaciones temporales.
- Entrega final del proyecto.

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Una vez finalizadas las actividades contractuales se verificó el cumplimiento total del alcance previsto, alcanzando un avance físico acumulado del CIEN POR CIENTO (100%).

Las cantidades de obra ejecutadas corresponden a las contempladas dentro del contrato y fueron desarrolladas conforme a los requerimientos técnicos establecidos por la entidad contratante.

5. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El valor total ejecutado corresponde a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($597.508.177,42), equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor contratado.

La ejecución financiera presenta total concordancia con el avance físico alcanzado durante la ejecución del proyecto.

6. CONTROL DE CALIDAD

Durante toda la ejecución del contrato se implementaron actividades permanentes de control de calidad sobre materiales, procesos constructivos y actividades ejecutadas.

Se verificó el cumplimiento de:

- Especificaciones técnicas.
- Diseños estructurales.
- Normas aplicables.
- Procesos de fabricación.
- Procesos de montaje.
- Sistemas de protección anticorrosiva.
- Condiciones de instalación de cubierta.

Como resultado de las verificaciones realizadas se evidenció el cumplimiento satisfactorio de los estándares técnicos exigidos para la obra.

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La ejecución de la obra se desarrolló bajo los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el desarrollo del contrato se realizaron:

- Charlas de seguridad.
- Inspecciones periódicas.
- Verificación de uso de EPP.
- Control de trabajos en alturas.
- Supervisión de actividades de soldadura.
- Seguimiento permanente a condiciones seguras de trabajo.

Las actividades fueron ejecutadas manteniendo condiciones adecuadas de seguridad para el personal vinculado al proyecto.

8. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución contractual se implementaron medidas orientadas a prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la construcción.

Entre las acciones desarrolladas se destacan:

- Manejo adecuado de residuos.

- Recolección y disposición de materiales sobrantes.
- Control de emisiones de polvo.
- Limpieza permanente del área de intervención.
- Protección de las zonas aledañas al proyecto.

9. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

Una vez culminadas las actividades contractuales se realizaron las verificaciones finales correspondientes, evidenciando que la infraestructura construida cumple con las condiciones técnicas, estructurales y funcionales previstas dentro del proyecto.

La cubierta metálica del Escenario Deportivo Parque Bolívar fue entregada completamente terminada, operativa y en condiciones adecuadas para su utilización por parte de la comunidad.

Asimismo, se atendieron las observaciones formuladas durante el proceso constructivo y se efectuó la entrega de la documentación técnica requerida para el cierre contractual.

10. CONCLUSIONES

El Contratista ejecutó satisfactoriamente la totalidad de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 20254110, logrando el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del plazo establecido y conforme a las especificaciones técnicas definidas por el Municipio de Pasto.

La obra alcanzó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 100%, sin requerir adiciones, suspensiones ni prórrogas contractuales.

La infraestructura construida fue entregada completamente terminada, funcional y apta para su puesta en servicio, constituyéndose en una mejora significativa para el fortalecimiento de los espacios deportivos y recreativos del Municipio de Pasto.

Por lo anterior, se deja constancia de la terminación satisfactoria del contrato y de la entrega final de la cubierta metálica correspondiente al Escenario Deportivo Parque Bolívar.

Para constancia se firma.

ELABORADO POR:

OSCAR AURIO BRAVO VILLOTA
CONTRATISTA DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101296641	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	02	2026	22	09	2025	00:00	28	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
BRAVO VILLOTA, OSCAR ALIRIO		CC: 12.988.147	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO.14-05 B-SAN MIGUEL	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO:	3136516008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PASTO		NIT: 891.280.000-3	
DIRECCIÓN: SEDE AGANOY ROSALES II	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO	7292000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 20254110 CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO. DENTRO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS PUBLICAS (SUD-0033-013)

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/09/2025	28/07/2026	$239,003,270.97	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/09/2025	28/07/2026	$119,501,635.48	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/09/2025	28/01/2029	$59,750,817.74	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$59,750,817.74	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA FINAL DE CONTRATO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, AL CONTRATO No. 20254110 SE DA POR ENTREGADO A SATISFACCION EL OBJETO DE DICHO CONTRATO
ESTABILIDAD DE OBRA VIGENCIA DESDE 31-12-2025 HASTA 31-12-2028
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******478,006,541.93	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101296641

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101296641	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	02	2026	22	09	2025	00:00	28	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
BRAVO VILLOTA, OSCAR ALIRIO		CC:	12.988.147
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO.14-05 B-SAN MIGUEL	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO:	3136516008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT:	891.280.000-3
MUNICIPIO DE PASTO			
DIRECCIÓN: SEDE AGANOY ROSALES II	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO	7292000

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED

SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******478,006,541.93	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101296641	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	02	2026	22	09	2025	00:00	28	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
BRAVO VILLOTA, OSCAR ALIRIO			CC: 12.988.147
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO.14-05 B-SAN MIGUEL	CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO: 3136516008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PASTO			NIT: 891.280.000-3
DIRECCIÓN: SEDE AGANOY ROSALES II	CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO: 7292000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101296641

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBACIÓN DE POLIZA

De conformidad con la delegación otorgada por el Sr. Alcalde Municipal mediante el Decreto 016 de 2024, el Director del Departamento Administrativo de Contratación de la Alcaldía Municipal de Pasto, procede a aprobar la(s) póliza(s), conforme a la siguiente información:

Fecha de Aprobación	Numero Contrato	Tipo Contrato	N° de Registro
2026-02-20	20254110	Contratación de menor cuantía	214

Objeto Contractual

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE LA ZONA URBANA - ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE BOLIVAR, VIGENCIA 2025. CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO. Dentro del plan anual de compras públicas (SUD-0033-013)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Identificación	12988147-8
Nombre contratista	OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA

DATOS DE LA PÓLIZA

Clase de Póliza	Nombre Aseguradora	N° de Póliza	Fecha de Expedición
Póliza de responsabilidad extracontractual	MUNDIAL DE SEGUROS	41-40-101057061	2025-08-25
Póliza de Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	41-44-101296641	2025-08-25
Póliza de Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	41-44-101296641	2026-02-17

AMPAROS

N° Póliza	Descripción	Desde	Hasta	Valor
41-40-101057061	Predios, labores y operaciones	2025-08-25	2025-12-31	$ 284,700,000.00
41-40-101057061	Daño emergente y lucro cesante	2025-08-25	2025-12-31	$ 284,700,000.00
41-40-101057061	Perjuicios extrapatrimoniales	20525-08-25	2025-12-31	$ 284,700,000.00
41-44-101296641	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-08-25	2026-06-30	$ 239,003,270.97
41-44-101296641	Cumplimiento del contrato	2025-08-25	2026-06-30	$ 119,501,635.48
41-44-101296641	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2025-08-25	2028-12-31	$ 59,750,817.74
41-44-101296641	Calidad y estabilidad de la obra	2025-08-25	2028-08-25	$ 59,750,817.74
41-44-101296641	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-09-22	2026-07-28	$ 239,003,270.97
41-44-101296	Cumplimiento del	2025-09-22	2026-07-28	$ 119,501,635.48

641	contrato			
41-44-101296641	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2025-09-22	2029-01-28	$ 59,750,817.74
41-44-101296641	Calidad y estabilidad de la obra	2025-09-22	2028-09-22	$ 59,750,817.74

CÚMPLASE

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE

Directora Departamento Administrativo de Contratación Publica
