Fundación Activos Mundo

6. INFORME EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN (SMSCE) A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR

ENTIDAD CONTRATANTE:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – **EICE–EDURHA**

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO – **FAMUNDO**

FECHA DE INICIO: 14 DE MARZO DE 2026
FECHA DE AVANCE: 13 DE ABRIL DE 2026

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Fundación Activos para el Mundo

INFORME EJECUTIVO

A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías (SGR), Colombia adoptó un nuevo modelo de distribución y administración de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, orientado a garantizar mayor equidad territorial, eficiencia en la inversión pública y cierre de brechas sociales. Esta transformación permitió que entidades territoriales y entidades descentralizadas accedieran a recursos de inversión bajo criterios objetivos como necesidades básicas insatisfechas, población y condiciones socioeconómicas.

En desarrollo de este modelo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ejerce funciones de orientación técnica, monitoreo y evaluación del desempeño de los proyectos financiados con recursos del SGR, a través del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), soportado en los aplicativos SUIFP–SGR, SPGR y GESPROY SGR.

Con la expedición de la Ley 2056 de 2020, se consolidó el esquema de aprobación directa de proyectos, fortaleciendo la autonomía territorial y definiendo con mayor claridad el rol de las entidades ejecutoras. En este marco, las entidades públicas designadas como ejecutoras asumen la responsabilidad integral de garantizar la correcta ejecución física, financiera y administrativa de los proyectos aprobados, así como el reporte oportuno, veraz y completo de la información en los sistemas oficiales.

En este contexto, la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de San Juan de Urabá – EICE–EDURHA, en su calidad de entidad ejecutora de proyectos financiados con recursos del SGR, adquiere la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión de la inversión pública.

REPORTE DE INFORMACION PARA LA MEDICION

Para efectos de la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), las entidades ejecutoras deben registrar, aprobar y enviar mensualmente en el aplicativo GESPROY SGR los hechos relacionados con la gestión del proyecto, desde su aprobación hasta su cierre y operación, dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada mes, con corte al último día del mes inmediatamente anterior. La aprobación y envío de la información corresponde al representante legal de la entidad ejecutora.

La unidad de medida del IGPR es el proyecto de inversión, y la evaluación se realiza exclusivamente sobre la gestión del trimestre objeto de medición, sin arrastrar resultados de periodos anteriores. Asimismo, la metodología reconoce diferencias en la capacidad institucional de las entidades ejecutoras.

El IGPR constituye el indicador oficial de desempeño de los proyectos financiados con recursos del SGR y mide la eficiencia en la etapa de ejecución, evaluando desviaciones en términos de cronograma y costo. La medición se realiza sobre el portafolio de

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

proyectos de la entidad ejecutora y corresponde al promedio simple del puntaje obtenido por cada proyecto que integre el universo de medición al corte del trimestre.

Universo de medición

Serán objeto de medición todos los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del SGR que hayan surtido la etapa de aprobación y se encuentren migrados al aplicativo GESPROY SGR para su seguimiento.

No harán parte del universo de medición aquellos proyectos que se encuentren en las situaciones expresamente excluidas por la normativa vigente, entre ellas: proyectos con decisión motivada de no continuidad, proyectos desaprobados en ejercicio de la autonomía territorial, proyectos con cambio de ejecutor dentro del trimestre evaluado, proyectos con medidas administrativas preventivas o sancionatorias vigentes, y demás condiciones previstas en la regulación aplicable.


De acuerdo con la Resolución 4574 de 2025, los proyectos en estado "TERMINADO" serán medidos únicamente en el trimestre en que se registre oficialmente su terminación y no integrarán el universo de medición en periodos posteriores.

MEDICIÓN DE PROYECTOS EN ESTADO "EN EJECUCIÓN"

Conforme a la metodología vigente, los proyectos en estado "EN EJECUCIÓN" son evaluados a partir de dos (2) indicadores orientados a medir la eficiencia en términos de cronograma y costo. La medición inicia una vez el proyecto suscribe el primer contrato.

La entidad ejecutora dispone de noventa (90) días calendario contados a partir de la suscripción del primer contrato para revisar y ajustar la línea base de planeación definida en el estado "SIN CONTRATAR". Transcurrido dicho término, la línea base queda fijada y constituye el referente para la medición del desempeño del proyecto.

El puntaje final del IGPR se expresa en una escala de 0 a 100 puntos. Se considera desempeño adecuado cuando el resultado es igual o superior a 60 puntos. La medición es trimestral y anual, y el índice institucional corresponde al promedio simple del desempeño de los proyectos que integran el portafolio de la entidad al corte del período evaluado.

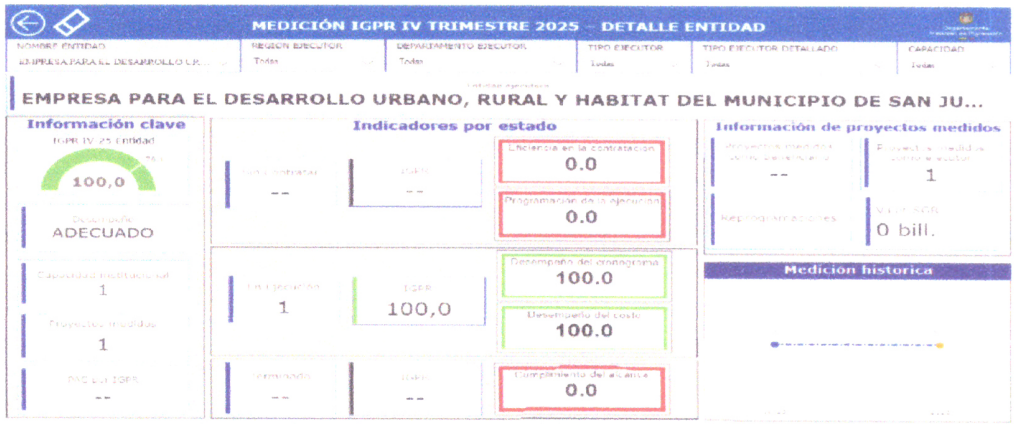

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com



A pesar de los inconvenientes presentados durante la etapa precontractual, los cuales generaron retrasos en algunos indicadores asociados a la eficiencia en la contratación y la programación de la ejecución, se logró obtener una calificación de 100 puntos en el IGPR. Este resultado refleja el compromiso institucional y la efectividad de las acciones correctivas implementadas, así como el adecuado desarrollo del proyecto en su fase de ejecución, evidenciado en el cumplimiento del cronograma y del costo, lo que permitió alcanzar un desempeño general clasificado como adecuado.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico–administrativo se elabora en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la Secretaría Técnica en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), celebrado entre la Fundación Activos por el Mundo – FAMUNDO y la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de San Juan de Urabá – EICE–EDURHA.

Las acciones desarrolladas se han orientado al cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y operativos necesarios para la correcta implementación del seguimiento a los proyectos financiados con recursos del SGR, así como al fortalecimiento institucional de la entidad en su calidad de ejecutora.

En este sentido, la gestión se ha enfocado en adelantar las actuaciones requeridas para la habilitación institucional en los sistemas dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), incluyendo la creación y validación de usuarios, el registro en los aplicativos SUIFP–SGR y SPGR, y la parametrización necesaria para la operación efectiva del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE.


2. ACCIONES DESARROLLADAS – PROYECTO OBJETO DE MEDICIÓN

De acuerdo con la metodología vigente para la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), serán objeto de evaluación aquellos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que se encuentren dentro del universo de medición definido para el trimestre correspondiente, conforme a su estado en el aplicativo GESPROY SGR.

En el caso de la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de San Juan de Urabá – EICE–EDURHA, actualmente el portafolio institucional financiado con recursos del SGR está conformado por un (1) único proyecto de inversión, el cual constituye la totalidad del universo de medición y, en consecuencia, determina de manera directa la calificación institucional en el IGPR.

A continuación, se enuncia el proyecto objeto de seguimiento y medición:

2.1. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA DE ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS - BPIN: 2025056590001

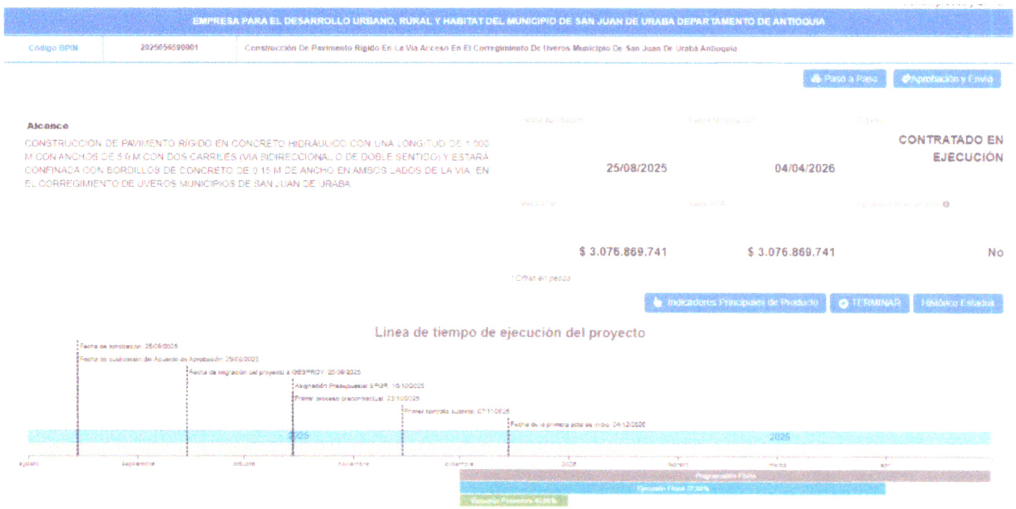

Estado en GESPROY SGR: CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Avance físico: 33.88%

Avance financiero: 40.56%

ACCIONES REALIZADAS

- ✓ Se reporta ejecución de acuerdo con acta del contratista.



Fundación Activos del Mundo

Cargue de Ejecución del Proyecto

Cargue en Línea | Cierre proceso de cargue masivo de información

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	$ 3.676.869.741,00
Valor Actividades Programadas	$ 3.676.869.741,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 1.165.389.029,00

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..

Producto MGA: Vía terciaria mejorada

Actividad MGA: REALIZAR AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.7.1 REALIZAR AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$	13.26	60.62	NO		Inicial			
							Prog	316.746.457	1	316.746.457
							Eje	191.410.565	1	191.410.565

Actividad MGA: REALIZAR ESTRUCTURAS Y DRENAJES


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.8.1 REALIZAR ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$	18.67	12.96	NO		Inicial			
							Prog	512.964.843	1	512.964.843
							Eje	70.382.522	1	70.382.522

Actividad MGA: Realizar explanaciones

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.6.1 REALIZAR EXPLANACIONES	$	16.27	70.75	NO		Inicial			
							Prog	503.807.740	1	503.807.740
							Eje	361.471.815	1	361.471.815

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	Periodos				
	1 dic-25	2 ene-26	3 feb-26	4 mar-26	5 abr-26
* Valor Planeado (PV)	305	1061	2028	3052	3077
* Valor Ganado (EV)	11	11	11	1155	
* Costo Actual (AC)	11	11	11	1155	
Cumplimiento en la programación (SPI)	0.03	0.01	0.01	0.36	
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	-	
Retraso SV(t) Meses				1.99	

* Valores en millones de pesos

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com



ACTA DE COBRO N°1

CADIA INGENIERIA SAS

EICE - EDURHA

CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	ACTA DE INICIO:	4 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO DE OBRA:	No. EICE-029-2025	FECHA DE SUSPENSION:	4 DE FEBRERO DEL 2026
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ ANTIOQUIA	FECHA DE REINICIO:	16 DE MARZO DEL 2026
INTERVENTORIA:	CADIA INGENIERIA SAS	FECHA DE TERMINACION:	6 DE MAYO DEL 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No.EICE-030-2025	VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.875.469.197,00
SUPERVISIÓN:	EDURHA DE SAN JUAN DE URABA	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE ABRIL 2026

	PRESUPUESTO GENERAL				ACTA No. 1			PENDIENTE POR COBRAR		
Nº ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GRAL	ESPECIFICACIONES PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES													
1.1	100-5	INV-100-22	DEMOLICION, RETIRO Y DISPOSICION DE CONCRETO	M3	1.000,00	$ 96.878,00	$ 96.878.000	100,00	$ 96.878,00	$ 9.687.800	900,00	$ 96.878,00	$ 87.190.200
1.2	120-13	INV-120-22	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO A COSTO	M3	4.000,00	$ 91.338,00	$ 365.352.000	400,00	$ 91.338,00	$ 36.535.200	3.600,00	$ 91.338,00	$ 328.816.800
1.3	150-1	INV-150-22	DESCAPOTE	HA	1,00	$ 1.241.496,00	$ 1.241.496	0,10	$ 1.241.496,00	$ 124.150	0,90	$ 1.241.496,00	$ 1.117.346
1.4	154-1	INV-154-22	EXCAVACION DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN	M3	1.000,00	$ 4.218,00	$ 4.218.000	100,00	$ 4.218,00	$ 421.800	900,00	$ 4.218,00	$ 3.796.200
1.5	154-2	INV-154-22	EXCAVACION DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN (ROCA)	M3	1.000,00	$ 4.218,00	$ 4.218.000	100,00	$ 4.218,00	$ 421.800	900,00	$ 4.218,00	$ 3.796.200
1.6	170-15	INV-170-22	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION	M3	5.000,00	$ 75.429,00	$ 377.145.000	500,00	$ 75.429,00	$ 37.714.500	4.500,00	$ 75.429,00	$ 339.430.500
Subtotal							$ 382.857.746,85			$ 347.471.815,00			$ 142.323.837,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y BASES													
2.1	330-13	INV-330-22	SUB-BASE GRANULAR CBR 70	M3	1.000,00	$ 3.619,00	$ 3.619.000	100,00	$ 3.619,00	$ 361.900	900,00	$ 3.619,00	$ 3.257.100
Subtotal							$ 313.746.497,85			$ 291.415.668,00			$ 134.330.769,00
3 PAVIMENTO DE CONCRETO													
3.1	360-21	INV-360-22	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR = 4,0 MPa	M3	1.000,00	$ 3.434.275,00	$ 3.434.275.000	100,00	$ 3.434.275,00	$ 343.427.500	900,00	$ 3.434.275,00	$ 3.090.847.500
Subtotal							$ 3.391.886.212,85			$ 343.427.500,00			$ 3.090.847.500,00
4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
4.1	500	INV-500-22	EXCAVACION PARA LA CUNETA	M3	1.000,00	$ 96.878,00	$ 96.878.000	100,00	$ 96.878,00	$ 9.687.800	900,00	$ 96.878,00	$ 87.190.200
4.2	610-2	INV-610-22	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.000,00	$ 54.000,00	$ 54.000.000	100,00	$ 54.000,00	$ 5.400.000	900,00	$ 54.000,00	$ 48.600.000
4.3	630-14-1-1	INV-630-22	Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 MPa para obras pequeñas ubicadas dentro o fuera de cimentaciones	M3	27,43	$ 1.719.142,00	$ 47.157.442,06	27,43	$ 1.719.142,00	$ 47.157.442,06	24,69	$ 1.719.142,00	$ 42.441.697,85
4.4	660-1-1	INV-660-22	Suministro, fabricación y colocación de acero de refuerzo	KG	2.000,00	$ 3.800.787,00	$ 7.601.574.000	200,00	$ 3.800.787,00	$ 760.157.400	1.800,00	$ 3.800.787,00	$ 6.841.416.600
4.5	680-1	INV-680-22	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado clase III para alcantarillado de aguas lluvias y sanitarias	M	1.000,00	$ 1.276.847,00	$ 1.276.847.000	100,00	$ 1.276.847,00	$ 127.684.700	900,00	$ 1.276.847,00	$ 1.149.162.300
4.6	672-A	INV-672-22	Suministro de cajillas prefabricadas de concreto, incluye la preparación de la superficie de apoyo	U	1.000,00	$ 3.217.250,00	$ 3.217.250.000	100,00	$ 3.217.250,00	$ 321.725.000	900,00	$ 3.217.250,00	$ 2.895.525.000
Subtotal							$ 12.394.646.442,06			$ 1.271.832.342,06			$ 11.122.814.100,00
5 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD													
5.1	700-2	INV-700-22	Señal vertical de reglamentación	UN	8,00	$ 1.267.440,00	$ 10.139.520	8,00	$ 1.267.440,00	$ 10.139.520	8,00	$ 1.267.440,00	$ 10.139.520
5.2	700-3-1	INV-700-22	Señal vertical de nomenclatura SR 3# y/o SI (aplica en dimensiones estandarizadas por la ANSI)	UN	1,00	$ 3.957.670,00	$ 3.957.670	1,00	$ 3.957.670,00	$ 3.957.670	1,00	$ 3.957.670,00	$ 3.957.670
Subtotal							$ 11.713.690,00			$ 14.097.190,00			$ 14.097.190,00
6 TRANSPORTE													
6.1	100-2	INV-900-22	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 101 metros y 1.000 m. Incluido el suelo de cien metros y 100 m	M3-KM	17.754,00	$ 1.842,00	$ 32.711.515,75	24.858,00	$ 1.842,00	$ 45.796.236,00	17.466,00	$ 1.842,00	$ 32.169.279,00
Subtotal							$ 88.813.315,00			$ 44.788.214,00			$ 24.806.886,00
7 ADECUACION CUNETA PREFABRICADA A-80													
7.1	Particular		Bordillo con cuneta prefabricado A-80	ML	1.000,00	$ 139.846,00	$ 139.846.000	0,00	$ 139.846,00	$ 0	1.000,00	$ 139.846,00	$ 139.846.000
Subtotal							$ 86.462.753,85			$ 0,00			$ 86.462.753,85
						SUBTOTAL OBRAS $	$ 17.672.313.170,00			$ 1.181.360.239,06			$ 14.490.732.932,00

PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO - PMT	$ 29.521.644,00	PMT	$ 29.521.644,00
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	$ 34.032.975,00	PAGA	$ 34.032.975,00
TOTAL OBRAS	$ 2.875.469.197,00	TOTAL OBRAS	$ 1.181.360.239,06	TOTAL OBRAS	$ 1.714.380.857,00

- Se reportan actas de reinicio

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Soporte
	SN	Acta de inicio	04/12/2025	DE JAN CONSTANCIA DE LA INICIACION REAL Y EFECTIVA DEL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ADICIONAR LAS POLIZAS ACTUALIZADAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO EN AL CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL CONTRATO NO. EICE-029-2025 SEGÚN LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO. EN TÉRMINO DE TRES DIAS HABILES	0,00	29/01/2026		Ver
	001	Acta de suspensión	04/02/2026	QUE MEDIANTE COMUNICACIÓN DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2026, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, MANIFESTANDO LA OCURRENCIA DE FENOMENOS NATURALES EXTRAORDINARIOS EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS, TALES COMO DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, PÉRDIDA DE BANCA, COLAPSO DE PUENTES E INCOMUNICACIÓN TOTAL DE LA ZONA, QUE LA INTERVENTORIA, MEDIANTE CONCEPTO TÉCNICO DE LA MISMA FECHA, RECOMENDÓ APROBAR LA SUSPENSIÓN, AL EVIDENCIAR: • IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE ACCESO Y TRANSPORTE DE MATERIALES. • ALTO RIESGO PARA EL PERSONAL Y EQUIPOS. • AFECTACIÓN EXTERNA, IMPREVISIBLE Y NO IMPUTABLE A LAS PARTES. Y, QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS CONSTITUYEN UN EVENTO EXTERNO, IMPREVISIBLE Y NO ATRIBUIBLE A LAS PARTES ENCUADRABLE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR CONTEMPLADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO. 8. QUE ES DEBER DE LA ENTIDAD PROTEGER EL INTERÉS PÚBLICO, LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL, LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA Y EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	0,00	16/02/2026	Condiciones Climáticas o de un tercero imprevisibles	Ver
	1	Acta de reinicio	16/03/2026	PRIMERO: REANUDAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. EICE-029-2025 A PARTIR DEL DÍA DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026). SEGUNDO: EL PLAZO CONTRACTUAL SE REANUDA A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2026, POR EL TERMINO RESTANTE DE DOS (2) MESES, EN RAZÓN A LA SUSPENSIÓN PREVIAMENTE DECLARADA. EN CONSECUENCIA, LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDE AL 16 DE MAYO DE 2026	0,00	15/04/2026		Ver

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

3. CONCLUSIONES

De conformidad con la metodología establecida para la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), y teniendo en cuenta que el portafolio institucional está compuesto por un único proyecto en estado "EN EJECUCIÓN", se concluye que la entidad logró alcanzar un desempeño sobresaliente con una calificación de 100 puntos, superando ampliamente el umbral definido para un desempeño adecuado. Este resultado evidencia la correcta aplicación de los lineamientos técnicos y administrativos en la etapa de ejecución, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento del cronograma y la adecuada gestión de los costos.

Fundación Activos por el Mundo

No obstante, es importante precisar que, durante el periodo pasado, el proyecto presentó una suspensión derivada de las afectaciones ocasionadas por la ola invernal, lo cual limitó el reporte de avances físicos recientes.

En este sentido, se resalta el compromiso institucional en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), así como en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Sistema General de Regalías (SGR), consolidando así una gestión eficiente que contribuye al fortalecimiento de la ejecución de proyectos de inversión pública en el territorio.

HAMILTON BURITICA MANCO
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Fundación Activos Mundo

7. ANEXOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

Departamento Nacional de Planeación - DNP	FICHA RESUMEN ENTIDAD SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	SGR

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO D

Fecha	27/04/2026	Entidad territorial	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO D
Región	NA	Tipo de OCAD	
Población étnica			
Entidad Habilitada		Entidad con adecuado desempeño	

*Cifras en millones de pesos


SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

1. SALDOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS

Inversión	2019-2020[1]
TOTAL INVERSIÓN	0

[1]Incluye Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018 y saldos de vigencias anteriores. El valor puede variar a partir de aprobaciones de proyectos o ajustes registrados en SUIFP, desaprobación de proyectos o liberación de saldos.

Fuente: SICODIS - Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP / https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v6.aspx
Fecha de corte:

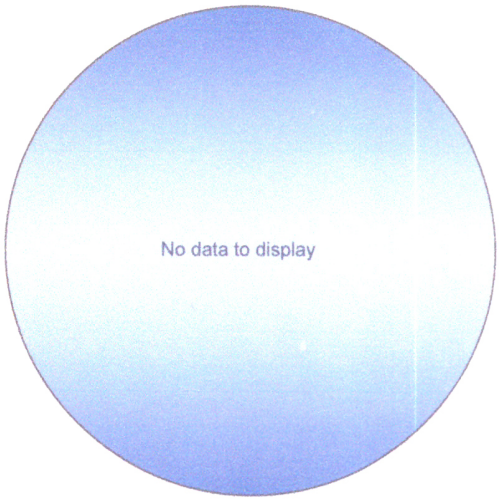

2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

Conceptos	Fortalecimiento SSEC[2]	Fortalecimiento SGR[3]	Total General

[2]Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 2902 de 2014.
[3] Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación; Resoluciones 0002 de 2012, 1730 de 2012, 0001 de 2013, 0006 de 2013, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 0008 de 2014, 0135 de 2015, 1308 de 2015, 1400 de 2015, 2697 de 2016, 3680 de 2016, 1145 de 2017, 1459 de 2017, 3364 de 2017, 3366 de 2017, 4640 de 2017 y 2178 de 2018.

Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.
Fecha de corte:

3. CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS VIGENTES -SGR

No. de Cuenta	Banco	Fuente de Recursos	Autorizada / Registrada / Sustituida	Saldo
No. total cuentas	0			

Fuente: SSEC - DVR – DNP
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

4. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%), FDR y ASIGNACION PARA LA PAZ)[4]

TIPO DE	Total Proyectos	Cumple Aprobado	Cumple Pendiente de	No Cumple	%	Promedio

OCAD			OCAD		Aprobación				Cumplimiento	Revisiones
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0		

[4]Artículo 26 Ley 1530 de 2012 y Decreto 965 de 2018.
Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP

5. EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO D COMO ENTIDAD BENEFICIARIA[5]

Tipo de ejecutor designado	No. Entidades	No. Proyectos	Valor SGR	Valor Total[6]
TOTAL	0	0	0	0

[5] Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.
[6] Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.
[7] El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso
[8] Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP..

Distribución de recursos SGR por sector[7]

No data to display

6. INFLEXIBILIDADES[9]

No presenta información


[9]Inflexibilidades: Compromisos con cargo a recursos de regalías del régimen vigente a 31 de diciembre de 2011, que en aplicación de los artículos 144 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 2.2.4.1.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 se financian con cargo a recursos del SGR.


Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR y Archivo Excel para los compromisos.
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

7. EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO D COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

7.1 Estado de proyectos

Estado de proyectos	No.	%	Valor SGR	%	Valor Total[6]	%
2 EN EJECUCIÓN	1	100%	3,077	100%	3,077	100%
TOTAL GENERAL	1	100%	3,077	100%	3,077	100%






	No.	Valor SGR	Valor Total[6]
Proyectos sin cerrar[11]	1	3,077	3,077
Proyectos aprobados como entidad habilitada	0	0	0
Proyectos con enfoque diferencial	0	0	0
Proyectos aprobados por OCAD PAZ	0	0	0


[6]Incluye todas las fuentes aprobadas.
[7]El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso.
[*10]De los 0 proyectos sin contratar 0 se encuentran en riesgo de liberación de recursos.
[11]Corresponde al número de proyectos que la entidad actualmente debe administrar.

7.2 Fuentes de Financiación[6]



ASIG. INVLOCAL_NBI_2056	100.00%
Total	**100.00%**

7.3 Sectores de Inversión[7]

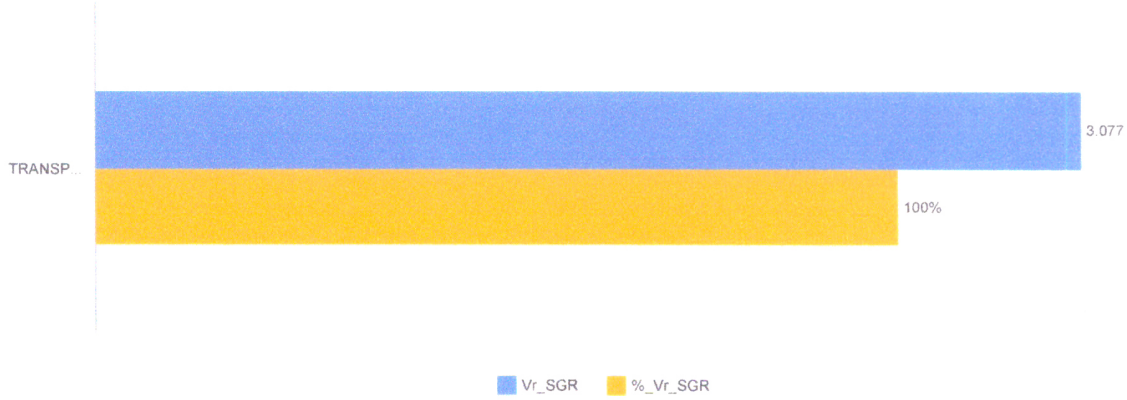


7.4 Contratación

% recursos contratados/ recursos aprobados	100.00	%

No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecuci¿n inversi¿n	2,875	1,251	43
1	Interventor¿a	201	0	0
TOTAL		3,077	1,251	

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 27/04/2026
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

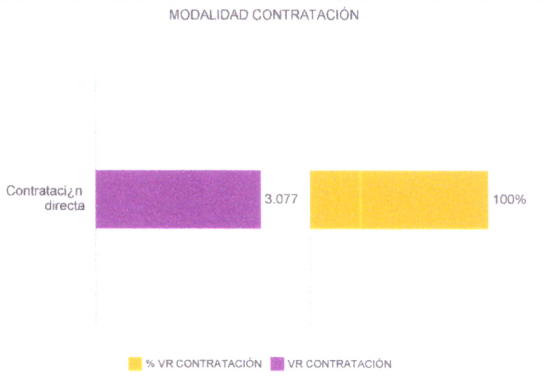

8. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR

Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 -2022	72 / 100	Promedio nacional último trimestre medido	

Histórico de Resultados

No data to display

Resultados IGPR

Resultado entidad		Rango[12]	
Puesto Nacional			
Puesto departamental			
Puesto ejecutor similar			

[12]El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4.Insuficiente (Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".
Donde:
• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
• Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
• Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).


Resultados IGPR por Categoría

No data to display

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

9. INDICADORES DE GESTIÓN

9.1 Consistencia en la programación de proyectos



Inconsistente, 1

Inconsistente	100%

9.2 Retraso en la ejecución de proyectos

No data to display

	N. Proyectos	
No. de proyectos en ejecución		
Con programación inconsistente		

9.3. Adición de recursos en proyectos



Rangos de adición	No. de proyectos	%
1. 0	1	100%

9.4. Cumplimiento en la terminación de proyectos



Proyectos sin terminar, 1

Proyectos sin terminar	100%

9.5 Cierre de proyectos

No data to display

Fuente: Gesproy-SGR
Fecha de corte: 24/04/2026
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

10. ALERTAS

No. de alertas como Secretaría Técnica			
No. de proyectos con alertas		**% proyectos con alertas**	

Aplicativo Tipo de Alerta	No. de eventos sin subsanar			
	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18
Total Eventos	0	0	0	0

DETALLE ALERTAS CUENTAS MAESTRAS OTROS PAGOS

La entidad tiene sin subsanar alertas por OTROS PAGOS*		**Valor de OTROS PAGOS**	

*Corresponde a pagos registrados en el aplicativo Cuentas SGR Sin asociar un proyecto aprobado o concepto de gasto.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte:
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

11. VISITAS DEL SSEC

Componente del SSEC	No. de proyectos visitados	Valor SGR de proyectos visitados	% de recursos SGR visitados
Seguimiento			
Evaluación			
Control Social			

11.1 Seguimiento a proyectos del SGR

No data to display

Planes de Mejora

[13]Un proyecto puede tener más de un plan de mejora.

Proyectos Críticos

No. de proyectos críticos	Valor SGR	% Valor SGR[14]	Valor total	% Valor total[14]

[14]El % Valor SGR corresponde a la relación entre la suma del valor SGR de los proyectos críticos y la suma del valor SGR de los proyectos sin cerrar de la entidad.
[14]El % Valor Total corresponde a la relación entre la suma del valor total de los proyectos críticos y la suma del valor total de los proyectos sin cerrar de la entidad.

Fuente: Gesproy-SGR y Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

11.2 Evaluación a proyectos del SGR

#	BPIN	Nombre	Sector	Valor total ejecutado	Planeación	Ejecución	Eficacia y Efectos	Operación y Sostenibilidad	Participación	ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN[15]

[15]El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a ""Techo Alto""; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a ""Techo Alto"" y mayor o igual a ""Promedio""; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que ""promedio"" y mayor o igual que ""Techo Bajo"" o 4. Insuficiente(Rojo), Si Resultado es menor que ""Techo Bajo"".
Donde:
- Promedio. Es el promedio de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
- DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
- Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
- Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR - SSEC y Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP/ https://www.sgr.gov.co/SMSCE/Evaluaci%C3%B3nSGR.aspx

11.3 Control Social a proyectos del SGR

No data to display

Proyectos con Auditoría Visible

BPIN	Proyecto

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP

12. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SSEC

12.1. Medidas Vigentes

						TOTAL MEDIDAS VIGENTES	0
No. PAP	BPIN	Causal	Descripción	No. Resolución	Fecha	Estado	Valor Retenido en MHCP

Fuente: SSEC - Módulo de control,Subdirección de Control SdC - DVR - DNP
Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dnp.gov.co

12.2. Procedimientos Correctivos y Sancionatorios – PACS

			TOTAL PACS	0
No.	BPIN	Causal	Estado	

Fuente: SSEC - Módulo de control,Subdirección de Control SdC - DVR - DNP
Fecha de corte:
Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dnp.gov.co

13. OTROS RECURSOS ANTERIOR SISTEMA DE REGALÍAS (CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro	Con recursos retenidos en Agencias

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
Fecha de corte: -
Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP.

14. DATOS DE CONTACTO

Región	Consultor asignado	Email consultor	Líder oficina regional	Email líder oficina regional	Teléfono oficina regional	Dirección	Enlace gestión sedes	Correo	Extensión

ANEXO N1. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR

			TOTAL USUARIOS	1	
No.	Nombre USUARIO	Aplicativo	Perfil	Vigencia del usuario	
				desde	hasta
1	MATINEZ ROMERO CRISTIAN ANDRES	CUENTAS ENTIDAD; GESPROY - SGR; GESPROY - SGR	ELABORA Y REVISA; REPRESENTANTE LEGAL; REPRESENTANTE LEGAL	13/11/2025	31/12/2026

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte: 27/04/2026
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

Departamento Nacional de Planeación - DNP

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
REPORTE PROYECTOS POR OCAD

Entidad:**ANTIOQUIA**

NOMBRE OCAD	BPIN	TIPO OCAD	ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	LOCALIZACION	SECTOR	PLAZO	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	FUENTES SUIFP	FUENTES NO SUIFP	ESTADO
SAN JUAN DE URABA	2025056590001	MUNICIPALES	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO D	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Construcción De Pavimento Rígido En La Vía Acceso En El Corregimiento De Uveros Municipio De San Juan De Urabá Antioquia		TRANSPORTE	4,94 Meses	3,076,869,741.00	3,076,869,741.00	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 3,076,869,741.00		CONTRATADO EN EJECUCIÓN
SUBTOTAL	**1.00**								**3,076869741E9**	**3,076869741E9**			
TOTAL	**1.00**								**3,076869741E9**	**3,076869741E9**			
