

ID	Task Mode	Nombre de la actividad	Costo	Duracion	Inicio	Fin
1		**Yarumito**	**$7.696.559.777,00**	**163 days**	**Mon 3/08/26**	**Fri 2/04/27**
2		Incio de Obra	$0,00	0 days	Mon 3/08/26	Mon 3/08/26
3		**PRELIMINARES**	**$111.070.898,00**	**30 days**	**Tue 4/08/26**	**Wed 16/09/26**
4		**REPLANTEO**	**$39.304.182,00**	**30 days**	**Tue 4/08/26**	**Wed 16/09/26**
5		Localizacion, trazado y replanteo	$39.304.182,00	30 days	Tue 4/08/26	Wed 16/09/26
6		**INSTALACIONES PROVISIONALES**	**$71.766.716,00**	**15 days**	**Tue 25/08/26**	**Mon 14/09/26**
7		Cerramiento provisional en tela verde sarán	$43.366.776,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26
8		Cerramiento provisional conformado por estacones de madera	$28.399.940,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26
9		**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**$39.605.552,00**	**20 days**	**Tue 25/08/26**	**Mon 21/09/26**
10		**DEMOLICIONES**	**$31.815.715,00**	**20 days**	**Tue 25/08/26**	**Mon 21/09/26**
11		Demolición de cordones en concreto	$1.387.251,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26
12		Demolición de pavimentos, andenes y cordones en concreto	$20.000.737,00	20 days	Tue 25/08/26	Mon 21/09/26
13		Demolición de pavimento asfáltico	$8.651.791,00	20 days	Tue 25/08/26	Mon 21/09/26
14		Demolición de estructuras en concreto manual o mecánicamente	$1.775.936,00	15 days	Tue 1/09/26	Mon 21/09/26
15		**RETIROS**	**$7.789.837,00**	**15 days**	**Tue 25/08/26**	**Mon 14/09/26**
16		Retiro de basurera plástica adosada a poste	$107.421,00	2 days	Tue 25/08/26	Wed 26/08/26
17		Desmonte de señales verticales existentes	$413.922,00	2 days	Thu 27/08/26	Fri 28/08/26
18		Tala, carga y retiro se árboles bajo cualquier condición	$7.268.494,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26
19		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**$567.844.643,00**	**65 days**	**Tue 29/09/26**	**Tue 5/01/27**
20		**EXCAVACIÓN**	**$567.844.643,00**	**65 days**	**Tue 29/09/26**	**Tue 5/01/27**
21		Excavación mecánica de material heterogéneo de 0.0 a 2.0 m	$327.080.730,00	60 days	Tue 29/09/26	Mon 28/12/26
22		Excavación manual de material heterogéneo	$91.322.071,00	45 days	Wed 21/10/26	Mon 28/12/26
23		Excavación manual para pilotes en material heterogéneo de altura hasta 1.80 m	$18.619.944,00	35 days	Thu 5/11/26	Mon 28/12/26
24		Excavación en roca de suelo macizo rocoso y bloque de roca con cemento demoledor	$60.730.273,00	35 days	Thu 5/11/26	Mon 28/12/26
25		Excavación en roca con cuña hidráulica	$64.881.317,00	35 days	Thu 5/11/26	Mon 28/12/26
26		Cargue manual o mecánico, transporte y botada del material de material proveniente de las explanaciones	$5.210.308,00	5 days	Tue 29/12/26	Tue 5/01/27
27		**ANDENES**	**$574.578.682,00**	**50 days**	**Tue 29/12/26**	**Wed 10/03/27**
28		Base granular	$82.621.155,00	20 days	Tue 29/12/26	Wed 27/01/27
29		Llenos con arenilla compactada	$85.450.773,00	20 days	Tue 29/12/26	Wed 27/01/27
30		Andén corrido en concreto	$302.105.369,00	15 days	Thu 28/01/27	Wed 17/02/27
31		Escalas en concreto	$10.440.828,00	25 days	Thu 28/01/27	Wed 3/03/27
32		Rampa en concreto	$58.756.885,00	25 days	Thu 4/02/27	Wed 10/03/27
33		Piso en Tablequín	$35.203.672,00	20 days	Thu 11/02/27	Wed 10/03/27
34		**VIAS**	**$865.552.194,00**	**65 days**	**Mon 14/12/26**	**Wed 17/03/27**
35		Base granular	$164.908.518,00	35 days	Mon 21/12/26	Wed 10/02/27
36		Subbase granular (SBG)	$176.446.351,00	35 days	Mon 14/12/26	Wed 3/02/27
37		Riego de imprimación con emulsión asfáltica	$81.824.777,00	15 days	Thu 4/02/27	Wed 24/02/27
38		Instalacion Geotextil Tejido T 2400	$24.549.556,00	15 days	Thu 4/02/27	Wed 24/02/27
39		Mezcla asfáltica aditivada	$324.739.329,00	15 days	Thu 25/02/27	Wed 17/03/27
40		Mezcla densa en caliente	$93.083.663,00	15 days	Thu 25/02/27	Wed 17/03/27
41		**OBRAS HIDRAULICAS**	**$1.943.439.096,00**	**105 days**	**Tue 25/08/26**	**Wed 27/01/27**
42		**PRELIMINARES**	**$19.652.091,00**	**15 days**	**Tue 25/08/26**	**Mon 14/09/26**
43		Localización, trazado y replanteo.	$19.652.091,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26
44		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**$5.422.254,00**	**15 days**	**Tue 25/08/26**	**Mon 14/09/26**
45		Demolición de pavimentos, andenes y cordones en concreto	$3.908.190,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26
46		Demolición de pavimento asfáltico	$1.514.064,00	15 days	Tue 25/08/26	Mon 14/09/26

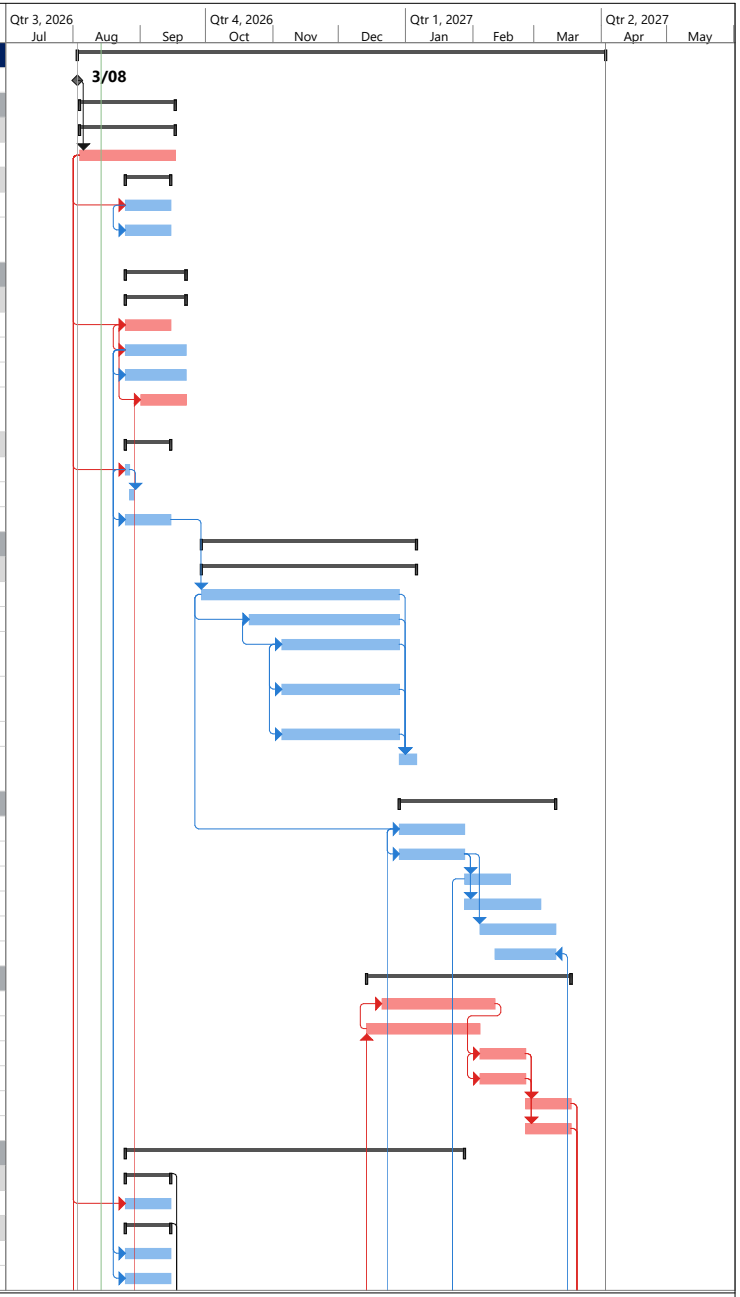

Project: Cronograma Via.mpp
Date: Fri 14/08/26

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
Manual Progress


ID	Task Mode	Nombre de la actividad	Costo	Duracion	Inicio	Fin
47		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**$820.673.391,00**	**40 days**	**Tue 15/09/26**	**Wed 11/11/26**
48		Excavación mecánica de material heterogéneo de 0.0 a 2.0 m	$206.470.719,00	20 days	Tue 15/09/26	Tue 13/10/26
49		Excavación mecánica de material heterogéneo de 2.0 a 4.0 m	$113.431.700,00	25 days	Tue 22/09/26	Tue 27/10/26
50		Llenos con material seleccionado proveniente de las excavaciones	$38.040.112,00	25 days	Tue 29/09/26	Wed 4/11/26
51		Llenos con arenilla compactada	$187.605.065,00	30 days	Tue 29/09/26	Wed 11/11/26
52		Base granular de máximo Ø 1½	$88.892.450,00	25 days	Tue 6/10/26	Wed 11/11/26
53		Subbase granular (SBG) de máximo Ø 1½	$86.623.149,00	25 days	Tue 6/10/26	Wed 11/11/26
54		Base estabilizada con cemento	$7.381.843,00	25 days	Tue 6/10/26	Wed 11/11/26
55		Instalacion de material granular limpio para camas de triturado	$38.725.095,00	5 days	Tue 22/09/26	Mon 28/09/26
56		Cargue manual o mecánico, transporte y botada del material de material proveniente de las explanaciones	$2.245.822,00	35 days	Tue 22/09/26	Wed 11/11/26
57		Entibado Temporal	$31.938.563,00	35 days	Tue 15/09/26	Wed 4/11/26
58		Entibado Permanente	$19.318.873,00	35 days	Tue 15/09/26	Wed 4/11/26
59		**RED DE ABASTOS**	**$54.327.248,00**	**15 days**	**Thu 5/11/26**	**Thu 26/11/26**
60		Instalacion red de abastos y accesorios	$54.327.248,00	15 days	Thu 5/11/26	Thu 26/11/26
61		**RED DE AGUAS RESIDUALES**	**$1.043.364.112,00**	**60 days**	**Wed 28/10/26**	**Wed 27/01/27**
62		Instalacion Tuberia Novafort	$766.378.849,00	30 days	Wed 28/10/26	Fri 11/12/26
63		Instalacion de MHs	$194.829.138,00	20 days	Mon 14/12/26	Wed 13/01/27
64		Sumidero tipo B	$6.305.168,00	15 days	Tue 29/12/26	Wed 20/01/27
65		Sumidero de captación lateral	$26.956.716,00	20 days	Tue 29/12/26	Wed 27/01/27
66		Cajas de inspeccion	$48.894.241,00	20 days	Tue 29/12/26	Wed 27/01/27
67		**CORDONES Y TABLETAS**	**$688.443.102,00**	**50 days**	**Tue 29/12/26**	**Wed 10/03/27**
68		Instalaciones de cordones prefabricados	$377.939.888,00	50 days	Tue 29/12/26	Wed 10/03/27
69		Instalacion adoquin tactil o alerta	$140.018.882,00	30 days	Thu 28/01/27	Wed 10/03/27
70		Vaciado de cañuela en concreto	$89.603.966,00	30 days	Wed 6/01/27	Wed 17/02/27
71		Cordones en concreto	$80.880.366,00	25 days	Thu 4/02/27	Wed 10/03/27
72		**CONCRETOS Y ACEROS**	**$1.552.081.690,00**	**75 days**	**Fri 4/12/26**	**Mon 29/03/27**
73		Acero de refuerzo y mallas	$403.236.287,00	40 days	Thu 21/01/27	Wed 17/03/27
74		Micro Pilotes	$46.374.285,00	15 days	Fri 4/12/26	Mon 28/12/26
75		Solados	$23.966.881,00	20 days	Fri 4/12/26	Tue 5/01/27
76		Vigas de fundacion y zapatas	$292.530.600,00	35 days	Tue 29/12/26	Wed 17/02/27
77		Muro cordon o bordillo	$39.021.145,00	20 days	Thu 11/02/27	Wed 10/03/27
78		Vastagos muro de contencion	$364.369.118,00	35 days	Wed 6/01/27	Wed 24/02/27
79		Recintes en fundaciones de vivienda	$48.310.570,00	20 days	Tue 29/12/26	Wed 27/01/27
80		Andenes y placas de concreto	$21.066.879,00	15 days	Thu 25/02/27	Wed 17/03/27
81		Losa Banca	$11.681.420,00	15 days	Thu 4/03/27	Mon 29/03/27
82		Pasamanos	$197.930.902,00	15 days	Thu 4/03/27	Mon 29/03/27
83		Filtros	$103.593.603,00	20 days	Thu 11/02/27	Wed 10/03/27
84		**SEÑALIZACION VIAL**	**$126.615.865,00**	**9 days**	**Thu 18/03/27**	**Fri 2/04/27**
85		**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**	**$99.427.134,00**	**9 days**	**Thu 18/03/27**	**Fri 2/04/27**
86		Líneas de demarcación vial	$21.769.510,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
87		Marcas viales con pintura plástico en frio	$57.715.542,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
88		Demarcación guía táctil en la vía con plástico en frio	$19.942.082,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
89		**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**$27.188.731,00**	**9 days**	**Thu 18/03/27**	**Fri 2/04/27**
90		Instalacion de señalizacion vertical	$27.188.731,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
91		**MOBILIARIO**	**$62.175.868,00**	**9 days**	**Thu 18/03/27**	**Fri 2/04/27**
92		Baurera cilindrica pivotante	$15.728.642,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
93		Bolardos vaciados	$22.154.428,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
94		Juago infantil en madera	$8.280.284,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27

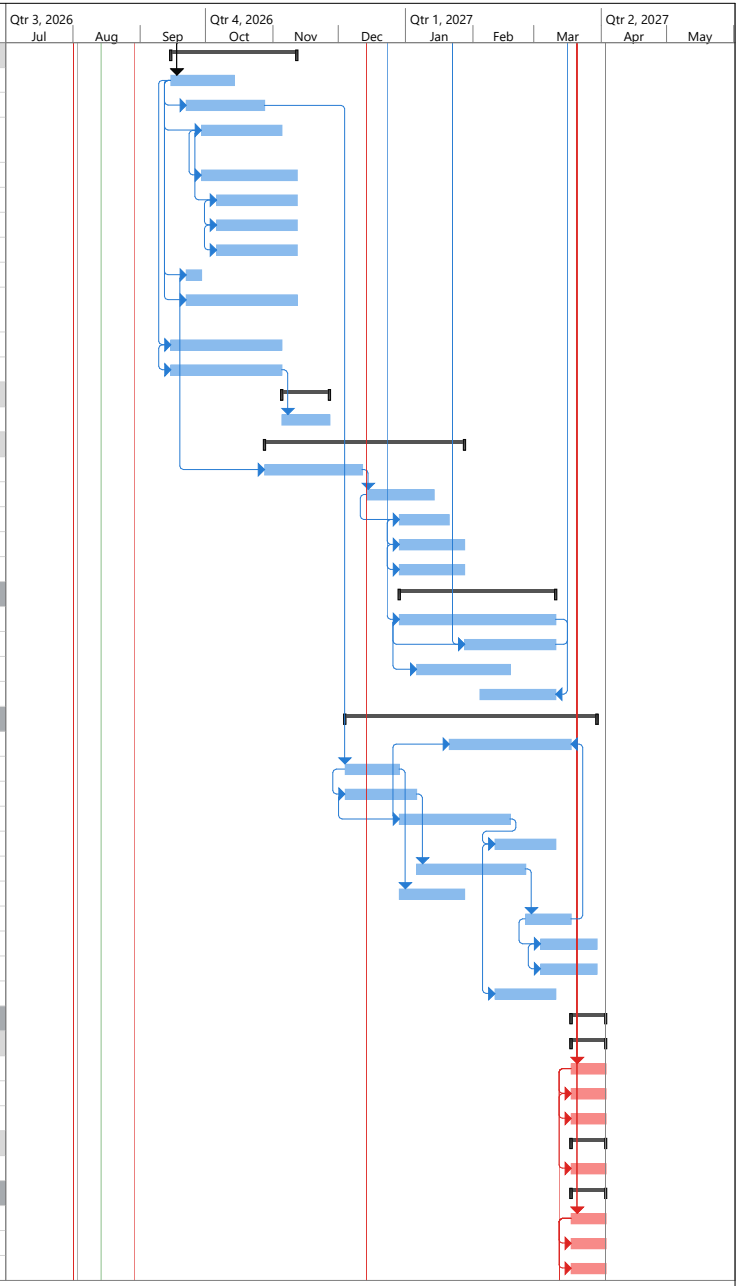

Project: Cronograma Via.mpp
Date: Fri 14/08/26

Task | Split | Milestone | Summary
Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary
Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary
Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone
Deadline | Critical | Critical Split | Progress
Manual Progress


ID	Task Mode	Nombre de la actividad	Costo	Duracion	Inicio	Fin
95		Modulos de columpios	$3.353.674,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
96		Deslizadero en fibra de vidrio	$3.491.968,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
97		Juegos en estructura metalica	$9.166.872,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
98		**SILVICULTURA**	**$48.235.162,00**	**9 days**	**Thu 18/03/27**	**Fri 2/04/27**
99		Especies nativas para cercos vivos	$6.472.009,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
100		Grama macana	$14.255.433,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
101		Jardines con especies ornamentales	$27.507.720,00	9 days	Thu 18/03/27	Fri 2/04/27
102		**ELECTRICO**	**$1.116.917.025,00**	**112 days**	**Tue 15/09/26**	**Fri 26/02/27**
103		**MOVIMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN**	**$389.901.108,00**	**75 days**	**Tue 15/09/26**	**Tue 5/01/27**
104		Instalacion de postes en fibra	$72.236.036,00	15 days	Tue 15/09/26	Mon 5/10/26
105		Traslado de acometida en cable concentrico	$48.585.162,00	20 days	Tue 22/09/26	Tue 20/10/26
106		Instalacion cable concentrico	$37.974.391,00	20 days	Tue 22/09/26	Tue 20/10/26
107		Traslado de cable triplex	$29.271.536,00	25 days	Tue 22/09/26	Tue 27/10/26
108		Traslado linea monofasica	$5.026.022,00	25 days	Tue 22/09/26	Tue 27/10/26
109		Traslado de red trifasica	$3.670.274,00	25 days	Tue 22/09/26	Tue 27/10/26
110		Traslado de transformador monofasico	$11.456.925,00	20 days	Tue 6/10/26	Wed 4/11/26
111		Linea secundaria en triplex	$4.315.695,00	20 days	Tue 29/09/26	Tue 27/10/26
112		Instalación de cable compacto red trifásica	$7.580.121,00	20 days	Tue 29/09/26	Tue 27/10/26
113		Instalación de línea monofásica	$6.684.029,00	20 days	Tue 29/09/26	Tue 27/10/26
114		Suminitro e instalación de norma	$71.015.853,00	30 days	Fri 20/11/26	Tue 5/01/27
115		Retiro de luminaria de alumbrado público	$1.413.552,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
116		Retiro de poste	$16.453.787,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
117		Retiro de vestida trifásica	$309.690,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
118		Retiro de vestida monofásica	$4.547.308,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
119		Retiro de vestida secundaria	$2.055.901,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
120		Retiro de viento	$1.798.834,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
121		Retiro de línea secundaria triplex	$2.386.228,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
122		Retiro de cable compacto red trifásica	$40.880,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
123		Retiro de caja portabornera	$243.673,00	10 days	Tue 15/09/26	Mon 28/09/26
124		Suministro e instalación de crucetas	$4.735.714,00	10 days	Tue 29/09/26	Tue 13/10/26
125		Suminitro e instalación de bajante	$805.573,00	10 days	Wed 14/10/26	Tue 27/10/26
126		Suministro e instalación de cable super GX 1/4	$1.565.644,00	10 days	Wed 14/10/26	Tue 27/10/26
127		Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12AWG para luminarias de AP	$4.941.619,00	10 days	Wed 28/10/26	Wed 11/11/26
128		Traslado de cables de telecomunicaciones, fibras, coaxiales, tubería galvanizada y multipares.	$24.328.178,00	15 days	Wed 28/10/26	Thu 19/11/26
129		Actualización y/o ajustes a planos de redes incluye trámites para sellos	$6.614.621,00	45 days	Tue 15/09/26	Thu 19/11/26
130		Trámites para el traslado y coordinación de movimiento de sistema de telecomunicaciones ante los operadores	$19.843.862,00	45 days	Tue 15/09/26	Thu 19/11/26
131		**TELECOMUNICACIONES**	**$186.947.223,00**	**30 days**	**Wed 14/10/26**	**Thu 26/11/26**
132		Tuberia	$49.918.266,00	19 days	Wed 14/10/26	Tue 10/11/26
133		Caja	$42.647.634,00	18 days	Wed 14/10/26	Mon 9/11/26
134		Canalización subterránea	$94.381.323,00	30 days	Wed 14/10/26	Thu 26/11/26
135		**ALUMBRADO PÚBLICO**	**$456.818.026,00**	**93 days**	**Tue 15/09/26**	**Mon 1/02/27**
136		Poste en fibra de vidrio	$51.608.246,00	14 days	Fri 27/11/26	Thu 17/12/26
137		Luminarias	$83.941.939,00	18 days	Wed 6/01/27	Mon 1/02/27
138		Tablero de medida	$6.958.056,00	15 days	Fri 11/12/26	Mon 4/01/27
139		Transformador monofasico	$35.956.621,00	15 days	Fri 4/12/26	Mon 28/12/26
140		Vestida de poste	$9.924.872,00	15 days	Mon 14/12/26	Tue 5/01/27

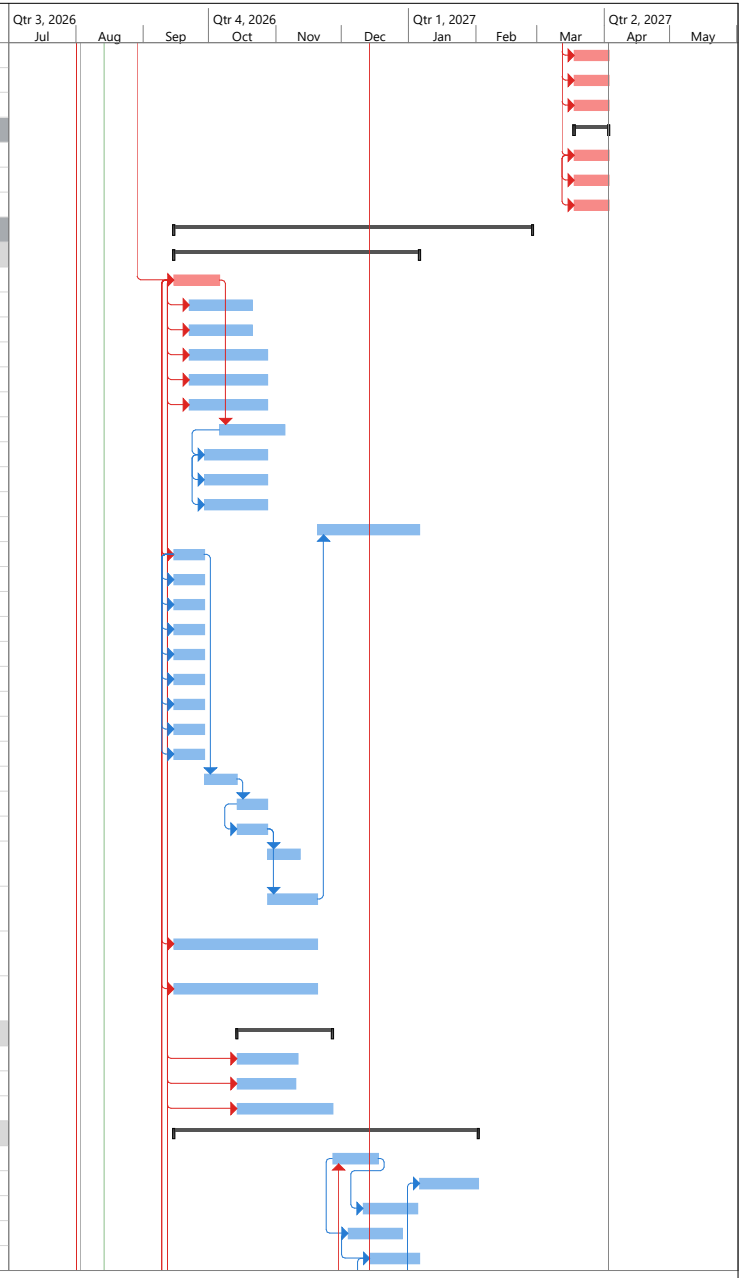

Project: Cronograma Via.mpp
Date: Fri 14/08/26

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
Manual Progress

ID	Task Mode	Nombre de la actividad	Costo	Duracion	Inicio	Fin
141		Tuberia para bajante de transformador	$2.416.720,00	15 days	Mon 14/12/26	Tue 5/01/27
142		Trenza cuadruplex	$84.850.012,00	20 days	Mon 14/12/26	Wed 13/01/27
143		Cable de cobre encauchetado 3x12AWG	$15.541.673,00	15 days	Wed 6/01/27	Wed 27/01/27
144		Tubería PVC tipo DB 2 de 2.	$49.918.266,00	20 days	Tue 15/09/26	Tue 13/10/26
145		Caja de piso Antifraude	$21.320.298,00	20 days	Tue 15/09/26	Tue 13/10/26
146		Canalización subterránea	$94.381.323,00	30 days	Wed 14/10/26	Thu 26/11/26
147		**TRAMITES Y LEGALIZACIONES**	**$83.250.668,00**	**40 days**	**Thu 31/12/26**	**Fri 26/02/27**
148		Trámites para el traslado y coordinación de movimiento de sistema de energía	$9.572.414,00	30 days	Thu 31/12/26	Fri 12/02/27
149		Trámites de alumbrado público ante el municipio y/o EPM para la entrega del proyecto funcional	$9.572.414,00	40 days	Thu 31/12/26	Fri 26/02/27
150		Certificado RETIE de instalaciones nuevas.	$18.568.563,00	25 days	Wed 6/01/27	Wed 10/02/27
151		Certificado RETILAP de alumbrado público.	$11.141.250,00	25 days	Wed 6/01/27	Wed 10/02/27
152		Provisión para la elaboración, ajuste, revisión y complementación de diseños eléctricos de detalle	$34.396.027,00	10 days	Thu 31/12/26	Fri 15/01/27

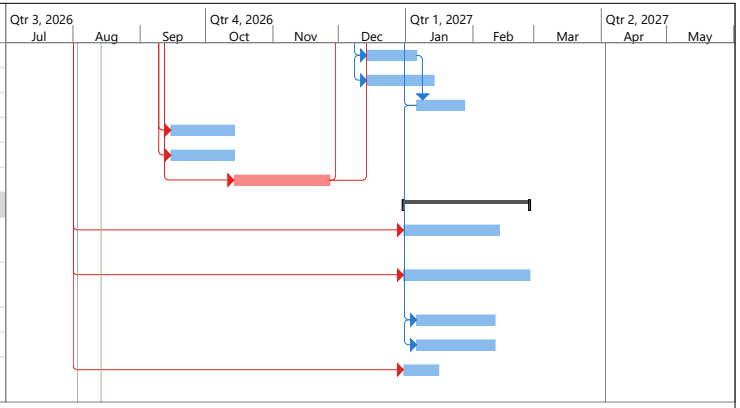

Project: Cronograma Via.mpp
Date: Fri 14/08/26

Task | Split | Milestone | Summary
Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary
Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary
Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone
Deadline | Critical | Critical Split | Progress
Manual Progress
