
Emergencia Colegio Tom Adams



Pendientado de placa.



Pendientado de placa.

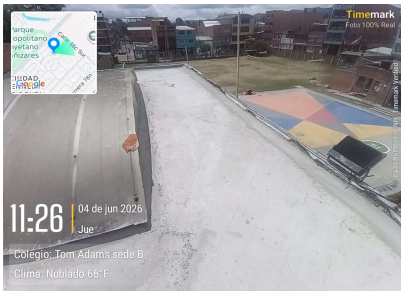


Pendientado de placa.




Pendientado de placa.


San Carlos

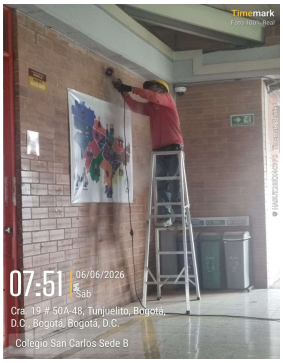


Corte de muro.

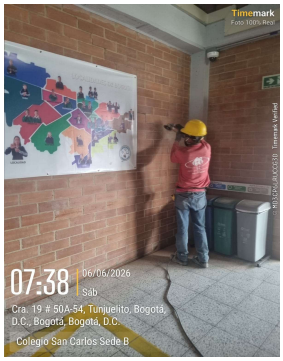

Corte de muro.

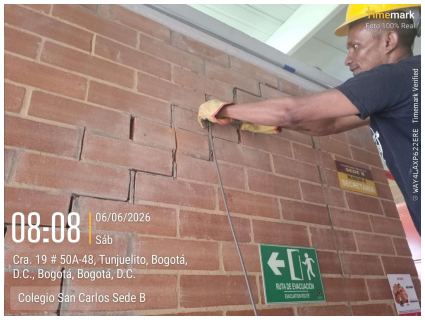

Corte de muro.

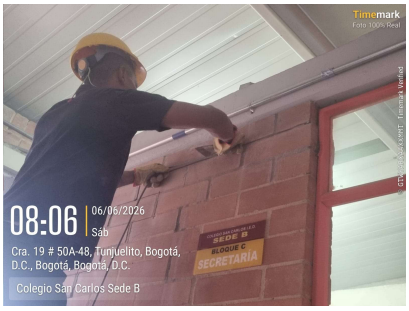

Corte de muro.

FECHA: 13/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 45 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
14 de junio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026
MODIFICACIÓN	29 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	29 de septiembre de 2026	29 de julio de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES	16	16
PRÓRROGAS	123	61
ADICIÓN	0	0
TOTAL	350	288

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
ADICIÓN #1	$ 83.867.649,00	$ -
ADICIÓN #2	$ 184.210.953,00	$ -
TOTAL	$ 1.064.357.530,00	$ 2.497.896.864,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-40-101075759	14 10 2025	14 5 ###

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	78,99%	100,00%	99,51%		$ 351.783.320,20	$ 351.783.320	3/12/2025	4/04/2026																			
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	63,20%	90,78%	92,94%		$ 114.342.419,78	$ 103.802.130	3/12/2025	4/05/2026																			
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José María Cordoba	100,00%	100,00%	100,00%		$ 353.607.262,42	$ 353.607.262	4/11/2025	4/03/2026																			
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	60,02%	79,33%	92,50%		$ 277.106.807,00	$ 219.839.534	13/01/2026	13/04/2026																			
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	88,68%	88,55%	91,40%		$ 220.305.772,01	$ 217.103.948	4/11/2025	4/04/2026																			
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	48,88%	95,60%	92,86%		$ 272.831.623,66	$ 260.825.208	13/01/2026	13/05/2026																			
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	90,89%	100,00%	90,91%		$ 153.725.546,14	$ 153.725.546	13/01/2026	13/04/2026																			
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,56%	1,18%	0,56%		$ 248.315.879,08	$ 2.937.710	16/12/2025	15/04/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						83,18%	82,59%		$ 1.992.018.630	$ 1.663.624.659																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	100,00%	100,00%	100,00%		$ 66.518.828	$ 66.518.828	5/12/2025	23/12/2025																			
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	98,62%	100,00%	100,00%		$ 40.447.661	$ 40.446.944	5/12/2025	21/12/2025																			
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa Maria Gordillo	100,00%	100,00%	100,00%		$ 4.409.208	$ 4.409.209																					
884	CODEMA	Kennedy	A	Dario Echandia - CODEMA	100,00%	100,00%	100,00%		$ 45.922.593	$ 45.922.593	18/03/2026	30/12/2026																			
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100,00%	100,00%	100,00%		$ 17.760.045	$ 17.760.045	12/12/20205	30/12/2025																			
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																			
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100,00%	100,00%	100%		$ 27.305.453	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						100,00%	100,00%		$ 205.063.881	$ 205.063.164																					

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	6	0	8	$ 1.663.624.659
ACUMULADO EMERGENCIAS				
3	4	0	7	$ 205.063.164
TOTAL				
5	10	0	15	$ 1.868.687.823
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	83,18%	#¡DIV/0!	84,38%
PROGRAMADO	82,59%		
ATRASO	0,60%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO

















AVANCE DE LOS FRENTES

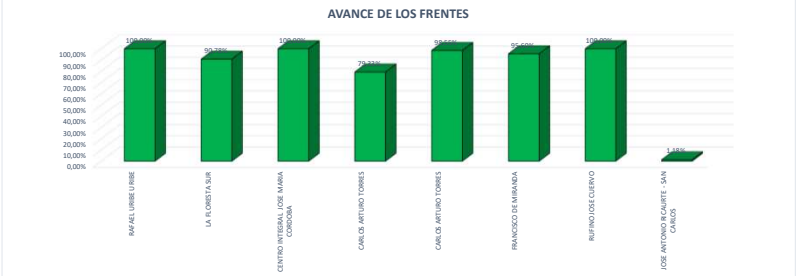

OBSERVACIONES:

FECHA:	13/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	45	Días				
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO 8	0
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA		
14/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Finalizada				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Finalizada				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Finalizada				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de instalación de reja metalica tipo persiana en cuarto debombas.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades de emboquillado de psisos, retiro de escombros, instlacion de iluminacion y cielo raso.				

Colegio La floresta	CANCHA	Actividades excavacion manual				
San Carlos	TERRAZA	Corte de muro				
Tom Adams	TERRAZA	Alistado de pendientado				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | VIGENCIA 2025.00

GRUPOS | ITEM | CPF 612 | IED RAFAEL URIBE URIBE | SEMANA

ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y	M2	436,08	436,08		$ 3.395,00	$ 1.480.491,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	98,39	98,39		$ 79.342,00	$ 7.806.459,38	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,60	66,6		$ 72.193,00	$ 4.808.053,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.510,53	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE	UN	3,00	3		$ 11.566,00	$ 34.698,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	96,00	96		$ 4.244,00	$ 407.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	23,09		$ 18.852,00	$ 435.292,68	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,59	61,59		$ 21.852,00	$ 1.345.864,68	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,38	8,3838		$ 30.684,00	$ 257.248,52	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	43,12	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8,91	8,91		$ 96.108,00	$ 856.322,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,92	4,92		$ 130.850,00	$ 643.782,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	250,38	250,38		$ 83.544,00	$ 20.917.746,72	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,92	4,92		$ 22.675,00	$ 111.561,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,33	2,33		$ 174.968,00	$ 407.675,44	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	121,46	121,464		$ 183.945,00	$ 22.342.695,48	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	121,46	121,46		$ 173.913,00	$ 21.123.472,98	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	5,38	5,38		$ 202.686,00	$ 1.090.450,68	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	31,20	31,20		$ 111.395,00	$ 3.475.524,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	148,99	148,99		$ 160.361,00	$ 23.892.185,39	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	22,96	22,96		$ 28.402,00	$ 652.109,92	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM	M	43,12	43,12		$ 334.957,00	$ 14.443.345,84	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2169,77	2169,77		$ 7.012,00	$ 15.214.427,24	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1435,45	1435,45		$ 7.421,00	$ 10.652.474,45	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	15,00	15		$ 88.516,00	$ 1.327.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	404,88	404,88		$ 12.255,00	$ 4.961.804,40	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R. CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	UN	1,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 22.533,00	$ 610.644,30	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG	UN	8,00	8,00		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	8,00	8,00		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	8,00	8		$ 62.384,00	$ 499.072,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE	M	96,00	96,00		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	255,89	255,89		$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	244,25	244,25		$ 35.908,00	$ 8.770.529,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	107,00	107		$ 498.089,00	$ 53.295.523,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	78,53	78,53		$ 19.187,00	$ 1.506.755,11	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,38	8,3838		$ 965.200,00	$ 8.092.043,76	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	21,56	21,56		$ 66.398,00	$ 1.431.540,88	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	73,81	73,81		$ 39.822,00	$ 2.939.261,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70,88	70,88		$ 23.852,00	$ 1.690.629,76	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	408,44		$ 4.508,00	$ 1.841.247,52	$ (0,00)	100,00%	100,00%	

CPF 829 | IED LA FLORESTA SUR | SEMANA

ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico	M	120,00	120,00		$ 30.066,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,30	1,30		$ 72.193,00	$ 93.562,13	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53	21,53		$ 28.405,00	$ 611.559,65	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,50	7,50		$ 16.333,00	$ 122.497,50	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,24	3,24		$ 96.108,00	$ 311.389,92	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	7,00	7,00		$ 55.969,00	$ 391.783,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,26	0,26		$ 22.675,00	$ 5.877,36	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1,30	1,30		$ 160.361,00	$ 207.827,86	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	42,70	42,70		$ 164.023,00	$ 7.003.782,10	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	960,00	960,00		$ 9.705,00	$ 9.316.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,00	2,00		$ 150.033,00	$ 300.066,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1,00		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	655,00		$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	220,94	220,94		$ 19.187,00	$ 4.239.175,78	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	23,52	23,52		$ 761.157,00	$ 17.902.412,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	21,53		$ 464.504,00	$ 10.000.771,12	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,20	4,20		$ 945.575,00	$ 3.971.415,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	0		$ 129.084,00	$ -	$ 1.351.509,48	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	0,00		$ 240.910,00	$ -	$ 2.442.827,40	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	655,00	655,00		$ 4.508,00	$ 2.952.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00	0		$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%	PT APROBAR

CPF 601 | IED Jose Maria Cordoba | SEMANA

ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico	M	40,11	40,11		$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$ 286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,72	32,72		$ 29.984,00	$ 981.076,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	40,27		$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$ 21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163,40	163,40		$ 10.995,00	$ 1.796.583,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	108,04		$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$ 32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28,00		$ 26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,70		$ 31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7,00		$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$ 7.219,00	$ 43.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,10	16,10		$ 4.244,00	$ 68.328,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4,00		$ 385.556,00	$ 1.542.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$ 23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,50		$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18,00		$ 14.178,00	$ 255.204,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS. SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	423,36	423,36		$ 147.193,00	$ 62.315.628,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30,00	30,00		$ 11.033,00	$ 330.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7,00		$ 36.280,00	$ 253.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22,58	22,58		$ 16.333,00	$ 368.799,14	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	71,30	71,30		$ 164.023,00	$ 11.694.839,90	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	0,76		$ 70.230,00	$ 53.374,80	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529,54	529,54		$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	529,58		$ 27.238,00	$ 14.424.700,04	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1,00		$ 25.481,00	$ 25.481,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	6,00		$ 14.486,00	$ 86.916,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6,00		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	18,00		$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	61,96		$ 13.297,00	$ 823.882,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	1,00		$ 61.772,00	$ 61.772,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	405,00		$ 5.814,00	$ 2.354.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	17,30		$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6,00		$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6,00		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	72,45	72,45		$ 41.218,00	$ 2.986.244,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61,65	61,65		$ 203.467,00	$ 12.543.740,55	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55,34	55,34		$ 83.512,00	$ 4.621.554,08	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,80	40,80		$ 14.858,00	$ 606.206,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	21,52		$ 63.550,00	$ 1.367.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	670,38		$ 19.187,00	$ 12.862.581,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	26,75	26,75		$ 85.861,00	$ 2.296.781,75	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	102,64		$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28		$ 451.950,00	$ 578.496,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	6,32		$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6,00		$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	12,00		$ 391.028,00	$ 4.692.336,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3,00		$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	5,07		$ 956.124,00	$ 4.847.548,68	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	2,63		$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	13,65		$ 34.979,00	$ 477.463,35	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,7	798,7		$ 39.822,00	$ 31.805.831,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	37,88		$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	46,92	46,92		$ 12.106,00	$ 568.013,52	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,3	959,3		$ 23.852,00	$ 22.881.223,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	15,57		$ 12.606,00	$ 196.275,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	32,94		$ 12.568,00	$ 413.989,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	46,92	46,92		$ 20.875,00	$ 979.455,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	49,64		$ 33.461,00	$ 1.661.004,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1458,79	1458,79		$ 28.786,00	$ 41.992.728,94	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1301,37	1301,37		$ 20.749,00	$ 27.002.126,13	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M. (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	99,29	99,29		$ 17.148,00	$ 1.702.624,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	1247,97		$ 23.550,00	$ 29.389.693,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2,20	2,20		$ 28.987,00	$ 63.771,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	35,94		$ 8.860,00	$ 318.428,40	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5,19	5,19		$ 128.780,00	$ 668.368,20	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3,00		$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	359,00		$ 4.508,00	$ 1.618.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	6,00	6		$ 1.165.807,00	$ 6.994.842,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	57,00		$ 4.093,00	$ 233.301,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	27,85	27,85		$ 30.066,00	$ 837.338,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	24,70	24,7		$ 2.402,00	$ 59.329,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$ 286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,59	0,59		$ 244.462,00	$ 143.743,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8,00	8,00		$ 113.245,00	$ 905.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	29,73		$ 31.500,00	$ 936.495,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	7,14		$ 21.553,00	$ 153.888,42	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$ 10.995,00	$ 583.284,75	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$ 12.224,00	$ 648.483,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	37,71		$ 32.061,00	$ 1.209.020,31	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$ 161.707,00	$ 646.828,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	35,22		$ 35.518,00	$ 1.250.943,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$ 31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4		$ 7.219,00	$ 28.876,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 4.244,00	$ 84.880,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	65,00		$ 8.659,00	$ 562.835,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	9,00	9		$ 14.178,00	$ 127.602,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	4		$ 45.204,00	$ 180.816,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	9,86		$ 30.684,00	$ 302.544,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32,93	32,93		$ 18.061,00	$ 594.748,73	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20		$ 16.333,00	$ 326.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18,33	18,33		$ 12.288,00	$ 225.239,04	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,60	0,6		$ 96.108,00	$ 57.664,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,14	1,14		$ 174.968,00	$ 199.463,52	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0,43	0,43		$ 1.069.032,00	$ 459.683,76	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	110,60	110,60		$ 101.433,00	$ 11.218.489,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	5,70	5,70		$ 57.073,00	$ 325.316,10	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,60	11,60		$ 160.361,00	$ 1.860.187,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	5,18	5,18		$ 241.182,00	$ 1.250.287,49	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	822,31		$ 7.012,00	$ 5.766.037,72	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	35,08	35,07856		$ 7.421,00	$ 260.317,99	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	5,67	5,67		$ 76.084,00	$ 431.396,28	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,08	12,08		$ 49.410,00	$ 596.872,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3,00	3		$ 135.539,00	$ 406.617,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	32,93		$ 25.481,00	$ 839.089,33	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	116,4		$ 19.470,00	$ 2.266.308,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	63		$ 9.479,00	$ 597.177,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	11,00	11		$ 61.400,00	$ 675.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	9		$ 61.400,00	$ 552.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	12,00	12		$ 94.029,00	$ 1.128.348,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	1,00	1,00		$ 200.497,00	$ 200.497,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1,00	1,00		$ 206.989,00	$ 206.989,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	120,00		$ 5.814,00	$ 697.680,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	4		$ 122.646,00	$ 490.584,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	7,00	7		$ 62.384,00	$ 436.688,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29,72	29,72		$ 41.218,00	$ 1.224.998,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	1,42	1,4175		$ 39.550,00	$ 56.062,13	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49,43	49,43		$ 26.248,00	$ 1.297.438,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80,00	80		$ 498.089,00	$ 39.847.120,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	45,67	45,67		$ 14.858,00	$ 678.564,86	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	23,09		$ 132.061,00	$ 3.049.288,49	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	103,03	103,03		$ 94.926,00	$ 9.780.225,78	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	19,80	19,80		$ 761.157,00	$ 15.073.192,07	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	23,31	23,3055		$ 965.200,00	$ 22.494.468,60	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,80	4,8		$ 945.575,00	$ 4.538.760,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8		$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	3		$ 746.496,00	$ 2.239.488,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	9,00	9		$ 391.028,00	$ 3.519.252,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2		$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
8 10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3		$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	13,60	13,6		$ 945.896,00	$ 12.864.185,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,98	5,98		$ 956.124,00	$ 5.717.621,52	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,52	2,52		$ 1.033.647,00	$ 2.604.790,44	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,00	107		$ 34.979,00	$ 3.742.753,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	61,31	61,31		$ 36.386,00	$ 2.230.825,66	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	105,00	105,00		$ 23.852,00	$ 2.504.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	29,37	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	107,70	107,7		$ 26.828,00	$ 2.889.375,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 8.860,00	$ 177.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31,06	31,06		$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6,13	6,125		$ 128.780,00	$ 788.777,50	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15,81	15,81		$ 102.700,00	$ 1.623.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51,74	51,74		$ 129.084,00	$ 6.678.806,16	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	51,74	51,74		$ 240.910,00	$ 12.464.683,40	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	27,00		$ 18.402,00	$ 496.854,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	144,00		$ 4.508,00	$ 649.152,00	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CAPACIDAD DEL SISTEMA 200 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 71-91 PSI, INCLUYE BOMBAS, DEPOSITO, TABLERO, MANOMETROS, PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE PASO, VÁLVULAS DE CHEQUE, FLOTADOR, TUBERIA DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y DEPOSITO, FLAUTA DE DESCARGA EN 4" DE DIAMETRO, TUBERIA DE SUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 2" Y VALVULA DE PIE DE 2"	UN	1,00	0		$ 57.267.273,00	$ -	$ 57.267.273,00	0,00%	0,00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	7,00	7		$ 1.165.807,00	$ 8.160.649,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	803	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	21,00	21		$ 30.066,00	$ 631.386,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	114,72	114,72		$ 3.395,00	$ 389.474,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,14	49,14		$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89,33	89,33		$ 10.995,00	$ 982.183,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19,32	19,32		$ 155.716,00	$ 3.008.433,12	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	8,23		$ 32.061,00	$ 263.862,03	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	5,39		$ 28.405,00	$ 153.102,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	133,62		$ 35.518,00	$ 4.745.915,16	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,60	40,6		$ 31.476,00	$ 1.277.925,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19,00	19		$ 11.566,00	$ 219.754,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	34,00	34		$ 7.219,00	$ 245.446,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	39,00	39		$ 4.244,00	$ 165.516,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	76,91		$ 16.333,00	$ 1.256.171,03	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	1,25		$ 64.356,00	$ 80.445,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	49,30	49,3		$ 632.023,00	$ 31.158.733,90	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,13	2,13		$ 141.229,00	$ 300.817,77	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 122.646,00	$ 858.522,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	3,00	3		$ 163.229,00	$ 489.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2,00	2		$ 147.178,00	$ 294.356,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	9,00	9		$ 204.593,00	$ 1.841.337,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	78,40	78,4		$ 15.899,00	$ 1.246.481,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	25,00	25		$ 174.276,00	$ 4.356.900,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	33,00	33		$ 241.381,00	$ 7.965.573,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,68	1,68		$ 120.329,00	$ 202.152,72	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	241,50	220,00		$ 74.985,00	$ 16.496.700,00	$ 1.612.177,50	91,10%	91,10%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0,10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219,00	205		$ 19.187,00	$ 3.933.335,00	$ 268.618,00	93,61%	93,61%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45. INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	42,98	42,98		$ 121.988,00	$ 5.243.044,24	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76,91	76,91		$ 25.380,00	$ 1.951.975,80	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	8,23	8,23		$ 738.943,00	$ 6.081.500,89	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5,39	5,39		$ 560.257,00	$ 3.019.785,23	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	5,63	5,63		$ 66.398,00	$ 373.820,74	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202,78	202,78		$ 34.979,00	$ 7.093.041,62	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	96,38	96,38		$ 39.822,00	$ 3.838.044,36	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72,11	72,11		$ 12.106,00	$ 872.963,66	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54,74	54,74		$ 23.852,00	$ 1.305.658,48	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,80	4,8		$ 7.804,00	$ 37.459,20	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4,87	4,87		$ 16.631,00	$ 80.992,97	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	121,62	121,62		$ 28.786,00	$ 3.500.953,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,00	73		$ 8.860,00	$ 646.780,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,74	129,74		$ 125.971,00	$ 16.343.477,54	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,53	0,53		$ 128.780,00	$ 67.995,84	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79,48	79,48		$ 102.700,00	$ 8.162.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,25	18,71		$ 68.873,00	$ 1.288.613,83	$ 106.064,42	92,40%	92,40%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	64,00	64		$ 97.011,00	$ 6.208.704,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	133,62		$ 129.084,00	$ 17.248.204,08	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	71,30	71,3		$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	19,61	16,03		$ 187.010,00	$ 2.997.770,30	$ 669.495,80	81,74%	81,74%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310,00	189,00		$ 4.508,00	$ 852.012,00	$ 545.468,00	60,97%	60,97%	
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19,32	19,32		$ 1.480.308,00	$ 28.599.550,56	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	816	IED	FRANCISCO DE MIRANDA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico	M	33,20	28,2		$ 30.066,00	$ 847.861,20	$ 150.330,00	84,94%	84,94%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,23	106,23		$ 31.500,00	$ 3.346.245,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,40	64,4		$ 21.553,00	$ 1.388.013,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,52	36,52		$ 12.224,00	$ 446.420,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	14,59		$ 32.061,00	$ 467.769,99	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	7,57		$ 28.405,00	$ 215.025,85	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	2,5		$ 20.015,00	$ 50.037,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,48	32,48		$ 35.518,00	$ 1.153.624,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	73,75	73,75		$ 31.476,00	$ 2.321.355,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	51,25		$ 24.868,00	$ 1.274.485,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,00	13		$ 11.566,00	$ 150.358,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13,00	13		$ 7.219,00	$ 93.847,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33,00	33		$ 4.244,00	$ 140.052,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	9		$ 8.659,00	$ 77.931,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4,00	4		$ 14.178,00	$ 56.712,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	21,91	21,91		$ 55.590,00	$ 1.217.976,90	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	24,32	24,32		$ 101.433,00	$ 2.466.850,56	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM. (NO INCLUYE ACERO)	M	16,82	16,82		$ 57.073,00	$ 959.967,86	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	106,23	106,23		$ 111.395,00	$ 11.833.490,85	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	281,89	281,89		$ 7.012,00	$ 1.976.612,68	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	51,62	51,62		$ 63.196,00	$ 3.262.177,52	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4,90	4,9		$ 141.229,00	$ 692.022,10	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	28,44	28,44		$ 9.398,00	$ 267.279,12	$ -	100,00%	100,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1,20	1,2		$ 40.794,00	$ 48.952,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,39	12,39		$ 88.516,00	$ 1.096.713,24	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,26	4,26		$ 49.410,00	$ 210.486,60	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3", INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	4		$ 135.539,00	$ 542.156,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	14,93	14,93		$ 14.486,00	$ 216.275,98	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10,00	10		$ 4.830,00	$ 48.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5,00	5		$ 61.400,00	$ 307.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3,00	3		$ 61.400,00	$ 184.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	5,00	5		$ 175.735,00	$ 878.675,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7,00	7		$ 94.029,00	$ 658.203,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	5		$ 73.531,00	$ 367.655,00	$ 367.655,00	50,00%	50,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	1,00		$ 176.353,00	$ 176.353,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30,00	30,00		$ 5.814,00	$ 174.420,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	10		$ 122.646,00	$ 1.226.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	21,00	21		$ 204.593,00	$ 4.296.453,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2,00	2		$ 598.211,00	$ 1.196.422,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	5,00	5		$ 28.341,00	$ 141.705,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1,00	1		$ 32.478,00	$ 32.478,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	25,00	25		$ 22.533,00	$ 563.325,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	19,00	19		$ 35.210,00	$ 668.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	34,00	34		$ 16.790,00	$ 570.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	21,00	21		$ 174.276,00	$ 3.659.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5,00	5		$ 241.381,00	$ 1.206.905,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	16,00	16,00		$ 62.384,00	$ 998.144,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	21,00	21,00		$ 60.364,00	$ 1.267.644,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	102,28	102,28		$ 43.769,00	$ 4.476.693,32	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	25,99	25,99		$ 26.248,00	$ 682.185,52	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	61,00	61,00		$ 498.089,00	$ 30.383.429,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	8,60	8,6		$ 14.858,00	$ 127.778,80	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	924,00	924,00		$ 63.550,00	$ 58.720.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	101,22	85,72		$ 132.061,00	$ 11.320.268,92	$ 2.046.945,50	84,69%	84,69%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	363,00	363,00		$ 19.187,00	$ 6.964.881,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	84,87	84,87		$ 94.926,00	$ 8.056.369,62	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA. VISTO DOS CARAS. E= 12 CM	M2	47,25	47,25		$ 166.287,00	$ 7.857.060,75	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	14,93	14,93		$ 801.420,00	$ 11.965.200,60	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	6,00		$ 464.504,00	$ 2.787.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	3,00	3,00		$ 762.932,00	$ 2.288.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3,00	3,00		$ 391.028,00	$ 1.173.084,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2,00		$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4,00	4,00		$ 32.443,00	$ 129.772,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	23,25		$ 956.124,00	$ 22.229.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112,35	112,35		$ 34.979,00	$ 3.929.890,65	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,97	68,97		$ 12.106,00	$ 834.950,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A 60 CM	M	30,95	30,95		$ 9.831,00	$ 304.269,45	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4, DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	36,95		$ 36.386,00	$ 1.344.462,70	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	75,04	75,04		$ 23.852,00	$ 1.789.854,08	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	260,17	260,17		$ 20.875,00	$ 5.431.048,75	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,95	36,95		$ 16.631,00	$ 614.515,45	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,24	33,25		$ 125.971,00	$ 4.188.535,75	$ 4.407.725,29	48,73%	48,73%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	1,50	1,50		$ 128.780,00	$ 193.170,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,40	13,40		$ 102.700,00	$ 1.376.180,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,50	2,50		$ 68.873,00	$ 172.182,50	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,48	32		$ 129.084,00	$ 4.130.688,00	$ 61.960,32	98,52%	98,52%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	32,48	14		$ 240.910,00	$ 3.372.740,00	$ 4.452.016,80	43,10%	43,10%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	8		$ 40.429,00	$ 323.432,00	$ 161.716,00	66,67%	66,67%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	3		$ 187.010,00	$ 561.030,00	$ 243.113,00	69,77%	69,77%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,50	120,00		$ 4.508,00	$ 540.960,00	$ 114.954,00	82,47%	82,47%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5	5		$ 1.165.807,00	$ 5.829.035,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	617	IED	RUFINO JOSE CUERVO SEDE C			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	160,53		$ 3.395,00	$ 544.999,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	161,53	161,53		$ 79.342,00	$ 12.816.113,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3,00		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	161,70	161,7		$ 16.333,00	$ 2.641.046,10	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	64,21	64,21		$ 130.850,00	$ 8.401.878,50	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	64,21		$ 174.968,00	$ 11.234.695,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1,00	1		$ 160.361,00	$ 160.361,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	431,81	431,81		$ 7.421,00	$ 3.204.462,01	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	640,00	640,00		$ 9.705,00	$ 6.211.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	160,53	160,53		$ 131.783,00	$ 21.155.124,99	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	76,96	76,96		$ 498.089,00	$ 38.332.929,44	$ 0,00	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	288,69	288,69		$ 63.550,00	$ 18.346.249,50	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	330,22	330,22		$ 19.187,00	$ 6.335.931,14	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	243,77	243,77		$ 25.380,00	$ 6.186.882,60	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	3,82	3,82		$ 761.157,00	$ 2.907.619,74	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3,60	3,6		$ 945.575,00	$ 3.404.070,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,22	4,22		$ 68.873,00	$ 290.644,06	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M	28,35	28,35		$ 319.199,00	$ 9.049.291,65	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	288,69	288,69		$ 4.508,00	$ 1.301.414,52	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	609	IED	JOSE ANTONIO SAN CARLOS SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico	M	150,00	80		$ 30.066,00	$ 2.405.280,00	$ 2.104.620,00	53,33%	53,33%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00			$ 11.566,00	$ -	$ 92.528,00	0,00%	0,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30,00	10		$ 4.244,00	$ 42.440,00	$ 84.880,00	33,33%	33,33%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00			$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70,00	30		$ 16.333,00	$ 489.990,00	$ 653.320,00	42,86%	42,86%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53			$ 9.398,00	$ -	$ 164.746,94	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53			$ 27.238,00	$ -	$ 477.482,14	0,00%	0,00%	
4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	1,00			$ 894.074,00	$ -	$ 894.074,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00			$ 122.646,00	$ -	$ 981.168,00	0,00%	0,00%	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	8,00			$ 134.072,00	$ -	$ 1.072.576,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00			$ 4.508,00	$ -	$ 1.352.400,00	0,00%	0,00%	
NP 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRINCIPAL TIPO CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN IMPULSOR CERRADO EN FUNDICIÓN, POTENCIA 30 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFASICO (CALCULADA PARA OPERACIÓN SIMULTANEA DE DOS GABINETES)	UND	1,00			$ 37.324.920,00	$ -	$ 37.324.920,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA JOCKEY TIPO VERTICAL MULTIEMPATADA, IMPULSOR CERRADO, POTENCIA DE 10 HP, TENSIÓN 220 VOLTIO TRIFASICO.	UND	1,00			$ 20.895.349,00	$ -	$ 20.895.349,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 008	SUMINISTRO E INSTLACIÓN VALVULAS DE PIE 3"	UND	1,00			$ 1.299.086,00	$ -	$ 1.299.086,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 2"	UND	1,00			$ 603.695,00	$ -	$ 603.695,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 010	Suministro e instalacion Valvula de Compuerta HD 3" Vastago Ascendente Sello Metálico Gaer Icbk075	UND	1,00			$ 1.560.469,00	$ -	$ 1.560.469,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO CON COFRE METALICO NEMA 4, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL, ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO, 230 VOLTIOS ARRANQUE DIRECTO	UND	1,00			$ 20.438.942,00	$ -	$ 20.438.942,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4" SCH 40 RANURADA	ML	95,00			$ 872.101,00	$ -	$ 82.849.595,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/2" SCH 40 RANURADA	ML	140,00			$ 296.070,00	$ -	$ 41.449.800,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 4"	UND	20,00			$ 145.952,00	$ -	$ 2.919.040,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 3"	UND	6,00			$ 126.838,00	$ -	$ 761.028,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 1 1/2"	UND	90,00			$ 96.905,00	$ -	$ 8.721.450,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1 1/2" RANURADO	UND	70,00			$ 87.355,00	$ -	$ 6.114.850,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO RANURADO DE 1 1/2"	UND	6,00			$ 84.884,00	$ -	$ 509.304,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	70,00			$ 50.345,00	$ -	$ 3.524.150,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	100,00			$ 44.487,00	$ -	$ 4.448.700,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA DE 0.5 HP 120 V DESCARGA DE 3"	UND	1,00			$ 3.718.776,00	$ -	$ 3.718.776,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPE	699	SED	EMERGENCIA JACKELIN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,00	$ 450.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (15MH=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.634,00	$ 1.948.634,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	699	SED	EMERGENCIA OEA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M e 0.12 M Y GUARDACECOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,59	31,59		$ 31.500,00	$ 995.085,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,41	16,41		$ 10.995,00	$ 180.427,95	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	31,59	31,59		$ 127.792,00	$ 4.036.949,28	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	16,41	16,41		$ 136.965,00	$ 2.247.595,65	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	10,00	10,00		$ 6.814,00	$ 68.140,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	31,59	31,59		$ 43.768,00	$ 1.382.682,71	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRADOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31,59	31,59		$ 72.800,00	$ 2.299.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,00	16,00		$ 26.248,00	$ 419.968,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE (INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	31,59	31,59		$ 74.985,00	$ 2.368.776,15	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	50,90	50,90		$ 25.380,00	$ 1.291.842,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE CIERTERAS MUROS CULATAS COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0.01 M HASTA 1.3 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	16,41	16,41		$ 36.386,00	$ 597.094,26	$ -	100,00%	100,00%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENTIA A RAYOS SOLARES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	54,99	54,99		$ 28.280,00	$ 1.554.444,95	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2	9,80	9,80		$ 262.756,00	$ 210.203,20	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	40,00	40,00		$ 40.429,00	$ 1.617.160,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	14,56	14,56		$ 24.883,00	$ 362.396,48	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	31,59	31,59		$ 4.508,00	$ 142.407,72	$ -	100,00%	100,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	9,88	9,88		$ 21.852,00	$ 215.897,76	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	9,88	9,88		$ 203.467,00	$ 2.009.256,57	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO HUESO. INCLUYE INSTALACIÓN EN BRONCE	M	69,07	69,07		$ 43.533,00	$ 2.777.461,84	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	95,50	95,50		$ 22.997,00	$ 2.196.213,50	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC- ANCHO 10 CM	M	93,07	93,07		$ 23.735,00	$ 2.209.616,45	$ -	100,00%	100,00%	
	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO EXISTENTES	M2	27,42	27,42		$ 67.537,00	$ 1.851.972,60	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,30	37,30		$ 40.967,00	$ 1.527.933,91	$ -	100,00%	100,00%	ESTUCO
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN LUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	37,30	37,30		$ 20.875,00	$ 778.568,61	$ -	100,00%	100,00%	ESPONJA
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	30,00		$ 40.429,00	$ 1.212.870,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	68,02	68,02		$ 4.508,00	$ 306.627,96	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	699	SED	EMERGENCIA DE TUNJUELITO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	25,00	25,00		$ 30.066,00	$ 751.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA e= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	20,00		$ 72.193,00	$ 1.443.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 20.015,00	$ 400.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3,00		$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATEN EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	5,00		$ 18.061,00	$ 90.305,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12,00		$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,88	0,88		$ 66.108,00	$ 84.766,55	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO (D) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0,25		$ 183.945,00	$ 45.986,21	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO (0.5 X 60 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR	M	5,00	5,00		$ 334.957,00	$ 1.674.785,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,00	2,00		$ 7.012,00	$ 14.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	90,00	90,00		$ 14.353,00	$ 1.291.770,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,10	30,10		$ 64.398,00	$ 1.938.579,80	$ -	100,00%	100,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN LUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	90,00	90,00		$ 20.875,00	$ 1.878.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA. ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M	3,00	3,00		$ 319.190,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 68.873,00	$ 1.377.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	120,00		$ 40.429,00	$ 4.851.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	150,00		$ 4.508,00	$ 676.200,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	699	SED	EMERGENCIA DE SALUDCOOP SUBA - SUBA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 6.953,00	$ 340.697,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 18.852,00	$ 923.748,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	49,00		$ 127.792,00	$ 6.261.808,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	50,00	50,00		$ 6.814,00	$ 290.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRADOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	49,00		$ 72.800,00	$ 3.567.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	35,00		$ 26.248,00	$ 918.680,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	35,00		$ 25.380,00	$ 888.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	8,75		$ 39.822,00	$ 348.442,50	$ -	100,00%	100,00%	
	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACION Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN)	M2	49,00	49,00		$ 97.031,00	$ 4.753.538,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15,00		$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	49,00		$ 4.508,00	$ 220.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP-003	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA COCINA – ZONA DE LAVADO Y ALMACÉN, COMPUESTO POR CAMPANA TIPO HONGO 2200/3PH, EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, VENTILADOR AXIAL, RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA, REJILLAS DE EXTRACCIÓN Y RETORNO, ACCESORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, APERTURAS Y PASOS EN MURO O PLACA, INCLUYE MONTAJE, SOPORTERÍA, SELLADOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINI SPLIT EXISTENTES EN COCINA DEL COLEGIO HERNAN DUSAN DUSSAN LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C.	UN	1,00	1,00		$ 47.097.726,00	$ 47.097.726,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	823	SED	INFRAESTRUCTURA COLEGIO ROSA MARIA CORDILLO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.15M A 0.20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	1,90	1,90	0,00	$ 108.649,00	$ 206.053,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATEN EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE	M	8,60	8,60	0,00	$ 18.061,00	$ 155.324,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,76	0,76	0,00	$ 96.108,00	$ 73.042,08	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.5	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (INCLUYE REFUERZO)	M	3,85	3,85	0,00	$ 156.356,00	$ 601.770,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM.	M	3,80	3,80	0,00	$ 374.827,00	$ 1.424.380,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO	M	1,80	1,80	0,00	$ 164.023,00	$ 623.287,40	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM DE 0.15 X 0.15 M	KG	38,57	38,57	0,00	$ 7.477,00	$ 313.217,07	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-U Y ACCESORIOS	M	0,80	0,80	0,00	$ 88.516,00	$ 70.812,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	3,00	0,00	$ 73.531,00	$ 220.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	8,60	8,60	0,00	$ 26.248,00	$ 225.732,80	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1,52	1,52	0,00	$ 377.538,00	$ 573.857,76	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	4,20	4,20	0,00	$ 4.508,00	$ 18.933,60	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	171	SED	INFRAESTRUCTURA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cuberta de aulas)	M2	0,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	(106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,99	0	0	$ 4.147,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACRO	M2	2,01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.661,29	49,75%	49,75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	1,01	1	0	$ 71.645,00	$ 71.645,00	$ 72.357,45	49,75%	49,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	CM	0,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,60	35	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	0,00	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	(13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

	CPE	884	SED	EMERGENCIA COLEGIO COSENA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,60	28,60		$ 24.868,00	$ 711.224,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,40	17,40	17,40	$ 30.684,00	$ 533.901,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20 ENTAMBORADO DE 1"	M2	39,70	39,70	39,70	$ 956.124,00	$ 37.958.122,80	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	6,30	6,30	6,30	$ 1.033.647,00	$ 6.511.976,10	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,00	46,00	46,00	$ 4.508,00	$ 207.368,00	$ -	100,00%	100,00%	

FECHA:	20/06/2026	**INFORME SEMANAL 29**	
DIAS RESTANTES	**38**		
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	29	**DEL**	15-jun-26	**AL**	21-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adición #1	$ 83.867.649,00	**Adición #1**	0
Adición #2	$ 184.210.953,00	**Adición #2**	0
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	2 MESES
Suspensión	1 (13/05/2026 AL 28/05/2026)	**Suspensión**	1 (13/05/2026 AL 28/05/2026)

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	RAFAEL URIBE URIBE	80,09%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Finalizada
2	LA FLORESTA SUR	64,39%	83,20%	100,00%	94,10%	-5,90%	Actividades excavacion manual
3	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Finalizada
4	CARLOS ARTURO TORRES	61,25%	60,02%	92,50%	79,33%	-13,16%	Actividades de instalación de reja metalica tipo persiana en cuarto debombas.
5	CARLOS ARTURO TORRES	89,41%	88,68%	91,40%	98,55%	7,14%	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.
6	FRANCISCO DE MIRANDA	49,79%	48,88%	92,86%	95,60%	2,74%	Actividades de emboquillado de psisos, retiro de escombros, instlacion de iluminacion y cielo raso.
7	RUFINO JOSE CUERVO	88,34%	90,89%	90,91%	100,00%	9,09%	Finalizada
8	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	0,00%	0,00%	0,56%	1,18%	0,62%	Alistado de pendientado
TOTALES		**66,66%**	**71,46%**	**83,53%**	**83,60%**		

3. RESUMEN FINANCIERO

RAFAEL URIBE URIBE

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 351.783.320	$ 351.783.320	**$ 0**		0,00%	100,00%

LA FLORESTA SUR

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 114.342.420	$ 107.596.467	**$ 6.745.953**		0,00%	94,10%

CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 353.607.262	$ 353.607.262	$ -		0,00%	100,00%

CARLOS ARTURO TORRES

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 277.106.807	$ 219.839.534	**$ 57.267.273**		79,33%	79,33%

CARLOS ARTURO TORRES

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 220.305.772	$ 217.103.948	**$ 3.201.824**		0,00%	98,55%

FRANCISCO DE MIRANDA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 272.831.624	$ 260.825.208	**$ 12.006.416**		95,60%	95,60%

RUFINO JOSE CUERVO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 153.725.546	$ 153.725.546	$ -		0,00%	100,00%

JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 248.315.879	$ 2.937.710	**$ 245.378.169**		1,18%	1,18%

EMERGENCIAS


BALANCE EMERGENCIAS	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 205.063.881	$ 205.063.164	**$ 717**		#¡REF!	100,00%

FECHA:	20/06/2026	**INFORME SEMANAL 29**	
DIAS RESTANTES	**38**		
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	29	**DEL**	15-jun-26	**AL**	21-jun-26

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

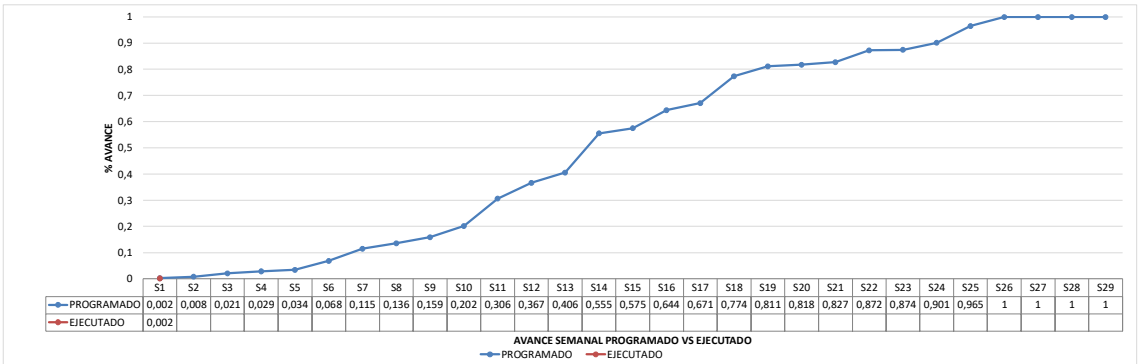

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
PROGRAMADO	0,002	0,008	0,021	0,029	0,034	0,068	0,115	0,136	0,159	0,202	0,306	0,367	0,406	0,555	0,575	0,644	0,671	0,774	0,811	0,818	0,827	0,872	0,874	0,901	0,965	1	1	1	1
EJECUTADO	0,002																												

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N.A

RECOMENDACIONES:
• Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
• Continuar con el uso correcto de EPP
• Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
• JOSE MARIA CORDOBA :Finalizada
RAFAEL URIBE URIBE : Finalizada
CARLOS ARTURO TORRES SEDE B: Actividade de trabajo en cancha.
RUFIJO JOSE CUERVO:Actividades, Finalizada
CARLOS ARTURO TORRES SEDE A: Actividades de remates en cuarto de bombas
FRANCISCO MIRANDA:Actividades acabados en baños y cieloraso
LA FLORESTA SUR:Actividades finalización de actividades.

EMERGENCIA OEA:Finalizada.
EMERGENCIA DILE TUNJUELITO:Finalizada
EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN: finalizada
EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA:Finalizada
EMERGENCIA CODEMA: finalizada
EMERGENCIA ROSA MARIA GORDILLO:finalizada
EMERGENCIA TON ADAMS: Actividades de cambio de manto asfaltico
EMERGENCIA ISLA DEL SOL en revisión por parte del contratista
EMERGENCIA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVERA en revisión por parte del contratista
EMERGENCIA BICENTENARIO en revisión por parte del contratista
EMERGENCIA RUFINO JOSE CUERVO en revisión por parte del contratista

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se realiza revision de actividades en colegios : Jose maria cordoba, Rafael uribe uribe, Carlos arturo torres sede B, Rufino jose cuervo,Carlos arturo torres sede A,Fancisco Miranda, La floresta
2.se realiza revision cantidades
3.se realiza revision de correspondecia
4.se realizan observaciones a requerimientos tecnicos del contratista
5.se realiza informe semanal
6. se le envia al contratista nuevas emergencias

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se mantuvo el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Interventoría para el desarrollo seguro de las labores. Asimismo, se realizaron recorridos de inspección y seguimiento en las Instituciones Educativas Tom Adams y Colegio OEA, con el fin de verificar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) implementadas en los diferentes frentes de obra.
Adicionalmente, en la Institución Educativa Carlos Arturo Torres – Sede A, se evidenció la presencia de material sobrante, andamios y escombros dispuestos en zonas verdes. En consideración a que la entrega de esta institución se encuentra programada para la presente semana, se recomienda al contratista realizar de manera inmediata el retiro de dichos elementos, garantizando condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad para la entrega final de las áreas intervenidas.
Por otra parte, en los frentes de obra que actualmente se encuentran activos, se reitera al contratista la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de todo el personal, de conformidad con los procedimientos de seguridad establecidos para la ejecución de las actividades.
Finalmente, se reitera al contratista la importancia de remitir de manera oportuna los informes mensuales, con el propósito de facilitar el seguimiento y control de la información documental asociada a la ejecución del proyecto.
Total de horas hombres trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0
REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 17

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IIED Tom Adams: Se realiza visita inicial en el frente, por lo que se recomienda durante las actividades garantizar la adecuada separación, señalización del acopio y disposición de los residuos, mantener los frentes de obra limpios y libres, realizar el cerramiento perimetral y señalizar la zona de trabajo al igual que cumplir todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED OEA: Se realiza visita inicial en el frente, por lo que se recomienda durante las actividades garantizar la adecuada separación, señalización del acopio y disposición de los residuos, mantener los frentes de obra limpios y libres, realizar el cerramiento perimetral y señalizar la zona de trabajo al igual que cumplir todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Carlos Arturo Sede A: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos y material de construcción, por lo que se recomendó al contratista realizar el retiro de todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
IED La floresta Sur: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos y material de construcción, por lo que se recomendó al contratista realizar el retiro de todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

OTROS

ARQ MILLER MARIN CASTELLANOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ HARRY ARNAGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	20/06/2026	INFORME SEMANAL 29	
DIAS RESTANTES	38		
CORTE DEL INFORME:	*21/06/2026*		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	29	**DEL**	15-jun-26	**AL**	21-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adición #1	$ 83.867.649,00	**Adición #1**	0
Adición #2	$ 184.210.953,00	**Adición #2**	0
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	2 MESES
Suspensión	1 (13/05/2026 AL 28/05/2026)	**Suspensión**	1 (13/05/2026 AL 28/05/2026)

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

CPF	COLEGIO	SEDE	CONTRATO DE OBRA	LOCALIDAD	Silviculturales	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	ESTADO	ALCANCE	FECHA INICIO ATENCION EMERGENCIA	FECHA TERMINACION Y ENTREGA AL COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO
878	HERNANDO DURAN DUSAN	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Se presentan filtraciones en la placa de la biblioteca, aparentemente por deficiencia en la impermeabilización de la cubierta y fisuras en la torta inferior de la placa.	5-dic.-25	09/04/2026	$ 19.421.102,74
878	HERNANDO DURAN DUSAN	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	problemas de condensación y confort térmico al interior de la cocina	26-mar.-26	09/04/26	$ 52.589.226,00
807	O.E.A	B	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Comedor escolar: Relacionada con hallazgos en la zona de cocina, que incluyen la necesidad de instalación de medias cañas, deterioro de	5-dic.-25	09/04/26	$ 20.381.480,89
807	O.E.A	B	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Ficha 2 – Placa de cubierta aula de preescolar: Correspondiente a la necesidad prioritaria de cambio del piso sobre placa de cubierta del	5-dic.-25	09/04/26	$ 20.066.180,12
863	KENNEDY	D	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Atención de obras por emergencia debido a las siguientes novedades presentadas y evidenciadas en campo:	20-mar.-26	09/04/26	$ 4.428.105,12
627	DIRECCION LOCALTUNJUELITO		CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	100,00%	finalizado	presenta un problema importante de humedades en canales y bajantes de la fachada principal,. Adicional al encontrarse 50 cm por	12-dic.-25	09/04/26	$ 17.760.044,55
826	JACKELINE	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	Silviculturales	100,00%	finalizado	TALA DE ARBOLES	9-dic.-25	09/04/26	$ 2.700.093,99
818	CASTILLA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	El 26 de Enero de 2026 la rectora de IED reportó presencia de abejas en un punto de las instalaciones, indicando la afectación a la	6/2/2026	09/04/26	$ 27.977.145,65
884	CODEMA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Espacio: Baterias sanitarias y circulaciones tercer pisoTema: Filtraciones por fugas de aguas residuales en baños y filtraciones en	23/3/2026	09/04/26	$ 45.922.593,29
840	TOM ADAMS	B	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	50,00%	En proceso	Se presenta una emergencia derivada de las fuertes lluvias registradas hacia el mediodía en la localidad de Kennedy, las cuales	27/04/2026	22/05/25	$ 62.000.000,00
701	CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	CO1.PCCNTR.8155154	Bosa	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Desde el dia 3 de Febrero de 2026, reportaron un agrietamiento en un muro de mamposteria de 1.80 de alto	11/05/2026	20/05/26	$ 7.771.172,92
621	ISLA DEL SOL	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Se requiere la intervención integral de mantenimiento correctivo en el área de cafetería y espacios adyacentes de la sede del Colegio	-	-	-
621	ISLA DEL SOL	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Se requiere habilitar la conexión funcional entre el bloque antiguo y el bloque nuevo mediante el retiro del tramo de reja	-	-	-
763	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Bosa	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Se requiere barrera visual en Acceso a Baños de Primera Infancia dada la vulnerabilidad de los mismos. En total son 6 baños con esta	-	-	-
611	RUFINO JOSE CUERVO	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	En la institución se determinó que la presencia de roedores tiene carácter transitorio, asociada principalmente a la inadecuada disposición de	-	-	-
837	MANUEL ZAPATA OLIVERA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Deacuerdoconlaverificaciónrealizada,seidentificóquelaproblemáticaseconcentraprincipalmenteenlafranja	-	-	-

FECHA:	20/06/2026	**INFORME SEMANAL 29**	
DIAS RESTANTES	**38**		
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Colegio Jose Maria Cordoba



mantenimiento ventanas




mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas

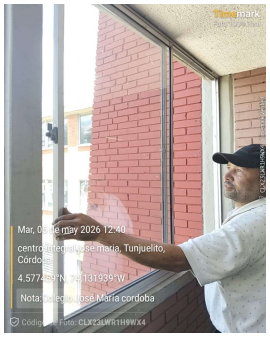

mantenimiento ventanas




mantenimiento ventanas

Colegio Rafael Uribe Uribe



construccion tapa caja

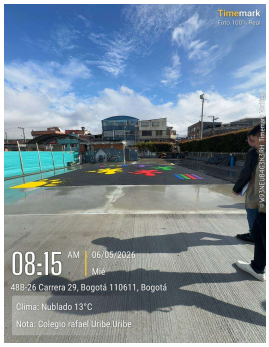

instalacion pis chips




rejilla carcamo



instalacion pis chips




rejilla carcamo

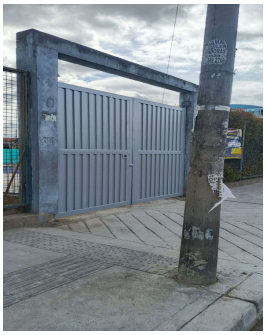


Instalacion de puertas

Colegio Carlos arturo torres sede B

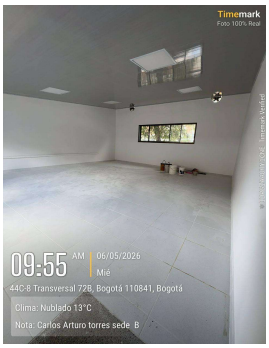


remates cielo raso

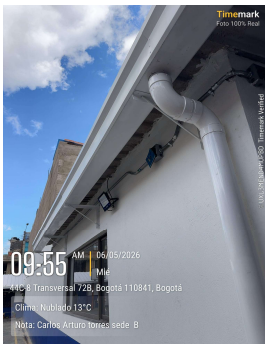


Pintura muros




Pintura muros

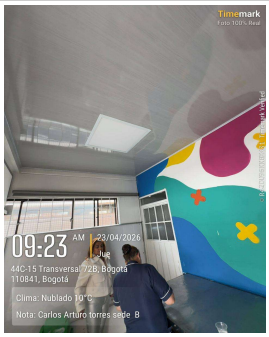

Pintura muros

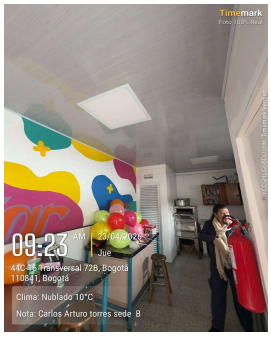

remates generales

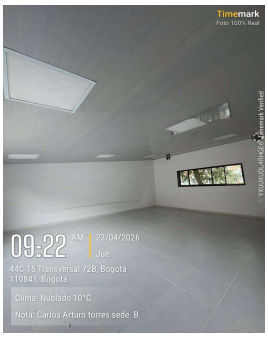


remates generales


Colegio Rufino Jose Cuervo




remates piso chips

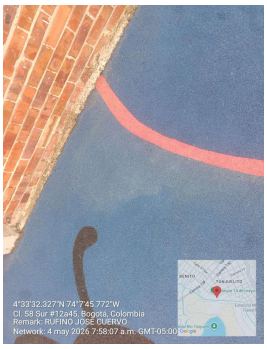


remates piso chips

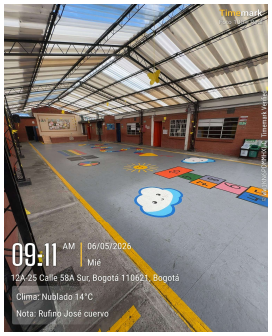


pintura plazoleta

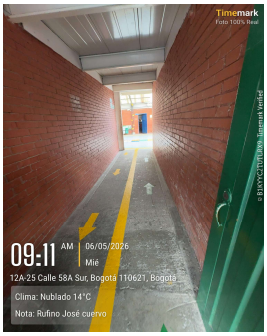

pintura corredores

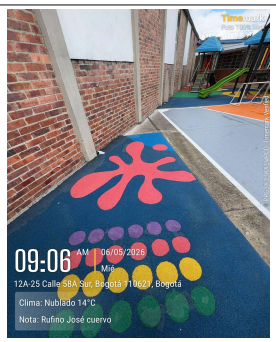

remates piso chips

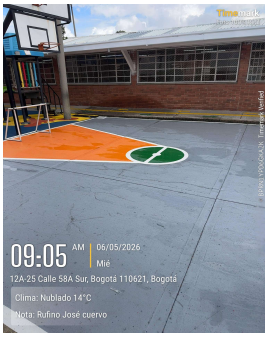


remates piso chips

Colegio Carlos arturo torres sede A



remates pinturas portones

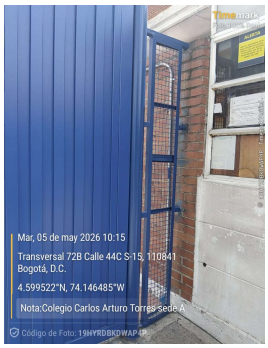

remates pinturas portones



remates pinturas portones



retiro de cubierta




Cuarto de bombas.



estructura cubierta

Colegio Fracisco de Miranda

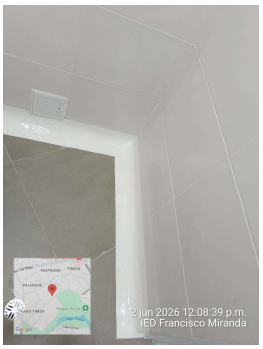

Acabado de media caña.




Acabado de sanitarios



Acabado en baños



Acabado en baños

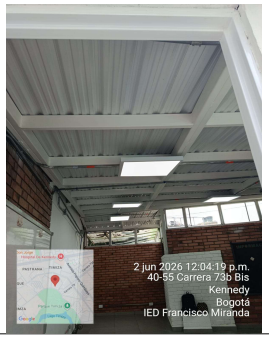


Instalación de luminarias




Boquilla de piso.


Colegio La Florestas sur sede A




construccion cajas

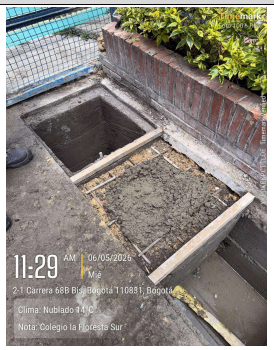

construccion cajas

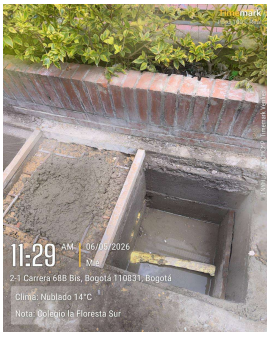

construccion cajas

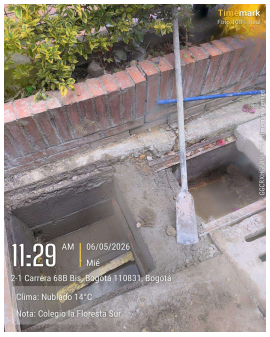

construccion cajas



retiro de escombros



cajas de inspeccion


Emergencia Colegio Tom Adams



Pendientado de placa.



Pendientado de placa.

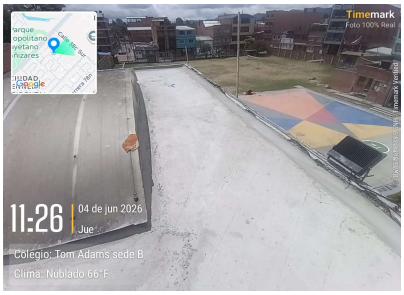


Pendientado de placa.




Pendientado de placa.


San Carlos

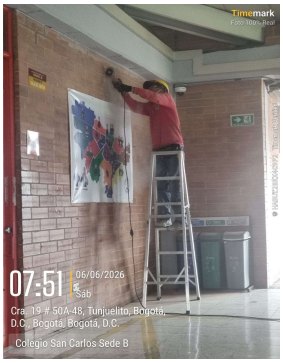


Corte de muro.

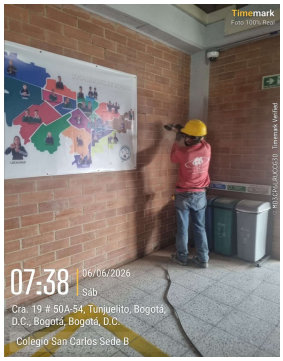

Corte de muro.

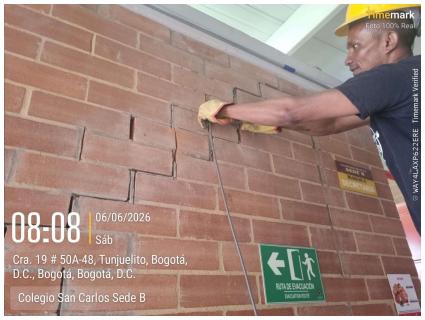

Corte de muro.

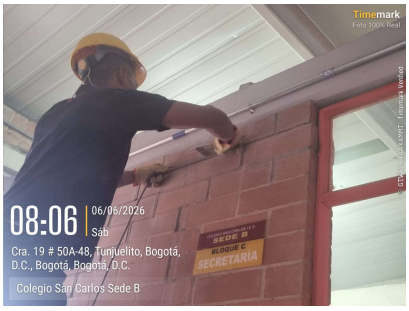

Corte de muro.

FECHA: 20/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 38 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
21 de junio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES	16	16	ADICIÓN #1	$ 83.867.649,00	$ -
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	123	61	ADICIÓN #2	$ 184.210.953,00	$ -
MODIFICACIÓN	29 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026	ADICIÓN	0	0	TOTAL	$ 1.064.357.530,00	$ 2.497.896.864,00
TERMINACION FINAL	29 de septiembre de 2026	29 de julio de 2026	TOTAL	350	288			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-40-101075759	14 10 2025	14 5 ###

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	100,00%	100,00%	100,00%		$ 351.783.320,20	$ 351.783.320	3/12/2025	4/04/2026																			
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	83,20%	94,10%	100,00%		$ 114.342.419,78	$ 107.596.467	3/12/2025	4/05/2026																			
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José María Cordoba	100,00%	100,00%	100,00%		$ 353.607.262,42	$ 353.607.262	4/11/2025	4/03/2026																			
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	60,02%	79,33%	92,50%		$ 277.106.807,00	$ 219.839.534	13/01/2026	13/04/2026																			
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	88,68%	88,55%	91,40%		$ 220.305.772,01	$ 217.103.948	4/11/2025	4/04/2026																			
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	48,88%	95,60%	92,86%		$ 272.831.623,66	$ 260.825.208	13/01/2026	13/05/2026																			
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	90,89%	100,00%	90,91%		$ 153.725.546,14	$ 153.725.546	13/01/2026	13/04/2026																			
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,56%	1,18%	0,56%		$ 248.315.879,08	$ 2.937.710	16/12/2025	15/04/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						83,60%	83,53%		$ 1.992.018.630	$ 1.667.416.996																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	100,00%	100,00%	100,00%		$ 66.518.828	$ 66.518.828	5/12/2025	23/12/2025																			
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	98,62%	100,00%	100,00%		$ 40.447.661	$ 40.446.944	5/12/2025	21/12/2025																			
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa Maria Gordillo	100,00%	100,00%	100,00%		$ 4.409.208	$ 4.409.209																					
884	CODEMA	Kennedy	A	Dario Echandia - CODEMA	100,00%	100,00%	100,00%		$ 45.922.593	$ 45.922.593	18/03/2026	30/12/2026																			
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100,00%	100,00%	100,00%		$ 17.760.045	$ 17.760.045	12/12/20205	30/12/2025																			
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																			
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100,00%	100,00%	100%		$ 27.305.453	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						100,00%	100,00%		$ 205.063.881	$ 205.063.164																					

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	6	0	8	$ 1.667.418.996
ACUMULADO EMERGENCIAS				
3	4	0	7	$ 205.063.164
TOTAL				
5	10	0	15	$ 1.872.482.160
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	83,60%	#¡DIV/0!	86,81%
PROGRAMADO	83,53%		
ATRASO	0,07%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO


















AVANCE DE LOS FRENTES

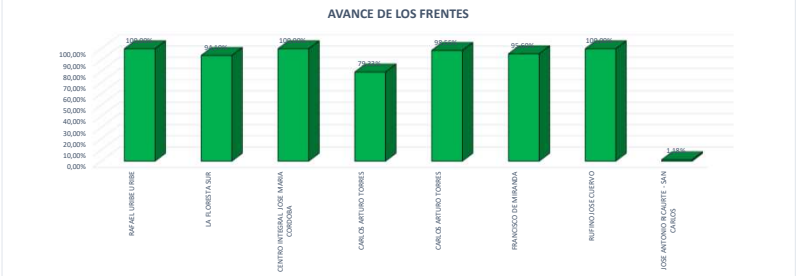

OBSERVACIONES:

FECHA:	20/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	38	Días				
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO 8	0
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA		
21/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Finalizada				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Finalizada				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Finalizada				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de instalación de reja metalica tipo persiana en cuarto debombas.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades de emboquillado de psisos, retiro de escombros, instlacion de iluminacion y cielo raso.				

Colegio La floresta	CANCHA	Actividades excavacion manual				
San Carlos	TERRAZA	Corte de muro				
Tom Adams	TERRAZA	Alistado de pendientado				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | VIGENCIA 2025.00

GRUPOS

ITEM	CPF Ítem / Actividad	612 Unidad de medida	IED Cantidad contratada	RAFAEL URIBE URIBE Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	SEMANA Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y	M2	436,08	436,08		$ 3.395,00	$ 1.480.491,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	98,39	98,39		$ 79.342,00	$ 7.806.459,38	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,60	66,6		$ 72.193,00	$ 4.808.053,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.510,53	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE	UN	3,00	3		$ 11.566,00	$ 34.698,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	96,00	96		$ 4.244,00	$ 407.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	23,09		$ 18.852,00	$ 435.292,68	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,59	61,59		$ 21.852,00	$ 1.345.864,68	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,38	8,3838		$ 30.684,00	$ 257.248,52	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	43,12	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8,91	8,91		$ 96.108,00	$ 856.322,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,92	4,92		$ 130.850,00	$ 643.782,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	250,38	250,38		$ 83.544,00	$ 20.917.746,72	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,92	4,92		$ 22.675,00	$ 111.561,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,33	2,33		$ 174.968,00	$ 407.675,44	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	121,46	121,464		$ 183.945,00	$ 22.342.695,48	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	121,46	121,46		$ 173.913,00	$ 21.123.472,98	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	5,38	5,38		$ 202.686,00	$ 1.090.450,68	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	31,20	31,20		$ 111.395,00	$ 3.475.524,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	148,99	148,99		$ 160.361,00	$ 23.892.185,39	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	22,96	22,96		$ 28.402,00	$ 652.109,92	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM	M	43,12	43,12		$ 334.957,00	$ 14.443.345,84	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2169,77	2169,77		$ 7.012,00	$ 15.214.427,24	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	1435,45	1435,45		$ 7.421,00	$ 10.652.474,45	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	15,00	15		$ 88.516,00	$ 1.327.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	404,88	404,88		$ 12.255,00	$ 4.961.804,40	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R. CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	UN	1,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 22.533,00	$ 610.644,30	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG	UN	8,00	8,00		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	8,00	8,00		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	8,00	8		$ 62.384,00	$ 499.072,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE	M	96,00	96,00		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	255,89	255,89		$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	244,25	244,25		$ 35.908,00	$ 8.770.529,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	107,00	107		$ 498.089,00	$ 53.295.523,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	78,53	78,53		$ 19.187,00	$ 1.506.755,11	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,38	8,3838		$ 965.200,00	$ 8.092.043,76	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	21,56	21,56		$ 66.398,00	$ 1.431.540,88	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	73,81	73,81		$ 39.822,00	$ 2.939.261,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70,88	70,88		$ 23.852,00	$ 1.690.629,76	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	408,44		$ 4.508,00	$ 1.841.247,52	$ (0,00)	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF Ítem / Actividad	829 Unidad de medida	IED Cantidad contratada	LA FLORESTA SUR Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	SEMANA Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico	M	120,00	120,00		$ 30.066,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,30	1,30		$ 72.193,00	$ 93.562,13	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53	21,53		$ 28.405,00	$ 611.559,65	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,50	7,50		$ 16.333,00	$ 122.497,50	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,24	3,24		$ 96.108,00	$ 311.389,92	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	7,00	7,00		$ 55.969,00	$ 391.783,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,26	0,26		$ 22.675,00	$ 5.877,36	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1,30	1,30		$ 160.361,00	$ 207.827,86	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	42,70	42,70		$ 164.023,00	$ 7.003.782,10	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	960,00	960,00		$ 9.705,00	$ 9.316.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,00	2,00		$ 150.033,00	$ 300.066,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1,00		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	655,00		$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	220,94	220,94		$ 19.187,00	$ 4.239.175,78	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	23,52	23,52		$ 761.157,00	$ 17.902.412,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	21,53		$ 464.504,00	$ 10.000.771,12	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,20	4,20		$ 945.575,00	$ 3.971.415,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	10,47		$ 129.084,00	$ 1.351.509,48	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	10,14		$ 240.910,00	$ 2.442.827,40	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	655,00	655,00		$ 4.508,00	$ 2.952.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00	0		$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%	PT APROBAR

ITEM	CPF Ítem / Actividad	601 Unidad de medida	IED Cantidad contratada	Jose Maria Cordoba Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	SEMANA Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico	M	40,11	40,11		$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$ 286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,72	32,72		$ 29.984,00	$ 981.076,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	40,27		$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$ 21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163,40	163,40		$ 10.995,00	$ 1.796.583,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	108,04		$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$ 32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28,00		$ 26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,70		$ 31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7,00		$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$ 7.219,00	$ 43.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,10	16,10		$ 4.244,00	$ 68.328,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4,00		$ 385.556,00	$ 1.542.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$ 23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,50		$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18,00		$ 14.178,00	$ 255.204,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	423,36	423,36		$ 147.193,00	$ 62.315.628,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30,00	30,00		$ 11.033,00	$ 330.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7,00		$ 36.280,00	$ 253.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22,58	22,58		$ 16.333,00	$ 368.799,14	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	71,30	71,30		$ 164.023,00	$ 11.694.839,90	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	0,76		$ 70.230,00	$ 53.374,80	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529,54	529,54		$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	529,58		$ 27.238,00	$ 14.424.700,04	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1,00		$ 25.481,00	$ 25.481,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	6,00		$ 14.486,00	$ 86.916,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6,00		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	18,00		$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	61,96		$ 13.297,00	$ 823.882,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	1,00		$ 61.772,00	$ 61.772,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	405,00		$ 5.814,00	$ 2.354.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	17,30	17,30		$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6,00		$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6,00		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	72,45	72,45		$ 41.218,00	$ 2.986.244,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61,65	61,65		$ 203.467,00	$ 12.543.740,55	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55,34	55,34		$ 83.512,00	$ 4.621.554,08	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,80	40,80		$ 14.858,00	$ 606.206,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	21,52		$ 63.550,00	$ 1.367.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	670,38		$ 19.187,00	$ 12.862.581,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	26,75	26,75		$ 85.861,00	$ 2.296.781,75	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	102,64		$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28		$ 451.950,00	$ 578.496,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	6,32		$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6,00		$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	12,00		$ 391.028,00	$ 4.692.336,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3,00		$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	5,07		$ 956.124,00	$ 4.847.548,68	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	2,63		$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	13,65		$ 34.979,00	$ 477.463,35	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,7	798,7		$ 39.822,00	$ 31.805.831,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	37,88		$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	46,92	46,92		$ 12.106,00	$ 568.013,52	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,3	959,3		$ 23.852,00	$ 22.881.223,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	15,57		$ 12.606,00	$ 196.275,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	32,94		$ 12.568,00	$ 413.989,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	46,92	46,92		$ 20.875,00	$ 979.455,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	49,64		$ 33.461,00	$ 1.661.004,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1458,79	1458,79		$ 28.786,00	$ 41.992.728,94	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1301,37	1301,37		$ 20.749,00	$ 27.002.126,13	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M. (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	99,29	99,29		$ 17.148,00	$ 1.702.624,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	1247,97		$ 23.550,00	$ 29.389.693,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2,20	2,20		$ 28.987,00	$ 63.771,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	35,94		$ 8.860,00	$ 318.428,40	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5,19	5,19		$ 128.780,00	$ 668.368,20	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3,00		$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	359,00		$ 4.508,00	$ 1.618.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	6,00	6		$ 1.165.807,00	$ 6.994.842,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A				SEMANA			
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	57,00		$ 4.093,00	$ 233.301,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	27,85	27,85		$ 30.066,00	$ 837.338,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	24.70	24.7		$ 2.402.00	$ 59.329.40	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$ 286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,59	0,59		$ 244.462,00	$ 143.743,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8,00	8,00		$ 113.245,00	$ 905.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	29,73		$ 31.500,00	$ 936.495,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	7,14		$ 21.553,00	$ 153.888,42	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	53.05		$ 10.995.00	$ 583.284.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	53.05		$ 12.224.00	$ 648.483.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	37,71		$ 32.061,00	$ 1.209.020,31	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$ 161.707,00	$ 646.828,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	35,22		$ 35.518,00	$ 1.250.943,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$ 31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4		$ 7.219.00	$ 28.876.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00		$ 4.244.00	$ 84.880.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	65,00		$ 8.659,00	$ 562.835,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	9.00	9		$ 14.178.00	$ 127.602.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	4		$ 45.204,00	$ 180.816,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	9,86		$ 30.684,00	$ 302.544,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32,93	32,93		$ 18.061,00	$ 594.748,73	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20		$ 16.333.00	$ 326.660.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18.33	18.33		$ 12.288.00	$ 225.239.04	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.60	0.6		$ 96.108.00	$ 57.664.80	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.14	1.14		$ 174.968.00	$ 199.463.52	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.43	0.43		$ 1.069.032.00	$ 459.683.76	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	110.60	110.60		$ 101.433.00	$ 11.218.489.80	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM. (NO INCLUYE ACERO)	M	5.70	5.70		$ 57.073.00	$ 325.316.10	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.60	11.60		$ 160.361.00	$ 1.860.187.60	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	5.18	5.18		$ 241.182.00	$ 1.250.287.49	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822.31	822.31		$ 7.012.00	$ 5.766.037.72	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	35.08	35.07856		$ 7.421.00	$ 260.317.99	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.67	5.67		$ 76.084.00	$ 431.396.28	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.08	12.08		$ 49.410.00	$ 596.872.80	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3". INCLUYE ACCESORIOS	UN	3.00	3		$ 135.539.00	$ 406.617.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	32.93	32.93		$ 25.481.00	$ 839.089.33	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116.40	116.4		$ 19.470.00	$ 2.266.308.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63.00	63		$ 9.479.00	$ 597.177.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	11.00	11		$ 61.400.00	$ 675.400.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9.00	9		$ 61.400.00	$ 552.600.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	12.00	12		$ 94.029.00	$ 1.128.348.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00	2		$ 66.686.00	$ 133.372.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	1.00	1.00		$ 200.497.00	$ 200.497.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1.00	1.00		$ 206.989.00	$ 206.989.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120.00	120.00		$ 5.814.00	$ 697.680.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	4		$ 122.646,00	$ 490.584,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	7,00	7		$ 62.384,00	$ 436.688,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29.72	29.72		$ 41.218.00	$ 1.224.998.96	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	1.42	1.4175		$ 39.550.00	$ 56.062.13	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49.43	49.43		$ 26.248.00	$ 1.297.438.64	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80.00	80		$ 498.089.00	$ 39.847.120.00	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	45.67	45.67		$ 14.858.00	$ 678.564.86	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23.09	23.09		$ 132.061.00	$ 3.049.288.49	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	103.03	103.03		$ 94.926.00	$ 9.780.225.78	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	19,80	19,80		$ 761.157,00	$ 15.073.192,07	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	23,31	23,3055		$ 965.200,00	$ 22.494.468,60	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4.80	4.8		$ 945.575.00	$ 4.538.760.00	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8		$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3		$ 746.496.00	$ 2.239.488.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	9.00	9		$ 391.028.00	$ 3.519.252.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2		$ 39.750.00	$ 79.500.00	$ -	100.00%	100.00%	
8 10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3.00	3		$ 32.443.00	$ 97.329.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES. INCLUYE 8 ASEOS	MES	13,60	13,6		$ 945.896,00	$ 12.864.185,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,98	5,98		$ 956.124,00	$ 5.717.621,52	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.52	2.52		$ 1.033.647.00	$ 2.604.790.44	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107.00	107		$ 34.979.00	$ 3.742.753.00	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	61.31	61.31		$ 36.386.00	$ 2.230.825.66	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	105.00	105.00		$ 23.852.00	$ 2.504.460.00	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	29,37	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	107,70	107,7		$ 26.828,00	$ 2.889.375,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 8.860,00	$ 177.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31,06	31,06		$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6.13	6.125		$ 128.780.00	$ 788.777.50	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15.81	15.81		$ 102.700.00	$ 1.623.687.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51,74	51,74		$ 129.084,00	$ 6.678.806,16	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	51,74	51,74		$ 240.910,00	$ 12.464.683,40	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27.00	27.00		$ 18.402.00	$ 496.854.00	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144.00	144.00		$ 4.508.00	$ 649.152.00	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CAPACIDAD DEL SISTEMA 200 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 71-91 PSI, INCLUYE BOMBAS, DEPOSITO, TABLERO, MANOMETROS, PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE PASO, VÁLVULAS DE CHEQUE, FLOTADOR, TUBERIA DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y DEPOSITO, FLAUTA DE DESCARGA EN 4" DE DIAMETRO, TUBERIA DE SUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 2" Y VALVULA DE PIE DE 2"	UN	1,00	0		$ 57.267.273,00	$ -	$ 57.267.273,00	0,00%	0,00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	7,00	7		$ 1.165.807,00	$ 8.160.649,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
	CPF	803	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE B				SEMANA			
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	21,00	21		$ 30.066,00	$ 631.386,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	114,72	114,72		$ 3.395,00	$ 389.474,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,14	49,14		$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89.33	89.33		$ 10.995.00	$ 982.183.35	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19.32	19.32		$ 155.716.00	$ 3.008.433.12	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	8,23		$ 32.061,00	$ 263.862,03	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	5,39		$ 28.405,00	$ 153.102,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	133,62		$ 35.518,00	$ 4.745.915,16	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,60	40,6		$ 31.476,00	$ 1.277.925,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19,00	19		$ 11.566,00	$ 219.754,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	34.00	34		$ 7.219.00	$ 245.446.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	39.00	39		$ 4.244.00	$ 165.516.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76.91	76.91		$ 16.333.00	$ 1.256.171.03	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1.25	1.25		$ 64.356.00	$ 80.445.00	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	49.30	49.3		$ 632.023.00	$ 31.158.733.90	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2.13	2.13		$ 141.229.00	$ 300.817.77	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 122.646,00	$ 858.522,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	3,00	3		$ 163.229,00	$ 489.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 147.178,00	$ 294.356,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	9,00	9		$ 204.593,00	$ 1.841.337,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	78,40	78,4		$ 15.899,00	$ 1.246.481,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	25,00	25		$ 174.276,00	$ 4.356.900,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	33,00	33		$ 241.381,00	$ 7.965.573,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1.68	1.68		$ 120.329.00	$ 202.152.72	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	241,50	220,00		$ 74.985,00	$ 16.496.700,00	$ 1.612.177,50	91,10%	91,10%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219.00	205		$ 19.187.00	$ 3.933.335.00	$ 268.618.00	93.61%	93.61%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45. INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	42.98	42.98		$ 121.988.00	$ 5.243.044.24	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76.91	76.91		$ 25.380.00	$ 1.951.975.80	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	8,23	8,23		$ 738.943,00	$ 6.081.500,89	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5,39	5,39		$ 560.257,00	$ 3.019.785,23	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	5.63	5.63		$ 66.398.00	$ 373.820.74	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.78	202.78		$ 34.979.00	$ 7.093.041.62	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	96.38	96.38		$ 39.822.00	$ 3.838.044.36	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72.11	72.11		$ 12.106.00	$ 872.963.66	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54.74	54.74		$ 23.852.00	$ 1.305.658.48	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,80	4,8		$ 7.804,00	$ 37.459,20	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4.87	4.87		$ 16.631.00	$ 80.992.97	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	121.62	121.62		$ 28.786.00	$ 3.500.953.32	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,00	73		$ 8.860,00	$ 646.780,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,74	129,74		$ 125.971,00	$ 16.343.477,54	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0.53	0.53		$ 128.780.00	$ 67.995.84	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79.48	79.48		$ 102.700.00	$ 8.162.596.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.25	18.71		$ 68.873.00	$ 1.288.613.83	$ 106.064.42	92.40%	92.40%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	64.00	64		$ 97.011.00	$ 6.208.704.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	133,62		$ 129.084,00	$ 17.248.204,08	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	71,30	71,3		$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	19,61	16,03		$ 187.010,00	$ 2.997.770,30	$ 669.495,80	81,74%	81,74%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310.00	189.00		$ 4.508.00	$ 852.012.00	$ 545.468.00	60.97%	60.97%	
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19.32	19.32		$ 1.480.308.00	$ 28.599.550.56	$ -	100.00%	100.00%	

	CPF	816	IED	FRANCISCO DE MIRANDA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	33,20	28,2		$ 30.066,00	$ 847.861,20	$ 150.330,00	84,94%	84,94%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,23	106,23		$ 31.500,00	$ 3.346.245,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,40	64,4		$ 21.553,00	$ 1.388.013,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,52	36,52		$ 12.224,00	$ 446.420,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	14,59		$ 32.061,00	$ 467.769,99	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	7,57		$ 28.405,00	$ 215.025,85	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	2,5		$ 20.015,00	$ 50.037,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,48	32,48		$ 35.518,00	$ 1.153.624,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	73,75	73,75		$ 31.476,00	$ 2.321.355,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	51,25		$ 24.868,00	$ 1.274.485,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,00	13		$ 11.566,00	$ 150.358,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13,00	13		$ 7.219,00	$ 93.847,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33,00	33		$ 4.244,00	$ 140.052,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	9		$ 8.659,00	$ 77.931,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4,00	4		$ 14.178,00	$ 56.712,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	21,91	21,91		$ 55.590,00	$ 1.217.976,90	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	24,32	24,32		$ 101.433,00	$ 2.466.850,56	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM. (NO INCLUYE ACERO)	M	16,82	16,82		$ 57.073,00	$ 959.967,86	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	106,23	106,23		$ 111.395,00	$ 11.833.490,85	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	281,89	281,89		$ 7.012,00	$ 1.976.612,68	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	51,62	51,62		$ 63.196,00	$ 3.262.177,52	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4,90	4,9		$ 141.229,00	$ 692.022,10	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	28,44	28,44		$ 9.398,00	$ 267.279,12	$ -	100,00%	100,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1,20	1,2		$ 40.794,00	$ 48.952,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,39	12,39		$ 88.516,00	$ 1.096.713,24	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,26	4,26		$ 49.410,00	$ 210.486,60	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3", INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	4		$ 135.539,00	$ 542.156,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	14,93	14,93		$ 14.486,00	$ 216.275,98	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10,00	10		$ 4.830,00	$ 48.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5,00	5		$ 61.400,00	$ 307.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3,00	3		$ 61.400,00	$ 184.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	5,00	5		$ 175.735,00	$ 878.675,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7,00	7		$ 94.029,00	$ 658.203,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	5		$ 73.531,00	$ 367.655,00	$ 367.655,00	50,00%	50,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	1,00		$ 176.353,00	$ 176.353,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30,00	30,00		$ 5.814,00	$ 174.420,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	10		$ 122.646,00	$ 1.226.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	21,00	21		$ 204.593,00	$ 4.296.453,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2,00	2		$ 598.211,00	$ 1.196.422,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	5,00	5		$ 28.341,00	$ 141.705,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1,00	1		$ 32.478,00	$ 32.478,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	25,00	25		$ 22.533,00	$ 563.325,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	19,00	19		$ 35.210,00	$ 668.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	34,00	34		$ 16.790,00	$ 570.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	21,00	21		$ 174.276,00	$ 3.659.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5,00	5		$ 241.381,00	$ 1.206.905,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	16,00	16,00		$ 62.384,00	$ 998.144,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	21,00	21,00		$ 60.364,00	$ 1.267.644,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	102,28	102,28		$ 43.769,00	$ 4.476.693,32	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	25,99	25,99		$ 26.248,00	$ 682.185,52	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	61,00	61,00		$ 498.089,00	$ 30.383.429,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	8,60	8,6		$ 14.858,00	$ 127.778,80	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	924,00	924,00		$ 63.550,00	$ 58.720.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	101,22	85,72		$ 132.061,00	$ 11.320.268,92	$ 2.046.945,50	84,69%	84,69%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	363,00	363,00		$ 19.187,00	$ 6.964.881,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	84,87	84,87		$ 94.926,00	$ 8.056.369,62	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS, E= 12 CM	M2	47,25	47,25		$ 166.287,00	$ 7.857.060,75	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	14,93	14,93		$ 801.420,00	$ 11.965.200,60	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	6,00		$ 464.504,00	$ 2.787.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	3,00	3,00		$ 762.932,00	$ 2.288.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3,00	3,00		$ 391.028,00	$ 1.173.084,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2,00		$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4,00	4,00		$ 32.443,00	$ 129.772,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	23,25		$ 956.124,00	$ 22.229.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112,35	112,35		$ 34.979,00	$ 3.929.890,65	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,97	68,97		$ 12.106,00	$ 834.950,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A 60 CM	M	30,95	30,95		$ 9.831,00	$ 304.269,45	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4, DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	36,95		$ 36.386,00	$ 1.344.462,70	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	75,04	75,04		$ 23.852,00	$ 1.789.854,08	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	260,17	260,17		$ 20.875,00	$ 5.431.048,75	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,95	36,95		$ 16.631,00	$ 614.515,45	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,24	33,25		$ 125.971,00	$ 4.188.535,75	$ 4.407.725,29	48,73%	48,73%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	1,50	1,50		$ 128.780,00	$ 193.170,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,40	13,40		$ 102.700,00	$ 1.376.180,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,50	2,50		$ 68.873,00	$ 172.182,50	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,48	32		$ 129.084,00	$ 4.130.688,00	$ 61.960,32	98,52%	98,52%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	32,48	14		$ 240.910,00	$ 3.372.740,00	$ 4.452.016,80	43,10%	43,10%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	8		$ 40.429,00	$ 323.432,00	$ 161.716,00	66,67%	66,67%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	3		$ 187.010,00	$ 561.030,00	$ 243.113,00	69,77%	69,77%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,50	120,00		$ 4.508,00	$ 540.960,00	$ 114.954,00	82,47%	82,47%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5	5		$ 1.165.807,00	$ 5.829.035,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	617	IED	RUFINO JOSE CUERVO SEDE C			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	160,53		$ 3.395,00	$ 544.999,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	161,53	161,53		$ 79.342,00	$ 12.816.113,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3,00		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	161,70	161,7		$ 16.333,00	$ 2.641.046,10	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	64,21	64,21		$ 130.850,00	$ 8.401.878,50	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	64,21		$ 174.968,00	$ 11.234.695,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1,00	1		$ 160.361,00	$ 160.361,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	431,81	431,81		$ 7.421,00	$ 3.204.462,01	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	640,00	640,00		$ 9.705,00	$ 6.211.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	160,53	160,53		$ 131.783,00	$ 21.155.124,99	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	76,96	76,96		$ 498.089,00	$ 38.332.929,44	$ 0,00	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	288,69	288,69		$ 63.550,00	$ 18.346.249,50	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	330,22	330,22		$ 19.187,00	$ 6.335.931,14	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	243,77	243,77		$ 25.380,00	$ 6.186.882,60	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	3,82	3,82		$ 761.157,00	$ 2.907.619,74	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3,60	3,6		$ 945.575,00	$ 3.404.070,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,22	4,22		$ 68.873,00	$ 290.644,06	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M	28,35	28,35		$ 319.199,00	$ 9.049.291,65	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	288,69	288,69		$ 4.508,00	$ 1.301.414,52	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	609	IED	JOSE ANTONIO SAN CARLOS SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	150,00	80		$ 30.066,00	$ 2.405.280,00	$ 2.104.620,00	53,33%	53,33%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00			$ 11.566,00	$ -	$ 92.528,00	0,00%	0,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30,00	10		$ 4.244,00	$ 42.440,00	$ 84.880,00	33,33%	33,33%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00			$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70,00	30		$ 16.333,00	$ 489.990,00	$ 653.320,00	42,86%	42,86%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53			$ 9.398,00	$ -	$ 164.746,94	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53			$ 27.238,00	$ -	$ 477.482,14	0,00%	0,00%	
4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	1,00			$ 894.074,00	$ -	$ 894.074,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00			$ 122.646,00	$ -	$ 981.168,00	0,00%	0,00%	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	8,00			$ 134.072,00	$ -	$ 1.072.576,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00			$ 4.508,00	$ -	$ 1.352.400,00	0,00%	0,00%	
NP 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRINCIPAL TIPO CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN IMPULSOR CERRADO EN FUNDICIÓN, POTENCIA 30 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFASICO (CALCULADA PARA OPERACIÓN SIMULTANEA DE DOS GABINETES)	UND	1,00			$ 37.324.920,00	$ -	$ 37.324.920,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA JOCKEY TIPO VERTICAL MULTIEMPATADA, IMPULSOR CERRADO, POTENCIA DE 10 HP, TENSIÓN 220 VOLTIO TRIFASICO.	UND	1,00			$ 20.895.349,00	$ -	$ 20.895.349,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 008	SUMINISTRO E INSTLACIÓN VALVULAS DE PIE 3"	UND	1,00			$ 1.299.086,00	$ -	$ 1.299.086,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 2"	UND	1,00			$ 603.695,00	$ -	$ 603.695,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 010	Suministro e instalacion Valvula de Compuerta HD 3" Vastago Ascendente Sello Metálico Gaer Icbk075	UND	1,00			$ 1.560.469,00	$ -	$ 1.560.469,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO CON COFRE METALICO NEMA 4, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL, ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO, 230 VOLTIOS ARRANQUE DIRECTO	UND	1,00			$ 20.438.942,00	$ -	$ 20.438.942,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4" SCH 40 RANURADA	ML	95,00			$ 872.101,00	$ -	$ 82.849.595,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/2" SCH 40 RANURADA	ML	140,00			$ 296.070,00	$ -	$ 41.449.800,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 4"	UND	20,00			$ 145.952,00	$ -	$ 2.919.040,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 3"	UND	6,00			$ 126.838,00	$ -	$ 761.028,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 1 1/2"	UND	90,00			$ 96.905,00	$ -	$ 8.721.450,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1 1/2" RANURADO	UND	70,00			$ 87.355,00	$ -	$ 6.114.850,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO RANURADO DE 1 1/2"	UND	6,00			$ 84.884,00	$ -	$ 509.304,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	70,00			$ 50.345,00	$ -	$ 3.524.150,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	100,00			$ 44.487,00	$ -	$ 4.448.700,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA DE 0.5 HP 120 V DESCARGA DE 3"	UND	1,00			$ 3.718.776,00	$ -	$ 3.718.776,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPE	699	SED	EMERGENCIA JACKELIN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,00	$ 450.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (15MH=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.634,00	$ 1.948.634,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	699	SED	EMERGENCIA OEA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M e 0.12 M Y GUARDACECOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,59	31,59		$ 31.500,00	$ 995.085,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,41	16,41		$ 10.995,00	$ 180.427,95	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	31,59	31,59		$ 127.792,00	$ 4.036.949,28	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	16,41	16,41		$ 136.965,00	$ 2.247.595,65	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	10,00	10,00		$ 6.814,00	$ 68.140,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	31,59	31,59		$ 43.768,00	$ 1.382.682,71	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRADOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31,59	31,59		$ 72.800,00	$ 2.299.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,00	16,00		$ 26.248,00	$ 419.968,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE (INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	31,59	31,59		$ 74.985,00	$ 2.368.776,15	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	50,90	50,90		$ 25.380,00	$ 1.291.842,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE CIERTERAS MUROS CULATAS COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0.01 M HASTA 1.3 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	16,41	16,41		$ 36.386,00	$ 597.094,26	$ -	100,00%	100,00%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENTIA A RAYOS SOLARES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	54,99	54,99		$ 28.280,00	$ 1.554.444,95	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2	9,80	9,80		$ 262.756,00	$ 210.203,20	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	40,00	40,00		$ 40.429,00	$ 1.617.160,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	14,56	14,56		$ 24.883,00	$ 362.396,48	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	31,59	31,59		$ 4.508,00	$ 142.407,72	$ -	100,00%	100,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	9,88	9,88		$ 21.852,00	$ 215.897,76	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	9,88	9,88		$ 203.467,00	$ 2.009.256,57	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO HUESO. INCLUYE INSTALACIÓN EN BRONCE	M	69,07	69,07		$ 43.533,00	$ 2.777.461,84	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	95,50	95,50		$ 22.997,00	$ 2.196.213,50	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC- ANCHO 10 CM	M	93,07	93,07		$ 23.735,00	$ 2.209.616,45	$ -	100,00%	100,00%	
	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO EXISTENTES	M2	27,42	27,42		$ 67.537,00	$ 1.851.972,60	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,30	37,30		$ 40.967,00	$ 1.527.933,91	$ -	100,00%	100,00%	ESTUCO
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN LUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	37,30	37,30		$ 20.875,00	$ 778.568,61	$ -	100,00%	100,00%	ESPONJA
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	30,00		$ 40.429,00	$ 1.212.870,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	68,02	68,02		$ 4.508,00	$ 306.627,96	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	699	SED	EMERGENCIA DE TUNJUELITO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	25,00	25,00		$ 30.066,00	$ 751.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA e= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	20,00		$ 72.193,00	$ 1.443.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 20.015,00	$ 400.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3,00		$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATEN EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	5,00		$ 18.061,00	$ 90.305,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12,00		$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,88	0,88		$ 66.108,00	$ 84.766,55	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO (D) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0,25		$ 183.945,00	$ 45.986,21	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO (0.5 X 60 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR	M	5,00	5,00		$ 334.957,00	$ 1.674.785,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,00	2,00		$ 7.012,00	$ 14.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	90,00	90,00		$ 14.353,00	$ 1.291.770,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,10	30,10		$ 64.398,00	$ 1.938.579,80	$ -	100,00%	100,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN LUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	90,00	90,00		$ 20.875,00	$ 1.878.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA. ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M	3,00	3,00		$ 319.190,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 68.873,00	$ 1.377.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	120,00		$ 40.429,00	$ 4.851.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	150,00		$ 4.508,00	$ 676.200,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	699	SED	EMERGENCIA DE SALUDCOOP SUBA - SUBA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 6.953,00	$ 340.697,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 18.852,00	$ 923.748,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	49,00		$ 127.792,00	$ 6.261.808,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	50,00	50,00		$ 6.814,00	$ 290.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRADOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	49,00		$ 72.800,00	$ 3.567.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	35,00		$ 26.248,00	$ 918.680,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	35,00		$ 25.380,00	$ 888.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	8,75		$ 39.822,00	$ 348.442,50	$ -	100,00%	100,00%	
	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACION Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN)	M2	49,00	49,00		$ 97.031,00	$ 4.753.538,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15,00		$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	49,00		$ 4.508,00	$ 220.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP-003	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA COCINA – ZONA DE LAVADO Y ALMACÉN, COMPUESTO POR CAMPANA TIPO HONGO 2200/3PH, EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, VENTILADOR AXIAL, RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA, REJILLAS DE EXTRACCIÓN Y RETORNO, ACCESORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, APERTURAS Y PASOS EN MURO O PLACA, INCLUYE MONTAJE, SOPORTERÍA, SELLADOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINI SPLIT EXISTENTES EN COCINA DEL COLEGIO HERNAN DUSAN DUSSAN LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C.	UN	1,00	1,00		$ 47.097.726,00	$ 47.097.726,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	823	SED	INFRAESTRUCTURA COLEGIO ROSA MARIA CORDILLO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.15M A 0.20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	1,90	1,90	0,00	$ 108.649,00	$ 206.053,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATEN EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE	M	8,60	8,60	0,00	$ 18.061,00	$ 155.324,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,76	0,76	0,00	$ 96.108,00	$ 73.042,08	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.5	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (INCLUYE REFUERZO)	M	3,85	3,85	0,00	$ 156.356,00	$ 601.770,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM.	M	3,80	3,80	0,00	$ 374.827,00	$ 1.424.380,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO	M	1,80	1,80	0,00	$ 164.023,00	$ 623.287,40	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM DE 0.15 X 0.15 M	KG	38,57	38,57	0,00	$ 7.477,00	$ 313.217,07	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-U Y ACCESORIOS	M	0,80	0,80	0,00	$ 88.516,00	$ 70.812,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	3,00	0,00	$ 73.531,00	$ 220.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	8,60	8,60	0,00	$ 26.248,00	$ 225.732,80	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1,52	1,52	0,00	$ 377.538,00	$ 573.857,76	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	4,20	4,20	0,00	$ 4.508,00	$ 18.933,60	$ -	100,00%	100,00%	

	CPE	171	SED	INFRAESTRUCTURA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cuberta de aulas)	M2	0,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	(106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,99	0	0	$ 4.147,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACRO	M2	2,01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.661,29	49,75%	49,75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	1,01	1	0	$ 71.645,00	$ 71.645,00	$ 72.357,45	49,75%	49,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	CM	0,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,60	35	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	0,00	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	(13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

	CPE	884	SED	EMERGENCIA COLEGIO COSENA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,60	28,60		$ 24.868,00	$ 711.224,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,40	17,40	17,40	$ 30.684,00	$ 533.901,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20 ENTAMBORADO DE 1"	M2	39,70	39,70	39,70	$ 956.124,00	$ 37.958.122,80	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	6,30	6,30	6,30	$ 1.033.647,00	$ 6.511.976,10	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,00	46,00	46,00	$ 4.508,00	$ 207.368,00	$ -	100,00%	100,00%	

FECHA:	30/06/2026	INFORME SEMANAL 30	UNIOBRAS DEL ORIENTE
DIAS RESTANTES	31		
CORTE DEL INFORME:	*28/06/2026*		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	30	**DEL**	22-jun-26	**AL**	28-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adición #1	$ 83.867.649,00	**Adición #1**	0
Adición #2	$ 184.210.953,00	**Adición #2**	0
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	2 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							**ACTIVIDADES**	
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	
1	RAFAEL URIBE URIBE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Finalizada	
2	LA FLORESTA SUR	83,20%	83,20%	100,00%	98,75%	-1,25%	Actividades excavacion manual	
3	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Finalizada	
4	CARLOS ARTURO TORRES	61,25%	75,02%	100,00%	77,08%	-22,92%	Actividades de instalación de reja metalica tipo persiana en cuarto debombas.	
5	CARLOS ARTURO TORRES	89,41%	71,68%	74,20%	75,80%	1,60%	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.	
6	FRANCISCO DE MIRANDA	49,79%	88,88%	100,00%	98,61%	-1,39%	Actividades de emboquillado de psisos, retiro de escombros, instlacion de iluminacion y cielo raso.	
7	RUFINO JOSE CUERVO	88,34%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Finalizada	
8	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	0,00%	0,00%	0,56%	1,18%	0,62%	Alistado de pendientado	
TOTALES		**71,50%**	**77,35%**	**84,35%**	**81,43%**			

3. RESUMEN FINANCIERO

RAFAEL URIBE URIBE

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 379.161.858	$ 379.161.858	$ -		0,00%	100,00%

LA FLORESTA SUR

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 90.435.499	$ 89.308.499	**$ 1.127.000**		0,00%	98,75%

CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 360.826.308	$ 360.826.308	$ -		0,00%	100,00%

CARLOS ARTURO TORRES

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 286.610.676	$ 220.926.924	**$ 65.683.751**		77,08%	77,08%

CARLOS ARTURO TORRES

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 237.774.666	$ 180.238.706	**$ 57.535.959**		0,00%	75,80%

FRANCISCO DE MIRANDA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 164.087.463	$ 161.802.315	**$ 2.285.148**		98,61%	98,61%

RUFINO JOSE CUERVO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 143.354.767	$ 143.354.767	$ -		0,00%	100,00%

JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 248.315.879	$ 2.937.710	**$ 245.378.169**		1,18%	1,18%

EMERGENCIAS


BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 311.005.352	$ 187.339.519	**$ 123.665.833**		#¡REF!	60,24%

FECHA:	30/06/2026	**INFORME SEMANAL 30**	
DIAS RESTANTES	**31**		
CORTE DEL INFORME:	***28/06/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	30	**DEL**	22-jun-26	**AL**	28-jun-26

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

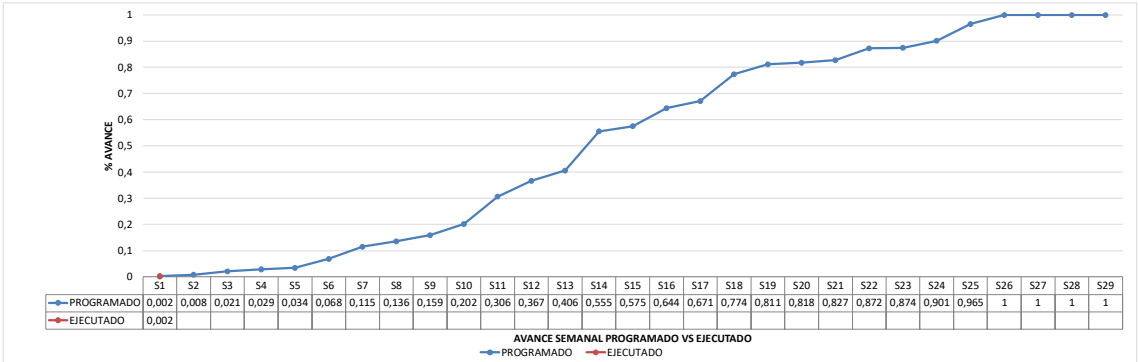

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
PROGRAMADO	0,002	0,008	0,021	0,029	0,034	0,068	0,115	0,136	0,159	0,202	0,306	0,367	0,406	0,555	0,575	0,644	0,671	0,774	0,811	0,818	0,827	0,872	0,874	0,901	0,965	1	1	1	1
EJECUTADO	0,002																												

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N.A

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- JOSE MARIA CORDOBA :Finalizada
  RAFAEL URIBE URIBE : Finalizada
  CARLOS ARTURO TORRES SEDE B: Actividade de trabajo en cancha.
  RUFIJO JOSE CUERVO:Actividades, Finalizada
  CARLOS ARTURO TORRES SEDE A: Actividades de remates en cuarto de bombas
  FRANCISCO MIRANDA:Actividades acabados en baños y cieloraso
  LA FLORESTA SUR:Actividades finalización de actividades.

  EMERGENCIA OEA:Finalizada.
  EMERGENCIA DILE TUNJUELITO:Finalizada
  EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN: finalizada
  EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA:Finalizada
  EMERGENCIA CODEMA: finalizada
  EMERGENCIA ROSA MARIA GORDILLO:finalizada
  EMERGENCIA TON ADAMS: Actividades de cambio de manto asfaltico
  EMERGENCIA ISLA DEL SOL en revisión por parte del contratista
  EMERGENCIA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVERA en revisión por parte del contratista
  EMERGENCIA BICENTENARIO en revisión por parte del contratista
  EMERGENCIA RUFINO JOSE CUERVO en revisión por parte del contratista

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se realiza revision de actividades en colegios : Jose maria cordoba, Rafael uribe uribe, Carlos arturo torres sede B, Rufino jose cuervo,Carlos arturo torres sede A,Fancisco Miranda, La floresta
2.se realiza revision cantidades
3.se realiza revision de correspondecia
4.se realizan observaciones a requerimientos tecnicos del contratista
5.se realiza informe semanal
6. se le envia al contratista nuevas emergencias

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se mantuvo el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Interventoría para el desarrollo seguro de las labores.
De igual manera, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en la Institución Educativa Carlos Arturo Sede B, donde se evidenció el avance de la demolición de la cancha. Durante la visita de inspección se verificó que el personal contaba con la dotación y los EPP requeridos para el desarrollo de las actividades.
Asimismo, se realizó seguimiento a la Institución Educativa Carlos Albán Holguín, donde se evidenciaron labores de demolición del muro en la zona de preescolar. Como resultado de la inspección, se recomendó al Contratista implementar el cerramiento perimetral del área intervenida.
De igual manera, se verificaron las actividades desarrolladas en la Institución Educativa Tom Adams, donde la Interventoría solicitó al Contratista efectuar el retiro del cerramiento temporal, los andamios y la totalidad de los RCD remanentes, con el propósito de dejar el área en condiciones adecuadas para su entrega.
Finalmente, se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en la emergencia de la Institución Educativa Carlos Albán Holguín, donde se reiteró la recomendación al Contratista de fortalecer la supervisión sobre el uso adecuado y permanente de los EPP, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución de las labores. Total
de horas hombres trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0
REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 15

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Tom Adams: Se realiza visita inicial en el frente, por lo que se recomienda durante las actividades garantizar la adecuada separación, señalización del acopio y disposición de los residuos, mantener los frentes de obra limpios y libres, realizar el cerramiento perimetral y señalizar la zona de trabajo al igual que cumplir todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED OEA: Se realiza visita inicial en el frente, por lo que se recomienda durante las actividades garantizar la adecuada separación, señalización del acopio y disposición de los residuos, mantener los frentes de obra limpios y libres, realizar el cerramiento perimetral y señalizar la zona de trabajo al igual que cumplir todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Carlos Arturo Sede B: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos y material de construcción, por lo que se recomendó al contratista realizar el retiro de todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
IED La floresta Sur: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos y material de construcción, por lo que se recomendó al contratista realizar el retiro de todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
IED Carlos Holguín: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos y material de construcción, por lo que se recomendó al contratista disponer todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

OTROS

ING JAVIER ALEJANDRO MAESTRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ HARRY ARNAGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	30/06/2026	**INFORME SEMANAL 30**	UNIOBRAS DEL ORIENTE
DIAS RESTANTES	**31**		
CORTE DEL INFORME:	***28/06/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	30	**DEL**	22-jun-26	**AL**	28-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adición #1	$ 83.867.649,00	**Adición #1**	0
Adición #2	$ 184.210.953,00	**Adición #2**	0
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	2 MESES
Suspensión	1 (13/05/2026 AL 28/05/2026)	**Suspensión**	1 (13/05/2026 AL 28/05/2026)

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

CPF	COLEGIO	SEDE	CONTRATO DE OBRA	LOCALIDAD	Silviculturales	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	ESTADO	ALCANCE	FECHA INICIO ATENCION EMERGENCIA	FECHA TERMINACION Y ENTREGA AL COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO
878	HERNANDO DURAN DUSAN	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Se presentan filtraciones en la placa de la biblioteca, aparentemente por deficiencia en la impermeabilización de la cubierta y fisuras en la torta inferior de la placa.	5-dic.-25	09/04/2026	$ 19.421.102,74
878	HERNANDO DURAN DUSAN	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	problemas de condensación y confort térmico al interior de la cocina	26-mar.-26	09/04/26	$ 52.589.226,00
807	O.E.A	B	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Comedor escolar: Relacionada con hallazgos en la zona de cocina, que incluyen la necesidad de instalación de medias cañas, deterioro de pisos porosos y adecuación del techo interior del baño ubicado dentro de la cocina.	5-dic.-25	09/04/26	$ 20.381.480,89
807	O.E.A	B	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Ficha 2 – Placa de cubierta aula de preescolar: Correspondiente a la necesidad prioritaria de cambio del piso sobre placa de cubierta del aula, que presenta deterioro y filtraciones que afectan gravemente el aula, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de los estudiantes.	5-dic.-25	09/04/26	$ 20.066.180,12
863	KENNEDY	D	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Atención de obras por emergencia debido a las siguientes novedades presentadas y evidenciadas en campo: Taponamiento de redes sanitarias. En baterías sanitarias se encuentran sifones tapados, así mismo en cuarto de lavado de traperos. Taponamiento de caja de aguas lluvias, cajas de inspección existentes al momento de la obra las dejaron selladas y no es posible el mantenimiento e inspección de estas. Taponamiento de la red de aguas lluvias. Desnivel hacia el centro de la cancha (zona dura) no tiene una pendiente adecuada que conduzca las aguas lluvias, así mismo la red existente no funciona.	20-mar.-26	09/04/26	$ 4.428.105,12
627	DIRECCION LOCALTUNJUELITO		CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	100,00%	finalizado	presenta un problema importante de humedades en canales y bajantes de la fachada principal,. Adicional al encontrarse 50 cm por debajo del nivel del anden es vulnerable a innundaciones constantemente. De igual forma posterior al sismo del pasado 8 de junio del 2025, trea muros del Edificio (Oficina atencion al ciudadano y) sufrieron afectacion importante presentando varias	12-dic.-25	09/04/26	$ 17.760.044,55
826	JACKELINE	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	Silviculturales	100,00%	finalizado	TALA DE ARBOLES	9-dic.-25	09/04/26	$ 2.700.093,99
818	CASTILLA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	El 26 de Enero de 2026 la rectora de IED reportó presencia de abejas en un punto de las instalaciones, indicando la afectación a la comunidad educativa con un episodio de picadura de abejas a un estudiante. La rectora, Manifiesta que bomberos hizo la visita correspondiente indicando que, como los panales se encuentran	6/2/2026	09/04/26	$ 27.977.145,65
884	CODEMA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	100,00%	finalizado	Espacio: Baterias sanitarias y circulaciones tercer pisoTema: Filtraciones por fugas de aguas residuales en baños y filtraciones en circulaciones de tercer pisoSituación:Serealizaactualizacióndelafichadeobraprioritariare mitidaenoctubrede2025,todavezqueseguneIrecorridorealizadoel30deenerode2026con el contratista de obra e interventoría, el alcance contemplado corresponde unicamente a diviones de las	23/3/2026	09/04/26	$ 45.922.593,29
604	RAFAEL URIBE URIBE	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	100,00%	finalizado	Durante la visita técnica a la zona de cocina se evidenció que el sistema de válvulas de suministro de gas se encuentra empotrado en el muro, presentando deterioro visible, presencia de residuos de combustión (hollín) y condiciones que dificultan su correcta operación y mantenimiento.	25/3/2026		$ 226.158,40
840	TOM ADAMS	B	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	50,00%	En proceso	Se presenta una emergencia derivada de las fuertes lluvias registradas hacia el mediodía en la localidad de Kennedy, las cuales incrementaron las filtraciones en la placa de cubierta del segundo piso de la IED Colegio Tom Adam – Sede B. Durante el evento de lluvia se recibió visita de la Secretaría de Salud,	27/04/2026	22/05/25	$ 62.000.000,00
701	CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	CO1.PCCNTR.8155154	Bosa	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Desde el dia 3 de Febrero de 2026, reportaron un agrietamiento en un muro de mamposteria de 1.80 de alto aproximadamente, de la seccion del bloque Primaria del colegio sede A, este muro divide el area de recreacion de los	11/05/2026	20/05/26	$ 7.771.172,92
621	ISLA DEL SOL	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Se requiere la intervención integral de mantenimiento correctivo en el área de cafetería y espacios adyacentes de la sede del Colegio Isla del Sol IED, orientada a restablecer condiciones adecuadas de salubridad, inocuidad alimentaria y funcionamiento de la infraestructura. Lo anterior, teniendo en cuenta que, conforme al diagnóstico técnico de inspección No	-	-	$ 3.311.453,73
621	ISLA DEL SOL	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Se requiere habilitar la conexión funcional entre el bloque antiguo y el bloque nuevo mediante el retiro del tramo de reja metálica existente, con el fin de garantizar principalmente la limpieza y aseo, y posteriormente la circulación dentro de la institución.	-	-	$ 5.605.522,00
763	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Bosa	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Se requiere barrera visual en Acceso a Baños de Primera Infancia dada la vulnerabilidad de los mismos. En total son 6 baños con esta problemática. Requerimiento de Secretaria de Salud. Mediante Comunicado S-2025-101760 la DCCEE dio respuesta al Administrador una vez validado por grupo de	-	-	$ 7.844.243,52
611	RUFINO JOSE CUERVO	A	CO1.PCCNTR.8155154	Tunjuelito	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	En la institución se determinó que la presencia de roedores tiene carácter transitorio, asociada principalmente a la inadecuada disposición de residuos por parte de establecimientos comerciales en el entorno. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de garantizar condiciones de hermeticidad al interior de las aulas, se requiere la instalación de barreras en la parte inferior de las puertas, el sellamiento de juntas entre muros y cubierta en aulas de preescolar, el sellado de pasamuros y elementos de la estructura metálica, así como el cerramiento de las bandejas	-	-	$ 7.000.000,00
759	BRASILIA	D	CO1.PCCNTR.8155154	BOSA	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	El Colegio Brasilia, Sede D, presenta deficiencias en la zona de la terraza debido a filtraciones que afectan la prestación del servicio y requieren mantenimiento. Las visitas realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Salud a la IED han generado un concepto desfavorable de manera reiterada. Asimismo, debido a	-	-	-
837	MANUEL ZAPATA OLIVERA	A	CO1.PCCNTR.8155154	Kennedy	OBRA	0,00%	SIN INICIAR	Deacuerdoconlaverificaciónrealizada,seidentificóquelaproblemáticaseconcentraprincipalmenteenlafranja verdealedañaalcerramientodelcolegio,zonaquepresentafacilidadde ingresosubterráneoderoedoresdebidoa las condiciones del terreno, lacercanía apuntos dedisposición inadecuadaderesiduos	-	-	$ 31.285.766,67

FECHA:	30/06/2026	**INFORME SEMANAL 30**	
DIAS RESTANTES	**31**		
CORTE DEL INFORME:	***28/06/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Colegio Jose Maria Cordoba



mantenimiento ventanas




mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas

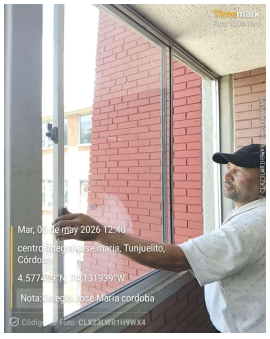

mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas
