

Colegio Rafael Uribe Uribe



construccion tapa caja

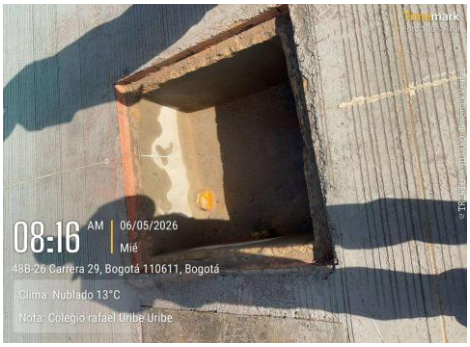

instalacion pis chips

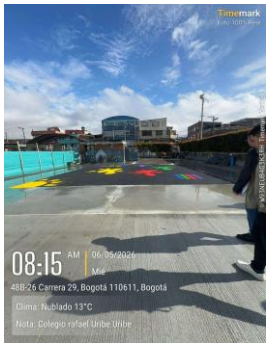

rejilla carcamo



instalacion pis chips



rejilla carcamo




Instalacion de puertas

Colegio Carlos arturo torres sede B




remates cielo raso

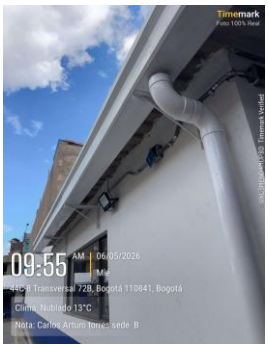


Pintura muros



Pintura muros

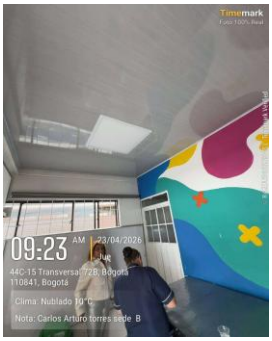

Pintura muros

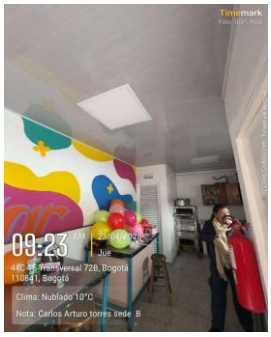

remates generales



remates generales


Colegio Rufino Jose Cuervo



remates piso chips



remates piso chips

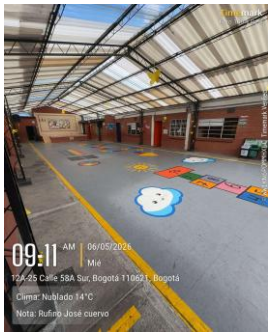


pintura plazoleta



pintura corredores



remates piso chips

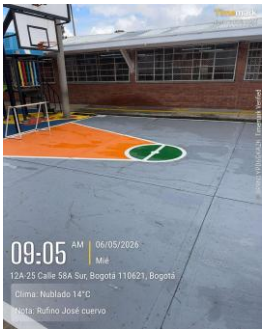

remates piso chips

Colegio Carlos arturo torres sede A



remates pinturas portones



remates pinturas portones



remates pinturas portones



retiro de cubierta



Cuarto de bombas.



estructura cubierta

Colegio Fracisco de Miranda



Acabado de media caña.



Acabado de sanitarios



Acabado en baños



Acabado en baños



Instalación de luminarias



Boquilla de piso.


Colegio La Florestas sur sede A



construccion cajas



construccion cajas

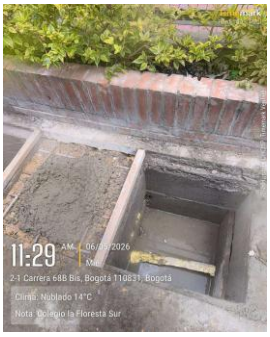

construccion cajas



construccion cajas



retiro de escombros



cajas de inspeccion

Emergencia Colegio Tom Adams



Aplicación de emulsión asfaltica.



Aplicación de emulsión asfaltica.



Aplicación de emulsión asfaltica.



Aplicación de emulsión asfaltica.

San Carlos



Corte de muro.



Corte de muro.



Corte de muro.



Corte de muro.

FECHA: 30/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 31 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		GRUPO 8

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
28 de junio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026
MODIFICACIÓN	29 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	29 de septiembre de 2026	29 de julio de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES	16	16
PRÓRROGAS	123	61
ADICIÓN	0	0
TOTAL	350	288

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
ADICIÓN #1	$ 83.867.649,00	$ -
ADICIÓN #2	$ 184.210.953,00	$ -
TOTAL	$ 1.064.357.530,00	$ 2.497.896.864,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-44-10107579	14 10 2025	14 5 #####

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROGR	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	100%	100%	100,00%	✓	$ 379.161.857,50	$ 379.161.857,50	3/12/2025	4/04/2026																		
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	96,75%	96,75%	100,00%	✓	$ 90.435.498,86	$ 89.308.498,86	3/12/2025	4/05/2026																		
681	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	Jose Maria Cordoba	100%	100%	100,00%	✓	$ 360.826.307,94	$ 360.826.307,94	4/11/2025	4/03/2026																		
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	75,12%	77,18%	100,00%	✓	$ 286.610.575,64	$ 220.926.324,34	13/01/2026	13/04/2026																		
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	71,68%	75,80%	74,20%	✓	$ 237.774.665,66	$ 180.238.706,41	4/11/2025	4/04/2026																		
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	88,88%	98,51%	100,00%	✓	$ 164.087.463,27	$ 161.802.315,27	13/01/2026	13/05/2026																		
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	100%	100%	100,00%	✓	$ 143.354.766,88	$ 143.354.766,88	13/01/2026	13/04/2026																		
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,96%	1,18%	0,96%	✓	$ 248.315.879,08	$ 2.937.710	16/12/2025	15/04/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						81,43%	84,35%	✓	$ 1.910.567.115	$ 1.538.557.087																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	100%	100%	100,00%	✓	$ 62.744.678,00	$ 62.744.678,00	5/12/2025	23/12/2025																		
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	100%	100%	100,00%	✓	$ 13.410.600	$ 13.410.600	5/12/2025	21/12/2025																		
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa Maria Gordillo	100%	100%	100,00%	✓	$ 1.732.929	$ 1.732.929																				
884	CODEMA	Kennedy	A	Dario Echandia - CODEMA	100%	100%	100,00%	✓	$ 45.822.999	$ 45.822.999	18/03/2026	30/12/2026																		
627	D.T.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100%	100%	100,00%	✓	$ 2.905.993	$ 2.905.993	12/12/20205	30/12/2025																		
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100%	100%	100,00%	✓	$ 2.399.434	$ 2.399.434	9/12/20255	12/12/2025																		
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100%	100%	100,00%	✓	$ 44.218.065,51	$ 44.218.066	6/02/2026	13/02/2026																		
611	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	A	Rufino José Cuervo		0,00%	0,00%	✓	$ 7.000.000	$ -																				
878	HERNANDO DURAN DUSAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)		100%	100,00%	✓	$ 7.222.260,00	$ 7.222.260,00																				
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 7.844.243,62	$ -																				
837	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Kennedy	A	Patio Bonito II	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 31.285.766,67	$ -																				
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	100%	100%	100,00%	✓	$ 6.344.315,01	$ 6.344.315																				
604	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	A	Unid.Bas.Rafael Uribe Uribe	100%	100%	100,00%	✓	$ 226.158,40	$ 226.158,40																				
840	TOM ADAMS	Kennedy	B	San Jorge	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 61.159.761,59	$ -																				
621	ISLA DEL SOL	Tunjuelito	A	Isla del Sol	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 3.311.453,73	$ -																				
621	ISLA DEL SOL	Tunjuelito	A	Isla del Sol	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 5.605.522,00	$ -																				
701	CARLOS ALBAN HOLGUIN	Bosa	A	Carlos Albán Holguín	10,00%	4,02%	4,02%	✓	$ 7.771.172,92	$ 312.087																				
TOTAL FRENTES DE OBRA						59%	37,19%	✓	$ 311.005.352	$ 187.339.519																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
3	5	0	8	$ 1.538.557.087
ACUMULADO EMERGENCIAS				
10	1	6	17	$ 187.339.519
TOTAL				
13	6	6	25	$ 1.725.896.606
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		5	-	11		22		33		5	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	81,43%	#¡DIV/0!	89,24%
PROGRAMADO	84,35%		
ATRASO	-2,92%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO






AVANCE DE LOS FRENTES

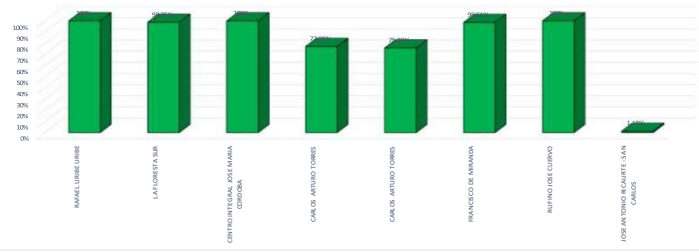

OBSERVACIONES:

FECHA:	30/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	31 Días				
REGISTRO FOTOGRAFICO				GRUPO 8	0
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
28/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Finalizada				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Finalizada				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Finalizada				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de instalación de reja metalica tipo persiana en cuarto debombas.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades de emboquillado de psisos, retiro de escombros, instlacion de iluminacion y cielo raso.				

Colegio La floresta	CANCHA	Actividades excavacion manual				
San Carlos	TERRAZA	Corte de muro				
Tom Adams	TERRAZA	Alistado de pendientado				
Carlos Albán Holguin	MURO	Demolicióndе muro				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025/09
GRUPOS	ITEM	OFF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE	SEMANA				

		Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paredes de madera 2 "x4" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No.18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica diaria del estado lona.	M	120,00	120,00		$ 30.064,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.5	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE 0= 0.03 HASTA 0= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	1,00		$ 74.193,00	$ 74.193,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,53	31,58		$ 28.455,00	$ 611.558,65	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELA CON PASSO DE 3,50 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	1,00		$ 36.193,00	$ 122.897,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,24	0,24		$ 96.300,00	$ 23.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,48	0,48		$ 96.300,00	$ 46.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.3	EXCAVACIÓN MECANICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2.552,88	2.552,88		$ 83.549,00	$ 213.271.746,12	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,24	0,24		$ 22.675,00	$ 5.442,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.7	RELLENO SOBRAS COMPACTADO TIPO MANUAL (SUMINISTRO, ALTURAS, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	0,24	0,24		$ 174.750,00	$ 41.940,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRAS GRANULAR TIPO SUB (SUMINISTRO, ALTURAS, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	125,06	125,064		$ 150.995,00	$ 22.292.605,48	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRAS GRANULAR TIPO BASE (SUMINISTRO, ALTURAS, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	125,06	125,064		$ 174.750,00	$ 25.824.624,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	22,96		$ 100.453,00	$ 2.328.003,88	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.10	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DESDE 0= 0.11 HASTA 0= 0.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,40	5,40		$ 206.586,00	$ 1.116.056,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.11	PICADA CON MARTILLO DE 10 LIB - CUBIERTAS DESDE 0= 0.05 HASTA 0= 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,20	21,20		$ 110.286,00	$ 2.338.063,80	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.12	PICADA CON MARTILLO DE 10 LIB - CUBIERTAS DESDE 0= 0.05 HASTA 0= 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	148,09	148,09		$ 102.353,00	$ 15.156.186,77	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.13	DESCARGANA MANUAL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	22,96	22,96		$ 28.950,00	$ 664.608,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 0.11 HASTA 0= 0.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	43,54	43,54		$ 109.767,00	$ 4.779.301,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO EN REFORZADO DE MINIMO 1M	Kg	2.660,17	2.660,17		$ 7.812,00	$ 20.778.617,28	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, 0M X 0.15 X 0.15 M	Kg	1.012,47	1.012,47		$ 7.812,00	$ 7.909.218,84	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORDÓN PVC-R	M	11.097	11.097		$ 38.143,00	$ 423.352.671,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.4	LOSA EN PROFUNDIDAD 80 X 80 EN MAMPOSTERIA (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI)	UN	1,00	1,00		$ 98.143,00	$ 1.177.716,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.5	LOSA EN PROFUNDIDAD 80 X 80 EN MAMPOSTERIA (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI)	UN	1,00	1,00		$ 98.143,00	$ 98.143,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL 0.15 X 0.30M	M2	604,84	604,84		$ 12.255,00	$ 7.412.278,20	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	M	604,84	604,84		$ 5.813,00	$ 3.515.181,92	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTADO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN	2,00	2,00		$ 166.229,00	$ 332.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.3	SALIDA PARA LÁMPARA EMPOTRADA TIPO "RONDINE" TIPO INSTITUCIONAL, CON CAJA DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN	1,00	1,00		$ 97.128,00	$ 97.128,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMEBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERIA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	96,00	96,00		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" - INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA	M	22,50	22,50		$ 22.543,00	$ 507.217,50	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE 3 HILOS DE AISLAMIENTO SENCILLO 3X12 (+) 3X12 (N) + 1X12 (T) AWG	UN	8,00	8,00		$ 195.276,00	$ 1.562.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED 18 A 20 W	UN	8,00	8,00		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTRA O SOBREPUESTO, 72MP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºH+40ºC VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	8,00	8		$ 62.384,00	$ 499.072,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.50	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN 3#8+1 #10 CU(AL) DESDE EL MEDIDOR(ES) INCLUYE CONDUCTORES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y ACCESORIOS	M	96,00	96,00		$ 62.414,00	$ 5.991.744,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.52	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TAPA Y ACCESORIOS	UN	1,00	1		$ 7.451,00	$ 10.022.676,85	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS PVC'S	UN	11,00	11		$ 98.143,00	$ 1.127.730,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.54	LUMINARIA TIPO LED 30 A 40 W MONOPOLO 5 MTS - INCLUYE TAPA PARA FABRICANTE	UN	1,00	1		$ 98.143,00	$ 98.143,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	UN	1,00	1		$ 98.143,00	$ 98.143,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.6.14	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y ALISADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALUMINADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 0= 10 CM	M2	255,89	255,89		$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%	
	2.6.19	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO DE CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	244,25	244,25		$ 36.868,00	$ 9.770.529,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM (INCLUYE CARPINTERIA EN ALUMINIO TIPO CORTINERO, 2" X 2" PARA SITIO DE VIDRIO)	M2	60,29	8,7		$ 998.180,00	$ 8.705.723,28	$ -	100,00%	100,00%	
	2.7.28	DEMOLICIÓN CON PERFORADORA NEUMÁTICA MEDIANA TIPO 34 KG/M2 DE ESPESOR (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	78,43	78,43		$ 59.987,00	$ 4.706.750,41	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO DE LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TESO LLAVE EXTERIOR Y MANIJA/PERILLA INTERNA. DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y FUGITOLA DE SELLADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y Nº DE HOJAS	M2	8,88	8,8848		$ 965.300,00	$ 8.092.563,76	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO O ANCHO 60CM	M	42,70	42,70		$ 164.023,00	$ 7.003.782,10	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.2	ANCLADO PARRILLA 1/4" - LONGA 30 (INCLUYE, PERFORACIONES, EPOXICO Y ANCLO)	UN	960,00	960,00		$ 9.450,00	$ 9.072.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC'S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,00	4,00		$ 107.143,00	$ 428.572,00	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.8	CAJA DE INSPECCION 600 X 600 EN MAMPOSTERIA - INCLUYE TAPA PARA FABRICANTE	UN	4,00	4,00		$ 1.107.400,00	$ 4.429.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.22	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	655,00		$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.28	DEMOLICIÓN CON PERFORADORA NEUMÁTICA MEDIANA TIPO 34 KG/M2 DE ESPESOR (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	220,08	220,08		$ 39.987,00	$ 8.799.676,98	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HIRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 1/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y Nº DE HOJAS	M2	23,52	23,52		$ 761.317,00	$ 17.902.412,64	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOS O INFERIOR Y VIDRIO, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SEGÚN JAPUCA CEDÚLA CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	21,53		$ 464.504,00	$ 10.000.771,12	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.6	PUNTO DE ACOMETIDA TIPO PUNTUAL	UN	5,00	5,00		$ 595.571,00	$ 2.977.855,00	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TÉRMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECONDOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	10,47		$ 129.084,00	$ 1.351.109,48	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	10,14		$ 240.910,00	$ 2.442.827,40	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	50,00	50,00		$ 4.500,00	$ 225.000,00	$ -	100,00%	100,00%	

		OFF	IED	LA FLORESTA SUR		SEMANA				

		Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paredes de madera 2 "x4" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No.18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica diaria del estado lona.	M	120,00	120,00		$ 30.064,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.5	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE 0= 0.03 HASTA 0= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	1,00		$ 74.193,00	$ 74.193,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,53	31,58		$ 28.455,00	$ 611.558,65	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELA CON PASSO DE 3,50 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,50	3,50		$ 36.193,00	$ 122.897,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,24	0,24		$ 96.300,00	$ 23.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,48	0,48		$ 96.300,00	$ 46.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.3	EXCAVACIÓN MECANICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2.552,88	2.552,88		$ 83.549,00	$ 213.271.746,12	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,24	0,24		$ 22.675,00	$ 5.442,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.7	RELLENO SOBRAS COMPACTADO TIPO MANUAL (SUMINISTRO, ALTURAS, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	0,24	0,24		$ 174.750,00	$ 41.940,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRAS GRANULAR TIPO SUB (SUMINISTRO, ALTURAS, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	125,06	125,064		$ 150.995,00	$ 22.292.605,48	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRAS GRANULAR TIPO BASE (SUMINISTRO, ALTURAS, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	125,06	125,064		$ 174.750,00	$ 25.824.624,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	22,96		$ 100.453,00	$ 2.328.003,88	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.10	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DESDE 0= 0.11 HASTA 0= 0.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,40	5,40		$ 206.586,00	$ 1.116.056,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.11	PICADA CON MARTILLO DE 10 LIB - CUBIERTAS DESDE 0= 0.05 HASTA 0= 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,20	21,20		$ 110.286,00	$ 2.338.063,80	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.12	PICADA CON MARTILLO DE 10 LIB - CUBIERTAS DESDE 0= 0.05 HASTA 0= 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	148,09	148,09		$ 102.353,00	$ 15.156.186,77	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.13	DESCARGANA MANUAL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	22,96	22,96		$ 28.950,00	$ 664.608,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 0.11 HASTA 0= 0.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	43,54	43,54		$ 109.767,00	$ 4.779.301,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO EN REFORZADO DE MINIMO 1M	Kg	2.660,17	2.660,17		$ 7.812,00	$ 20.778.617,28	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, 0M X 0.15 X 0.15 M	Kg	1.012,47	1.012,47		$ 7.812,00	$ 7.909.218,84	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORDÓN PVC-R	M	11.097	11.097		$ 38.143,00	$ 423.352.671,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.4	LOSA EN PROFUNDIDAD 80 X 80 EN MAMPOSTERIA (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI)	UN	1,00	1,00		$ 98.143,00	$ 1.177.716,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.5	LOSA EN PROFUNDIDAD 80 X 80 EN MAMPOSTERIA (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI)	UN	1,00	1,00		$ 98.143,00	$ 98.143,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL 0.15 X 0.30M	M2	604,84	604,84		$ 12.255,00	$ 7.412.278,20	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	M	604,84	604,84		$ 5.813,00	$ 3.515.181,92	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTADO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN	2,00	2,00		$ 166.229,00	$ 332.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.3	SALIDA PARA LÁMPARA EMPOTRADA TIPO "RONDINE" TIPO INSTITUCIONAL, CON CAJA DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN	1,00	1		$ 97.128,00	$ 97.128,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMEBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERIA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	96,00	96,00		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" - INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA	M	22,50	22,50		$ 22.543,00	$ 507.217,50	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE 3 HILOS DE AISLAMIENTO SENCILLO 3X12 (+) 3X12 (N) + 1X12 (T) AWG	UN	8,00	8,00		$ 195.276,00	$ 1.562.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED 18 A 20 W	UN	8,00	8,00		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTRA O SOBREPUESTO, 72MP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºH+40ºC VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	8,00	8,00		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.50	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN 3#8+1 #10 CU(AL) DESDE EL MEDIDOR(ES) INCLUYE CONDUCTORES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y ACCESORIOS	M	96,00	72,85		$ 62.414,00	$ 4.546.984,10	$ 1.444.759,90	75,89%	75,89%	
	2.5.52	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, INCLUYE CAJA, CONECTORES, TAPA Y ACCESORIOS	UN	1,00	1,00		$ 7.451,00	$ 7.451,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS PVC'S	UN	11,00	11,00		$ 98.143,00	$ 1.079.573,00	$ 47.557,00	95,79%	95,79%	
	2.5.54	LUMINARIA TIPO LED 30 A 40 W MONOPOLO 5 MTS - INCLUYE TAPA PARA FABRICANTE	UN	1,00	1,00		$ 98.143,00	$ 98.143,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.5.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	UN	1,00	1,00		$ 98.143,00	$ 98.143,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.6.14	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y ALISADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALUMINADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 0= 10 CM	M2	255,89	255,89		$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%	
	2.6.19	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO DE CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	244,25	244,25		$ 36.868,00	$ 9.770.529,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM (INCLUYE CARPINTERIA EN ALUMINIO TIPO CORTINERO, 2" X 2" PARA SITIO DE VIDRIO)	M2	60,29	8,7		$ 998.180,00	$ 8.705.723,28	$ -	100,00%	100,00%	
	2.7.28	DEMOLICIÓN CON PERFORADORA NEUMÁTICA MEDIANA TIPO 34 KG/M2 DE ESPESOR (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	78,43	78,43		$ 59.987,00	$ 4.706.750,41	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO DE LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TESO LLAVE EXTERIOR Y MANIJA/PERILLA INTERNA. DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y FUGITOLA DE SELLADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y Nº DE HOJAS	M2	8,88	8,8848		$ 965.300,00	$ 8.092.563,76	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO O ANCHO 60CM	M	42,70	42,70		$ 164.023,00	$ 7.003.782,10	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.2	ANCLADO PARRILLA 1/4" - LONGA 30 (INCLUYE, PERFORACIONES, EPOXICO Y ANCLO)	UN	960,00	960,00		$ 9.450,00	$ 9.072.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC'S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,00	4,00		$ 107.143,00	$ 428.572,00	$ -	100,00%	100,00%	
	9.2.8	CAJA DE INSPECCION 600 X 600 EN MAMPOSTERIA - INCLUYE TAPA PARA FABRICANTE	UN	4,00	4,00		$ 1.107.400,00	$ 4.429.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.22	PINTURA PARA CANCHA

	UNIDAD DE MEDIDA											

LOT		EPS	SEZ	FINANCIAL US BANKUA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No16 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3120	262		$ 30.066,00	$ 867.861,20	$ 150.330,00	84,94%	84,94%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AUSTRADO DE PISO EN 0.08 M x 0.12 M Y GUARDASOBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,23	106,23		$ 31.500,00	$ 3.346.345,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,60	64,6		$ 21.553,00	$ 1.388.013,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICION DE ENCHAPA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	39,52	39,52		$ 12.274,00	$ 485.129,68	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METALICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	14,59		$ 32.041,00	$ 467.769,19	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	7,57		$ 28.405,00	$ 215.025,85	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	2,5		$ 20.615,00	$ 50.037,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,68	32,68		$ 35.518,00	$ 1.153.624,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	73,75	73,75		$ 31.476,00	$ 2.321.355,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	51,25		$ 24.868,00	$ 1.274.485,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,00	13		$ 11.566,00	$ 150.358,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.30	DESMONTE DE SALIDAS HIDRAULICAS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 7.419,00	$ 93.987,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.31	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO, TELEFONICO, DE VOZ Y DE DATOS INCLUIDO EN CONDUCTICELDA Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	69,00	69		$ 6.248,00	$ 380.052,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	9		$ 8.659,00	$ 77.931,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE LAVADEROS EXISTENTES INCRUSTADOS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MEZCLAS)	UN	4,00	4		$ 14.179,00	$ 56.716,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN RIGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD<= 10 CM (INCLUYE COSTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 35 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	23,25	23,25		$ 50.000,00	$ 1.217.975,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN DE VIGA EN CM DE LOSA PARQUEADERO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO(AU)	M	28,20	28,20		$ 301.361,00	$ 7.866.360,06	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.8	CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 12 CMS (INCLUYE ACERO)	M	39,82	39,82		$ 77.577,00	$ 909.987,29	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.15	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	106,23	106,23		$ 111.895,00	$ 11.883.480,85	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.1	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN ACERO EN MARAÑAS DE 60KG/M3	Kc	241,89	241,89		$ 7.811,00	$ 1.979.312,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.2	MURO CONVENCIONAL ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	51,82	51,82		$ 52.596,00	$ 2.262.577,54	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.3	MURO LAURELES (PANDEOS) BASCULI	M	9,87	9,87		$ 185.229,00	$ 1.662.121,23	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.9	CANOAS CON PENDIENTES EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	28,08	28,08		$ 91.800,00	$ 2.577.554,40	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.11	SOBRE VIGUETAS CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (E: 20 CMS)	M	1,20	1,2		$ 60.794,00	$ 68.952,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.13	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN CUBIERTA PISO 3 INCLUYE ACELERANTES	M2	51,29	51,29		$ 89.134,00	$ 4.570.711,86	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.17	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN CUBIERTA PISO 2 INCLUYE ACELERANTES	M2	9,46	9,46		$ 43.813,00	$ 414.388,98	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.19	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN SILLON DE PISO 2 INCLUYE ACELERANTES	UN	4,00	4		$ 155.149,00	$ 582.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN CUBIERTA PISO ALTO Y DE 1.5" INCLUYE ACELERANTES	M	19,84	19,84		$ 79.998,00	$ 1.586.721,12	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.22	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN PUNTO AGUA Y DESAGUA 1/2"	UN	3,00	3		$ 58.833,00	$ 176.499,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.23	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	6,00	6		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.24	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 3"	UN	5,00	5		$ 125.720,00	$ 628.575,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.25	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7,00	7		$ 122.152,00	$ 854.653,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.26	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN REGISTRO VENTOSA EN BOCA 12"	UN	2,00	2		$ 66.000,00	$ 132.272,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.27	CAJA DE INSPECCION REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 60X60 PEG	UN	1,00	1		$ 395.147,00	$ 395.147,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	50,00	5		$ 73.531,00	$ 367.655,00	$ 367.655,00	50,00%	50,00%	
4.3.11	SUMIDO DE 100MMDIAS SANITARIOS INCLUYE SOMBRERETE Y REJILLA DE 4PVMETUS	UN	100	100		$ 176.357,00	$ 176.357,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.12	SUMIDO Y REVOQUE EN LADRILLO	M	20,00	20,00		$ 3.813,00	$ 76.260,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THWN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	10		$ 122.646,00	$ 1.226.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3N°12 (F) + 3N°12 (N) + 3N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS, Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21,00	21		$ 204.593,00	$ 4.296.453,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2,00	2		$ 598.210,00	$ 1.196.422,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 15A/2P 10 KA	UN	6,00	6		$ 29.897,00	$ 179.370,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 15A/2P 10 KA	UN	1,00	1		$ 32.478,00	$ 32.478,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CON DUCT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	25,00	25		$ 22.533,00	$ 563.325,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CON DUCT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	19,00	19		$ 35.210,00	$ 668.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE CABLE DE 3(#8) THHW, DE MEDIDORES 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	24,00	24		$ 56.796,00	$ 1.363.104,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 3N°12 (F) + 3N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21,00	21		$ 174.276,00	$ 3.659.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMÉTICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5,00	5		$ 241.381,00	$ 1.206.905,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIAMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºH-40ºC VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	16,00	16,00		$ 62.384,00	$ 998.144,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN #8 + #8 SD CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDIMENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	21,00	21,00		$ 60.364,00	$ 1.267.644,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	PISO ASEO EN PISOS EN MORTERO 1:4 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA E= 0.08 M	M2	302,48	302,48		$ 67.769,00	$ 20.576.844,12	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.5	VENTILADOR UNIVERSAL EJE REFORZADO 12"	UN	25,00	25,00		$ 26.298,00	$ 657.450,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.15	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN EN PISO EN CAUCHO VULCANIZADO CON SUAVIZA DE CAUCHO RECICLADA SPDM CHIPS FUNDIDOS DE 1" CM PARA EXTERIORES	MM	50,00	50,00		$ 998.189,00	$ 49.864.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.24	BOTA DE ACUEDUCTO	M	3,00	3,00		$ 59.083,00	$ 177.249,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	MQ	924,00	924,00		$ 63.555,00	$ 58.720.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 600 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	101,27	85,72		$ 112.061,00	$ 11.302.268,92	$ 2.026.345,14	84,68%	84,68%	
7.2.28	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN VIRTUALY MANGUERA CANCHA MULTIUSO INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE CAUCHO SILICONE DETALLE TERMINACIÓN SIMILAR	M	84,00	84,00		$ 79.136,00	$ 6.647.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SOBRELOSA NO 1 INSTALACIÓN LOSACERO PARED BLANCA 20MM	M2	89,87	89,87		$ 109.425,00	$ 9.834.460,62	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MALLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS 1> 12 DE	M2	47,25	47,25		$ 166.287,00	$ 7.857.060,75	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL CONFIGUESTAS DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIGOLPE, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	23,25		$ 956.324,00	$ 22.229.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	M2	112,20	112,20		$ 497.700,00	$ 55.845.894,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.5	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 1.20 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	2,00	2		$ 1.219.500,00	$ 2.439.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.6	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.7	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.8	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.9	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.10	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.11	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.12	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.13	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.14	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.15	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.16	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.17	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.18	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.19	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.20	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.21	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.22	VENTANA EN MARCO ALUMINIO 1.60 X 0.60 MTS INCLUYE VIDRIO FIJO Y CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCLUYE ACABADOS Y PERFILERIA	UN	1,00	1		$ 497.700,00	$ 497.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR 17 MM - 10 MM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,14	53,35		$ 105.471,00	$ 4.188.535,75	$ 4.407.735,29	48,70%	48,70%	
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE 0.6 X 0.80	MQ	1,20	1,20		$ 128.700,00	$ 154.170,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.3	ESPEJERA CAMERA SALA/VANDERIA 1.20 - 1.50 ANCHO/0.80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	11,00	11,00		$ 322.200,00	$ 3.676.580,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.2	MUEBLE BAJO MESON INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	2,00	2,00		$ 163.720,00	$ 327.440,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECONDOP O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,68	32		$ 129.084,00	$ 4.130.688,00	$ 61.960,32	98,52%	98,52%	
10.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	32,68	14		$ 240.910,00	$ 3.372.740,00	$ 4.452.016,80	43,16%	43,16%	
10.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO/ASFALTO)	M	12,00	8		$ 40.429,00	$ 323.432,00	$ 161.716,00	66,67%	66,67%	
10.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,00	3		$ 187.050,00	$ 561.150,00	$ 243.113,00	69,77%	69,77%	
10.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	190,00	140,00		$ 4.248,00	$ 594.720,00	$ 119.904,00	84,41%	84,41%	
NPE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y SEMILLA PLASTICO DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 6.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 PLACAS EN 30 SEGUNDOS DE DESCARGA.	UND	5	5		$ 1.165.807,00	$ 5.829.035,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

LOT		SEZ	SEZ	PISTRO JOSE LOZANO SAS N.A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenciones para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de autos)	M2	340,53	340,53		$ 1.205,00	$ 564.999,15	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE AUSTIADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364,53	364,53		$ 79.642,00	$ 12.864.313,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN RIGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD<= 10 CM (INCLUYE COSTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3,00		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.8	CORTE Y EN SUMINISTRO CON PULIDORA SUAVIZAR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	364,70	364,7		$ 10.414,00	$ 3.797.696,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS (CONSTRUCCIÓN) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	54,25	54,25		$ 10.000,00	$ 1.815.875,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO MANUAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	64,21		$ 174.966,00	$ 11.234.695,38	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.16	PLACA CONTRAPISO DE 10 CMS - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	3,00	3		$ 180.000,00	$ 540.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESAL 196 SOLDADA X MM, DE 5.5 X 5.5 M	Rc	614,81	613,81		$ 7.413,00	$ 4.549.862,06	$ -	100,00%	100,00%	
2.5.3	ANCLADO VARILLA 1/8" LISTA EN EPOXI INCLUYE PER

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paral de madera 5"x6" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,92	$ 450.892,97	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (>5M<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.614,00	$ 1.948.614,00	$ -	100,00%	100,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paral de madera 5"x6" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AJUSTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDASCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,59	21,59		$ 21.500,00	$ 995.085,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICION DE PENCA DE MADERA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,85	94,85		$ 10.999,00	$ 1.043.427,65	$ -	100,00%	100,00%	
	FUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	21,59	21,59		$ 127.792,00	$ 4.036.949,28	$ -	100,00%	100,00%	
	RELLENO Y REPOSICION DE UNRECUBRIMIENTO DE MURO EN LADRILLO A DE VISTA CON MORTERO DE INTERDICCION ULTRACEMENTO	M2	15,57	15,57		$ 185.962,00	$ 2.267.595,36	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTES Y REVISION DE SALMUERA	M	33,00	33,00		$ 5.613,00	$ 185.229,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ANDAMIO DE PISOS DE SEGURIDAD 1.2 METROSMODULADO A 1.65 M	M2	45,69	45,69		$ 34.769,00	$ 1.588.462,74	$ -	100,00%	100,00%	
	IMPERMEABILIZACION PARA TERRAZAS UN MURO MAS 2 A 3 CAP (PRIMERA) INCLUYE LA DEMOLICION DE LA CAPA PARA MEJORA DE ADHERENCIA DE LOS PISOS EXISTENTES	MX	45,69	45,69		$ 73.800,00	$ 2.499.352,80	$ -	100,00%	100,00%	
	IMPERMEABILIZACION MEDIANTE 1 A 2 IMPERMEABILIZANTE	M	33,00	33,00		$ 26.238,00	$ 865.854,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES EN CONCRETO - VOLEYTECHO)	M2	21,59	21,59		$ 74.985,00	$ 2.368.776,15	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 2" SOPORTADO EN PLACA DE 12MM,ESTA A 30 AMPOTRADO A 0.30 DE PISO	M	59,00	59,00		$ 25.488,00	$ 1.503.792,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PARED EN LADRILLO TOLETE COMUN DE 12 CMS Y PEGADO CON MORTERO 1:4 Y ENLUCIDO 1:3 ESPESOR 1.5 CM DE MINIMO 1.2 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76,95	76,95		$ 26.238,00	$ 2.019.284,10	$ -	100,00%	100,00%	
	PINTURA PARA LAS PAREDES DE ALTA RESISTENCIA DE 2 MAS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	54,00	54,00		$ 28.738,00	$ 1.551.949,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TEMPERADO DE SEGURIDAD INCOLORO 10 MM CON SEPARACIONES TIPO HERRERIA	M2	9,80	9,80		$ 262.754,00	$ 2.572.208,20	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	40,00	40,00		$ 40.429,00	$ 1.617.160,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CONFLITTACIONES DE AGUA	M	14,54	14,54		$ 24.883,00	$ 362.396,48	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	24,59	24,59		$ 9.108,00	$ 192.857,72	$ -	100,00%	100,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paral de madera 5"x6" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 20x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,88	9,88		$ 21.852,00	$ 215.897,76	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 22 X 22 PULIDO, BRILLOS, PULIDO Y BRILLADO	MX	9,88	9,88		$ 214.787,00	$ 2.122.253,56	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	93,07	93,07		$ 83.512,00	$ 7.772.461,84	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA LINEA EN CONCRETO (INCLUYE ACABADO)	M	55,00	55,00		$ 72.991,00	$ 4.014.505,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO PVC, ANCHO 30 CM	M	59,07	59,07		$ 42.716,00	$ 2.523.376,92	$ -	100,00%	100,00%	
	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE POZOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTE	MZ	27,62	27,62		$ 67.537,00	$ 1.865.472,68	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTA DE DIAMANTE (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	MX	37,20	37,20		$ 40.196,00	$ 1.547.863,95	$ -	100,00%	100,00%	RETIRO Y SPORTA
	CORTE Y RETIRO DE TIRAS PEGADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	MX	37,20	37,20		$ 20.675,00	$ 778.368,63	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	30,00		$ 40.429,00	$ 1.212.870,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	9,80	9,80		$ 9.108,00	$ 206.747,96	$ -	100,00%	100,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paral de madera 5"x6" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	25,00	25,00		$ 30.066,00	$ 751.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	MX	49,00	49,00		$ 73.993,00	$ 3.626.866,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 20.015,00	$ 400.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTAJE DE LAMINA DE TECHO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	M	100	100		$ 28.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	5,00		$ 18.061,00	$ 90.305,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12,00		$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,00	5,00		$ 36.728,00	$ 183.640,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO GARGANTA TIPO SSU (CUERPO DEL SUMIDERO, ENTUBADO, NIVELACIÓN, HUMIDIFICACIÓN Y CUBIERTA, MUDIN)	MX	5,00	5,00		$ 184.980,00	$ 924.900,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO (2.5 X 0.60 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR	M	5,00	5,00		$ 334.957,00	$ 1.674.785,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 9.000 PSI	Kc	200	200		$ 7.511,00	$ 1.502.200	$ -	100,00%	100,00%	
	MURO DE 1 PIE DE ESPESOR EN LADRILLO TOLETE COMUN DE 12 CMS Y PEGADO CON MORTERO 1:4 Y ENLUCIDO 1:3 ESPESOR 1.5 CM DE MINIMO 1.2 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76,95	76,95		$ 37.717,00	$ 2.901.773,55	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ORNIGU1 - ORNAMENTALES PARA EMPALME, INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	20,32	20,32		$ 56.378,00	$ 1.588.170,80	$ -	100,00%	100,00%	
	CIELO RASO EN LAMINA METALICA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	98,00	98,00		$ 37.717,00	$ 3.696.266,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM); INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	3,00	3,00		$ 319.699,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ANDAMIO METALICO MODULADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 68.817,00	$ 1.377.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	120,00		$ 40.429,00	$ 4.851.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	110,00	110,00		$ 9.108,00	$ 975.459,89	$ -	100,00%	100,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paral de madera 5"x6" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 6.341.806,00	$ 310.748,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 18.851,00	$ 923.699,00	$ -	100,00%	100,00%	
	FUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	49,00		$ 127.792,00	$ 6.261.808,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO Y REVISION DE SALMUERA	M	50,00	50,00		$ 5.613,00	$ 280.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
	IMPERMEABILIZACION PARA TERRAZAS UN MURO MAS 2 A 3 CAP (PRIMERA) INCLUYE LA DEMOLICION DE LA CAPA PARA MEJORA DE ADHERENCIA DE LOS PISOS EXISTENTES	MX	49,00	49,00		$ 73.800,00	$ 3.667.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	IMPERMEABILIZACION MEDIANTE 1 A 2 IMPERMEABILIZANTE	M	25,00	25,00		$ 26.238,00	$ 663.695,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTIPAJARO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA CANAL	M	25,00	25,00		$ 26.488,00	$ 662.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PONER EL MURO FALTANTE PARA EL CUBRIMIENTO DE MUROS (INCLUYE TECHO Y ESCALERAS) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	8,75		$ 34.117,00	$ 298.523,75	$ -	100,00%	100,00%	
	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE APLICACION Y REPARACION DE TRASLAPES)	M2	49,00	49,00		$ 77.113,00	$ 3.778.537,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15,00		$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	49,00	49,00		$ 9.108,00	$ 446.289,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP 003	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA COCINA – ZONA DE LAVADO Y ASIMILADO, COMPUESTO POR CAMPANA TIPO HONGO 220V/3PH, EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, VENTILACIÓN AXIAL, RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA, REJILLAS DE EXTRACCIÓN Y RETORNO, ACCESORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, APERTURAS Y PASOS EN MURO O PLACA, INCLUYE MONTAJE, SOPORTERÍA, SELLADOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINI SPLIT EXISTENTES EN COCINA DEL COLEGIO HERNAN DURAN DUSSAN LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C.	UN	1,00	1,00		$ 47.097.726,00	$ 47.097.726,00	$ -	100,00%	100,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
3.21	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.15M A 0.20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	1,00	1,00	0,00	$ 308.449,00	$ 308.451,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.22	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE	M	5,00	5,00	0,00	$ 18.061,00	$ 90.305,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.23	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,75	0,75	0,00	$ 36.728,00	$ 27.546,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.3	JUNTA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	1,00	1,00	0,00	$ 659.356,00	$ 605.172,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLERIA EN CONCRETO (EC 3 60 GR) (INCLUYE PUESTA EN OBRA)	M	1,00	1,00	0,00	$ 478.667,00	$ 1.629.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUEDA PLATINA DE ANGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO	M	1,00	1,00	0,00	$ 364.587,00	$ 364.587,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM, CR 15 X 15 CM	Kc	200,0	200,0	0,00	$ 7.511,00	$ 1.502.200	$ -	100,00%	100,00%	
6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO 3.000 PSI	M	0,80	0,80	0,00	$ 980.534,00	$ 784.427,20	$ -	100,00%	100,00%	
6.7.7	LIMPIEZA DE LADRI DE RECIBO Y RETIRO (INCLUYE EL RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0,80	0,80	0,00	$ 73.511,00	$ 58.808,80	$ -	100,00%	100,00%	
7.5	VENTILACION LAMINA GALVANIZADA CAL 20	M	0,80	0,80	0,00	$ 26.238,00	$ 20.990,40	$ -	100,00%	100,00%	
16.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA REFRIGERANTE FLEXIBLE PARA DE ALTA PRESIÓN 1/4" 2 MM	MX	6,40	6,40	0,00	$ 27.438,00	$ 175.603,20	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.5	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	6,40	6,40	0,00	$ 9.108,00	$ 58.293,60	$ -	100,00%	100,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenciones para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0,00	0	0	$ 3.045,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	($ 106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	EXCAVACIÓN EN CUERPO DE AGUA MANUAL EN SUELO BLANDO DE 2 A 4 M	M	24,00	0	0	$ 83.617,00	$ -	$ 83.617,00	0,00%	0,00%	
	RELLENO CASCAJO PRENSADO MACIZO	M3	2,00	1	0	$ 161.229,00	$ 161.229,00	$ 161.661,29	50,00%	49,73%	
	ENMALLADO EN ALAMBRE # 18 VIA EN UN SOLO SENTIDO A 1.50 M CON SEPARADO 1.0 M (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	408	1	0	$ 25.845,00	$ 25.845,00	$ 25.845,00	99,75%	99,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUNTA DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Ud	0,00	0	0	$ 1.674,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GUNITA EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (COLUMNAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,52	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	($ 57.590,00)	113,74%	113,74%	
	CIMBRA MIL CIMBRA AUTOPORTANTE LTE - 20 - DESARROLLO METAL - INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	77,60	95	0	$ 152.700,00	$ 1.580.500,00	$ 1.193.220,00	99,84%	99,84%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	($ 674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CONFLITTACIONES DE AGUA	M	0,00	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTÍA DE 13 KG/M2	M2	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	($ 1.886.235,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	57,00	62	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	($ 13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCION PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	($ 74.550,00)	600,00%	600,00%	

Ítem	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	%Avance físico	%Avance financiero	Observaciones
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDEPENDIENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,60	28,60	28,60	$ 24.868,00	$ 711.224,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,60	17,60	17,60	$ 30.684,00	$ 533.901,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	39,70	39,70	39,70	$ 956.324,00	$ 37.958.122,80	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN MARCO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA CABINA	MX	6,40	6,40	6,40	$ 1.410.691,00	$ 9.013.976,30	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.5	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MX	98,00	98,00	98,00	$ 4.508,00	$ 267.380,00	$ -	100,00%	100,00%	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169111 DE 2025
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154784

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3

UNIOBRAS DEL ORIENTE

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

INFORME MENSUAL No. 008
PERIODO DEL INFORME: 29 DE MAYO DE 2026 AL 28 DE JUNIO DE 2026

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Harry Arango Gutiérrez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
1.1 Introducción 5
1.2 Objetivos 6
1.3 Delimitación Área De Influencia Directa 7
1.4 Información Del Contrato 13
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA 14
2.1 Ingreso de personal de Obra 15
2.2 Personal Operativo de Obra 16
2.3 Registro de exámenes de ingreso 18
2.4 Personal Retirado 18
2.5 Porcentaje de Personal Femenino 19
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 19
4. SEÑALIZACIÓN 21
4.1 Señalización del campamento 22
4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 23
4.3 Señalización Plan de Emergencia 23
4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo 24
4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad 25
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 26
5.1 Registro Uso de los EPP 26
6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS 27
6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 27
6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo 27
6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo 28

6.4 Inspecciones SST 29

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 30

7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos 30

7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos 31

7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos 31

7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria 31

7.5 Control diario de horómetro 31

7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos 31

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 31

8.1 Pagos de Seguridad Social 31

9. EMERGENCIAS 34

9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias. 34

9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia 34

9.3 Simulacros de Emergencia. 34

10. BIENESTAR 34

10.1 Instalaciones Provisionales. 34

10.2 Baterías de Baños 34

10.3 Sistema de Hidratación 37

11. ORDEN Y ASEO 37

11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra 38

12. DIVULGACIÓN 38

12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 38

12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST. 38

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 38

14. INDICADORES SST 39

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 40

15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros. 40

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST 40

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes 41

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

17. ANEXOS 42

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1.PCCNTR.8169111 de 2025**, UNIOBRAS, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual N° 8 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155154, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EL MILAGROSO, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 8.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (UNIOBRAS) y contratista de obra (Consorcio Coral Ingeniería) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026. Para este periodo se anexan las planillas correspondientes al pago de la seguridad social (EPS, ARL y AFP) de interventoría y contratista.

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal.
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas.

En relación con los aspectos de SST, el contratista efectuó la entrega de la documentación de ingreso del personal, incluyendo la inducción y la notificación de riesgos de 04 trabajadores que ingresaron durante el periodo reportado. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 2. Planillas de Seguridad Social).**

El contratista, dentro del informe de gestión SST, anexa los respectivos ATS correspondientes a las actividades ejecutadas en la obra, para un total de 8 ATS durante el periodo evaluado. Se informa que en este periodo no se realizaron trabajos en alturas.

Asimismo, el contratista incluye las inspecciones de las herramientas disponibles en la obra y presenta el registro de 16 charlas diarias. De igual manera, el contratista presenta la documentación de ingreso del personal, la cual fue presentada previo al inicio de labores en los frentes de trabajo asignados.

A nivel administrativo, el contratista de obra realizó un total de 04 inducciones y notificaciones de riesgo, las cuales fueron debidamente presentadas a esta interventoría. Asimismo, durante el periodo reportado no se registraron accidentes laborales; en consecuencia, no se generaron investigaciones de accidentes, informes FURAT, lecciones aprendidas ni socializaciones asociadas.

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados cuando aplique
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos

de seguridad social correspondientes.

- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.
- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED.(**Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED)**

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe – Sede B**

La IED Rafael Uribe Uribe – Sede B – Nuestra Señora del Carmen se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección CL 48 B SUR # 28 - 75 en el Suroccidente de la ciudad.

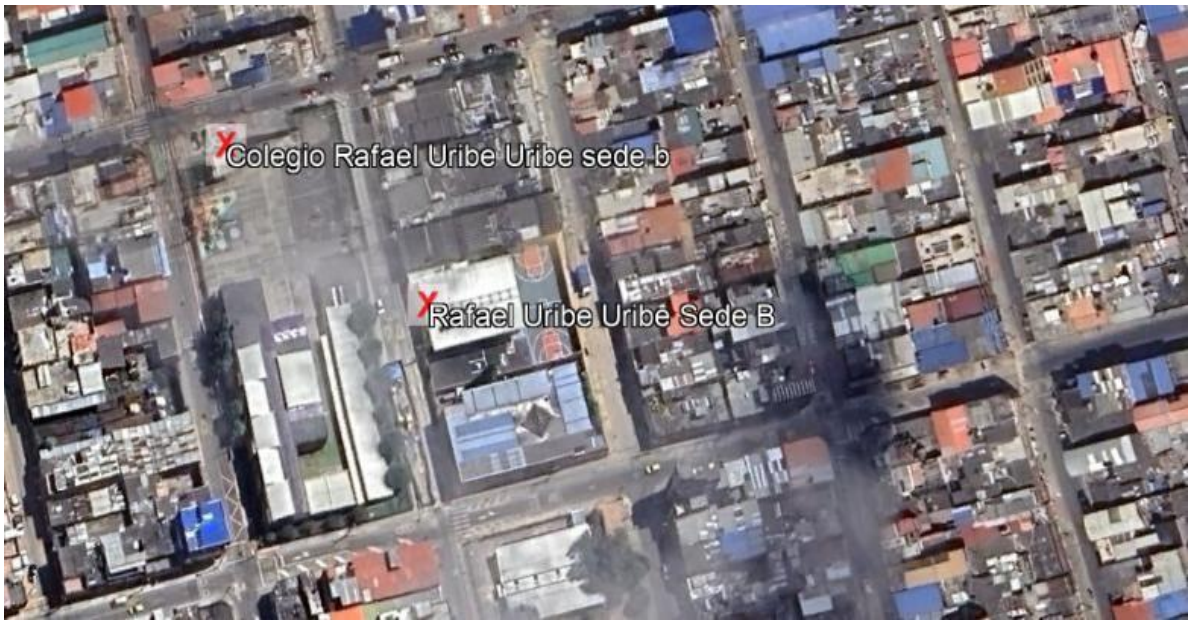


Imagen 1 – IED Rafael Uribe Uribe – Sede B, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital La Floresta Sur – Sede A**

La IED La Floresta Sur – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 68 B BIS # 1 - 09 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 2 – IED La Floresta Sur – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Centro Integral José María Córdoba – Sede A**
  La IED Centro Integral José María Córdoba – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección DG 48 B SUR # 24 B - 73 en el Suroccidente de la ciudad.

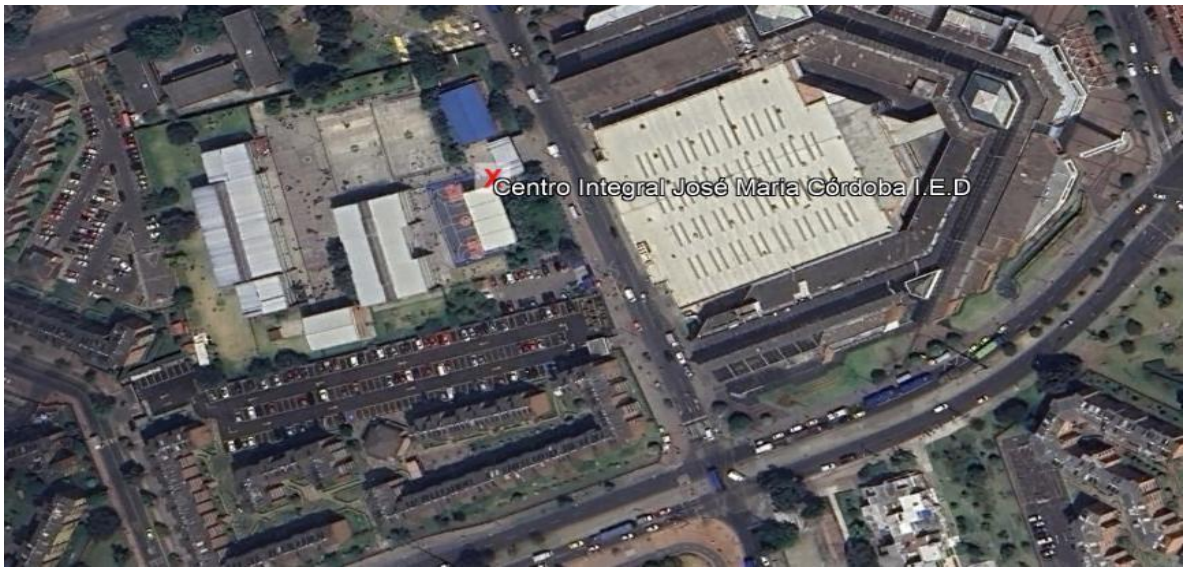


Imagen 3 – IED Centro Integral José María Córdoba- Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede A**

La IED Carlos Arturo Torres – Sede A y Rep de Finlandia se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección TV 72 B # 44 C - 19 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 4 – IED Carlos Arturo Torres – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede B**

La IED Carlos Arturo Torres – Sede B y Cent. Def. Mental Rep de Finlandia se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección TV 72 B # 44 C - 08 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 5 – IED Carlos Arturo Torres – Sede B, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Francisco Miranda – Sede A**

La IED Francisco Miranda – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección DG 41 SUR # 73 A - 80 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – IED Francisco Miranda – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Rufino José Cuervo – Sede C**

  La IED Rufino José Cuervo – Sede C – Nuevo Tunjuelito se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección CL 58 A SUR # 12 A - 25 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – IED Rufino José Cuervo – Sede C, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B**

La IED José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B –San Carlos se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección KR 19 # 50 - 37 SUR en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 8 – IED José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B, Fuente Google Earth

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155154 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.497.896.864
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENIERÍA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Andrés Ivanno Galeano
FECHA DE INICIACIÓN:	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13/05/2026 AL 28/05/2026
MODIFICACIONES	**Modificación No 1:** **Valor:** N/A **Prorroga:** Dos (2) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN	29/07/2026

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaria Distrital de Educación

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	John Harry Arango Gutiérrez	Director de Interventoría	100%
2	Claudia Marcela Forero	Profesional de apoyo	100%
3	Javier Alejandro Maestra Robayo	Residente 1	100%
4	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
5	Edison Jair López Castro	Especialista. Ambiental	60%
6	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
7	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
8	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
9	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
10	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
11	Yuleiny Tatiana Acosta Ramírez	Técnico SST 1	100%
12	Etelberto Riquelme	Inspector Interventoría 1	100%
13	Huber Alfonso Molina Sarmiento	Inspector Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se pudo evidenciar que el contratista presentó documentación de ingreso de 04 trabajadores administrativos y operativos, los cuales son trabajadores de mano de obra no calificada. Esta información se encuentra en el Anexo 1. Documentación de ingreso del informe SST No 8 del contratista.

2.2. Personal Operativo de Obra

Consorcio Coral Ingeniería

Para el periodo entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 se presentó el ingreso de los siguientes trabajadores:

Tabla 1. Personal de Ingreso

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Carol stephany Forero gil	1081182577	Inspector SST	14/05/2026	CONSORCIO CORAL INGENIERÍA
Morrison Acosta	1066732354	oficial de obra	22/06/2026	DI proyectos y Acabados S.A.S
Justi Rodríguez Zabaleta	1049939884	ayudante de obra	22/06/2026	DI proyectos y Acabados S.A.S
Domingo Antonio Beltrán	1003077307	ayudante de obra	22/06/2026	DI proyectos y Acabados S.A.S

Tabla 2. Personal activo

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Lina Mazuera Valbuena	1.072.593.718	Inspectora de obra	18/09/202	Consorcio Coral ingeniería
Elkin José Amaya García	1081795189	Oficial de Obra	14/01/2026	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Jarbel Danilo Chaparro	4.214.786	Oficial de Obra	2/12/2025	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Ronal Alberto Mena Quintero	14326441	Oficial de Obra	14/01/2026	DI Proyectos Y Acabados S.A.S

Eduardo José Arteaga Bolívar	6841838	Ayudante de obra	14/01/2026	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Pablo Alberto Rodríguez Pedreros	3234558	Oficial de Obra	22/12/2025	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Wilmer Enrique Vivas	PPT 5.902.274	Ayudante de obra	28/03/2026	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Kevin Andrés Botina Jojoa	10123946242	Ayudante de obra	20/04/26	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Jhon Stiven Gómez Jiménez	1000724797	Ayudante de obra	14/04/2026	DI Proyectos Y Acabados S.A.S
Diego Lugo Arana Lara	14325119	Maestro de obra	18/09/2025	DI Proyectos Y Acabados S.A.S

Cabe resaltar que el personal aprobado y debidamente radicado durante el periodo evaluado es rotado por el contratista entre los diferentes frentes de obra asignados, de acuerdo con la programación de actividades y las necesidades operativas del proyecto. Dicha rotación se realiza bajo la responsabilidad del contratista, garantizando en todo momento que el personal cuente con los soportes legales vigentes, afiliaciones al sistema de seguridad social al día, capacitación en SST y los elementos de protección personal requeridos para cada frente de trabajo.

2.3. Registro de exámenes de ingreso

Personal Interventoría

Para el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, por parte de interventoría no se presenta ingreso de personal.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se evidencia que el contratista presentó 04 exámenes de ingreso de los trabajadores. ingreso los respectivos con las respectivas recomendaciones médicas, estos exámenes médicos ocupacionales son practicados al trabajador antes de iniciar actividades en aras de determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto y acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. Esta información se puede evidenciar en el Anexo 2. Reporte de personal del informe SST No 8 del contratista.

2.4. Personal Retirado

Personal Interventoría

Para el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 por parte de interventoría se registran 16 retiros o cambios en la disponibilidad del personal.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en el Anexo11 del informe Mensual SST No 8 se evidencian los paz y salvos presentados.

Tabla 3. Personal Retirado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de retiro	Contratista
José Barajas	80.741.411	Oficial	9/04/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Johan estiven Lara Patiño	1022945079	Ayudante de Obra	28/04/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Luis Andrés Villegas tirado	1068139164	Oficial de Obra	07/05/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Luis Eduardo Devia daza	1106712105	Ayudante de Obra	07/05/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Miguel David Ríos Ruiz	1023946242	Ayudante de Obra	07/05/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Oscar Rafael Bitar Benítez	1063291359	Operario	23/04/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Andrea Paola bejarano Vargas	52394788	Residente de obra	05/05/2026	CONSORCIO CORAL INGENIERÍA
Andrés Elías Ávila mórelo	1007795040	Ayudante de Obra	18/04/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Fredy Antonio Jiménez Aldana	79828921	Ayudante de Obra	24/04/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS S.A.S
Iván Arturo Díaz Ayala	1033732412	Oficial de Obra	19/06/2026	DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS
July Ximena Castañeda Guerrero	1023006006	Residente técnica	19/06/2026	CONSORCIO CORAL INGENIERÍA

.

2.5. Porcentaje Personal Femenino

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se cuenta con el equipo de 30 trabajadores de interventoría, de los cuales 10 son mujeres y 20 son hombres lo que corresponde al 33,33% de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 2. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	10	33,33%
Hombres	20	66,66%
TOTAL	30	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el contratista cuenta con 3 mujeres y 16 hombres, lo que corresponde al 15,79% de personal femenino vinculado al contratista

Tabla 3. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	02	23,1%
Hombres	12	76,9%
TOTAL	14	100%

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 no se generaron ingresos por parte de interventoría. No obstante, en cumplimiento de sus obligaciones y del plan de trabajo definido, la interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema Señalización, demarcación y control de áreas de trabajo. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las competencias del personal de interventoría para verificar la correcta implementación de la señalización, demarcación y control de áreas de trabajo, con el fin de prevenir incidentes, proteger a los trabajadores y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades en campo. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual**

Personal Contratista - Inducciones

Para el periodo entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se pudo evidenciar, que el contratista presentó 04 inducciones con la respectiva evaluación de cada uno de los trabajadores que ingresaron a obra. Así mismo, se contó con el registro de las charlas de seguridad impartidas, las cuales estuvieron orientadas a reforzar las medidas preventivas, los riesgos asociados a las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para la obra.

- **Capacitaciones y Charlas de Seguridad**

No	TEMA	FECHA
1	Rotulación de envases, sustancias químicas-áreas delimitadas	29/05/2026
2	Uso obligatorio de EPP	01/06/2006
3	Clasificación de residuos	02/06/2026
4	Comunicación asertiva	03/06/2026
5	Prohibido hacer bromas en la jornada laboral	05/06/2026
6	Uso obligatorio EPP-EPI	09/06/2026
7	Líneas de fuego	10/06/2026
8	Normalización del peligro	12/06/2026
9	Partes del arnés	13/06/2026
10	Cumplimiento EPP	14/06/2026
11	Ergonomía en el trabajo	22/06/2026
12	Sucesos peligrosos	23/06/2026
13	Aspectos e impactos ambientales	24/06/2026
14	Relleno sanitario	25/06/2026
15	Manejo de la fatiga	25/06/2026
16	Procedimientos de evacuación	26/06/2026

Los registros de asistencias y soportes se encuentran en el Anexo 1. Inducción Personal y Anexo 6. Charlas y Capacitaciones, informe SST del contratista No 8 correspondiente al periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026

Registro Fotográfico – Charlas de Seguridad - Capacitaciones	
	

4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia.

Asimismo, para este periodo, el contratista anexó la inspección de los equipos y volqueta utilizados en la obra, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos en materia de SST. Esta información se encuentra en el registro fotográfico del informe SST del contratista No 8 correspondiente al periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026.





Señalización en Cerramiento Perimetral

4.1. Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería registró el ingreso de 1 volqueta, pulidora eléctrica, taladros, arnés, eslingas, líneas de vida. Por lo tanto, el contratista anexa las inspecciones preoperacionales, las cuales se pueden evidenciar en el Anexo 4 del informe Mensual SST No 8 del contratista.

Para este periodo se registró el ingreso de una volqueta de placas OAI 208 para retiro de escombros en las diferentes sedes de los colegios intervenidos

4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería no cuenta con señalización de maquinaria, dado que durante el periodo evaluado no se registró el ingreso ni la operación de maquinaria en la obra, por lo cual dicha señalización no resulta necesaria.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 , el Consorcio Coral Ingeniería ha implementado la señalización de acuerdo al plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra como se evidencian en las siguientes fotografías.

Registro Fotográfico – Señalización	





4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva señalización prohibitiva y de obligación como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización	
	

4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto, como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización



5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se pudo evidenciar que el Consorcio Coral Ingeniería anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo 3. Entrega de dotación - EPP, informe SST No 8 Contratista.

Registro Fotográfico – Entrega de EPP	
	


6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se pudo evidenciar que el Consorcio Coral Ingeniería 2026 anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en los anexos del informe mensual SST No 8 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio Coral Ingeniería para este periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, anexa el diligenciamiento de 8 análisis de trabajo seguro de las actividades que se realizaron en este periodo en la obra. Esta información se encuentra contenida en el Anexo 8. ATS, informe SST del contratista.

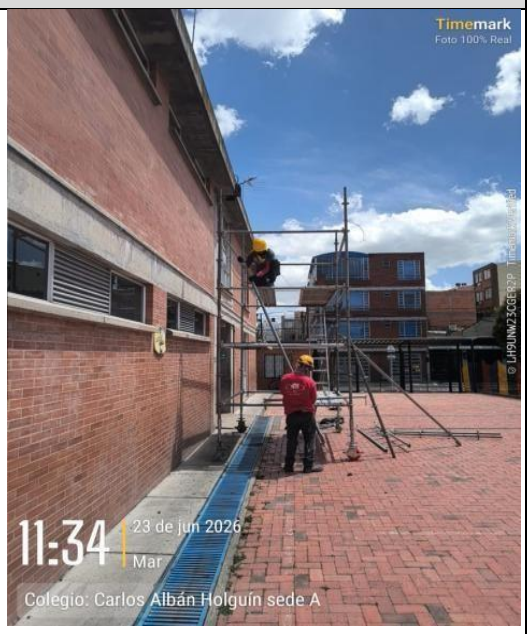Registro Fotográfico – Actividades – ATS	
	

6.3. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería realizó actividades de alto riesgo, por consiguiente, el contratista realizó 02 permisos de trabajo en alturas.

6.4. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería realiza 15 inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada. Esta información se encuentra en el Anexo 5. Inspecciones de obra del informe No 8 del contratista.

- **Institución Educativa Distrital Tom Adams sede B**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección De Andamio	1
2	Inspección De Taladro	1
3	Inspección EPCC	3
4	Inspección De Obra	2

- **Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede B**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de escalera	1
2	Inspección de taladro	1
3	Inspección De Obra	1

- **Institución Educativa Distrital La Floresta**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección De Pulidora	1
2	Inspección De Obra	1

Institución Educativa Distrital Francisco Miranda

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de obra	1

- **Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede A**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de obra	1

- **Institución Educativa Carlos Alban Holguín Sede A**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de obra	1

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería no registro el ingreso de vehículos.

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería, realizó 03 inspecciones preoperacionales volquetas de retiro de escombros. Esta información se encuentra relacionada en el Anexo 4. Preoperacionales volquetas del informe mensual SST No 8 del contratista.

7.4. Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato el Consorcio Coral Ingeniería, no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.5. Control diario de Horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Coral Ingeniería no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Uniobras SAS, para el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla N.° 9504097411, cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

Personal Contratista

Consorcio Coral Ingeniería

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Lina Mazuera Valbuena	36934285	AFP- Marzo 2026 Salud – Abril 2026	04-07-2026	$2.500.000	Inspectora de obra

DI Proyectos Y Acabados S.A.S


Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Elkin José Amaya García	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Oficial de construcción
Danilo Chaparro Benítez	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Oficial de construcción
Ronal Alberto Mena Quintero	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Oficial de Obra
Eduar José Arteaga Bolívar	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Ayudante de Obra
Wilmer Enrique Vivas	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Ayudante de Obra
Pablo Alberto Rodríguez Pedreros	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Oficial de Obra
Jhon Stiven Gómez Jiménez	91829301	AFP- mayo 2026 Salud – junio 2026	16/06/2026	$1.750.905	Ayudante de Obra
Carol stephany Forero gil	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Inspector Sst
Morrison Acosta	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	oficial de obra

Justi Rodríguez Zabaleta	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	ayudante de obra
Domingo Antonio Beltrán	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	ayudante de obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia. En

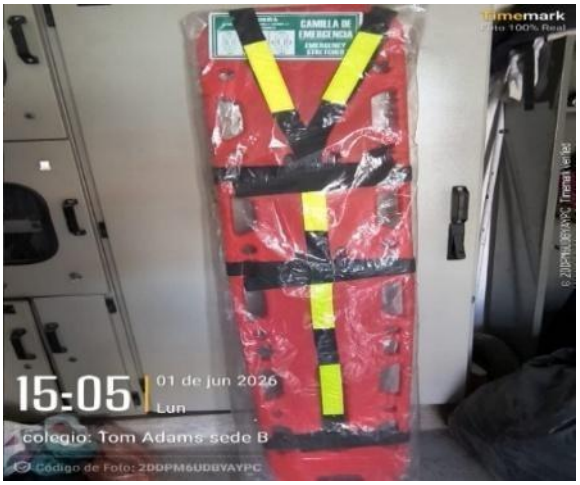



Plan de Emergencia

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio Coral Ingeniería, para este periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, se evidencia que la contratista conformada las brigadas, cumpliendo los lineamientos de la lista de chequeo de la SED. Estas brigadas fueron conformadas de primeros auxilios, contra incendios, y de evacuación. Esta información se encuentra en el Anexo 09. Actas de comité del informe SST No 8 del contratista.

9.3. Simulacros de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio Coral Ingeniería, para este periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 no realiza simulacro, se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Coral Ingeniería, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo.

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio Coral Ingeniería hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.

11. ORDEN Y ASEO

11.1. Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio Coral Ingeniería realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico



Orden y Aseo

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio Coral Ingeniería para este periodo, realizó en obra las inducciones y notificación de riesgos de los 4 trabajadores que ingresaron a trabajar en el periodo. De igual manera se evidencia la divulgación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en las Charlas realizas.



Reglamento

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio Coral Ingeniería, para este periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, realizó 16 charlas de seguridad y salud en el trabajo, 04 inducciones y notificaciones de riesgo, presenta 04 exámenes de ingreso, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio Coral Ingeniería, para este periodo del 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, hace entrega de la reunión mensual de:

COPASST: El contratista realiza el acta de reunión del COPASST sobre el reporte de gestión en seguridad y salud en el trabajo, esta reunión la realiza el 20/05/2026

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL): Para este periodo el contratista no realiza la reunión del CCL debido a que esta se realiza cada 3 meses.

Esta información se encuentra en el Anexo 09 del informe SST No 8 del contratista.

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$\text{IF AT} = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$\text{IF AT} = 0\%$$

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$\text{IS AT} = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IS AT = 0%

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

Letalidad AT = No. de AT mortales que se presentaron en el año *100

No. Total de AT que se presentaron en el año

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

Enfermedad Laboral = No. Casos de enfermedad laboral *100000

Promedio de trabajadores en el año

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de

accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST. (Ver Anexo 8 del informe mensual SST No 8 del contratista).

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3. Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En el periodo 29 de mayo 2026 al 28 de junio de 2026 esta interventoría realiza verificación a la documentación de personal, y volquetas registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.
- ✓ Las actividades desarrolladas durante el periodo se ejecutaron dentro de condiciones controladas, manteniendo coherencia entre la planeación, la ejecución operativa y los lineamientos de seguridad definidos para el proyecto.
- ✓ Se recomienda al contratista dar continuidad al uso adecuado, permanente y obligatorio de los Elementos de Protección Personal y a la correcta dotación del personal en todos los frentes de

obra activos, garantizando su utilización conforme a las actividades ejecutadas y a los riesgos asociados, con el fin de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.

- ✓ Durante el periodo reportado, tanto el contratista como la interventoría no registraron eventualidades asociadas a emergencias, ni la ocurrencia de accidentes de trabajo o incidentes, conforme a lo evidenciado en los indicadores de SST presentados. Lo anterior refleja el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas en obra, así como la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos, contribuyendo a la continuidad segura de las actividades y al control de los riesgos laborales durante el periodo evaluado.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_29/05/2026 – 28/06/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría mayo 2026- junio 2026

Anexo 3. Capacitación Mensual No 8_Interventoría

ANEXOS SST

Proyecto:	Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de La Secretaría de Educación del Distrito, Así como la Ejecución de Obras Menores, que Permitan a Través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".		
Contratista:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA	**Interventoría:**	UNIOBRAS
Contrato:	No. CO1.PCCNTR.8155154 DE 2025	**Contrato:**	No. CO1.PCCNTR.8169111 DE 2025
Informe No.:	No 8 - mayo 2026 - junio 2026	**Periodo:**	29 de Mayo 2026 al 28 de Junio del 2026

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTION SST DE LA INTERVENTORIA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	100%				*El contratista entrega el informe en los tiempos establecidos*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	2.3.	Se efectua examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*

	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaira, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 4 Enero 2026 - Febrero 2026 del contratista e interventoría*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*

	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	12.3.	Otros parametros relevantes e inherentes al proyecto.					
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	13.3.	Otros parametros relevantes e inherentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	14.2.	Otros parametros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe mensual SST No 8 mayo 2026 - junio 2026 del contratista e interventoría*
	15.4.	Otros parametros relevantes e inherentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACION:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

OFICIO DE RADICACIÓN _____

NOMBRE: Katerin Nuñez Osorio
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: UNIOBRAS
FECHA: 29/06/2026

FECHA: *29/06/2026*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000956	3	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ULOTE3	CR 03 50 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107799503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	265610429	9504097411	E	2026/06/12	2026/06/09	BANCO DE BOGOTA	0	$39,753,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096242581	ACOSTA RAMIREZ YULEINY TATIANA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
2	CC	79905278	ARANGO GUTIERREZ JOHN HARRY																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
3	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0	Si	$1,021,700
4	CC	93376173	BERMUDEZ OTALORA FREDY ALBERTO		X																25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
5	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1054567138	BROCHERO OSORIO JUAN SEBASTIAN		X																230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
7	CC	1090488111	CARDENAS LIZARAZO MARIA AUXILIADORA		X																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS001	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	80471240	CARRERO MARCO ANTONIO		X																25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	1030613586	CASALLAS JUNCA JONATHAN WILMER		X																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	1018487457	CURIEL ACOSTA ANYELI MARYED		X																230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
11	CC	16505486	ELJURE VALENCIA DECIO		X																25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS012	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
12	CC	1005483549	ESCOBAR MALDONADO LIZETH ALEJANDRA		X																25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
13	CC	52712303	FORERO CASTRO CLAUDIA MARCELA																		25-14	30	$6,350,000	$1,016,000	EPS005	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$1,966,000
14	CC	79258510	FRANCO GUZMAN ETELBERTO RIQUELME																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
15	CC	79995724	GUTIERREZ CALDERON ELMIN JEAN																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
16	CC	1052394844	HIGUERA ARAQUE KAREN LISETH		X																25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
17	CC	80164338	LOPEZ CASTRO EDISON JAIR																		25-14	30	$8,400,000	$1,428,000	EPS005	30	$8,400,000	$336,000	CCF24	30	$8,400,000	$336,000	14-11	30	$8,400,000	$584,700	30	$0	$0	Si	$2,684,700
18	CC	79744779	LOPEZ SANCHEZ OMAR CAMILO		X																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
19	CC	1233495366	MARIN CASTELLANOS MILLER ARLEY		X																230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS005	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
20	CC	1012460713	MARTINEZ TOVAR JHONER ANDRES		X																230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS010	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
21	CC	1065013090	MESTRA ROBAYO JAVIER ALEJANDRO																		230201	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS005	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
22	CC	1033722593	MOLINA SARMIENTO HUBER ALFONSO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
23	CC	1022366202	MORA VILLAREAL VICTOR ALFONSO		X																230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
24	CC	1073231766	MOYANO SEGURA LUIS FELIPE		X																25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
25	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
26	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
27	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS001	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
28	CC	88002563	RANGEL PAEZ PAUL ALBERTO		X																230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000956	3	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ULOTE3	CR 03 50 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107799503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	265610429	9504097411	E	2026/06/12	2026/06/09	BANCO DE BOGOTA	0	$39,753,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$20,805,600	$0	$0	$20,805,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$6,436,200	$0	$0	$6,436,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$11,207,800	$0	$0	$11,207,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$3,161,600	$0	$0	$3,161,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$8,815,600	$0	$0	$8,815,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$8,815,600	$0	$0	$8,815,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,066,100	$0	$0	$5,066,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	31	$5,066,100	$0	$0	$5,066,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	$5,066,100	$0	$0	$5,066,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$244,000	$0	$0	$244,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$110,000	$0	$0	$110,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$690,000	$0	$0	$690,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$568,000	$0	$0	$568,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$300,000	$0	$0	$300,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$144,000	$0	$0	$144,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$110,000	$0	$0	$110,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$2,800,100	$0	$0	$2,800,100
TOTAL				**31**	**$39,753,400**	**$0**	**$0**	**$39,753,400**

UNIOBRAS DEL ORIENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

NOMBRE DE LA CAPACITACION: Señalización, demarcación y control de áreas de trabajo

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Katerin Nuñez

LUGAR: Interventoria Oficinas

FECHA: 18/06/2026 **HORARIO:** 8:20 am

Nº	PARTICIPANTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Claudia Marcela Favero	88002563	Apoyo	
2	Tatiana Acosta	1096427581	Técnico SST	Tatiana Acosta
3	Etelberto Franco	19258510	Inspector	Etelberto Franco
4	Jair López	81043367	Espe. Ambiental	Jair López
5	Katerin Nuñez	1054552084	Prof. SST	

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:

CARGO: Residente SST

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **MARIAM LUZ GUTIERREZ CORREA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA 46.644.261**, en mi condición de Representante Legal de **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS** identificada con **NIT 829000956-3,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual, de acuerdo a la oferta en el proceso de licitación SED-CM-ADCCEE-018-2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 28 días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

miriam gutierrez

UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS
MARIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
CC 46.644.261
Representante Legal Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169111
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155154

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3

UNIOBRAS DEL ORIENTE

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

INFORME MENSUAL No. 08

Periodo del informe: 29 de mayo AL 28 de junio de 2026

Elaboró	Aprobó
Edison Jair López Castro	**Arq. Harry Arango Gutiérrez**
Profesional Ambiental	Director de interventoría
	

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com

Contenido

1. Introducción 3

2. Objetivos 4

2.1. Objetivo general 4

2.2. Objetivos específicos 4

3. Localización 5

- Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe – Sede B 5
- Institución Educativa Distrital La Floresta Sur – Sede A 5
- Institución Educativa Distrital Centro Integral José María Córdoba – Sede A 6
- Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede A 7
- Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede B 8
- Institución Educativa Distrital Francisco Miranda – Sede A 8
- Institución Educativa Distrital Rufino José Cuervo – Sede C 9
- Institución Educativa Distrital José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B 10

4. Estado contractual y de gestión 11

5. Personal Interventoría 12

6. Resumen de obras en fase de ejecución 13

7. Actividades de gestión ambiental realizadas por la interventoría 14

8. Actividades de gestión ambiental realizadas por el contratista 16

9. Permisos y tramites ambientales 24

10. Conclusiones y recomendaciones 26

11. Anexos 27

1. Introducción

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR. 8169111 DE 2025**, UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 8 correspondiente al **Lote 8** para el periodo 29 de mayo al 28 de junio del 2026, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 8155154 de 2025, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO CORAL INGENIERIA, cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato CO1.PCCNTR. 8155154 de 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 29 de mayo al 28 de junio de 2026.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

3. Localización

○ Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe – Sede B

La IED Rafael Uribe Uribe – Sede B – Nuestra Señora del Carmen se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección CL 48 B SUR # 28 - 75 en el Suroccidente de la ciudad.

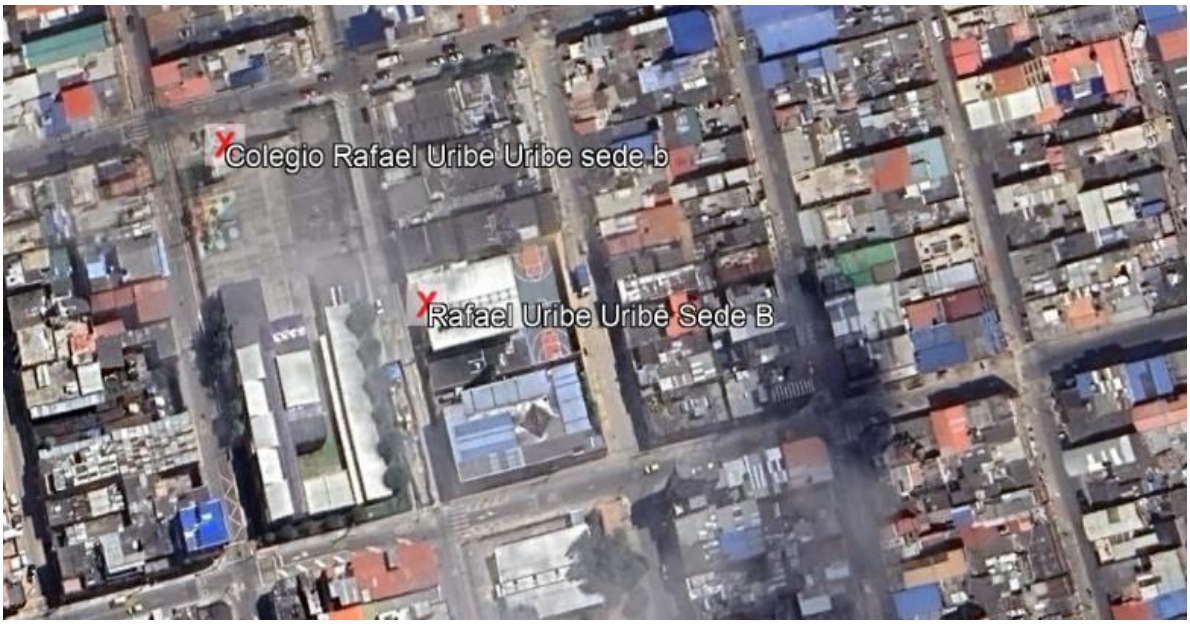


Imagen 1 – IED Rafael Uribe Uribe – Sede B, Fuente Google Earth

○ Institución Educativa Distrital La Floresta Sur – Sede A

La IED La Floresta Sur – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 68 B BIS # 1 - 09 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 2 – IED La Floresta Sur – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Centro Integral José María Córdoba – Sede A

La IED Centro Integral José María Córdoba – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección DG 48 B SUR # 24 B - 73 en el Suroccidente de la ciudad.

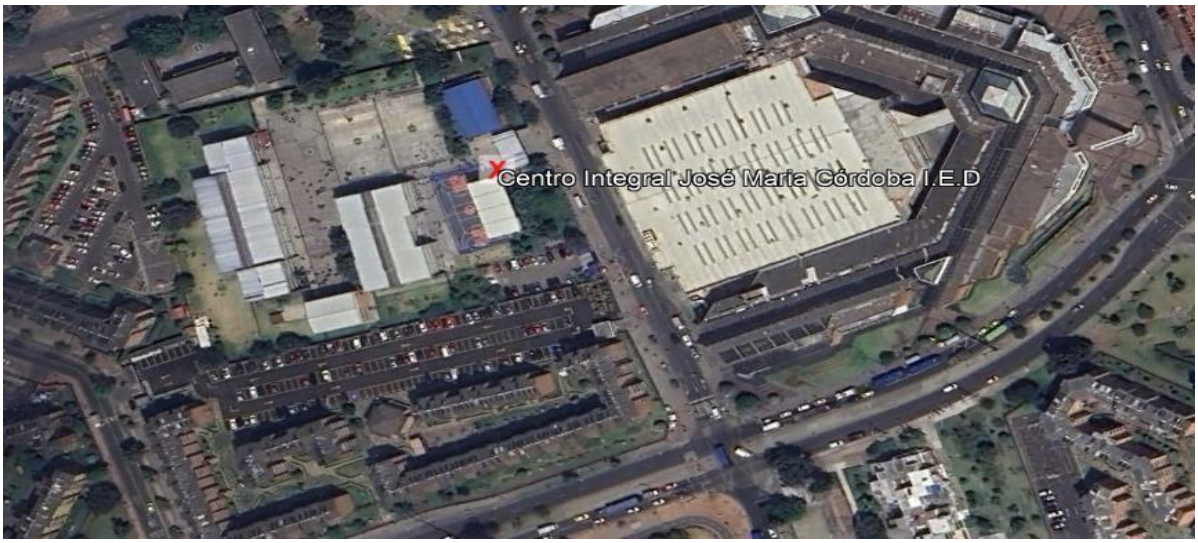


Imagen 3 – IED Centro Integral José María Córdoba- Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede A

La IED Carlos Arturo Torres – Sede A y Rep de Finlandia se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección TV 72 B # 44 C - 19 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 4 – IED Carlos Arturo Torres – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres – Sede B

La IED Carlos Arturo Torres – Sede B y Cent. Def. Mental Rep de Finlandia se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección TV 72 B # 44 C - 08 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 5 – IED Carlos Arturo Torres – Sede B, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Francisco Miranda – Sede A

La IED Francisco Miranda – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección DG 41 SUR # 73 A - 80 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – IED Francisco Miranda – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Rufino José Cuervo – Sede C

La IED Rufino José Cuervo – Sede C – Nuevo Tunjuelito se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección CL 58 A SUR # 12 A - 25 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – IED Rufino José Cuervo – Sede C, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B

La IED José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B –San Carlos se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito en la dirección KR 19 # 50 - 37 SUR en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 8 – IED José Antonio Ricaurte San Carlos – Sede B, Fuente Google Earth

4. Estado contractual y de gestión

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155154 – 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.497.896.864
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENIERÍA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Andrés Ivanno Galeano
FECHA DE INICIACIÓN:	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13/05/2026 al 28/05/2026
MODIFICACIONES	**Modificación No 1:** **Valor:** N/A **Prorroga:** Dos (2) meses
FECHA DE REINICIO:	29/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29/07/2026

5. Personal Interventoría

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	John Harry Arango Gutiérrez	Director de Interventoría	100%
2	Claudia Marcela Forero	Profesional de apoyo	100%
3	Jhoner Andrés Martínez	Residente 1	100%
4	Víctor Alfonso Mora	Residente 2	100%
5	Miller Arley Marín Castellanos	Residente 3	100%
6	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
7	Edison Jair López Castro	Especialista. Ambiental	60%
8	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
9	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
10	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
11	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
12	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
13	Yuleiny Tatiana Acosta Ramírez	Técnico SST 1	100%
14	Juan Sebastián Brochero Osorio	Técnico SST 2	100%
15	Luis Felipe Moyano Segura	Técnico SST 3	100%

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
16	Paul Alberto Rangel Páez	Técnico SST 4	100%
17	Decio Eljure Valencia	Técnico SST 5	100%
18	Karen Liseth Higuera Araque	Técnico SST 6	100%
19	Marco Antonio Carrero	Inspector Interventoría 1	100%
20	María Auxiliadora Cárdenas Lizarazo	Inspector Interventoría 2	100%
21	Jonathan Wilmer Casallas Junca	Inspector Interventoría 3	100%
22	Anyeli Mayed Curiel Acosta	Inspector Interventoría 4	100%
23	Etelberto Riquelme	Inspector Interventoría 5	100%

6. Resumen de obras en fase de ejecución

Durante el periodo comprendido entre 29 de mayo al 28 de junio de 2026 se realizan las siguientes actividades:

IED Tom Adams Sede B

- Demolición y retiro de afinado existente
- Aplicación de afinado
- Construcción de medias cañas impermeabilizadas

IED Carlos Arturo Torres Sede A

- Construcción de mediacaña y aplicación de pintura en baños
- Instalación de estructura metálica y cubierta de bodega
- Mantenimiento y pintura de estructura de bodega
- Instalación de cerramiento metálico tipo persiana
- Resane de placa y columnas de la zona de equipos hidroneumáticos

IED Rafael Uribe Uribe Sede B

- Desmonte de cerramiento provisional y aseo final de obra
- Instalación de bajantes para aguas lluvias
- Nivelación de superficie de cancha deportiva
- Resane y retoque de acabados arquitectónicos
- Instalación de shut de basuras
- Retoque general de pintura

IED José maría Córdoba

- Mantenimiento correctivo de ventanas
- Instalación de elementos de protección para el sistema de drenaje
- Sustitución de tableros de canchas deportivas

IED Francisco de miranda

- Instalación de espejos biselados
- Aplicación de estuco y pintura
- Construcción de media caña
- Instalación de puertas metálicas
- Mantenimiento de ventanas
- Instalación de puerta y ventana
- Figurado de acero para caja de inspección
- Construcción de cajas de inspección
- Instalación shut de basuras

7. Actividades de gestión ambiental realizadas por la interventoría

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

  - ✔ Contrato de Obra
  - ✔ Apéndice Ambiental
  - ✔ Anexo técnico
  - ✔ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE
  - ✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA

- Revisión del presupuesto
- Inspección de las actividades ejecutadas en los frentes de obra
- Reporte de imprevistos o novedades

INDICADORES AMBIENTALES

- **Programa de capacitación**

Personal capacitado = Se realizo una capacitación a 11 asistentes, respectivamente, como anexo se presenta las planillas de capacitaciones

$$\frac{N° \ de \ personas \ capacitadas}{Total \ personal} \ x100$$

$$\frac{11}{23} \ x \ 100 = 47{,}83\%$$

Cumplimiento de temáticas planificadas = Se realizo una capacitación respecto al uso eficiente de agua y ahorro de energía el día 11 de junio

$$\frac{N° \ de \ \ capacitaciones \ realizadas}{N° \ de \ capacitaciones \ programadas} \ x100$$

$$\frac{1}{1} \text{ x } 100 = 100\%$$

- **Programa de reciclaje**

Residuos aprovechados = Se reutilizo el papel que se utilizó para la impresión a doble cara en otros formatos, por lo que se estaría aprovechando el material al igual se comparte la ficha técnica del papel como anexo

$$\frac{Peso \ residuos \ aprovechados}{Peso \ total \ residuos \ generados} \ x100$$

$$\frac{0{,}17 \ kg}{0{,}17 \ kg} x100 = 100\%$$

- **Programa de movilidad sostenible**

Número de desplazamientos optimizados: Se ha optimizado las visitas por medio de movilidad sostenible como lo es en bicicleta o caminata entre puntos cercanos, al igual que se ha realizado visitas de manera grupal.

Reuniones virtuales: Se ha optimizado por reuniones virtuales en este periodo, en temas que no requieren la visita técnica en campo, por lo que presenta porcentaje igual a 30%

$$\frac{\boldsymbol{Reuniones\ virtuales}}{\boldsymbol{Total\ de\ reuniones\ al\ mes}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\boldsymbol{6}}{\boldsymbol{20}}\boldsymbol{x100} = \boldsymbol{30\%}$$

8. Actividades de gestión ambiental realizadas por el contratista

- Se dio Apertura del PIN Ambiental el día 7 de noviembre con el numero 27908 ante la secretaria Distrital de Ambiente (SDA)
- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

  - ✔ Contrato de Obra
  - ✔ Apéndice Ambiental
  - ✔ Anexo técnico
  - ✔ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE
  - ✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad vigente nacional

Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista

ITEM	CUMPLE	NOTA
Cargue reporte mensual RCD	Si	Se realizo el cargue del PIN hasta el mes de junio con los respectivos certificados

Anexos RCD (I, III, V y VI del decreto 507 de 2023)	SI	El contratista mediante el informe presenta los anexos del decreto 507 de 2023 y se realiza el cargue
Meta de aprovechamiento	NA	Durante este periodo se cumple la meta de aprovechamiento, ya que realizo la disposición a centros de aprovechamiento como lo son Greco y reciclados industriales
Meta de circularidad	Si	El contratista realizo una compra de material a GRECO de 3 Ton de material Heterogéneo, por lo que se estaría cumpliendo parcialmente la meta de circularidad
Protocolo manejo de asbesto	SI	Se realizo la entrega de este protocolo mediante oficio CORAL SED 269 2026 y se aprobó mediante oficio UNIOBRAS-LOTE3-267
Inventario de sumideros	NA	No se evidencian sumideros en las instituciones educativas

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el periodo, Se dio aprobación al Informe ambiental del contratista, al igual que ya se encuentran aprobados el plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio UNIOBRAS-LOTE3-067 el día 26 de noviembre de 2025 y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) mediante oficio UNIOBRAS-LOTE3-051 el día 13 de noviembre de 2025 que presento el contratista.

8.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

El espacio destinado para el campamento ira cambiando de acuerdo con el orden de las intervenciones y el contratista de obra, durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026 se reportó cuatro campamentos de obra en los colegios Carlos Arturo Torres y Francisco Miranda.





8.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026 se reportó el ingreso material valorizado del centro de aprovechamiento GRECO

MATERIAL	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (Ton)
Agr Fino TM 0-5 Heterogéneo	2	3
Total	**2**	**3**

El certificado correspondiente se presenta anexo a este informe y al informe del contratista.





Meta de circularidad:

$$\frac{\boldsymbol{Cantidad\ de\ material\ valorizado\ usado\ en\ obra}}{\boldsymbol{Cantidad\ de\ material\ a\ usar\ en\ obra}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\boldsymbol{3\ Ton}}{\boldsymbol{9\ Ton}}\ \boldsymbol{x100 = 33,3\%}$$

Durante este periodo la meta de circularidad es del 33,3%, ya que se realizó una compra de material al centro de aprovechamiento Greco que cuenta con el PIN de proveedores 26493 ante la SDA

8.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Los frentes de obra cuentan con puntos ecológicos para realizar la separación en la fuente de los residuos convencionales generados durante este periodo, las empresas de aseo de Bogotá serán las encargadas de realizar la recolección de estos residuos, tres veces por semana, dependiendo del sector en donde se ubique el colegio.



Para este periodo, se dispuso 400 kg (0,4 Ton) de chatarra y/o residuos metálicos a la empresa Exireciclables M.C SAS, la cual es una empresa autorizada por la Secretaria Distrital de ambiente para que el material sea incorporado como materia prima en los diferentes procesos productivos. Se presenta certificación como anexo a este informe.

8.5. MANEJO DE RCD

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026, el CONSORCIO CORAL INGENIERIA realizó la disposición del material RCD. Además, presentó los vales y certificados de estos residuos a esta interventoría.

PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (Ton)
JUN	GRECO	7	8,96
	Reciclados industriales	14	18,10
	Total	21	27,06

Meta de aprovechamiento:

$$\frac{\boldsymbol{Cantidad\ de\ RCD\ reutilizado\ o\ a\ planta\ de\ aprovechamiento}}{\boldsymbol{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ periodo}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\boldsymbol{21\ m3}}{\boldsymbol{21\ m3}}\ \boldsymbol{x100 = 100\%}$$

$$\frac{\boldsymbol{27,06\ Ton}}{\boldsymbol{27,06\ Ton}}\ \boldsymbol{x100 = 100\%}$$

Durante este periodo la meta de aprovechamiento fue del 100%, se anexa a este informe los certificados presentados por el contratista.

Consolidado RCD

Mes	Aprovechable (Ton)	No Aprovechable (Ton)	Excavación (Ton)
Octubre	0	0	0
Noviembre	0	0	0
Diciembre	18,06	0	0
Enero	62,72	30,78	0
Febrero	0	0	0
Marzo	44,06	0	257,775

Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	27,46	0	0
Total	152,3	30,78	257,775

Teniendo en cuenta la formula para la meta de aprovechamiento estaría en 83,19% para este periodo.

Meta de aprovechamiento:

$$\frac{\boldsymbol{Cantidad\ de\ RCD\ reutilizado\ o\ a\ planta\ de\ aprovechamiento}}{\boldsymbol{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ (Sin\ Excavacion)}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\boldsymbol{152,3\ Ton}}{\boldsymbol{183,08\ Ton}}\ \boldsymbol{x100 = 83,19\%}$$





8.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026 no se generó ni ingreso residuos peligrosos y/o especiales a los frentes de obra

8.7. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026 se reportan sustancias químicas dentro de los frentes de obra que cuentan con las fichas de seguridad y procedimiento de uso adecuadas.

- Soldadura PVC
- Limpiador PVC
- Aditivo para impermeabilización




8.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.

8.9 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026 se reporta el cerramiento perimetral adecuado, asimismo se reporta el ingreso de dos volquetas para la recolección de RCD con placa OAI-208(PIN trans:2761) y GMJ-246 (PIN trans:1518), las cuales se dio aprobación por esta interventoría ya que contaba con la documentación al día, todas las actividades como limpieza se realizó teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental adecuadas

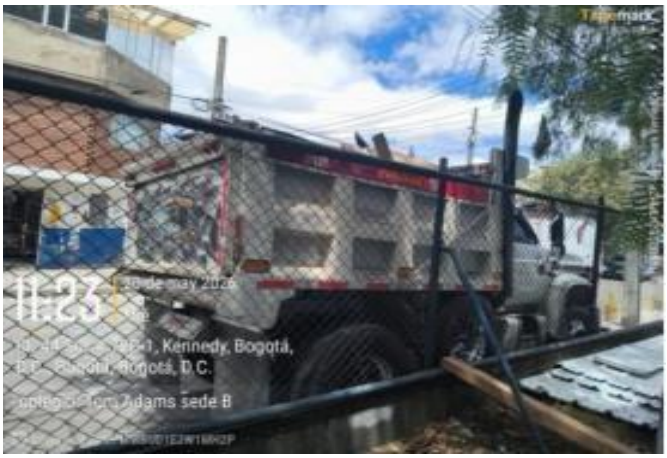

8.10 MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026, no se evidencian zonas verdes ni individuos arbóreos cercanos a los frentes.

8.11 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026, el contrato no requiere tramite de valla de obra ni publicidad exterior visual en los frentes de obra

8.12. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026, el contratista reporto tres (3) capacitaciones ambientales teniendo en cuenta el PIGA de la entidad, sobre clasificación de residuos, uso código de colores y aspectos e impactos ambientales para un total de 9 asistentes, se presenta anexo a este informe la planilla de capacitación presentada por el contratista.

8.13. ORDEN Y ASEO

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026, los frentes de obra se encuentran debidamente demarcados y señalizados. Al igual el contratista en cada frente ha garantizado semanalmente jornadas de orden y aseo.



8.14. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo al 28 de junio de 2026 se realizó un requerimiento de la SDA mediante el radicado E-2026-96056, el cual no le da aprobación al programa de manejo ambiental, por falta de datos de la obra en el anexo I, la falta de declaración de generador firmado por el representante legal y se requería el cargue de información hasta el mes de mayo para el debido seguimiento

En atención a dicho requerimiento, el día 11 de junio de 2026, se realizó una reunión de trabajo con el especialista ambiental de la secretaria de educación distrital y el contratista, con el fin de revisar y efectuar el cargue de la información asociada al PIN Ambiental en la plataforma web de la SDA.

Como resultado de esta gestión, se subsano el requerimiento formulado por la autoridad ambiental, quedando actualizada la información solicitada en la plataforma, como anexo a este informe, se encuentra el acta de reunión realizada.

9. Correspondencia

A continuación, se resume la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA A	TIPO	OBJETIVO
16/06/2026	UNIOBRAS-LOTE3-583	Consorcio CORAL	Ambiental	Traslado de requerimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente y solicitud de atención prioritaria
22/06/2026	UNIOBRAS-LOTE3-601	SED	Ambiental	Traslado de respuesta a requerimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente y validación de información

Como respuesta a los comunicados anteriormente evidenciados, se presentan los siguientes reportes de correspondencia recibida.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA POR	TIPO	OBJETIVO
20/06/2026	CORAL SED 470 2026	Consorcio CORAL	Ambiental	Respuesta oficio UNIOBRAS-LOTE3-583

10. Permisos y tramites ambientales

Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento.

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD): Se está en la elaboración del documento, dentro del cual se especificarán los materiales, estimaciones de las cantidades, estimación de costos del manejo de RCD e indicadores y demás información conforme a la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD establecido por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

Permiso de valla fija: De conformidad con los documentos contractuales, no se requiere la instalación de la valla ni tramito ante autoridad ambiental.

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce.

11. Conclusiones y recomendaciones

- El contratista ha realizado las actividades bajo las especificaciones técnicas – ambientales del plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actividades y/o programas que garanticen el uso adecuado de manejo de residuos, control de emisiones de polvo y ruido, protección de fuentes hídricas, manejo responsable de materiales peligrosos y conservación de las áreas intervenidas, implementando capacitaciones y inspecciones periódicas que permita prevenir impactos dentro del proyecto

- Se hace un llamado de atención al contratista por el no cumplimiento de la meta de aprovechamiento, se recomienda al contratista reportar los materiales que ingresan de centro de aprovechamiento y la disposición de los RCD, ya que es de obligatorio cumplimiento al igual que presentar los anexos del decreto 507 de 2023 para mantener actualizada la información respecto al cargue mensual al PIN Ambiental

- Se recomienda fortalecer la gestión integral de residuos, realizando la separación en la fuente, almacenamiento temporal adecuado, transporte con gestor autorizado y los soportes de disposición final y/o aprovechamiento

- Se han realizado medidas preventivas para minimizar los impactos ambientales y sociales en las instituciones, especialmente en el control de ruido, manejo de polvo, señalización en áreas intervenidas y seguridad en zonas de tránsito para el personal externo como interno.

- El informe No. 8 a la fecha del presente informe ha sido remitido por el contratista

12. Anexos

- Lista de chequeo Interventoría Lote 8
- Cronograma de Capacitaciones
- Planilla de capacitación Uniobras del oriente S.A.S
- Ficha técnica Papel
- Acta de reunión
- Certificados RCD
- Anexo V y VI
- Planilla Charla ambiental CORAL INGENIERIA
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-583 Traslado de requerimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente y solicitud de atención prioritaria
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-601 Traslado de respuesta a requerimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente y validación de información
- Certificación No intervención en zonas verdes

Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						
Contratista:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA		**Interventoría:**		UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8155154		
Informe No.:	8		**Periodo:**		29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME AMBIENTAL							
REQUERIMIENTO AMBIENTAL	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X			El informe ambiental N°8 presentado por el contratista, fue aprobado por esta interventoria	*Aprobación de la interventoría del informe mensual de gestión ambiental del contratista de obra*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			Se encuentra documentacion actualizada en el campamento de obra	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.			X	No se han requerido permisos y licencias ambientales para el contrato	*Lista de chequeo de cada una de las obligaciones y disposiciones de los actos administrativos emitidos para el proyecto y relación de la respectiva evidencia aceptada por la Interventoría*
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría"	X			Se presenta informe mensual de gestion ambiental bajo estructura y lineamientos de la SED	*El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los materiales de construccion se encuentran acopiados y protegidos en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X			Las mezclas de concreto se realizan en una batea metalica para no contaminar el suelo	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X	No se ha utilizado madera en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.		X		La Zona verde de las instituciones se encuentra libre de materiales o residuos	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X			En el PMA presentado por el contratista se presenta los proveedores y antes de entrar, se aprueban por interventoria	*La interventoría verifica la legalidad de los proveedores utilizados*
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos para la separacion y recoleccion de los residuos solidos convencionales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			En el PMA Y PGRCD presentado por el contratista se verifico los gestores para realizar la disposicion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.		X		Se realiza la apertura del Pin Ambiental con numero 27908 y se realiza el cargue de informacion hasta el mes de junio	*Revisión y aprobación de la documentación cargada al aplicativo web de la SDA del PIN del proyecto*
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			En los frentes de obra se encuentran acopiados y clasificados los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X			En los frentes de obra se encuentran protegidos los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.			X	No se han reutilzado los RCD generados en este periodo	*Información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X			Se realizo la disposicion de material RCD de 14 m3 a reciclados industriales y 7 m3 a Greco	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			Las volquetas cuentan con pin de transportador y se verifico que la carga no excedia la capacidad del platon	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del archivo CSV mensual de registro de viajes de volquetas del PIN cargado al aplicativo web de la SDA. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X			No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.	X			No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Las cantidades generadas y los certificados de disposición se incluyeron correctamente en el reporte mensual de RCD del PIN ambiental y están disponibles en el aplicativo web de la SDA*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Las sustancias quimicas utilizadas cuentan con la hoja de seguridad y se capacita al personal para el uso de estas	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del seguimiento al inventario de sustancias químicas. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.		X		No cuentan con kit de derrames en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Garantizar que el documento permanezca en la obra y que el Contratista reporte su seguimiento en todos los informes mensuales*
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Lista de chequeo y registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría del estado de cada uno de los sumideros inventariados. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X			Se garantizo el manejo adecuado de las aguas residuales dometicas generadas	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría y verificación de la documentación presentada por el Contratista. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.	X			Se garantizo el tratamiento de agua	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.	X			No se realizan actividades de obra que alteren las coindiciones de las fuentes hidricas	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.	X			Los acopios de materiales estan alejados de sumideros y cuerpos de agua	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.			X	No se encuentran granulares finos al igual todo material se encuentra acopiado	*Cuando aplique*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			En todos los frentes de obra cuentan con cerramiento perimetral y puntual	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.	X			Se acopian adecuadamente los materiales y RCD en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.	X			Despues del ingreso de la volqueta, se realizo limpieza de las vias de acceso para evitar la dispersion de material particulado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.	X			Se conto con la limpieza adecuada de las llantas de las volqueta antes de salir del frente de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X			Previo al ingreso de los vehiculos y maquinaria fueron aprobados por interventoria	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacía la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X			La volqueta contaba con el cubrimiento total y adecuado de la carga	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).	X			Se realiza la proteccion de los individuos arboreos en el Colegio Jose Maria Cordoba, ya que se acopia los RCD cerca a estos	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No se han presentado programacion para tratamientos de vegetacion	*Programación de tratamientos silviculturales*
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X	No se han presentado programacion para tratamientos de vegetacion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de avifauna*
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Fichas de registro y seguimiento de árboles trasladado. Plano de localización georeferenciada*
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de manejo de zonas verdes*
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Relación de volúmenes generados y dispuestos. Certificación de disposición final de residuos vegetales*
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Consolidado de especies plantadas vs especies propuestas*

	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Consolidado de especies plantadas vs especies propuesta. Actas de reunión con JBB para asignación de sitios de plantación y aprobación del diseño. Acta JBB asignación códigos SIGAU. Plano de localización georeferenciada de los árboles*
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Fichas de seguimietno de árboles trasladados*
	9.11.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días depués de firmada el acta de inicio			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría.*
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado			X	No se requiere para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente			X	No se requiere para el contrato	*Montaje del aviso*
	10.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X			el contratista reporto tres capacitaciones ambientales teniendo en cuenta el PIGA de la entidad, sobre clasificación de residuos, uso código de colores y aspectos e impactos ambientales para un total de 9 asistentes	*Seguimiento de la ejecución de las capacitaciones programadas por el Contratista, acompañada de registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Lista de chequeo de asistentes vs el personal convocado por cada mes.*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X			Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			Todos los frentes de obra cuentan con un campamento adecuado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.	X			Se realiza seguimiento a las observaciones que realiza la SED para subsanar o mejorar en los procedimientos	*Relación de observaciones realizadas por la SED y su correspondiente respuesta y subsanación, acompañada de la gestión realizada por la Interventoría.*


13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.	X			Se realizo seguimiento a las observaciones que realiza la SDA para subsanar, se aprueba y se radica	*Relación y respuesta a las visitas realizadas por la SDA. Se entrega toda la documentación relacionada y aprobada por la Interventoría.*
	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:



NOMBRE: Edson Jair Lopez
CARGO: Especialista ambiental
EMPRESA: Uniobras del oriente S.A.S
FECHA: 06 de julio

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

PLAN/ PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1
INDUCCION	1	Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					E					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FORMACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION INTERVENTORIA	2	Problemática ambiental/ dispocision y getion de residuos solidos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P						X																						
					E						X																						
	3	Programa de transporte sostenible	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P									X																			
					E									X																			
	4	Manejo de cerramiento de los frentes	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P													X															
					E													X															
	5	Posconsumo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																	X											
					E																	X											
	6	Manejo de materiales de construcción	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																					X							
					E																					X							
	7	Orden y aseo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P											X																	
					E											X																	
	8	Uso eficiente de y ahorro de agua y energia	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P														X														
					E														X														
	9	Conocimiento y manejo de sustancias químicas y hojas de seguridad	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																			X									
					E																			X									
	10	Actualización Requisitos legales ambientales.	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																							X					
					E																							X					
	11	Manejo de reciduos peligrosos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																										X		
					E																										X		

PROGRAMADO						0				5				6				6				6				6				5				
EJECUTADO						0				5				6				6				6				6				5				
INCUMPLMIENTO						0,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				
REPROGRAMADO																																		

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
NIT: 829000956-3

FORMATO
PLANILLA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: UNIOBRAS • FT 005
Versión 01
Paqma 1 de 1
recha 12/10/2025

FECHA:

LuGAR:

Capacitación
Charla [Z]
Reunión Gerencial D

Inducción
Otra/Cual:

HORA INICIO: 9 1 O Q

HORA FIN: Cf ; IS SC?

TEMA:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA"

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2				Etelberto Franco
3				
4				
5				Jhoner Andres Ventura
6				Nancy C.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:


CARGO: Especialista

Powered by CamScanner

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar



Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.

Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

earth pact
100% sweet cane paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m^2	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m^2	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m^2	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

earth pact
100% sweet cane paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m^2	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m^2	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m^2	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11-06-2026	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	SEC. DE EDUCACION PISO 3.
Asunto	MESA TRABAJO ACTUALIZACION COMPONENTE AMBIENTALES GRUPO						
Asistentes	FRANKLIN PEREZ H. - DDE.-DCCEE					Asistentes Externos	ING. FELIPE SUAREZ - ING. ANA ALVARADO.
Fecha de Elaboración	11-06-2026	Elaborado por	FRANKLIN PEREZ				Próxima Reunión NO

Desarrollo de la Agenda

- REVISION Y ACTUALIZACION GESTION AMBIENTAL PLATAFORMA WEB. SDA
- REVISION Y RECOMENDACION INFORMES AMBIENTALES
- REVISION Y VERIFICACION % APROVECHAMIENTO (90): 59,8 %.
- REVISION Y VERIFICACION % CIRCULARIDAD 0 %.
- ENTREGA OFICIO SDA - RADICADO 2026EE118830 06-05-2026.

COMPROMISOS

- ACTUALIZAR RG-RCD EN PLATAFORMA.
- PAR RESPUESTA OFICIO 2026 EE118830.
- PAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME AMBIENTAL.
- ACTUALIZAR INFORMACION EN PLATAFORMA MES DE MAYO
- JOLGAMOS REUNION URGENTE A DIRECTOR DE OBRA + SUPERVISOR OBRA Y A INGENIEROS AMBIENTALES DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO DE METAS DE CIRCULARIDAD.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11-06-2026	Inicio	9:00 AM	Fin	2:31 PM	Lugar	SEC. ED. DIST. - PISO 3
Asunto	MESA TRABAJO ACTUALIZACION COMPONENTE AMBIENTALES GRUPO B						
Asistentes	FRANKLIN PEREZ					Asistentes Externos	ING. FELIPE SUAREZ - ANA ALVARADO
Fecha de Elaboración	FRANKLIN P.	Elaborado por	011-06-2026				Próxima Reunión

Compromisos adquiridos:

VER IMAGEN 1 DE 2. →

NOMBRE: FRANKLIN PEREZ H.
CARGO: APOYO SUPERVISION ESP. DCCEE

NOMBRE: Ana Emilse Alvarado
CARGO: Coordinadora HSEQ Consorcio Coral. Grupo B

NOMBRE: Felipe Suarez
CARGO: Apoyo Ambiental UNIMAS - lote 3

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA	ORIGEN *	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas vegetales								
	01 01 02 Tierras limpias de excavación								
	01 01 03 Limos								
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación								
	01 01 05 Otros residuos de excavación			27,06			27,06		Planta de Aprovechamiento GRE VD A004112-0043-2026-CV274 Centro de aprovechamiento RECICLADOS INDUSTRIALES CERT-1226-2026, CERT-1277-2026
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas								
	01 02 02 Bentonitas								
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos								
	01 03 02 Gravas								
	01 03 03 Cantos								
	01 03 04 Ladrillos								
	01 03 05 Arenas								
	01 03 06 Morteros								
	01 03 07 Materiales Cerámicos								
	01 03 08 Residuos de material asfáltico								
	01 03 09 Bases y sub bases granulares								
	01 03 10 Otros residuos pétreos	3	GRECO			3			
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera								
	01 04 02 Plásticos								
	01 04 03 Vidrio								
	01 04 04 Papel y Cartón								
	01 04 05 Gomas y cauchos								
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)								
	01 04 07 Acrílico								
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán								
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento								
	01 04 10 Otros residuos no pétreos								
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro								
	01 05 02 Zinc								
	01 05 03 Cobre								
	01 05 04 Aluminio								
	01 05 05 Otros metales			0,4			0,4		Excireciclables CCO-00001-2026
	02 RCD No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad.								
	*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado. **Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.								
