PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No. 49 — LOTE COP No.16

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — BOGOTÁ

SEMANA N°	49	DEL	7/09/2026 (DD-MM-AA)	AL	13/09/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	345 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16		

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.455.237.837,00
AIU	33,88% $ 831.834.376,18
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82
OFERTADO	$ 2.176.494.644,00
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.276.494.644,00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178.743.193,00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278.743.193,00
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00
Valor adicional No. 2:	$ 635.129.689,00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635.129.689,00
Valor adicional No. 3:	$ -
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 400.000.000,00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3.870.367.526,00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 878.743.193,00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.991.624.333,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026


INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796.278.928,00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139.026.666,00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219.541.737,00
VALOR ADICIONAL No. 03:	$ 178.451.454,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.333.298.785,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0,00%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,35%	100,13%
Valor de la Obra Programada:	$ -	$ 3.870.367.526,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 10.321.104,00	$ 3.875.205.485,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100,00%	99,78%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,35%	
Acumulado actual	100,00%	100,13%	

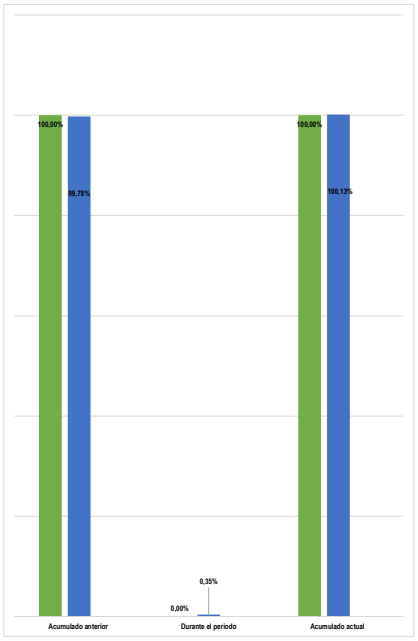

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0,00%	3,45%	3,45%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			0,00%	1,15%	1,15%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			0,00%	0,35%	0,35%	100,00%	100,00%	0,00%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 17.578.413,00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 8.789.206,00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 8.717.991,00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 3.906.314,00		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.859.471,00		
	SUBA	RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.953.157,00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 3.906.314,00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.709.647,00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 11.260.411,00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 127.473.241,00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 52.645.176,00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 45.542.577,00	$ 878.743.193,00	$ 134.217.939,17
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.932.800,00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 18.138.074,00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 63.510.856,00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 21.021.095,00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 15.292.215,00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.346.647,00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.601.511,00		
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%	$ 20.116.701,00		
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	95,00%	95,00%	0,00%	$ 86.367.806,00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	20,00%	20,00%	0,00%	$ 8.550.750,00		
908	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ 5.479.697,00		
	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ 95.754.169,50		
	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE B	6,00%	6,00%	0,00%	$ 36.153.335,33		
		SAN FRANCISCO DE ASIS	0,00%	0,00%	0,00%	$ 50.058.208,00		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORIRARIAS			86,46%	86,46%	0,00%	$ 744.525.253,83	$ 878.743.193,00	$ 134.217.939,17

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3.870.367.526,00
VALOR PARCIAL N°1	$	88.202.201,00
VALOR PARCIAL N°2	$	500.169.705,00
VALOR PARCIAL N°3	$	509.104.595,00
VALOR PARCIAL N°4	$	327.265.136,00
VALOR PARCIAL N°5	$	268.133.285,00
VALOR PARCIAL N°6	$	620.841.807,00
VALOR PARCIAL N°7	$	263.529.060,00
VALOR PARCIAL N°8	$	431.609.822,00
TOTAL VALOR FACTURADO	$	3.008.855.611,00
SUMAS IGUALES		$ 861.511.915,00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3.008.855.611,00	77,74%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 861.511.915,00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	100,00%	100,13%	0,00%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	426	0,00

CURVA S

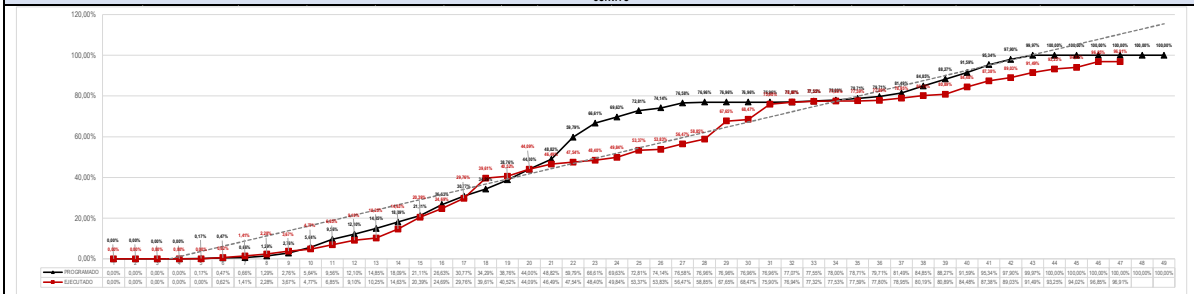

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	17/02/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	SEM 2	24/02/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	SEM 3	2/03/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	SEM 4	9/03/1900	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	SEM 5	16/03/1900	$ 4.755.494,21	0,17%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,17%	$ 4.755.494,21	0,00%	$ -
6	SEM 6	23/03/1900	$ 8.125.912,59	0,29%	0,62%	$ 16.977.206,64	-$ 8.851.294,05	0,47%	$ 12.881.406,80	0,62%	$ 16.977.206,64
7	SEM 7	30/03/1900	$ 5.288.020,00	0,19%	0,79%	$ 21.771.422,72	-$ 16.483.402,72	0,66%	$ 18.169.426,80	1,41%	$ 38.748.629,36
8	SEM 8	6/04/1900	$ 17.444.983,27	0,63%	0,87%	$ 23.997.772,21	-$ 6.552.788,94	1,29%	$ 35.614.410,07	2,28%	$ 62.746.401,57
9	SEM 9	13/04/1900	$ 40.343.446,53	1,46%	1,39%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	2,76%	$ 75.957.856,60	3,67%	$ 101.086.454,08
10	SEM 10	20/04/1900	$ 79.444.682,79	2,88%	1,10%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	5,64%	$ 155.402.539,39	4,77%	$ 131.468.871,36
11	SEM 11	27/04/1900	$ 108.209.197,15	3,92%	2,08%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	9,56%	$ 263.611.736,54	6,85%	$ 188.871.238,19
12	SEM 12	4/05/1900	$ 69.900.889,80	2,54%	2,25%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	12,10%	$ 333.512.626,34	9,10%	$ 250.957.065,40
13	SEM 13	11/05/1900	$ 75.956.528,24	2,76%	1,15%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	14,85%	$ 409.469.154,58	10,25%	$ 282.643.449,07
14	SEM 14	18/05/1900	$ 89.212.283,49	3,24%	4,37%	$ 120.616.837,44	-$ 31.404.553,95	18,09%	$ 498.681.438,07	14,63%	$ 403.260.286,51
15	SEM 15	25/05/1900	$ 83.223.770,74	3,02%	5,76%	$ 158.783.369,63	-$ 75.559.598,89	21,11%	$ 581.905.208,81	20,39%	$ 562.043.656,14
16	SEM 16	1/06/1900	$ 152.231.709,97	5,52%	4,30%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	26,63%	$ 734.136.918,78	24,69%	$ 680.669.456,10
17	SEM 17	8/06/1900	$ 114.051.601,68	4,14%	5,07%	$ 139.680.056,20	-$ 25.628.454,52	30,77%	$ 848.188.520,46	29,76%	$ 820.349.512,30
18	SEM 18	15/06/1900	$ 97.149.131,29	3,52%	9,85%	$ 271.555.749,04	-$ 174.406.617,75	34,29%	$ 945.337.651,75	39,61%	$ 1.091.905.261,34
19	SEM 19	22/06/1900	$ 123.336.874,83	4,47%	0,92%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	38,76%	$ 1.068.674.526,58	40,52%	$ 1.117.198.758,64
20	SEM 20	29/06/1900	$ 144.354.651,09	5,24%	3,57%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	44,00%	$ 1.213.029.177,67	44,09%	$ 1.215.595.784,44
21	SEM 21	6/07/1900	$ 133.044.130,87	4,83%	2,39%	$ 65.986.851,22	$ 67.057.279,65	48,82%	$ 1.346.073.308,54	46,49%	$ 1.281.582.635,66
22	SEM 22	13/07/1900	$ 302.192.068,33	10,96%	1,05%	$ 28.959.518,19	$ 273.232.550,14	59,79%	$ 1.648.265.376,87	47,54%	$ 1.310.542.153,85
23	SEM 23	20/07/1900	$ 188.077.906,58	6,82%	0,86%	$ 23.746.298,25	$ 164.331.608,33	66,61%	$ 1.836.343.283,45	48,40%	$ 1.334.288.452,10
24	SEM 24	27/07/1900	$ 83.278.260,58	3,02%	1,44%	$ 39.714.826,84	$ 43.563.433,74	69,63%	$ 1.919.621.544,03	49,84%	$ 1.374.003.278,94
25	SEM 25	3/08/1900	$ 87.605.509,23	3,18%	3,54%	$ 97.485.710,00	-$ 9.880.200,77	72,81%	$ 2.007.227.053,26	53,37%	$ 1.471.488.988,94
26	SEM 26	10/08/1900	$ 36.671.729,02	1,33%	0,46%	$ 12.586.346,12	$ 24.085.382,90	74,14%	$ 2.043.898.782,28	53,83%	$ 1.484.075.335,06
27	SEM 27	17/08/1900	$ 67.465.761,55	2,45%	2,64%	$ 72.654.892,31	-$ 5.189.130,76	76,58%	$ 2.111.364.543,83	56,47%	$ 1.556.730.227,37
28	SEM 28	24/08/1900	$ 10.504.787,87	0,38%	2,38%	$ 65.673.691,00	-$ 55.168.903,13	76,96%	$ 2.121.869.331,70	58,85%	$ 1.622.403.918,37
29	SEM 29	31/08/1900	$ -	0,00%	8,81%	$ 242.792.425,00	-$ 242.792.425,00	76,96%	$ 2.121.869.331,70	67,65%	$ 1.865.196.343,37
30	SEM 30	7/09/1900	$ -	0,00%	0,82%	$ 22.593.456,00	-$ 22.593.456,00	76,96%	$ 2.121.869.331,70	68,47%	$ 1.887.789.799,37
31	SEM 31	14/09/1900	$ -	0,00%	7,43%	$ 204.830.616,00	-$ 204.830.616,00	76,96%	$ 2.121.869.331,70	75,90%	$ 2.092.620.415,37
32	SEM 32	21/09/1900	$ 2.939.616,46	0,11%	1,04%	$ 28.542.222,29	-$ 25.602.605,83	77,07%	$ 2.124.808.948,16	76,94%	$ 2.121.162.637,66
33	SEM 33	28/09/1900	$ 13.157.394,66	0,48%	0,38%	$ 10.486.451,43	$ 2.670.943,23	77,55%	$ 2.137.966.342,82	77,32%	$ 2.131.649.089,09
34	SEM 34	5/10/1900	$ 12.548.751,03	0,46%	0,21%	$ 5.874.529,72	$ 6.674.221,31	78,00%	$ 2.150.515.093,85	77,53%	$ 2.137.523.618,81
35	SEM 35	12/10/1900	$ 19.593.618,07	0,71%	0,06%	$ 1.598.978,52	$ 17.994.639,55	78,71%	$ 2.170.108.711,92	77,59%	$ 2.139.122.597,33
36	SEM 36	19/10/1900	$ 27.411.758,80	0,99%	0,21%	$ 5.775.725,09	$ 21.636.033,71	79,71%	$ 2.197.520.470,72	77,80%	$ 2.144.898.322,42
37	SEM 37	26/10/1900	$ 49.017.622,18	1,78%	1,15%	$ 31.821.056,27	$ 17.196.565,91	81,49%	$ 2.246.538.092,90	78,95%	$ 2.176.719.378,69
38	SEM 38	2/11/1900	$ 92.689.422,33	3,36%	1,24%	$ 34.157.077,65	$ 58.532.344,68	84,85%	$ 2.339.227.515,23	80,19%	$ 2.210.876.456,34
39	SEM 39	9/11/1900	$ 94.464.846,21	3,43%	0,70%	$ 19.295.707,59	$ 75.169.138,62	88,27%	$ 2.433.692.361,44	80,89%	$ 2.230.172.163,93
40	SEM 40	16/11/1900	$ 91.363.907,55	3,31%	3,59%	$ 98.989.618,19	-$ 7.625.710,64	91,59%	$ 2.525.056.268,99	84,48%	$ 2.329.161.782,12
41	SEM 41	23/11/1900	$ 103.561.399,66	3,76%	2,90%	$ 79.872.634,44	$ 23.688.765,22	95,34%	$ 2.628.617.668,65	87,38%	$ 2.409.034.416,56
42	SEM 42	30/11/1900	$ 70.486.269,07	2,56%	1,65%	$ 45.378.952,96	$ 25.107.316,11	97,90%	$ 2.699.103.937,72	89,03%	$ 2.454.413.369,52
43	SEM 43	7/12/1900	$ 57.127.153,06	2,07%	2,46%	$ 67.903.696,24	-$ 10.776.543,18	99,97%	$ 2.756.231.090,78	91,49%	$ 2.522.317.065,76
44	SEM 44	14/12/1900	$ 733.972,09	0,03%	1,76%	$ 48.598.205,98	-$ 47.864.233,89	100,00%	$ 2.756.965.062,87	93,25%	$ 2.570.915.271,74
45	SEM 45	21/12/1900		0,00%	0,77%	$ 21.260.114,90	-$ 21.260.114,90	100,00%	$ 2.756.965.062,87	94,02%	$ 2.592.175.386,64
46	SEM 46	28/12/1900		0,00%	2,82%	$ 77.844.021,32	-$ 77.844.021,32	100,00%	$ 2.756.965.062,87	96,85%	$ 2.670.019.407,96
47	SEM 47	4/01/1901		0,00%	0,06%	$ 1.778.534,51	-$ 1.778.534,51	100,00%	$ 2.756.965.062,87	96,91%	$ 2.671.797.942,47
48	SEM 48	11/01/1901		0,00%	1,15%	$ 13.550.300,00	-$ 13.550.300,00	100,00%	$ 2.756.965.062,87		
49	SEM 49	18/01/1901		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.756.965.062,87		
			$ 2.756.965.062,87								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se debe efectuar la reparación del filo del cárcamo, la cual nuevamentel presenta agrietamiento y desprendimiento. De igual manera edebe efectuar repapracion de la dilatacion en cancha. Respecto a la diferencia de tonalidad de la pintura existente, la interventoría solicita realizar el acabado con una tonalidad similar a la existente, con el fin de garantizar la uniformidad del acabado y evitar diferencias visibles en el área intervenida.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, el contratista realizo jornadas de orden y aseo e implemento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Sede entregada sin novedad.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se solicito la pintura en el cuarto de almacen ubicado en el primer nivel, al igual que ajuste de soporte de una bajante y reparacion de enchape en piso. Estas actividades se realizaran durante el transcurso de la proxima semana.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: El contratista efectúa reparaciones en las dilataciones de la parte interna del cuarto de basuras. Sin embargo, estas intervenciones se limitan al interior dicho espacio, por lo que las demás dilataciones quedan pendientes de reparación.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observaciones presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Durante el presente periodo, se efectúa la fundida de la gravilla sobre la placa del tanque.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la programación de actividades para la colocación de gravilla en el área perimetral de la placa, alrededor del piso instalado previamente, con el propósito de complementar las condiciones de adecuación y acabado del área intervenida.
De igual manera, se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad del tanque de almacenamiento de agua y de las áreas intervenidas, verificando aspectos relacionados con el orden, aseo, accesibilidad y control de condiciones que puedan representar riesgos para los trabajadores y demás usuarios de la institución.
Se recomienda mantener las áreas de trabajo delimitadas y señalizadas durante la ejecución de las actividades, así como garantizar el adecuado manejo y disposición de los materiales, herramientas y residuos, con el fin de prevenir incidentes, caídas al mismo nivel y demás condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio los andamios y barandas en el frente, se recomienda retirar todo, realizar jornadas de aseo y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: La supervisión solicita efectuar pruebas de estanqueidad mediante el llenado y puesta en funcionamiento del tanque, con el fin de verificar su correcto funcionamiento, así como el funcionamiento del flotador y comprobar que no se presenten fugas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Durante el presente periodo, se ejecutan actividades de instalación de la estructura metálica y la madera correspondiente para la conformación de las mesas ubicadas en el salón de informática y de labores de aseo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con la adecuación, organización y disposición de los espacios de la institución, correspondientes a las aulas intervenidas en el tercer piso.
En el desarrollo de estas actividades se realizó la instalación y disposición de puestos de trabajo, tableros y televisores, verificando las condiciones de orden, aseo y organización de las áreas intervenidas, con el propósito de minimizar condiciones inseguras y garantizar espacios adecuados para su uso.
Asimismo, se efectuó seguimiento a las condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades, procurando mantener las áreas despejadas, libres de obstáculos y con una adecuada disposición de los elementos instalados. Estas acciones estuvieron orientadas a prevenir incidentes y accidentes de trabajo y a garantizar condiciones seguras para trabajadores y usuarios.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se le hace un llamado de atención al contratista por que se sigue evidenciando los andamios en la zona, al igual que no se evidencio el cerramiento adecuado de los individuos arbóreos y se vio afectado, por lo que se recomienda recuperar la zona verde y la debida protección a los individuos arbóreos, al igual que realizar labores de orden y aseo en las áreas intervenidas e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: La supervisión solicita realizar el retiro y evacuación del material acopiado, con el fin de liberar y mantener despejados los espacios intervenidos. Se solicitó la reposición de algunas tomas, debido a que no se encuentra en funcionamiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: Durante el presente periodo, se culmina la instalación de la reja en el área de parqueaderos, se efectúa la demarcación de la placa y se instalan los bicicleteros. De igual manera, se efectúa la entrega de la primera etapa de la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la culminación de las labores de pintura en la placa intervenida, así como la finalización de las actividades de instalación y acabados de la baranda ubicada en dicha área. De igual manera, se realizó la instalación de bicicleteros en la placa de la institución.
Durante el seguimiento se verificaron las condiciones generales de seguridad de las áreas intervenidas, haciendo énfasis en el adecuado desarrollo de las actividades y en la disposición segura de los elementos instalados, con el fin de prevenir condiciones que puedan generar incidentes, accidentes o afectaciones a trabajadores y usuarios.
Como aspecto de mejora, se recomienda realizar la limpieza inmediata de las áreas que presenten derrames o residuos de pintura, garantizando condiciones adecuadas de orden y aseo, evitando superficies resbaladizas y posibles riesgos de caídas al mismo nivel. Asimismo, se deberá realizar la disposición adecuada de los residuos generados durante las actividades, de acuerdo con los lineamientos establecidos para el manejo de residuos en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos, se evidencio derrame de pintura al igual que se evidencia las barandas retiradas en la zona verde, por lo que se solicita realizar el retiro de esta zona, asimismo el contratista realizo jornadas de orden y aseo al igual se garantizó el cumplimiento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Como pendiente, queda la ejecución de la segunda etapa, la cual contempla la instalación del policarbonato, la escalera y el sistema de CCTV. Para este último, el contratista debe remitir el NP correspondiente para la revisión y aprobacion

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **EL JAZMIN - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 11 de Agosto de 2026, labores finalizadas.

° **LA FELICIDAD - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 10 de Agosto de 2026, labores finalizadas.

° **RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A:** Labores finalizadas. El contratista realiza labores de corte y retiro de material vegetal.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se finalizan las obras diseñadas para reparar las filtraciones en cubierta y se realiza la entrega sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Obra finalizada y entregada sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:

6. Generales: Se espera que la supervisión verifique el balance presupuestal y, con base en este, defina la viabilidad de realizar la intervención correspondiente en la sede. No se realizará la intervención hasta contar con el aval correspondiente por parte de la supervisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se instalo la canal, flanche y el desagüe. Se verifico arreglo de filtracion de sanitario, sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Para el día martes se programaron las pruebas y capacitación del equipo de bombeo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion es Mantenimiento cerramiento metálico existente incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero de Nivelacion Tipo Sikafloor, suminitro e instalacion de flanches y Reparacion de filtracion en la placa de cubierta

Se efectuó la entrega de este frente el día miércoles 9 de septiembre.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, el contratista realizo jornadas de orden y aseo e implemento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: El cerramiento de la biblioteca presenta observaciones relacionadas con los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista efectuar las respectivas correcciones, así como las labores de aseo correspondientes. Se encuentra pendiente que el contratista ejecute dichas actividades.
Así mismo, queda pendiente que el contratista entregue el soporte correspondiente de la entrega de las mallas de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

1. Actividades Tecnicas: El alcance contempla las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado "la casona"

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Labores ejecutadas sin novedad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales:N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas y entregadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La intervencion incluye las labores de pintura en la fachada posterior y la fachada lateral interna efectuadas en el bloque principal, lo anterior con el fin de unificar la apariencia del bloque; labores finalizadas sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se programaron actividades de pintura de puertas durante el fin de semana, con el fin de ejecutarlas sin presencia de los estudiantes y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El alcance de la intervencion incluye la pintura de muros, puertas y esmalte punto fijos de primer y segundo nivel

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: En la presente sede, el residente de obra estuvo en sitio durante las labores de cierre de algunos registros por parte de la institución, con el fin de identificar su ubicación y determinar a qué corresponden. Las labores de intervención en esta sede se tienen previstas para iniciar durante la próxima semana.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, por lo que se recomendó realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Ficha SAE remitida el 03 de Agosto de 2026. El alcance de la intervención contempla el desmonte del cielorraso para permitir la intervención de la tubería y garantizar nuevamente el suministro de agua en los baños, así como la posterior reinstalación del cielorraso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO COSTA RICA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La supervisión aprobó el inicio de las labores para la próxima semana.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista realiza la instalación del cerramiento en polisombra. De igual manera, se inician las actividades de traslado y acopio de materiales, así como las labores de demolición de un muro.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VAN UDEN SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La supervisión aprobó el inicio de las labores para la próxima semana.

OBSERVACION: Se actualizacion en la tabla de los valores unitarios de las emergencias

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. PEDRO ENRIQUE GALENAO SANTANA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRIGUEZ
ASESOR JURÍDICO

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 329 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Se hicieron terminaciones en esquina del cielo raso de la ludoteca de la institución.



Pendiente taponamiento de conexión eléctrica de luminarias al cielo raso.



Persisten fisuras en piso de la cancha con respecto al carcamo.



Se evidencia instalación de tapa registro para el access point.



Se evidencia instalación de tapa registro para el access point.



Se evidencia limpieza del cielorraso de la ludoteca.

1.



Se evidencia terminación parcial del cielorraso de la biblioteca.



Se hicieron terminaciones en esquina del cielo raso de la ludoteca de la institución.



Se evidencia terminación parcial del cielorraso de la biblioteca.



Finalización de cielo raso.



Persiste agrietamiento en piso de la cancha con respecto al carcamo.

p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 49** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 329 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Se evidencia reestructuración en cerramiento de la institución.



Se evidencia pintura en puertas del primer piso, tonalidad amarillo.




Se evidencia pintura en puertas del primer piso, tonalidad amarillo.



Se evidencia finalización de puertas en segundo piso, tonalidad amarillo.



Pendiente pintura de guardaescobas en primer y segundo piso.



Se evidencia falta de aseo en salones intervenidos, tercer y cuarto piso.

1.




Se evidencia ejecución de aseo en salones intervenidos, tercer y cuarto piso.



Se evidencia tomacorrientes quemado y fuera de servicio en salón de tercer piso.



Se evidencia instalación de estructuras metálicas y bases de madera en cuarto piso.



Se evidencia instalación de puestos y accesorios en salones intervenidos.



Se evidencia instalación de televisores, puestos y demás en salones intervenidos.



Pendiente pintura de guardaescobas en primer y segundo piso.



Se evidencia vidrio del rack roto.



Se evidencia vidrio de mueble de la institución roto.


p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 49** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 329 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Se evidencia colocación de pernos en baranda de la placa.



Ejecución parcial de instalación de baranda en la placa.

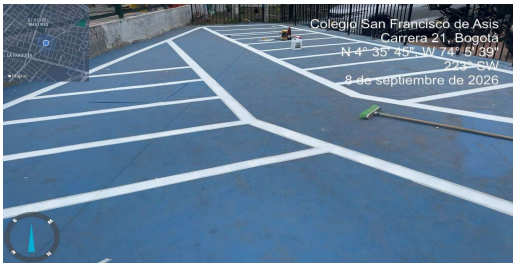

Inicio de pintura en placa, tonalidad blanco



Se ejecutó parte de cerramiento en la placa.




Se evidencia pintura amarilla derramada en parte de la institución, pendiente de limpieza.




Se prevé reestructuración de la rampa.




Finalización de pintura en toda la placa.

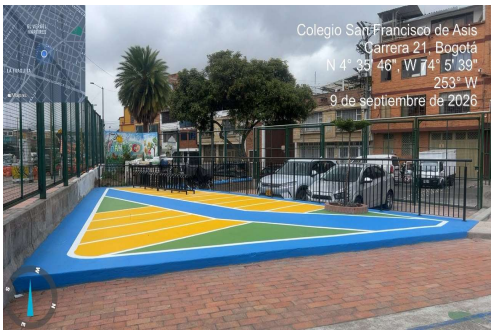

Finalización de pintura en toda la placa.




Instalación de bicicleteros en la placa.




Instalación de tapones en baranda de la placa.



Se evidencia ejecución de pintura en placa ubicada en jardín de la institución.



Se evidencian remates en baranda de la placa.



Baranda retirada anteriormente de la placa de sala de juegos infantil aún sin disposición final, ubicada en zona verde.



Se evidencia limpieza parcial de pintura anteriormente derramada.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 329 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Finalización de filos y remates de instalación de piso en placa del tanque.



Finalización de filos y remates de instalación de piso en placa del tanque.




No se evidencia descenso del nivel de agua del tanque nuevo respecto a marca de 1,65 m con relación al filo.



Aplicación de piso en la placa.



Se prevé instalación de gravilla en la placa.

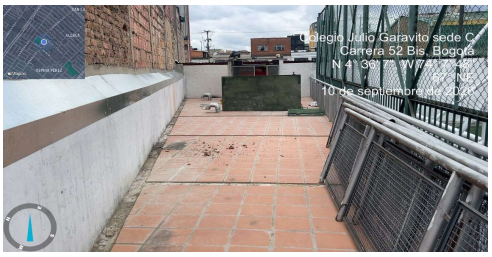

Se prevé instalación de gravilla en la placa.

1.



No se evidencia descenso del nivel de agua del tanque nuevo respecto a marca de 1,65 m con relación al filo.



Se verifica que el muro posterior al tanque ya no presenta humedad.



Se confirma que el sistema contra incendios ya no presenta fuga de agua.



Desmonte de andamio.



Se prevé inicio de instalación de gravilla



El muro del costado opuesto de la placa persiste seco.
