PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 50 — LOTE COP No.17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	50	DEL	14/09/2026 (DD-MM-AA)	AL	20/09/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	352 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	LOTE COP	17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 17"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.220.672.788,00
AIU	35,95% $ 798.331.867,29
COSTO DIRECTO	$ 1.422.340.920,71
OFERTADO	$ 2.010.369.000,00
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.110.369.000,00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 110.273.788,00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 210.273.788,00
Valor adicional No. 1:	$ 791.000.000,00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591.000.000,00
Valor adicional No. 2:	$ 266.646.703,00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 266.646.703,00
Valor adicional No. 3:	$ -
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 125.000.000,00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3.403.319.491,00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 535.273.788,00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.868.045.703,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/11/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796.278.928,00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139.026.666,00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219.541.737,00
VALOR ADICIONAL No. 03: 01 de mayo de 2026	$ 178.451.454,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.333.298.785,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/11/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0,00%	100,00%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0,34%	95,59%
Valor de la Obra Prooramada:	$ -	$ 3.403.319.491,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 9.884.248,00	$ 3.253.390.795,75

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100,00%	95,25%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,34%	
Acumulado actual	100,00%	95,59%	

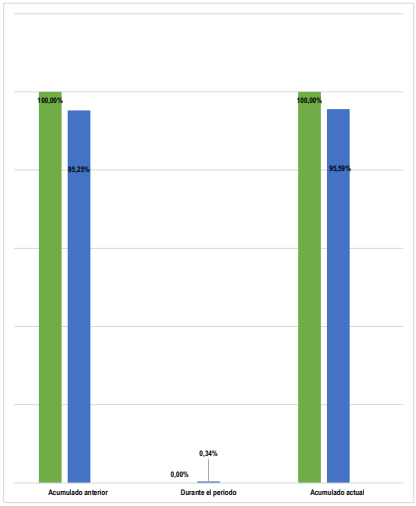

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED) - (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.256.247,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) - (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 991.678,00		
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 4.000.213,00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A (IED) - (OBRA N°1)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.290.790,00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.002.895,00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 12.292.686,00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 69.693.624,00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%	$ 31.959.238,00		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 693.525,00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	90,00%	90,00%	0,00%	$ 5.698.350,00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.563.407,00	$ 535.273.788,00	$ -
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0,00%	0,00%	0,00%	$ 8.745.190,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 46.472.263,00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.391.911,00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 11.360.185,00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 13.911.534,00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 37.690.598,00		
	ENGATIVA	TABORA - SEDE B (IED)	98,00%	98,00%	0,00%	$ 59.029.576,00		
1026	ENGATIVA	MORISCO - SEDE A	8,00%	8,00%	0,00%	$ 22.344.568,00		
1306	TEUSAQUILLO	DIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO Y CHAPINERO	9,00%	9,00%	0,00%	$ 7.252.881,00		
	TEUSAQUILLO	CENTRO DE INNOCAVION CIUDAD MAESTRA	0,05%	0,05%	0,00%	$ 18.206.468,00		
	ENGATIVA	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	$ 80.636.916,00		
		BOLSA DISPONIBLE	0,00%	0,00%	0,00%	$ 2.797.365,00		
	TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS		78,48%	78,48%	0,00%	$ 535.273.788,00	$ 535.273.788,00	$ -

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS — SEMANA 50

% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	VALOR TOTAL OBRAS EMERGENCIA / PRIORITARIAS	BOLSA DISPONIBLE (SIN ASIGNAR)
73,98%	$ 395.989.401,44	$ 139.284.386,56	$ 535.273.788,00	$ 2.797.365,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3.403.319.491,00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250.642.138,00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117.739.152,00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189.500.435,00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575.032.890,00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 205.546.137,00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 1.183.611.476,00	
VALOR PARCIAL N°7	$ 251.107.445,00	
VALOR PARCIAL N°8	$ 256.304.221,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3.029.483.894,00	
SUMAS IGUALES		$ 373.835.597,00

INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3.029.483.894,00	89,02%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 373.835.597,00	


NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	100,00%	95,59%	0,00%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	395	0,00

CURVA S

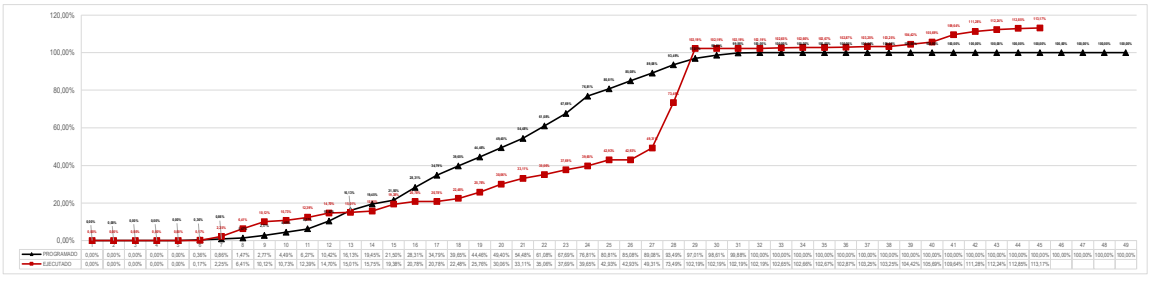

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$ 3.560.372,37
7	SEM 7	23/11/2025	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$ 48.239.463,89
8	SEM 8	30/11/2025	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$ 137.597.360,22
9	SEM 9	7/12/2025	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$ 217.168.694,22
10	SEM 10	14/12/2025	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$ 230.190.767,94
11	SEM 11	21/12/2025	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$ 265.806.778,97
12	SEM 12	28/12/2025	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$ 315.377.088,18
13	SEM 13	4/01/2026	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$ 322.161.053,34
14	SEM 14	11/01/2026	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$ 337.968.167,27
15	SEM 15	18/01/2026	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$ 415.845.541,16
16	SEM 16	25/01/2026	$ 146.069.718,11	6,81%	1,40%	$ 30.089.741,18	$ 115.979.976,93	28,31%	$ 607.360.138,42	20,78%	$ 445.935.282,34
17	SEM 17	1/02/2026	$ 139.176.465,48	6,49%	0,00%	$ -	$ 139.176.465,48	34,79%	$ 746.536.603,90	20,78%	$ 445.935.282,34
18	SEM 18	8/02/2026	$ 104.287.650,61	4,86%	1,70%	$ 36.490.712,95	$ 67.796.937,66	39,65%	$ 850.824.254,51	22,48%	$ 482.425.995,29
19	SEM 19	15/02/2026	$ 103.217.358,77	4,81%	3,28%	$ 70.411.280,31	$ 32.806.078,46	44,46%	$ 954.041.613,28	25,76%	$ 552.837.275,61
20	SEM 20	22/02/2026	$ 106.018.979,79	4,94%	4,30%	$ 92.230.745,51	$ 13.788.234,28	49,40%	$ 1.060.060.593,07	30,06%	$ 645.068.021,12
21	SEM 21	1/03/2026	$ 108.890.772,44	5,07%	3,04%	$ 65.324.533,83	$ 43.566.238,61	54,48%	$ 1.168.951.365,51	33,11%	$ 710.392.554,94
22	SEM 22	8/03/2026	$ 141.591.914,58	6,60%	1,96%	$ 41.952.272,34	$ 99.639.642,24	61,08%	$ 1.310.543.280,09	35,06%	$ 752.344.827,28
23	SEM 23	15/03/2026	$ 141.821.023	6,61%	2,63%	$ 56.436.113,65	$ 85.384.908,93	67,69%	$ 1.452.364.302,67	37,69%	$ 808.780.940,94
24	SEM 24	22/03/2026	$ 195.783.357,18	9,12%	1,96%	$ 42.032.589,39	$ 153.750.767,79	76,81%	$ 1.648.147.659,85	39,65%	$ 850.813.530,33
25	SEM 25	29/03/2026	$ 85.857.460,32	4,00%	3,28%	$ 70.464.825,01	$ 15.392.635,31	80,81%	$ 1.734.005.120,17	42,93%	$ 921.278.355,34
26	SEM 26	5/04/2026	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%	$ -	$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17	42,93%	$ 921.278.355,34
27	SEM 27	12/04/2026	$ 85.894.033,40	4,00%	6,37%	$ 136.751.605,45	-$ 50.857.572,05	89,08%	$ 1.911.419.741,57	49,31%	$ 1.058.029.960,79
28	SEM 28	19/04/2026	$ 94.703.170,29	4,41%	24,18%	$ 518.879.264,72	-$ 424.176.094,43	93,49%	$ 2.006.122.911,86	73,49%	$ 1.576.909.225,51
29	SEM 29	26/04/2026	$ 75.414.814,61	3,51%	28,70%	$ 615.876.991,66	-$ 540.462.177,05	97,01%	$ 2.081.537.726,47	102,19%	$ 2.192.786.217,17
30	SEM 30	3/05/2026	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%	$ -	$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28	102,19%	$ 2.192.786.217,17
31	SEM 31	10/05/2026	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%	$ -	$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67	102,19%	$ 2.192.786.217,17
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%	$ -	$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,19%	$ 2.192.786.217,17
33	SEM 33	24/05/2026		0,00%	0,45%	$ 9.741.992,00	-$ 9.741.992,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,65%	$ 2.202.528.209,17
34	SEM 34	31/05/2026		0,00%	0,02%	$ 321.872,32	-$ 321.872,32	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,66%	$ 2.202.850.081,49
35	SEM 35	7/06/2026		0,00%	0,01%	$ 170.566,46	-$ 170.566,46	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,67%	$ 2.203.020.647,95
36	SEM 36	14/06/2026		0,00%	0,20%	$ 4.365.724,96	-$ 4.365.724,96	100,00%	$ 2.145.760.549,67	102,87%	$ 2.207.386.372,91
37	SEM 37	21/06/2026		0,00%	0,38%	$ 8.059.922,60	-$ 8.059.922,60	100,00%	$ 2.145.760.549,67	103,25%	$ 2.215.446.295,51
38	SEM 38	28/06/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67	103,25%	$ 2.215.446.295,51
39	SEM 39	5/07/2026		0,00%	1,17%	$ 25.190.766,00	-$ 25.190.766,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67	104,42%	$ 2.240.637.061,51
40	SEM 40	12/07/2026		0,00%	1,27%	$ 27.191.796,29	-$ 27.191.796,29	100,00%	$ 2.145.760.549,67	105,69%	$ 2.267.828.857,80
41	SEM 41	19/07/2026		0,00%	3,95%	$ 84.769.332,78	-$ 84.769.332,78	100,00%	$ 2.145.760.549,67	109,64%	$ 2.352.598.190,58
42	SEM 42	26/07/2026		0,00%	1,64%	$ 35.107.747,34	-$ 35.107.747,34	100,00%	$ 2.145.760.549,67	111,28%	$ 2.387.705.937,92
43	SEM 43	2/08/2026		0,00%	0,97%	$ 20.733.636,67	-$ 20.733.636,67	100,00%	$ 2.145.760.549,67	112,24%	$ 2.408.439.574,59
44	SEM 44	9/08/2026		0,00%	0,61%	$ 13.076.063,54	-$ 13.076.063,54	100,00%	$ 2.145.760.549,67	112,85%	$ 2.421.515.638,13
45	SEM 45	16/08/2026		0,00%	0,32%	$ 6.880.375,01	-$ 6.880.375,01	100,00%	$ 2.145.760.549,67	113,17%	$ 2.428.396.013,14
46	SEM 46	23/08/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
47	SEM 47	30/08/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
48	SEM 48	6/09/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
49	SEM 49	13/09/2026		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTÁ BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto, estos se encuentran en fabricacion. Para esta actividad, se requiere una programación previa, teniendo en cuenta la extensión de la jornada estudiantil. En comité se solicitó que dicha actividad sea programada con antelación, con el fin de coordinar su ejecución y garantizar las condiciones adecuadas para su desarrollo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el cambio de sifones, con el fin de mitigar la presencia de olores provenientes de la tubería, considerando que los nuevos sifones cuentan con sello hidráulico mediante agua, no obstante, persiste la presencia de olores en uno de los baños

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Por solicitud de la supervisión, se requiere realizar el cambio de los sifones existentes, incluyendo el respectivo desmonte de los elementos actuales y la instalación de los nuevos sifones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos. Se debe verificar la cantidad y el metraje de cable requerido para la conexión de los puntos de datos.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Queda pendiente la atención en garantía de las mesas de informática que presentan afectaciones. De igual manera, se debe efectuar una visita para verificar y realizar la nivelación de las lámparas, actividad prevista para la semana de receso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ

1. Actividades Tecnicas: Se efectuan actividades de ajustes en la pintura

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidencia desprendimiento de la pintura del piso. De acuerdo con el recorrido realizado en sitio, se establece la necesidad de efectuar los ajustes y reparaciones correspondientes.
Según lo observado, las afectaciones podrían estar asociadas al desplazamiento de mobiliario por parte de la institución sin la debida protección del piso, lo que habría ocasionado impactos sobre el recubrimiento. Asimismo, se considera que el exceso de humedad generado por las lluvias y por bajantes instaladas por la institucion contribuyó al desprendimiento de la pintura en algunos sectores. De igual manera, queda pendiente la verificación de puerta y la atención de goteras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El frente se encuentra entregado, sin novedades pendientes a la fecha.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **LAS MERCEDES - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El requerimiento se efectua en respuesta a la necesidad de reparar el equipo del cuarto frio de refrigeración que estaba dañado y no llegaba a temperatura, ante esto se procede al cambio del compresor, mantenimiento y reubicación de la condensadora. El equipo de congelación se traslada y se reubica en un espacio aislado en la zona de la cocina interna que permita la manipulación del mismo.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realizó entrega

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion fue "Instalación de estructura metálica y cubierta en lamina Alveolar con el fin de garantizar el acceso a la biblioteca de la institución, ubicada en el segundo nivel del BLOQUE B."

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista ejecuta las actividades, no se presenta ninguna novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra gestionando la autorización de ingreso del personal encargado de realizar el remate pendiente. Dicha actividad está prevista para ejecutarse durante un fin de semana.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada. Queda pendiente instalacion de una tableta y remate de muro donde se efectuo el arreglo

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El contratista efectúa el sellado por la parte inferior de la cubierta. Queda pendiente verificar la efectividad del sellado frente a la filtración en condiciones de lluvia que permitan comprobar el correcto sellado.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se encuentra pendiente verificar el correcto sellado de la cubierta durante la presencia de lluvias, con el fin de identificar y prevenir posibles filtraciones que puedan generar condiciones inseguras. Así mismo, se encuentra pendiente la instalación del flanche de unión entre el bloque de música y las aulas escolares. Se recomienda mantener las áreas de trabajo en condiciones seguras, evitando superficies húmedas o resbaladizas y garantizando las medidas de prevención y control requeridas.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta. Se sellará por la parte inferior del flanche, con el fin de evitar generar afectaciones adicionales en el elemento existente de acuerdo con lo indicado en comite de obra realizado el dia 14 de agosto del 2026. A la espera que el contratista inicie labores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El NP 015 en relacion a un humificador industrial se encuentra radicado ante la SED

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia que las actividades previstas para el frente de trabajo se encuentran finalizadas, dando cumplimiento a las labores contempladas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre y a la espera de la entrega definitiva, debido a que este colegio está programado para entrega definitiva.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se encuentran terminadas las labores asociadas al área intervenida frente al nuevo punto de suministro de agua.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó una visita de inspección, en la cual se evidenció que el acueducto aún no ha efectuado la instalación del medidor requerido para el suministro de agua hacia los laboratorios. Se recomienda realizar el seguimiento correspondiente ante la entidad competente hasta su instalación y puesta en funcionamiento.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realiza intervención en la sede para la conformación de una nueva caja de medición de acueducto, con conexión mediante tubería de 3/4", con el fin de garantizar las condiciones de caudal y presión requeridas para el adecuado funcionamiento de la institución educativa. Lo anterior, debido a que la sede contaba anteriormente con una conexión en tubería de 1/2". La Secretaría realizará los trámites correspondientes ante la Empresa de Acueducto para la anulación del punto de conexión existente y la posterior habilitación y conexión de la nueva caja de medición.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Durante el comité se revisó el compromiso relacionado con la instalación de los bicicleteros. El contratista realiza entrega de bicicleteros

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre y a la espera de la entrega definitiva, debido a que este colegio está programado para entrega definitiva.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realizo entrega, sin novedad

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Con el fin de garantizar el carácter modular del aula y facilitar su posterior desmonte y reinstalación en otro lugar, se ejecutó un sistema de aislamiento y anclaje de la estructura metálica respecto al piso, permitiendo su desmontaje sin afectar los elementos estructurales. Asimismo, se elevó la estructura para evitar el contacto directo con el terreno y reducir la exposición a humedad y nivel freático, minimizando el riesgo de corrosión y prolongando la vida útil de los elementos metálicos.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 352 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizo entrega, sin novedad

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizaron actividades de pintura en el cerramiento contra impacto existente en la institución, con el fin de efectuar labores de mantenimiento, mejorar su acabado y garantizar uniformidad en su apariencia

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MORISCO - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizo cerramiento e ingreso de materiales a la sede para dar inicio a las labores

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, el contratista remitió la documentación correspondiente a dos trabajadores, con el fin de avanzar en las actividades programadas en la institución. Se recomendó realizar la inducción de SST antes del inicio de labores, así como garantizar el uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal requeridos de acuerdo con las actividades a ejecutar.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se remite ficha SAE el sabado 22 de agosto del 2026. Se efectuó visita de verificación el día miércoles 2 de septiembre, durante la cual se definió la instalación de un eje central como elemento de refuerzo estructural entre las luces de soporte conformadas por perfiles tipo C, ubicados en la zona del caballete; a la espera del presupuesto de obra con el fin de que la supervision apruebe si se va a llevar a cabo la ejecucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se efectúa instalacion de piso, gravilla y se realiza aseo del espacio intervenido

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de labores de enchapado de piso, mediante la colocación de baldosa de gres sobre la capa de alistado previamente instalada. Se recomienda garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP requeridos para la actividad, especialmente el casco de seguridad, así como mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos (volumen bajo), por lo que se recomienda retirarlos de esta zona, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La intervencion incluye ampliacion de la tuberia de red sanitaria, lo que incluye la ultima caja del predio y la conexión a las redes principales. Se aprobó la demolición y fundición de la placa en la zona correspondiente al acceso de la institución educativa, debido a que, una vez efectuado el desmonte del piso existente, se verificó que la placa se encontraba totalmente fisurada. En atención a esta condición, la supervisión solicitó la instalación de losetas prefabricadas en gres. Respecto a la caja de inspección ubicada en el acceso principal de la sede, la cual conecta con la red de salida, se solicitó su marcación, teniendo en cuenta que, por su ubicación, no podrá quedar accesible para inspección. Se requiere dejar claramente señalizada su ubicación para facilitar su localización en caso de requerirse.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCION LOCAL DE EDUCACION TEUSAQUILLO Y CHAPINERO

1. Actividades Tecnicas: Se realiza demolicion de placa, excavacion, cajas de inspeccion

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de demolición de placa y retiro de unidades sanitarias. Se recomienda garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP requeridos para estas labores, así como mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el área de trabajo, con el fin de prevenir incidentes y accidentes laborales.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, se evidencio la demolición de placa y el retiro de unidades sanitarias, por lo que se recomienda disponer todo adecuadamente, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA CENTRO DE INNOVACION CIUDAD MAESTRA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista radica el NP 020 para incluir el item panel de lamina en fibra mineral. Este se encuentra en revision

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B

1. Actividades Tecnicas: La supervisión aprobó el ingreso al colegio para realizar la intervención desde el dia 21 de septiembre.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se plantea la conformación de una plazoleta, la demolición de los muros perimetrales en la zona de los tanques y la adecuación de un nuevo punto de suministro para los tanques.

OBSERVACION: Se actualizacion en la tabla de los valores unitarios de las emergencias

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. PEDRO ENRIQUE GALENAO SANTANA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRIGUEZ
ASESOR JURÍDICO

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA SEDE B



Labores de enchapado del piso mediante la instalacion de baldosa de gres sobre la capa de alistado previa.



Avance en las actividades de afinado, aplicación y preparación de áreas para acabado en granito.



Avance en las actividades de afinado, aplicación y preparación de áreas para acabado en granito.




Avance en las actividades de afinado, aplicación y preparación de áreas para acabado en granito.



Proceso de lavado de granito (revelado de grano)



Se ejecuta la preparación del borde de la placa mediante la perforación e hincado de anclajes metálicos, seguido del armado del acero de refuerzo longitudinal (varillas) y la figuración de malla electrosoldada.

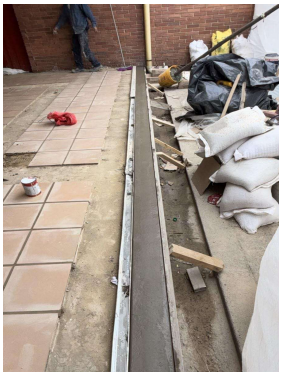

Se ejecutaron las labores de encofrado, vaciado y nivelación de bordillo en concreto, estableciendo la delimitación física del área de circulación.



Se ejecutaron las labores de encofrado, vaciado y nivelación de bordillo en concreto, estableciendo la delimitación física del área de circulación.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17


ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE CHAPINERO Y TEUSAQUILLO



En la visita no se evidencio inicio de actividades.



En la visita se registro no se evidencio incio de actividades.

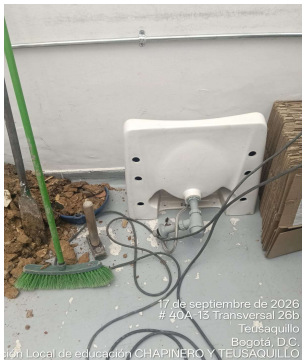

Retiro de unidades sanitarias



Demolición de de placa y excavación.



Demolicon de placa, retiro de tapa en caja de inspeccio. Retiro de residuos sanitarios en tuberia y caja de inspección.



Se ejecutó el levantamiento de muros en mampostería de ladrillo para la conformación de la caja de inspección. Se aplicó pañete e impermeabilización en la cañuela, fondo de la caja y borde de coronación para garantizar el correcto flujo de aguas residuales.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 50 **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 50 (Consecutivo) **DEL** 14/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 20/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MORISCO SEDE A



Acopio de perfiles metalicos para refuerzo de cubierta.



Acopio de trasiego de andamios certiifcados a la planta 4




Acopio de trasiego de andamios certiifcados a la planta 4



Intalacion de polisombra y señalizacion en vacios para prevenir caidas a las plantas inferiores.



Intalacion de polisombra y señalizacion en vacios para prevenir caidas a las plantas inferiores.

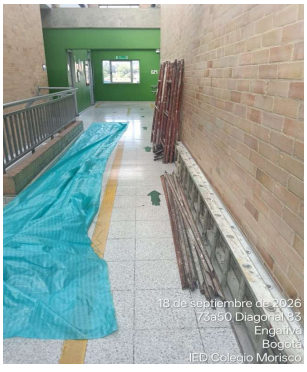

Intalacion de polisombra y señalizacion en vacios para prevenir caidas a las plantas inferiores.
