
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PRELIMINARES

ÍTEM DE PAGO	1.1		DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	**UNIDAD**	m2

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRADA VEHICULAR MARGEN DERECHA	26,60	6,42			1,00	170,71
ENTRADA VEHICULAR MARGEN IZQUIERDA	25,91	4,58			1,00	118,67
					SUBTOTAL	**289,37**
					TOTAL	**289,37**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

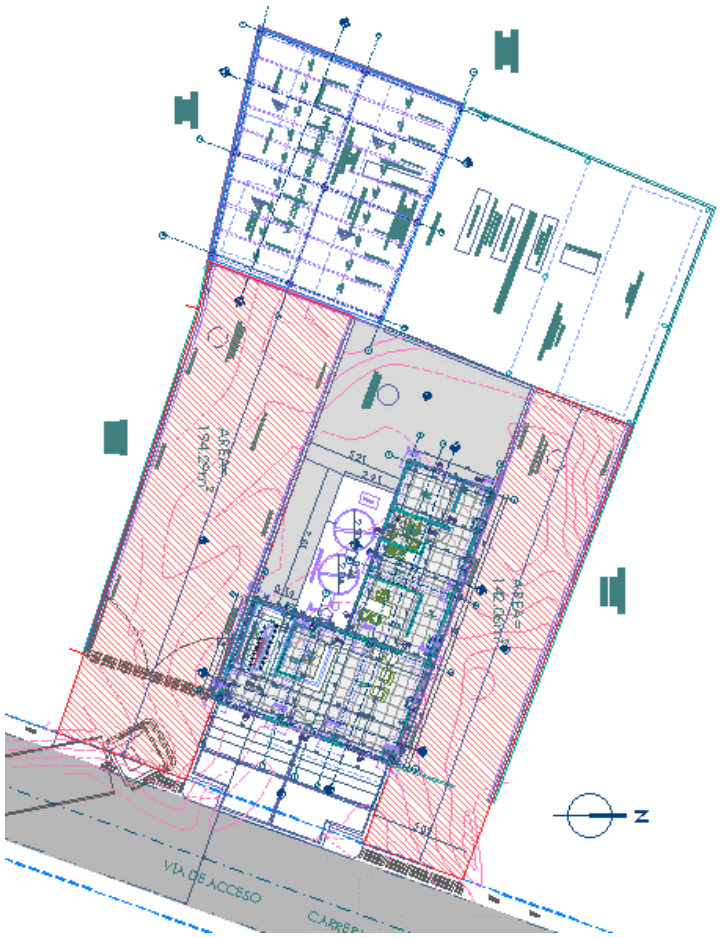


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PREELIMINARES
SUBCAPÍTULO	

ÍTEM DE PAGO	1,2		DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	**UNIDAD**	m2

LOCALIZACIÓN	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**DESCUENTO/AUMENTO (+/-)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO EXISTENTE EN ZONA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE	12,10	14,00			1,00	169,40
EXTRUCTURA EXISTENTE EN ZONA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE	2,09	2,00			2,00	8,36
	2,05	2,00			1,00	4,10
	2,22	2,35			2,00	10,43
ANDEN EXISTENTE	17,69	1,02			1,00	18,04
COLUMNA EXISTENTE	3,00	0,30			4,00	3,60
					TOTAL	**213,94**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

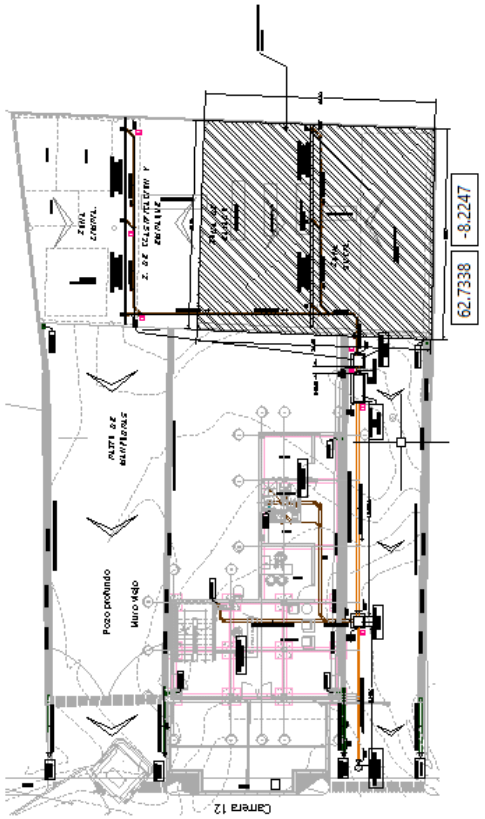


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PLACA DE CONCRETO

ÍTEM DE PAGO	2,1		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS	**UNIDAD**	m2

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
PLACA CONTRAPISO EN ZONA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE	9,58	9,15			1,00	87,66
PLACA CONTRAPISO EN ZONA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE	8,58	5,41			1,00	46,42
					TOTAL	**134,07**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

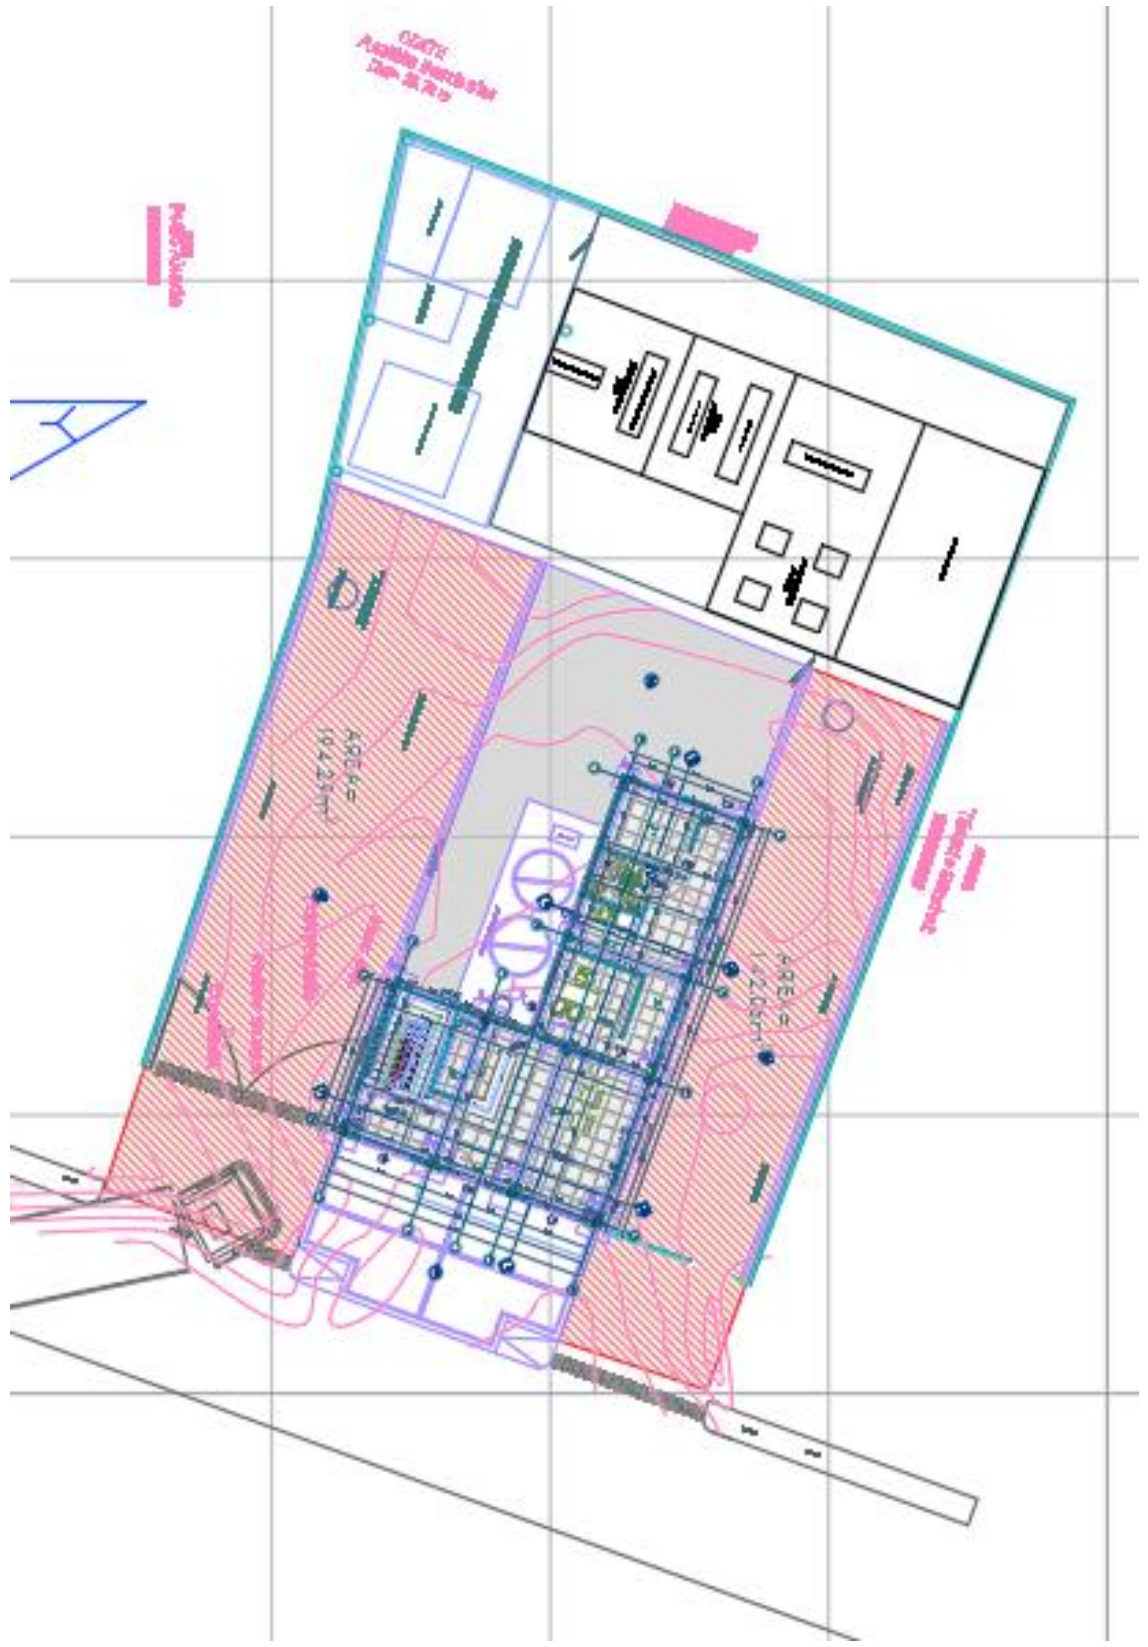


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CALZADA

ÍTEM DE PAGO	3,1		CONFORMACIÓN DE CALZADA	**UNIDAD**	m2

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRADA VEHICULAR MARGEN DERECHA	26,60	6,42			1,00	170,71
ENTRADA VEHICULAR MARGEN IZQUIERDA	25,91	4,58			1,00	118,67
					SUBTOTAL	**289,37**
					TOTAL	**289,37**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

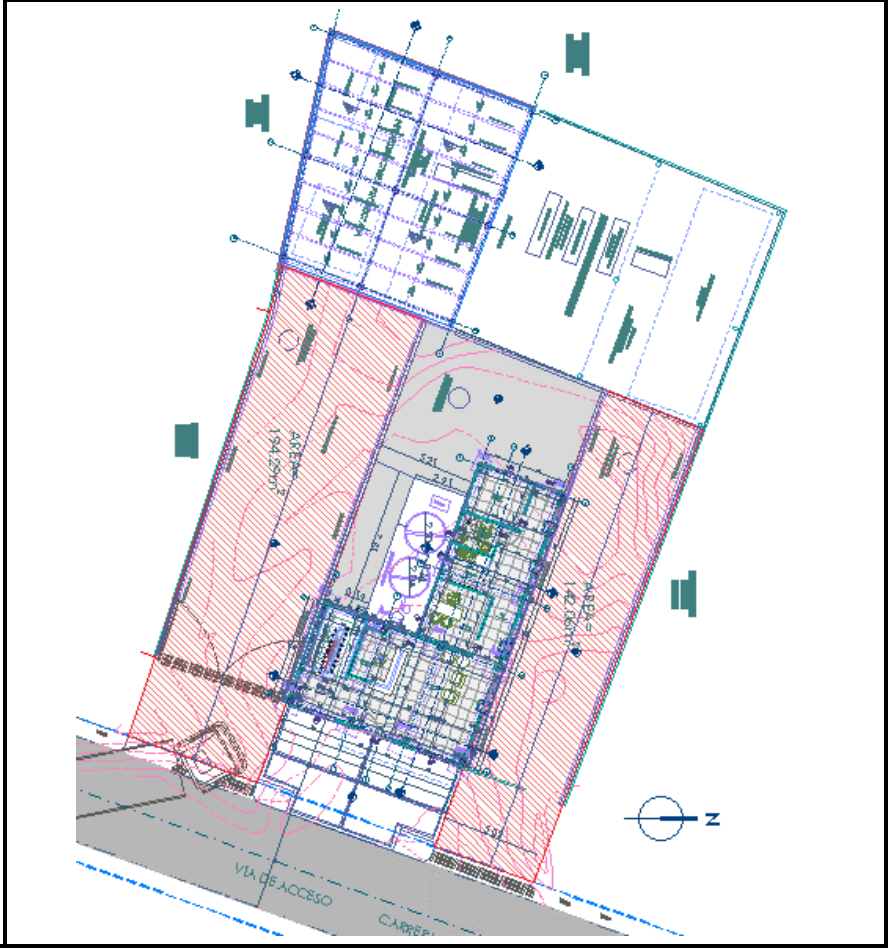


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CALZADA

ÍTEM DE PAGO	4,2		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	UNIDAD	m2

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRADA VEHICULAR MARGEN DERECHA	26,60	6,42			1,00	170,71
ENTRADA VEHICULAR MARGEN IZQUIERDA	25,91	4,58			1,00	118,67
					SUBTOTAL	**289,37**
					TOTAL	**289,37**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

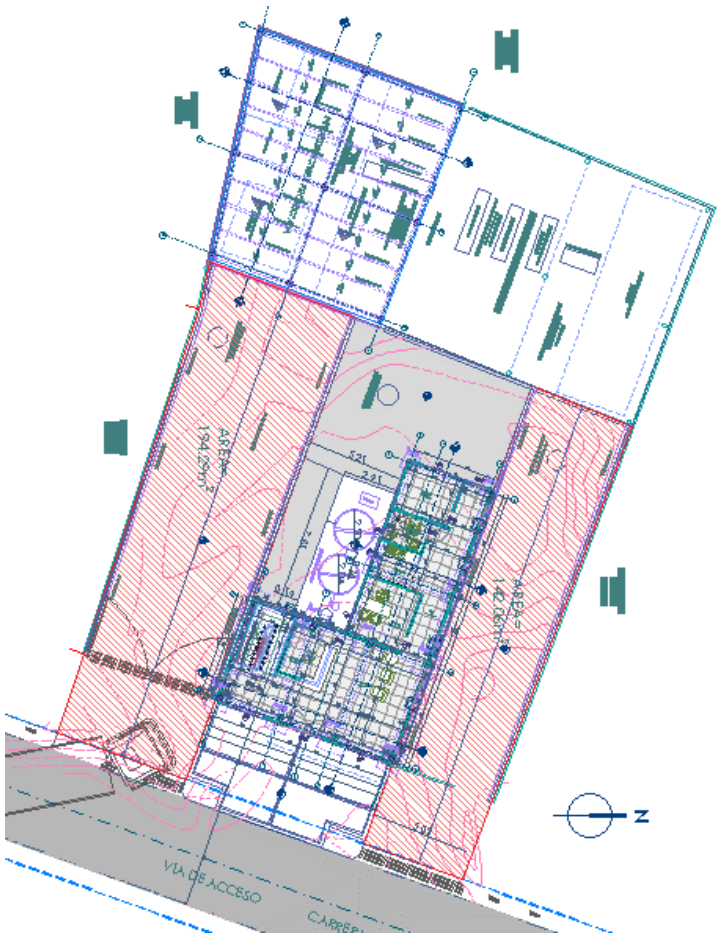


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CALZADA

ÍTEM DE PAGO	4,4		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO)	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRADA VEHICULAR MARGEN DERECHA	26,60	6,42	0,35		1,00	59,77
ENTRADA VEHICULAR MARGEN IZQUIERDA	25,91	4,58	0,35		1,00	41,53
ZONA POSTERIOR DE ESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVA (PATIO)	10,00	5,91	0,25		1,00	14,78
	5,20	2,00	0,25		1,00	2,60
	7,80	2,15	0,25		1,00	4,19
FRENTE ESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	10,00	5,51	0,35		1,00	19,29
					SUBTOTAL	**142,16**
					TOTAL	**142,16**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

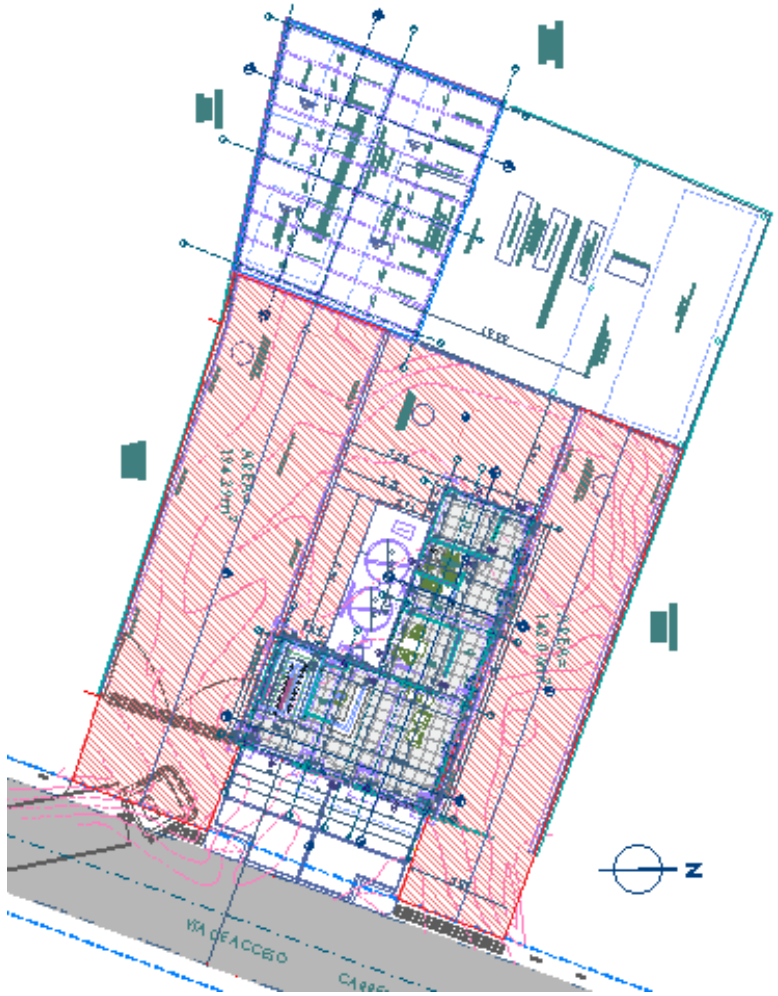


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PINTURA

ÍTEM DE PAGO	4,1		Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	UNIDAD	m2

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETES MUROS FACHADAS OFICINAS ADMININISTRATIVAS						
Pintura muro fachada frontal eje A entre ejes 1 y 2(primer y segundo piso)	10,00		6,35		1,00	63,50
Descuento vano ventanas V1 primero y segundo piso	2,00		1,20		3,00	7,20
Descuento vano ventanas V4 sala de juntas segundo piso	3,26		2,20		1,00	7,17
Descuento vano puerta P3 entrada principal primer piso	1,80		2,20		1,00	3,96
					SUBTOTAL	**45,17**
Pintura muro fachada posterior eje B entre ejes 1 y 3 (primer y segundo piso)	5,20		6,35		1,00	33,02
Pintura muro fachada eje B (segundo piso)	4,87		3,35		1,00	16,31
Pintura muro fachada eje B (Muro tanque elevado)	1,84		0,60		1,00	1,10
Descuento vano ventana baño V5 segundo piso	0,50		0,70		1,00	0,35
Descuento vano ventana V1 sala de juntas muro posterior segundo piso	2,00		1,20		1,00	2,40
Descuento muro calado primer piso	1,58		1,04		1,00	1,64
Descuento muro calado segundo piso	1,58		2,51		1,00	3,97
					SUBTOTAL	**42,08**
Pintura muro fachada eje D (primer piso)	4,84		3,53		1,00	17,09
Descuento vano puerta P1 parte posterior primer piso	0,90		2,20		1,00	1,98
Descuento vano ventana V3 bodega primer piso	1,50		1,20		1,00	1,80
					SUBTOTAL	**13,31**
Pintura muro fachada eje 5 entre ejes B y D (primer piso)	9,80		3,80		1,00	37,24
Pintura muro fachada eje 5 entre ejes A y B (primer piso)	5,80		3,05		1,00	17,69
Pintura muro fachada eje 5 entre voladizo y eje B (segundo piso)	7,05		3,80		1,00	26,79
Descuento muro calado primer piso	1,25		2,30		3,00	8,63
Descuento muro calado primer piso	2,52		2,30		1,00	5,80
Descuento vano puerta P1 primer piso entrada sa de espera	0,90		2,20		1,00	1,98
					SUBTOTAL	**65,32**
Pintura muro fachada eje 1 entre ejes A y B (primer y segundo piso)	5,90		6,60		1,00	38,94
	1,23		3,70		1,00	4,55
Descuento vano ventana V3 lovin segundo piso	1,50		1,20		1,00	1,80
Descuento vano puerta P1 primer piso	0,90		2,20		1,00	1,98
					SUBTOTAL	**39,71**
Pintura muro fachada eje 3 entre ejes B y D (primer piso)	9,80		3,27		1,00	32,05
Descuento vano ventana V5 baño primer piso	0,70		0,50		1,00	0,35
Descuento vano V2 cocina primer piso	1,30		1,20		1,00	1,56
Descuento vano V2 oficina primer piso	1,30		1,20		1,00	1,56
					SUBTOTAL	**28,58**
PINTURA MUROS PLACA PARA TANQUES ELEVADOS						
MURO EXTERNO	3,50		0,85		2,00	5,95
MURO EXTERNO	1,81		0,85		1,00	1,54
					SUBTOTAL	**7,49**
					TOTAL	**241,66**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

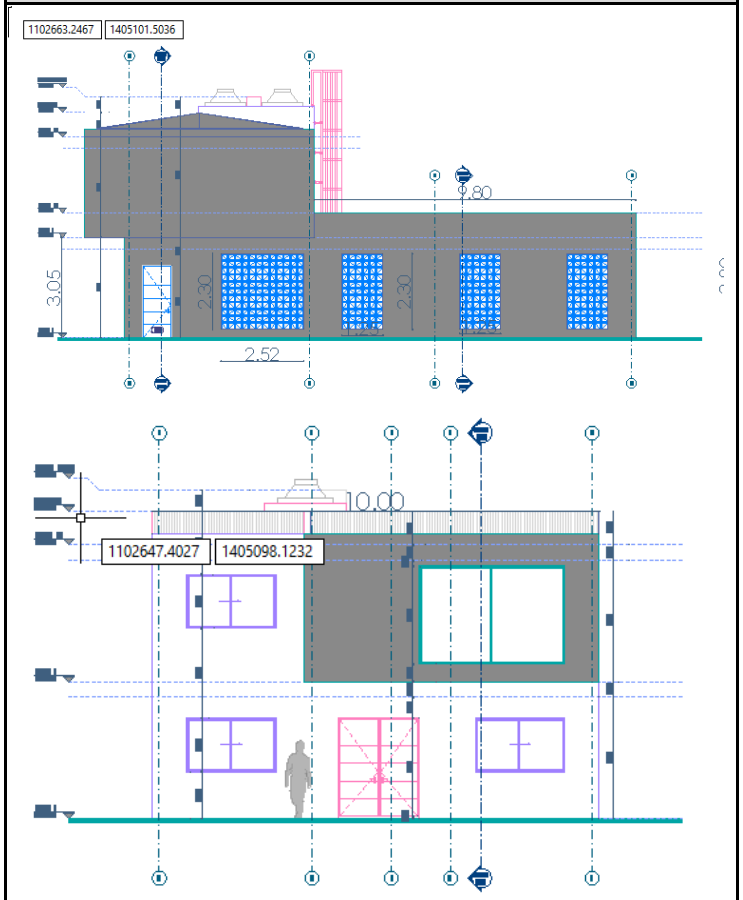


CONSORCIO ERES 2022	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA CONTRATO DE OBRA No 417 DE 2022	Fondo Colombia en Paz - FCP

CAPÍTULO	PINTURA

ÍTEM DE PAGO	4,2		Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos	UNIDAD	m2

LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	DESCUENTO/AUMENTO (+/-)	CANTIDAD	TOTAL
PLACA DE ENTREPISO AREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS						
PLACA DE ENTREPISO AREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6,02	1,36			1,00	8,19
	9,98	5,78			1,00	57,68
					SUBTOTAL	**65,87**
DESCONTAR HUECO DE ESCALERA						
HUECO DE ESCALERA	3,25	2,21			1,00	7,18
					SUBTOTAL	**7,18**
					VIENE	**462,83**
					TOTAL	**521,52**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

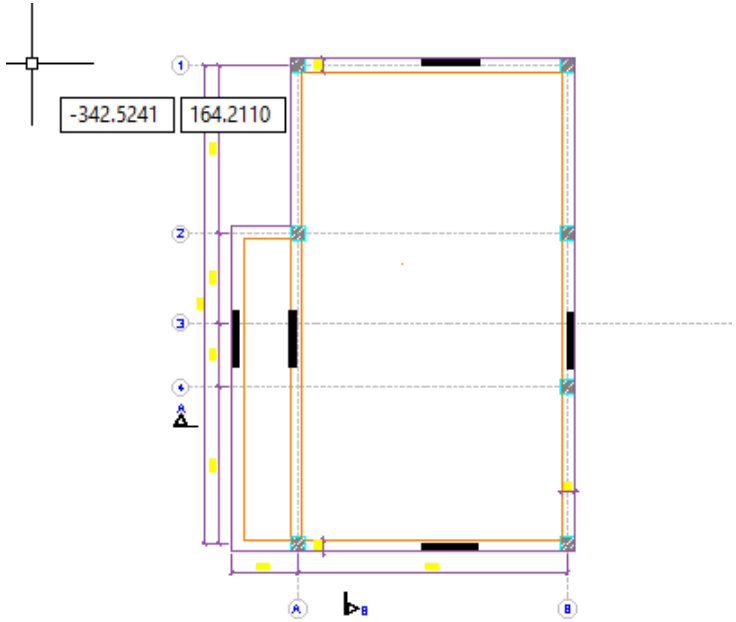

CONSORCIO ERES 2022

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No 417 DE 2022

Fondo Colombia en Paz - **FCP**

CAPÍTULO	PINTURA

ÍTEM DE PAGO	4,3		Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación	**UNIDAD**	m2

LOCALIZACIÓN	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**DESCUENTO/AUMENTO (+/-)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS VECINOS						
MURO POSTERIOR	15,14	2,21			1,00	33,46
MURO LATERAL IZQUIERDO	12,88	2,05			1,00	26,40
COLUMNAS CIRCULARES		0,30	3,68		3,00	3,31
		0,30	3,35		3,00	3,02
		0,30	3,03		3,00	2,73
					TOTAL	**68,92**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

