
RSE INGENIEROS

SC-2000637 SA-2000638 ST-2000639

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO N.º 3

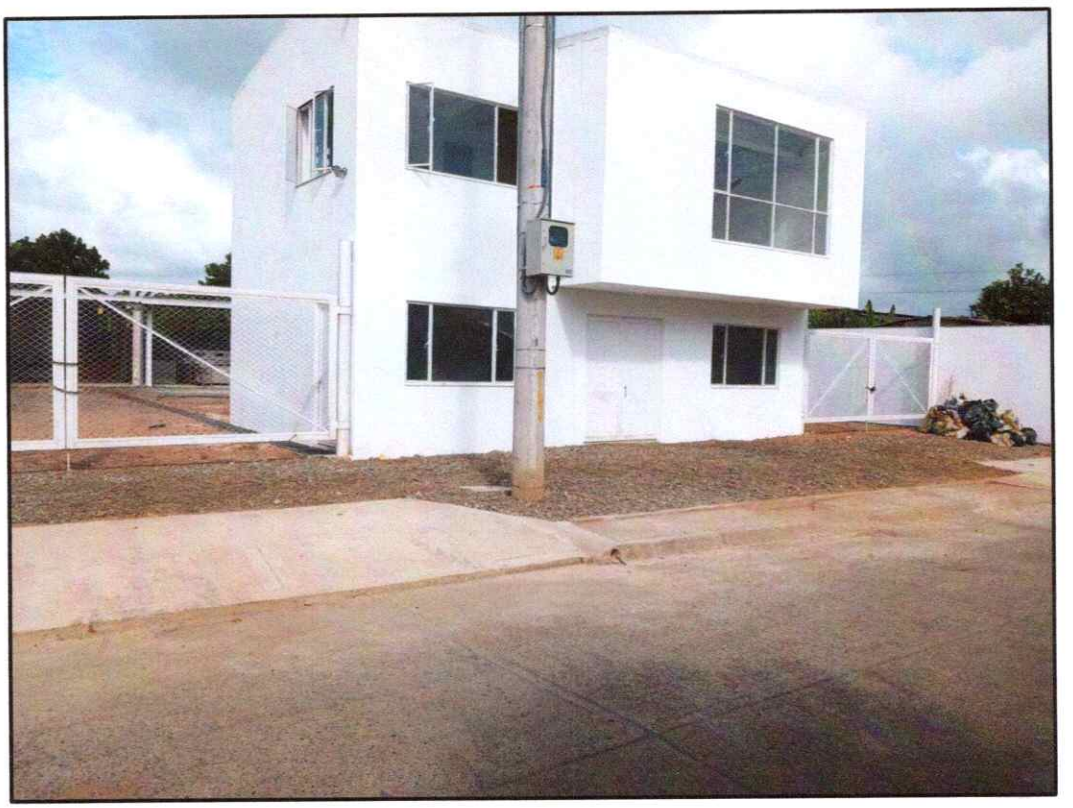

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA".

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02/12/2025 HASTA EL 22/12/2025
VALENCIA – CÓRDOBA

TABLA DE CONTENIDO


INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO N° 1 1
INTRODUCCIÓN 3
LOCALIZACIÓN 4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO 5
1.1 VIGENCIA DE GARANTÍAS 6
1.2 CUMPLIMIENTO 6
1.2.1 Pólizas iniciales obra 6
1.2.2 Pólizas acta de inicio 6
1.2.3 Pólizas iniciales interventoría 6
1.2.4 Pólizas según acta de inicio 7
2. INFORME FINANCIERO 7
2.1 Anticipo 7
2.2 Plan de inversion del Anticipo 7
2.3 Estado de las actas de pago parcial 8
2.4 Valor de las actas en trámite 8
3. INFORME CONSOLIDADO GENERAL 8
3.1 Alcance 8
3.2 Avance ejecutado vs programado 9
3.2.1 Avance de obra 9
3.3 Novedades presentadas en el periodo 10
4. INFORME DETALLADO DE AVANCE 10
4.1 Control de los procesos de conservación de las obras durante la construcción 10
4.2 Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos 11
4.3 Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado 11
4.4 Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas 11
4.5 Actualización de cantidades y presupuesto de las obras en ejecución 11
5. COMPONENTE SST 11
5.1 Listado de personal 11
5.2 Listado de persona administrativo de obra 11
5.3 Listado de personal de interventoría 11
5.4 Listado de personal de apoyo y operativo de obra 11
5.5 Verificación entrega de EPP y dotacion 12
5.6 Seguimiento accidentes de trabajo y enfermedad laboral 12
6. Anexos 12

INTRODUCCIÓN

En virtud DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALENCIA – CÓRDOBA Y LA FIRMA RSE INGENIEROS S.A.S. N° CMC-022-2025 cuyo objeto corresponde a **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOB"**, el documento presenta los avances registrados durante el periodo de referencia, en concordancia con los lineamientos contractuales, el cronograma aprobado y las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante. asimismo, se describen las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos, el estado físico y financiero del proyecto, las observaciones técnicas realizadas al contratista de obra, así como los aspectos administrativos y ambientales asociados a la correcta ejecución del contrato.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Valencia – Córdoba

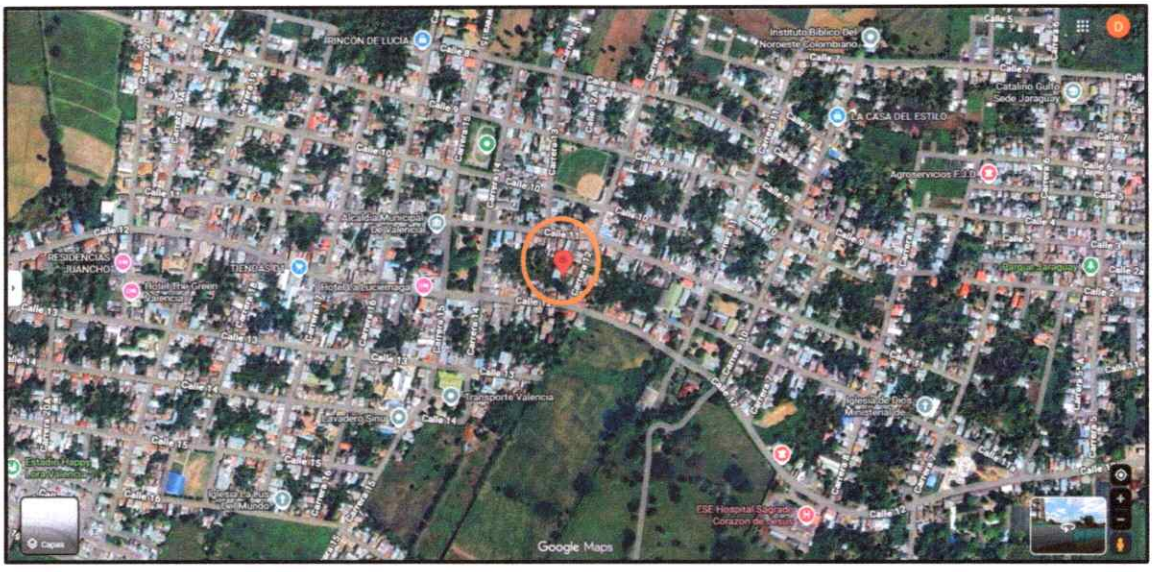

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO

NÚMERO DE CONTRATO:	CMC- MV 022 -2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA
FECHA DE INICIO:	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 20.984.460,00) MCTE.
OTRO SI No. 1 DE ADICCIÓN Y PRORROGA	N/A
SUPERVISIÓN:	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA
ETAPA:	EJECUCIÓN

1.1 VIGENCIA DE GARANTÍAS

1.2 CUMPLIMIENTO

1.2.1 Pólizas iniciales de obra

Compañia de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	53-44-101040494	26/08/2025	26/02/2026	$12,848,036.10
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	53-44-101040494	26/08/2025	26/02/2025	$64,240,180.50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	53-44-101040494	26/08/2025	26/10/2028	$6,424,018.05
Estabilidad y calidad de la obra	53-44-101040494	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$12,848,036.10

1.2.2 Pólizas iniciales de obra

Compañia de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	53-44-101040494	08/09/2025	11/03/2026	$12,848,036.10
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	53-44-101040494	08/09/2025	11/03/2026	$64,240,180.50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	53-44-101040494	08/09/2025	08/11/2028	$6,424,018.05
Estabilidad y calidad de la obra	53-44-101040494	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$12,848,036.10

SEGÚN REINICIO.			
Cumplimiento del contrato	08/09/2025	18/04/2026	$12.848.036,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2025	18/04/2026	$64.240.180,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/09/2025	18/12/2028	$6.424.018,05
Estabilidad y calidad de la obra	08/11/2025	08/11/2026	$12.848.036,10
Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	Póliza No		

		53-44-101040494

SEGÚN OTROSI ADICIÓN TIEMPO Y RECURSOS			
Cumplimiento del contrato	08/09/2025	21/04/2026	$14.448.036,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2025	21/04/2026	$64.240.180,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/09/2025	21/12/2028	$7.224.018,05
Estabilidad y calidad de la obra	22/12/2025	22/12/2026	$12.848.036,10

1.2.3 Pólizas iniciales interventoría

Compañia de seguros:	SEGUROS MUNDIAL	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	CMT-100018313	28/08/2025	28/05/2026	$2.098.446,00
Prestaciones sociales	CMT-100018313	28/08/2025	28/11/2028	$2.098.446,00
Estabilidad de la obra	CMT-100018313	28/11/2025	28/11/2030	$2.098.446,00

1.2.4 Pólizas según acta de inicio

Compañia de seguros:	SEGUROS MUNDIAL	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	CMT-100018313	08/09/2025	08/06/2026	$2.098.446,00
Prestaciones sociales	CMT-100018313	08/09/2025	09/12/2028	$2.098.446,00
Estabilidad de la obra	CMT-100018313	09/12/2025	28/11/2030	$2.098.446,00

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Anticipo

De acuerdo con lo pactado contractualmente se estableció que, el municipio de Valencia Córdoba desembolsara al contratista a titulo de anticipo el CINCUENTA (50%) del valor del componente de obra del contrato.

De igual manera se estableció que, el anticipo del CINCUENTA (50%) el cual se amortizara en su totalidad en los pagos de que tratan los numerales 2 y 3 de las clausulas establecidas en el contrato.

2.2 Plan de inversión del anticipo

Durante el periodo evaluado, se generó y tramitó un anticipo con fecha 21 de octubre de 2025, por un valor de cincuenta y un millones trescientos noventa y un mil ciento ochenta y un pesos ($51.391.181), conforme a las condiciones financieras establecidas en el contrato.

2.3 Estado de las actas de pago parcial

En el presente periodo no se han realizado pagos de actas parciales.

ACTA DE CORTE No.

No.	Establecimiento	Valor ejecutado
1	ACTA DE OBRA PARCIAL Nº N/A	N/A

2.4 Valor de las actas en tramite

A la fecha de cierre del presente informe, el contratista no radico acta de corte del periodo

No.	Establecimiento	Valor ejecutado
1	ACTA DE OBRA PARCIAL Nº N/A	N/A

3. INFORME CONSOLIDADO GENERAL

3.1 Alcance

Dentro del alcance general de las obras a ejecutar para el municipio, se establece la ejecución de las obras complementarias para el centro de acopio de papaya cuyas actividades son:

- Demolición
- Descapote
- Calzada

- Pintura

3.2 Avance ejecutado VS programado

A la fecha el contrato presenta un avance superior al programado del 8,07%.

Avance programado	Avance Ejecutado	Diferencia
100%	100%	

3.2.1 Avance de obra

En el periodo del informe se realizan las actividades que presentamos a continuación:

- Geotextil para estabilización de la subrasante





- Suministro, extendida y compactación de material de subbase granular clase c (estructura del pavimento, bordillo)





- Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)





- Suministro e instlacion de tuberia sanitaria de 4" para prolongacion de carcamos.





- Excavación a maquina area de zona de lavado





- Desmonte de porton existen zona salida de frutas limpias.




- Demolición de cajas de registro existente.





- Construccion de cajas de registro sanitarias de 0,80 x 0,80 x 0,60, e=0,12m, en concreto de 3000 psi; incluye tapa en concreto. Incluye acero de refuerzo. Espesor de todos los elementos 0,12 m



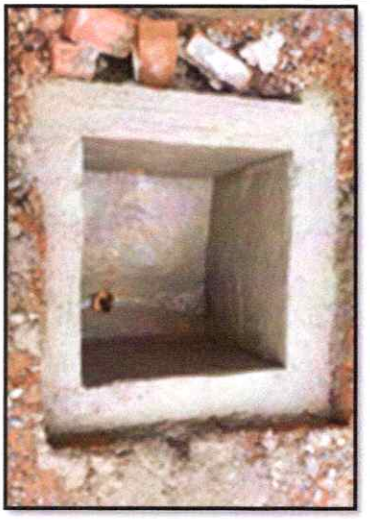

- Suministro, extendida y compactación de material seleccionado.








- Construccion de rampas de acceso en concreto de 3500 psi. E: 0,20m. Acero de refuerzo diam 1/2" en ambos sentidos. @ 0,25 m, incluye bordillos de confinamiento perimetral y bordillo de cambio de nivel. Seccion 0,12 x 0,40 m en concreto 3500 psi, acero de refuerzo longitudinal diametro 2n3/8" y transversal de 1/4"@0,2m. Incluye excavación, relleno y conformación del terreno.



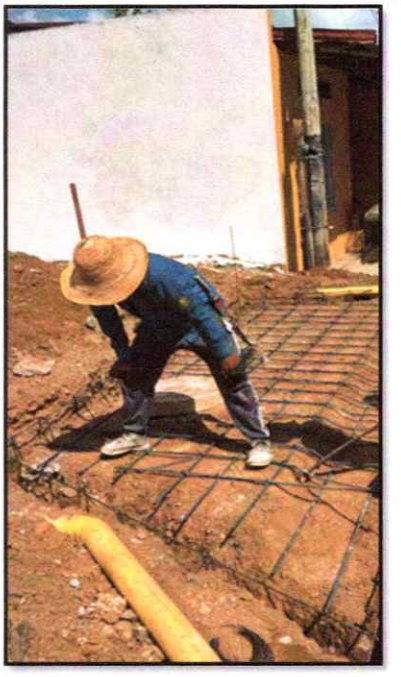

- Placa de contrapiso en concreto 3500 psi e=0,20 m incluye refuerzo





- Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos




- Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación




- Construccion de caja de registro electrica de 0,80 x 0,80 x 0,60, e=0,12m, en concreto de 3000 psi. Incluye tapa en concret, acero de refuerzo diam 3/8" en ambos sentidos.



3.3 Novedades presentadas en el periodo

Durante el período evaluado se suscribió una modificación contractual mediante otrosí, con fecha 17 de diciembre de 2025, la cual contempló una adición presupuestal y una ampliación del plazo contractual, con el propósito de incorporar la ejecución de actividades no previstas inicialmente en el alcance del contrato, necesarias para la adecuada y completa ejecución del objeto contractual. Así mismo, una vez culminadas las actividades contractuales, se recibió la obra de manera satisfactoria, con un avance físico del 100 %, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y normativa vigente.

1. INFORME DETALLADO DE AVANCE

4.1 Control de los procesos de conservación de las obras durante la construcción

Para el presente periodo de ejecución de actividades no se han presentado afectaciones a las estructuras existentes aledañas al lugar de desarrollo de las obras.

4.2 Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos

Para el periodo del presente informe no se han realizado observaciones por parte de la interventoría ni se han solicitado cambios en la forma de ejecución de estas.

4.3 Seguimiento a las medidas correctivas que se han otorgado

Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral anterior no se han realizado requerimientos ni solicitud de correcciones al contratista de obra.

4.4 Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas

Durante este periodo no se han presentado solicitudes de correcciones y/o reparaciones y/o reconstrucciones por parte de la interventoría al constructor, dado que se ha venido realizado tal como se establece en el anexo técnico.

4.5 Actualización de cantidades y presupuesto de las obras en ejecución

N/A

2. COMPONENTE SST

5.1 Listado de personal

A la fecha de cierre del presente informe, el contratista no ha presentado novedades para el personal aprobado en el proceso de selección relacionado a continuación:

5.2 Listado de persona administrativo de obra

CARGO	NOMBRE
Director de obra	Hugo Yunior Vergara Sotelo
Residente de obra	Luis Felipe Llorente Cogollo

5.3 Listado personal de interventoría

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Kelly Johanna Soto Martínez

5.4 Listado de personal de apoyo y operativo

N.°	C.C	CARGO	NOMBRE
1	1.064.186.871	Auxiliar residente de obra	Luna Vanessa Bedoya Gamboa
2	10.898.108	Maestro de obra	Jorge Eliecer Rangel Aldana
4	1.001.747.895	Ayudante	Luis Fernando Peña Gómez
6	1.010.045.719	Ayudante	Gregorio Miguel Morales Arrieta

El contratista de obra PISCINGENIERIA HVS S.A.S remite soportes de pagos a seguridad social, así como demás soportes a seguridad y salud en el trabajo.

5.5 Verificación entrega de EPP y dotacion

El contratista ha entregado elementos de seguridad al personal de obra. Donde se ha evidenciado el correcto uso, elementos de seguridad como:

- Casco
- Guantes
- Gafas de protección

5.6 Seguimiento accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo, tampoco se reportaron enfermedades laborales.

6 ANEXOS

1. Informe tecnico de obra N° 1
2. Informes semanales
3. Correspondencia

RSE INGENIEROS

CERTIFIED WOMEN OWNED WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM

icontec ISO 9001 SC-2000637

icontec ISO 14001 SA-2000638

icontec ISO 45001 ST-2000639

IQNET

INFORME TECNICO DE OBRA FINAL

Dirección: calle 26 # 5-27 Montería - Córdoba
Celular: 311 392 4965 - Correo: gestion@rsingenieros.co

	INFORME MENSUAL N°3 **SAMC-MV-014-2025**	PISCINGENIERIA HVS S.A.S.

"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

CONTRATO DE OBRA No. SAMC-MV-014-2025

INFORME MENSUAL DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 02 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

PISCINGENIERIA HVS S.A.S

CONTRATISTA

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN..... 4

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO..... 5

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 6

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL..... 6

5. INFORMACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL..... 7

6. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA..... 8

7. ACTIVIDADES DE OBRAS CONTRATADAS..... 8

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO..... 9

9. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA..... 11

10. INFORMES SEMANALES.....12

11. RELACIÓN EQUIPO PROFESIONAL DE OBRA.....12

12. CONCLUSIONES..... 13

13. ANEXOS..... 13

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación.

DEPENDENCIA DE ENTREGA	No DE COPIAS	ORIGINAL
Secretaria de obras Públicas	1	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

INDICÉ REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVADORES
0			VERSIÓN ORIGINAL

1. INTRODUCCIÓN.

Los trabajos por realizar por este contratista contemplan el suministro de materiales, equipos, trasporte, la mano de obra para realizar para realizar las actividades del proyecto que tiene como objeto: **"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"** además de los requisitos técnicos y legales.

Para ello se adelantó el proceso de contratación SAMC-MV-014-2025 para la **"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"** con un plazo de ejecución de dos (02) meses contados a partir del acta de inicio, con un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 128.480.361,00 MCTE).

Durante la ejecución del proyecto se presentaron una serie de actividades no contempladas en el alcance original del proyecto las cuales fueron presentadas en el balance de obra N°1, con un valor adicional de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000,00) las cuales fueron aprobadas mediante el OTROSI N°1 con fecha de 17 de diciembre de 2025. Dando como resultado un nuevo valor del contrato de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($144.480.361,00).

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.


El municipio de Valencia se ubica al sur del departamento de Córdoba en la subregión alto Sinú, a una distancia 90 kilómetro de la de la capital del departamento (Montería) y a unos 15 km del municipio de Tierralta. La cabecera municipal está situada cerca al Rio Sinú con 8° 16° de latitud norte y 76°09° de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Tiene 130 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 28°C. Su extensión territorial es de 914 km2. Limita al norte con el municipio de Montería, al este con Montería y Tierralta, al sur con Tierralta y al oeste con San Pedro de Urabá.



Departamento de Córdoba



Municipio de Valencia

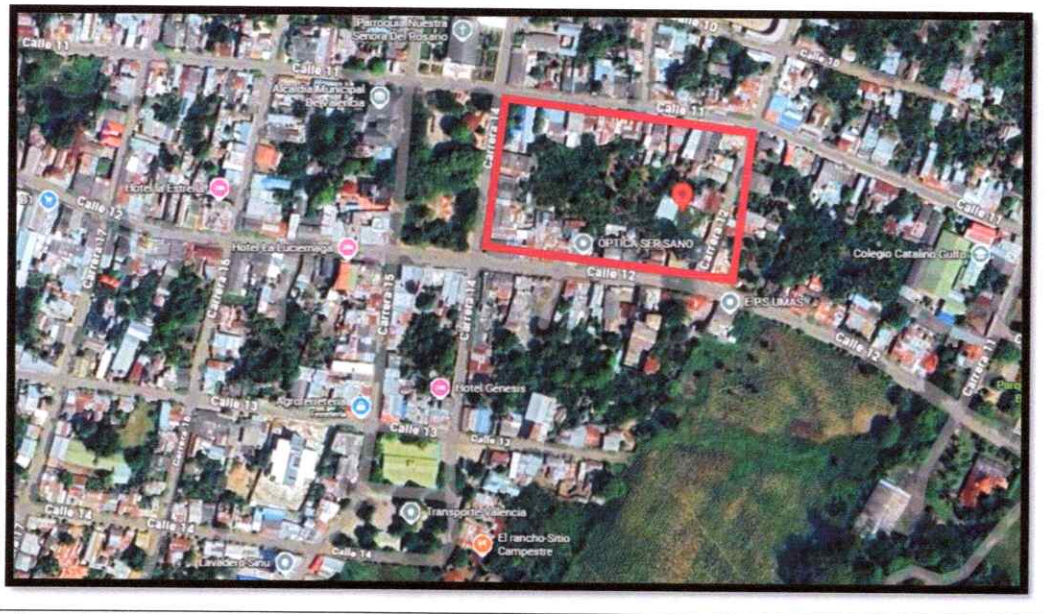

Localización del centro de la infraestructura productiva de la asociación APPALSI zona urbana del Municipio de Valencia – Córdoba (8°15´31,8"N 76°08´48,3 W

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Valencia, en calidad de gestor de progreso y desarrollo en el departamento de Córdoba, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones, calidad de vida de sus habitantes desarrollando trabajos como la: **"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"** esto con el fin de mejorar la productividad de papaya en la región.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.

CONTRATO No	SAMC-MV-014-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA	PISCINGENIERIA HVS S.A.S
NIT	No 901.324.084-8
OBJETO	"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE VALENCIA, CALLE 12 CON CARRERA 12 CASCO URBANO
VALOR DEL CONTRATO	$ 128.480.361,00 MCTE
VALOR ADICIÓN	$ 16.000.000,00 M/CTE
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIÓN.	$ 144.480.361,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES CUATRO (04) DIAS
FECHA DE INICIO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N°1	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N°1	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÒN EN TIEMPO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 64.240.181,00 MCTE
INTERVENTORÍA	RSE INGENIEROS S.A.S

5. INFORMACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.

CONTRATO DE OBRA No SAMC-MV-014-2025 CUMPLIMIENTO			
AMPAROS	**VIGENCIA HASTA (fecha)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
SEGÚN CONTRATO			
Cumplimiento del contrato	26/08/2025	26/02/2026	$12.848.036,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	26/08/2025	26/02/2026	$64.240.180,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/08/2025	26/10/2028	$6.424.018,05

Estabilidad y calidad de la obra	26/08/2025	26/08/2026	$12.848.036,10
Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	Póliza No		53-44-101040494
SEGÚN ACTA DE INICIO			
Cumplimiento del contrato	08/09/2025	11/03/2026	$12.848.036,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2025	11/03/2026	$64.240.180,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/09/2025	08/11/2028	$6.424.018,05
Estabilidad y calidad de la obra	08/09/2025	08/11/2026	$12.848.036,10
Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	Póliza No		53-44-101040494
SEGÚN REINICIO.			
Cumplimiento del contrato	08/09/2025	18/04/2026	$12.848.036,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2025	18/04/2026	$64.240.180,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/09/2025	18/12/2028	$6.424.018,05
Estabilidad y calidad de la obra	08/11/2025	08/11/2026	$12.848.036,10
Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	Póliza No		53-44-101040494
SEGÚN OTROSI ADICIÓN TIEMPO Y RECURSOS			
Cumplimiento del contrato	08/09/2025	21/04/2026	$14.448.036,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2025	21/04/2026	$64.240.180,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/09/2025	21/12/2028	$7.224.018,05
Estabilidad y calidad de la obra	22/12/2025	22/12/2026	$12.848.036,10

Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	Póliza No	53-44-101040494

6. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA.

Prorroga	No de Prorroga	Desde:	Hasta:	No. Comité Tecnico.
	N°1	18/12/2025	22/12/2025	N/A
Tiempo total de la Prorroga	CUATRO DIAS (04)			

En este periodo se presentaron prorroga en tiempo y adición en recursos.

7. ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATADAS.

A continuación, se relacionan las actividades establecidas para la ejecución del proyecto:

REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.					
PRESUPUESTO					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1,	**PRELIMINARES**				**6.299.703,00**
1,1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	m2	289,37	7.230,00	2.092.145,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	m2	213,94	19.667,00	4.207.558,00
2.	**PLACA DE CONCRETO**				**32.912.040,00**
2,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS	m2	134,07	245.484,00	32.912.040,00
3	**CALZADA**				**36.594.386,00**

3,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA	m2	289,37	1.453,00	420.455,00
3,2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	289,37	33.141,00	9.590.011,00
3,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO)	m3	142,16	187.000,00	26.583.920,00
4	**PINTURA**				**18.318.678,00**
4,1	Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	m2	241,66	21.700,00	5.244.022,00
4,2	Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos	m2	521,52	21.000,00	10.951.920,00
4,3	Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación	m2	68,92	30.800,00	2.122.736,00

COSTOS DIRECTOS		$ 94.124.807,00
A	30,50%	$ 28.708.066,00
I	1,00%	$ 941.248,00
U	5,00%	$ 4.706.240,00
AIU	36,50%	$ 34.355.554,00
COSTOS DIRECTOS + AIU		**128.480.361,00**

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.


A continuación, se muestran las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución comprendido desde el 02 de diciembre al 22 de diciembre del 2025, especificando las cantidades, valores y porcentajes de avance.

				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N.º 1		EJECUTADO		
N°	**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Vr.Unitario**	**Cantidad**	**Vr.Total**	**Cantidad ejecutada**	**Valor ejecutado**	**% De avance**
	1 PRELIMINARES							
1,1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	m2	7.230	367,39	2.656.230,00	367,39	2.656.230,00	100%

1,2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	m2	19.667	169,94	3.342.210,00	169,94	3.342.210,00	100%
	2. PLACA DE CONCRETO				**5.998.440,00**		**5.998.440,00**	
2,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS	m2	245.484	0,00	-	-		
	3 CALZADA				**-**			
3,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA	m2	1.453	0,00	-	-	-	
3,2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	33.141	296,27	9.818.684,00	296,27	9.818.684,00	100%
3,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO)	m3	187.000	142,40	26.628.800,00	142,40	26.628.800,00	100%
	4 PINTURA				**36.447.484,00**		**36.447.484,00**	
4,1	Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	m2	21.700	308,77	6.700.309,00	308,77	6.700.309,00	100%
4,2	Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos	m2	21.000	371,67	7.805.070,00	371,67	7.805.070,00	100%
4,3	Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación	m2	30.800	69,17	2.130.436,00	69,17	2.130.436,00	100%
					16.635.815,00		**16.635.815,00**	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**							
NP-1	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PARA PROLONGACION DE CARCAMOS	m	50.280,00	28,00	1.407.840,00	28,00	1.407.840,00	100%
NP-2	EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA DE ZONA DE LAVADO	m3	22.805,00	38,61	880.501,00	38,61	880.501,00	100%
NP-3	DESMONTE DE PORTON EXISTEN ZONA SALIDA DE FRUTAS LIMPIAS	Und	99.850,00	1,00	99.850,00	1,00	99.850,00	100%
NP-4	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO EXISTENTE	Und	43.571,00	5,00	217.855,00	5,00	217.855,00	100%
NP-5	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE TAPA EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 0,12 M	Und	681.153,00	4,00	2.724.612,00	4,00	2.724.612,00	100%


NP-6	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TAPA EN CONCRET, ACERO DE REFUERZO DIAM 3/8" EN AMBOS SENTIDOS.	Und	608.743,46	1,00	608.743,00	1,00	608.743,00	100%
NP-7	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO.	m3	84.744,00	16,37	1.387.259,00	16,37	1.387.259,00	100%
NP-8	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3500 PSI. E: 0,20m. ACERO DE REFUERZO diam 1/2" EN AMBOS SENTIDOS. @ 0,25 M, INCLUYE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL Y BORDILLO DE CAMBIO DE NIVEL. SECCION 0,12 X 0,40 M EN CONCRETO 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 2N3/8" Y TRANSVERSAL DE 1/4"@0,2M. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO.	m2	335.293,00	24,00	8.047.032,00	24,00	8.047.032,00	100%
NP-9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO.	m2	239.005,54	131,34	31.390.987,00	131,34	31.390.987,00	100%
					46.764.679,00		**46.764.679,00**	
	SUBTOTAL OBRAS				**105.846.418,00**		**105.846.418,00**	
	ADMINISTRACIÓN		30,5%		32.283.157,49		32.283.157,49	
	IMPREVISTOS		1,0%		1.058.464,18		1.058.464,18	
	UTILIDAD		5,0%		5.292.320,90		5.292.320,90	
	VALOR TOTAL				**144.480.361,00**		**144.480.361,00**	**100,00%**

A continuación, se, evidencia la ejecución semanal programada VS la ejecutada durante el periodo de ejecución comprendido desde el 02 de diciembre al 22 de diciembre de 2025.

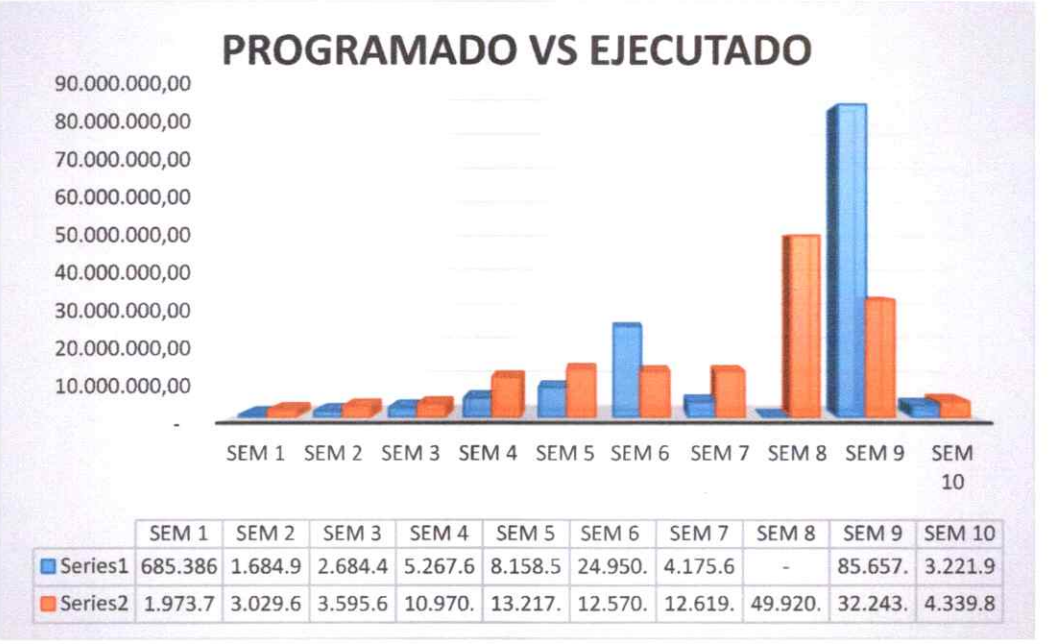

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
Series1	685.386	1.684.9	2.684.4	5.267.6	8.158.5	24.950.	4.175.6	-	85.657.	3.221.9
Series2	1.973.7	3.029.6	3.595.6	10.970.	13.217.	12.570.	12.619.	49.920.	32.243.	4.339.8

A continuación, se muestra el grafico de la curva S donde se puede evidenciar que las obras ejecutadas se completan en un 100%.

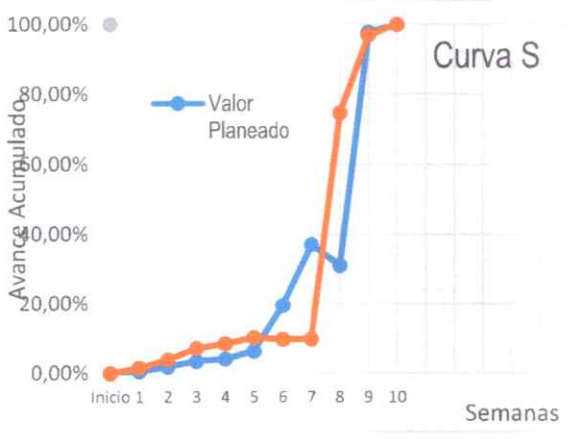

9. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA.

A la fecha el contrato de obra se encuentra en un cien por ciento de sus actividades contratadas.

CONCEPTO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
% Programado	100,00%	$144.480.361,00
% Ejecutado	100,00%	$144.480.361,00
Diferencia	0%	$0

10. INFORMES SEMANALES.

Los informes semanales se describen en la siguiente tabla de resumen desde la semana 8 hasta la semana 10 comprendidas desde el 02 de diciembre al 22 de diciembre de 2025.

SEMANAS	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%EJECUTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO
Sem 8 (02 dic – 06 de dic)	$49.920.643,50	$107.897.153,91	74,68%	$44.938.054,64	$44.938.054,64	31,10%
Sem 9 (08 de dic al 13 dic)	$32.243.354,33	$140.140.508,24	97,00%	$96.321.818,17	$96.321.818,17	66,67%
Sem 10 (15 de dic al 22 de dic)	$4.339.852,34	$144.480.361,00	100,00%	$144.480.361,00	$144.480.361,00	100,00%

Durante este periodo de ejecución se logró terminar las actividades a satisfacción.

11. RELACIÓN EQUIPO PROFESIONAL DE OBRA.

Director de Obra	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO	TP.0820261908ATL	INGENIERO CIVIL ESP. EN GERENCIA Y DIRECCIÓN DE OBRA.
Residente de Obra	LUIS FELIPE LLORENTE COGOLLO	TP.2202-263537COR	INGENIERO CIVIL

12. CONCLUSIONES.

- La obra presenta un porcentaje de ejecución del 100% sin ninguna novedad.
- El contratista de obra cumplió con las especificaciones técnicas de cada actividad realizada.
- Se dio implementación al programa SST usando todos los elementos de protección personal.
- Se realizaron las actividades contempladas en el contrato cumpliendo con todos los estándares de calidad de cada y uno de los ítems.

13. ANEXOS.

- Registro fotográfico.
- Pólizas según Reinicio N°1, según adición en tiempo y recurso.
- Planilla de seguridad social.

13.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Imagen 1: Descapote

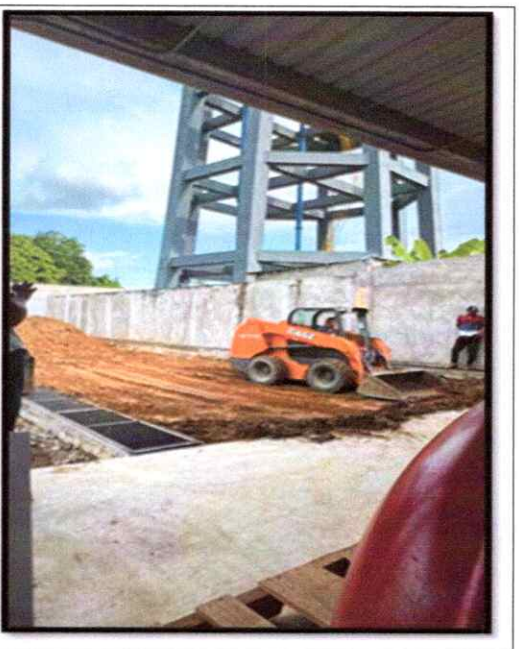


Imagen 2: Suministro e instalación de geotextil.

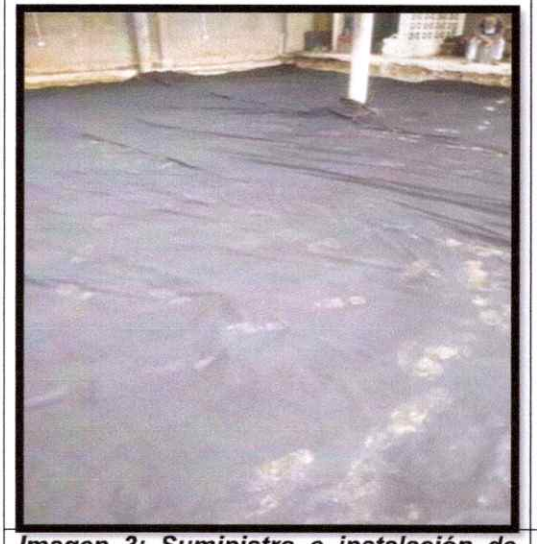


Imagen 3: Suministro e instalación de geotextil.



Imagen 4: Suministro e instalación de geotextil.



Imagen 5: Suministro e instalación de geotextil.



Imagen 6: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.

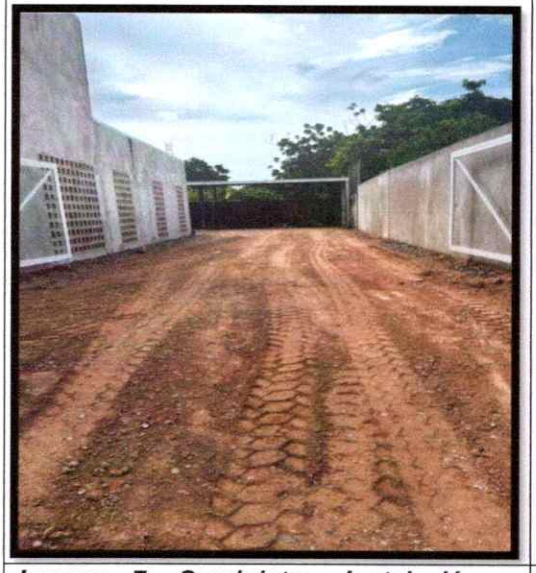


Imagen 7: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.

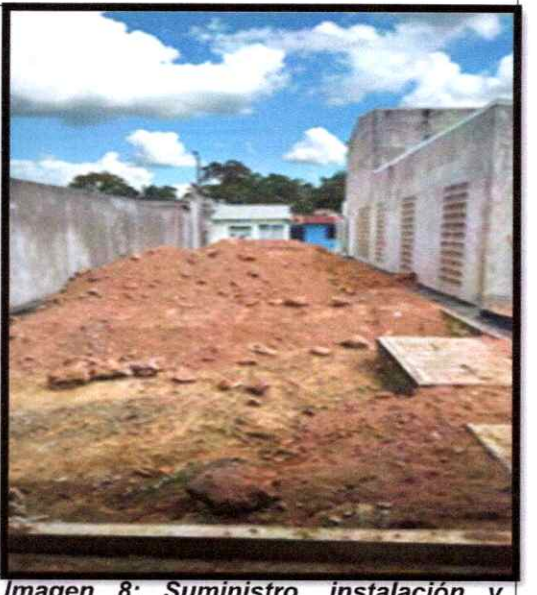


Imagen 8: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.



Imagen 9: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.

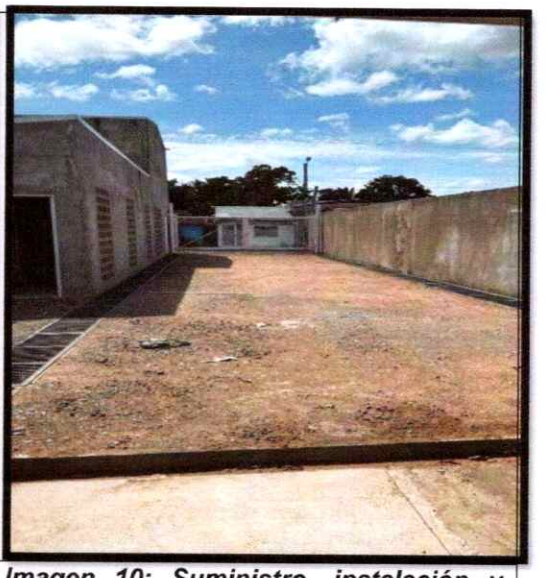


Imagen 10: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.



Imagen 11: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.



Imagen 12: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.



Imagen 13: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.

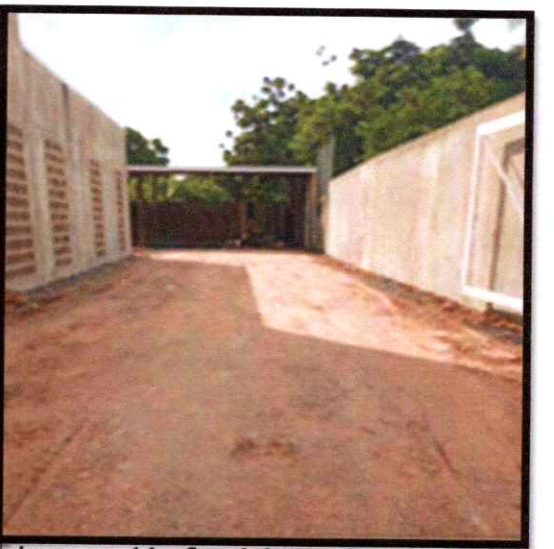


Imagen 14: Suministro, instalación y compactación de Subbase Granular.

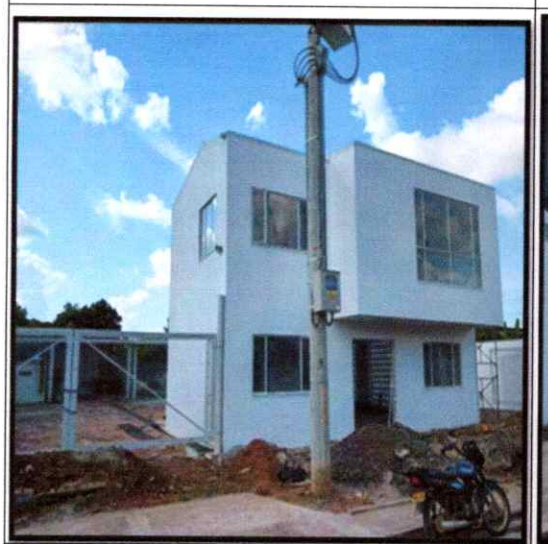


Imagen 15: Vinilo tipo 1 para muros externos.

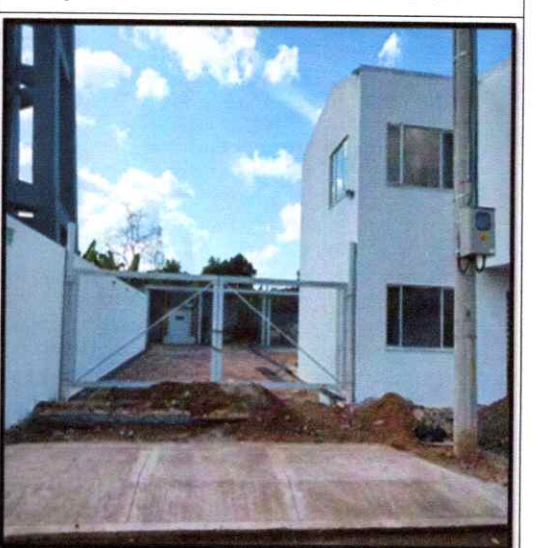


Imagen 16: Vinilo tipo 1 para muros externos.

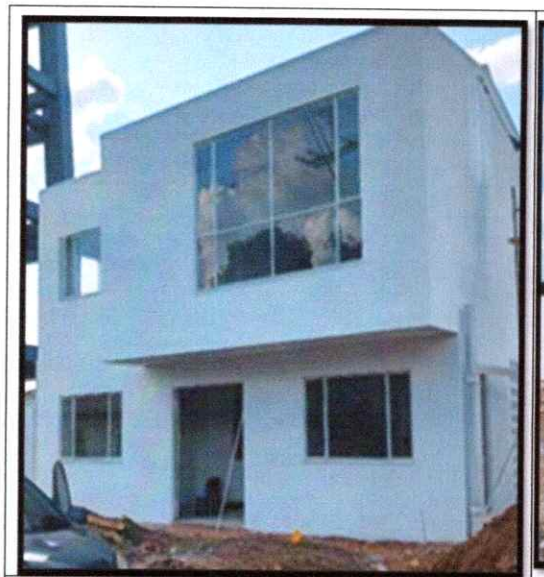


Imagen 17: Vinilo tipo 1 para muros externos.

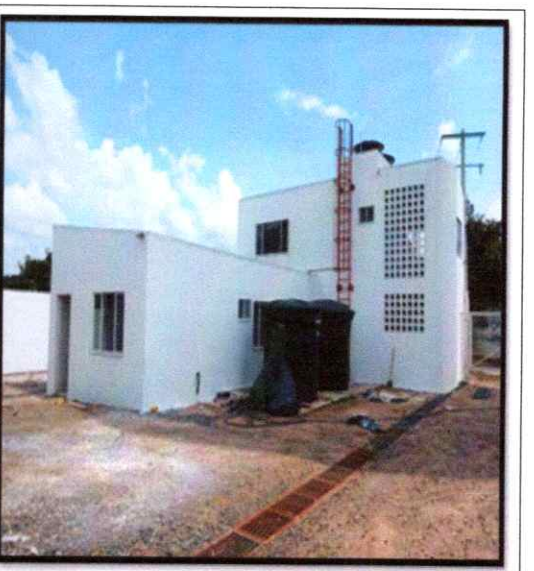


Imagen 18: Vinilo tipo 1 para muros externos.



Imagen 19: Vinilo tipo 1 para muros externos.



Imagen 20: Vinilo tipo 1 para muros externos.

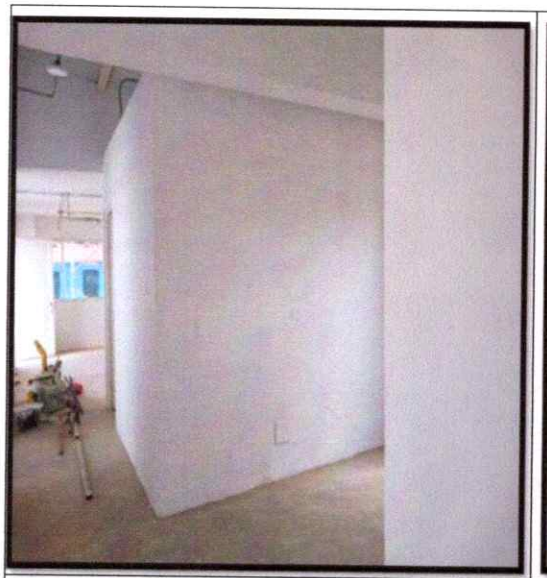


Imagen 21: Vinilo tipo 2 muros internos.



Imagen 22: Vinilo tipo 2 muros internos.



Imagen 23: Vinilo tipo 2 muros internos.

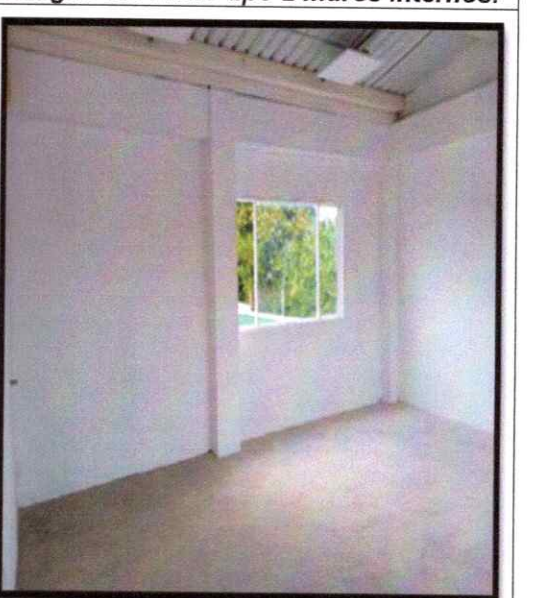


Imagen 24: Vinilo tipo 2 muros internos.

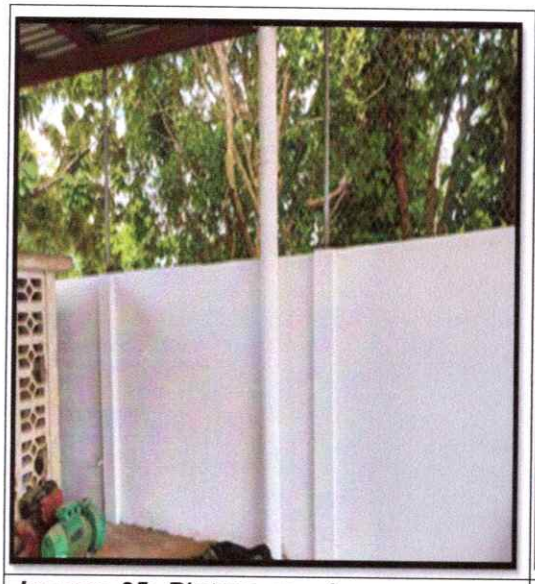


Imagen 25: Pintura epoxica para muros zona de lavado.

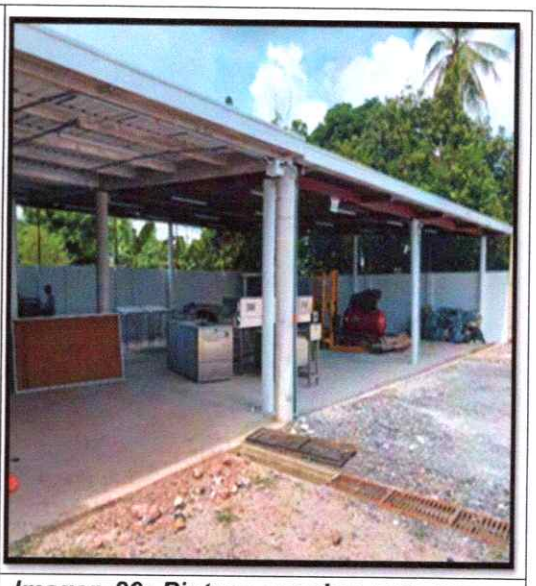


Imagen 26: Pintura epoxica para muros zona de lavado.

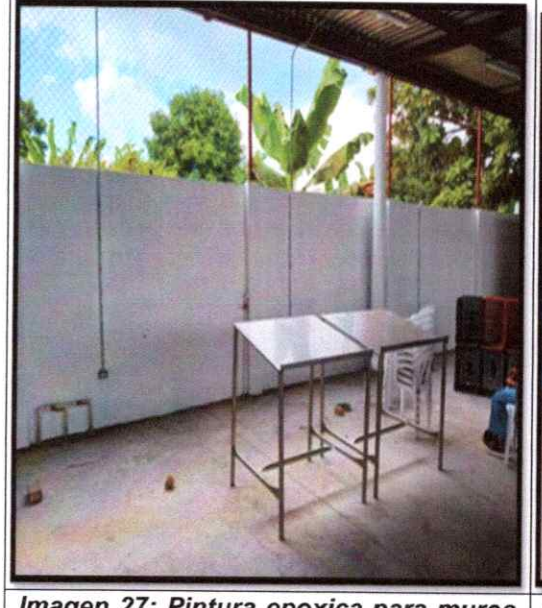


Imagen 27: Pintura epoxica para muros zona de lavado.

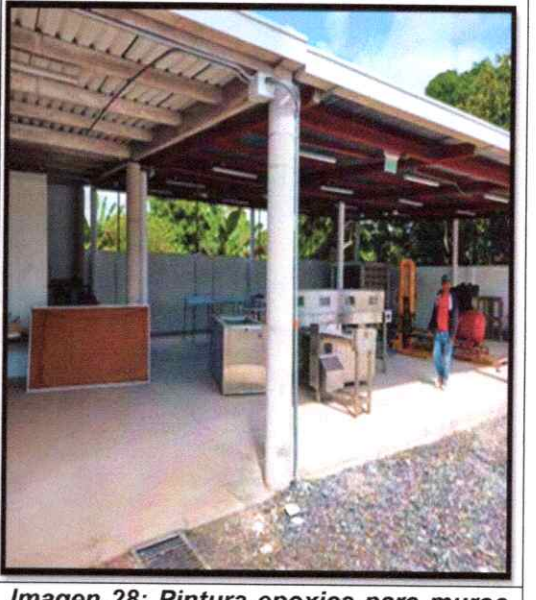


Imagen 28: Pintura epoxica para muros zona de lavado.



Imagen 29: Tubería sanitaria de 4" prolongación de cárcamo.



Imagen 30: Tubería sanitaria de 4" prolongación de cárcamo.



Imagen 31: Excavación a máquina.

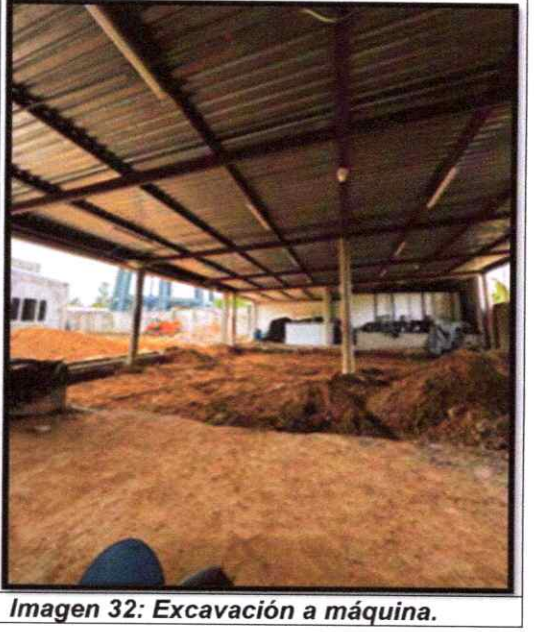


Imagen 32: Excavación a máquina.

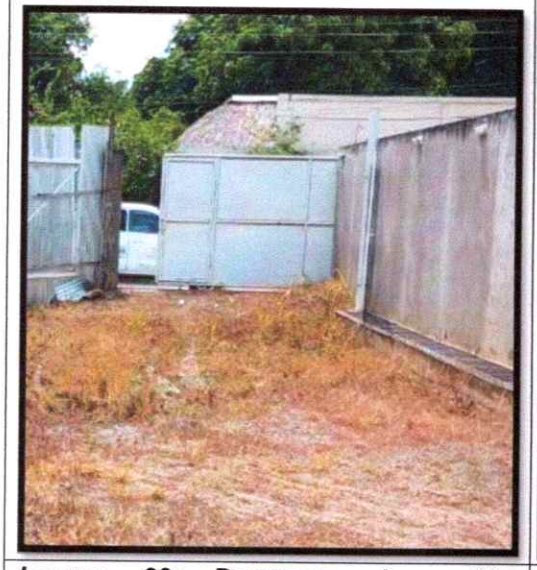


Imagen 33: Desmonte de portón existente.

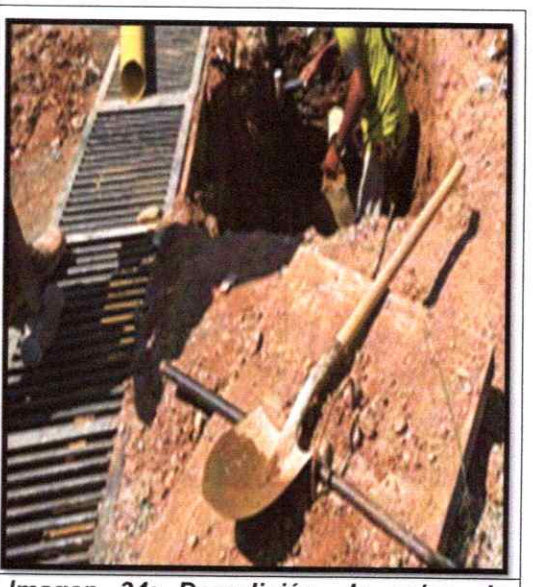


Imagen 34: Demolición de cajas de registro.

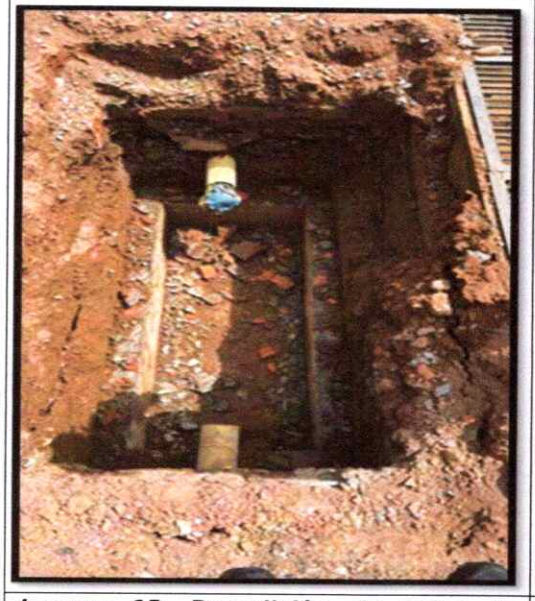


Imagen 35: Demolición de cajas de registro.

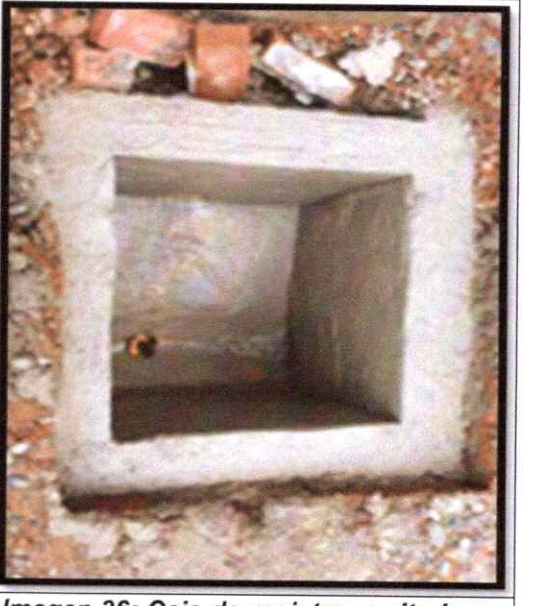


Imagen 36: Caja de registro sanitaria en concreto de 3000 PSI

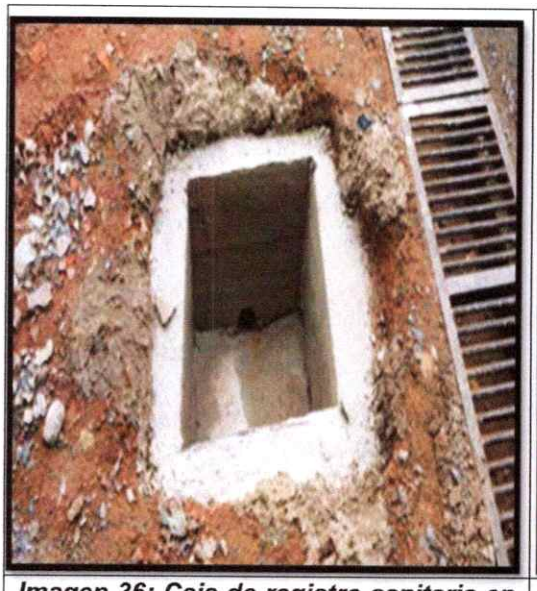


Imagen 36: Caja de registro sanitaria en concreto de 3000 PSI



Imagen 37: Caja de registro sanitaria en concreto de 3000 PSI

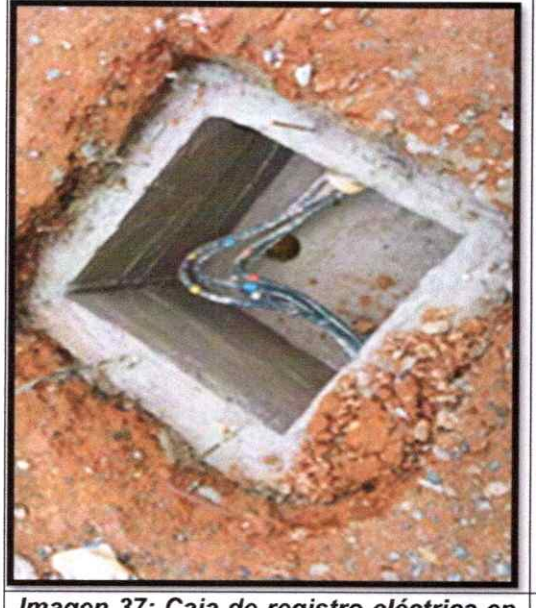


Imagen 37: Caja de registro eléctrica en concreto de 3000 PSI



Imagen 38: Suministro de material seleccionado.

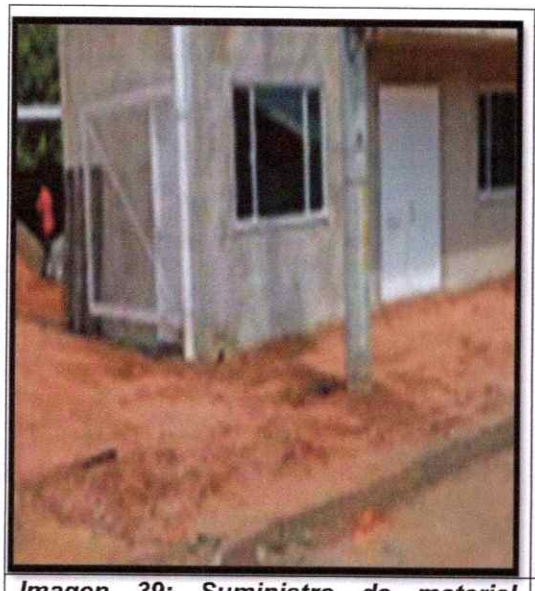


Imagen 39: Suministro de material seleccionado.



Imagen 40: Rampas de acceso.



Imagen 41: Rampas de acceso.



Imagen 42: Rampas de acceso.



Imagen 43: Acero de refuerzo para placa de contrapiso.



Imagen 44: Acero de refuerzo para placa de contrapiso.



Imagen 45: Concreto de 3500 PSI para placa de contrapiso.

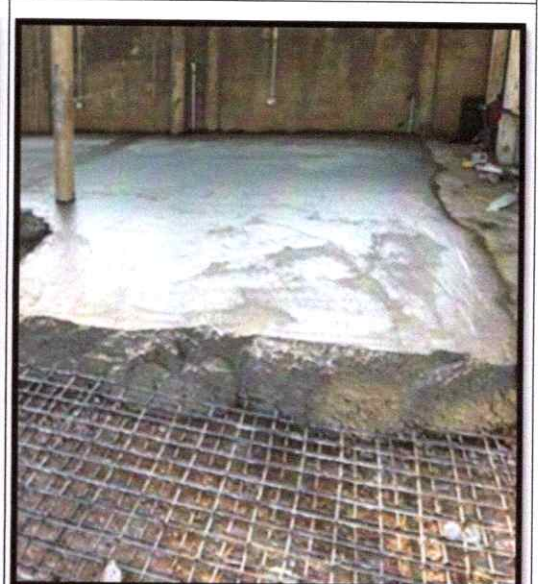


Imagen 46: Concreto de 3500 PSI para placa de contrapiso.



Imagen 47: Concreto de 3500 PSI para placa de contrapiso.

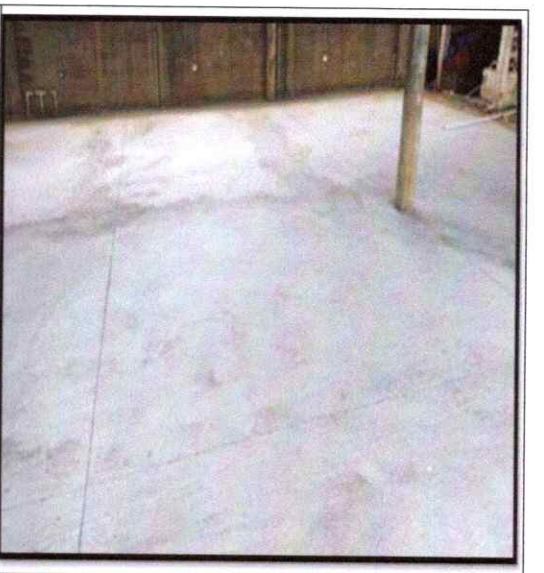


Imagen 48: Concreto de 3500 PSI para placa de contrapiso.

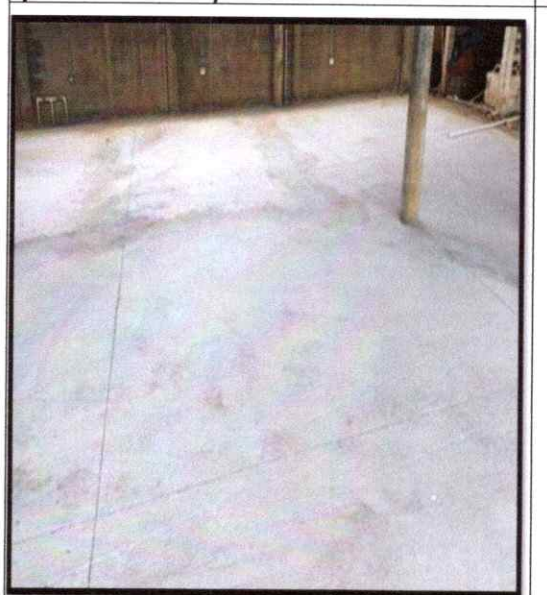


Imagen 49: Concreto de 3500 PSI para placa de contrapiso.

13.3. POLIZAS SEGUN CONTRATO Y ACTA DE INICIO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	09	2025	26	08	2025	00:00	26	10	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8	3228900321

DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8	7773049

DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: VALENCIA, CORDOBA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2025	26/02/2026	$12,848,036.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2025	26/02/2026	$64,240,180.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/08/2025	26/10/2028	$6,424,018.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$12,848,036.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****183,988.00	$ *******8,000.00	$ ******36,477.00	$ **********228,466.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	09	2025	26	08	2025	00:00	26	10	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****183,988.00	$ *******8,000.00	$ ******36,477.00	$ **********228,466.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101580192728 1(3900)000000228466(96)20260826

REFERENCIA PAGO:
1101580192728-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

12 Sep 2025 11:27:29
NIT: 901324084
Usuario: HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO

Pago exitoso
CUS 1771612941

Comercio
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Referencia 1
1699912377

Fecha
12 Sep 2025 11:27:29

Referencia 2
NIT

Número de factura
1699912377

Referencia 3
8600095786

Descripción del pago
Internet

Valor del Pago
$228.466

Número de comprobante
TR1126262941

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7254**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2025	26	08	2025	00:00	26	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8	3228900321

DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8	7773049

DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: VALENCIA, CORDOBA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA SE AJUSTA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 08/09/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(183,988.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(36,477.00)	$ *********(228,466.00)	$ *****(96,360,270.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2025	26	08	2025	00:00	26	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED

Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(183,988.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(36,477.00)	$ *********(228,466.00)	$ *****(96,360,270.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2025	26	08	2025	00:00	26	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PISCINGENIERIA HVS SAS		NIT: 901.324.084-8	
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE VALENCIA		NIT: 800.096.808-8	
DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** VALENCIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7773049

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

PILARGONZALEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2025	08	09	2025	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	11/03/2026	$12,848,036.10	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2025	11/03/2026	$64,240,180.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2025	08/11/2028	$6,424,018.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$12,848,036.10	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA SE AJUSTA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 08/09/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****183,988.00	$ *******8,000.00	$ ******36,477.00	$ **********228,466.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2025	08	09	2025	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED

Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****183,988.00	$ *******8,000.00	$ ******36,477.00	$ **********228,466.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1101580193247 3 (3900) 000000228466 (96) 20260908

REFERENCIA PAGO:
1101580193247-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2025	08	09	2025	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

PILARGONZALEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

12 Sep 2025 11:34:44
NIT: 901324084
Usuario: HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO

Pago exitoso
CUS 1771633177

Comercio
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha
12 Sep 2025 11:34:44

Número de factura
1699914003

Descripción del pago
Internet

Número de comprobante
TR1133213177

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7254**

Referencia 1
1699914003

Referencia 2
NIT

Referencia 3
8600095786

Valor del Pago
$228.466

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2025	08	09	2025	00:00	18	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	18/04/2026	$12,848,036.10	$12,848,036.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2025	18/04/2026	$64,240,180.50	$64,240,180.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2025	18/12/2028	$6,424,018.05	$6,424,018.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$12,848,036.10	$12,848,036.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENCION N 1 DE FECHA 23/10/2025 SE SUSPENDE POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y SEGUN PRORROGA N 1 A LA SUSPENCION N 1 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA SUSPENCION POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y SEGUN ACTA DE REINICIO N 1 DEL 02/12/2025 QUEDA COMO NUEVA FECHA FINAL EL 18/12/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,720.00	$ *******8,000.00	$ *******5,456.00	$ **********34,176.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2025	08	09	2025	00:00	18	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,720.00	$ *******8,000.00	$ *******5,456.00	$ **********34,176.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101580203125 8(3900)000000034176(96)20260908

REFERENCIA PAGO:
1101580203125-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2025	08	09	2025	00:00	18	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PISCINGENIERIA HVS SAS		NIT: 901.324.084-8
DIRECCION: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE VALENCIA		NIT: 800.096.808-8
DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** VALENCIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7773049

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIGUELMORENOSUS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2025	08	09	2025	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO
DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	18/04/2026	$12,848,036.10	$12,848,036.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2025	11/03/2026	$64,240,180.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2025	08/11/2028	$6,424,018.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$12,848,036.10	$12,848,036.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENCION N 1 DE FECHA 23/10/2025 SE SUSPENDE POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y SEGUN PRORROGA N 1 A LA SUSPENCION N 1 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA SUSPENCION POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y SEGUN ACTA DE REINICIO N 1 DEL 02/12/2025 QUEDA COMO NUEVA FECHA FINAL EL 18/12/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2025	08	09	2025	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******96,360,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143466	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2025	08	09	2025	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PISCINGENIERIA HVS SAS		NIT: 901.324.084-8	
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE VALENCIA		NIT: 800.096.808-8	
DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** VALENCIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7773049

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIGUELMORENOSUS 2

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 66734901

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	15/12/2025	143468	DORIS HELENA GALEANO DUARTE

Tomador: PISCINGENIERIA HVS SAS — **NIT/CC** 901324084

Suma de: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.******

Pagador: PISCINGENIERIA HVS SAS — **NIT/CC** 901324084

Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #214467399

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
53-AGENCIA MONTERIA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101040494-4-1	$20.720,05	$8.000,00	$5.456,81	$0,00	$34.176,86

Otros conceptos de pago	Valor
APROVECHAMIENTOS	$-0,86
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$34.176,00

Forma de pago

Ahorro: $0,00

Corriente: $0,00
Tarjeta: $0,00
Otro: $0,00

Transacción: 17748060

Total: **$34.176,00**
Cajero: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	08	09	2025	00:00	21	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PISCINGENIERIA HVS SAS		NIT: 901.324.084-8
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE VALENCIA		NIT: 800.096.808-8
DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: VALENCIA, CORDOBA	TELÉFONO	7773049
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	21/04/2026	$14,448,036.10	$14,448,036.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2025	21/04/2026	$64,240,180.50	$64,240,180.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2025	21/12/2028	$7,224,018.05	$7,224,018.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$12,848,036.10	$12,848,036.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AUMENTA VALOR ASEGURADO EN $16.000.000 QUEDANDO EN $144.480.361 Y SE PRORROGA PLAZO DE EJECUCION POR 4 DIAS MAS , SEGUN CONTRATO ADICIONAL No. 01 - ADICION EN VALOR Y TIEMPO FIRMADO POR LAS PARTES EL 17/12/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ *******4,000.00	$ *******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******98,760,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	08	09	2025	00:00	21	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ *******4,000.00	$ *******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******98,760,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015802043352(3900)000000019040(96)20260908

REFERENCIA PAGO: 1101580204335-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	08	09	2025	00:00	21	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PISCINGENIERIA HVS SAS		NIT: 901.324.084-8	
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE VALENCIA		NIT: 800.096.808-8	
DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** VALENCIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7773049

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PILARGONZALEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101040494, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MONTERIA a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2025

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	08	09	2025	00:00	18	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	MONTERIA, CORDOBA	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	VALENCIA, CORDOBA	7773049

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.SAMC-MV-014-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	18/04/2026	$14,448,036.10	$12,848,036.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/09/2025	18/04/2026	$64,240,180.50	$64,240,180.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2025	18/12/2028	$7,224,018.05	$6,424,018.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$12,848,036.10	$12,848,036.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIC DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AUMENTA VALOR ASEGURADO EN $16.000.000 QUEDANDO EN $144.480.361 Y SE PRORROGA PLAZO DE EJECUCION POR 4 DIAS MAS , SEGUN CONTRATO ADICICNAL No. 01 - ADICION EN VALOR Y TIEMPO FIRMADO POR LAS PARTES EL 17/12/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,005.00	$ *******4,000.00	$ *******2,661.00	$ **********16,666.00	$ *******98,760,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	08	09	2025	00:00	18	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
PISCINGENIERIA HVS SAS	NIT: 901.324.084-8	3228900321

DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VALENCIA	NIT: 800.096.808-8	7773049

DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: VALENCIA, CORDOBA

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,005.00	$ *******4,000.00	$ *******2,661.00	$ **********16,666.00	$ *******98,760,270.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015802043345(3900)000000016666(96)20261218

REFERENCIA PAGO: 1101580204334-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101040494	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	08	09	2025	00:00	18	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PISCINGENIERIA HVS SAS		**NIT: 901.324.084-8**
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 B CENTRO	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3228900321

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE VALENCIA		**NIT: 800.096.808-8**
DIRECCIÓN: CRA. 15 CALLE 11 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** VALENCIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7773049

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PILARGONZALEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101040494, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MONTERIA a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2025

53-44-101040494

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Dic 2025 15:13:37
NIT: 901324084
Usuario: HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO

Pago exitoso
CUS 2019842843

Comercio
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Referencia 1
1716865654

Fecha
18 Dic 2025 15:13:37

Referencia 2
NIT

Número de factura
1716865654

Referencia 3
8600095786

Descripción del pago
Internet

Valor del Pago
$35.706

Número de comprobante
TR1511202843

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7254**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: LHeBOAkE/+uvE4JrmPt0nA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100018313	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	489040400	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2025	24:00 Horas Del	09/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RSE INGENIEROS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.846.891-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO 5-27	**TELÉFONO**	3126597932
ASEGURADO	MUNICIPIO DE VALENCIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.808-8
DIRECCIÓN	CALLE 11 CARRERA 15 - PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	7773071
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VALENCIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.808-8
DIRECCIÓN	CALLE 11 CARRERA 15 - PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	7773071

OBJETO DE CONTRATO

NOTA: DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, PRORROGA A LA SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ACTA DE REINICIO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, ACTUALIZAMOS LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CMC- MV 022 -2025 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGA POR CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/09/2025	24:00 Horas Del 16/06/2026	2.098.446,00	8.333,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/09/2025	24:00 Horas Del 16/12/2028	2.098.446,00	8.333,33
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2025	24:00 Horas Del 09/12/2030	2.098.446,00	8.333,33
		TOTAL ASEGURADO	$ 6.295.338,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	24.999,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	24.999,99
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.749,99

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2030

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100018313	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	489040400	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2025	24:00 Horas Del	09/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociacion Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100018313** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **RSE INGENIEROS SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VALENCIA / MUNICIPIO DE VALENCIA** , expedida por la Compañía en **15/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **15** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	489040400
Fecha de Facturación	15/12/2025
Fecha Límite de Pago	14/01/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	CMT-100018313		Prima (incluye gastos de expedición)	24.999,99
Periodo Facturado	08/09/2025	09/12/2030	IVA	4.750,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	29.749,99

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RSE INGENIEROS SAS
CALLE 26 NO 5-27	900846891
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	489040400
Fecha de Facturación	15/12/2025
Fecha Límite de Pago	14/01/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	CMT-100018313		Prima (incluye gastos de expedición)	24.999,99
Periodo Facturado	08/09/2025	09/12/2030	IVA	4.750,00
			VALOR TOTAL A PAGAR $	29.749,99

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RSE INGENIEROS SAS
CALLE 26 NO 5-27	900846891
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000004890404003900)2974999(96)20260114

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299000004890404003900)2974999(96)20260114

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13.4. SEGURIDAD SOCIAL.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901324084	8	PISCINGENIERIA HVS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA VALENCIA	CALLE 15	VALENCIA-CORDOBA	3167454512	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2031558241	9496769586	E	2026/01/22	2025/12/23	BANCOLOMBIA	0	$511,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1010045719	MORALES ARRIETA GREGORIO MIGUEL	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF16	7	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$99,100	7	$0	$0
2	CC	1001747895	PEÑA GOMEZ LUIS FERNANDO	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF16	7	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$99,100	7	$0	$0
3	CC	10898108	RANGEL ALDANA JORGE ELIECER	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF16	7	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$99,100	7	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$1,067,625	$171,000			$0	$0			$1,067,625	$42,900			$4,270,500	$297,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$171,000	$0	$0	$171,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$0	$297,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$42,900	$0	$0	$42,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$42,900	$0	$0	$42,900
TOTAL				3	$511,200	$0	$0	$511,200

RSE INGENIEROS

CERTIFIED WOMEN OWNED WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM

icontec ISO 9001 SC-2000637

icontec ISO 14001 SA-2000638

icontec ISO 45001 ST-2000639

IQNET

INFORMES SEMANALES

Dirección: calle 26 # 5-27 Montería - Córdoba
Celular: 311 392 4965 - Correo: gestion@rsingenieros.co

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2	
						VERSIÓN	1			
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001			

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO SEDE ALMAGRAS

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1,1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	$ 7.230,00	78,02	$ 564.085,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	$ 19.667,00	-44,00	-$ 865.348,00
3,2	GEOTEXTIL PARA ESTABILICACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	$ 33.141,00	6,90	$ 228.673,00
3,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO)	M3	$ 187.000,00	0,24	$ 44.880,00
4,1	Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	M2	$ 21.700,00	155,00	$ 3.363.500,00
NP-1	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PARA PROLONGACION DE CARCAMOS	M	$ 50.280,00	28,0	$ 1.407.840,00
NP-2	EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA DE ZONA DE LAVADO	M3	$ 22.805,00	38,61	$ 880.501,00
NP-3	DESMONTE DE PORTON EXISTEN ZONA SALIDA DE FRUTAS LIMPIAS	UND	$ 99.850,00	1,00	$ 99.850,00
NP-4	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO EXISTENTE	UND	$ 43.571,00	4,00	$ 174.284,00
NP-5	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE TAPA EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 0,12 M	UND	$ 681.153,00	2,00	$ 1.362.306,00
NP-6	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO.	M3	$ 84.744,00	16,37	$ 1.387.259,00

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA			
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S				CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S			
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO				REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ			
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$	128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$	20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025				FECHA FINAL	17/12/2025			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

NP-7	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3500 PSI. E: 0,20m. ACERO DE REFUERZO diam 1/2" EN AMBOS SENTIDOS. @ 0,25 M, INCLUYE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL Y BORDILLO DE CAMBIO DE NIVEL. SECCION 0,12 X 0,40 M EN CONCRETO 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 2N3/8" Y TRANSVERSAL DE 1/4"@0,2M. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO.	M2	$ 335.293,00	12,00	$ 4.023.516,00

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


ANTICIPO		PORCENTAJE%	50%	
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -	
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

NP-8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO.	M2	$ 239.005,54	100,00	$	23.900.554,00
	SUBTOTAL OBRAS				**$**	**36.571.900,00**
	ADMINISTRACIÓN			30,5%	**$**	**11.154.429,50**
	IMPREVISTOS			1,0%	**$**	**365.719,00**
	UTILIDAD			5,0%	$	1.828.595,00
	COSTO TOTAL OBRAS				**$**	**49.920.643,50**

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO





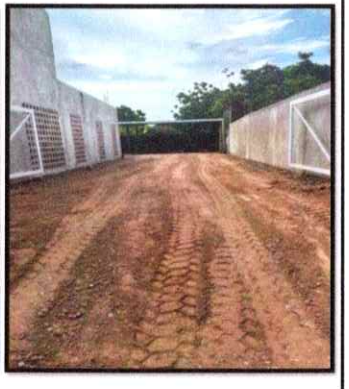

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25



CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

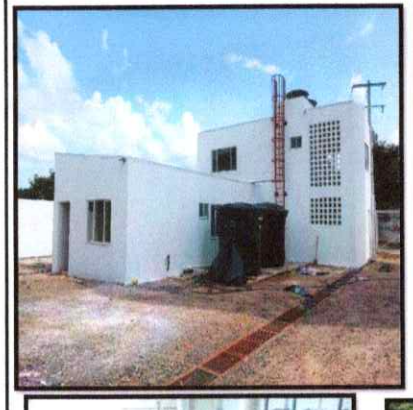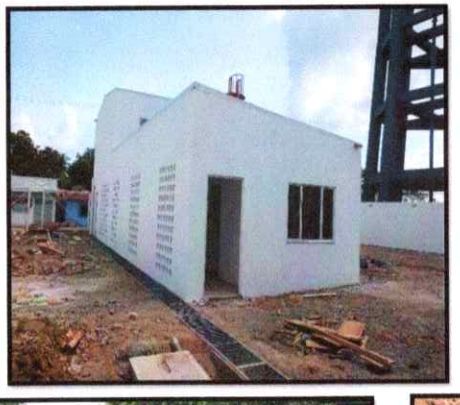

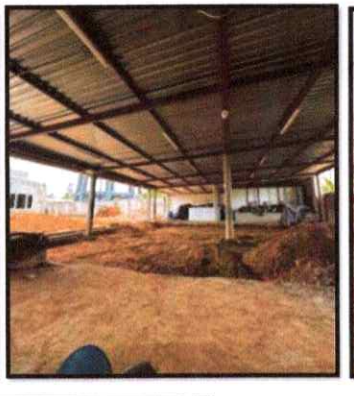

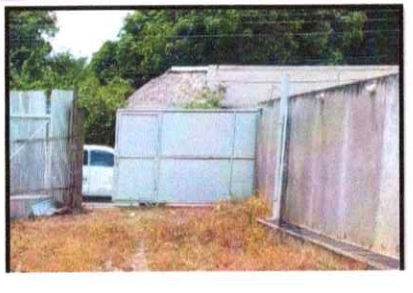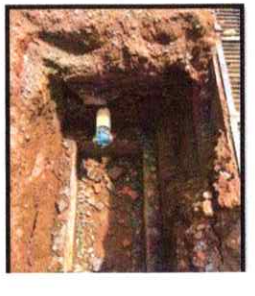	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2	
						VERSIÓN	1			
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001			
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25	
CONTRATO DE OBRA					**CONTRATO DE INTERVENTORIA**					
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA				
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S				CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S				
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO				REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ				
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$	128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$	20.984.460,00	
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	20.984.460,00	
FECHA FINAL	8/11/2025				FECHA FINAL	17/12/2025				
II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA										
ANTICIPO					PORCENTAJE%		50%			
RESUMEN ACTAS PAGADAS:					TOTAL PAGADO:		$	-		
PARCIAL 1:	$ -				% AVANCE FINANCIERO:		0,00%			
PARCIAL 2:	$ -									
PARCIAL 3:	$ -									
FINAL:	$ -									







	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA			
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S				CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S			
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO				REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ			
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$	128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$	20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025				FECHA FINAL	17/12/2025			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	**0,00%**
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			



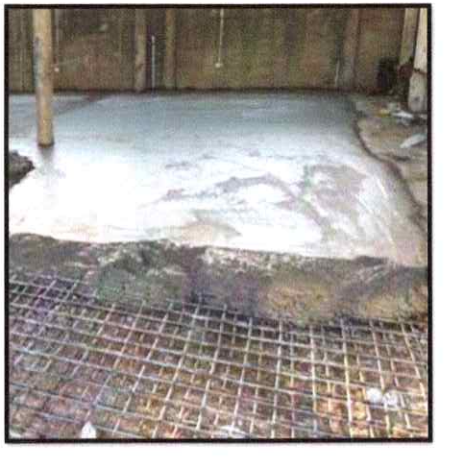


AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	37,05%	40,13%	43,58%
DURANTE EL PERIODO	-5,95%	34,55%	
ACUMULADO ACTUAL	31,10%	74,68%	



	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25
CONTRATO DE OBRA					**CONTRATO DE INTERVENTORIA**				
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA			
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S				CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S			
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO				REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ			
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$	128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$	20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025				FECHA FINAL	17/12/2025			
II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA									
ANTICIPO			PORCENTAJE%			50%			
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:			$			-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:			0,00%			
PARCIAL 2:	$ -								
PARCIAL 3:	$ -								
FINAL:	$ -								
	ACUMULADO ACTUAL		61,70%	14,00%		ANTERIOR			

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-001		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	8	DEL	2-dic-25	AL	6-dic-25
CONTRATO DE OBRA					**CONTRATO DE INTERVENTORIA**				
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA			
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S				CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S			
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO				REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ			
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$	128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$	20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025				FECHA FINAL	17/12/2025			
II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA									
ANTICIPO			PORCENTAJE%			50%			
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:			$			-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:			**0,00%**			
PARCIAL 2:	$ -								
PARCIAL 3:	$ -								
FINAL:	$ -								

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	2	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-001		

V. FIRMAS

RSE INGENIEROS S.A.S	**SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA**
R.L. KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ	SUPERVISOR
ELABORÓ	REVISÓ

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE		2
						VERSIÓN	1			
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001			

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	15	12	2025	SEMANA No.:	9	DEL	8-dic-25	AL	13-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO SEDE ALMAGRAS

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
4,1	Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	M2	$ 21.700,00	125,00	$ 2.712.500,00
4,2	Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos	M2	$ 21.000,00	250,00	$ 5.250.000,00
4,3	Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación	M2	$ 30.800,00	69,17	$ 2.130.436,00
NP-4	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO EXISTENTE	UND	$ 43.571,00	1,00	$ 43.571,00
NP-5	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE TAPA EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 0,12 M	UND	$ 681.153,00	2,00	$ 1.362.306,00
NP-6	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TAPA EN CONCRET, ACERO DE REFUERZO DIAM 3/8" EN AMBOS SENTIDOS.	UND	$ 608.743,46	1,00	$ 608.743,00
NP-8	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3500 PSI. E: 0,20m. ACERO DE REFUERZO diam 1/2" EN AMBOS SENTIDOS. @ 0,25 M, INCLUYE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL Y BORDILLO DE CAMBIO DE NIVEL. SECCION 0,12 X 0,40 M EN CONCRETO 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 2N3/8" Y TRANSVERSAL DE 1/4"@0,2M. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO.	M2	$ 335.293,00	12,00	$ 4.023.516,00
NP-9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO.	M2	$ 239.005,54	31,34	$ 7.490.433,00

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					VERSIÓN	1				
						CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001				

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	15	12	2025	SEMANA No.:	9	DEL	8-dic-25	AL	13-dic-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA			
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S				CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S			
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO				REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ			
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$	128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$	20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$	-
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$	20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025				FECHA FINAL	17/12/2025			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

SUBTOTAL OBRAS		**$ 23.621.505,00**
ADMINISTRACIÓN	30,5%	**$ 7.204.559,03**
IMPREVISTOS	1,0%	**$ 236.215,05**
UTILIDAD	5,0%	$ 1.181.075,25
COSTO TOTAL OBRAS		**$ 32.243.354,33**

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO










	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	15	12	2025	SEMANA No.:	9	DEL	8-dic-25	AL	13-dic-25


CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		


II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			







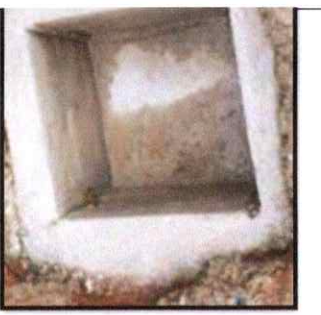







	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					VERSIÓN	1		
						CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	15	12	2025	SEMANA No.:	9	DEL	8-dic-25	AL	13-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%		50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:		0,00%
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				









	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	15	12	2025	SEMANA No.:	9	DEL	8-dic-25	AL	13-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	PISCINGENIERIA HVS S.A.S			CONTRATISTA:	RSE INGENIEROS S.A.S		
REP. LEGAL:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO			REP. LEGAL:	KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ		
CONTRATO No.	SAMC-MV-014-2025	VALOR INICIAL:	$ 128.480.361,00	CONTRATO No.	CMC-MV 022-2025	VALOR INICIAL:	$ 20.984.460,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	2 MESES	ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 128.480.361,00	FECHA DE INICIO	8/09/2025	VALOR TOTAL	$ 20.984.460,00
FECHA FINAL	8/11/2025			FECHA FINAL	17/12/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	50%
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	31,10%	74,68%	-0,77%
DURANTE EL PERIODO	66,67%	22,32%	
ACUMULADO ACTUAL	97,77%	97,00%	



	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	2	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-001		

V. FIRMAS

RSE INGENIEROS S.A.S	**SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA**
R.L. KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ	SUPERVISOR
ELABORÓ	REVISÓ

RSE INGENIEROS

CERTIFIED WOMEN OWNED WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM

icontec ISO 9001 SC-2000637

icontec ISO 14001 SA-2000638

icontec ISO 45001 SI-2000639

IQNET

CORRESPONDENCIA

Dirección: calle 26 # 5-27 Montería - Córdoba
Celular: 311 392 4965 - Correo: gestion@rsingenieros.co

RSE INGENIEROS

CERTIFIED WOMEN OWNED WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM

icontec ISO 9001 SC-2000637

icontec ISO 14001 SA-2000638

icontec ISO 45001 ST-2000639

IQNET

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Dirección: calle 26 # 5-27 Montería – Córdoba
Celular: 311 392 4965 - Correo: gestion@rsingenieros.co

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos 11
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más

Etiquetas +

4 de 59 Es

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS SEGUN REINICIO

OBRAS 1 RSE INGENIEROS <obras1rseingenieros@gmail.com>
para obraspublicas

Buenas tardes

Por medio del presente nos permitimos enviar las pólizas según reinicio del contrato de obra SAMC-MV-014-2025 Y Contrato de interventoría CMC-MV-022-2025 Para su revisión y aprobación

Anexos
1 Pólizas según reinicio de obra
2 Pólizas según reinicio Interventoría

Descargar todos los archivos adjuntos

3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail Añadirlo todo a Drive



Responder Reenviar

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

informe de interventoria Nº2

OBRAS 1 RSE INGENIEROS <obrasrseingenieros@gmail.com>
para obraspublicas

mar, 16 dic, 15:01 (hace 7 días)

Buenas tardes

cordial saludo

Por medio del presente nos permitimos hacerle entrega del informe de ejecución Nº2 comprendido desde el dia 01 de octubre al 23 de octubre de 2025 para su revisión

Quedamos atentos a sus comentarios

Un archivo adjunto · Analizados por Gmail · Añadir a Drive



Informe Mensual ...

Responder Reenviar

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

ACTA PARCIAL DE OBRA Nº1

OBRAS 1 RSE INGENIEROS <obras1rseingenieros@gmail.com>
para obraspublicas

Buenas tardes

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito remitir el acta de cobro Nº1 del contrato de obra SAMC-MV-014-2025 emitida por el contratista de obra, para su revisión y aprobación
Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente

ACTA PARCIAL Nº1.rar

Un archivo adjunto · Analizados por Gmail

Responder

Reenviar

RSE INGENIEROS

CERTIFIED WOMEN OWNED WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM

icontec ISO 9001 SC-2000637 icontec ISO 14001 SA-2000638 icontec ISO 45001 ST-2000639 IQNET

17 de diciembre de 2025

CMC-MV-022-2025 -010

Señores
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Sandra Patricia Hernández Sierra
Secretaria de Obras Públicas.
Valencia – Córdoba

REFERENCIA: CONTRATO DE N.º SAMC-MV-014-2025 Cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ASUNTO: APROBACIÒN A SOLICITUD DE AM0PLIACIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA N.º SAMC-MV-014-2025.

KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ en calidad de Representante Legal de la empresa **RSE INGENIEROS S.A.S,** Interventores, me dirijo a usted en calidad de Representante Legal de la empresa. Con el fin de dar aprobación a la solicitud de ampliación en tiempo emitido por el contratista de obra en el oficio **N.º SAMC-MV-2025-0013** con fecha de **17 de diciembre de 2025.**

- Anexo oficio emitido por el contratista de obra.
- Programación de obra segun Balance.

Atentamente:

KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ
Representante Legal
RSE INGENIEROS S.A.S

SAMC-MV-2025-0013

Montería, 17 de diciembre de 2025

Señores
RSE INGENIEROS S.A.S
KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ. – Representante Legal.

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÒN EN TIEMPO.
Respetados señores,

Por medio de la presente, y de manera respetuosa, nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia, con fundamento en consideraciones técnicas, administrativas y de programación de obra, las cuales se exponen a continuación:

Las actividades del proyecto fueron reiniciadas el día **02 de diciembre de 2025**, luego de haber permanecido suspendidas por causas ajenas a este contratista. Dicho reinicio se realizó una vez fue aprobado el Balance de Obra N.º 1 y previa adición al contrato en referencia, en el cual se incorporaron actividades no contempladas dentro del alcance inicial del contrato, derivadas de ajustes técnicos necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operación del proyecto.

Dentro de las actividades adicionales aprobadas, se destaca **la "Construcción de rampas de acceso a zona de frutas sucias y limpias"**, la cual constituye una actividad de ruta crítica, dado que condiciona el avance de actividades posteriores y la puesta en funcionamiento de áreas directamente relacionadas con el proceso operativo del proyecto. Conforme a la reprogramación actualizada del cronograma de obra, dicha actividad requiere un plazo aproximado de dieciocho (18) días calendario para su ejecución integral, incluyendo las labores constructivas, acabados y adecuaciones necesarias para su correcta operación.

En este sentido, la inclusión de esta actividad impacta de manera directa el camino crítico del cronograma contractual, afectando los tiempos inicialmente pactados. Por lo tanto, resulta

técnicamente procedente realizar un ajuste al plazo de ejecución, con el fin de asegurar la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad constructiva, evitando afectaciones al desempeño y funcionalidad final del proyecto.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual por un término de cuatro (4) días calendario, adicionales al plazo inicialmente establecido, de conformidad con la reprogramación presentada.

Agradecemos la atención brindada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional o aclaración técnica que se requiera.
Atentamente,

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
Representante Legal
Piscingenieria HVS S.A.S

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**	**146 días**	**lun 8/09/25**	**dom 1/02/26**		**$ 144.480.361,00**
2		ACTA DE INICIO	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25		$ 0,00
3		**PRELIMINARES**	**35 días**	**lun 8/09/25**	**lun 13/10/25**		**$ 8.187.870,60**
4		DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	20 días	lun 8/09/25	dom 28/09/25		$ 3.625.753,95
5		DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	15 días	dom 28/09/25	lun 13/10/25	4	$ 4.562.116,65
6		**PLACA DE CONCRETO**	**0 días**	**lun 8/09/25**	**lun 8/09/25**		**$ 0,00**
7		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25		$ 0,00
8		**CALZADA**	**81 días**	**dom 28/09/25**	**jue 18/12/25**		**$ 49.750.815,66**
9		CONFORMACIÓN DE CALZADA	20 días	dom 28/09/25	sáb 18/10/25	4	$ 0,00
10		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	10 días	sáb 18/10/25	lun 8/12/25	9	$ 13.402.503,66
11		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO)	10 días	lun 8/12/25	jue 18/12/25	10	$ 36.348.312,00
12		**PINTURA**	**66 días**	**lun 13/10/25**	**jue 18/12/25**		**$ 22.747.578,95**
13		Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	25 días	lun 13/10/25	jue 18/12/25	5	$ 9.185.613,26
14		Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos	25 días	lun 13/10/25	jue 18/12/25	5	$ 10.653.920,55

Proyecto: Programación De Ob
Fecha: jue 18/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
15		Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación	25 días	lun 13/10/25	jue 18/12/25	5	$ 2.908.045,14
16		**ITEM NO PREVISTOS**	**20 días**	**mar 2/12/25**	**lun 22/12/25**		**$ 63.794.095,79**
17		SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PARA PROLONGACION DE CARCAMOS	3 días	mié 3/12/25	sáb 6/12/25		$ 1.921.701,60
18		EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA DE ZONA DE LAVADO	3 días	mié 3/12/25	sáb 6/12/25	25CC	$ 1.201.883,87
19		DESMONTE DE PORTON EXISTEN ZONA SALIDA DE FRUTAS LIMPIAS	2 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	17CC+1 día	$ 136.295,25
20		DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO EXISTENTE	3 días	sáb 6/12/25	mar 9/12/25	19CC+2 días	$ 297.372,08
21		CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE TAPA EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 0,12 M	5 días	mar 9/12/25	dom 14/12/25	20	$ 3.719.095,38
22		CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TAPA EN CONCRET, ACERO DE REFUERZO DIAM 3/8" EN AMBOS SENTIDOS.	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	21CC	$ 831.275,45
23		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO.	2 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	17CC+1 día	$ 1.893.608,54


Proyecto: Programación De Ob
Fecha: jue 18/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
24		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3500 PSI. E: 0,20m. ACERO DE REFUERZO diam 1/2" EN AMBOS SENTIDOS. @ 0,25 M, INCLUYE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL Y BORDILLO DE CAMBIO DE NIVEL. SECCION 0,12 X 0,40 M EN CONCRETO 3500 PSI, ACERO DE	14 días	lun 8/12/25	lun 22/12/25		$ 10.944.165,96
25		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO.	18 días	mar 2/12/25	sáb 20/12/25	5FC+50 días	$ 42.848.697,66
26		ACTA DE TERMINACIÓN	105 días	lun 8/09/25	dom 1/02/26	4CC	$ 0,00


Proyecto: Programación De Ob
Fecha: jue 18/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

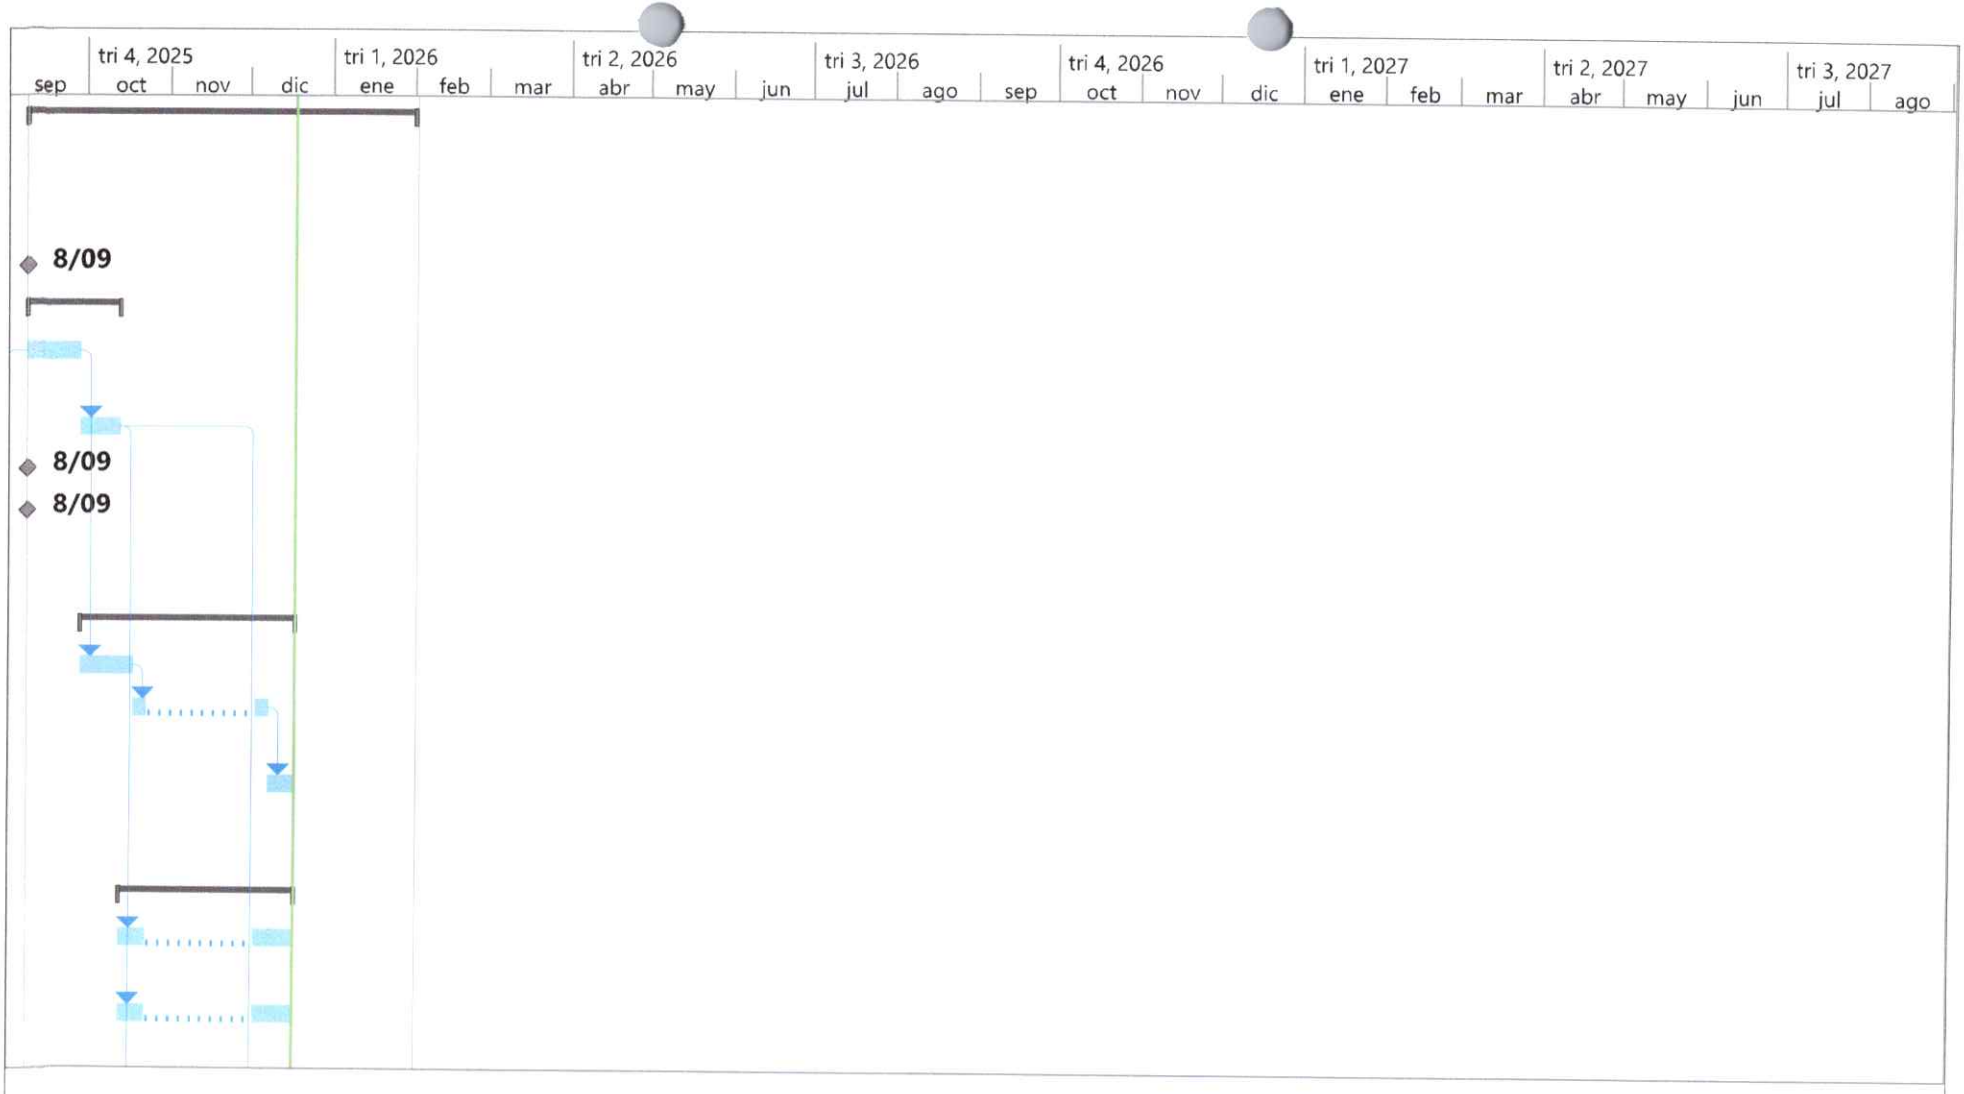


Proyecto: Programación De Ob
Fecha: jue 18/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

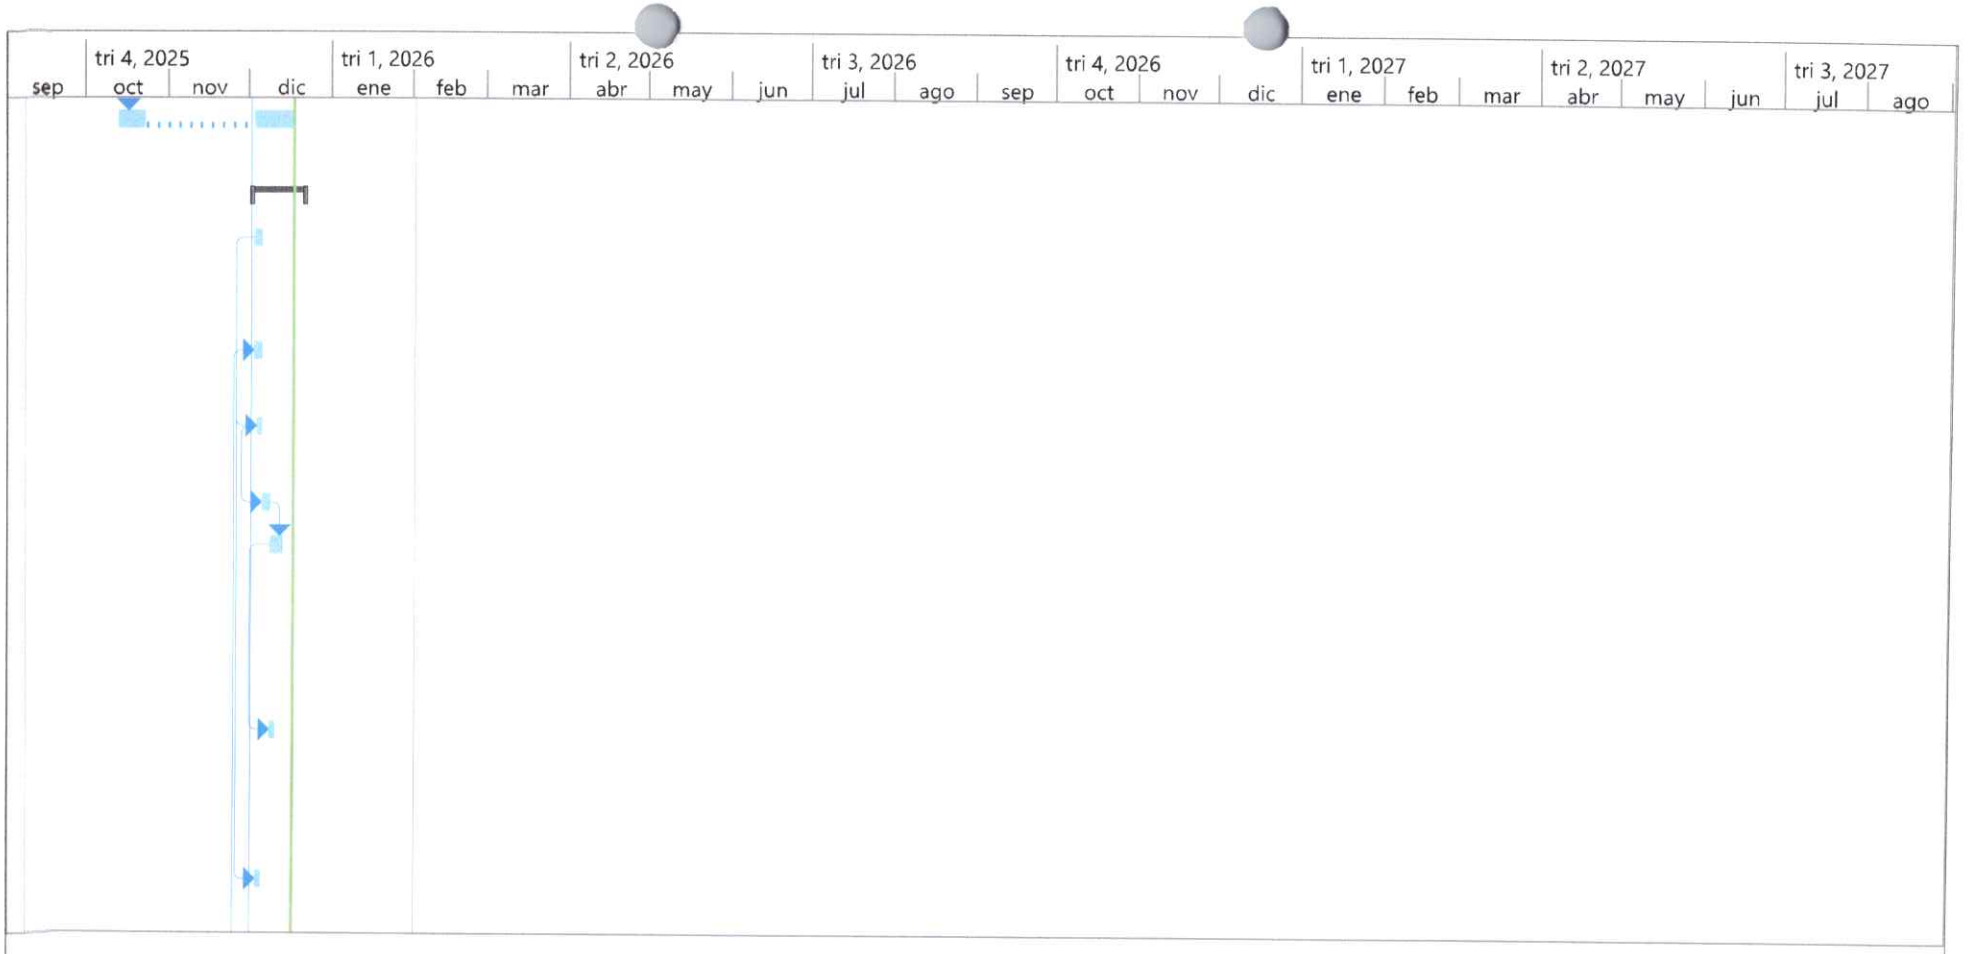

Proyecto: Programación De Ob
Fecha: jue 18/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

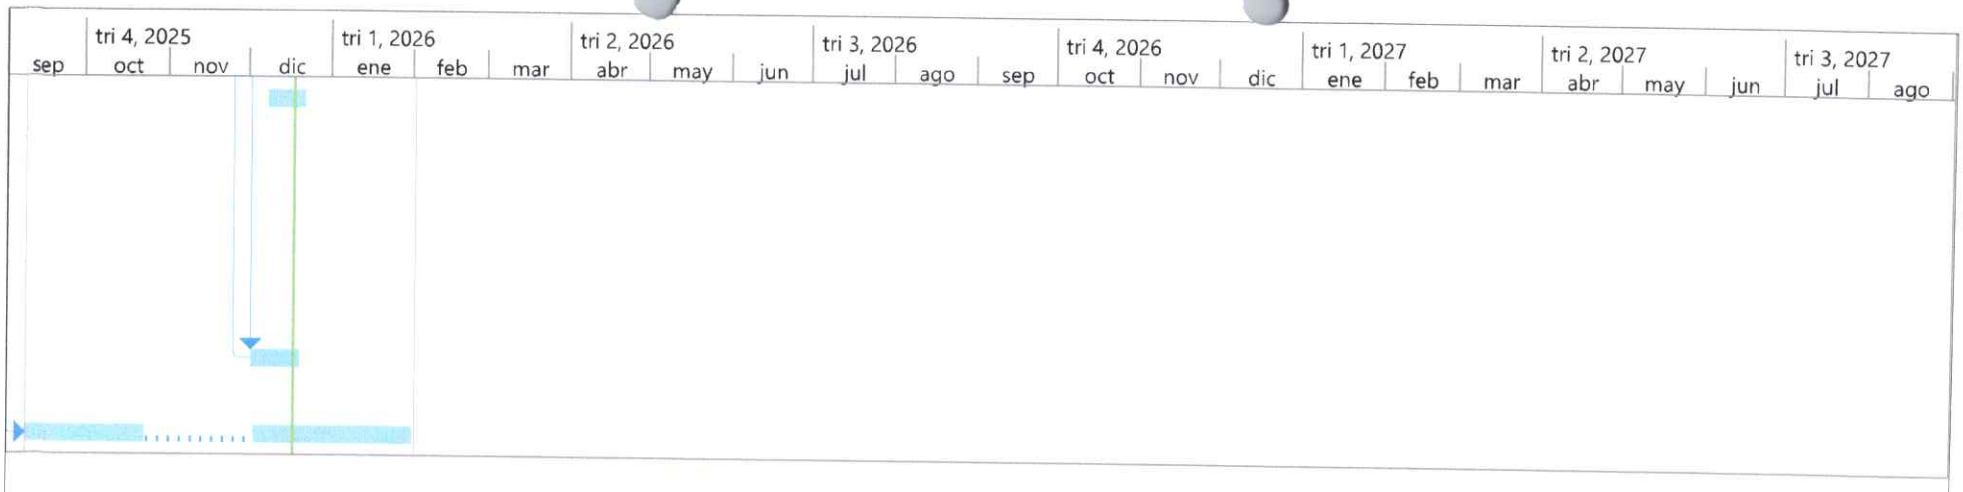

Proyecto: Programación De Ob
Fecha: jue 18/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

RSE INGENIEROS

CERTIFIED WOMEN OWNED WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM

icontec ISO 9001 SC-2000637


icontec ISO 14001 SA-2000638

icontec ISO 45001 ST-2000639

IQNET

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Dirección: calle 26 # 5-27 Montería – Córdoba
Celular: 311 392 4965 - Correo: gestion@rsingenieros.co

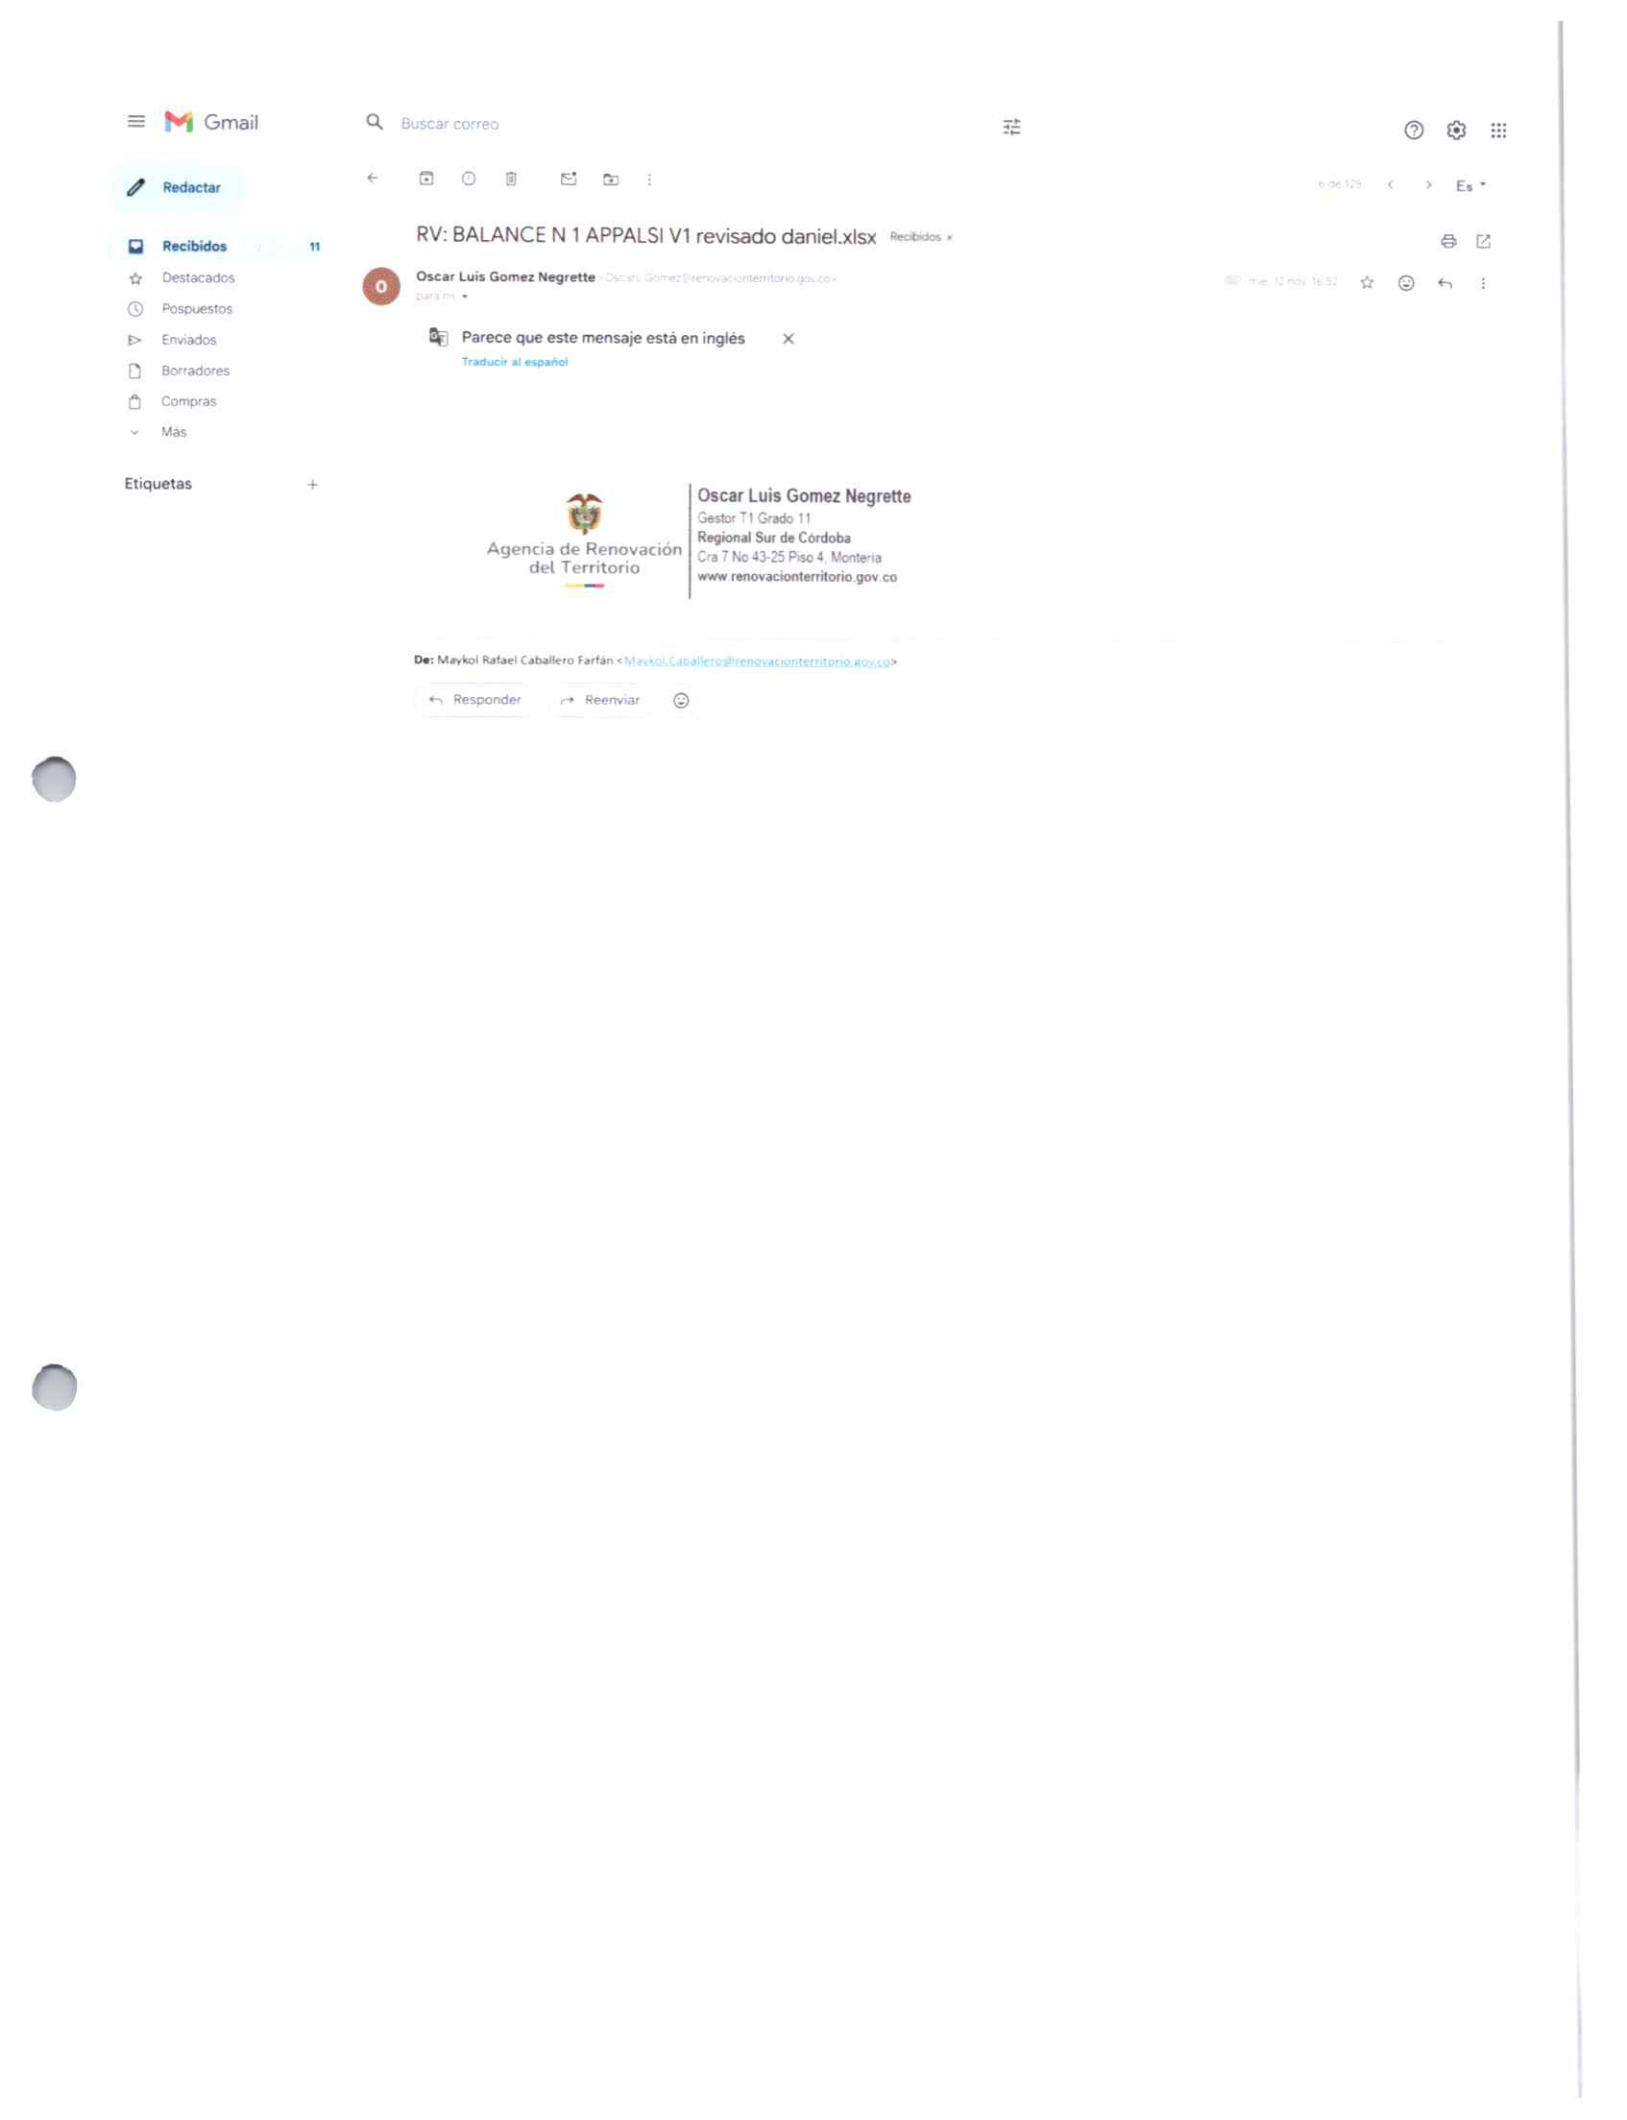
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 11
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
RV: BALANCE N 1 APPALSI V1 revisado daniel.xlsx
Recibidos
Oscar Luis Gomez Negrette
para mí
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Agencia de Renovación del Territorio
Oscar Luis Gomez Negrette
Gestor T1 Grado 11
Regional Sur de Córdoba
Cra 7 No 43-25 Piso 4, Monteria
www.renovacionterritorio.gov.co
De: Maykol Rafael Caballero Farfán
Responder
Reenviar

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 11

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

5 de 128

Es

Fw: estudio

Recibidos ×

Oscar Luis Gomez Negrette <Oscar.L.Gomez@renovacionterritorio.gov.co>
para mí

mié, 12 nov, 22:01

Obtener Outlook para iOS

De: Maykol Rafael Caballero Farfán <Maykol.Caballero@renovacionterritorio.gov.co>
Enviado: Wednesday, November 12, 2025 9:59:15 PM
Para: Oscar Luis Gomez Negrette <Oscar.L.Gomez@renovacionterritorio.gov.co>
Asunto: estudio

Gestor T1-16 · Líder DEEP

Maykol Rafael Caballero Farfan

maykol.caballero@

Responder Reenviar


Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 10
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
4 de 128
Es
POLIZAS SEGUN ACTA DE REINICIO
Recibidos ×
O
OBRAS PISCINGENIERIA
para mí
2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail
Añadirlo todo a Drive
53-44-101040494...
53-44-101040494...
Responder
Reenviar

PISCINGENIERIA HVS S.A.S.
Nit. 901.324.084 - 8

SAMC-MV-2025-0013

Montería, 17 de diciembre de 2025

Señores
RSE INGENIEROS S.A.S
KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ. – Representante Legal.

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÒN EN TIEMPO.
Respetados señores,

Por medio de la presente, y de manera respetuosa, nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia, con fundamento en consideraciones técnicas, administrativas y de programación de obra, las cuales se exponen a continuación:

Las actividades del proyecto fueron reiniciadas el día **02 de diciembre de 2025**, luego de haber permanecido suspendidas por causas ajenas a este contratista. Dicho reinicio se realizó una vez fue aprobado el Balance de Obra N.º 1 y previa adición al contrato en referencia, en el cual se incorporaron actividades no contempladas dentro del alcance inicial del contrato, derivadas de ajustes técnicos necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operación del proyecto.

Dentro de las actividades adicionales aprobadas, se destaca **la "Construcción de rampas de acceso a zona de frutas sucias y limpias"**, la cual constituye una actividad de ruta crítica, dado que condiciona el avance de actividades posteriores y la puesta en funcionamiento de áreas directamente relacionadas con el proceso operativo del proyecto. Conforme a la reprogramación actualizada del cronograma de obra, dicha actividad requiere un plazo aproximado de dieciocho (18) días calendario para su ejecución integral, incluyendo las labores constructivas, acabados y adecuaciones necesarias para su correcta operación.


En este sentido, la inclusión de esta actividad impacta de manera directa el camino crítico del cronograma contractual, afectando los tiempos inicialmente pactados. Por lo tanto, resulta

técnicamente procedente realizar un ajuste al plazo de ejecución, con el fin de asegurar la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad constructiva, evitando afectaciones al desempeño y funcionalidad final del proyecto.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual por un término de cuatro (4) días calendario, adicionales al plazo inicialmente establecido, de conformidad con la reprogramación presentada.

Agradecemos la atención brindada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional o aclaración técnica que se requiera.
Atentamente,

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
Representante Legal
Piscingenieria HVS S.A.S

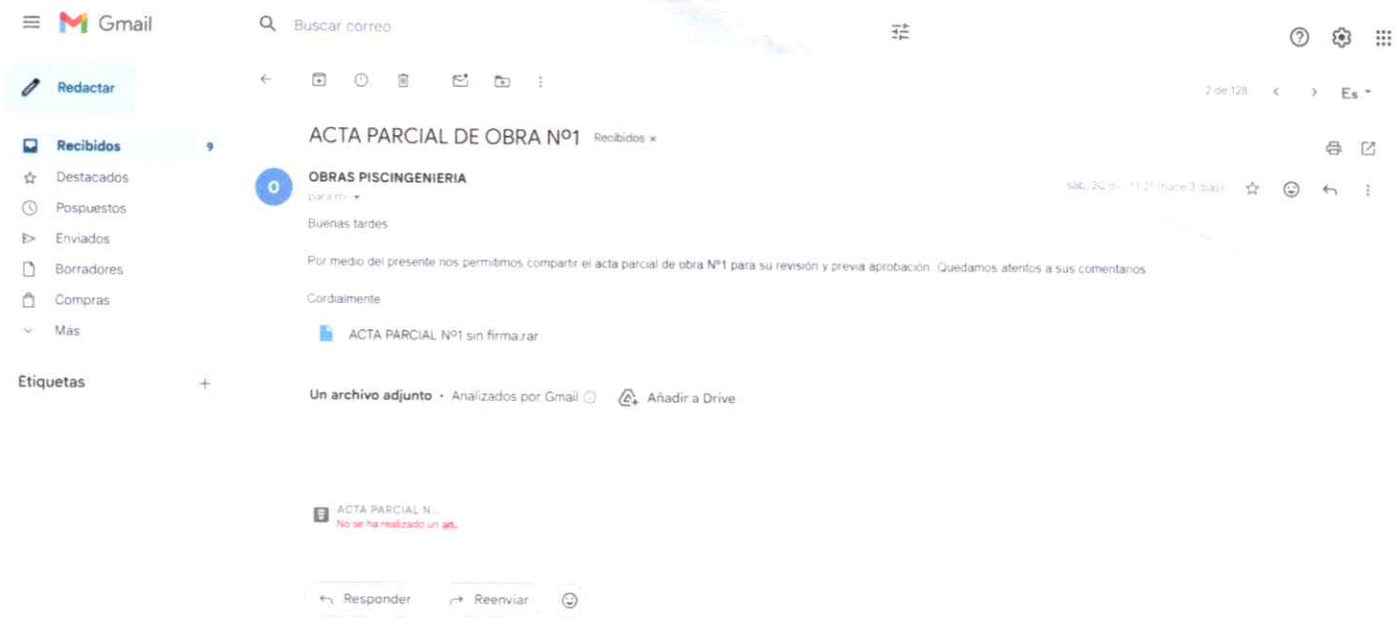
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 9
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
2 de 128
ACTA PARCIAL DE OBRA Nº1
Recibidos ×
OBRAS PISCINGENIERIA
Buenas tardes
Por medio del presente nos permitimos compartir el acta parcial de obra Nº1 para su revisión y previa aprobación. Quedamos atentos a sus comentarios
Cordialmente
ACTA PARCIAL Nº1 sin firma.rar
Un archivo adjunto · Analizados por Gmail
Añadir a Drive
ACTA PARCIAL N...
No se ha realizado un an...
Responder
Reenviar
