ACTA PARCIAL 02

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 02				
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO:	2025

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL		
CONTRATISTA:	RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TURPIAL 2025	
	NIT O CC:	901.950.635-0	
	DIRECCIÒN:	CLL 60A SUR # 73-72 Galicia	Bogotá
	E-MAIL.:	consorcioturpial2025@gmail.com	
	TELÉFONOS	315 340 7434 / 310 278 4324	
	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO	
	CC:	13.491.013 de Cúcuta	
OBJETO:	"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1. No. 4250 del 11/07/2025. 2. No. 4251 del 11/07/2025. 3. No. 9053 del 30/12/2025.		
CUENTA BANCARIA	No. 219 900 628 Tipo de Cuenta: Cuenta de Corriente Banco. Banco de Occidente		
VALOR INICIAL:	$ 1.853.552.197,39		
	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS.		
VALOR ADICIONAL	$ 926.637.147,66		
	NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS.		
VALOR TOTAL	$ 2.780.189.345,05		

ACTA PARCIAL 02

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 02				
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO:	2025

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL		
CONTRATISTA:	RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TURPIAL 2025	
	NIT O CC:	901.950.635-0	
	DIRECCIÒN:	CLL 60A SUR # 73-72 Galicia	Bogotá
	E-MAIL.:	consorcioturpial2025@gmail.com	
	TELÉFONOS	315 340 7434 / 310 278 4324	
	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO	
	CC:	13.491.013 de Cúcuta	
OBJETO:	"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1. No. 4250 del 11/07/2025. 2. No. 4251 del 11/07/2025. 3. No. 9053 del 30/12/2025.		
CUENTA BANCARIA	No. 219 900 628 Tipo de Cuenta: Cuenta de Corriente Banco. Banco de Occidente		
VALOR INICIAL:	$ 1.853.552.197,39		
	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS.		
VALOR ADICIONAL	$ 926.637.147,66		
	NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS.		
VALOR TOTAL	$ 2.780.189.345,05		

	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	TRES (03) MESES	
	Nº2	-	
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO:	10/09/2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	-
		REINICIO	-
	Nº2	SUSPENSIÒN	-
		REINICIO	-
FECHA DE TERMINACIÒN:	09 /04/ 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	04 /03/ 2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 05/12/2025 AL 03/02/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO**	
	EN CALIDAD DE:	R/L. CONSORCIO JAZ 2026 – Interventor	
	NOMBRE:	**ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO**	
	EN CALIDAD DE:	R/L/SUPLENTE. CONSORCIO TURPIAL 2025 – Contratista de obra	
	NOMBRE:	**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL - Gobernación del Huila	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio – Valor Inicial del Contrato	10/09/2025		$ 1.853.552.197,39	$ 1.853.552.197,39
2. Acta parcial No. 01	04/12/2025	$ 848,291,358.00		$ 1.005.260.839,39
3. Balance de Obra - Adicional No. 01	30/12/2025		$ 926,637,147.66	$ 1.931.897.987,05
4. Acta parcial No. 02	04/03/2026	$ 960,111,810,00		$ 971,786,177,05
TOTAL		**$ 1,808,403,168.00**	**$ 2,780,189,345.05**	**$ 971,786,177,05**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO TURPIAL 2025, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL. De todo el personal técnico y operativo planillas descritos a continuación:

PERSONAL ADMINISTRATIVO				
No	IDENTIFICACION	NOMBRE	CARGO	ESTADO
1	13491013	JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO
2	91530080	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO
4	1077870403	RICARDO OLIVEROS ZAMBRANO	PROFESIONAL SST	ACTIVO

PERSONAL OPERATIVO				
No	IDENTIFICACION	NOMBRE	CARGO	ESTADO
1	100641824	FABIO JAVER MENESES HERNANDEZ	MAESTRO DE OBRA	ACTIVO
2	17788201	LEONARDO FABIO MENESES CHILITO	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
3	1006511872	JANER STEEVEN DUCUARA RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
4	1007571742	LUIS FERNANDO VANEGAS CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO
5	1193540244	JACOBO TIQUE LOAIZA	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO

CONTADORA:	CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO. CC. 1.012.320.269 de Bogotá TP: 156650-T

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÒN)

1. El contrato de obra arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que se autorizó y realizó el pago del Acta Parcial No.01, con fecha del 04 de diciembre de 2025, por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 848,291,358,00).

3. Que se realizó un Balance de Obra con un adicional al contrato de obra por un valor de NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 926,637,147.66); y una prórroga al tiempo de ejecución de tres (03) meses.

4. Que el 02 de marzo de 2026, mediante oficio radicado No. 2026-0001152-1, La Contraloría realizó la Refrendación de las Reservas Presupuestales de la vigencia 2025 de la Secretaría General.

5. Que, en ejecución del contrato de obra, se autoriza el pago del Acta Parcial No.02 de fecha 04 de marzo de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de diciembre de 2025 al 03 de febrero de 2026 del presente año, por la suma neta a pagar por **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($960,111,810,00) M/CTE.**

6. Que las partes contractuales se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL HUILA

ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO
R/L/S. CONSORCIO TURPIAL 2025
Contratista de obra

ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R/L. CONSORCIO JAZ 2026
INTERVENTOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Ing. Eduar M. Gordo	Ing. Pedro Velasquez Trujillo	Ing. James Andrade Zambrano
Cargo	Residente de Obra - Contratista	Supervisor	Interventor



CONSORCIO TURPIAL 2025

NIT: 901950635-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 60 A SUR # 73 - 72, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111921

Tel. 6017768868

Email. contabilidad@imgcolombia.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764099666360 válida desde 2025-10-03 hasta 2027-10-03 rango desde FECT-1 hasta FECT-500.

FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE N. 219900628 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE CONSORCIO TURPIAL 2025 NIT: 901.950.635-0

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT: 800103913-4
Dirección: CRA 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION, Neiva, Huila, Colombia, CP 410002
Teléfono: 6871300
Email: hacienda.dian@huila.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FECT - 5
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:43:33
FECHA FIRMADO: 08/04/2026 11:43:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	04	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	010	CORTE N. 2 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 942 DE 2025 ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS D	94	1,00	$738.224.672,00				0,00	$738.224.672,00
2	011	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES - INSTALACIONES ELECTRICAS - VOZ Y DATOS	94	1,00	$352.719,00	IVA	19%	$67,017.00	0,00	$352.719,00
3	012	ADMINISTRACIÓN 20%	94	1,00	$147.644.934,00				0,00	$147.644.934,00
4	013	IMPREVISTOS 5%	94	1,00	$36.911.234,00				0,00	$36.911.234,00
5	014	UTILIDAD 5% UTILIDAD NO GRAVADA (ART 100Ley 21 de 1992)	94	1,00	$36.911.234,00				0,00	$36.911.234,00

Notas:

SON: (novecientos sesenta millones ciento once mil ochocientos diez pesos)
CUFE: e5a7b2118cf41685e66c2cead4ad8e52c112ceae3cec49c6eb3ff61491a4e0164f602a7dd7c5bf616d5b216ec8577e65

Subtotal:	$960.044.793,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$67.017,00
Total:	$960.111.810,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$352.719,00	19,00%	$67.017,00

CONFORMACION CONSORCIAL
INVERSIONES GUERFOR SAS NIT: 860.510.142-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 80%
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S NIT 900.500.905-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 20%

Firma Digital: Drs7INM75OEWsLyVCJB0XDPgMCpXgVDilMof/sbwuPrwLHZwk3jvFlHGthYQsozH
nqaliX5k40KO4rEbdkriZgx6RVe2wFBAOXps5pPoAl3fu1mbbh
bKszSNIeUED0pJ vjm2JiZAuO/RoCwowA5kmyot5P00dj0a7TAPR1oilMjvYZUC8fk9ug2JhwFXr7sn aWa7c3ko+1QQilaaDUjZVKEwrP+9qLRT3EW
OwTr4W4p/ppME3hfIoJFB6FlWe6LS CXkDlUtFL1QlNMTX3ryBKP05usMfeqCfhJdkaRQKUsteZKrX6POb8je3l0CC0oYX cEpy3Ofik6RHhO4vU6d8
8w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**	Version: 7 Página 1 de 1

TIPO DE INFORME:	Parcial: __X___	Final: _____	No.: 02		Fecha: (04/03/25)	
CONTRATO _x	DE: OBRA		Nº	942	AÑO:	2025
CONVENIO___						
CONTRATANTE:	**SECRETARIA GENERAL GOBERNACION DEL HUILA**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TURPIAL 2025				
	NIT:	901.950.635-0				
	DIRECCIÓN	Calle 60a Sur No. 73 -72	TEL:	(601) 7768868		
	CIUDAD:	Bogota D.C				
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR HERNANDO GUERRERO				
	CC:	79.324.622 DE Bogota D.C.				
OBJETO:	"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10/06/2025					

1. BALANCE JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	En cifras: $1.853.552.197.39		
	En Letras: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SITE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: $ 926.637.147,66	Fecha: 12/30/2026
	Nº 2	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL:	En cifras: $2.780.189.345.05		
	En Letras: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: TRES (03) MESES	Fecha: 12/30/2026
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO:	10/09/2025		

		Término	Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	9/01/2026		

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-100068303	**16/01/2026**	**Cumplimiento**	**$ 556.037.869,00**	30/12/2025	10/04/2026
		Prestaciones Sociales	**$ 278.018.934,54**	30/12/2025	10/04/2029
		Calidad de los Elementos	**$ 556.037.869,00**	30/12/2025	10/04/2027
		Estabilidad de la Obra	**$ 556.037.869,00**	10/04/2026	10/04/2031
NV-100013292	**16/01/2026**	**Responsabilidad Civil**	**$ 350.181.000,00**		
		Patronal	**$ 350.181.000,00**		
		Contratistas y Subcontratistas	**$ 350.181.000,00**		
		Vehiculos Própios y No Própios	**$ 350.181.000,00**		

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales en concordancia con la ejecución del Contrato de Obra, mediante certificación de Revisora Fiscal y aportación de Planillas de Pago de Seguridad Social anexas.

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Version: 7 Página 1 de 1

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**10/06/2025**		$	**$ 1.853.552.197,39**
VALOR ADICIONAL N°1	**30/12/2025**	**$ 926.637.147,66**	$	**$ 2.780.189.345,05**
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		$	$	**$ 2.780.189.345,05**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**4/12/2025**	**$ 848.291.358,00**		**$ 1.931.897.987,05**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	**4/03/2026**	**$ 960.111.810,00**	$	**$ 971.786.177,05**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$	$	$
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, el contratista viene cumpliendo con las obligaciones contractuales, y cumpliendo y recibiendo a satisfacción las sigientes actividades relacionadas:

. Secretaría de Salud (Pisos 1 y 2)
Baños y Archivos: Demoliciones de muros existentes para adecuación de espacios.

Laboratorio de Salud Pública y Zoonosis: Renovación de acabados con estuco, pintura (muros y cielos) e instalación de nuevos lavamanos institucionales.

Oficinas Administrativas (Aseguramiento, Contratación, Dirección): Aplicación de pintura general y acabados en muros.

Pasillos y Áreas Públicas: Demolición de placas en baños públicos y acabados de pintura en cielos y muros.

2. Centro Regulador de Urgencias (CRUE) y Salud Mental
Baños: Modernización mediante el suministro e instalación de lavamanos de sobreponer con su respectiva grifería y pintura de cielos rasos.

3. Nueva Sede de Atención al Contribuyente
Instalaciones Eléctricas: Cableado completo (red regulada y normal) y montaje de canaletas para redes de datos/energía.

Pisos: Suministro e instalación de cerámica de tráfico pesado en la oficina principal, zona de atención y baños.

4. Secretaría de Agricultura
Sistema Eléctrico: Instalación de ocho (8) circuitos alimentadores y actualización de protecciones (breakers) en el tablero de iluminación.

5. Áreas Externas (Parqueadero)
Baño: Mantenimiento de acabados con estuco y pintura en todas las superficies.

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Version: 7
		Página 1 de 1

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Conforme a la información relacionada y anexada, el Interventor certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 05/12/2025 y el 03/02/2026, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 04 de Marzo de 2025.

Ing. James Andrade Zambrano
Interventor
Consorcio JAZ 2026

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	**Nº:**	942	**AÑO**	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	**ACTA Nº.**	2	**HOJA**	1					**PLAZO INICIAL**	4 Meses	**ADICIONAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	**FECHA PRESENTE ACTA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					**PLAZO ADICIONAL**	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	**Nº** / **SUSPENSIÓN** / **REINICIO**	**OBJETO:**	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							**PLAZO TOTAL**	7 Meses	**V.R. TOTAL**
10/sep/2025	Nº 1 / Nº 2											$ 2.780.189.345,05

						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
	EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA												
1	**Preliminares**												
1.1	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	M2	120,00	$ 42.731	$ 5.127.720	126,00	$ 5.384.106	101,28	$ 4.327.860	16,95	$ 724.098	118,23	$ 5.051.958
1.2	Desmonte de puerta metalica o de madera, incluye el marco	UND	10,00	$ 21.117	$ 211.170	3,00	$ 63.351	3,00	$ 63.351	0,00	$ -	3,00	$ 63.351
2	**Pintura**												
2.1	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M2	120,00	$ 52.559	$ 6.307.080	1164,99	$ 61.230.709	89,09	$ 4.682.219	586,64	$ 30.833.212	675,73	$ 35.515.430
2.2	Pintura de puertas y marcos en madera	M2	15,00	$ 30.837	$ 462.555	6,39	$ 197.048	3,40	$ 104.846	0,00	$ -	3,40	$ 104.846
3	**Mamposteria**												
3.1	Meson en concreto con acabado en marmol	ML	8,00	$ 842.463	$ 6.739.704	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	**Pisos**												
4.1	Resane en granito pulido	ML	20,00	$ 59.368	$ 1.187.360	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**Hidrosanitarias**												
5.1	Punto hidrahulico PVC de 1/2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	UND	1,00	$ 95.286	$ 95.286	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	Punto sanitario PVC de 2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	UND	1,00	$ 176.307	$ 176.307	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.	**Aparatos**												
6.1	Suministro e instalación de sanitario con tanque tipo laguna o similar color blanco.	UND	10,00	$ 442.935	$ 4.429.350	13,00	$ 5.758.155	9,00	$ 3.986.415	0,00	$ -	9,00	$ 3.986.415
6.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye griferia	UND	8,00	$ 490.947	$ 3.927.576	13,00	$ 6.382.311	7,00	$ 3.436.629	1,00	$ 490.947	8,00	$ 3.927.576
6.3	Suministro e instalación de orinal mediano entrada superior	UND	6,00	$ 533.833	$ 3.202.998	5,00	$ 2.669.165	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	**Drywall**												
7.1	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	M2	190,00	$ 146.041	$ 27.747.790	108,28	$ 15.813.319	2,65	$ 386.424	0,00	$ -	2,65	$ 386.424
8	**Carpinteria**												
8.1	Suministro e instalacion de division modular en acero inoxidable tipo para baños.	M2	7,20	$ 1.161.353	$ 8.361.742	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable tipo para baños de 0,60x1,2	UND	6,00	$ 822.358	$ 4.934.148	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.3	Suministro e instalacion de espejos flotados para baños.	UND	8,00	$ 226.548	$ 1.812.384	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**Vidrios**												
9.1	Suministro e instalación de división piso - techo en vidrio templado esp.: 10 mm con película esmerilada H 2,40 aprox.	M2	65,40	$ 1.011.656	$ 66.162.302	65,40	$ 66.162.302	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	Suministro e instalación de puerta corrediza en vidrio templado de 1,7x2.2 m, con película de esmerilada; incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	UND	1,00	$ 2.708.656	$ 2.708.656	1,00	$ 2.708.656	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado esp.: 10mm, 2.40 ALTX.90 AN. con película esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios -manijas.	UND	5,00	$ 1.784.055	$ 8.920.275	5,00	$ 8.920.275	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.4	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.9x2.4 m Blanca	UND	1,00	$ 559.449	$ 559.449	1,00	$ 559.449	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.5	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.6x2.4 m	UND	2,00	$ 556.312	$ 1.112.624	2,00	$ 1.112.624	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.6	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 0.9x2.00 m con película esmerilada, incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	UND	6,00	$ 1.716.134	$ 10.296.804	6,00	$ 10.296.804	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.7	Suminstro e instalación de puerta corrediza, y hoja fija en vidrio templado, dimensión: 2.20Hx 2.20 ancho con pelicula esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios - manijas.	UND	1,00	$ 3.957.767	$ 3.957.767	1,00	$ 3.957.767	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 168.441.047,00		$ 191.216.041,00		$ 16.987.744		$ 32.048.257		$ 49.036.001
10	**Instalaciones eléctricas**												
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	27,00	$ 591.904	$ 15.981.408	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA) Y ETIQUETADO	UND	10,00	$ 278.913	$ 2.789.130	20,00	$ 5.578.260	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942		AÑO	2025					$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	2		HOJA	1				PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA		DIA	MES	AÑO				PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026					4	MARZO	2026				PLAZO TOTAL	7 Meses	V.R. TOTAL
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									$ 2.780.189.345,05
10/sep/2025	Nº 1													
	Nº 2													

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	519,00	$ 54.422	$ 28.245.018	1069,00	$ 58.177.118	0,00	$ -	868,85	$ 47.284.555	868,85	$ 47.284.555
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	UND	5,00	$ 349.267	$ 1.746.335	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE Y ETIQUETADO	UND	2,00	$ 379.747	$ 759.494	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	UND	5,00	$ 313.397	$ 1.566.985	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	UND	8,00	$ 83.683	$ 669.464	25,00	$ 2.092.075	0,00	$ -	8,00	$ 669.464	8,00	$ 669.464
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	60,00	$ 215.589	$ 12.935.340	109,70	$ 23.650.113	0,00	$ -	19,50	$ 4.203.986	19,50	$ 4.203.986
10.14	Suministro e instalación de detector de humo	UND	3,00	$ 435.502	$ 1.306.506	3,00	$ 1.306.506	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.15	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU	UND	8,00	$ 4.500.640	$ 36.005.120	8,00	$ 36.005.120	0,00	$ -	6,00	$ 27.003.840	6,00	$ 27.003.840
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED INTELIGENTE (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	UND	2,00	$ 189.037	$ 378.074	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	UND	31,00	$ 136.431	$ 4.229.361	60,00	$ 8.185.860	0,00	$ -	5,00	$ 682.155	5,00	$ 682.155
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA) Y ETIQUETADO	UND	34,00	$ 161.422	$ 5.488.348	50,00	$ 8.071.100	0,00	$ -	5,00	$ 807.110	5,00	$ 807.110
10.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO AA UNIDAD Y ETIQUETADO	UND	6,00	$ 204.200	$ 1.225.200	6,00	$ 1.225.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	102,00	$ 426.042	$ 43.456.284	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	16,00	$ 128.173	$ 2.050.768	20,00	$ 2.563.460	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 10 AWG AA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	93,00	$ 66.685	$ 6.201.705	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	ML	46,00	$ 82.655	$ 3.802.130	60,00	$ 4.959.300	0,00	$ -	60,00	$ 4.959.300	60,00	$ 4.959.300
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	223,00	$ 78.074	$ 17.410.502	720,00	$ 56.213.280	0,00	$ -	526,67	$ 41.119.234	526,67	$ 41.119.234
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 2" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	85,00	$ 139.461	$ 11.854.185	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	UND	4,00	$ 270.121	$ 1.080.484	4,00	$ 1.080.484	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	UND	2,00	$ 1.207.693	$ 2.415.386	2,00	$ 2.415.386	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x100 A DE ATORNILLAR	UND	2,00	$ 876.315	$ 1.752.630	2,00	$ 1.752.630	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 203.349.857,00		$ 213.275.892,00		$ -		$ 126.729.644		$ 126.729.644
11	Voz y datos												
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	UND	38,00	$ 610.305	$ 23.191.590	48,00	$ 29.294.640	0,00	$ -	5,00	$ 3.051.525	5,00	$ 3.051.525
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORIA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	ML	670,00	$ 38.795	$ 25.992.650	1125,00	$ 43.644.375	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 66MMx200MMx3000MM	ML	46,00	$ 56.760	$ 2.610.960	60,00	$ 3.405.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.6	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	UND	1,00	$ 13.241.124	$ 13.241.124	1,00	$ 13.241.124	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.7	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	UND	38,00	$ 120.567	$ 4.581.546	48,00	$ 5.787.216	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.8	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	UND	38,00	$ 92.087	$ 3.499.306	43,00	$ 3.959.741	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1									PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2											

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	UND	3,00	$ 2.430.900	$ 7.292.700		3,00	$ 7.292.700	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL VOZ Y DATOS EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 80.409.876,00			$ 106.625.396,00		$ -		$ 3.051.525		$ 3.051.525
	TOTAL OBRAS CIVILES - ELECTRICAS - VOZ Y DATOS - EDIFICACIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				**$ 452.200.780,00**			**$ 511.117.329,00**		**$ 16.987.744**		**$ 161.829.426**		**$ 178.817.170**
12	**MOBILIARIO EDIFICIO CENTRAL (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**													
12.1	Puesto de trabajo 1.50*1.50 M con cajonera metálica 2 X 1. Superficies en aglomerado de 25mm, color a elegir. Ver especificaciones técnicas.	UND.	7,00	$ 1.597.611	$ 11.183.277		7,00	$ 11.183.277	7,00	$ 11.183.277	0,00	$ -	7,00	$ 11.183.277
12.2	División modular mixta o vidrio con película esmerilada de H:1.30; 5 -7 cm de espesor; acabado en fórmica y vidrio de 5mm con película esmerilada.	M2	51,58	$ 786.357	$ 40.560.294		51,28	$ 40.324.387	48,60	$ 38.216.950	0,00	$ -	48,60	$ 38.216.950
12.3	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro bascualnte.	UND.	18,00	$ 497.957	$ 8.963.226		18,00	$ 8.963.226	18,00	$ 8.963.226	0,00	$ -	18,00	$ 8.963.226
12.4	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	UND.	50,00	$ 316.410	$ 15.820.500		50,00	$ 15.820.500	50,00	$ 15.820.500	0,00	$ -	50,00	$ 15.820.500
12.5	Mesa de juntas 2.40 x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	UND.	2,00	$ 3.319.712	$ 6.639.424		2,00	$ 6.639.424	2,00	$ 6.639.424	0,00	$ -	2,00	$ 6.639.424
12.6	Listones verticales 3D, en PVC.	M2	15,00	$ 160.327	$ 2.404.905		15,00	$ 2.404.905	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.7	Superficie de 1.65x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	UND.	7,00	$ 1.565.546	$ 10.958.822		7,00	$ 10.958.822	7,00	$ 10.958.822	0,00	$ -	7,00	$ 10.958.822
12.8	Superficie de 1.10x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	UND.	1,00	$ 1.461.805	$ 1.461.805		1,00	$ 1.461.805	1,00	$ 1.461.805	0,00	$ -	1,00	$ 1.461.805
12.9	Mesa juntas de 1.50 x.90. Superfice en aglomerado de 25 mm, enchapada; soportes metálicos.	UND.	1,00	$ 2.192.981	$ 2.192.981		1,00	$ 2.192.981	1,00	$ 2.192.981	0,00	$ -	1,00	$ 2.192.981
12.11	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	UND.	2,00	$ 3.640.366	$ 7.280.732		2,00	$ 7.280.732	2,00	$ 7.280.732	0,00	$ -	2,00	$ 7.280.732
12.12	Recepción tipo counter en U de 1.88+3.16+.98 aprox, entamborado. Incluye superficies de trabajo principal y lateral; archivadores metálicos 2x1 (2); reborde, aplique en PVC frontal. Según diseño- plano.	UND.	1,00	$ 6.686.107	$ 6.686.107		1,00	$ 6.686.107	1,00	$ 6.686.107	0,00	$ -	1,00	$ 6.686.107
12.13	Sofa de espera, dos puestos sin brazos, acabado tela vinilica o antifluido alto tráfico.	UND.	8,00	$ 2.809.306	$ 22.474.448		10,00	$ 28.093.060	10,00	$ 28.093.060	0,00	$ -	10,00	$ 28.093.060
12.14	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	M2	75,90	$ 129.676	$ 9.842.408		75,90	$ 9.842.408	68,80	$ 8.921.709	0,00	$ -	68,80	$ 8.921.709
12.15	Recepción tipo counter en U de .68+3.66+.68, H:.95m entamborado de 8cm; reborde de .08, aplique en PVC frontal; incluye superficies principales y lateral, archivador metálico 2x1 (2); incluye dos muebles posteriores, inferiores de almacenamiento en RH, con puertas. Según diseño.	UND.	1,00	$ 10.477.841	$ 10.477.841		1,00	$ 10.477.841	1,00	$ 10.477.841	0,00	$ -	1,00	$ 10.477.841
12.16	Recepción tipo counter 1.50+.60,H:.95m;entamborado de 8cm; reborde .08, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	UND.	1,00	$ 2.810.438	$ 2.810.438		1,00	$ 2.810.438	1,00	$ 2.810.438	0,00	$ -	1,00	$ 2.810.438
12.17	Puesto de trabajo recto de 1.20 X.60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	UND.	1,00	$ 1.033.260	$ 1.033.260		1,00	$ 1.033.260	1,00	$ 1.033.260	0,00	$ -	1,00	$ 1.033.260
12.18	Mesa de reuniones 1.20x.90m, superficie de 25mm, enchapada en HPL; soportes metálicos con niveladores.	UND.	1,00	$ 2.018.234	$ 2.018.234		1,00	$ 2.018.234	1,00	$ 2.018.234	0,00	$ -	1,00	$ 2.018.234
12.19	MÓDULO SENCILLO 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho - fijo. Metálico, con manija. Ver especificaciones técnicas.	UND.	2,00	$ 1.133.370	$ 2.266.740		2,00	$ 2.266.740	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.20	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Movil doble servicio- metálico con manija.	UND.	1,00	$ 1.789.532	$ 1.789.532		1,00	$ 1.789.532	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.21	PUERTA METÁLICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. de ancho, con chapa.	UND.	1,00	$ 462.581	$ 462.581		1,00	$ 462.581	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025						$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				4	MARZO	2026					PLAZO TOTAL	7 Meses	V.R. TOTAL
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									$ 2.780.189.345,05
10/sep/2025	Nº 1													
	Nº 2													

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
12.22	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	UND.	2,00	$ 196.900	$ 393.800	2,00	$ 393.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.23	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	UND.	5,00	$ 3.464.949	$ 17.324.745	5,00	$ 17.324.745	5,00	$ 17.324.745	0,00	$ -	5,00	$ 17.324.745
12.24	Poltrona, estructura interna en madera, base - patas a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	UND.	5,00	$ 2.049.922	$ 10.249.610	5,00	$ 10.249.610	5,00	$ 10.249.610	0,00	$ -	5,00	$ 10.249.610
12.25	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	UND.	4,00	$ 724.112	$ 2.896.448	4,00	$ 2.896.448	4,00	$ 2.896.448	0,00	$ -	4,00	$ 2.896.448
12.26	Refacción de mesa de juntas 3.60x1.50-1.20; retiro de pintura existente, terminado en laca poliuretano.	UND.	1,00	$ 1.754.166	$ 1.754.166	1,00	$ 1.754.166	1,00	$ 1.754.166	0,00	$ -	1,00	$ 1.754.166
12.27	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, mecanismo sincro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	UND.	1,00	$ 829.928	$ 829.928	1,00	$ 829.928	1,00	$ 829.928	0,00	$ -	1,00	$ 829.928
12.28	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Faldero en fórmica.	UND.	4,00	$ 3.409.967	$ 13.639.868	4,00	$ 13.639.868	4,00	$ 13.639.868	0,00	$ -	4,00	$ 13.639.868
12.29	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	UND.	4,00	$ 2.056.147	$ 8.224.588	4,00	$ 8.224.588	4,00	$ 8.224.588	0,00	$ -	4,00	$ 8.224.588
12.30	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, mecanismo sicro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	UND.	4,00	$ 829.928	$ 3.319.712	4,00	$ 3.319.712	4,00	$ 3.319.712	0,00	$ -	4,00	$ 3.319.712
12.31	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	UND.	8,00	$ 555.014	$ 4.440.112	8,00	$ 4.440.112	8,00	$ 4.440.112	0,00	$ -	8,00	$ 4.440.112
12.32	Mueble de almacenamiento 1.15ANx 2.30 Hx.40, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	UND.	1,00	$ 2.546.370	$ 2.546.370	1,00	$ 2.546.370	1,00	$ 2.546.370	0,00	$ -	1,00	$ 2.546.370
12.33	Mueble de almacenamiento 2.80ANx 2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	UND.	1,00	$ 4.621.190	$ 4.621.190	1,00	$ 4.621.190	1,00	$ 4.621.190	0,00	$ -	1,00	$ 4.621.190
12.34	Mueble sala espera sobre area de 3.60ANx2.30Hx.40F. Almacenamiento bajo, torres laterales, con luz led. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	UND.	1,00	$ 4.243.950	$ 4.243.950	1,00	$ 4.243.950	1,00	$ 4.243.950			1,00	$ 4.243.950
12.35	Mueble botellón .45ANx 2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puerta. Según diseño.	UND.	1,00	$ 1.603.270	$ 1.603.270	1,00	$ 1.603.270	1,00	$ 1.603.270			1,00	$ 1.603.270
12.36	Mueble para esculturas.45x2.30Hx.35-40F; torres laterales, con luz led y listones decorativos. Elaborado en RH, entrepaños reforzados y cajon. Según diseño.	UND.	2,00	$ 2.169.130	$ 4.338.260	2,00	$ 4.338.260	2,00	$ 4.338.260	0,00	$ -	2,00	$ 4.338.260
12.37	Mueble para nevera 1.05ANX.85Hx.60F. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	UND.	1,00	$ 1.603.270	$ 1.603.270	1,00	$ 1.603.270	1,00	$ 1.603.270			1,00	$ 1.603.270
12.38	Película de seguridad de 4 micras, para vidrio de ventanas (ofic. Piso 2 y piso 7).	M2	42,00	$ 84.879	$ 3.564.918	42,00	$ 3.564.918	39,40	$ 3.344.233			39,40	$ 3.344.233
12.39	Persiana enrollable sheer en screen, con cenefa. (juntas y ofic. Piso 2)	M2	14,80	$ 207.482	$ 3.070.734	14,80	$ 3.070.734	11,70	$ 2.427.539	0,00	$ -	11,70	$ 2.427.539
12.40	Panel japones en screen cristal, con cenefa. (piso 7 sala - comedor)	M3	33,00	$ 179.189	$ 5.913.237	33,00	$ 5.913.237	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.41	Película esmerilada sobre vidrio.	M2	10,00	$ 56.586	$ 565.860	10,00	$ 565.860	7,50	$ 424.395	0,00	$ -	7,50	$ 424.395
12.42	Acarreo de mobiliario existente	M2	200,00	$ 7.384	$ 1.476.800	200,00	$ 1.476.800	200,00	$ 1.476.800	0,00	$ -	200,00	$ 1.476.800
	SUBTOTAL MOBILIARIO EDIFICIO CENTRAL				**$ 263.948.391,00**		**$ 269.331.096,00**		**$ 252.066.820**		**$ -**		**$ 252.066.820**
	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO												
13	**Preliminares**												
13.1	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	M2	25,00	$ 42.731	$ 1.068.275	18,14	$ 775.140	18,48	$ 789.669	0,00	$ -	18,48	$ 789.669
13.2	Cargue y retiro de material de escombros.	M3	12,00	$ 77.240	$ 926.880	14,00	$ 1.081.360	14,00	$ 1.081.360	0,00	$ -	14,00	$ 1.081.360
13.3	Resane muros divisorios	M2	10,00	$ 86.926	$ 869.260	10,44	$ 907.507	10,44	$ 907.507	0,00	$ -	10,44	$ 907.507
13.4	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	M2	40,00	$ 131.878	$ 5.275.120	36,14	$ 4.766.071	23,41	$ 3.086.934	5,00	$ 659.390	28,41	$ 3.746.324
13.5	Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.	M2	250,00	$ 28.826	$ 7.206.500	2805,01	$ 80.857.218	1699,28	$ 48.983.366	412,21	$ 11.882.233	2111,48	$ 60.865.598

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1									PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2											

						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
13.6	Suministro e instalación de cielo raso con placas de fibra mineral 60x60 de 14mm	M2	380,00	$ 104.213	$ 39.600.940	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.7	Muro doble cara en drywall divisiones oficinas	M2	75,00	$ 146.041	$ 10.953.075	79,25	$ 11.573.749	79,25	$ 11.574.187	0,00	$ -	79,25	$ 11.574.187
13.8	Suministro e instalación hojas puertas en triplex,de 1 x 2,50 M. incluyen cerradura.	UND	6,00	$ 514.929	$ 3.089.574	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 68.989.624		$ 99.961.045		$ 66.423.023		$ 12.541.623		$ 78.964.645
14	**Instalaciones eléctricas**												
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	UND	38,00	$ 136.431	$ 5.184.378	42,00	$ 5.730.102	42,00	$ 5.730.102	0,00	$ -	42,00	$ 5.730.102
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA)	UND	42,00	$ 161.422	$ 6.779.724	42,00	$ 6.779.724	42,00	$ 6.779.724	1,00	$ 161.422	43,00	$ 6.941.146
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V TRIFILAR Y ETIQUETADO	UND	1,00	$ 204.200	$ 204.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	41,00	$ 591.904	$ 24.268.064	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMETICA DE 36 W (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	3,00	$ 224.039	$ 672.117	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	9,00	$ 278.913	$ 2.510.217	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3F#4/0+1N#4/0+1T#2 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	135,00	$ 659.551	$ 89.039.385	114,00	$ 75.188.814	114,00	$ 75.188.814	0,00	$ -	114,00	$ 75.188.814
14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	3,00	$ 426.042	$ 1.278.126	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	10,00	$ 128.173	$ 1.281.730	10,00	$ 1.281.730	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN CABLE # 10 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	19,00	$ 66.685	$ 1.267.015	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	920,00	$ 54.422	$ 50.068.240	515,00	$ 28.027.330	240,00	$ 13.061.280	325,72	$ 17.726.334	565,72	$ 30.787.614
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	ML	87,00	$ 82.655	$ 7.190.985	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	241,00	$ 78.074	$ 18.815.834	38,96	$ 3.041.763	38,96	$ 3.041.763	0,00	$ -	38,96	$ 3.041.763
14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	130,00	$ 230.024	$ 29.903.120	67,00	$ 15.411.608	67,00	$ 15.411.608	5,00	$ 1.150.120	72,00	$ 16.561.728
14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	UND	5,00	$ 270.121	$ 1.350.605	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 810.363	3,00	$ 810.363
14.16	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 300A	UND	1,00	$ 6.462.619	$ 6.462.619	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	UND	2,00	$ 1.207.693	$ 2.415.386	2,00	$ 2.415.386	2,00	$ 2.415.386	0,00	$ -	2,00	$ 2.415.386
14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CTOS Y ETIQUETADO	UND	1,00	$ 1.918.791	$ 1.918.791	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Y ETIQUETADO	UND	3,00	$ 132.837	$ 398.511	14,00	$ 1.859.718	4,00	$ 531.348	8,00	$ 1.062.696	12,00	$ 1.594.044
14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	UND	2,00	$ 349.312	$ 698.624	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	UND	6,00	$ 313.397	$ 1.880.382	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x40 A DE ATORNILLAR	UND	2,00	$ 498.982	$ 997.964	1,00	$ 498.982	1,00	$ 498.982	0,00	$ -	1,00	$ 498.982
14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x250 A DE ATORNILLAR	UND	1,00	$ 1.655.664	$ 1.655.664	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1									PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2											

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x150 A DE ATORNILLAR	UND	1,00	$ 1.021.955	$ 1.021.955		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X20 A	UND	1,00	$ 158.225	$ 158.225		6,00	$ 949.350	3,00	$ 474.675	0,00	$ -	3,00	$ 474.675
14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	UND	31,00	$ 83.683	$ 2.594.173		46,00	$ 3.849.418	23,00	$ 1.924.709	0,00	$ -	23,00	$ 1.924.709
14.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	105,00	$ 215.589	$ 22.636.845		84,00	$ 18.109.476	84,00	$ 18.109.476	0,00	$ -	84,00	$ 18.109.476
14.28	Aire acondicionado mini split Inverter 24.000BTU/220V	UND	7,00	$ 5.910.574	$ 41.374.018		7,00	$ 41.374.018	0,00	$ -	8,00	$ 47.284.592	8,00	$ 47.284.592
14.29	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU/220V	UND	3,00	$ 4.439.338	$ 13.318.014		3,00	$ 13.318.014	0,00	$ -	2,00	$ 8.878.676	2,00	$ 8.878.676
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 337.344.911			$ 217.835.433		$ 143.167.867		$ 77.074.203		$ 220.242.070
15	Voz y datos													
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 6,6MMx300MMx3000MM	ML	77,00	$ 137.952	$ 10.622.304		30,00	$ 4.138.560	30,00	$ 4.138.560	6,00	$ 827.712	36,00	$ 4.966.272
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20 KVA	UND	1,00	$ 61.217.912	$ 61.217.912		1,00	$ 61.217.912	0,00	$ -	2,00	$ 122.435.824	2,00	$ 122.435.824
15.3	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	UND	42,00	$ 92.087	$ 3.867.654		44,00	$ 4.051.828	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.4	SWITCH SW L3 LITE 24 1G 4 SFP POE+	UND	4,00	$ 14.720.516	$ 58.882.064		4,00	$ 58.882.064	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	ML	940,00	$ 38.795	$ 36.467.300		1627,60	$ 63.142.742	1627,60	$ 63.142.742	0,00	$ -	1627,60	$ 63.142.742
15.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO	UND	1,00	$ 12.461.272	$ 12.461.272		1,00	$ 12.461.272	1,00	$ 12.461.272	0,00	$ -	1,00	$ 12.461.272
15.7	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	UND	1,00	$ 13.241.124	$ 13.241.124		1,00	$ 13.241.124	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	UND	4,00	$ 2.430.900	$ 9.723.600		4,00	$ 9.723.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	UND	42,00	$ 610.305	$ 25.632.810		92,00	$ 56.148.060	44,00	$ 26.853.420	0,00	$ -	44,00	$ 26.853.420
15.10	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	UND	42,00	$ 120.567	$ 5.063.814		44,00	$ 5.304.948	44,00	$ 5.304.948	0,00	$ -	44,00	$ 5.304.948
15.11	HERRAJE TERA 24P NEGRO ZMAX ANGULAR	UND	4,00	$ 1.087.908	$ 4.351.632		4,00	$ 4.351.632	2,00	$ 2.175.816	0,00	$ -	2,00	$ 2.175.816
	SUBTOTAL INSTALACIONES VOZ Y DATOS				$ 241.531.486			$ 292.663.742		$ 114.076.758		$ 123.263.536		$ 237.340.294
16	Aseo													
16.1	Aseo y limpieza general de obra	M2	380,00	$ 3.433	$ 1.304.540		1219,13	$ 4.185.273	1219,13	$ 4.185.280	777,96	$ 2.670.751	1997,10	$ 6.856.031
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA				$ 1.304.540			$ 4.185.273		$ 4.185.280		$ 2.670.751		$ 6.856.031
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES - ELECTRICAS - VOZ Y DATOS RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO				**$ 649.170.561**			**$ 614.645.493**		**$ 327.852.928**		**$ 215.550.113**		**$ 543.403.040**
17	MOBILIARIO (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)													
17.1	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Falda.	UND.	1,00	$ 3.409.967	$ 3.409.967		1,00	$ 3.409.967	1,00	$ 3.409.967	0,00	$ -	1,00	$ 3.409.967
17.2	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	UND.	1,00	$ 2.056.147	$ 2.056.147		1,00	$ 2.056.147	1,00	$ 2.056.147	0,00	$ -	1,00	$ 2.056.147
17.3	MESA DE JUNTAS de 1.80M Ancho x 1.20M. Superficie en vidrio templado de 15mm; estructura, soportes y ducto verticales, canaleta horizontal conexión superior metálicos.	UND.	1,00	$ 4.091.545	$ 4.091.545		1,00	$ 4.091.545	1,00	$ 4.091.545	0,00	$ -	1,00	$ 4.091.545
17.4	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, con rodachinas. Brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	UND.	1,00	$ 829.928	$ 829.928		1,00	$ 829.928	1,00	$ 829.928	0,00	$ -	1,00	$ 829.928
17.5	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	UND.	8,00	$ 555.014	$ 4.440.112		8,00	$ 4.440.112	8,00	$ 4.440.112	0,00	$ -	8,00	$ 4.440.112
17.6	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y acabado en tela anti fluidos.	UND.	1,00	$ 3.464.949	$ 3.464.949		1,00	$ 3.464.949	1,00	$ 3.464.949	0,00	$ -	1,00	$ 3.464.949
17.7	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	UND.	1,00	$ 724.112	$ 724.112		1,00	$ 724.112	1,00	$ 724.112	0,00	$ -	1,00	$ 724.112
17.8	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	UND.	1,00	$ 3.640.366	$ 3.640.366		1,00	$ 3.640.366	1,00	$ 3.640.366	0,00	$ -	1,00	$ 3.640.366
17.9	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	UND.	1,00	$ 497.957	$ 497.957		1,00	$ 497.957	1,00	$ 497.957	0,00	$ -	1,00	$ 497.957
	PUESTOS DE TRABAJO													

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1									PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2											

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
17.10	Puesto de trabajo recto de 1.20 X.60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	UND.	28,00	$ 1.033.260	$ 28.931.280		28,00	$ 28.931.280	28,00	$ 28.931.280	0,00	$ -	28,00	$ 28.931.280
17.11	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	UND.	28,00	$ 497.957	$ 13.942.796		28,00	$ 13.942.796	28,00	$ 13.942.796	0,00	$ -	28,00	$ 13.942.796
17.12	Mesa de juntas 2.00M x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes, tapa pasacables, ducto vertical y canaleta horizontal metálicos.	UND.	1,00	$ 2.535.534	$ 2.535.534		1,00	$ 2.535.534	1,00	$ 2.535.534	0,00	$ -	1,00	$ 2.535.534
17.13	Mesa de juntas 1.50M x .90M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	UND.	1,00	$ 2.192.981	$ 2.192.981		1,00	$ 2.192.981	1,00	$ 2.192.981	0,00	$ -	1,00	$ 2.192.981
17.14	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	UND.	10,00	$ 316.410	$ 3.164.100		10,00	$ 3.164.100	10,00	$ 3.164.100	0,00	$ -	10,00	$ 3.164.100
	ARCHIVO RODANTE Y DIVISIONES													
17.15	MÓDULO SENCILLO ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho. Metálico - fijo, con manija. Ver especificaciones técnicas.	UND.	4,00	$ 1.133.370	$ 4.533.480		4,00	$ 4.533.480	4,00	$ 4.533.480	0,00	$ -	4,00	$ 4.533.480
17.16	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Metálico con manija. Ver especificaiones técnicas.	UND.	2,00	$ 1.789.532	$ 3.579.064		2,00	$ 3.579.064	2,00	$ 3.579.064	0,00	$ -	2,00	$ 3.579.064
17.17	PUERTA METALICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. Ancho PARA ARCHIVO RODANTE	UND.	1,00	$ 462.581	$ 462.581		1,00	$ 462.581	1,00	$ 462.581	0,00	$ -	1,00	$ 462.581
17.18	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	UND.	4,00	$ 196.900	$ 787.600		4,00	$ 787.600	4,00	$ 787.600	0,00	$ -	4,00	$ 787.600
17.19	Marco puerta metálico y puerta marco en aluminio y vidrio laminado 4 + 4 con película esmerilada. Incluye chapa y herrajes necesarios.	UND.	2,00	$ 1.485.571	$ 2.971.142		2,00	$ 2.971.142	2,00	$ 2.971.142			2,00	$ 2.971.142
17.20	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	M2	96,00	$ 129.676	$ 12.448.896		96,00	$ 12.448.896	80,00	$ 10.374.080	0,00	$ -	80,00	$ 10.374.080
17.21	Listones verticales 3D, en PVC.	M2	2,20	$ 160.327	$ 352.719		2,20	$ 352.719	0,00	$ -	2,20	$ 352.719	2,20	$ 352.719
	SUBTOTAL MOBILIARIO DESARROLLO ECONOMICO - RECINTO FERIAL				**$ 99.057.256**			**$ 99.057.256**		**$ 96.629.721**		**$ 352.719**		**$ 96.982.440**
	ADECUACIONES EN EL EDFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA													
18	**Preliminares**													
18.1	Cargue y retiro de material de escombros.	M3	24,00	$ 77.240	$ 1.853.760		55,00	$ 4.248.200	55,00	$ 4.248.200	58,45	$ 4.514.678	113,45	$ 8.762.878
18.2	Revisión sifones y bajantes en todas las placas y cañuelas, destape y puesta en funciona -miento con suministro e instalación de rejillas especiales.	UND	38,00	$ 79.692	$ 3.028.296		38,00	$ 3.028.296	6,00	$ 478.152	0,00	$ -	6,00	$ 478.152
18.3	Desmonte cielorasos en Dry wall, y en fibra mineral afectados por filtraciones, y acomodación.	M2	120,00	$ 13.470	$ 1.616.400		350,73	$ 4.724.333	338,20	$ 4.555.608	336,64	$ 4.534.581	674,85	$ 9.090.189
18.4	Demolición piso tablón de gress en áreas de sala de espera exterior edificio principal	M2	250,00	$ 22.682	$ 5.670.500		75,33	$ 1.708.635	75,33	$ 1.708.522	0,00	$ -	75,33	$ 1.708.522
18.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2" PVC ALTA PRESION SOTANO	ML	60,00	$ 55.171	$ 3.310.260		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.6	ADECUACION TUBERIA DESAGUES AIRES ACONDICIONADOS FACHADA EDF CENTRAL 3/4	ML	650,00	$ 30.651	$ 19.923.150		650,00	$ 19.923.150	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.7	Retiro cubierta existente exterior sobre la calle 9	M2	95,00	$ 13.241	$ 1.257.895		51,24	$ 678.469	51,24	$ 678.469	0,00	$ -	51,24	$ 678.469
19	**Impermeabilizaciones**													
19.1	**Muros y Pisos**													
19.1.1	Impermeabilizado sobre muro.	M2	280,00	$ 34.160	$ 9.564.800		151,22	$ 5.165.675	151,22	$ 5.165.594	0,00	$ -	151,22	$ 5.165.594
19.1.2	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M2	280,00	$ 52.559	$ 14.716.520		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.1.3	Afinado de nivelacion e Impermeabilizacion placa terraza 3 piso. (Oficinas desarrollo económico)	M2	180,00	$ 153.254	$ 27.585.720		36,00	$ 5.517.144	36,00	$ 5.517.144	0,00	$ -	36,00	$ 5.517.144
19.2	**Placas**													
19.2.1	Mantenimiento manto edil, impermeabilizacion placa cubierta	M2	180,00	$ 46.589	$ 8.386.020		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.2.2	Impermeabilizacion placas terrazas, poliuretano SIKA- LASTICK 612 o Similar, luego de aplicar una mano de SIKA-PAVIMENT o similar, SIKA ROD, para dilataciones o similar, ampliando estas, y una capa de SIKA FELT 30 TPP, o sim.	M2	90,00	$ 202.295	$ 18.206.550		186,10	$ 37.647.100	186,10	$ 37.647.100	0,00	$ -	186,10	$ 37.647.100

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025						$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1											PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2													

						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
19.3.1	**Cubiertas**														
19.3.1.1	Suministro e instalación cubierta en teja Termoacústica Ecoroof cal 36 UPVC 2mm. Blanca Incluye tornillos de anclaje, tornillos de ala y demás accesorios (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	M2	350,00	$ 220.685	$ 77.239.750	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.3.1.2	Canal en lámina cal.22 (Dimensiones similares a existente en cubierta segundo piso), con un ancho de 0,40 m. y altura o profundidad de 0,25 m. soportada con pie de amigos en ángulo.	ML	85,00	$ 180.747	$ 15.363.495	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.3.1.3	Bajantes aguas lluvias hasta piso 1., similares a existentes, en tubo aguas lluvias PVC de 6"	ML	80,00	$ 174.257	$ 13.940.560	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.3.1.4	Muros exteriores en superboard Segundo piso cubierta oficinas atención al público y pasaportes	M2	150,00	$ 180.443	$ 27.066.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.3.1.5	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	M2	120,00	$ 146.041	$ 17.524.920	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.3.2	**Cielorasos**														
	Arreglo Cielorasos en láminas fibra mineral														
19.3.2.2	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	M2	250,00	$ 131.878	$ 32.969.500	0,00	$ -	0,00	$ -	37,70	$ 4.971.141	37,70	$ 4.971.141		
20	**Varios**														
20.1	Enchape pared	M2	150,00	$ 71.110	$ 10.666.500	400,83	$ 28.503.021	400,83	$ 28.503.014	-19,39	-$ 1.378.823	381,44	$ 27.124.191		
	SUBTOTAL ADECUACIONES OBRAS CIVILES EN EL EDFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				**$ 309.891.046**		**$ 111.144.023**		**$ 88.501.803**		**$ 12.641.577**				**$ 101.143.380**
NP	**ITEMS NUEVOS (NO PREVISTOS -NP-)**														
	Preliminares														
NP.01	LIMPIEZA MECANICA Y DESCONTAMINACIÓN CON ÁCIDO MURIATICO SOBRE ACABADO PIEDRA BOGOTANA O SIMILAR. EDIFICIO CENTRA - PASILLO TERCER PISO EDIFICIO CENTRAL.	M2		$ 49.357		18,90	$ 932.847	0,00		18,90	$ 932.625	18,90	$ 932.625		
NP.02	ACOMETIDA GENERAL DESDE CAJILLA DOMICILIARIA A LA ACOMETIDA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, EXCAVACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" Y 8" EN PVC (L=6,20 MTS), TAPADA CON MATERIAL DE RECEBO, CAPA DE BASE 0,20 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO E=0,20 MTS DE 3000 PSI; Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) - SECRETARIA DE SALUD.	UND		$ 7.950.000		1,00	$ 7.950.000	0,00		1,00	$ 7.950.000	1,00	$ 7.950.000		
NP.03	MEJORAMIENTO DE CAJILLAS DE LA ACOMETIDA INTERIOR EXISTENTE QUE CORRESPONDEN SUS DIMENSIONES DE 0,80 A 1,10 MTS; INCLUYE: RESANES, PAÑETES EN SU INTERIOR, MEJORAMIENTO DE CAÑUELAS Y CONSTRUCCION DE TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO Y REFORZADAS CON ACERO CADA 0,10 MTS EN VARILLA DE 1/2" EN CONCRETO DE 3000 PSI, REVISION Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA EXISTENTE ENTRE CAJILLAS; Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO . SECRETARIA DE SALUD.	UND		$ 1.350.000		9,00	$ 12.150.000	0,00		9,00	$ 12.150.000	9,00	$ 12.150.000		
NP.04	ADECUACIONES DE BAÑOS PRIMER PISO INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONSTRUCCION CAJILLAS, CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLACA EN CONCRETO, PINTURA; JUEGO DE INCRUSTACIONES, ARBOL; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SECRETARIA DE SALUD.	UND		$ 1.050.000		12,00	$ 12.600.000	0,00		12,00	$ 12.600.000	12,00	$ 12.600.000		
NP.05	ADECUACIONES DE BAÑOS; INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS, MANGUERAS; ARBOL. INCRUSTACIOONES; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 485.000		16,00	$ 7.760.000	0,00		17,00	$ 8.245.000	17,00	$ 8.245.000		
NP.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 1.150.000		2,00	$ 2.300.000	0,00		2,00	$ 2.300.000	2,00	$ 2.300.000		
NP.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 750.000		2,00	$ 1.500.000	0,00		2,00	$ 1.500.000	2,00	$ 1.500.000		
	Pintura														

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025						$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1											PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2													

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS ACCESO BAÑOS SECRETARIA DE SALUD; INCLUYE MANTENIMIENTO Y/O ARREGLOS DE CHAPAS.	UND		$ 65.862		28,00	$ 1.844.136	0,00		18,00	$ 1.185.516	18,00	$ 1.185.516
	Mampostería												
NP.09	MESÓN FLOTADO AUTOSOPORTADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CON ACABADO EN QUARZO GRIS. INCLUYE CONFORMACIÓN DE POCETAS DE LAVAMANOS. EDIFICIO CENTRAL.	ML		$ 1.644.500		44,40	$ 73.015.800	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	Pisos												
NP.10	PLACA DE PISO EN CONCRETO SIMPLE 21MPa E=10CM. INCLUYE CORTES Y DILATACIÓNES - EDI. CENTRAL- SECRETARIA SALUD	M2		$ 143.197		67,42	$ 9.654.342	0,00		47,42	$ 6.790.402	47,42	$ 6.790.402
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLÓN EN GRES EXTERIOR EDIF. PRINCIPAL	M2		$ 97.810		26,22	$ 2.564.578	0,00		26,22	$ 2.564.578	26,22	$ 2.564.578
NP.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC - RECINTO FERIAL	ML		$ 26.028		70,00	$ 1.821.925	0,00		70,00	$ 1.821.925	70,00	$ 1.821.925
	Hidrosanitarias												
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS (EDIFICIO CENTRAL)	ML		$ 38.397		12,00	$ 460.764	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 74.294		40,40	$ 3.001.478	0,00		46,36	$ 3.444.270	46,36	$ 3.444.270
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 3". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 67.098		12,00	$ 805.176	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 75.280		12,00	$ 903.360	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 50.124		44,00	$ 2.205.460	0,00		6,00	$ 300.745	6,00	$ 300.745
NP.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 1" - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 37.050		74,00	$ 2.741.700	0,00		45,00	$ 1.667.250	45,00	$ 1.667.250
NP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 3/4" - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 30.485		24,00	$ 731.640	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 1/2" - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 24.180		60,00	$ 1.450.800	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.21	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" AGUA FRÍA	UND		$ 46.635		2,00	$ 93.270	0,00		2,00	$ 93.270	2,00	$ 93.270
NP.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO -LLAVE DE PASO- VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE. 1-1/2" - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 251.160		5,00	$ 1.255.800	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO -LLAVE DE PASO- VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE. 1/2"	UND		$ 58.493		15,00	$ 877.395	0,00		11,00	$ 643.423	11,00	$ 643.423
NP.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO PLÁSTICA DE 20X20CM	UND		$ 25.810		15,00	$ 387.145	0,00		11,00	$ 283.906	11,00	$ 283.906
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2"	UND		$ 71.761		7,00	$ 502.329	0,00		2,00	$ 143.523	2,00	$ 143.523
NP.26	SUSPENSIÓN Y DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN DE PUNTO Y/O SALIDA SANITARIA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN	UND		$ 21.555		15,00	$ 323.327	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.27	SUSPENSIÓN Y DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN DE PUNTO Y/O SALIDA HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN	UND		$ 8.026		10,00	$ 80.260	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.28	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA EXISTENTE EN HIERRO FUNDIDO CON ACETILENO. VARIOS DIAMETROS. INCLUYE RETIRO DE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 131.832		80,00	$ 10.546.537	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.29	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DE REDES HIDROSANITARIAS EXISTENTE EN PVC, CONCRETO, CEMENTO. VARIOS DIAMETROS. INCLUYE RETIRO DE ACCESORIOS. - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 18.184		82,66	$ 1.503.063	0,00		82,66	$ 1.503.063	82,66	$ 1.503.063

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO							
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL	7 Meses	V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1											$ 2.780.189.345,05
	Nº 2											

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP.30	SONDEO Y REVISIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUES PLUVIALES Y Y SANITARIOS (incluye utilización electrobomba y reconstrucción de sitios de ubicación del equipos como también la construcción de cajillas de inspección con marco y contramarco para dejarlas inspecionables) como todo trabajo para garantizar la evacuación de las aguas lluvias y pluviales; como también todos los materiales y actividades para garantizar su funcionamiento) en la SECRETARIA DE SALUD PARTE INTERNA; son dos (2) acometidas: acometida del sitio arquitectónico denominado laboratorio y el auditorio; acometidas que se encuentran totalmente obstruidas y no funcionan desde hace varios meses.	UND		$ 4.950.000		2,00	$ 9.900.000	0,00		2,00	$ 9.900.000	2,00	$ 9.900.000
NP.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE 1 1/2"	UND		$ 232.977		1,00	$ 232.977	0,00		1,00	$ 232.977	1,00	$ 232.977
NP.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE 1"	UND		$ 94.021		1,00	$ 94.021	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE 3/4"	UND		$ 62.713		3,00	$ 188.140	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	Aparatos												
NP.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL. - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 298.520		2,00	$ 597.040	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PUSH DE SOBREPONER PARA LAVAMANOS. INCLUYE ACOPLE Y SIFÓN. - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 318.442		3,00	$ 955.327	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE PARED EN ACERO INOX. OPACO - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 720.248		2,00	$ 1.440.497	0,00		2,00	$ 1.440.497	2,00	$ 1.440.497
NP.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 16" DE PARED EN ACERO INOX. OPACO (L=0,60 mts) - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 350.000		2,00	$ 700.000	0,00		2,00	$ 700.000	2,00	$ 700.000
NP.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INSCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA. EDIFICO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 136.799		2,00	$ 273.598	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	Drywall												
NP.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO MODULADO REGISTRABLE 600X600X15MM. ACABADO LISO COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA, PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	M2		$ 240.500		1133,83	$ 272.686.115	0,00		476,85	$ 114.683.147	476,85	$ 114.683.147
NP.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO CONTINUO EN DRYWALL TERMINADO. INSTALADO ALTURA CON ANDAMIOS CERTIFICADOS. RECINTO FERIAL.	M2		$ 87.029		12,53	$ 1.090.473	0,00		12,53	$ 1.090.473	12,53	$ 1.090.473
NP.41	RESANE Y PINTURA VINILO TIPO 01 A TRES MANOS. INSTALADO EN ALTURA DOBLE CON ANDAMIOS CERTIFICADOS. RECINTO FERIAL.	M2		$ 67.275		185,91	$ 12.507.095	0,00		185,93	$ 12.508.441	185,93	$ 12.508.441
NP.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL ACABADO Y TERMINADO A UNA CARA - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	M2		$ 126.854		105,14	$ 13.337.430	0,00		79,70	$ 10.110.771	79,70	$ 10.110.771
	Carpintería												
NP.43	REINSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCOS METÁLICOS EXISTENTES. - RECINTO FERIAL	UND		$ 48.626		3,00	$ 145.879	0,00		3,00	$ 145.879	3,00	$ 145.879
NP.44	AJUSTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINALES - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 32.584		10,00	$ 325.835	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, PUERTAS ENTAMBORADAS Y PÁNELES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 PARA BAÑOS INSTITUCIONALES - EDIFICIO CENTRAL	M2		$ 1.310.758		6,50	$ 8.519.925	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	Vidrios												
NP.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO 4MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA BAÑOS. EDIFICIO CENTRAL	M2		$ 199.026		40,60	$ 8.080.468	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.47	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA DE SOPORTE. EDIFICIO CENTRAL.	UND		$ 142.541		5,00	$ 712.704	0,00		5,00	$ 712.704	5,00	$ 712.704

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025					$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	2	HOJA	1				PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO				PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				4	MARZO	2026				PLAZO TOTAL	7 Meses	V.R. TOTAL
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							$ 2.780.189.345,05
10/sep/2025	Nº 1											
	Nº 2											

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TIPO PERSIANA E= 4mm; CON ESTRUCTURA DE SOPORTE CUBIERTA. EDIFICIO CENTRAL EN 10 MODULOS BLOQUE CENTENARIO INCLUYE INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERSIANA ADICIONAL EN TODOS LOS MODULOS Y MANTENIMIENTO DE MARCOS EXISTENTES Y AJUSTE DE LOS MISMOS. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES PARA SU ESTRICTO OPPERACION Y FUNCIONAMIENTO. - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 2.541.500		10,00	$ 25.415.000	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	Instalaciones Eléctricas												
NP.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60 CMS 48W BLANCA LUZ FRIA 6500K CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD RETIE (EN CIELO RASO TERMINADO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 334.130		427,00	$ 142.673.510	0,00		155,00	$ 51.790.150	155,00	$ 51.790.150
NP.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 18W BLANCA LUZ FRIA 6500K (EN CIELO RASO TERMINADO). EDIFICIO CENTRAL (CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD RETIE) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 60.358		35,00	$ 2.112.520	0,00		4,00	$ 241.431	4,00	$ 241.431
NP.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ETIQUTADO DE INTERRUPTOR DOBLE - RECINTO FERIAL	UND		$ 125.934		10,00	$ 1.259.340	0,00		6,00	$ 755.604	6,00	$ 755.604
NP.52	SUSPENSIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES. - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 41.448		13,00	$ 538.827	0,00		13,00	$ 538.827	13,00	$ 538.827
NP.53	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 26.948		193,00	$ 5.201.012	0,00		180,00	$ 4.850.685	180,00	$ 4.850.685
NP.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 2F#10+1T#12 AWG CONVRE (SOBRE TUBERÍA EMT 1", REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS) - CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD RETIE - RECINTO FERIAL - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 55.775		287,24	$ 16.020.811	0,00		283,62	$ 15.818.906	283,62	$ 15.818.906
NP.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA, INCLUYLE MARQUILLADO Y/O ETIQUETADO - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 843.694		3,00	$ 2.531.081	0,00		2,00	$ 1.687.387	2,00	$ 1.687.387
NP.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO 12 CTOS BIFÁSICO.INCLUYE MARQUILLADO Y/O ETIQUETADO - RECINTO FERIAL	UND		$ 500.000		1,00	$ 500.000	0,00		1,00	$ 500.000	1,00	$ 500.000
NP.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA TABLERO AA. INCLUYE 3#2+1N#2+1T#2 AWG COBRE CU - RECINTO FERIAL	ML		$ 279.500		15,00	$ 4.192.500	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X30 A	UND		$ 185.526		6,00	$ 1.113.154	0,00		7,00	$ 1.298.679	7,00	$ 1.298.679
NP.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X30 A	UND		$ 159.526		2,00	$ 319.051	0,00		1,00	$ 159.526	1,00	$ 159.526
NP.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 1/4" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML		$ 123.282		96,20	$ 11.859.728	0,00		54,00	$ 6.657.228	54,00	$ 6.657.228
NP.61	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO PARA CONTROL Y DISTRIBUCIÓN. RECINDO FERIAL Y EDIFICIO CENTRAL - SECRETARÍA DE LA MUJER.	UND		$ 10.465.000		2,00	$ 20.930.000	0,00		1,00	$ 10.465.000	1,00	$ 10.465.000
	Aires Acondicionados												
NP.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE 1/4"x1/2" R32 PARA AIRE ACONDICIONADO CON AISLAMIENTO EN POLIETILENO. INCLUYE LLENADO DE LÍNEA. - RECINTO FERIAL	ML		$ 96.492		182,00	$ 17.561.489	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE 3/8"x1/4" R32 PARA AIRE ACONDICIONADO CON AISLAMIENTO EN POLIETILENO. INCLUYE LLENADO DE LÍNEA. - RECINTO FERIAL	ML		$ 89.181		159,00	$ 14.179.747	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025							$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	2	HOJA	1					PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		4	MARZO	2026					PLAZO TOTAL	7 Meses	V.R. TOTAL
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA									$ 2.780.189.345,05
10/sep/2025	Nº 1											
	Nº 2											

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP.64	DESMONTE, RETIRO Y REEMPLAZO DE TUBERÍA DE DESAGUES DE AA DE 2" PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADA EN FACHADAS Y/O EXTERIORES CON TRABAJO EN ALTURA, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA SUSTITUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. - RECINTO FERIAL	ML		$ 41.325		576,08	$ 23.806.506	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS RECINTO FERIAL (4 MANEJADORAS 20TR, 8 CONDENSADORAS DE 10TR) INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA DE COBRE Y DE CORREAS DE MANEJADORAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. RECINTO FERIAL	TON		$ 134.550		80,00	$ 10.764.000	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	Cubiertas												
NP.66	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES EXISTENTES	ML		$ 20.202		21,50	$ 434.343	0,00		21,50	$ 434.343	21,50	$ 434.343
NP.67	DESMONTE DE TODO TIPO DE CANALES Y DUCTOS EXISTENTES, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA O DE MADERA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIO AUTORIZADO) - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 45.806		10,50	$ 480.958	0,00		34,50	$ 1.580.290	34,50	$ 1.580.290
NP.68	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIO AUTORIZADO) EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	M2		$ 55.000		271,49	$ 14.931.950	0,00		218,60	$ 12.022.753	218,60	$ 12.022.753
NP.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF CAL.36 UPVC 2MM. BLANCA INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE, TORNILLOS DE ALA, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	M2		$ 167.967		396,34	$ 66.572.041	0,00		396,52	$ 66.602.695	396,52	$ 66.602.695
NP.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMOACÚSTICA ECOROOF CAL.36 UPVC 2MM. BLANCA INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 159.065		12,00	$ 1.908.780	0,00		12,00	$ 1.908.780	12,00	$ 1.908.780
NP.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA DE 15CM PARA SELLAMIENTO DE MUROS EN SUPERBOARD; INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN CON BRONCOELÁSTICO SOBRE LA CINTA- RECINTO FERIAL - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 19.575		297,20	$ 5.817.690	0,00		227,45	$ 4.452.334	227,45	$ 4.452.334
NP.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJES ESTRCUTURALES CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA EN FACHADA - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 942.500		56,00	$ 52.780.000	0,00		53,00	$ 49.952.500	53,00	$ 49.952.500
NP.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOX. ALTURA 1.10m. EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 1.569.750		12,50	$ 19.621.875	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA Y FALDONES EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20. LONGITUD DE DESARROLLO ENTRE 85CM Y 100 CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 181.250		35,50	$ 6.434.375	0,00		63,52	$ 11.513.000	63,52	$ 11.513.000

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRE No.02

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025					$ 1.853.552.197,39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	2	HOJA	1				PLAZO INICIAL	4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				4	MARZO	2026				PLAZO ADICIONAL	3 Meses	$ 926.637.147,66
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA								V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1										PLAZO TOTAL	7 Meses	$ 2.780.189.345,05
	Nº 2												

						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA FIGURADA CAL 26 LON: 0,50 A 0,60 MTS; INCLUYE RETIRO DE FLANCHE EXISTENTE - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 108.750		64,95	$ 7.063.313	0,00		27,98	$ 3.042.281	27,98	$ 3.042.281
	Varios y Complementarios												
NP.76	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 21MPa (3000PSI) 0,20X0,20m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA - RECINTO FERIAL	ML		$ 225.000		10,80	$ 2.430.000	0,00		10,80	$ 2.430.000	10,80	$ 2.430.000
NP.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y TANQUES. INCLUYE ANTICORROSIVO ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD.	KG		$ 23.500		4855,38	$ 114.101.430	0,00		4066,46	$ 95.561.749	4066,46	$ 95.561.749
NP.78	ADECUACIONES ARCHIVO CENTRAL. TODO LO NECESARIO PARA CONTROL DE HUMEDADES POR ESCURRIMIENTO -SEDE EXTERNA	UND		$ 6.500.000		1,00	$ 6.500.000	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC 6". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 55.000		76,00	$ 4.180.000	0,00		24,00	$ 1.320.000	24,00	$ 1.320.000
NP.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE KORAZA AMERICANA	ML		$ 48.500		22,00	$ 1.067.000	0,00		11,20	$ 543.200	11,20	$ 543.200
NP.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL PARA PISO TRÁFICO PESADO.	M2		$ 95.500		50,26	$ 4.799.830	0,00		50,80	$ 4.851.400	50,80	$ 4.851.400
NP.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN EN COBRE PARA CAMBIOS DE ACABADOS DE PISO	ML		$ 22.500		46,57	$ 1.047.825	0,00		46,57	$ 1.047.825	46,57	$ 1.047.825
NP.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO GOBERNACION DEL HUILA EN ACERO INOXIDABLE LETRAS DE 15 CENTIMETROS	UND		$ 1.110.000		1,00	$ 1.110.000	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
NP.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS NOMBRES DE LAS SECRETARIAS DE LA GOBERNACION DEL HUILA EN ACERO INOXIDABLE DE 120x25 CENTIMETROS	UND		$ 950.000		15,00	$ 14.250.000	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 1.104.900.342,00**		**$ -**		**$ 569.670.958**		**$ 569.670.958,00**
	TOTAL MOBILIARIO				**$ 363.005.647,00**		**$ 368.388.352,00**		**$ 348.696.541**		**$ 352.719**		**$ 349.049.260**
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES - INSTALACIONES ELECTRICAS - VOZ Y DATOS				**$ 1.085.586.451,54**		**$ 1.801.390.143,85**		**$ 333.340.365,38**		**$ 738.224.672,31**		**$ 1.071.565.036,92**
	ADMINISTRACIÓN	20,00%		$	217.117.290,31	$	360.278.028,77	$	66.668.073,00	$	147.644.934,00	$	214.313.007,00
	IMPREVISTOS	5,00%		$	54.279.322,58	$	90.069.507,19	$	16.667.018,00	$	36.911.234,00	$	53.578.252,00
	UTILIDAD	5,00%		$	54.279.322,58	$	90.069.507,19	$	16.667.018,00	$	36.911.234,00	$	53.578.252,00
	TOTAL A.I.U.	**30%**		**$**	**325.675.935,46**	**$**	**540.417.043,15**	**$**	**100.002.109,00**	**$**	**221.467.402,00**	**$**	**321.469.511,00**
	TOTAL COSTOS DE OBRA CIVIL - INSTALACIONES ELECTRICAS - VOZ Y DATOS				**$ 1.411.262.387,00**		**$ 2.341.807.187,00**		**$ 433.342.474,38**		**$ 959.692.074,31**		**$ 1.393.034.547,92**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 10.313.071,29		$ -	$	-	$	-	$	-
	IVA SOBRE MOBILIARIIO	19%			$ 68.971.072,93		$ 69.993.786,88	$	66.252.343,00	$	67.017,00	$	66.319.359,40
	TOTAL IVA				$ 79.284.144,22		$ 69.993.786,88	$	66.252.343,00	$	67.017,00	$	66.319.359,40
	TOTAL COSTO				**$ 1.853.552.197,39**		**$ 2.780.189.345,05**	**$**	**848.291.358,00**	**$**	**960.111.810,00**	**$**	**1.808.403.168,00**
								30,51%		**34,53%**		**65,05%**	

CONSORCIO TURPIAL 2025
R.L.S. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
INTERVENTOR

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL	
ITEM: 1.1	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	M2





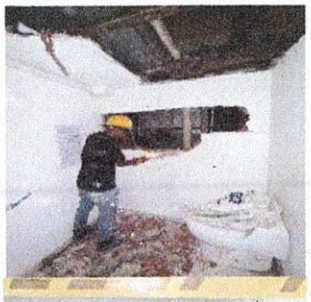









LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
CANTIDAD PAGADA EN EL ACTA PARCIAL No. 1						**-101.28**
EDIFICIO CENTRAL						
MURO ADECUACION CUBO	4.00		1.87		1.00	7.48
VANO PUERTA LADO POLICIA	2.10		1.26		1.00	2.65
MURO INTERNO BAÑO PISO 6	1.90	1.00			1.00	1.90
MUROS BUITRON BAÑOS PISO 6-5-4-3-2-1	1.44	1.72			6.00	14.86
CIELO RASO EN CONCRETO BAÑO PISO 6-4-3	2.66	1.70			6.00	27.13
VANO PUERTA ASESORE, INGRESO NUEVO PASILLO	1.00		2.00			2.00
TOTAL EDIFICIO CENTRAL						**56.02**
SECRETARÍA DE SALUD						
ATENCIÓN AL CIUDADANO BAÑO 01	1.05	1.97				2.07
ATENCIÓN AL CIUDADANO BAÑO 02	1.86	1.97				3.66
SALUD PÚBLICA BAÑO 01	1.87	1.15			2.00	4.30
SALUD PÚBLICA BAÑO 02	1.37	1.86			2.00	5.10
ARCHIVO PISO 1	1.40	1.09				1.53
GESTION DIRECION BAÑO 01	1.20	2.20				2.64
GESTION DIRECION BAÑO 02	1.60	1.20				1.92
ASEGURAMIENTO BAÑO 01	1.14	1.95				2.22
ASEGURAMIENTO BAÑO 02	1.16	1.96				2.27
ASEGURAMIENTO BAÑO 03	1.13	1.94				2.19
ASEGURAMIENTO BAÑO PÚBLICO	1.14	1.90				2.17
ASEGURAMIENTO BAÑO CRUCE	1.18	2.07				2.44
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	1.83	2.33				4.26
ZOONOSIS	1.78	1.00				1.78
LAB BAÑO 01	1.17	1.87				2.19
LAB BAÑO 02	1.00	1.85				1.85
LAB BAÑO 03	1.10	1.70				1.87
P02 DESPACHO BAÑO	1.15	1.56				1.79

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							
EDIF	SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL						
ITEM: 1.1	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)						M2
P02 SALA JUNTAS BAÑO	1.16	1.56					1.81
P02 CONTRATACIÓN BAÑO	1.16	1.58					1.83
P02 BAÑOS PUBLICOS 01	2.15	1.90					4.09
P02 BAÑOS PUBLICOS 02	2.00	1.16					2.32
ACOMETIDA PRINCIPAL							3.65
ACOMETIDA INTERIOR CAJILLAS							2.25
TOTAL SALUD							62.21
SE CONTABILIZA DEMOLICIÓN DE PLACA EN COMO DEMOLICIÓN DE MURO, YA QUE LAS ACTIVIDADES Y PRECIOS SON CONGRUENTES							
CANTIDAD A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA							16.95





CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2025
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF | **SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL**

ITEM: 2.1 **Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos** **m²**












LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			m²	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
SECRESALUD						
OFICINA RECEPCION MUESTRAS						
CIELO RASO	2.80	3.80		10.64		10.64
MUROS	3.90	2.52		9.83		9.83
	-0.32	1.80		- 0.58		-0.58
	-0.42	0.90		- 0.38		-0.38
	1.18	2.52		2.97		2.97
	1.65	0.56		0.92		0.92
	1.65	1.00		1.65		1.65
	3.77	2.52		9.50		9.50
	-0.97	1.90		- 1.84		-1.84
	1.86	1.47		2.73		2.73
TOTAL OFICINA						35.45
OFICINA PROFECIONALES Y DIRECCIÓN						
CIELO RASO	3.20	4.70		15.04		15.04
	2.80	2.62		7.34		7.34
MUROS	3.70	2.52		9.32		9.32
	1.92	2.52		4.84		4.84
	2.62	1.00		2.62		2.62
	2.80	2.52		7.06		7.06
	1.13	2.52		2.85		2.85
	0.90	0.90		0.81		0.81
	1.80	2.52		4.54		4.54
	0.15	4.75		0.71		0.71
	2.90	1.90		5.51		5.51
	1.80	0.42		0.76		0.76
TOTAL OFICINA						61.39
OFICINA LABORATORIO						
CIELO RASO	2.90	3.77		10.93		10.93
MUROS	3.77	2.52		9.50		9.50
	-0.97	1.90		- 1.84		-1.84
	0.97	2.52		2.44		2.44
	3.77	2.52		9.50		9.50
	-0.97	1.90		- 1.84		-1.84
	2.90	1.44		4.18		4.18
TOTAL OFICINA						32.87
OFICINA TOMA MUESTRAS						
CIELO RASO	1.00	2.00		2.00		2.00
	0.17	1.63		0.28		0.28
	2.95	3.20		9.44		9.44
MUROS						
	1.63	0.86		1.40		1.40
	2.10	0.80		1.68		1.68
	0.12	1.19		0.14		0.14

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF | **SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL**

ITEM: 2.1 | **Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos** | **m²**













	0.20	1.80		0.36		0.36
	0.97	1.32		1.28		1.28
	0.26	0.47		0.12		0.12
	0.52	1.78		0.93		0.93
	2.24	1.78		3.99		3.99
	2.48	2.10		5.21		5.21
	0.50	1.78		0.89		0.89
	1.93	1.78		3.44		3.44
	1.95	2.78		5.42		5.42
TOTAL OFICINA						36.57
HALL DE ACCESO (LABORATORIO)						
CIELO RASO	1.95	4.20		8.19		8.19
	1.53	7.95		12.16		12.16
	2.47	1.53		3.78		3.78
	1.95	1.20		2.34		2.34
	2.00	2.07		4.14		4.14
	2.09	1.65		3.45		3.45
	3.80	1.02		3.88		3.88
	5.00	3.80		19.00		19.00
MUROS	1.15	1.95		2.24		2.24
	1.71	2.83		4.84		4.84
	0.95	1.34		1.27		1.27
	0.60	1.85		1.11		1.11
	0.30	1.00		0.30		0.30
	2.55	1.65		4.21		4.21
	0.15	1.04		0.16	4.00	0.62
	2.47	1.04		2.57		2.57
	1.04	1.53		1.59		1.59
	1.09	1.40		1.53		1.53
	0.63	0.95		0.60		0.60
	0.35	2.54		0.89		0.89
	3.80	2.54		9.65		9.65
	0.83	2.54		2.11	2.00	4.22
	0.40	3.80		1.52		1.52
	1.45	0.84		1.22		1.22
	0.47	2.00		0.94		0.94
	1.20	0.72		0.86		0.86
	0.74	0.22		0.16		0.16
	0.07	2.00		0.14		0.14
	1.95	0.71		1.38		1.38
	0.70	0.38		0.27		0.27
	1.09	0.65		0.71		0.71
	0.60	0.69		0.41		0.41
	2.07	0.60		1.24		1.24
	0.20	2.00		0.40		0.40
	0.52	2.00		1.04		1.04
	2.00	2.54		5.08		5.08
	1.40	2.54		3.56		3.56
	0.67	0.63		0.42		0.42
	2.09	2.54		5.31		5.31

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF | **SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL**

ITEM: 2.1 **Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos** **m²**

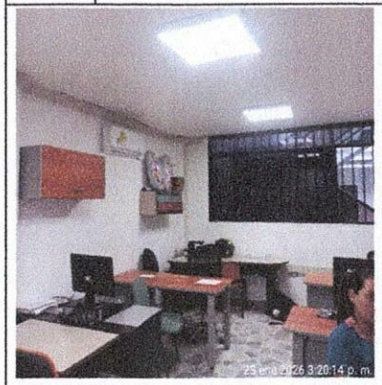

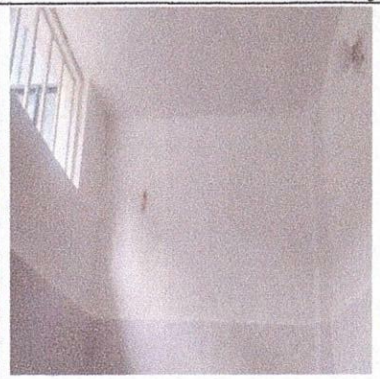











	-2.00	0.68		- 1.36		-1.36
	1.65	2.54		4.19		4.19
	1.15	2.54		2.92		2.92
	1.82	2.54		4.62		4.62
	-2.00	0.92		- 1.84		-1.84
	1.30	2.54		3.30		3.30
	-0.82	2.00		- 1.64		-1.64
	0.83	2.54		2.11	2.00	4.22
	0.40	3.80		1.52		1.52
	5.70	2.54		14.48		14.48
	3.80	2.54		9.65		9.65
	-2.80	1.42		- 3.98		-3.98
	5.00	2.54		12.70		12.70
TOTAL HALL						166.03
ARCHIVO (TOXICOLOGÍA)						
CIELO RASO	2.45	0.85		2.08		2.08
	3.70	2.80		10.36		10.36
TOTAL						12.44
PRIMER PISO BAÑO PASILLO						
CIELO RASO	2.30	1.87		4.30		4.30
MUROS	7.22	0.73		5.27		5.27
	1.07	0.70		0.75		0.75
DESCUENTO	-1.70	0.40		- 0.68		-0.68
TOTAL BAÑO						9.64
CRUE BAÑO						
CIELO RASO	2.06	1.16		2.39		2.39
TOTAL BAÑO						2.39
LABORATORIO BAÑO #1						
CIELO RASO	1.87	1.03		1.93		1.93
MUROS	5.00	0.64		3.20		3.20
DESCUENTO	-1.90	0.30		- 0.57		-0.57
LABORATORIO BAÑO #2						
CIELO RASO	1.22	1.88		2.29		2.29
MUROS	6.03	0.62		3.74		3.74
LABORATORIO BAÑO #3						
CIELO RASO	1.70	0.98		1.67		1.67
MUROS	5.42	1.33		7.21		7.21
	1.70	0.15		0.26		0.26
DESCUENTO	0.26			3.14		-0.21
TOTAL BAÑOS						19.51
OFICINA DIRECTOR						
CIELO RASO	6.00	4.83		28.98		28.98
MUROS	5.98	2.67		15.97		15.97

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF | **SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL**

ITEM: 2.1 **Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos** **m²**

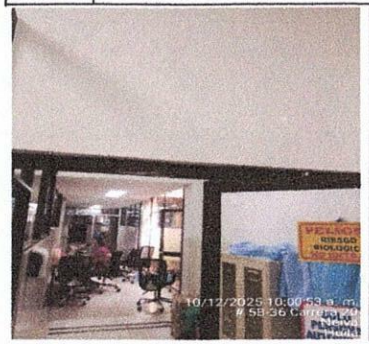

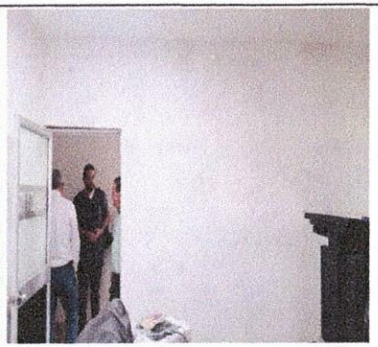













	3.64	2.15		7.83		7.83
	5.98	2.67		15.97		15.97
	1.16	2.67		3.10		3.10
	2.45	2.67		6.54		6.54
	1.21	2.67		3.23		3.23
DESCUENTO	-1.95	0.76		- 1.48		-1.48
	-1.95	0.88		- 1.72		-1.72
TOTAL OFICINA						78.41
BAÑO PÚBLICO						
CIELO RASO	1.13	1.84		2.08		2.08
MUROS	1.15	0.40		0.46		0.46
	1.86	0.4		0.74		0.74
	1.86	0.4		0.74		0.74
	0.15	0.4		0.06		0.06
	0.15	0.4		0.06		0.06
TOTAL BAÑO						4.15
ZOONOSIS						
CIELO RASO OFICINA	3.78	5.27		19.92		19.92
MUROS OFICINA	3.60	1.11		4.00		4.00
	5.77	2.52		14.54		14.54
	-0.67	1.95		- 1.31		-1.31
	3.80	2.52		9.58		9.58
	4.22	2.52		10.63		10.63
	1.92	0.88		1.69		1.69
BAÑO						
CIELO RASO	1.01	1.65		1.67		1.67
MUROS	5.20	0.40		2.08		2.08
TOTAL						62.80
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
CIELO RASO	1.13	1.86		2.10		2.10
	1.08	1.83		1.98		1.98
	1.34	1.83		2.45		2.45
MUROS	1.07	1.75		1.87		1.87
	0.78	0.10		0.08		0.08
TOTAL BAÑO						8.48
PARQUEADERO BAÑO						
CIELO RASO	1.00	1.95		1.95		1.95
MUROS	5.20	0.68		3.54		3.54
DESCUENTO	-0.50	0.90		- 0.45		-0.45
TOTAL BAÑO						5.04

ASEGURAMIENTO (HALL)						

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL


ITEM: 2.1	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos						m²
	CIELO RASO	2.57	4.14		10.64		10.64
	MUROS	4.14	2.40		9.94	2	19.87
	DESCUENTO	-0.66	1.95		- 1.29	3	-3.86
		-0.84	2.15		- 1.81		-1.81
		-1.56	1.40		- 2.18		-2.18
	TOTAL BAÑO						22.66





LABORATORIO (DEPOSITO 2)

CIELO RASO	2.84	2.26		6.42		6.42
MUROS	2.84	2.62		7.44		7.44
	2.26	2.62		5.92	2	11.84
DESCUENTO	2.84	1.10		3.12		3.12
TOTAL BAÑO						28.83



CUARTOS ELECTRICO TODO LOS PISOS EDIF GOBERNACION	6.86		2.20		5.00	75.46
CUARTOS ELECTRICO PLACA TECHO	2.18	1.25			5.00	13.63



TOTAL ACUMULADO	**675.73**
TOTAL ACTA 02	**586.64**


CONSORCIO TURPIAL 2025
R.L. OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
CONTRATISTA


CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	SECRETARIA DE SALUD - EDIFICIO CENTRAL
ITEM: 6,2	**Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye griferia** — **UND**

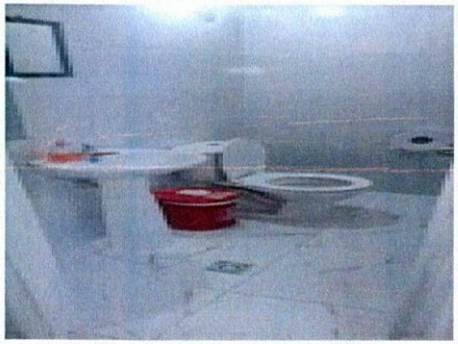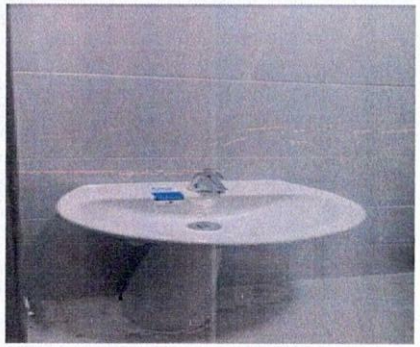


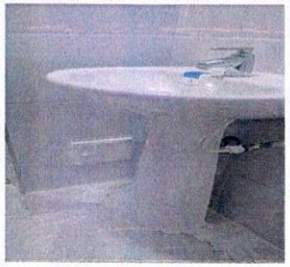
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	UND	TOTAL
SALUD MENTAL					
BAÑO # 1				1,00	1,00
BAÑO # 2				1,00	1,00
LABORATORIO					
BAÑO # 1				1,00	1,00
BAÑO # 2				1,00	1,00
CRUE					
BAÑO 1				1,00	1,00
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
BAÑO 1				1,00	1,00
BAÑO 2				1,00	1,00
BAÑO 3				1,00	1,00
TOTAL INSTALADOS					8,00
CANTIDAD PAGADA EN ACTA 01					-7,00
				TOTAL	1,00

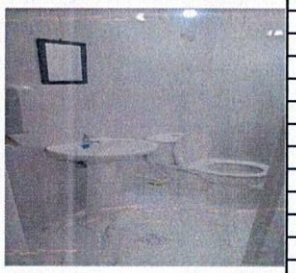
CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA			
EDIF		CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA	
ITEM:	10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML

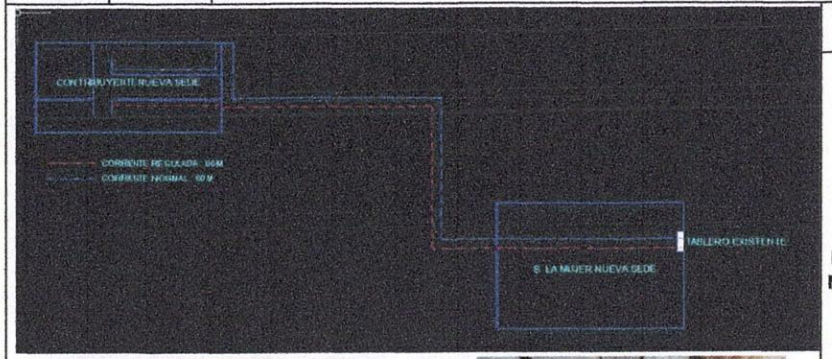

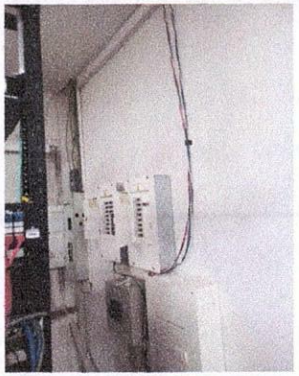

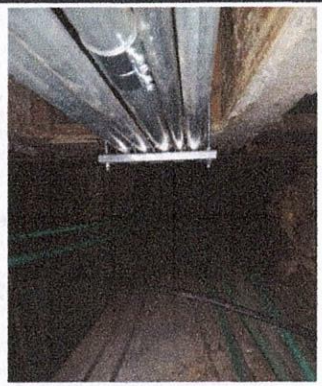





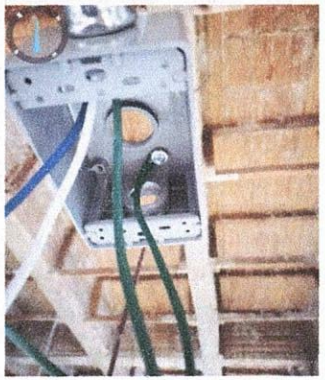

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
DESDE CUARTO ELECTRICO DE LA SEDE NUEVA DE LA MUJER, A LA NUEVA SEDE DE ATENCION AL CONTRUBUYENTE, UN CIRCUITO CORRIENTE REGULADA	60.00					60.00
DESDE CUARTO ELECTRICO DE LA SEDE NUEVA DE LA MUJER, A LA NUEVA SEDE ATENCION AL CONTRUBUYENTE, UN CIRCUITO CORRIENTE NORMAL	60.00					60.00
AGRICULTURA						
CIRCUITO 1	53.10					53.10
CIRCUITO 2	116.65					116.65
CIRCUITO 3	95.53					95.53
CIRCUITO 4	80.81					80.81
CIRCUITO 5	62.45					62.45
CIRCUITO 6	65.39					65.39
CIRCUITO 7	129.74					129.74
CIRCUITO 8	145.18					145.18

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA			
EDIF		CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA	
ITEM:	10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML

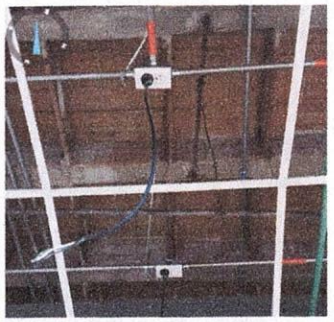

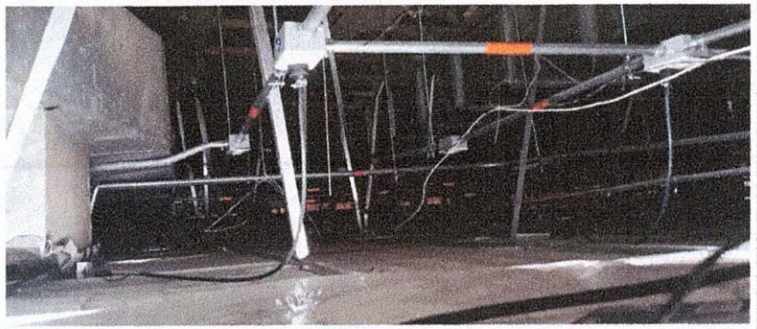

NOTA: VER PLANO RECORD SECRETARIA DE AGRICULTURA

						868.85

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA

ITEM:	10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	UND




LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
SECRETARIA DE AGRICULTURA CUARTO ELECTRICO TABLERO DE 12 PARA ILUMINACION					8.00	8.00
						8.00

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF		CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA	
ITEM:	10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML

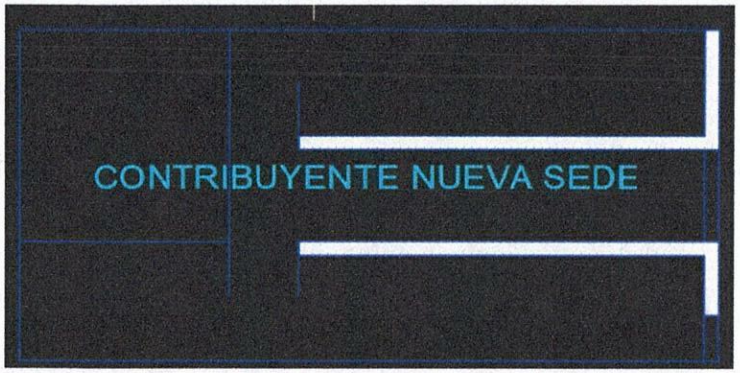





LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
NUEVA OFICINA DE ATENCION CONTRIBUYENTE	19.50					19.50
						19.50





CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	10.15	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU	UND







LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
EDIFICIO CENTRAL						
5to Piso Rack Secretaría de Hacienda					1.00	1.00
4to Piso Rack Secretaría de Educación					1.00	1.00
3er Piso Secretaría de Vías e Infraestructura					1.00	1.00
2do Piso Rack Secretaría de la Mujer					1.00	1.00
2do Piso Cuarto Electrico Salón Exgobernadores					1.00	1.00
SECRETARÍA DE SALUD						
Recepción Laboratorio					1.00	1.00
						6.00

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2025
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF		CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA	
ITEM:	10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	UN







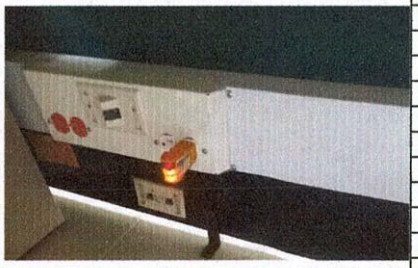

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE NUEVA SEDE					5.00	5.00
						5.00






CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA


CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA

ITEM:	10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA) Y ETIQUETADO	UN

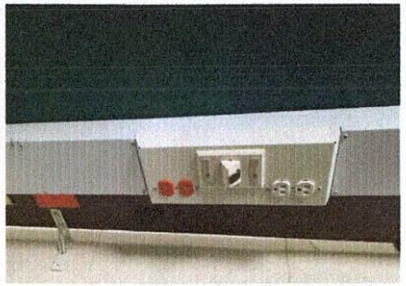

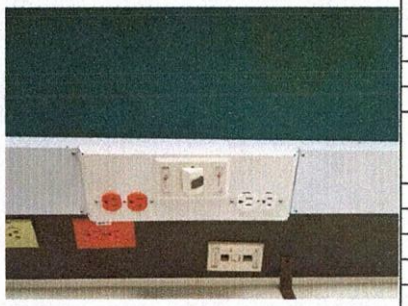

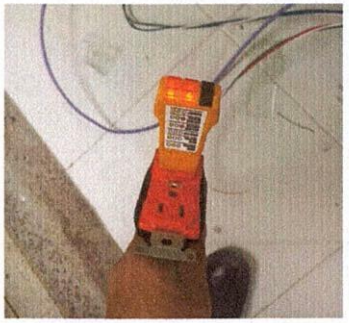



LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE NUEVA SEDE					5.00	5.00
						5.00



CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE LAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA

ITEM:	10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	ML







LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
DESDE TABLERO LOCALIZADO EN LA NUEVA SEDE DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE HASTA LA SUBESTACION LINEA DE TIERRA	60.00				60.00	60.00
						60.00


NOTA: SE INSTALA LINEA DE TIERRA HASTA LA SUBESTACION, DEBIDO A QUE ESTE TABLERO NO CONTABA CON LINEA DE TIERRA.

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF		CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA	
ITEM:	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML

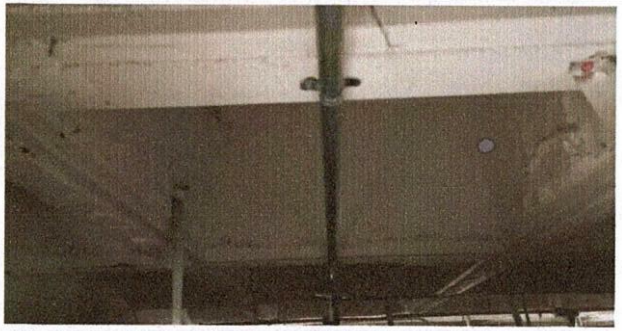





LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL						
CIRCUITO 9	22.39					22.39
CIRCUITO 10	21.45					21.45
CIRCUITO 11	23.51					23.51
CIRCUITO 12	3.96					3.96
CIRCUITO 13	44.76					44.76
OFICINA DE AGRICULTURA						
CIRCUITO 1	47.56					47.56
CIRCUITO 2	87.02					87.02
CIRCUITO 3	50.92					50.92
CIRCUITO 4	49.60					49.60
CIRCUITO 5	30.04					30.04
CIRCUITO 6	20.93					20.93

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA

ITEM:	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML







CIRCUITO 7	74.31					74.31
CIRCUITO 8	50.22					50.22
						526.67






CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE TAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA

ITEM:	11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	UND

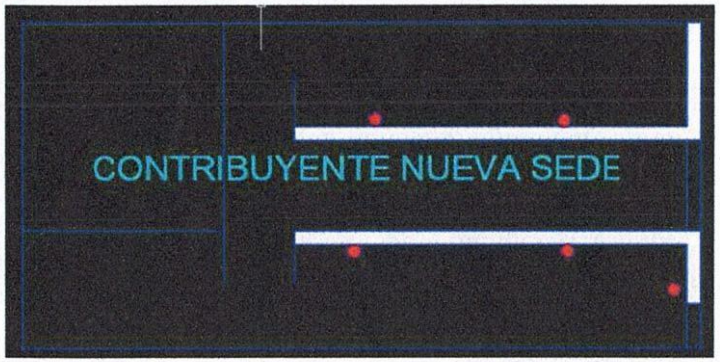








LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE NUEVA SEDE					5.00	5.00
						5.00



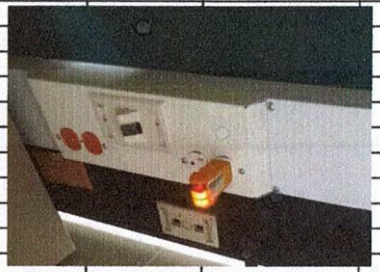

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO IAZ 2025
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF

ITEM: 13.4 — **Suministro e instalación cielorasos en Drywall** — **M2**






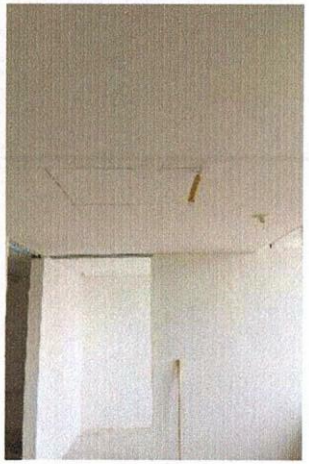

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PASILLO LABORATORIO	2.10	2.00			1.00	4.20
RECINTO FERIAL SEGUNDO PISO SALA DE JUNTAS NUEVA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO.	0.5	0.40			4	0.80
						5.00



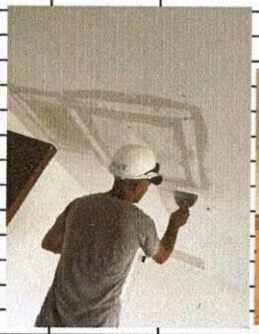



CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. RESIDENTE - EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
RC. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SECRETARIA DE SALUD
ITEM: 13.5	**Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.** — **M2**














LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL
SECRESALUD ACTA 01						-376.10
RECINTO FERIAL						
TOTAL EJECUTADO RECINTO FERIAL OFICINAS DESARROLLO ECONOMICO NUEVA SEDE Y PRIMER PISO				1094.34		
TOTAL PAGADO EN EL ACTA 1 RECINTO FERIAL OFICINA DESARROLLO SEDE NUEVA Y PRIMER PISO				-1051.27		
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA RECINTO FERIAL OFICINA DESARROLLO SEDE NUEVA Y PRIMER PISO				43.08		43.08
OFICINAS AGUAS DEL HUILA UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DEL RECINTO FERIAL						
OFICINA 1 AGUAS DEL HUILA UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DEL RECINTO FERIAL	12.58			2.35		29.56
	4.75			0.9		4.28
OFICINA 2 UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DEL RECINTO FERIAL	10.98			2.35		25.80
	4.8			0.9		4.32
	5.29			4.8		25.39
CUARTOS INTERNOS DE LA OFICINA 2 UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DEL RECINTO FERIAL	5.87			2.35		13.79
	2.27			0.9		2.04
	8.03			2.35		18.87
	2.6			2.27		5.90
	2.27			2.15		4.88
SALON EXGOBERNADORES UBICADO SEGUNDO PISO EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA						
CIELO RASO PASILLO ACCESO A LA ASAMBLEA	1.34		9.10			12.19
	1.43		3.72			5.32
ACCESO ASAMBLEA	7.23		2.10			15.18
MURO LATERAL IZQUIERDO	9.1		2.40			21.84
MURO LATERAL DERECHO	1.3		2.40			3.12
MURO LATERAL DERECHO	7.8		1.07			8.35
MURO LATERAL DERECHO	2.1		0.80			1.68
DINTEL	1.34		0.27			0.36
SALON EXGOBERNADORES						
CUARTO 1	10		2.35			23.50
	1.2		2.35			2.82
CIELO RASO CUARTO 1	5		1.20			6.00
VANO PUERTA	0.85		2.10			-1.79
CUARTO 2	11.6		2.37			27.49
CIELO RASO CUARTO 2	4.6		1.20			5.52
VANO PUERTA	0.78		2.15			-1.68
AREA SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS						
MURO 1 SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS	21.56		2.35			50.67
	0.78		2.10			-1.64
MURO 2 SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS	11		2.10			23.10
	3.53		0.69			2.44

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SECRETARIA DE SALUD

ITEM: 13.5	Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.	M2















MUROS MEDIANEROS SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS	0.85		2.00			1.70
	3.6		0.69			2.48
	1.7		2.00			3.40
MURO 3 SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS	7.34		2.00			14.68
	1.85		2.10			3.89
MURO 4 SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS	9.50		2.40			22.80
CIELO RASO SALON GENERAL EXGOBERNADORES DONDE SE UBICAN LAS MESAS	18.20		10.00			182.00
OFICINA SINDICATO UBICADO EN EL SOTANO						
MUROS SINDICATO	4.92		2.43			11.96
	2.96		2.43			7.19
	0.15		2.43			0.36
	0.23		1.00			0.23
	0.38		2.43			0.92
	0.15		2.43			0.36
CIELO RASO SINDICATO	5.4		2.96			15.98
LUCETA SINDICATO	1.4		0.25			-0.35
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - CONTRALORIA						
	3.35	1.62				5.43
	5.55	1.62				8.99
	0.18	3.35				0.60
	2.17	5.65				12.26
	- 0.98	2.00				- 1.96
	0.55	0.16				0.09
	2.37	2.05				4.86
	2.22	1.83				4.06
	5.57	1.83				10.19
	2.17	5.55				12.04
	- 0.80	2.00				- 1.60
	5.30	0.18				0.95
	0.55	0.18				0.10
	0.84	2.07				1.74
	0.84	2.07				1.74
	1.80	0.18				0.32
	1.54	2.07				3.19
	4.03	2.04				8.22
	0.56	2.04				1.14
	0.33	2.04				0.67
	0.57	2.04				1.16
	2.92	2.16				6.31
OFICINA ESCOLTAS ED. CENTRAL						
	0.25	2.20				0.55
	0.27	2.10				0.57
	0.18	2.00				0.36
	0.18	2.10				0.38
	1.78	2.25				4.01
	1.74	2.25				3.92
	2.07	2.25				4.66

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SECRETARIA DE SALUD

ITEM:	13.5	Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.	M2





	- 0.85	2.00				- 1.70
	0.13	2.00			2.00	0.26
	0.13	0.84				0.11
	0.20	2.25				0.45
	0.29	2.30				0.67
	0.15	2.30				0.35
	0.22	2.30				0.51
	1.95	2.30				4.49
	1.95	1.00				1.95
	1.60	0.95				1.52
	0.95	1.18				1.12
	1.95	1.00				1.95
	1.90	2.15				4.09
	2.16	2.15				4.64
	0.48	2.15				1.03
	0.20	2.30				0.46
	0.17	1.95				0.33
	2.36	2.25				5.31
	0.60	2.25				1.35
	0.30	2.25				0.68
	6.12	2.25				13.77
						412.21


CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA


CONSORCIO JAL 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA)	UN



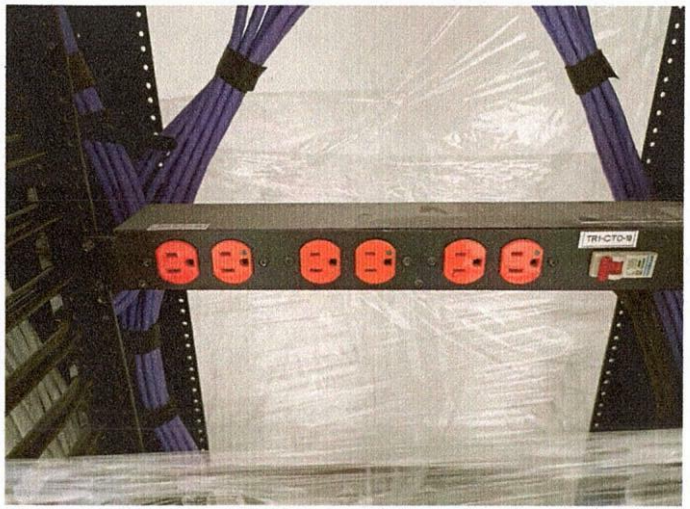

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL OFICINA DESARROLLO ECONOMICO PISO 2						
RACK					1.00	1.00
						1.00


CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML





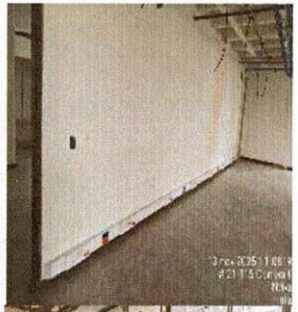





LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL OFICINA DESARROLLO ECONOMICO PISO 2						
TOMAS REGULADO Y NORMALES						
CIRCUITO 1	12.73				2	25.46
CIRCUITO 2	20.50				2	41.00
CIRCUITO 3	10.79				2	21.58
CIRCUITO 4	12.84				2	25.68
CIRCUITO 5	13.28				2	26.56
CIRCUITO 6	17.62				2	35.24
CIRCUITO 7	23.29				2	46.58
CIRCUITO 8	34.04				2	68.08
CIRCUITO 9	5.70				2	11.40
CIRCUITO 10	17.26				2	34.52
CIRCUITO 14	5.35				2	10.70
CIRCUITO 11	56.48					56.48
CIRCUITO 10	45.78					45.78
CIRCUITO 9	34.65					34.65
CIRCUITO 13	38.01					38.01
CIRCUITO 12	44.00					44.00
TOTAL EJECUTADO	**565.72**					**565.72**
NOTA: VER PLANO ANEXO						
TOTAL PAGADO ACTA 1	**240**					**240**
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA						**325.72**

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA


CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML



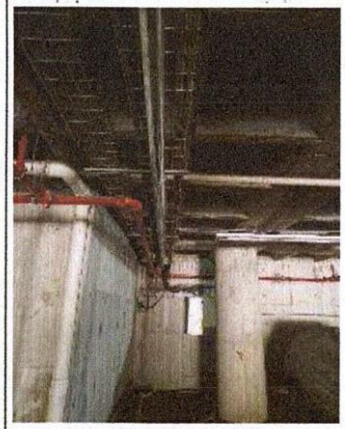

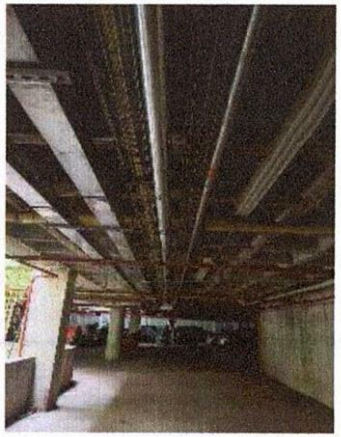

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL						
TOTAL INSTALADO	72.00					72.00
CANTIDAD PAGADA EN EL ACTA 01	67.00					-67.00
						5.00


CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA


CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM: 14.15 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM** — **UN**



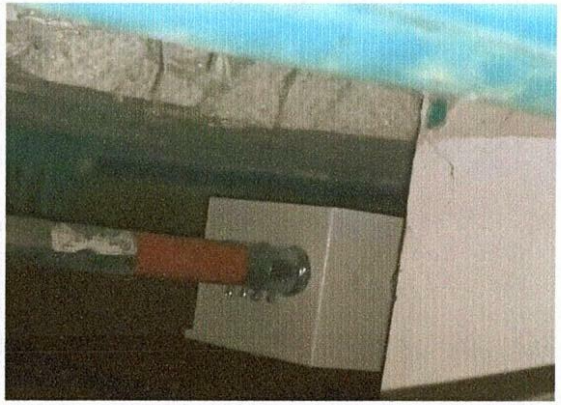

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL						
CAJA UBICADA CONTINO AL BUITRON FRENTE A ESCALERA	1.00				1.00	1.00
TERRAZA RECINTO	1.00				1.00	1.00
CAJA UBICADA ENTRE CAJA SALIDA DE BUITRON A TABLERO DE AIRES	1.00				1.00	1.00
						3.00



CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO DAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA


EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Y ETIQUETADO	UN





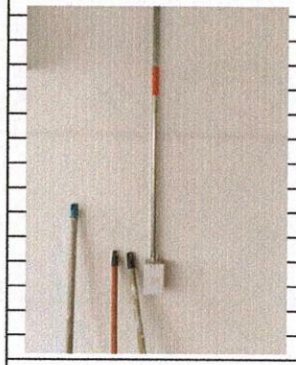

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AGRICULTURA						
OFICINA DESPACHO SECRETARIO					1.00	1.00
OFICINA SALA DE JUNTAS					1.00	1.00
ACCESO ARACHIVO					1.00	1.00
INGRESO AL RACK					1.00	1.00
BAÑOS					2.00	2.00
COCINETA					1.00	1.00
RECINTO FERIAL						
RECINTO SALA DE JUNTAS NUEVA SEDE DESARROLLO ECONOMICO					1.00	1.00
						8.00

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO SAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	14.28	Aire acondicionado mini split Inverter 24.000BTU/220V	UND








LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
EDIFICIO CENTRAL						
ANTICONTRABANDO					1.00	1.00
RECINTO FERIAL						
DESPACHO					1.00	1.00
AREA DE PROFESIONALES					4.00	4.00
SALA DE JUNTAS GRANDE					1.00	1.00
						7.00

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA			
EDIF		RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	
ITEM:	14.29	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU/220V	UND



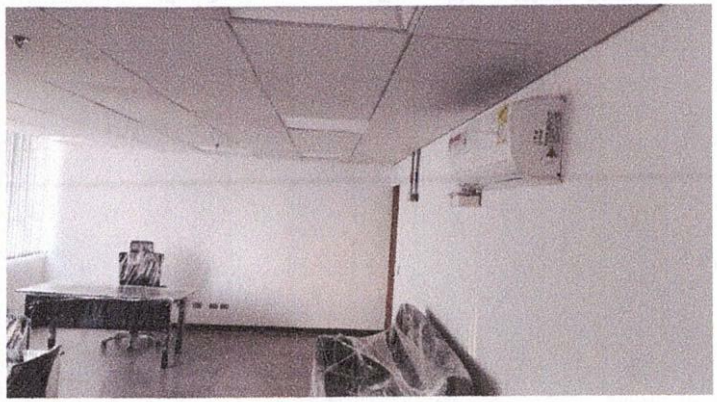

LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL OFICINAS						
CUARTO TÉCNICO					1.00	1.00
CUARTO ELÉCTRICO					1.00	1.00
SALA DE JUNTAS					1.00	1.00
						3.00


CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA

EDIF	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ITEM:	15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 6,6MMx300MMx3000MM	ML





LOCALIZACION	DIMENSIONES			M2	CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RECINTO FERIAL						
TOTAL INSTALADO	36.00					36.00
CANTIDAD PAGADA EN ACTA 01	30.00					-30.00
						6.00

CONSORCIO TURPIAL 2025
ING. EDUAR M. GORDO B. - RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
