ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003 – 2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	No. 003 – 2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 de Chiquinquirá
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S NIT. 901.992.295-1 R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ C.C. No. 1.018.450.439 de Bogotá
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS CO SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($142.869.009,65)
VALOR ADICIÓN No. 01	SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 64.289.842,49)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 01	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ 207.158.852,14)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON ACTA DE REINICIO No. 01	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA No. 1	DOS (2) MESES
	ONCE (11) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA No. 1	DOCE (12) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	OCHO (08) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 02	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON ACTA DE REINICIO No. 02	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA No. 2	DOS (02) MESES
	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA No. 1 Y No. 2	DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCIÓN	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRESENTE ACTA	VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. Registro Presupuestal	Código Presupuestal	Nombre del Rubro	Fuente
RP202511070002	2.3.2.02.02.005.43.4301.430100400	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción a la infraestructura deportiva	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.3.2.02.02.005.43.4301.430100400	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción a la infraestructura deportiva	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
	2.3.2.02.02.005.43.4301.430100400	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO

		construcción a la infraestructura deportiva	GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.3.2.02.02.005.33.3301.330106800	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de infraestructura cultural	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.3.2.02.02.005.33.3301.330106800	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de infraestructura cultural	1.2.4.3.02-SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA
	2.3.2.02.02.005.33.3301.330106800	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de infraestructura cultural	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.3.2.02.02.005.45.4599.459901100	Realizar construcción, mejoramiento y/o mantenimientos a las edificaciones para el servicio institucional	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.3.2.02.02.005.45.4599.459901100	Realizar construcción, mejoramiento y/o mantenimientos a las edificaciones para el servicio institucional	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
	2.3.2.02.02.005.45.4599.459901100	Realizar construcción, mejoramiento y/o mantenimientos a las edificaciones para el servicio institucional	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6

RP202606100001	2.3.2.02.02.005.33.3301.330106800	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de infraestructura cultural	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
	2.3.2.01.01.001.03.15.21.2102.2102013	Realizar mantenimiento, ampliación y/o mejoramiento de la red de alumbrado público	1.2.3.1.14-Impuesto de alumbrado público
	2.3.2.01.01.001.03.18.43.4301.4301004	Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o construcción a la infraestructura deportiva	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
	2.3.2.02.02.005.45.4599.4599011	Realizar construcción, mejoramiento y/o mantenimiento a las edificaciones ara el servicio institucional	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
	2.3.2.02.02.005.45.4599.4599011	Realizar construcción, mejoramiento y/o mantenimiento a las edificaciones ara el servicio institucional	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6

GARANTÍAS DEL CONTRATO

GARANTÍAS CUMPLIMIENTO OTORGADAS ANEXO 9				
Número de póliza:	21-44-101485315			
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA

Cumplimiento del contrato	20%	$41.431.770,43	07/11/2025	10/02/2027
Calidad del servicio	20%	$41.431.770,43	07/11/2025	10/08/2029

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	PASIVO	ACTIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		$142.869.009,65
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES (ANTICIPADO DEL 40%)	$57.147.603,86	
VALOR ADICIÓN No. 01 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		$64.289.842,49
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	$150.011.248,28	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$0	
VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR	$0	
VALORES TOTALES	**$207.158.852,14**	**$207.158.852,14**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO CINCUENTA MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($150.011.248,28).

Siendo el día veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Alcaldía del Municipio de San Pablo de Borbur el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ**, alcalde del municipio, el arquitecto **JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ**, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor del contrato interadministrativo de la referencia, y el ingeniero **EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.450.439 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S,** identificada con NIT. 901.992.295-1, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003 – 2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Que el día 07 de noviembre de 2025, el municipio de San Pablo de Borbur, suscribió el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, con la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S**, identificada con NIT 901.922.295-1, representada legalmente por **EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ,**

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.450.439 expedida en Bogotá D.C., cuyo objeto es **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR".**

2. Que el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, fue pactado por el valor inicial de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($142.869.009,65)**, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Contrato.
3. Que el plazo de ejecución inicial del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, es de **DOS (02) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
4. Que el día 24 de noviembre de 2025 se suscribió el **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, estableciendo como fecha de terminación el día 23 de enero de 2026.
5. Que el día 12 de diciembre de 2025, se suscribió el **OTRO SI MODIFICATORIO No. 01** al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, modificando la CLAUSULA 9 GARANTÍAS.
6. Que el día 29 de diciembre de 2025, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01**, al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**.
7. Que el día 19 de enero de 2026, se suscribió el **ACTA DE REINICIO No. 01**, al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, estableciendo como nueva fecha de terminación el 12 de febrero de 2026.
8. Que el día 11 de febrero de 2026, se suscribió el **OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 Y PRÓRROGA No. 01** al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, prorrogando el plazo de ejecución por el termino de dos (02) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día doce (12) de abril de 2026.
9. Que el día 8 de abril de 2026, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02**, al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

10. Que el día 05 de junio de 2026, se suscribió el **ACTA DE REINICIO No. 02**, al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, estableciendo como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026.
11. Que el día 10 de junio de 2026, se suscribió el **OTROSI MODIFICATORIO No. 03, ADICIÓN No. 01 Y PRÓRROGA No. 02** al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, prorrogando el plazo de ejecución por el termino de dos (02) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día diez (10) de agosto de 2026 y adicionando al contrato la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 64.289.842,49),** para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ 207.158.852,14).**
12. Que el día 29 de julio de 2026 se suscribió el acta de terminación y recibo final y/o a satisfacción del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**.
13. El supervisor del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la supervisión a satisfacción.
14. Una vez realizada la verificación de las obligaciones del objeto contractual, se constató la ejecución del 100% de las obligaciones del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR",** dentro de los términos previstos.

Que de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 "ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" de su concurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo".

Que en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece: "el plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal termino, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el Contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con los dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de los previsto en el artículo 136 del C.C.A.

Que de acuerdo a lo estipulado por las partes y en atención a la Jurisprudencia del C.E. tercera, Sent, Sep. 13/99 Exp. 10.264. M.P. Ricardo Hoyos Duque "alcance de la liquidación del contrato". "no en vano la sala ha considerado que la liquidación del contrato es un auténtico corre de cuentas entre los contratantes, en el cual se define quien debe y cuanto (2), y que cuanto se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo". (2) en este sentido pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992, Exp. 6661; diciembre 2 de 1993, Exp. 8310; Julio 29 de 1996, Exp. 9477. Por lo que EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

Que, conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias a conciliar o acordar, las partes acuerdan liquidar el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR".**

Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS del municipio de San Pablo de Borbúr – Boyacá.

Que, por lo anterior, las partes de manera bilateral acuerdan:

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"** a partir de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

SEGUNDA: Que, de acuerdo con el informe de fecha siete (07) de septiembre de 2026, expedido por el supervisor del presente contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, certifica el cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

TERCERA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de San Pablo de Borbúr-Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"**.

CUARTA: Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($150.011.248,28),** correspondiente al saldo final para completar el 100% de la ejecución del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

QUINTA: Queda entendido que el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, que se liquida con la presente acta, no genera ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de San Pablo de Borbur Boyacá y el contratista.

SEXTA: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos definitivos y el CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se afecten con posterioridad en tomo a las precisiones, aclaraciones y explicaciones del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Sec. Planeación y Obras Públicas
Supervisor

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S.
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista

ING. CARLOS A. CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

	Proyectado por	Revisado por	Aprobado Por
Nombre	Fernanda Ramos / Apoyo Profesional Sec Planeación y Obras Públicas	Sec. Juan Camilo Villamil Rodríguez	Sec. Juan Camilo Villamil Rodríguez
Firma			
Tabla de Retención Documental			
Dependencia	Secretaria de Planeación y Obras Publicas	Numero TRD	120

Informe de Actividades (Acta de liquidación)

Contrato interadministrativo: **No. 003-2025**

OBJETO:

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"

Fecha de Presentación: **29 de julio de 2026**

AUDITORIO MUNICIPAL

1. PRELIMINARES

1.1 DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE *ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5* KM.)

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó desmonte de cielo falso en el auditorio municipal, pasillos de la biblioteca y auditorio municipal y segundo piso del auditorio y concejo municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
294,15 m²	0,00 m²	294,15 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	294,15 m²	294,15 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 1, 2. *Demolición de cielo falso, auditorio municipal.*



Foto 3, 4. Demolición de cielo falso, pasillos biblioteca.



Foto 5, 6. Demolición de cielo falso, segundo piso auditorio.

1.2 DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el desmonte de la cubierta localizada en el auditorio, biblioteca y concejo municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
194,62 m²	0,00 m²	194,62 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	194,62 m²	194,62 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 7, 8. Desmonte de cubierta, auditorio municipal.



Foto 9, 10. Desmonte de cubierta, auditorio municipal.

1.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIGA CANAL. INC IMPERMEABILIZACIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó mantenimiento y reparación de viga canal, incluyendo impermeabilización para viga canal del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	0,00 ml	13,15 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,15 ml	13,15 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 11, 12, 13. Mantenimiento y reparación viga canal, auditorio municipal.

2. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de combo sanitario, incluyendo accesorios, en los baños del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
2,00 unidades	*0,00 unidades*	*2,00 unidades*
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	2,00 unidades	2,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 14, 15. *Instalación de combos sanitarios, auditorio municipal.*

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de griferías para lavamanos con llave sencilla, en el Sanitario del Concejo Municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
2,00 unidades	0,00 unidades	2,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	***Total ejecutado:***
0,00 unidades	1,00 unidades	1,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	-1,00 unidades	



Foto 16. Instalación de griferias para lavamanos, auditorio municipal.

3. PINTURA

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de pintura en esmalte a lámina lineal para perfilería metálica para la cubierta del auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	0,00 ml	13,15 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,15 ml	13,15 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 17, 18. Pintura en esmalte para perfilería, auditorio municipal.

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de esmalte a lámina llena para puertas y ventanas del auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
84,00 m²	0,00 m²	84,00 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	84,00 m²	84,00 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 19, 20, 21, 22. Pintura en esmalte para puertas, auditorio municipal.

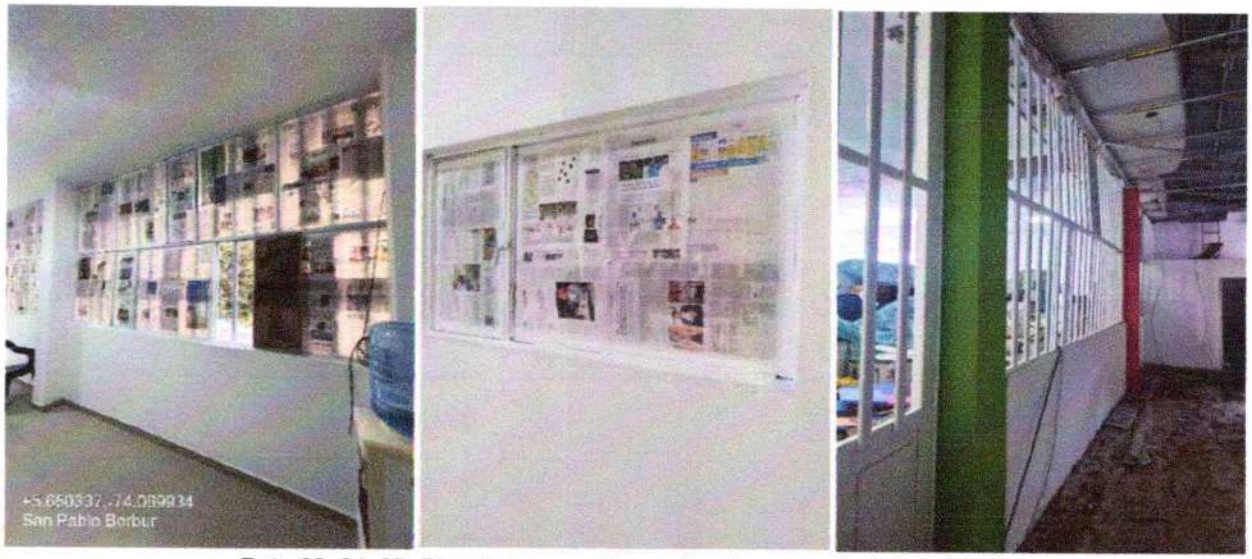


Foto 23, 24, 25. Pinturta en esmalte para ventanas, auditorio municipal.

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de vinilo tipo I sobre estuco en todas las instalaciones que componen el edificio del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
621,52 m2	0,00 m2	621,52 m2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m2	621,52 m2	621,52 m2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m2	0,00 m2	



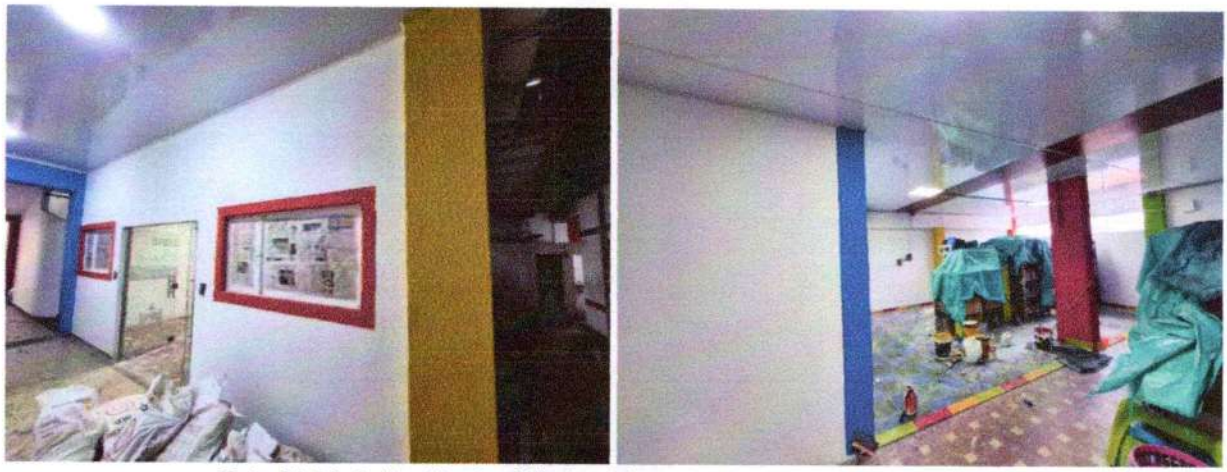


Foto 26-33. Aplicación de vinilo tipo I áreas interiores, auditorio municipal.



Foto 34, 35. Aplicación de vinilo tipo I áreas exteriores, auditorio municipal.

4. CUBIERTA

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de cubierta arquitectónica galvanizada en el auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
194,62 m^2	0,00 m^2	194,62 m^2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m^2	194,62 m^2	194,62 m^2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m^2	0,00 m^2	



Foto 36. Instalación de cubierta arquitectónica en auditorio municipal.

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de flanche en lámina para la cubierta del auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	0,00 ml	13,15 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,15 ml	13,15 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 37, 38. Instalación de flanche en lámina para cubierta, audiotorio municipal.

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

AUDITORIO MUNICIPAL

Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta para edificación de auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
39,45 kg	118,35 kg	157,80 kg
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 kg	162,29 kg	162,29 kg
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
4,49 kg	0,00 kg	



Foto 39, 40. Instalación de perfilería metálica para cubierta auditorio.

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).

AUDITORIO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de las canales. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	- 13,15 ml	0,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	0,00 ml	0,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"

AUDITORIO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de las canales y por consiguiente tampoco se requirió la instalación de las bajantes de aguas lluvias. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
24,00 ml	- 24,00 ml	0,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	0,00 ml	0,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
25,00 unidades	31,00 unidades	56,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	56,00 unidades	56,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó instalación de panel led redondo de 24W en instalaciones generales del auditorio municipal. Se instalaron 46 unidades.

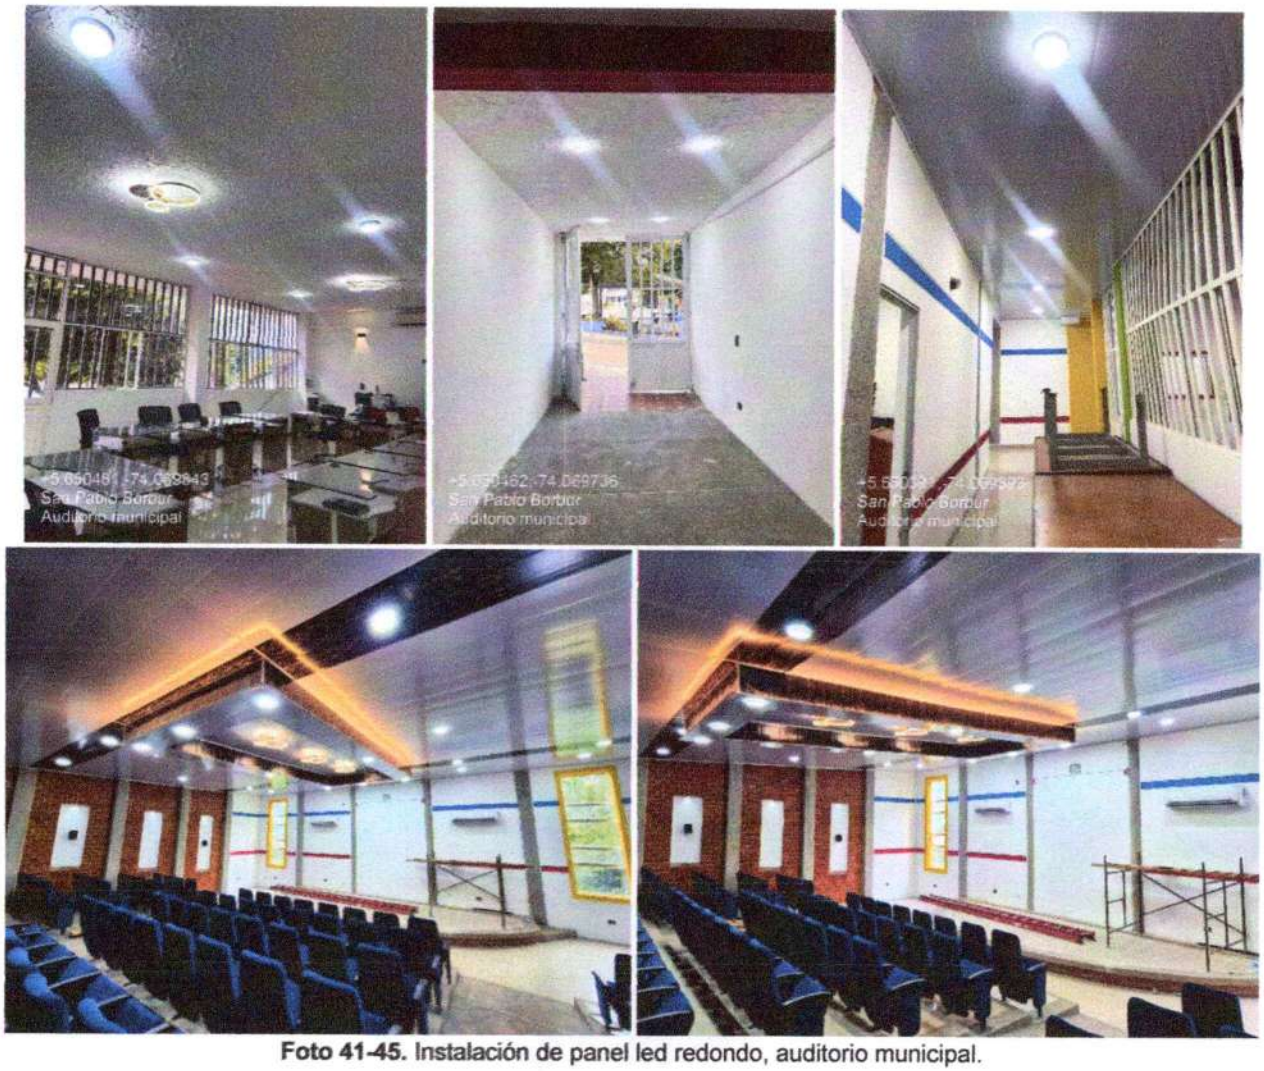


Foto 41-45. Instalación de panel led redondo, auditorio municipal.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó instalación de panel led redondo de 24W en instalaciones generales. Se instalaron 8 paneles en los baños y 2 en la oficina del sector de la terraza.



Foto 46, 47. Instalación de panel led redondo, plaza de mercado (baños).

6. CIELO RASOS

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó instalación de cielo raso en PVC para la zona del auditorio y los pasillos de la biblioteca/auditorio.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
178,10 m²	0,00 m²	178,10 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	178,10 m²	178,10 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 48-51. Instalación de cielo raso, auditorio/pasillos biblioteca.

COLISEO MUNICIPAL

7. PRELIMINARES

7.1 LAVADA DE CERRAMIENTOS, MUROS Y FACHADAS. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTE

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la lavada de cerramientos como muros y fachas con productos de limpieza y desengrasante adecuados para cada superficie.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
966.05 m²	0,00 m²	966.05 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	966.05 m²	966.05 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	

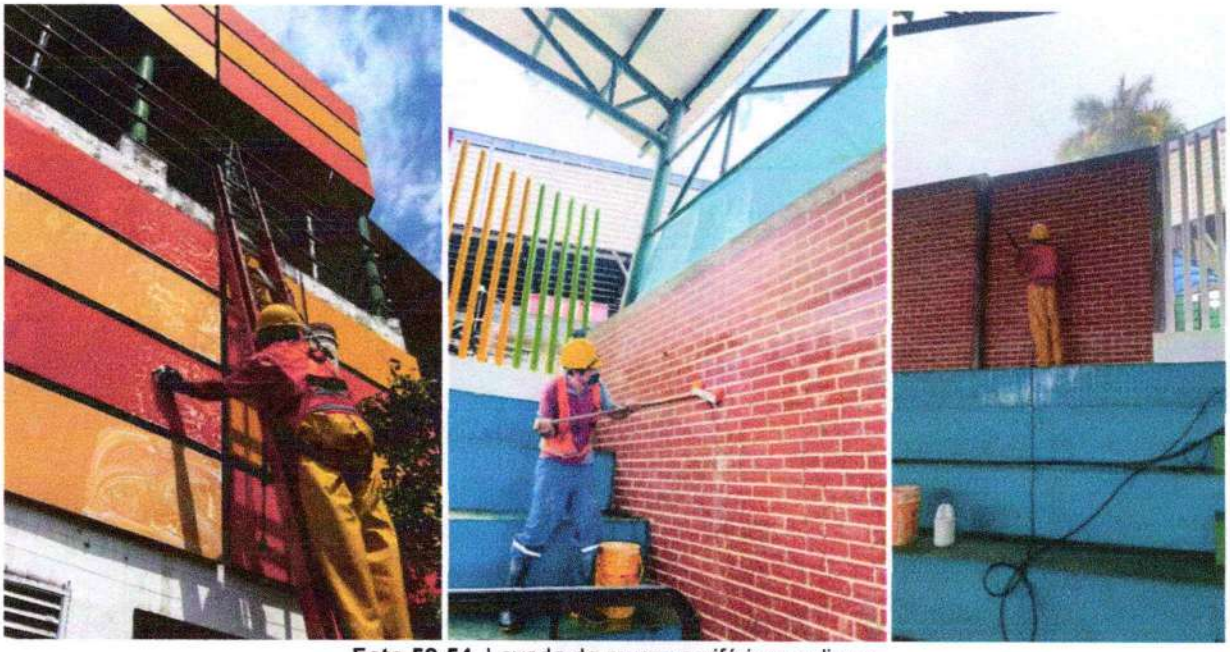


Foto 52-54. Lavada de muros periféricos coliseo.



Foto 55,56. Lavada de muros edificación "baños".

7.2 LAVADA DE ESTRUCTURA METALICA. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESENGRASANTE Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la lavada de estructura metálica con productos de limpieza como desengrasante y el equipo de trabajo necesario para realizar esta actividad.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
1873,00 ml	0,00 ml	1873,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	1873,00 ml	1873,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 57-62. Lavada de estructura metálica en coliseo.

8. CIMENTACION Y DESAGUES

8.1 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la construcción de plaza maciza de concreto de 21 MPa para parte anterior del coliseo municipal, con el fin de evitar infiltraciones.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
8,40 m²	6,75 m²	15,15 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	15,15 m²	15,15 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 63-66. Construcción de placa maciza en concreto.

9. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de grifería completa para lavamanos con llave sencilla.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
4,00 unidades	0,00 unidades	4,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 67, 68. Instalación de griferias para lavamanos.

9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA

COLISEO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de las duchas, ya que el espacio acondicionado para tal fin ya no se usa. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
4,00 unidades	-4,00 unidades	0,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	0,00 unidades	0,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

10. PINTURAS

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
981,60 ml	14,50 ml	996,10 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	996,10 ml	996,10 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina lineal a 3 manos para cerramiento periférico (tubos metálicos) del coliseo municipal. Adicionalmente, se interviene la baranda metálica que está en el sector de las graderías del costado de la vía nacional. En total se aplicaron 996,10ml de esmalte en el sector del Coliseo Municipal.



Foto 69-74. Aplicación de pintura en esmalte para tubos metálicos, coliseo.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina lineal a 3 manos en la nueva baranda (tubos metálicos) en el sector de la terraza en el nuevo paso peatonal construido. En total se aplicaron 14,50ml de esmalte en el sector de la Plaza de Mercado.



Foto 75, 76. Aplicación de pintura en esmalte, nueva baranda plaza municipal.

10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
112,32 m²	9,25 m²	121,57 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	121,57 m²	121,57 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina llena a 3 manos para puertas y ventanas del coliseo municipal, con un total de 112,32 m²

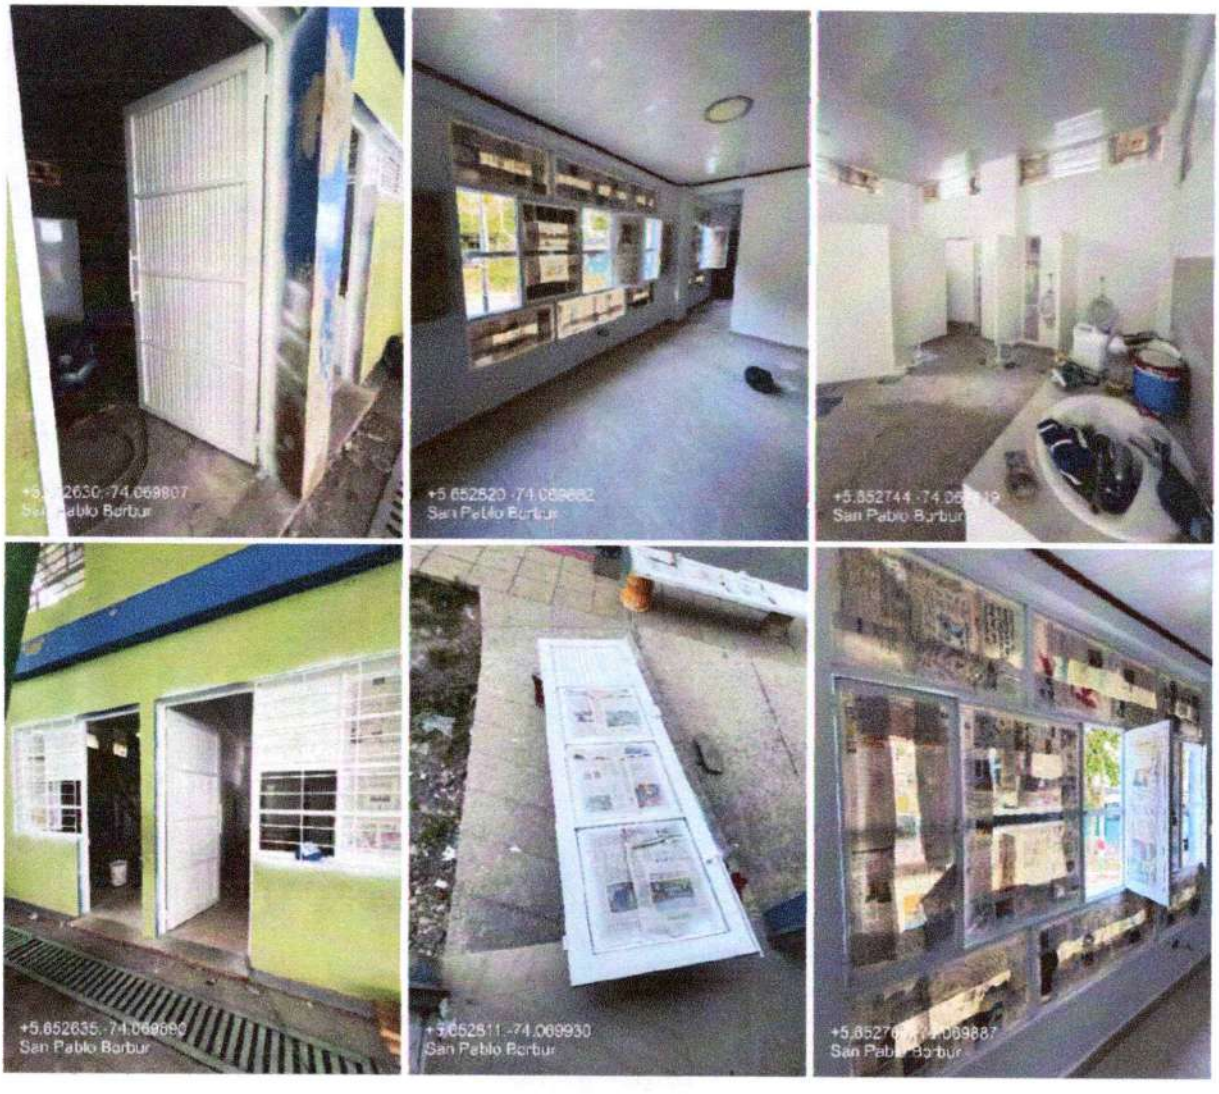




Foto 77-84. Aplicación de pintura en esmalte para puertas y ventanas, coliseo.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina llena a 3 manos para puertas y ventanas de la Plaza de Mercado, con un total de 9,25 m^2



Foto 85-87. Aplicación de pintura en esmalte, puertas plaza municipal.

10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
325,89 m²	187,78 m²	513,67 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	513,67 m²	513,67 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de vinilo tipo I en muros del edificio de baños del coliseo, así como en los muros perimetrales de este. En total en este sector se aplicaron 410,89 m².



Foto 88-92. Aplicación de pintura vinilo para muros (edificio baños).



Foto 93-97. Aplicación de pintura vinilo para muros (cerramiento).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó la aplicación de vinilo tipo I en muros de las nuevas oficinas que se adecuaron. En total en este sector se aplicaron 102,78 m².



Foto 98-101. Aplicación de pintura vinilo, oficinas plaza municipal.

11. INSTALACIONES DEPORTIVAS

11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM

COLISEO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de los tableros en Acrílico debido a que dicha instalación ya fue realizada. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
2,00 unidades	-2,00 unidades	0,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	0,00 unidades	0,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

ÍTEMS NO PREVISTOS

NP. 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidad	5,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidad	5,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de 1 salida completa para interruptor doble en instalaciones del coliseo municipal (canchas).



Foto 102, 103. Instalación de interruptor, coliseo municipal.

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de 4 salidas completas para interruptor doble en instalaciones del Auditorio Municipal (en el cuarto de controles).



Foto 104-106. Instalación de interruptores, instalaciones auditorio municipal.

NP. 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOCO LED TIPO OJO DE BUEY. INC ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación foco led tipo ojo de buey en instalaciones del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	8,00 unidades	8,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	8,00 unidades	8,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 107-108. *Instalación de foco led tipo ojo de guey, auditorio.*

NP. 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED LUJO PARA TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de lámpara led de lujo para techo en el concejo municipal y auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	6,00 unidades	6,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	***Total ejecutado:***
0,00 unidades	6,00 unidades	6,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

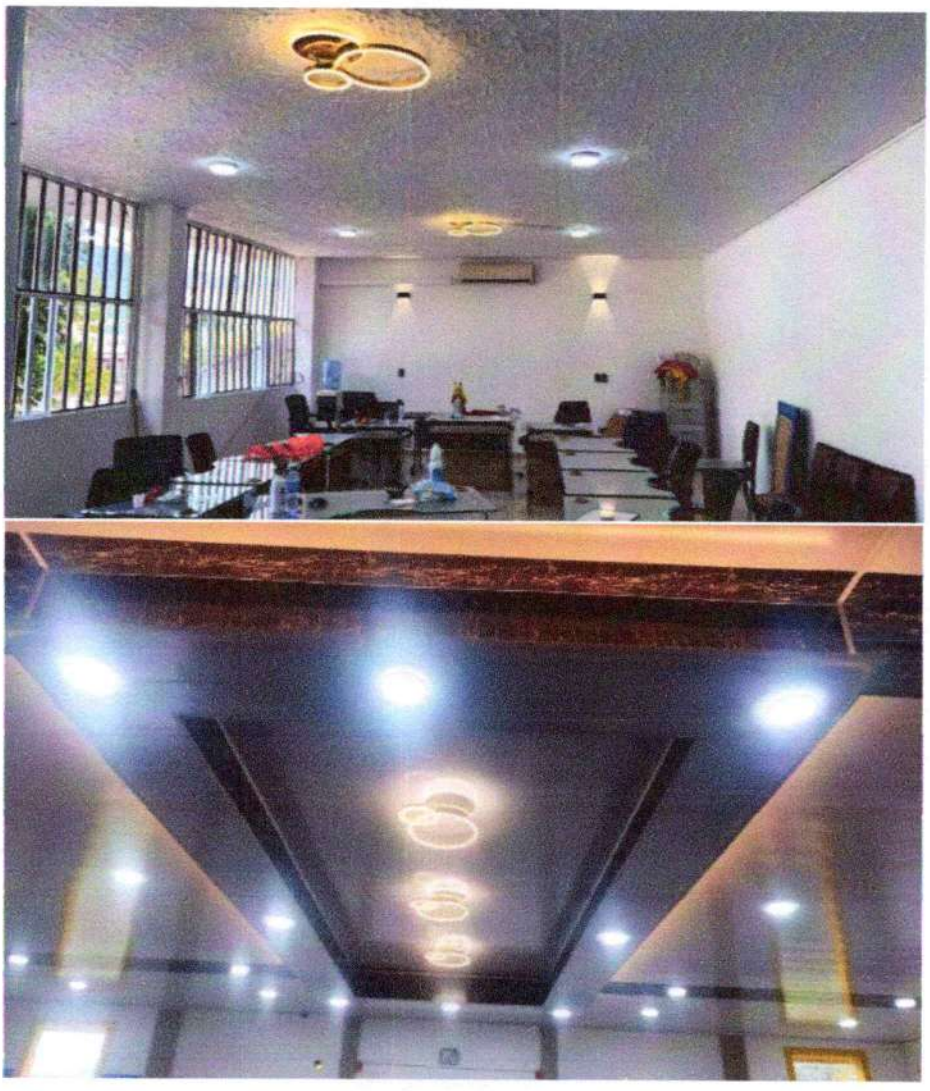


Foto 109, 110. Instalación de lámparas led de lujo, concejo y auditorio municipal.

NP. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de alimentador parcial trifásico en cable cobre No. 10 AWG para instalaciones de los nuevos Aires Acondicionados del Auditorio Municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	24,00 ml	24,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	24,00 ml	24,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 111-113. Instalación de líneaspara alimentación de aire acondicionado.

NP. 5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de tomacorrientes dobles en instalaciones del auditorio municipal (auditorio municipal, concejo municipal, pasillos biblioteca).

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	24,00 unidades	24,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	24,00 unidades	24,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

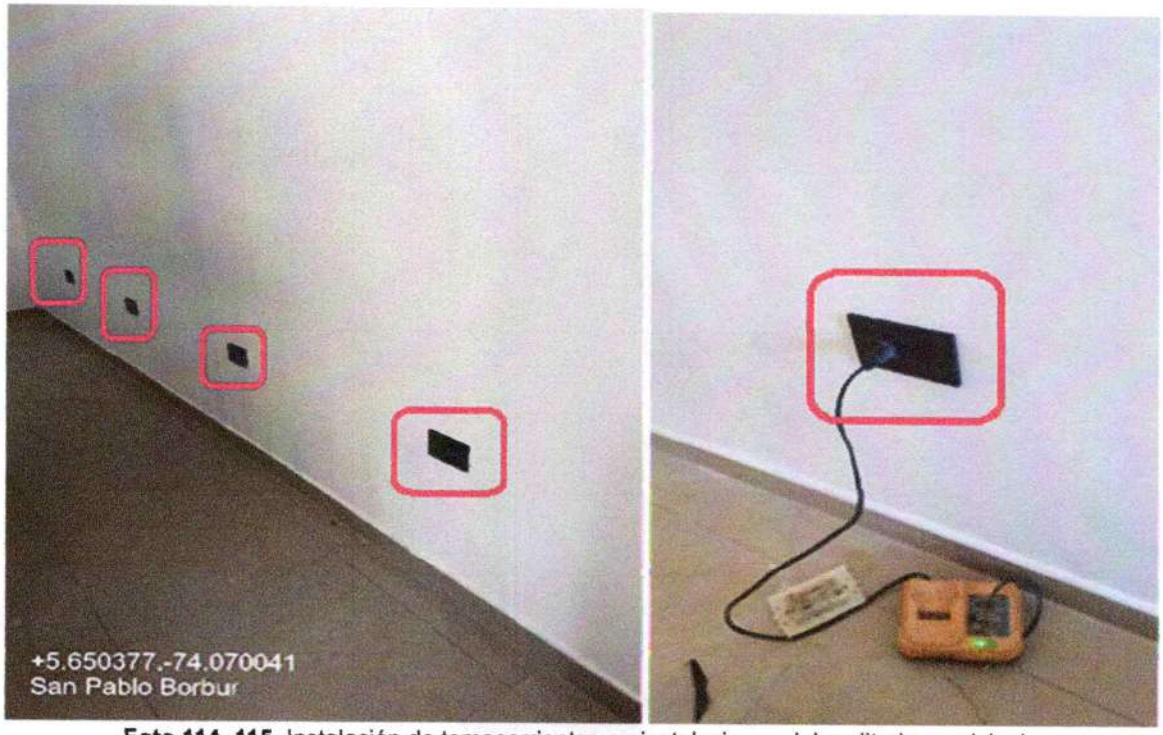


Foto 114, 115. Instalación de tomacorrientes en instalaciones del auditorio municipal.

NP. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	12,00 unidades	12,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	12,00 unidades	12,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker termomagnético monopolar para administración de los circuitos para aires acondicionados. Se instalaron 4 unidades.

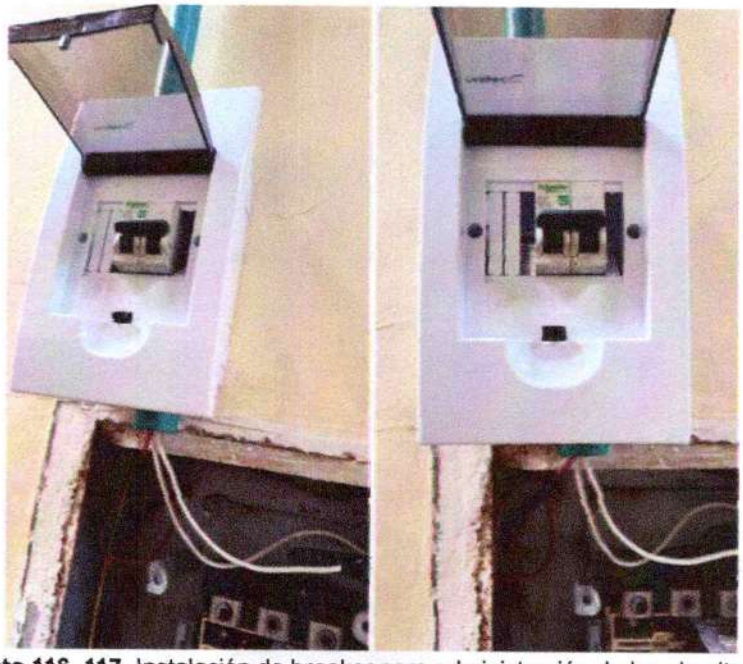


Foto 116, 117. Instalación de breaker para administración de los circuitos.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker termomagnético monopolar para administración de los circuitos para aires acondicionados. Se instalaron 8 unidades.

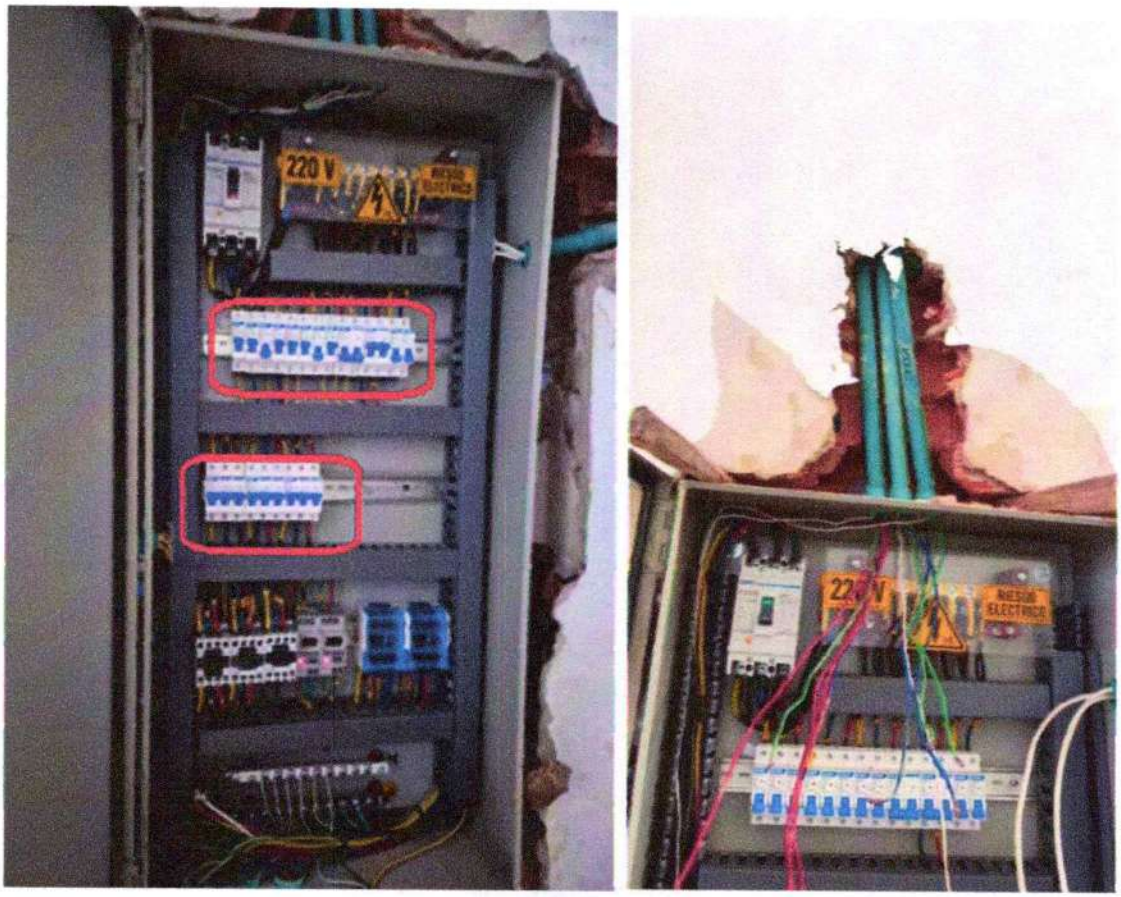


Foto 118, 119. Instalación de breaker para administración de los circuitos.

NP. 7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de interruptores sencillos en las instalaciones del auditorio municipal. En total se instalaron 5 unidades.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 120-122. Instalación de interruptores, aditorio municipal.

NP. 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de aires acondicionados de 36000 BTU para instalaciones del auditorio municipal. En total se instalaron 2 unidades.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	2,00 unidades	2,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	2,00 unidades	2,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 123-126. Instalación de aires acondicionados, auditorio municipal.

NP. 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHORRO EN CONSUMO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de válvulas de entrada para sanitarios en el coliseo municipal. En total se instalaron 7 válvulas.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	7,00 unidades	7,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	7,00 unidades	7,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 127, 128. *Instalación de válvula de entrada para sanitarios.*

NP. 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de asiento y tapa en algunos de los sanitarios ubicados en el coliseo municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	6,00 unidades	6,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	6,00 unidades	6,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 129-132. Instalación de asiento y tapa para sanitarios.

NP. 11 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el desmonte de marcos y puertas en la plaza de mercado, para el reemplazo de estas. Se realizó el desmonte de 3 puertas.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	7,68 m²	7,68 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	7,68 m²	7,68 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 133-135. Desmonte de marcos y puertas.

NP. 12 ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA

PLAZA DE MERCADO

Se realizó abertura para ventanas en las 3 nuevas oficinas de la plaza de mercado.

Contratado:	***Cant. Adicional:***	***Total contratado:***
0,00 m²	3,24 m²	3,24 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	3,24 m²	3,24 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	









Foto 136-139. Abertura de vanos para ventanas.

NP. 13 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

PLAZA DE MERCADO

Se realizaron filos y dilataciones en lugares donde se realizaron aberturas de vanos, para la instalación de Puertas y Ventanas.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	26,78 ml	26,78 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	26,78 ml	26,78 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	







Foto 140-142. Filos y dilataciones para vanos.

NP. 14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de panel cuadrado de incrustar en 2 de las oficinas de la plaza de mercado. En total se instalaron 4 unidades.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 143, 144. Instalación de panel led cuadrado.

NP. 15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR. CAL 14. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de lámina alfajor calibre 14, para nueva rampa de acceso a oficina en la plaza de mercado. En total se instalaron 3,00 m²

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	3,00 m²	3,00 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	***Total ejecutado:***
0,00 m²	3,00 m²	3,00 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 145, 146. Instalación de lámina en alfajor para pasillo nuevo.

NP. 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de baranda metálica para uno costados de la nueva rampa de acceso a oficina en la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 kg	21,71 kg	21,71 kg
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 kg	21,71 kg	21,71 kg
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 kg	0,00 kg	



Foto 147, 148. Instalación de barandas metálicas para rampa de acceso.

NP. 17 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro, fabricación, figurada y montaje de estructura metálica para nuevo paso metálico (nuevo pasillo – rampa).

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 kg	58,81 kg	58,81 kg
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 kg	58,81 kg	58,81 kg
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 kg	0,00 kg	



Foto 149, 150. Fabricación de estructura metálica para rampa de acceso.

NP. 18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de marco y puerta de acceso en aluminio para oficina en la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	1,84 m²	1,84 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 m²	1,84 m²	1,84 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 151, 152. Instalación de puerta de acceso en aluminio.

NP. 19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio para 2 oficinas de la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m^2	3,24 m^2	3,24 m^2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 m^2	3,24 m^2	3,24 m^2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m^2	0,00 m^2	



Foto 153, 154. Instalación de ventana corrediza para oficinas.

NP. 20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1 1/2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON PUNTOS DE AMARRE, CERRADURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de puerta en vidrio templado incoloro para oficinas en la plaza de mercado. En total se instalaron 2 puertas, con un total de 5,78 m^2.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m^2	5,78 m^2	5,78 m^2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m^2	5,78 m^2	5,78 m^2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m^2	0,00 m^2	



Foto 155, 156. Instalación de puertas en vidrio templado.

NP. 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de cerradura para puertas de baños en la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas *anteriores:*	**Cantidades ejecutadas presente *acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 157-159. Instalación de cerraduras en puertas de baños.

NP. 22 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MORTERO Y PINTURA TIPO SIKA. IMPRIMACION 1:1, DOS CAPAS PURAS

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la impermeabilización de viga canal con mortero y pintura Sika para oficinas del segundo piso del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	6,50 ml	6,50 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 ml	6,50 ml	6,50 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 160-162. Impermeabilización de viga canal con mortero.



Foto 163-165. Impermeabilización de viga canal con pintura tipo sika.

NP. 23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de tubería de aguas lluvias de 2" en PVC para bajante de aguas lluvias para la canal del sector de oficinas del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	3,00 ml	3,00 ml
Cantidades ejecutadas actas *anteriores:*	**Cantidades ejecutadas presente *acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 ml	3,00 ml	3,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 166, 167. Instalación de bajante en tubería PVC de 2".

NP. 24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN).

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de cinta asfáltica impermeabilizante de 0,20 m para protección de la cubierta en donde se instalaron los flanches.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	13,50 ml	13,50 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,50 ml	13,50 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

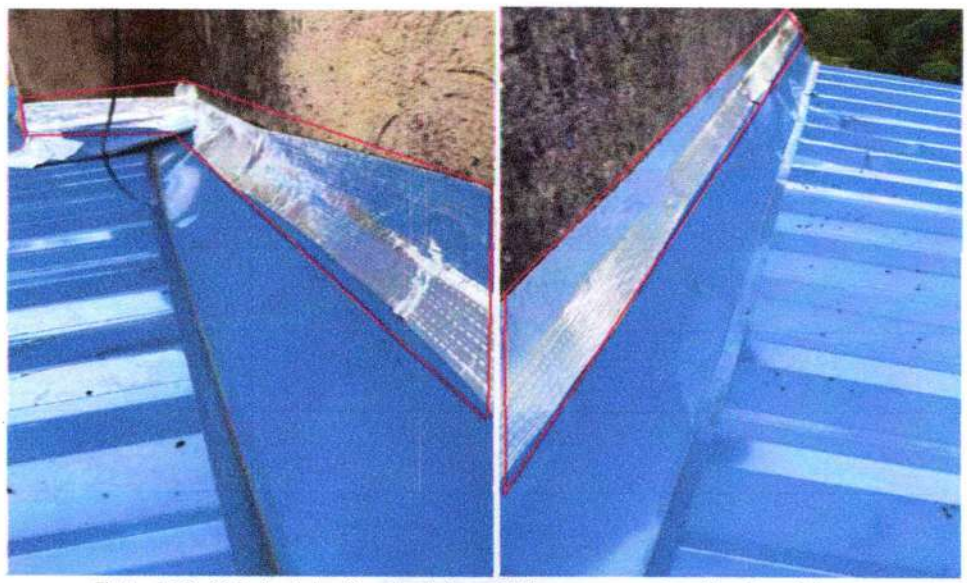


Foto 168, 169. Instalación de cinta asfáltica para protección de cubierta.

NP. 25 DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO. INC SUSPENSION DEL CONEXIONADO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el desmonte de tablero eléctrico trifásico en las instalaciones del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas *anteriores:*	**Cantidades ejecutadas presente *acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 170, 171. Desmonte de tablero eléctrico trifásico.

NP. 26 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO TRIFASICO EMPOTRADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS. INC CONEXIONADO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de gabinete eléctrico trifásico empotrado para control de alumbrado y transferencias automáticas, en el coliseo municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 172-174. Instalación de gabinete eléctrico trifásico empotrado.

NP. 27 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELECTRICO TRIFÁSICO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de barraje eléctrico trifásico para control interno de las dos canchas deportivas y un alumbrado periférico exterior del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

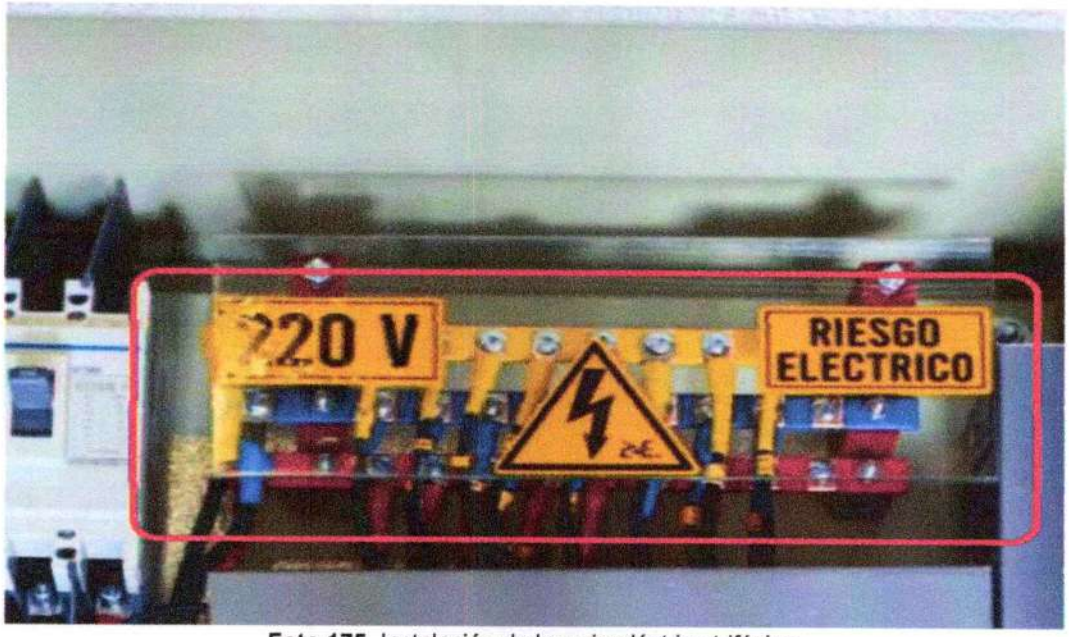


Foto 175. Instalación de barraje eléctrico trifásico.

NP. 28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de contactor eléctrico electromagnético para control interno de las dos canchas deportivas y un alumbrado periférico exterior del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

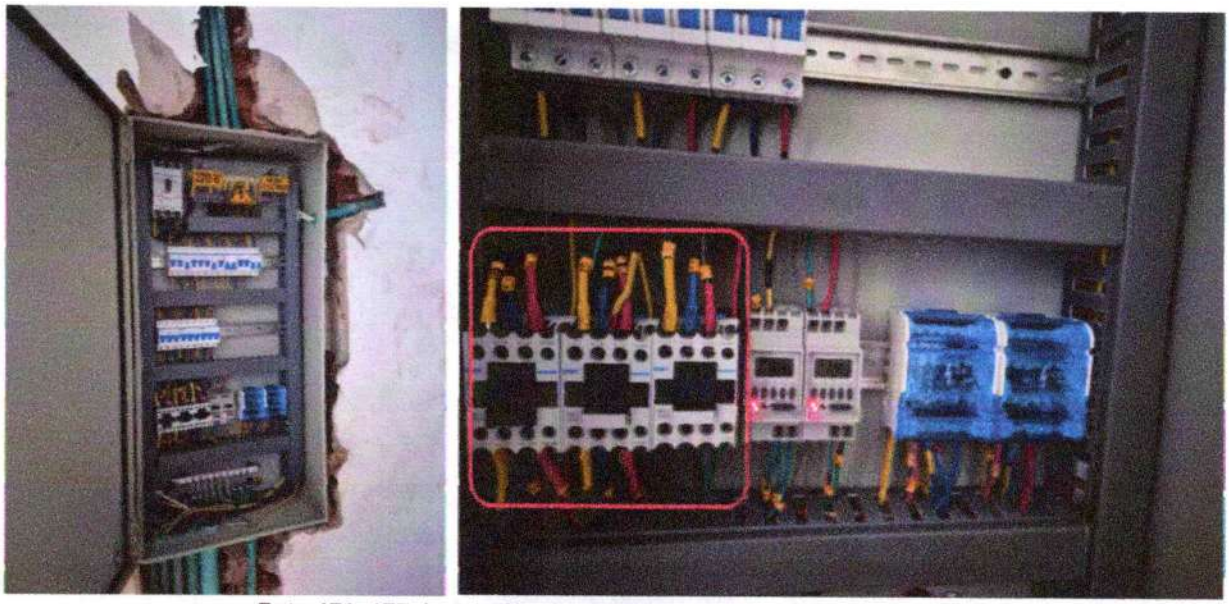


Foto 176, 177. Instalación de contactor eléctrico electromagnético.

NP. 29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL A 220V. INC PROGRAMACION DE TIEMPOS DE SERVICIO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de temporizador (relojes) electrónico digital para control interno de las dos canchas deportivas y un alumbrado periférico exterior del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

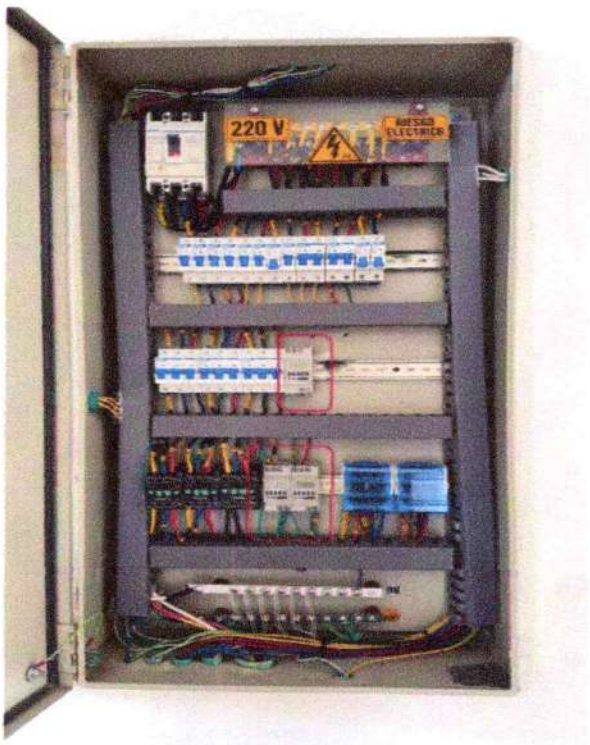


Foto 178. Instalación de temporizador electrónico digital.

NP. 30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 7,0M.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salidas para iluminación expuesta en cable encauchetado para nuevas lámparas colgantes.

Contratado: 0,00 unidades	**Cant. Adicional:** 35,00 unidades	**Total contratado:** 35,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores: 0,00 unidades	***Cantidades ejecutadas presente acta:*** 35,00 unidades	**Total ejecutado:** 35,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 unidades	**Menores cantidades ejecutadas:** 0,00 unidades	



Foto 179, 180. Salida para iluminación expuesta para nuevas lámparas colgantes.

NP. 31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA EN ACERO DE 1/8". INC GRILLETES

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de guaya en acero para cada una de las lámparas colgantes.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	87,50 ml	87,50 ml
Cantidades ejecutadas actas *anteriores:*	**Cantidades ejecutadas presente *acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 ml	87,50 ml	87,50 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

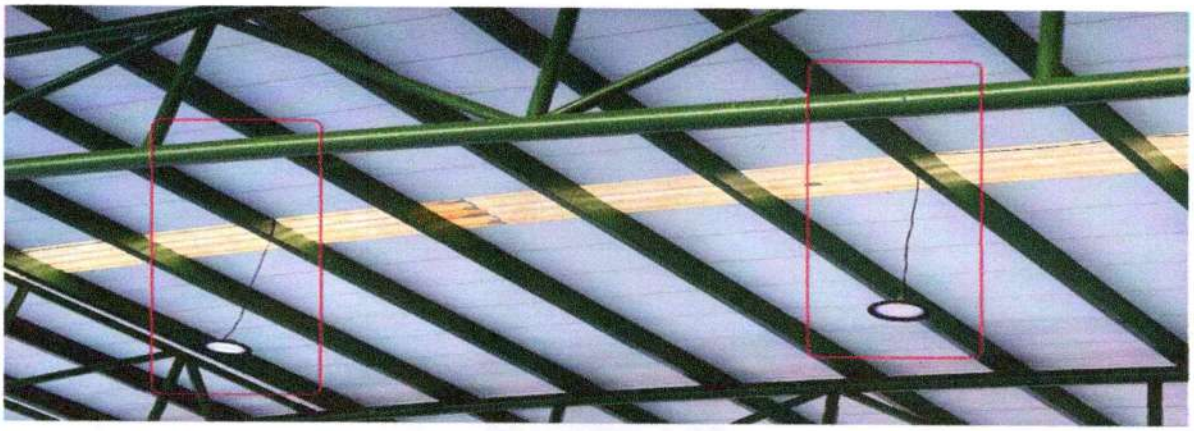






Foto 181-183. Instalación de guaya en acero para cada lámpara.

NP. 32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de alimentador parcial monofásico expuesto en tubería EMT, para las luminarias de las graderías que van para el costado de la vía nacional.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	30,00 ml	30,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	30,00 ml	30,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

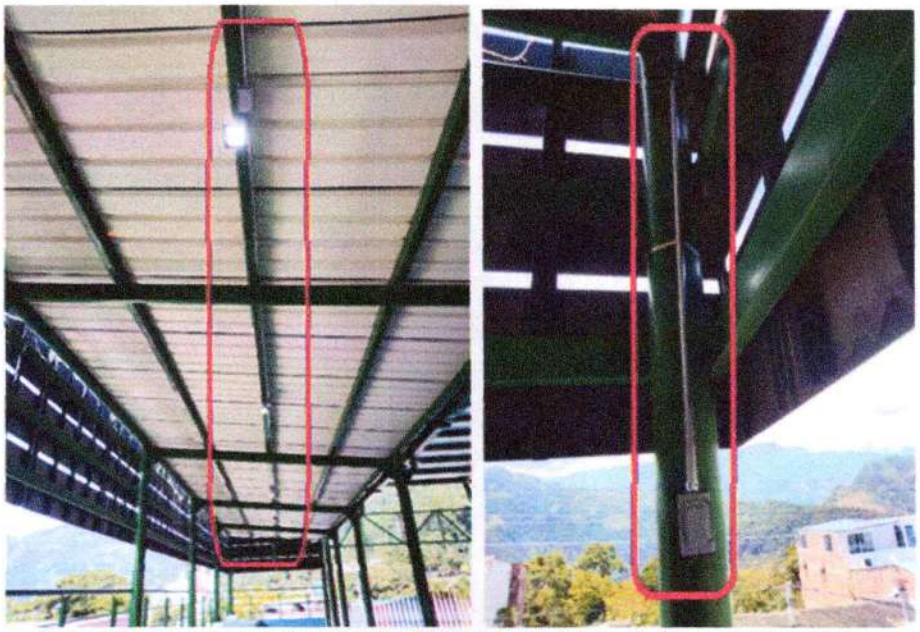


Foto 184, 185. Instalación de alimentador parcial monofásico para luminarias.

NP. 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO)

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salida completa para tomacorriente en el sector del nuevo gabinete eléctrico.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 186. Instalación de salida completa para tomacorriente.

NP. 34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salida completa para tomacorriente bifásico en el sector del nuevo gabinete eléctrico.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 187, 188. Instalación de salida completa para tomacorriente bifásico.

NP. 35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de tomacorriente monofásico tipo GFCI para tomas en las gradas al costado de la vía nacional y al costado de la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

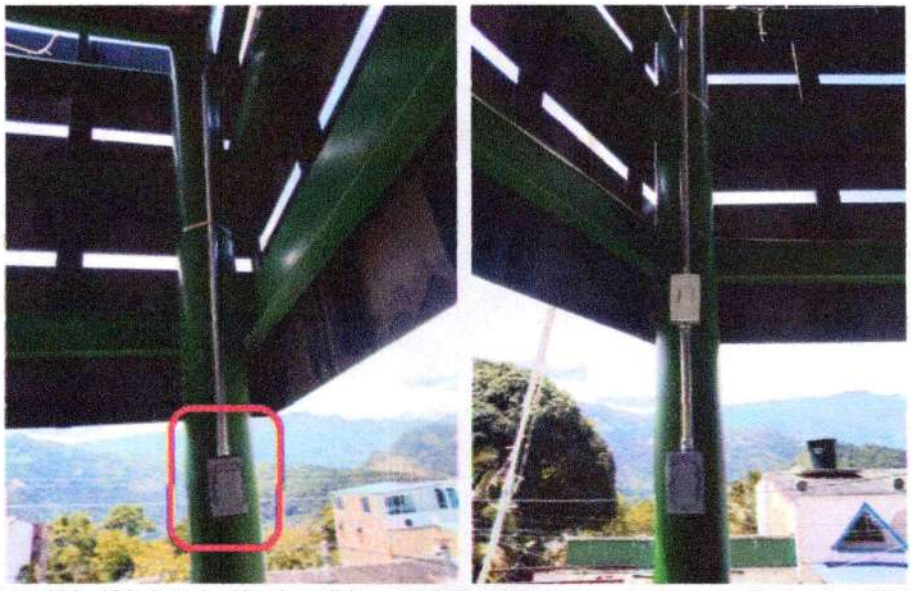


Foto 189, 190. Instalación de salida completa para tomacorriente monofásico tipo GFCI.

NP. 36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salida de iluminación expuesta para nuevos reflectores en graderías que dan a la vía nacional.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

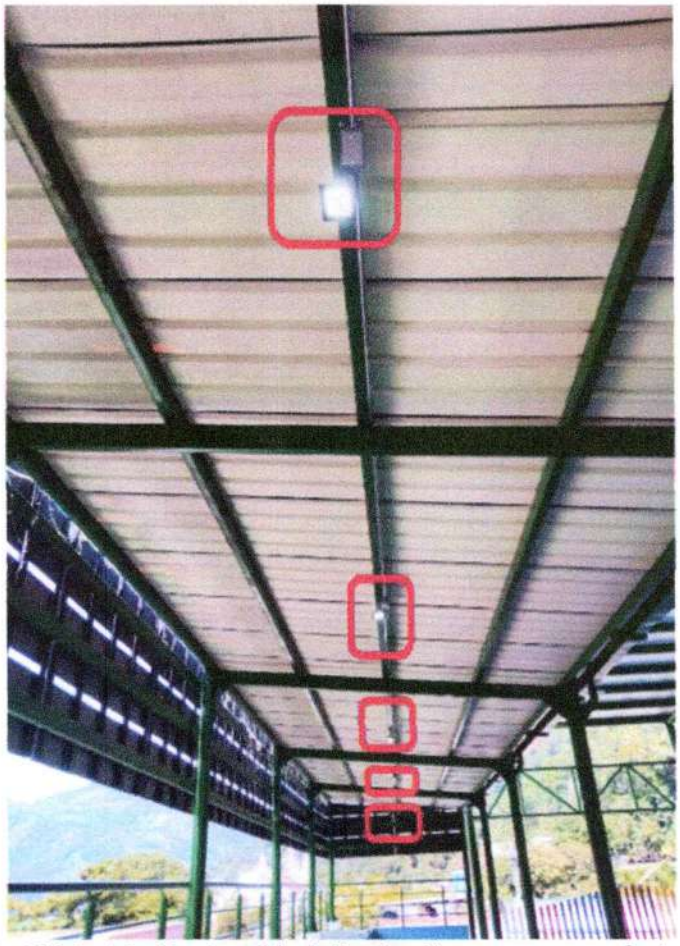


Foto 191. Instalación de salida de iluminación para nuevos reflectores.

NP. 37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de reflector para iluminación en las graderías al lado dela vía nacional.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 192, 193. Instalación de reflectores led de 50 W.

NP. 38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker termomagnético bipolar en el nuevo gabinete para protección de circuitos.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

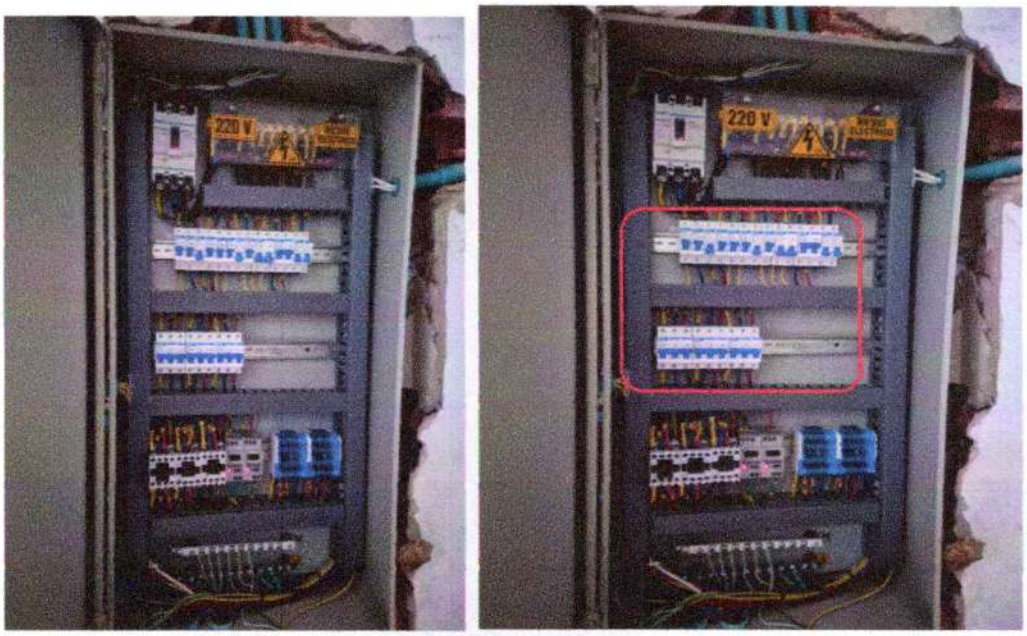


Foto 194, 195. Instalación de breaker para gabinete nuevo.

NP. 39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker totalizador tipo industrial en el nuevo gabinete para protección de circuitos.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	***Cantidades ejecutadas presente acta:***	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

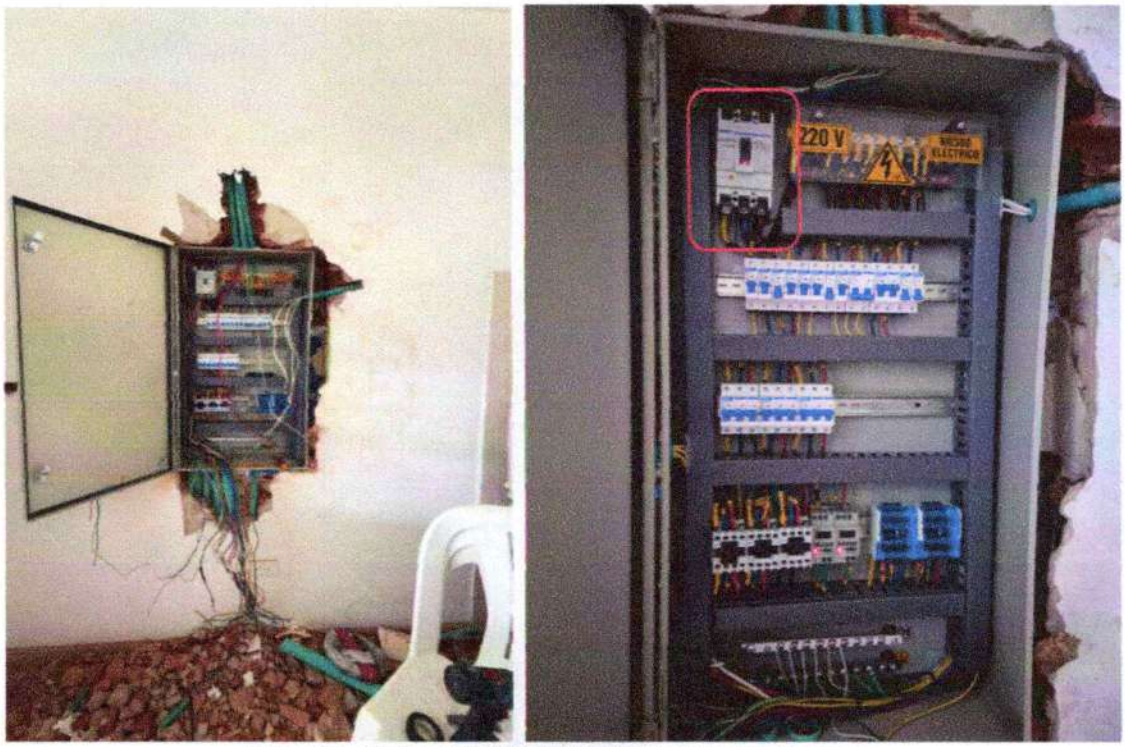


Foto 196, 197. Instalación de breaker para gabinete nuevo.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE IMPREVISTOS CAUSADOS – ACTA DE LIQUIDACIÓN

El valor correspondiente al rubro de Imprevistos, en esta Acta corresponde a ***$ 1.593.529,63*** y corresponde al porcentaje establecido contractualmente (1%) aplicado sobre el subtotal ejecutado de costos directos a la fecha del presente informe. Dicho valor corresponde únicamente a las actividades realmente ejecutadas y verificadas en campo, sin representar cobros adicionales o ajenos al alcance contractual.

Este rubro cubre las contingencias menores e inevitables que surgieron durante la ejecución de la obra en el periodo que actualmente se está cobrando, necesarias para garantizar la continuidad, seguridad y correcta adecuación de las instalaciones del Auditorio Municipal, el Coliseo Municipal y la Plaza de Mercado.

A continuación, se relacionan las actividades que justifican la causación del valor de imprevistos:

1. AUDITORIO MUNICIPAL. Cielo Falso

Teniendo en cuenta que se requirió la instalación del Cielo Falso con un descolgado en el centro; se requirió instalar Cielo Falso adicional tanto para las tapas laterales como toda la parte plana del descolgadizo.

2. AUDITORIO MUNICIPAL. Luces indirectas en el Cielo Falso

Como parte de los acabados y para lograr mejores terminaciones, se realizó la instalación de luces indirectas en toda la parte periférica del descolgadizo.

3. COLISEO MUNICIPAL. Pintura en esmalte para la estructura de la parte alta de la cubierta.

Debido a que se encontró afectaciones (corrosión evidenciada después de realizar el lavado y limpieza de la estructura) en algunas partes de la estructura, específicamente en las correas que soportan la cubierta, se aplicó pintura tipo anticorrosivo tanto en las correas longitudinales como en la estructura que soporta dichas correas. Así mismo, se aplicó pintura en parte de las Columnas principales de la estructura.

4. COLISEO MUNICIPAL. Lavado de andenes

Como complemento a las intervenciones realizadas, se realizó el lavado periférico de los andenes con Hidro lavadora.

5. COLISEO. Instalación de vidrios.

En el sector de los baños se realiza el suministro e instalación de cinco (5) vidrios para igual número de ventanas.

6. PLAZA DE MERCADO (sector oficina de la terraza).

Se requirió la Construcción de escalón (incluyendo pañetes y pintura) para mayor acceso a la oficina.

7. PLAZA DE MERCADO (sector oficina de la terraza). Construcción de muro

Se requirió construir un muro de 0,60m de ancho por 2,10m de alto en bloque para poder instalar la puerta de acceso a la oficina. El muro se debió pañetar por ambas caras.

8. PLAZA DE MERCADO (sector oficina de la terraza). Adecuación de ventana en Aluminio e Instalación de Vidrio

Para poder utilizar una ventana existente se debió cortarla y mandarla adecuar al espacio disponible. Esta ventana se instaló por el mismo costado donde se instaló la nueva puerta. Finalmente, una vez instalada la ventana, se suministró e instaló el vidrio correspondiente.

En conjunto, estas contingencias son inherentes a la naturaleza de un proyecto y no generan modificación del objeto contractual, pero sí causan costos indirectos que deben ser reconocidos conforme al porcentaje pactado.

El valor de ***$ 1.593.529,63*** corresponde al total ejecutado en la presente acta de liquidación y se encuentra dentro de los parámetros técnicos, contractuales y normativos establecidos para la correcta ejecución del proyecto.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SABANA DE CANTIDADES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR			FECHA DE INICIO:	24-nov-2025	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION		$ 207.158.852,14		FECHA REINICIO No. 02		05-jun-2026			
CONTRATISTA.	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S		CONTRATO No.	003-2025	VALOR INICIAL:	$ 142.869.009,65	FECHA SUSPENSIÓN No. 01		29-dic-2025		FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 02		10-ago-2026		
INTERVENTOR:	N/A		CONTRATO No.	N/A	VALOR A ADICIONAR:	$ 64.289.842,49	FECHA REINICIO No. 01		19-ene-2026		VALOR ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO 40%)		$ 57.147.603,86			
							FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 01		12-abr-2026		VALOR PRESENTE ACTA		$ 150.011.248,28			
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ				PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS	FECHA SUSPENSIÓN No. 02		08-abr-2026		FECHA PRESENTE ACTA		29-jul-2026			

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
A		AUDITORIO MUNICIPAL															
1		PRELIMINARES															
1.1	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	294,15	$ 9.430,39	$ 2.773.961,23				294,15	$ 2.773.961,23		$ 0,00	294,15	$ 2.773.961,23	0,00	$ -
1.2	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	194,62	$ 20.819,48	$ 4.051.887,20				194,62	$ 4.051.887,20		$ 0,00	194,62	$ 4.051.887,20	0,00	$ -
1.3	APU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIGA CANAL. INC IMPERMEABILIZACION	ML	13,15	$ 37.800,00	$ 497.070,00				13,15	$ 497.070,00		$ 0,00	13,15	$ 497.070,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 7.322.918,43**			**$ 0,00**		**$ 7.322.918,43**		**$ 0,00**		**$ 7.322.918,43**		**$ -**
2		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS															
2.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	2,00	$ 768.162,39	$ 1.536.324,78				2,00	$ 1.536.324,78		$ 0,00	2,00	$ 1.536.324,78	0,00	$ -
2.2	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	2,00	$ 106.836,96	$ 213.673,92				2,00	$ 213.673,92		$ 0,00	2,00	$ 213.673,92	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 1.749.998,69**			**$ 0,00**		**$ 1.749.998,69**		**$ 0,00**		**$ 1.749.998,69**		**$ -**
3		PINTURA															
3.1	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	13,15	$ 8.884,99	$ 116.837,58				13,15	$ 116.837,58		$ 0,00	13,15	$ 116.837,58	0,00	$ -
3.2	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	84,00	$ 22.987,47	$ 1.930.947,08				84,00	$ 1.930.947,08		$ 0,00	84,00	$ 1.930.947,08	0,00	$ -
3.3	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	621,52	$ 12.214,40	$ 7.591.506,35				621,52	$ 7.591.506,35		$ 0,00	621,52	$ 7.591.506,35	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 9.639.291,01**			**$ 0,00**		**$ 9.639.291,01**		**$ 0,00**		**$ 9.639.291,01**		**$ -**
4		CUBIERTA															
4.1	1.12.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	194,62	$ 66.236,32	$ 12.890.913,45				194,62	$ 12.890.913,45		$ 0,00	194,62	$ 12.890.913,45	0,00	$ -
4.2	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	13,15	$ 56.638,94	$ 744.802,02				13,15	$ 744.802,02		$ 0,00	13,15	$ 744.802,02	0,00	$ -
4.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	39,45	$ 23.794,26	$ 938.683,46	118,35		$ 2.816.050,39	157,80	$ 3.754.733,85		$ 0,00	157,80	$ 3.754.733,85	0,00	$ -
4.4	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	13,15	$ 159.433,32	$ 2.096.548,09		-13,15	-$ 2.096.548,09	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4.5	ICCU 7.5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	24,00	$ 56.079,00	$ 1.345.896,00		-24,00	-$ 1.345.896,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 18.016.843,03**			**-$ 626.393,71**		**$ 17.390.449,32**		**$ 0,00**		**$ 17.390.449,32**		**$ -**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SABANA DE CANTIDADES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR	FECHA DE INICIO:	24-nov-2025	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION	$ 207.158.852,14	FECHA REINICIO No. 02	05-jun-2026		
CONTRATISTA.	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO No. 003-2025	VALOR INICIAL: $ 142.869.009,65	FECHA SUSPENSIÓN No. 01	29-dic-2025	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 02	10-ago-2026		
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No. N/A	VALOR A ADICIONAR: $ 64.289.842,49	FECHA REINICIO No. 01	19-ene-2026	VALOR ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO 40%)	$ 57.147.603,86		
				FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 01	12-abr-2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 150.011.248,28		
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS	FECHA SUSPENSIÓN No. 02	08-abr-2026	FECHA PRESENTE ACTA	29-jul-2026		

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
5		**INSTALACIONES ELECTRICAS**															
5.1	2.10.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	25,00	$ 45.771,25	$ 1.144.281,33	31,00		$ 1.418.908,85	56,00	$ 2.563.190,18		$ 0,00	56,00	$ 2.563.190,18	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 1.144.281,33**			**$ 1.418.908,85**		**$ 2.563.190,18**		**$ 0,00**		**$ 2.563.190,18**		**$ -**
6		**CIELO RASOS**															
6.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	178,10	$ 83.710,94	$ 14.909.002,20				178,10	$ 14.909.002,20		$ 0,00	178,10	$ 14.909.002,20	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 14.909.002,20**			**$ 0,00**		**$ 14.909.002,20**		**$ 0,00**		**$ 14.909.002,20**		**$ -**
B		**COLISEO SAN PABLO DE BORBUR**															
7		**PRELIMINARES**															
7.1	APU	LAVADA DE CERRAMIENTOS, MUROS Y FACHADAS. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTE.	M2	966,05	$ 12.575,48	$ 12.148.542,45				966,05	$ 12.148.542,45		$ 0,00	966,05	$ 12.148.542,45	0,00	$ -
7.2	APU	LAVADA DE ESTRUCTURA METALICA. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESENGRASANTE Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA.	ML	1873,00	$ 14.000,00	$ 26.222.000,00				1.873,00	$ 26.222.000,00		$ 0,00	1.873,00	$ 26.222.000,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 38.370.542,45**			**$ 0,00**		**$ 38.370.542,45**		**$ 0,00**		**$ 38.370.542,45**		**$ -**
8		**CIMENTACION Y DESAGUES**															
8.1	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	8,40	$ 175.768,79	$ 1.476.457,84	6,75		$ 1.186.439,34	15,15	$ 2.662.897,17		$ 0,00	15,15	$ 2.662.897,17	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 1.476.457,84**			**$ 1.186.439,34**		**$ 2.662.897,17**		**$ 0,00**		**$ 2.662.897,17**		**$ -**
9		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**															
9.1	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	4,00	$ 106.836,96	$ 427.347,84				4,00	$ 427.347,84		$ 0,00	4,00	$ 427.347,84	0,00	$ -
9.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	4,00	$ 148.456,79	$ 593.827,16		-4,00	-$ 593.827,16	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 1.021.174,99**			**-$ 593.827,16**		**$ 427.347,84**		**$ 0,00**		**$ 427.347,84**		**$ -**
10		**PINTURAS**															
10.1	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	981,60	$ 8.884,99	$ 8.721.503,44	14,50		$ 128.832,31	996,10	$ 8.850.335,75		$ 0,00	996,10	$ 8.850.335,75	0,00	$ -
10.2	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	112,32	$ 22.987,47	$ 2.581.952,09	9,25		$ 212.834,05	121,57	$ 2.794.586,14		$ 0,00	121,57	$ 2.794.586,14	0,00	$ -
10.3	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	325,89	$ 12.214,40	$ 3.980.513,96	187,76		$ 2.293.620,11	513,67	$ 6.274.134,07		$ 0,00	513,67	$ 6.274.134,07	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 15.283.969,49**			**$ 2.635.086,47**		**$ 17.919.055,96**		**$ 0,00**		**$ 17.919.055,96**		**$ -**
11		**INSTALACIONES DEPORTIVAS**															

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SABANA DE CANTIDADES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR	FECHA DE INICIO:	24-nov-2025	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION	$ 207.158.852,14	FECHA REINICIO No. 02	05-jun-2026
CONTRATISTA.	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO No. 003-2025 VALOR INICIAL:	$ 142.869.009,65	FECHA SUSPENSIÓN No. 01	29-dic-2025	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 02	10-ago-2026
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No. N/A VALOR A ADICIONAR:	$ 64.289.842,49	FECHA REINICIO No. 01	19-ene-2026	VALOR ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO 40%)	$ 57.147.603,86
				FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 01	12-abr-2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 150.011.248,28
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS	FECHA SUSPENSIÓN No. 02	08-abr-2026	FECHA PRESENTE ACTA	29-jul-2026

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
11.1	2.18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UND	2,00	$ 482.379,36	$ 964.758,73		-2,00	-$ 964.758,73	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 964.758,73			-$ 964.758,73		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS																
NP. 1	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		$ 127.317,96	$ -	5,00		$ 636.589,80	5,00	$ 636.589,80		$ 0,00	5,00	$ 636.589,80	0,00	$ -
NP. 2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION FOCO LED TIPO OJO DE BUEY. INC ADAPTADORES PARA LA INSTALACION	UND		$ 23.774,37	$ -	8,00		$ 190.194,96	8,00	$ 190.194,96		$ 0,00	8,00	$ 190.194,96	0,00	$ -
NP. 3	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED LUJO PARA TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND		$ 302.709,75	$ -	6,00		$ 1.816.258,50	6,00	$ 1.816.258,50		$ 0,00	6,00	$ 1.816.258,50	0,00	$ -
NP. 4	2.10.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	ML		$ 32.902,45	$ -	24,00		$ 789.658,80	24,00	$ 789.658,80		$ 0,00	24,00	$ 789.658,80	0,00	$ -
NP. 5	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND		$ 22.359,26	$ -	24,00		$ 536.622,24	24,00	$ 536.622,24		$ 0,00	24,00	$ 536.622,24	0,00	$ -
NP. 6	2.10.208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	UND		$ 29.540,14	$ -	12,00		$ 354.481,68	12,00	$ 354.481,68		$ 0,00	12,00	$ 354.481,68	0,00	$ -
NP. 7	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 18.022,55	$ -	5,00		$ 90.112,75	5,00	$ 90.112,75		$ 0,00	5,00	$ 90.112,75	0,00	$ -
NP. 8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UND		$ 6.210.000,00	$ -	2,00		$ 12.420.000,00	2,00	$ 12.420.000,00		$ 0,00	2,00	$ 12.420.000,00	0,00	$ -
NP. 9	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHORRO EN CONSUMO	UND		$ 72.273,87	$ -	7,00		$ 505.917,09	7,00	$ 505.917,09		$ 0,00	7,00	$ 505.917,09	0,00	$ -
NP. 10	2.12.190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO	UND		$ 67.656,48	$ -	6,00		$ 405.938,88	6,00	$ 405.938,88		$ 0,00	6,00	$ 405.938,88	0,00	$ -
NP. 11	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2		$ 31.209,12	$ -	7,68		$ 239.686,04	7,68	$ 239.686,04		$ 0,00	7,68	$ 239.686,04	0,00	$ -
NP. 12	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	M2		$ 24.171,56	$ -	3,24		$ 78.315,85	3,24	$ 78.315,85		$ 0,00	3,24	$ 78.315,85	0,00	$ -
NP. 13	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML		$ 13.821,20	$ -	26,78		$ 370.131,74	26,78	$ 370.131,74		$ 0,00	26,78	$ 370.131,74	0,00	$ -
NP. 14	2.10.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	UND		$ 190.764,69	$ -	4,00		$ 763.058,76	4,00	$ 763.058,76		$ 0,00	4,00	$ 763.058,76	0,00	$ -
NP. 15	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR. CAL 14. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	M2		$ 207.364,16	$ -	3,00		$ 622.092,48	3,00	$ 622.092,48		$ 0,00	3,00	$ 622.092,48	0,00	$ -
NP. 16	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG		$ 24.042,70	$ -	21,71		$ 521.967,02	21,71	$ 521.967,02		$ 0,00	21,71	$ 521.967,02	0,00	$ -
NP. 17	3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG		$ 26.043,49	$ -	58,81		$ 1.531.617,65	58,81	$ 1.531.617,65		$ 0,00	58,81	$ 1.531.617,65	0,00	$ -
NP. 18	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2		$ 553.268,59	$ -	1,84		$ 1.018.014,21	1,84	$ 1.018.014,21		$ 0,00	1,84	$ 1.018.014,21	0,00	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SABANA DE CANTIDADES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR	FECHA DE INICIO:	24-nov-2025	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION	$ 207.158.852,14	FECHA REINICIO No. 02	05-jun-2026		
CONTRATISTA.	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO No. 003-2025	VALOR INICIAL: $ 142.869.009,65	FECHA SUSPENSIÓN No. 01	29-dic-2025	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 02	10-ago-2026		
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No. N/A	VALOR A ADICIONAR: $ 64.289.842,49	FECHA REINICIO No. 01	19-ene-2026	VALOR ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO 40%)	$ 57.147.603,86		
				FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 01	12-abr-2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 150.011.248,28		
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS	FECHA SUSPENSIÓN No. 02	08-abr-2026	FECHA PRESENTE ACTA	29-jul-2026		

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
NP. 19	2.15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	M2		$ 420.228,89	$ -	3,24		$ 1.361.541,60	3,24	$ 1.361.541,60		$ 0,00	3,24	$ 1.361.541,60	0,00	$ -
NP. 20	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1 1/2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON PUNTOS DE AMARRE, CERRADURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 876.734,67	$ -	5,78		$ 5.079.086,39	5,78	$ 5.079.086,39		$ 0,00	5,78	$ 5.079.086,39	0,00	$ -
NP. 21	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	UND		$ 105.270,17	$ -	5,00		$ 526.350,85	5,00	$ 526.350,85		$ 0,00	5,00	$ 526.350,85	0,00	$ -
NP. 22	APU	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MORTERO Y PINTURA TIPO SIKA. IMPRIMACION 1:1, DOS CAPAS PURAS	ML		$ 72.819,58	$ -	6,50		$ 473.327,27	6,50	$ 473.327,27		$ 0,00	6,50	$ 473.327,27	0,00	$ -
NP. 23	2.12.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC	ML		$ 31.327,39	$ -	3,00		$ 93.982,17	3,00	$ 93.982,17		$ 0,00	3,00	$ 93.982,17	0,00	$ -
NP. 24	2.08.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN).	ML		$ 41.446,87	$ -	13,50		$ 559.532,75	13,50	$ 559.532,75		$ 0,00	13,50	$ 559.532,75	0,00	$ -
NP. 25	APU	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO. INC SUSPENSION DEL CONEXIONADO	UND		$ 297.694,41	$ -	3,00		$ 893.083,23	3,00	$ 893.083,23		$ 0,00	3,00	$ 893.083,23	0,00	$ -
NP. 26	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO TRIFASICO EMPOTRADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS. INC CONEXIONADO	UND		$ 1.770.758,18	$ -	1,00		$ 1.770.758,18	1,00	$ 1.770.758,18		$ 0,00	1,00	$ 1.770.758,18	0,00	$ -
NP. 27	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELECTRICO TRIFÁSICO	UND		$ 64.402,17	$ -	3,00		$ 193.206,51	3,00	$ 193.206,51		$ 0,00	3,00	$ 193.206,51	0,00	$ -
NP. 28	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO	UND		$ 205.026,89	$ -	3,00		$ 615.080,67	3,00	$ 615.080,67		$ 0,00	3,00	$ 615.080,67	0,00	$ -
NP. 29	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL A 220V. INC PROGRAMACION DE TIEMPOS DE SERVICIO.	UND		$ 248.683,78	$ -	3,00		$ 746.051,34	3,00	$ 746.051,34		$ 0,00	3,00	$ 746.051,34	0,00	$ -
NP. 30	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 7,0M.	UND		$ 198.305,52	$ -	35,00		$ 6.940.693,20	35,00	$ 6.940.693,20		$ 0,00	35,00	$ 6.940.693,20	0,00	$ -
NP. 31	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA EN ACERO DE 1/8". INC GRILLETES	ML		$ 5.217,01	$ -	87,50		$ 456.488,38	87,50	$ 456.488,38		$ 0,00	87,50	$ 456.488,38	0,00	$ -
NP. 32	2.10.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	ML		$ 32.321,14	$ -	30,00		$ 969.634,20	30,00	$ 969.634,20		$ 0,00	30,00	$ 969.634,20	0,00	$ -
NP. 33	2.10.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND		$ 135.313,45	$ -	1,00		$ 135.313,45	1,00	$ 135.313,45		$ 0,00	1,00	$ 135.313,45	0,00	$ -
NP. 34	2.10.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND		$ 132.530,29	$ -	1,00		$ 132.530,29	1,00	$ 132.530,29		$ 0,00	1,00	$ 132.530,29	0,00	$ -
NP. 35	2.10.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND		$ 242.497,64	$ -	3,00		$ 727.492,92	3,00	$ 727.492,92		$ 0,00	3,00	$ 727.492,92	0,00	$ -
NP. 36	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UND		$ 162.121,12	$ -	5,00		$ 810.605,60	5,00	$ 810.605,60		$ 0,00	5,00	$ 810.605,60	0,00	$ -
NP. 37	2.10.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UND		$ 103.233,01	$ -	5,00		$ 516.165,05	5,00	$ 516.165,05		$ 0,00	5,00	$ 516.165,05	0,00	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SABANA DE CANTIDADES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR		FECHA DE INICIO:	24-nov-2025	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION	$ 207.158.852,14	FECHA REINICIO No. 02	05-jun-2026
CONTRATISTA.	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO No. 003-2025	VALOR INICIAL:	$ 142.869.009,65	FECHA SUSPENSIÓN No. 01	29-dic-2025	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 02	10-ago-2026
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO No. N/A	VALOR A ADICIONAR:	$ 64.289.842,49	FECHA REINICIO No. 01	19-ene-2026	VALOR ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO 40%)	$ 57.147.603,86
					FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No. 01	12-abr-2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 150.011.248,28
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ		PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS	FECHA SUSPENSIÓN No. 02	08-abr-2026	FECHA PRESENTE ACTA	29-jul-2026

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
NP. 38	2.10.220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.	UND		$ 60.602,19	$ -	4,00		$ 242.008,76	4,00	$ 242.008,76		$ 0,00	4,00	$ 242.008,76	0,00	$ -
NP. 39	2.10.234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP.	UND		$ 264.678,68	$ -	1,00		$ 264.678,68	1,00	$ 264.678,68		$ 0,00	1,00	$ 264.678,68	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -			$ 46.398.269,93		$ 46.398.269,93		$ 0,00		$ 46.398.269,93		$ -
		COSTO TOTAL OBRA CIVIL				$ 109.899.238,19			$ 49.453.724,99		$ 159.352.963,18		$ 0,00		$ 159.352.963,18		$ 0,00
		ADMINISTRACION			24%	$ 26.375.817,17			$ 11.868.894,00		$ 38.244.711,16		$ 0,00		$ 38.244.711,16		$ 0,00
		IMPREVISTOS			1%	$ 1.098.992,38			$ 494.537,25		$ 1.593.529,63		$ 0,00		$ 1.593.529,63		$ 0,00
		UTILIDAD			5%	$ 5.494.961,91			$ 2.472.686,25		$ 7.967.648,16		$ 0,00		$ 7.967.648,16		$ 0,00
		TOTAL CONTRATO				$ 142.869.009,65			$ 64.289.842,49		$ 207.158.852,14		$ 0,00		$ 207.158.852,14		$ 0,00

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 142.869.009,65
VALOR A ADICIONAR No. 1	$ 64.289.842,49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 207.158.852,14

BALANCE FINANCIERO	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 150.011.248,28
VALOR ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO 40%)	$ 57.147.603,86
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100,00%

En el Municipio de San Pablo de Borbúr a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2026, se reunieron los Señores: **ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ** en calidad de Alcalde Municipal; **ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del Contrato, y el **ING. EDISON FERNANDO RIVERA LOPEZ** en calidad de Representante Legal de la empresa EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S. , con el fin de suscribir la presente **Sabana de Cantidades para Liquidación** del contrato interadministrativo No. 003-2025.

La presente Sabana de Cantidades para Liquidación del contrato interadministrativo No. 003-2025 se firma por los que en ella intervienen a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2026.

ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

ING. EDISON FERNANDO RIVERA LOPEZ
R/L EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	1	PRELIMINARES	1.1	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD:	M2









DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Desmonte cielo falso	9,76	12,85		125,42	1,00	125,42
PASILLO ENTRE BIBLIOTECA Y AUDITORIO - Desmonte cielo falso	12,85	4,10		52,69	1,00	52,69
SEGUNDO PISO - Desmonte cielo falso en madera	9,28	12,50		116,05	1,00	116,05
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		294,15
				TOTAL EJECUTADO		294,15

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	1	PRELIMINARES	1.2	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD:	M2







DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Desmonte cubierta zinc	14,20	13,15		186,73	1,00	186,73
AUDITORIO - Desmonte volado de la cubierta de zinc	13,15	0,60		7,89	1,00	7,89
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						194,62
TOTAL EJECUTADO						194,62

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	1	PRELIMINARES	1.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIGA CANAL. INC IMPERMEABILIZACION	UNIDAD:	ML



DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Mantenimiento Viga Canal	13,15			13,15	1,00	13,15
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						**13,15**
TOTAL EJECUTADO						**13,15**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	2	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UNIDAD:	UND





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Suministro de Combos Sanitarios					2,00	2,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		2,00
				TOTAL EJECUTADO		2,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)			**FORMATO**						
FECHA	**DD**	**29**	**MM**	**7**	**AA**	**2026**	**CORTE N°**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**										
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S						CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	
INTERVENTOR:	N/A						CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas	

ACTIVIDAD	**2**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**2.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA**	**UNIDAD:**	**UND**





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
BAÑOS GENERALES - Suministro de grifería para 2 lavamanos					2,00	2,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		**2,00**
				TOTAL EJECUTADO		**2,00**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	**FORMATO**	

FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE N°**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**3**	**PINTURA**	**3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS**	**UNIDAD:**	**ML**





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
PASILLO 2 - Pintura de Perfil metálico para la cubierta	13,15			13,15	1,00	13,15
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	**13,15**
					TOTAL EJECUTADO	**13,15**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	3	PINTURA	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	UNIDAD:	M2










DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
FACHADA, P1 - 1 Puerta (2,40 x 2,90), (1 puerta * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,40	2,90	6,96	2,00	13,92
FACHADA, P2 - 1 Puerta (1,50 x 2,90), (1 puerta * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,50	2,90	4,35	2,00	8,70
FACHADA, V1 - 1 Ventana (2,20 x 1,85), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,20	1,85	4,07	2,00	8,14
FACHADA, V2 - 1 Ventana (2,40 x 1,85), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,40	1,85	4,44	2,00	8,88
FACHADA, V3 - 1 Ventana (3,50 x 1,85), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		3,50	1,85	6,48	2,00	12,95
BIBLIOTECA, V4, V5 - 2 Ventanas (1,49 x 0,78), (2 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		1,45	0,75	1,09	4,00	4,35
BIBLIOTECA, V6 - 1 Ventana (3,80 x 2,10), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		3,80	2,10	7,98	2,00	15,96
BIBLIOTECA, V7 - 1 Ventana (1,70 x 2,10), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,70	2,10	3,57	2,00	7,14
BAÑOS, P3, P4 - 2 Puertas (0,59 x 1,80), (2 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		0,55	1,80	0,99	4,00	3,96
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	84,00
					TOTAL EJECUTADO	84,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO						
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	3	PINTURA	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	UNIDAD:	M2








DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
FACHADA - Piso 1 y Piso 2		13.10	6.30	82.53	1.00	82.53
CONCEJO MPAL, MT1 - 2 Muros Transversales (10.40 x 2.95). (2 muros * (1 lado interno)) = 2 Lados		10.40	2.95	30.68	2.00	61.36
CONCEJO MPAL, ML1 - 2 Muros Longitudinales (5.90 x 2.95). (2 muros * (1 lado interno)) = 2 Lados		5.90	2.95	17.41	2.00	34.81
PASILLO 1, ML2 - 1 Muro Longitudinal (22.00 x 2.90). (1 * (1 lado interno)) = 1 Lado		22.00	2.90	63.80	1.00	63.80
PASILLO 1, ML3 - 1 Muro Longitudinal (19.90 x 2.90). (1 * (1 lado interno)) = 1 Lado		19.90	2.90	57.71	1.00	57.71
PASILLO 2, MT2 - 1 Muro Transversal (10.51 x 3.00). (1 * (1 lado externo)) = 1 Lado		10.51	2.90	30.48	1.00	30.48
PASILLO 2, MT3 - 1 Muro Transversal (9.34 x 2.90). (1 * (1 lado externo + 1 lado interno)) = 2 Lados		9.34	2.90	27.09	2.00	54.17
AUDITORIO, MT4 - 1 Muro Transversal (12.80 x 4.00). (1 * (1 lado externo + 1 lado interno)) = 2 Lados		12.80	4.00	51.20	2.00	102.40
AUDITORIO, MT5 - 1 Muro Transversal (12.80 x 4.00). (1 * (1 lado interno)) = 1 Lado		12.80	4.00	51.20	1.00	51.20
AUDITORIO, ML4 - 2 Muros Longitudinales (9.70 x 2.90). (2 * (1 lado interno)) = 2 Lados		9.70	2.90	28.13	2.00	56.26
BIBLIOTECA, ML5 - 2 Muros Longitudinales (11.50 x 3.00). (2 * (1 lado interno)) = 2 Lados		11.50	3.00	34.50	2.00	69.00








BIBLIOTECA, MT6 - 2 Muros Transversales (10,30 x 3,00), (2 * (1 lado interno)) = 2 Lados		10,30	3,00	30,90	2,00	61,80
FACHADA, P1 - 1 Puerta entrada principal (2,40 x 2,90), (1 puerta * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,40	2,90	6,96	-2,00	-13,92
FACHADA, P2 - 1 Puerta entrada principal (1,50 x 2,90), (1 puerta * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,50	2,90	4,35	-2,00	-8,70
FACHADA, V1 - 1 Ventana (2,20 x 1,85), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,20	1,85	4,07	-2,00	-8,14
FACHADA, V2 - 1 Ventana (2,40 x 1,85), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,40	1,85	4,44	-2,00	-8,88
FACHADA, V3 - 1 Ventana (3,50 x 1,85), (1 * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		3,50	1,85	6,48	-2,00	-12,95
BIBLIOTECA, V4, V5 - 2 Ventanas (1,49 x 0,78), (2 Ventanas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		1,45	0,75	1,09	-4,00	-4,35
BIBLIOTECA, V6 - 1 Ventana (3,80 x 2,10), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		3,80	2,10	7,98	-2,00	-15,96
BIBLIOTECA, V7 - 1 Ventana (1,70 x 2,10), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,70	2,10	3,57	-2,00	-7,14
BIBLIOTECA, PV1 - 1 Puerta en Vidrio (2,00 x 2,00), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,00	2,00	4,00	-2,00	-8,00
AUDITORIO, PA1 y PA2 - 2 Puertas en Aluminio (1,50 x 2,90), (2 puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		1,50	2,00	3,00	-4,00	-12,00
BAÑOS, P3, P4 - 2 Puertas (0,59 x 1,80), (2puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		0,55	1,80	0,99	-4,00	-3,96
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	621,62
					TOTAL EJECUTADO	621,62

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	


FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	4	CUBIERTA	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	UNIDAD:	M2





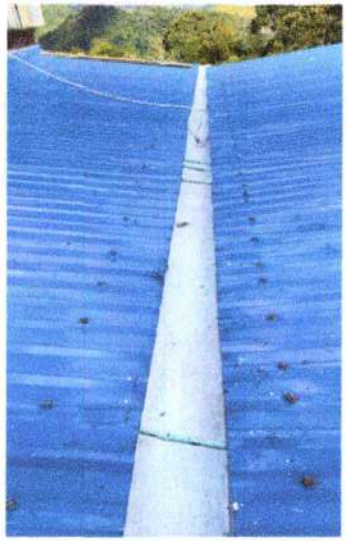

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Galvanizada	14,20	13,15		186,73	1,00	186,73
AUDITORIO - Suministro e Instalación de Volado para Cubierta en Teja Galv.	0,60	13,15		7,89	1,00	7,89
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		194,62
				TOTAL EJECUTADO		194,62

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	4	CUBIERTA	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	UNIDAD:	ML

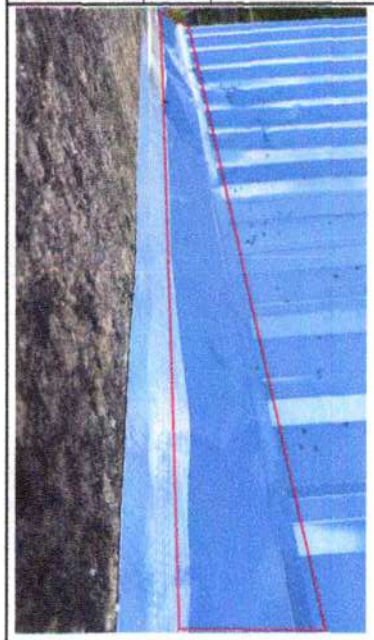

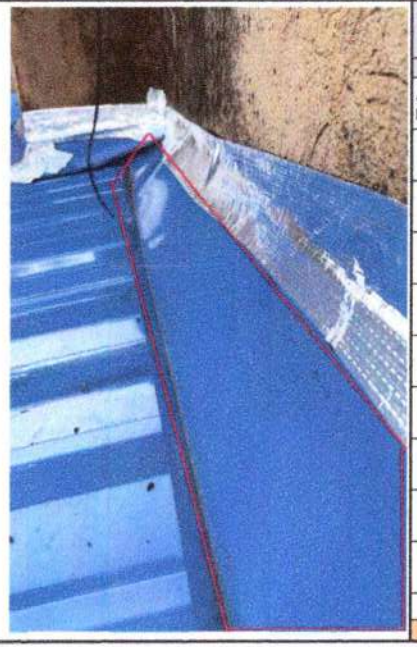

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Suministro e Instalación de Flanche Metálico	13.15			13.15	1.00	13.15
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		13.15
				TOTAL EJECUTADO		13.15

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	4	CUBIERTA	4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	UNIDAD:	KG







DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PESO (KG)			
AUDITORIO MUNICIPAL						
Estructura para la Cubierta (Perfil Metálico 4x8) para refuerzo de estructura	13,15		3,00	39,45	1,00	39,45
Estructura para la Cubierta (Perfil Metálico 4x8) para refuerzo de estructura	13,15		3,00	39,45	3,00	118,35
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		157,80
				TOTAL EJECUTADO		157,80

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	4	CUBIERTA	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	UNIDAD:	ML

NOTA: Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió las instalación de las canales. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PESO (KG)			
AUDITORIO MUNICIPAL						
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						
TOTAL EJECUTADO						

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	4	CUBIERTA	4.5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	UNIDAD:	ML

NOTA: Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió las instalación de las canales y por consiguiente tampocase requirió la instalación de la bajantes de aguas lluvias. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PESO (KG)			
AUDITORIO MUNICIPAL						
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		
				TOTAL EJECUTADO		

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	5	INSTALACIONES ELECTRICAS	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	UNIDAD:	UND










DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Suministro e instalación de paneles					24,00	24,00
BAÑOS - Suministro e instalación de paneles					2,00	2,00
PASILLOS - Suministro e instalación de paneles					13,00	13,00
CUARTO DE CONTROLES - Suministro e instalación de paneles					1,00	1,00
CONCEJO MUNICIPAL - Suministro e instalación de paneles					6,00	6,00
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	**46,00**
PLAZA DE MERCADO						
BAÑOS - LAMPARA DE 24 W					8,00	8,00
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	**8,00**
					TOTAL EJECUTADO	**54,00**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	6	CIELO RASOS	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	UNIDAD:	M2









DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Suministro e instalación Cielo falso	9,76	12,85		125,42	1,00	125,42
PASILLO ENTRE BIBLIOTECA Y AUDITORIO - Suministro e instalación Cielo falso	12,85	4,10		52,69	1,00	52,69
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						178,10
TOTAL EJECUTADO						178,10

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	7	PRELIMINARES	7.1	LAVADA DE CERRAMIENTOS, MUROS Y FACHADAS. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTE.	UNIDAD:	M2







DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL (Muros periféricos)						
Muros y Cerramiento - Costado Lateral Izquierdo (1 Lado interno + 1 lado externo)	46,00		2,50	115,00	2,00	230,00
Muros y Cerramiento - Costado Anterior (1 Lado interno + 1 lado externo)	33,00		2,50	82,50	2,00	165,00
Muros y Cerramiento - Costado Lateral Derecho (1 Lado interno + 1 lado externo)	46,00		2,50	115,00	2,00	230,00
(RESTAR) Muros y Cerramiento - Costado Lateral Derecho Baños (1 Lado interno + 1 lado externo)	14,00		2,50	35,00	-2,00	-70,00
Muros y Cerramiento - Costado Frontal PRIMER PISO(1 lado externo)	33,00		3,50	115,50	1,00	115,50
Muros y Cerramiento - Costado Frontal LAMINAS SEGUNDO PISO (1 lado interno + 1 lado externo)	2,00		0,50	1,00	116,00	116,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		786,50
COLISEO MUNICIPAL (Edificaciones baños)						
Fachada - Costado Coliseo (1 lado externo) , Piso 1 y Piso 2	14,00		6,50	91,00	1,00	91,00
Muros Costado Lateral Derecho (1 lado externo)	4,90		6,50	31,85	1,00	31,85
Muros Costado Anterior (1 lado externo), sector vía	14,00		3,00	42,00	1,00	42,00
Muros Costado Lateral Izquierdo (1 lado externo), sector plaza de mercado	4,90		3,00	14,70	1,00	14,70
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		179,55
				TOTAL EJECUTADO		966,05

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	7	PRELIMINARES	7.2	LAVADA DE ESTRUCTURA METALICA. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESENGRASANTE Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA.	UNIDAD:	ML



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
CUBIERTA - 7 Vigas Transversales (h=1,0m, L=34,0m)	34,00			34,00	7,00	238,00
CUBIERTA - 1 Viga Central Longitudinal(h=1,0m, L=44,0m)	44,00			44,00	1,00	44,00
CUBIERTA - 14 Columnas Tipo Cilindro(L=7,0m)	7,00			7,00	14,00	98,00
CUBIERTA - 2 Vigas Conectoras de Columnas Tipo Cilindro(L=42,0m)	42,00			42,00	2,00	84,00
CUBIERTA - 31 Viguetas Longitudinales (L=44,0m)	44,00			44,00	31,00	1.364,00
SECTOR GRADERIAS - 6 Columnas parte baja(L=4,50m)	4,50			4,50	6,00	27,00
SECTOR GRADERIAS - 6 Columnas parte alta(L=3,00m)	3,00			3,00	6,00	18,00
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	1.873,00
				TOTAL EJECUTADO		1.873,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	8	CIMENTACION Y DESAGUES	8.1	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	UNIDAD:	M2











DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
Placa para Protección en la parte Anterior del Coliseo.	4,00	2,10		8,40	1,00	8,40
Placa Adicional para Protección en la parte Anterior del Coliseo.	2,50	2,70		6,75	1,00	6,75
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		15,15
				TOTAL EJECUTADO		15,15

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UNIDAD:	UND

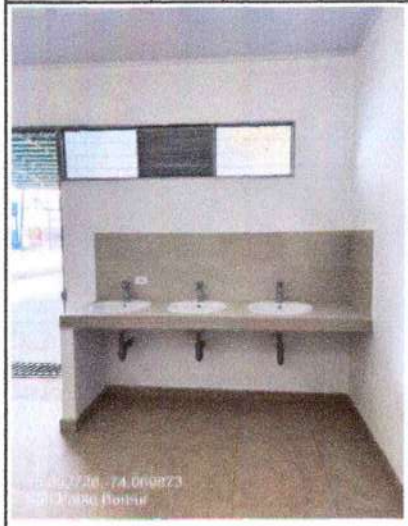





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
BAÑOS PRIMER PISO - Suministro de Griferías para Lavamanos					3.00	3.00
BAÑOS SEGUNDO PISO - Suministro de Griferías para Lavamanos					1.00	1.00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						4.00
TOTAL EJECUTADO						4.00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UNIDAD:	UND

NOTA: Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió las instalación de las duchas, ya que el espacio acondicionado para tal fin ya no se usa. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PESO (KG)			
AUDITORIO MUNICIPAL						
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						
TOTAL EJECUTADO						

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretaria de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	10	PINTURAS	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	UNIDAD:	ML










DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
CERRAMIENTO PERIFERICO - Tubo metálico de 3"			2,40	2,40	396,00	950,40
SECTOR GRADERIAS COSTADO VIA NACIONAL - Baranda de protección (L=31,20m, h=1,10)	31,20			31,20	1,00	31,20
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		981,60
PLAZA DE MERCADO						
PINTURA NUEVA BARANDA - 5 Tubos de 2,90m	2,90			2,90	5,00	14,50
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		14,50
				TOTAL EJECUTADO		996,10

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	10	PINTURAS	10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	UNIDAD:	M2










DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
BAÑOS FACHADA, P1 y P2 - 2 Puertas (2,40 x 0,95), (2 puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		0,95	2,40	2,28	4,00	9,12
BAÑOS FACHADA, P3 y P4 - 2 Puertas (2,40 x 1,0), (2 puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		1,00	2,40	2,40	4,00	9,60
BAÑOS FACHADA, V1 y V2 - 2 Ventanas (2,10 x 1,80), (2 ventanas * (1 lado externo + 1 lado interno)) = 4 Lados		2,10	1,80	3,78	4,00	15,12
BAÑOS FACHADA, V3 - 1 Ventana (3,10 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo + 1 lado interno)) = 2 Lados		3,10	1,80	5,58	2,00	11,16
BAÑOS FACHADA, V4 - 1 Ventana (1,70 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo + 1 lado interno)) = 2 Lados		1,70	1,80	3,06	2,00	6,12
BAÑOS FACHADA, V5 - 1 Ventana (1,10 x 1,40), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,10	1,40	1,54	2,00	3,08
BAÑOS FACHADA, V6 - 1 Ventana (1,05 x 1,40), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,05	1,40	1,47	2,00	2,94
BAÑOS FACHADA, V7 - 1 Ventana (2,10 x 0,45), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,10	0,45	0,95	2,00	1,89
BAÑOS FACHADA, V8 - 1 Ventana (1,90 x 0,45), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,90	0,45	0,86	2,00	1,71
BAÑOS, FACHADA COSTADO Lateral Derecho, V9, V10, V11, V12 - 4 Ventanas (2,00 x 0,45), (4 ventanas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 8 Lados		2,00	0,45	0,90	8,00	7,20
BAÑOS, FACHADA COSTADO Lateral Izquierdo, V13, V14, V15, V16 - 4 Ventanas (2,00 x 0,40), (4 ventanas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 8 Lados		2,00	0,40	0,80	8,00	6,40











BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V17 - 1 Ventana (1,40 x 1,80), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,40	1,80	2,52	2,00	5,04
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V18 - 1 Ventana (2,60 x 1,80), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,60	1,80	4,68	2,00	9,36
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V19 - 1 Ventana (2,90 x 1,80), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,90	1,80	5,22	2,00	10,44
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V20, V21 - 2 Ventanas (2,50 x 0,45), (2 ventanas * (1 lado interna + 1 lado externo)) = 4 Lados		2,50	0,45	1,13	4,00	4,50
BAÑOS, 2 Puertas Duchas (0,90 x 2,40), (2 puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		0,90	2,40	2,16	4,00	8,64
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	112,32
PLAZA DE MERCADO						
OFICINA 1 - Pintura puerta # 2 (0,80 x 2,10), pintar por los dos lados		0,80	2,10	1,68	2,00	3,36
OFICINA 2 - Pintura puerta # 2 (0,78 x 2,10), pintar por los dos lados		0,78	2,10	1,64	2,00	3,28
PINTURA para la lámina de piso para el nuevo pasillo en Acero	2,90	0,90		2,61	1,00	2,61
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	9,25
					TOTAL EJECUTADO	121,57

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretaria de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	10	PINTURAS	10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS		UNIDAD:	M2









DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL (Muros edificio baños)						
BAÑOS, FACHADA COSTADO COLISEO (1 lado externo) , Piso 1 y Piso 2	14,00		6,50	91,00	1,00	91,00
BAÑOS, Muros Costado Lateral Derecho (1 lado externo)	4,90		6,50	31,85	1,00	31,85
BAÑOS, Muros Costado Anterior (1 lado externo), sector vía	14,00		3,00	42,00	1,00	42,00
BAÑOS, Muros Costado Lateral Izquierdo (1 lado externo), sector plaza de mercado	4,90		3,00	14,70	1,00	14,70
BAÑOS, PISO 1; 2 Muros Longitudinales costado interno (1 lado interno)	4,60		3,30	15,18	2,00	30,36
BAÑOS, PISO 1; 2 Muros Transversales costado interno (1 lado interno)	13,70		3,30	45,21	2,00	90,42
BAÑOS, PISO 2; 2 Muros Longitudinales costado interno (1 lado interno)	4,60		3,00	13,80	2,00	27,60
BAÑOS, PISO 2; 2 Muros Transversales costado interno (1 lado interno)	13,54		3,00	40,62	2,00	81,25
BAÑOS FACHADA, P1 y P2 - 2 Puertas (2,40 x 0,95), (2 puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		0,95	2,40	2,28	-4,00	-9,12
BAÑOS FACHADA, P3 y P4 - 2 Puertas (2,40 x 1,0), (2 puertas * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 4 Lados		1,00	2,40	2,40	-4,00	-9,60
BAÑOS FACHADA, V1 y V2 - 2 Ventanas (2,10 x 1,80), (2 ventanas * (1 lado externo)) = 2 Lados		2,10	1,80	3,78	-2,00	-7,56
BAÑOS FACHADA, V3 - 1 Ventana (3,10 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		3,10	1,80	5,58	-1,00	-5,58
BAÑOS FACHADA, V4 - 1 Ventana (1,70 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		1,70	1,80	3,06	-1,00	-3,06










BAÑOS FACHADA, V5 - 1 Ventana (1,10 x 1,40), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,10	1,40	1,54	-2,00	-3,08
BAÑOS FACHADA, V6 - 1 Ventana (1,05 x 1,40), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,05	1,40	1,47	-2,00	-2,94
BAÑOS FACHADA, V7 - 1 Ventana (2,10 x 0,45), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		2,10	0,45	0,95	-2,00	-1,89
BAÑOS FACHADA, V8 - 1 Ventana (1,90 x 0,45), (1 ventana * (1 lado interno + 1 lado externo)) = 2 Lados		1,90	0,45	0,86	-2,00	-1,71
BAÑOS, FACHADA COSTADO Lateral Derecho, V9, V10, V11, V12 - 4 Ventanas (2,00 x 0,45), (4 ventanas * (1 lado externo)) = 4 Lados		2,00	0,45	0,90	-4,00	-3,60
BAÑOS, FACHADA COSTADO Lateral Izquierdo, V13, V14, V15, V16 - 4 Ventanas (2,00 x 0,40), (4 ventanas * (1 lado externo)) = 4 Lados		2,00	0,40	0,80	-2,00	-1,60
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V17 - 1 Ventana (1,40 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		1,40	1,80	2,52	-1,00	-2,52
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V18 - 1 Ventana (2,60 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		2,60	1,80	4,68	-1,00	-4,68
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V19 - 1 Ventana (2,90 x 1,80), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		2,90	1,80	5,22	-1,00	-5,22
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V20, V21 - 2 Ventanas (2,50 x 0,45), (2 ventanas * (1 lado externo)) = 2 Lados		2,50	0,45	1,13	-2,00	-2,25
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V22 - 1 Ventana (1,60 x 0,45), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		1,60	0,45	0,72	-1,00	-0,72
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), V23 - 1 Ventana (0,90 x 0,40), (1 ventana * (1 lado externo)) = 1 Lado		0,90	0,40	0,36	-1,00	-0,36
BAÑOS, FACHADA COSTADO ANTERIOR (por la vía), P5 - 1 Puerta (1,30 x 2,20), (1 puerta * (1 lado externo)) = 1 Lado		1,30	2,20	2,86	-1,00	-2,86
BAÑOS PRIMER PISO, Enchapes		8,30	1,80	14,94	-1,00	-14,94
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	325,89
COLISEO MUNICIPAL (Cerramiento)						
CERRAMIENTO - Vinilo para Vigas y Columnas que confinan los muros de ladrillo a la vista	100,00	0,60		60,00	1,00	60,00
CERRAMIENTO - Vinilo para Muros inferiores donde están empotrados los tubos.	50,00	0,50		25,00	1,00	25,00
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	85,00







PLAZA DE MERCADO						
OFICINA 1 - Pintura para la Facha de esa oficina	5,30		2,50	13,25	1,00	13,25
OFICINA 1 - Pintura interna de esa oficina	24,65		2,30	56,70	1,00	56,70
OFICINA 1 - Descontar puerta nueva		1,40	2,10	2,94	-2,00	-5,88
OFICINA 1 - Descontar ventana nueva		1,50	1,20	1,80	-2,00	-3,60
OFICINA 2 - Pintura para la Fachada de esa oficina	5,40		2,50	13,50	1,00	13,50
OFICINA 2 - Pintura interna de esa oficina	16,30		2,30	37,49	1,00	37,49
OFICINA 2 - Descontar puerta nueva		1,38	2,10	2,90	-2,00	-5,80
OFICINA 2 - Descontar ventana nueva		1,20	1,20	1,44	-2,00	-2,88
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	102,78
					TOTAL EJECUTADO	513,67

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	11	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UNIDAD:	UND

NOTA: Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió las instalación de los tableros en Acrílico debido a que dicha instalación ya fue realizada. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PESO (KG)			
AUDITORIO MUNICIPAL						
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		
				TOTAL EJECUTADO		

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UNIDAD:	UND








DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
Suministro e Instalacion de Salidas Completas para Interruptores Dobles para cuarto de Controles					4,00	4,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						**4,00**
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE PARA CONTROL INTERNO MANUAL DE ENCENDIDO DE LAS 2 CANCHAS DEPORTIVAS					1,00	1,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						**1,00**
TOTAL EJECUTADO						**5,00**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 2	SUMINISTRO E INSTALACION FOCO LED TIPO OJO DE BUEY. INC ADAPTADORES PARA LA INSTALACION	UNIDAD:	UND

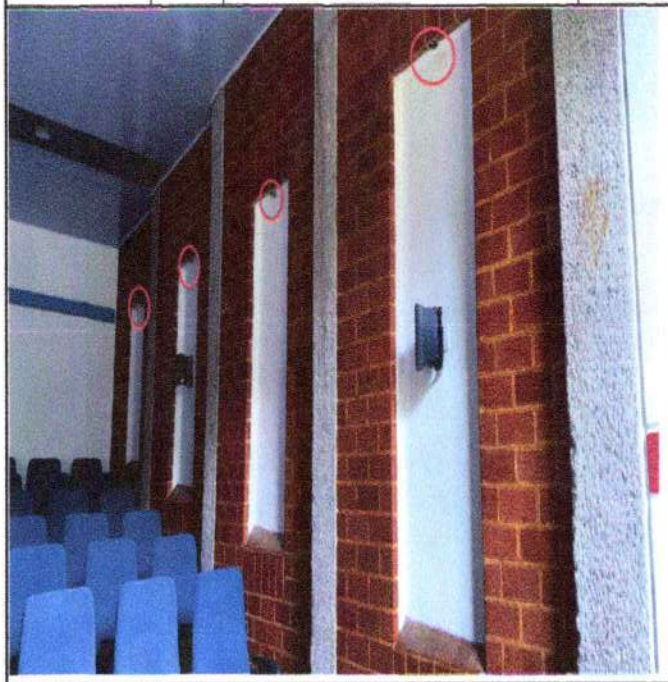

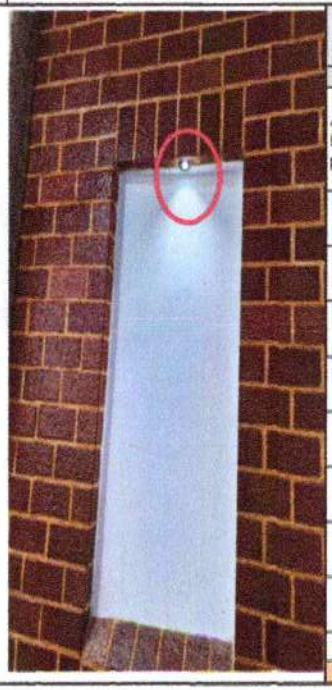

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO - Suministro e Instalación de Luz LED TIPO OJO DE BUEY, con sus accesorios para reparar las salidas de conexión					8,00	8,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						8,00
TOTAL EJECUTADO						8,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED LUJO PARA TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UNIDAD:	UND






DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
CONCEJO MUNICIPAL - Sumjnistro e Instalacion de 2 lámparas					2,00	2,00
AUDITORIO MUNICIPAL - Sumjnistro e Instalacion de 3 lámparas					3,00	3,00
CUARTO CONTROLES AUDITORIO MUNICIPAL - Sumjnistro e Instalacion de 1 lámpara					1,00	1,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		6,00
				TOTAL EJECUTADO		6,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	UNIDAD:	ML



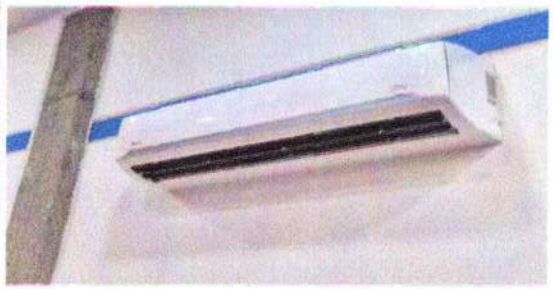



DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
AUDITORIO MUNICIPAL - Sumjnistro e Instalacion de Lineas (4FASES + 1 NEUTRO) para Instalación de 2 Aires Acondicionados (2 FASES para 2 UNIDADES CONDENSADORAS + 2 FASES PARA 2 AIRES)	24,00			24,00	1,00	24,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		24,00
				TOTAL EJECUTADO		24,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UNIDAD:	UND

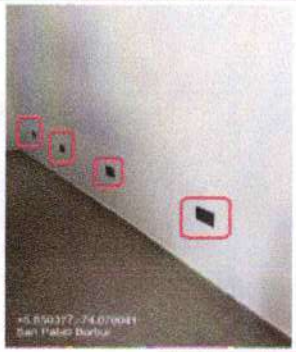

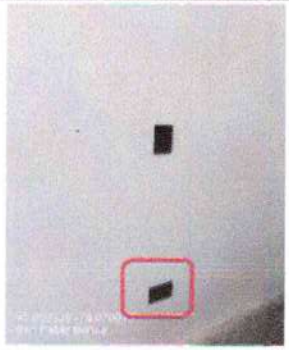





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
CONCEJO MUNICIPAL - Suministro e Instalación de Tomacorrientes Dobles					10,00	10,00
AUDITORIO MUNICIPAL - Suministro e Instalación de Tomacorrientes Dobles					12,00	12,00
PASILLOS - Suministro e Instalación de Tomacorrientes Dobles					2,00	2,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		24,00
				TOTAL EJECUTADO		24,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	UNIDAD:	UND








DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
Suministro e Instalación de 4 Breaker para Administración de los Circuitos para Aires Acondicionados					4,00	4,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						**4,00**
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER PARA PROTECCION DE CIRCUITOS					8,00	8,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						**8,00**
TOTAL EJECUTADO						**12,00**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD:	UND






DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
AUDITORIO MUNICIPAL						
Suministro e Instalación de Interruptores Sencillos					5,00	5,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		5,00
				TOTAL EJECUTADO		5,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		**FORMATO**						
FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE N°**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 8**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION**	**UNIDAD:**	**UND**






DESCRIPCION	**Dimensiones**			**V. PARCIAL**	**Número de elementos**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
AUDITORIO MUNICIPAL						
Suministro e instalación de Aires Acondicionados					2,00	2,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		2,00
				TOTAL EJECUTADO		2,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHORRO EN CONSUMO	UNIDAD:	UND







DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
BAÑOS - Suministro e Instalación de Válvula de Entrada para la Cisterna					7,00	7,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		7,00
				TOTAL EJECUTADO		7,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO	UNIDAD:	UND








DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
BAÑOS DEPORTES - Suministro e Instalación de Asiento y Tapa (Bizcocho) para Tasa Sanitaria					2,00	2,00
BAÑOS PRIMER PISO - Suministro e Instalación de Asiento y Tapa (Bizcocho) para Tasa Sanitaria					4,00	4,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		6.00
				TOTAL EJECUTADO		6.00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	**FORMATO**	

FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE N°**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 11**	**DESMONTE DE MARCOS. PUERTAS Y VENTANAS.**	**UNIDAD:**	**M2**







DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
PUERTA OFICINA 1 - Desmonte puerta # 1		1,40	2,10	2,94	1,00	2,94
PUERTA OFICINA 2 - Desmonte puerta # 1		1,38	2,10	2,90	1,00	2,90
PUERTA SECTOR TERRASA - Desmonte puerta # 1		0,80	2,30	1,84	1,00	1,84
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	**7,68**
					TOTAL EJECUTADO	**7,68**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 12	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	UNIDAD:	M2









DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
OFICINA 1 - Demolición para nueva Ventana (1,20m X 1,50m)		1,50	1,20	1,80	1,00	1,80
OFICINA 2 - Demolición para nueva Ventana (1,20m X 1,20m)		1,20	1,20	1,44	1,00	1,44
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		3,24
				TOTAL EJECUTADO		3,24

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACÁ)		**FORMATO**						
FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE Nº**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 13**	**FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES**	**UNIDAD:**	**ML**






DESCRIPCION	**Dimensiones**			**V. PARCIAL**	**Número de elementos**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PLAZA DE MERCADO						
PUERTA OFICINA 1 - Filos y Dilataciones para puerta # 1 (1,40 x 2,10)	5,60			5,60	1,00	5,60
PUERTA OFICINA 2 - Filos y Dilataciones para puerta # 1 (1,38 x 2,10)	5,58			5,58	1,00	5,58
OFICINA 1 - Filos y Dilataciones para nueva Ventana (1,20m X 1,50m)	5,40			5,40	1,00	5,40
OFICINA 2 - Filos y Dilataciones para nueva Ventana (1,20m X 1,20m)	4,80			4,80	1,00	4,80
PUERTA SECTOR TERRASA - Filos y Dilataciones para Puerta # 1	5,40			5,40	1,00	5,40
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		**26,78**
				TOTAL EJECUTADO		**26,78**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	UNIDAD:	UND

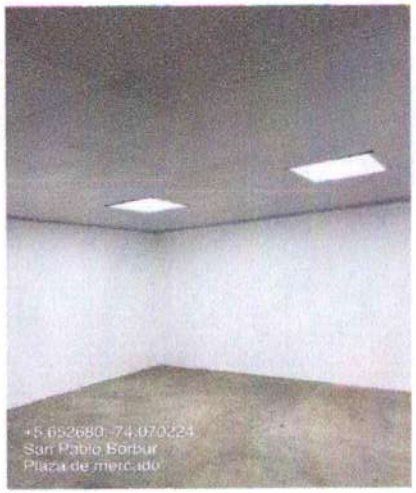

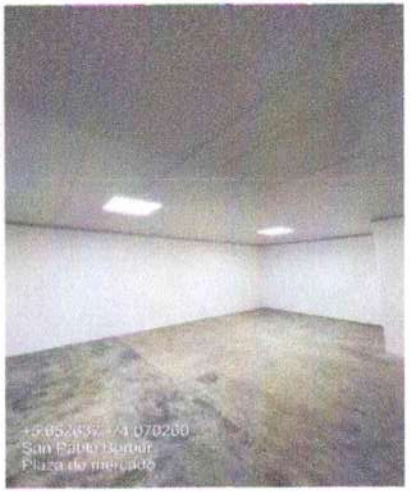

DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
PLAZA DE MERCADO						
OFICINA 1 - Suministro de 2 Paneles LED 60x60					2,00	2,00
OFICINA 2 - Suministro de 2 Paneles LED 60x60					2,00	2,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						4,00
TOTAL EJECUTADO						4,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR. CAL 14. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	UNIDAD:	M2





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
NUEVO PASILLO - Lámina para el piso del nuevo pasillo	3,00	1,00		3,00	1,00	3,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		3,00
				TOTAL EJECUTADO		3,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	UNIDAD:	KG





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PESO			
PLAZA DE MERCADO						
NUEVO PASO METALICO - (Baranda) Suministro e Instalación de Tubos redondos de 1"	2,90		1,15	3,34	4,00	13,34
NUEVO PASO METALICO - (Baranda) Suministro e Instalación de Tubos redondos de 1 1/2"	2,90		1,78	5,16	1,00	5,16
NUEVO PASO METALICO - (Baranda) Suministro e Instalación de Tubos redondos de 1 1/2" para Parales	0,90		1,78	1,60	2,00	3,20
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		21,71
				TOTAL EJECUTADO		21,71

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretaria de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD:	KG

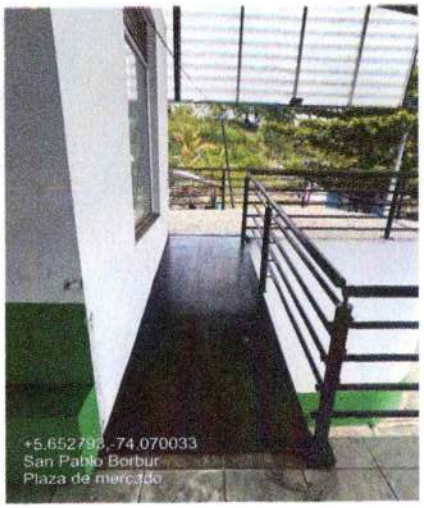



DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	PESO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
PLAZA DE MERCADO						
NUEVO PASO METALICO - Suministro e Instalación de Tubo metálico 10x10	2,90		8,95	25,96	2,00	51,91
NUEVO PASO METALICO - Suministro e Instalación de Tubo redondo de 1" para refuerzo de apoyo a la lámina Alfajor	1,00		1,15	1,15	6,00	6,90
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		58,81
				TOTAL EJECUTADO		58,81

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	UNIDAD:	M2

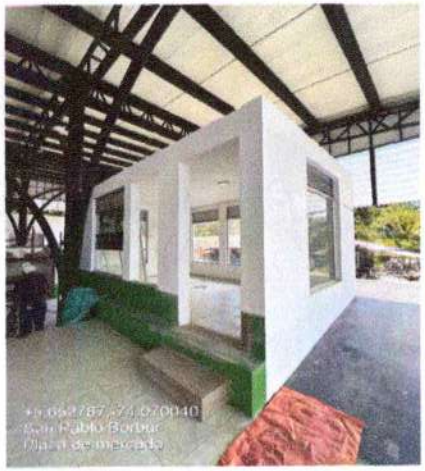



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
PUERTA SECTOR TERRASA - Instalación de nueva puerta		0,80	2,30	1,84	1,00	1,84
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		1,84
				TOTAL EJECUTADO		1,84

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	UNIDAD:	M2





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
OFICINA 1 - Nueva Ventana (1,20m X 1,50m)		1,50	1,20	1,80	1,00	1,80
OFICINA 2 - Nueva Ventana (1,20m X 1,20m)		1,20	1,20	1,44	1,00	1,44
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						3,24
TOTAL EJECUTADO						3,24

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1 1/2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON PUNTOS DE AMARRE, CERRADURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD:	M2





DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
OFICINA 1 - Puerta Nueva (1,40m X 2,10m)		1,40	2,10	2,94	1,00	2,94
OFICINA 2 - Puerta Nueva (1,35m X 2,10m)		1,35	2,10	2,84	1,00	2,84
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		5,78
				TOTAL EJECUTADO		5,78

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	UNIDAD:	UND



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
PLAZA DE MERCADO						
Suministro e Instalacion de Chapas para Acceso a las Instalaciones					5,00	5,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		5,00
				TOTAL EJECUTADO		5,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	**FORMATO**	

FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE N°**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 22**	**IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MORTERO Y PINTURA TIPO SIKA. IMPRIMACION 1:1, DOS CAPAS PURAS**		**UNIDAD:**	**ML**

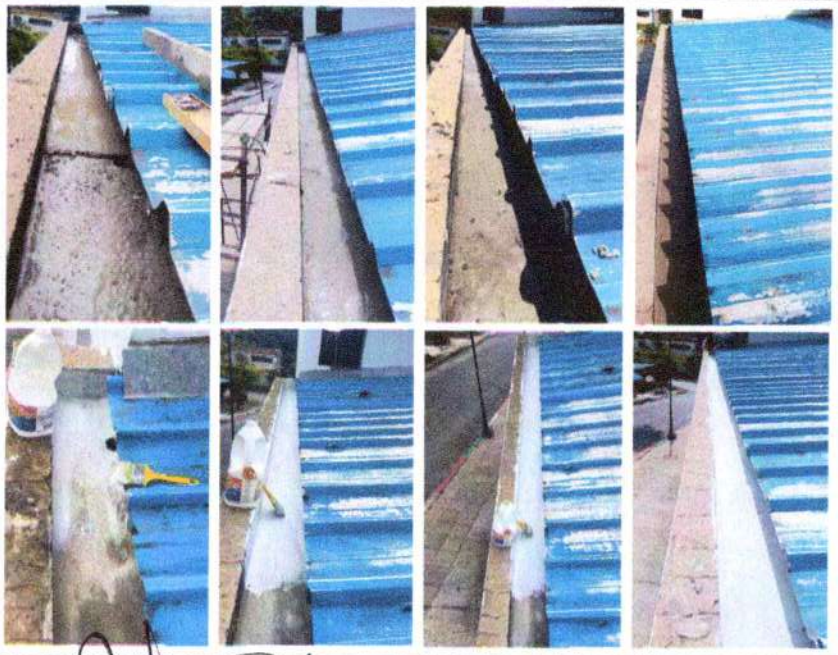

DESCRIPCION	**Dimensiones**			**V. PARCIAL**	**Número de elementos**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
COLISEO MUNICIPAL						
VIGA CANAL - Impermeabilización con Mortero Impermeabilizado y Pintura en la Viga Canal del sector de las oficinas del segundo piso.	6,50			6,50	1,00	6,50
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		6,50
				TOTAL EJECUTADO		6,50

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC	UNIDAD:	ML

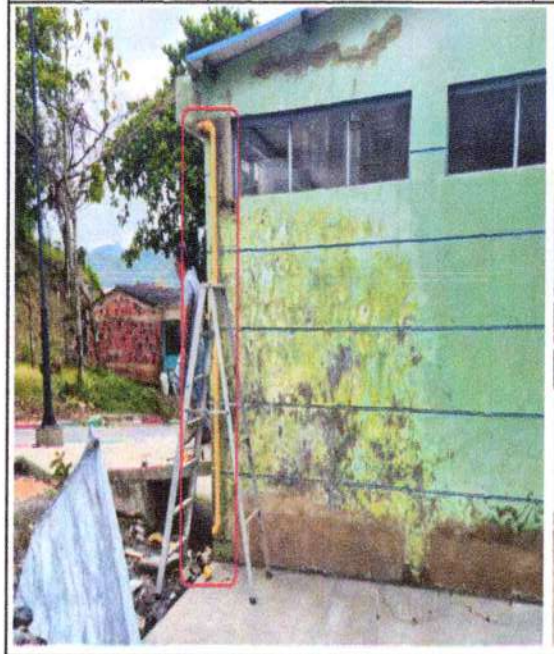



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
VIGA CANAL - Bajante para Aguas Lluvias para la Viga Canal del sector de las oficinas del segundo piso.	3,00			3,00	1,00	3,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		3,00
				TOTAL EJECUTADO		3,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO						
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN).	UNIDAD:	ML

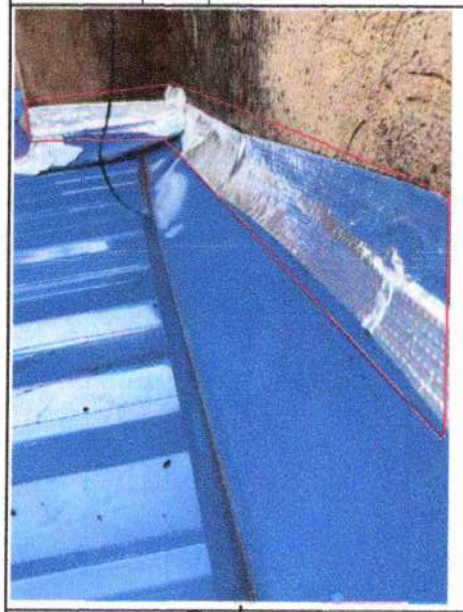



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
AUDITORIO MUNICIPAL						
CUBIERTA - Suministro e Instalación de Cinta Asfáltica para protección en el donde se instalaron los Flanches	13.50			13.50	1.00	13.50
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		13.50
				TOTAL EJECUTADO		13.50

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra


ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)						FORMATO				
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR										
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S						CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	
INTERVENTOR:	N/A						CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas	

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 25	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO. INC SUSPENSION DEL CONEXIONADO	UNIDAD:	UND

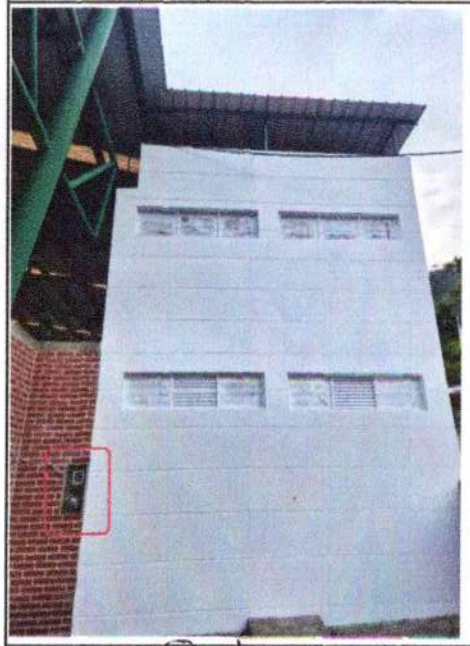

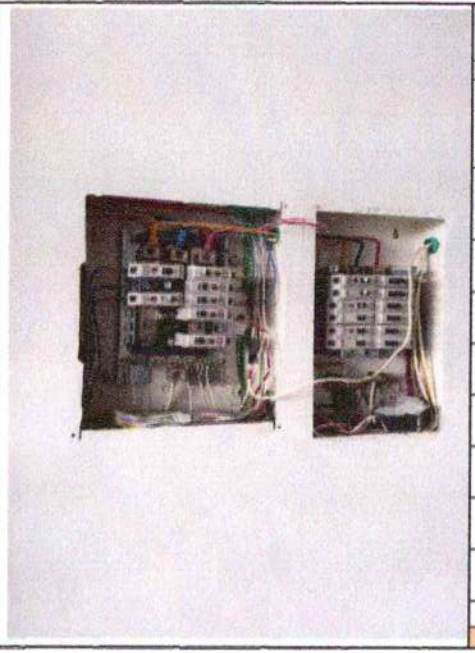

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
DESMONTE DE TABLEROS TRIFASICOS EXISTENTES LOCALIZADO EN LA PARTE INTERNA DE LAS ESTRUCTURA DE LOS BAÑOS					2,00	2,00
DESMONTE DE TABLERO TRIFASICO EXISTENTE LOCALIZADO EN LA PARTE EXTERNA A LA ENTRADA DEL COLISEO					1,00	1,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		3,00
				TOTAL EJECUTADO		3,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		**FORMATO**							
FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE Nº**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**										
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S						CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	
INTERVENTOR:	N/A						CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas	

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 26**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO TRIFASICO EMPOTRADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS. INC CONEXIONADO**	**UNIDAD:**	**UND**





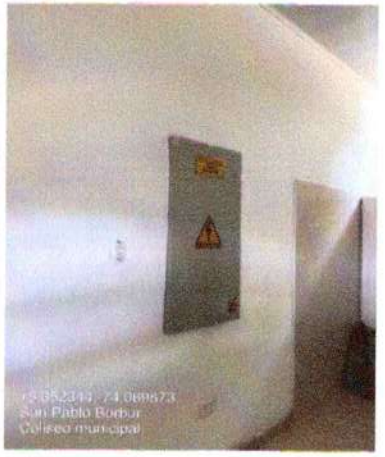

DESCRIPCION	**Dimensiones**			**V. PARCIAL**	**Número de elementos**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL AUTOMATICO INTERNO DE LAS 2 CANCHAS DEPORTIVAS Y 1 ALUMBRADO PERIFERICO EXTERIOR DEL COLISEO					1,00	1,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						1,00
TOTAL EJECUTADO						1,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR			
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A	

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELECTRICO TRIFÁSICO	UNIDAD:	UND







DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES EN EL GABINETE PARA CONTROL AUTOMATICO INTERNO DE LAS 2 CANCHAS DEPORTIVAS Y 1 ALUMBRADO PERIFERICO EXTERIOR DEL COLISEO					3,00	3,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						3.00
TOTAL EJECUTADO						3,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2


MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)						FORMATO		
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO	UNIDAD:	UND





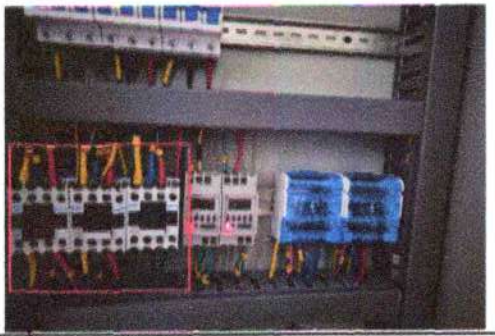

DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES PARA CONTROL AUTOMATICO INTERNO DE LAS 2 CANCHAS DEPORTIVAS Y 1 ALUMBRADO PERIFERICO EXTERIOR DEL COLISEO					3,00	3,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		3.00
				TOTAL EJECUTADO		3.00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL A 220V. INC PROGRAMACION DE TIEMPOS DE SERVICIO.	UNIDAD:	UND



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADORES (RELOJES) PARA CONTROL AUTOMATICO INTERNO DE LAS 2 CANCHAS DEPORTIVAS Y 1 ALUMBRADO PERIFERICO EXTERIOR DEL COLISEO					3,00	3,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						3,00
TOTAL EJECUTADO						3,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		**FORMATO**						
FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE Nº**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 30**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 7,0M.**	**UNIDAD:**	**UND**



DESCRIPCION	**Dimensiones**			**V. PARCIAL**	**Número de elementos**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LAS NUEVAS LÁMPARAS COLGANTES					35,00	35.00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		**35.00**
				TOTAL EJECUTADO		**35.00**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		**FORMATO**						
FECHA	**DD**	29	**MM**	7	**AA**	2026	**CORTE N°**	1	**ELABORÓ**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR**				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP. 31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA EN ACERO DE 1/8". INC GRILLETES**	**UNIDAD:**	**ML**

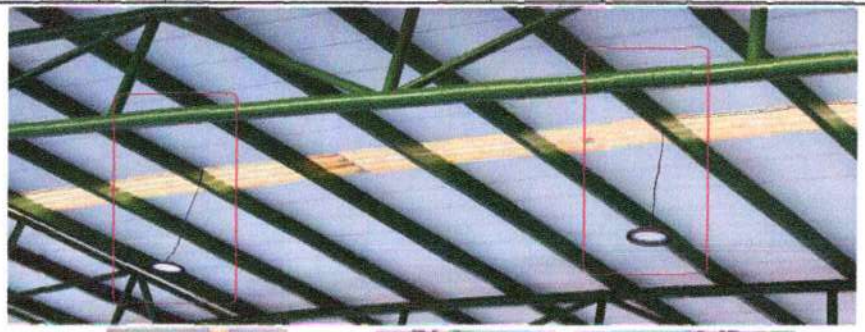





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA EN ACERO PARA CADA UNA DE LAS LAMPARAS COLGANTES	2,50			2,50	35,00	87,50
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		87,50
				TOTAL EJECUTADO		87,50

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO						
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	UNIDAD:	ML





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO (NO SE TIENEN ENCUENTA 9ML, QUE YA VIENEN INCLUIDOS EN EL ÍTEM 10.13 DE SALIDA DE ILUMINACION EXPUESTA) PARA LAS LUMINARIAS DE LAS GRADERÍAS QUE VAN PARA EL COSTADO DE LA VÍA NACIONAL	30,00			30,00	1,00	30,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		30,00
				TOTAL EJECUTADO		30,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UNIDAD:	UND



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
1 SALIDA PARA TOMA EN EL SECTOR DEL NUEVO GABINETE ELÉCTRICO, PARA USO GENERAL (SALIDA A 110V)					1,00	1,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		1,00
				TOTAL EJECUTADO		1,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO						
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE Nº	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UNIDAD:	UND

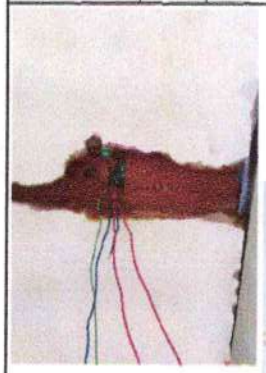





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
1 SALIDA PARA TOMA EN EL SECTOR DEL NUEVO GABINETE ELÉCTRICO, PARA USO GENERAL (SALIDA A 220V)					1,00	1,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		1,00
				TOTAL EJECUTADO		1,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UNIDAD:	UND





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
2 SALIDAS PARA TOMAS EN GRADAS, AL COSTADO DE LA VIA NACIONAL					2,00	2,00
1 SALIDA PARA TOMAS EN GRADAS PARA TABLERO DE MARCADOR, AL COSTADO DE LA PLAZA DE MERCADO					1,00	1,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						3,00
TOTAL EJECUTADO						3,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UNIDAD:	UND

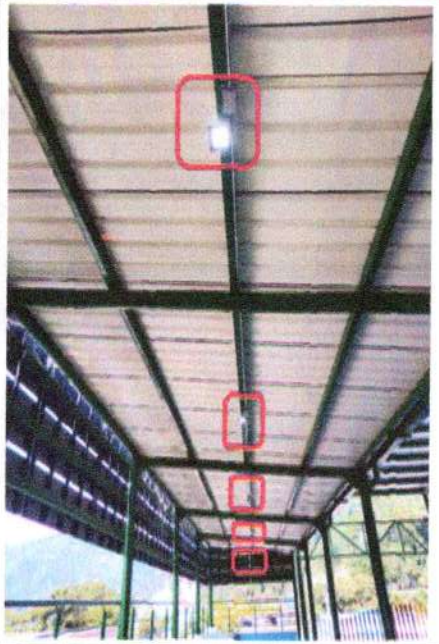

DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
SALIDAS PARA ILUMINACION (PARA 5 NUEVOS REFLECTORES) EN GRADERIAS DEL COSTADO DE LA VÍA NACIONAL					5,00	5,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						5,00
TOTAL EJECUTADO						5,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UNIDAD:	UND

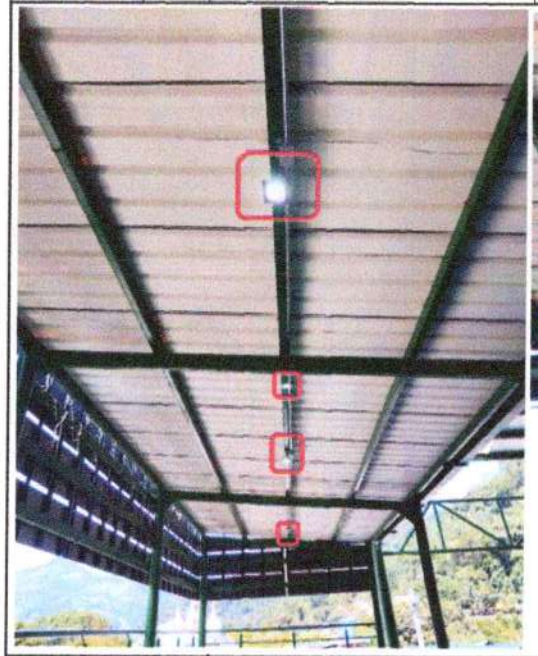



DESCRIPCION	Dimensiones			V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COLISEO MUNICIPAL						
RELECTORES PARA PARA ILUMINACION EN GRADERIAS DEL COSTADO DE LA VÍA NACIONAL					5,00	5,00
				SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS		5,00
				TOTAL EJECUTADO		5,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)	FORMATO	

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO	N/A		Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.	UNIDAD:	UND







DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 40 AMP, EN EL NUEVO GABINETE PARA PROTECCION DE CIRCUITOS					4,00	4,00
					SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS	4,00
					TOTAL EJECUTADO	4,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

MUNICIPIO	SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)						FORMATO		
FECHA	DD	29	MM	7	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR								
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S						CONTRATO	003-2025	SUPERVISOR: ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A						CONTRATO	N/A	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	NP	ITEMS NO PREVISTOS	NP. 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP.	UNIDAD:	UND





DESCRIPCION	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	V. PARCIAL	Número de elementos	Medida Total
COLISEO MUNICIPAL						
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3 X 60 AMP, EN EL NUEVO GABINETE PARA PROTECCION DE CIRCUITOS (PIN DE CORTE)					1,00	1,00
SUBTOTAL ACTAVIDADES EJECUTADAS						1,00
TOTAL EJECUTADO						1,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S
R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ
Contratista de Obra

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

MAMPOSTERIA

ITEM : (1.3) - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIGA CANAL. INC IMPERMEABILIZACION

UNIDAD: ML

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,025	713.708,61	17.842,72
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, SELLANTE DE FILTRACIONES (TIPO SIKA 2 O SIMILAR X 2.5 KG).	KG	0,030	52.180,00	1.545,73
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**19.388,44**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	0,60	29.224,69	17.534,81
				-
			Subtotal	**17.534,81**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	17.534,81	876,74
				-
			Subtotal	**876,74**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**37.800,00**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

MAMPOSTERIA

ITEM : (7.1) - LAVADA DE CERRAMIENTOS, MUROS Y FACHADAS. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTE.

UNIDAD: M2

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
DESENGRASANTE TIPO INDUSTRIAL	GL	0,020	20.000,00	400,00
AGUA	LT	10,000	3,65	36,50
ACIDO NITRICO O SIMILAR	LT	0,01	12.000,00	120,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**556,50**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	0,28	29.224,69	8.099,03
			Subtotal	**8.099,03**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	8.099,03	404,95
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	0,05	27.700,00	1.385,00
HIDROLAVADORA	DIA	0,05	45.000,00	2.250,00
			Subtotal	**4.039,95**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**12.695,48**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

MAMPOSTERIA

ITEM : **(7.2) - LAVADA DE ESTRUCTURA METALICA. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESENGRASANT Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA.**

UNIDAD: ML

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
DESENGRASANTE TIPO INDUSTRIAL	GL	0,011	20.000,00	220,00
AGUA	LT	10,000	3,65	36,50
ACIDO NITRICO O SIMILAR	LT	0,011	12.000,00	132,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**388,50**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	0,28	29.224,69	8.116,66
			Subtotal	**8.116,66**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	8.116,66	405,83
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	0,07	27.700,00	1.939,00
HIDROLAVADORA	DIA	0,07	45.000,00	3.150,00
			Subtotal	**5.494,83**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**14.000,00**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM : (NP 2) SUMINISTRO E INSTALACION FOCO LED TIPO OJO DE BUEY. INC ADAPTADORES PARA LA INSTALACION

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
ACCESORIO PARA CONEXIONES (UNION PVC, ESPUMA EXPANDIBLE EN POLIPROPILENO)	UND	1,00	3.500,00	3.500,00
FOCO LED TIPO OJO DE BUEY	UND	1,00	8.000,00	8.000,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**11.500,00**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	0,25	46.759,51	11.689,88
				-
			Subtotal	**11.689,88**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	11.689,88	584,49
				-
			Subtotal	**584,49**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**23.774,37**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 3) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED LUJO PARA TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
LAMPARA LED DE LUJO PARA TECHO. INC CONTROL REMOTO PARA CAMBIO TIPO DE LUZ E INTENSIDAD	UND	1,00	297.800,00	297.800,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**297.800,00**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	0,10	46.759,51	4.675,95
				-
			Subtotal	**4.675,95**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	4.675,95	233,80
				-
			Subtotal	**233,80**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**302.709,75**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 8) - SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CON SISTEMA INVERTER.	UND	1,00	#########	5.457.223,84
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**5.457.223,84**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ESPECIALIZADAS EN REFRIGERACION Y CLIMATIZACION (FF1)	HC	8,00	86.318,59	690.548,72
				-
			Subtotal	**690.548,72**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	690.548,72	34.527,44
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	1,000	27.700,00	27.700,00
				-
			Subtotal	**62.227,44**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**6.210.000,00**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM : (NP 9) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHOF EN CONSUMO

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHORRO	UND	1,00	50.000,00	50.000,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2''	RLL	0,10	1.800,00	180,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**50.180,00**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	0,60	35.069,63	21.041,78
				-
			Subtotal	**21.041,78**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	21.041,78	1.052,09
				-
			Subtotal	**1.052,09**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**72.273,87**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

CARPINTERIA METALICA

ITEM : (NP 15) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR. CAL 14. (INCLUYE ANTICORROSI' PRIMER Y ESMALTE).

UNIDAD: M2

1. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
LAMINA ALFAJOR. CAL 14	M2	1,00	166.500,00	166.500,00
ANTICORROSIVO PRIMER	GL	0,05	137.419,50	6.870,98
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II	GL	0,10	80.836,50	8.083,65
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	UND	0,40	3.300,00	1.320,00
DISOLVENTE THINER	GL	0,03	30.000,00	900,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**183.674,63**

2. Mano de Obra				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1)	HC	0,16	64.294,32	10.287,09
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	0,25	49.097,48	12.274,37
			Subtotal	**22.561,46**

3. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	22.561,46	1.128,07
				-
			Subtotal	**1.128,07**

4. Transporte				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	-

Precio unitario TOTAL	**207.364,16**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

VIDRIOS Y CERRADURAS

ITEM : (NP 20) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1 1/2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON PUNTOS DE AMARI CERRADURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE

UNIDAD: M2

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
PUERTA EN VIDRIO Ttemplado	M2	1,00	823.500,00	823.500,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	823.500,00

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	1,50	35.069,63	52.604,45
			Subtotal	52.604,45

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	52.604,45	2.630,22
			Subtotal	2.630,22

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	-

Precio unitario TOTAL	878.734,67

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)

MAMPOSTERIA

ITEM : (NP. 22) - IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MORTERO Y PINTURA TIPO SIKA. IMPRIMACION 1:1, DOS CAPAS PURAS

UNIDAD: ML

1. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,05	713.708,61	35.685,43
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, SELLANTE DE FILTRACIONES (TIPO SIKA 2 O SIMILAR X 2.5 KG).	KG	0,30	52.180,00	15.654,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**51.339,43**

2. Mano de Obra				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	0,50	40.914,57	20.457,29
				-
			Subtotal	**20.457,29**

3. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	20.457,29	1.022,86
				-
			Subtotal	**1.022,86**

4. Transporte				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**72.819,58**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 25) DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO. INC SUSPENSION DEL CONEXIONAL

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
DESPERDICIO %				
			Subtotal	-

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	6,80	40.914,57	278.219,08
				-
			Subtotal	**278.219,08**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	7,00	278.219,08	19.475,34
				-
			Subtotal	**19.475,34**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	-

Precio unitario TOTAL	**297.694,41**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 26) - SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO TRIFASICO EMPOTRADO PAI CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
GABINETE ELECTRICO TRIFASICO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS	UND	1,00	#########	1.540.000,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**1.540.000,00**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	4,70	46.759,51	219.769,70
				-
			Subtotal	**219.769,70**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	219.769,70	10.988,48
				-
			Subtotal	**10.988,48**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**1.770.758,18**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 27) SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELECTRICO TRIFÁSICO

UNIDAD: UND

1. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
BARRAJE ELECTRICO TRIFASICO	UND	1,00	48.200,00	48.200,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**48.200,00**

2. Mano de Obra				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	0,33	46.759,51	15.430,64
			Subtotal	**15.430,64**

3. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	15.430,64	771,53
			Subtotal	**771,53**

4. Transporte				
Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	-

Precio unitario TOTAL	**64.402,17**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 28) - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO	UND	1,00	173.113,53	173.113,53
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**173.113,53**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	0,65	46.759,51	30.393,68
			Subtotal	**30.393,68**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	30.393,68	1.519,68
			Subtotal	**1.519,68**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	-

Precio unitario TOTAL	**205.026,89**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 29) - SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL A 220V. INC PROGRAMACION DE TIEMPOS DE SERVICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO.

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
TEMPORIZADOR ELECTRONICO DIGITAL A 220V	UND	1,00	166.200,00	166.200,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**166.200,00**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	1,68	46.759,51	78.555,98
				-
			Subtotal	**78.555,98**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	78.555,98	3.927,80
				-
			Subtotal	**3.927,80**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**248.683,78**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 30) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 5,0M.

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO (TIPO RAWELT) OCTAGONAL CON SALIDAS DE 3/4"	UND	1,00	17.120,00	17.120,00
ABRAZADERA PLÁSTICA	UND	3,00	400,00	1.200,00
CONECTOR TERMINAL DE ACERO PARA TUBO EMT DE 3/4"	UND	1,00	2.835,00	2.835,00
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 2X14 AWG	ML	3,00	7.362,60	22.087,80
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**43.242,80**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	HC	2,91	46.759,51	136.070,17
				-
			Subtotal	**136.070,17**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	136.070,17	6.803,51
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	0,400	27.700,00	11.080,00
TALADRO	HORA	0,24	4.621,00	1.109,04
				-
			Subtotal	**18.992,55**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**198.305,52**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS (AÑO 2026)
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM : (NP 31) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 5,0M.

UNIDAD: UND

1. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
GUAYA EN ACERO DE 1/8"	ML	1,00	1.000,00	1.000,00
GRILLETE DE AMARRE	UND	1,00	2.000,00	2.000,00
DESPERDICIO %				
			Subtotal	**3.000,00**

2. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	0,04	40.914,57	1.636,58
				-
			Subtotal	**1.636,58**

3. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (M.O)	%	5,00	1.636,58	81,83
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	0,018	27.700,00	498,60
				-
			Subtotal	**580,43**

4. Transporte

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial
			Subtotal	**-**

Precio unitario TOTAL	**5.217,01**

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON		CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/01/2026	5210888	$1.064.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	1	300	0	375.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	1	300	0	480.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	1	200	209.000			2.088	209.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.300
Pensión	1	480.000	480.300
Riesgos Laborales	1	208.800	209.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.064.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 38	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/01/2026	5210888	$1.064.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días cotiz.	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	5	206.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	656259707	9511138832	E	2026/01/08	2026/09/15	BANCOLOMBIA	250	$172,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY	X	X																25-14	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO	X	X																230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
Total	**Afiliados(2)**																						$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0		$147,200

2026/09/15 03:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	656259707	9511138832	E	2026/01/08	2026/09/15	BANCOLOMBIA	250	$172,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$76,000	$13,200						$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$38,000	$6,600	$0	$0	$0	$0		$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$38,000	$6,600	$0	$0	$0	$0		$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$33,200	$5,800						$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$33,200	$5,800	$0	$0	$0	$0		$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$19,000	$3,300						$0
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$19,000	$3,300	$0	$0	$0	$0		$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$19,000	$3,400						$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$9,500	$1,700	$0	$0	$0	$0		$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,500	$1,700	$0	$0	$0	$0		$0
TOTAL				2	$147,200	$25,700	$0	$0	$0	$0		$0

aportes en línea

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$89,200
$44,600
$44,600
$39,000
$39,000
$22,300
$22,300
$22,400
$11,200
$11,200
$172,900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON		CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	23/02/2026	55749309	$1.075.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	17	4.100	0	379.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	17	5.200	0	485.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	17	2.300	211.100			2.088	211.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	17	0	0	0
ICBF				
0	17	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	379.100
Pensión	1	480.000	485.200
Riesgos Laborales	1	208.800	211.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.075.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	23/02/2026	55749309	$1.075.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Clase cot.	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IBC	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	5	206.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36242190	9499193904	E	2026/02/06	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	$1,202,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY	X																	25-14	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF10	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0	SI	$198,900
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO	X																	230301	11	$641,999	$102,800	EPS041	11	$641,999	$25,700	CCF10	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0	SI	$198,900
3	CC	1002524230	RAMOS FLORIAN MARIA FERNANDA																		230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF10	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
Total	**Afiliados(3)**																						$3,883,998	$621,600			$3,883,998	$155,400			$3,883,998	$155,400			$3,883,998	$270,400		$0	$0		$1,202,800

2026/02/04 12:22 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36242190	9499193904	E	2026/02/06	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	$1,202,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$621,600	$0	$0	$621,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$102,800	$0	$0	$102,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$102,800	$0	$0	$102,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$270,400	$0	$0	$270,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$270,400	$0	$0	$270,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$155,400	$0	$0	$155,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$155,400	$0	$0	$155,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$155,400	$0	$0	$155,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$25,700	$0	$0	$25,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$129,700	$0	$0	$129,700
TOTAL				3	$1,202,800	$0	$0	$1,202,800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67157883	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$1.067.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	5	1.300	0	376.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	5	1.600	0	481.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	5	700	209.500			2.088	209.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	376.300
Pensión	1	480.000	481.600
Riesgos Laborales	1	208.800	209.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.067.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON		CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67157683	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$1.067.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Extranjero	Colomb. exterior	Econviviente	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRESPCCF	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	375.000	14-23	3.000.000	30	5	206.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	76251484	9499956098	E	2026/03/06	2026/02/19	BANCOLOMBIA	0	$1,487,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1002524230	RAMOS FLORIAN MARIA FERNANDA		X																230201	15	$1,300,000	$208,000	EPS041	15	$1,300,000	$52,000	CCF10	15	$1,300,000	$52,000	14-11	15	$1,300,000	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
Total	**Afiliados(3)**																						$4,801,810	$768,400			$4,801,810	$192,200			$4,801,810	$192,200			$4,801,810	$334,300		$0	$0		$1,487,100

2026/02/19 04:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	76251484	9499956098	E	2026/03/06	2026/02/19	BANCOLOMBIA	0	$1,487,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$768,400	$0	$0	$768,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$334,300	$0	$0	$334,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$334,300	$0	$0	$334,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$192,200	$0	$0	$192,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$192,200	$0	$0	$192,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$192,200	$0	$0	$192,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$122,100	$0	$0	$122,100
TOTAL				3	$1,487,100	$0	$0	$1,487,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76046836	17/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.069.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	8	2.100	0	377.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	480.000	0	0	0	0	8	2.600	0	482.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	8	1.200	210.000			2.088	210.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	377.100
Pensión	1	480.000	482.600
Riesgos Laborales	1	208.800	210.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.069.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76046836	17/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.069.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Dirección	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Estudiante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	375.000	14-23	3.000.000	30	5	206.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	292310203	9501852715	E	2026/04/09	2026/05/08	BANCOLOMBIA	29	$1,106,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(2)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0		$1,084,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	292310203	9501852715	E	2026/04/09	2026/05/08	BANCOLOMBIA	29	$1,106,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$11,200	$0	$571,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$5,600	$0	$285,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$5,600	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$4,900	$0	$248,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$4,900	$0	$248,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$2,800	$0	$143,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$140,200	$2,800	$0	$143,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$2,800	$0	$143,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,400	$0	$71,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$1,400	$0	$71,500
TOTAL				2	$1,084,600	$21,700	$0	$1,106,300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON		CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82352014	11/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$1.066.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	3	900	0	375.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	3	1.100	0	481.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	3	500	209.300			2.088	209.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.900
Pensión	1	480.000	481.100
Riesgos Laborales	1	208.800	209.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.066.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82352014	11/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$1.066.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	375.000	14-23	3.000.000	30	5	206.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	656266028	9511138978	E	2026/07/07	2026/09/15	BANCOLOMBIA	70	$190,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY	X	X																25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
Total	Afiliados(2)																						$583,636	$93,400			$583,636	$23,400			$583,636	$23,400			$583,636	$40,800		$0	$0		$181,000

2026/09/15 03:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	656266028	9511138978	E	2026/07/07	2026/09/15	BANCOLOMBIA	70	$190,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$93,400	$5,000					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$46,700	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$46,700	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$40,800	$2,200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$40,800	$2,200	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$23,400	$1,300					$0	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$23,400	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$23,400	$1,400					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,700	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,700	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				2	$181,000	$9,900	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/09/15 03:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$98,400
$49,200
$49,200
$43,000
$43,000
$24,700
$24,700
$24,800
$12,400
$12,400
$190,900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93335652	07/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.063.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	0	0	208.800			2.088	208.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	208.800	208.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.063.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93335652	07/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.063.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Ordenante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. Exterior	Residente	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	375.000	14-23	3.000.000	30	5	208.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	656266028	9511138978	E	2026/07/07	2026/09/15	BANCOLOMBIA	70	$190,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY	X	X																25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
Total	**Afiliados(2)**																						$583,636	$93,400			$583,636	$23,400			$583,636	$23,400			$583,636	$40,800		$0	$0		$181,000

2026/09/15 03:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	656266028	9511138978	E	2026/07/07	2026/09/15	BANCOLOMBIA	70	$190,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$93,400	$5,000					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$46,700	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$46,700	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$40,800	$2,200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$40,800	$2,200	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$23,400	$1,300					$0	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$23,400	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$23,400	$1,400					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,700	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,700	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				2	$181,000	$9,900	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$98,400
$49,200
$49,200
$43,000
$43,000
$24,700
$24,700
$24,800
$12,400
$12,400
$190,900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON		CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94208054	10/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$1.063.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	0	0	208.800			2.088	208.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	208.800	208.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.063.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94208054	10/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$1.063.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	375.000	14-25	3.000.000	30	5	206.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	656282548	9511139069	E	2026/08/10	2026/09/15	BANCOLOMBIA	36	$186,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY	X	X																25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
2	CC	1031151012	PINEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
Total	**Afiliados(2)**																						$583,636	$93,400			$583,636	$23,400			$583,636	$23,400			$583,636	$40,800		$0	$0		$181,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9498427	1	LAITON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	656282548	9511139069	E	2026/08/10	2026/09/15	BANCOLOMBIA	36	$186,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$93,400	$2,600					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$46,700	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$46,700	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$40,800	$1,200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$40,800	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$23,400	$700					$0	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$23,400	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$23,400	$800					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,700	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,700	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				2	$181,000	$5,300	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/09/15 03:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$96,000
$48,000
$48,000
$42,000
$42,000
$24,100
$24,100
$24,200
$12,100
$12,100
$186,300

2026/09/15 03:33 PM

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO AGRARIO	170571060	652916962	14/09/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **9498427**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.156.181.166**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 89,203.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 89,203.00	COP$ 89,203.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO AGRARIO	170571060	652916962	14/09/2026

Número de Identificación
9498427

Primer Nombre ó Razón Social
JHON

Primer Apellido (si es Persona natural)
LAITON

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 3 2 62

Ciudad de Domicilio
SAN PABLO DE BORBUR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3123452018

Correo electrónico
jhonlaiton@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
001-2025

Nombre Obra
MTO AUDITORIO MUNICIPAL

Fecha Inicio Obra
17/12/2025

Fecha Terminación Obra
21/07/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
SAN PABLO DE BORBUR

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
89202885.09

Costo Total Mano de Obra
8920288.51

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
89203.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
89203.00

Recollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO AGRARIO	170598361	653733623	14/09/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **9498427**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.12.94**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 95,300.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 95,300.00	COP$ 95,300.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO AGRARIO	170598361	653733623	14/09/2026

Número de Identificación
9498427

Primer Nombre ó Razón Social
JHON

Primer Apellido (si es Persona natural)
LAITON

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 3 2 62

Ciudad de Domicilio
SAN PABLO DE BORBUR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3123452018

Correo electrónico
jhonlaiton@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
002-2025

Nombre Obra
MTO COLISEO MUNICIPAL

Fecha Inicio Obra
17/12/2025

Fecha Terminación Obra
21/07/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
SAN PABLO DE BORBUR

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
95300261.43

Costo Total Mano de Obra
9530026.14

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
95300.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
95300.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCO AGRARIO**	**170599281**	**653768230**	**14/09/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **9498427**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.12.94**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 17,875.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 17,875.00	COP$ 17,875.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO AGRARIO	170599281	653768230	14/09/2026

Número de Identificación
9498427

Primer Nombre ó Razón Social
JHON

Primer Apellido (si es Persona natural)
LAITON

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 3 2 62

Ciudad de Domicilio
SAN PABLO DE BORBUR

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3123452018

Correo electrónico
jhonlaiton@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
003

Nombre Obra
MTO PLAZA MERCADO MUNICIPAL

Fecha Inicio Obra
10/06/2026

Fecha Terminación Obra
21/07/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
SAN PABLO DE BORBUR

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
17875116.72

Costo Total Mano de Obra
1787511.67

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
17875.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
17875.00

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $104.400 EL DIA 14-01-2026 RESPECTO DE 1 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202512 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 849496930051.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electronico, dirección, teléfono celular, tada vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y telefónos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y registrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todas los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualizacion de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripcion y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $155.400 EL DIA 04-02-2026 RESPECTO DE 3 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202601 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 849499193904.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE .
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electronico, dirección, teléfono celular, tada vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y telefónos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y registrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todas los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualizacion de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripcion y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $ 192.200 EL DIA 19-02-2026 RESPECTO DE 3 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202602 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 9499956098.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, toda vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todos los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $ 143.000 EL DIA 08-05-2026 RESPECTO DE 2 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202603 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 9501852715.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, toda vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todos los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes párafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $ 37.400 EL DIA 08-05-2026 RESPECTO DE 2 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202604 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 9504488523.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, toda vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todos los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $ 24.700 EL DIA 15-09-2026 RESPECTO DE 2 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202606 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 9511138978.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, toda vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todos los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE $ 24.100 EL DIA 15-09-2026 RESPECTO DE 2 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202607 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 9511139069.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:
- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, toda vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a http://www.comfaboy.com.co, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todos los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:
-Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
-Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

comfaboy
unidos para crecer

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que la empresa Laiton Jhon Alexander identificada con Nit canceló a COMFABOY por concepto de aportes parafiscales, desde el periodo 2025 hasta el periodo 17/09/2026

No.	Fecha Recaudo	Año	Mes	Nº Planilla	Monto De Aporte	Valor Interes
1	2025-09-18	2025	03	9491863311	$38.000	$4.000
2	2025-09-18	2025	04	9491863414	$38.000	$3.300
3	2025-09-18	2025	05	9491863463	$38.000	$2.500
4	2025-09-18	2025	06	9491863510	$38.000	$1.800
5	2025-11-28	2025	10	9495589482	$28.500	$400
6	2025-12-15	2025	11	9496359338	$69.400	$500
7	2025-12-19	2025	11	9496672122	$28.500	$300
8	2026-01-14	2025	12	9496930051	$104.000	$400
9	2026-09-15	2025	12	9511138832	$19.000	$3.300
TOTALES:					**$401.400**	**$16.500**

Se expide en Tunja, a los 17/09/2026 a solicitud del interesado

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA

JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

comfaboy
unidos para crecer

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que la empresa Laiton Jhon Alexander identificada con Nit canceló a COMFABOY por concepto de aportes parafiscales, desde el periodo 2026 hasta el periodo 17/09/2026

No.	Fecha Recaudo	Año	Mes	Nº Planilla	Monto De Aporte	Valor Interes
1	2026-02-04	2026	01	9499193904	$155.400	$0
2	2026-02-20	2026	02	9499956098	$192.200	$0
3	2026-05-08	2026	03	9501852715	$140.200	$2.800
4	2026-05-08	2026	04	9504488523	$37.400	$0
5	2026-09-15	2026	06	9511138978	$23.400	$1.300
6	2026-09-15	2026	07	9511139069	$23.400	$700
TOTALES:					**$572.000**	**$4.800**

Se expide en Tunja, a los 17/09/2026 a solicitud del interesado

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA

JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
78d07e6499855a544bb4dc64cacde6141a4fd0a529637e31f46a0fd8f9a5ff227ceb624fd1cb6877942da7ab1529df1e

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 22/09/2026
Fecha de Vencimiento: 23/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901992295
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: San Pablo De Borbur
Dirección: CR 3 2 06
Teléfono / Móvil: 3219801331
Correo: DESARROLLOTERRITORIALTECNOLOGI@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891801369
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: San Pablo De Borbur
Dirección: Carrera 3 # 02 - 06
Teléfono / Móvil: 3107790143
Correo: alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RP20251070002	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MTO PREV Y COR DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	NIU	1,00	$ 150.011.248,28	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.011.248,28

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/09/2026 11:19:49
Documento validado por la DIAN:
22/09/2026 11:19:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	150011248.28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150011248.28
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	150011248.28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 150011248.28

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.011.248,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.011.248,28
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	150.011.248,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 150.011.248,28

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102394653 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-01

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A. identificado(a) con NITPJ 9019922951 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Superdía Jurídica No. 268327871 desde el 05 de diciembre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de septiembre de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003 – 2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"

SEPTIEMBRE DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito verificar, analizar y emitir concepto respecto al avance físico, técnico y financiero del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003 – 2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR".

Lo anterior se fundamenta en el informe de ejecución presentado por el contratista, con el fin de respaldar el trámite de cobro correspondiente a la liquidación del contrato, en cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual y de la normatividad vigente aplicable a los contratos de obra pública.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1. TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	No. 003 – 2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 de Chiquinquirá
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA S.A.S NIT. 901.992.295-1 R/L EDISON FERNANDO RIVERA LÓPEZ C.C. No. 1.018.450.439 de Bogotá
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS CO SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($142.869.009,65)
VALOR ADICIÓN No. 01	SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 64.289.842,49)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 01	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ 207.158.852,14)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON ACTA DE REINICIO No. 01	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA No. 1	DOS (2) MESES
	ONCE (11) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA No. 1	DOCE (12) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	OCHO (08) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 02	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON ACTA DE REINICIO No. 02	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA No. 2	DOS (02) MESES
	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA No. 1 Y No. 2	DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2026

2.2. ACTIVIDADES CONTRATADAS

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL
A	AUDITORIO MUNICIPAL										
1		PRELIMINARES									
1.1	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	294,15	$ 9.430,39	$ 2.773.961,23				294,15	$ 2.773.961,23
1.2	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	194,62	$ 20.819,48	$ 4.051.887,20				194,62	$ 4.051.887,20
1.3	APU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIGA CANAL. INC IMPERMEABILIZACION	ML	13,15	$ 37.600,00	$ 497.070,00				13,15	$ 497.070,00
		SUBTOTAL				$ 7.322.918,43			$ 0,00		$ 7.322.918,43
2		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS									
2.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	2,00	$ 768.162,39	$ 1.536.324,78				2,00	$ 1.536.324,78
2.2	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	2,00	$ 106.836,96	$ 213.673,92				2,00	$ 213.673,92
		SUBTOTAL				$ 1.749.998,69			$ 0,00		$ 1.749.998,69
3		PINTURA									
3.1	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	13,15	$ 8.884,99	$ 116.837,58				13,15	$ 116.837,58
3.2	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	84,00	$ 22.987,47	$ 1.930.947,08				84,00	$ 1.930.947,08
3.3	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	521,52	$ 12.214,40	$ 7.591.506,35				521,52	$ 7.591.506,35
		SUBTOTAL				$ 9.639.291,01			$ 0,00		$ 9.639.291,01
4		CUBIERTA									
4.1	1.12.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	194,62	$ 66.236,32	$ 12.890.913,45				194,62	$ 12.890.913,45
4.2	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	13,15	$ 56.638,94	$ 744.802,02				13,15	$ 744.802,02
4.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	39,45	$ 23.794,26	$ 938.683,46	116,35		$ 2.816.050,39	157,80	$ 3.754.733,85
4.4	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	13,15	$ 159.433,32	$ 2.096.548,09		-13,15	-$ 2.096.548,09	0,00	$ 0,00
4.5	ICCU 7.5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	24,00	$ 56.079,00	$ 1.345.896,00		-24,00	-$ 1.345.896,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 18.016.843,03			-$ 620.393,71		$ 17.396.449,32
5		INSTALACIONES ELECTRICAS									
5.1	2.10.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	25,00	$ 45.771,25	$ 1.144.281,33	31,00		$ 1.418.908,85	56,00	$ 2.563.190,18
		SUBTOTAL				$ 1.144.281,33			$ 1.418.908,85		$ 2.563.190,18
6		CIELO RASOS									
6.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	178,10	$ 83.710,94	$ 14.909.002,20				178,10	$ 14.909.002,20
		SUBTOTAL				$ 14.909.002,20			$ 0,00		$ 14.909.002,20
B	COLISEO SAN PABLO DE BORBUR										
7		PRELIMINARES									
7.1	APU	LAVADA DE CERRAMIENTOS, MUROS Y FACHADAS. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTE.	M2	966,05	$ 12.575,48	$ 12.148.542,45				966,05	$ 12.148.542,45
7.2	APU	LAVADA DE ESTRUCTURA METALICA. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESENGRASANTE Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA.	ML	1873,00	$ 14.000,00	$ 26.222.000,00				1.873,00	$ 26.222.000,00
		SUBTOTAL				$ 38.370.542,45			$ 0,00		$ 38.370.542,45
8		CIMENTACION Y DESAGUES									
8.1	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	8,40	$ 175.768,79	$ 1.476.457,84	6,75		$ 1.186.439,34	15,15	$ 2.662.897,17
		SUBTOTAL				$ 1.476.457,84			$ 1.186.439,34		$ 2.662.897,17
9		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS									
9.1	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	4,00	$ 106.836,96	$ 427.347,84				4,00	$ 427.347,84
9.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	4,00	$ 148.456,79	$ 593.827,16		-4,00	-$ 593.827,16	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 1.021.174,99			-$ 593.827,16		$ 427.347,84

10		PINTURAS									
10.1	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	981,60	$ 8.884,99	$ 8.721.503,44	14,50		$ 128.832,31	996,10	$ 8.850.335,75
10.2	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	112,32	$ 22.987,47	$ 2.581.952,09	9,25		$ 212.634,05	121,57	$ 2.794.586,14
10.3	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	325,88	$ 12.214,40	$ 3.980.513,96	187,78		$ 2.293.620,11	513,67	$ 6.274.134,07
		SUBTOTAL				$ 15.283.969,49			$ 2.635.086,47		$ 17.919.055,96
11		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
11.1	2.18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UND	2,00	$ 482.379,36	$ 964.758,73		-2,00	-$ 964.758,73	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 964.758,73			-$ 964.758,73		$ 0,00
NP		ITEMS NO PREVISTOS									
NP. 1	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		$ 127.317,96	$ -	5,00		$ 636.589,80	5,00	$ 636.589,80
NP. 2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION FOCO LED TIPO OJO DE BUEY. INC ADAPTADORES PARA LA INSTALACION	UND		$ 23.774,37	$ -	8,00		$ 190.194,96	8,00	$ 190.194,96
NP. 3	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED LUJO PARA TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND		$ 302.709,75	$ -	6,00		$ 1.816.258,50	6,00	$ 1.816.258,50
NP. 4	2.10.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	ML		$ 32.902,45	$ -	24,00		$ 789.658,80	24,00	$ 789.658,80
NP. 5	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND		$ 22.359,26	$ -	24,00		$ 536.622,24	24,00	$ 536.622,24
NP. 6	2.10.208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	UND		$ 29.540,14	$ -	12,00		$ 354.481,68	12,00	$ 354.481,68
NP. 7	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 18.022,55	$ -	5,00		$ 90.112,75	5,00	$ 90.112,75
NP. 8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UND		$ 6.210.000,00	$ -	2,00		$ 12.420.000,00	2,00	$ 12.420.000,00
NP. 9	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHORRO EN CONSUMO	UND		$ 72.273,87	$ -	7,00		$ 505.917,09	7,00	$ 505.917,09
NP. 10	2.12.190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO	UND		$ 67.656,48	$ -	6,00		$ 405.938,88	6,00	$ 405.938,88
NP. 11	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2		$ 31.200,12	$ -	7,68		$ 239.686,04	7,68	$ 239.686,04
NP. 12	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	M2		$ 24.171,56	$ -	3,24		$ 78.315,85	3,24	$ 78.315,85
NP. 13	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML		$ 13.821,20	$ -	26,78		$ 370.131,74	26,78	$ 370.131,74
NP. 14	2.10.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	UND		$ 190.764,68	$ -	4,00		$ 763.058,76	4,00	$ 763.058,76
NP. 15	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR. CAL 14. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	M2		$ 207.364,16	$ -	3,00		$ 622.092,48	3,00	$ 622.092,48
NP. 16	3.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG		$ 24.042,70	$ -	21,71		$ 521.967,02	21,71	$ 521.967,02
NP. 17	3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG		$ 26.043,49	$ -	58,81		$ 1.531.617,65	58,81	$ 1.531.617,65
NP. 18	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2		$ 553.268,59	$ -	1,84		$ 1.018.014,21	1,84	$ 1.018.014,21
NP. 19	2.15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	M2		$ 420.228,80	$ -	3,24		$ 1.361.541,60	3,24	$ 1.361.541,60
NP. 20	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1 1/2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON PUNTOS DE AMARRE, CERRADURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 578.734,67	$ -	5,78		$ 5.079.086,39	5,78	$ 5.079.086,39
NP. 21	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	UND		$ 105.270,17	$ -	5,00		$ 526.350,85	5,00	$ 526.350,85
NP. 22	APU	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MORTERO Y PINTURA TIPO SIKA. IMPRIMACION 1:1, DOS CAPAS PURAS	ML		$ 72.819,58	$ -	6,50		$ 473.327,27	6,50	$ 473.327,27
NP. 23	2.12.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC	ML		$ 31.327,39	$ -	3,00		$ 93.982,17	3,00	$ 93.982,17
NP. 24	2.08.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN).	ML		$ 41.446,67	$ -	13,50		$ 559.532,75	13,50	$ 559.532,75
NP. 25	APU	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO. INC SUSPENSION DEL CONEXIONADO	UND		$ 297.694,41	$ -	3,00		$ 893.083,23	3,00	$ 893.083,23
NP. 26	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO TRIFASICO EMPOTRADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS. INC CONEXIONADO	UND		$ 1.770.758,18	$ -	1,00		$ 1.770.758,18	1,00	$ 1.770.758,18
NP. 27	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELECTRICO TRIFÁSICO	UND		$ 64.402,17	$ -	3,00		$ 193.206,51	3,00	$ 193.206,51
NP. 28	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO	UND		$ 205.026,89	$ -	3,00		$ 615.080,67	3,00	$ 615.080,67
NP. 29	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL A 220V. INC PROGRAMACION DE TIEMPOS DE SERVICIO.	UND		$ 248.683,78	$ -	3,00		$ 746.051,34	3,00	$ 746.051,34
NP. 30	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 7,0M.	UND		$ 198.305,52	$ -	35,00		$ 6.940.693,20	35,00	$ 6.940.693,20
NP. 31	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA EN ACERO DE 1/8". INC GRILLETES	ML		$ 5.217,01	$ -	87,50		$ 456.488,38	87,50	$ 456.488,38
NP. 32	2.10.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	ML		$ 32.321,14	$ -	30,00		$ 969.634,20	30,00	$ 969.634,20

NP. 33	2.10.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND		$ 135.313,45	$ -	1,00		$ 135.313,45	1,00	$ 135.313,45
NP. 34	2.10.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND		$ 132.530,29	$ -	1,00		$ 132.530,29	1,00	$ 132.530,29
NP. 35	2.10.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND		$ 242.497,64	$ -	3,00		$ 727.492,92	3,00	$ 727.492,92
NP. 36	2.10.155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UND		$ 162.121,12	$ -	5,00		$ 810.605,60	5,00	$ 810.605,60
NP. 37	2.10.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W	UND		$ 103.233,01	$ -	5,00		$ 516.165,05	5,00	$ 516.165,05
NP. 38	2.10.220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X40 AMP.	UND		$ 60.502,19	$ -	4,00		$ 242.008,76	4,00	$ 242.008,76
NP. 39	2.10.234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X60 AMP.	UND		$ 264.678,68	$ -	1,00		$ 264.678,68	1,00	$ 264.678,68
		SUBTOTAL				$ -			$ 46.398.268,93		$ 46.398.268,93
		COSTO TOTAL OBRA CIVIL				$ 109.899.238,19			$ 49.453.724,99		$ 159.352.963,18
		ADMINISTRACION			24%	$ 26.375.817,17			$ 11.868.894,00		$ 38.244.711,14
		IMPREVISTOS			1%	$ 1.098.992,38			$ 494.537,25		$ 1.593.529,63
		UTILIDAD			5%	$ 5.494.961,91			$ 2.472.686,25		$ 7.967.648,14
		TOTAL CONTRATO				$ 142.869.009,65			$ 64.289.842,49		$ 207.158.852,14

2.3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA	COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN
1	ACTA DE INICIO	24/11/2025	N/A
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2025	N/A
3	ACTA DE REINICIO No. 1	19/01/2026	N/A
4	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	08/04/2026	N/A
5	ACTA DE REINICIO No. 2	05/06/2026	N/A
6	ACTA DE TERMINACIÓN	29/07/2026	N/A

2.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	PASIVO	ACTIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		$142.869.009,65
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES (ANTICIPADO DEL 40%)	$57.147.603,86	
VALOR ADICIÓN No. 01 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		$64.289.842,49
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	$150.011.248,28	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$0	
VALORES TOTALES	**$207.158.852,14**	**$207.158.852,14**

3. VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO

De acuerdo con el informe presentado por el contratista, se evidenció la ejecución de las siguientes actividades, las cuales fueron verificadas y avaladas por la supervisión:

AUDITORIO MUNICIPAL

1. PRELIMINARES

1.1 DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó desmonte de cielo falso en el auditorio municipal, pasillos de la biblioteca y auditorio municipal y segundo piso del auditorio y concejo municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
294,15 m²	0,00 m²	294,15 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	294,15 m²	294,15 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 1, 2. Demolición de cielo falso, auditorio municipal.



Foto 3, 4. Demolición de cielo falso, pasillos biblioteca.



Foto 5, 6. Demolición de cielo falso, segundo piso auditorio.

1.2 DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el desmonte de la cubierta localizada en el auditorio, biblioteca y concejo municipal.

Contratado: **Cant. Adicional:** **Total contratado:**

194,62 m²	0,00 m²	194,62 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	194,62 m²	194,62 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 7, 8. Desmonte de cubierta, auditorio municipal.

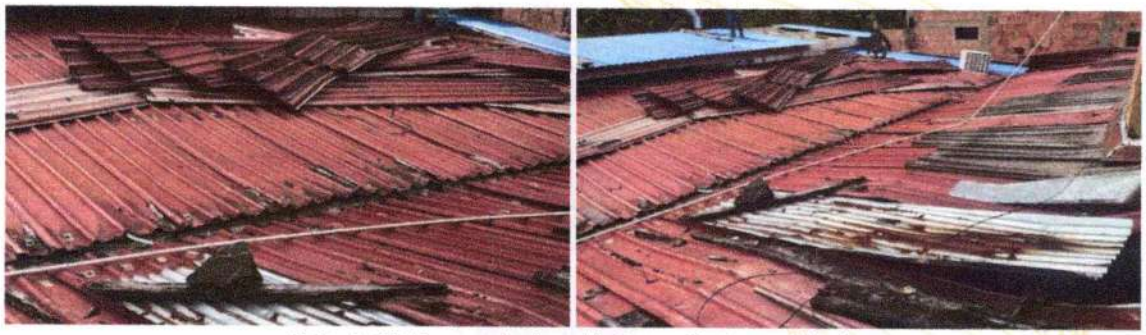


Foto 9, 10. Desmonte de cubierta, auditorio municipal.

1.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIGA CANAL. INC IMPERMEABILIZACIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó mantenimiento y reparación de viga canal, incluyendo impermeabilización para viga canal del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	0,00 ml	13,15 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,15 ml	13,15 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 11, 12, 13. Mantenimiento y reparación viga canal, auditorio municipal.

2. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de combo sanitario, incluyendo accesorios, en los baños del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
2,00 unidades	0,00 unidades	2,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	2,00 unidades	2,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 14, 15. Instalación de combos sanitarios, auditorio municipal.

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de griferías para lavamanos con llave sencilla, en el Sanitario del Concejo Municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
2,00 unidades	0,00 unidades	2,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidades	1,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	-1,00 unidades	



Foto 16. Instalación de griferias para lavamanos, auditorio municipal.

3. PINTURA

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de pintura en esmalte a lámina lineal para perfilería metálica para la cubierta del auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	0,00 ml	13,15 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,15 ml	13,15 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 17, 18. Pintura en esmalte para perfilería, auditorio municipal.

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de esmalte a lámina llena para puertas y ventanas del auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
84,00 m²	0,00 m²	84,00 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	84,00 m²	84,00 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 19, 20, 21, 22. Pintura en esmalte para puertas, auditorio municipal.





Foto 23, 24, 25. Pinturta en esmalte para ventanas, auditorio municipal.

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de vinilo tipo I sobre estuco en todas las instalaciones que componen el edificio del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
621,52 m2	0,00 m2	621,52 m2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m2	621,52 m2	621,52 m2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m2	0,00 m2	







Foto 26-33. Aplicación de vinilo tipo I áreas interiores, auditorio municipal.



Foto 34, 35. Aplicación de vinilo tipo I áreas exteriores, auditorio municipal.

4. CUBIERTA

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de cubierta arquitectónica galvanizada en el auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
194,62 m²	0,00 m²	194,62 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	194,62 m²	194,62 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 36. Instalación de cubierta arquitectónica en auditorio municipal.


4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de flanche en lámina para la cubierta del auditorio/biblioteca municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	0,00 ml	13,15 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	13,15 ml	13,15 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	

0,00 ml 0,00 ml

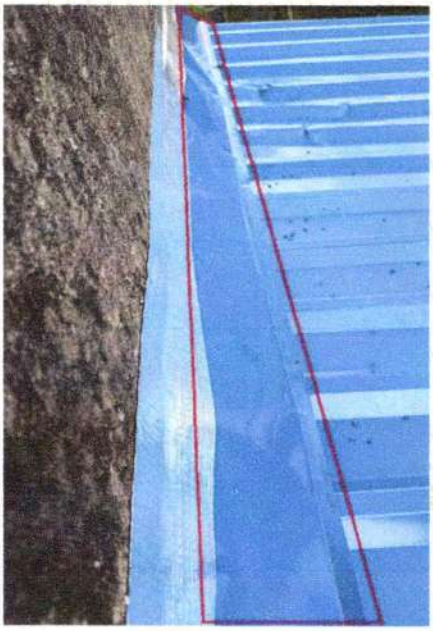

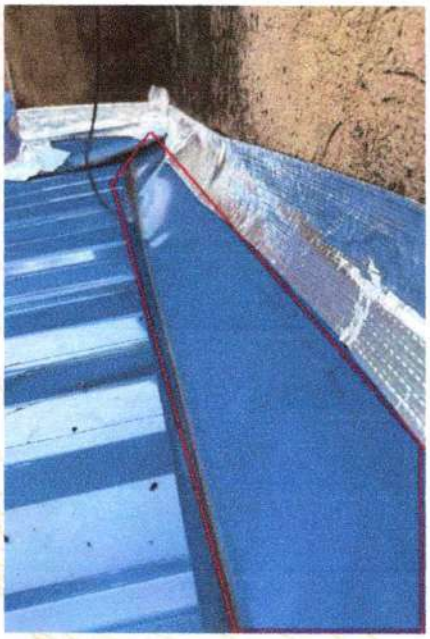


Foto 37, 38. Instalación de flanche en lámina para cubierta, audiotorio municipal.

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

AUDITORIO MUNICIPAL

Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta para edificación de auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
39,45 kg	118,35 kg	157,80 kg
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 kg	162,29 kg	162,29 kg
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
4,49 kg	0,00 kg	



Foto 39, 40. Instalación de perfilería metálica para cubierta auditorio.

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).

AUDITORIO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de las canales. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
13,15 ml	- 13,15 ml	0,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	0,00 ml	0,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"

AUDITORIO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de las canales y por consiguiente tampoco se requirió la instalación de las bajantes de aguas lluvias. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
24,00 ml	- 24,00 ml	0,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	0,00 ml	0,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
25,00 unidades	31,00 unidades	56,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	56,00 unidades	56,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó instalación de panel led redondo de 24W en instalaciones generales del auditorio municipal. Se instalaron 46 unidades.



Foto 41-45. Instalación de panel led redondo, auditorio municipal.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó instalación de panel led redondo de 24W en instalaciones generales. Se instalaron 8 paneles en los baños y 2 en la oficina del sector de la terraza.



Foto 46, 47. Instalación de panel led redondo, plaza de mercado (baños).

6. CIELO RASOS

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó instalación de cielo raso en PVC para la zona del auditorio y los pasillos de la biblioteca/auditorio.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
178,10 m²	0,00 m²	178,10 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	178,10 m²	178,10 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 48-51. Instalación de cielo raso, auditorio/pasillos biblioteca.

COLISEO MUNICIPAL

7. PRELIMINARES

7.1 LAVADA DE CERRAMIENTOS, MUROS Y FACHADAS. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASANTE

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la lavada de cerramientos como muros y fachas con productos de limpieza y desengrasante adecuados para cada superficie.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
966.05 m²	0,00 m²	966.05 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	966.05 m²	966.05 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	

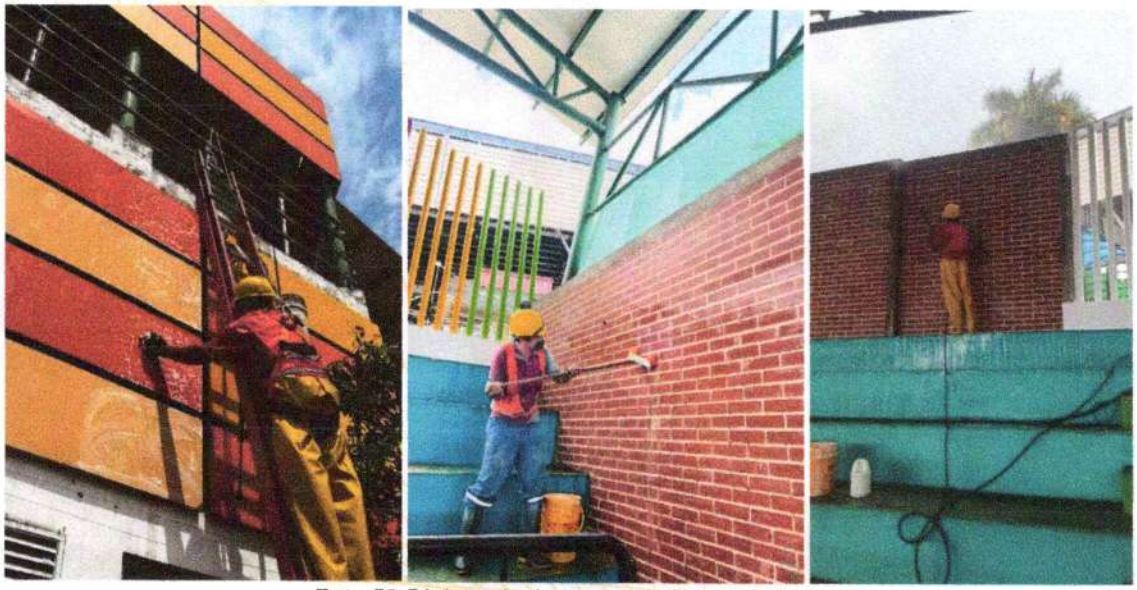


Foto 52-54. Lavada de muros periféricos coliseo.



Foto 55,56. Lavada de muros edificación "baños".

7.2 LAVADA DE ESTRUCTURA METALICA. INC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESENGRASANTE Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la lavada de estructura metálica con productos de limpieza como desengrasante y el equipo de trabajo necesario para realizar esta actividad.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
1873,00 ml	0,00 ml	1873,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	1873,00 ml	1873,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 57-62. Lavada de estructura metálica en coliseo.

8. CIMENTACION Y DESAGUES

8.1 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la construcción de plaza maciza de concreto de 21 MPa para parte anterior del coliseo municipal, con el fin de evitar infiltraciones.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
8,40 m^2	6,75 m^2	15,15 m^2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m^2	15,15 m^2	15,15 m^2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m^2	0,00 m^2	

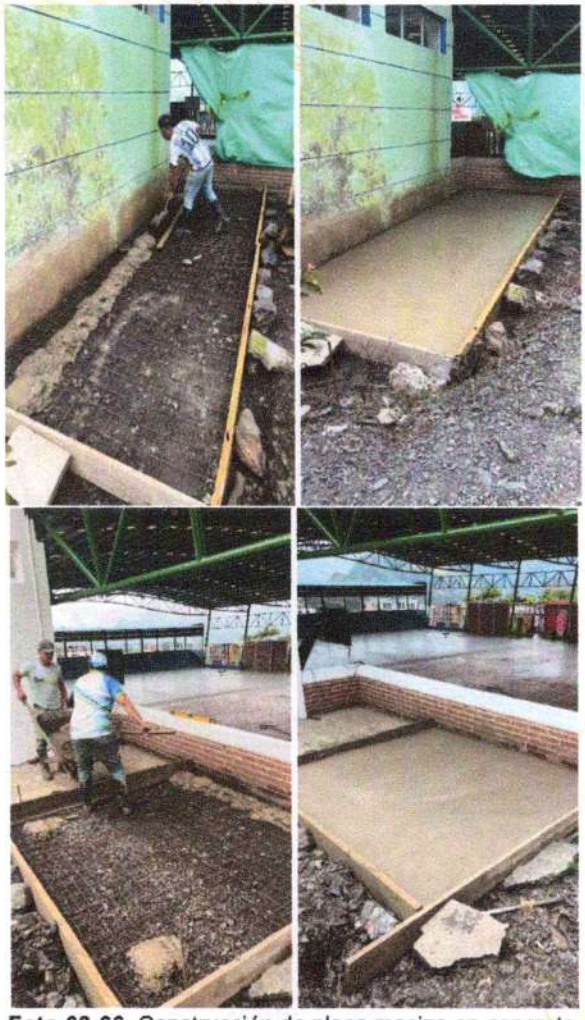


Foto 63-66. Construcción de placa maciza en concreto.

9. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de grifería completa para lavamanos con llave sencilla.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
4,00 unidades	0,00 unidades	4,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 67, 68. Instalación de griferias para lavamanos.

9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA

COLISEO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de las duchas, ya que el espacio acondicionado para tal fin ya no se usa. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**

4,00 unidades	-4,00 unidades	0,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	0,00 unidades	0,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

10. PINTURAS

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
981,60 ml	14,50 ml	996,10 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	996,10 ml	996,10 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina lineal a 3 manos para cerramiento periférico (tubos metálicos) del coliseo municipal. Adicionalmente, se interviene la baranda metálica que está en el sector de las graderías del costado de la vía nacional. En total se aplicaron 996,10ml de esmalte en el sector del Coliseo Municipal.

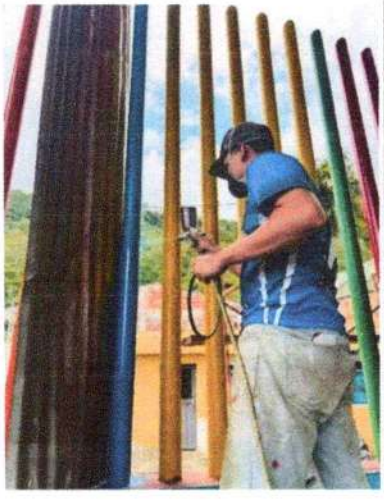
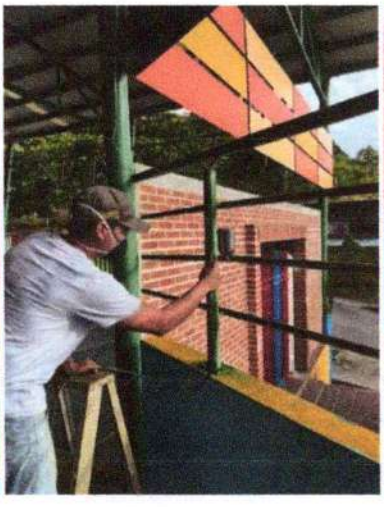






Foto 69-74. Aplicación de pintura en esmalte para tubos metálicos, coliseo.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina lineal a 3 manos en la nueva baranda (tubos metálicos) en el sector de la terraza en el nuevo paso peatonal construido. En total se aplicaron 14,50ml de esmalte en el sector de la Plaza de Mercado.



Foto 75, 76. Aplicación de pintura en esmalte, nueva baranda plaza municipal.

10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS

Contratado:	Cant. Adicional:	Total contratado:
112,32 m²	9,25 m²	121,57 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	121,57 m²	121,57 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina llena a 3 manos para puertas y ventanas del coliseo municipal, con un total de 112,32 m²





Foto 77-84. Aplicación de pintura en esmalte para puertas y ventanas, coliseo.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó la aplicación de esmalte en lámina llena a 3 manos para puertas y ventanas de la Plaza de Mercado, con un total de 9,25 m^2



Foto 85-87. Aplicación de pintura en esmalte, puertas plaza municipal.

10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
325,89 m²	187,78 m²	513,67 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	513,67 m²	513,67 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la aplicación de vinilo tipo I en muros del edificio de baños del coliseo, así como en los muros perimetrales de este. En total en este sector se aplicaron 410,89 m².



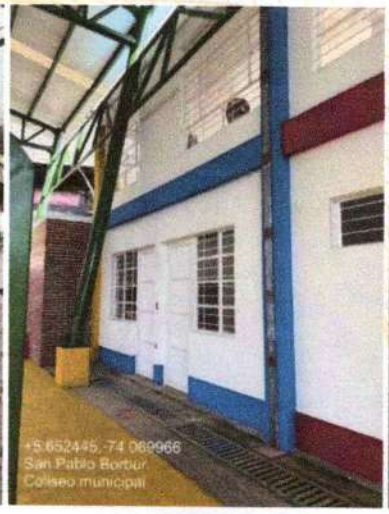








Foto 88-92. Aplicación de pintura vinilo para muros (edificio baños).



Foto 93-97. Aplicación de pintura vinilo para muros (cerramiento).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó la aplicación de vinilo tipo I en muros de las nuevas oficinas que se adecuaron. En total en este sector se aplicaron 102,78 m².





Foto 98-101. Aplicación de pintura vinilo, oficinas plaza municipal.

11. INSTALACIONES DEPORTIVAS

11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM

COLISEO MUNICIPAL

Actividad con menores cantidades. Esta actividad NO se realizó, debido a que por consideraciones técnicas NO se requirió la instalación de los tableros en Acrílico debido a que dicha instalación ya fue realizada. Modificaciones contractuales realizadas en el OTRO SI MODIFICATORIO No. 3.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
2,00 unidades	-2,00 unidades	0,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	0,00 unidades	0,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

ÍTEMS NO PREVISTOS

NP. 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidad	5,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidad	5,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de 1 salida completa para interruptor doble en instalaciones del coliseo municipal (canchas).



Foto 102, 103. Instalación de interruptor, coliseo municipal.

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de 4 salidas completas para interruptor doble en instalaciones del Auditorio Municipal (en el cuarto de controles).



Foto 104-106. Instalación de interruptores, instalaciones auditorio municipal.

NP. 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOCO LED TIPO OJO DE BUEY. INC ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación foco led tipo ojo de buey en instalaciones del auditorio municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	8,00 unidades	8,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	8,00 unidades	8,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 107-108. Instalación de foco led tipo ojo de guey, auditorio.

NP. 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED LUJO PARA TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de lámpara led de lujo para techo en el concejo municipal y auditorio municipal.

Contratado: 0,00 unidades	**Cant. Adicional:** 6,00 unidades	**Total contratado:** 6,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores: 0,00 unidades	**Cantidades ejecutadas presente acta:** 6,00 unidades	**Total ejecutado:** 6,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 unidades	**Menores cantidades ejecutadas:** 0,00 unidades	



Foto 109, 110. Instalación de lámparas led de lujo, concejo y auditorio municipal.

NP. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de alimentador parcial trifásico en cable cobre No. 10 AWG para instalaciones de los nuevos Aires Acondicionados del Auditorio Municipal.

Contratado: 0,00 ml	**Cant. Adicional:** 24,00 ml	**Total contratado:** 24,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores: 0,00 ml	**Cantidades ejecutadas presente acta:** 24,00 ml	**Total ejecutado:** 24,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 ml	**Menores cantidades ejecutadas:** 0,00 ml	







Foto 111-113. Instalación de líneaspara alimentación de aire acondicionado.

NP. 5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de tomacorrientes dobles en instalaciones del auditorio municipal (auditorio municipal, concejo municipal, pasillos biblioteca).

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	24,00 unidades	24,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	24,00 unidades	24,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

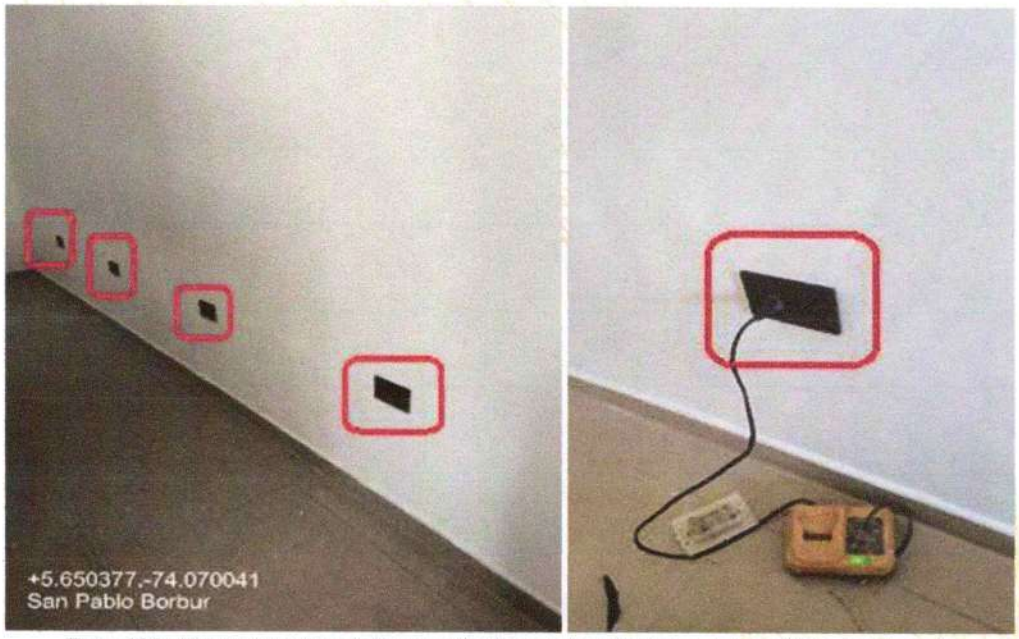


Foto 114, 115. Instalación de tomacorrientes en instalaciones del auditorio municipal.

NP. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	12,00 unidades	12,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	12,00 unidades	12,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker termomagnético monopolar para administración de los circuitos para aires acondicionados. Se instalaron 4 unidades.

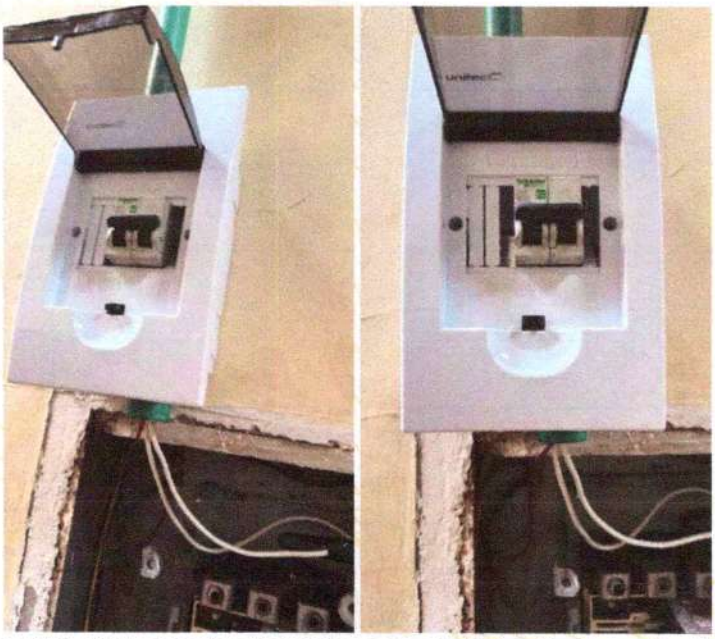


Foto 116, 117. Instalación de breaker para administración de los circuitos.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker termomagnético monopolar para administración de los circuitos para aires acondicionados. Se instalaron 8 unidades.

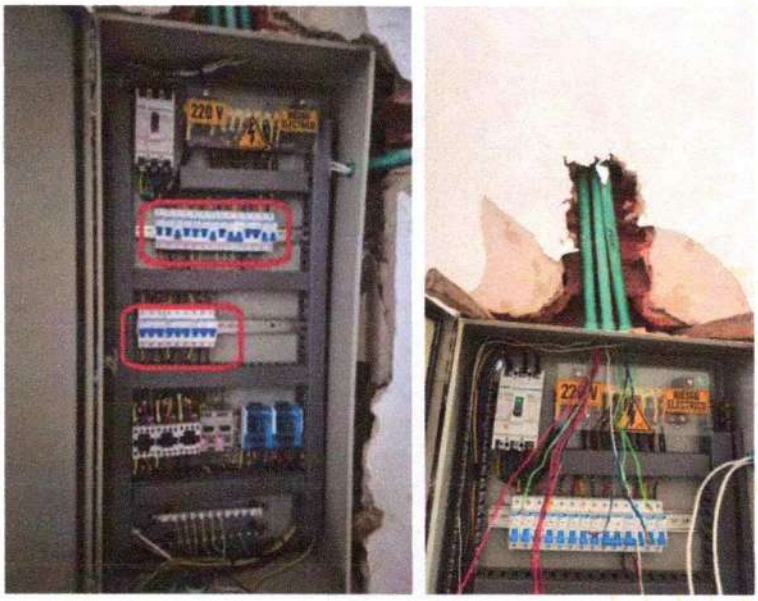


Foto 118, 119. Instalación de breaker para administración de los circuitos.

NP. 7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de interruptores sencillos en las instalaciones del auditorio municipal. En total se instalaron 5 unidades.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 120-122. Instalación de interruptores, aditorio municipal.

NP. 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de aires acondicionados de 36000 BTU para instalaciones del auditorio municipal. En total se instalaron 2 unidades.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	2,00 unidades	2,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	2,00 unidades	2,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:	Menores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades	0,00 unidades



Foto 123-126. Instalación de aires acondicionados, auditorio municipal.

NP. 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO. TIPO AHORRO EN CONSUMO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de válvulas de entrada para sanitarios en el coliseo municipal. En total se instalaron 7 válvulas.

Contratado:	Cant. Adicional:	Total contratado:
0,00 unidades	7,00 unidades	7,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	7,00 unidades	7,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	





Foto 127, 128. Instalación de válvula de entrada para sanitarios.

NP. 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de asiento y tapa en algunos de los sanitarios ubicados en el coliseo municipal.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	6,00 unidades	6,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	6,00 unidades	6,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 129-132. Instalación de asiento y tapa para sanitarios.

NP. 11 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el desmonte de marcos y puertas en la plaza de mercado, para el reemplazo de estas.
Se realizó el desmonte de 3 puertas.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	7,68 m²	7,68 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	7,68 m²	7,68 m²

Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 133-135. Desmonte de marcos y puertas.

NP. 12 ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA

PLAZA DE MERCADO

Se realizó abertura para ventanas en las 3 nuevas oficinas de la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	3,24 m²	3,24 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	3,24 m²	3,24 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	









Foto 136-139. Abertura de vanos para ventanas.

NP. 13 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

PLAZA DE MERCADO

Se realizaron filos y dilataciones en lugares donde se realizaron aberturas de vanos, para la instalación de Puertas y Ventanas.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	26,78 ml	26,78 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	26,78 ml	26,78 ml

Mayores cantidades ejecutadas:	Menores cantidades ejecutadas:
0,00 ml	0,00 ml

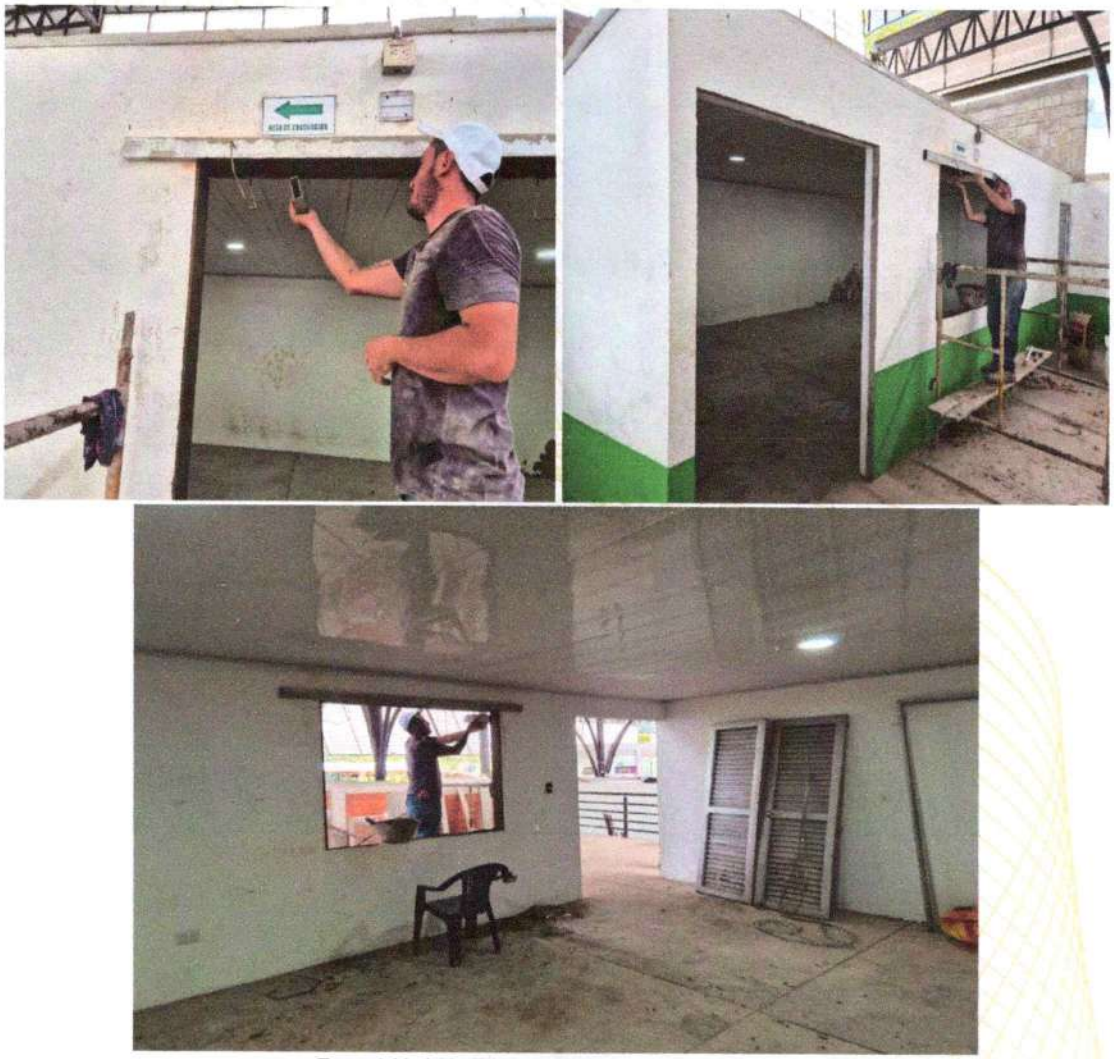


Foto 140-142. Filos y dilataciones para vanos.

NP. 14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de panel cuadrado de incrustar en 2 de las oficinas de la plaza de mercado. En total se instalaron 4 unidades.

Contratado:	Cant. Adicional:	Total contratado:
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades

Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 143, 144. Instalación de panel led cuadrado.

NP. 15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR. CAL 14. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de lámina alfajor calibre 14, para nueva rampa de acceso a oficina en la plaza de mercado. En total se instalaron 3,00 m²

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	3,00 m²	3,00 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	3,00 m²	3,00 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 145, 146. Instalación de lámina en alfajor para pasillo nuevo.

NP. 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de baranda metálica para uno costados de la nueva rampa de acceso a oficina en la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 kg	21,71 kg	21,71 kg
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 kg	21,71 kg	21,71 kg
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 kg	0,00 kg	



Foto 147, 148. Instalación de barandas metálicas para rampa de acceso.

NP. 17 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro, fabricación, figurada y montaje de estructura metálica para nuevo paso metálico (nuevo pasillo – rampa).

Contratado: 0,00 kg	**Cant. Adicional:** 58,81 kg	**Total contratado:** 58,81 kg
Cantidades ejecutadas actas anteriores: 0,00 kg	**Cantidades ejecutadas presente acta:** 58,81 kg	**Total ejecutado:** 58,81 kg
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 kg	**Menores cantidades ejecutadas:** 0,00 kg	



Foto 149, 150. Fabricación de estructura metálica para rampa de acceso.

NP. 18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de marco y puerta de acceso en aluminio para oficina en la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m^2	1,84 m^2	1,84 m^2
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m^2	1,84 m^2	1,84 m^2
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m^2	0,00 m^2	



Foto 151, 152. Instalación de puerta de acceso en aluminio.

NP. 19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio para 2 oficinas de la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	3,24 m²	3,24 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	3,24 m²	3,24 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 153, 154. Instalación de ventana corrediza para oficinas.

NP. 20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1 1/2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON PUNTOS DE AMARRE, CERRADURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de puerta en vidrio templado incoloro para oficinas en la plaza de mercado. En total se instalaron 2 puertas, con un total de 5,78 m².

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 m²	5,78 m²	5,78 m²
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 m²	5,78 m²	5,78 m²
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 m²	0,00 m²	



Foto 155, 156. Instalación de puertas en vidrio templado.

NP. 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL

PLAZA DE MERCADO

Se realizó el suministro e instalación de cerradura para puertas de baños en la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 157-159. Instalación de cerraduras en puertas de baños.

NP. 22 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON MORTERO Y PINTURA TIPO SIKA. IMPRIMACION 1:1, DOS CAPAS PURAS

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la impermeabilización de viga canal con mortero y pintura Sika para oficinas del segundo piso del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	6,50 ml	6,50 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	6,50 ml	6,50 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	



Foto 160-162. Impermeabilización de viga canal con mortero.



Foto 163-165. Impermeabilización de viga canal con pintura tipo sika.

NP. 23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de tubería de aguas lluvias de 2" en PVC para bajante de aguas lluvias para la canal del sector de oficinas del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	3,00 ml	3,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	3,00 ml	3,00 ml

Mayores cantidades ejecutadas:
0,00 ml

Menores cantidades ejecutadas:
0,00 ml

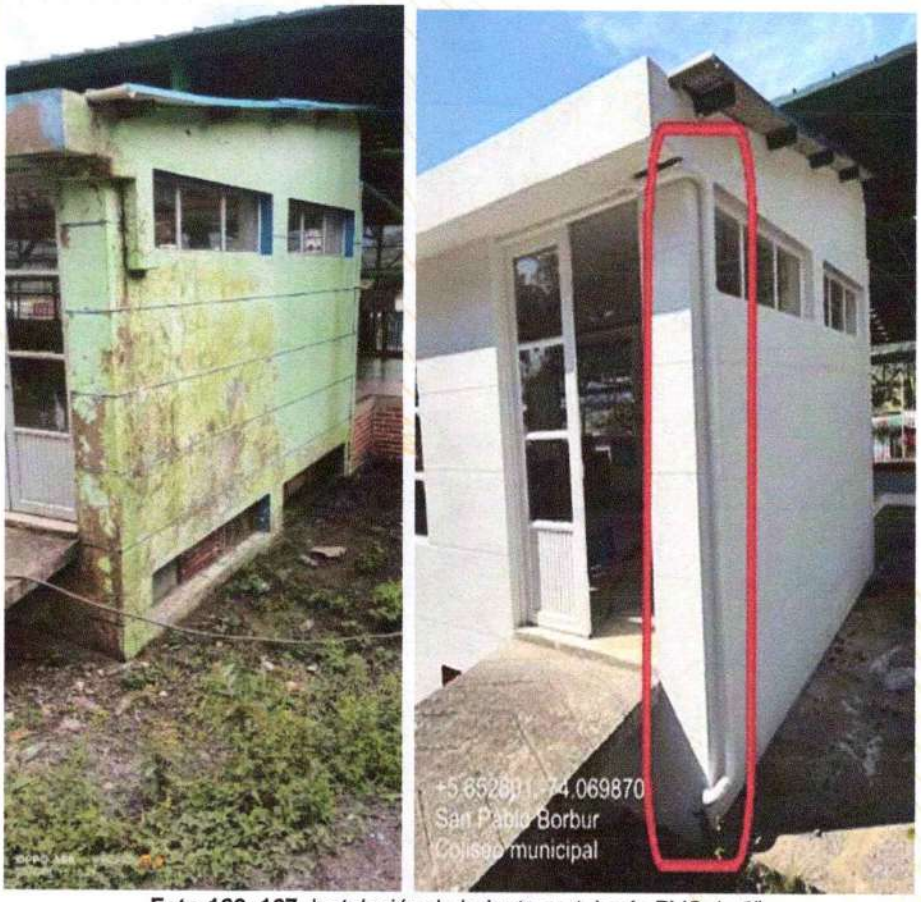


Foto 166, 167. Instalación de bajante en tubería PVC de 2".

NP. 24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN).

AUDITORIO MUNICIPAL

Se realizó la instalación de cinta asfáltica impermeabilizante de 0,20 m para protección de la cubierta en donde se instalaron los flanches.

Contratado:
0,00 ml

Cant. Adicional:
13,50 ml

Total contratado:
13,50 ml

Cantidades ejecutadas actas anteriores:
0,00 ml

Cantidades ejecutadas presente acta:
13,50 ml

Total ejecutado:
13,50 ml

Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

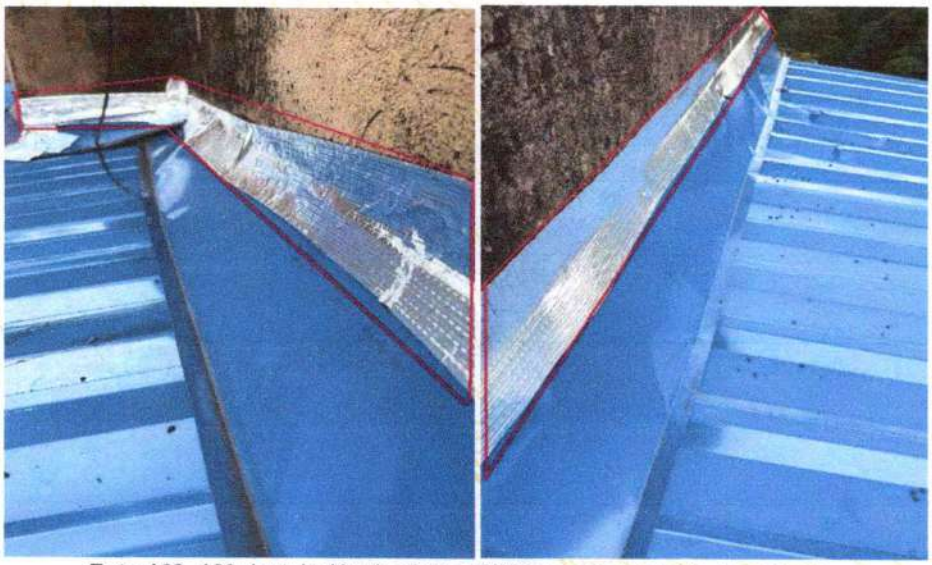


Foto 168, 169. Instalación de cinta asfáltica para protección de cubierta.

NP. 25 DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO. INC SUSPENSION DEL CONEXIONADO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el desmonte de tablero eléctrico trifásico en las instalaciones del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

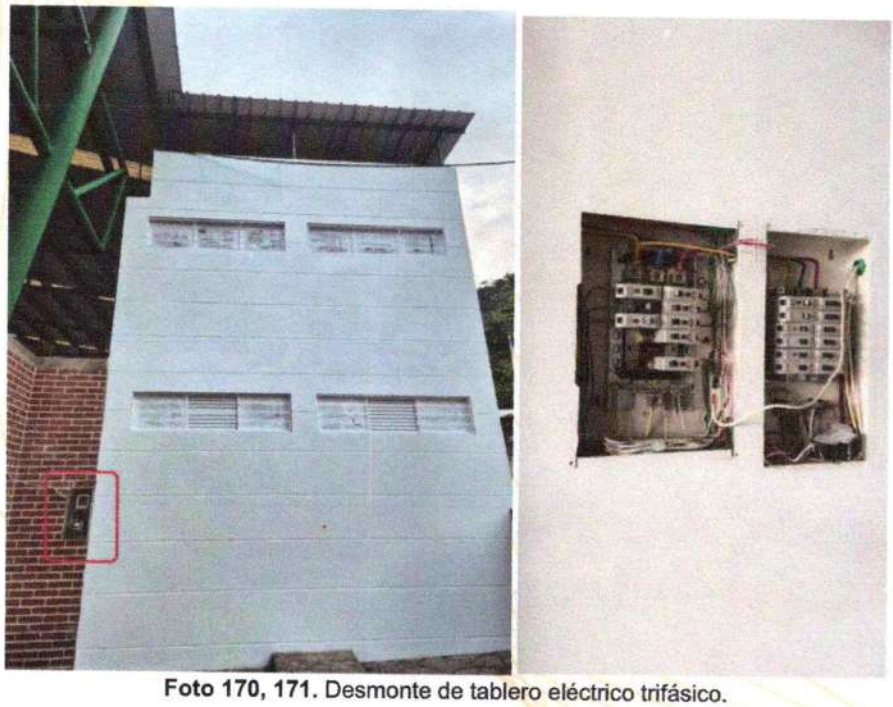


Foto 170, 171. Desmonte de tablero eléctrico trifásico.

NP. 26 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO TRIFASICO EMPOTRADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS. INC CONEXIONADO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de gabinete eléctrico trifásico empotrado para control de alumbrado y transferencias automáticas, en el coliseo municipal.

Contratado:
0,00 unidades

Cant. Adicional:
1,00 unidad

Total contratado:
1,00 unidad

Cantidades ejecutadas actas anteriores:
0,00 unidades

Cantidades ejecutadas presente acta:
1,00 unidad

Total ejecutado:
1,00 unidad

Mayores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades

Menores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades



Foto 172-174. Instalación de gabinete eléctrico trifásico empotrado.

NP. 27 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELECTRICO TRIFÁSICO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de barraje eléctrico trifásico para control interno de las dos canchas deportivas y un alumbrado periférico exterior del coliseo.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 175. Instalación de barraje eléctrico trifásico.

NP. 28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTRICO ELECTROMAGNÉTICO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de contactor eléctrico electromagnético para control interno de las dos canchas deportivas y un alumbrado periférico exterior del coliseo.

Contratado:
0,00 unidades
Cant. Adicional:
3,00 unidades
Total contratado:
3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:
0,00 unidades
Cantidades ejecutadas presente acta:
3,00 unidades
Total ejecutado:
3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades
Menores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades

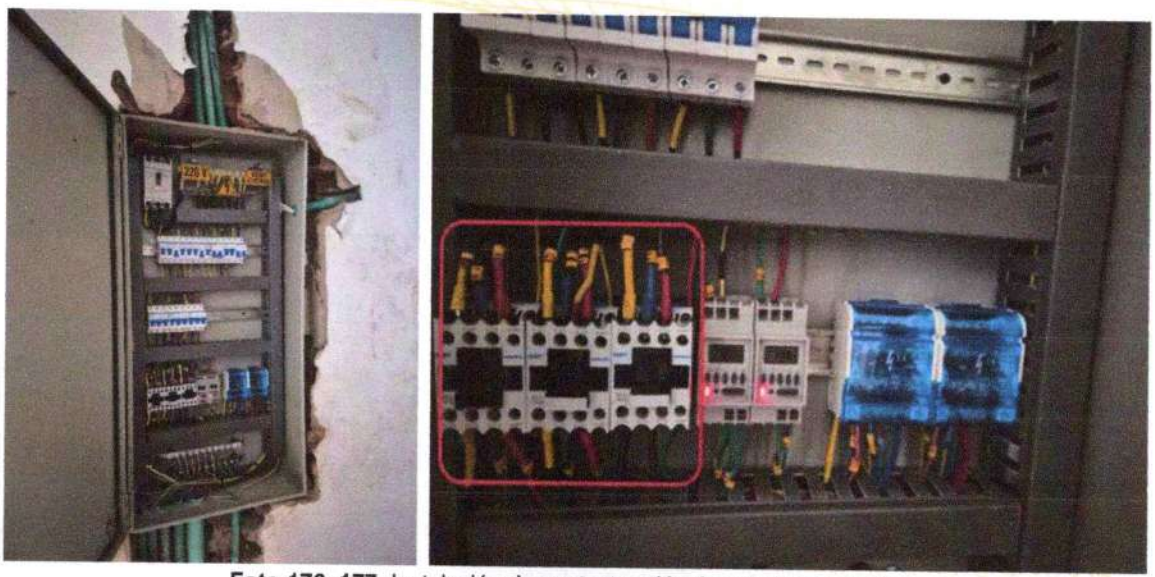


Foto 176, 177. Instalación de contactor eléctrico electromagnético.

NP. 29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL A 220V. INC PROGRAMACION DE TIEMPOS DE SERVICIO

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de temporizador (relojes) electrónico digital para control interno de las dos canchas deportivas y un alumbrado periférico exterior del coliseo.

Contratado:
0,00 unidades
Cant. Adicional:
3,00 unidades
Total contratado:
3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:
0,00 unidades
Cantidades ejecutadas presente acta:
3,00 unidades
Total ejecutado:
3,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

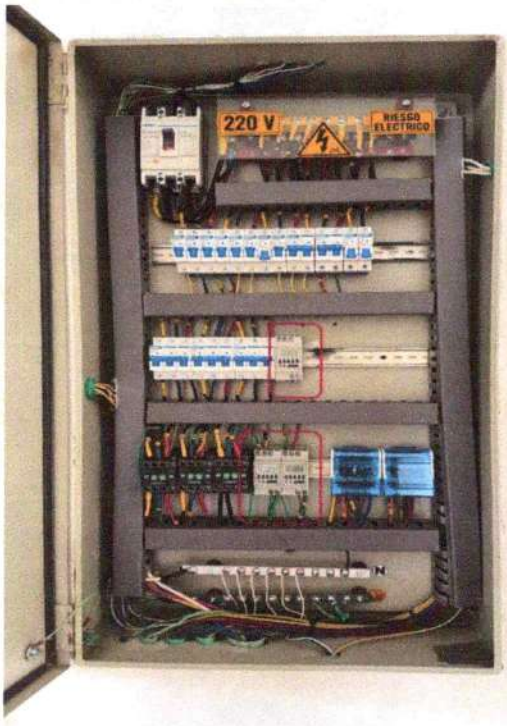


Foto 178. Instalación de temporizador electrónico digital.

NP. 30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CABLE ENCAUCHETADO 2X14; EN ALTURAS MAYORES A 7,0M.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salidas para iluminación expuesta en cable encauchetado para nuevas lámparas colgantes.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	35,00 unidades	35,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	35,00 unidades	35,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

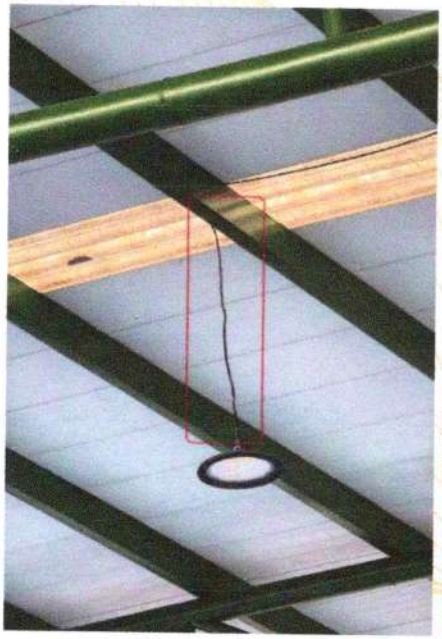



Foto 179, 180. Salida para iluminación expuesta para nuevas lámparas colgantes.

NP. 31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA EN ACERO DE 1/8". INC GRILLETES

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de guaya en acero para cada una de las lámparas colgantes.

Contratado: 0,00 ml	**Cant. Adicional:** 87,50 ml	**Total contratado:** 87,50 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores: 0,00 ml	**Cantidades ejecutadas presente acta:** 87,50 ml	**Total ejecutado:** 87,50 ml
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 ml	**Menores cantidades ejecutadas:** 0,00 ml	

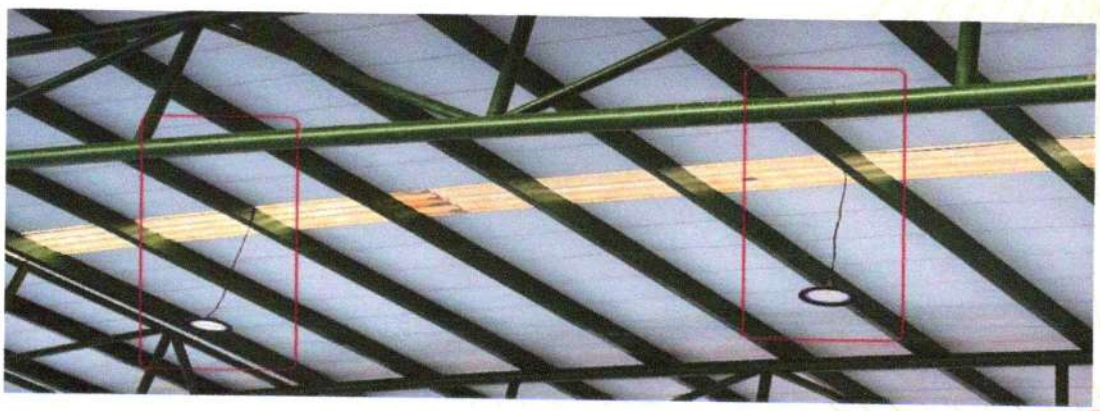




Foto 181-183. Instalación de guaya en acero para cada lámpara.

NP. 32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de alimentador parcial monofásico expuesto en tubería EMT, para las luminarias de las graderías que van para el costado de la vía nacional.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 ml	30,00 ml	30,00 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 ml	30,00 ml	30,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 ml	0,00 ml	

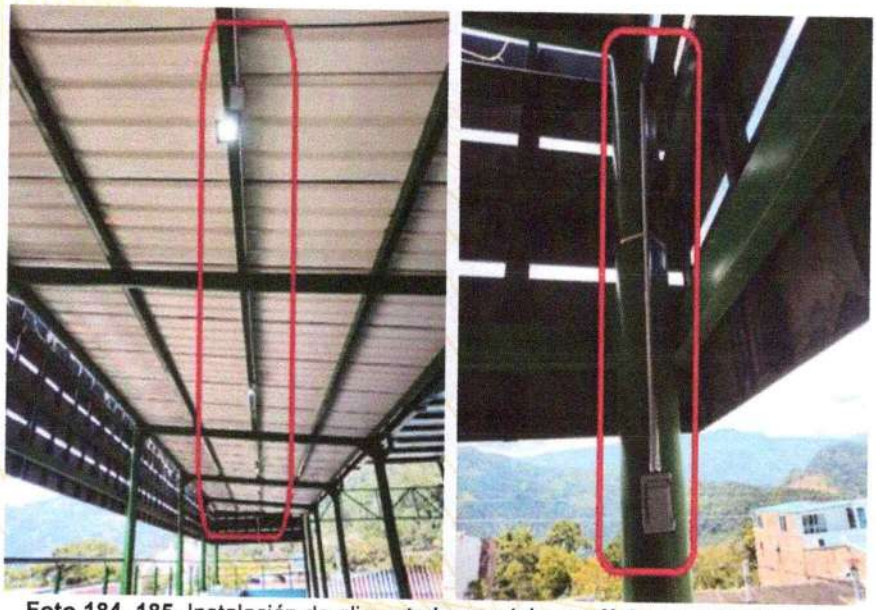


Foto 184, 185. Instalación de alimentador parcial monofásico para luminarias.

NP. 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO)

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salida completa para tomacorriente en el sector del nuevo gabinete eléctrico.

Contratado:
0,00 unidades

Cant. Adicional:
1,00 unidad

Total contratado:
1,00 unidad

Cantidades ejecutadas actas anteriores:
0,00 unidades

Cantidades ejecutadas presente acta:
1,00 unidad

Total ejecutado:
1,00 unidad

Mayores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades

Menores cantidades ejecutadas:
0,00 unidades



Foto 186. Instalación de salida completa para tomacorriente.

NP. 34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salida completa para tomacorriente bifásico en el sector del nuevo gabinete eléctrico.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 187, 188. Instalación de salida completa para tomacorriente bifásico.

NP. 35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de tomacorriente monofásico tipo GFCI para tomas en las gradas al costado de la vía nacional y al costado de la plaza de mercado.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	3,00 unidades	3,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

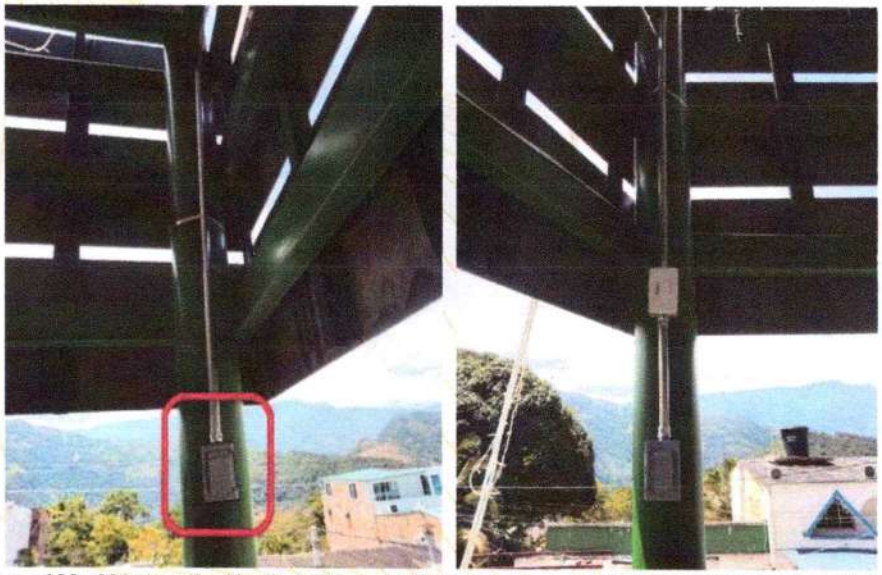


Foto 189, 190. Instalación de salida completa para tomacorriente monofásico tipo GFCI.

NP. 36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de salida de iluminación expuesta para nuevos reflectores en graderías que dan a la vía nacional.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

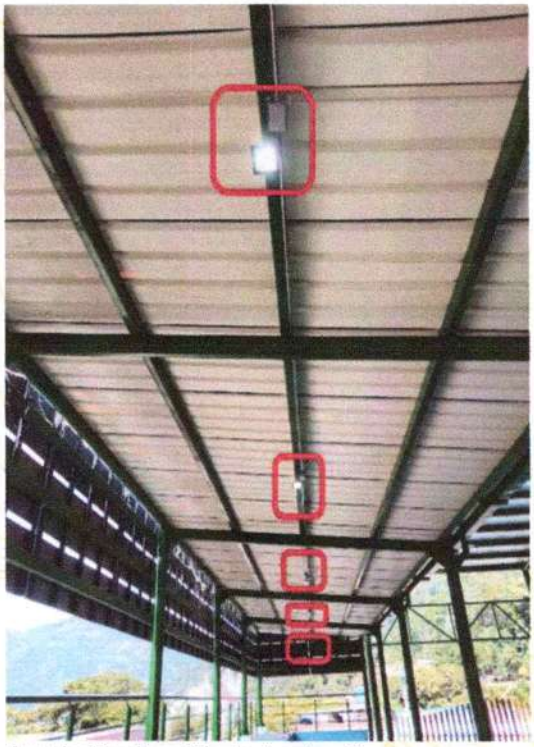


Foto 191. Instalación de salida de iluminación para nuevos reflectores.

NP. 37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de reflector para iluminación en las graderías al lado dela vía nacional.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	5,00 unidades	5,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	



Foto 192, 193. Instalación de reflectores led de 50 W.

NP. 38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker termomagnético bipolar en el nuevo gabinete para protección de circuitos.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	4,00 unidades	4,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

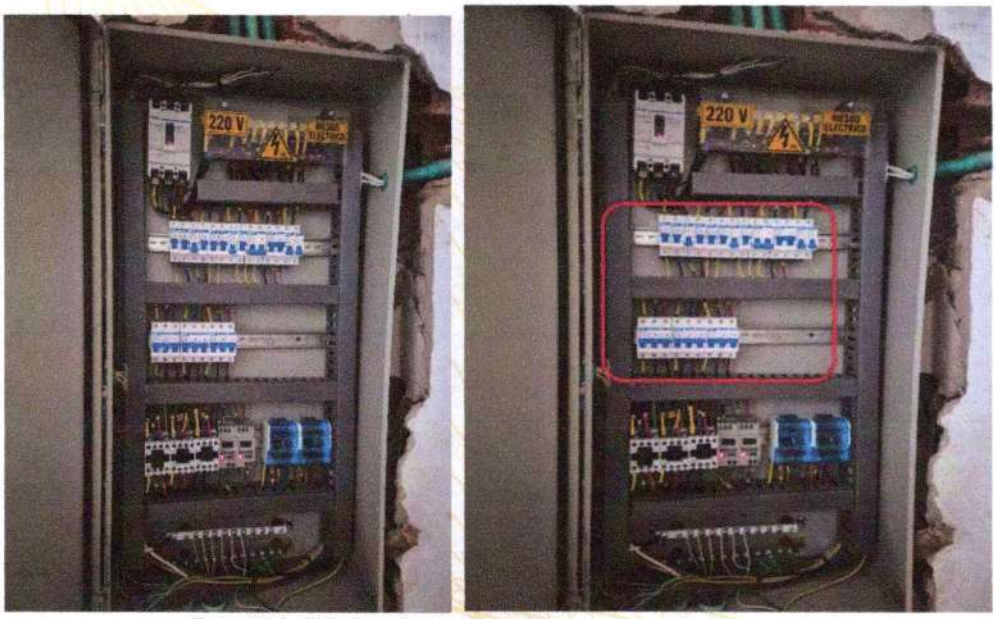


Foto 194, 195. Instalación de breaker para gabinete nuevo.

NP. 39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP.

COLISEO MUNICIPAL

Se realizó el suministro e instalación de breaker totalizador tipo industrial en el nuevo gabinete para protección de circuitos.

Contratado:	**Cant. Adicional:**	**Total contratado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Cantidades ejecutadas actas anteriores:	**Cantidades ejecutadas presente acta:**	**Total ejecutado:**
0,00 unidades	1,00 unidad	1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:	**Menores cantidades ejecutadas:**	
0,00 unidades	0,00 unidades	

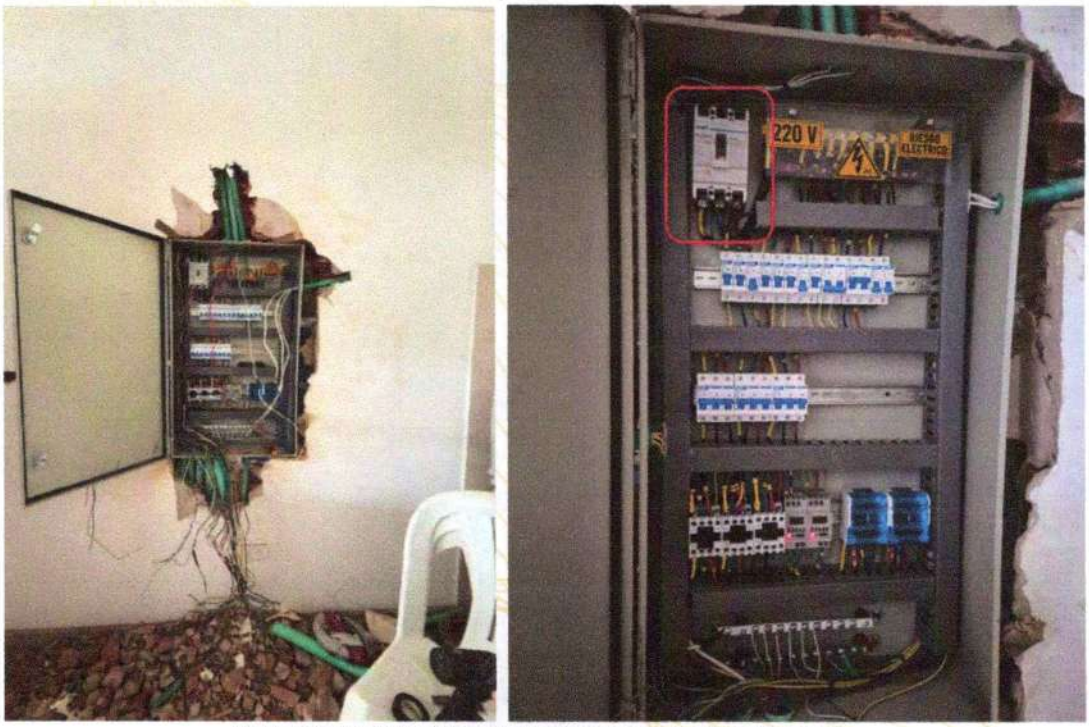


Foto 196, 197. Instalación de breaker para gabinete nuevo.

4. VERIFICACIÓN TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico, el suscrito supervisor constata que:

- Las actividades ejecutadas presentan concordancia con el objeto del contrato, evidenciándose la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura institucional y deportiva del municipio conforme a lo establecido en los documentos contractuales.
- Los materiales utilizados corresponden a los especificados en el contrato y en las especificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo con las condiciones requeridas para su implementación.
- La calidad observable de las obras ejecutadas es aceptable y acorde con el alcance del contrato, evidenciándose cumplimiento de las especificaciones técnicas, buenas prácticas y condiciones mínimas de servicio requeridas.

5. VERIFICACIÓN FINANCIERA

De conformidad con el estado financiero presentado:

- El avance acumulado corresponde al 100% del valor del contrato.

- El valor a pagar en la presente acta de liquidación, asciende a la suma de:

CIENTO CINCUENTA MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($150.011.248,28).

El balance financiero evidencia coherencia entre el avance físico ejecutado y los recursos solicitados, sin observaciones que afecten el trámite del pago de liquidación.

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con base en la revisión técnica, administrativa y financiera realizada, el Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del contrato interadministrativo no. 003 – 2025:

- Conceptúa favorablemente el informe de ejecución final presentado por el contratista.
- Avala el avance físico del 100% del contrato.
- Autoriza el trámite del pago de liquidación, conforme al valor presentado y a la forma de pago establecida contractualmente.

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Sec. Planeación y Obras Publicas
