DIAN

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
49217b8a6c9c1a46bb891ac0c8aeff91c50c984fb70e6bf6c2e84ad667c07cbf34f266d47f551eb85684834075aaadf4

Número de Factura: FAOS-38
Fecha de Emisión: 17/09/2026
Fecha de Vencimiento: 17/10/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAP
Fecha de orden de pedido: 17/09/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO FAO SAS
Nombre Comercial: GRUPO FAO SAS
Nit del Emisor: 901484861
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290;7112

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 1 A 11 130 TO 1 OF 314
Teléfono / Móvil: 6018158257
Correo: grupofaosas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CAPARRAPI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Caparrapí
Dirección: CL 9 3 32 PALACIO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 3123003436
Correo: planeacion@caparrapi-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO DE OBRA No. SAMC 006 2026	COSTO DIRECTO PAGO PARCIAL 2	LH	1,00	$ 151.390.371,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.390.371,00
2	CONTRATO DE OBRA No. SAMC 006 2026	ADMINISTRACION PAGO PARCIAL 2	LH	1,00	$ 39.361.496,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.361.496,00
3	CONTRATO DE OBRA No. SAMC 006 2026	UTILIDAD PAGO PARCIAL 2	LH	1,00	$ 7.569.519,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.569.519,00
4	CONTRATO DE OBRA No. SAMC 006 2026	IMPREVISTOS PAGO PARCIAL 2	LH	1,00	$ 1.513.904,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.513.904,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ-

Notas Finales

PAGO PARCIAL N.2 OTROS OBRA - CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2026 CUYO OBJETO ES LA FASE No.2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE [illegible] VALOR CONTRATO $245.687.053,00 MAS ADICION $118.616.297.00 TOTAL CON TRATO$364.303.350.00-PAGO PARCIAL N. 1 $128.037.725.00 PAGO PARCIAL 2 $199.835.290.00 SALDO $36.430.335.00
VALOR FACTURA $199.835.290.00 VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOCIENTOS NOVEN TA PESOS M/CTE
POR FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N. 946-000015-56 A NOMBRE DE GRIPO FA SAS NIT.901484861
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/09/2026 15:53:50
Documento validado por la DIAN:
17/09/2026 15:53:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	199835290
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199835290
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	199835290
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 199835290

Valores informativos

ANTICIPOS	0
Anticipos	

RETENCIONES	3996705.8
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	199.835.290,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199.835.290,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	199.835.290,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 199.835.290,00

Valores informativos

ANTICIPOS	0,00
Anticipos	

RETENCIONES	3.996.705,80
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

Numero de Autorización: 18764090318751 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-11

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

REINTEGRO DE BIENES INMUELBLES A BODEGA DE ALMACEN
Nº 20260223

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI JUEVES, 17 SEPTIEMBRE 2026
No. 0 del

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA, C.C.14325849
DIRECCIÓN:CRA 19C # 7A-16 HONDA TOLIMA

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 001 ALCALDIA MUNICIPAL

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	307010004		0	1.00	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		199,835,290.00	199,835,290.00	-0.50

SubTotal	199,835,290.00	-0.50
Ajuste Detalle	0.00	
Total $	199,835,290.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
30701	199,835,290.00
SubTotal $	199,835,290.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	199,835,290.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	199,835,290.00

Observación:

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
REVISADO	CARGO COORDINADOR ALMACEN	CARGO ORDENADOR ALMACEN	SECRET DE PLANEACION E INFRAES
			c.c. Nº 14325849

FASE No. 2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI

CONTRATO DE OBRA NÚMERO SAMC-006-2026



INFORME TÉCNICO – ACTA DE OBRA No. 2

VERSIÓN 0

CAPARRAPI CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL
CAPARRAPI CUND.
HORA: 9:23 am
22 SEP 2026
RECIBIDO:
OBSERVACIONES:

CONTENIDO

1. GENERALIDADES 5
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 5
1.2. LOCALIZACIÓN 5
1.3. OBJETO DEL CONTRATO 7
1.3.1. PLAZO, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, Y REINICIACIÓN EN SUS DIFERENTES FASES..... 7
1.4. EL CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA. 7
1.4.1. CONTRATISTA 7
1.5. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS. 8
1.6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA. 9
1.7. INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO 9
2. INFORMACIÓN TÉCNICA 9
2.1. CRONOGRAMA DEL CONTRATO – AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO. 9
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 10
2.3. CANTIDADES EJECUTADAS. 16
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Caparrapi Cundinamarca – Ubicación Proyecto..... 6
Ilustración 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS..... 10

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del contrato obra 7
Tabla 2 Cuadro de control legal del contratista 7
Tabla 3 Balance financiero de contratista 9
Tabla 4 Cantidades Ejecutadas 17

1. GENERALIDADES


1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

En el municipio de Caparrapi Cundinamarca, y dando cumplimiento al Plan de Desarrollo, "Por un mejor Caparrapi", busca la forma de mejorar la calidad de vida de los Caparrapos, para lo que se han llevado a cabo diferentes proyectos encaminados al cumplimiento del interés social. Por tal motivo, uno de los proyectos que pretende realizar el Municipio en pro del desarrollo municipal y la evolución socioeconómica, es el MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Donde se pretende ejecutar la reposición de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y la instalación por primera vez de la red de alcantarillado pluvial.

1.2. LOCALIZACIÓN

El área del Proyecto está localizada en el Departamento de Cundinamarca – municipio de CAPARRAPI, el cual, se encuentra ubicado al Noroccidente del Departamento de Cundinamarca, limita por el Norte con el municipio de Yacopí; por el noroccidente con el municipio de Puerto Salgar; por el Sur oriente con el municipio de Guaduas; por el Suroccidente con el municipio de Utica y al Occidente con el municipio de la Palma

Ilustración 1 Caparrapi Cundinamarca – Ubicación Proyecto

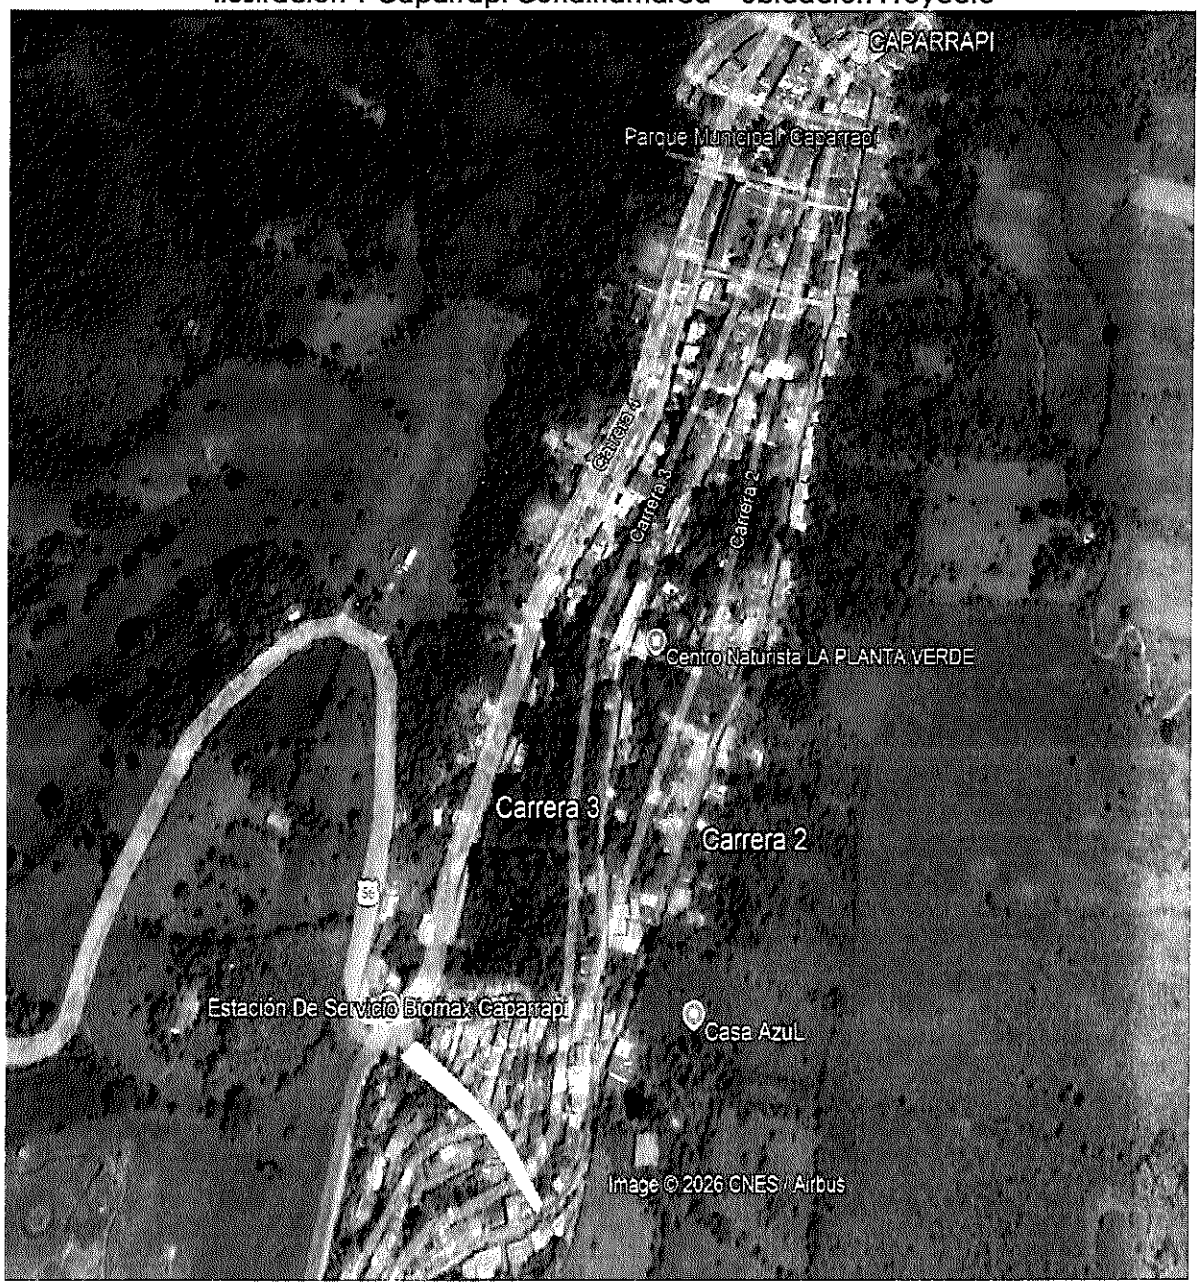

Fuente: Google Earth – Elaboración Propia

1.3. OBJETO DEL CONTRATO

- **OBJETO CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2026**

Ejecutar "FASE No. 2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI".

1.3.1. PLAZO, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, Y REINICIACIÓN EN SUS DIFERENTES FASES.

- **GRUPO FAO SAS.**

Tabla 1 Información del contrato obra

CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2026	
Objeto del contrato	FASE No. 2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI
Contratista	GRUPO FAO SAS
Fecha de Inicio	26/05/2026
Fecha de Fin	25/09/2026
Plazo Inicial	4 meses
Valor Contrato Inicial	$245.687.053,00
Adición No. 01	$118.616.297,00
Valor Total Contrato	$364.303.350,00
Prórrogas / Suspensiones	No se presentaron

Fuente: Propia

1.4. EL CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA.

En las siguientes tablas se presenta el control legal del contrato de obra.

1.4.1. CONTRATISTA

Tabla 2 Cuadro de control legal del contratista

Objeto	Fecha de Suscripción
Acta de inicio de contrato de obra	26/05/2026
Acta Parcial de Obra No. 01	08/07/2026

Objeto	Fecha de Suscripción
Acta de Adición y Modificación No. 01	Septiembre de 2026
Acta parcial de Obra No. 02	16/09/2026

Fuente: Propia

1.5. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS.

Durante el desarrollo de la obra se llevaron a cabo, cumpliendo con todas las obligaciones contractuales y requerimientos técnicos, las siguientes actividades:

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA DE TRABAJO
- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES HIDROSANITARIAS
- ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
- ENTIBADO TIPO 1 (1/7 DE UTILIZACIONES)
- RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" PARA SOPORTE DE TUBERÍA
- RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 18"
- PLACA DE FONDO DE POZO EN CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
- CILINDRO DE POZO EN LADRILLO TOLETE (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y CAÑUELA)
- CUBIERTA DE POZO EN CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)
- CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60
- PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
- CONEXIÓN DOMICILIARIA CON SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10" X 6" Y 16" X 6"
- DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO

- DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)
- CONCRETO CLASE D f´c=3000 PSI (PLACA HUELLA)

1.6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presenta el balance financiero del contratista de obra.

Ø Contratista de obra

Tabla 3 Balance financiero de contratista

CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2026			
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR FACTURADO**	**VALOR POR FACTURAR**
VALOR Contrato Obra	$245.687.053	-	-
ADICIÓN No. 01	$118.616.297	-	-
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	-	$128.037.725	-
ACTA FINAL DE OBRA No. 02	-	$199.835.290	-
VALOR TOTAL	$364.303.350	$327.873.015	$36.430.335

Fuente: Propia

1.7. INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO

El Contrato no cuenta con anticipo, ni pagos anticipado.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1. CRONOGRAMA DEL CONTRATO – AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO.


El proyecto a fecha 16 de septiembre de 2026 cuenta con un avance físico y financiero correspondiente al 90%, conforme a la totalidad de las actividades y cantidades del balance final del contrato aprobado mediante el Acta de Adición y Modificación No. 01.

A continuación, se ilustra con imágenes las actividades de ejecución de cada una de las actividades que conforman el proyecto:

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se describen mediante registro fotográfico las actividades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato:

Ilustración 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

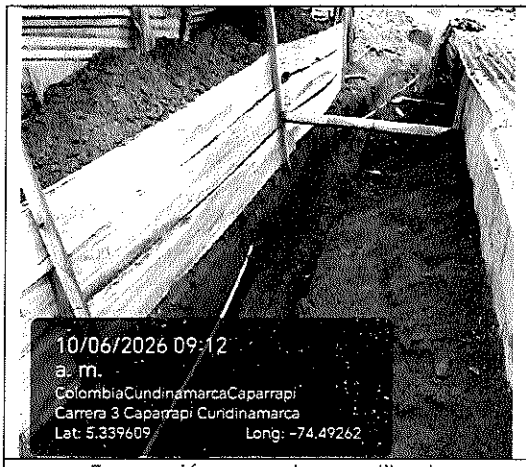

Excavación manual con entibado



Instalación de entibado tipo 1



Excavación manual – conformación de fondo de zanja



Entibado en excavación junto a pozo



Entibado y señalización del área de trabajo



Instalación de silla YEE PVC




Excavación manual para pozo




Excavación manual para pozo




Excavación manual de zanja

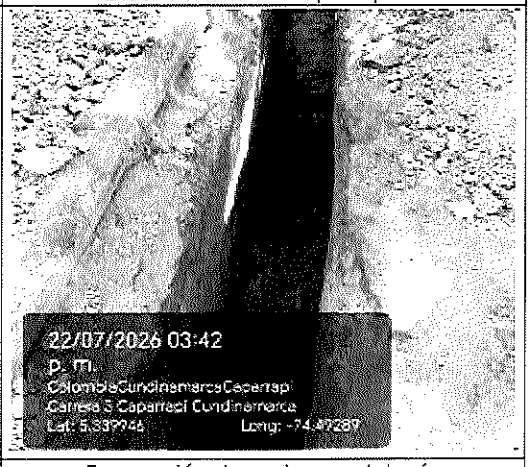

Excavación de zanja para tubería

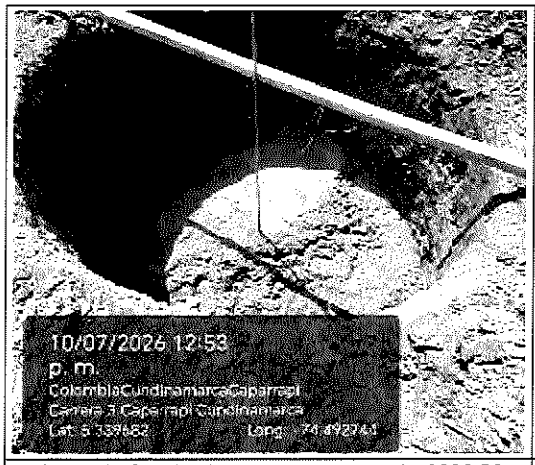


Placa de fondo de pozo en concreto 3000 PSI

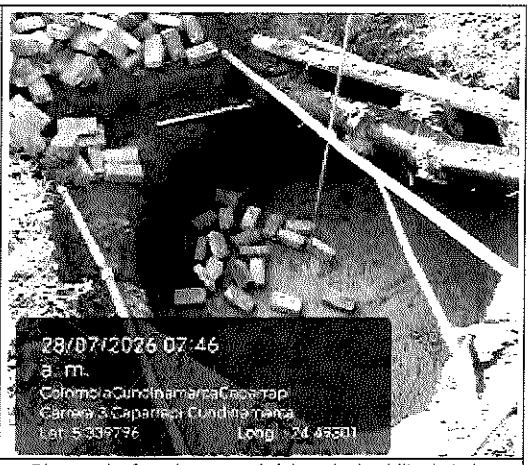

Placa de fondo y suministro de ladrillo tolete




Construcción de cilindro de pozo en ladrillo tolete

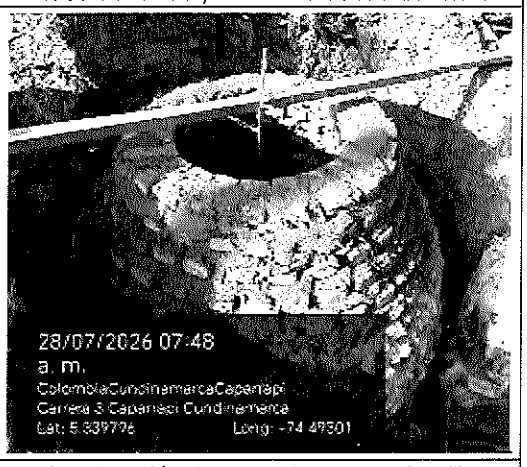

Construcción de cono de pozo en ladrillo



Construcción de pozo de inspección

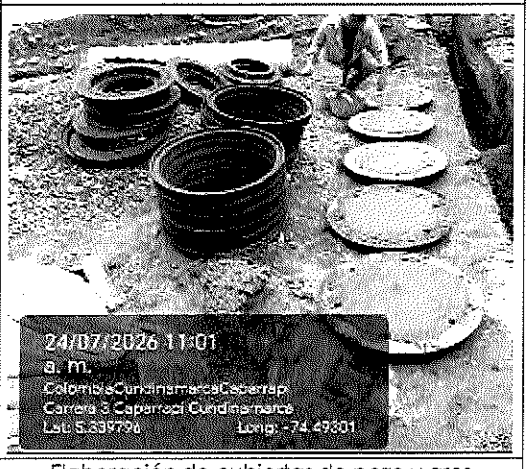

Elaboración de cubiertas de pozo y aros



Suministro de tubería PVC alcantarillado 18"



Instalación de tubería PVC 8" sobre arena de peña



Instalación de tubería PVC alcantarillado 18"







Instalación de tubería PVC alcantarillado 18"







Instalación de tubería PVC alcantarillado 18"



Instalación de tubería PVC 18" – sector escaleras

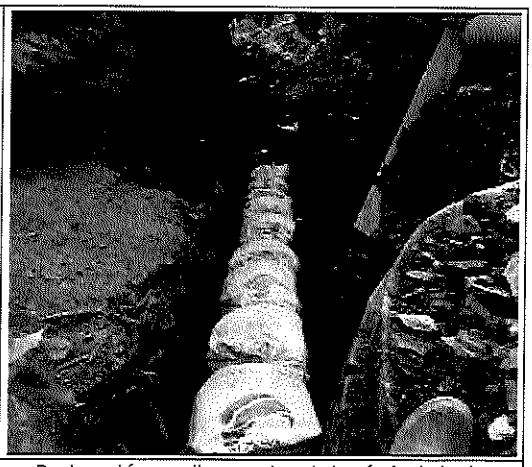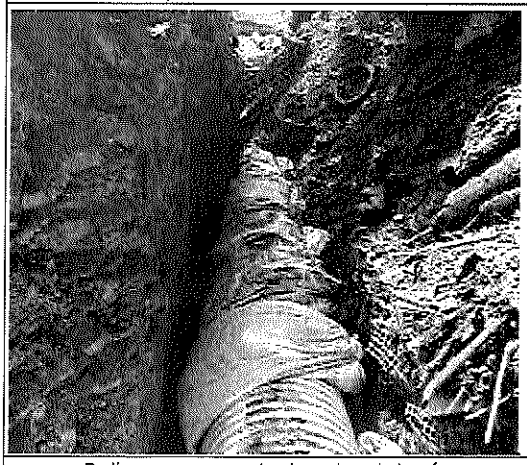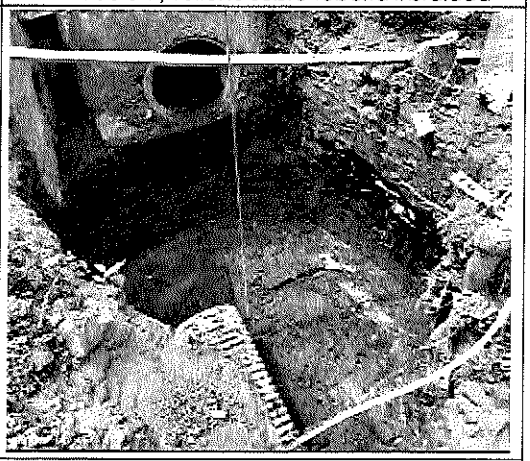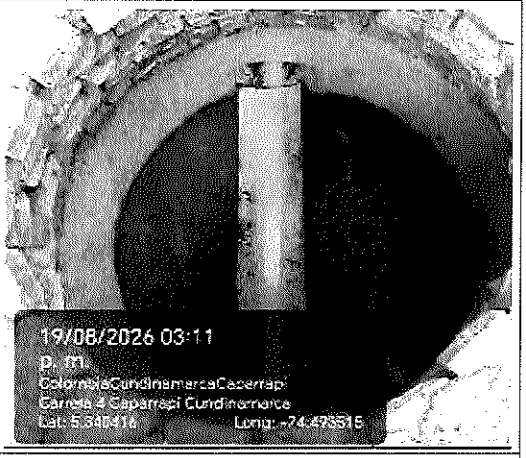	
Protección y relleno sobre tubería instalada	Protección y relleno sobre tubería instalada
	
Relleno compactado sobre tubería	Empalme de tubería a pozo existente
	
Pozo en construcción y tubería de conexión	Pozo terminado con cañuela y pañete interno

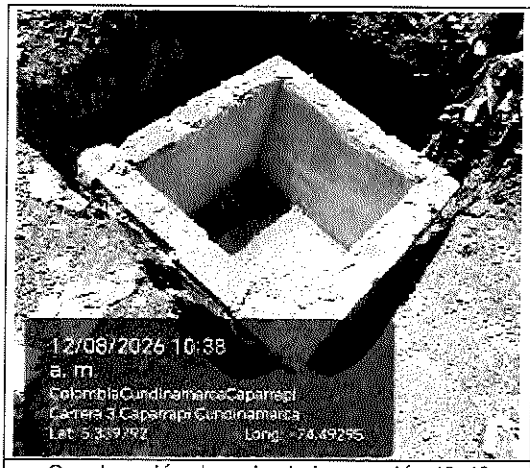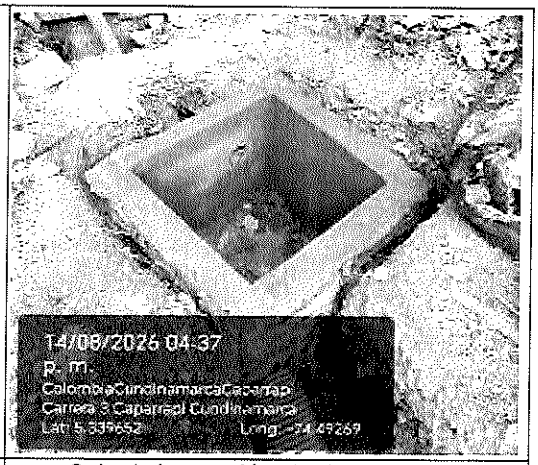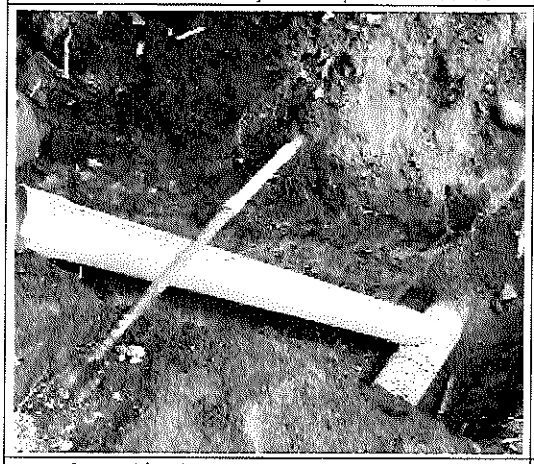	
Construcción de caja de inspección 60x60	Caja de inspección 60x60 con pañete
	
Conexión domiciliaria con silla YEE PVC	Conexión domiciliaria con silla YEE PVC
	
Demolición de concreto estructural	Demolición de escaleras en concreto

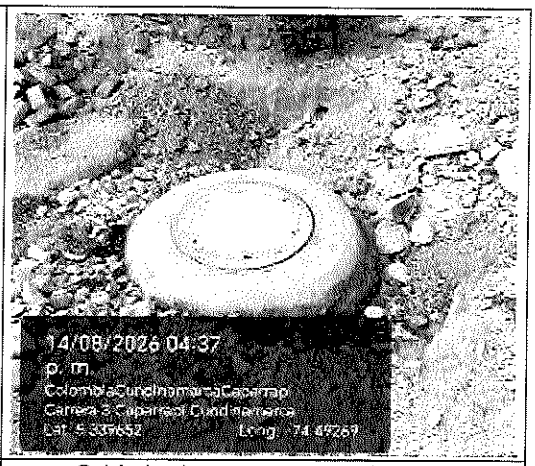	
Concreto clase D para placa huella	Cubierta de pozo con aro y tapa HF
	
Cubierta de pozo terminada	Pozo terminado con aro y tapa HF

2.3. CANTIDADES EJECUTADAS.

A continuación, se describen las cantidades finales ejecutadas de las actividades de obra del contrato, acumuladas entre el Acta Parcial de Obra No. 1 y el Acta Parcial de Obra No. 2:

Tabla 4 Cantidades Ejecutadas

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO | ACTA DE OBRA N° 02

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No	SAMC-006-2026
		VALOR CONTRATADO	$ 245.687.351,99
		VALOR ADICION	$ 118.615.297,01
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 364.303.349,00
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS	PLAZO DE EJECUCION	4 meses
		FECHA INICIO	25 de mayo 2026
		ACTA No	1
		FECHA PRESENTE ACTA	10 de septiembre 2026

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO								ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO		VALOR SIN EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	(+)	(-)	FINAL	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2A.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=2.0-3.0 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	1.251.00	233.20	0.00	1.484.20	$ 42.000,00	$ 48.554.400,00	450	$ 17.647.200,00	223.5	$ 10.979.214,40	673.5	$ 41.926.414,40	75.21	$ 6.628.185,60
MP1	DIVERSOS TIPO 2 (1 M DE PROFUNDIDAD)	M2	0.00	70.00	0.00	70.00	$ 10.543,00	$ 1.350.000,00	1.00	$ -	11.5	$ 1.228.925,00	12.5	$ 1.228.925,00	7.00	$ 73.754,00
2.5	RELLENO TIPO 1 "MATERIA DE PRIMA"	M3	11.16	17.00	0.00	31.13	$ 105.942,00	$ 10.179.000,04	45	$ 7.477.200,00	22.3	$ 6.150.709,47	73.3	$ 13.628.409,47	5.12	$ 1.117.133,27
2A.7	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO MEJORAMIENTO	M3	430.00	150.00	0.00	670.00	$ 34.000,00	$ 22.814.000,00	220	$ 13.041.600,00	224.1	$ 7.671.360,00	644.1	$ 20.712.960,00	37.10	$ 2.101.040,00
3.26	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	24	175.72	0.00	200.0	$ 70.000,00	$ 12.102.800,00	24	$ 1.614.400,00	124.8	$ 11.957.299,44	148.8	$ 13.571.699,44	10.72	$ 1.019.100,56
3.27	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	0.0	0.00	48.00	0.00	$ 222.000,00	$ -	0	$ -	0.0	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.28	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 320.000,00	$ -	0	$ -	0.0	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.29	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18"	ML	0.00	135.00	0.00	135.00	$ 370.000,00	$ 49.950.000,00	0	$ -	123.6	$ 47.287.152,00	123.6	$ 47.287.152,00	11.32	$ 4.331.424,00
3.2	CIMENTO PISO EN LADRILLO TOLETE 0.14 ESPESOR 1:4 MEZCLA (INCLUYE PRETIL INTERIOR 0.14 ESPESOR Y CANALETA)	M2	139.6	8.20	0.00	23.0	$ 42.000,00	$ 22.000.000,00	13	$ 14.745.600,00	0.0	$ 8.648.847,00	20.7	$ 23.394.447,00	2.22	$ 2.605.553,00
3.4	PLACA DE FONDO PISO 0.14 ESPESOR 1:4 MEZCLA (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO INCLUYE ACERO)	UND	13	4.00	0.00	13	$ 1.492.619,00	$ 22.000.000,00	1	$ 11.940.952,00	3.0	$ 8.000.464,80	12.1	$ 20.153.226,80	0.90	$ 1.346.773,20
3.5	CUBIERTA PISO 0.14 ESPESOR 1:4 MEZCLA (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO INCLUYE ACERO Y TEJA 1.5)	UND	11	4.00	0.00	15.00	$ 1.401.333,00	$ 21.000.000,00	8	$ 11.466.240,00	0.0	$ 7.842.170,00	12.1	$ 19.251.410,00	0.90	$ 1.348.590,00
3.6	CAJA DE INSPECCION DE 60X60	UND	10	11.00	0.00	11.00	$ 330.000,00	$ 12.374.000,00	10	$ 3.300.000,00	10.7	$ 7.625.925,00	10.7	$ 10.967.454,00	3.33	$ 1.106.546,00
3.10	PANETE 0.60 VARIOS 0.6 X 0.3 (H)	M2	2.4	24.00	0.00	47.7	$ 29.700,00	$ 1.417.650,00	12	$ 440.000,00	37.9	$ 1.122.615,00	42.5	$ 1.270.692,27	4.77	$ 141.557,73
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6"	UND	0	4.00	0.00	4.00	$ 162.400,00	$ 1.014.000,00	4	$ 677.200,00	5.4	$ 797.200,00	9.4	$ 974.200,00	0.60	$ 39.800,00
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UND	0	0.00	0.00	10	$ 267.770,00	$ 2.677.700,00	0	$ -	9.0	$ 2.500.000,00	9.0	$ 2.500.000,00	1.00	$ 177.700,00
MP3	CONSOLIDACION TERRENO ESTRUCTURA, INCLUYE CONCRETO Y REFUERZO DE 3000 PSI ESPESOR DE 0.15M	M3	0.00	9.00	0.00	9.0	$ 223.700,00	$ 2.013.300,00	0	$ -	9.0	$ 1.205.607,00	9.0	$ 1.205.607,00	0.00	$ 807.693,00
3.9	DEMOLICION ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	22	3.00	0.00	25	$ 39.450,00	$ 1.462.450,00	8	$ 315.600,00	9.3	$ 367.544,80	12.3	$ 1.343.230,80	3.00	$ 119.219,20
4.6	CONCRETO CLASE D, (f'c = 3000 psi) (base)	M3	0	3.00	0.00	9.0	$ 1.243.333,00	$ 11.214.000,00	0	$ -	8.6	$ 10.023.204,45	8.6	$ 10.023.204,45	0.00	$ 1.471.795,55
	SUB TOTAL							$ 373.887.351,00		$ 96.998.274,00		$ 151.190.371,00		$ 248.188.645,00		$ 27.598.230,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							$ 373.887.351,00		$ 96.998.274,00		$ 151.190.371,00		$ 248.188.645,00		$ 27.598.230,00
	ADMINISTRACION	24.0%						$ 71.709.720,00		$ 23.219.582,00		$ 39.251.406,00		$ 64.581.648,00		$ 7.173.672,00
	IMPREVISTOS	4.0%						$ 2.795.574,00		$ 969.963,00		$ 1.512.994,00		$ 2.482.898,00		$ 275.867,00
	UTILIDAD	8.0%						$ 43.709.369,00		$ 4.848.914,00		$ 7.569.546,00		$ 12.418.452,00		$ 1.379.357,00
	TOTAL OBRA							$ 364.303.349,00		$ 126.037.725,00		$ 199.525.296,00		$ 327.673.012,00		$ 36.430.335,00
	VALOR TOTAL							$ 364.303.349,00		$ 126.037.725,00		$ 199.525.296,00		$ 327.673.012,00		$ 36.430.335,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			%
VALOR CONTRATO (A)	$	245.687.351,99	
VALOR ADICIONAL (B)	$	118.615.297,01	
VALOR TOTAL CONTRATO (A+B=C)	$	364.303.349,00	
VALOR ACTA PARCIAL 02 (D)	$	199.525.296,00	54,8%
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 01 (E)			
VALOR NETO A CANCELAR ACTA PARCIAL 01 (D) -(E)	$	199.525.296,00	
VALOR ACUMULADO EJECUCION	$	327.673.012,00	90,00%
SALDO POR EJECUTAR	$	36.430.335,00	10,00%

ORLANDO ORDOÑEZ
GRUPO FAO SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FERNANDO RIVEROS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR / ALCALDIA DE CAPARRAPI

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ejecutó a cabalidad el objeto del contrato de obra SAMC-006-2026 "FASE No. 2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ", dentro del plazo contractual comprendido entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre de 2026.

- Se recomienda al Municipio realizar mantenimiento preventivo periódico a pozos y cajas de inspección, evitar el vertimiento de residuos sólidos a la red, y proceder con el recibo final de la obra y la liquidación del contrato.

Para constancia se firma en Caparra (Cundinamarca), a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
Representante Legal
GRUPO FAO S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO | | | | ACTA DE OBRA N° 02

SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No	SAMC-006-2026
		VALOR CONTRATADO	$ 245,687,051.99
		VALOR ADICION	$ 118,616,297.01
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 364,303,349.00
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
		FECHA INICIO	26 de mayo 2026
		ACTA No	1
		FECHA PRESENTE ACTA	18 de septiembre 2026

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO								ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO		VALOR SIN EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	(+)	(-)	FINAL	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	529.10	221.00	0.00	750.10	$ 62,105.00	$ 46,584,960.50	450	$ 27,947,250.00	225.1	$ 13,979,214.45	675.1	$ 41,926,464.45	75.01	$ 4,658,496.05
NP1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 DE UTILIZACIONES)	M2	0.00	70.00	0.00	70.00	$ 19,985.00	$ 1,398,950.00	0.00	$ -	63.0	$ 1,259,055.00	63.0	$ 1,259,055.00	7.00	$ 139,895.00
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	61.68	19.50	0.00	81.18	$ 186,943.00	$ 15,176,032.74	40	$ 7,477,720.00	33.1	$ 6,180,709.47	73.1	$ 13,658,429.47	8.12	$ 1,517,603.27
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	480.60	190.00	0.00	670.60	$ 34,320.00	$ 23,014,992.00	380	$ 13,041,600.00	223.5	$ 7,671,892.80	603.5	$ 20,713,492.80	67.06	$ 2,301,499.20
3.25	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	24	176.90	0.00	200.9	$ 75,624.00	$ 15,192,861.60	24	$ 1,814,976.00	156.8	$ 11,858,599.44	180.8	$ 13,673,575.44	20.09	$ 1,519,286.16
3.27	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	60	0.00	-60.00	0.00	$ 152,179.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.28	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	197	0.00	-107.50	89.5	$ 233,153.00	$ 20,867,193.50	12	$ 2,797,836.00	68.6	$ 15,982,638.15	80.6	$ 18,780,474.15	8.95	$ 2,086,719.35
NP2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18"	ML	0.00	139.50	0.00	139.50	$ 376,840.00	$ 52,541,280.00	0	$ -	125.6	$ 47,287,152.00	125.6	$ 47,287,152.00	13.95	$ 5,254,128.00
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	19.8	3.25	0.00	23.1	$ 983,211.00	$ 22,663,013.55	15	$ 14,748,165.00	5.7	$ 5,648,547.20	20.7	$ 20,396,712.20	2.31	$ 2,266,301.36
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	11	4.00	0.00	15	$ 1,492,619.00	$ 22,389,285.00	8	$ 11,940,952.00	5.5	$ 8,209,404.50	13.5	$ 20,150,356.50	1.50	$ 2,238,928.50
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	11	4.00	0.00	15.00	$ 1,426,031.00	$ 21,390,465.00	8	$ 11,408,248.00	5.5	$ 7,843,170.50	13.5	$ 19,251,418.50	1.50	$ 2,139,046.50
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	10	23.00	0.00	33.00	$ 390,150.00	$ 12,874,950.00	10	$ 3,901,500.00	19.7	$ 7,685,955.00	29.7	$ 11,587,455.00	3.30	$ 1,287,495.00
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	24	23.70	0.00	47.7	$ 29,739.00	$ 1,418,550.30	15	$ 446,085.00	27.9	$ 830,610.27	42.9	$ 1,276,695.27	4.77	$ 141,855.03
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UND	2	4.00	0.00	6.00	$ 169,488.00	$ 1,016,928.00	4	$ 677,952.00	1.4	$ 237,283.20	5.4	$ 915,235.20	0.60	$ 101,692.80
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UND	8	2.00	0.00	10	$ 397,778.00	$ 3,977,780.00	0	$ -	9.0	$ 3,580,002.00	9.0	$ 3,580,002.00	1.00	$ 397,778.00
NP3	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	0.00	9.50	0.00	9.5	$ 228,726.00	$ 2,172,897.00	0	$ -	8.6	$ 1,955,607.30	8.6	$ 1,955,607.30	0.95	$ 217,289.70
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	12	3.00	0.00	15	$ 99,499.00	$ 1,492,485.00	8	$ 795,992.00	5.5	$ 547,244.50	13.5	$ 1,343,236.50	1.50	$ 149,248.50
4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	6	3.50	0.00	9.5	$ 1,243,659.00	$ 11,814,760.50	0	$ -	8.6	$ 10,633,284.45	8.6	$ 10,633,284.45	0.95	$ 1,181,476.05
	SUB TOTAL							$ 275,987,385.00		$ 98,998,276.00		$ 151,390,371.00		$ 248,388,646.00		$ 27,598,739.00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							$ 275,987,385		$ 96,999,276.00		$ 151,390,371.00		$ 248,388,646.00		$ 27,598,739.00
	ADMINISTRACION	26.0%						$ 71,756,720		$ 25,219,552.00		$ 39,361,496.00		$ 64,581,048.00		$ 7,175,672.00
	IMPREVISTOS	1.0%						$ 2,759,874		$ 969,983.00		$ 1,513,904.00		$ 2,483,886.00		$ 275,987.00
	UTILIDAD	5.0%						$ 13,799,369		$ 4,849,914.00		$ 7,569,519.00		$ 12,419,432.00		$ 1,379,937.00
	TOTAL OBRA							$ 364,303,349		$ 128,037,725.00		$ 199,835,290.00		$ 327,873,012.00		$ 36,430,335.00
	VALOR TOTAL							$ 364,303,349		$ 128,037,725.00		$ 199,835,290.00		$ 327,873,012.00		$ 36,430,335.00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			%
VALOR CONTRATO (A)	$	245,687,051.99	
VALOR ADICIONAL 1 (B)	$	118,616,297.01	
VALOR TOTAL CONTRATO (A+B+B')	$	364,303,349.00	
VALOR ACTA PARCIAL 02 (C)	$	199,835,290.00	54.85%
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 01 (D)			
VALOR NETO A CANCELAR ACTA PARCIAL 01 (C) - (D)	$	199,835,290.00	
VALOR ACUMULADO EJECUCION	$	327,873,012.00	90.00%
SALDO POR EJECUTAR	$	36,430,335.00	10.00%

ORLANDO ORDOÑEZ
GRUPO FAO SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FERNANDO RIVEROS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR / ALCALDIA DE CAPARRAPÍ

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	16.40
ITEM:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNIDAD	M3	ESPECIFIC	TOL

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				M3	VACIOS			ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	EXP-	PROF		LARGO	ANCHO	ALTO			
Domiciliarias Sanitarias	24.00	1.50	0.70		1.20	30.24						
Cajas de inspeccion	33.00	1.10	1.10		1.20	47.92						
Tuberia Sanitaria	1	90.00	1.20		1.50	162.00						
Tuberia Pluvial	1	139.50	1.60		1.70	379.44						
Pozos	15	3.12	1.80		1.55	130.57						
						750.17						

675.15	90%
450.00	ACTA 1
225.15	TOTAL ACTA 2



TOTAL		ZZ5
OBSERVACIONES		

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT 901.464.851-1 R.L.: ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA


SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:		PRESPUESTO		REF.	3.1.0
ITEM:	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 DE UTILIZACIONES)		UNIDAD	M2	ESPECIFIC

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP.	PROF	M2	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML
Domiciliarias Sanitarias	3.00	11	1,2			39,6					
Tuberia Sanitaria	1,00	12,00	1,50			18					
Tuberia Pluvial	1,00	9,50	1,45			12,325					
						69,93					

62,93	90%
0,00	ACTA 1
62,93	TOTAL ACTA 2

PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO

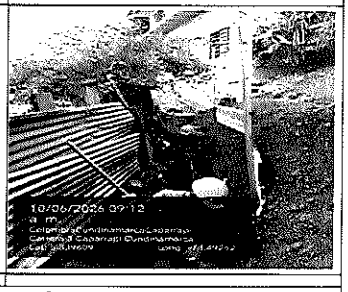

TOTAL 63

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.494.661-1 R/L : ORLANDO CRDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	


Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/08/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	2.90
ITEM:	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	UNIDAD	M3	ESPECIFIC	CCC

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				M3	VACIOS			ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	EXP-	PROF		LARGO	ANCHO	ALTO			
Domiciliarias Sanitarias	24,00	1.50	0,60		0.23	4.97						
Tuberia Sanitaria	1	90.00	1,20		0.23	24.84						
Tuberia Pluvial	1	139.50	1.60		0.23	51.34						
						81.14						
						73.03	90%					
						40	ACTA 1					
						33.0	TOTAL ACTA 2					
TOTAL											33,0	

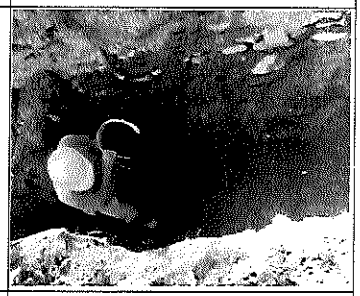

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.484.681-1 R/L : ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	16.70
ITEM:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	UNIDAD	M3	ESPECIFIC	ICCU

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	M3	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	M1
Domiciliarias Sanitarias	24.00	1.50	0.60		1.50	32.69					
Tuberia Sanitaria	1	90.00	1.25		1.90	213.75					
Tuberia Pluvial	1	139.50	1.60		1.90	424.08					
						670.52					
						603.468	90%				
						380	ACTA 1				
						223.5	TOTAL ACTA 2				
TOTAL											223.5

PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.464.681-1 RL : ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	


Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRASTRUCTURA	FECHA	15/OCTUBRE
CONTRATISTA	GRUPO FAG SAS		

CAPITULO:		PRESPUESTO		REF.	1.1.1
ITEM:	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"	UNIDAD	ML	ESPECIFIC	4.7.1

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	ML	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	24.00	1.00	1.00	1.00	24.00						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	15.50	1.00	1.00	1.00	15.50						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	12.50	1.00	1.00	1.00	12.50						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	14.00	1.00	1.00	1.00	14.00						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	36.00	1.00	1.00	1.00	36.00						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	47.00	1.00	1.00	1.00	47.00						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	23.90	1.00	1.00	1.00	23.90						
Tuberia Sanitaria 8" Domiciliaria	1	28.00	1.00	1.00	1.00	28.00						
						200.90						
						180.8	90%					
						24.0	ACTA 1					
						156.81	TOTAL ACTA 2					

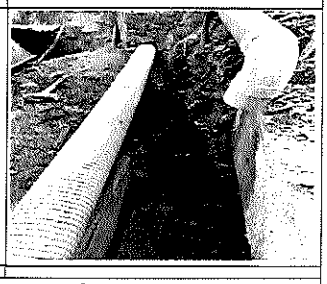

TOTAL			156.8
OBSERVACIONES			

CONTRATISTA
GRUPO FAG SAS
NIT 901454391-1
RL. ORLANDO GIRON

SUPERVISOR
ING. FERNANDO RIVEROS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA


Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		FECHA 25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO		REF.	3.28
ITEM:	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"	UNIDAD	ML	ESPECIFIC .CCU

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP.	PROF	ML	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
Tubería Sanitaria 16"	1	89.50	1.00	1.00	1.00	89.50						
						89.50						
						80.55	90%					
						12.00	ACTA 1					
						68.6	TOTAL ACTA 2					
TOTAL											68.6	

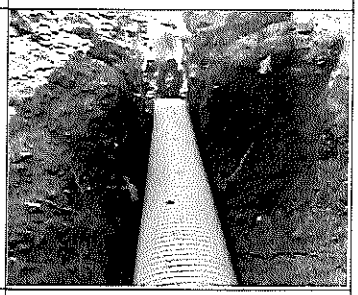

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.484.861-1 R/L: ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA


SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	7/SOAD/21
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:		PRESPUESTO		REF	
ITEM:	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18"		UNIDAD	ML	ESPECIFIC

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP+	PROF	ML	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	AREA PARCIAL	ML
Tubería pluvial 18"	1.00	139,50	1,00	1,00	1,00	139,50					
						139,50					

125,55	30%
0,00	ACTA 1
125,55	TOTAL ACTA 2

PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO

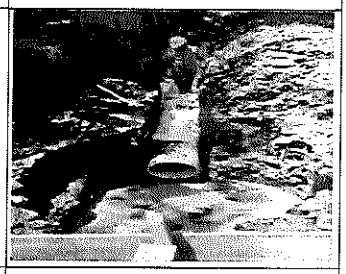

TOTAL 125,6

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT 901434611-1 RL. ORLANDO GROSSO		SUPERVISOR ING. FERNANDO PINEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	7/04/21

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO	REF.	16.40
ITEM:	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE DIH 2.00M E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)	UNIDAD	ML

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	ML	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.90	1.90					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.70	1.70					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.80	1.80					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.70	1.70					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.15	1.15					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.90	1.90					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.30	1.30					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.55	1.55					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.20	1.50					
Cilindro Ladrillo Tolete	1	1.00	1.00	1.00	1.20	1.50					
						23.1					

20.7	90%
15.0	ACTA 1
5.7	TOTAL ACTA 2

PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO



TOTAL	5.7

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT 901.484.961-1 R/L.: ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca


ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	23/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	4.40
ITEM:	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M ,CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO	UNIDAD	UNO	ESPECIFIC	ICCU

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	UND	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
Cubierta Pozo 1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 2	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 3	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 4	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 5	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 6	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 7	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 8	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 9	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 10	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 11	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 12	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 13	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 14	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 15	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
						15.00						

13.5	90%
8.0	ACTA 1
5.5	TOTAL ACTA 2

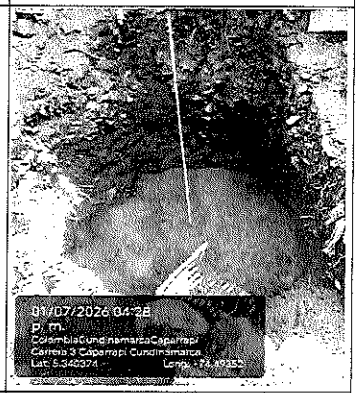

TOTAL			5,5
OBSERVACIONES			

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT 901.484.961-1 R/L : ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca


ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	4.90
ITEM:	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO ,INCLUYE ARO Y TAPA HFI	UNIDAD	UND	ESPECIFIC	4000

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				UND	VACIOS			ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	EXP.	PROF		LARGO	ANCHO	ALTO			
Cubierta Pozo 1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 2	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 3	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 4	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 5	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 6	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 7	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 8	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 9	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 10	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 11	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 12	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 13	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 14	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Cubierta Pozo 15	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
						15.00						

13.50	90%
8.00	ACTA 1
5.50	TOTAL ACTA 2

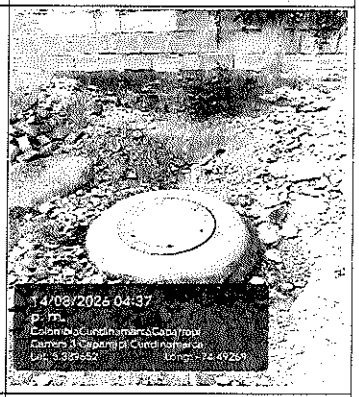


TOTAL		5.5
OBSERVACIONES		

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT 901.464.881-1 R/L : ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/08/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	3.50
ITEM:	CAJA DE INSPECCION DE 60X60	UNIDAD	UND	ESPECIFIC	ICC_

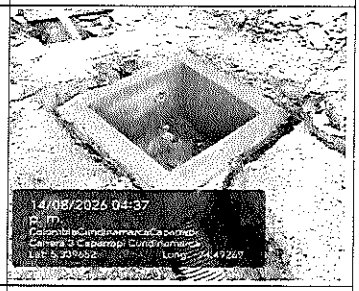EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				UND	VACIOS			ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	EXP-	PROF		LARGO	ANCHO	ALTO			
Cajas de Inspeccion	33.00	1.00	1.00	1.00	1.00	33.00						
						33.00						
						29.7	90%					
						10.0	ACTA 1					
						19.7	TOTAL ACTA 2					
TOTAL											19.7	

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.484.861-1 RÚ. ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/09/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAD SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	6.17
ITEM:	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM	UNIDAD	M2	ESPECIFIC	

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP.	PROF	M2	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
Pañete colas de inspeccion	33	0.60	0.60	1.00	4.00	47.5						
						47.52						
						42.77	90%					
						15.00	ACTA 1					
						27.8	TOTAL ACTA 2					
TOTAL											27.8	



OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAD SAS NIT:901.464.961-1 R/L : ORLANDO ORDOREZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapi Cundinamarca


ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/05/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	3.1.3
ITEM:	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UNIDAD	UND	ESPECIFIC	ICCU

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	UND	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	NIL
Silla YEE PVC	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Silla YEE PVC	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Silla YEE PVC	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Silla YEE PVC	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Silla YEE PVC	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Silla YEE PVC	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
						6.00					
						5.4	90%				
						4	ACTA 1				
						1.4	TOTAL ACTA 2				
TOTAL											1.4

PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO

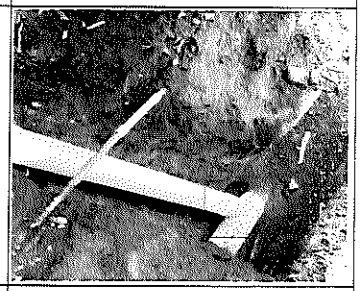

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.464.661-1 R/L : ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	


Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		FECHA 25/06/2025
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:		PRESPUESTO			REF.
ITEM:	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 8"		UNIDAD	UND	ESPECIFIC UCU

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	UND	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 8"	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00						
						10.00						
						9.00	90%					
						0.00	ACTA 1					
						9.00	TOTAL ACTA 2					
TOTAL											9	



OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT 901.434.301-1 R/L ORLANDO OROCHEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	RECIBIDO

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	15/08/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAG SAS		

CAPITULO:	PRESUPUESTO			REF.	2.2
ITEM:	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UNIDAD	M3	ESPECIFIC	C.D.

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP.	PROF	M3	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	AREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
DEMOLICION DE CUNETAS EN ESCALERAS	1.00	16.60	0.90		0.40	6.70						
DEMOLICION PLACA HUELLA	1.00	10.00	0.90		0.30	2.70						
DEMOLICION DE PISOS DE CAJAS EXISTENTES	3	1.50	0.80		0.12	0.14						
						9.54						

8.6	90%
0	ACTA 1
8.6	TOTAL ACTA 2



TOTAL 8.6

OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAG SAS NIT 901.484.381-1 R.L.: ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	25/06/2026
CONTRATISTA	GRUPO FAQ SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	1.30
ITEM:	DEMOLICION ESCALERAS EN CONCRETO	UNIDAD	M2	ESPECIFIC	

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP.	PROF	M2	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML
Demolición Escaleras	1	18.00	0.50			9.00					
Demolición Escaleras entrada domiciliaria	1	8.00	0.75			6.00					
						15.00					
						13.50	90%				
						5	ACTA 1				
						5.50	TOTAL ACTA 2				
TOTAL											5.5

PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA GRUPO FAQ SAS NIT:901.484.861-1 RL : ORLANDO ORJUELA		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca


ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA	23/DEAGOS
CONTRATISTA	GRUPO FAO SAS		

CAPITULO:	PRESPUESTO			REF.	4.60
ITEM:	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (Losas)	UNIDAD	M3	ESPECIFIC	

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	PROF	M3	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA PARCIAL	ML	PLANO Y O REGISTRO FOTOGRAFICO
CONCRETO PLACA HUELLA	1.00	18.60	0.90		0.40	6.70						
CONCRETO PLACA HUELLA	1.00	10.00	0.90		0.31	2.80						
						9.5						

8.6	90%
0.0	ACTA 1
8.6	TOTAL ACTA 2

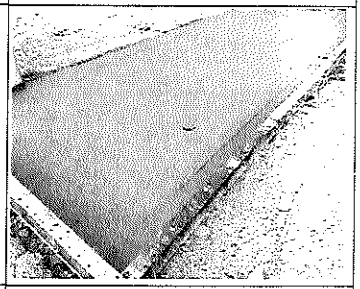

TOTAL			8.6
OBSERVACIONES			

CONTRATISTA GRUPO FAO SAS NIT:901.434.961-1 RL.: ORLANDO ORDOÑEZ		SUPERVISOR ING. FERNANDO RIVEROS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA	

FORMATO 6

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
Carrera 4 No. 7-52
Caparrapí, Cundinamarca

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO. SAMC 006-2026

Objeto: "FASE No.2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ".

Yo, **ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA**, identificado con C.C. No. 79.556.358, en mi condición de representante legal de **GRUPO FAO S.A.S.**, identificada con el NIT 901.484.861-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **NELLY ULALIA GUERRERO ÁVILA**, identificada con C.C. No. 51.969.616 y con tarjeta profesional No. 68395-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **GRUPO FAO S.A.S.**, identificada con el NIT 901.484.861-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (artículo 114-1 del Estatuto Tributario), bajo la gravedad del juramento, manifestamos que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes

parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chía (Cundinamarca), a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2026.

ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA
C.C. 79.556.358
Representante Legal

NELLY ULALIA GUERRERO ÁVILA
C.C. 51.969.616 – T.P. 68395-T
Revisor Fiscal

Anexos: copia de la tarjeta profesional, cédula y certificado de antecedentes disciplinarios (JCC) vigente de la revisora fiscal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 B 8 9 3 0 0 B 8 B 3 C 2 6 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY ULALIA GUERRERO AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51969616 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 68395-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.969.616

GUERRERO AVILA

APELLIDOS

NELLY ULALIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1968

LA PEÑA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

04-JUN-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00016542-F-0051969616-20080624 0000597269A 1 1520012322

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



68395-T

NELLY ULALIA
GUERRERO AVILA
C.C. 51969616
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 02/12/99
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00077201

CARVAJAL S.A. 06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

026209

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51969616

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901484861-1	GRUPO FAO SAS		Cra 1 A # 11 - 130 TORRE 1 OFC 406	3188842475	grupofaosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94351024	19/08/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$6,936,230	$2,151,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.500	0		0		0	1	100	0	92.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	50.800	0		0		0	1	100	0	50.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	90.100	0		0		0	1	100	0	90.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	23.400	0		0		0	1	100	0	23.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	21.100	0		0		0	1	100	0	21.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	56.100	0	0	0	0	1	100	0	56.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	684.500	0	0	0	0	1	600	0	685.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	369.600	0	0	0	0	1	300	0	369.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	483.100				483.100	1	400	483.500			4.831	483.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	277.900	1	300	278.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	277.900	278.400
Pensión	3	1.110.200	1.111.200
Riesgos Laborales	1	483.100	483.500
CCF	1	277.900	278.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.149.100	2.151.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901484861-1	GRUPO FAO SAS	Cra 1 A # 11 - 130 TORRE 1 OFC 406	3188842475	grupofaosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94351024	19/08/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$6,936,230	$2.151.300	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
y o de cación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
4701	GUZMAN GIRALDO REYNALDO	1	0			S	X																230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPSC34	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	5	36.600	CCF34	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
07875	SALINAS CARRILLO NICOLAS FARID	1	0			S																	230301	2.250.905	30	360.200	0	0	0	0	EPS002	2.250.905	30	90.100	14-11	2.250.905	30	5	156.700	CCF34	2.250.905	30	90.100	0	0	0	0	0
0222B	GUARIN ORTIZ WILDER ALEXANDER	1	0			S	X																230301	916.868	10	146.800	0	0	0	0	EPS005	916.868	10	36.700	14-11	916.868	10	5	63.900	CCF34	916.868	10	36.700	0	0	0	0	0
11023	MANOSALVA CASTELLANOS JOSE FERNANDO	1	0			S	X																230201	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS005	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	24.400	CCF34	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
59515	NAVARRO ROJAS SEBASTIAN	1	0			S	X																25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
83316	BORDA GIRALDO LUIS FRANCISCO	1	0			S	X																230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS041	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF34	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
16834	MANA VARGAS GLORIA YASMIN	1	0			S																	25-14	2.250.905	30	360.200	0	0	0	0	EPS037	2.250.905	30	90.100	14-11	2.250.905	30	5	156.700	CCF34	2.250.905	30	90.100	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901484861-1	GRUPO FAO SAS		Cra 1 A # 11 - 130 TORRE 1 OFC 406	3188842475	grupofaosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95119706	14/09/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$29,613,035	$9,172,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	93,400	0		0		0	0	0	0	93,400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	233,200	0		0		0	0	0	0	233,200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	280,700	0		0		0	0	0	0	280,700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145,300	0		0		0	0	0	0	145,300	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	222,700	0		0		0	0	0	0	222,700	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	210,300	0		0		0	0	0	0	210,300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	924,600	0	0	0	0	0	0		924,600	5
230301	Porvenir	800224808-8	3,532,700	0	0	0	0	0	0		3,532,700	14
25-14	Colpensiones	800336004-7	281,500	0	0	0	0	0	0		281,500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2,062,200				2,062,200	0	0	2,062,200			20,622	2,062,200	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1,185,600	0	0	1,185,600	21

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1,185,600	1,185,600
Pensión	3	4,738,800	4,738,800
Riesgos Laborales	1	2,062,200	2,062,200
CCF	1	1,185,600	1,185,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	9,172,200	9,172,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901484861-1	GRUPO FAO SAS	Cra 1 A # 11 - 130 TORRE 1 OFC 406	3188842475	grupofaosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95119706	14/09/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$29,613,035	$9.172.200	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES					
y ro de cación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C 4701	GUZMAN GIRALDO REYNALDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
C 37875	SALINAS CARRILLO NICOLAS FARID	1	0			S																	230301	2.250.905	30	360.200	0	0	0	0	EPS002	2.250.905	30	90.100	14-11	2.250.905	30	5	156.700	CCF34	2.250.905	30	90.100	0	0	0	0	0
C 67172	RODRIGUEZ SALGADO JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS002	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF34	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
C 21332	BETANCUR AYALA YEISON FERNANDO	1	0			S	X																230201	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS037	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF34	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
C 35649	CARDONA MORALES LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
C 67060	VARELAS BEDOYA YEISON BIASNEY	1	0			S	X																230201	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS037	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF34	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
C 92448	CASAS ALFONSO VICTOR ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF34	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
C 38324	HERNANDEZ BEDOYA JOSE ALBEIRO	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS037	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF34	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
C 37068	CORREA RUIZ CESAR AUGUSTO	1	0			S	X																230301	1.300.603	20	208.100	0	0	0	0	EPS041	1.300.603	20	52.100	14-11	1.300.603	20	5	90.600	CCF34	1.300.603	20	52.100	0	0	0	0	0
C 62228	GUARIN ORTIZ WILDER ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.750.905	30	440.200	0	0	0	0	EPS005	2.750.905	30	110.100	14-11	2.750.905	30	5	191.500	CCF34	2.750.905	30	110.100	0	0	0	0	0
C 93150	FONSECA AYALA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
C 18323	MANDSALVA CASTELLANOS JOSE FERNANDO	1	0			S		X															230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	5	28.500	CCF34	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
C 09647	VANEGAS QUIROGA DAVID FELIPE	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	CCFC55	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF34	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
C 69515	NAVARRO ROJAS SEBASTIAN	1	0			S		X															25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	5	28.500	CCF34	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
C 06510	MONROY REYES JEAN CARLOS	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	CCFC55	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF34	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
C 42312	PEÑA MONA FREDY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
C 07660	RUIZ MARQUEZ JHON ALEXANDER	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS041	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF34	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
263316	BORDA GIRALDO LUIS FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
216834	MANA VARGAS GLORIA YASMIN	1	0			S		X															25-14	1.350.543	18	216.100	0	0	0	0	EPS037	1.350.543	18	54.100	14-11	1.350.543	18	5	94.000	CCF34	1.350.543	18	54.100	0	0	0	0	0
797341	REYES DIAZ DIANA CRISTINA	1	0			S	X																230201	2.100.845	28	336.200	0	0	0	0	EPS005	2.100.845	28	84.100	14-11	2.100.845	28	5	146.300	CCF34	2.100.845	28	84.100	0	0	0	0	0
007755	MONDRAGON GAVIRIA ROBINSON	1	0			S		X															230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
