
tonalidad gris en la zona de la escalera, avanzando en detalles de acabado. Se recomienda dar continuidad a la instalación de abrazaderas en las bajantes y realizar la aplicación de pintura correspondiente en estos elementos para su protección y correcto acabado.
Inspector I.C

05 de mayo de 2026 - Martes
Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) trabajador del área operativa. Se ejecutaron actividades de aplicación de pintura en tubería EMT en la fachada interna, labores de aseo en aula del segundo piso y recolección de residuos con limpieza del área del cerramiento, dejándola en condiciones adecuadas. Se recomienda mantener las rutinas de limpieza y orden en obra, así como programar actividades operativas adicionales que permitan optimizar el rendimiento del personal disponible.
Inspector I.C

Powered by CamScanner


1073246437 | Programacion Colegio Integrado de Fontibon - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**27/02/2026**	98d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	06/11/2025	27/02/2026	98d
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de...	13/11/2025	14/11/2025	2d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**31/01/2026**	**60d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORI...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.2	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	26/11/2025	01/12/2025	5d
3.3	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	30/01/2026	31/01/2026	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	15/01/2026	16/01/2026	2d
3.5	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/01/2026	14/01/2026	2d
3.6	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.7	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/01/2026	17/01/2026	2d
3.8	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.9	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	28/01/2026	29/01/2026	2d
4	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**18/12/2025**	**16d**
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	01/12/2025	03/12/2025	3d
4.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	16/12/2025	18/12/2025	3d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**20/01/2026**	**34d**
5.1	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	12/12/2025	16/12/2025	4d
5.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/12/2025	26/12/2025	5d
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	19/01/2026	20/01/2026	2d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**19/01/2026**	**40d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	04/12/2025	19/01/2026	40d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	19/12/2025	22/12/2025	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/01/2026**	**22/01/2026**	**2d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	21/01/2026	22/01/2026	2d
8	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**03/02/2026**	**16d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	27/01/2026	31/01/2026	5d
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	16/01/2026	03/02/2026	16d
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**16/02/2026**	**5d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	11/02/2026	13/02/2026	3d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	14/02/2026	16/02/2026	2d
10	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**04/02/2026**	**3d**
10.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	31/01/2026	04/02/2026	3d
11	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/02/2026**	**11/02/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	04/02/2026	11/02/2026	7d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	07/02/2026	11/02/2026	3d
12	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**19/02/2026**	**3d 6h**
12.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/02/2026	18/02/2026	3d
12.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	16/02/2026	19/02/2026	3d 6h
12.3	ENTREGA DE ACABADOS AULA	19/02/2026	19/02/2026	
13	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/01/2026**	**28/01/2026**	**20d**
13.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	21/01/2026	22/01/2026	2d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	23/01/2026	26/01/2026	3d
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	06/01/2026	28/01/2026	20d
13.5	ENTREGA DE CUBIERTA	28/01/2026	28/01/2026	
14	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
14.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	27/02/2026	98d
14.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	20/01/2026	22/01/2026	3d
15	**NO PREVISTOS**	**15/11/2025**	**19/02/2026**	**82d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	09/02/2026	14/02/2026	5d 1h
15.2	DESMONTE Y RETIRO DE LEONES	21/11/2025	22/11/2025	2d
15.3	DESMONTE DE TAPAS DE SUPERBOARD DE LA CUBIERTA	03/01/2026	06/01/2026	2d
15.4	CORTE DE TEJA	09/01/2026	12/01/2026	3d
15.5	RECORRIDO DE CUBIERTA (INCLUYE SUJECION DE TEJAS Y RESANES A QUE HAYA LUGAR)	29/12/2025	01/01/2026	4d
15.6	APUNTALAMIENTO PARA MURO SEGÚN DISEÑO	15/11/2025	20/11/2025	5d
15.7	PINTURA DE REJA DE TECHO	23/01/2026	27/01/2026	4d
15.8	DESMONTE Y REINSTALACION DE REJA DE TECHO	09/01/2026	16/02/2026	33d
15.9	ENCORAZADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
15.10	FIN	19/02/2026	19/02/2026	

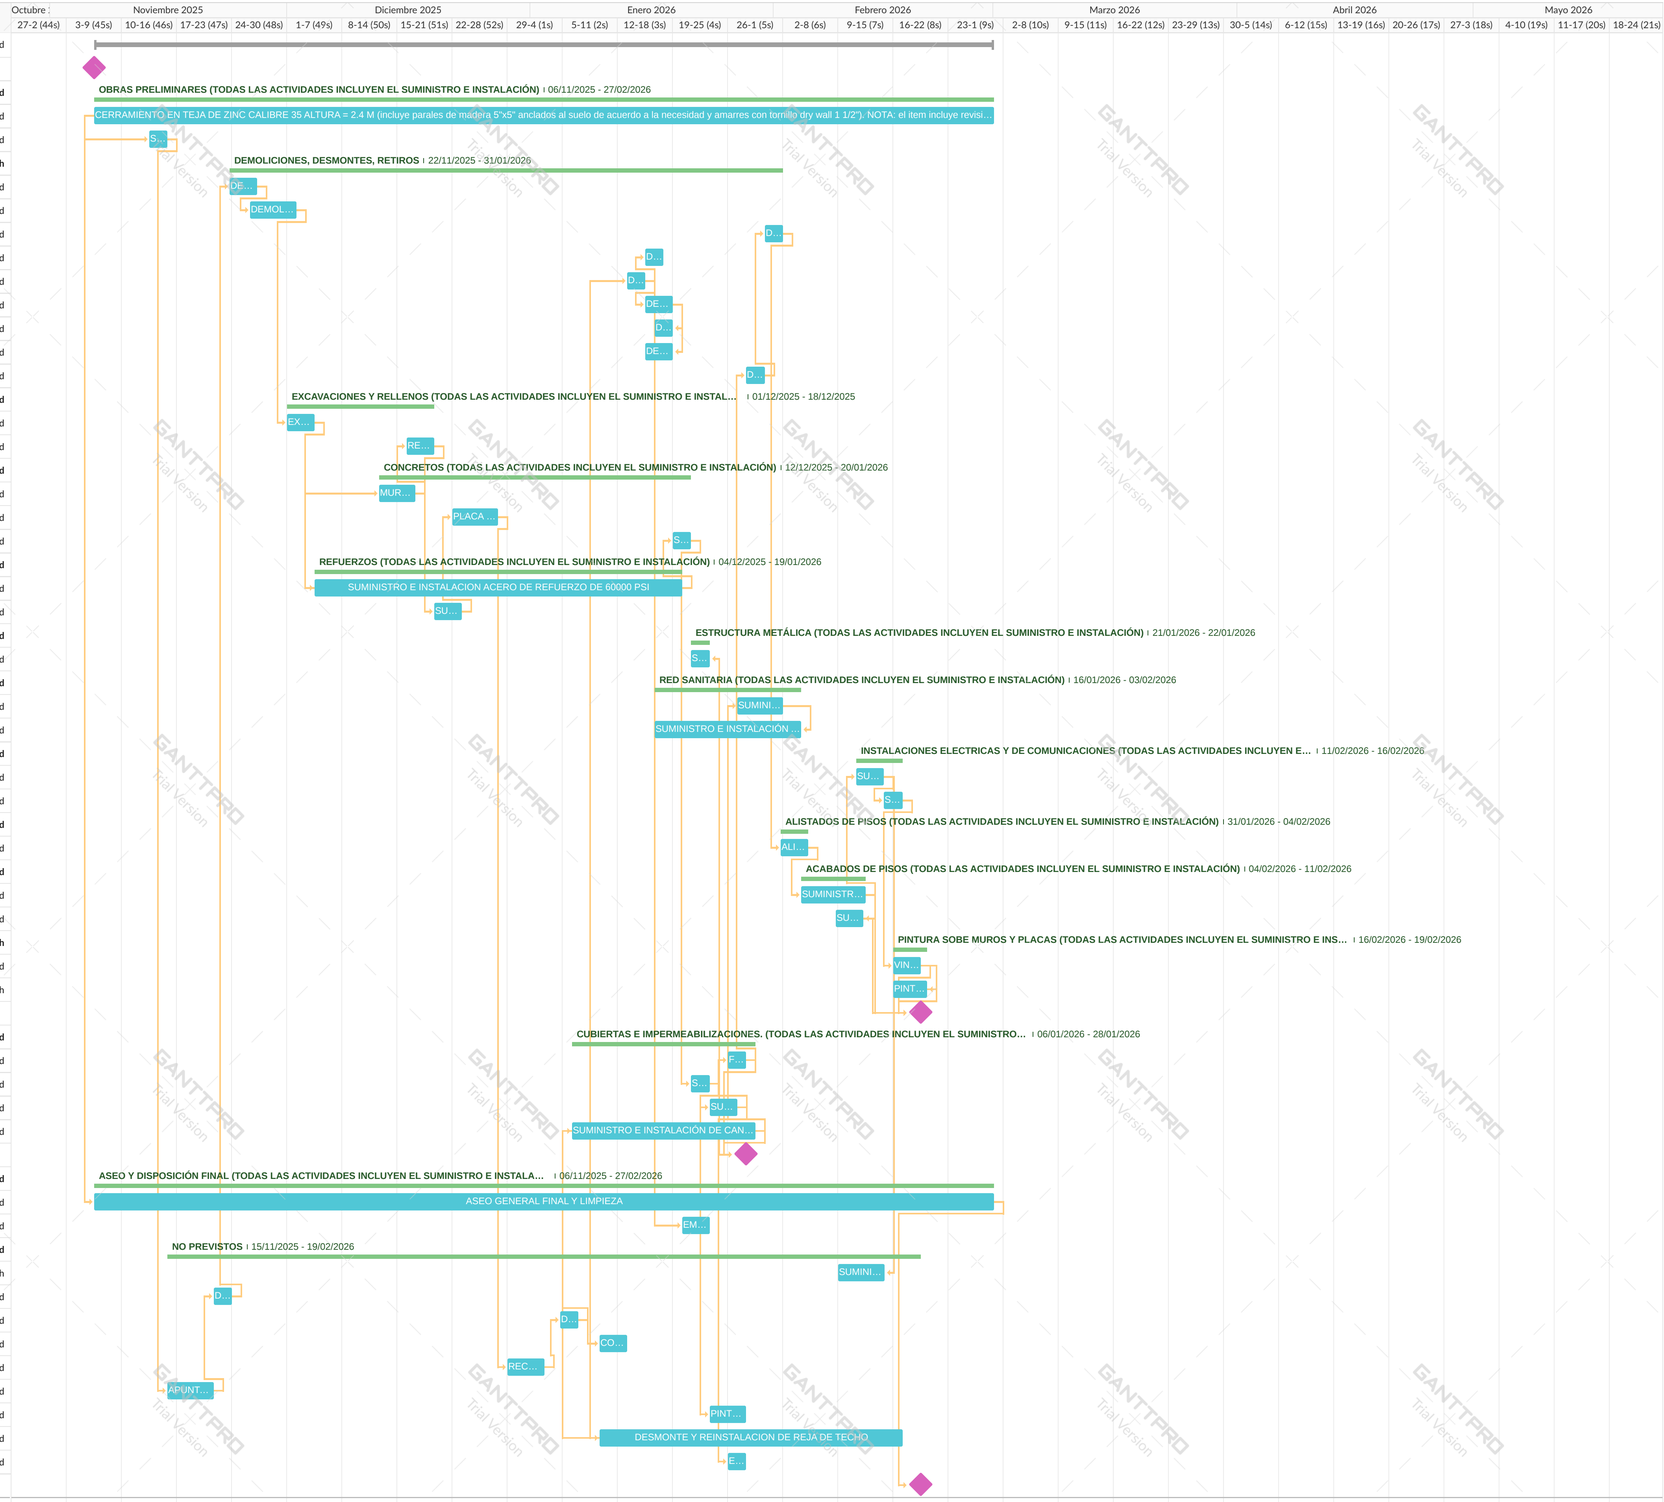

1073246437 | Programacion Colegio Antonio Van Uden - Sede C


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		18/11/2025	**13/04/2026**	**126d**
1	INICIO	18/11/2025	18/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	18/11/2025	13/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**20/11/2025**	**09/03/2026**	**94d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	05/01/2026	08/01/2026	3d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	23/12/2025	25/12/2025	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
3.5	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	23/12/2025	24/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	06/12/2025	09/03/2026	80d
3.7	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	02/01/2026	03/01/2026	2d
3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.9	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	28/11/2025	26/12/2025	24d 2m
3.10	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	27/12/2025	31/12/2025	4d
3.11	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	24/11/2025	02/01/2026	35d
3.12	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	20/11/2025	25/12/2025	31d
3.13	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	24/11/2025	03/01/2026	36d
3.14	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	19/02/2026	20/02/2026	1d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/12/2025	01/01/2026	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RE...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	02/01/2026	09/01/2026	6d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/01/2026**	**07/04/2026**	**82d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPE...	02/01/2026	07/04/2026	82d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**20/01/2026**	**8d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	13/01/2026	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	17/01/2026	20/01/2026	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/01/2026**	**09/02/2026**	**15d**
6.1	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	03/02/2026	06/02/2026	3d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	06/02/2026	09/02/2026	2d
6.3	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	31/01/2026	04/02/2026	3d
6.4	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/01/2026	26/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**07/02/2026**	**16d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	29/01/2026	07/02/2026	8d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	20/01/2026	22/01/2026	2d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/03/2026**	**52d 58m**
8.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	24/01/2026	29/01/2026	4d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	26/02/2026	26/03/2026	25d
9	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y T...	29/01/2026	03/02/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**25/02/2026**	**37d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	25/02/2026	37d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	13/02/2026	20/02/2026	6d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	15/01/2026	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**15/01/2026**	**19/01/2026**	**3d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.3	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	17/01/2026	17/01/2026	
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/02/2026**	**28d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/02/2026	11/02/2026	3d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	07/02/2026	12/02/2026	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	10/01/2026	15/01/2026	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	10/01/2026	15/01/2026	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**13/02/2026**	**2d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	11/02/2026	13/02/2026	2d
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**20/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	13/01/2026	16/01/2026	3d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZAD...	17/01/2026	20/01/2026	2d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/03/2026**	**23/03/2026**	**1d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	21/03/2026	23/03/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**20/03/2026**	**83d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	10/03/2026	11/03/2026	1d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	13/12/2025	19/03/2026	82d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	26/12/2025	31/12/2025	4d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	11/03/2026	13/03/2026	2d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**06/03/2026**	**12d**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	20/02/2026	24/02/2026	3d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	02/03/2026	06/03/2026	4d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/02/2026**	**12/03/2026**	**15d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	23/02/2026	03/03/2026	7d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	06/03/2026	09/03/2026	2d
18.3	WIN DE ALUMINIO	06/03/2026	12/03/2026	5d
18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	02/03/2026	05/03/2026	3d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**12/03/2026**	**5d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	06/03/2026	12/03/2026	5d
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**16/03/2026**	**24d 2m**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	16/02/2026	26/02/2026	10d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	11/03/2026	16/03/2026	4d
21	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**26/02/2026**	**6d**
21.1	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	20/02/2026	26/02/2026	6d
22	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/03/2026**	**12/03/2026**	**4d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	07/03/2026	12/03/2026	4d
23	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**27/03/2026**	**22d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	21/03/2026	23/03/2026	1d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON F...	24/03/2026	26/03/2026	2d
23.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	26/03/2026	27/03/2026	1d
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	02/03/2026	04/03/2026	2d
24	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/03/2026**	**30/03/2026**	**3d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	26/03/2026	30/03/2026	3d
24.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	26/03/2026	30/03/2026	3d
25	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**14/03/2026**	**27d**
25.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	11/02/2026	18/02/2026	6d
25.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.4	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CER...	14/02/2026	18/02/2026	3d
26	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**03/04/2026**	**32d**
26.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	26/02/2026	03/04/2026	32d
26.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	27/02/2026	03/04/2026	31d
26.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	18/03/2026	3d
26.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	26/02/2026	01/04/2026	30d
26.5	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	14/03/2026	19/03/2026	4d
26.6	ENTREGA DE PINTURA DE FACHADAS	28/03/2026	28/03/2026	
27	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/03/2026**	**17/03/2026**	**5d**
27.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	11/03/2026	17/03/2026	5d
28	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**31/03/2026**	**2d**
28.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	28/03/2026	31/03/2026	2d
28.2	ENTREGA DE BAÑOS	31/03/2026	31/03/2026	
29	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/12/2025**	**21/03/2026**	**91d 7h 58m**
29.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	06/01/2026	21/03/2026	64d 2m
29.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	12/03/2026	14/03/2026	2d
29.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	13/12/2025	05/03/2026	71d
29.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	06/12/2025	25/02/2026	69d
29.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	05/12/2025	08/12/2025	2d
29.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	02/01/2026	21/03/2026	68d
29.7	ENTREGA DE CUBIERTA	14/03/2026	14/03/2026	
30	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
30.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	18/11/2025	13/04/2026	126d
30.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	03/01/2026	08/01/2026	4d
31	**ITEM NO PREVISTOS**	**18/11/2025**	**01/04/2026**	**116d**
31.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	13/12/2025	04/03/2026	69d
31.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALI...	07/03/2026	12/03/2026	4d
31.3	DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 8MM, INCLUYE MASILLA Y DEMAS EL...	26/02/2026	28/02/2026	3d
31.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES DE SANITARIO 50CM	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.5	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	05/01/2026	06/01/2026	2d
31.6	DESMONTE DE INCRUSTACIONES INCLUYE RETIRO	03/01/2026	05/01/2026	1d
31.7	DESMONTE Y REINTALACION DE TANQUE DE AGUA	18/02/2026	18/03/2026	24d
31.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA , ACOPLE Y SIFÓN)	26/03/2026	27/03/2026	1d
31.9	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION	18/11/2025	14/01/2026	50d
31.10	DESMONTE E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EXISTENTE, (INCLUYE EL DESMONTE DE LA MALLA ESLABONADA Y DE LAS MA...	24/02/2026	01/04/2026	32d
31.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	18/03/2026	19/03/2026	1d
31.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARG...	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.13	ENCORAZADO	20/02/2026	24/02/2026	3d
31.14	FIN	31/03/2026	31/03/2026	




GANTTPRO Trial Version

1073246437 | Programacion Colegio Tecnico Internacional - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**01/04/2026**	126d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	06/11/2025	01/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**08/11/2025**	**19/02/2026**	**89d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	06/12/2025	12/12/2025	5d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	05/12/2025	06/12/2025	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	20/11/2025	17/01/2026	51d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	24/11/2025	28/11/2025	5d
3.5	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	14/01/2026	3d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	19/01/2026	20/01/2026	2d
3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS ...	15/01/2026	19/01/2026	4d
3.8	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	10/11/2025	11/11/2025	2d
3.9	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
3.11	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	08/11/2025	10/11/2025	2d
3.12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.13	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.14	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO D...	12/11/2025	13/11/2025	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	13/12/2025	17/12/2025	4d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**16/03/2026**	**75d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUP...	19/12/2025	16/03/2026	75d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**30/12/2025**	**9d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	19/12/2025	20/12/2025	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	27/12/2025	30/12/2025	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/01/2026**	**20/01/2026**	**14d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	17/01/2026	20/01/2026	3d
6.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	05/01/2026	07/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**16/01/2026**	**12d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	15/01/2026	16/01/2026	2d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	03/01/2026	05/01/2026	2d
8	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/01/2026**	**2d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	24/01/2026	26/01/2026	2d
9	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**25/03/2026**	**65d 7h**
9.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	19/01/2026	03/03/2026	37d 2h
9.2	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	08/01/2026	12/01/2026	4d
9.3	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	07/02/2026	25/03/2026	39d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**09/02/2026**	**45d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	20/12/2025	24/12/2025	3d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**24/12/2025**	**29/12/2025**	**5d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	24/12/2025	26/12/2025	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	26/12/2025	29/12/2025	3d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**26/12/2025**	**6d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	20/12/2025	24/12/2025	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	20/12/2025	24/12/2025	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**03/01/2026**	**5d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	29/12/2025	31/12/2025	3d
13.2	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	03/01/2026	03/01/2026	
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**02/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	26/12/2025	27/12/2025	2d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZA...	27/12/2025	02/01/2026	5d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**07/03/2026**	**54d 1h**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	07/03/2026	07/03/2026	1d
15.2	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	03/01/2026	05/01/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**27/02/2026**	**35d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	19/02/2026	24/02/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	19/02/2026	19/02/2026	1d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, ...	19/01/2026	22/01/2026	4d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/02/2026	07/02/2026	4d
16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	24/02/2026	27/02/2026	4d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**07/02/2026**	**17d 7h**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	31/01/2026	07/02/2026	6d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/01/2026**	**17/03/2026**	**43d 2h**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	07/02/2026	14/02/2026	7d
18.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	14/02/2026	16/02/2026	2d
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	13/03/2026	17/03/2026	3d
18.4	WIN DE ALUMINIO	26/01/2026	31/01/2026	6d
18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	12/03/2026	17/03/2026	4d
18.6	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=...	16/02/2026	17/02/2026	2d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/01/2026**	**14/02/2026**	**19d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	23/01/2026	02/02/2026	9d
19.2	ENTREGA DE OBRA BLANCA	14/02/2026	14/02/2026	
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**18/03/2026**	**11d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	14/03/2026	18/03/2026	4d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	06/03/2026	07/03/2026	2d
21	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**07/02/2026**	**2d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLER...	06/02/2026	07/02/2026	2d
22	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**09/03/2026**	**20d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	2d
22.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	3d
22.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON ...	03/03/2026	06/03/2026	4d
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	04/03/2026	06/03/2026	3d
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	07/03/2026	09/03/2026	2d
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	14/02/2026	17/02/2026	3d
23	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**07/03/2026**	**5d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	03/03/2026	05/03/2026	3d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	03/03/2026	07/03/2026	5d
24	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**09/02/2026**	**23d 7h**
24.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	13/01/2026	19/01/2026	6d
24.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	22/01/2026	24/01/2026	3d
24.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	31/01/2026	09/02/2026	7d
25	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/02/2026**	**05/03/2026**	**22d 1h**
25.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	24/02/2026	27/02/2026	4d
25.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/02/2026	05/03/2026	5d
26	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**24/02/2026**	**5d**
26.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	19/02/2026	24/02/2026	5d
27	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/03/2026**	**14/03/2026**	**3d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	12/03/2026	14/03/2026	3d
27.2	ENTREGA DE BAÑOS	14/03/2026	14/03/2026	
28	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**06/02/2026**	**15d**
28.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	20/01/2026	26/01/2026	6d
28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	29/01/2026	02/02/2026	4d
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	02/02/2026	03/02/2026	2d
28.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICO...	04/02/2026	05/02/2026	2d
28.5	ENTREGA DE CUBIERTA	06/02/2026	06/02/2026	
29	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
29.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	01/04/2026	126d
29.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	17/01/2026	23/01/2026	6d
30	**NO PREVISTOS**	**12/11/2025**	**19/03/2026**	**109d**
30.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO EN PVC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	27/02/2026	09/03/2026	8d
30.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE ...	18/02/2026	24/02/2026	6d
30.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTICO PARA EL ALISTADO DEL PISO	07/03/2026	13/03/2026	5d
30.4	RETIRO DE MUEBLES DE MADERA INCLUYE SU PROTECCION	25/02/2026	27/02/2026	2d
30.5	DEMOLICION Y RETIRO DE MESONES O POCETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	14/11/2025	19/11/2025	5d
30.6	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	12/11/2025	12/11/2025	1d
30.7	DESMONTE Y RETIRO DE ESPEJOS	29/11/2025	03/12/2025	4d
30.8	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	02/12/2025	04/12/2025	3d
30.9	TAPAS DE INSPECCION PARA CIELO DE PVC INCLYE LA PERFORACION, EL MARCO Y LA TAPA EN PVC	19/02/2026	25/02/2026	6d
30.10	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	27/02/2026	03/03/2026	4d
30.11	DESMONTE Y RETIRO DE DOMO	10/01/2026	12/01/2026	1d
30.12	ESCARIFICACION DE MUROS	23/01/2026	31/01/2026	8d
30.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO DE SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (IN...	28/02/2026	02/03/2026	2d
30.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE BRIDA...	28/02/2026	03/03/2026	3d
30.15	VENTANERÍA CON PERSIANA EN ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	07/03/2026	14/03/2026	6d
30.16	ENCOROZADO	26/01/2026	28/01/2026	3d
30.17	PAÑETE LINEAL HASTA LOS .59 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
30.18	FIN	19/03/2026	19/03/2026	




	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		24/11/2025	**18/04/2026**	126d
1	INICIO	24/11/2025	24/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	24/11/2025	18/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**29/11/2025**	**28/01/2026**	**52d**
3.1	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/01/2026	28/01/2026	1d
3.2	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE ...	13/12/2025	17/12/2025	3d
3.3	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	29/11/2025	04/12/2025	5d
4	**MANTENIMIENTOS**	**17/12/2025**	**29/01/2026**	**38d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	17/01/2026	29/01/2026	10d
4.2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE M...	17/12/2025	19/12/2025	3d
4.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	16/01/2026	29/01/2026	12d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/02/2026**	**26/02/2026**	**4d**
6.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	21/02/2026	26/02/2026	4d
7	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**20/12/2025**	**1d**
7.1	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	20/12/2025	20/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**21/02/2026**	**3d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	19/02/2026	21/02/2026	3d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**27/03/2026**	**26d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	26/02/2026	27/03/2026	26d
10	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**5d**
10.1	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	29/01/2026	03/02/2026	5d
11	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/03/2026**	**06/04/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	30/03/2026	03/04/2026	5d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	06/04/2026	06/04/2026	1d
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**12/02/2026**	**1d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	12/02/2026	12/02/2026	1d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**14/01/2026**	**21d**
13.1	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA...	27/12/2025	07/01/2026	10d
13.2	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE ...	08/01/2026	13/01/2026	5d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	20/12/2025	25/12/2025	5d
13.4	PINTURA DE CANCHA	14/01/2026	14/01/2026	
14	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/02/2026**	**12/02/2026**	**9d**
14.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/02/2026	06/02/2026	4d
14.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	04/02/2026	06/02/2026	3d
14.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	12/02/2026	5d
14.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10/02/2026	11/02/2026	2d
14.5	ENTREGA DE PINTURA	12/02/2026	12/02/2026	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**08/04/2026**	**2d**
15.1	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA...	07/04/2026	08/04/2026	2d
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/12/2025**	**08/04/2026**	**105d 1h**
16.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	08/04/2026	08/04/2026	1d
16.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	06/12/2025	13/12/2025	6d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	30/03/2026	04/04/2026	6d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	25/03/2026	30/03/2026	5d
16.5	ENTREGA DE CUBIERTA	13/12/2025	13/12/2025	
16.6	ENTREGA PERGOLA	08/04/2026	08/04/2026	
17	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
17.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24/11/2025	18/04/2026	126d
18	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**10/04/2026**	**50d**
18.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	12/02/2026	10/04/2026	50d
19	**NO PREVISTOS**	**29/11/2025**	**09/04/2026**	**112d**
19.1	MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CARCAMO (AJUSTE-ALINEACION-SOLDADURA)	14/01/2026	17/01/2026	4d
19.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTE,	13/12/2025	16/12/2025	2d
19.3	DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUES DE AGUA	29/11/2025	01/12/2025	2d
19.4	DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERIA	01/12/2025	17/12/2025	15d
19.5	AUTONIVELANTE	04/12/2025	06/12/2025	3d
19.6	FIN	09/04/2026	09/04/2026	

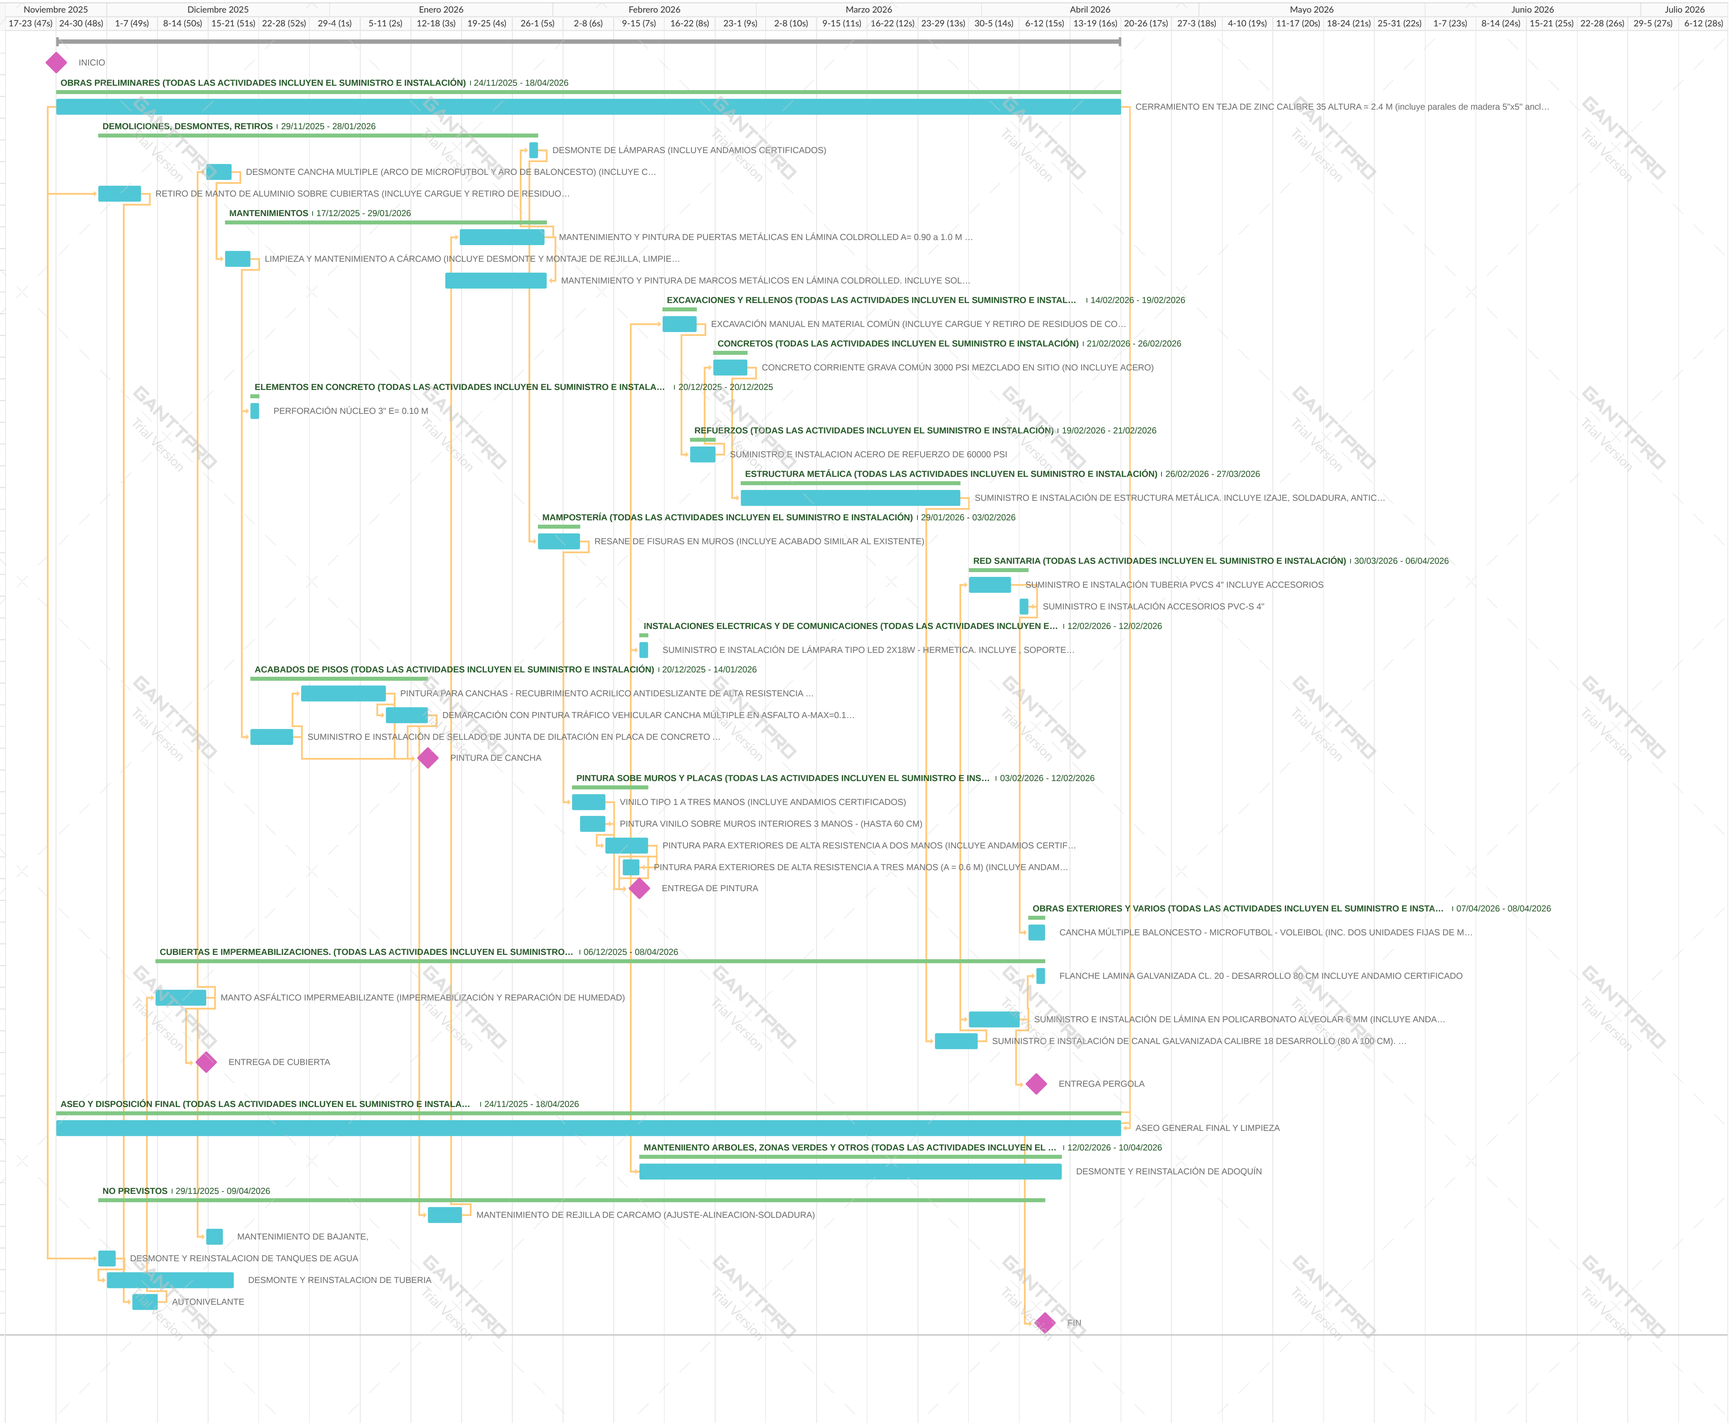


1073246437 | Programacion Colegio Marco Antonio Carreño - Sede B

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		01/12/2025	**25/04/2026**	126d
1	INICIO	01/12/2025	01/12/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**24/04/2026**	**122d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	04/12/2025	24/04/2026	122d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**06/12/2025**	**13/03/2026**	**84d**
3.1	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	09/01/2026	15/01/2026	6d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	26/12/2025	08/01/2026	12d
3.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	06/12/2025	10/12/2025	4d
3.4	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	23/12/2025	23/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/12/2025	23/12/2025	5d
3.6	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/12/2025	18/12/2025	7d
3.7	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	17/12/2025	23/12/2025	6d
3.8	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	12/03/2026	13/03/2026	2d
3.9	FIN DESMONTE DE CUBIERTA	09/01/2026	09/01/2026	
4	**MANTENIMIENTOS**	**10/04/2026**	**16/04/2026**	**6d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	10/04/2026	16/04/2026	6d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	10/04/2026	16/04/2026	6d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**06/02/2026**	**6d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	31/01/2026	06/02/2026	6d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/01/2026**	**30/01/2026**	**3d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/01/2026	30/01/2026	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**13/04/2026**	**75d**
8.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	16/01/2026	24/01/2026	8d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	09/04/2026	13/04/2026	4d
9	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**28/01/2026**	**4d**
9.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	24/01/2026	28/01/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**05/03/2026**	**4d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	02/03/2026	05/03/2026	4d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	03/03/2026	05/03/2026	3d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/03/2026**	**09/04/2026**	**18d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	31/03/2026	01/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/04/2026	09/04/2026	4d
12	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**13/04/2026**	**115d**
12.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	12/03/2026	18/03/2026	6d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	11/04/2026	13/04/2026	2d
12.3	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO D...	01/12/2025	03/12/2025	3d
13	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/03/2026**	**16/04/2026**	**26d**
13.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/03/2026	19/03/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	09/04/2026	16/04/2026	7d
13.3	FIN DE PINTURA	16/04/2026	16/04/2026	
14	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**19/03/2026**	**35d 7h**
14.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	19/03/2026	4d
14.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	14/03/2026	17/03/2026	3d
14.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	06/02/2026	20/02/2026	13d
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	02/03/2026	12/03/2026	10d
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	12/03/2026	14/03/2026	3d
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TO...	25/02/2026	02/03/2026	5d
14.7	FIN CUBIERTA	19/03/2026	19/03/2026	
15	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**25/04/2026**	**126d**
15.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	01/12/2025	25/04/2026	126d
15.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	22/01/2026	7d
16	**NO PREVISTOS**	**02/12/2025**	**16/04/2026**	**116d 7h**
16.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO Y REINSTALACION	12/03/2026	17/03/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	20/03/2026	27/03/2026	7d
16.3	PUERTA CON CHAPA PARA CERRAMIENTO	02/12/2025	03/12/2025	2d
16.4	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD	11/04/2026	16/04/2026	4d
16.5	PINTURA REJA CUBIERTA	23/02/2026	24/02/2026	2d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BA...	28/03/2026	31/03/2026	3d
16.7	ENCORAZADO	19/02/2026	23/02/2026	4d
16.8	FIN	16/04/2026	16/04/2026	

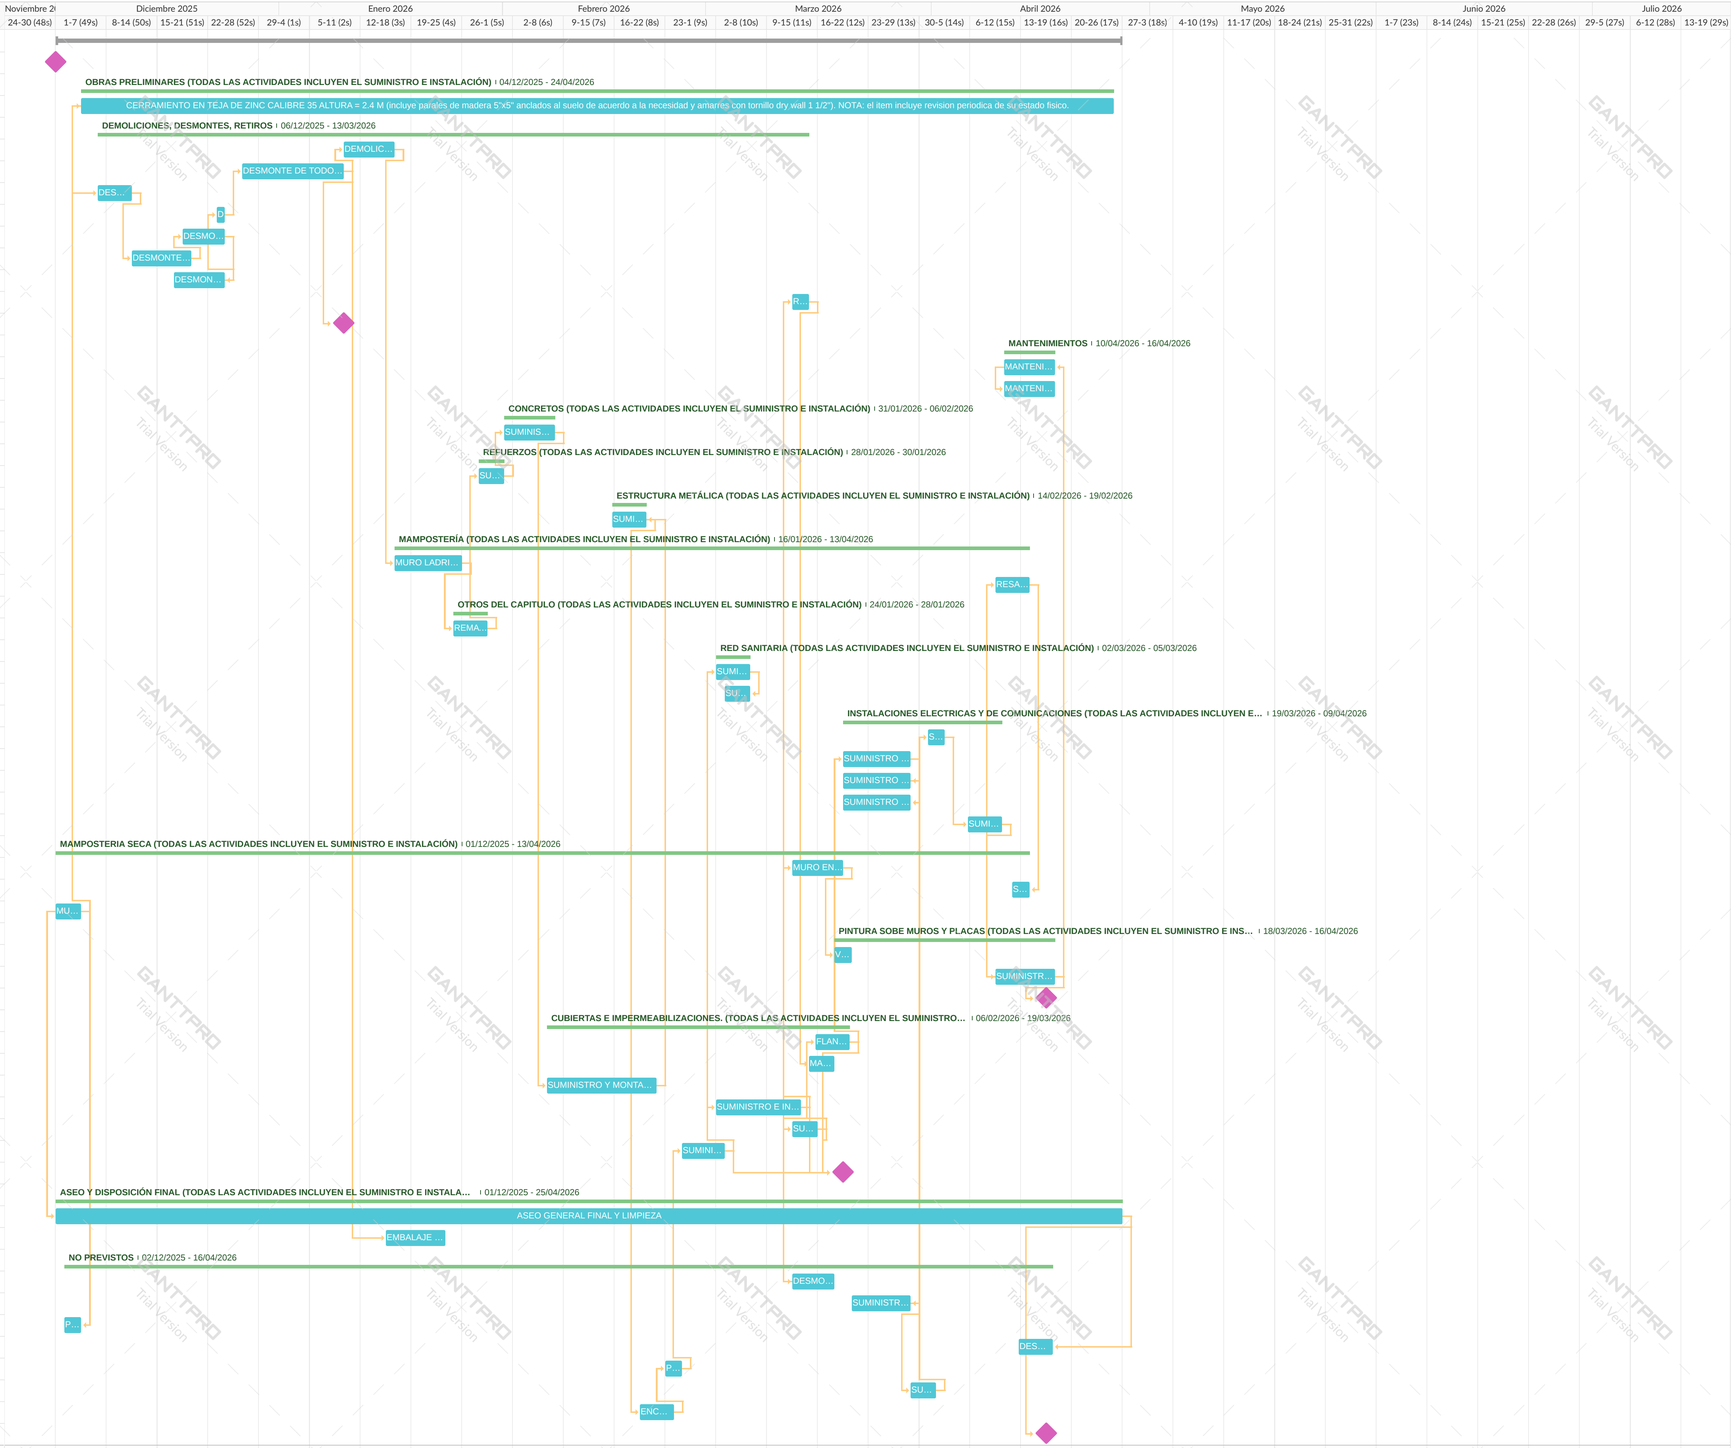


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		21/11/2025	**11/05/2026**	147d
1	INICIO	21/11/2025	21/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	21/11/2025	11/05/2026	147d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**04/04/2026**	**114d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	06/03/2026	07/03/2026	2d
3.2	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	20/12/2025	22/12/2025	2d
3.3	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.4	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	26/11/2025	28/11/2025	3d
3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	04/04/2026	04/04/2026	1d
3.6	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/12/2025	20/12/2025	6d
3.7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.8	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	04/12/2025	05/12/2025	2d
3.9	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ...	07/03/2026	10/03/2026	2d
3.10	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	09/12/2025	11/12/2025	3d
3.11	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	03/12/2025	2d
3.12	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	09/12/2025	11/12/2025	3d
4	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**05/03/2026**	**3d**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	03/03/2026	05/03/2026	3d
5	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/02/2026**	**03/03/2026**	**2d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/02/2026	03/03/2026	2d
6	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/03/2026**	**20/03/2026**	**5d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	16/03/2026	20/03/2026	5d
7	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**22/04/2026**	**53d**
7.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	20/02/2026	27/02/2026	7d
7.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	20/04/2026	22/04/2026	3d
8	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**28/02/2026**	**3d**
8.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	26/02/2026	28/02/2026	3d
9	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**01/04/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	28/03/2026	01/04/2026	4d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	28/03/2026	01/04/2026	4d
10	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**07/04/2026**	**1d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/04/2026	07/04/2026	1d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**23/04/2026**	**14d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	18/04/2026	21/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	18/04/2026	23/04/2026	4d
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 ...	22/04/2026	22/04/2026	1d
11.7	FIN ACTIVIDADES ELECTRICAS	23/04/2026	23/04/2026	
12	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**09/04/2026**	**2d**
12.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	08/04/2026	09/04/2026	2d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/04/2026**	**18/04/2026**	**5d**
13.1	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	16/04/2026	18/04/2026	3d
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	14/04/2026	15/04/2026	2d
14	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/04/2026**	**14/04/2026**	**9d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	10/04/2026	14/04/2026	4d
14.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	04/04/2026	09/04/2026	5d
15	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/03/2026**	**27/03/2026**	**13d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	13/03/2026	18/03/2026	5d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	18/03/2026	23/03/2026	5d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE...	24/03/2026	27/03/2026	4d
16	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**21/04/2026**	**11d 7h**
16.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	08/04/2026	17/04/2026	9d
16.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/04/2026	21/04/2026	8d
16.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	16/04/2026	20/04/2026	4d
17	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**09/04/2026**	**27/04/2026**	**16d**
17.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	09/04/2026	10/04/2026	2d
17.2	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18/04/2026	20/04/2026	1d
17.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
17.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**21/04/2026**	**37d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	21/04/2026	21/04/2026	1d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	10/03/2026	12/03/2026	3d
19	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**11/04/2026**	**28d**
19.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	10/03/2026	21/03/2026	11d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	25/03/2026	04/04/2026	10d
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	07/04/2026	10/04/2026	4d
19.4	FIN DE CUBIERTA	11/04/2026	11/04/2026	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	21/11/2025	11/05/2026	147d
20.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	29/12/2025	02/01/2026	5d
21	**NO PREVISTOS**	**06/12/2025**	**27/04/2026**	**121d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BAR...	15/04/2026	18/04/2026	4d
21.2	ESCARIFICIACION	04/04/2026	07/04/2026	2d
21.3	DESMONTE DE REJA DE TECHO	12/12/2025	13/12/2025	2d
21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	04/04/2026	16/04/2026	10d
21.5	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.6	DEMOLICION DE MUROS DE SUPERBOARD INCLUYE EL RETIRO	06/12/2025	08/12/2025	2d
21.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA DE .80X2.10 INCLUYE CHAPA	09/04/2026	10/04/2026	2d
21.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	21/04/2026	21/04/2026	1d
21.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL , BRIDA DE ...	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.10	ENCOROZADO	21/03/2026	24/03/2026	3d
21.11	PAÑETE LINEAL .HASTA 59 M	27/02/2026	05/03/2026	6d
21.12	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	05/03/2026	10/03/2026	5d
21.13	ENTREGA DE BAÑO	22/04/2026	22/04/2026	
21.14	FIN	27/04/2026	27/04/2026	

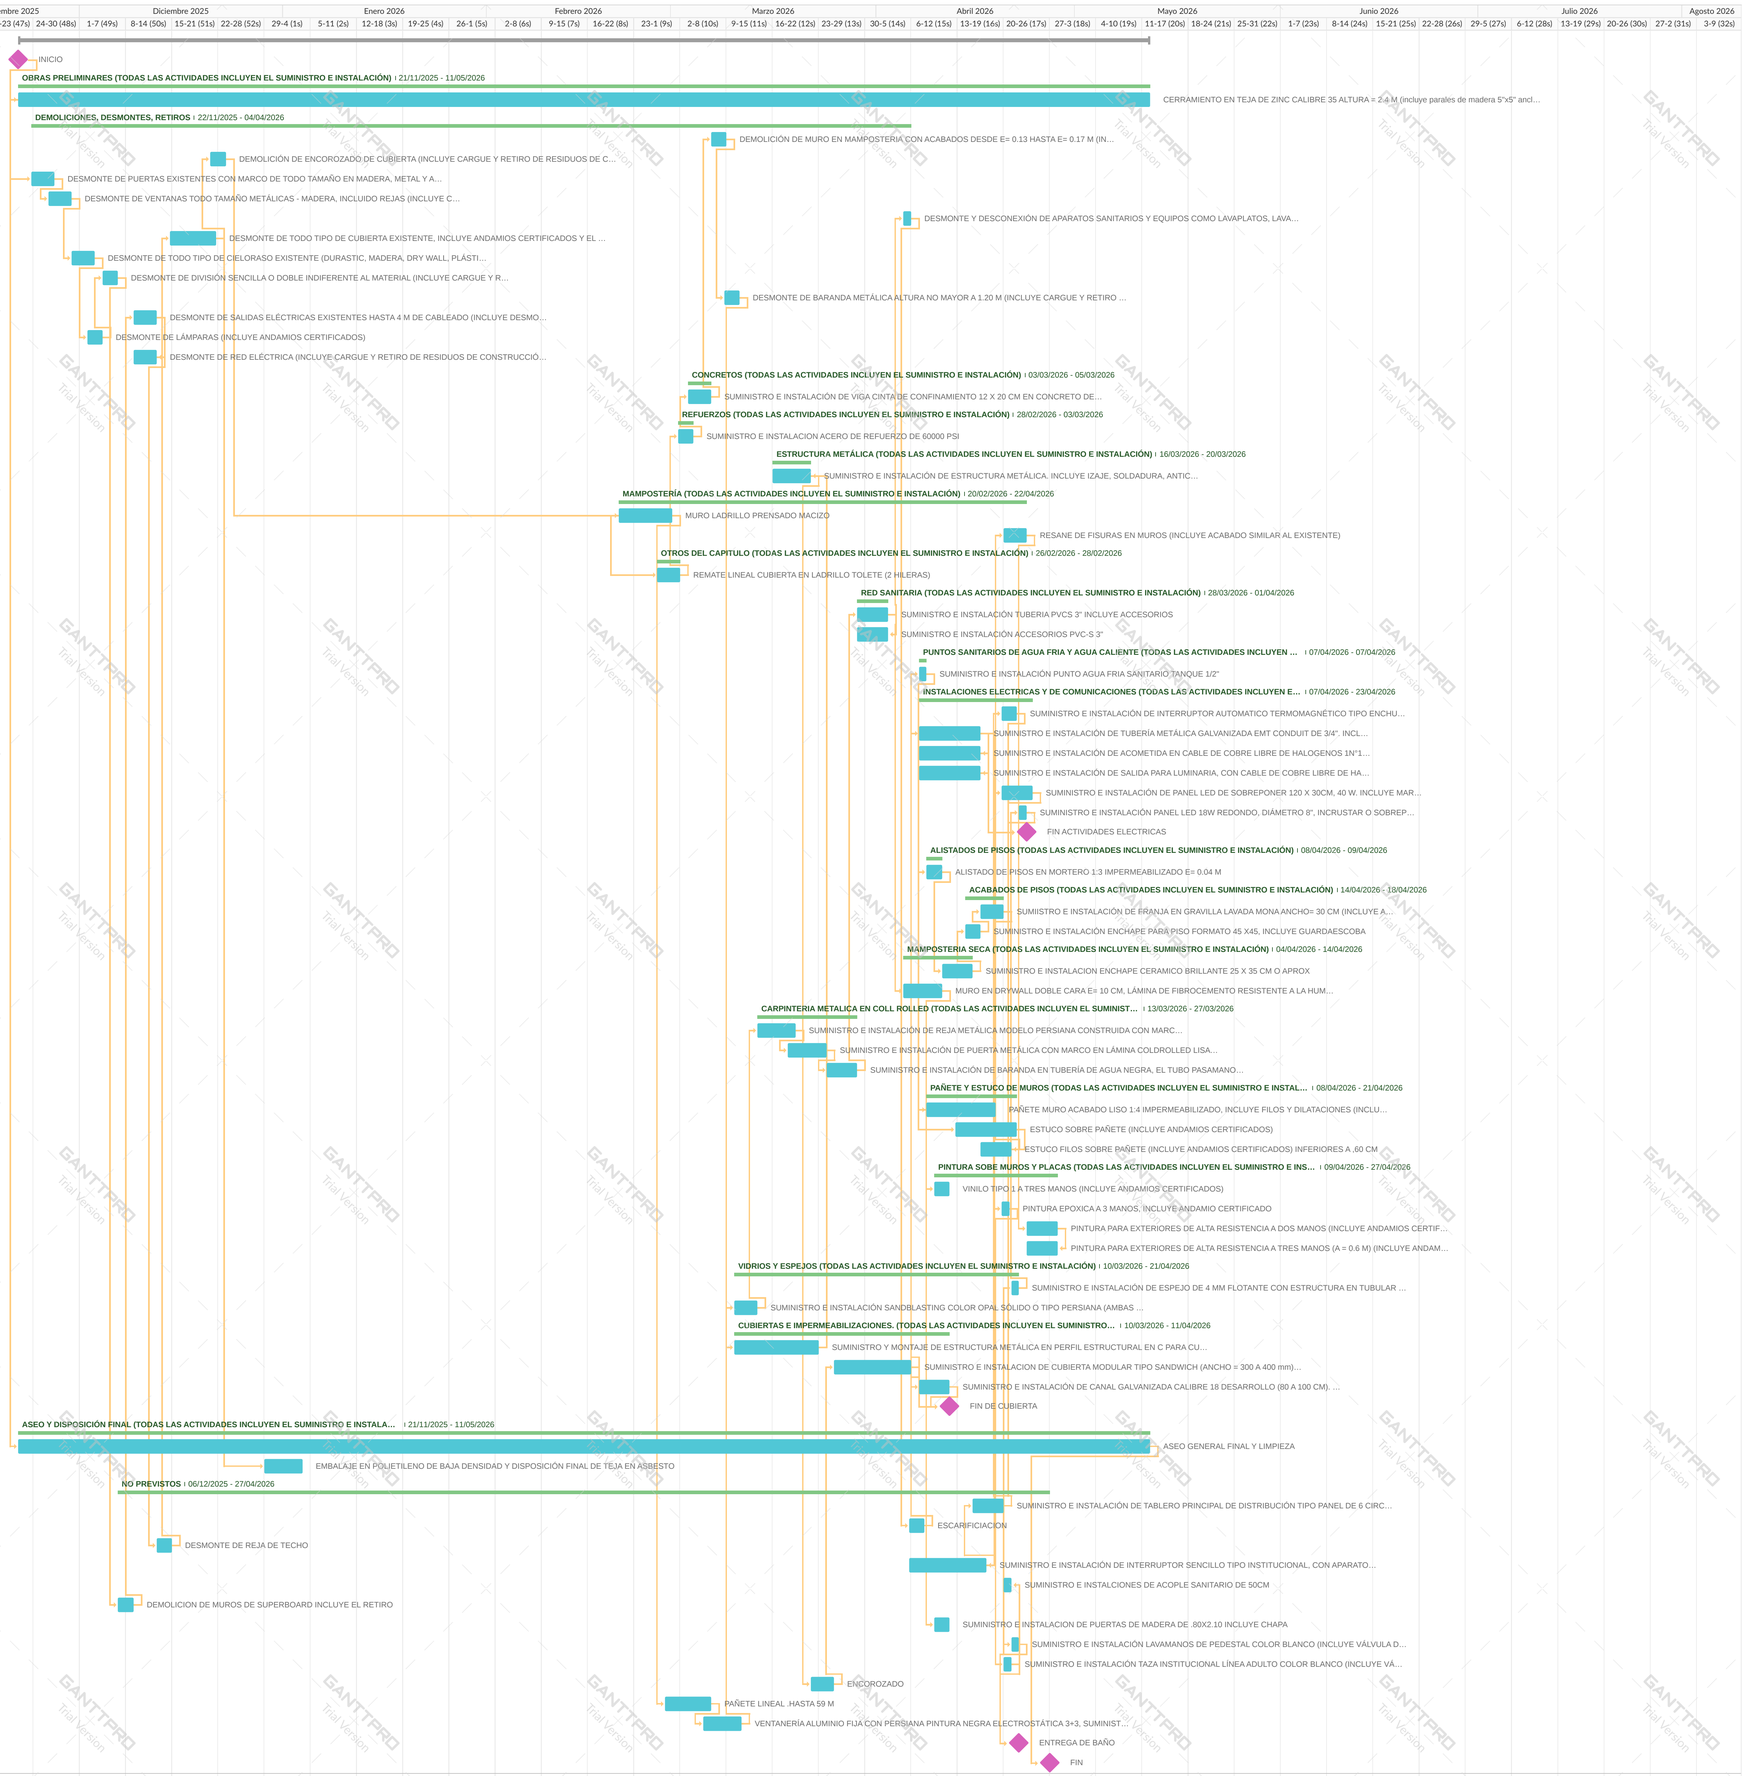

1073246437 | Programacion Colegio Cultura Popular - Sede C

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		13/11/2025	**24/01/2026**	63d
1	INICIO	13/11/2025	13/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
2.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplaz...	09/12/2025	09/12/2025	1d
2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	13/11/2025	24/01/2026	63d
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de i...	14/11/2025	14/11/2025	1d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**15/11/2025**	**11/12/2025**	**22d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	11/12/2025	11/12/2025	1d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA M...	18/11/2025	19/11/2025	2d
3.3	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FIN...	03/12/2025	03/12/2025	1d
3.4	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	02/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAM...	01/12/2025	02/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CAR...	15/11/2025	17/11/2025	1d
4	**MANTENIMIENTOS**	**16/01/2026**	**21/01/2026**	**5d**
4.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, ...	16/01/2026	21/01/2026	5d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	17/01/2026	20/01/2026	3d
5	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/12/2025**	**10/12/2025**	**1d**
5.1	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, C...	10/12/2025	10/12/2025	1d
6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**12/12/2025**	**1d**
6.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	12/12/2025	12/12/2025	1d
7	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**18/12/2025**	**4d**
7.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJE...	16/12/2025	17/12/2025	2d
7.2	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	16/12/2025	18/12/2025	3d
7.3	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ...	15/12/2025	15/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**15/12/2025**	**1d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	15/12/2025	15/12/2025	1d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**22/12/2025**	**3d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	19/12/2025	22/12/2025	3d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**29/12/2025**	**14d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**13/12/2025**	**15/12/2025**	**2d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	13/12/2025	15/12/2025	2d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**30/12/2025**	**2d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	29/12/2025	30/12/2025	2d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	30/12/2025	30/12/2025	1d
14	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17/01/2026**	**17/01/2026**	**1d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	17/01/2026	17/01/2026	1d
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
15.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	17/01/2026	20/01/2026	3d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	10/01/2026	19/01/2026	8d
15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG ...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NEC...	17/01/2026	21/01/2026	4d
15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	20/01/2026	20/01/2026	1d
16	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**09/01/2026**	**13d**
16.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	29/12/2025	30/12/2025	2d
16.2	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	26/12/2025	27/12/2025	2d
16.3	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	05/01/2026	09/01/2026	5d
17	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/12/2025**	**19/01/2026**	**34d**
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	02/01/2026	09/01/2026	7d
17.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	16/01/2026	19/01/2026	3d
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	10/01/2026	15/01/2026	5d
17.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PAR...	11/12/2025	13/12/2025	3d
18	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**05/01/2026**	**9d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	02/01/2026	05/01/2026	3d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA ...	26/12/2025	29/12/2025	3d
19	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/01/2026**	**2d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISA...	10/01/2026	12/01/2026	2d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON...	10/01/2026	12/01/2026	2d
20	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	30/12/2025	30/12/2025	1d
21	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**16/01/2026**	**1d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	16/01/2026	16/01/2026	1d
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	16/01/2026	16/01/2026	1d
22	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**08/01/2026**	**17d 7h**
22.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.4	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.5	ENTREGA DE OBRA GRIS	08/01/2026	08/01/2026	
23	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
23.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	20/01/2026	20/01/2026	1d
23.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.6	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	08/01/2026	09/01/2026	2d
23.7	ENTREGA DE OBRA BLANCA	21/01/2026	21/01/2026	
24	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/01/2026**	**16/01/2026**	**2d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASIL...	15/01/2026	16/01/2026	2d
25	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/12/2025**	**21/01/2026**	**27d**
25.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	27/12/2025	27/12/2025	1d
25.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFI...	16/01/2026	21/01/2026	5d
25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	22/12/2025	24/12/2025	3d
25.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
25.5	ENTREGA DE CUBIERTA	21/01/2026	21/01/2026	
26	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
26.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	13/11/2025	24/01/2026	63d
26.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	15/01/2026	1d
27	**NO PREVISTOS**	**14/11/2025**	**22/01/2026**	**59d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS PUERTA, BARRAJES DE NEU...	15/01/2026	16/01/2026	2d
27.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE...	10/01/2026	14/01/2026	4d
27.3	DESMONTE Y REINTALACION DE REJA DE CERRAMIENTO	10/12/2025	21/01/2026	36d 2h
27.4	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO	14/11/2025	14/11/2025	1d
27.5	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO	10/12/2025	10/12/2025	1d
27.6	CHAPA DE SEGURIDAD	13/01/2026	13/01/2026	1d
27.7	PUERTA DE REJA EN LA MALLA DE CERRAMIENTO	15/11/2025	15/11/2025	1d
27.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	13/12/2025	19/12/2025	5d
27.9	FIN	22/01/2026	22/01/2026	

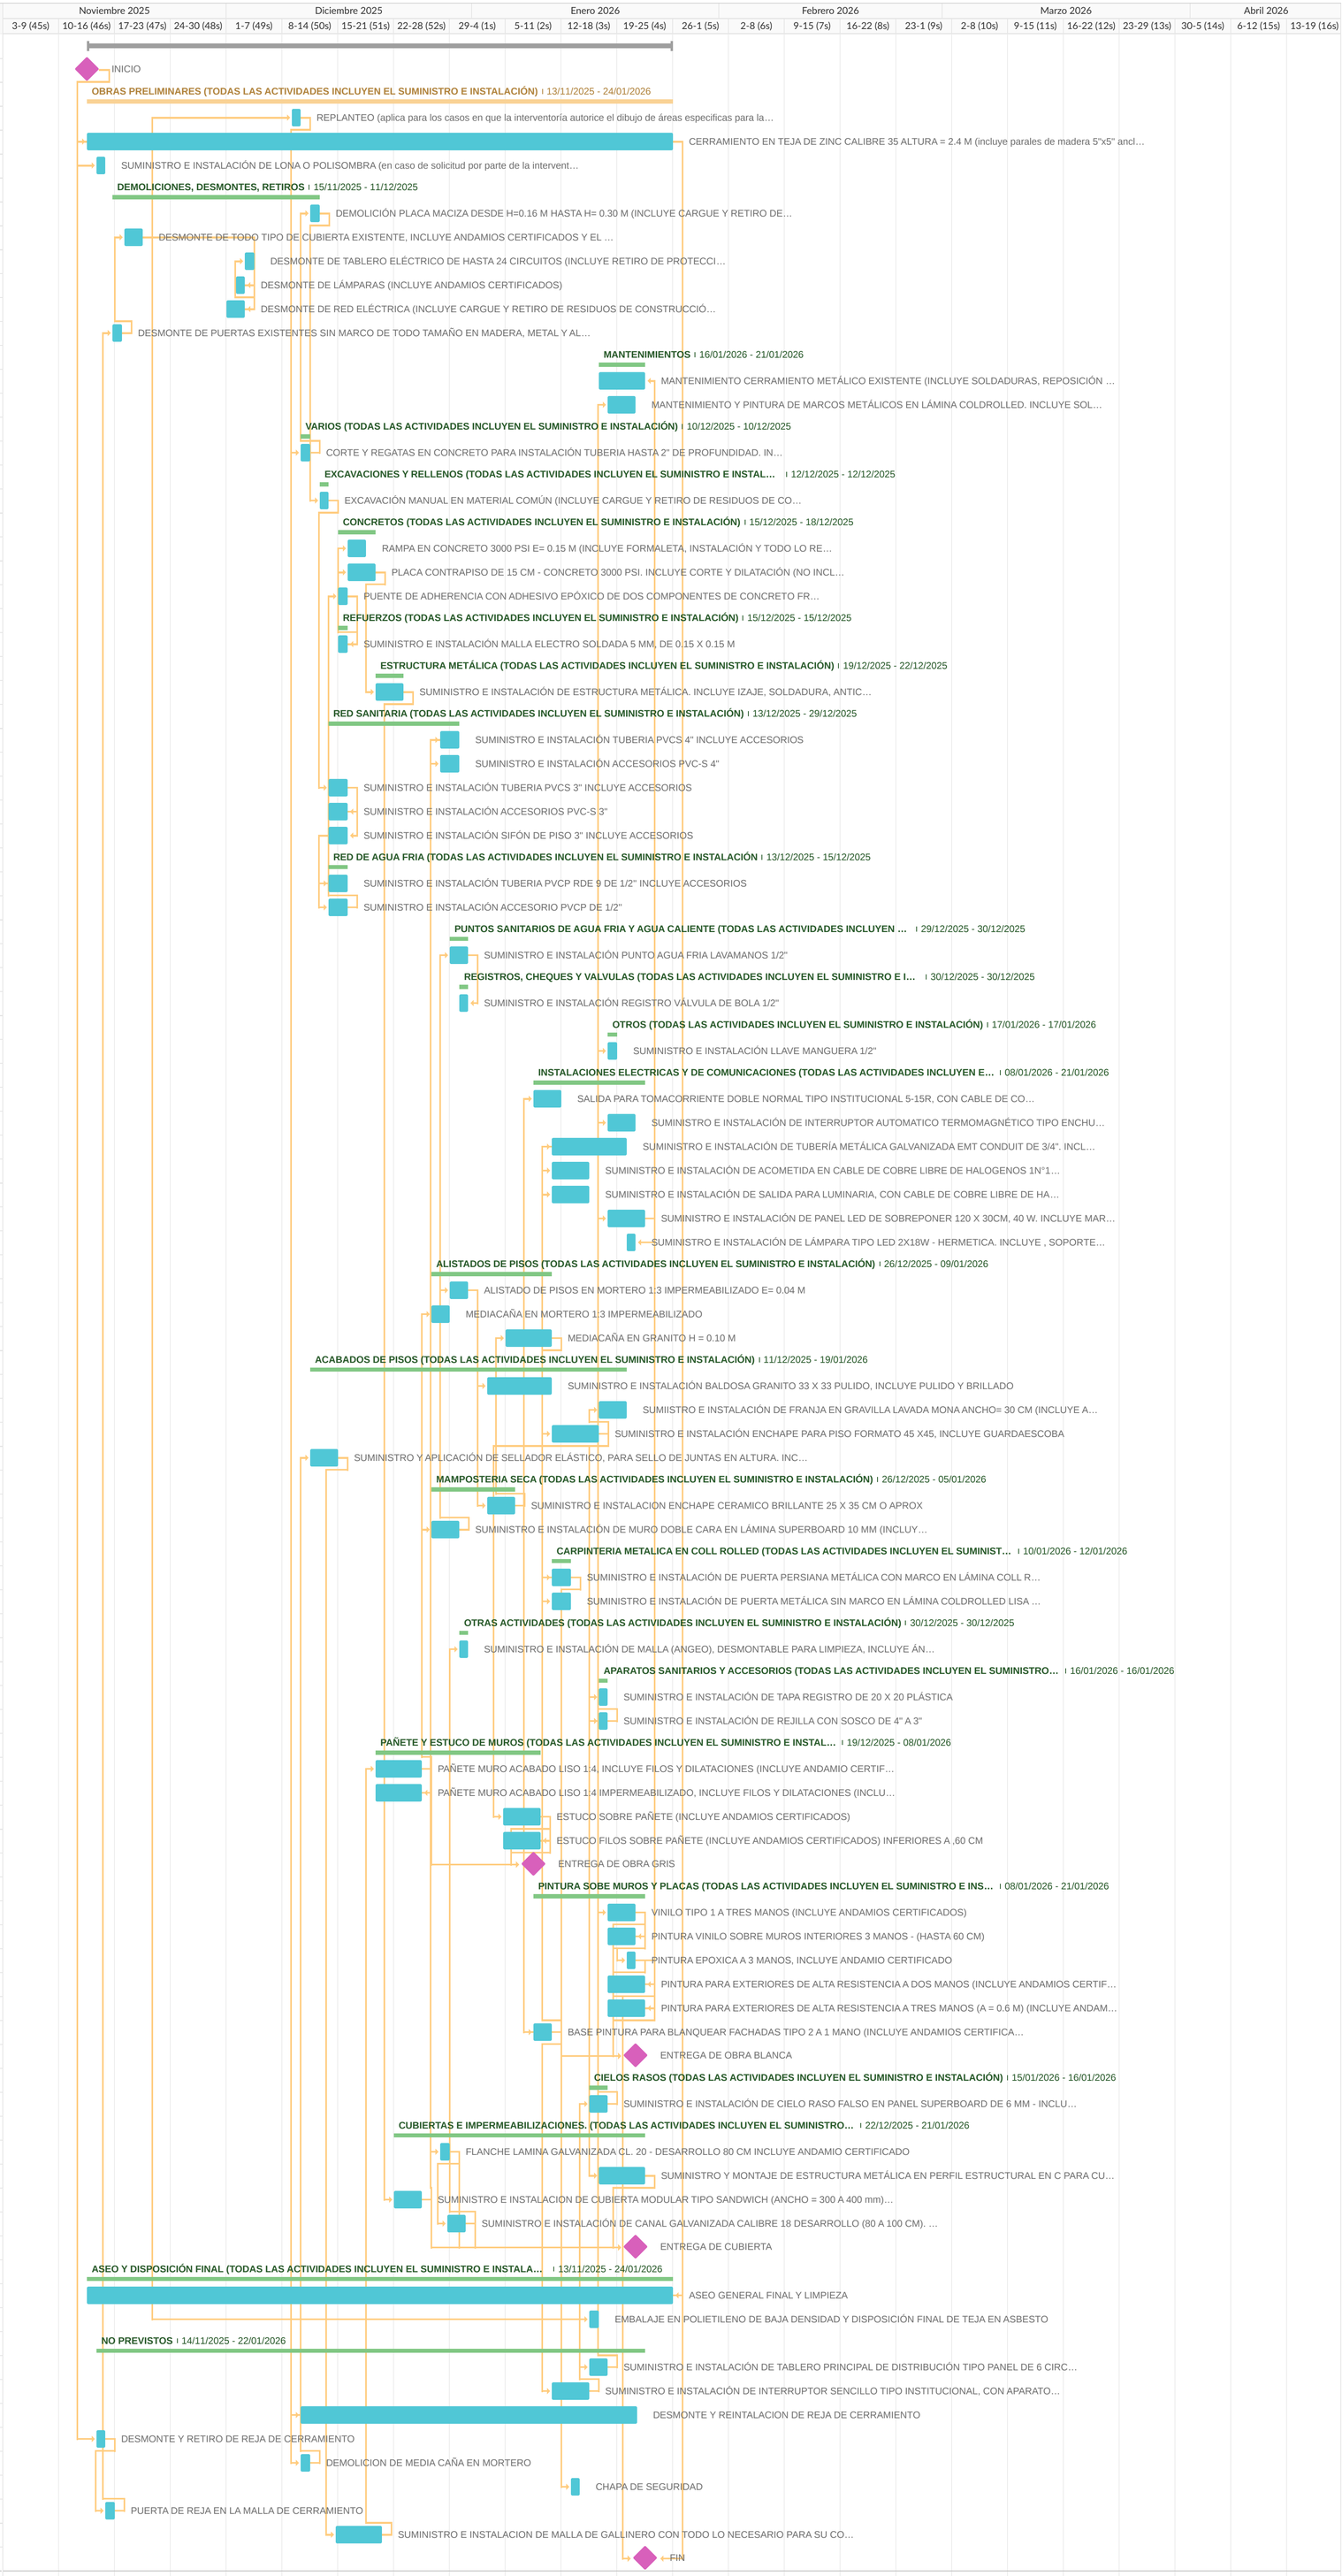

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

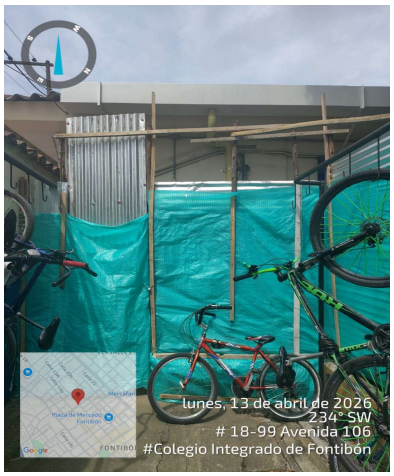

Se realiza la apertura de la puerta correspondiente al ingreso del area del almacen en la casona.

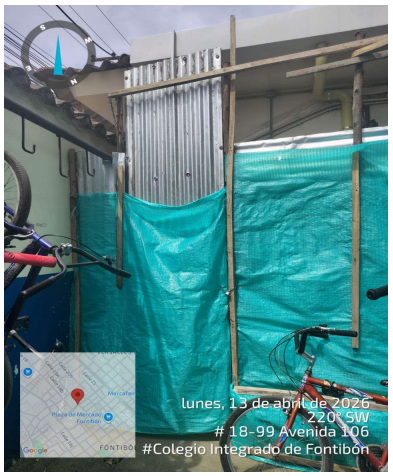

Se realiza la apertura de la puerta correspondiente al ingreso del area del almacen en la casona.

ANEXO N° 1.12:
RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

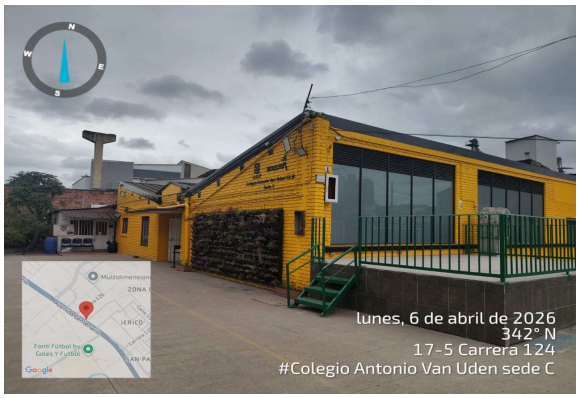

Se evidencia que se finalizan las actividades de pintura en el area superior de la fachada y en el area de la alfajia de la ventanas en cinta.



Se evidencia que se finalizo el detallado de estuco correspondiente a la fachada de la bateria de baños.



Se evidencia que se estan realizando los remates de estuco en el area superior de los muros internos de la bateria de baños.



Se realiza llamado de atencion teniendo en cuenta que se observa que la mitad de la platina correspondiente al alguno de la estructura de la cubierta no se encuentra correctamente soportado.





PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Se evidencia que se esta realizando la instalacion de orinales y sus respectivas griferias y desagues.



Se evidencia que se esta realizando el retoque de la pintura correspondiente a la canal y la estructura de esta correspondiente a la bateria de baños.



Se evidencia la llegada de material correspondiente a los espejos de la bateria de baños.



Se evidencia que se finalizo la instalacion de la luminaria que se encontraba pendiente en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se estan realizando los remates de estuco en el area superior de los muros internos de la bateria de baños.

Se evidencia que se estan realizando los remates de estuco en el area superior de los muros internos de la bateria de baños.

PROBINTEC S.A.S
CP

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la instalacion de los espejos en la bateria de baños.



Se evidencia que se esta realizando la correcion de detalles en los muros sin enchape en ciertas areas de la bateria de baños.



Se evidencia que se realiza la instalacion y el remate de las puertas en el area de la bateria de baños.



Se evidencia que no se han finalizado las actividades de aseo en ciertos elementos del bloque alianza.



Se evidencia que se realiza la aplicación de la ultima capa de pintura epoxica en la bateria de baños.



Se evidencia que se esta realizando la correccion de detalles en el area correspondiente al area de la cenefa de la fachada a la Calle 13.

PROBINTEC S.A.S
CP

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

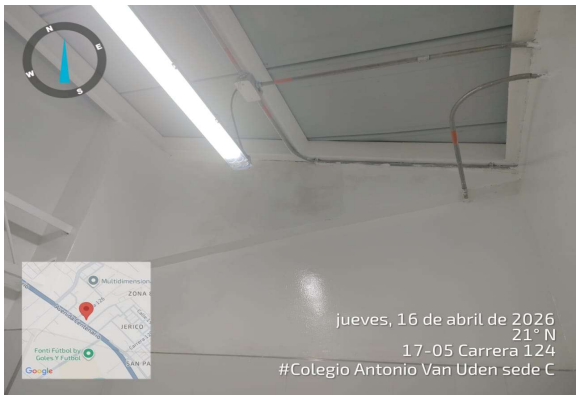

Se evidencia una humedad existente en el area correspondiente al deposito en la bateria de baños, la cual se encuentra en tratamiento.



Se evidencia que de acuerdo a las recomendaciones realizadas por parte de la Directora de interventoria se realiza el respectivo ajuste en la instalacion de los desagues de la bateria de baños.



Se evidencia la instalacion de taparegistros en las respectivas areas de la bateria de baños.



Entrega bloque alianza.



Entrega bloque alianza.



Entrega bloque alianza.

PROBINTEC S.A.S
CP

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega bloque alianza.



Entrega bloque alianza.




Entrega bloque alianza.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.

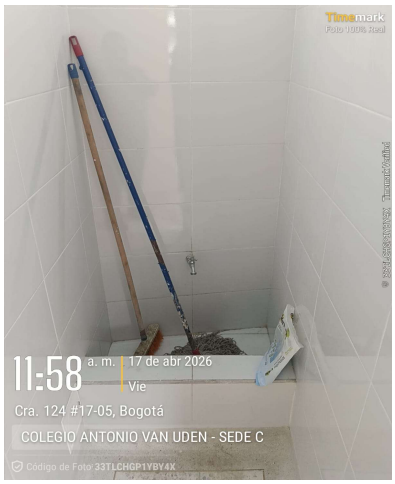

Entrega de bateria de baños.

PROBINTEC S.A.S
CP

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.

PROBINTEC S.A.S
CP

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de aulas de primaria infancia.



Entrega de aulas de primaria infancia.

PROBINTEC S.A.S
CP

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de aulas de primaria infancia.



Entrega de aulas de primaria infancia.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que se finalizo la intervencion en referencia a direccionar y embeber las bajantes de aguas lluvias en la bateria de baños.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la ventaneria de la biblioteca.

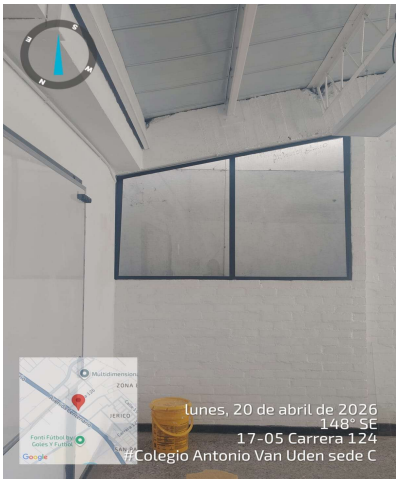

Se evidencia que se finaliza la instalacion de la ventaneria de la biblioteca.

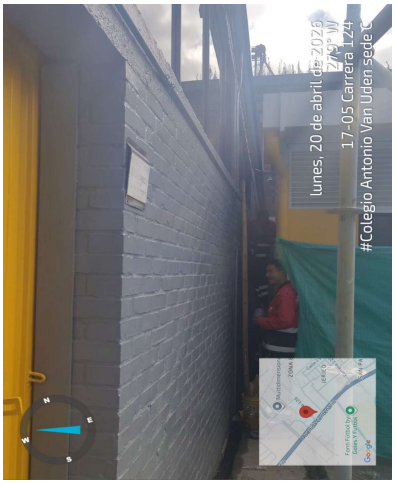

Se evidencia que se finaliza el remate de pintura de la fachada interna del bloque alianza.



Se evidencia que se finaliza la intervencion de la humedad que se presento en la bateria de baños en el area de la bodega.



Se evidencia que se realiza la reparacion del sanitario que se encuentra filtrando.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.

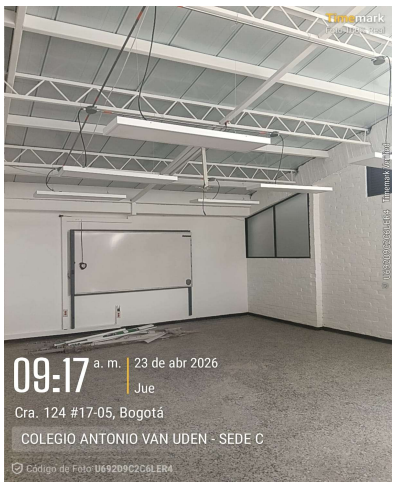

Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.




Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.

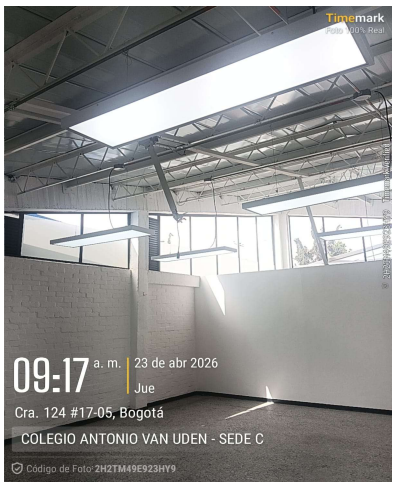

Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que esta pendiente la instalacion de la ventana con rejilla de la bateria de baños de bachillerato, area de mujeres.



Se evidencia que esta pendiente la jornada de aseo de la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se realiza el sello con silicona blanca en la perimetral de los lavamanos en policuarzo de las baterias de baños de primaria y bachillerato.



Se evidencia que no se ha realizado el remates de los vanos despues de instaladas las rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se esta realizando jornada de orden de la bateria de baños primaria.



Se evidencia que se esta realizando el remate del vano de la puerta correspondiente al cuarto de aseo ubicado en la bateria de baños de primaria.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que no se ha realizado el remates de los vanos despues de instaladas las rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que esta pendiente el aseo de las rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria, area de niñas.

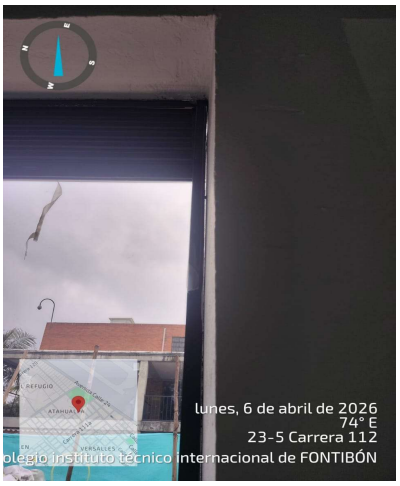


Se evidencia que no se ha realizado el remate interno de los vanos de la ventanas correspondiente al aula multiple.



Se evidencia que se finaliza la pintura de la fachada del aula multiple.



Se evidencia que se realiza la instalacion de las rejillas de ventilacion correspondiente a la puerta del auditorio del aula multiple.

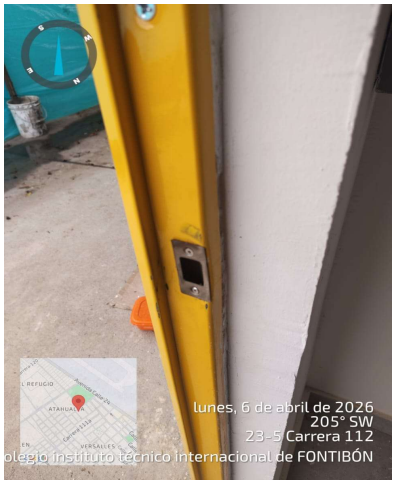

Se evidencia que las puertas del aula multiple presentan detalles de pintura en ciertas areas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

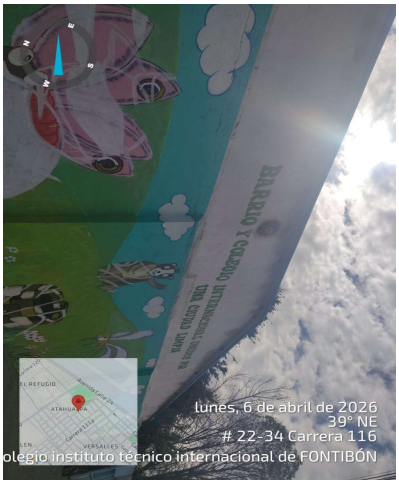

Se evidencia que la fachada posterior del aula multiple presenta detalles de pintura en el remate del encorozado de la fachada exterior.



Se evidencia que se adelantan actividades de aseo en la bateria de baños de primaria.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.

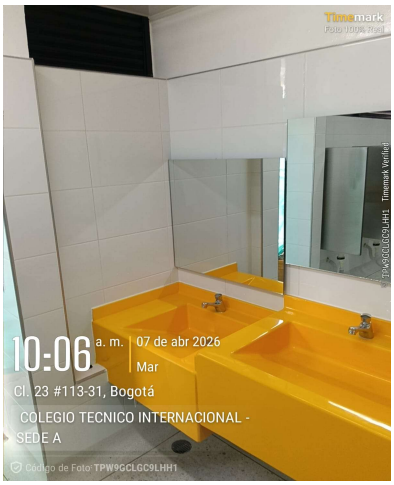

Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Registro fotografico - Bateria de baños de primaria y bachillerato - Entrega de espacio.



Se evidencia que se esta realizando la aplicación de gravilla lavada de acuerdo al diseño del piso al ingreso del auditorio en el area del aula multiple.



Se evidencia la instalacion de enchape de acuerdo al diseño del piso al ingreso del auditorio en el area del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando el remate de los vanos de la ventaneria del aula multiple.



Se evidencia que se realiza limpieza de la ventaneria y rejillas de ventilacion exterior del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza jornada de orden y aseo en el area de acopio para el proceso de disposicion final.



Se evidencia que la perimetral del ventilador presenta detalles sin atender en el area del auditorio del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la pintura de los detalles de las puertas correspondiente a los espacios del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la limpieza de la tuberia EMT del auditorio del aula multiple.



Se evidencia que se realiza en la canal de la fachada posterior la instalacion de los soportes sugeridos por parte del especialista de la interventoria en el aula multiple.



Se evidencia que se realiza la pintura de los soportes de la canal de la fachada posterior del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizan actividades de aseo a la tuberia EMT en el aula multiple.



Se realizan actividades de retoque de estuco en los muros correspondientes al aula mutliple.



Se evidencia que ciertas hojas de las puertas presentan detalles de pintura en el aula mutliple.



Se realizan actividades de retoque de pintura en los muros correspondientes al aula mutliple.



Se realizan retoques de pintura en la reja correspondiente al area TEC.



Se estan realizando actividades de limpieza en las aulas correspondientes al aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.
