



Retiro de la teja

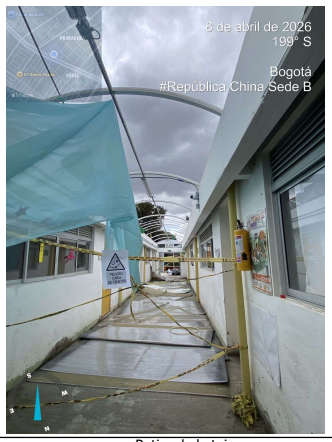

Exacavación para zapata

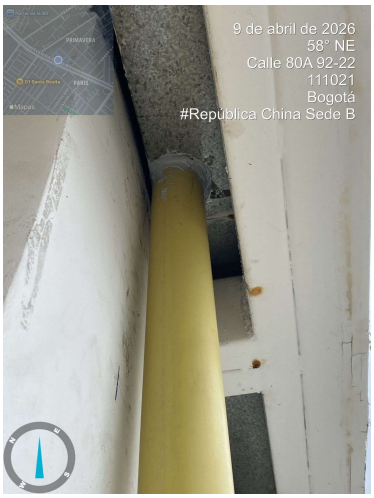

Empalme de tubería



Ejecución del shut de basuras

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Drenaje con manguera y camara CCTV en carcamos _zona canchas



Retiro de rejillas para el drenaje



Retiro de unidad sanitraria para ingreso de la maraca CCTV



Ingreso de la camara CCTV



Equipamiento para el uso de las camaras CCTV



Visualizacion de tuberia por medio del recorrido con la camara CCTV

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A

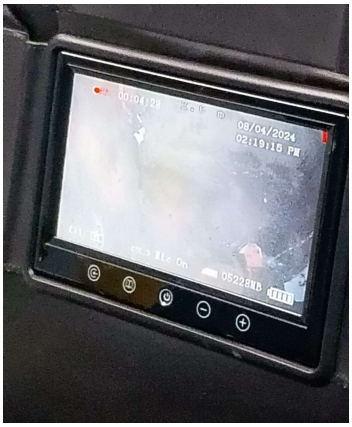

Visualizacion de tuberia por medio del recorrido con la camara CCTV



Exvacacion en piso para Tener un correcto recorriedo con la camara CCTV



Resane de piso donde se excavo para introducir la camara

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop #¡REF! dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Alineación de platinas



Retiro de RCD



Concreto fundida de dados



Excavación de zapatas ,se evidencia el Rajon para su fundida.



Dados fundidos



Dados



Fundida de placa de espesor (10 cm)



Cilindros , tipo muestra



Curado de placa



Fundida de dados

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



INSTALACION DE 4 LAMPARAS HERMETICAS DISTRIBUIDAS EN LA LUZ DE LA COLUMNA.

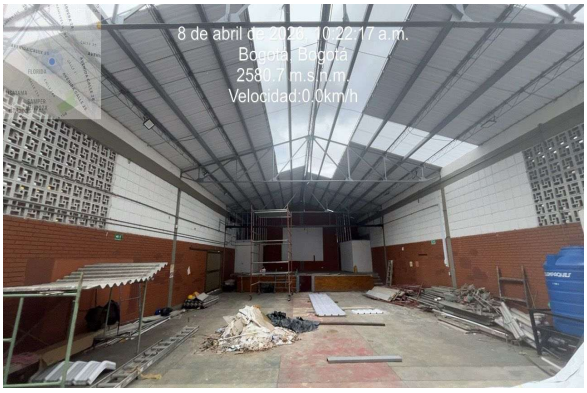

INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF



INSTALACION DE CUBIERTA TRASLUCIDA

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Excavación Manual



fundicón de la placa



limpieza bajo cubierta



ajuste del anden



fundida de carcamo



fundida del anden

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



desmonte de anden



llegada de material

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR DEL CONTRATO		$	**2.220.672.788,00**	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	35,95%	$	798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$	1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**
OFERTADO		$	**2.109.535.964,00**		
EMERGENCIAS		$	100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	**2.209.535.964,00**		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	11.136.824,00		
Valor Parcial (Inicial + Emeroencias)		$	**111.136.824,00**		
Valor adicional No. 1:		$	**791.000.000,00**		
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	**591.000.000,00**		
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		$	**3.011.672.788,00**		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	411.136.824,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	**2.600.535.964,00**		


Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO**	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	212	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026		

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,69%	80,08%	Obra Física Ejecutada (%)	5,29%	75,09%
Valor de la Obra	$ 147.840.470,00	$ 1.769.313.542,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 137.633.366,00	$ 1.659.223.413,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	74,39%	69,80%	-4,98%
Durante el periodo	5,69%	5,29%	
Acumulado actual	80,08%	75,09%	

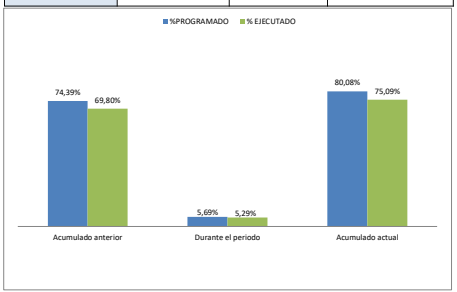

OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,17%	0,00%	-0,17%	85,10%	83,83%	-1,27%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	7,90%	11,00%	3,10%	86,90%	91,00%	4,10%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	10,24%	12,02%	1,78%	80,70%	74,60%	-6,10%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	2,08%	0,00%	-2,08%	50,13%	48,00%	-2,13%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	17,91%	13,19%	-4,72%	77,40%	46,09%	-31,31%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	1,13%	0,83%	-0,30%	88,13%	89,73%	1,60%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	5,85%	4,80%	-1,05%	79,95%	75,00%	-4,95%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,20%	0,50%	0,30%	92,30%	92,50%	0,20%
TOTAL PROMEDIO			5,69%	5,29%	-0,39%	80,08%	75,09%	-4,98%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	33.290.790,24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	7.593.424,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	10,00%	10,00%	0,00%	-		
						$ 41.875.892,24	$ 411.136.824,00	$ 369.260.931,76

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		$	3.011.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		$	250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		$	117.739.152,00
VALOR PARCIAL 3		$	189.500.435,00
VALOR PARCIAL 4		$	575.032.890,00
TOTAL VALOR FACTURADO		$	1.132.914.615,00
SUMAS IGUALES		$	1.878.758.173,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.132.914.615,00	$ 1.132.914.615,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	80,08%	**75,09%**	**-4,98%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	198	**93,40%**

CURVA S

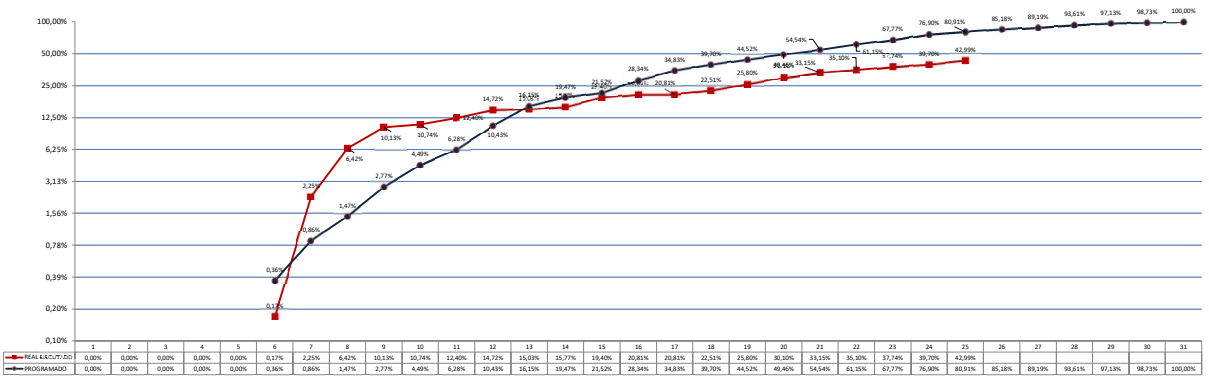

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,42%	10,13%	10,74%	12,40%	14,72%	15,03%	15,77%	19,40%	20,81%	20,81%	22,51%	25,80%	30,10%	33,15%	35,10%	37,74%	39,70%	42,99%						
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,28%	10,43%	16,15%	19,47%	21,52%	28,34%	34,83%	39,70%	44,52%	49,46%	54,54%	61,35%	67,77%	76,90%	80,91%	85,18%	89,19%	93,61%	97,13%	98,73%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se evidenciaron actividades en obra esta semana

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 15, en este se manifesto que ya los NPs esta en revisión final de interventoria y supervisión

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, se evidencia residuos y material acopiados en el frente, pero cerca a zonas verdes, por lo que se recomienda realizar la disposición, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso se realiza istalación cielo raso falso en lamina de superboard

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado, se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con la instalación de cielo raso falso. Estas labores implican riesgos asociados a trabajos en altura y manipulación de materiales, por lo cual se recomienda garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo el uso adecuado de EPP, el empleo de equipos de acceso en condiciones seguras y la correcta organización del área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se realizo la instalación de suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante este periodo, según la programación vigente, se tenia previsto:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 15, en el cual la supervisión solicito incluir la actividad de mantenimiento de placa para subsanar humedades

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con material acopiado en el frente y residuos al igual se recomienda realizar una jornada de orden y aseo en la institución e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades: Armado de acero para estructura de tanque, Instalacion de tejas en shut de basuras, realizacion de caja de inspeccion, instalacion de piso en hall, inicio de instalacion de enchape muros en shut.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de enchape del pasillo, pañete de la caja de inspección y armado de acero. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP. De igual manera, se evidenció la zona de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo, contribuyendo a la prevención de incidentes y al desarrollo seguro de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa en semana anterior

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
16.1.21. SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)
2.4.1. SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
9.1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO (actividad iniciada, falta pulida y brillado)
4.7.3. CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICAD (falta unicamente tapas)
7.2.37. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 (actividad iniciada)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo del presente informe se realizó comité de obra, en el cual se indico que las bajantes del hall deben ser tapadas con cajas de superboard y debe ser pintado de color blanco.

6. Aspectos ambientales:Se realiza recorrido en el frente, se evidencia material acopiado y residuos en la parte interna como externa, al igual se recomienda disponerlo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo inspección de tuberia sanitaria CCTV

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 3 trabajadores ejecutando actividades relacionadas con el sistema de CCTV. Se verificó que el personal cuenta con la dotación requerida y hace uso adecuado de los EPP, acorde con las labores desarrolladas. Se recomienda mantener el cumplimiento de las medidas de seguridad, así como el orden y aseo en el área de trabajo, con el fin de prevenir riesgos asociados.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: inspección de tuberia sanitaria CCTV

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación , se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS DEL COLEGIO JOSE ASUNCIÓN SILVA CON CABEZAL CCTV, CABLE RETRÁCTIL, MONITOR HD, CAPACIDAD DE ALUMBRADO LED + SONDA LOCALIZADORA. DIGITALIZACIÓN (LEVANTAMIENTO) DE REDES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS + PLANIMETRÍA (ARQUITECTURA EXISTENTE DE LAS ÁREAS DONDE SE UBIQUEN TUBERIAS EXISTENTES) DEL COLEGIO, LA DIGITALIZACIÓN SE ENTREGARÁ EN FORMATO PDF Y DWG (AUTOCAD); INCLUYE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR, LIMPIEZA BASICA DE TUBERIAS EXISTENTES Y CAJAS (MATERIAL GRUESO), LA FOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, MEDICION DE DISTSNCIAS APROXIMADAS Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES (NO INCLUYE LIMPIEZA CON BACTOR O SIMILAR). (Hacen falta los entregables)
RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal se señalo la necesidad de entrega de los documentos incluidos en el CCTV asi como la inclusion de actividades a realizar en el colegio (cambio de enchape de baños, cambio de divisiones, sondeos, etc)

6. Aspectos ambientales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
-Excavacion para los pedestales y fundida de pedestales y parte de placa contrapiso. Adicionalmente se inicia con el armado de primer aula modular.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la continuidad en las actividades de ensamble de la estructura metálica para las aulas. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP, dotación correspondiente y condiciones seguras en la utilización de andamios para el desarrollo de la actividad. De igual manera, se recomendó al contratista fortalecer y mejorar el cerramiento perimetral, con el fin de garantizar mayor control del área intervenida y prevenir el ingreso no autorizado o la materialización de riesgos.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del ítem

15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
2.2.15. PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: En el comité realizado en la SED, el ingeniero apoyo a la supervision realiza solicitud respecto al avance de los salones, indicando que se debe dar dinamismo para cumplir con los tiempos contractuales.

6. Aspectos ambientales: El frente de obra no cuenta con el cerramiento en buen estado, se contina con la instalación de la estructura metálica, se evidencia acopio de la teja de zinc perteneciente del cerramiento, se evidencia acopio de material mixto y un acopio de residuos adecuadamente, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período se inicio la instalación de cubierta ecoroof upvc

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, no se evidenció la ejecución de actividades en el área del colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
No obstante, se recomienda al contratista programar y ejecutar jornadas de orden y aseo en el frente de obra, dado que se ha identificado la persistencia de condiciones de desorganización desde periodos anteriores. Esta situación puede generar riesgos locativos, por lo que se hace necesario implementar acciones correctivas que garanticen condiciones seguras en el área.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado la actividad de instalación de cuberta ecoroof UPVC

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Instalación de cubierta ecorrof UPVC

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra, en el que se manifesto que para el punto de la malla concertina no se ncesita flanche ya que no hay filtraciones.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, todavía se verifica que los residuos dSe realizo visita al frente, todavía se verifica que los residuos de construcción y demolición están acopiados, las tejas de fibrocemento se encuentran sin embalar y sin cubrir, se recomendó al contratista cubrir las tejas, disponer los residuos con los gestores adecuados, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuada teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo la actrividad de corte con pulidora, excavacion, findición del anden, fundicion del carcamo y aseo y limpieza

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenciaron actividades de limpieza de estructuras de cubierta. Se verificó que el personal hace uso adecuado de la escalera, así como de la dotación y los EPP, conforme a las labores desarrolladas.
No obstante, se recomienda continuar garantizando condiciones seguras para trabajos en altura, incluyendo la verificación del estado de la escalera, su correcta ubicación y estabilidad, así como la implementación de medidas de prevención adicionales según aplique.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron la actividades de fundición del anden, el carcamo y aseo y limpieza

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI
MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (rampas de acceso a salones)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades de corte con pulidora, excavacion, findición del anden, fundicion del carcamo y aseo y limpieza

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra y en el se definio la ejecución de la pergola bajo el rubro de emergencias

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con el cerramiento adecuado, Se realizo visita al frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se evidencia material de construccion y residuos sin acopiar ni señalizar,por lo que se hace un llamado de atencion para realizar la disposicion total, garantizar jornadas de orden y aseo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: No se ejecutaron actividades en esta sede

5. Generales: Durante el comité de obra se la semana se solicito la instalación de un vidrio afectado en el desarrollo de las actividades

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. No se impactó en los sumideros o cunetas. Cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. LUISA FERNANDA YUSTRES PEREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	20/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	141 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	GRUPO 17
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 99400011040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2029	9 4 2029	9 4 2026	27662	4 9 2025	9 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (19/04/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	83,83%	83,83%		85,10%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																		
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	80,00%	91,00%		86,90%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																		
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	70,00%	74,60%		80,70%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																		
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	48,00%	48,00%		50,13%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																		
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	40,50%	46,09%		77,40%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																		
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	88,90%	89,73%		88,13%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																		
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	72,20%	75,00%		79,95%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																		
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	92,00%	92,00%		92,50%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																		
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						75,03%		80,10%		$ 2.010.399.000	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																										
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																										
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																										
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!		###	#¡DIV/0!	#####	$ -	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	0	8	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	8	0	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 250.642.138,00	12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 250.642.138,00		11		22		33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	75,03%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	80,10%		
ATRASO	-5,07%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



estructura metalica para cieloraso



Instalacion de Laminas de superboard en salones B-103, B-104 y C-101



Se identifica patologia de humedad en salon B-104



Vinilo tipo 1 para tratamiento de juntas



Tratamiento de juntas con cienta de fibra de papel



Segunda capa de masillado en juntas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B

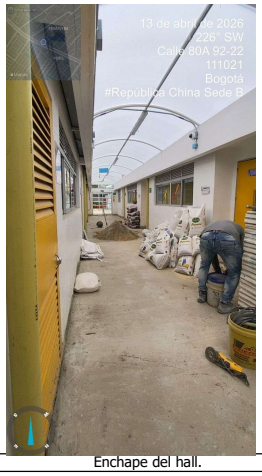

Enchape del hall.



Vista general del hall.




Trasiego de material.



Armado del acero.



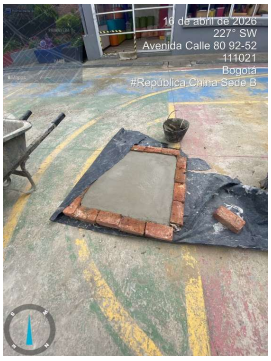

Pañete de la caja de inspección y fundición de la tapa.



Instalación de la teja en el shut de basuras.



Inicio de enchape área del shut de basuras

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



No se registran actividades



No se registran actividades



No se registran actividades



No se registran actividades

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Estructura metálica



Fundida de placa



Área de cerramiento



Estructura metálica



Instalación de estructura metálica



Platina y dado



Estructura metálica



Acopió de estructura metálica



Lamina Steel deck



Estructura metálica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR DEL CONTRATO		$	2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	35,95%	$	798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$	1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**
OFERTADO		$	2.109.535.864,00		
EMERGENCIAS		$	100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	2.209.535.864,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	11.136.824,00		
Valor Parcial (inicial + Emergencias)		$	111.136.824,00		
Valor adicional No. 1:		$	791.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	591.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		$	3.011.672.788,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	411.136.824,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	2.600.535.864,00		

Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO** 212
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	5,49%	85,57%	Obra Física Ejecutada (%)	4,87% 80,39%
Valor de la Obra	$ 142.801.931,00	$ 1.890.644.686,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 126.696.551,00 $ 1.776.193.677,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	80,08%	75,52%	-5,18%
Durante el periodo	5,49%	4,87%	
Acumulado actual	85,57%	80,39%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	1,00%	0,00%	-1,00%	86,10%	83,83%	-2,27%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	3,69%	2,19%	-1,50%	90,59%	93,19%	2,60%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	4,80%	7,81%	2,42%	85,50%	85,81%	-4,78%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	3,77%	4,85%	1,08%	53,90%	52,85%	-1,05%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	4,60%	14,44%	3,47%	82,00%	60,54%	-34,78%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	5,87%	3,24%	-2,63%	94,00%	92,97%	-1,03%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	17,70%	3,41%	-14,29%	97,65%	78,41%	-19,24%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	2,50%	3,00%	0,50%	94,80%	95,50%	0,70%
TOTAL PROMEDIO			5,49%	4,87%	-1,49%	85,57%	80,39%	-5,18%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	33.290.790,24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	7.593.424,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	50,00%	50,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA	0,00%	0,00%	0,00%			
	LOS MARTIRES	BODEGA ROSA ZARATE	0,00%	0,00%	0,00%			
						$ 41.875.892,24	$ 411.136.824,00	$ 369.260.931,76

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		$	3.011.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		$	250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		$	117.739.152,00
VALOR PARCIAL 3		$	189.500.435,00
VALOR PARCIAL 4		$	575.032.890,00
TOTAL VALOR FACTURADO		$	1.132.914.615,00
SUMAS IGUALES		$	1.878.758.173,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.132.914.615,00	$ 1.132.914.615,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	85,57%	80,39%	-5,18%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	205	96,70%

CURVA S

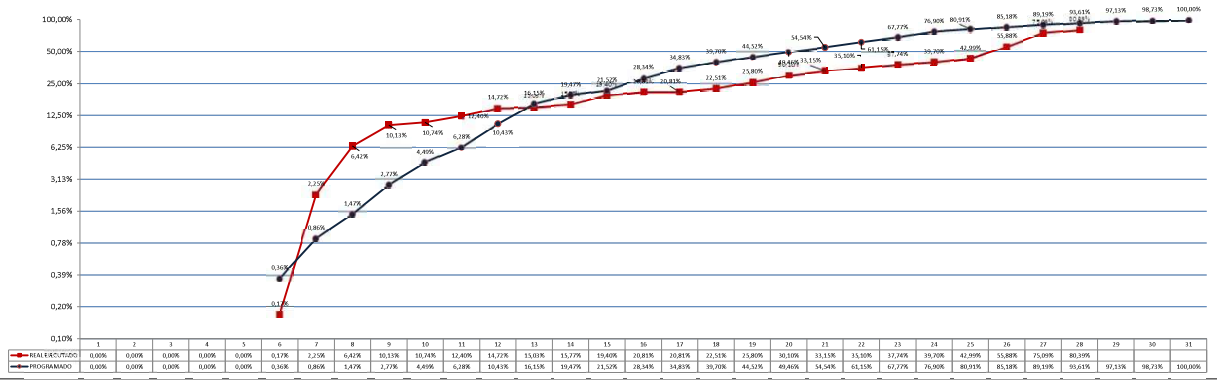

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se evidenciaron actividades en obra esta semana

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenia previsto ejecutar los siguientes items:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM COLOR OPAL CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE FIJACIONES, SELLOS DE HERMETICIDAD, CONECTOR OMEGAL BASE DE ALUMINIO, CONECTOR TAPA CRISTAL, U DE REMATE DE ALVEOLO, CINTA ANTIDUST MICROPERFORADA

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 16, en este se manifesto el inicio de labores el dia 27 de abril

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, se evidencia residuos y material acopiados en el frente, pero cerca a zonas verdes, por lo que se recomienda realizar la disposición, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso se realiza istalación cielo raso falso en lamina de superboard

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenciaron actividades de instalación de cortineros en bordes de ventanas del salón C-101, así como instalación de estructura para cielo raso. De igual manera, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal y la dotación correspondiente para el desarrollo seguro de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se realizo la instalación de suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante este periodo, según la programación vigente, se tenia previsto:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 16, en el cual la supervisión solicito pintura sobre columnas de color fuxia cambio a amarillo pastel

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con material acopiado en el frente al igual se recomienda realizar una jornada de orden y aseo en la institución e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades: Armado de acero para estructura de tanque, fundida de columnas para el tanque, Instalacion de tejas en shut de basuras, pulida de piso en hall, instalacion de enchape muros en shut y piso

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de enchape del pasillo, pañete de la caja de inspección y armado de acero. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP. De igual manera, se evidenció la zona de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo, contribuyendo a la prevención de incidentes y al desarrollo seguro de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilndros de fundida de placa en semana anterior

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenia previsto ejecutar los siguientes items:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE), esta actividad se realizara al final de la obra, ya que el alcance cambio. (congelada), esta actividad se reprograma teniendo en cuenta que se modifico el alcance de la intervencion.
16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)
2.4.1. SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
9.1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
2.2.3. VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)
4.7.3. CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICAD (falta unicamente tapas)
7.2.37. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 (actividad iniciada)
8.1.8. SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. (Actividad iniciada, falta acabado)
13.1.1. CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
18.1.4. PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).
4.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"
4.9.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS
5.1.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo del presente informe se realizó comité de obra, en el cual se indico por parte del ingeniero apoyo a la supervision que las bajantes del hall deben ser tapadas con cajas de superboard y debe ser pintado de color blanco. Respecto a los colores de shut os definio como amarillo, blanco y gris. El contratista se comprometio a realizar la impermeabilizacion con poliurea el dia Viernes, el acabado del piso de la cancha la proxima semana junto con la totalidad de la pintura. Respecto al tanque se indico que este debe quedar ubicado para cuando acaba el contrato, sin embargo aun no en funcionamiento hasta que el concreto alcance resistencia.

6. Aspectos ambientales: Se realiza recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento perimetral, se reporta la limpieza de las vias de acceso, se evidencia material acopiado y residuos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda disponerlo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo inspección de tuberia sanitaria CCTV, desmonte de sanitarios y desmonte de enchape de piso

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de desmonte de sanitarios y demolición parcial del enchape de piso. Así mismo, se verificó que el área intervenida se encuentra debidamente delimitada mediante polisombra y cinta de señalización, controlando el acceso y reduciendo riesgos para la comunidad educativa.
De igual manera, se validó el personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal y la dotación requerida para la ejecución segura de sus actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: inspección de tuberia sanitaria CCTV, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de enchape

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación , se tenia previsto ejecutar los siguientes items:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS DEL COLEGIO JOSE ASUNCIÓN SILVA CON CABEZAL CCTV, CABLE RETRÁCTIL, MONITOR HD, CAPACIDAD DE ALUMBRADO LED + SONDA LOCALIZADORA. DIGITALIZACIÓN (LEVANTAMIENTO) DE REDES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS + PLANIMETRÍA (ARQUITECTURA EXISTENTE DE LAS ÁREAS DONDE SE UBIQUEN TUBERÍAS EXISTENTES) DEL COLEGIO, LA DIGITALIZACIÓN SE ENTREGARÁ EN FORMATO PDF Y DWG (AUTOCAD); INCLUYE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR, LIMPIEZA BASICA DE TUBERIAS EXISTENTES Y CAJAS (MATERIAL GRUESO), LA FOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRITICOS, MEDICION DE DISTSNCIAS APROXIMADAS Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES (NO INCLUYE LIMPIEZA CON BACTOR O SIMILAR). (Hacen falta los entregables)
RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal se señalo la necesidad de entrega de los documentos incluidos en el CCTV asi como la inclusion de actividades a realizar en el colegio (cambio de enchape de baños, cambio de divisiones, sondeos, etc)

6. Aspectos ambientales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
Fundida de placa, armado de aula modular y pintura.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de fundida de placa, así como continuidad en las labores de limpieza y pintura de la estructura metálica. De igual manera, se verificó el personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal y la dotación requerida para la ejecución segura de las actividades.
Se recomienda al contratista mantener el cerramiento perimetral debidamente ajustado y en condiciones estables, realizando el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo cuando sea necesario, con el fin de evitar caidas o afectaciones en el área intervenida.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del item

15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
2.2.15. PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" (faltan dilataciones)
9.1.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.
9.2.8. VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
5.1.1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
5.1.5: SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
7.1.1. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04
7.2.25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA
7.2.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: En el comité realizado en la SED, el ingeniero apoyo a la supervision realiza solicitud respecto al avance de los salones, indicando que se debe dar dinamismo para cumplir con los tiempos contractuales.El contratista se compromete a instalar cubierta el miercoles, la proxima semana tener instalado todo lo modular. Respecto al espacio entre placa de contrapiso y placa del aula modular se define que va a ir cubierto con malla microperforada, la cual permitira ventilacion, de igual modo se hicieron unos ajustes de las aulas modulares, por lo que se solicito plano al contratista para que OTIC poueda definir los puntos de datos. Tambien se definio que las ventanas iran al frente sde las aulas, y en la parte posterior rejillas ventana en la parte alta.

6. Aspectos ambientales: El frente de obra cuenta con el cerramiento en buen estado, se continua con la instalación de la estructura metálica, se evidencia material de construcción y un acopio de residuos en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo se inicio la instalación de pintura esmalte tipo 1, reparación del murete y piso de la tarima del auditorio e instalación de flanches

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se continúa con la construcción de la viga y la ejecución de detalles finales asociados a la actividad. Se recomienda al contratista realizar jornadas periódicas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas en el área de trabajo.
Asi mismo, se recomienda reforzar mediante charlas de seguridad al personal sobre el uso adecuado y permanente del casco durante la ejecución de las labores, promoviendo la prevención de incidentes en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado la actividad de instalación de cuberta ecoroof UPVC

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Instalación de pintura esmalte tipo 1 e instalación de flanches

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra, en el que se manifesto que se debera cortar la reja de seguridad y soldar a la estructura metalica para dejar igual que antes (en el punto de la tarima - auditorio)

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se evidencia material de construcción, se reporta el retiro de residuos del frente y solo se encuentran los andamios acopiados, por lo que se recomendó al contratista garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo la actividad de instalación de estructura metalica, fundida de placa, limpieza bajo cubierta y limpieza de la cancha, **suministro e instalación de enchape**

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció continuidad en la construcción de la viga, así como en la ejecución de detalles finales asociados a la actividad. Se recomienda al contratista mantener jornadas periódicas de orden y aseo, con el fin de conservar condiciones seguras, limpias y organizadas en el área de trabajo.
De igual manera, se recomienda reforzar mediante charlas de seguridad al personal sobre el uso adecuado y permanente del casco durante la ejecución de las labores, promoviendo la prevención de incidentes y el cumplimiento de las medidas de seguridad en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron la actividades de instalación de estructura metalica, instalació de cubierta tipo sandwish, suministro e instalación de enchape

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (rampas de acceso a salones)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA (en proceso)
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades de corte con pulidora, excavacion, findición del anden, fundicion del carcamo y aseo y limpieza

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra y en el se definio el inicio de la pintura de la cancha durante esta semana y finalización de la pintura de fachada del 02 de mayo

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se reporta el retiro de residuos, pero todavía se evidencia material de construccion,por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de lavado y pintura de fachadas. Asi mismo, se verificó el uso correcto del andamio para la ejecución de la labor, asi como el adecuado uso de EPP, EPCC y linea de vida. De igual manera, se validó acompañamiento constante por parte del área SST durante estas actividades, además de la realización de pausas activas y charlas de seguridad al personal.
Adicionalmente, el dia 23 de abril se presentó un incidente en la zona de trabajo, ocurrido durante el traslado del andamio hacia otro costado para dar continuidad a las labores, generándose su volcamiento sin ocasionar lesiones ni accidentes al personal. Frente a lo sucedido, se elaboró el respectivo informe de incidente, en el cual se documentaron los hechos y se establecieron acciones correctivas.
Entre las medidas definidas se indicó que, previo al traslado del andamio, este debe movilizarse de manera segura y controlada, evaluando la posibilidad de desmontar uno de sus cuerpos para facilitar su movimiento. Asi mismo, se anexó registro fotográfico de las condiciones actuales de anclaje del andamio y evidencia de las charlas de seguridad impartidas a los trabajadores respecto a lo ocurrido, con el fin de prevenir la recurrencia de eventos similares.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenia previsto ejecutar los siguientes items:
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) (falta un 30%)
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTÍ GRAFITI EN DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERA ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y EL USO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (EPP) REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

5. Generales: Durante el comité de obra se la semana se solicito realizar NP solo para el rendimiento de la pintura antigrafitis y la instalación del vidrio queda la semana del 27 al 02

6. Aspectos ambientales: se realizó visita al frente, se reporta el cerramiento perimetral adecuado, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. No se impactó en los sumideros o cunetas. Cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. LUISA FERNANDA YUSTRES PEREZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. KATHERINE CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ PROFESIONAL AMBIENTAL	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO PROFESIONAL ELECTRICO	ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS PROFESIONAL HIDRAULICO	ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	27/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISIÓN
DÍAS RESTANTES	141 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	GRUPO 17
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM	
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS		VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORÍA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,220,672,788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRORROGAS			TOTAL	$ 796,278,928,00	$ 2,220,672,788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2029	9 4 2026	9 4 2028	27662	4 9 2025	9 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	83,83%	83,83%		86,10%		$ 241,333,081		6/11/2025	11/03/2026																		
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	91,00%	93,19%		90,59%		$ 265,020,456		28/11/2025	14/04/2026																		
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	74,60%	85,81%		85,50%		$ 59,937,127		6/11/2025	18/03/2026																		
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	46,00%	52,85%		53,90%		$ 177,681,099		12/01/2026	30/04/2026																		
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	46,09%	60,54%		82,00%		$ 643,879,211		15/01/2026	30/04/2026																		
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	89,73%	92,97%		94,00%		$ 356,063,923		5/12/2025	30/04/2026																		
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	75,00%	78,41%		97,65%		$ 246,822,791		5/12/2025	30/04/2026																		
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	92,50%	95,50%		94,80%		$ 19,661,312		28/11/2025	30/01/2026																		
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						80,39%		85,57%		$ 2,010,399,000	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																										
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																										
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																										
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!		###	#¡DIV/0!	#####	$ -	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	0	8	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	8	0	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 250,642,138.00	12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32	TOTAL INTERVENTORIA		
11		$ 250,642,138.00		11		22		33	$ -		

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	80,39%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	85,57%		
ATRASO	-5,18%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20//04/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



cortes para dilatadores



Instalacion de dilatadores



Tratamiento de juentas(segunda mano)



Cotinero de remate en ventanas



instalacion total de lamina de superboard



Masillado de cieloraso

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Enchape de las paredes del shut de basuras.



Arreglo de los filos del área destinada para la instalación del tanque.




Fundición del área de los tanques.





Enchape del piso del shut de basuras.

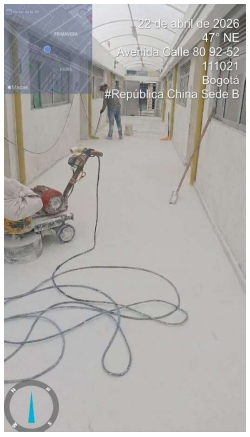


Pulido del piso del hall.




Instalación de la tubería.



Fundición de la columna

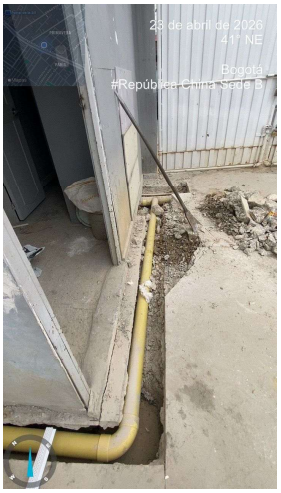

Demolición de la placa para el ajuste de la tubería.

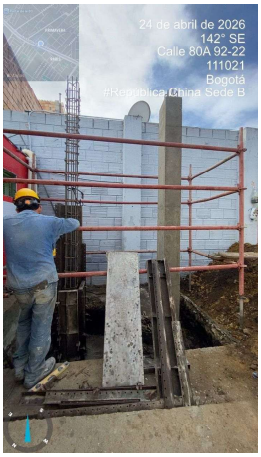

Fundición de la segunda columna en el área de los tanques

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A




Señalización y cerramiento en baños de hombre y mujeres (profesores)



Desmonte de unidades sanitarias en baños de hombres y mujeres (tanques)



Demolicion de enchape de piso

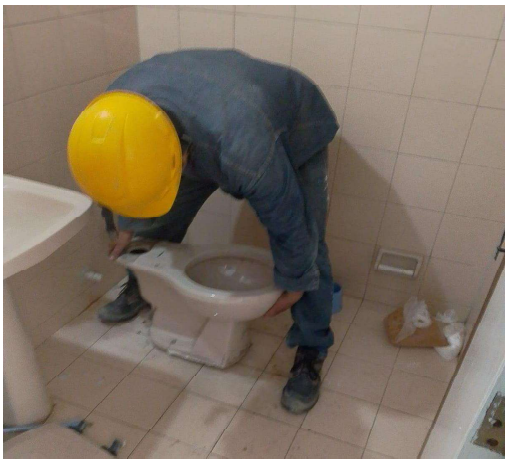

Desmonte de unidad sanitaria para introducir camara CCTV



En el desmonte de unidades saniotrtarias se evidencias vencimientos de los aparatos



Inspeccion de tuberia con camara CCTV

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Demolicion de piso y parte parcial de la placa para la introduccion de la camara CCTV



dacion de unidad sanitaria en orientacion y coordinacion despues de la isnpeccion con camara

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Pintura en Estructura metálica



Estructura metálica



Soldadura en Estructura metálica



Área de cerramiento



Perno en lámina stell deck



Malla electrosoldada



Lamina Steel deck lista con malla electrosoldada



Fundida de placa



Fundida de placa



Placa , aulas modulares

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR DEL CONTRATO		$	**2.220.672.788,00**	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	35,95%	$	798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$	1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**
OFERTADO		$	**2.109.535.964,00**		
EMERGENCIAS		$	100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	**2.209.535.964,00**		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	11.136.824,00		
Valor Parcial (Inicial + Emeroencias)		$	**111.136.824,00**		
Valor adicional No. 1:		$	**791.000.000,00**		
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	**591.000.000,00**		
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		$	**3.011.672.788,00**		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	411.136.824,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	**2.600.535.964,00**		


Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO**
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	212
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,14%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	13,37%	93,67%
Valor de la Obra	$ 315.757.066,00	$ 2.209.535.963,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 347.647.909,00	$ 2.069.639.388,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	87,86%	80,30%	El contratista realiza labores de terminación para efectuar la entrega de las sedes del contrato inicial
Durante el periodo	12,14%	13,37%	
Acumulado actual	100,00%	93,67%	

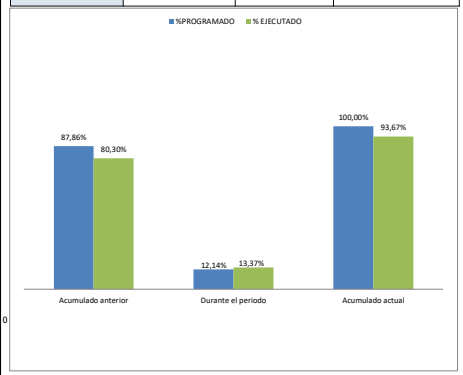

OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	13,90%	10,00%	-3,90%	100,00%	93,83%	-6,17%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	9,51%	4,20%	-5,31%	100,00%	97,39%	-2,61%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	9,41%	11,35%	-1,94%	100,00%	99,02%	-0,98%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	46,10%	37,74%	-8,36%	100,00%	90,59%	-9,41%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	4,64%	27,94%	-3,30%	100,00%	85,52%	-34,48%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	6,00%	4,92%	-1,08%	100,00%	97,89%	-2,11%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	2,38%	8,70%	6,32%	100,00%	87,51%	-12,49%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	5,20%	2,10%	-3,10%	100,00%	97,60%	-2,40%
TOTAL PROMEDIO			12,14%	13,37%	2,58%	100,00%	93,67%	-6,33%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 33.290.790,24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 7.593.424,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	80,00%	80,00%	0,00%	$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	90,00%	90,00%	0,00%	$ 86.095.004,83		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) sede D	40,00%	40,00%	0,00%	$ 19.497.755,70		
	LOS MARTIRES	BODEGA ROSA ZARATE	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
						$ 147.468.652,77	$ 411.136.824,00	$ 263.668.171,23

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		$	3.011.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		$	250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		$	117.739.152,00
VALOR PARCIAL 3		$	189.500.435,00
VALOR PARCIAL 4		$	575.032.890,00
TOTAL VALOR FACTURADO		$	1.132.914.615,00
SUMAS IGUALES		$	1.878.758.173,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.132.914.615,00	$ 1.132.914.615,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	100,00%	**93,67%**	**inación para efectuar la en**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	212	100,00%

CURVA S

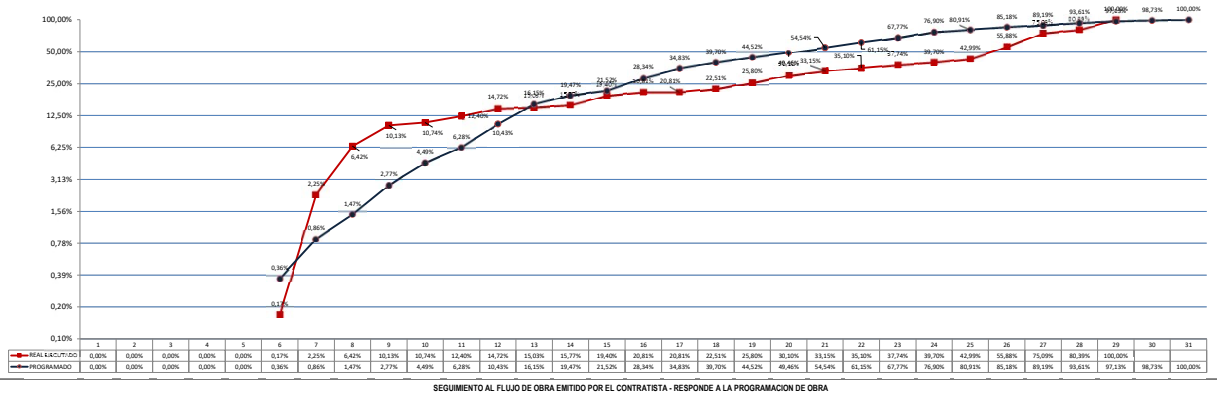

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,42%	10,13%	10,74%	12,40%	14,72%	15,03%	15,77%	19,40%	20,81%	20,81%	22,51%	25,80%	30,10%	33,15%	35,10%	37,74%	39,70%	42,99%	55,88%	75,09%	80,39%	100,00%		
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,28%	10,43%	16,15%	19,47%	21,52%	28,34%	34,83%	39,70%	44,52%	49,46%	54,54%	61,35%	67,77%	76,90%	80,91%	85,18%	89,19%	93,61%	97,13%	98,73%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se evidenciaron actividades en obra esta semana

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, el contratista remitió la documentación del personal requerido para la ejecución de actividades durante el fin de semana en este colegio, con el fin de realizar la correspondiente revisión y validación por parte de la interventoría conforme a los requisitos establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM COLOR OPAL CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE FIJACIONES, SELLOS DE HERMETICIDAD, CONECTOR OMEGAL BASE DE ALUMINIO, CONECTOR TAPA CRISTAL, U DE REMATE DE ALVEOLO, CINTA ANTIDUST MICROPERFORADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURAS CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 5.000 LBF (22 KN), FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE E INCLUYENDO PERNO DE 1/2", TUERCA, ARANDELA Y GUASA, INSTALADO MEDIANTE SISTEMA DE FIJACIÓN CON RESINA EPÓXICA ESTRUCTURAL. INCLUYE PRUEBA DE EXTRACCIÓN MEDIANTE EXTRACTÓMETRO PARA VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL ANCLAJE Y ENTREGA DE INFORME TÉCNICO Y DOSSIER DE CERTIFICACIÓN. LA INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN SE REALIZARÁN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYENDO LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 Y ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE.

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 16, en este se manifesto el inicio de labores el dia 27 de abril

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, se evidencia residuos y material acopiados en el frente, pero cerca a zonas verdes, por lo que se recomienda realizar la disposición, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso se realiza istalación cielo raso falso en lamina de superboard

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenciaron actividades de demarcación para la ejecución de dilataciones en el área del parqueadero. Así mismo, se observaron labores de recolección de escombros y jornadas de orden y aseo en las zonas intervenidas, contribuyendo a mantener condiciones seguras y organizadas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se realizo la instalación de suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: suministro e instalación de cielo raso falso en lamina superboard

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal No. 16, en el cual la supervisión solicito pintura sobre columnas de color fuxia cambio a amarillo pastel

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con material y residuos acopiados en el frente al igual se recomienda retirar todo, realizar una jornada de orden y aseo en la institución e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades: Armado de acero y fundida para estructura de tanque, pulida de piso, pintura en hall, aplicación poliurea, instalacion de tanques.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de pintura en el hall, así como el retiro de materiales que se encontraban sobre el tapete de caucho en la zona de juegos. De igual manera, se evidencian jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas, contribuyendo a mantener condiciones seguras en el entorno.
Se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado y permanente del casco por parte del personal durante la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras en obra.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa en semanaa anteriores

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el ultimo balance realizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE), esta actividad se realizara al final de la obra, ya que el alcance cambio. (congelada), esta actividad se reprograma teniendo en cuenta que se modifico el alcance de la intervencion.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo del presente informe se realizó comité de obra, en el cual se indico por parte del ingeniero apoyo a la supervision que las bajantes del hall deben ser tapadas con cajas de superboard y debe ser pintado de color blanco. Respecto a los colores de shut os definio como amarillo, blanco y gris. El contratista se comprometio a realizar la impermeabilizacion con poliurea el dia Viernes, el acabado del piso de la cancha la proxima semana junto con la totalidad de la pintura. Respecto al tanque se indico que este debe quedar ubicado para cuando acaba el contrato, sin embargo aun no en funcionamiento hasta que el concreto alcance resistencia.

6. Aspectos ambientales:Se realiza recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento perimetral, se evidencia material acopiado, se reporta la recolección de escombro y posteriormente su disposición, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo desmonte de sanitarios, desmonte de enchape, suministro e instalación de tuberia sanitaria e instalación de la tuberia en pvcs de 3"

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de instalación de tubería para ventilación en los baños de hombres y mujeres. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de EPP y la dotación correspondiente, garantizando condiciones seguras para la ejecución de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo desmonte de sanitarios, desmonte de enchape, suministro e instalación de tuberia sanitaria e instalación de la tuberia en pvcs de 3"

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación , se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS DEL COLEGIO JOSE ASUNCIÓN SILVA CON CABEZAL CCTV, CABLE RETRÁCTIL, MONITOR HD, CAPACIDAD DE ALUMBRADO LED + SONDA LOCALIZADORA. DIGITALIZACIÓN (LEVANTAMIENTO) DE REDES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS + PLANIMETRÍA (ARQUITECTURA EXISTENTE DE LAS ÁREAS DONDE SE UBIQUEN TUBERIAS EXISTENTES) DEL COLEGIO, LA DIGITALIZACIÓN SE ENTREGARÁ EN FORMATO PDF Y DWG (AUTOCAD); INCLUYE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR, LIMPIEZA BASICA DE TUBERIAS EXISTENTES Y CAJAS (MATERIAL GRUESO), LA FOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, MEDICION DE DISTSNCIAS APROXIMADAS Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES (NO INCLUYE LIMPIEZA CON BACTOR O SIMILAR). (Hacen falta los entregables)
RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité semanal se señalo la necesidad de entrega de los documentos incluidos en el CCTV asi como la inclusion de actividades a realizar en el colegio (cambio de enchape de baños, cambio de divisiones, sondeos, etc)

6. Aspectos ambientales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
Armado de aula modular y pintura, instalacion de cubierta y canal.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de pintura en la estructura metálica, así como la instalación de la perfilería para la cubierta. De igual manera, se verificó el uso de andamios para la ejecución de estas labores, evidenciando condiciones adecuadas para su utilización.
Así mismo, se validó al personal con el uso adecuado de EPP y la dotación correspondiente, garantizando condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el ultimo balance realizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del ítem

15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
4.2.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1. CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
9.1.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.
5.1.1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
5.1.5: SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
7.1.1. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04
7.2.25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA
16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
9.2.8. VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: En el comité realizado en la SED, el ingeniero apoyo a la supervision realiza solicitud respecto al avance de los salones, indicando que se debe dar dinamismo para cumplir con los tiempos contractuales.El contratista se compromete a instalar cubierta el miercoles, la proxima semana tener instalado todo lo modular. Respecto al espacio entre placa de contrapiso y placa del aula modular se define que va a ir cubierto con malla microperforada, la cual permitira ventilacion, de igual modo se hicieron unos ajustes de las aulas modulares, por lo que se solicito plano al contratista para que OTIC poueda definir los puntos de datos. Tambien se definio que las ventanas iran al frente sde las aulas, y en la parte posterior rejillas ventana en la parte alta.

6. Aspectos ambientales: El frente de obra cuenta con el cerramiento en buen estado, se continua con la instalación de la estructura metálica, se evidencia material de construcción y un acopio de residuos en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período se inicio la instalación de pintura esmalte tipo 1, reparación del murete y piso de la tarima del auditorio **e instalación de flanches**

2. Seguridad Social y SST: Durante el período evaluado se ejecutaron actividades de adecuación de las láminas de madera afectadas. Así mismo, se reitera al personal la obligación de hacer uso adecuado del casco como EPP y se recomienda la implementación constante de jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado la actividad de instalación de cuberta ecoroof UPVC

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Instalación de pintura esmalte tipo 1 e instalación de flanches

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra, en el que se manifesto que se debera cortar la reja de seguridad y soldar a la estructura metalica para dejar igual que antes (en el punto de la tarima - auditorio)

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se evidencia material de construcción, se reporta el retiro de residuos del frente y solo se encuentran los andamios acopiados, por lo que se recomendó al contratista garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo la actrividad de instalación de estructura metalica, fundida de placa, limpieza bajo cubierta y limpieza de la cancha**, suministro e instalación de enchape**

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de estructura metálica para pérgola, así como la instalación de rejilla para cárcamo. De igual manera, se verificó al personal con el uso adecuado de EPP requeridos para la ejecución segura de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron la actividades de instalación de estructura metalica, instalació de cubierta tipo sandwish, suministro e instalación de enchape

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades de corte con pulidora, excavacion, findición del anden, fundicion del carcamo y aseo y limpieza

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra y en el se definio el inicio de la pintura de la cancha durante esta semana y finalización de la pintura de fachada del 02 de mayo

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se evidencia material de construccion y residuos debidamente acopiados, por lo que se recomienda disponer todo, garantizar jornadas de orden y aseo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal ejecutando actividades de resane de fisuras y pintura de fachada. Así mismo, se verificó la realización de charlas diarias al personal, el uso adecuado de andamios y de los EPCC durante la ejecución de las labores.
De igual manera, se validó que el cerramiento perimetral se encuentra en condiciones adecuadas en la zona de trabajo, garantizando control y seguridad en el área intervenida

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) (falta un 30%)
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTI GRAFITI EN DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERA ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y EL USO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (EPP) REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

5. Generales: Durante el comité de obra se la semana se solicito realizar NP solo para el rendimiento de la pintura antigrafitis y la instalación del vidrio queda la semana del 27 al 02

6. Aspectos ambientales: se realizó visita al frente, se reporta el cerramiento perimetral adecuado, No se impactó en los sumideros o cunetas. Cuenta con punto ecológico. Se evidencian residuos en la parte del parqueadero, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ING. LUISA FERNANDA YUSTRES PEREZ** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. KATHERINE CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ** PROFESIONAL AMBIENTAL	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO PROFESIONAL ELECTRICO	**ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS** PROFESIONAL HIDRAÚLICO	**ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ** PROFESIONAL ESTRUCTURAL
