60

JUEVES. 16 DE Abril / 2026.

Personal en obras:

Diego Mendez (Ayudante).

Daniel Lopez (Ayudante).

Jose Tomeo. (Encofrador).

Personal técnico:

Yuriorm yoleth (Ing. Fiscalizadora.).

Oscar Michaels (Ing. Contratista).

Actividades:

* Continua encofrado Hall.
* Se Verifican Medidas para Colocación y Fijación de canaleta y Flyer, Estructura tanques. (Según plano Estructural).
* Fueron retiradas de Instalación Estructura cubierta shut basuras.
* Se funde tapa Caja Inspección tubería 6" (Hall.)
* Queda armada Pared. Piso y se continua con Armado de canaleta Colindante.

Ing. Contratista
16-Abril/2026.

Norma

Scanned with CamScanner

61

Viernes 16 de Enero de 2026.

Personal en obra:

Operativo:

Franklin Marmol (Ayudante.)
Daniel Suspes (Ayudante)
Diego Mendez (Ayudante.)
Elbert Castro (Enchapador Shut.)
Jose Toro (Enchapador Hall.)
Javier Avila (Contratista)

Personal Tecnico:

Milipy Yulieth. (Ing. Interventoría.)
Oscar Michael (Ing. Contratista)

Actividades:

* Pulido pico Gruesto + Instalacion Guardaescoba (Hall)
* Enchape Muro (shut basuras.) + cubierta.
* Tirado y Armado Acero (estructura tanques.)
* Llega 3m³ Mixto. (se recibio el despacho de Vía Colegio).

Ingeniero Contratista.
16 Ene/2026

82

Sabado. 18 Abril de 2026.

Personal operativo:

*Elber Castro (Encofrador.)
*Daniel Suspes. (Ayudante).
*Diego Mendez (Ayudante.)
*Jaime Tadeo (Encofrador.)

Personal tecnico

*Oscar Machado (Inspector Contratista).

Actividades a ejecutar:

+Shot basuras:

*Encofrado Muros.
*Cielo Raso PVC (finalizado.)

+Estructura tanque elevado:

*Armado de Hierro.
*Ubicación de Tornillos y Hierro columnas en Sitio. (El Dia Luego se fundiria la Cimentacion).

+*Hall. (Encofrado.)
*Se Instala la tapa Caja Inspección (tubo 6")
*Finaliza la Instalacion de encofrado Sobre piso
+Enbaquetillado. (Proximas actividades "Pulido"

Inspector Contratista
18-Abril/2026.

Norma

Scanned with CamScanner

CB

LUNES 20 DE 2026.
PERSONAL OPERATIVO.
FRANKLIN MARMOL. (OPERADOR.).
DIEGO MENDEZ (AYUDANTE.)
JOSE TODEO. (ENCHAPADOR.).
JAVIER AVILA. (CARPINTERO.)
PERSONAL TECNICO:
MIRYAM. YULIETH. (INSP. INTERVENTORIA.).
OSCAR MICHAEL (INSP. CONSTRUCTOR.).
ACTIVIDADES:
*BOCACUERTA HALL.
*EMBOQUILLADO CONDUCTO ESCOBA + BOCACUERTAS HALL.
*FUNDIDA CORGO BASE TANQUES SOBRE CUBIERTA
BAÑO HOMBRES + FUNDIDA CIMENTACION TODAS
COLUMNAS (ESTRUCTURA TANQUES ELEVADOS).
*SE AUTORIZA POR PARTE DE INTERVENTORIA;
INSPECTORA YULIET FUNDIDA DE ESTRUCTURA CIMENTACION + COLUMNAS + BASE DE TANQUES
ELEVADOS. (EXCELENTE EL SISTEMA CONDUCTOR
DE ESTE ELEMENTO SE ENSAMBLO Y ARMO EN
BASE A PLANO ESTRUCTURAL).

CONSTRUCTOR TOPETE.
20-OCT/2026.

64

Abril 21 - 2026.
Se realiza charla de seguridad al personal de obra, inspección a las pulidoras, se evidencia personal trabajando sin casco en enchape y trabajo alturas.
Se le informa a oscar que el personal debe trabajar con casco y cambiar el bicicletero que tienen como acceso a la cubierta por una escalera. Att. esperanza Vargas Camacho SST. consorcio capital LH. Vargas

Martes 21 Abril/2026.
Personal en obra:
FRANKLIN Marmol. (Oficial)
Diego Mendez (Oficial)
JOSE TORRES. (Enchapador)
Personal técnico:
Oscar Mercado R (Ingeniero Residente)
Maireth Yulieth (Ingeniera Interventoría).
Actividades a ejecutar

Nosme Sique

* Llega la formaleta para columnas, cimentación y tanque.
* Se realiza limpieza general sobre placa tanque, barro regados.
* Enchape piso área shut basuras.
* Instalación tubería hidrosanitaria sifón shut, bajante casa y red hidráulica (llave jardín)
* Se espera el resto faltante para armar formaleta columna tanque elevado.

Supervisor Constructor
Abril 21 de 2026.

Miércoles 22 de Abril/2026.

Personal operativo:
Diego Mendez (Ayudante)
Jose Toro (Enchapador)
Elber Castro (Enchapador)
Franklin Manuel (Ayudante)

Personal técnico:
Oscar Michels R (Supervisor contratista)

Estudiantes:

Norma

Sigue

66

PISO 1 → * Continua Entrega Menor Sht. basorias. y piso.
* Armado de Viga Fachada Sht basorias.
* Llega lo que falta de Formaleta. (tableros, angulos)
* Destorcado de piso Hall.
* Placa carga Peatonal + Fundida poyo tanques
* El Dia de Mañana se Forra con Armado de Formaleta para fundida estructura tanques.

Inspector Contratista
Pbl/ 22/2026.
4:44 pm.

Jueves 23 de abril, 2026.

se evidenció que las conexiones de tubería ejecutadas no cumplen en su totalidad con las condiciones técnicas requeridas; por lo anterior, la interventoría solicita que dichas conexiones se realicen de manera adecuada, empleando los accesorios correspondientes, con el fin de garantizar la correcta instalación y funcionamiento del sistema.

Norma

Scanned with CamScanner

67

JUEVES 23 de Abril / 2026.

Personal de obra:
José Isidro (Enchapador.)
Daniela Flores (Ayudante.)
Duban Mendez (Ayudante.)
Alfredo Mendez (Oficial.)
Javier Rojas (Contratista.)

Personal técnico:
Myriam Yuliethh (Inspectora Interventoría.)
Oscar Michaela (Inspector Contratista.)

Actividades:

Hall:

*Enbaquillado de Ras (Sello Juntas) Piso. (Con Novedad).

*Estructura Tanque:

*Se limpia y prepara la formaleta para armado y fundida Columnas.

*Se Realiza Conexión faltante Salida Tubo 3" De Slut basuras a tubo Sanitario Salida cuarto de Aseo. + Salida Red Hidraulica Punto Slut basuras.

Inspector Contratista
Bogotá 23 Abril/2026.
3:15 PM.

Para.

Sigue - Nota D/R. 23 abril / 2026.

* Estructura tanque Aereo: (FUNDIDA Columna).
* Se Verifican planos y Niveles.
* Verticalidad: Utilizando plomada y Nivel.
* Fijación: Encofrado con puntales, para evitar Desplazamientos
* Dosificación pd Concreto.

Inicio fundida 3:30 pm.

* Se autoriza fundida por parte de Fabricadora.

Termina fundida 3ra Columna Cole las 4:30 pm.

Inspector Constructor
Abril 23 / 2026
4:30 pm.

VIERNES. 24-Abril / 2026

Personal operativo:

Daniel Mendez (Ayudante)
Alfredo Mendez (Capizal)
Franklin Ramos (Ayudante)
Jose Tapia (Enchapador)
Javier Avila (Contratista)

Actividades:

* Alistamiento area acceso Shut (Rampa).
* Fundida columna Nº 2.

Pasa

69

siga → * Armado de formaleta 2da colomna para fundida.
* Adecuando placa base, para imprimacion o impermeabilizacion
* Estructurado de Zapatas 3" (So Perboard.) en Hall.
* Alistamiento de muros para pintura Perimetral Hall.


Sabado 25-Abril/2026.

Personal operativo:
Jose Tadeo (Enchapador.)
Franklin Hamid (Ayudante.)
Dorian Mendez (Ayudante.)
Alfredo. Mendez (Oficial.)

Personal tecnico:
Oscar Michaeck (Inspector Contratista.)
Miryam. Yolreth Inspectora Interventoria.)

Actividades:
+ Estructura tanques.
* Desencofrado columna No 2.
* Corte, figurado y armado de estructura (Acero) placa tanques Eneo.
Shut Basuras:

* Pulida Enchape piso (Destroncado).
Hall:
+ Aplicado y Aplicado de columnetas (Joerboard)
+ Aplicado mural Paredes Hall.



Domingo
~~Sabado~~ 26 Abril / 2026.

Personal en obra:
Jose Tadeo. (Enchapador).
Jordan Mendez (Ayudante).
Alfredo Mendez (Ayudante).
~~Alfredo~~ Diego Mendez (Oficial).
Jasper Davila (conductor).
Michael Betancourt (oficial)
Jhon Bermon (Ayudante).
~~Enrique~~ Enrique Pantoja (Ayudante).

Actividades:
* Pulido Pacpa Acceso Shut basuras
* Aplicado y frisado de Acero y Formaleta para Fundida de Base + pleca (Tanque elevado).
* Masillado + Lijado + Aplicado Pintura Mural

Nombre Firma

1

21

Vicente y Columnetas bayonetas 3" (Superboard).

Personal técnico:

Ing Hilton Ortiz.

Ing Wilson. cercera.

Esperanza Vargas (SST.)

Oscar Michaels R (Inspector Contratista)

Hoy No Asiste Personal (Fundida de Estructura Tanque) DE Interventoría.

Inspector Contratista.

Abril 26 de 2026.

Nota Diario 26 de abril:

* Se fundida placa y base tanque sobre las 11:10 am.
* Se realiza vibrado externo (Chapolin) y de formaleta/escoba.
* No Asiste a fundida Interventoría (se le informo a Inspectora Mirysol Gullet que el día de Hoy se ejecutaría esta actividad.
* finaliza fundida + afinado placa + apuntalamiento Torres hora sobre las. 12:30 pm.

Ing Contratista Abril 26 1:00 pm

Norma

Scanned with CamScanner

72

LUNES. 27 DE Abril / 2026.

Personal de obra:
Alfredo Mendez (oficial). Diego Mendez (ayudante.)
Joyer Tadeo (Enchapador)
Javier Avila (contratista).
Jhon Bernal. (Pintor).

Personal técnico:
Minyam. Yolieth (Inspectora Interventoría)
Oscar michaek (Inspector Contratista).

Actividades:
* Alistamiento muros y columnetas + esdcanot ligado Hall.
* Relleno cimentación y fundida piso Estructura tanque bereco.
* Pegue de tubería hidrosanitaria 3" PE Shut bajantes a caja de paso.
* Construccion de caja Inspección; esta Recibe aguas lluvias. Medida 60X60.
* Instalación de tobera Ht. En cuanto Shut bajantes Alimenta 2 salidas Lavamanos; 1 Interruptor; 1 toma.
* polida piso Shut bajantes.

Abril. 27/2026
Inspector Contratista 5:10 p.m.

73

Martes. 28 de Abril / 2026.

Personal en obra:

Franklin Manuel. (Albañil.)

Diego Mendez. (Ayudante)

Jose Pedro. (Enchapador.)

Personal técnico.

Oscar Michael R (Inspector Contratista.)

Miriam Goliath (Inspectora Interventora.)

Actividades:

* Pulido de Hall. (Inicio)
* Segunda escuela Anden. (En la tarde llegada Valeta).
* Se Realizo empastado en muros exteriores del Sshut Laterales.
* Acometida electrica Shut.
* Impermeabilización de placas Parques barandas
* Reforzamiento de Solado y canal en bajantes de 3"
* Mantenimiento Muros Pintura Muros Hall

Inspector Contratista
Abril 28 de 2026
5:15 pm.

74

miercoles 29 abril / 2026

se evidencia el acopio de material metálico directamente sobre la superficie de la concha en caucho, sin ningún tipo de protección o aislamiento. dicho material presenta presencia de óxido, el cual está generando manchas sobre el acabado existente. adicionalmente, se identifican aristas y elementos potencialmente filosos que pueden ocasionar deterioro físico del recubrimiento.

En consideración de lo anterior, se recomienda de manera inmediata al contratista implementar medidas de protección, tales como el uso de elementos aislantes (plásticos, geotextil, madera u otro material adecuado), que eviten el contacto directo entre el material acopiado y la superficie de la concha, con el fin de prevenir daños en el acabado.

inspector de interventoría.

Miercoles 29 de abril / 2026.

Personal en obras

Franklin Yormel. (Ayudante)

Gabriel Acosta. (electrico)

Yhoin Bernal (pintor).

35

Viernes Personal técnico:

Miriam Yuliet (Inspectora Interventoría)
Oscar Michael. (Inspector contratista).

Actividades:

* Se Impermeabiliza placa tanque sobre Muro Muretes (Poliurea).
* Finaliza Actividad Emboquillado de Encharpe Sobre Muros Shut bateria.
* Queda Instalada Red hidraulica (llave) en Shut bateria.
* Instalacion y Acometida electrica en Shut Queda energizada.
* Se Realiza excavacion para caja electrica Sobre placa zona patio posterior, Segun lo requerido por Interventoria.
* Continuan trabajos de Lijado, Masticado y pintura Muros perimetrales Hall.

Inspector Contratista
Abril 29 de 2026
1:00 pm.

26

JUEVES. 30 Abril / 2026.

Personal en obra:

Franklin Momol.

Alfredo. Hernández

Jhoel Bernal.

Personal técnico:

Oscar Mitchael. (Inspector.)

Actividades:

* Junta de Construcción placa patio exterior
* Desmonte Formaleta (se programa en horas de la tarde la recogida de los elementos)
* Fundida placa piso (al lado de escalera caracol.)
+ Limpieza + pintura vigas Hall.
+ Desmontada tubería hidráulica + llave stop baños.
* Se espera a poder subir PAÑETE con instalación de los tanques.

Inspector Constructor
Abril 30/2026

Norma

Viernes 01 de Mayo.
Personal en obra:
Jhon Bernal (Prador.)
Alfredo Mendez (oficial)
Javier Avila. (contratista).
Personal técnico
Oscar Michaels R (Inspector Contratista.)
Actividades:
*Pintura Hall y Masillado muros shut basuras.
*Instalación Tanques. (3 und.) 2 de 500 Lts y 1 de 2000 Lts.

Inspector Contratista
Abril 1/2026
2:30pm

Sabado 02 de Mayo:
Personal en obra:
*Javier Avila (Contratista)
*Alfredo Mendez (Oficial)
*Franklin Manuel (Ayudante)
*Yhon Bernal (pintor)

Norma

78

Actividades:
* Fundida tapas caja Inspección
* Armado fibra placa zona cortón
* Prueba Hall. (Mensual)
* Masillado Muro. Shut

Maquina Inversión

Fecha Conductor
DIA 2 DE 2026.

Domingo. 3 marzo/2026.

Personal en obra:
Michael Patarroyo (Piloto)
Brayan. Patarroyo. (Piloto)
Dorder Mendez (Ayudante.)
Alfredo Mendez (Ayudante.)
Jader Ruiz (Conductor.)

Personal técnico:
Ing. Wilson Ortiz
Ing. Roberto. Bernardo (Residente)
Oscar Michaels (Inspector)

Norma Ing.

79

Actividades:

*Aseo y limpieza obras - lavado los Alcoholes.
*Traslado Material
*Mastillado + Ligada + pruebas, Shut basuras
*detalles placa peatón, Inspección empate y bordillos entrada Ppal.

Inspector contratista.
Mayo 3 de 2026.

Lunes. 4 Mayo 2026

Personal en obra:

Jaider Avila (contratista).
Dimar Mendez (Ayudante)
Alfredo Mendez (Ayudante).

Personal Externo:

Oscar Michels R (Inspector obra).

Actividades:

*Instalacion tapa Cajas Inspección.
*Recogida de cerdaceos (Programada para hoy en la mañana)

Norma

PAGINA

01 de Abril de 2026.
En la institución educativa Manuela Beltran sede B se encuentran (7) siete trabajadores adelantando la actividad de excavación, y fundida de ciclopeos y dados para el dia de hoy se funden (8) ocho dados y (2) dos ciclopeos mas, se evidencia agilidad en la ejecución.

Inspectora de Interventoria

02/04/2026
JUEVES SANTO

03/04/2026
VIERNES SANTO.

04/04/2026
Excavación de dados. Agaudra Conde.

05/04/2026 DOMINGO.

Norma

Powered by CamScanner

06/04/26

Se realiza verificación de ejes en obra en conjunto contratista e interventoría, evidenciando que algunos dados fueron ajustados en su posición con el fin de garantizar que la platina quedara centrada con respecto al dado. Así mismo en los ejes que actualmente se encuentran en proceso de excavación, se observa que las varillas guía presentan leves desviaciones, por lo anterior, se requiere que previo a la fundida de los dados, se realice la correspondiente verificación y ajuste de los ejes, asegurando el cumplimiento de lo establecido en la planimetría del proyecto.

Robinson Barrero Gamboa
Residente de Obra Contratista.

Paola Martínez Residente Interventoría

07 de abril de 2026

En la institución educativa Manuela Beltrán sede B se encuentra (7) siete trabajadores adelantando las actividades de excavación, fundida de dados y fundida de ciclopeos. se

evidencia avance en el frente de trabajo, se evidencia llegada de material mallas electrosoldada #5, y un viaje de mixta, por otro lado llego perfileria metalica para la estructura del aula modular.

Inspector de Interventoria

08 de abril de 2026.
En el IED manuela beltran sede B, se encuenta personal en el frente de trabajo (7) Personas. se avanza con excavacion y fundido de dados, se evidencia llegada de Material, armado de acero se evidencia avence en el frente de trabajo.

Inspector de Interventoria

09 de abril de 2026.
En la institucion educativa., se encuenta personal labarando, en el dia de hoy se encuentan 2 cuadrillas en actividades de fundido de placa de 10 cm y fundida de dados y excavacion de dados, en total (14) catorce personas labcando, se tomo la muesta de concreto en los cilindros correspondentes, se avanzo en la actividad propuesta..

Inspector de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

10 de Abril de 2026.

En el IED Manuela Beltran sede B, se encuentra personal en el frente de trabajo, (7) siete personas se lleva a cabo la actividad de excavación, fundida de dados y fundida de ciclopeo, a la fecha queda la actividad con 36 dados fundidos, a lo que evidencia avance en el frente de trabajo.

Se realiza verificación de la perfilería - perfil Tipo C 160 x 60 x 3mm. Empacado. - Suministrado y acopiado por el Contratista de Obra; el perfil esta diseñado para soportar el Aula modular y se ubica en la base de la Estructura; Actualmente los perfiles en C 160 x 60 x 3 mm se unen por cordones de Soldadura de 4 cm Cada 60 cm sin embargo la Instrucción dada por el estructura de la Interventoria en Mesa de trabajo fue que estos perfiles Empacados se instalara de manera tal en la Qe los dos se unieran con una Soldadura 60 - 13 y/o 70 - 13 cordón. que garantizara la unión de los dos (2) perfiles; En consecuencia se deja la

observacáy y se informa en sitio al contratista para que proceda con la corrección de la actividad

Firma: Ing. Yurema Rodríguez R; Directora de Interventoría promitec.

11 de Abril del 2026.
Considerando los Resultados de los ensayos del tintag penetrantes, Se evidencia la ausencia de defectos, porosidades o Fisuras Superficiales que indiquen potencial peligro para la Integridad de los elementos empactados.
Se da entonces via libre a la Instalación de las correas Referidas

El presente Concepto avala el procedimiento bajo la Responsabilidad del contratista y no precisa un

Norma

Powered by CamScanner

Estudio o análisis estructural que respalde los valores implementados por el ejecutor. Se emite concepto aprobatorio a la luz de prácticas habituales de la ingeniería y como respuesta al probrema de funcionamiento existente.

Firma: Interventoria.

Residente Ing. Paula Martinez

12/04/2026 DOMINGO.

13/04/2026

Descargue de estructura metálica, armado y presentación de un aula, estructura metalica de piso y muros. Fundida de placa contrapiso con refuerzo de malla electrosoldada de 5 mm. Total 16 m^3. Acero general.

Alejandra Caude

14/04/2026.
Continua montaje de estructura metálica, arreglo y corrida de cerramiento.
Aplicación de agua para curado de placa
Lluvias en la tarde. Alejandra Caude.

15/04/2026.
Cautinua montaje de estructura metálica. Se presenta lluvias fuertes en la mañana durante dos horas.
Alejandra Caude.

En visita a obra se evidencia el armado de estructura metalica de las aulas. De igual manera, se observa la falta de alineacion en algunos elementos; sin embargo, el subcontratista manifesta que el proceso constructivo contempla primero el armado y posteriormente la alineacion y fijacion de la estructura.
Respecto a la fundida de la placa, se observa que en los bordes no presenta un acabado uniforme, por lo cual se requiere retalizar los ajustes correspondientes, asi como mejorar el acabado general.

Residente Interventoria
Paula Martinez

Norma

Powered by CamScanner

16/04/2026.

Continua montaje de estructura metalica.

Descargue de malla electrosoldada y teja Steel deck.

AlejandraCoude.


17/04/26

Visita técnica a obra, se recomienda colocar en valles intermedios conectores de cortante para la losa de steel deck, pulir soldaduras previo a repintada, dar apriete a pernos con copa y rachet para asegurar la fijación de los perfiles, colocar perfil de remate en ander para asegurar el borde del steel deck, pendiente los pernos anclados de las placas base a pedestales de concreto, la conformación de los perfiles dase

Norma

Powered by CamScanner

ser en forma discontinua separación de soldaduras cada 60cm y cordones en soldadura E70xx cada 5cm.

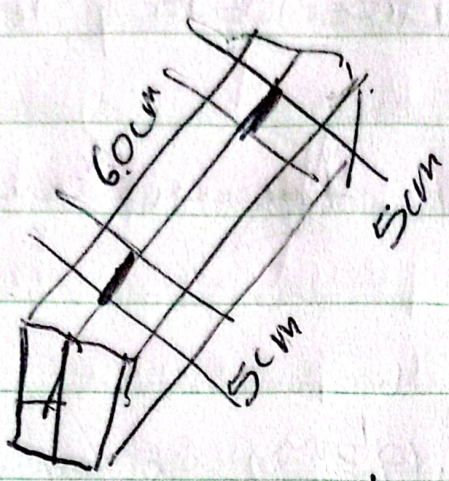

Ing. Yesid Nonar C.
AS. Estructural.

18 de Abril de 2024

En el IED manuela Beltran jornada B, se evidencia personal laborando y avance de la actividad de instalación de estructura metalica
en cuanto al personal se trabaja con 6 personas
se hace la verificación de niveles
se hace el respectivo ajuste de tercas, para dejar fijo el perfil y asi ajustar por completo la estructura metalica

Inspector de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

19 de Abril 2026.
Domingo

20 de Abril de 2026
En el IED Manuela Beltran sede B.
se encontra 7 personas labacando en el frente de trabajo.
para las horas de la tarde la actividad que se ejecuta es pintura en perfileria metalica.

Inspector de Interventoria

21 de abril de 2026

En la institución educativa Manela Beltran Sede B, se llevan actividades de pintura en perfileria metalica y soldadura de los laminas que reciben la estructura, especificamente hace su función de recubrimiento., donde va la placa de 10 cm y su respectivo sobre piso y enchape.

Norma

Powered by CamScanner
