Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
34		12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M)	M	104,28	$ 963.756,00	2 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	32
35		**13**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**40 días**	**vie 13/02/26**	**vie 27/03/26**	
36		13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,00	$ 4.851.385,00	15 días	vie 13/02/26	lun 2/03/26	14
37		13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	12,44	$ 1.532.919,00	15 días	jue 12/03/26	vie 27/03/26	36FC+10 días
38		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**79 días**	**sáb 10/01/26**	**jue 2/04/26**	
39		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	31,00	$ 3.320.968,00	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	41
40		16.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	M2	51,20	$ 5.289.011,00	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26	43
41		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON	M2	213,46	$ 56.976.103,00	25 días	sáb 10/01/26	jue 5/02/26	11
42		16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	60,34	$ 23.186.550,00	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	41

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43		16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	297,02	$ 48.220.009,00	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	37
44		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**120 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 24/04/26**	
45		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	556,14	$ 2.614.414,00	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	31
46		18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	6.165,00	$ 22.033.710,00	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	5
47		18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	225,39	$ 1.718.373,00	3 días	mié 24/12/25	sáb 27/12/25	46

Nombres de los recursos

Nombres de los recursos

Nombres de los recursos

Nombres de los recursos

Nombres de los recursos

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	Duración	Comienzo	Fin
1				**COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D**			**160 días**	**mié 5/11/25**	**lun 20/04/26**
2			**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**105 días**	**mié 5/11/25**	**sáb 21/02/26**
3			**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mié 5/11/25**	**vie 14/11/25**
4			1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	283,78	10 días	mié 5/11/25	vie 14/11/25
5			**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**91 días**	**mié 19/11/25**	**sáb 21/02/26**
6			1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	260,00	10 días	mié 19/11/25	sáb 29/11/25
7			1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	80,00	10 días	sáb 29/11/25	mié 10/12/25
8			1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	6,25	7 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25
9			1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,00	3 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
10			1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	2 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26
11			1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	67,89	10 días	mar 3/02/26	vie 13/02/26
12			1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,79	5 días	lun 16/02/26	sáb 21/02/26
13			1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	3 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
14			**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**vie 14/11/25**	**mié 19/11/25**
15			1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	50,00	4 días	vie 14/11/25	mié 19/11/25
16			**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**91 días**	**mié 17/12/25**	**sáb 21/03/26**

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	Duración	Comienzo	Fin
17		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**30 días**	**mié 17/12/25**	**sáb 17/01/26**
18		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	85,00	15 días	mié 17/12/25	jue 1/01/26
19		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	80,00	15 días	jue 1/01/26	sáb 17/01/26
20		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**8 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 31/01/26**
21		2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	8,30	4 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26
22		2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	8,30	4 días	mié 28/01/26	sáb 31/01/26
23		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**sáb 31/01/26**	**mié 11/02/26**
24		2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y	M	37,00	10 días	sáb 31/01/26	mié 11/02/26
25		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**6 días**	**sáb 17/01/26**	**vie 23/01/26**
26		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	150,00	3 días	sáb 17/01/26	mar 20/01/26
27		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	500,00	3 días	mar 20/01/26	vie 23/01/26
28		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**lun 16/03/26**	**sáb 21/03/26**
29		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	450,00	5 días	lun 16/03/26	sáb 21/03/26
30		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 21/02/26**
31		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**mié 11/02/26**	**lun 16/02/26**
32		4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	10,00	5 días	mié 11/02/26	lun 16/02/26
33		**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**lun 16/02/26**	**sáb 21/02/26**
34		4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	2,00	5 días	lun 16/02/26	sáb 21/02/26
35		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**9 días**	**mié 1/04/26**	**vie 10/04/26**
36		5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	40,00	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	Duración	Comienzo	Fin
37		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS	UN	12,00	3 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26
38		5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA, EN CABLE ELÉCTRICO COBRE AISLADO (3Ø + N) 8 + T (# 10 AWG) LIBRE	M	80,00	3 días	mar 7/04/26	vie 10/04/26
39		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**80 días**	**vie 23/01/26**	**jue 16/04/26**
40		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**13 días**	**vie 23/01/26**	**jue 5/02/26**
41		7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	125,00	3 días	mar 3/02/26	jue 5/02/26
42		7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA E=0,10m. INCLUYE IMPRIMANTE EPOXICO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE CANCHAS (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	230,00	5 días	vie 23/01/26	mié 28/01/26
43		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**9 días**	**mar 7/04/26**	**jue 16/04/26**
44		7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	9,00	2 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26
45		7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E	M2	230,00	7 días	mar 7/04/26	mar 14/04/26
46		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mar 14/04/26**	**jue 16/04/26**
47		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mar 14/04/26**	**jue 16/04/26**
48		9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	6,00	2 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26
49		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**jue 16/04/26**	**vie 17/04/26**
50		10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26
51		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**jue 16/04/26**	**lun 20/04/26**
52		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**jue 16/04/26**	**lun 20/04/26**
53		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	250,00	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26
54		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	200,00	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	Duración	Comienzo	Fin
55		**15**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**mié 28/01/26**	**mar 3/02/26**
56		15.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H= 0,10 M FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	70,00	5 días	mié 28/01/26	mar 3/02/26
57		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**jue 26/03/26**	**sáb 11/04/26**
58		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	30,00	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26
59		16.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	64,00	4 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26
60		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	67,89	5 días	jue 26/03/26	mié 1/04/26
61		16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	6,00	2 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26
62		16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	10,00	2 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26
63		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**58 días**	**vie 13/02/26**	**mar 14/04/26**
64		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	330,00	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26
65		18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	945,00	2 días	vie 13/02/26	sáb 14/02/26
66		**20**	**NO PREVISTOS**			**8 días**	**mar 7/04/26**	**mié 15/04/26**
67		N.P.20.2	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	26,00	5 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26
68		N.P.20.4	DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI	ML	28,00	3 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26

Predecesoras	Nombres de los recursos
15	
6	
7	
11	
9	
56	
13	
11	
4	

Predecesoras	Nombres de los recursos
8	
18	
27	
21	
22	
19	
26	
10FC+25 días	
24	
32	
60	

Predecesoras	Nombres de los recursos
36	
37	
56	
27	
45	
59	
45	
48	
48	
53	

Predecesoras	Nombres de los recursos
42	
60	
58	
29FC+5 días	
59	
61	
67	
11	
59	
67	

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin
1			**OTIC**				**110,88 días**	**sáb 6/12/25**	**mar 31/03/26**
2		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**20 días**	**sáb 6/12/25**	**vie 26/12/25**
3		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**10 días**	**sáb 6/12/25**	**mar 16/12/25**
4		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	4,18	$ 652.013,00	10 días	sáb 6/12/25	mar 16/12/25
5		**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**				**10 días**	**mar 16/12/25**	**vie 26/12/25**
6		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,61	$ 255.114,00	10 días	mar 16/12/25	vie 26/12/25
7		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15 días**	**vie 26/12/25**	**lun 12/01/26**
8		**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15 días**	**vie 26/12/25**	**lun 12/01/26**
9		3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	51,72	$ 755.577,00	15 días	vie 26/12/25	lun 12/01/26
10		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15 días**	**lun 9/02/26**	**mar 24/02/26**
11		**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15 días**	**lun 9/02/26**	**mar 24/02/26**
12		9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4” Y PASO EN TUBO DE	M	7,00	$ 3.229.044,00	15 días	lun 9/02/26	mar 24/02/26
13		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**68,88 días**	**lun 12/01/26**	**mar 24/03/26**
14		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**16 días**	**lun 12/01/26**	**mié 28/01/26**
15		12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO	M2	44,97	$ 1.640.865,00	8 días	lun 12/01/26	mar 20/01/26
16		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	53,33	$ 710.356,00	8 días	mar 20/01/26	mié 28/01/26
17		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**27 días**	**mar 24/02/26**	**mar 24/03/26**

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin
18		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE	M2	200,00	$ 6.005.400,00	15 días	mar 24/02/26	mié 11/03/26
19		12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	340,00	$ 7.180.120,00	12 días	mié 11/03/26	mar 24/03/26
20		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**				**90,88 días**	**vie 26/12/25**	**mar 31/03/26**
21		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	147,34	$ 692.645,00	2 días	sáb 28/03/26	mar 31/03/26
22		18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	$ 76.240,00	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
23		**20**	**NO PREVISTOS**				**86,88 días**	**lun 29/12/25**	**sáb 28/03/26**
24		N.P.20.1	REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44,97	$ 336.251,93	5 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26
25		P-006-2026	Suministro y aplicación de pintura antigrafiti en dos manos sobre superficie preparada, incluyendo materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta ejecución. Considera andamios certificados para trabajos en altura y el uso de todos los elem	M2	300,00	$ 11.073.616,92	5 días	mar 24/03/26	sáb 28/03/26

Predecesoras	Nombres de los recursos
4	
6	
9	
15	

Predecesoras	Nombres de los recursos
12	
18	
25	
9CC	
22	
19	

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A




estructura metalica para cieloraso



instalacion de omegas, parte de la estructura metalica para cielo raso



alistamiento de lamin as para ser instalas

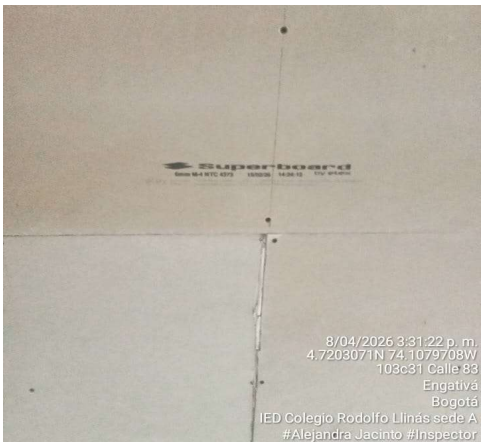

Lamina de superboard



Intalacion de laminba de superboard



instalaciondel 50% en salon C-101

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



estructura metalica para cieloraso



Instalacion de Laminas de superboard en salones B-103, B-104 y C-101



Se identifica patologia de humedad en salon B-104



Vinilo tipo 1 para tratamiento de juntas



Tratamiento de juntas con cienta de fibra de papel



Segunda capa de masillado en juntas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20//04/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



cortes para dilatadores



Instalacion de dilatadores



Tratamiento de juentas(segunda mano)



Cotinero de remate en ventanas



instalacion total de lamina de superboard



Masillado de cieloraso

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A

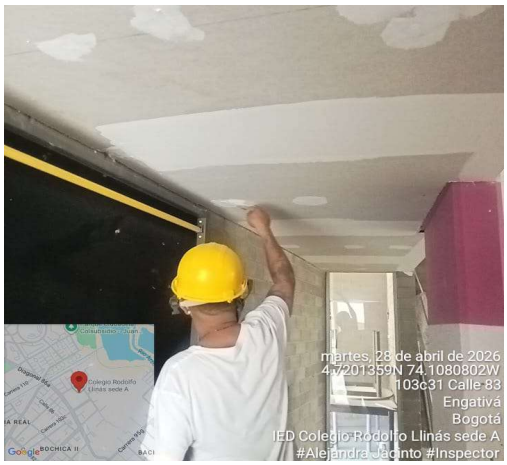

Tratamiento de juntas de cieloraso en areas falantes




Masillado de cielo raso



Remates en caja con los filos del antecho de ventanas



Apertura para remates de cortineros

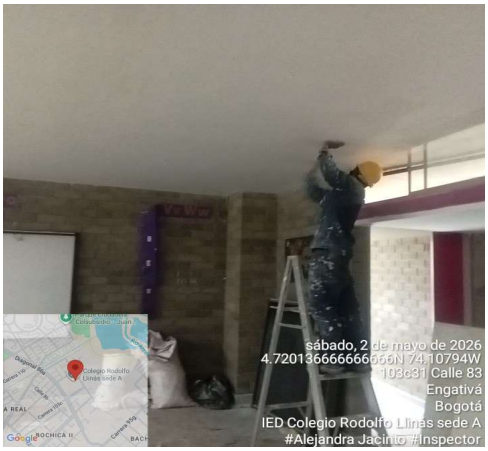

Aplicación de pintura en cieloraso



pulida ya listamiento de superficies

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B

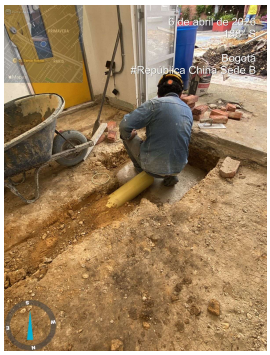


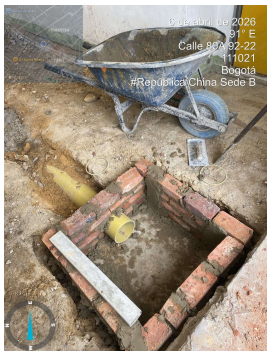


Ejecución de la caja de inspección




Extensión de material

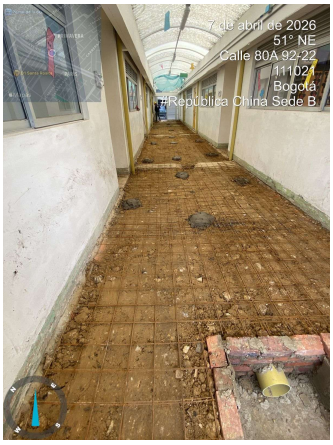

Instalación de malla

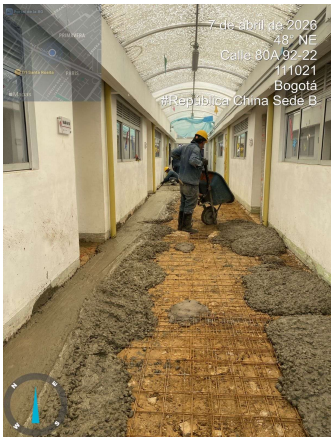


Fundición de la placa del hall

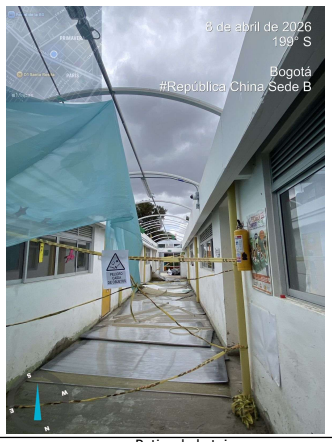

Retiro de la teja



Exacavación para zapata

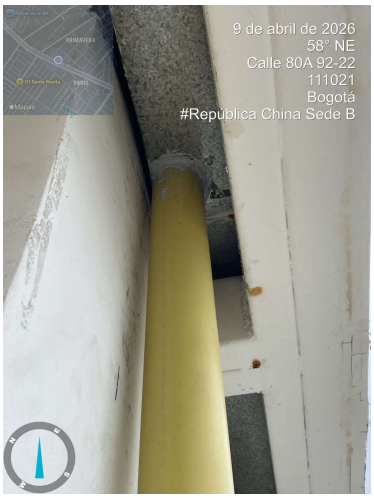

Empalme de tubería



Ejecución del shut de basuras

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B

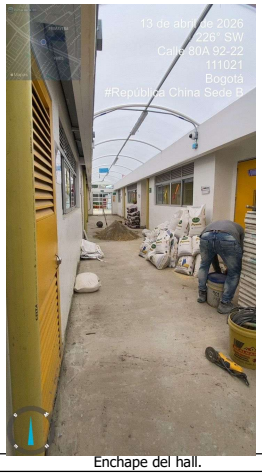

Enchape del hall.



Vista general del hall.




Trasiego de material.



Armado del acero.



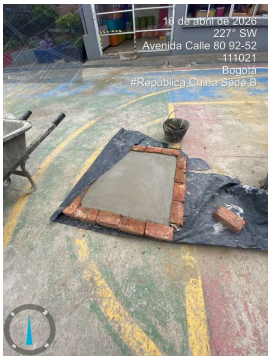

Pañete de la caja de inspección y fundición de la tapa.



Instalación de la teja en el shut de basuras.



Inicio de enchape área del shut de basuras

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Enchape de las paredes del shut de basuras.



Arreglo de los filos del área destinada para la instalación del tanque.




Fundición del área de los tanques.





Enchape del piso del shut de basuras.

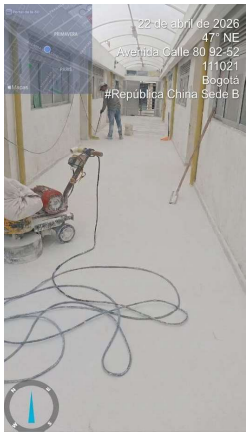


Pulido del piso del hall.




Instalación de la tubería.



Fundición de la columna

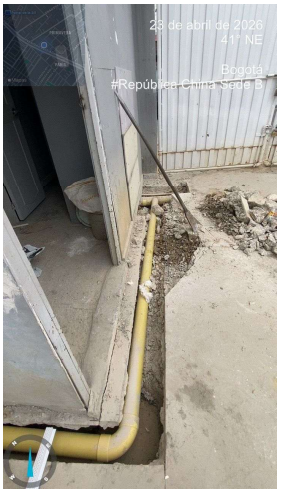

Demolición de la placa para el ajuste de la tubería.

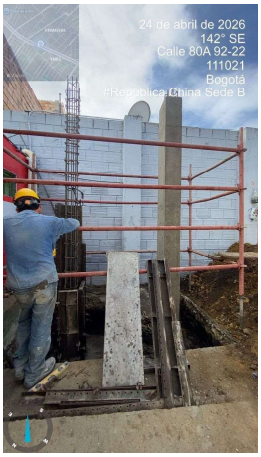

Fundición de la segunda columna en el área de los tanques

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Fundición del área de los tanques.




Pulido del piso del hall.




Excavación para la caja eléctrica.



Instalación de las lámparas

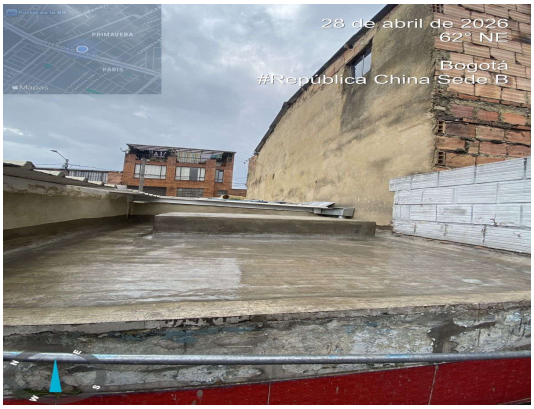


Vista general del área de los tanques.

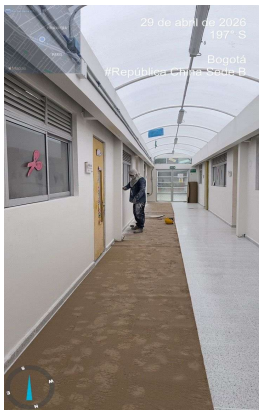

Lijado del hall previo a la pintura.



Vista general del tanque con la impermeabilización

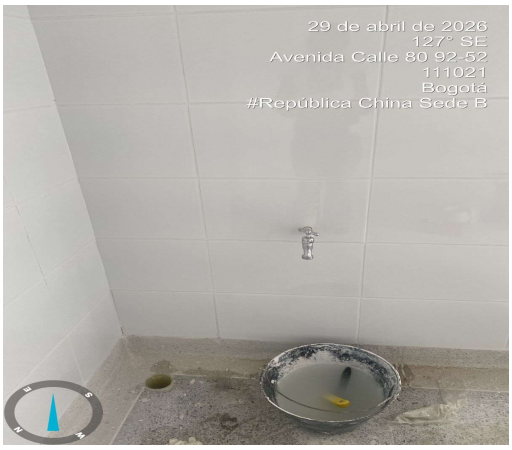

Instalación de la llave en el área del shut de basuras.



Dilatanción de la placa

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Drenaje con manguera y camara CCTV en carcamos _zona canchas



Retiro de rejillas para el drenaje



Retiro de unidad sanitraria para ingreso de la maraca CCTV



Ingreso de la camara CCTV



Equipamiento para el uso de las camaras CCTV



Visualizacion de tuberia por medio del recorrido con la camara CCTV

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A

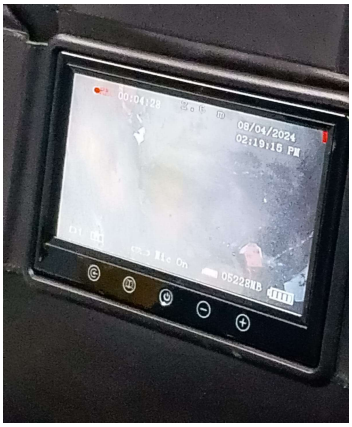

Visualizacion de tuberia por medio del recorrido con la camara CCTV



Exvacacion en piso para Tener un correcto recorriedo con la camara CCTV



Resane de piso donde se excavo para introducir la camara

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



No se registran actividades



No se registran actividades



No se registran actividades



No se registran actividades

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A




Señalización y cerramiento en baños de hombre y mujeres (profesores)



Desmonte de unidades sanitarias en baños de hombres y mujeres (tanques)



Demolicion de enchape de piso

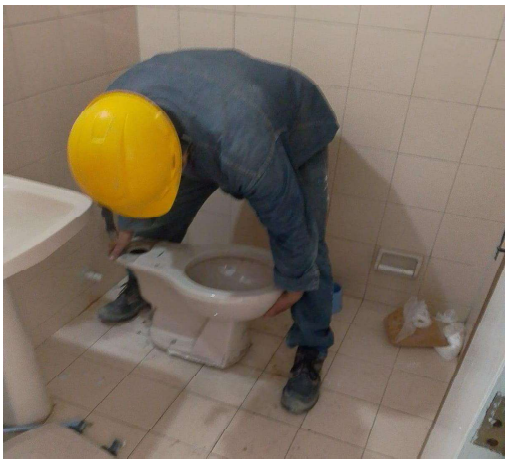

Desmonte de unidad sanitaria para introducir camara CCTV



En el desmonte de unidades saniotrtarias se evidencias vencimientos de los aparatos



Inspeccion de tuberia con camara CCTV

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Demolicion de piso y parte parcial de la placa para la introduccion de la camara CCTV



dacion de unidad sanitaria en orientacion y coordinacion despues de la isnpeccion con camara

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 | **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Demolicion de enchape de piso en baños de hombres y mujeres



Baños sin enchape



Instalacion de tuberia para ventilación



acopio de material para enchape de piso



Instalacion de enchape de psio



Instalacion de puerta para cuarto de archivo

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop #¡REF! dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Alineación de platinas



Retiro de RCD



Concreto fundida de dados



Excavación de zapatas ,se evidencia el Rajon para su fundida.



Dados fundidos



Dados



Fundida de placa de espesor (10 cm)



Cilindros , tipo muestra



Curado de placa



Fundida de dados

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Estructura metálica



Fundida de placa



Área de cerramiento



Estructura metálica



Instalación de estructura metálica



Platina y dado



Estructura metálica



Acopió de estructura metálica



Lamina Steel deck



Estructura metálica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Pintura en Estructura metálica



Estructura metálica



Soldadura en Estructura metálica



Área de cerramiento



Perno en lámina stell deck



Malla electrosoldada



Lamina Steel deck lista con malla electrosoldada



Fundida de placa



Fundida de placa



Placa , aulas modulares

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop #¡REF! dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Instalación de estructura metálica



Instalación de perfileria metálica



Pintura en estructura metálica



Pintura y soldadura de perfileria metálica



Instalación de estructura metálica



Instalación de estructura metálica



Instalación de viga canal



Pintura en perfileria metálica



Cubierta aulas modulares



Instalación de teja tipo sandwich

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



INSTALACION DE 4 LAMPARAS HERMETICAS DISTRIBUIDAS EN LA LUZ DE LA COLUMNA.

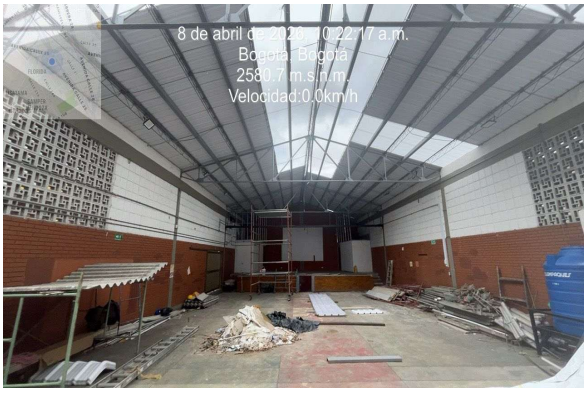

INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF



INSTALACION DE CUBIERTA TRASLUCIDA

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Pintura de bordes del escenario




Pintura de borde del escenario




Retiro de angeo para pintar la columna



Pintura de la columna

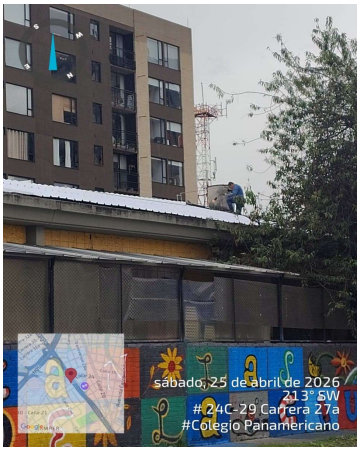

Instalación de manto asfáltico

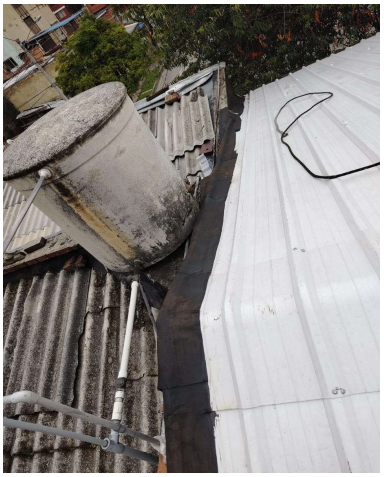

Instalación de manto asfáltico



Instalación de manto asfáltico



Instalación de manto asfáltico

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Excavación Manual



fundicón de la placa



limpieza bajo cubierta



ajuste del anden



fundida de carcamo



fundida del anden

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **#¡REF!**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** #¡REF!

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



desmonte de anden



llegada de material
