PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

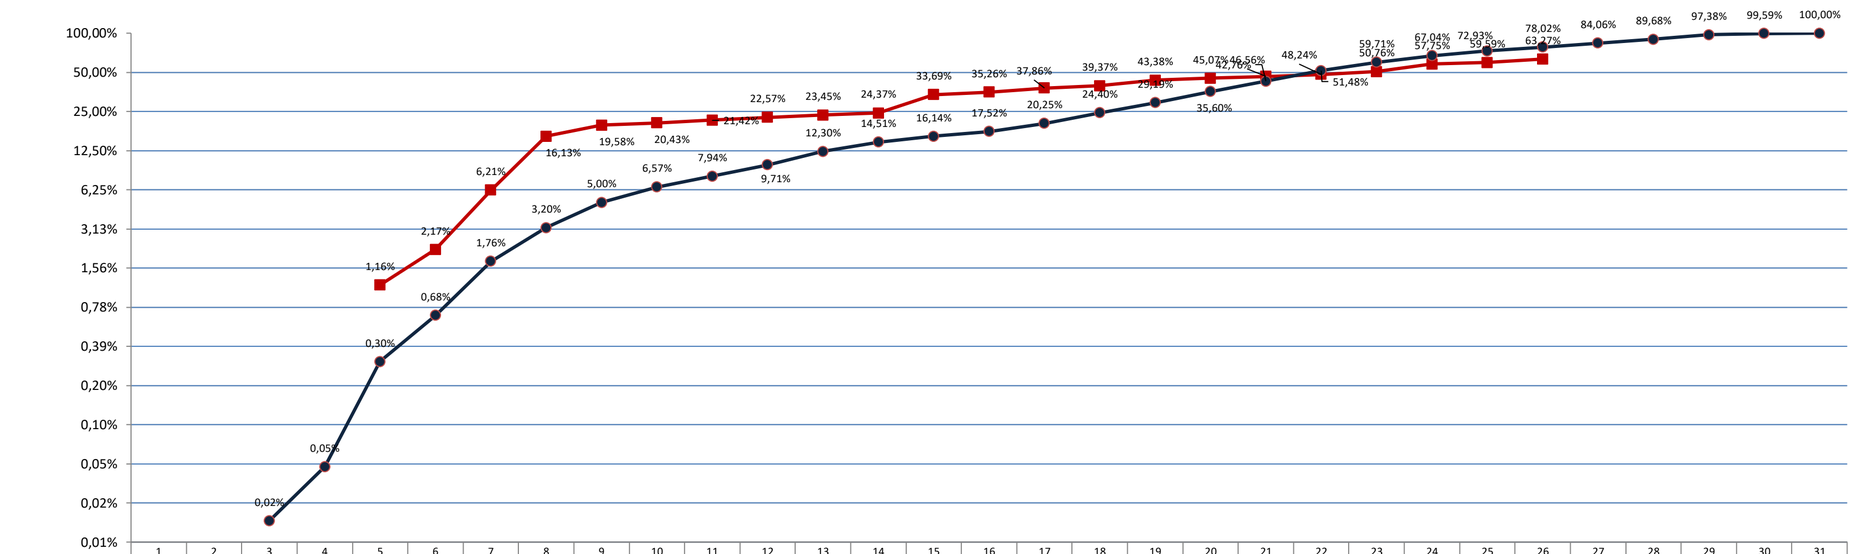

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%	63,27%					
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de reja en el cerramiento perimetral con su debida aplicación de pintura, adicional realizó obras de subsanación de detalles en todos los espacios a entregar en este frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la instalación total de la reja correspondiente al cerramiento perimetral del área intervenida, lo cual representa un avance en las actividades de delimitación y control del proyecto. No obstante, durante este mismo periodo no se observó la presencia de personal operativo ejecutando actividades en el frente de obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede no presenta sobre avance ni retraso. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD y material acopiado cerca a los individuos arbóreos, por lo que se recomienda hacer la protección adecuada, realizar jornadas de orden y aseo y disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra hacer la respectiva entrega final de espacios para este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, pulida de piso

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 5 trabajadores realizando actividades de estucado y limpieza de muros. Asimismo, se verificó la ejecución de inspecciones a los andamios utilizados en el frente de obra, evidenciando condiciones adecuadas para su uso. De igual manera, se observó que el personal contaba con el uso adecuado de los elementos de EPP conforme a las actividades desarrolladas. No obstante, se recomienda al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo en el área de trabajo, así como garantizar el adecuado acopio y disposición de materiales y residuos, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas en el frente de obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada, sin embargo algunas de las actividades no se les cambio fecha de inicio, debido a que se considera que no de deben programar demasiadas actividades dias previos a la finalizacion del contrato.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:

15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 10 de marzo
5.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 13 de marzo
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
12.2.4 PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
5.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.2.16 PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
5.1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
9.2.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
12.2.2. PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
NP 03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se encuentra material de construcción y los residuos, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante el comité realizado en la SED en esta semana se acordo que el tablero electrico quedara dentro de el salon de la emisora.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de muro en drywall y cubierta para la conformación del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se continua con la instalación de la cubierta para el shut de basuras. Durante la actividad, se realizó recomendación al personal respecto al uso adecuado y permanente del casco como elemento de protección personal, con el fin de prevenir riesgos asociados a la labor y garantizar el cumplimiento de las normas de SST.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 23,82%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en obra. No obstante, se recomienda al contratista realizar el ajuste y/o mantenimiento de la puerta de cerramiento, toda vez que se encuentra en mal estado y actualmente está sostenida en un solo punto, lo que representa un riesgo de desprendimiento por acción del viento. Se sugiere atender esta situación de manera prioritaria con el fin de prevenir posibles incidentes y garantizar condiciones seguras en el área.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada, sin embargo algunas de las actividades no se les cambio fecha de inicio, debido a que se considera que no de deben programar demasiadas actividades dias previos a la finalizacion del contrato.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas:

16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) programado al 9 de marzo
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
La mayoria de actividades programadas no ejecutadas corresponden a las relacionadas con el Shut

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, presenta un campamento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante la reunion realizada en la SED se hablo de las capas de pintura para la cancha de juegos y se establecio que se realizaran con los items 7.1.10, 7.2.23 y un NP correspondiente a las demarcaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de estructura metálica para la conformación del domo en la zona de urbanismo del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 2 trabajadores realizando actividades de instalación de la estructura de la cubierta. Se verificó que el personal contaba con el uso adecuado de los elementos de EPP, incluyendo máscara de soldadura conforme a la labor ejecutada. No obstante, se recomienda al contratista garantizar la correcta instalación de los andamios, asegurando que cuenten con todos sus componentes estructurales y de seguridad, evitando el uso de elementos improvisados como tablas para su soporte. Adicionalmente, se evidenció la señalización del área de trabajo, contribuyendo a la prevención de riesgos en el frente de obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 6,96%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El cerramiento en algunos tramos se encuentra en mal estado, se encuentra materiales, residuos en el frente acopiados, pero debe contar con la debida protección y señalización, por lo que se realizó un llamado de atención, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de pañete en muros exteriores e interiores de los baños. Adicional realizó la aplicación de pintura blanca en muros internos de las baterías sanitarias.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se recomienda al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo en el área de trabajo, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas. Durante este periodo, se evidenció la presencia de 3 trabajadores ejecutando actividades de pañetado en los muros exteriores y realizando remates de enchapado en la parte interior de los baños. Se verificó que el personal contaba con el uso adecuado de los EPP correspondientes a las labores desarrolladas. Se sugiere además asegurar que los materiales y herramientas se mantengan organizados y debidamente almacenados, para evitar riesgos de accidentes y facilitar la eficiencia en la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 0,46%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD en lonas y acopiados (volumen alto), por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA). Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 se da autorización a la tala de 16 individuos arbóreos en esta institución, ya se realizó la tala a todos para bajo el procedimiento adecuado, disponer todos los residuos vegetales y al finalizar la actividad silvicultural presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA)

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar el espacio de las baterías sanitarias para el 15 de abril del presente año.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de manto asfaltico en las cubiertas requeridas dentro del alcance del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 4 trabajadores realizando actividades de instalación de manto y estucado en la cubierta de los baños. Se verificó que el personal contaba con la dotación y el uso adecuado de los EPP, acordes a las labores ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 2,09%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
Las actividades que generan retraso obedecen a las actividades de construcción del shut de basuras.
2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
3.3.2 ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra RCD en el frente, por lo que se recomendó realizar la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) .

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos contractuales establecidos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de estructura metálica para la extensión de la cubierta del pasillo de circulación. Adicional realizó la instalación de muro en drywall y cubierta en el shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se continuó con la presencia de 2 soldadores realizando el detallado de cordones de soldadura. Se verificó que el personal contaba con la dotación completa y el uso adecuado de los EPP requeridos para la actividad. Adicionalmente, se evidenció el acompañamiento del personal de SST durante la ejecución de las labores, garantizando el cumplimiento de las medidas preventivas y protocolos de seguridad establecidos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado y residuos en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de desmonte de estructura que colindaba con el edificio vecino. Seguidamente realizó la instalación de estructura metálica independiente para la conformación de muros e independizar el bloque del colegio con el del edificio vecino.

2. Seguridad Social y SST: Durante este periodo, se llevó a cabo la instalación de la estructura metálica para la conformación de muros en drywall, así como la aplicación de pintura sobre dicha estructura, actividades que implican riesgos asociados a trabajo manual, manipulación de herramientas y posible caída de objetos. En este sentido, se realizó seguimiento en campo evidenciando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, especialmente el uso adecuado de los EPP. Se recomienda de manera reiterativa al personal el uso permanente del casco de seguridad, con el fin de prevenir lesiones por golpes, caídas de objetos o incidentes durante la ejecución de las labores.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se evidencia material y residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de malla electrosoldada y concreto de 3000 psi para la conformación de placa en el cuarto de bombas de la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante este periodo, se realizó la aprobación de ingreso del personal requerido para ejecutar actividades en el colegio. Se evidenció la presencia de 3 trabajadores —el maestro de obra y sus ayudantes— realizando labores de terminación de encofrado con el fin de preparar la fundición de la placa. Se verificó que todo el personal contaba con la dotación completa y el uso adecuado de los EPP cumpliendo con los estándares de seguridad establecidos para este tipo de actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se realiza la mezcla ce concreto en batea metálica, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 14 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	6/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	26 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
6 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	72,20%	84,37%		84,37%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	51,59%	51,60%		75,16%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	87,21%	90,19%		66,37%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	57,39%	57,39%		43,85%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	75,20%	81,99%		75,03%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	23,42%	26,52%		26,06%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	52,94%	58,12%		60,21%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	3,00%	66,00%		63,59%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	0,00%	34,18%		33,62%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						64,31%		58,70%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		50,09%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%		$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						77,64%		55,56%		$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
5	12	1	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	64,31%	0,00%	87,68%
PROGRAMADO	58,70%		
ATRASO	5,62%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			



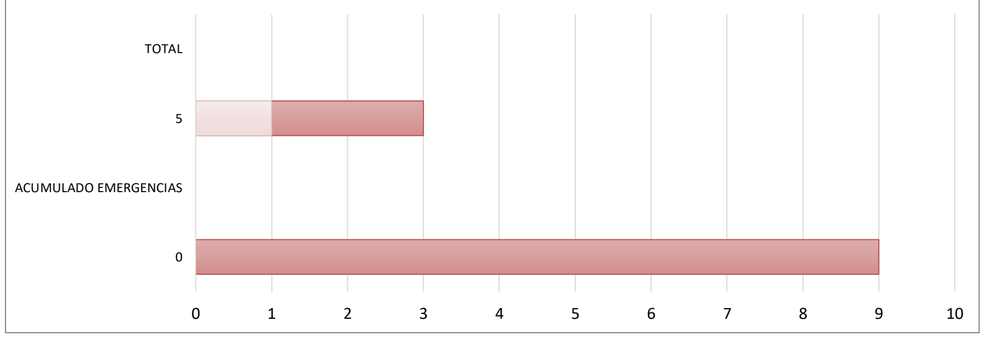

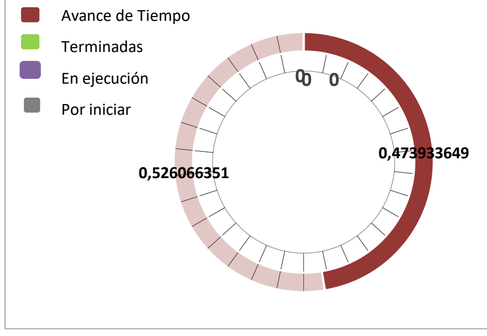

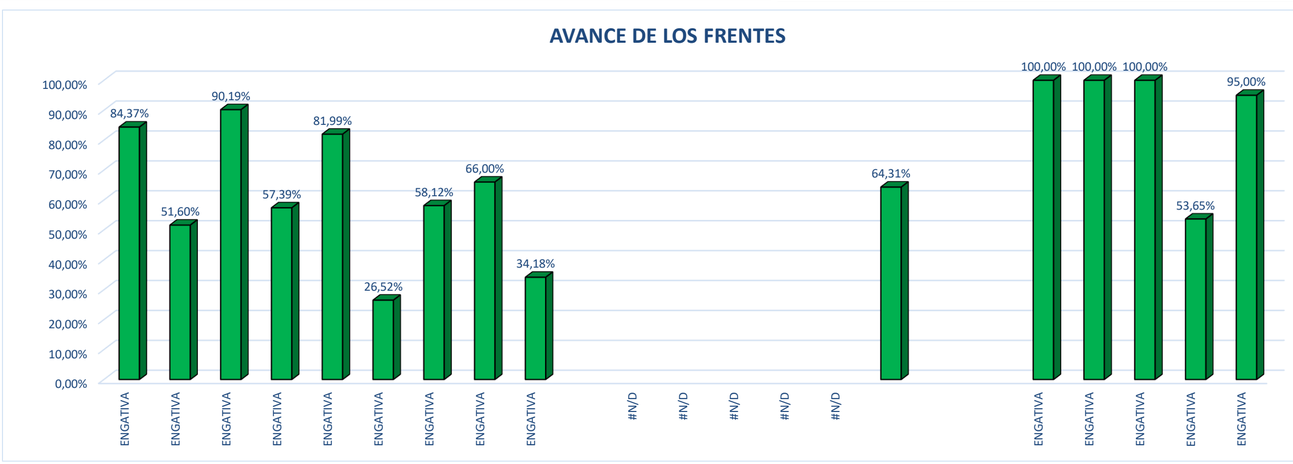

OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Retiro de cerramiento



Recolección de escombros y retiro de cerramiento.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Pulida de baldosa



Emboquillada para juntas de enchape



Residuo de rasqueteado de pared



Estucado de muro



Estucado de antepecho



Estucado de vanos

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Rasqueteado de pared. Limpeiza



Estucado de muro(1 capa)

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de cubierta - shut de basuras.



Instalación de muro en drywall - shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Vista general de la obra sin actividades.



Vista general de la obra sin actividades.

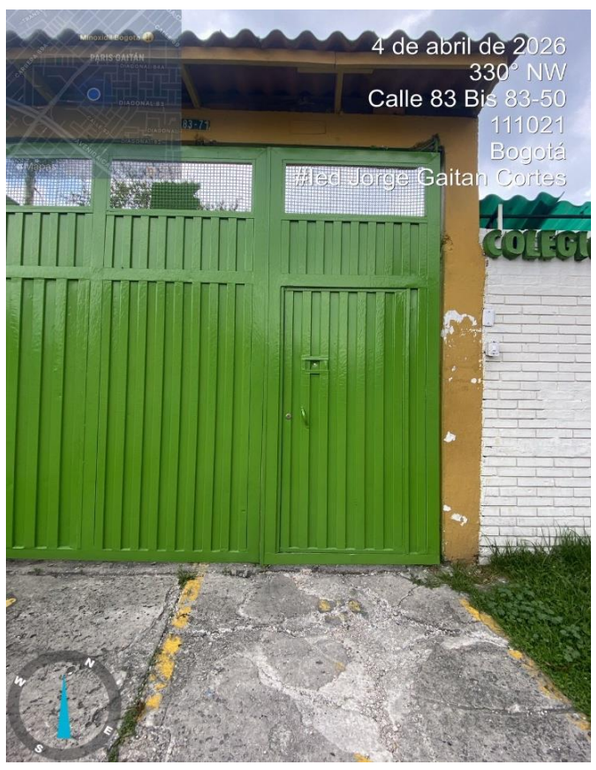

Puerta Institución



Vista general de la obra sin actividades.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de tierra negra para jardín - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Aplicación de pintura en muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Aplicación de pintura en muros interiores - Zona baños.



Aplicación de pintura en muros interiores - Zona baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de manto asfaltico.



Instalación de manto asfaltico.



Instalación de manto asfaltico.



Instalación de manto asfaltico.



Instalación de manto asfaltico.



Instalación de manto asfaltico.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de estructura metálica para la cubierta del tanque de almacenamiento.




Instalación de estructura metálica para extensión de cubierta - hall de circulación.




Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.

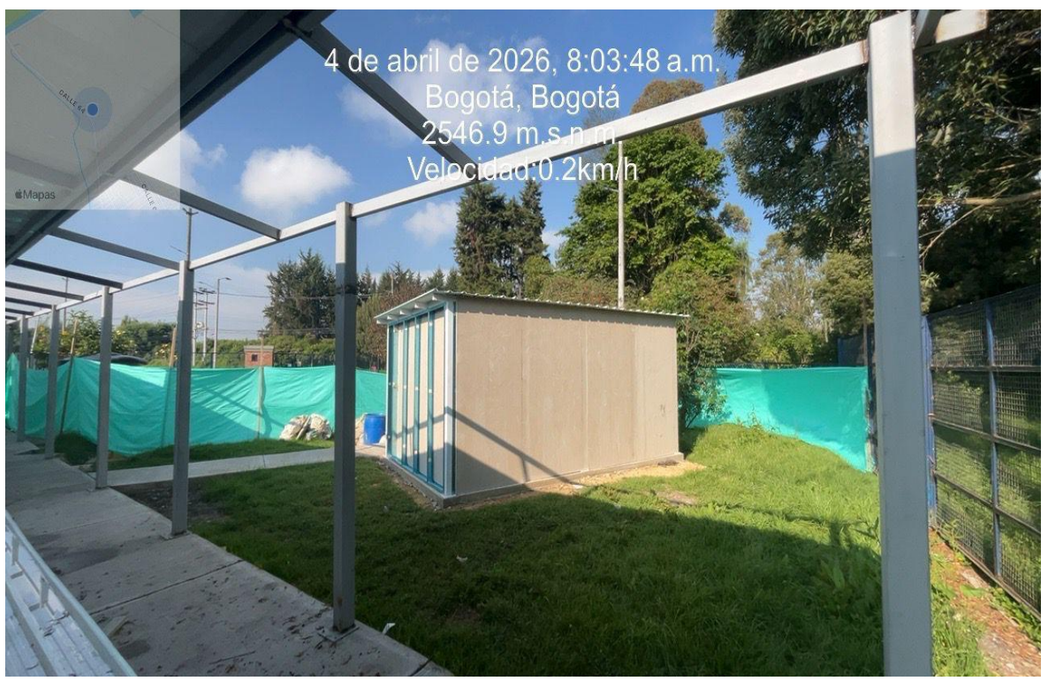

Instalación de muro en drywall para shut de basuras.

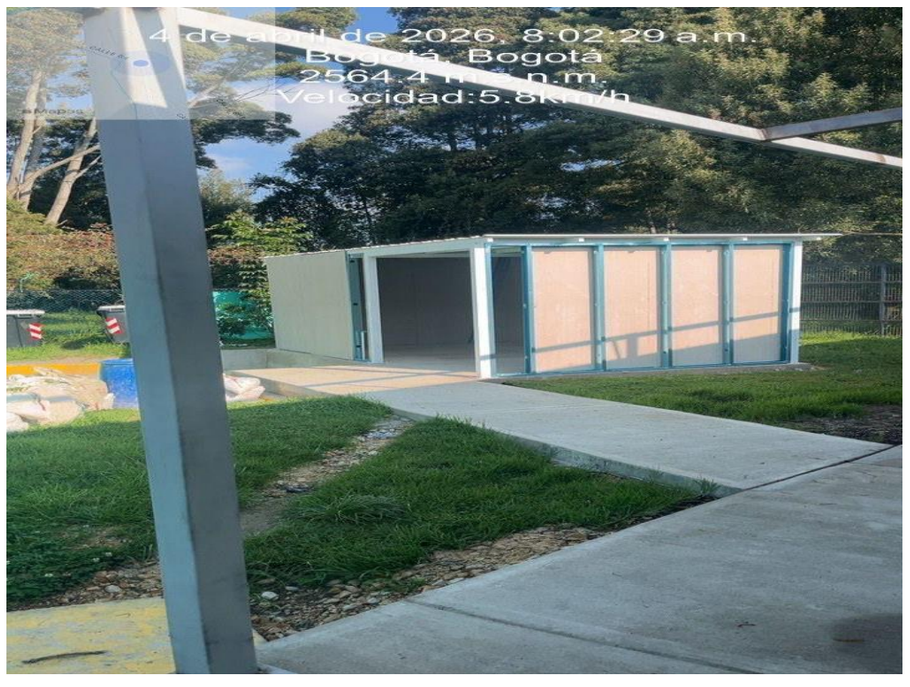

Instalación de muro en drywall para shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B




Desmonte de estructura existente en las aulas.



Instalación de estructura metálica para muro en drywall.



Instalación de estructura metálica para muro en drywall y aplicación de pintura al mismo.

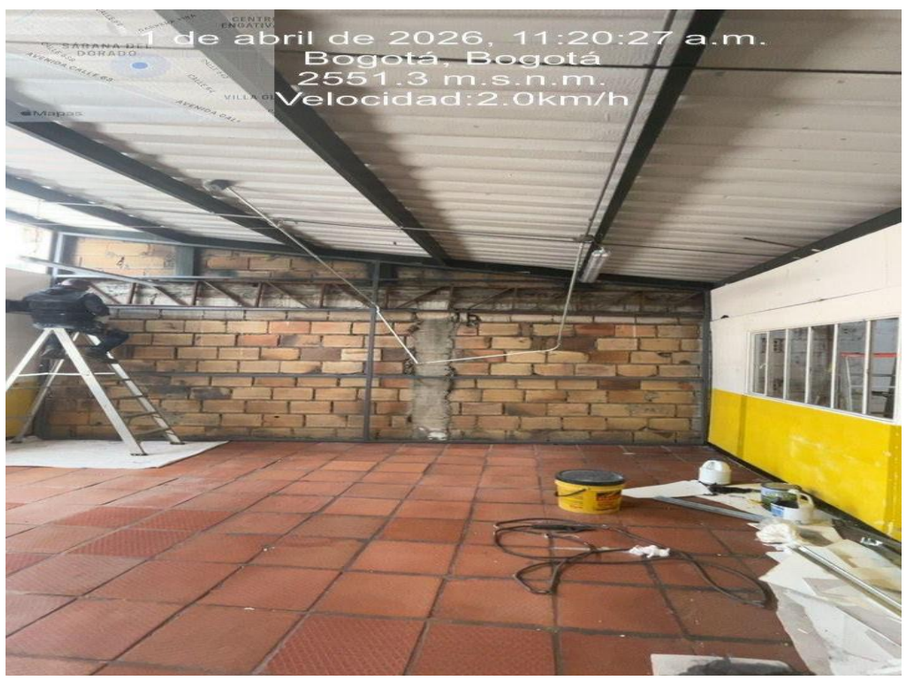

Instalación de estructura metálica para muro en drywall y aplicación de pintura al mismo.



Instalación de estructura metálica para muro en drywall.



Instalación de estructura metálica para muro en drywall.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A



Suministro e instalación de malla electrosoldada y formaleta para placa.



Suministro e instalación de malla electrosoldada y formaleta para placa.



Suministro e instalación de malla electrosoldada y formaleta para placa.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa donde van los tanques y bombas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	3,33%	57,47%	Obra Física Ejecutada (%)	6,45%	69,41%
Valor de la Obra programada:	$ 92.244.723,00	$ 1.591.179.443,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 178.675.328,00	$ 1.921.802.960,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	54,14%	62,96%	**11,94%**
Durante el periodo	3,33%	6,45%	
Acumulado actual	57,47%	69,41%	

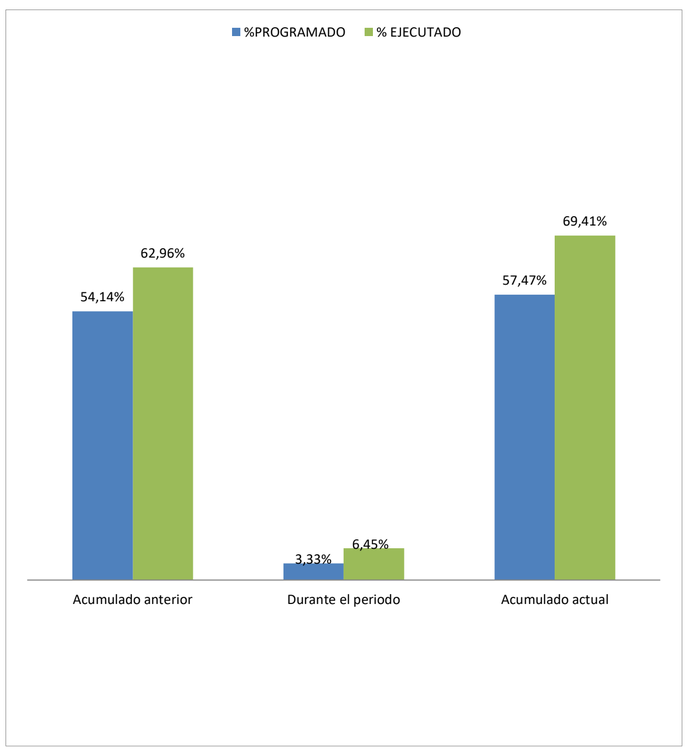

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	5,68%	5,68%	84,37%	90,05%	5,68%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	9,99%	8,10%	-1,89%	85,15%	59,71%	-25,44%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	1,68%	2,37%	0,69%	68,05%	92,56%	24,51%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	9,48%	0,00%	-9,48%	53,32%	57,39%	4,07%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	11,04%	11,04%	75,03%	93,03%	18,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	5,16%	17,88%	12,72%	31,22%	44,40%	13,18%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	1,33%	8,74%	7,41%	61,54%	66,86%	5,32%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**3,95%**	**7,69%**	**3,74%**	**65,53%**	**72,00%**	**6,47%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	2,37%	6,72%	4,35%	65,96%	72,72%	6,76%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	3,06%	3,72%	0,66%	36,68%	37,90%	1,22%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**2,72%**	**5,22%**	**2,51%**	**51,32%**	**55,31%**	**3,99%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	55,00%	55,00%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	95,00%	95,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	78,25%	78,25%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 20.000.000,00		
			55,56%	80,92%		$ 290.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 138.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 340.158.088,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.888.851.473,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.308.707.841,00	$ 1.308.707.841,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.888.851.473,00	$ 1.548.693.385,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	57,47%	**69,41%**	**11,94%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	191	**22,81**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

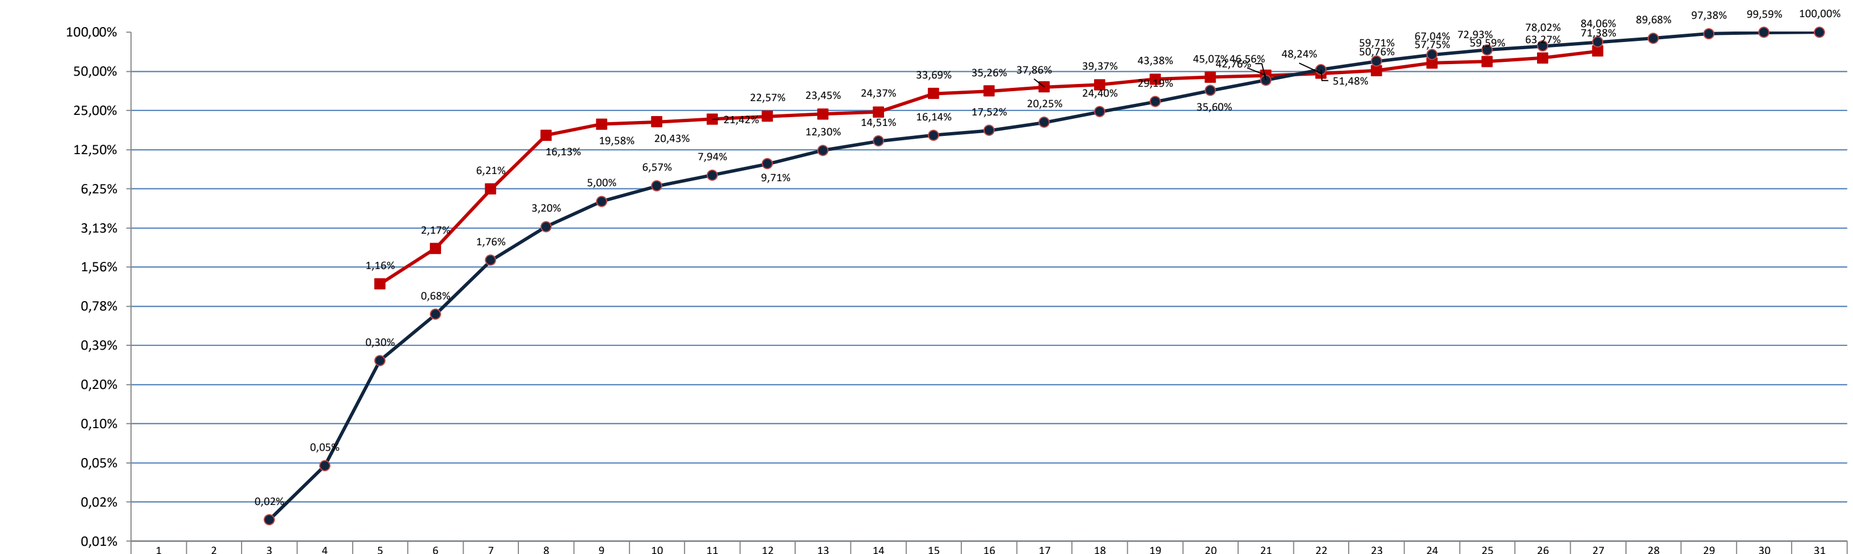

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%	63,27%	71,38%				
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de subsanación de detalles en todos los espacios a entregar en este frente, tales como aplicación de otra mano al cerramiento perimetral, aplicación de pintura bituminosa en la cubierta del shuta y emboquillado de piso en el salón 103.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció el acopio de material y pintura en el punto de soldadura correspondiente a la reja del cerramiento colindante con el jardín infantil. Esta actividad se desarrolló en condiciones adecuadas de orden y aseo, minimizando riesgos asociados a caídas, tropiezos y exposición a materiales. Asimismo, se verificó que el área de trabajo cumple con las condiciones básicas de seguridad, manteniendo una adecuada organización de los elementos y control de residuos. Por otra parte, se acordó con el contratista el suministro de una escalera en condiciones seguras y certificadas, con el fin de realizar la revisión de la impermeabilización de la cubierta.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede sobre avance del 5,68%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD y material acopiado cerca a los individuos arbóreos, por lo que se recomienda hacer la protección adecuada, realizar jornadas de orden y aseo y disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra hacer la respectiva entrega final de espacios para este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, excavacion para carcamo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 6 trabajadores ejecutando actividades de estucado de muros, conformación de filos y fachadas en los salones 1 y 2, así como labores de excavación para la construcción del cárcamo. Se verificó que el personal cuenta con la dotación y hace uso adecuado de los EPP, acorde con las actividades desarrolladas. Igualmente, se evidenció el uso adecuado de andamios para la ejecución de trabajos en altura, cumpliendo con condiciones seguras. Sin embargo, se recomienda fortalecer las prácticas de orden y aseo en la zona de trabajo, así como implementar una adecuada separación de residuos, con el fin de prevenir riesgos locativos y garantizar condiciones seguras. Finalmente, se valida que el cerramiento perimetral del área de trabajo se mantiene en adecuadas condiciones, contribuyendo al control de accesos y a la seguridad del entorno.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: 16.1.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 10 de marzo
5.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 13 de marzo
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
12.2.4 PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
5.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
5.1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
9.2.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
12.2.2. PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
NP 03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE
5.1.31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) 14.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se encuentra material de construcción y gran parte de residuos sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante el comité realizado en la SED en esta semana se acordo que el tablero electrico quedara dentro de el salon de la emisora.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de piso en granito debidamente emboquillado, destroncado y pulido, adicional aplicó una mano de pintura a los muros en superboard del shut de basuras. Cabe mencionar que también realizó la instalación de la red y punto electrico que suministra la energía al shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 4 trabajadores en obra: 2 de ellos ejecutando actividades de instalación de cielo raso y dos 2 realizando conexiones eléctricas.
Se verificó que las labores se desarrollan de manera simultánea, por lo que es necesario garantizar la adecuada coordinación de actividades para prevenir interferencias y riesgos asociados. Asimismo, se recomienda asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo el uso de EPP, control de riesgos eléctricos y condiciones seguras para trabajos en altura, según aplique.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 24,51%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso al igual que los residuos, se recomendo al contratista realizar la disposicion, garantizar jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se realizaron actividades de limpieza de las juntas de dilatación, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y orden en el área de intervención. Adicionalmente, se llevó a cabo el marcaje de las zonas donde se presenta empozamiento de agua, con el fin de identificar puntos críticos y prevenir riesgos locativos como resbalones y caídas al mismo nivel. Se recomienda implementar las medidas correctivas correspondientes para el adecuado drenaje y control de estas áreas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada, sin embargo algunas de las actividades no se les cambio fecha de inicio, debido a que se considera que no de deben programar demasiadas actividades dias previos a la finalizacion del contrato.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: 4.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) programado al 9 de marzo
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
2.1.2. EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.1.6. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
2.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
5.1.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
7.1.2. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
16.1.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, asimismo una parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante la reunion realizada en la SED se hablo de las capas de pintura para la cancha de juegos y se establecio que se realizaran con los items 7.1.10, 7.2.23 y un NP correspondiente a las demarcaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de bancas en concreto, lamina en policarbonato y tierra negra para jardín en la zona de urbanismo del frente. Adicional realizó el arreglo en adoquín de la zona afectada por el minicargador.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció el retiro del cerramiento previamente existente en el área de intervención. No obstante, se identifica que aún persiste material pendiente por recoger en la parte posterior, así como la presencia de algunos elementos desorganizados dentro del área de trabajo. Esta condición puede generar riesgos locativos, tales como tropiezos, caídas al mismo nivel y obstrucción de rutas de tránsito. Por lo anterior, se recomienda al contratista realizar de manera oportuna la recolección del material restante y fortalecer las prácticas de orden y aseo, con el fin de garantizar condiciones seguras en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 18,00%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el retiro del cerramiento perimetral se encuentra residuos en la parte posterior, por lo que se realizó un llamado de atención para la recolección y disposición de estos, al igual se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de pañete en muros exteriores e interiores de los baños. Adicional realizó la aplicación de pintura blanca en muros internos de las baterías sanitarias, también realizó la instalación de ventanería, orinales y puertas en acero inox.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 2 trabajadores ejecutando actividades de estucado en los muros exteriores de los baños. Se verificó que el cerramiento perimetral del área de intervención se encuentra debidamente instalado, ajustado y en adecuadas condiciones, garantizando el control de acceso y la seguridad del entorno. Asimismo, se recomienda mantener el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución de las actividades, incluyendo el uso adecuado de EPP y el orden y aseo en el área de trabajo, con el fin de prevenir riesgos asociados.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 13,18%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta residuos en lonas y acopiados (volumen alto), parte de estos en zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA). Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 ya se realizó la tala de 16 individuos arbóreos y se debe presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA)

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar el espacio de las baterías sanitarias para el 15 de abril del presente año.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de tapa para caja de inspección ubicada en el sendero peatonal, adicional inició actividades de instalación de platinas en el área donde va el shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, no se evidenció personal ejecutando actividades en el área de intervención. No obstante, se verificó el ingreso de perfilería destinada al cuarto de almacenamiento. Se recomienda garantizar que el material ingresado sea ubicado de manera organizada y segura, evitando obstrucciones en las áreas de tránsito y posibles riesgos locativos. Asimismo, se debe asegurar su correcto apilamiento y estabilidad, con el fin de prevenir caídas de materiales y condiciones inseguras en el área.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 5,32%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra RCD en el frente, por lo que se recomendó realizar la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de subsanación de actividades en la batería sanitaria, la cual fue demarcar la caja de inspección.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de estructura metálica para el cerramiento del tanque de almacenamiento y cubierta, aplicó pintura a la estructura instalada para la extensión de la cubierta del pasillo de circulación. Adicional realizó la instalación de alistado de piso y baldosa en granito en el shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de emboquillado del enchape del piso en el shut de basuras. El personal presente cuenta con la dotación y hace uso adecuado de los EPP, conforme a las labores desarrolladas. Adicionalmente, se inició la instalación de la cubierta en el área destinada para el tanque de almacenamiento. Para estas actividades, se recomienda garantizar el uso adecuado de andamios, verificando que estos se encuentren en condiciones seguras, correctamente armados y con sus respectivos sistemas de protección, con el fin de prevenir riesgos asociados a trabajos en altura.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado y residuos en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de muro en superboard y aplicación de masilla y estuco para la conformación del muro.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció la presencia de 3 trabajadores ejecutando labores de instalación de láminas de superboard en muros. Se verificó que el personal cuenta con la dotación completa y hace uso de tapabocas para el desarrollo de las actividades. No obstante, se recomienda reforzar el uso obligatorio de casco de seguridad, con el fin de prevenir riesgos asociados a golpes o caída de objetos. Adicionalmente, se recomienda implementar y mantener condiciones adecuadas de orden y aseo al finalizar la jornada laboral, con el propósito de minimizar riesgos locativos y garantizar un entorno de trabajo seguro. Adicionalmente, durante el periodo reportado, se recibió por parte del contratista el Informe Mensual No. 6, el cual será objeto de revisión y verificación conforme a los lineamientos establecidos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se evidencia material y residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de tanque de almacenamiento en el cuarto de bombas y la instalación de tubería hacía la cocina del colegio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se realiza la mezcla ce concreto en batea metálica, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 15 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	13/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	26 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
6 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	84,37%	90,05%		84,37%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	51,60%	59,71%		85,15%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	90,19%	92,56%		68,05%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	57,39%	57,39%		53,32%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	81,99%	93,03%		75,03%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	26,52%	44,40%		31,22%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	58,12%	66,86%		61,54%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	66,00%	72,72%		65,96%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	34,18%	37,90%		36,68%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						72,00%		62,37%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		50,09%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%		$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						77,64%		55,56%		$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
5	12	1	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	72,00%	0,00%	87,68%
PROGRAMADO	62,37%		
ATRASO	9,63%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

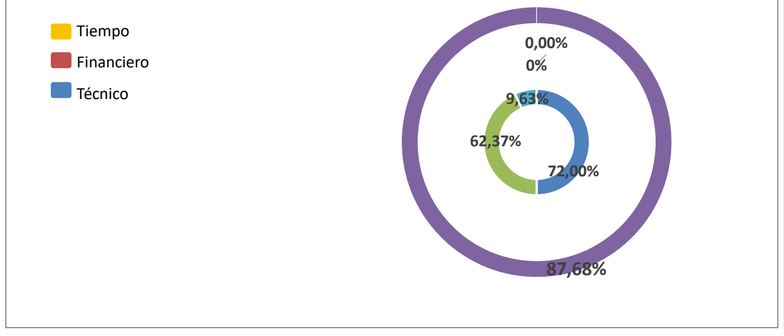

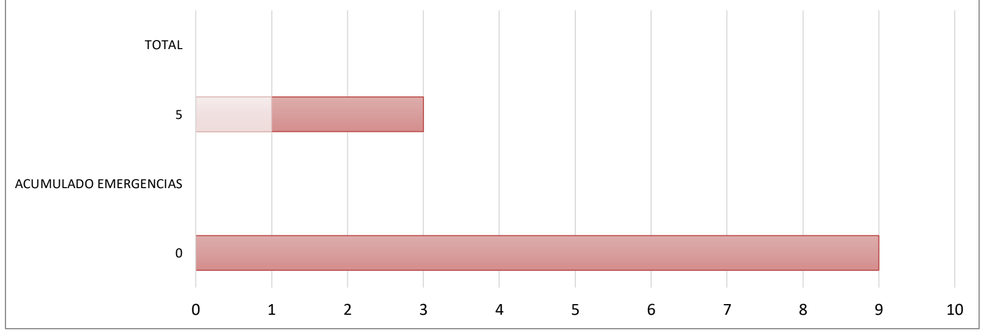

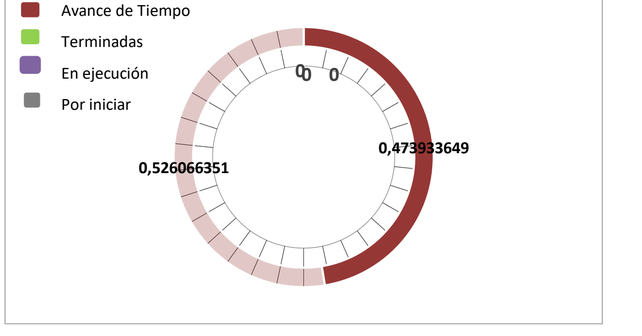

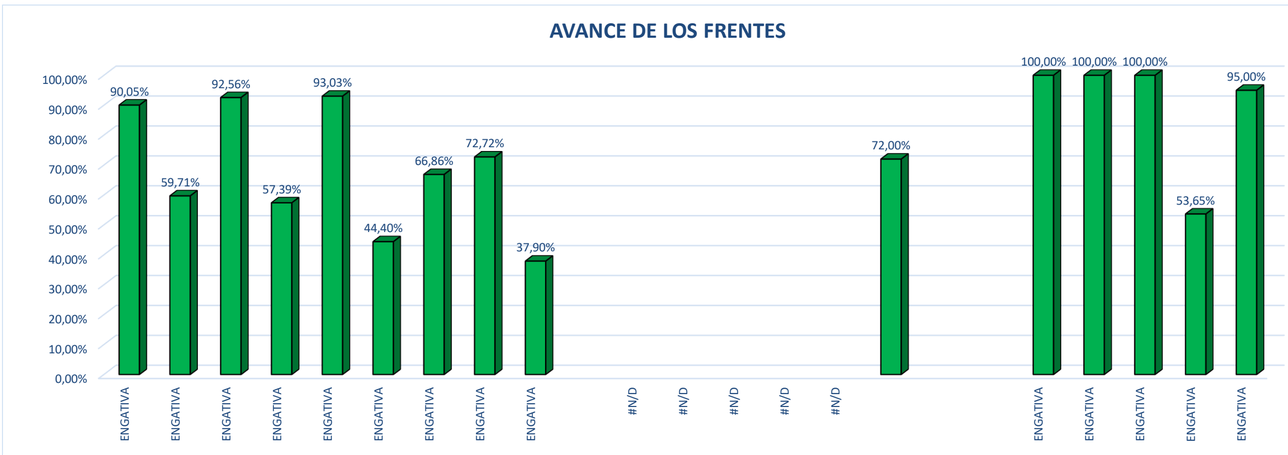

OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Aplicación de pintura a reja de cerramiento.




Aplicación de pintura a reja de cerramiento.



Instalación de enchape en muros de shut de basuras.



Instalación de enchape en muros de shut de basuras.

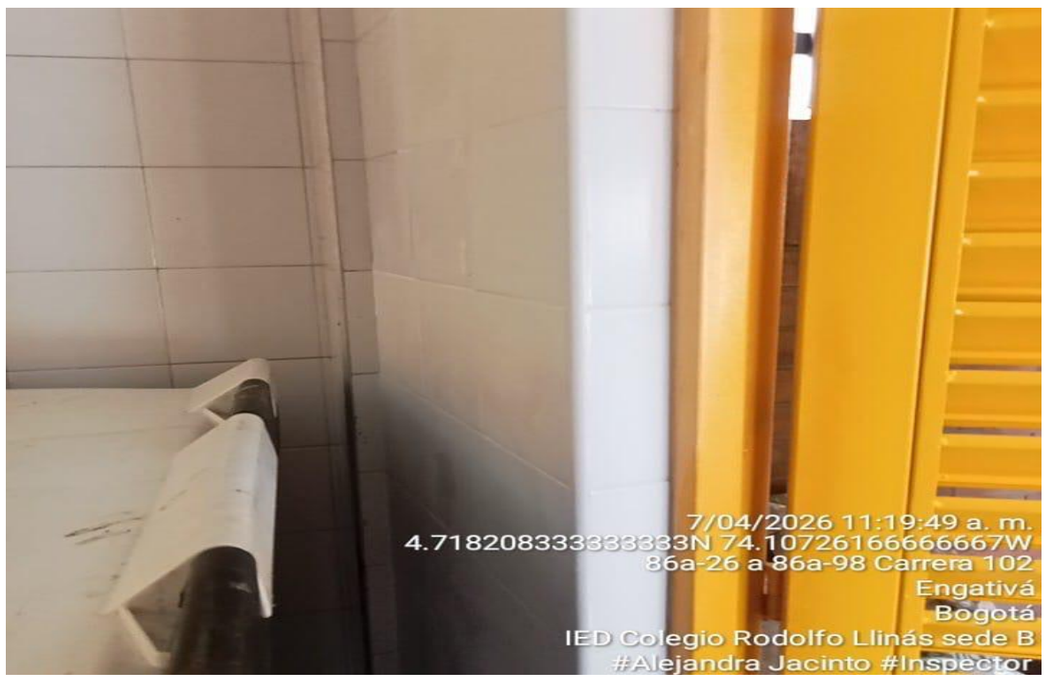

Instalación de enchape en muros de shut de basuras.



Aplicación de pintura a reja de cerramiento.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Estucado de muro en parte superior del muro



Estucado en zona baja de pared



Limpieza de muro



Estucado de muro (columnas)



Replanteo para ubicación del carcamos



Excavacion para el carcamo

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Acopio de material



Revestimiento de pintura en muro de fachada



Estucado de vanos



Alistamiento de vanos para instalacion de ventanas



Llegan ventanas para ser instaladas



Estucado de vanos de puertas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Emboquillado de baldosa en granito - shut de basuras.



Instalación de canal - shut de basuras.



Emboquillado de baldosa en granito - shut de basuras.



Instalación de red electrica - shut de basuras.



Destronque de piso en granito- shut de basuras.



Aplicación de pintura a muro en superboard - shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

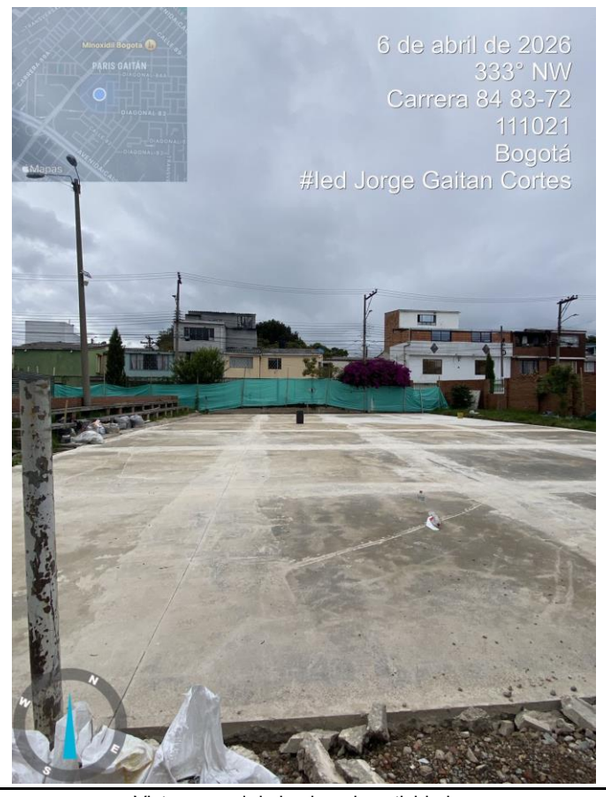

Vista general de la obra sin actividades.



Vista general de la obra sin actividades.

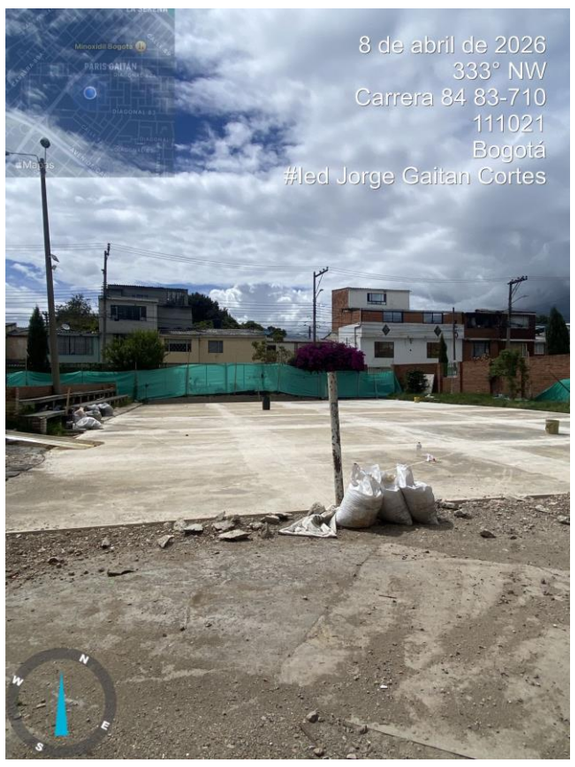

Vista general de la obra sin actividades.



Limpieza de las juntas de dilatación y marcación de zonas de empozamiento de agua.





Sellado de juntas de dilatación y correcciones de estancamiento de agua

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A

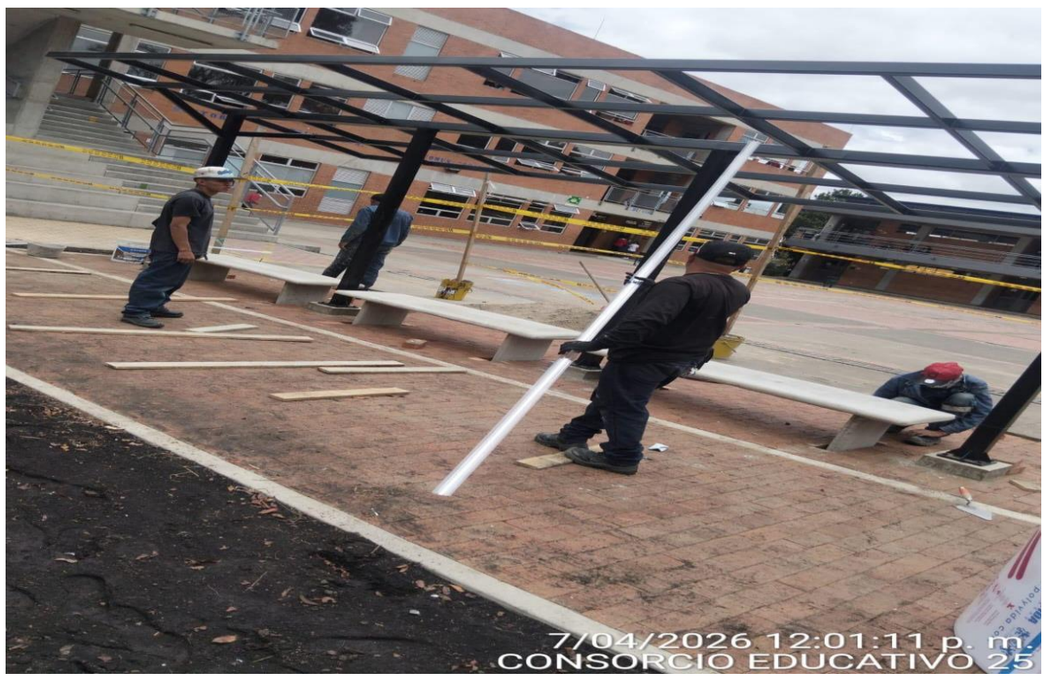

Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.

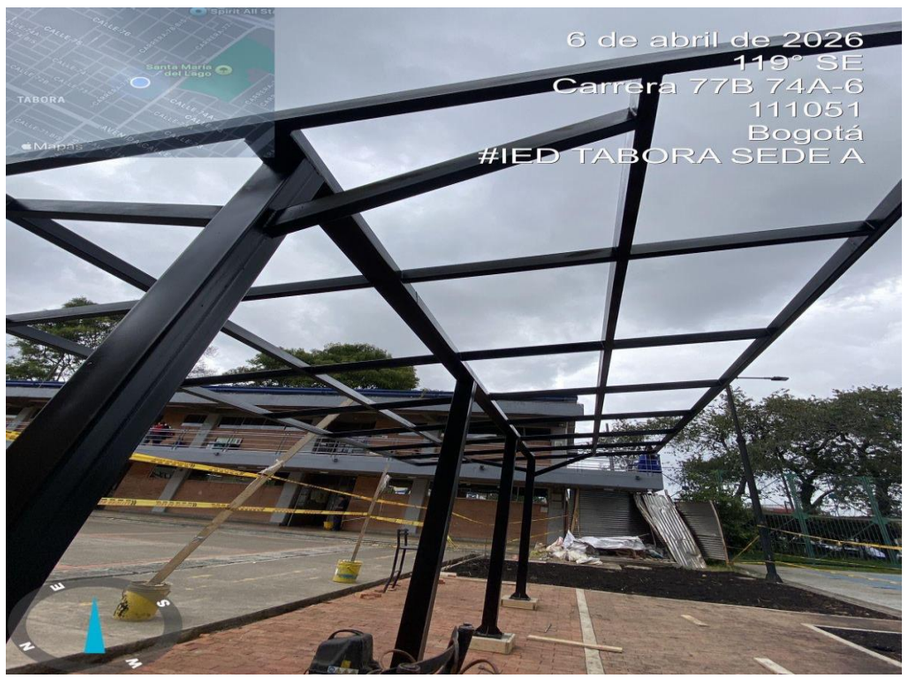

Aplicación de pintura para estructura de domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de bancas en concreto - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de lamina en policarbonato para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Vista general de actividades de obra culminadas - Zona lateral izquierda de la cancha.



Vista general de actividades de obra culminadas - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de estuco para muros exteriores - Zona baños.



Instalación de estuco para muros exteriores - Zona baños.



Instalación de estuco para muros exteriores - Zona baños.



Instalación de orinales - Zona baños.



Instalación de lavamanos - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de estructura para ventanería - Zona baños.



Instalación de vidrio para ventanas - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Construcción de tapa en el sendero peatonal.



Aplicación de pintura para estructura de cubierta - Aula de música.



Aplicación de pintura para estructura de cubierta - Aula de música.



Construcción de tapa en el sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A




Aplicación de pintura para estructura metálica de la cubierta del tanque de almacenamiento.



Aplicación de pintura para estructura metálica de extensión de cubierta - hall de circulación.



Instalación de laminas en superboard - shut de basuras.

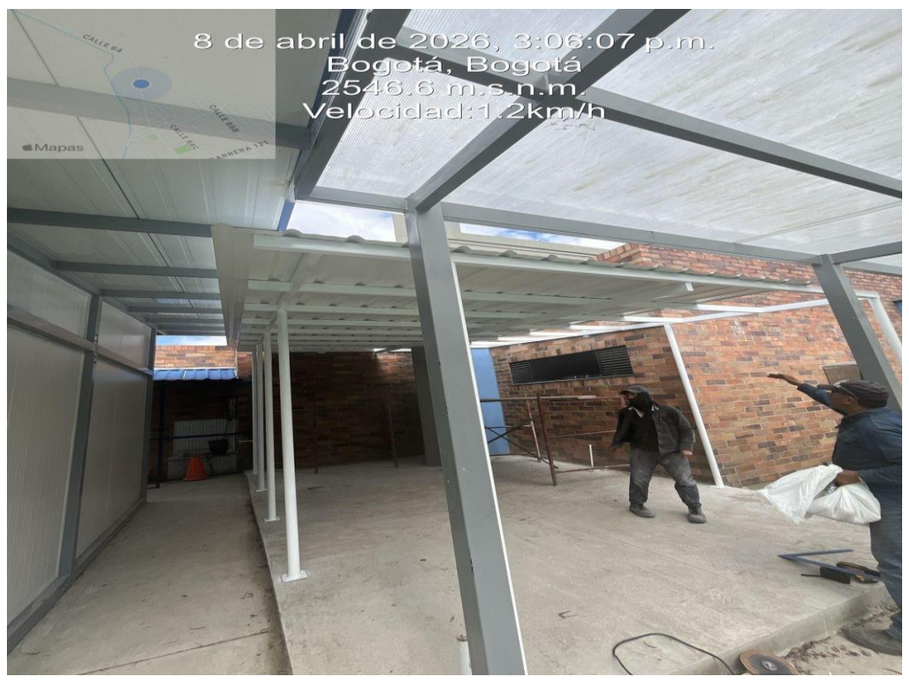

Instalación de cubierta - Tanque de almacenamiento.



Instalación de piso en granito pulido para shut de basuras.



Instalación de piso en granito pulido, debidamente emboquillado e instalación de media caña.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 | **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B

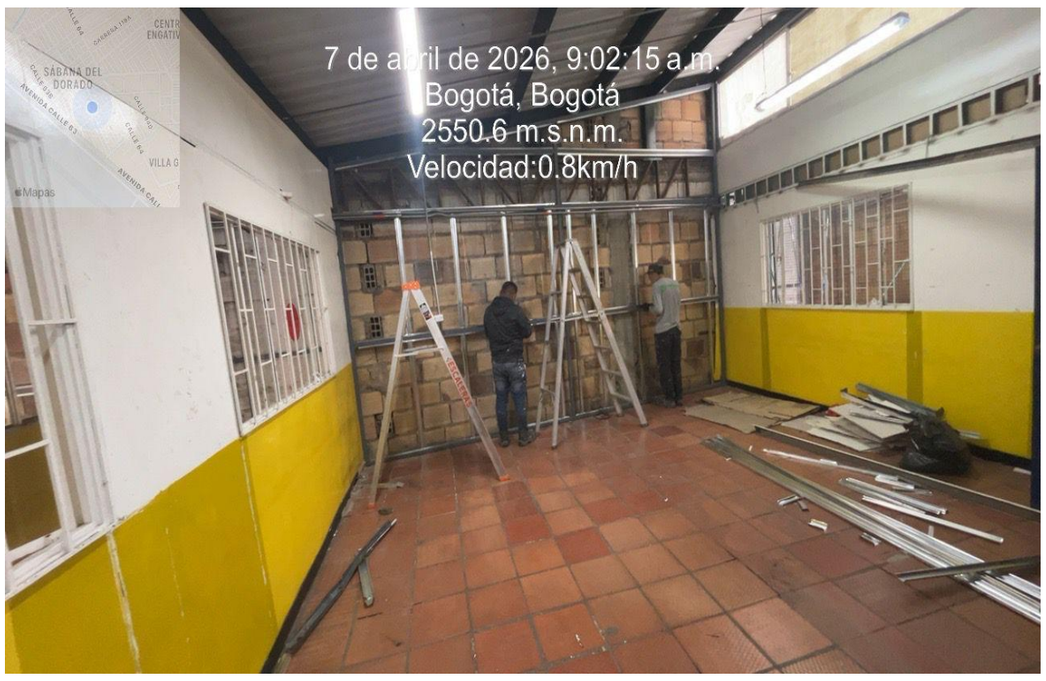

Aplicación de pintura para estructura de refuerzo.



Instalación de lamina en superboard para muro.



Instalación de lamina en superboard para muro.



Instalación de lamina en superboard para muro.



Instalación de lamina en superboard para muro.



Instalación de lamina en superboard para muro.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 27 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 27 (Consecutivo) **DEL** 6/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 191 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A



Instalación de tanques de almacenamiento.



Suministro e instalación de tubería.



Apertura de zanja en el parqueadero para instalación de tubería.



Instalación de tanques de almacenamiento.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	5,04%	62,81%	Obra Física Ejecutada (%)	4,26%	73,21%
Valor de la Obra programada:	$ 139.519.031,00	$ 1.738.954.915,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 118.052.283,00	$ 2.027.020.678,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	57,77%	68,95%	**2,27%**
Durante el periodo	5,04%	4,26%	
Acumulado actual	62,81%	73,21%	

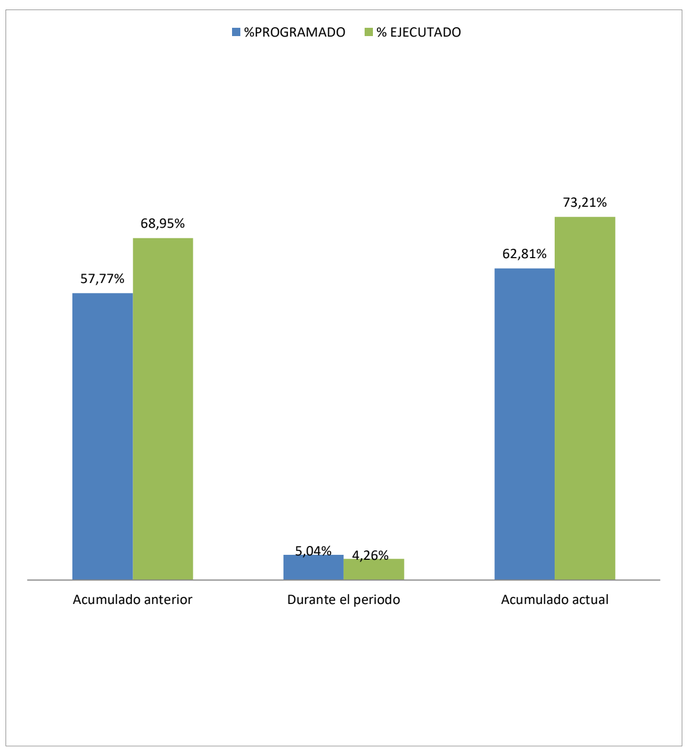

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	97,86%	-2,14%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	7,83%	3,24%	-4,59%	93,46%	60,86%	-32,60%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	4,28%	1,06%	-3,22%	72,33%	93,62%	21,29%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	16,50%	1,38%	-15,12%	70,35%	58,02%	-12,33%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	99,06%	-0,94%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	19,42%	6,46%	-12,96%	50,64%	50,86%	0,22%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	1,52%	1,81%	0,29%	63,06%	68,67%	5,61%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**7,08%**	**1,99%**	**-5,09%**	**78,55%**	**75,56%**	**-2,98%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	3,54%	11,02%	7,48%	69,50%	83,74%	14,24%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	2,46%	2,05%	-0,41%	39,14%	39,95%	0,81%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**3,00%**	**6,54%**	**3,54%**	**54,32%**	**61,85%**	**7,52%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	55,00%	55,00%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	95,00%	95,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	90,06%	90,06%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 20.000.000,00		
			55,56%	82,23%		$ 290.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 138.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 340.158.088,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.888.851.473,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.308.707.841,00	$ 1.308.707.841,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.888.851.473,00	$ 1.548.693.385,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	62,81%	**73,21%**	**2,27%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	198	**4,50**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

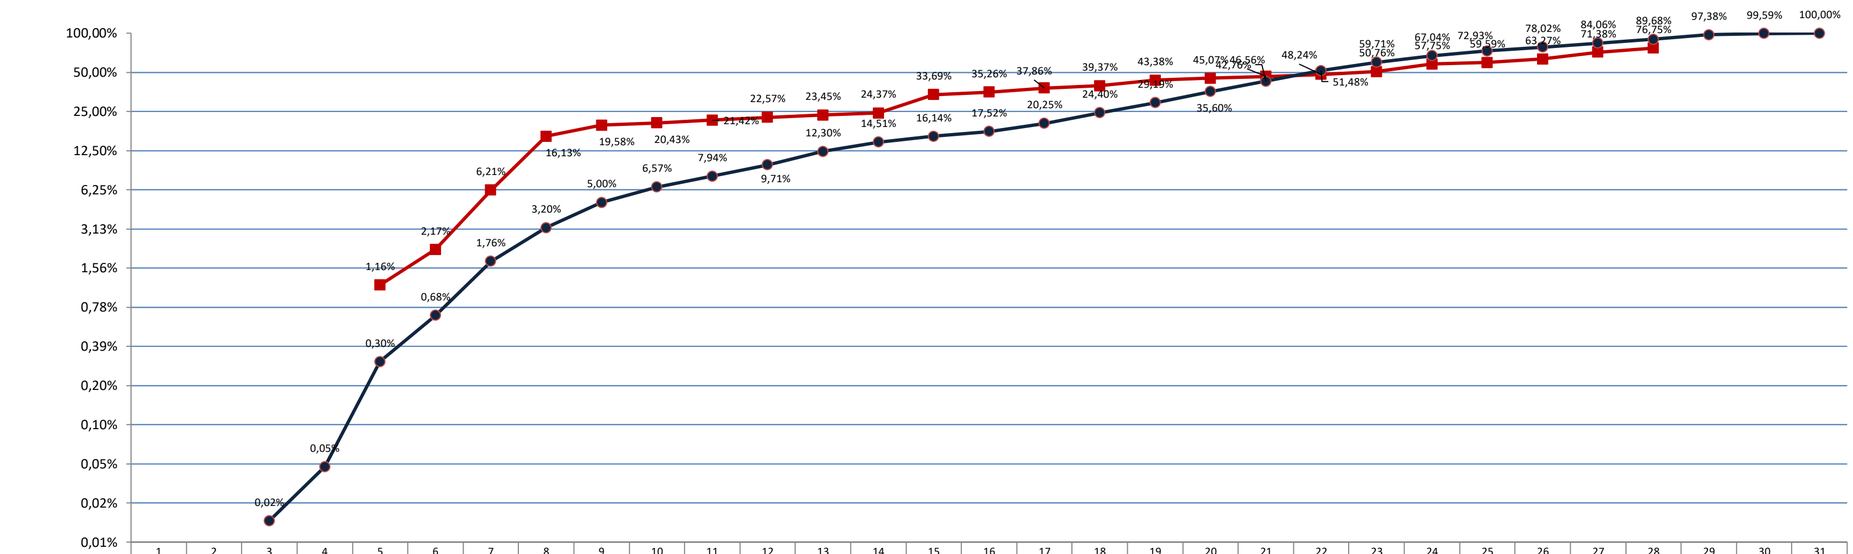

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%	63,27%	71,38%	76,75%			
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de subsanación de detalles en todos los espacios a entregar en este frente, tales como aplicación de otra mano de pintura al cerramiento perimetral, aplicación de pintura bituminosa en la cubierta del shut y emboquillado de piso en el salón 103.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se efectuaron observaciones a las áreas intervenidas por la interventoría. A la fecha, se está a la espera del inicio de las zonas pendientes por intervenir, para realizar el respectivo seguimiento en materia de SST.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede existe un retrado del 2,14%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones. El retraso obedece a temas de remates y detalles finales para entregar la sede.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD y material acopiado cerca a los individuos arbóreos, por lo que se recomienda hacer la protección adecuada, realizar jornadas de orden y aseo y disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra hacer la respectiva entrega final de espacios para este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, excavacion para carcamo, alistado en area del aula modular, inicio de trabajo electrico.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de nivelación de puertas, levantamiento de mampostería para caja de inspección y demás labores asociadas. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP, condiciones seguras en la utilización de andamios y correcta señalización de las áreas intervenidas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: 16.1.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
12.2.4 PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
5.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
5.1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
12.2.2. PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
NP 03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE
5.1.31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
14.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)
2.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se encuentra material de construcción y gran parte de residuos sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante el comité realizado en la SED en esta semana se acordo que el tablero electrico quedara dentro de el salon de la emisora.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de enchape en muros internos del shut de basura y aplicación de primera mano en el cielo raso.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de enchape de los muros del shut de basuras. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP, con el fin de mitigar riesgos asociados a la labor y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 21,29%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, cuenta con batea metálica, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso al igual que los residuos, se recomendo al contratista realizar la disposicion, garantizar jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizo cerramiento de shut, se inicio la excavacion para carcamos y se demolio placa de concreto zona baja de gradas

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de instalación de cerramiento perimetral en el área del shut de basuras, así como avance en labores de excavación. De igual manera, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los elementos de EPP, con el fin de controlar riesgos asociados a las actividades ejecutadas y garantizar condiciones seguras en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: 4.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" NP mantenimiento de puerta
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) 2.2.13. PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
2.1.2. EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.1.6. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
2.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
5.1.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
7.1.2. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
16.1.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, gran parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, quitar el material de las zonas verdes, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante la reunion realizada en la SED el ingeniero apoyo a la supervision solicito las gradas pintadas y al anden frente a ellas un acabado en escobiado, para acometida de shut pintura de señalizacion electrico y de agua

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de aseo en la zona de urbanismo donde se instaló adoquín.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de retiro de escombros, así como jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas, en preparación para la entrega del colegio.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 0,94%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones. El retraso obedece a temas de remates y detalles finales para la entrega.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el retiro del cerramiento perimetral se encuentra residuos en la parte posterior, por lo que se realizó un llamado de atención para la recolección y disposición de estos, al igual se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista realizar la subsanación de detalles y remates para la respectiva entrega del frente

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de orinales y sanitarios, adicional inició actividades de aplicación de pintura para fachada en muros exteriores. Adicional realizó la instalación de cerramiento en lona y rigido en el hall de circulación central de la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la presencia de trabajadores ejecutando actividades de lijado de muros exteriores y acondicionamiento de los orinales. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP y condiciones seguras en la utilización de andamios para el desarrollo de las labores. De igual manera, se evidenció el cerramiento perimetral en adecuadas condiciones y la respectiva señalización informativa, contribuyendo al control de riesgos y a la seguridad en las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 0,22%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta residuos en lonas y acopiados (volumen alto), parte de estos en zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar el espacio de las baterías sanitarias lo más pronto posible, ya que que logró cumplir con el compromiso de entrega que estaba programado para el 15 de abril.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de estructura metálica para la conformación del shut de basuras, adicional realizó la instalación de guarda escoba en el salón de música.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de instalación de la estructura en aluminio como fase previa para la instalación de superboard. Así mismo, se realizó verificación al diligenciamiento del Análisis de Trabajo Seguro, con el fin de identificar peligros, establecer controles y garantizar condiciones seguras durante el desarrollo de la actividad.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 5,61%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se evidencio el retiro de chatarra de este frente, se encuentra pocos residuos en el frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de lamina en policarbonato para la extensión de la cubierta del pasillo de circulación, adicional realizó la instalación de enchape en muros internos del shut de basuras y destroncó y pulió el enchape y media caña del piso del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de destronque de piso e instalación de enchape en el shut de basuras. Así mismo, se realizó recomendación al personal sobre el uso permanente y adecuado de los EPP, especialmente el casco de seguridad, con el fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las labores.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado y residuos en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de guarda escoba y aplicación de pintura para muros en superboard.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la presencia de personal ejecutando labores de pintura. Así mismo, se realizó verificación al uso adecuado de la escalera empleada para la actividad, garantizando condiciones seguras de acceso y trabajo. De igual manera, se evidenció el acopio adecuado de residuos generados, contribuyendo al orden, aseo y prevención de riesgos en el área intervenida.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se evidencia material y residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista realizar subsanación de detalles y remates para la entrega final del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de demolición y excavación de zanja donde va la tubería hacía las cocinas, adicional realizó el suministro e instalación de tubería hacía la cocina del colegio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la ejecución de actividades de instalación de tubería. Así mismo, se realizó verificación del área de trabajo, evidenciando que se encontraba debidamente señalizada con cinta de peligro y señalización informativa. De igual manera, el área intervenida presentaba condiciones adecuadas de orden y aseo, contribuyendo a la prevención de incidentes y al desarrollo seguro de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se realiza la mezcla ce concreto en batea metálica, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 16 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	20/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	13 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
19 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA			POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029	CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	90,05%	97,86%		100,00%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	59,71%	60,86%		93,46%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	92,56%	93,62%		72,33%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	57,39%	58,02%		70,35%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	93,03%	99,06%		100,00%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	44,40%	50,86%		50,64%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	66,86%	68,67%		63,06%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	72,72%	83,74%		69,50%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	37,90%	39,95%		39,14%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						75,56%		73,16%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		90,06%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%		$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						82,08%		55,56%		$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
5	12	1	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE GENERAL	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	75,56%	0,00%	93,84%
PROGRAMADO	73,16%		
ATRASO	2,40%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

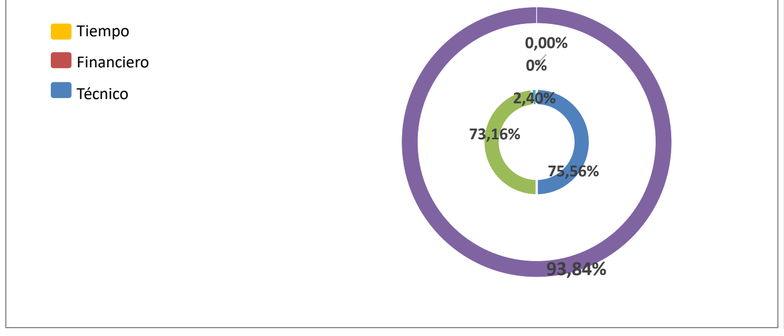

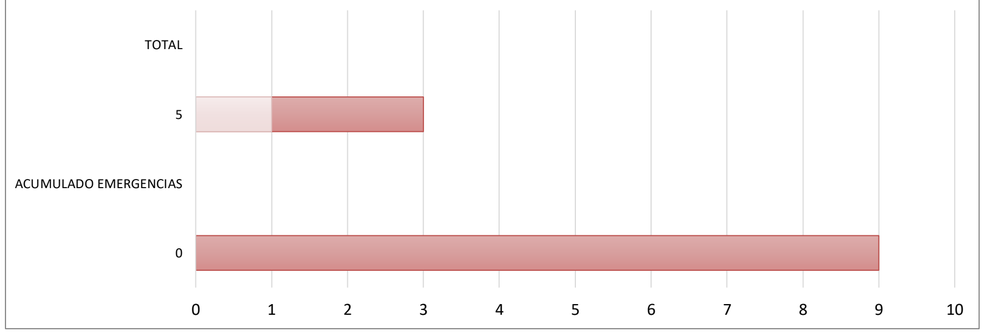

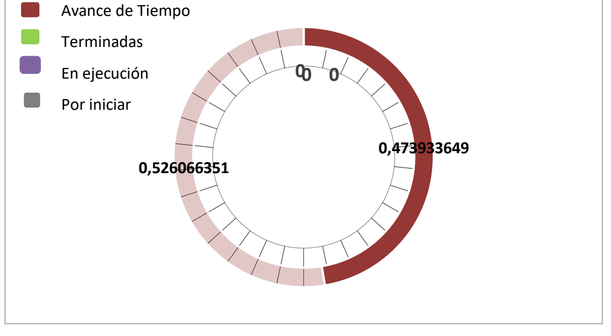

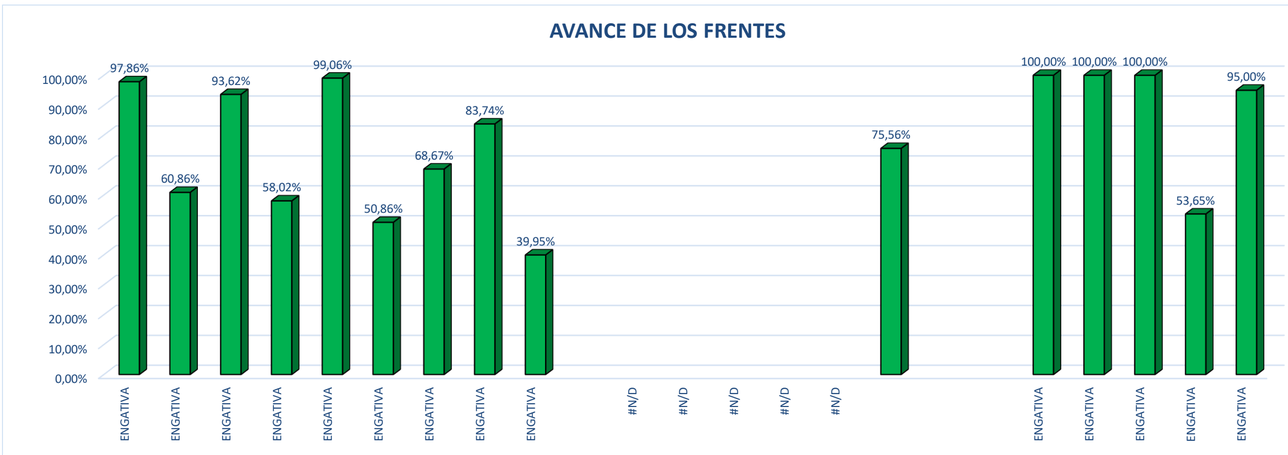

OBSERVACIONES:
