INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A





Estructura con malla electrosoldada en area modular



Fundida de placa en area modular



Instalacion de ventanas en salon 1 y 2



Nivelacion de puertas en salon de sistemas



Corte de tuberias para red electrica

Instalacion de red electrica en salon 1 y 2

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Refuerzo es estructura en cubierta



Corte de varilla electrosldada para parrilla de carcamo



Levantamiento de mamposteria para caja de inspeccion



Excavacion de carcamo



Estucado de fachada en parte posterior de salon de sistemas



Resane con estuco en muro de salon 1

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de enchape - muros interiores de shut de basuras.



Instalación de enchape - muros interiores de shut de basuras.



Instalación de enchape - muros interiores de shut de basuras.



Instalación de enchape - muros interiores de shut de basuras.



Emboquillado de enchape - muros interiores shut de basuras.



Emboquillado de enchape - muros interiores shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Inicio de excavación para el área del cárcamo.



Continuidad de la excavación del cárcamo.

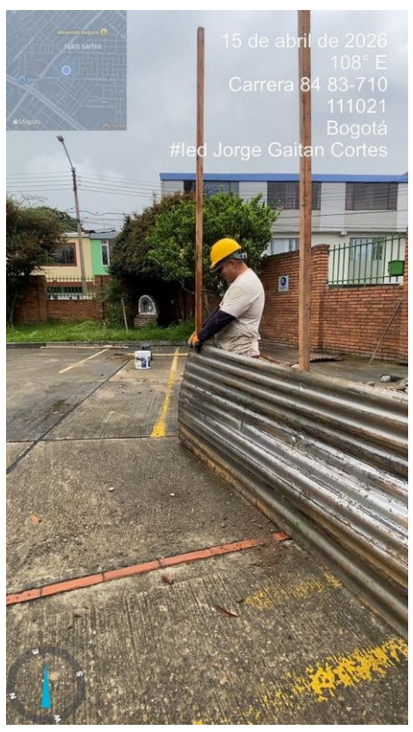




Ejecución del cerramieto del área del shut de basuras.



Vista general del cerramiento.



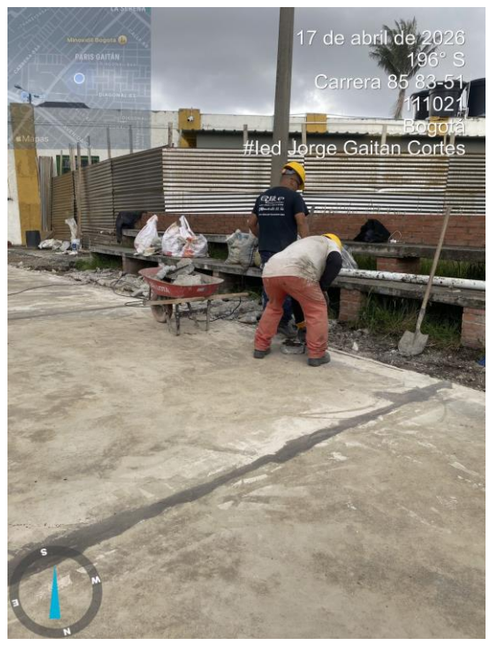

Demolición de la placa

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.




Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.

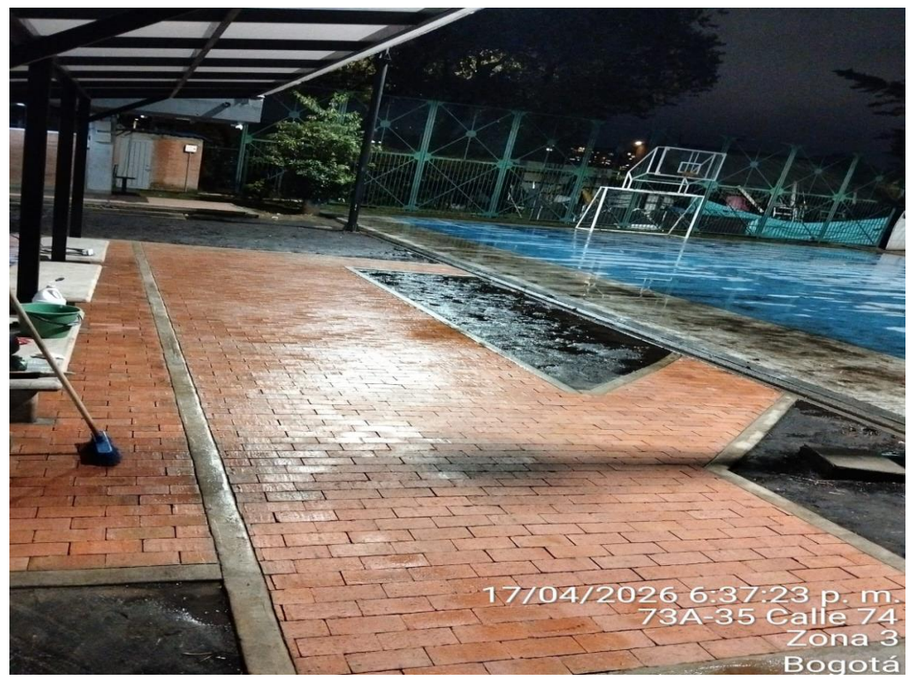

Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Divisiones en acero inox. instaladas - Zona baños.



Instalación de orinales - Zona baños.



Instalación de puntos electricos con su respectivo cableado y tubería MT - Zona baños.



Instalación de puntos electricos con su respectivo cableado y tubería MT - Zona baños.



Instalación de puntos electricos con su respectivo cableado y tubería MT - Zona baños.



Divisiones en acero inox. instaladas - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños.



Instalación de sanitarios - Zona baños.



Cerramiento perimetral - Zona hall de circulación central.



Cerramiento perimetral - Zona hall de circulación central.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de estructura metálica - Shut de basuras.



Instalación de guarda escoba - Aula de música.



Instalación de estructura metálica - Shut de basuras.



Instalación de estructura metálica - Shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de enchape - Shut de basuras.



Instalación de enchape - Shut de basuras.



Emboquillado de enchape - Shut de basuras.



Emboquillado de enchape - Shut de basuras.



Instalación de lamina en policarbonato - Pasillo de circulación.



Instalación de lamina en policarbonato - Pasillo de circulación.

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 28** **LOTE COP No 18**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B



Aplicación de pintura - Aula.



Aplicación de pintura - Pasillo.



Aplicación de pintura - Aula.



Aplicación de pintura - Aula.



Aplicación de pintura - Pasillo.



Aplicación de pintura - Aula.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B



Instalación de guarda escoba - Aula



Instalación de guarda escoba - Aula



Instalación de guarda escoba - Pasillo.



Instalación de guarda escoba - Aula

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A




Apertura de zanja para instalación de tubería - Zona parqueadero.



Apertura de zanja para instalación de tubería - Zona parqueadero.




Instalación de tubería de 1-1/2".

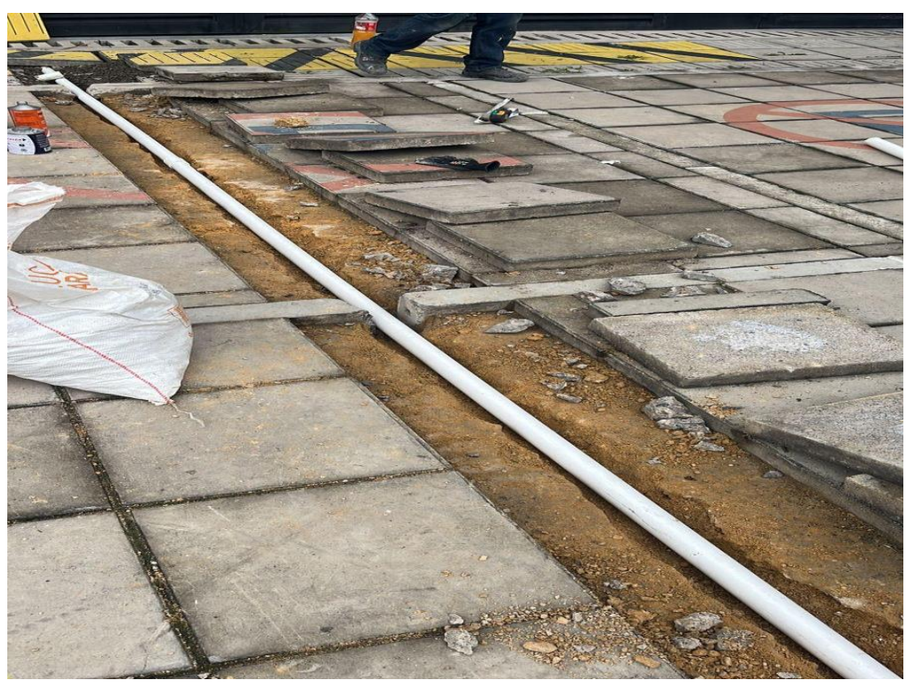

Instalación de tubería de 1-1/2".



Instalación de tubería de 1-1/2".

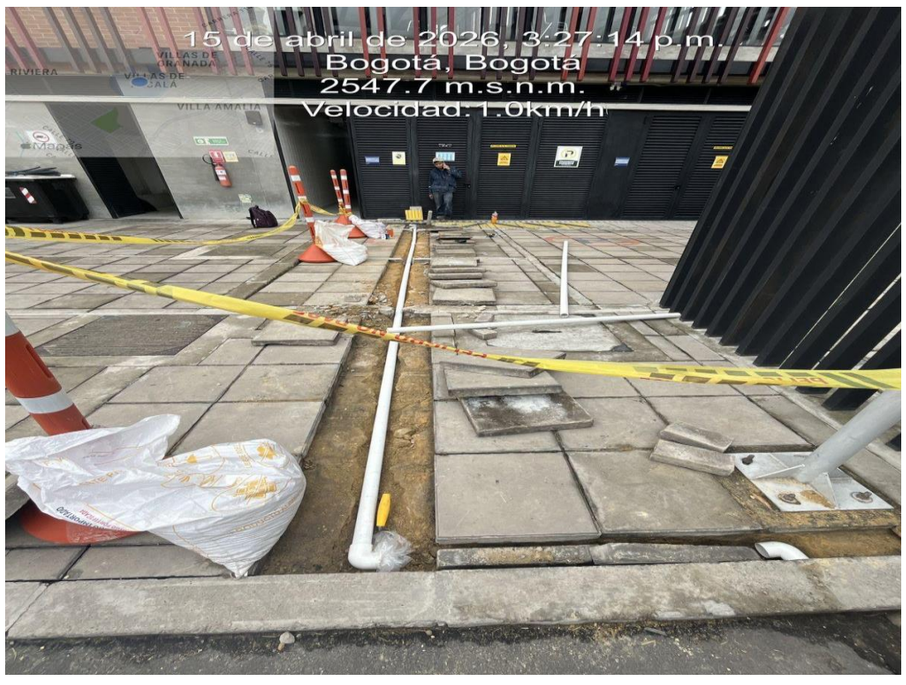

Instalación de tubería de 1-1/2".

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	20,26%	92,71%	Obra Física Ejecutada (%)	6,23%	87,44%
Valor de la Obra programada:	$ 561.042.509,00	$ 2.566.912.854,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 172.396.478,00	$ 2.420.798.558,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	72,45%	81,21%	**-5,27%**
Durante el periodo	20,26%	6,23%	
Acumulado actual	92,71%	87,44%	

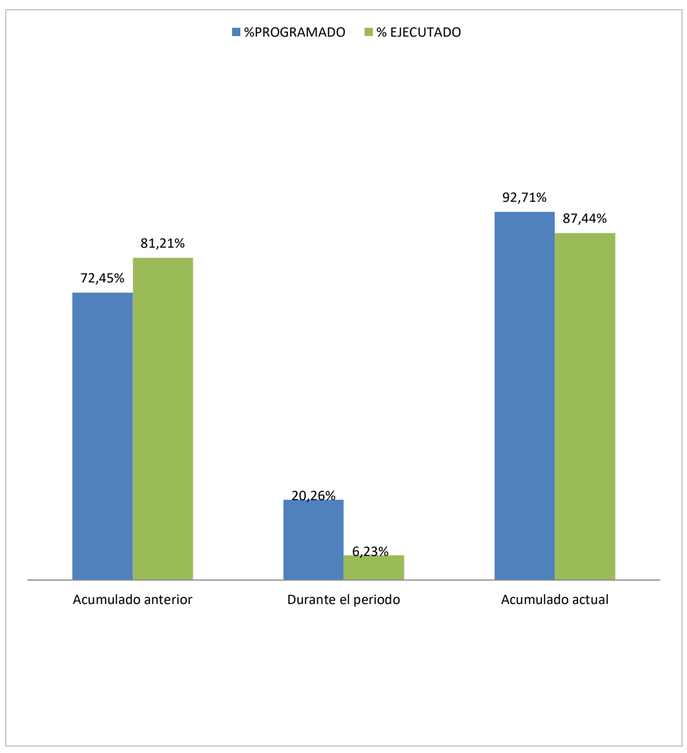

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	1,08%	1,08%	100,00%	98,94%	-1,06%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	4,95%	9,04%	4,09%	98,31%	70,80%	-27,51%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	18,14%	1,12%	-17,02%	90,47%	96,74%	6,27%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	20,84%	2,43%	-18,41%	90,10%	62,67%	-27,43%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,94%	0,94%	100,00%	100,00%	0,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	36,50%	5,90%	-30,60%	91,14%	79,76%	-11,38%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	12,87%	5,03%	-7,84%	87,93%	90,73%	2,80%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**13,33%**	**3,65%**	**-9,68%**	**93,99%**	**85,66%**	**-8,33%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	23,34%	16,26%	-7,08%	90,24%	100,00%	9,76%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	31,06%	1,35%	-29,71%	86,20%	87,30%	1,10%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**27,20%**	**8,81%**	**-18,40%**	**88,22%**	**93,65%**	**5,43%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	55,00%	55,00%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	95,00%	95,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	96,08%	96,08%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 20.000.000,00		
			55,56%	82,90%		$ 290.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 138.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 340.158.088,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.888.851.473,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.308.707.841,00	$ 1.308.707.841,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.888.851.473,00	$ 1.548.693.385,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	92,71%	**87,44%**	**-5,27%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	205	**-10,81**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

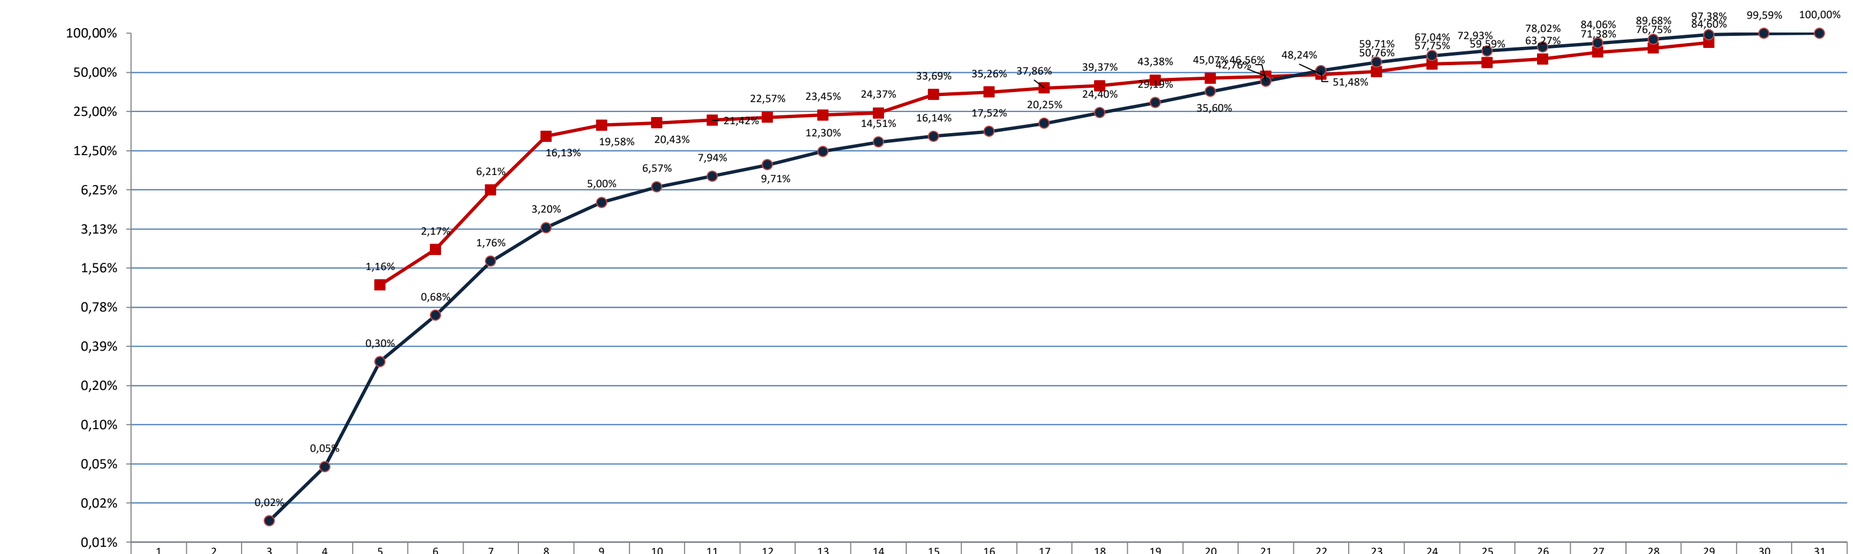

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%	63,27%	71,38%	76,75%	84,60%		
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de subsanación de detalles en todos los espacios a entregar en este frente, tales como aplicación de otra mano de pintura al cerramiento perimetral, aplicación de pintura bituminosa en la cubierta del shut y emboquillado de piso en el salón 103.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de pintura en el cerramiento perimetral, verificando el uso adecuado de elementos de protección personal por parte del personal ejecutor, así como condiciones seguras en el área de trabajo, incluyendo orden, aseo y señalización preventiva para el desarrollo seguro de la actividad.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede existe un retrado del 1,06%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones. El retraso obedece a temas de remates y detalles finales para entregar la sede.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo y disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra hacer la respectiva entrega final de espacios para este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, excavacion para carcamo, inicio de ensamble de aula modular, trabajo electrico.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de armado de formaletas para cárcamo, desmonte de luminarias y demás labores asociadas al proceso constructivo. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades. Se recomienda al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, realizando el acopio de materiales y residuos de escombros en un solo lugar, así como implementar la debida señalización del área, con el fin de mantener condiciones seguras de trabajo y tránsito en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: 16.1.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
2.2.2. RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).
2.2.13. PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
5.1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
12.2.2. PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
NP 03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE
5.1.31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
14.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)
2.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
19.1.6. PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se encuentra material de construcción y gran parte de residuos sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante el comité realizado en la SED en esta semana el contratista indico que se programo instalacion de cubierta del aula modular el dia lunes 27 de abril. De igual modo se indico por parte del ingeniero apoyo a la supervision que la parte baja del aula modulares sera tapada con malla microperforada y flanches, permitiendo que haya ventilacion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de pintura en muros exteriores del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de cimbra de muros del shut para la aplicación de pintura, así como instalación de pañete en el muro contiguo al shut de basuras. Se recomienda continuar reforzando al personal en el uso adecuado del casco durante la ejecución de sus labores y mantener jornadas de orden y aseo antes de finalizar la jornada laboral, con el fin de conservar condiciones seguras en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 6,27% , Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, cuenta con batea metálica, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso, se recomendo garantizar jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizo cerramiento de shut, excavacion para carcamos y se fundio placa en concreto de shut.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de compactación en el área destinada para el shut de basuras, así como labores de corte y acomodo de malla en el área de los cárcamos y en la zona donde se proyecta la fundida de la placa. Se continúa recomendando al contratista reforzar el adecuado uso del casco por parte del personal durante la ejecución de las actividades, así como impartir charlas de sensibilización y capacitación sobre su correcta utilización, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: 4.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" NP mantenimiento de puerta
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) 2.2.13. PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
2.1.2. EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
5.1.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
7.1.2. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
16.1.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, gran parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, al igual se evidencia un bajo volumen de residuos sin acopiar ni señalizar por lo que se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, quitar el material de construcción de las zonas verdes, realizar la disposición adecuada de los residuos, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante la reunion realizada en la SED el ingeniero apoyo a la supervision solicito las gradas pintadas y al anden frente a ellas un acabado en escobiado, de igual modo se recomendo que en el shut el superboard quedara dilatado y respecto a NP de mantenimiento de la puerta se dijo que se realizara actividad hasta que este NP este aprobado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de aseo general para la entrega final del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de excavación para la siembra de helechos, así como labores de cambio de adoquín en diferentes frentes de trabajo. Se recomienda al contratista reforzar el uso permanente del casco por parte del personal durante la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 20 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el retiro del cerramiento perimetral, no se evidencian residuos, al igual se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de luminarias, aplicación de pintura en muros exteriores, instalación de flanche perimetral, emboquillado de enchape, instalación de puertas y aseo general. Todo lo descrito anteriormente se realizó en las baterías sanitarias, adicional realizó actividades de desmonte de cubierta en el hall central de circulación.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se validó que el cerramiento perimetral se encuentra en óptimas condiciones y debidamente señalizado. Así mismo, se verificó el uso de escalera para el desarrollo de actividades, evidenciando condiciones adecuadas para su utilización. Se recomienda al contratista mejorar el acopio de los residuos ubicados en la zona verde, disponiéndolos de manera organizada, debidamente señalizados y cubiertos, con el fin de prevenir riesgos y mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el área intervenida.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 11,38%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: Las actividades que se mencionan a continuación obedecen a la intervención de la cubierta del hall de circulación:
1.2.23 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).
16.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA).

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta el embalaje de las cubiertas de asbesto, se reporta residuos en lonas y acopiados (volumen alto), parte de estos en zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima y la institución solicita la disposición de los residuos vegetales del colegio, por lo que también se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar el espacio de las baterías sanitarias lo más pronto posible, ya que el apoyo a la supervisión programó la entrega de dicho espacio para el día 27 de abril de 2026.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de muros en superboard e instalación de baldosa en el piso del shut de basuras. Adicional realizó actividades de excavación para la instalación de bordillo perimetral en la zona del jardín.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la instalación de baldosas en el área del shut de basuras. Así mismo, se verificó por parte del contratista la realización de jornadas de orden y aseo, recomendando continuar con la evacuación de los residuos que aún permanecen acopiados en obra. De igual manera, se validó la instalación de la señalización preventiva y del cerramiento perimetral en la nueva zona a intervenir dentro de la institución, con el fin de controlar el acceso y mantener condiciones seguras durante la ejecución de las actividades. Adicionalmente, el día 21 de abril de 2026 se realizó acercamiento por parte de interventoría y contratista con la institución educativa, con el fin de revisar el accidente presentado a un estudiante el 27 de marzo de 2026. En dicha verificación se evidenció que el hecho ocurrió en una zona no intervenida por el contratista; no obstante, se continúa con las investigaciones correspondientes y el seguimiento respectivo

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 2,80%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se encuentra residuos en el frente acopiados, se recomienda realizar la disposicion de estos residuos, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Durante el recorrido realizado en conjunto con el apoyo a la supervisión se determinó realizar la intervención del auditorio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de aplicación de pintura en muro exterior de shut de basuras, adicional realizó la instalación de canal y bajante en la cubierta del shut

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se reporta la presencia de 4 trabajadores en obra durante la jornada, distribuidos así: 1 maestro ejecutando labores de acabados en el cuarto del shut y 3 trabajadores realizando recorrido técnico para actividades de ornamentación. Así mismo, se verificó que las zonas de trabajo se encuentran en adecuadas condiciones de orden y aseo, y que el cerramiento perimetral permanece en buenas condiciones, garantizando control y seguridad en el área intervenida.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado, se realizó la disposición adecuada de los residuos, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de aseo general y bote de escombros, con el fin de hacer la respectiva entrega final del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando labores de instalación de WING. Se recomienda al personal efectuar jornadas de orden y aseo antes de finalizar la jornada laboral, con el fin de mantener condiciones seguras, organizadas y adecuadas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría. Se realizó la entrega final del frente de obra.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se evidencia residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). El 23 de abril se realizó la entrega final de espacios del frente de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de concreto en zanja donde va la nueva tubería.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal ejecutando actividades de resane de sardineles, así como jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas. Se recomienda al contratista señalizar adecuadamente los escombros y materiales acopiados, con el fin de prevenir riesgos y mantener condiciones seguras para el tránsito y desarrollo de las labores en obra.
Durante el periodo reportado se remitió el oficio PROBINTEC-LOTE6-544, mediante el cual se efectuaron requerimientos relacionados con el cumplimiento de las condiciones de seguridad. En dicho documento se recordó al contratista la importancia de garantizar el uso adecuado de los EPP por parte del personal, mantener en óptimas condiciones los cerramientos perimetrales, implementar jornadas permanentes de orden y aseo, y reforzar las charlas de seguridad dirigidas a los trabajadores.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se realiza la mezcla ce concreto en batea metálica, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 17 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión).

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	6 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
26 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA			POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029	CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	97,86%	98,94%		100,00%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	60,86%	70,80%		98,31%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	93,62%	96,74%		90,47%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	58,02%	62,67%		90,10%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	99,06%	100,00%		100,00%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	50,86%	79,76%		84,69%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	68,67%	90,73%		87,93%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	83,74%	100,00%		85,24%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	39,95%	87,30%		86,20%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						85,66%		91,44%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		96,08%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%		$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						82,75%		55,56%		$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
7	10	1	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	85,66%	0,00%	97,16%
PROGRAMADO	91,44%		
ATRASO	-5,77%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

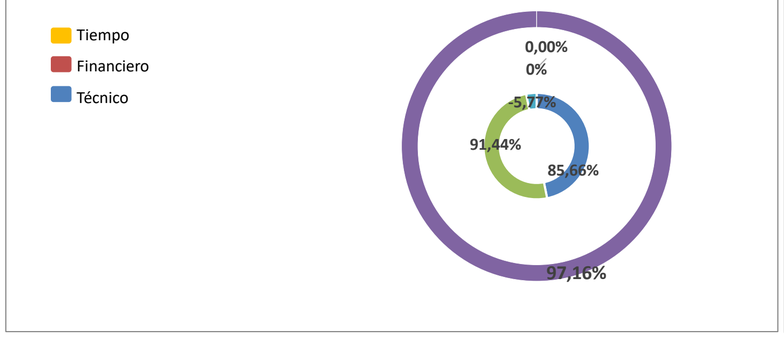

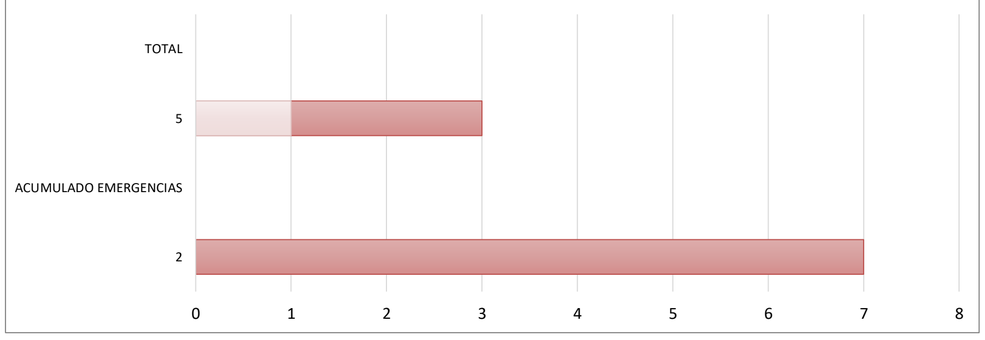

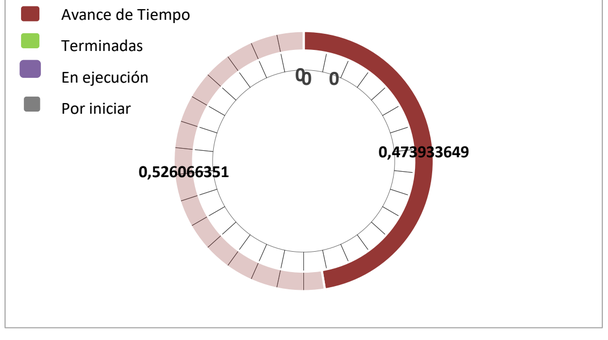

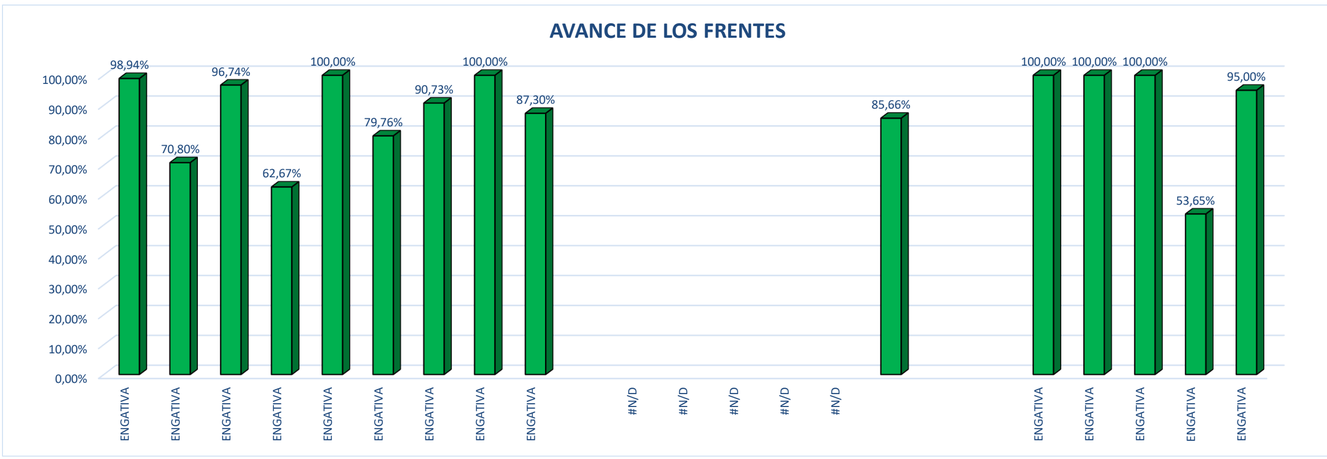

OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B

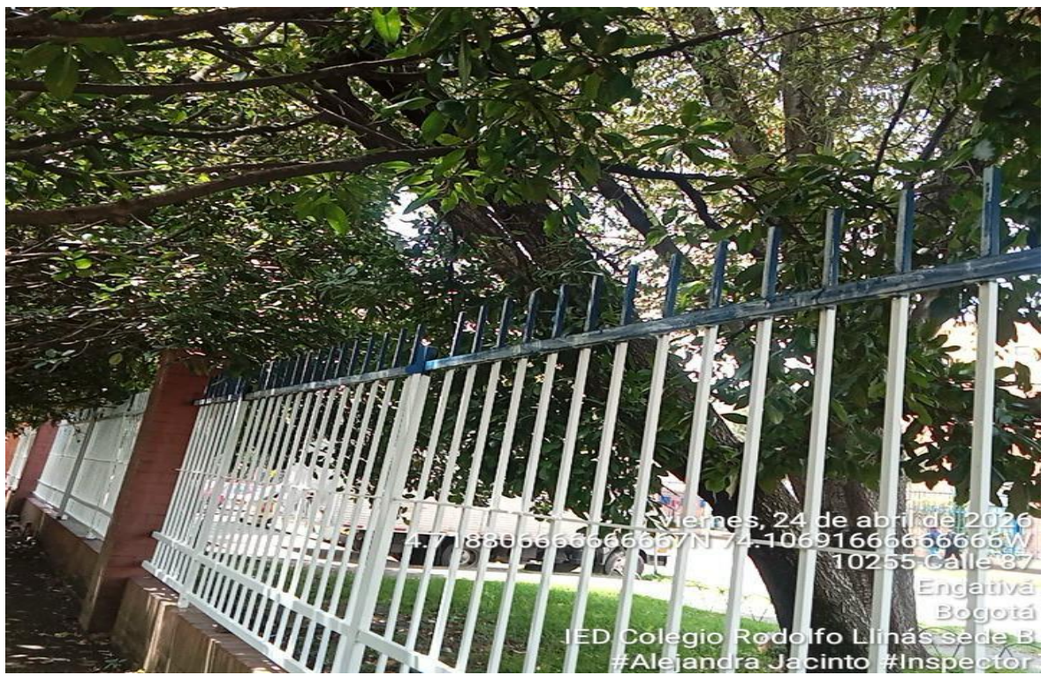

Subsanación de remates - cerramiento perimetral.



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.



Subsanación de remates - cerramiento perimetral.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Nodos para estructura metalica



Anclaje de parales y viguetas a nodos para estructura de aula modular



Montaje de tuberia para red electrica



Armado de luminarias



Acopio de luminarias



Replanteo, vertimiento de recebo y armado estructural para carcamo

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A




Acopio de material (madera aglomerada y angulos) para carcamo



Armado de formaletas en madera aglomerada



Fundida de paredes para carcamo

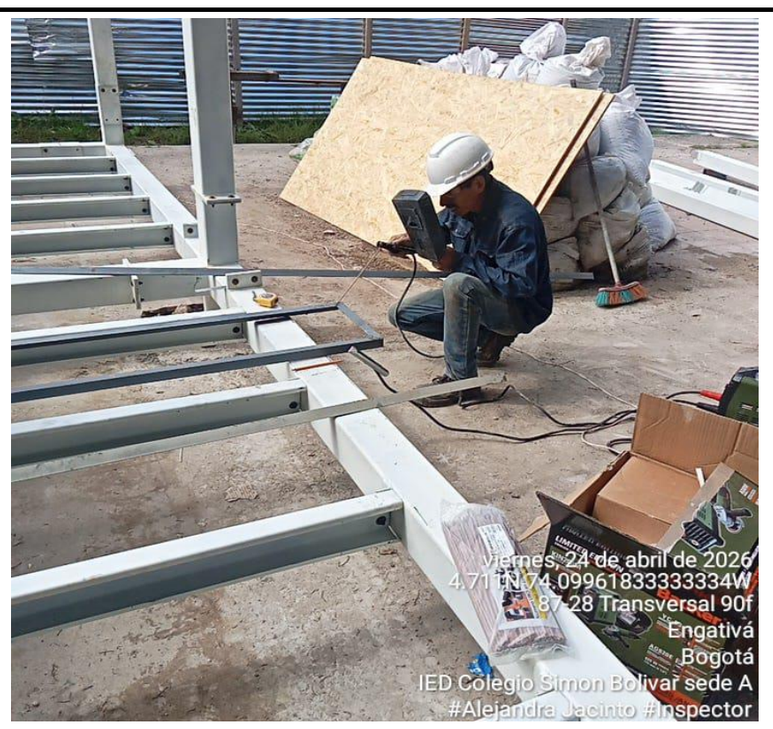

Soldadura de angulos para carcamo



Estucado, resane y preparacion de superficies (vanos)



Nivelacion de ventanas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Aplicación de pintura - muros exteriores shut de basuras.



Aplicación de pintura - muros exteriores shut de basuras.



Aplicación de pintura - muros exteriores shut de basuras.



Aplicación de pintura - muros exteriores shut de basuras.



Aplicación de pintura - muros exteriores shut de basuras.



Aplicación de pintura - muros exteriores shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B




Continuidad de la excavación del cárcamo.




Demolición de la placa del shut de basuras.

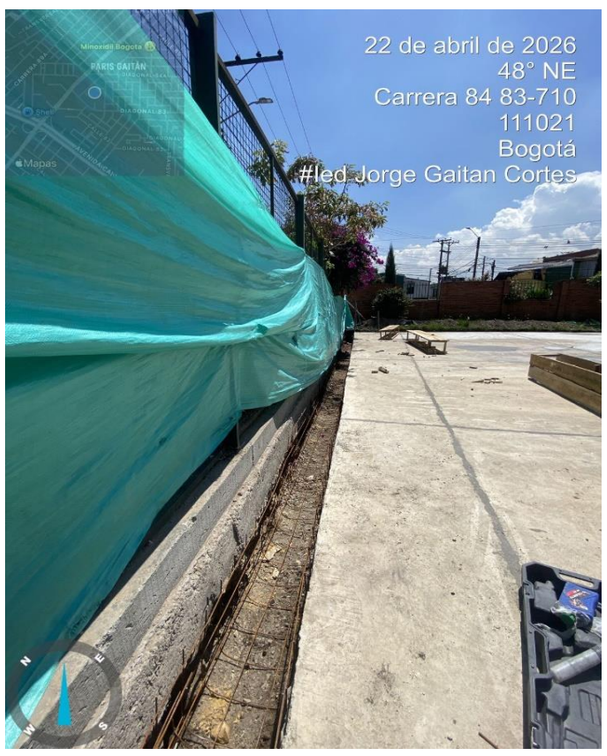


Vista general de la excavación del cárcamo.

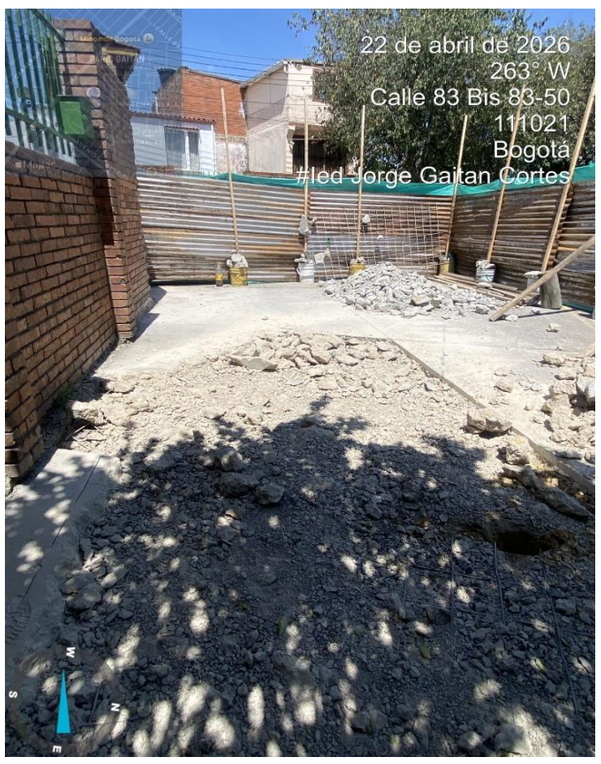

Vista general de la demolición

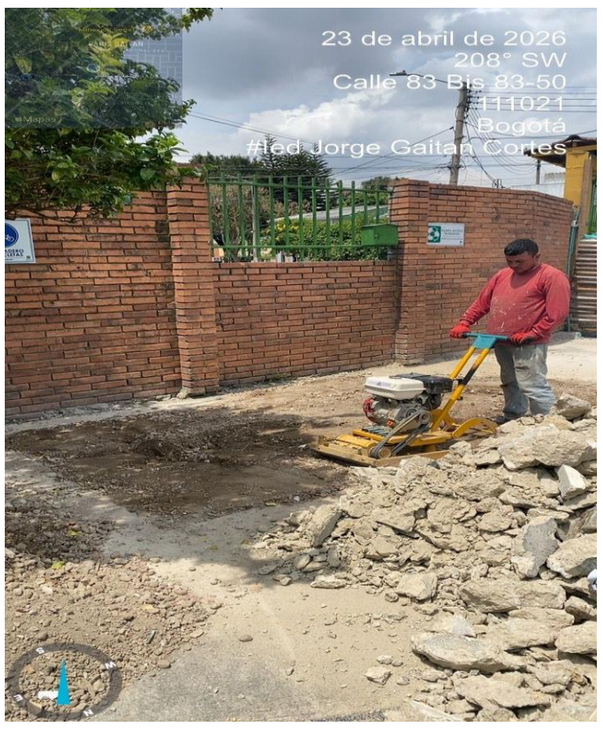

Compactación del área.

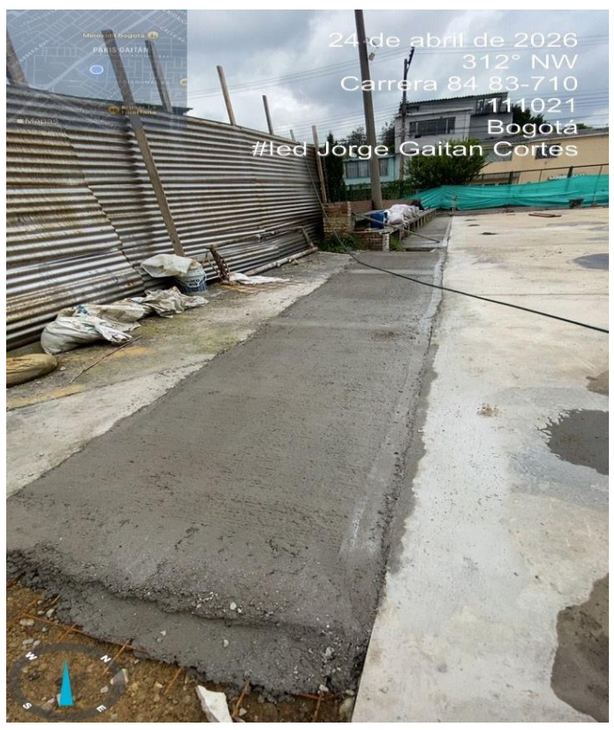

Vista general de la placa fundida

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Fundición del área del carcamo

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.



Aseo general - Zona lateral izquierda de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Aplicación de pintura muros exteriores - Zona baños.



Aplicación de pintura muros exteriores - Zona baños.

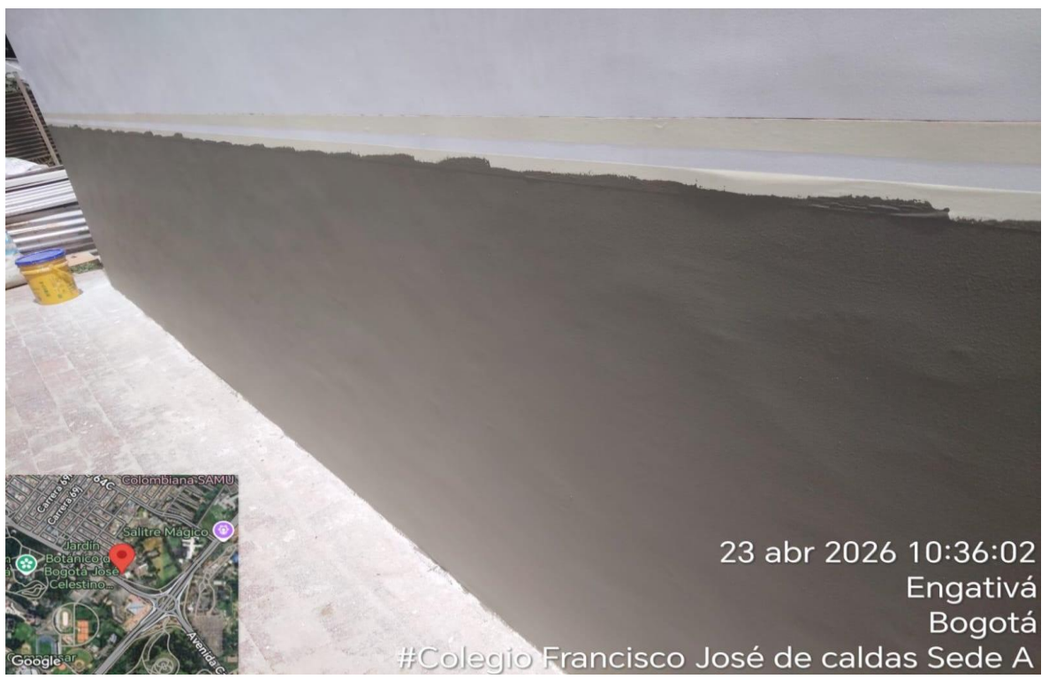

Aplicación de pintura muros exteriores - Zona baños.



Aplicación de pintura muros exteriores - Zona baños.



Instalación de luminarias - Zona baños.



Aplicación de pintura muros exteriores - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de luminarias - Zona baños.



Instalación de puerta persina - Zona baños.



Instalación de puerta persina - Zona baños.



Instalación de puerta persina - Zona baños.



Desmonte de cubierta - Zona hall de circulación.



Aplicación de pintura muros exteriores - Zona baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Excavación perimetral - zona de jardín.



Excavación perimetral - zona de jardín.



Ingreso de material bordillo para zona del jardín



Ingreso de material bordillo para zona del jardín



Instalación de alistado de piso - shut de basuras.



Instalación de baldosa en granito - Shut de basura.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A

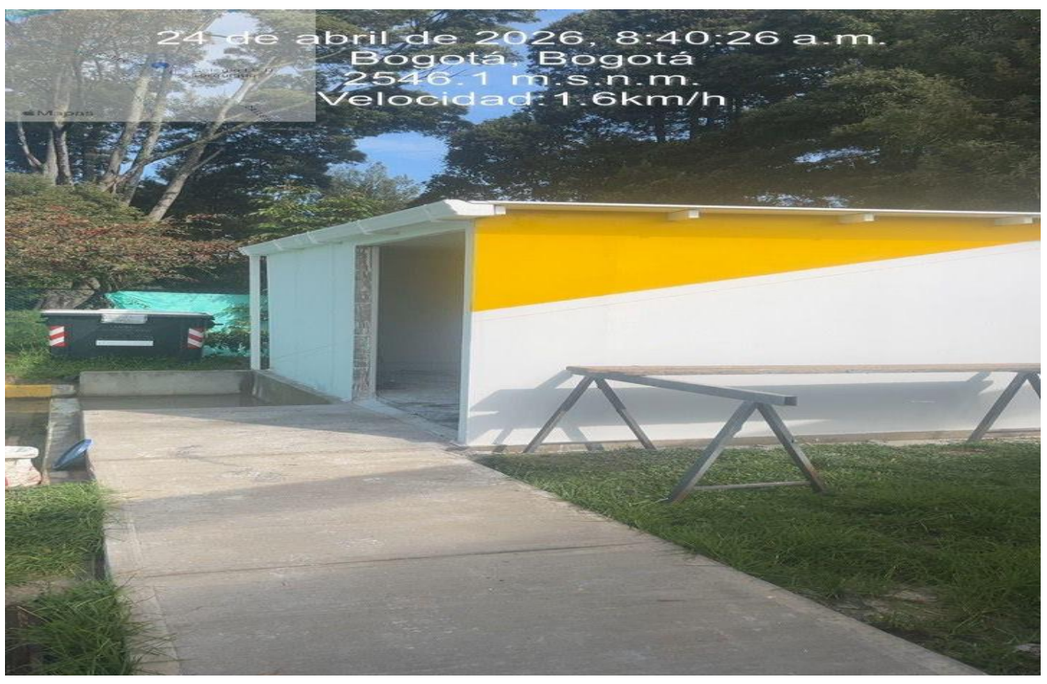

Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.



Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.



Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.



Instalación de canal y bajante en cubierta - Shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B



Vista general de área/espacio a entregar al colegio.



Vista general de área/espacio a entregar al colegio.



Vista general de área/espacio a entregar al colegio.



Vista general de área/espacio a entregar al colegio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A



Instalación de concreto para zanja donde va la nueva tubería.



Instalación de concreto para zanja donde va la nueva tubería.

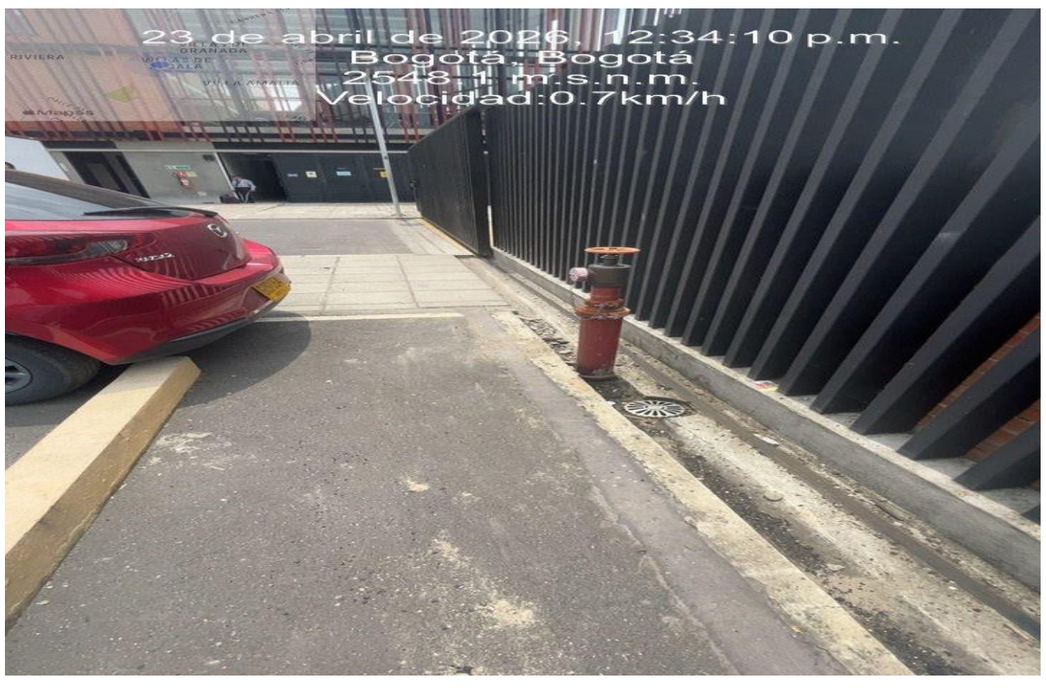

Instalación de concreto para zanja donde va la nueva tubería.



Instalación de concreto para zanja donde va la nueva tubería.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	8,89%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	4,80%	92,56%
Valor de la Obra programada:	$ 246.071.623,00	$ 3.197.490.795,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 132.884.214,00	$ 2.959.649.481,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	91,11%	87,76%	**-7,44%**
Durante el periodo	8,89%	4,80%	
Acumulado actual	100,00%	92,56%	

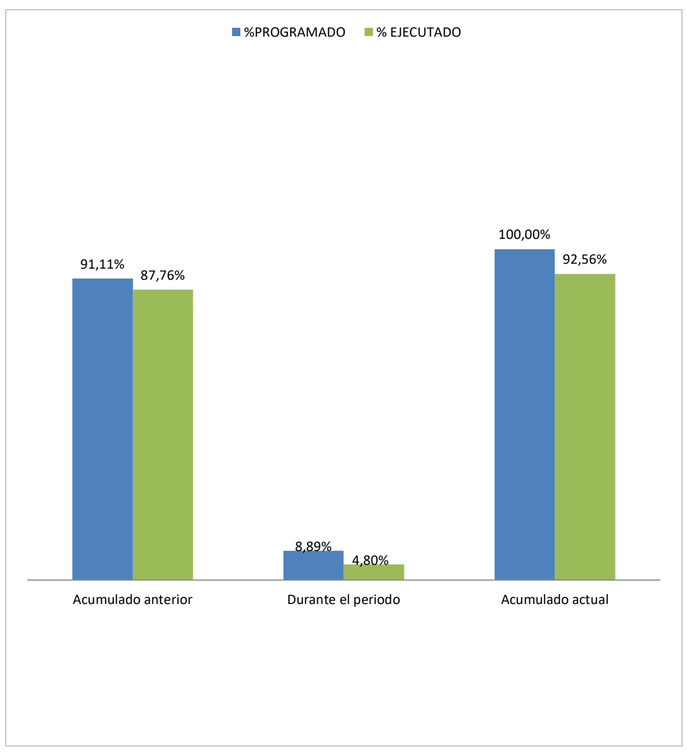

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	1,06%	1,06%	100,00%	100,00%	0,00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	1,42%	10,28%	8,86%	100,00%	81,62%	-18,38%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	9,53%	3,26%	-6,27%	100,00%	100,00%	0,00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	10,09%	6,85%	-3,24%	100,00%	72,47%	-27,53%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	8,86%	6,24%	-2,62%	100,00%	86,00%	-14,00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	12,07%	5,03%	-7,04%	100,00%	95,76%	-4,24%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**6,00%**	**4,67%**	**-1,32%**	**100,00%**	**90,84%**	**-9,16%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	9,76%	0,00%	-9,76%	100,00%	100,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	13,80%	9,85%	-3,95%	100,00%	97,15%	-2,85%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**11,78%**	**4,93%**	**-6,86%**	**100,00%**	**98,58%**	**-1,43%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100,00%	72,45%	-27,55%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100,00%	95,00%	-5,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100,00%	98,06%	-1,94%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 20.000.000,00		
			100,00%	85,06%		$ 290.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 138.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 340.158.088,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.888.851.473,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.308.707.841,00	$ 1.308.707.841,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.888.851.473,00	$ 1.888.851.473,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	100,00%	**92,56%**	**-7,44%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	211	**-15,71**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

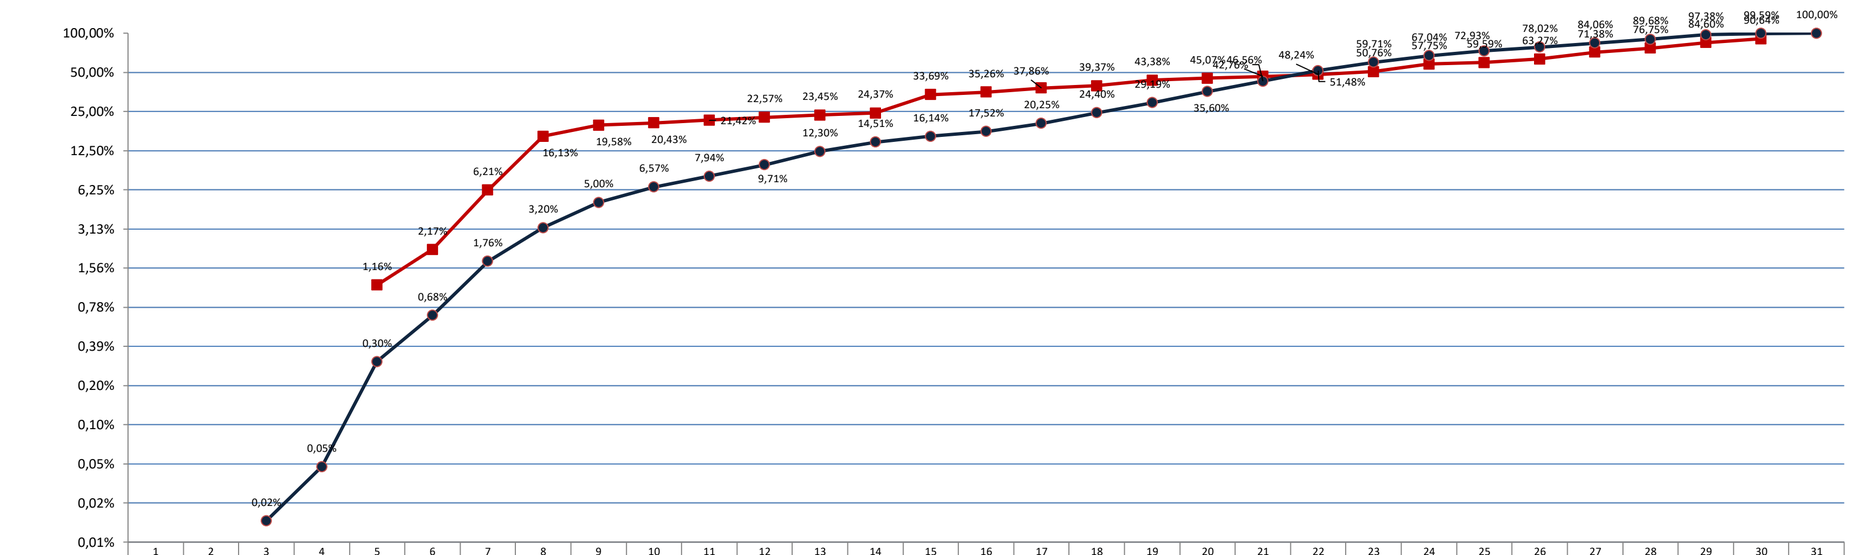

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%	63,27%	71,38%	76,75%	84,60%	90,64%	
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de pintura en el cerramiento perimetral. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal para la ejecución de las labores. Cabe señalar que, durante este mismo periodo, el colegio contó con programación de entrega, en el marco de la finalización de las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 30 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo y retirar adecuadamente todo el material.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, excavacion para carcamo, ensamble de aula modular, trabajo electrico.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de soldadura de ángulos e instalación de parrilla del cárcamo. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos para labores de soldadura. Se recomienda que, en los casos donde se ejecuten trabajos en alturas asociados a estas actividades, el personal implemente de manera adecuada y permanente los EPCC, con el fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: 16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
-4.7.7. LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)
2.2.10. RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).
-16.1.2.CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
-16.1.3. BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
-16.1.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
14.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)
2.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se encuentra material de construcción y gran parte de residuos sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de puerta persiana en el shut de basura y adecuación de la puerta del cerramiento perimetral para el bote de basura almacenada en el shut. Se le recomienda al contratista finalizar detalles de acabados para la entrega final del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de instalación de la bajante de la canal. Cabe señalar que, durante este mismo periodo, el colegio contó con programación de entrega, en el marco de la finalización de las actividades ejecutadas. Durante la ejecución de las actividades no se presentaron accidentes ni incidentes, manteniéndose condiciones seguras en el desarrollo de las labores.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, reportar el retiro de cerramiento perimetral, se acopia y protege adecuadamente el material, se recomendo retirar el material, garantizar jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se estructuro shut, carcamos, excavacion para tuberia e instalacion de cubierta Shut.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de excavación en el área destinada para la construcción del cárcamo. Así mismo, se continúa evidenciando personal realizando labores sin el uso de casco y sin la dotación completa, por lo cual se reitera al contratista la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de seguridad y el uso adecuado de los EPP. Se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno del material sobrante, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: 4.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" NP mantenimiento de puerta NP PINTURA ARTISTICA
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
8.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
7.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM
9.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
4.9.10.SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"
13.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
12.2.4. PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.5.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"
12.2.3.PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
7.1.2. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M
7.2.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, gran parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, al igual se evidencia un bajo volumen de residuos sin acopiar ni señalizar por lo que se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, quitar el material de construcción de las zonas verdes, realizar la disposición adecuada de los residuos, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Durante la reunion realizada en la SED el ingeniero apoyo a la supervision solicito las gradas pintadas y al anden frente a ellas un acabado en escobiado, de igual modo se recomendo que en el shut el superboard quedara dilatado y respecto a NP de mantenimiento de la puerta se dijo que se realizara actividad hasta que este NP este aprobado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de ajuste de adoquín en el área contigua a las canchas. Así mismo, se validó que el cerramiento perimetral se encuentra en condiciones adecuadas, garantizando control y seguridad en la zona intervenida.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 20 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el retiro del cerramiento perimetral, no se evidencian residuos, al igual se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de estructura metálica para soporte de cubierta del hall de circulación. Adicional se realizó la entrega de espacio parcial de las baterías sanitarias.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de desmonte de cerramiento rígido, así como la subsanación de detalles en una de las zonas del colegio, en el marco de la preparación para su entrega. Por otra parte, se evidenció la instalación de estructura metálica para el refuerzo de la estructura existente de la cubierta del hall, garantizando condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 14,00%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: Las actividades que se mencionan a continuación obedecen a la intervención de la cubierta del hall de circulación:
1.2.23 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).
16.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA).

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta el embalaje de las cubiertas de asbesto, se reporta el retiro de parte de residuos, por lo que se recomienda al contratista realizar la disposición total, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de enchape para muros del shut de basuras. Adicional realizó actividades de instalación de bordillo perimetral en la zona del jardín.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de bordillo, así como la instalación de enchape en los muros del shut. Se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado y permanente del casco por parte del personal durante la ejecución de las labores. De igual manera, se sugiere mejorar las condiciones de la polisombra del cerramiento perimetral, debido a que se encuentra deteriorada, con el fin de garantizar un adecuado control del área y mantener condiciones seguras en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 4,24%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se encuentra material de construcción y residuos en el frente acopiados, se recomienda realizar la disposicion de estos residuos, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de aplicación de pintura en muro exterior de shut de basuras, adicional realizó el replanteo de red electrica para conexión del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de pintura en la fachada del shut de basura. Así mismo, se verificó que el cerramiento perimetral se encuentra en buenas condiciones y se validó el uso adecuado de EPP por parte del personal. Se recomienda implementar de manera constante jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado, se realizó la disposición adecuada de los residuos, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 23 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría. Se realizó la entrega final del frente de obra.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se evidencia residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de bombas y conexión de tubiería de la red nueva.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de desencofrado de la placa de concreto. Se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo, así como realizar el retiro oportuno de los escombros generados, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	4/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	0 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
2 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	98,94%	100,00%	↑	100,00%	✓	$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	70,80%	81,62%	↑	100,00%	↓	$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	96,74%	100,00%	↑	100,00%	↓	$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	62,67%	72,47%	↑	100,00%	↓	$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	79,76%	86,00%	↑	100,00%	↓	$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	90,73%	95,76%	↑	100,00%	↓	$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	87,30%	97,15%	↑	100,00%	↓	$ 100.000.000																					
							→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						90,84%	↑	#######	↓	$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%	↑	0,00%	↑	$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%	↑	0,00%	↑	$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		96,08%	↑	0,00%	↑	$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%	↑	100%	✓	$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%	→	0%	✓	$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						82,75%	↑	55,56%	↑	$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
9	8	1	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
PROGRAMADO	100,00%		
ATRASO	-9,16%	PLAZO VENCIDO	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

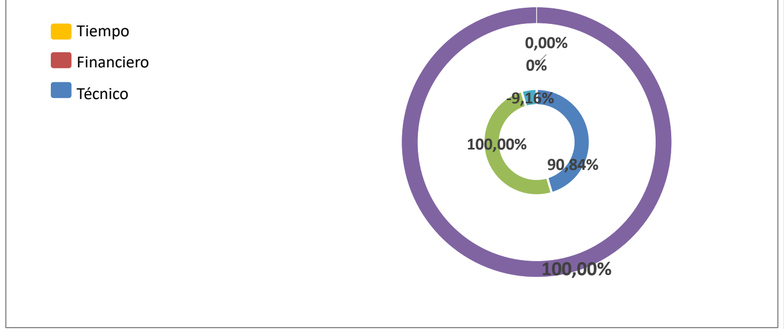

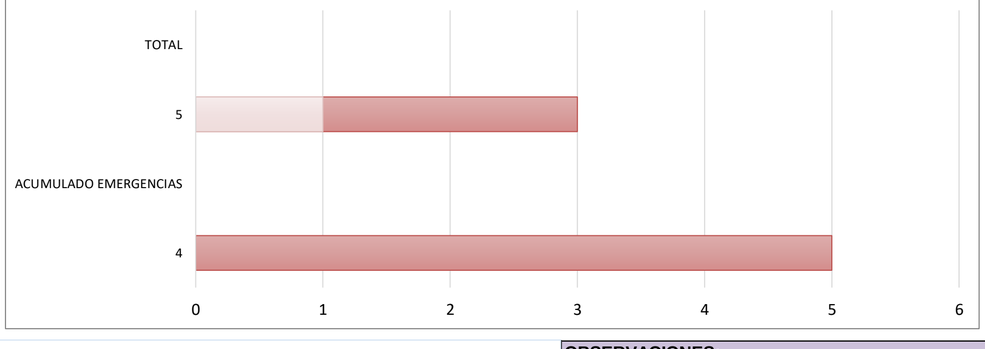

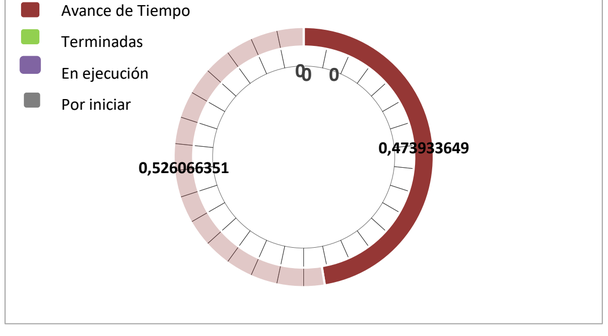

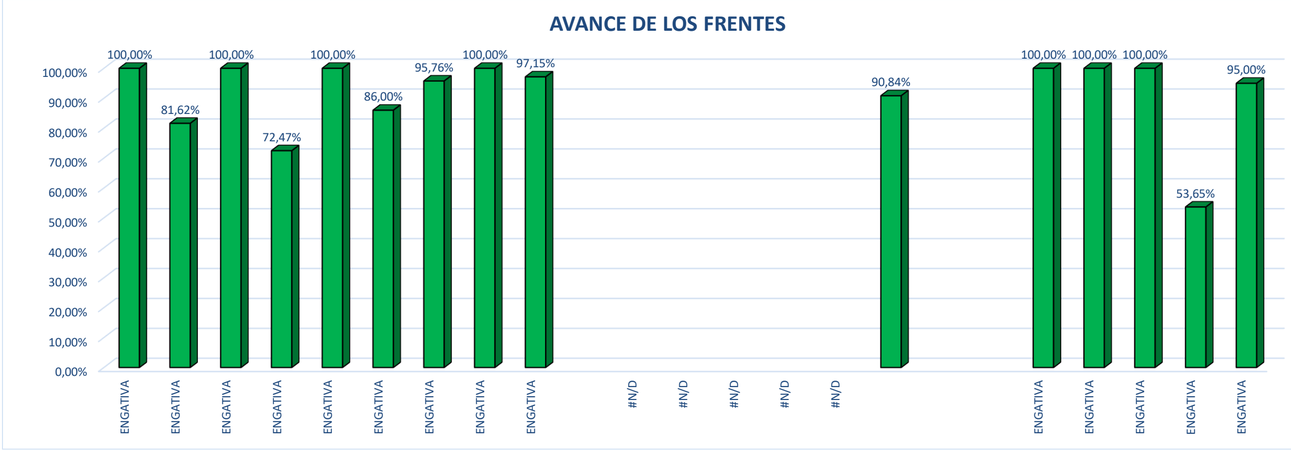

OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias


CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A







Desencofrado de carcamo

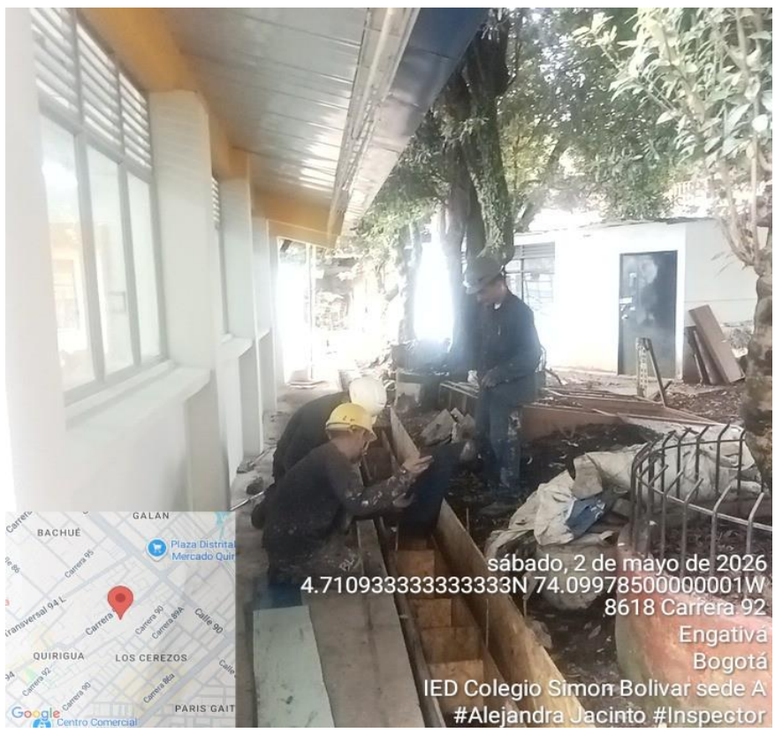


soldadura de angulos

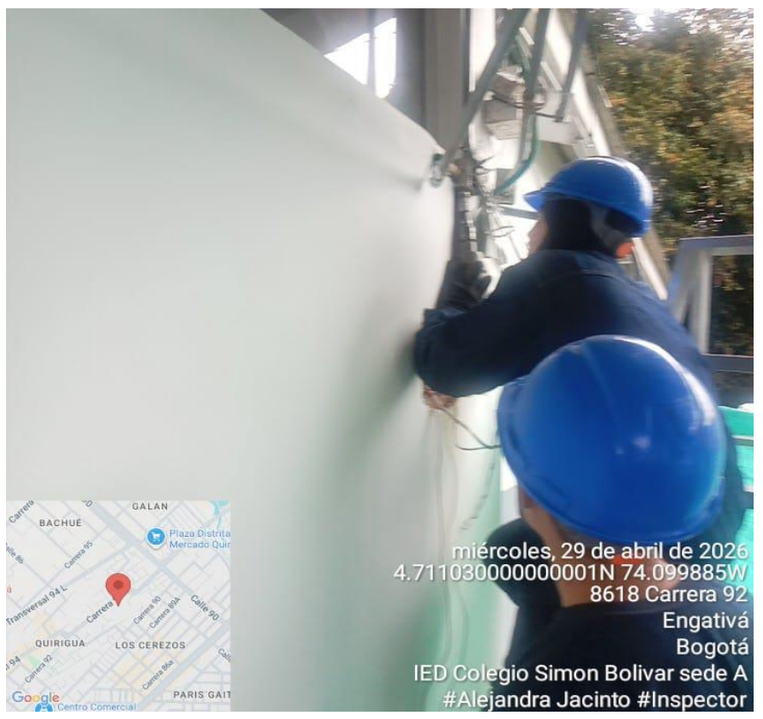

Armado de formaleta para el carcamo

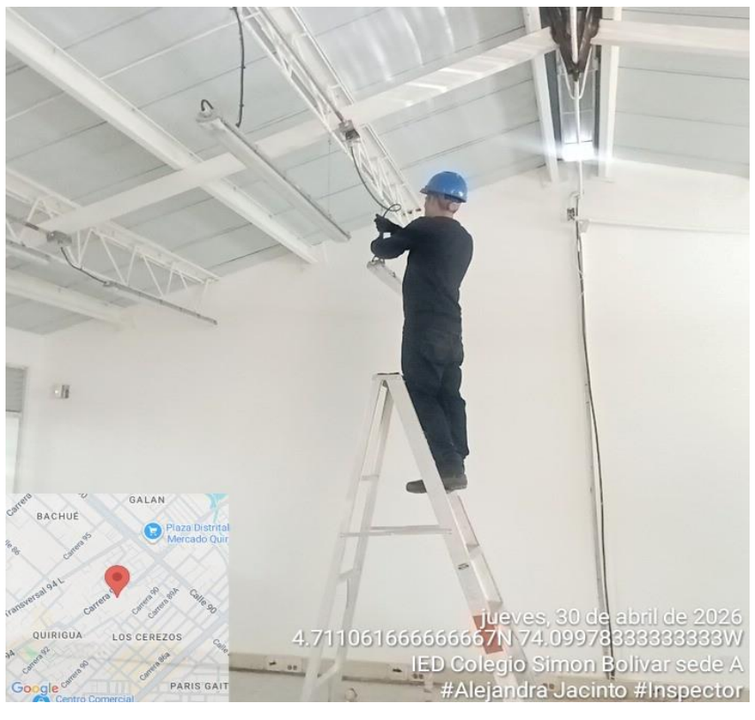

Trabajo electrico en fachada de salones

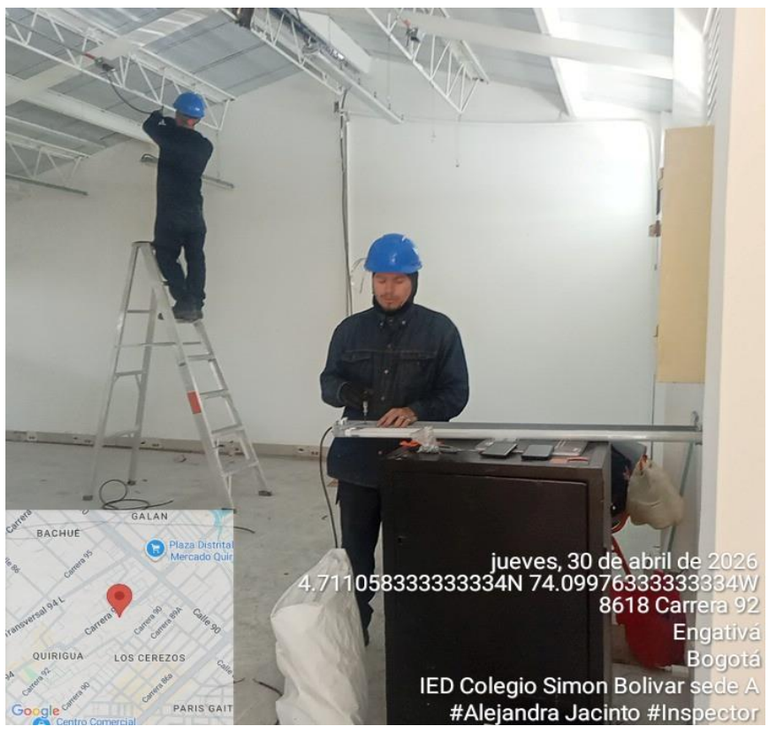

Encauchetado para luminarias

Instalacion de luminarias
