ACTA DE OBRA 02 Y FINAL

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA		OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA	
1	INFORME Nº 02	ACTA DE OBRA FINAL 02 (Corte del 05 de mayo de 2026 Hasta el 05 de julio de 2026)	CONTRATO DE OBRA Nº	COIP-040-2026	
2	CONTRATISTA	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 901.061.932-9	SUPERVISON	INGENIERA LAURA MELISA CASTAÑO	
3	VALOR INICIAL:$270,644,205	ADICION: $86,874,745	VALOR TOTAL	$357,518,950	
4	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR EL 22 DE MAYO DE 2026	SUSPENSION	mayo 22 de 2026	
5	FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2026	REINICIO	JUNIO 22 DE 2026	
6	FECHA DE TERMINACION INICIAL	JUNIO 11 DE 2026	FECHA DE TERMINACION	JULIO 5 DE 2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1						ACTA 2		ACUMULADO		SALDO	
		UD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT ANTES	FACTOR	CANT CONTRACT	CANT ACTA	VR ACTA	CANT ACTA 2	VR ACTA 2	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	Demolición y retiro de bordillos existente,Incluye corte cargue transporte y botada.	ml	112,00	$ 37.000	$ 4,144,000	54,00		58,00	112,00	4,144,000			112	4,144,000	-	-
2	rebaje de bordillo existente de la circunvalar	ml	0,00	$ 149.900	$ -				-	-			-	-	-	-
3	Retiro manual y trasporte de adoquin existente en anden	m2	144,00	$ 34.500	$ 4,968,000			144,00	144,00	4,968,000			144	4,968,000	-	-
4	traslado de bordillo existente entre anden y nuevo parqueadero	ml	0,00	$ 149.900	$ -				-	-			-	-	-	-
5	Rebajes de MH existenie	un	2,00	$ 1,945,000	$ 3,890,000			2,00	2,00	3,890,000			2	3,890,000	-	-
6	Excavación en material común. Incluye corte cargue transporte y botada.	m3	343,70	$ 93.500	$ 32,135,950	212,80		130,90	343,70	32,135,950			343,7	32,135,950	-	-
7	Suministro, transporte aplicación y compactación de base granular	m3	204,500	$ 322.000	$ 65,849,000	124,70		79,80	204,50	65,849,000	- 0		204,500	65,849,000	-	-
8	Perfilación y recompactación de subrasante existente	m2	638,80	$ 6.300	$ 4,011,840			638,80	638,800	4,011,840			638,800	4,011,840	-	-
9	Imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	685,00	$ 7.200	$ 4,788,000				-	-	665,0	4,788,000	665	4,788,000	-	-
10	Suministro, transporte aplicación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.	m3	68,500	$ 1,997,000	$ 132,800,500				-	-	66,426	132,653,003	68,4	132,653,003	0,07	147,497,02
11	Demarcacion de lineas para parqueadero con pintura blanca trafico	un	260,00	$ 29.900	$ 7,774,000				-	-	260	7,774,000	260	7,774,000	-	-

ACTA DE OBRA 02 Y FINAL

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA		OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
1	INFORME Nº 02	ACTA DE OBRA FINAL 02 (Corte del 05 de mayo de 2026 Hasta el 05 de julio de 2026)	CONTRATO DE OBRA Nº	CCIP-040-2026
2	CONTRATISTA	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 901.061.932-9	SUPERVISON	INGENIERA LAURA MELISA CASTAÑO
3	VALOR INICIAL:$270.844.205	ADICION: $86.874.745	VALOR TOTAL	$357.518.950
4	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR EL 22 DE MAYO DE 2026	SUSPENSION	mayo 22 de 2026
5	FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2026	REINICIO	JUNIO 22 DE 2026
6	FECHA DE TERMINACION INICIAL	JUNIO 11 DE 2026	FECHA DE TERMINACION	JULIO 5 DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS A				ACTA 1					ACTA 2		ACUMULADO		SALDO	
		UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ADICION A1	CANTIDAD A1	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA 1	VALOR ACTA 1	CANT. ACTA 1	VALOR ACTA 2	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
OBRA EXTRA																
OE1	Suministro e instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en teja naranja, bolicos plasticos y cinta peligro con una altura de 2 m. Incluye, transporte, y desmonte de . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	96	15.525	1.490.400		96		96,00	1.490.400		-	96,00	1.490.400	-	-
OE2	Suministro y construccion de sumidero doble tipo B, incluye 2 rejas de acuerdo a especificación técnica	UN	1,0	2.988.095	2.988.095		1		1,00	2.988.095		-	1,00	2.988.095	-	-
OE3	Colocación de ADOQUIN RECTANGULAR en concreto RCAPA DE0.10x0.20x0.06mCOLOR, tipo peatonal No incluye suministro de adoquin. Incluye perfilacion y instalacion del terreno cama de asiento en arena limpia de 0.05m, corte de piezas, elementos de confinamiento, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	M2	12,50	75.601	945.008,5		12,5		12,50	945.009		-	12,50	945.009	-	-
OE4	Suministro, transporte y construccion de tapelosa para mh de diAMETRO EXTERIOR 1,7 M.	UN	1,00	1.783.934	1.783.934,3		1		1,00	1.783.934		-	1,00	1.783.934	-	-
OE5	demolicion de viga de concreto de 0.50x0.30 87	m3	11,23	5.246.244	2.765.543,8		11,23		11,23	2.765.543		-	11,23	2.765.543	-	-
OE6	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC alcantarillado corrugado 10" con caracteristicas (PS 8KN/M2- 57 psi) tipo duafort o similar	M	8,0	166.539	1.332.312,5		8		8,00	1.332.313		-	8,00	1.332.313	-	-
OE7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA	KG	170,5	7.154	1.219.572,3		170,5		170,50	1.219.572		-	170,50	1.219.572	-	-
OE8	Retiro y transporte de poste de energia al sitio definido por la entidad	un	2	312.300	624.600,0		2		2,00	624.600		-	2,00	624.600	-	-
OE9	INSTALACION DE BORDILLOS DE 45 RECUPERADOS, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y RESANE DE JUNTAS	M	25,6	58.743	1.503.820,8		25,6		25,60	1.503.821		-	25,60	1.503.821	-	-
															-	-
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				275.014.577					129.852.077		145.215.003		274.887.080		147.497
	AU			30,00%	82.504.373					38.895.623		43.564.501		82.460.124		44.249
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				357.518.950					168.547.700		188.779.504		357.327.204		191.746

LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ
REP. LEGAL LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

LAURA MELISA CASTAÑO
SUPERVISION CONTRATO

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No2

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA: 5	MES: 7	AÑO: 2026
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	UNIDAD	M2	ITEM	9

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL	FOTO
	area de parqueadero		(65.5+64.3)/2	10.26		666.55	
	reparacion falla calle 28		7.3	2.5		18.25	
	ÁREA A DESCONTAR						
	area tapaloza		1.7	1.7		-2.89	
	sumidero		1.8	0.8		-1.44	
	mhs		1.51			-1.51	
	Jardinera		2.5	1.5		-3.75	
	SUBTOTAL					675.21	
	TOTAL					675.21	

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONTRATISTA
ING, JOSE LEONCIO GÓMEZ

SUPERVISOR
ING, MELISA CASTAÑO

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No2

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA: 6	MES: 7	AÑO: 2026
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte aplicación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.	UNIDAD	M3	ITEM	10

FECHA	LOCALIZACION	CANT	Área		E	SUBTOTAL
	pavimento parqueadero		(65.6+64.3)/2	(11.3+9.6+8.9+10.25)/4	0.10	66.655
	nivelacion sobre carrera 28		7.3	2.5	0.04	0.73
	ÁREA A DESCONTAR					
	area tapaloza		1.7	1.7	0.1	-0.29
	sumidero		1.8	0.8	0.1	-0.14
	mhs		1.51		0.1	-0.15
	Jardinera		2.5	1.5	0.1	-0.38
	SUBTOTAL					66.43
	TOTAL					66.43

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO









CONTRATISTA
ING, JOSE LEONCIO GÓMEZ

SUPERVISOR
ING, MELISA CASTAÑO


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No2

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA: 5	MES: 7	AÑO: 2026
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Demarcacion de lineas para parqueadero con pintura blance trafico	UNIDAD	ML	ITEM	11


FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
			6.0		43.3	260
	SUBTOTAL					260
	TOTAL					260

FOTO

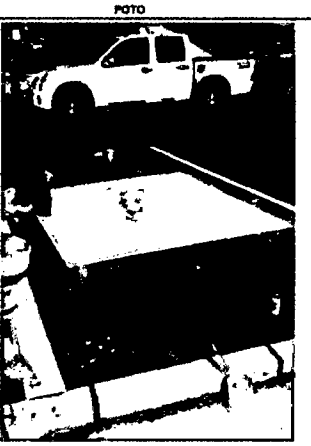

REGISTRO FOTOGRAFICO

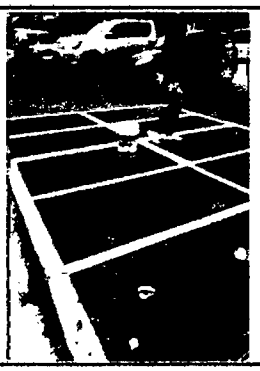

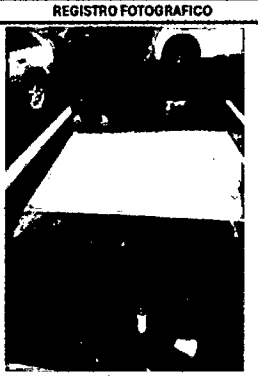



CONTRATISTA
ING, JOSE LEONCIO GÓMEZ

SUPERVISOR
ING, MELISA CASTAÑO
