
CRONOGRAMA CON PRORROGA No. 03 C.O. No. ICCU-139 DE 2025 "INTERVENCIÓN DE VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CRONOGRAMA EJECUCIÓN C.O. No. ICCU-139 DE 2025_CAMINOS VECINALES LOTE 2**	**591.33 días**	**1/04/2025**	**27/02/2027**
2	Inicio contractual	0 días	1/04/2025	1/04/2025
3	**CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS**	**65 días**	**1/04/2025**	**30/06/2025**
4	Proyección de suscripción prórroga No. 02	0 días	16/06/2026	16/06/2026
5	Prórroga No. 03	0 días	1/10/2026	1/10/2026
6	**1 - MANTA**	**442.75 días**	**1/07/2025**	**2/12/2026**
7	PRELIMINARES	133 días	1/07/2025	3/12/2025
8	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	1/07/2025	8/07/2025
9	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	3/12/2025	3/12/2025
10	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	9/07/2025	1/08/2025
11	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	114.75 días	7/10/2025	17/02/2026
12	Afirmado	2 días	15/02/2026	17/02/2026
13	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	2 días	7/10/2025	8/10/2025
14	Remocion de alcantarillas	4 días	28/10/2025	1/11/2025
15	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	7 días	4/11/2025	11/11/2025
16	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	5 días	2/12/2025	6/12/2025
17	MANTENIMIENTO RASANTE	238.75 días	24/02/2026	2/12/2026
18	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	26 días	24/02/2026	23/06/2026
19	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	30 días	27/10/2026	2/12/2026
20	ALCANTARILLAS	313.75 días	5/11/2025	7/11/2026
21	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	5 días	11/12/2025	17/12/2025
22	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	10 días	12/12/2025	24/12/2025
23	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	5 días	6/11/2025	12/11/2025
24	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	15 días	10/11/2025	26/11/2025
25	Relleno para estructuras	5 días	7/11/2025	13/11/2025
26	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	30 días	2/10/2026	7/11/2026
27	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	2 días	13/01/2026	14/01/2026
28	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km	8 días	18/11/2025	27/11/2025
29	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	8 días	15/01/2026	26/01/2026
30	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	5 días	6/11/2025	12/11/2025
31	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	5 días	5/11/2025	11/11/2025
32	**4 - CHOCONTA**	**397.75 días**	**4/08/2025**	**12/11/2026**
33	PRELIMINARES	104 días	4/08/2025	3/12/2025
34	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	4/08/2025	11/08/2025
35	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	3/12/2025	3/12/2025
36	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	12/08/2025	4/09/2025
37	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	90 días	7/10/2025	20/01/2026
38	Afirmado	0 días	20/01/2026	20/01/2026
39	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	7/10/2025	7/10/2025
40	Remocion de alcantarillas	8 días	28/10/2025	5/11/2025
41	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	9 días	4/11/2025	13/11/2025
42	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	7 días	2/12/2025	9/12/2025
43	MANTENIMIENTO RASANTE	153 días	12/05/2026	7/11/2026
44	Gestión y traslado de estabilizante	8 días	12/05/2026	20/05/2026
45	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	25 días	21/05/2026	30/06/2026
46	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	21 días	14/10/2026	7/11/2026
47	ALCANTARILLAS	316.75 días	6/11/2025	12/11/2026
48	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	6 días	11/12/2025	18/12/2025
49	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	13 días	16/12/2025	1/01/2026
50	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	6 días	6/11/2025	13/11/2025
51	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	14.63 días	10/11/2025	26/11/2025
52	Relleno para estructuras	6 días	7/11/2025	14/11/2025
53	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	34 días	2/10/2026	12/11/2026
54	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	9 días	13/01/2026	22/01/2026
55	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	3 días	18/11/2025	20/11/2025
56	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	15 días	15/01/2026	3/02/2026
57	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	6 días	14/11/2025	21/11/2025
58	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	9 días	14/11/2025	24/11/2025
59	**5 - UBATÉ**	**340.75 días**	**7/10/2025**	**10/11/2026**
60	PRELIMINARES	31 días	11/05/2026	16/06/2026
61	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	8/06/2026	13/06/2026
62	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	11/05/2026	11/05/2026
63	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	2 días	15/06/2026	16/06/2026
64	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	185.75 días	7/10/2025	11/05/2026
65	Afirmado	0 días	11/05/2026	11/05/2026
66	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	2 días	7/10/2025	8/10/2025
67	Remocion de alcantarillas	0 días	28/10/2025	28/10/2025
68	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	4/11/2025	4/11/2025
69	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	14 días	2/12/2025	18/12/2025
70	MANTENIMIENTO RASANTE	124.75 días	16/06/2026	10/11/2026
71	Gestión y traslado de estabilizante	1 día	16/06/2026	17/06/2026
72	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	23 días	17/06/2026	14/07/2026
73	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	20 días	17/10/2026	10/11/2026
74	ALCANTARILLAS	315.75 días	9/11/2025	10/11/2026
75	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	2 días	11/12/2025	13/12/2025
76	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	5 días	12/12/2025	18/12/2025
77	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	3 días	13/03/2026	17/03/2026
78	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	8 días	10/11/2025	19/11/2025
79	Relleno para estructuras	2 días	7/11/2025	11/11/2025
80	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	32 días	2/10/2026	10/11/2026
81	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	0 días	11/05/2026	11/05/2026
82	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	2 días	18/11/2025	20/05/2026
83	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	14 días	12/05/2026	28/05/2026
84	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	2 días	6/11/2025	8/11/2025
85	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	3 días	5/11/2025	8/11/2025
86	**2 - SUSA**	**479.55 días**	**9/07/2025**	**27/01/2027**
87	PRELIMINARES	406 días	9/07/2025	27/10/2026
88	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	2/10/2026	8/10/2026
89	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	1/10/2026	1/10/2026
90	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	9/07/2025	27/10/2026
91	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	310.75 días	7/10/2025	3/10/2026
92	Afirmado	2 días	2/10/2026	3/10/2026
93	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	7/10/2025	7/10/2025
94	Remocion de alcantarillas	7 días	28/10/2025	4/11/2025
95	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	4/11/2025	4/11/2025
96	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	17 días	2/12/2025	20/12/2025
97	MANTENIMIENTO RASANTE	93.8 días	2/10/2026	27/01/2027
98	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	2/10/2026	29/10/2026
99	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	18 días	31/12/2026	23/01/2027
100	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	15 días	8/01/2027	27/01/2027
101	ALCANTARILLAS	376.55 días	5/11/2025	26/01/2027
102	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	12 días	11/12/2025	26/12/2025
103	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	29 días	12/12/2025	16/01/2026
104	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	16 días	13/03/2026	2/04/2026
105	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	38.5 días	17/11/2025	2/01/2026
106	Relleno para estructuras	12 días	12/11/2025	27/11/2025
107	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	17 días	5/01/2027	26/01/2027
108	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	27.63 días	13/01/2026	14/02/2026
109	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	7 días	18/11/2025	25/11/2025
110	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	18 días	12/05/2026	1/06/2026
111	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	12 días	7/11/2025	22/11/2025
112	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	9 días	5/11/2025	15/11/2025
113	**10 - SIMIJACA**	**380.75 días**	**20/11/2025**	**15/02/2027**
114	PRELIMINARES	295.75 días	20/11/2025	31/10/2026
115	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	2/10/2026	14/10/2026
116	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	19/12/2025	19/12/2025
117	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	20/11/2025	31/10/2026
118	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	248.75 días	16/12/2025	1/10/2026
119	Afirmado	0 días	1/10/2026	1/10/2026
120	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	16/12/2025	16/12/2025
121	Remocion de alcantarillas	0 días	16/12/2025	16/12/2025
122	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	17/12/2025	17/12/2025
123	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	16/12/2025	16/12/2025
124	MANTENIMIENTO RASANTE	214.75 días	2/06/2026	15/02/2027
125	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	2/06/2026	25/06/2026
126	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	19 días	8/01/2027	30/01/2027
127	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	20 días	23/01/2027	15/02/2027
128	ALCANTARILLAS	105 días	2/10/2026	9/02/2027
129	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	25 días	12/01/2027	9/02/2027
130	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	11 días	2/10/2026	15/10/2026
131	**11 - TAUSA**	**169.3 días**	**16/07/2026**	**6/02/2027**
132	PRELIMINARES	37 días	16/07/2026	28/08/2026
133	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	16/07/2026	23/07/2026
134	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	28/08/2026	28/08/2026
135	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	23/07/2026	13/08/2026
136	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	13 días	13/08/2026	28/08/2026
137	Afirmado	0 días	28/08/2026	28/08/2026
138	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	13/08/2026	13/08/2026
139	Remocion de alcantarillas	0 días	13/08/2026	13/08/2026
140	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	13/08/2026	13/08/2026
141	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	13/08/2026	13/08/2026
142	MANTENIMIENTO RASANTE	160.8 días	27/07/2026	6/02/2027
143	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	27/07/2026	18/08/2026
144	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	22 días	28/08/2026	31/12/2026
145	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	25 días	7/01/2027	6/02/2027
146	ALCANTARILLAS	135.3 días	13/08/2026	26/01/2027
147	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	35 días	12/12/2026	26/01/2027
148	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	13 días	13/08/2026	8/10/2026
149	**7 - SESQUILÉ**	**383.75 días**	**17/10/2025**	**15/01/2027**
150	PRELIMINARES	233.25 días	17/10/2025	16/07/2026
151	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	22/06/2026	27/06/2026
152	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	22/06/2026	22/06/2026
153	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	17/10/2025	16/07/2026
154	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	190 días	12/11/2025	22/06/2026
155	Afirmado	0 días	22/06/2026	22/06/2026
156	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	12/11/2025	12/11/2025
157	Remocion de alcantarillas	1 día	18/11/2025	19/11/2025
158	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	21/11/2025	21/11/2025

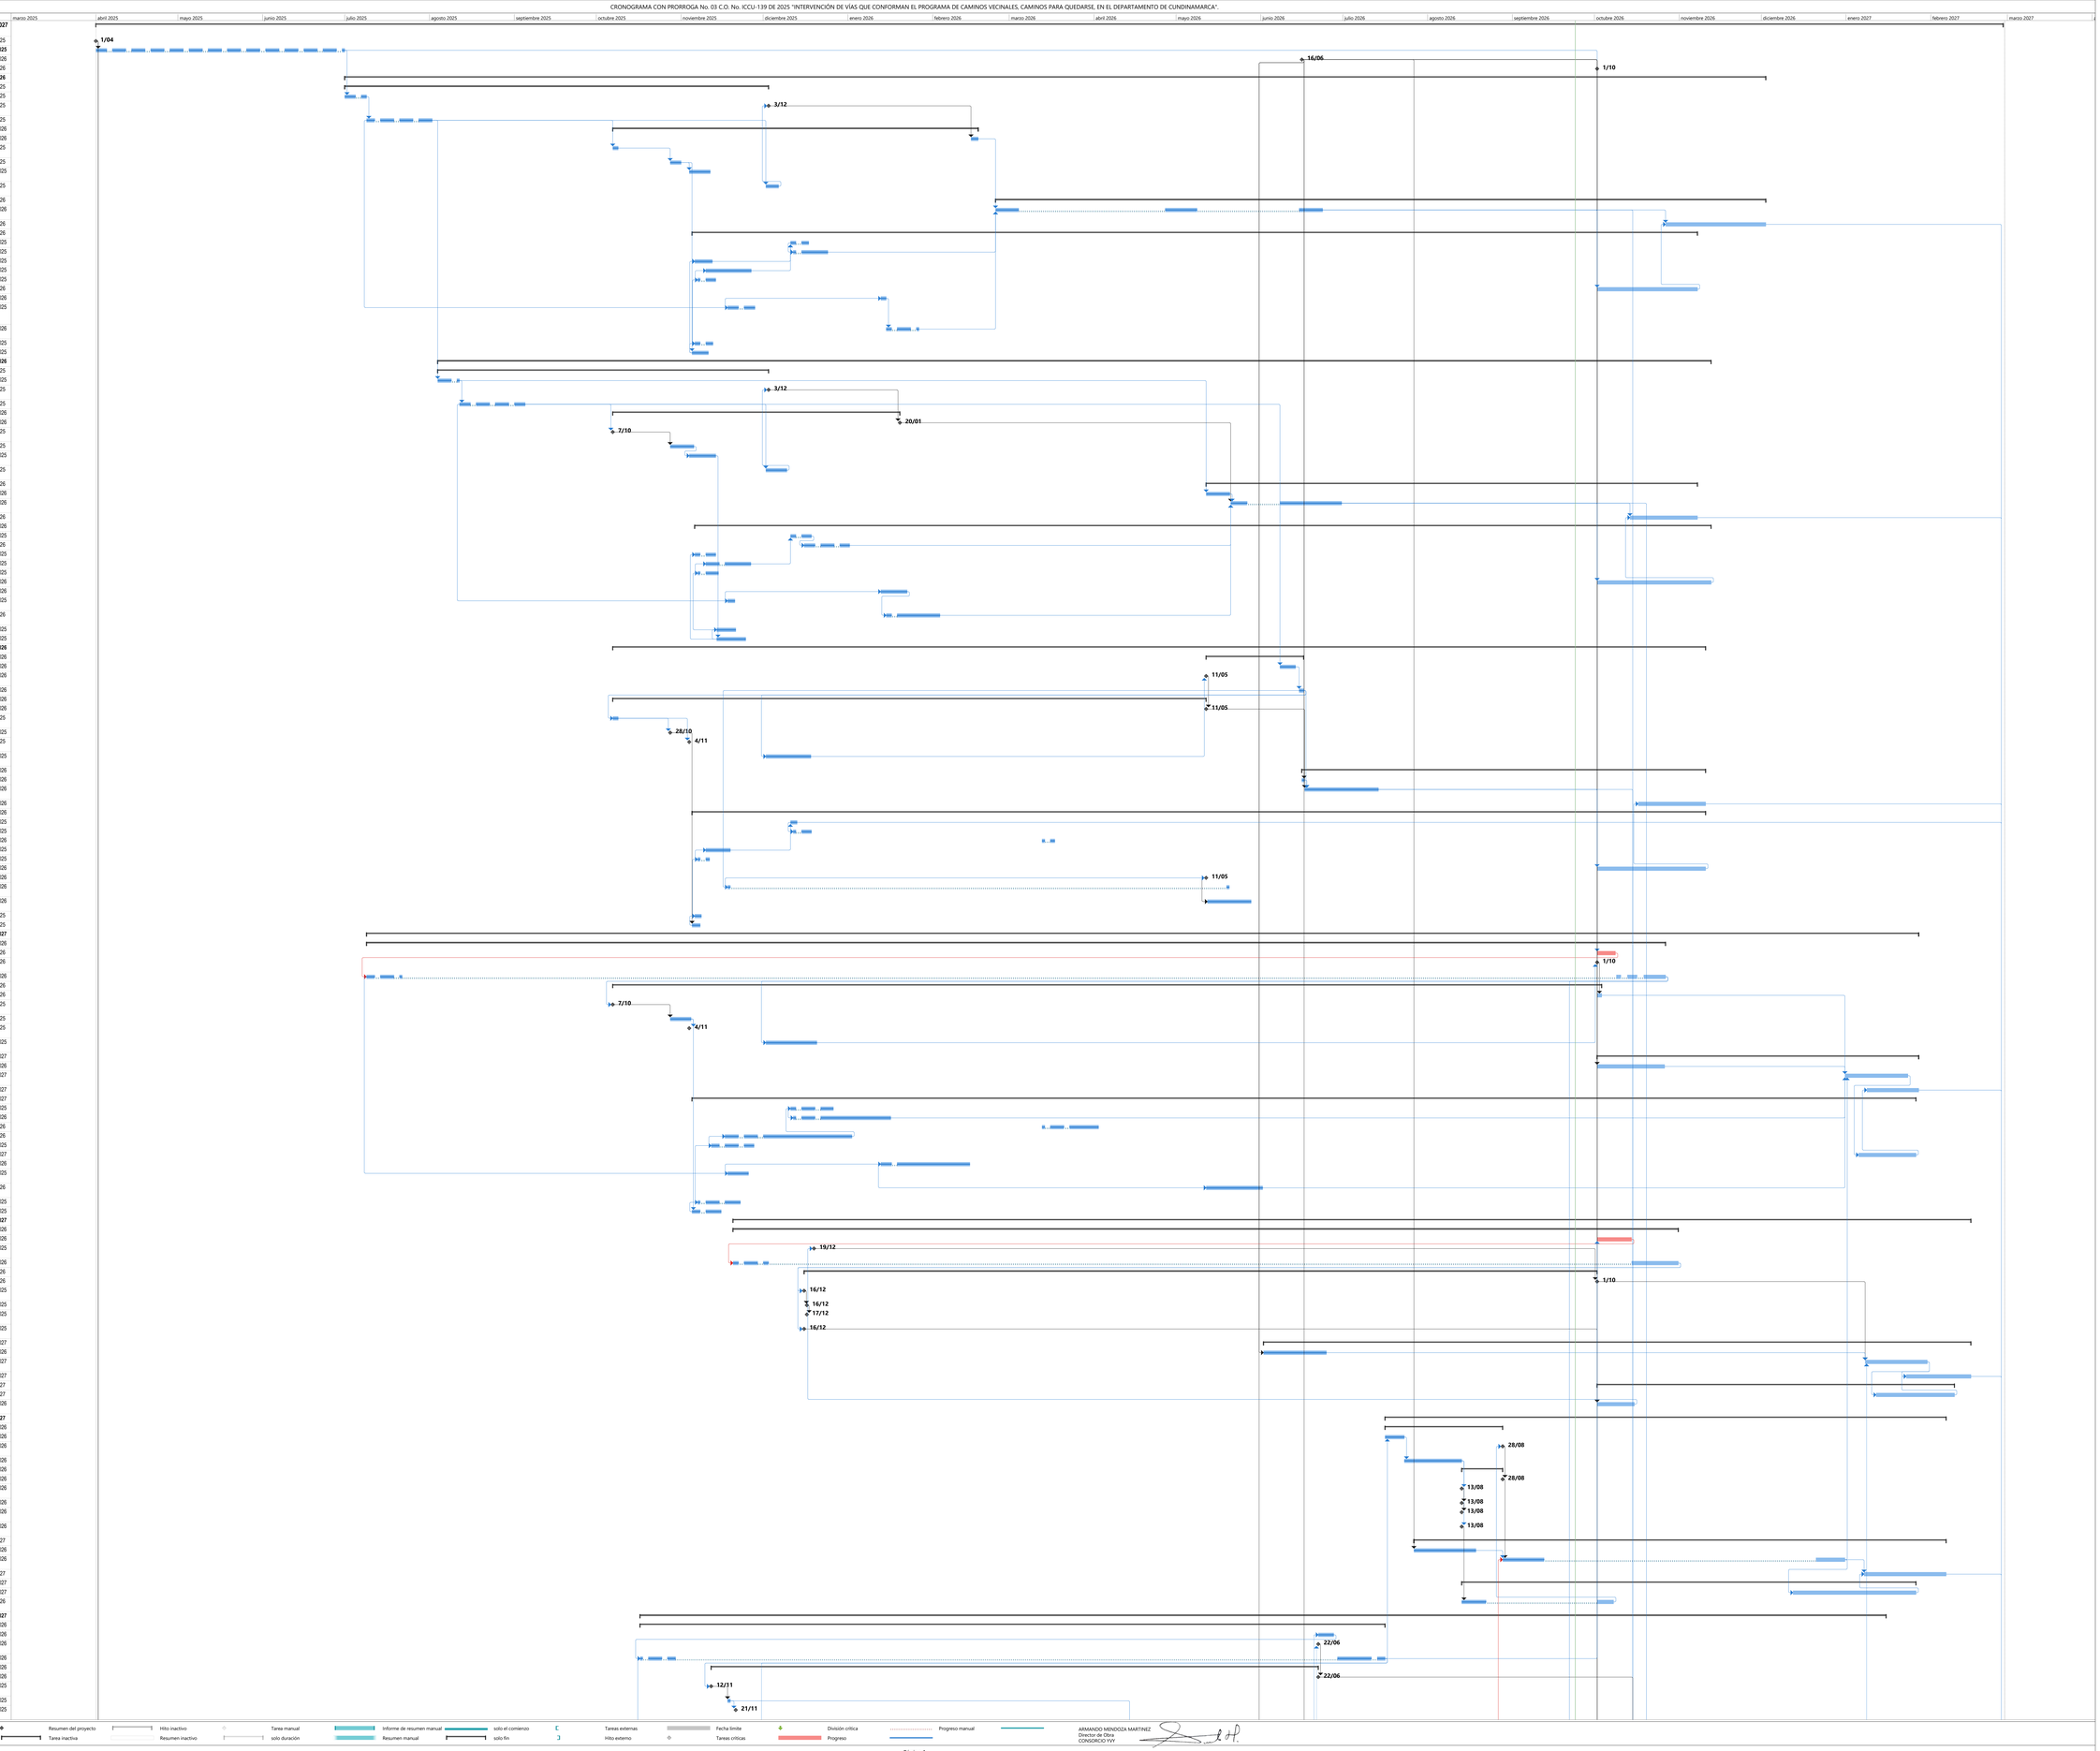


Proyecto: PROGRAMACIÓN VE
Fecha: 24/09/2026

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

ARMANDO MENDOZA MARTINEZ
Director de Obra
CONSORCIO YVY

CRONOGRAMA CON PRORROGA No. 03 C.O. No. ICCU-139 DE 2025 "INTERVENCIÓN DE VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
159	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	12 días	2/12/2025	15/12/2025
160	MANTENIMIENTO RASANTE	188.75 días	2/06/2026	15/01/2027
161	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	2/06/2026	14/10/2026
162	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	54 días	15/10/2026	19/12/2026
163	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	46 días	19/11/2026	15/01/2027
164	ALCANTARILLAS	353.75 días	18/11/2025	12/01/2027
165	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	8 días	24/04/2026	9/06/2026
166	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	18 días	24/04/2026	25/05/2026
167	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	9 días	14/04/2026	18/05/2026
168	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	27 días	14/04/2026	8/06/2026
169	Relleno para estructuras	9 días	14/04/2026	16/05/2026
170	Cuneta estabilizada con químico y cemento	70 días	16/10/2026	12/01/2027
171	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	9 días	12/05/2026	21/05/2026
172	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a ø= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	9 días	18/11/2025	29/11/2025
173	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	8 días	22/05/2026	30/05/2026
174	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	8 días	14/04/2026	27/04/2026
175	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada ø=36	9 días	14/04/2026	28/04/2026
176	**3 - LA PALMA**	**448.75 días**	**12/08/2025**	**21/01/2027**
177	PRELIMINARES	355.25 días	12/08/2025	30/09/2026
178	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	23/09/2026	30/09/2026
179	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes	8 días	4/12/2025	29/06/2026
180	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	12/08/2025	4/09/2025
181	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	310.59 días	7/10/2025	3/10/2026
182	Afirmado	6 días	29/06/2026	6/07/2026
183	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	7/10/2025	7/10/2025
184	Remocion de alcantarillas	5 días	28/10/2025	3/11/2025
185	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	4/11/2025	4/11/2025
186	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	23 días	12/05/2026	3/10/2026
187	MANTENIMIENTO RASANTE	181.75 días	16/06/2026	21/01/2027
188	Gestión y traslado de estabilizante	14 días	16/06/2026	9/10/2026
189	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	64 días	20/10/2026	7/01/2027
190	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	56 días	12/11/2026	21/01/2027
191	ALCANTARILLAS	366.75 días	5/11/2025	14/01/2027
192	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	15 días	24/12/2025	5/10/2026
193	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	33 días	24/12/2025	7/10/2026
194	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	16.99 días	13/03/2026	20/10/2026
195	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	50 días	18/11/2025	10/10/2026
196	Relleno para estructuras	16 días	13/11/2025	3/10/2026
197	Cuneta estabilizada con químico y cemento	60 días	30/10/2026	14/01/2027
198	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	21 días	13/01/2026	6/02/2026
199	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a ø= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	23.99 días	18/11/2025	24/10/2026
200	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	34 días	2/10/2026	12/11/2026
201	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	16 días	10/11/2025	3/10/2026
202	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada ø=36	16.99 días	5/11/2025	3/10/2026
203	MUROS	29 días	2/10/2026	6/11/2026
204	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	25 días	7/10/2026	6/11/2026
205	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	15 días	13/10/2026	29/10/2026
206	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	19 días	2/10/2026	24/10/2026
207	Relleno para estructuras	7 días	20/10/2026	27/10/2026
208	Material granular filtrante	2 días	17/10/2026	19/10/2026
209	Suministro e instalación de geotextil nt 2500 (estabilización, filtro y separación)	4 días	15/10/2026	19/10/2026
210	Tubería drenaje PVC 110	5 días	9/10/2026	15/10/2026
211	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	13 días	5/10/2026	20/10/2026
212	**5 - VILLAGOMEZ**	**344.75 días**	**18/11/2025**	**25/01/2027**
213	PRELIMINARES	19 días	1/10/2026	24/10/2026
214	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	16/10/2026	22/10/2026
215	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes	0 días	1/10/2026	1/10/2026
216	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	2 días	23/10/2026	24/10/2026
217	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	92.75 días	8/07/2026	24/10/2026
218	Afirmado	0 días	1/10/2026	1/10/2026
219	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	24/10/2026	24/10/2026
220	Remocion de alcantarillas	0 días	24/10/2026	24/10/2026
221	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	24/10/2026	24/10/2026
222	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	8 días	8/07/2026	17/07/2026
223	MANTENIMIENTO RASANTE	92 días	2/10/2026	25/01/2027
224	Gestión y traslado de estabilizante	10 días	2/10/2026	14/10/2026
225	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	8 días	14/01/2027	22/01/2027
226	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	7 días	18/01/2027	25/01/2027
227	ALCANTARILLAS	363.75 días	18/11/2025	23/01/2027
228	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	2 días	21/07/2026	23/07/2026
229	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	5 días	21/07/2026	27/07/2026
230	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	3 días	17/07/2026	21/07/2026
231	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	8 días	9/07/2026	18/07/2026
232	Relleno para estructuras	4 días	9/07/2026	14/07/2026
233	Cuneta estabilizada con químico y cemento	8 días	15/01/2027	23/01/2027
234	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	3.5 días	13/01/2026	16/01/2026
235	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a ø= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	2.5 días	18/11/2025	8/07/2026
236	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	3 días	2/10/2026	5/10/2026
237	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	4 días	8/07/2026	13/07/2026
238	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada ø=36	4 días	8/07/2026	13/07/2026
239	**6 - TOPAIPI**	**207 días**	**25/05/2026**	**28/01/2027**
240	PRELIMINARES	130 días	25/05/2026	23/10/2026
241	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	25/05/2026	30/05/2026
242	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes	0 días	1/10/2026	1/10/2026
243	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	2/10/2026	23/10/2026
244	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	56 días	1/10/2026	10/12/2026
245	Afirmado	0 días	1/10/2026	1/10/2026
246	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	23/10/2026	23/10/2026
247	Remocion de alcantarillas	11 días	24/10/2026	6/11/2026
248	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	6/11/2026	6/11/2026
249	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	38 días	24/10/2026	10/12/2026
250	MANTENIMIENTO RASANTE	90 días	2/10/2026	22/01/2027
251	Gestión y traslado de estabilizante	10 días	2/10/2026	14/10/2026
252	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	72 días	15/10/2026	13/01/2027
253	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	65 días	3/11/2026	22/01/2027
254	ALCANTARILLAS	87 días	13/10/2026	28/01/2027
255	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	13 días	24/12/2026	9/01/2027
256	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	28 días	24/12/2026	28/01/2027
257	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	14 días	11/12/2026	29/12/2026
258	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	42 días	14/11/2026	6/01/2027
259	Relleno para estructuras	14 días	14/11/2026	1/12/2026
260	Cuneta estabilizada con químico y cemento	82 días	13/10/2026	22/01/2027
261	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	21 días	19/10/2026	12/11/2026
262	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a ø= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km	18 días	15/10/2026	5/11/2026
263	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	40 días	22/10/2026	10/12/2026
264	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	13 días	11/11/2026	26/11/2026
265	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada ø=36	14 días	7/11/2026	24/11/2026
266	MUROS	24 días	10/11/2026	9/12/2026
267	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	8 días	14/11/2026	24/11/2026
268	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	16 días	20/11/2026	9/12/2026
269	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	8 días	10/11/2026	19/11/2026
270	Relleno para estructuras	8 días	27/11/2026	5/12/2026
271	Material granular filtrante	6 días	25/11/2026	1/12/2026
272	Suministro e instalación de geotextil nt 2500 (estabilización, filtr	6 días	23/11/2026	28/11/2026
273	Tubería drenaje PVC 110	5 días	18/11/2026	23/11/2026
274	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	20 días	12/11/2026	5/12/2026
275	**8 - YACOPI**	**202.33 días**	**29/06/2026**	**27/02/2027**
276	PRELIMINARES	18.58 días	2/10/2026	24/10/2026
277	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	2/10/2026	8/10/2026
278	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes	6 días	17/10/2026	24/10/2026
279	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	5 días	9/10/2026	15/10/2026
280	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	115.33 días	29/06/2026	12/11/2026
281	Afirmado	20 días	19/10/2026	12/11/2026
282	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	4.5 días	16/10/2026	21/10/2026
283	Remocion de alcantarillas	8 días	29/06/2026	20/10/2026
284	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	4.5 días	21/10/2026	26/10/2026
285	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	2 días	29/06/2026	17/10/2026
286	MANTENIMIENTO RASANTE	97 días	30/10/2026	27/02/2027
287	Concreto clase D, fc =3000 PSI (Bases) Huellas y Vigas	65 días	6/11/2026	27/01/2027
288	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	60 días	25/11/2026	8/02/2027
289	Cuneta de concreto clase E, 2000 PSI fundida en el lugar	40 días	12/01/2027	27/02/2027
290	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	30 días	30/10/2026	7/12/2026
291	ALCANTARILLAS	136.33 días	29/06/2026	7/12/2026
292	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	19 días	14/08/2026	13/11/2026
293	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	19 días	14/08/2026	21/10/2026
294	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	19 días	1/08/2026	4/12/2026
295	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	25 días	16/07/2026	26/10/2026
296	Relleno para estructuras	19 días	9/07/2026	16/10/2026
297	Cuneta en geomembrana de polietileno HDPE 0.75mm	0 días	7/12/2026	7/12/2026
298	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	10.5 días	17/10/2026	29/10/2026
299	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a ø= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	10.5 días	14/10/2026	26/10/2026
300	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	8.5 días	21/10/2026	30/10/2026
301	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	19 días	6/07/2026	16/10/2026
302	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada ø=36	27 días	29/06/2026	23/10/2026
303	MUROS	30 días	24/10/2026	30/11/2026
304	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (bases)	8 días	31/10/2026	10/11/2026
305	Concretos clase D, f'c =3000 PSI (elevaciones)	8 días	9/11/2026	18/11/2026
306	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	8 días	24/10/2026	3/11/2026
307	Relleno para estructuras	9 días	20/11/2026	30/11/2026
308	Material granular filtrante	8 días	17/11/2026	25/11/2026
309	Suministro e instalación de geotextil nt 2500 (estabilización, filtro y separación)	8 días	12/11/2026	21/11/2026
310	Tubería drenaje PVC 110	8 días	5/11/2026	13/11/2026
311	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	9 días	28/10/2026	7/11/2026
312	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)**	**407 días**	**1/04/2025**	**26/02/2027**
313	**GUIA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)**	**407 días**	**1/04/2025**	**26/02/2027**
314	Final contractual	0 días	27/02/2027	27/02/2027

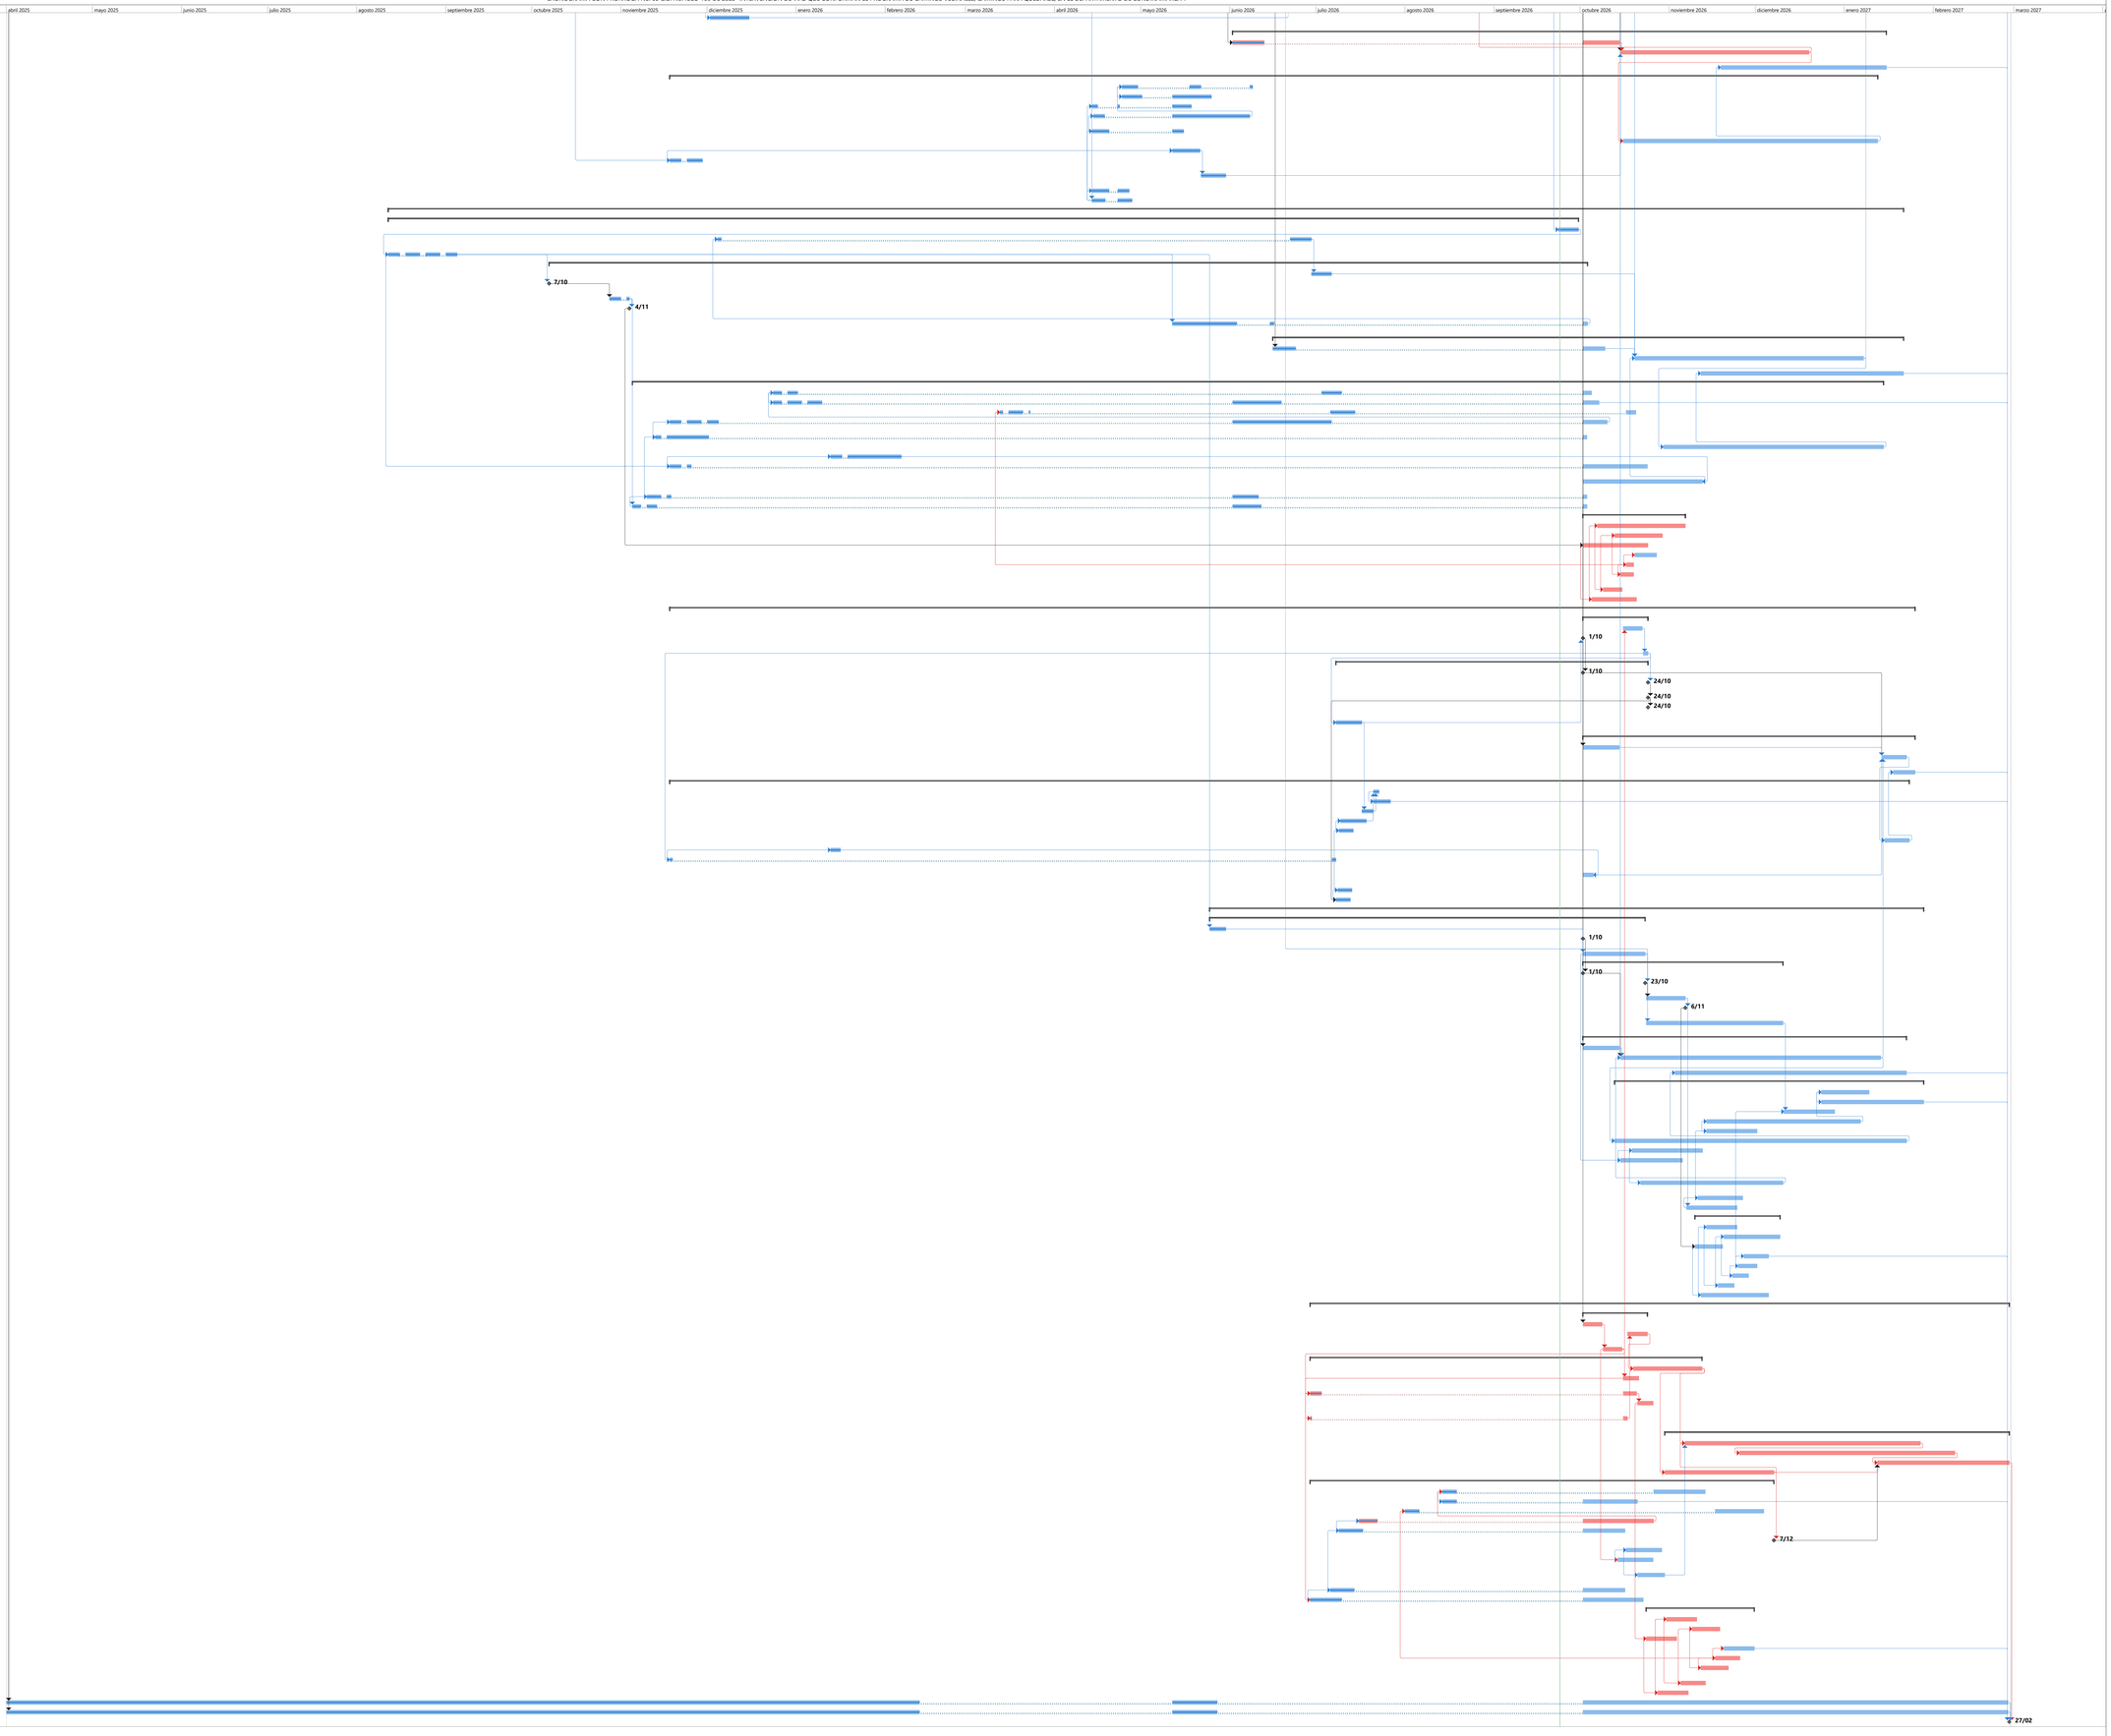

Proyecto: PROGRAMACIÓN VE
Fecha: 24/09/2026

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

ARMANDO MENDOZA MARTINEZ
Director de Obra
CONSORCIO YVY
