CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026

NIT: 902.058.961-5

6778

San Martin, 23 de Septiembre de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Atn: Ing. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Dirección: Carrera 5 No. 4 – 75 Barrio Fundadores
San Martín - Meta

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA 23-SEP-2026 8:30 a.m.
RECIBIDO

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026.**Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META DE LOS LLANOS, META"**

ASUNTO: **INFORME MENSUAL No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA**

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo del CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026. firma interventora del Contrato de Obra No. 109 de 2026 "Mejoramiento de la carrera 5 entre calles 10 - 20 del Municipio de San Martín, Meta de los Llanos, Meta"

Por medio de la presente hago entrega de la documentación revisada y avalada del Informe Mensual No. 4 del Contrato de la referencia, periodo de ejecución desde el **7 de agosto de 2026 al 6 de septiembre de 2026.**

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, comentario o aprobación.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES
C.C. 9.396.784 expedida en Sogamoso
R.L. CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026

312 522 4011
ingeollanos@gmail.com
Carrera 16 No. 18-23 Barrio El Remanso

6771

Villavicencio, 15 de septiembre de 2026

Señores:

CCRA5-CE-025-2026

MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META
Secretaria de Infraestructura
Supervisor del contrato de Obra Publica No 109 de 2026

Recibe: Jhon Gonzalez 15/09/26 5:00 p.m

REFERENCIA: CONTRATO N° 109 DE 2026 MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10- 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META

ASUNTO: Entrega informe mensual No 4

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos remitir el Informe Mensual No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de agosto y el 06 de septiembre de 2026.

La documentación se remite para su revisión, verificación y aprobación, según corresponda, una vez atendidas y subsanadas las observaciones formuladas, con el propósito de dar continuidad al desarrollo y ejecución de las actividades contempladas en el proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, comentario o requerimiento adicional que se derive de la revisión de la documentación presentada.

Atentamente,

ING. LEONARDO ANDRES BORDA IPUS
DIRECTOR DE OBRA

6780

INFORME MENSUAL DE OBRA

6781

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META."



CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME MENSUAL No. 04

(07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

6782

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3

1. OBJETIVOS 4
2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 6
8. CONCLUSIONES 26

6783

INTRODUCCION

El Municipio de San Martin de los Llanos-Meta, suscribió el Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"** con la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, Actuando como Representante Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS, por un valor de "CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278´148.553.00) M/CTE".

El presente documento corresponde al informe mensual No. 4, describiendo el avance de las actividades del Contrato de Obra No. 109 de 2026, durante el periodo comprendido entre el 07 de agosto de 2026 hasta el día 06 de septiembre de 2026.

El presente informe contendrá los siguientes aspectos:

- Generalidades del proyecto.
- Condiciones del Contrato.
- Relación de actas.
- Control de pólizas.
- Maquinaria y equipo Utilizados.
- Personal en obra.
- Avance del proyecto.
- Registro de lluvias.
- Registro Fotográfico.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

- Dar a conocer y entregar por medio de este informe las actividades de obra durante el periodo comprendido entre el 07 de JULIO de 2026 hasta el día 06 de AGOSTO de 2026.

2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

2.1.2 LOCALIZACION

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META",** se ejecutan sobre el corredor vial correspondiente a la Carrera 5, entre las calles 10 y 20, ubicado en el casco urbano del municipio de San Martín, departamento del Meta.

El municipio de San Martín se encuentra localizado en la región centro-oriental del departamento del Meta, aproximadamente a 70 km de la ciudad de Villavicencio. El área de intervención corresponde a uno de los principales ejes viales urbanos del municipio,

sobre el cual se desarrollan las actividades contempladas en el contrato, orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial y al fortalecimiento de las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para los usuarios.

La localización del proyecto permite intervenir un corredor de alta importancia para la conectividad urbana del municipio, beneficiando tanto a la población residente como a los diferentes actores que hacen uso de esta vía para el desarrollo de actividades comerciales, institucionales y de transporte.



Ilustración 1 Localización del proyecto.

2.1.3 UBICACIÓN DE LA OBRA

Los sectores donde actualmente se adelanta las actividades del proyecto están en la carrera 5 entre las calles 10 y calle 20 del casco urbano.

6786



Ilustración 2 Zona a intervenir carrera 5 entre calle 10 a 20 San Martin Meta

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 de 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000179 del 16 de febrero de 2026
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META

Valor Total del Contrato:	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278´148.553.00) M/CTE
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT No.902.054.725 – 5 Rep. Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS C.C.No.1.006.776.424 de VILLAVICENCIO Meta
Fecha Del Contrato:	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026
Nombre Del Supervisor:	ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Cargo Del Supervisor:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Plazo De Ejecución:	CINCO (5) MESES
Fecha de Inicio:	07 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación:	06 DE OCTUBRE DE 2026

3.2GENERALIDALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO Nº	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 111 DE 2026
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SANMARTÍN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026 NIT. 902.058.961-5 R/L NELSON ORLANDO BARRERA TORRES C.C. 9.396.784 DE SOGAMOSO
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($ 223.382.322,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/04/2026
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	07/05/2026

6788

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/10/2026
SUPERVISIÓN A CARGO	Ing. JAIRO ABDUL RICO ENCISO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VIA				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	1,06	$ 3.780.000,00	$ 4.006.800,00
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	9,74	$ 562.000,00	$ 5.473.880,00
1.2.2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	407,87	$ 370.000,00	$ 150.911.900,00
1.2.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	509,83	$ 520.000,00	$ 265.111.600,00
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	173	$ 290.000,00	$ 50.170.000,00
1.3	EXCAVACIONES				
1.3.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	6249,08	$ 60.000,00	$ 374.944.800,00
1.3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1071	$ 290.000,00	$ 310.590.000,00
1.4	RELLENOS				
1.4.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	1351,15	$ 97.000,00	$ 131.061.550,00
1.4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2195,62	$ 184.500,00	$ 405.091.890,00

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.3	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1857,84	$ 204.500,00	$ 379.928.280,00
1.5	**CARPETA ASFALTICA**				
1.5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8444,7	$ 11.650,00	$ 98.380.755,00
1.5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	844,47	$ 1.600.000,00	$ 1.351.152.000,00
1.6	**BORDILLOS Y ANDENES**				
1.6.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	576	$ 140.000,00	$ 80.640.000,00
1.6.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	216	$ 160.000,00	$ 34.560.000,00
1.6.3	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1266,3	$ 165.000,00	$ 208.939.500,00
1.7	**SEÑALIZACION VIAL**				
1.7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	3186	$ 7.000,00	$ 22.302.000,00
1.7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	284,8	$ 47.000,00	$ 13.385.600,00
1.7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60	$ 496.000,00	$ 29.760.000,00
1.8	**NIVELACION POZOS Y SUMIDEROS**				
1.8.1	RENIVELACIÓN DE POZOS Y SUMIDEROS EXISTENTES. INCLUYE DEMOLICIÓN.	UN	34	$ 1.100.000,00	$ 37.400.000,00
2	**ALCANTARILLADO**				
2.1	**PRELIMINARES**				

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO	ML	850,88	$ 6.300,00	$ 5.360.544,00
2.2	**EXCAVACIONES**				
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50 M	M3	559,16	$ 56.000,00	$ 31.312.960,00
2.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H < 3.00 M	M3	1824,81	$ 69.000,00	$ 125.911.890,00
2.2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	154	$ 290.000,00	$ 44.660.000,00
2.3	**TUBERIA**				
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	233,51	$ 265.000,00	$ 61.880.150,00
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	64,49	$ 300.000,00	$ 19.347.000,00
2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	355,02	$ 365.000,00	$ 129.582.300,00
2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM F16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	93,65	$ 510.000,00	$ 47.761.500,00
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	198,92	$ 1.020.000,00	$ 202.898.400,00
2.4	**RELLENOS**				
2.4.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3	483,73	$ 250.000,00	$ 120.932.500,00
2.4.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1579,29	$ 36.000,00	$ 56.854.440,00
2.5	**CARCAMOS PARA CIMENTACION SUPERFICIAL**				
2.5.1	CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	29,02	$ 1.630.000,00	$ 47.302.600,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1440,75	$ 11.000,00	$ 15.848.250,00
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YUMBOLON #15	M2	40,37	$ 17.000,00	$ 686.290,00
2.6	**POZOS DE INSPECCION**				

6791

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.6.1	PLACA CUBIERTA- POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28 MPA ELAB. OBRA E=0.20 M, INC AROTAPA/BASE TRAF_PESADO)	UN	20	$ 2.900.000,00	$ 58.000.000,00
2.6.2	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA ELAB EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	ML	25,9	$ 1.550.000,00	$ 40.145.000,00
2.6.3	PLACA CIRCULAR BASE-POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	20	$ 1.250.000,00	$ 25.000.000,00
2.6.4	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C=28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	13	$ 320.000,00	$ 4.160.000,00
2.6.5	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C=28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	6	$ 410.000,00	$ 2.460.000,00
2.7	**SUMIDEROS**				
2.7.1	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	34	$ 4.900.000,00	$ 166.600.000,00
3	**URBANISMO**				
3.1	**URBANISMO ANDENES**				
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	45	$ 95.000,00	$ 4.275.000,00
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	300	$ 170.000,00	$ 51.000.000,00
3.1.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI -20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4,5	$ 183.000,00	$ 823.500,00
3.2	**MOBILIARIO**				
3.2.1	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	2	$ 915.000,00	$ 1.830.000,00

6792

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.2.2	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	12	$ 735.000,00	$ 8.820.000,00
3.2.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	30	$ 415.000,00	$ 12.540.000,00
3.2.4	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6	$ 2.000.000,00	$ 12.000.000,00
3.2.5	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	20	$ 450.000,00	$ 9.000.000,00
	VALOR COSTO TOTAL REDONDEADO AL PESO				**$ 5.260.802.879,00**
	ADMINISTRACIÓN (28%)				$ 1.473.024.806,12
	IMPREVISTOS (1%)				$ 52.608.028,79
	UTILIDAD (5%)				$ 263.040.143,95
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.788.672.978,86**
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				**$ 5.260.802.879,00**
	BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PUBLICA				
	PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL	UN	1	$ 8.742.555,50	$ 8.742.555,50
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN	1	$ 8.603.118,50	$ 8.603.118,50
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 5.278.148.553,00**

3.4 RELACION DE ACTAS

ACTAS / CONTRATOS	FECHA	CAUSAL
Acta de Inicio	07/05/2026	Inicio de Actividades de Obra

3.5 CONTROL DE POLIZAS

Estas pólizas fueron expedidas en la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, siendo asegurado MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META, de la siguiente forma:

6793

SEGÚN CONTRATO DE OBRA

No. de Póliza 360 47 994000064883– Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2026	13/01/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/04/2026	13/09/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/04/2026	13/09/2026	$700,362,000.00

SEGÚN ACTA DE INICIO

No. de Póliza 360 47 994000064883 – Anexo 2


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2026	06/02/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2026	06/10/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2026	06/10/2026	$700,362,000.00

3.6 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

En el desarrollo del Proyecto se cuenta con una estructura de dirección con base en la Alcaldía de san Martín de los llanos.

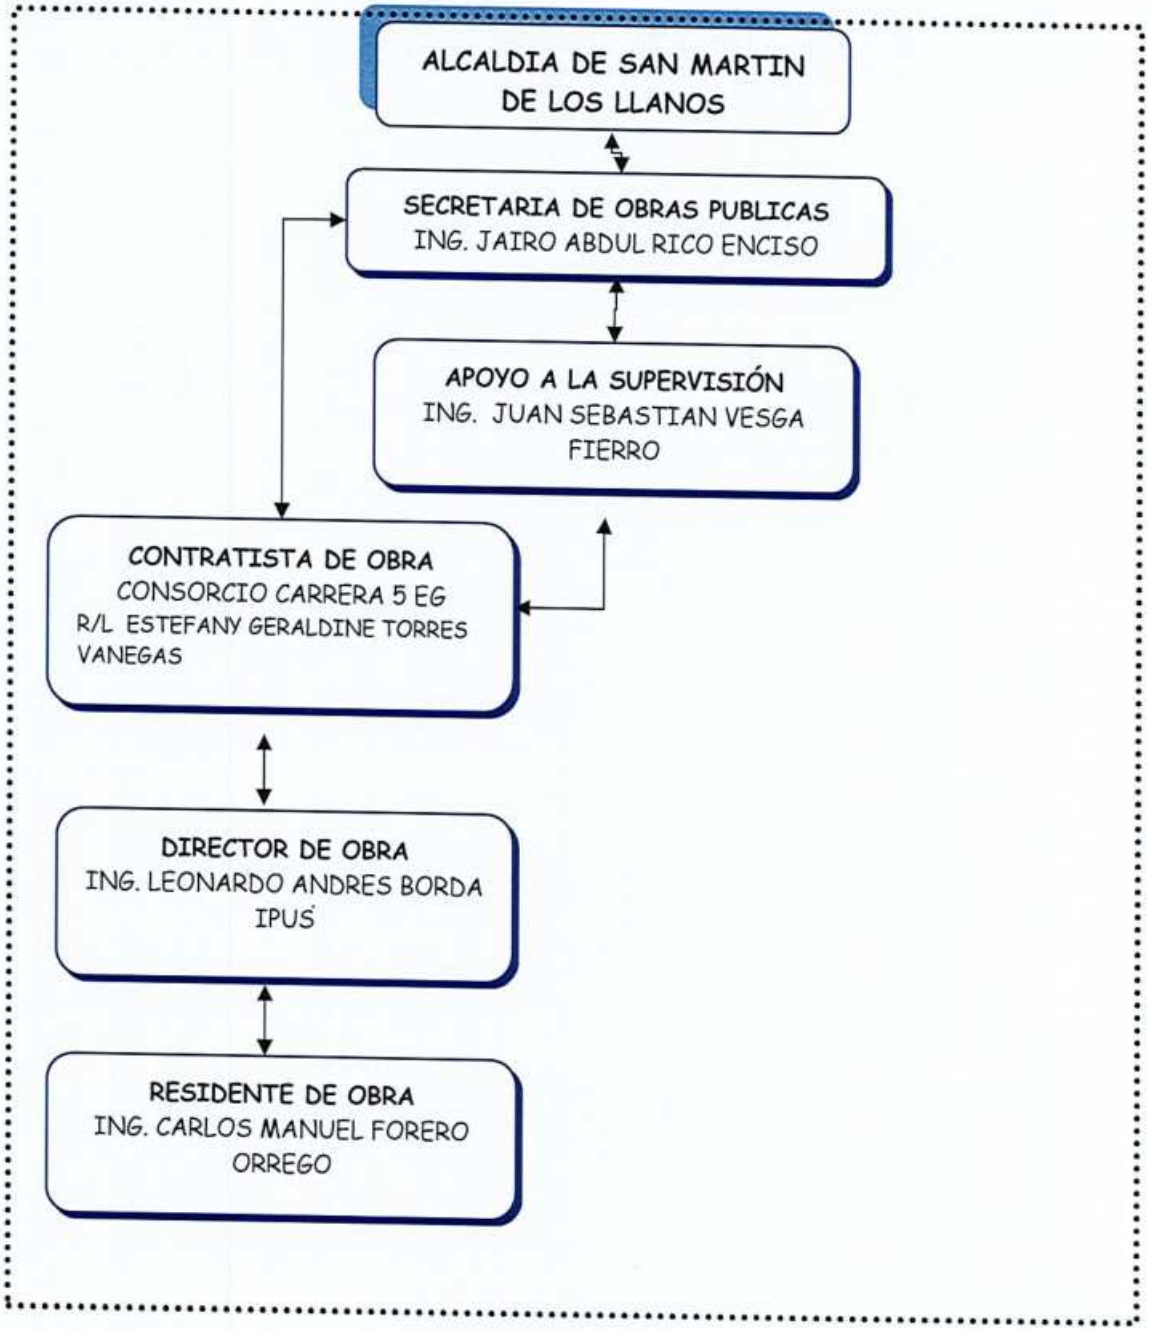

3.7PERSONAL EN OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	INDEPENDIENTE
2	NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	1.121.830.599	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	INDEPENDIENTE
4	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECILISTA VIAS	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	INDEPENDIENTE
5	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	INDEPENDIENTE
6	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST	PROTEGER	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

PERSONAL TECNICO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	QUINTERIO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

3.8 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES PERSONAL EN OBRA

Es importante mencionar que al presente informe se anexan planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al presente periodo. Debido a que como las obligaciones de seguridad social de algunos empleados se les imputan a las personas naturales y jurídicas que integran el CONSORCIO CARRERA 5 EG, tal como lo establece la Ley 80 de 1993. Y teniendo en cuenta, que el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar a ellos, tal y como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941-1	09/09/2026
MARIA FERNANDA QUEVEDO ESP. HIDRAULICO	1.121.862.487-1	18/09/2026
JAIME ANDRES CAÑON DONCEL ESP. VIAS	1.049.630.249-9	10/09/2026
PAULA ANDREA PARDO REDONDO ESP. AMBIENTAL	1.121.889.444-2	10/09/2026
CONSORCIO CARRERA 5 EG	902.054.725-5	07/09/2026
APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS	901882346-5	10/09/2026
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	900.862.112-1	03/09/2023

6797

3.9AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Valor Proyecto	$5.278´148.553.00
Anticipo	N. A
Avance Financiero	32,52%

3.10 AVANCE FISICO

AVANCE FISICO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Valor Inicial Proyecto	$5.278´148.553.00
Valor Actualizado Proyecto	$5.278´148.553.00
Valor ejecutado en el periodo	$ 302.411.700
Porcentaje ejecutado en el periodo	5,72%
Valor Ejecutado acumulado	$ 2.247.689.056,00
Porcentaje Ejecutado acumulado	42,58%

6798

3.11 AVANCE EN TIEMPO

AVANCE EN TIEMPO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
TIEMPO INICIAL PROYECTO	CINCO (5) MESES
TIEMPO DE EJECUCION A LA FECHA	CUATRO (4) MESES
Avance Porcentual	80%

3.12 MAQUINARIA Y EQUIPO


TIPO MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1
MINICARGADOR	1
MOTONIVELADORA	1
VIBROCOMPACTADOR	1
HERRAMIENTA MENOR	GL
PLANTA ELÉCTRICA	1
VIBRADOR DE CONCRETO	1
COMPACTADOR MANUAL	2

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se han ejecutado las siguientes cantidades de obra:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						II. TOTAL ACUMULADO					
						PROGRAMADO			EJECUTADO		
				TOTAL CONTRATO	$ 5.278.148.553	PROGRAMADO HASTA LA FECHA	$ 4.804.004.396 91,02%		EJECUTADO HASTA LA FECHA		$ 2.247.689.056 42,58%
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTIVIDAD	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO SOBRE EL TOTAL
1	VIA										
1.2	DEMOLICIONES										
1.2.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	509,83	$ 520.000	$ 265.111.600	509,83	$ 265.111.600	100,0%	339,67	$ 176.625.800	66,62%
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	173,00	$ 290.000	$ 50.170.000	173,00	$ 50.170.000	100,0%	173,00	$ 50.170.000	100,00%
1.3	EXCAVACIONES										
1.3.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	6.249,08	$ 60.000	$ 374.944.800	6249,08	$ 374.944.800	100,0%	4.940,89	$ 296.453.400,00	79,07%
1.3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1.071,00	$ 290.000	$ 310.590.000	1071,00	$ 310.590.000	100,0%	778,77	$ 225.843.300	72,71%
1.6	BORDILLOS Y ANDENES										
1.6.3	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.266,30	$ 165.000	$ 208.939.500	1266,30	$ 208.939.500	100,0%	1.088,00	$ 179.520.000,00	85,9%
2	ALCANTARILLADO										
2.3	TUBERIA										
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	233,51	$ 265.000	$ 61.880.150	233,51	$ 61.880.150	100,0%	233,51	$ 61.880.150,00	100,0%
2.5	CARCAMOS PARA CIMENTACION SUPERFICIAL										
2.5.2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1.440,75	$ 11.000	$ 15.848.250	1440,75	$ 15.848.250	100,0%	288,15	$ 3.169.650,00	20,0%
2.6	POZOS DE INSPECCION										
2.6.2	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA ELAB EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	ML	25,90	$ 1.550.000	$ 40.145.000	25,90	$ 40.145.000	100,0%	21,92	$ 33.976.000	84,6%
2.7	SUMIDEROS										
2.7.1	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UN	34,00	$ 4.900.000	$ 166.600.000	34,00	$ 166.600.000	100,0%	34,00	$ 166.600.000,00	100,0%
3	URBANISMO										
3.2	MOBILIARIO										
3.2.1	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	2,00	$ 915.000	$ 1.830.000	0,67	$ 610.000	33,3%	1,60	$ 1.464.000	80,0%
3.2.2	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	12,00	$ 735.000	$ 8.820.000	4,00	$ 2.940.000	33,3%	9,60	$ 7.056.000,00	80,0%
3.2.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	30,00	$ 415.000	$ 12.450.000	10,00	$ 4.150.000	33,3%	24,00	$ 9.960.000,00	80,0%
3.2.4	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 2.000.000	$ 12.000.000	2,00	$ 4.000.000	33,3%	4,80	$ 9.600.000	80,0%
3.2.5	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	20,00	$ 450.000	$ 9.000.000	6,67	$ 3.000.000	33,3%	16,00	$ 7.200.000	80,0%

5. PROGRAMADO VS EJECUTADO

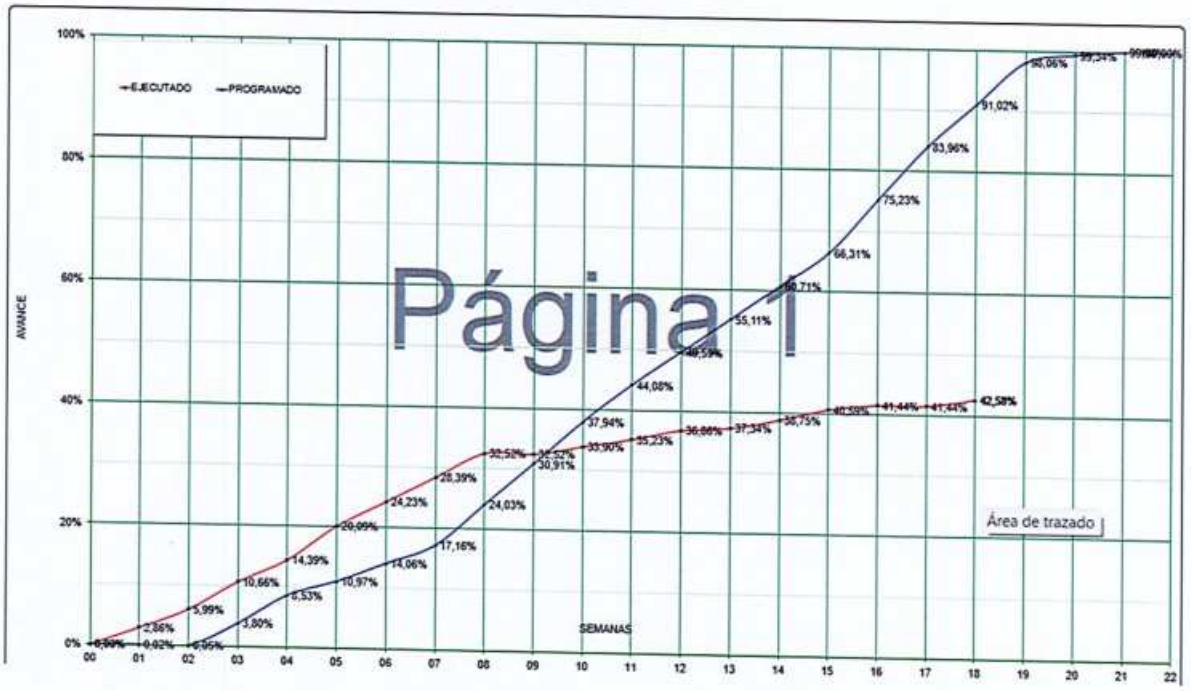

Página 1

6. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Como soporte de las actividades ejecutadas durante el presente periodo, se anexan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en obra, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de calidad establecidos para el proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

1.2.3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)





1.2.4 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES





1.3.1 EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	
	

1.3.2 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	
	

1.6.3 SARDINEL PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80*50*20CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO



2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE



2.5.2 ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60000PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO COLOCACION Y AMARRE






2.6.2 CILINDRO POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. FÇ=28MPA ELAB EN OBRA E=2.20M INCLUYE ESCALERA DE GATO



2.7.1 SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"

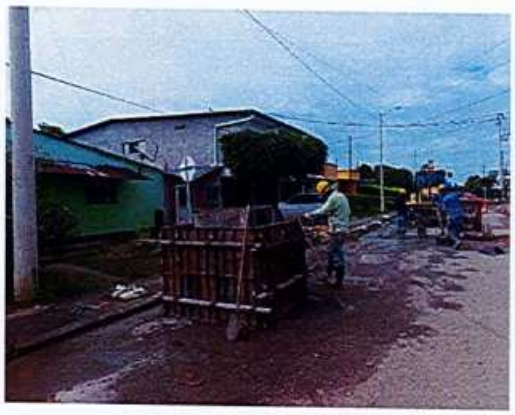



3.2.1 CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA
3.2.2 CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA
3.2.3 BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA
3.2.4 BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
3.2.5 PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA



8. CONCLUSIONES

Durante el periodo objeto del presente informe, el proyecto presenta un avance físico acumulado ejecutado del 42,58 % frente a un avance programado acumulado del 91,02 %, evidenciándose una diferencia de 48,44 puntos porcentuales respecto a la programación prevista. Esta condición refleja un desfase significativo en la ejecución de las actividades contractuales, por lo cual se requiere continuar fortaleciendo los frentes de trabajo y los rendimientos de las actividades pendientes. El cuadro de programación y ejecución del informe registra dichos porcentajes acumulados.

Durante la ejecución se han presentado condiciones particulares en diferentes sectores del corredor vial que han incidido en los rendimientos inicialmente previstos. Una vez adelantadas las actividades de demolición del pavimento rígido, fue necesario verificar las condiciones reales del material existente debajo de la estructura retirada, con el propósito de determinar su comportamiento y establecer las actividades requeridas antes de continuar con la conformación de la nueva estructura vial.

En este sentido, se realizaron apiques de verificación en los sectores comprendidos entre la Calle 10 y la Calle 13, específicamente en los tramos K0+000 a K0+102,15, K0+118,97 a K0+229,69 y K0+249,02 a K0+339,54. Estas verificaciones permitieron identificar directamente las condiciones del material subyacente encontrado después de la demolición del pavimento rígido y contar con información de campo para definir técnicamente las intervenciones necesarias en cada sector.

Las condiciones identificadas durante la ejecución han requerido, en determinados puntos, actividades adicionales relacionadas con excavación, retiro y disposición de material, adecuación y posterior conformación de las zonas intervenidas, con el fin de garantizar condiciones apropiadas para la construcción de la estructura vial. La necesidad de atender estas situaciones ha incidido directamente en los rendimientos y en el desarrollo de la programación inicialmente prevista.

De igual manera, las intervenciones realizadas en las diferentes intersecciones de la Carrera 5 han requerido procesos de adecuación y conformación previos a la ejecución de las actividades posteriores. El informe registra trabajos en diferentes componentes del proyecto, incluyendo demolición de pavimento rígido, excavaciones para caja vial, transporte y disposición de sobrantes, instalación de sardines, redes de alcantarillado, pozos de inspección, sumideros y urbanismo.

Dentro de las actividades ejecutadas se observan avances importantes en algunos componentes, alcanzándose el 100 % en actividades como el transporte y disposición final de escombros correspondiente al ítem 1.2.4, la instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado de 250 mm y la construcción de sumideros; asimismo, se registran avances del 79,07 % en excavación mecánica para cajas de vía, 85,9 % en sardinel prefabricado tipo A-10 y 84,6 % en cilindros para pozos de inspección.

En el componente de urbanismo y mobiliario urbano se evidencia igualmente avance en el suministro de ciclo-parqueaderos tipo M100, canecas tipo M120, bolardos tipo M62, bancas en concreto tipo M30 y protectores de árbol tipo M91, elementos previstos para complementar las condiciones funcionales y urbanísticas del corredor intervenido.

Adicionalmente, durante algunas jornadas se presentaron condiciones climáticas adversas, principalmente precipitaciones, que afectaron el normal desarrollo de actividades asociadas a excavaciones, conformación y compactación de materiales, las cuales requieren condiciones adecuadas de humedad y estabilidad para garantizar los resultados técnicos esperados. Como consecuencia, algunas actividades debieron ajustarse o reprogramarse temporalmente con el propósito de preservar la calidad de los trabajos ejecutados.

Como parte del control de calidad, durante el periodo se realizaron y anexaron los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra, orientados a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

Finalmente, teniendo en cuenta que el proyecto presenta un avance ejecutado acumulado del 42,58 % frente al 91,02 % programado, se hace necesario implementar y mantener medidas orientadas a la recuperación de la programación,

fortaleciendo los frentes de trabajo, optimizando la utilización de maquinaria, equipos y personal disponible, y priorizando las actividades que tienen mayor incidencia sobre la ruta de ejecución del proyecto. Lo anterior deberá desarrollarse sin afectar las condiciones técnicas, especificaciones y controles de calidad requeridos para la correcta terminación de las obras.

LEONARDO ANDRES BORDA IPUS
DIRECTOR DE OBRA

6804

BITACORA DE OBRA

6810

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	7	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6811

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

nbre:		N° Mat. Profesional:	
nbre:		N° Mat. Profesional:	

6812

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	9	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ndo se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

bre:		N° Mat. Profesional:	
bre:		N° Mat. Profesional:	

6813

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISIÓN	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6814

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6815

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6916

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6817

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+390 A LA ABSCISA K0+300 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6819

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
PLACA CIRCULAR BASE-POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA, REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UND	VACIADO DE CONCRETO PLACA BASE POZO 24	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6819

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	16	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6320

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA ELAB EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	UND	VACIADO DE CONCRETO POZO 24	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
YHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6821

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 14 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+350 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6822

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 14 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+350 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6823

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 14 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+350 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizaron apiques de verificación en los tramos de calzada completa comprendidos entre las Calles 10 y 13 de la Carrera 5, posterior a la demolición del pavimento rígido existente. Los apiques se ejecutaron en los sectores comprendidos entre las abscisas K0+000 a K0+102,15, K0+118,97 a K0+229,69 y K0+249,02 a K0+339,54, con el propósito de verificar directamente las características y condiciones del material encontrado bajo la estructura de pavimento retirada. Se efectuó inspección visual y reconocimiento de campo como soporte para determinar las actividades posteriores requeridas para la adecuación y conformación de la estructura vial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6824

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]UMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UND	VACIADO DE CONCRETO SUMIDEROS No 7 Y 8	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ITHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

6825

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UND	VACIADO DE CONCRETO SUMIDEROS No 33 Y 34	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6826

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6827

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6828

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	26	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6330

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	27	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

[redacted] ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

[redacted] ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6831

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6832

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

[redacted]STADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

[redacted] ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6833

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	30	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6834

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	31	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6835

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	9	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6836

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	2	9	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6837

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	3	9	2026	7:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]EL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6839

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	4	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6339

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	5	9	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6840

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	6	9	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

6841

ENSAYOS DE LABORATORIO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

6842

Bogotá D.C. 29 de Julio de 2026

Ingeniero (a)
HUGO BAQUERO

PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS

OBRA: 26221-PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

Apreciado(a) Ingeniero (a):
De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP3-0450-26 con referencia: 10-26221 en el cual se presentan los resultados de:

- Ensayo de Flexión en Prefabricados de concreto.

Estos ensayos fueron realizados a las muestras enviadas a nuestro laboratorio, se describen a continuación:

- Sardinel

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras enviadas.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Fecha: 2026.05.29 15:45:30 -05'00'

David Santiago Rodríguez
JEFE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

6843

FLEXIÓN Y MÓDULO DE ROTURA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO (BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS)
NTC 4109:2019 (NUMERAL 7)

***COMPAÑÍA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***OBRA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***DIRIGIDO A:** HUGO BAQUERO
***DIRECCIÓN:** VILLAVICENCIO

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-29
REFERENCIA: 26221-10
DIGITÓ: Anderson Sanchez
LABORATORISTA: Alejandro Vega

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de trabajo	* Unidad N°	* Descripción	Dimensiones (mm)				* Fecha de toma	Fecha de recepción	Fecha de rotura	Edad (días)	* Momento de inercia (mm^4)	Área nominal transversal (mm^2)	Carga máxima (N)	Módulo de Rotura		Observaciones
			Largo	Ancho	Alto	Luz								MPa	kg/cm²	
561814	1	Sardinel	803	501	201	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	315105139,1	100701,0	69700	4,2	42,8	
561814	1	Sardinel	804	501	202	754	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	319964204,7	101202,0	66100	3,9	39,8	
561814	1	Sardinel	803	502	201	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	319668929,4	100902,0	71500,0	4,2	43,2	

* La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Resistencia promedio	4,1	41,9
Desviación estándar	0,2	1,8
Coeficiente de variación	4,88%	4,30%

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

6814

FLEXIÓN Y MÓDULO DE ROTURA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO (BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS)
NTC 4109:2019 (NUMERAL 7)

N° DE INFORME: DCP3-0450-26

***COMPAÑÍA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***OBRA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***DIRIGIDO A:** HUGO BAQUERO
***DIRECCIÓN:** VILLAVICENCIO

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-29
REFERENCIA: 26221-10
DIGITÓ: Anderson Sanchez
LABORATORISTA: Alejandro Vega

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de trabajo	* Unidad N°	* Descripción	Dimensiones (mm)				* Fecha de toma	Fecha de recepción	Fecha de rotura	Edad (días)	* Momento de inercia (mm^4)	Área nominal transversal (mm^2)	Carga máxima (N)	Módulo de Rotura		Observaciones
			Largo	Ancho	Alto	Luz								MPa	kg/cm²	
561814	2	Sardinel	804	502	201	754	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	322410857,6	100902,0	72400	4,3	43,8	
561814	2	Sardinel	803	501	201	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	315165889,1	100701,0	74500	4,5	45,9	
561814	2	Sardinel	803	502	202	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	324898581,7	101404,0	68100,0	4,0	40,6	

* La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Resistencia promedio	4,3	43,4
Desviación estándar	0,3	2,6
Coeficiente de variación	6,98%	5,99%

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR :

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Firmado digitalmente por DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Fecha: 2026.05.29 15:45:18 -05'00'

concretos@concrelab.com

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

6845

INFORME HIDRAULICO

CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME HIDRÁULICO MES DE AGOSTO DE 2026

N° 4

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

Informe Hidráulico Del Contrato De Obra No. 109 De 2026

Periodo Comprendido Entre El 01 De Agosto De 2026 Hasta El Día 31 De Agosto De 2026.

AGOSTO DE 2026

INDICE

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 4
3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
3.1.1 DESCRIPCION 4
3.1.2 LOCALIZACIÓN 4
4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 5
4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 5
No. 109 DE 2026 5
7. CONTROL TÉCNICO Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN 7
CONCLUSIONES 8
REGISTRO FOTOGRÁFICO 9

1. INTRODUCCION

El presente informe hidráulico consolida el seguimiento técnico efectuado durante el mes de agosto de 2026 al componente de drenaje pluvial de la Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META". Durante este periodo se ejecutaron actividades directamente relacionadas con la captación, conducción, protección y entrega de aguas lluvias, correspondientes a la instalación de tubería corrugada de 10 pulgadas en conexiones entre sumideros y pozos 7 y 8, la instalación de los sumideros No. 33 y 34, la ejecución de cárcamos de protección para dicha tubería y trabajos asociados al pozo No. 24.

En calidad de especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, se realizó acompañamiento y verificación técnica a estas actividades, revisando la continuidad hidráulica entre los elementos del sistema, las cotas de conexión, la pendiente de las conducciones, la adecuada disposición de los sumideros y pozos, y la protección mecánica de la tubería en los sectores donde se instalaron cárcamos. El seguimiento se orientó a conservar la funcionalidad del sistema pluvial proyectado y a prevenir restricciones de flujo, contrapendientes, infiltraciones por conexiones deficientes o afectaciones sobre la tubería instalada.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Reportar el seguimiento hidráulico mensual realizado durante agosto de 2026 a las actividades de instalación de tubería corrugada de 10 pulgadas, sumideros, cárcamos de protección y trabajos asociados al pozo No. 24, verificando la continuidad y funcionalidad hidráulica de las conexiones ejecutadas dentro del sistema de drenaje pluvial del corredor vial.

Objetivos específicos

- Verificar la instalación de la tubería corrugada de 10 pulgadas correspondiente a las conexiones sumidero-pozo asociadas a los pozos No. 7 y 8, revisando alineamiento, pendiente y cotas de entrega.
- Realizar seguimiento a la instalación de los sumideros No. 33 y 34, verificando su localización, nivel de captación y conexión con la red pluvial proyectada.

• Verificar la disposición de los cárcamos de protección construidos sobre la tubería corrugada de 10 pulgadas, de manera que se reduzca el riesgo de afectación mecánica durante las etapas posteriores de la obra.

• Revisar los trabajos ejecutados en el pozo No. 24 y su relación con las cotas y conducciones del sistema de drenaje pluvial.

• Dejar registro del seguimiento técnico realizado desde la especialidad hidráulica y formular recomendaciones para mantener la continuidad, limpieza y operatividad del sistema durante la ejecución restante del proyecto.

3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el ***"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".***

3.1.2 LOCALIZACIÓN

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.

Las áreas donde se realizará el ***"CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026" cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META",*** están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 De 2026
Certificado De Disponibilidad Presupuestal	2026000179 Del 16 De Febrero De 2026
Objeto Del Contrato:	Mejoramiento De La Carrera 5 Entre Calles 10 A 20 Del Municipio De San Martin, Meta
Valor Total Del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Setenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos ($5.278´148.553.00) M/Cte
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG Nit No.902.054.725 - 5 Rep. Legal Estefany Geraldine Torres Vanegas.
Fecha Del Contrato:	Trece (13) De Abril De 2026
Nombre Del Supervisor:	Ing. Jairo Abdul Rico Enciso
Cargo Del Supervisor:	Secretaria De Obras Publicas
Plazo De Ejecución:	Cinco (5) Meses
Fecha De Inicio:	07 De Mayo De 2026
Fecha De Terminación:	06 De Octubre De 2026

5. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO DE REFERENCIA

El seguimiento hidráulico se desarrolló tomando como referencia el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, modificado por la Resolución 0799 de 2021 y corregido mediante la Resolución 0908 de 2021. Para los componentes de tuberías y accesorios destinados a sistemas de aguas lluvias se tuvo igualmente como referencia la

Resolución 0501 de 2017. Como apoyo técnico para la revisión del drenaje vial se consideraron, además, los criterios del Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS.

La aplicación de estos referentes se complementó con los planos aprobados del proyecto, las especificaciones contractuales, las instrucciones de la interventoría o supervisión y las condiciones reales observadas en campo. El control se concentró en la continuidad hidráulica entre sumideros, tuberías y pozos, el respeto de las cotas de conexión y pendientes de conducción, y la protección de los elementos instalados frente a cargas o intervenciones propias del proceso constructivo.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de agosto de 2026 se ejecutaron actividades asociadas directamente al sistema de drenaje pluvial. Desde la especialidad hidráulica se efectuó seguimiento a la instalación de tubería corrugada de 10 pulgadas, a los sumideros No. 33 y 34, a los cárcamos de protección dispuestos sobre la conducción y a los trabajos asociados al pozo No. 24, verificando la articulación hidráulica entre los distintos elementos de captación, conducción e inspección.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Instalación de tubería corrugada de 10"	Se realizó seguimiento a la instalación de tubería corrugada de 10 pulgadas en las conexiones entre sumideros y pozos asociadas a los pozos No. 7 y 8. Se revisaron el trazado, la continuidad de la conducción, las cotas de empalme y la pendiente requerida para favorecer el flujo por gravedad.
Instalación de sumideros No. 33 y 34	Se verificó la instalación de los sumideros No. 33 y 34, considerando su localización respecto de la sección vial, el nivel de captación y la correcta conexión de salida hacia la tubería pluvial correspondiente.
Cárcamos de protección de tubería	Se efectuó seguimiento a la instalación de cárcamos destinados

	a proteger la tubería corrugada de 10 pulgadas asociada a los sumideros ejecutados, procurando evitar daños por cargas, tránsito de equipos o actividades constructivas posteriores.
Trabajos asociados al pozo No. 24	Se realizó revisión técnica de los trabajos asociados al pozo No. 24, verificando su integración con la red de drenaje pluvial, las cotas de conexión y la continuidad hidráulica con las conducciones previstas en el proyecto.

7. CONTROL TÉCNICO Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN

Durante la ejecución de las actividades hidráulicas del mes de agosto se realizó seguimiento técnico orientado a verificar la adecuada conexión y funcionamiento conjunto de sumideros, tuberías, cárcamos de protección y pozos. La revisión se concentró en la continuidad del flujo por gravedad, la correspondencia entre cotas de entrada y salida y la protección física de las conducciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios de control:

• Verificación del trazado, alineamiento y pendiente de la tubería corrugada de 10 pulgadas, procurando mantener una conducción continua hacia los pozos previstos y evitando contrapendientes o puntos susceptibles de retener agua.

• Revisión de las cotas de conexión entre los sumideros No. 33 y 34, la tubería de salida y los pozos asociados, con el fin de conservar la continuidad hidráulica definida en los planos del proyecto.

• Seguimiento a la instalación y nivel de captación de los sumideros No. 33 y 34, verificando su compatibilidad con las pendientes superficiales de la calzada y su capacidad para recibir la escorrentía conducida hacia estos puntos.

• Verificación de los cárcamos de protección instalados sobre la tubería corrugada de 10 pulgadas, procurando que cumplan su función de resguardo frente a acciones mecánicas sin generar interferencias, obstrucciones o cambios desfavorables en la conducción.

• Revisión de los trabajos asociados al pozo No. 24, con atención a las cotas de conexión, accesibilidad para inspección y continuidad con los tramos de la red pluvial que confluyen o salen de esta estructura.

• Recomendación de mantener libres de material de obra, residuos y sedimentos los sumideros, tuberías y pozos intervenidos, y de conservar protegidas las conducciones hasta la conformación definitiva de rellenos, capas granulares y acabados de la vía.

CONCLUSIONES

• Durante agosto de 2026, las actividades con incidencia directa sobre el componente hidráulico correspondieron a la instalación de tubería corrugada de 10 pulgadas en conexiones hacia los pozos No. 7 y 8, la instalación de los sumideros No. 33 y 34, la ejecución de cárcamos de protección sobre la conducción y trabajos asociados al pozo No. 24.

• El seguimiento de la especialidad hidráulica se concentró en la continuidad de las conexiones, las cotas y pendientes de conducción, la adecuada captación en los sumideros y la protección mecánica de la tubería, aspectos fundamentales para conservar el funcionamiento por gravedad de la red pluvial.

• Se recomienda mantener el control topográfico de cotas de batea y niveles de captación, conservar limpios y protegidos los elementos instalados y realizar una verificación final de continuidad hidráulica antes del cierre de rellenos y de la puesta en servicio definitiva del corredor vial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de tubería corrugada de 10" / conexiones a pozos 7 y 8



Instalación de sumideros No. 33 y 34



Instalación de tubería corrugada de 10" / conexiones a pozos 7 y 8



Trabajos asociados al pozo No. 24

MARÍA FERNANDA QUEVEDO GUTIÉRREZ
Esp. En Ingeniería Hidráulica y Ambiental
M.P 25202-314639 CND

6855

INFORME DE TOPOGRAFIA

CONSORCIO CARRERA 5 EG 902.094.725-5	CONTROL TOPOGRAFICO
	INFORME DE TOPOGRAFIA MENSUAL CRA 5 EG

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME DE TOPOGRAFIA MENSUAL AGOSTO 2026

CONSORCIO CARRERA 5 EG 902.054.725-5	CONTROL TOPOGRAFICO
	INFORME DE TOPOGRAFIA MENSUAL CRA 5 EG

DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	AGOSTO 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	**ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META** NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO CARRERA 5 EG** Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE

OBJETIVO

Dar a conocer avance de obra en un informe de topografía descriptivo para el mes de agosto 2026 de las cantidades ejecutadas del contrato cuyo objeto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONTROL TOPOGRAFICO
	INFORME DE TOPOGRAFIA MENSUAL CRA 5 EG


1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 13 de abril de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martin, Meta



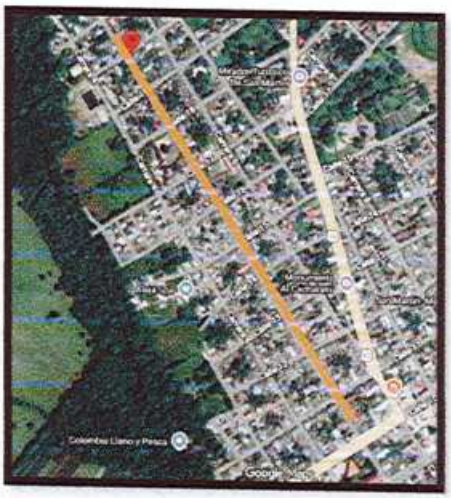

2. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA OBRA

PERSONAL PROPUESTO	
N° DE TRABAJADORES	1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Especialista hidráulica 4. Especialista ambiental 5. Especialista vial 6. Profesional en salud ocupacional 7. Topógrafo


3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EXISTENTE CRA 5 ENTRE CALLES 10 Y 12, PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO. K0+000 AL K0+124.01

Se realiza el levantamiento topográfico utilizando como amarre los puntos geodésicos aportados por la georreferenciación por parte de la consultoría, para así representar gráficamente mediante un plano la topografía existente de la carrera 5 entre calles 10 y 12, detallando el ancho de calzada y catastro de redes hidráulicas, para la demolición de pavimento rígido, con un espesor de 0.15 m por el área levantada 1095.697 m2 nos da como resultado en metros cúbicos un Volumen de 164.35. A continuación las carteras topográficas para la demolición:

CARTERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EXISTENTE CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 Y 12, PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO.

AREA DEMOLICION VIAL DE CONCRETO CRA 5 ENTRE CALLE 10 A CALLE 12 DEL K0+000 AL K0+124.01							
PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION	PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
1	900521.546	1041940.100	DEMOLICION RIGIDO	19	900440.306	1041993.862	DEMOLICION RIGIDO
2	900516.857	1041932.651	DEMOLICION RIGIDO	20	900447.378	1041989.183	DEMOLICION RIGIDO
3	900508.397	1041938.249	DEMOLICION RIGIDO	21	900453.687	1041985.008	DEMOLICION RIGIDO
4	900501.631	1041942.727	DEMOLICION RIGIDO	22	900461.153	1041980.067	DEMOLICION RIGIDO
5	900493.947	1041947.812	DEMOLICION RIGIDO	23	900469.118	1041974.796	DEMOLICION RIGIDO
6	900486.935	1041952.453	DEMOLICION RIGIDO	24	900477.421	1041969.301	DEMOLICION RIGIDO
7	900479.658	1041957.268	DEMOLICION RIGIDO	25	900484.801	1041964.417	DEMOLICION RIGIDO
8	900472.629	1041961.919	DEMOLICION RIGIDO	26	900491.565	1041959.941	DEMOLICION RIGIDO
9	900464.108	1041967.559	DEMOLICION RIGIDO	27	900499.043	1041954.992	DEMOLICION RIGIDO
10	900456.684	1041972.471	DEMOLICION RIGIDO	28	900506.673	1041949.943	DEMOLICION RIGIDO
11	900448.959	1041977.584	DEMOLICION RIGIDO	29	900513.735	1041945.269	DEMOLICION RIGIDO
12	900442.256	1041982.019	DEMOLICION RIGIDO	30	900539.862	1041927.979	DEMOLICION RIGIDO
13	900435.650	1041986.391	DEMOLICION RIGIDO	31	900535.006	1041920.641	DEMOLICION RIGIDO
14	900433.132	1041988.057	DEMOLICION RIGIDO	32	900519.126	1041931.149	DEMOLICION RIGIDO
15	900430.292	1041987.120	DEMOLICION RIGIDO	33	900516.857	1041932.651	DEMOLICION RIGIDO
16	900434.017	1041992.748	DEMOLICION RIGIDO	34	900521.546	1041940.100	DEMOLICION RIGIDO
17	900437.727	1041998.355	DEMOLICION RIGIDO	35	900523.689	1041938.682	DEMOLICION RIGIDO
18	900439.248	1041994.691	DEMOLICION RIGIDO	50			
AREA TOTAL DEMOLICION 1095.69 M2							M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO		0.15	METROS	VOLUMEN PARCIAL			164.35

VISTA EN PLANTA AREA PARA DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO K0+000 AL K0+124.01 ENTRE CALLES 10 Y 12.

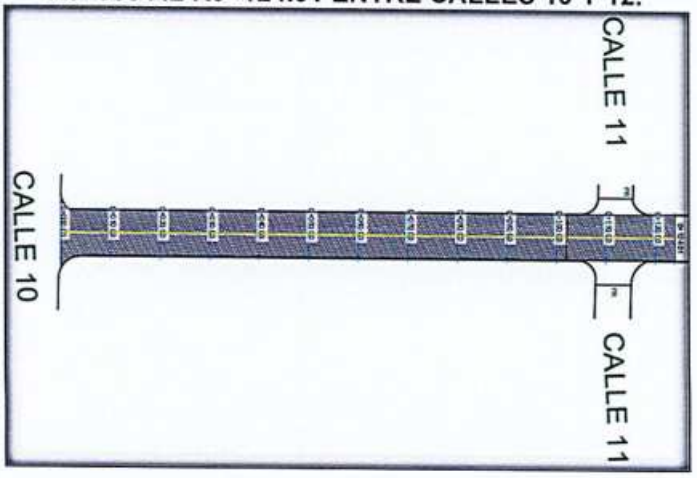

4. CONTROL TOPOGRAFICO CRA 5 ENTRE CALLES 10 Y 12, PARA EXCAVACION CAJA VIAL ABSCISAS K0+000 AL K0+141.

Teniendo en cuenta ya nuestra demolición de pavimento rígido, se procede a cuantificar la cantidad de material de excavación en metros cúbicos de la carrera 5 abscisas K0+000 AL K0+141.00, calculando con CIVIL AUTOCAD 3D de Autodesk utilizando las curvas de nivel tomadas de nuestra topografía existente para crear la supervise actual, se le descuenta a la superficie el espesor en el área en donde se encontraba el pavimento rígido 0.15 metros y a partir de esta nueva rasante de terreno natural se realiza el cajeo vial aplicando nuestra estructura de vial de diseño de 0.74 metros de espesor restándole a nuestra rasante de diseño geométrico para así hallar la cota roja o fondo que determina la profundidad de nuestra excavación. A continuación, las carteras topográficas para la excavación de caja vial:

Volume Report EXCAVACION

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION CAJA VIAL CLL 10 A CLL 11
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION CAJA VIAL CLL 10 A CLL 11
Start Sta: 0+000.00 **End Sta: 0+102.15**

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	8.48	0.00	0.00
0+005.00	5.49	34.93	34.93
0+010.00	5.48	27.43	62.36
0+015.00	5.49	27.44	89.80
0+020.00	5.37	27.16	116.96
0+025.00	5.35	26.80	143.76
0+030.00	5.33	26.71	170.47
0+035.00	5.39	26.80	197.27
0+040.00	5.42	27.01	224.28
0+045.00	5.28	26.74	251.02
0+050.00	5.16	26.08	277.10
0+055.00	5.16	25.79	302.89
0+060.00	5.26	26.06	328.95
0+065.00	5.24	26.25	355.20
0+070.00	5.12	25.90	381.10
0+075.00	5.07	25.49	406.59
0+080.00	5.10	25.43	432.02
0+085.00	5.04	25.35	457.37
0+090.00	5.18	25.55	482.92
0+095.00	5.18	25.88	508.80
0+100.00	4.97	25.37	534.17
0+102.15	4.98	10.03	544.20


Volume Report EXCAVACION			
Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12			
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12			
Start Sta: 0+102.15			End Sta: 0+141.00
0+102.15	4.99	0.00	0.00
0+105.00	5.06	13.80	13.80
0+110.00	5.18	25.59	39.39
0+115.00	5.22	26.00	65.39
0+120.00	5.12	25.84	91.23
0+125.00	5.16	25.69	116.92
0+130.00	5.42	26.45	143.37
0+135.00	5.53	27.37	170.74
0+140.00	5.51	27.59	198.33
0+141.00	5.52	5.55	203.88

TOTAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL	748.08

ABSCISA K0+070 CALLE 10 A CALLE 11



PLANO No. 1
PLANTA LOCALIZACION EXCAVACION CAJA VIAL CALLE 10 A CALLE 11

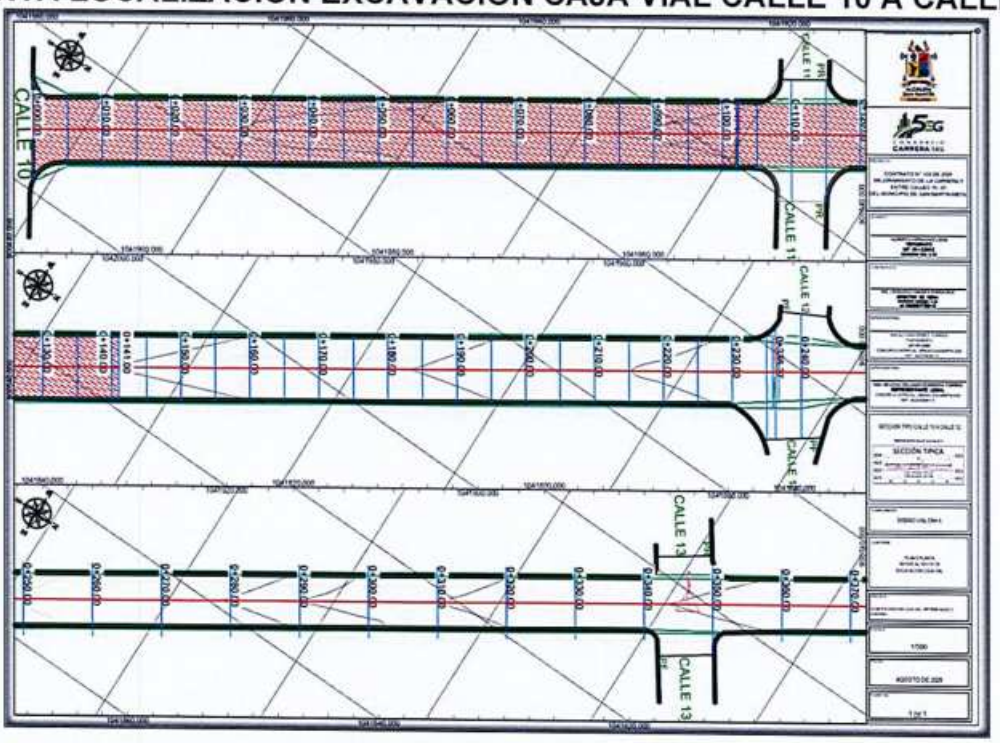

5. CONTROL TOPOGRAFICO CRA 5 ENTRE CALLES 20 Y 18, PARA INSTALACION DE SARDINEL TIPO A-10 80X50X20 CM.

Con la demolición de los sardineles existentes, se procede a realizar la instalación de los sardineles prefabricados tipo A-10 de dimensiones 80 x 50 x 20 cm; en la siguiente tabla en Excel se registran los metros lineales instalados para el mes de agosto 2026 así:

LOCALIZACION		CALLE 20 A CALLE 19						
LONGITUD TOTAL SARDINELES ML DEMOLICION			SARDINEL TIPO A-10 ML			SARDINEL TIPO A-80 ML		
MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD TOTAL ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML
90.085	94.875	184.960	78.39	73.795	152.18	11.70	21.08	32.78
LOCALIZACION		CALLE 19 A CALLE 18						
LONGITUD TOTAL SARDINELES ML DEMOLICION			SARDINEL TIPO A-10 ML			SARDINEL TIPO A-80 ML		
MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD TOTAL ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML
90.085	90.363	180.448	70.79	77.033	147.82	15.30	10.30	25.60
TOTAL METROS LINEALES SARDINEL TIPO A-10					300.00			

ANEXOS

Anexo 1 : CARTERAS Y PLANOS DE: DEMOLICION, EXCAVACION CRA 5.

Anexo 2 : DOCUMENTOS TOPOGRAFO.

Anexo 3 : CERTIFIADOS DE CALIBRACION EQUIPOS.

ALBERTO HERNANDEZ LEON
TOPOGRAFO MP: 01-23012 C.P.N.T.





República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 667[illegible]92[illegible]

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JESUS ALBERTO HERNA[illegible]LEON** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 17423294** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Unico de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN** de la Institución de Educación Superior **SE[illegible]** bajo la Licencia Profesional **No. 01-23012** con fecha de expedición del **30 de Septiembre de 2024.**

Que el(la) Señor(a) **JESUS [illegible]TO HERNANDEZ LEON**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-23012** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, [illegible]los **9 días del mes de Septiembre de 2026.**

LUIS ALEJANDRO ZA[illegible]RA JARAMILLO
Dire[illegible] Ejecutivo

Firma del profesional

*La firma del profesional es requerida [illegible]ta con [illegible]encia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado n[illegible]de la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento [illegible]erificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CARRERA 5 EG
CARRERA 5 EG
CARRERA 5 EG

Calle 42 No. 8A- 69 Oficina 601 Teléfono: 288 14 90 - 245 1694 - Bogotá, D.C.
www.cpnt.gov.co - Email: info@cpnt.gov.co - presidencia@cpnt.gov.co

VERTEX INGENIERIA PH S.A.S

Laboratorio topográfico.
NIT 901224871-9

CERTIFICADO DE CALIBRACION
No. 2349

EL NIVEL TOPCON AT-B4 SERIAL RX6753

Fue verificado, ajustado y calibrado en nuestro taller de mantenimiento encontrándose actualmente en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Exactitud por kilómetro doble de nivelación..... 1.5mm.

Aumentos del anteojo..... 32 X

Nivel de compensación automática

Imagen directa

Constante de multiplicación..... 100

Este instrumento fue ajustado y evaluado utilizando colimador óptico y puntos cuya diferencia de altura fue:

Previamente verificado. h = 0.426 m

Lectura atrás adelante:	1.557 m	*Lectura adelante atrás:*	1.654 m
	1.131 m		1.228 m
	0.426 m		0.426 m

Patrón utilizado: Colimador óptico marca SANWEI FS50 con micrómetro Óptico Node serie 18675120022 y exactitud de 0.7mm.

Esta certificación se expide a solicitud de:

CLIENTE	**PRISMA DAV INGENIERIA SAS**
CC/NIT	**900862112**
FECHA DE CALIBRACION	**21/04/2026**
PROXIMA CALIBRACION	**21/10/2026**
NUMERO DE CERTIFICADO	**No. 2349**

JEFE DE LABORATORIO	*ING. LABORATORIO*	*FECHA DE EMISION*
ING NICOLAS HERNANDEZ *MP 25202-372822*	*JAIR PARRADO HERNANDEZ* *CPNT 01-23090* *COPNIA 091239-0758812*	VERTEX INGENIERÍA *21/04/2026*

Cl. 3ª A Sur #28, Bosques de rosa blanca Villavicencio, Meta

Correo: gerencia@vertexingenieria.com.co

3187002525 www.vertexingenieria.com.co

AERONÁUTICA CIVIL

VERTEX INGENIERIA PH S.A.S

Laboratorio topográfico.
NIT 901224871-9

CERTIFICADO DE CALIBRACION No. 2348

TOPCON

Mantenimiento ( )	Reparación ( )	Calibración (X)	Garantia ( )
Cliente: PRISMA DAV INGENIERIA SAS C.C/Nit: 900862112 Dirección/ciudad: Villavicencio		CERTIFICADO No. 2348 EQUIPO: TOPCON GTS-255 SERIAL: KB2771	

La estación **TOPCON GTS-255** serial **KB2771** *fue* verificado y colimado en nuestro taller de mantenimiento y calibración encontrándose en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante y se realiza inspección técnica del Conjunto nivelante, Ejes Horizontales y Verticales, Desplazamiento de tornillo de movimiento fino, Desplazamiento del enfoque.

Fecha de calibración	*21/04/2026*
Fecha de próxima calibración	*21/10/2026*

EQUIPO DE CALIBRACION UTILIZADO

EQUIPO DE CALIBRACION	MARCA	SERIE
COLIMADOR	*SANWEI F550*	*18675120022*

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

Por medio del enfoque en directa posición y en tránsito con vista al infinito a través de un set de colimadores

RESULTADOS

ANGULOS	ANGULO DIRECTO	ANGULO INVERTIDO	DIFERENCIA	TOLERANCIA
VERTICAL	*90°00'00"*	*270°0'01"*	*0°0'1"*	*+-0°0'2"*
HORIZONTAL	*0°0'0"*	*180°0'0"*	*0°0'1"*	*+-0°0'2"*

JEFE DE LABORATORIO	ING. LABORATORIO	FECHA DE EMISION
ING NICOLAS HERNANDEZ MP 25202-372822	JAIR PARRADO HERNANDEZ CPNT 01-23090 COPNIA 091239-0758812	VERTEX INGENIERÍA 21/04/2026

Cl. 3ª A Sur #28, Bosques de rosa blanca Villavicencio, Meta

Correo: gerencia@vertexingenieria.com.co

3187002525 www.vertexingenieria.com.co

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

6867

LOCALIZACION		CALLE 20 A CALLE 19						
LONGITUD TOTAL SARDINELES ML DEMOLICION			SARDINEL TIPO A-10 ML			SARDINEL TIPO A-80 ML		
MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD TOTAL ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML
90,085	94,875	184,960	78,39	73,795	152,18	11,70	21,08	32,78
LOCALIZACION		CALLE 19 A CALLE 18						
LONGITUD TOTAL SARDINELES ML DEMOLICION			SARDINEL TIPO A-10 ML			SARDINEL TIPO A-80 ML		
MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD TOTAL ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML	MARGEN IZQ	MARGEN DER	LONGITUD ML
90,085	90,363	180,448	70,79	77,033	147,82	15,30	10,30	25,60
TOTAL METROS LINEALES SARDINEL TIPO A-10					300,00			

Volume Report EXCAVACION

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION CAJA VIAL CLL 10 A CLL 11
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION CAJA VIAL CLL 10 A CLL 11
Start Sta: 0+000.00 End Sta: 0+102.15

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	8,48	0,00	0,00
0+005.00	5,49	34,93	34,93
0+010.00	5,48	27,43	62,36
0+015.00	5,49	27,44	89,80
0+020.00	5,37	27,16	116,96
0+025.00	5,35	26,80	143,76
0+030.00	5,33	26,71	170,47
0+035.00	5,39	26,80	197,27
0+040.00	5,42	27,01	224,28
0+045.00	5,28	26,74	251,02
0+050.00	5,16	26,08	277,10
0+055.00	5,16	25,79	302,89
0+060.00	5,26	26,06	328,95
0+065.00	5,24	26,25	355,20
0+070.00	5,12	25,90	381,10
0+075.00	5,07	25,49	406,59
0+080.00	5,10	25,43	432,02
0+085.00	5,04	25,35	457,37
0+090.00	5,18	25,55	482,92
0+095.00	5,18	25,88	508,80
0+100.00	4,97	25,37	534,17
0+102.15	4,98	10,03	544,20


Volume Report EXCAVACION

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12
Start Sta: 0+102.15 End Sta: 0+141.00

0+102.15	4,99	0,00	0,00
0+105.00	5,06	13,80	13,80
0+110.00	5,18	25,59	39,39
0+115.00	5,22	26,00	65,39
0+120.00	5,12	25,84	91,23
0+125.00	5,16	25,69	116,92
0+130.00	5,42	26,45	143,37
0+135.00	5,53	27,37	170,74
0+140.00	5,51	27,59	198,33
0+141.00	5,52	5,55	203,88
TOTAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL			748,08

6869

AREA DEMOLICION VIAL DE CONCRETO CRA 5 ENTRE CALLE 10 A CALLE 12 DEL K0+000 AL K0+124.01							
PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION	PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
1	900521,546	1041940,100	DEMOLICION RIGIDO	19	900440,306	1041993,862	DEMOLICION RIGIDO
2	900516,857	1041932,651	DEMOLICION RIGIDO	20	900447,378	1041989,183	DEMOLICION RIGIDO
3	900508,397	1041938,249	DEMOLICION RIGIDO	21	900453,687	1041985,008	DEMOLICION RIGIDO
4	900501,631	1041942,727	DEMOLICION RIGIDO	22	900461,153	1041980,067	DEMOLICION RIGIDO
5	900493,947	1041947,812	DEMOLICION RIGIDO	23	900469,118	1041974,796	DEMOLICION RIGIDO
6	900486,935	1041952,453	DEMOLICION RIGIDO	24	900477,421	1041969,301	DEMOLICION RIGIDO
7	900479,658	1041957,268	DEMOLICION RIGIDO	25	900484,801	1041964,417	DEMOLICION RIGIDO
8	900472,629	1041961,919	DEMOLICION RIGIDO	26	900491,565	1041959,941	DEMOLICION RIGIDO
9	900464,108	1041967,559	DEMOLICION RIGIDO	27	900499,043	1041954,992	DEMOLICION RIGIDO
10	900456,684	1041972,471	DEMOLICION RIGIDO	28	900506,673	1041949,943	DEMOLICION RIGIDO
11	900448,959	1041977,584	DEMOLICION RIGIDO	29	900513,735	1041945,269	DEMOLICION RIGIDO
12	900442,256	1041982,019	DEMOLICION RIGIDO	30	900539,862	1041927,979	DEMOLICION RIGIDO
13	900435,650	1041986,391	DEMOLICION RIGIDO	31	900535,006	1041920,641	DEMOLICION RIGIDO
14	900433,132	1041988,057	DEMOLICION RIGIDO	32	900519,126	1041931,149	DEMOLICION RIGIDO
15	900430,292	1041987,120	DEMOLICION RIGIDO	33	900516,857	1041932,651	DEMOLICION RIGIDO
16	900434,017	1041992,748	DEMOLICION RIGIDO	34	900521,546	1041940,100	DEMOLICION RIGIDO
17	900437,727	1041998,355	DEMOLICION RIGIDO	35	900523,689	1041938,682	DEMOLICION RIGIDO
18	900439,248	1041994,691	DEMOLICION RIGIDO	50			
AREA TOTAL DEMOLICION 1095.69 M2							M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO		0,15	METROS	VOLUMEN PARCIAL			164,35

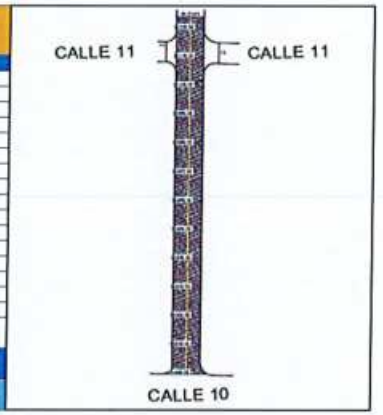

6870

INFORME VIAS

6871

CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME ESPECIALISTA EN VIAS

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

Contrato de Obra No. 109 de 2026



7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades de seguimiento, acompañamiento y verificación técnica desarrolladas durante el mes de agosto de 2026, en el marco del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META"**, correspondiente al Contrato de Obra No. 109 de 2026.

El presente informe tiene como finalidad documentar, desde el componente vial, las actividades ejecutadas durante el periodo, efectuando seguimiento técnico a los trabajos relacionados con la intervención de la estructura vial, entre ellos la demolición del pavimento existente, excavaciones para conformación de caja vial, retiro y disposición de materiales, adecuación de los sectores intervenidos y demás actividades asociadas a la preparación de la plataforma para la construcción de la estructura proyectada. El contrato contempla igualmente actividades de rellenos, subbase y base granular, carpeta asfáltica, bordillos, andenes y señalización vial.

Dentro del seguimiento se consideran las condiciones encontradas en campo, el comportamiento de los sectores intervenidos, el avance de las actividades y la verificación de los aspectos técnicos que puedan incidir en la correcta conformación y desempeño de la estructura vial. En particular, durante la ejecución se realizaron verificaciones en sectores comprendidos entre las calles 10 y 13, donde se identificaron condiciones del material subyacente que requirieron la evaluación de intervenciones específicas antes de continuar con la conformación de la nueva estructura vial.

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

2.1.2 LOCALIZACION

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.

Las áreas donde se realizará el **"CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026"** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**, están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 De 2026
Certificado De Disponibilidad Presupuestal	2026000179 Del 16 De Febrero De 2026
Objeto Del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META
Valor Total Del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Setenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos ($5.278´148.553.00) M/Cte
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT No.902.054.725 - 5 Rep. Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS C.C.No.1.006.776.424 de VILLAVICENCIO

Contrato No.	109 De 2026
	Meta
Fecha Del Contrato:	Trece (13) De Abril De 2026
Nombre Del Supervisor:	Ing. Jairo Abdul Rico Enciso
Cargo Del Supervisor:	Secretaria De Obras Publicas
Plazo De Ejecución:	Cinco (5) Meses
Fecha De Inicio:	07 De Mayo De 2026
Fecha De Terminación:	06 De Octubre De 2026

4. OBJETO

El presente informe tiene como objeto presentar las actividades de seguimiento, acompañamiento y verificación técnica desarrolladas durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, en el marco del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META"**, en desarrollo del Contrato de Obra No. 109 de 2026.

El presente informe tiene por objeto presentar las actividades de seguimiento, acompañamiento y verificación técnica desarrolladas por el Especialista en Vías durante el periodo comprendido entre el 07 de agosto y el 06 de septiembre de 2026, en el marco del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META", correspondiente al Contrato de Obra No. 109 de 2026.

El informe comprende el seguimiento técnico efectuado a las actividades asociadas al componente vial ejecutadas durante el periodo, entre las cuales se encuentran la demolición de pavimento rígido,

excavación mecánica para conformación de cajas viales, transporte y disposición final de materiales sobrantes, instalación de sardines prefabricados y demás actividades de adecuación de la plataforma vial, verificando su ejecución de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

De igual manera, se busca dejar registro de las verificaciones técnicas realizadas en los diferentes sectores intervenidos, las condiciones observadas durante el desarrollo de las actividades y las recomendaciones formuladas desde la especialidad de vías, con el propósito de contribuir al adecuado proceso de conformación de la estructura vial, al control de calidad de las actividades ejecutadas y al cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el presente periodo se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades relacionadas con el componente vial del proyecto.

✓ Seguimiento a demoliciones y liberación del corredor vial

Se efectuó seguimiento a las actividades de demolición de pavimento rígido y al retiro y disposición de los materiales resultantes. Desde el componente vial, estas actividades constituyen la fase previa para liberar la franja de intervención y permitir la excavación y conformación de la nueva caja vial. Se recomendó mantener la remoción completa de elementos sueltos o inestables y evitar que residuos de demolición permanezcan incorporados dentro de la plataforma que recibirá las capas estructurales.

✓ Excavación y conformación de caja vial

Durante el periodo se registraron actividades de excavación mecánica para cajas de vía, incluyendo cargue y transporte de sobrantes. El seguimiento técnico se orientó a verificar que la excavación se ejecute de manera ordenada por tramos, conservando la geometría prevista para el corredor y

evitando sobreexcavaciones o zonas con material perturbado que puedan afectar la uniformidad de apoyo de la estructura de pavimento.

Previo a la colocación de materiales de relleno, subbase o base, se recomienda verificar y dejar registro de las condiciones de la superficie receptora, incluyendo nivelación, estabilidad, drenaje temporal y aceptación de los sectores intervenidos por parte de los responsables técnicos del proyecto.

- ✓ **Coordinación con obras de drenaje y redes**

Se observó la ejecución paralela de actividades correspondientes a tubería de alcantarillado, pozos de inspección, sumideros y elementos de concreto reforzado. Estas obras deben coordinarse con la conformación de la vía, debido a que sus cotas, rellenos laterales y restituciones inciden directamente sobre la estabilidad de la plataforma y sobre la continuidad de las capas granulares y del pavimento. Se recomendó priorizar la terminación y aceptación de las interferencias subterráneas antes de avanzar con capas definitivas de la estructura vial.

- ✓ **Equipos disponibles para el componente vial**

El informe general reporta disponibilidad de retroexcavadora de orugas, retroexcavadora de llantas, minicargador, motoniveladora, vibrocompactador y compactadores manuales, entre otros equipos. Para las actividades viales del periodo, estos equipos resultan coherentes con los procesos de excavación, cargue, extendido, nivelación y compactación. Se recomienda mantener la disponibilidad efectiva del equipo necesario en cada frente, especialmente durante la conformación de capas y trabajos que requieran continuidad operativa.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESPECIALISTA

Continuar el control de cotas, anchos, pendientes longitudinales y pendientes transversales de la caja vial antes de recibir las capas granulares.

Evitar la colocación de materiales estructurales sobre superficies con presencia de agua, material suelto o zonas que evidencien pérdida de capacidad de soporte; cualquier condición localizada debe ser tratada y documentada antes de continuar.

Coordinar la terminación de alcantarillado, sumideros, pozos y demás redes que crucen o colinden con la calzada, minimizando reaperturas posteriores de sectores ya conformados.

Mantener control de procedencia, granulometría, humedad, compactación y demás parámetros de aceptación de los materiales empleados en rellenos, subbase y base, de acuerdo con las especificaciones contractuales aplicables.

Programar los frentes de obra de manera que la motoniveladora, vibrocompactador y equipos de cargue/excavación tengan continuidad de operación y no se generen sectores abiertos durante periodos prolongados.

Contrastar semanalmente el avance real con la programación vigente, identificando actividades críticas del componente vial y definiendo acciones de recuperación cuando los rendimientos ejecutados sean inferiores a los previstos.

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 07 de agosto y el 06 de septiembre de 2026 se adelantaron actividades que inciden directamente en la preparación y conformación del corredor vial, principalmente demoliciones, retiro de sobrantes y excavaciones para la caja de vía, de manera simultánea con obras de drenaje y redes complementarias. Estas actividades requieren coordinación permanente para asegurar que la plataforma quede en condiciones adecuadas antes de iniciar o continuar la colocación de las capas estructurales.

De acuerdo con el informe general, el avance físico acumulado alcanza el 36,86 %, mientras que el tiempo contractual transcurrido corresponde al 80 %. En consecuencia, se recomienda fortalecer el

seguimiento a la programación aprobada, identificar las actividades críticas del componente vial y asegurar la continuidad de los recursos necesarios para incrementar los rendimientos sin afectar las condiciones técnicas y de calidad del proyecto.

El Especialista en Vías continuará realizando acompañamiento técnico a los procesos relacionados con la conformación de la plataforma, ejecución de las capas de la estructura de pavimento, control de materiales, coordinación con drenajes y verificación de las condiciones que incidan en el desempeño de la vía.

JAIME ANDRES CAÑON DONCEL
M.P. No. 01114-10719

6879

INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO CARRERA 5 EG 901.054.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

PERIODO DEL INFORME
(07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

2026

TABLA DE CONTENIDO.

1. GENERALIDADES 3
2. ALCANCE. 4
3. OBJETIVOS. 5
4.1 Objetivo General. 5
4.2 Objetivos Específicos. 5
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO. 6
7. ASPECTOS AMBIENTALES. 9
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERMISOS. 10
9. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 10
10. Desarrollo de fichas de manejo ambiental. 11
Ficha N 1: Información y Comunicación a la Comunidad. 11
Ficha N2. Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. 12
- Ficha N 3. Manejo y Disposición de Material Sobrante. 14
- Ficha N 4. Capacitación ambiental. 14
- Ficha N 5. Manejo Maquinaria equipos y vehículos. 14
- Ficha N 6. Manejo integral de materiales de construcción. 15
- Ficha N 7. Manejo y disposición de residuos sólidos. 15
- Ficha N8. Señalización Frentes de obra y Sitios Temporales. 16
- Ficha N9. Control de emisión de ruido. 16
- Ficha N 10. Manejo de descapote y cobertura vegetal. 16
- Ficha N 11.Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de campamentos y sitios temporales. 17
- Ficha N 12. Protección de fauna. 17
- Ficha N 13 Atención a la comunidad. 18
- Ficha N 14 Contratación mano de obra. 18
- Ficha N 15 Conformación grupo ambiental. 18
- Ficha N 16 Manejo de aguas superficiales 18
- Ficha N 17 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 18
- Ficha N 18 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 19

11. CONCLUSIÓN. 20
12. ANEXOS. 20

1. GENERALIDADES

El programa de implementación de medidas ambientales es un componente básico del proyecto, que comprende las medidas de manejo ambiental necesarias respecto a las actividades constructivas con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Es la principal herramienta de gestión ambiental y social de obligatorio cumplimiento por los responsables del proyecto en la cual interviene un profesional ambiental encargado de dar cumplimiento a estas actividades durante toda la ejecución del proyecto. **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.**

2. ALCANCE.

Mediante la presentación del Plan de Adaptación a la guía Ambiental - PAGA, se espera la ejecución de las actividades del proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META. ,** así mismo dar a conocer las características del área de trabajo (factores físicos y bióticos) las generalidades del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica su ejecución, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o compensación; todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

El presente informe, integra los conceptos de la ingeniería con los lineamientos de la Gestión Ambiental. Igualmente, pretende identificar y valorar los impactos y las acciones a desarrollar con el fin de contribuir a la conservación del medio natural donde se desarrollan las obras, alterando al mínimo las condiciones ambientales y socioeconómicas preexistentes.

Este tendrá una repercusión directa y mejora continua en el desarrollo de la parte operativa del proyecto, garantizando un flujo de recursos por parte del contratista y la participación activa de la comunidad asociada al proyecto; de ello dependerá el buen desarrollo de las obras de manera ambientalmente segura respetando los principios de protección y conservación de un ambiente sano y la elevación de la calidad de vida de los habitantes del municipio de puerto concordia y vecinos beneficiarios del proyecto.

3. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Implementación y puesta en marcha del plan de medidas ambientales PAGA para el proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.**

4.2 Objetivos Específicos.

- Ejecución y puesta en marcha de las fichas ambientales del Programa.
- Prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos a cada uno de los componentes ambientales.
- Cumplimiento con lo establecido en la legislación ambiental vigente que aplique en cada una de las etapas de construcción.
- Implementar y mantener medidas preventivas y de control que minimicen el riesgo de ocurrencia de derrames y contingencias ambientales, asegurando la correcta gestión de los materiales peligrosos y el cumplimiento de los procedimientos de respuesta ante emergencias.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 13 de abril de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martín, Meta.





DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARRERA 5 EG Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE
OBJETIVO	
Dar a conocer las actividades desarrolladas en el contrato cuyo objeto es desarrollar el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META".	

5. ASPECTOS AMBIENTALES.


Se describen los aspectos ambientales del proyecto que aplican al presente periodo evaluado a fin de conocer los posibles impactos asociados a la ejecución normal de las actividades en obra de MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META". La evaluación de los impactos ambientales identificados muestra que los más significativos y de mayor importancia, afectarán principalmente el Recurso suelo .

Contamos con 26 impactos identificados en un total de 15 corresponde a carácter medio, 10 a carácter bajo, y uno (1) de carácter alto, el impacto significativo que se presenta corresponde a al uso del suelo y emisiones atmosféricas.





Frente a los impactos positivos observamos mejoras en la calidad de vida de los habitantes del sector y mejoras en la estructura principal de la vía , en cuanto a los impactos derivados por emergencias se encuentran 1 por movimientos de tierras o sismos en el área urbana, 14 situaciones anormales relacionadas con (desastres naturales) y 7 situaciones consideradas como normales.

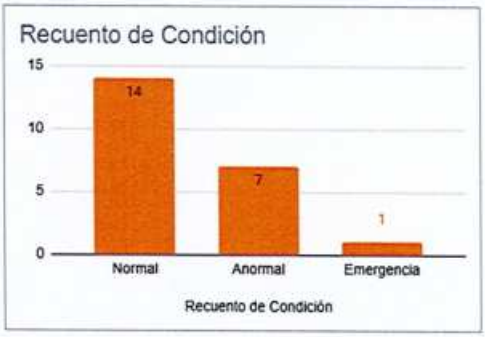

Este análisis sugiere que, si bien existen eventos imprevistos y condiciones inusuales, la mayor parte del tiempo el entorno se mantiene en condiciones aceptables, lo cual favorece la percepción positiva del proyecto por parte de la comunidad.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Como herramienta básica para la aplicación de medidas y acciones para la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos se da cumplimiento a las actividades propuestas en las Fichas de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyecto durante el respectivo periodo a continuación se relaciona el avance de las fichas evaluadas.

Tabla 1. Descripción de las fichas ambientales.

Programa	Proyecto	Código
1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01
	Capacitación ambiental al personal de obra.	DAGA-1.2-02
2. Programa Actividades Constructivas	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.	PAC-2.1-04
	Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.	PAC-2.3-06
	Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.	PAC-2.4-07
	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08
3. Programa Gestión Hídrica	Proyecto de manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-09
	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	PGH-3.2-10
4. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipo	Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.	PMIT -5.1-15
	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT- 5.3-17
5. Programas de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la Comunidad.	PGS-6.1-18
	Proyecto de Contratación Mano de Obra	PGS-6.6-23

6. DESARROLLO DE FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuación, se describen las actividades realizadas frente a lo dispuesto en cada una de las fichas relacionadas en pro de la mitigación de impactos ambientales negativos.

1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental.

Durante el periodo evaluado se encuentra en funcionamiento el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto, responsable de liderar y apoyar la implementación de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Nombre	Cargo
Paula andrea pardo redondo	Profesional ambiental
Nataly Guzman	Residente de obra

DAGA-1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante el período evaluado se llevó a cabo una jornada de capacitación y sensibilización dirigida al personal de obra, enfocada a las condiciones atmosféricas que se presentan en un lugar durante un largo periodo de tiempo (clima y medio ambiente), con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental durante la ejecución del proyecto.

Imagen 1. *Capacitación en obra.*



con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y promover prácticas responsables durante la ejecución del proyecto.

2. Programa Actividades Constructivas

PAC-2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.

Durante el periodo reportado se realizaron actividades orientadas al manejo adecuado de los materiales de construcción utilizados en la obra, garantizando su almacenamiento, organización y conservación en condiciones apropiadas.Se efectuó el ordenamiento de materiales en las áreas destinadas para su acopio, facilitando el control de inventarios, la optimización de los espacios de trabajo y la prevención de pérdidas o deterioro de los insumos, **Gravicon** es la empresa encargada del material granular.

Imagen 2. *Manejo de materiales en obra.*



PAC-2.3-06 Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.

Durante el periodo reportado se realizó la instalación de la señalización en los diferentes frentes de trabajo y áreas temporales del proyecto, garantizando la identificación de zonas de riesgo, áreas de trabajo, puntos de acopio y vías de circulación. Asimismo, se verificó periódicamente su estado y visibilidad, contribuyendo a la seguridad del personal y al adecuado desarrollo de las actividades de obra.

Imagen 3. *Señalización en obra.*



Imagen 4. *Señalización en obra*



PAC-2.4-07 Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.

Se garantizó que los materiales transportados, incluidos escombros, material sobrante de excavación y lodos, fueran movilizados en vehículos debidamente acondicionados y cubiertos con lonas, con el fin de prevenir la dispersión de partículas, la generación de material particulado, los derrames durante el transporte y posibles afectaciones a las vías y al entorno. Asimismo, se verificó que la disposición final de estos materiales se realizará en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Imagen 5. *Manejo de escombros en obra.*





Por parte de la Alcaldía Municipal se otorgó viabilidad para el uso del lote destinado al acopio temporal y disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos por la administración municipal.

Imagen 6. *Predio RCD para disposición final.*

IDENTIFICACIÓN PREDIAL ÁREA POTENCIAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD		
Nombre Predio	**Cedula catastral**	**Área ha**
Lote	50689000200040125000	48,01

PAC-2.5-08 Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuada gestión de los residuos sólidos convencionales y especiales generados en la obra, mediante la separación en la fuente y el uso de puntos ecológicos debidamente identificados. Se verificó la correcta disposición temporal de los residuos y su entrega a gestores autorizados empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la minimización de impactos al entorno.

Imagen 7. *Manejo de residuos en obra.*




3. Programa Gestión Hídrica

PGH-3.1-09 Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales

Durante el periodo reportado se implementaron medidas orientadas al uso eficiente y controlado del recurso hídrico en la obra. Para el consumo del personal se suministró agua potable mediante la adquisición de agua envasada por la empresa AGUA DEL META, garantizando condiciones adecuadas de calidad e higiene para los trabajadores y evitando afectaciones a las fuentes hídricas del área de influencia.

Imagen 8. *Agua potable en obra.*

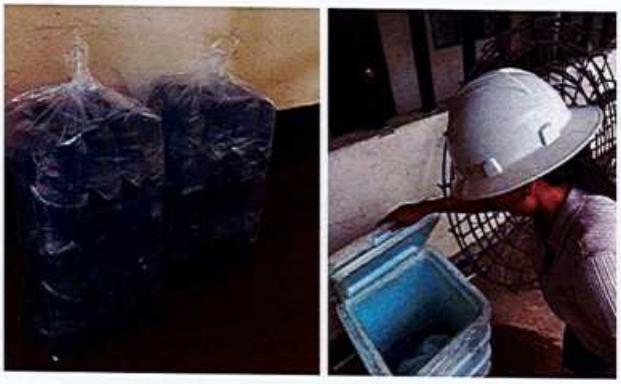

PGH-3.2-10 Proyecto de Manejo de Residuos Líquidos Domésticos e Industriales

Durante el periodo reportado se adecuaron unidades sanitarias para hombres y mujeres destinadas al personal de obra en las instalaciones de la oficina del proyecto. Debido a que el predio cuenta con disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, las aguas residuales domésticas generadas son conducidas y dispuestas a través de la red de alcantarillado existente por la empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, garantizando condiciones sanitarias adecuadas y previniendo impactos ambientales

Imagen 9. *Baños en obra.*



PMIT-5.1-15 Instalación, funcionamiento desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuación y puesta en funcionamiento de la oficina del proyecto, la bodega para almacenamiento de herramientas, equipos e insumos, así como la instalación de unidades sanitarias para el personal de obra. De igual forma, se habilitaron las áreas destinadas al acopio temporal de materiales granulares, garantizando condiciones adecuadas de orden, organización y protección de los materiales, con el fin de prevenir afectaciones al entorno y facilitar el desarrollo de las actividades constructivas.

Imagen 10. *Acopio temporal de material de relleno.*



PMIT-5.3-17 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo reportado se realizaron inspecciones periódicas a la maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proyecto, con el fin de verificar sus condiciones operativas y ambientales. Como resultado de las inspecciones efectuadas, no se evidenciaron fugas de combustibles, aceites u otros fluidos, contribuyendo a la prevención de la contaminación del suelo y al cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Imagen 11. *Inspección de acopio de combustibles.*



6. Programas de Gestión Social.

PGS-6.1-18 Proyecto de Atención a la Comunidad.

Durante el periodo evaluado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad, sin embargo se mantienen los canales de comunicación abiertos al público y con el personal para la atención oportuna de las necesidades de la comunidad aledaña al área del proyecto.

Canales de comunicación:
oficina de atención a la comunidad ubicada al interior de la obra.
Formato de atención a PQRS.
Correo electrónico: **consorciocalle5ta@gmail.com**

- **Seguimiento a indicadores.**

Indicador	Resultado	Observaciones
N de PQRS resueltas / N de PQRS recibidas.	0 / 0 = 0 %	No se presentaron PQRS durante el periodo evaluado.
N de reuniones realizadas / N de reuniones propuestas.	2 / 2 = 100%	no se realizaron actividades el mes de agosto.

PGS-6.6-23 Proyecto de Contratación Mano de Obra

Durante el presente periodo se cuenta con el personal mínimo para la ejecución de las actividades y con el personal operativo.

1.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CÉDULA	CARGO
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA
2	CARLOS MANUEL FORERO	19.405.796	RESIDENTE DE OBRA
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECIALISTA VÍAS

4	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL
5	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST

1.2 PERSONAL OPERATIVO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.057	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
18	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

Registro Fotografico.



visita técnica interventoría



visita técnica interventoría



Instalación señalización



oficina de atención a la comunidad



manejo de papel en obra



Inspección de puntos ecológicos.

7. CONCLUSIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el **07 de agosto** al **06 de septiembre del 2026** , en el marco del proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.** , no se presentaron afectaciones al medio ambiente derivadas de los procesos constructivos, ni se materializaron incidentes ambientales relacionados con derrames o contingencias sobre la fuente hídrica.

Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana vigente, particularmente al Decreto 1076 de 2015, en lo referente a los lineamientos del Plan de adaptación a la guía Ambiental (PAGA), y a la Resolución 2184 de 2019, que establece el nuevo código de colores para la clasificación y disposición final de los residuos sólidos.

En línea con el compromiso institucional frente al cambio climático y en cumplimiento de la **Enmienda de 2015 de la Norma ISO 14001**, se continuó con la identificación y gestión de riesgos y oportunidades asociados a condiciones climáticas extremas, buscando fortalecer la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

8. ANEXOS.

Anexo 1. Inspección Puntos ecológicos

Anexo 2. Inspección de kit de emergencias ambientales

Anexo 3. Acopio de combustible.

Anexo 4. Listado asistencia capacitación ambiental

Paula Andrea Pardo Redondo
Profesional Ambiental
Consorcio Carrera 5ta. EG

Anexo 1.
Inspección Puntos ecológicos

6901

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO:	SIG-FO-137
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	Inspección Acopios y puntos ecologicos	FECHA:	17/1/2025

CHA	21/8/2026
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta.
LUGAR	san martin

Ítem	Criterio de Verificación	si	no	Descripción.
Ubicación	El punto ecologico está en el sitio designado, de fácil acceso y seguro.	x		n.a
	los acopios de residuos se encuentran es sitios adecuados y seguros?	x		n.a
Señalización	Colores y rótulos según código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (verde, blanco, negro, etc.).	x		n.a
Estado físico	Recipientes en buen estado, sin roturas, con tapas y limpios.	x		n.a
	Recipiente con bolsa	X		n.a
Separación correcta	Residuos dispuestos de acuerdo con su categoría (aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos).	x		n.a
Limpieza del área	Zona libre de residuos fuera de los contenedores, sin olores ni lixiviados.	x		n.a
Frecuencia de recolección	Retiro de residuos según plan establecido, evitando sobreacumulación.	x		se realiza semanal y de forma quinsenal por parte del la empresa de aseo
Contención de lixiviados	El punto cuenta con bandejas o medidas para evitar derrames.		x	N.a
Protección contra plagas	se evidencian insectos, roedores u otros vectores.		x	N.a
Capacitación del personal	Usuarios conocen y aplican el código de colores y la correcta disposición.	x		N.a
Manejo de residuos peligrosos	En caso de existir, están almacenados y rotulados según normatividad.	x		N.a

Conclusiones y Recomendaciones:

Estado general de punto ecologicos : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Estado general de Acopios : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Recomendaciones especificas:
Continuar con el buen uso de los acopios y de los puntos ecologicos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo Redondo.	**Firma:**	

Anexo 2.

Inspección de kit de emergencias ambientales

6903

CONSORCIO CARRERA 5TA. EG		CÓDIGO: SIG-FO-67
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAME AMBIENTAL	FECHA: 18/07/2022
	NTC 4532 De 2010 Sección 7	

PROYECTO:	san martin carrera 5ta	**FECHA:**	21-ago-26
UBICACIÓN DEL KIT:	Area de bodega	**INSPECTOR:**	Paula pardo

DATOS BÁSICOS

N° IDENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN/PROYECTO:	kit n1 area de bodega
FECHA INSPECCIÓN:	21/8/2026

				KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS															
N°	**COMPONENTES**	**Unidad**	**Cantidad Mínima**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**
1	Ubicación (Protegido de condiciones ambientales)	N/A	1	x														
2	Señalización y visibilidad	N/A	1	x														
3	Acceso (facilidad de uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso)	N/A	1	x														
4	Estado de empaque (maletín o barril…)	N/A	1	X														
5	Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	1	X														
6	Bolsas Rojas	Und	1	x														
7	Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	10	x														
8	Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos)	Und	1	x														
9	Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	2	x														
10	Cinta de Señalización	mt	50	x														

Anexo 3.
Acopio de combustible.

6905

CONSORCIO CARRERA 5TA. EG		CÓDIGO:	SIG-FO-95
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	2
	Inspección de Acopio de combustible	FECHA:	10/7/2024

CHA	21/08/2026
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta
LUGAR	san martin

1. ETIQUETADO		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Todos los envases del acopio están etiquetados bajo el sistema SGA.	X		N.A
1.2	Las etiquetas de los productos son legibles y están en idioma español.	X		N.A
2. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
2.1	Estan disponibles las fichas de datos de seguridad de las sustancias almacenadas en el acopio de combustibles	X		N.A
2.2	Las fichas de datos de seguridad se encuentran en un lugar visible y en buen estado	X		N.A
3. ACOPIO DE COMBUSTIBLES.		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
3.9	¿El combustible está almacenado en contenedores adecuados y rotulados?	x		N.A
4.1	¿Se cuenta con kits de respuesta a derrames disponibles y en buen estado?	x		N.A
4.2	¿Existen sistemas de contención (bandejas, diques, paños) para evitar derrames?	x		N.A
4.3	¿El área de almacenamiento de combustible está claramente señalizada y es de acceso restringido?	x		N.A
4.4	¿El personal está familiarizado con el plan de emergencia y ha participado en simulacros?	x		N.A
4.5	El acerrin y dique de contencion se encuentra en buen estado?	x		N.A
4.6	¿El área de almacenamiento cuenta con una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores inflamables?	x		N.A
4.7	El diques de contención garantiza el almacenamiento de 110% del tanque con mayor capacidad	x		N.A

4. OBSERVACIONES GENERALES Y O REGISTRO FOTOGRAFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo	Firma:	

Anexo 4.
Listado asistencia

6907

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	21 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Clima y medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Condiciones atmosfericas que se presentan en un lugar durante un largo periodo de tiempo.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6908

INFORME SST

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 04
(07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026)


DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	**ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META** NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO CARRERA 5 EG** Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE
OBJETIVO	
Dar a conocer las actividades desarrolladas en el periodo 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026en seguridad y salud en el trabajo, del contrato cuyo objeto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".	


1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 13 de abril de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martin, Meta

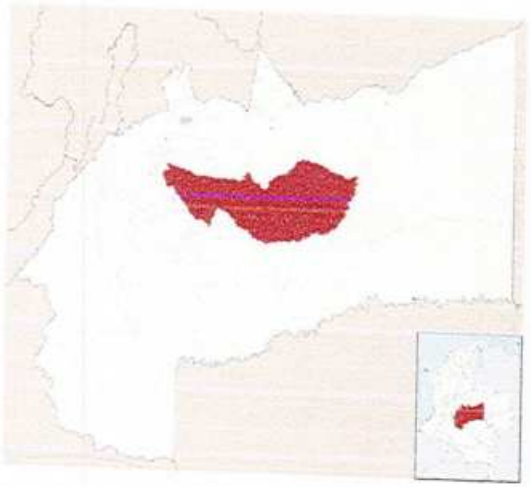

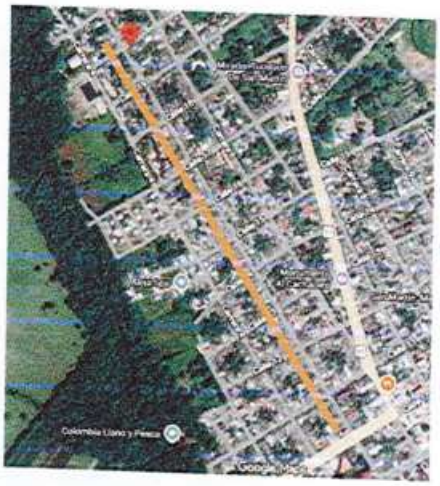

2. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA OBRA

	PERSONAL PROPUESTO
N° DE TRABAJADORES	1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Especialista hidráulica 4. Especialista ambiental 5. Especialista vial 6. Profesional en salud ocupacional

3. RELACIÓN DE PERSONAL

Durante el periodo del 07 de agosto al 06 de agosto de 2026, se realizó afiliación al sistema de seguridad personal de obra:

1. Afiliación a la ARL
2. Afiliación a la EPS
3. Afiliación a la AFP

El CONSORCIO CARRERA 5 EG, se compromete con el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente, realizando las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la obra, además supervisa que los contratistas y su personal cuenten de igual manera con las correspondientes cotizaciones a SGRL a fin de garantizar la cobertura del sistema en caso de cualquier eventualidad.

A continuación, se relaciona el personal, que ha intervenido en la obra ejecutada del CONSORCIO CARRERA 5 EG, dando cumplimiento a la legislación vigente en torno a la afiliación del personal al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. EPS, ARL, AFP y CCF.

3.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	INDEPENDIENTE
2	NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	1.121.830.599	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	INDEPENDIENTE
4	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECILISTA VIAS	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	INDEPENDIENTE
5	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	INDEPENDIENTE
6	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST	PROTEGER	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

3.2 PERSONAL OPERATIVO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	QUINTERIO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

Anexo 1 Reporte diario de ingreso y salida

3.2.1 PERSONAL OPERATIVO SUBCONTRATISTA

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LUIS GUILLERMO SEPULVEDA PUERTA	1.006.796.279	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS
2	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	NUEVA EPS	COLPESIONES	SURA	PRISMA DAV INGENIERIA S.AS.
3	WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGÓN	17.357.749	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	PRISMA DAV INGENIERIA S.AS.

3.3 INGRESOS

Durante el presente periodo se presentó 1 ingreso bajo la razón social del CONSORCIO CARRERA 5 EG.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
1	WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGÓN	17.357.749	OPERADOR	13/08(2026
2	NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	1.121.830.599	RESIDENTE DE OBRA	15/08/2026

Anexo 2 Afiliaciones

3.4 RETIROS

Durante el presente periodo no se presentaron retiros bajo la razón social el CONSORCIO CARRERA 5 EG.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
1	CARLOS MANUEL FORERO	19.405.796	RESIDENTE DE OBRA	15/08/2026
2	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	19/08/2026
3	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	03/09/2026

Anexo 3 Retiros

1. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Es importante mencionar que al presente informe se anexan planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al presente periodo. Debido a que como las obligaciones de seguridad social de algunos empleados se les imputan a las personas naturales y jurídicas que integran el CONSORCIO CARRERA 5 EG, tal como lo establece la Ley 80 de 1993. Y teniendo en cuenta, que el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar a ellos, tal y como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941-1	09/09/2026
MARIA FERNANDA QUEVEDO ESP. HIDRAULICO	1.121.862.487-1	18/09/2026
JAIME ANDRES CAÑON DONCEL ESP. VIAS	1.049.630.249-9	10/09/2026
PAULA ANDREA PARDO REDONDO ESP. AMBIENTAL	1.121.889.444-2	10/09/2026
CONSORCIO CARRERA 5 EG	902.054.725-5	07/09/2026
APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS	901882346-5	10/09/2026
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	900.862.112-1	03/09/2023

2. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.

Este informe mensual de SST proporciona una visión general de las actividades y resultados clave relacionados con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes específico. Se espera que este documento sea utilizado para la toma de decisiones informadas y para fortalecer constantemente las prácticas de SST en la empresa o proyecto.

- Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo.
- Mejorar las condiciones de trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.

2.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

La Medicina Preventiva y del Trabajo tiene como objetivo principal promover, prevenir y controlar la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo laborales presentes en su entorno laboral. Este enfoque integral busca reducir la incidencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, mejorando así el bienestar general de los empleados y optimizando la productividad en el consorcio.

2.1.1 EXAMENES DE INGRESO

Teniendo en cuenta que los exámenes médicos laborales pre- ocupacionales o de Ingreso, evalúan la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.

Resolución 2346 de 2007 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales"* ***Artículo 16.*** *Reserva de la historia clínica ocupacional.*

Resolución 1918 de 2009 *"Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones"* ***Articulo 17.*** *Custodia y*

entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.

Resolución 1843 de 2025 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones".* ***Artículo 30. Custodia y entrega de la historia clínica ocupacional*** *... Para la custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales se aplicarán las siguientes disposiciones: ... b) En ningún caso, los empleadores podrán tener, conservar o anexar copia de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajador salvo que cuenten con autorización expresa de este y tengan vinculado un médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo o el servicio de medicina laboral habilitado.*

2.1.2 EXAMEN DE EGRESO

Los Exámenes de Egreso se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

Resolución 1843 de 2025 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones".* ***Artículo 11. Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso.*** *Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. En atención a los establecido en el numeral 7 del artículo 57 del código sustantivo del trabajo, el empleador o contratante deberá informar al trabajador sobre el proceso para la realización de la evaluación médica ocupacional de egreso, la cual deberá ser realizada dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la relación laboral o contractual y deberá dejar constancia de la respectiva notificación.*

2.1.3 INDUCCIÓN AL PERSONAL

La inducción en SST es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le informa sobre aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo que debe tener en cuenta en el cargo que va a ocupar. Durante el presente periodo se realizó inducción a los trabajadores que ingresaron a laborar en la ejecución de la obra, con el fin de brindar orientación y de que el personal a cargo tenga la debida información sobre los riesgos a los que está expuesto y asistan a los planes de capacitación y entrenamiento orientados a mejorar sus habilidades para la solución de problemas y la adopción de hábitos seguros.

Anexo 4 Inducción del personal

2.1.4 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocido como COPASST es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, se encuentra reglamentado por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 2013 de 1986. En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, la empresa conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el cual está integrado de manera equitativa por representantes del empleador y de los trabajadores, quienes fueron designados mediante elección democrática. Este comité tiene como objetivo principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.

La obligación de contar con actas de reunión del COPASST está establecida en la Resolución 2013 de 1986, que en su artículo 11 sobre las funciones del COPASST dice: *«j) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes»*. Se realizo la respectiva reunión con los miembros del COPASST.

Anexo 5 Acta de reunión mensual COPASST

2.1.5 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3461 de 2025, el consorcio tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral, el cual se encuentra integrado por representantes del empleador y de los trabajadores. El objetivo principal de este Comité es prevenir el acoso laboral, promover un entorno de trabajo sano y respetuoso, así como gestionar de manera oportuna los conflictos que puedan afectar la convivencia y el bienestar psicosocial de todos nuestros colaboradores. La participación de este Comité reafirma el compromiso de la organización con el respeto, la equidad y la construcción de un clima laboral positivo y seguro para todos.

Anexo 6 Acta de reunión mensual COCOLAB

2.1.6 BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se llevó a cabo la conformación de la brigada de emergencia integral de la empresa, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, contratistas, visitantes o las instalaciones. La brigada está integrada por personal voluntario que

ha sido seleccionado para cumplir funciones en áreas clave como evacuación, primeros auxilios, control de incendios y búsqueda y rescate.

2.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son dispositivos, accesorios y prendas diseñados para ser llevados o utilizados por una persona con el propósito de brindar protección frente a uno o varios riesgos que puedan comprometer su seguridad o salud en el entorno laboral. En el contexto de la industria de la construcción, donde los riesgos laborales son múltiples y constantes, el uso adecuado de los EPP es una medida esencial para prevenir incidentes y enfermedades profesionales.

Desde el momento en que el personal ingresa a laborar en la obra, se le suministran los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades. Estos EPP son reemplazados de manera oportuna cada vez que se evidencie su deterioro o pérdida de funcionalidad, garantizando así su eficacia y la seguridad continua del trabajador.

Adicionalmente, el Código Sustantivo del Trabajo- *Artículo 230. Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.*

Este marco legal complementa las acciones que desde la Seguridad y Salud en el Trabajo se adelantan para promover ambientes laborales seguros y saludables, reafirmando la obligación de los empleadores y el derecho de los trabajadores a contar con condiciones dignas y seguras para el ejercicio de sus funciones.
Anexo 7 Formato entrega de EPP







MC70817




2.3 SEÑALIZACIÓN DE OBRA


La señalización de obra es un elemento esencial dentro de las medidas de prevención y control de riesgos en los entornos de trabajo del sector construcción. Su función principal es informar, advertir, prohibir o guiar a los trabajadores y visitantes sobre los peligros existentes, las rutas de evacuación, zonas restringidas, uso obligatorio de EPP, y demás aspectos relevantes para la seguridad.









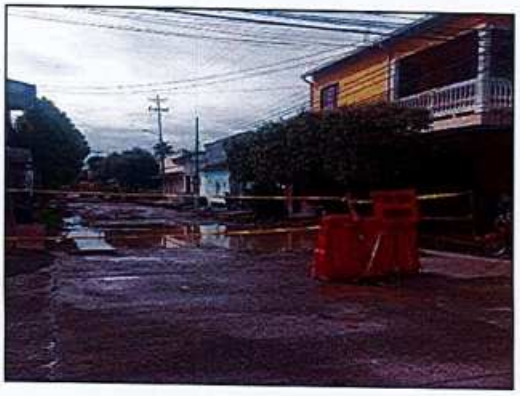



2.4 INSPECCIONES

La inspección de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta basada en un proceso de análisis visual que busca verificar que las actividades se ejecuten de manera saludable y segura, acorde con los procedimientos, estándares y políticas, e identifiquen la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores y el consorcio.

2.4.1 INSPECCIÓN DE EPP

Una inspección de EPP o elementos de protección personal es un proceso que se debe realizar en el lugar de trabajo para garantizar la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos. Se deben inspeccionar antes de cada uso de tal manera que asegure el buen funcionamiento de todas las partes que conforman el elemento de protección personal, finalizada su uso o jornada laboral realizar la limpieza, desinfección y asegure su almacenamiento en lugares y condiciones adecuadas.

Anexo 8 Inspección de EPP









2.4.2 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

El botiquín de primeros auxilios es el recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención primaria a los trabajadores que pueden sufrir alguna lesión o fractura y en muchos casos pueden ser decisivos para evitar complicaciones y salvar vidas. Por ende, en el mes de agosto 2026, se realizó una inspección para verificar el estado en el que se encontraban los implementos de atención primaria y que no le faltara nada para así darle cumplimiento a lo establecido.

Anexo 9 Inspección de botiquín y camilla





2.4.3 INSPECCIÓN DE EXTINTOR

La inspección del extintor es un recurso básico para las actividades laborales de los trabajadores, la realización periódica de inspecciones garantiza que los extintores estén en condiciones óptimas y listos para su uso en caso de un incendio. Para el

mes de agosto 2026, se realizó una inspección completa y se evidencia que el extintor está en buen estado, cumple con lo requerido y se encuentra vigente.
Anexo 10 Inspección de extintor





2.4.4 INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla de primeros auxilios es el recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentra para dar atención inicial a los trabajadores que pueden sufrir alguna lesión o evento y en muchos casos pueden ser decisivas para evitar complicaciones y salvar vidas. Se evidencia camilla de emergencia en buen estado, para primeros auxilios fabricada en polietileno traslucida rayos X flotante color naranja con varias manijas de transporte, para la atención primaria de un trabajador en caso de AT, existe un botiquín de primeros auxilios, camilla e inmovilizadores y para prevención de incendios extintor multipropósito.





2.4.5 INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo. El orden es fundamental en el área de la seguridad, la falta de él puede contribuir a diferentes tipos de accidentes como caídas y choques u originar algún incendio por su inadecuado almacenamiento.

Las inspecciones realizadas pretenden verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos. CONSORCIO CARRERA 5 EG procura el mantenimiento del orden y aseo con la finalidad de encontrar despejados los espacios de circulación, evitando así riesgos adicionales por cuenta de las condiciones del lugar de trabajo.

Anexo 11 Inspección de orden y aseo









Anexo 12 Inspección gerencial HSE

2.4.6 INSPECCIONES LOCATIVAS


Con las inspecciones locativas se pretende verificar que se encuentre en buen estado las rutas de evacuación, salidas de emergencia, los elementos de atención de emergencia y que estén señalizadas, legibles y en buen estado. También se inspecciona los lugares o áreas de trabajo que estén en ordenados y aseados, los elementos de trabajo se encuentren bien dispuestos en archivos o estantes, los puntos ecológicos estén ubicados y que le den un uso adecuado, que la iluminación y la ventilación del área o lugar de trabajo sea la adecuada, que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones que no generen ningún riesgo al trabajador.

Anexo 13 Inspecciones locativas







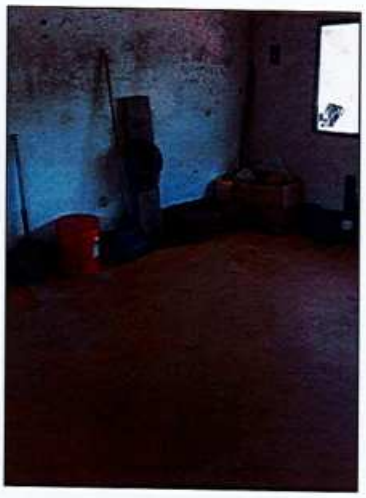





2.4.7 INSPECCIÓN SEMANAL- HERRAMIENTA MENOR

La inspección de herramienta menor constituye una medida preventiva esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia en la ejecución de las actividades operativas en el sector de la construcción. En el CONSORCIO CARRERA 5 EG, esta práctica se desarrolla de manera sistemática antes y después del uso de las herramientas manuales, con el propósito de:

- Verificar su estado físico y condiciones de seguridad.
- Comprobar su funcionalidad y correcto desempeño.
- Identificar oportunamente posibles deficiencias o fallas que puedan generar incidentes.

El cumplimiento de esta medida permite reducir riesgos de accidente, garantizar la calidad en las labores ejecutadas y fomentar una cultura de autocuidado y responsabilidad compartida en el lugar de trabajo.

Anexo 14 Inspección semanal- herramienta menor





2.4.8 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES

La inspección preoperacional de equipos menores consiste en revisar antes de su uso el estado físico y funcional del equipo para garantizar condiciones seguras de operación. Esta verificación incluye confirmar que cuente con su guarda de seguridad correctamente instalada, que el cableado no presente peladuras ni empates, y que el disco o accesorio esté en óptimas condiciones sin fisuras ni desgaste.

Adicionalmente, se debe realizar una prueba en vacío para comprobar su funcionamiento normal. Este procedimiento es obligatorio para prevenir accidentes como amputaciones, proyecciones de fragmentos y descargas eléctricas, proteger la integridad del trabajador y evitar daños en los equipos.

2.4.9 INSPECCIÓN DE MAQUINARIA

La inspección de maquinaria es una actividad fundamental para garantizar que los equipos y máquinas empleados en las operaciones cumplan con condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad. Esta práctica permite identificar de manera temprana fallos, desgastes o anomalías que puedan afectar la operación segura, facilitando la adopción de medidas preventivas o correctivas oportunas para evitar accidentes, paradas no programadas, daños mayores o incumplimientos normativos.

Anexo 15 Inspección de maquinaria

















3. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SST

3.1 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) son herramientas fundamentales para evaluar de manera objetiva y sistemática los resultados obtenidos en materia de prevención y control de riesgos laborales.


En el consorcio carrera 5 EG, estos indicadores permiten analizar y resumir el comportamiento de las acciones implementadas en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de agosto 2026, facilitando la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del sistema.

3.1.1 ACCIDENTES DE TRABAJO


Durante el presente periodo se presentó 1 accidente de trabajo bajo la razón social del consorcio.




3.1.2 HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT

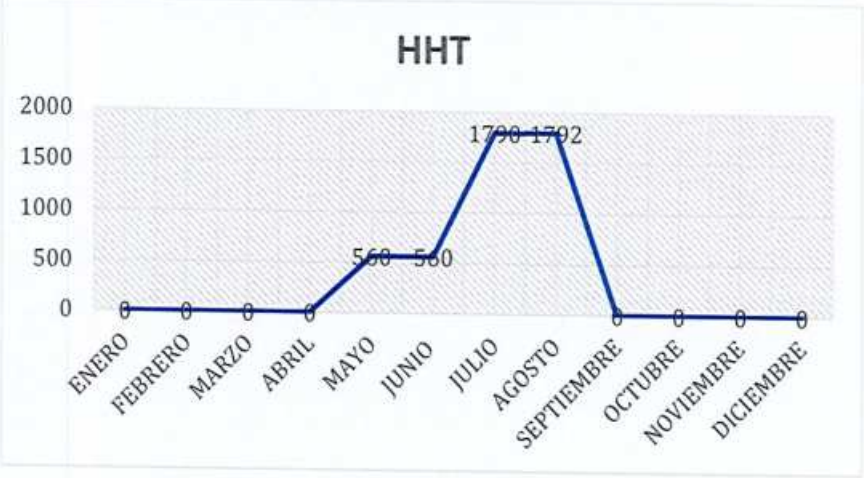


3.1.3 INDICE DE FRECUENCIA

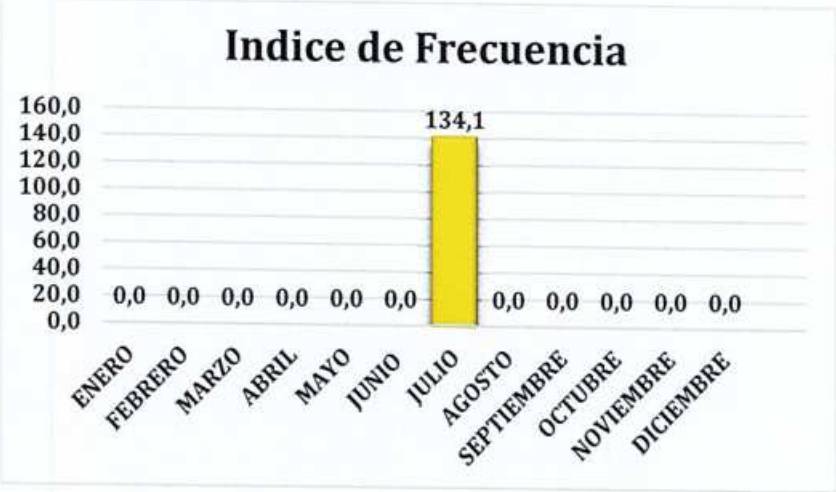


3.1.4 INDICE DE SEVERIDAD

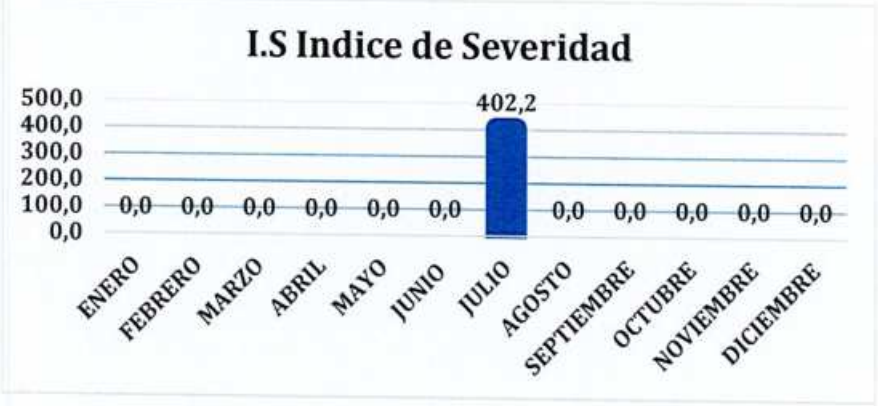

3.1.5 INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

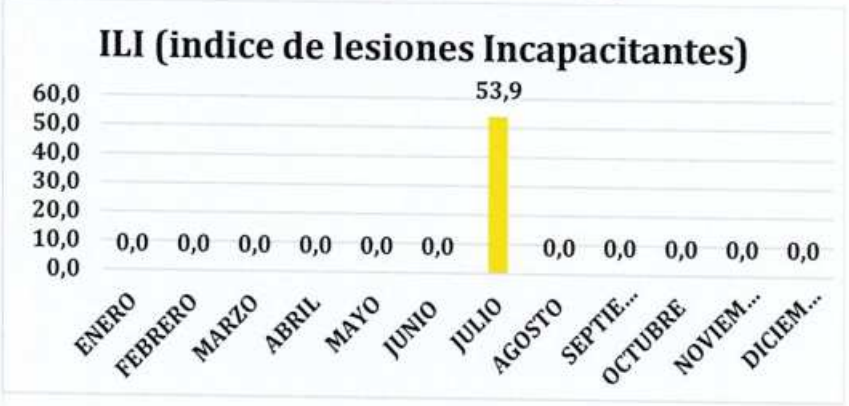

3.1.6 TASA DE ACCIDENTABILIDAD

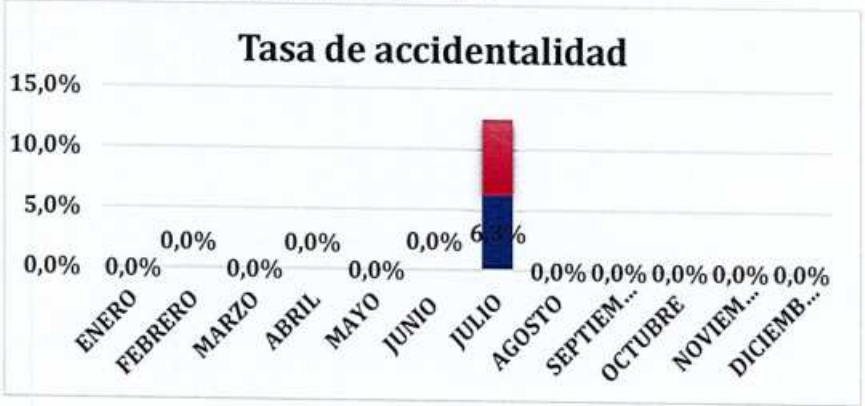

4. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del 07 de agosto al 06 de septiembre de 2026, no se presentó accidente laboral bajo la razón social del consorcio carrera 5 EG.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT N902054725, no presenta accidentes de trabajo desde el 07 de agosto de 2026 hasta el 06 de septiembre de 2026.

Anexo 16 Certificado de accidentalidad emitido por ARL

5. CHARLAS DIARIAS

Se realizan las charlas preoperacionales, dirigida por el Profesional en seguridad y salud en el trabajo, al personal operativo de perteneciente al CONSORCIO CARRERA 5 EG, estas se ejecutan con la finalidad de concientizar a los trabajadores sobre la importancia de verificar siempre las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y cumplir con las normas seguridad y recomendaciones para la prevención de accidentes.

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
1	Protección contra caídas	06/08/2026	Profesional SST
2	Uso de EPI	08/08/2026	Profesional SST
3	Seguridad en el uso de escalera	10/08/2026	Profesional SST
4	Andamio	11/08/2026	Profesional SST
5	Seguridad eléctrica	12/08/2026	Profesional SST
6	Prevención de incendio	13/08/2026	Profesional SST
7	Primeros auxilios	14/08/2026	Profesional SST
8	Excavaciones	15/08/2026	Profesional SST
9	Operaciones de equipos	18/08/2026	Profesional SST
10	Comunicación de riesgo	19/08/2026	Profesional SST
11	Gestión interna	20/08/2026	Profesional SST
12	Clima y medio ambiente	21/08/2026	Profesional SST
13	Preparación para emergencia	22/08/2026	Profesional SST
14	Bienestar de los trabajadores	24/08/2026	Profesional SST

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
15	Reporte de actos y condiciones inseguras	25/08/2026	Profesional SST
16	Prevención de lesiones musculoesqueléticas	26/08/2026	Profesional SST
17	Gestión de residuos peligrosos	27/08/2026	Profesional SST
18	Manipulación y almacenamiento	28/08/2026	Profesional SST
19	Control de polvo ruido y vibraciones	29/08/2026	Profesional SST
20	Inspección de herramientas y equipos menores	31/08/2026	Profesional SST
21	Rotulación de productos químicos	01/09/2026	Profesional SST
22	Radiación ionizada	02/09/2026	Profesional SST
23	Protección respiratoria	03/09/2026	Profesional SST
24	Manejo manual de material	04/09/2026	Profesional SST
25	Aseo en el trabajo	05/09/2026	Profesional SST

Anexo 17 Listado de asistencia









Anexo 18 ATS y permisos de trabajo

Los diferentes subcontratistas realizan seguimiento a las actividades realizadas en obra. Entre las cuales se destacan la realización de charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores, con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad y promover comportamientos seguros. Asimismo, lleva a cabo inspecciones preoperacionales para verificar que las condiciones, herramientas y equipos cumplan con los requisitos técnicos y normativos antes de iniciar cualquier actividad. De igual manera, realiza inspecciones en campo de forma periódica para identificar condiciones y actos inseguros, garantizando la aplicación de medidas correctivas y preventivas que contribuyan al bienestar de los trabajadores y al cumplimiento de la normatividad vigente.

6. CONCLUSIONES

- En el presente informe describe el compromiso de implementación de la seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores, el riesgo siempre va a existir en el ámbito laboral para esto se ejecutan actividades en las cuales se concientice al personal ayudando a la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud.
- La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo en el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".** Con el fin de mostrar el máximo compromiso por parte de la dirección y todos los trabajadores en el periodo de la ejecución del contrato.
- Durante la ejecución de la obra, a la fecha, no se ha presentaron accidentes de trabajo.
- Para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** es primordial velar por la seguridad de los trabajadores, es por ello por lo que se diseña un sistema de Gestión que le permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en las diferentes actividades previas a ejecutarse. Este proyecto abre las perspectivas y expone múltiples opciones que se tienen para el desarrollo de esta obra, es un eje fundamental para la construcción de la sociedad en materia de sostenibilidad ambiental y social.

7. ANEXOS

Anexo 1 Reporte diario de ingreso y salida
Anexo 2 Soportes de afiliación
Anexo 3 Soportes de retiros
Anexo 4 Induccion de personal
Anexo 5 Acta de reunión mensual COPASST
Anexo 6 Acta de reunión mensual COCOLAB
Anexo 7 Formato entrega de EPP
Anexo 8 Inspección de EPP
Anexo 9 Inspección de botiquín y camilla
Anexo 10 Inspección de extintor
Anexo 11 Inspección de orden y aseo
Anexo 12 Inspección gerencial HSE
Anexo 13 Inspecciones locativas
Anexo 14 Inspección semanal- herramienta menor
Anexo 15 Inspección de maquinaria
Anexo 16 Certificado de accidentalidad emitido por ARL
Anexo 17 Listado de asistencia
Anexo 18 ATS y permisos de trabajo

Marlly Bejarano E.

MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO CARRERA S EG 902.054.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reporte diario de ingreso y salida

6938

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	06/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P.	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

C939

CONSORCIO CARRERA 900.614.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	8/8/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	10/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

941

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	12/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6942

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	13/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

943

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	14/8/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6944

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	15/08/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6945

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	18/08/20

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

GFA.6

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	19/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6947

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	29/08/2026

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	—	—	—	—
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6948

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	21/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6949

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	22/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	21/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6951

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	29/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6952

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	26/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6953

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	27/08/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	28/08/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6955

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	29/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6956

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	31/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6157

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	01/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	—		—	—
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6958

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	02/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

6959

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	03/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

696

CONSORCIO CARRERA 5 EG 901.054.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	04/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Doran	Geiner Doran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P.	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

616

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	05/09/20

ITEM	Nombre del trabajador	Nº de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00		
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

6962

SaludTotal EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4017332249	2|5|0|8|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen	4.Contribución Solidaria
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual; -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐	Si ☐ No ☒
5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante		7.Codigo (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
GARAVITO (Primer apellido)	ARAGON (Segundo apellido)	WILLIAM (Primer nombre)	ALEXANDER (Segundo nombre)

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación	13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento	15.Fecha Nacimiento
CC	17357749	Femenino ☐ Masculino ☒	F☐ M☒ T☐ NB☐ Otro☐ Cual	COLOMBIA	País: COLOMBIA Departamento: Municipio:	3|0|0|4|1|9|8|0

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN	21.Grupo población especial
6		Si ☐ No ☒ Categoria Discapacidad	Si ☐ NO ☒	Nivel Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A		2000000	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
MZ 1 CA 18 BRR VILLA ESPERANZA		3124617534	WGARAVITOARAGON@GMAIL.COM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
META	SAN MARTIN	170	Urbana cabecera municipal ☐ Rural dispersa ☐ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de Identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento	34.Fecha Nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	F☐ M☐ T☐ NB☐ Otro☐ Cual		País: Departamento: Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	País	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	MULTISALUD SAN MARTIN - MULTISALUD SAN MARTIN	MULTISANMA - MULTISANMA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	NIT	900862112	

59.Ubicación				
CL 15 N 40 01 OF 404 (Dirección)	6741131 (Teléfono fijo o celular)	TALENTOHUMANO@PRISMADAV.CO (Correo electrónico)	META (Departamento)	VILLAVICENCIO (Municipio/distrito)

6963

No de Radicacion
4017332249

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 15.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 16. Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ 17.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 18. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 19. Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ 20. Ingreso a contribución solidaria
- ☐ 21. Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico	63.Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
☐		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	1|3|0|8|2|0|2|6	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 69. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 70. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 71. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 72. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 73. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 74. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 75. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 76. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- 77. ☐ Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- 78. ☐ Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad
☐	

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X. ANEXOS

- ☐ 82.Anexo Copia del documento de identidad: CN.☐ RC.☐ TI.☐ CC.☐ PA.☐ CE.☐ CD.☐ SC.☐ PT.☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 86. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 87.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 88.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 89.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 90.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del Departamento	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95.Firma del funcionario

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

6964

Cofrem

FORMATO
"RADICACIÓN DE DOCUMENTOS"

Dependencia Generadora: Div. Comercial y de Mercadeo
Fecha de Vigencia: 2018-09-25

2026/09/07 **2:26 pm** **Radicado:** 3864739

Recibe: DUVAN ANDRES RAMOS PADILLA
Clasificación: **Estado:** R **Asesor:** 94
REACTIVAR
Centro de Servicio: VILLAVICENCIO

Información Empresa: **Caso:** 0
Nit: 900862112 **Telefono:**6741131
Razón Sócial: PRISMA DAV INGENIERIA SAS
Tipo Aportante: 1 EMPLEADOR APORTE 4%

Información Solicitante:

Documento: 17357749 **Telefono:** 0
Nombre: GARAVITO ARAGON WILLIAM ALEXANDER
Dependencia:
[redacted]ISION DE SUBSIDIOS

:umentos Presentados:

- **Copia cédula de ciudadania**

  17357749 WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON

- **Formulario de inscripción del trabajador**

  17357749 WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON

Observaciones:

02 FOLIOS
REACTIVACION
CORREO: talentohumano@prismadav.co

Recuerde:

1. Actualizar cada año a partir del 1 de febrero certificación de estudios de hijos mayores de 12 años,
actualizar en cada semestre la certificación de estudio
para hijos que estén adelantando pregrado.
2. Sr. Empleador y trabajador según ley 1581 de 2012 las firmas respaldan la validez de los datos consignados en el formulario, por tanto su registro debe ser personal e intransferible.

Nombre, cédula y teléfono quien entrega los documentos para afiliación.

6965

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **17.357.749**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura 6966

Medellín, 09 de Septiembre de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PRISMA DAV INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - PRINCIPAL OFICNA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C17357749	GARAVITO ARAGON WILLIAM ALEXANDER	13/08/2026		1413128u	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10068233232625254383

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/09/2026 15:06:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
GILADO

CONSORCIO CARRERA 5 EC 900.854.725-1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Soportes de retiros

ONSORCIO
CARRERA 5 EG
902.054.725-5

6963

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT. 902.054.725 - 5

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **CARLOS MANUEL FORERO ORREGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.405.796, estuvo vinculado laboralmente con el CONSORCIO CARRERA 5 EG, desempeñando el cargo de Residente de Obra, desde el 13 de mayo de 2026 hasta el 15 de agosto de 2026, inclusive.

Se certifica igualmente que la terminación de su contrato individual de trabajo se efectuó por mutuo acuerdo entre las partes, conforme a la liquidación suscrita libre y voluntariamente por el empleador y el trabajador el día 15 de agosto de 2026, documento que hace parte de su expediente laboral.

En consecuencia, de acuerdo con la documentación que reposa en los archivos del CONSORCIO CARRERA 5 EG, la finalización del vínculo laboral obedeció a la causal de mutuo acuerdo entre las partes.

La anterior certificación se expide en Villavicencio – Meta el tres (03) de septiembre del 2026.

LINA MARÍA ARENAS NIÑO
Directora de Gestión del Talento Humano

CONSORCIO CARRERA 5 RG
NIT 902,054,725-5
LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

6969

No. CONT. 000007

OMBRE DEL TRABAJADOR: HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION:VILLAVICENCIO Agosto 24/26
OCUMENTO IDENTIDAD: CC 1,120,366,743 Codigo:HER001	MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO: DURACION DE OBRA
LTIMO CARGO DESEMPEÑADO: AYUDANTE DE OBRA 26	TERMINACION DEL CONTRATO: RENUNCIA VOLUNTARIA

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA
ECHA DE RETIRO:	2026	08	19
ECHA DE INGRESO:	2026	05	25
ECHA LIQUIDACION:	2026	08	24
.TIMA LIQUIDACION VACACIONES	2026	05	25
EMPO DE SERVICIO	85.0		
ENOS DIAS LICEN			
OTAL DIAS TRABAJ.	85.0		
AS PARA VACAC .	85.0		
AS PARA CESANT.	85.0		
AS INT. CESANT.	85.0		
[redacted]RA PRIMA	49.0		

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS	
SALARIO BASICO	1,750,905
PROMEDIO ANUAL	1,991,204
SALARIO BASICO DIARIO	58,363.5
PROMEDIO VACACIONES	1,750,905.0
PROMEDIO PRIMA SERVICIOS	1,984,745.0
PROMEDIO CESANTIAS	1,991,204.0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTOS
7	CESANTIAS	85.0	470,145	
8	INT. CESANTIAS	85.0	13,321	
9	Prima Servic.	49.0	270,146	
0	Vacaciones	85.0	206,704	

TAL DEVENGOS: 960,316 **TOTAL DESCUENTOS:** **NETO A PAGAR:** 960,316

SERVACIONES

ELAB: DECR FECHA: 260824.

MODI: FECHA:

ace constar expresamente lo siguiente:

Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, la totalidad de los valores correspondientes a todo concepto relacionado con salarios, por toda acreencia laboral que tenga por causa el contrato de [redacted] ha quedado extinguido.(2.)Que no obstante la anterior declaracion, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación queda transada, [redacted]'erencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado como en efecto se transa y por todo reclamo pasado, el empleador y trabajador se declaran recíprocamente a paz y salvo por los ep... expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

TRABAJADOR
1120366743

Geraldine Torres Vargas
EL EMPLEADOR
C.C.

Periodo Nomina:
202608L

6970

CONSORCIO CARRERA 5 EG **NOMINA DE MAYO/2026** **2026050**
NIT: 902,054,725-5 OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: ALIRICHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
000	101	Sueldo basico	6.00	350,181		
000	102	Aux. Transporte	6.00	49,818		
000	19A	Incap. Enfemed				
000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	14,007
000	233	NUEVA EPS			1.00	14,007
		TOTAL EMPLEADO		399,999		28,014
		NETO PAGADO:		**371,985**	Elab: ANDR 260525	

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

6971

CONSORCIO CARRERA 5 EG **NOMINA DE JUNIO/2026** **2026060**

NIT: 902,054,725-5 OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: ALIRIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	30.00	1,750,905		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	70,036
[redacted]	233	NUEVA EPS			1.00	70,036
		TOTAL EMPLEADO		1,999,995		140,072
		NETO PAGADO:		**1,859,923**	Elab: ANDR 260603	

FIRMA DEL EMPLEADO:  Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

6972

CONSORCIO CARRERA 5 EG **NOMINA** **2026131**
NIT: 902,054,725-5 OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: ALIRIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

OSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS
000	199	Prima Servic.	36.00	200,000	
		TOTAL EMPLEADO		200,000	
		NETO PAGADO:		**200,000**	Elab:

FIRMA DEL EMPLEADO:  Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

6973

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE JULIO/2026
OF.404.CL.15.NO.41-101.

2026070
tel:3103069962

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: ALIRICHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

OSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
)00	101	Sueldo basico	27.00	1,575,815		
)00	102	Aux. Transporte	27.00	224,181		INCP 3 DIAS
)00	122	VIÁTICOS.	30.00	73,416		HE
)00	190	Incap. Enfemed	3.00	175,091		PERIODO DE: 20260703
	19A	Incap. Enfemed				A: 20260705
)00	227	PORVENIR PENSIO			1.00	70,036
)00	233	NUEVA EPS			1.00	70,036
		TOTAL EMPLEADO		2,048,503		140,072
		NETO PAGADO:		**1,908,431**		Elab: ANDR 260714

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE AGOSTO/2026 2026080
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

6974

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: ALIRIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
000	101	Sueldo basico	19.00	1,108,907		
000	102	Aux. Transporte	19.00	157,757		
000	19A	Incap. Enfemed				
000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	44,356
	233	NUEVA EPS			1.00	44,356
		TOTAL EMPLEADO		1,266,664		88,712
		NETO PAGADO:		**1,177,952**	Elab: ANDR 260821	

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

6975

CONSORCIO CARRERA

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Paz y Salvo

Nombre:	**HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO**	**Motivo de retiro:**	Renuncia Voluntaria
Cargo:	Ayudante de Obra	**Sueldo:**	1750905
Doc. Id:	1120366743	**Tipo de contrato:**	OBRA O LABOR
Fecha de ingreso	28 de Mayo de 2026	**Fecha de salida:**	19 de Agosto de 2026

Yo, **HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO,** identificado (a) con c.c. N.º **1120366743** por medio de este documento declaro a **PAZ Y SALVO** al **CONSORCIO CARRERA 5 EG**, por el cumplimiento del pago que me hiciera éste en razón de la relación laboral que finalizó el día, 19 de Agosto de 2026, y dejó constancia así:

Que recibí todo lo correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales y en general todo lo que se causó en la relación laboral de acuerdo a lo contemplado en la Ley 50 de 1990 en su Artículo 09 Ordinal 3.

Que el trámite de elaboración, revisión y aprobación de la respectiva liquidación se realizó en los términos legales y en el tiempo prudencial que se establece en la ley.

Que la liquidación a la que soy acreedor corresponde realmente a mis derechos ciertos e indiscutibles en ocasión a la relación laboral que existió, y que en ningún momento renuncio a los mismos.

Que autorizo los descuentos que figuran en la presente liquidación.

Que las sumas que aparecen en la liquidación, que es parte integral de este documento, fueron canceladas en su totalidad de acuerdo con lo convenido con el empleador, y que recibo a satisfacción sin reclamación alguna.

Por todo lo expuesto anteriormente, desistiré de cualquier reclamación laboral ante el Ministerio del Trabajo o ante la Justicia Ordinaria Laboral.

Expedido en la ciudad de Villavicencio el 19 de Agosto de 2026 y en ellos intervienen:

Geraldine Torres Vanegas

Estefany Geraldine Torres Vanegas
Representante legal
Nit. 902.054.725-5

Hernandez Mendoza Yeison Alirio
C.C. 1120366743
Trabajador

6976

CONSORCIO
CARRERA
902.054.725-5

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Autorización de exámenes de permanencia y/o egreso

Villavicencio, 19 de Agosto de 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES DE PERMANENCIA Y/O EGRESO

HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1120366743, certifico que he sido notificado y autorizado para que asista a la I.P.S. CONFIANZA IPS, con el fin de realizarme los exámenes de egreso, de conformidad con la terminación del contrato de trabajo existente entre las partes.

Así mismo, he sido notificado que debo asistir dentro de los siguientes CINCO (5) días siguientes a la entrega de la presente notificación, aun así, doy a entender que no es mi deseo realizármelos.

En constancia de lo anterior, es suscrito el día 19 de Agosto de 2026, por:

HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO
C.C. No. 1120366743
Trabajador

6977

CONSORCIO
CARRERA
902.054.725-5

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902.054.725 - 5

CERTIFICA:

El señor **HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1120366743 laboró para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** desde el día **25 de Mayo de 2026** hasta el día **19 de Agosto de 2026**, desempeñando el cargo de **Ayudante de Obra** en el **CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT 902.054.725-5** con un contrato individual de trabajo por **OBRA O LABOR,** devengando un salario mensual de **$1750905** (*UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE*). La causa de su retiro fue:

RENUNCIA VOLUNTARIA	**X**	**ABANDONO DEL CARGO.**		**TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR MUTUO ACUERDO.		**FALLECIMIENTO.**		**PERIODO DE PRUEBA.**	

A la fecha de su retiro, se encontraba afiliada a:

EPS: NUEVA EPS
AFP: PORVENIR
ARL: SURA
CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

Los aportes correspondientes a parafiscales y seguridad social se encuentran a PAZ Y SALVO.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el **19 de Agosto de 2026.**

LINA MARÍA ARENAS NIÑO
Directora de Gestión del Talento Humano.

6978

CONSORCIO
CARRERA 5 EG
900.054.725-5

Villavicencio, 08 de Septiembre de 2026

Señora:
RESTREPO CAROLINA
C.C. No. 1070586114
Ciudad

ASUNTO: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA

Respetada señora Carolina,

Por medio de la presente, CONSORCIO CARRERA 5 EG., en calidad de empleador, se permite comunicarle formalmente su decisión de dar por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo por OBRA O LABOR celebrado con usted el día 25 de Mayo de 2026.

En consecuencia, la relación laboral terminará de manera efectiva el día 03 de Septiembre de 2026, fecha hasta la cual se reconocerán y pagarán los conceptos laborales que legalmente correspondan.

La presente decisión se adopta con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador y establece la obligación de reconocer al trabajador la correspondiente indemnización.

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de trabajo por OBRA O LABOR, que su salario mensual corresponde a UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905), la empresa reconocerá la indemnización por terminación unilateral sin justa causa que resulte aplicable conforme a la legislación laboral vigente y a la liquidación definitiva que será elaborada por la Empresa.

Así mismo, CONSORCIO CARRERA 5 EG procederá al reconocimiento y pago de los salarios pendientes, prestaciones sociales, vacaciones y demás conceptos laborales causados hasta la fecha efectiva de terminación del contrato, de acuerdo con la liquidación definitiva correspondiente.

La empresa realizará igualmente las gestiones administrativas relacionadas con el retiro del Sistema de Seguridad Social Integral y demás trámites derivados de la terminación de la relación laboral, conforme a las obligaciones legales aplicables.

6979

CONSORCIO
CARRERA 5 EG
902.054.725-5

Se deja expresa constancia de que la presente comunicación constituye la notificación formal de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, siendo el 03 de Septiembre de 2026 la fecha efectiva de finalización del vínculo laboral.

Agradecemos los servicios prestados a CONSORCIO CARRERA 5 EG durante el tiempo de vinculación laboral y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Cordialmente,

Geraldine Torres Vanegas
CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT. 902.054.725-5

CONSTANCIA DE RECIBIDO.

RESTREPO CAROLINA
C.C. No. 1070586114
Firma: Carolina Restrepo
Fecha de recibido: 08 de Septiembre de 2026

6980

CONSORCIO CARRERA 5 EG **NOMINA DE JUNIO/2026** **2026060**
NIT: 902.054.725-5 OF.404 CL 15 NO.41-101. tel:3103069962

RES001 RESTREPO **CAROLINA** CARGO: AYUDANTE DE OBRA 28
E-MAIL: RESTREPOCAROLINA1@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	30.00	1,750,905		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	19A	Incap. Enfermed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	70,036
0000	233	NUEVA EPS			1.00	70,036
		TOTAL EMPLEADO		1,999,995		140,072
		NETO PAGADO:		**1,859,923**	Elab: ANDR 260603	

FIRMA DEL EMPLEADO: Carolina Restrepo Doc.Ident: 1070,586,114 VoBo_____

6951

CONSORCIO CARRERA 5 EG **NOMINA** **202609L**
NIT: 902.054.725-5 OF.404,CL.15,NO.41-101. tel:3103069962

RES001 RESTREPO **CAROLINA** CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: RESTREPOCAROLINA1@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS
0000	199	Prima Servic.	36.00	200,000	
		TOTAL EMPLEADO		200,000	
		NETO PAGADO:		**200,000**	Elab:

FIRMA DEL EMPLEADO: Carolina Restrepo Doc.Ident: 1070,586,114 VoBo_____

6982

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT. 902.054.725-5

NOMINA DE JULIO/2026 **2026070**
OF.404 CL 15 NO.41-101. tel:3103069962

RES001 RESTREPO **CAROLINA**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: RESTREPOCAROLINA1@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	30.00	1,750,905		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	122	VIÁTICOS.	30.00	130,517		HE
0000	19A	Incap. Enfermed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	70,036
0000	233	NUEVA EPS			1.00	70,036
		TOTAL EMPLEADO		2,130,512		140,072
		NETO PAGADO:		**1,990,440**		Elab: ANDR 260714

FIRMA DEL EMPLEADO: Carolina Restrepo Doc.Ident: 1070,586,114 VoBo_____

6983

CONSORCIO CARRERA 5 EG **NOMINA DE AGOSTO/2026** **2026080**
NIT: 902,054,725-5 OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

RES001 RESTREPO CAROLINA CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: RESTREPOCAROLINA18@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	28.00	1,634,178		
0000	102	Aux. Transporte	28.00	232,484		INP 14/15
0000	190	Incap. Enfemed	2.00	116,727		PERIODO DE: 20260814
0000	19A	Incap. Enfemed				A: 20260815
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00 70,036	
0000	233	NUEVA EPS			1.00 70,036	
		TOTAL EMPLEADO		1,983,389	140,072	
		NETO PAGADO:		**1,843,317**	Elab: ANDR 260821	

FIRMA DEL EMPLEADO: Caroline Rstrepo Doc.Ident: 1070,586,114 VoBo_____

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE SEPT./2026 **2026090**
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

6984

RES001 RESTREPO **CAROLINA**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: RESTREPOCAROLINA18@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	3.00	175,091		
0000	102	Aux. Transporte	3.00	24,909		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	7,004
0000	233	NUEVA EPS			1.00	7,004
		TOTAL EMPLEADO		200,000		14,008
		NETO PAGADO:		**185,992**	Elab: ALEJ 260908	

FIRMA DEL EMPLEADO: Carolina Restrepo Doc.Ident: 1070,586,114 VoBo_____

6985

CONSORCIO
CARRERA 5 EG
902.054.725-5

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Autorización de exámenes de permanencia y/o egreso

Villavicencio, 08 de Septiembre de 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES DE PERMANENCIA Y/O EGRESO

RESTREPO CAROLINA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1070586114, certifico que he sido notificado y autorizado para que asista a la I.P.S. CONFIANZA IPS, con el fin de realizarme los exámenes de egreso, de conformidad con la terminación del contrato de trabajo existente entre las partes.

Así mismo, he sido notificado que debo asistir dentro de los siguientes CINCO (5) días siguientes a la entrega de la presente notificación, aun así, doy a entender que no es mi deseo realizármelos.

En constancia de lo anterior, es suscrito el día 08 de Septiembre de 2026, por:

Carolina Restrepo

RESTREPO CAROLINA
C.C. No. 1070586114
Trabajador

6986

CONSORCIO
CARRERA 5 EG
902.054.725-5

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902.054.725 - 5

CERTIFICA:

La señora **RESTREPO CAROLINA,** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1070586114 laboró para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** desde el día **25 de Mayo de 2026** hasta el día **03 de Septiembre de 2026**, desempeñando el cargo de **Ayudante de Obra** en el **CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT 902.054.725-5** con un contrato individual de trabajo por **OBRA O LABOR**, devengando un salario mensual de **$1750905** (*UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE*). La causa de su retiro fue:

RENUNCIA VOLUNTARIA		**ABANDONO DEL CARGO.**		**TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**	
TERMINACIÓN UNILATERAL POR PARTE DEL EMPLEADOR	**X**	**FALLECIMIENTO.**		**PERIODO DE PRUEBA.**	

A la fecha de su retiro, se encontraba afiliada a:

EPS: NUEVA EPS
AFP: PORVENIR
ARL: SURA
CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

Los aportes correspondientes a parafiscales y seguridad social se encuentran a PAZ Y SALVO.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el **08 de Septiembre de 2026.**

LINA MARÍA ARENAS NIÑO
Directora de Gestión del Talento Humano.

6987

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Inducción del personal

6988

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO: SIG-TH-FO-21
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 1
	Evaluación De La Inducción	FECHA: 06/05/2026

FECHA:	13/08/26		
NOMBRE:	William Garavito Arango	CC.	17.357.749
CARGO:	Operador	CALIFICACION:	15/15

1. ¿Une con una linea los residuos que correspondan al color?

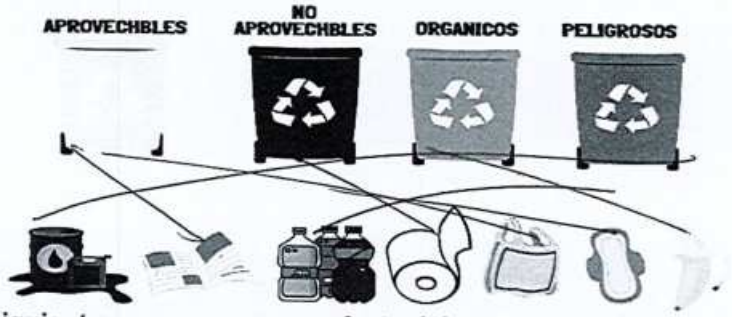

2. ¿Cuál de los siguientes crees que es un efecto del cambio climático?

A) Que las herramientas se desgasten más rápido

B) Que haya lluvias más intensas y frecuentes fuera de temporada y golpes de calor

C) Que se usen más equipos eléctricos y aire acondicionado

3. ¿Cuál de las siguientes consideras que son prácticas es sostenibles?

A) Tirar los residuos mezclados en cualquier contenedor

B) Lavar herramientas directamente en el suelo

C) Usar el agua energia y papel necesario, separar residuos adecuadamente.

4. ¿En cual de las siguientes normas esta certificada la empresa?

A) Seguridad y Salud en el Trabajo 45000.

B) Politica integral (Calidad 9001, Seguridad 45000, Ambiental 14001)

C) Energia (50001)

5. Para prevenir las lesiones y enfermedades, usted:

A. Utiliza los elementos de protección personal

B. Trabaja rápido sin tomar medidas de precaucion para salir temprano

6. Si un compañero de trabajo no cumple con las normas de seguridad, usted:

A. Sigue trabajando sin preocuparse por lo que le pase

B. Le recomienda cumplir con las normas de seguridad

7. La politica de alcohol, drogas y tabaquismo prohibe:



8. Como trabajadores de CONSORCIO CARRERA 5 EG nos comprometemos a cumplir con:

A. Cumplir con el horario laboral

B. Acatar las instrucciones del encargado y/o líder de proceso

C. Todas las Anteriores

9. Seleccione los elementos de proteccion personal para realizar actividades al interior de la empresa y en su lugar de trabajo (Marque con una X)



6989

10.Cuales de las siguientes actividades requieren permiso de trabajo? (Marque con una X)

a. Demoliciones b.Trabajo en alturas c.Excavaciones X. Trabajos eléctricos

11. En caso de presentarse un accidente de trabajo que se debe Hacer:

A. Salir corriendo B. Buscar al gerente de la empresa X Reportarlo al area de SST y/o jefe inmediato

12. Marque con X los riesgos a los que está expuesto durante su trabajo.



13. Con sus palabras escriba que es y que hace el Copasst

Comité encargado de la seguridad y la salud en el trabajo

14. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las normas de seguridad en el trabajo? (Por ejemplo no utilizar los EPPS, incumplir las instrucciones del SISO, dañar la señalización, etc.)

Accidentes de trabajo.

15 ¿Para que sirve el comité de convivencia?

Prevenir el acoso laboral de los diferentes miembros de la empresa

6990

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CÓDIGO: SIG-TH-FO-21
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 1
	Evaluación De La Inducción	FECHA: 06/05/2026

FECHA:	13/08/2026		
NOMBRE:	Nathali. Gozman	CC.	1121830599
CARGO:	ING RESIDENTE	CALIFICACION:	15/15

1. ¿Une con una linea los residuos que correspondan al color?



2. ¿Cuál de los siguientes crees que es un efecto del cambio climático?

A) Que las herramientas se desgasten más rápido

B) Que haya lluvias más intensas y frecuentes fuera de temporada y golpes de calor

C) Que se usen más equipos eléctricos y aire acondicionado

3. ¿Cuál de las siguientes consideras que son prácticas es sostenibles?

A) Tirar los residuos mezclados en cualquier contenedor

B) Lavar herramientas directamente en el suelo

C) Usar el agua energia y papel necesario, separar residuos adecuadamente.

4. ¿En cual de las siguientes normas esta certificada la empresa?

A) Seguridad y Salud en el Trabajo 45000.

B) Politica integral (Calidad 9001, Seguridad 45000, Ambiental 14001)

C) Energia (50001)

5. Para prevenir las lesiones y enfermedades, usted:

A. Utiliza los elementos de protección personal

B. Trabaja rápido sin tomar medidas de precaucion para salir temprano

6. Si un compañero de trabajo no cumple con las normas de seguridad, usted:

A. Sigue trabajando sin preocuparse por lo que le pase

B. Le recomienda cumplir con las normas de seguridad

7. La politica de alcohol, drogas y tabaquismo prohibe:



8. Como trabajadores de CONSORCIO CARRERA 5 EG nos comprometemos a cumplir con:

A. Cumplir con el horario laboral

B. Acatar las instrucciones del encargado y/o líder de proceso

C. Todas las Anteriores

9. Seleccione los elementos de proteccion personal para realizar actividades al interior de la empresa y en su lugar de trabajo (Marque con una X)



6991

10.Cuales de las siguientes actividades requieren permiso de trabajo? (Marque con una X)

a. Demoliciones b. Trabajo en alturas c. Excavaciones d. Trabajos eléctricos

11. En caso de presentarse un accidente de trabajo que se debe Hacer:

A. Salir corriendo B. Buscar al gerente de la empresa C. Reportarlo al area de SST y/o jefe inmediato

12. Marque con X los riesgos a los que está expuesto durante su trabajo.



13. Con sus palabras escriba que es y que hace el Copasst

Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo

14. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las normas de seguridad en el trabajo? (Por ejemplo no utilizar los EPPS, incumplir las instrucciones del SISO, dañar la señalización, etc.)

AT, morir, incidentes

15 ¿Para que sirve el comité de convivencia?

Prevenir el acoso laboral

CONSORCIO CARRERA 5 EG 1102.014.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Soportes de afiliación

6993

CONSORCIO CARRERA 5 EC 900954725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acta de reunión mensual COPASST

6994

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06/05/2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	31/8/2026	**HORA INICIO:**	10:00 a. m.	**HORA FINAL:**	11:00 a. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COPASST (Agosto 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación de asistencia
Revisión de condiciones de seguridad e higiene en el área
Reporte de actos y condiciones inseguras
Seguimiento a actividades de SST
Próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de asistencia:
Se confirma la presencia de los integrantes del COPASST y del Profesional SST, así como de los asistentes convocados.
2. Revisión de condiciones de seguridad:
Se informó sobre las inspecciones realizadas en la zona de trabajo, destacando los siguientes puntos:
Se evidencia buen uso de EPP en la mayoría de los trabajadores.
Se evidencia orden y aseo en obra.
Se realizo señalización de los puntos de la obra.
Se realiza charlas de seguirdad diarias.
3. Reporte de actos y condiciones inseguras:
No se reportaron accidentes de trabajo.
4. Seguimiento a campañas y actividades SST:
Se realizaron todas las actividades programadas.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COPASST	30/9/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	Carolina R.
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acta de reunión mensual COCOLAB

6996

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06-05-2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	31/8/2026	**HORA INICIO:**	11:00 a. m.	**HORA FINAL:**	12:00 p. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COCOLAB (Agosto 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación del quórum
Revisión de compromisos del comité anterior
Informe de capacitación realizada
Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos
Actividades del comité
Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum: Se confirma asistencia de los miembros del comité para dar inicio a la reunión.
2. Revisión de compromisos del comité anterior: Se revisan las tareas asignadas en la reunión anterior y su nivel de cumplimiento.
3. Informe de capacitación realizada: Se realizo charla de bienestar de los trabajadores, gestion interna, responsabilidades.
4. Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos: Se realizó la revisión del buzón de sugerencias correspondiente al periodo actual.

No se reportaron casos nuevos de presunta situación de acoso laboral o conflicto interpersonal.
Se recuerda a los trabajadores la disponibilidad del buzón como canal confidencial para reportar inquietudes, quejas o sugerencias relacionadas con la convivencia laboral.

5. Actividades del comité: Se realizó seguimiento al buzón de sugerencias y no se identificaron casos que requieran intervención.
6. Programación de la próxima reunión: Se establece la fecha tentativa para el siguiente encuentro del comité.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COCOLAB	30/9/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	Carolina R.
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

6997

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato entrega de EPP

6998

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jorge Ivan Aguilar	No. CEDULA	1.006.697.344
CARGO	Oficial	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
10/8/26		X																				Jorge Ivan A
18/8/26			X						X													Jorge Ivan A.
25/8/26		X																				Jorge Ivan A.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

6999

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis Eduardo Arboleda	No. CEDULA	6648582
CARGO	Oficial	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
12/8/26			X																			
19/8/26		X																				
26/8/26				X					X													

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7000

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Geiner Estiven Duran	No. CEDULA	1220506904
CARGO	Aprendiz	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
14/8/26				X					X													Geiner
21/8/26			X																			Geiner

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7001

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	David Quintero	No. CEDULA	1120501079
CARGO	Almacenista	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
20/8/26			X																			David Quintero

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7002

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Ivan Gabriel Cepeda	No. CEDULA	93439539
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
11/8/26				X					X													Juan
18/8/26			X																			Juan
25/8/26				X																		Juan

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7003

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jose Ubaldo Rojas	No. CEDULA	93338325
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
13/8/26				X					X													Ubaldo Rojas
27/8/26			X						X													Ubaldo Rojas

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7004

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Oscar PEREZ GARCIA	No. CEDULA	11205665
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
15/8/26			X						X													Oscar P

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7005

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Carlos Alberto Martinez	No. CEDULA	1735545l
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
18/8/26									X													Carlos M
31/8/26			X																			Carlos M

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7006

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Ricardo Rincon	No. CEDULA	1122126548
CARGO	Operador	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
31/8/26			X																			Rincon

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7007

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Juan Pablo Mancera	No. CEDULA	93437799.
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
11/8/26			X						X													
18/8/26		X																				
25/8/26				X																		

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

7005

CONSORCIO CARRERA S.A.C.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de EPP

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Codigo	SIG-SST-FO-30
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	01
	Inspección de EPP	Fecha	6/5/2025

FECHA: 18 . 08 . 2026 .

LUGAR DE INSPEECIOI SAN MARTIN

7004

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		LENTES DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES		BOTAS PUNTA DE ACERO		DOTACIÓN		METODOS DE CONTROL	FIRMA
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO		
1	JORGE AGUILAR	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Jorge Ivan A.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
3	GEINER DURAN GAITAN	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Geiner Duran
4	YEISON HERNANDEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
5	DAVID QUINTERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		David Quintero
6	CAROLINA RESTREPO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Carolina R.
7	LUIS PULIDO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Luis P.
8	JUAN PABLO MANCERA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
9	JOHN MARQUEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
10	CESAR BAQUERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
11	LUIS CARLOS REY	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
14	OSCAR FERNANDO PEREZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Juan
16	JOSE UBALDO ROJAS LEON	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Ubaldo Rojas

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No Requiere

METODOS DE CONTROL: (1) Instrucción, (2) Motivación, (3) Cambio de EPP, (4) Capacitación, (5) Otra

COMENTARIOS:

Manly Bejarano

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

2010

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de botiquín y camilla

2011

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-27
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCION A BOTIQUIN Y CAMILLA	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG		
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	MARLLY BEJARANO ENCISO	**CARGO**	**PROFESIONAL SST**
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	ALMACEN	**FECHA DE INSPECCION**	20/08/2026
UBICACIÓN CAMILLA	ALMACEN		

INSPECCION A BOTIQUIN

No	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Estado del botiquín	X			1 UND		
2	Señalización	X			1 UND		
3	Gasas limpias paquete	X			1 CAJA		
4	Esparadrapo de tela rollo de 4"	X			1 UND		
5	Bajalenguas	X			17 UND		
6	Guantes de latex para examen	X			1 CAJA		
7	Venda elástica 2 x 5 yardas	X			1 UND		
8	Venda elástica 3 x 5 yardas	X			1 UND		
9	Venda elástica 5 x 5 yardas	X			1 UND		
10	Venda de algodón 3 x 5 yardas	X			1 UND		
11	Venda de algodón 5 x 5 yardas	X			1 UND		
12	Yodopovidona (jabón quirúrgico)	X			1 UND		120 ml
13	Solución salina 250 cc ó 500 cc	X			2 UND		500 ml
14	Termómetro de mercurio o digital	X			1 UND		DIGITAL
15	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	X			1 UND		350 ml

** Nota: Los elementos mencionados anteriormente son basados según Resolución No. 705 de 2007 - Botiquín Tipo A*

No	DESCRIPCIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1							
2							
3							
4							
5							

** Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)*

INSPECCIÓN DE CAMILLA

No	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				N/A	
2	Señalización	X				N/A	
3	Estado del soporte	X				N/A	
4	Correas de seguridad	X				N/A	
5	Sujetadores para agarre	X				N/A	

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Marlly Bejarano E.

Inspección de extintor

7013

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-26
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha	6/5/2026

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MARLLY BEJARANO ENCISO — FECHA DE INSPECCIÓN: 20/08/2026

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS								CILINDRO															
		BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
1	ALMACEN		X					20 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
2	MINICARGADOR		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
3	RETROEXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	feb-27	
4	EXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	ago-26	
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Marlly Bejarano E.

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	2014
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

Inspección de orden y aseo

2015

CONSORCIO CARRERA 5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-15
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FECHA	6/5/2026

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

LUGAR: SAN MARTIN - META **FECHA DE INSPECCIÓN:** 22/08/26

MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA, C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA),

	1. CONDICIONES GENERALES	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1,1	Políticas y reglamentos de la empresa publicados en sitio con acceso a todo el personal.	X			
1.2	Sistema de alertamiento en caso de emergencia.	X			
1.3	Rutas de evacuación debidamente señalizadas, incluye rutas de manejo y disposición de residuos.	X			
1.4	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos.	X			
1.5	Botiquín debidamente equipado e identificado.	X			
1.6	Brigada de emergencia constituida y conocida por todo el personal.	X			
1.7	MEDEVAC publicado y actualizado.	X			
1.8	Extintores suficientes y del tipo adecuado, con fecha de recarga vigente y señalización respectiva.	X			
1.9	Kit ambiental para respuesta a contingencias	X			
	2. ESTRUCTURA	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
2.1	Iluminación adecuada y suficiente.	X			
2.2	Equipos eléctricos con conexión a tierra.	X			
2.3	Conexiones eléctricas en buen estado.	X			
2.4	Ventilación suficiente y adecuada.	X			
	3. ÁREA - PUESTOS DE TRABAJO	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
3.1	Espacio de trabajo adecuado.	X			
3.2	Mesas y sillas de trabajo cómodas, ajustables y de dimensiones adecuadas.	X			
3.3	Vías de movilización despejadas.	X			
3.4	Iluminación y ventilación adecuada y suficiente.	X			
3.5	Limpieza, orden y aseo.	X			
3.6	Estado de las escaleras del área	X			
	4. SERVICIOS SANITARIOS	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
4.1	Baterías sanitarias: cantidad, dotación y estado de acuerdo a numero de personas.	X			
4.2	Conexiones sanitarias (Ausencia de fugas).	X			
4.3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico	X			
4.4	Orden y aseo.	X			
	5. MANEJO DE RESIDUOS	**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
5.1	Adecuada separación de residuos de acuerdo con el plan integral de gestión de residuos.	X			
5.2	Rotulado.	X			
5.3	Orden y aseo.	X			
5.4	El centro de acopio cumple con las condiciones de infraestructura requerida por la normatividad vigente.	X			
	6. INFRAESTRUCTURA	**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
6.1	Cunetas perimetrales y desarenadores en buen estado y libres de residuos.	X			
6.2	Ausencia de fugas de agua en red hidráulica.	X			
6.3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente de la energía.	X			
	7. CONDICIONES GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
7,1	Señalización de Ingreso a la locación para induccion de seguridad.	X			
7,2	Señalización de seguridad, y salud en el trabajo en areas operativas de la locación.	X			
7,3	Señalización ambiental en vias de acceso a la locación, de acuerdo a licencia Ambiental.	X			
7,4	Señalización vial en vias de acceso a locación.	X			
	8. CONDICIONES GENERALES DE LA DEMARCACIÓN	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
8.1	Salidas, puertas de acceso y de emergencia.	X			
8.2	Instalaciones para almacenamiento, incluyendo las necesarias para sustancias peligrosas.	X			
8.3	Vías de circulación interna.	X			

10. OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR:	**Marlly Julieth Bejarano Enciso**	**FIRMA:**	Marlly Bejarano

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2016

Inspección gerencial HSE

2017

CONSORCIO CARRERA	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-69
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN GERENCIAL HSE	FECHA:	6/5/2026

ÁREA - PROYECTO: CRA 5 – SAN MARTIN FECHA: 24/8/26 HORA INICIO: 10:00 HORA FIN: 11:00

RESPONSABLE: MARLLY BEJARANO ENCISO CARGO: PROFESIONAL SST

No	ASPECTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
	ORDEN Y ASEO				
1	Se tiene sitios adecuados para el almacenamiento de equipos y herramientas	X			
2	Las condiciones de orden y aseo de la oficina son adecuadas y agradables para el trabajador	X			
3	Se tiene recipiente para disposición y clasificación de residuos en el área de oficinas	X			
4	Las condiciones de orden y aseo de la zona del comedor son apropiadas	X			
5	Las zonas de construcción se encuentran en optimo estado de orden y aseo	X			
6	Las zonas de construcción y campamento cuentan con recipientes para disposición y clasificación de residuos.	X			
7	Los pasillos o zonas de transito de personal, se encuentran libres de obstáculos	X			
	SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
8	Las zonas de trabajo de alto riesgo se encuentran debidamente señalizadas	X			
9	Las zonas de transito de personal se encuentra señalizada	X			
10	Las zonas de peligro se encuentran debidamente señalizadas para evitar el paso del personal	X			
11	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas	X			
12	El punto de encuentro esta debidamente señalizado	X			
13	Las zonas cuentan con señalización informativa que guie al visitante en su recorrido por la locación	X			
14	Las barandas se encuentran debidamente pintadas con color de contraste (Amarillo-negro)	X			
15	Las líneas de flujo se encuentran pintadas según el contenido	X			
16	El sentido de las líneas de flujo se encuentra debidamente señalizado en la tubería	X			
17	Las zonas de trabajo riesgoso, equipos, y zonas peligrosas se encuentran	X			
	BIENESTAR DEL PERSONAL	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
18	Se cuenta con equipos de comunicación y telecomunicación (TV, Radio, Teléfono, Celular)		X		
19	Se cuenta con botellones de agua apta para el consumo humano, disponibles	X			
20	La cantidad de baños es suficiente para el personal, mínimo 1 por cada 15 personas	X			
21	los lavamanos funcionan correctamente	X			
22	Los mobiliarios de los contenedores se encuentran en optimas condiciones (escritorios, sillas...)	X			

2018

	SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
23	Los equipos y Elementos de Protección personal son los adecuados para el trabajo que debe desempeñarse	X			
24	Se encuentra completo y limpio y cumple con las normas técnicas	X			
25	Se llevan los registros de asistencia de todas las charlas y actividades realizadas	X			
26	Se tienen registros de inducción y reinducción al día	X			
27	Disponen de cartelera informativa de HSE	X			
28	Los trabajadores conocen y comprenden las políticas de la Organización	X			
29	El personal está informado sobre los riesgos inherentes a la actividad que	X			
30	Hay registro de afiliación al Sistema de Seguridad Social de todos los empleados ubicados en la facilidad	X			
31	Utilizan los trabajadores el equipo de protección personal disponible	X			
32	**El Equipo y los elementos de Protección Personal incluye:**				
3[redacted]	Casco para protección de la cabeza	X			
3[redacted]	Protectores para los oídos	X			
35	Protectores para los ojos	X			
36	Máscaras y equipo respiratorio	X			
37	Guantes para los diferentes tipos de actividad y riesgo	X			
38	Calzado de seguridad para los pies	X			
39	Ropa de trabajo	X			
40	Equipo de protección contra caída en buen estado	X			
41	Se cuenta con pararrayos en la locación	X			
42	Se mantienen protegidos los circuitos	X			
43	Se mantienen en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, maquinas eléctricas portátiles	X			
44	**Tableros Eléctricos se mantuvieren en buenas condiciones en cuanto a:**				
45	Limpieza	X			
46	Pintura	X			
47	Ubicación	X			
[redacted]	Empotrado	X			
49	Conexiones	X			
50	Funcionamiento	X			
51	Alambrado	X			
52	**Enchufes e Interruptores están en buen estado en cuanto a:**				
53	Correcto alambrado y ajuste de contactos	X			
54	Cuenta con canalización de instalaciones eléctricas o están entubadas	X			
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
55	Se encuentran los extintores en condiciones de usarse	X			
56	Los extintores se encuentran debidamente señalizados	X			
57	Han sido capacitados los trabajadores para utilizar ese equipo.	X			
58	Se tienen las actas de conformación de brigada de emergencia, capacitación y reuniones periódicas de la brigada	X			
59	Hay una persona encargada del mantenimiento e inspección.	X			
60	Los trabajadores conocen los números de los teléfonos de emergencia.	X			
61	Conocen los trabajadores las rutinas y ejercicios de emergencia en caso de incendio	X			
62	Se cuenta con material de respuesta ante emergencias.	X			

2019

63	Se cuenta con un sistema de alarma de emergencia	X			
64	se cuenta con un botiquín de primeros auxilios con material suficiente para una respuesta a emergencia; basarse en el formato de inspección de botiquines	X			
	REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO Y AST	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
65	Existen ATS para la realización de actividades críticas	X			
66	Los Trabajadores reportan actos y condiciones inseguras	X			
67	Se reportan los incidentes presentados en la locación	X			
68	Los trabajadores entienden la importancia de los reportes.	X			
69	Los trabajadores comunican sus inquietudes en salud y seguridad al COPASST	X			
70	Se tienen las actas de reunión y actividades del COPASST, al día.	X			
	PROCEDIMIENTOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
71	Está disponible el programa de mantenimiento de equipos.	X			
[illegible]	Se llevan los registros de las verificaciones y mantenimientos	X			
73	Los procedimientos de los equipos se encuentran disponibles en el sitio de trabajo y tienen peligros identificados	X			
74	Los trabajadores están capacitados en el manejo de equipos y herramientas críticas.	X			
75	Existen registros de inspección de equipos y evidencia de seguimiento de las acciones generadas	X			
76	Fueron identificados y está disponible el stock de repuestos críticos	X			
	EQUIPOS OPERACIONALES	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
81	Líneas y conexionado con soportes adecuados, sin fugas y señalizadas correctamente	X			
82	Compresores en correcto funcionamiento(con sus mangueras), conexionado adecuado, empalmes en buen estado	X			
83	Bombas de transferencia en optimo funcionamiento, sin fugas e instalación adecuada. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
85	Tanques de almacenamiento con spool de medición	X			
86	Todos los equipos tienen puesta a tierra	X			
[illegible]	Generadores en correcto funcionamiento, sin fugas y con mantenimiento al día. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
88	Iluminación perimetral en buen estado (limpieza e instalación, con empalmes y conexionado eléctrico adecuado.	X			

PARTICIPANTES DE LA INSPECCION

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARLLY BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano
CAROLINA RESTREPO	MIEMBRO COPASST	Carolina R.

Inspecciones locativas

2021

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Código	SIG-SST-FO-24
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión	1
	Inspecciones Locativas	Fecha	6/5/2026

Sede/Obra: San Martín – CRA 5

Fecha inspección: 25/08/2026

Item	Aspectos a inspeccionar	SI	NO	NA	Observaciones
1	SEÑALIZACIÓN				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	x			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	x			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	x			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	x			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	x			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	x			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	x			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	x			
2.5	La ventilación es adecuada				
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra	x			
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos	x			
3.3	No existen cables sueltos en el piso	x			
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado	x			
3.5	Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente	x			
3.6	Tomas o multitomas recargadas	x			
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente	x			
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente	x			
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia	x			

Inspeccionó:

Nombre: MARLLY BEJARANO

Firma: Marlly Bejarano E.

Cargo: profesional SST

Inspección semanal- herramienta menor

CONSORCIO CARRERA	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha: 10/08/26 **Área/Proyecto:** CONSORCIO CARRERA 5 EG 2023

Ubicación del equipo SAN MARTIN **Inspeccionado por:** MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO

Cargo: PROFESIONAL SST **Marca del equipo** ———

Id kit herramienta ——— Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

CONSORCIO CARRERA	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha: 18/08/25 **Área/Proyecto:** CONSORCIO CARRERA 5 EG 2024

Ubicación del equipo SAN MARTIN **Inspeccionado por:** MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO

Cargo: PROFESIONAL SST **Marca del equipo** ———

Id kit herramienta ——— Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto critico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

CONSORCIO CARRERA	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha: 24/08/26 **Área/Proyecto:** CONSORCIO CARRERA 5 EG 2025

Ubicación del equipo SAN MARTIN **Inspeccionado por:** MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO

Cargo: PROFESIONAL SST **Marca del equipo** ———

Id kit herramienta ———

Marlly Bejarano E.

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto critico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

CONSORCIO CARRERA	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha: 31/08/26 **Área/Proyecto:** CONSORCIO CARRERA 5 EG 2026

Ubicación del equipo SAN MARTIN **Inspeccionado por:** MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO

Cargo: PROFESIONAL SST **Marca del equipo** —

Id kit herramienta —

Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCERTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto critico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer dia de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

Inspección preoperacional de equipos menores

Inspección de maquinaria

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

2021

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

2030

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera				NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buien estado (mangueras)**			X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento			X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor			X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador			X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)			X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas			X		X		X		X		X			
	En buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	/		X		X		X		X		X			/
FIRMA	FIRMA OPERADOR	/		Rawku		Rawku		Rawku		Rawku		Rawku		/	
	FIRMA ENCARGADO SST	/		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		/	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

7031

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buien estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X			/
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo		/
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly		/

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

7032

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL ~~~~ FINAL ~~~~

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

7033

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X	NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	~~LUIS~~		LUIS		LUIS		LUIS		LUIS		LUIS		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	~~Marly~~		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

7034

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Batería y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion			X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Frenos principales			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquín de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	/		X		X		X		X		X			/
FIRMA	FIRMA OPERADOR	/		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis			/
	FIRMA ENCARGADO SST	/		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly			/

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

2025

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL _____ FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X	NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

2036

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X	NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		x		x		x		x		x		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

2037

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR Luis Sepulveda PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

2038

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR Alexander Garavito PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**			X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**			X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7039

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR ALEXANDER CARAVITO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL _____ FINAL _____

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Alexande	Alejande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	Alexande	—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	—	

OBSERVACIONES

7040

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR Alexander Garavito PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Murilly		Murilly		Murilly		Murilly		Murilly		Murilly		—	

OBSERVACIONES

2041

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
DAV PRISMA DAV	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapiceria	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"	X		X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido	X		X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape	X		X		X		X		X		X			
	ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven	X		X		X		X		X		X			
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Manly		Manly		Manly		Manly		Manly		Manly			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
DAV / PRISMA DAV	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

2042

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)			X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)			X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad			X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado			X		X		X		X		X			
	Silletería y tapicería			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor)			X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)			X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso			X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento			X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos			X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado			X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Batería y cables			X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"			X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite			X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante			X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)			X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso			X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido			X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape			X		X		X		X		X			
	ruidos extraños			X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo			X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión			X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas			X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven			X		X		X		X		X			
	Kit de carretera			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	—		X		X		X		X		X			—
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	—		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Mauricio		Mauricio		Mauricio		Mauricio		Mauricio		—	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
DAV / PRISMA DAV	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

243

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapiceria	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"	X		X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido	X		X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape	X		X		X		X		X		X			
	ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven	X		X		X		X		X		X			
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Luis	Luis	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Manly	Manly	Manly		Manly		Manly		Manly		Manly		—	

DAV / PRISMA DAV	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

7014

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapicería	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"	X		X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido	X		X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape	X		X		X		X		X		X			
	ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven	X		X		X		X		X		X			
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	X		X		X		X		X		X			—
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis			—
	FIRMA ENCARGADO SST	Mardy		Mardy		Mardy		Mardy		Mardy		Mardy			—

7045

Certificado de accidentalidad emitido por ARL

ARL | sura

7046

Medellín, 9 de septiembre de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT N902054725, no presenta accidentes de trabajo desde el 07 de agosto de 2026 hasta el 06 de septiembre de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

DE COLOMBIA

Listado de asistencia

7048

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	05/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Protección contra caidas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas para prevenir AT en alturas

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7049

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	08/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

USO de EPI

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Seleccionar, utilizar y cuidar

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7050

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	10/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad en el uso de escaleras

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Verificar estado, ubicacion y forma correcta de ascenso y descenso

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7051

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	11 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Anclamio

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas de seguridad para el anclaje

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7052

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	12 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad electrica

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

prevencion de AT relacionados con la electricidad

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2053

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	13 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Prevención de incendio

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones para identificar y control condiciones que pueden generar incendios

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2054

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	14/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Primeros auxilios

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Conocimiento basico para atender emergencias

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7055

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	15 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Excavaciones

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas preventivas para derrumbes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2056

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	18/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Operaciones de equipos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Uso seguro de maquinaria y equipos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7057

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	19 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Comunicación de riesgo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Identificación, compresión y comunicación

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7058

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	20/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Gestión Interna

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones y procedimientos de la organización

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2059.

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	21 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Clima y medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Condiciones atmosfericas que se presentan en un lugar durante un largo periodo de tiempo.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2066

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	27/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro

TEMA

Preparación para emergencia

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Organización y entrenamiento para responder adecuadamente incendios accidentes y desastres

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2061

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	24/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Bienestar de los trabajadores

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Promoción de condiciones que favorecen la salud física.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Iván
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7062

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	25/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Reporte de actos y condiciones inseguras

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Identificación y comunicación apertura.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2063

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	26/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Prevención de lesiones musculoesqueleticas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas para prevenir dolores y lesiones en musculos, articulaciones y espalda.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2064

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	27/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Gestión de residuos peligrosos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Manejo, clasificación y disposición

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2065

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	28/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manipulacion y almacenamiento

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Manejo seguro para manipular, transportar y almacenar materiales.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7066

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	29 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Control de polvo, Ruido y vibraciones

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

identificar, controlar y reducir la exposición de los trabajadores.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	31 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Inspección de Herramientas y equipos menores

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Verificar estado y funcionamiento de herramientas y equipos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2068

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	01 /09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Rotulación de productos quimicos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Practicas adecuados para almacenamiento y uso de productos quimicos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos M
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan.
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2069

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	02/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro

TEMA

Radiacion ionizante

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Prevencion y control de la exposicion a radiaciones ionizantes.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geinerdoar
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos M
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan.
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2070

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	03/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Protección Respiratoria

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Uso correcto de respiradores y otros elementos de protección para reducir exposición

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

2071

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	04/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manejo Manual de Material

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Tecnica Segura para levantar, transportar, empurla o halar cargas.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7092

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	05/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Aseo en el trabajo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas para prevenir AT

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Juan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Maicol T.
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

CONSORCIO CARRERA SEG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ATS y permisos de trabajo

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instalación de bordillo, excavacion manual excavacion mecanica.						ATS No.	1	
							FECHA PT ASOCIADO		
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	10/08/26	FECHA INICIAL	10/08/26	FECHA FINAL	10/08/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)											
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS		
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO		

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes X	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

2017

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua / Suelo / Aire / Flora / Fauna	X Comunidad / R. Naturales / X Paisaje / otro.	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	—
Responsable Ambiental.							
Responsable SST.	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David	David	David	David	David	David	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

7078

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación mecanica, instalación de bordillo Excavación manual, Exterdido y compactacion de material.						ATS No.	1	
							FECHA PT ASOCIADO		
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	17/08/26	FECHA INICIAL	17/08/26	FECHA FINAL	23/08/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes X	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua X Comunidad; X Suelo R. Naturales; Aire Paisaje; X Flora otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua X Comunidad; X Suelo R. Naturales; X Aire Paisaje; Flora otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua X Comunidad; X Suelo R. Naturales; X Aire Paisaje; Flora otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua Comunidad; Suelo R. Naturales; Aire Paisaje; Flora otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

| | | |

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua / Suelo / Aire / Flora / Fauna	X Comunidad / R. Naturales / X Paisaje / otro.	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	—	Nathaly G.	Nathaly G.	Nathaly G.	Nathaly G.	Nathaly G.	—
Responsable Ambiental.							
Responsable SST.	—	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	—	David	David Q	David Q	David Q	David Q	—
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL	—	∅	∅	∅	∅	∅	
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	—	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	—	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	—	Cardina	Cardina	Cardina	Carolina	Carolina	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	—	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P.	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE	—	JC	JC	JC	JC	JC	
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE	—	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE	—	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	—	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	—	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE	—	Maicol	Maicol	Maicol	Maicol	Maicol	
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	—	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	—	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	—	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

-7082

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación mecanica, instalacion de bordillo, excavacion manual						ATS No.	1	
							FECHA PT ASOCIADO	—	
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	24/08/26	FECHA INICIAL	24/08/26	FECHA FINAL	30/08/26	
TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes X	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo	R. Naturales		
			Aire	X Paisaje		
			Flora	otro.		
			Fauna			

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Nathali G	Nathali G	Nathali G	Nathali G	Nathali G	Nathal. G	—
Responsable Ambiental.							
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marly B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación manual - Extendido y compactacion de Excavacion mecanica material.					**ATS No.**	1		
						FECHA PT ASOCIADO			
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		**FECHA DE ELABORACIÓN**	31/08/26	**FECHA INICIAL**	05/09/26	**FECHA FINAL**	06/09/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		**IZAJE DE CARGAS**		**TRABAJO EN CALIENTE**		**EXCAVACIONES**		**SUSTANCIAS PELIGROSAS**	
	NO		**ESPACIOS CONFINADOS**		**TRABAJO EN ALTURAS**		**TRABAJOS ELECTRICOS**		**OTRO**	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					**Otros Equipos o EPP (Especifique):**
Casco	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	**PELIGROS** (Fuente, Situación, Acto)	**RIESGOS** (Suceso o Exposición peligrosa)	**ASPECTO AMBIENTAL** (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	**IMPACTO AMBIENTAL** (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	**CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL**
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua: X Comunidad; X Suelo: R. Naturales; Aire: Paisaje; X Flora: otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua: X Comunidad; X Suelo: R. Naturales; X Aire: Paisaje; Flora: otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua: X Comunidad; X Suelo: R. Naturales; X Aire: Paisaje; Flora: otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua: Comunidad; Suelo: R. Naturales; Aire: Paisaje; Flora: otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

| | | |

| | | |

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Nathali C	Nathali C	Nathali C	Nathali G	Nathali G	Nathali G	—
Responsable Ambiental.							
Responsable SST.	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE					—	—	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							
