1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	Consultoría		
Número:	24001332 H3 DE 2024	**Fecha:**	1 de abril de 2025
Objeto: REALIZAR CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.			
Contratista:	CONSORCIO PMA ATLÁNTICO • INGEPLAN.CO SAS BIC - 35% • INCOPLAN IN S.A.S – 65%		
Interventor y/o Supervisor:	CONSORCIO INTER PMA CC • CONSULTORA CAPITAL S.A.S.-BIC - 70% • CONSULTORA CENTRAL S.A.S.-BIC – 30%		
Valor inicial del contrato:	SEIS MIL SETECIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.703.059.171) INCLUIDO IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	ONCE (11) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
Fecha de inicio del contrato:	1 de julio de 2025	**Fecha de terminación del contrato:**	26 de septiembre de 2026

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. MODIFICATORIO 01	Hasta el 31 de mayo del 2026.

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
No se han presentado Adiciones al Contrato de Consultoría	N/A
Valor total del contrato:	No se han presentado adiciones al Contrato.

SUSPENSIONES	
Suspensión No1	DEL 22 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2026 (30 DÍAS)
Prorroga 1 suspensión No 1	DEL 22 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 26 DE JULIO DE 2026 (34 DÍAS)
Suspensión No 2	DEL 31 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026 (31 DÍAS)
Prórroga Suspensión No. 2	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (20 DÍAS)
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	26 de septiembre de 2026

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)

Número de la Modificación	**Cláusula N.º**	**Descripción**
No se han presentado Modificaciones al Contrato de Consultoría.	N/A	N/A

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
A la fecha de la presente solicitud no ha sido solicitado por el contratista cesión al contrato de Consultoría.	N/A

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
A la fecha de la presente solicitud no se le ha impuesto ningún tipo de sanción al contrato de Consultoría.	N/A	N/A

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal		
Número de Garantía:	1. 400063041 2. 400063042		
Fecha de Expedición de la Garantía.	02 de abril de 2025	**Fecha de Aprobación de la garantía**	08 de abril de 2025

Descripción del Amparo:

Amparos	**Vigencia desde**	**Vigencia Hasta**	**Suma Asegurada/Actual**
Cumplimiento de Contrato	01/07/2025	06/01/2027	$1.340.611.834,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/07/2025	06/09/2029	$1.340.611.834,60
Calidad del bien	06/09/2026	06/09/2031	$1.340.611.834,60
RCE	01/07/2025	06/09/2026	$875.452.500,00

Porcentaje:

Amparos	**Cuantía de Cobertura**
Cumplimiento	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato
Calidad del servicio	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [20%] del valor total del contrato.

Anexo:	Anexo 2

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de suscripción del presente documento, la ejecución del contrato presenta avances en los componentes de las Etapas I, II, III y IV.

Respecto a la **Etapa I**, se cuenta con la aprobación integral de sus cinco (5) componentes.

ETAPA I – Caracterización y evaluación de la infraestructura existente en contraste con los pronósticos, proyecciones de demanda y niveles de servicio esperados en los diferentes horizontes de planificación.

Durante esta etapa se desarrollaron los productos orientados a la recopilación, análisis y estructuración base del estudio, entre los cuales se destacan:

1. Metodología, plan de trabajo, cronograma de ejecución del contrato y presentación del equipo consultor.
2. Revisión de la información existente y debida diligencia documental.
3. Identificación de partes interesadas (stakeholders) y desarrollo de reuniones iniciales internas y externas (kickoff meetings).
4. Presentación de la estructuración del documento Plan Maestro (índice, contenido mínimo y capítulo introductorio).
5. Levantamiento de la información (inventario, fichas y DOFA).

En la **Etapa II**, se encuentran aprobados los componentes 6, 7, 8, 9 y 10; asimismo, el Consultor adelanta los ajustes y complementaciones a los componentes 11 y 12 para atender las observaciones formuladas en el proceso de revisión y lograr su posterior aprobación.

ETAPA II – Diagnóstico del aeropuerto

Durante esta etapa se desarrollaron los productos orientados a la recopilación, análisis y estructuración base del estudio, entre los cuales se destacan con aprobación de los siguientes componentes:

6. Levantamiento topográfico por método tradicional y levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del aeropuerto.
7. Pronóstico de demanda y análisis socioeconómico.
8. Estudio de conectividad aeroportuaria
9. Diagnóstico ambiental preliminar de alternativas, incluyendo los componentes ambiental, urbano, social y predial, así como la definición de lineamientos para la gestión del riesgo de desastres.
10. Análisis y estudio operacional

Por su parte, los componentes 11 y 12 se encuentran en proceso de ajuste y complementación, como resultado de las observaciones formuladas durante su revisión, con el propósito de obtener su correspondiente aprobación. Los demás productos de la etapa continúan su trámite de acuerdo con el estado particular de revisión y cumplimiento de los requerimientos contractuales.

11. Cálculo de capacidad en lado aire; lado tierra y complementarios
12. Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.

En cuanto a la **Etapa III**, correspondiente a los estudios de prefactibilidad, se destaca la aprobación del componente 22. Adicionalmente, el Consultor ha entregado a la Interventoría los componentes 13, 15, 16, 19, 20 y 21, los cuales se encuentran en fase de revisión, ajuste y aprobación según el estado particular de cada producto.
A continuación, se detalla el estado de avance desagregado por etapas:

ETAPA III – Elaboración de los estudios de prefactibilidad necesarios para la actualización del Plan Maestro

Esta etapa corresponde al desarrollo de los estudios técnicos que sirven de soporte para la formulación, análisis y evaluación de las alternativas planteadas para la actualización del Plan Maestro Aeroportuario. A continuación, se destacan los siguientes componentes entregados:

13. Alternativas de desarrollo e impactos.
16. Estrategias de Desarrollo CAME – DOFA por fases Análisis Jerárquico (AHP Analytic Hierarchy Process).
19. Análisis económico y social del sector.
20. Análisis de impacto urbano, social, la conectividad al (a los) aeropuerto(s) intermodal y multimodalmente.
21. Propuesta técnica para implantar el uso de infraestructuras logísticas especializadas (ILE) del (los) aeropuerto(s).

A la fecha, el Consultor cuenta con la aprobación del componente 22, adicional se ha realizado la entrega formal a la Interventoría de los componentes 13, 16, 19, 20 y 21 de la Etapa III. Estos productos se encuentran en diferentes instancias del proceso de revisión técnica, atención de observaciones, ajuste y complementación, según corresponda.

En consecuencia, la Etapa III presenta un avance significativo tanto en la elaboración y entrega de sus productos como en el proceso de aprobación de estos. No obstante, permanece pendiente culminar los procesos de revisión, atención integral de observaciones, complementación y aprobación definitiva de los componentes 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 21, así como finalizar aquellos productos cuyo desarrollo aún se encuentre en curso.


ETAPA IV – Viabilidad financiera

En esta etapa se estructuran el modelo financiero integral y los esquemas contractuales, definiendo las condiciones y mecanismos de financiación para preconstrucción, construcción y operación, bajo criterios de costo-beneficio, optimización de recursos. A continuación, se destacan los siguientes componentes entregados:

Componente 30. Producto 1. Plan de trabajo
Componente 30. Producto 2. Debida diligencia

Respecto al **Componente 30 (Producto 2: Debida Diligencia)**, cuenta con la aprobación formal de sus entregables jurídicos y financieros.

Para efectos del presente documento, se precisa que el avance físico del 70 %, al corte del 1 de septiembre de 2026, versus el 99% del avance programado, corresponde al porcentaje de ejecución de las actividades y componentes establecido mediante el seguimiento al cronograma adjunto a esta solicitud, de acuerdo con la ponderación definida para cada actividad. Este porcentaje se contrasta con el avance financiero del contrato, que se detalla más adelante, el cual actualmente correspondiente al 21,63% ($1.449.681.617,99) que ya se encuentra pagado. En este sentido, el 48,37% ($3.242.269.721,01) restante corresponde al avance físico efectivamente desarrollado, asociado a actividades y productos elaborados, entregados y en proceso de revisión, cuya ejecución ha implicado la utilización de recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos por parte de la Consultoría, sin que a la fecha dichos recursos hayan sido reconocidos económicamente mediante pago, por encontrarse sujetos a los procesos de revisión, aprobación y recibo a satisfacción.

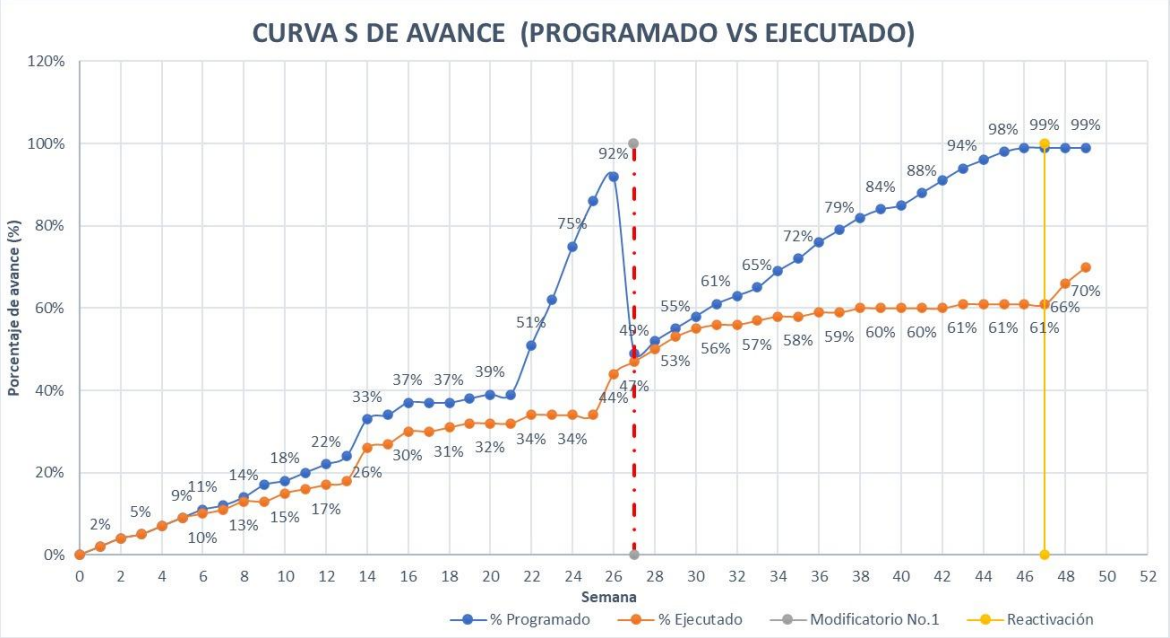

La curva muestra el avance físico calculado con los productos que la Consultoría ha entregado a la interventoría y no refleja el estado de avance financiero, el cual se reporta a continuación

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.703.059.171,00	$ 1.449.681.617,99	$ 0,00
ADICIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EN TRÁMITE DE PAGO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OTROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.253.377.553,01
VALOR TOTAL CONTRATO	**$6.703.059.171**	$ 1.449.681.617,99	$ 5.253.377.553,01

El avance financiero asociado a los pagos efectuados corresponde al 21,63% ($ 1.449.681.617,99). Este porcentaje no resulta directamente comparable con el avance físico del 70 %, toda vez que este último corresponde a la ponderación de actividades y componentes ejecutados conforme al cronograma. Dentro de dicho avance físico se encuentran productos entregados y/o en proceso de revisión cuyo valor aún no ha sido reconocido mediante pago. No obstante, se puede indicar

que el valor de los productos entregados y en revisión por parte de la interventoría representa el 48.37% adicional, como se detalló previamente, lo que justifica el avance físico evidenciado en la Curva S.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Con fundamento en lo expuesto en los numerales precedentes, el Consultor solicita que, mediante la correspondiente modificación contractual, se otorgue una prórroga al plazo por ochenta y cinco (85) días calendario, con el fin de asegurar la debida culminación de las actividades pendientes, así como la revisión, ajuste y aprobación de los productos contractuales que a la fecha se encuentran en trámite. La presente solicitud se sustenta en las circunstancias técnicas, operativas y contractuales desarrolladas en el presente documento, las cuales han generado afectaciones en la programación inicialmente establecida y hacen necesaria la ampliación del plazo contractual. Acorde con la finalización de la prórroga de la Suspensión No. 2 la nueva fecha de terminación del proyecto se propone para el 20 de diciembre de 2026.

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	**__85__DÍAS** **_____MESES** **_____AÑOS** **Texto de la Cláusula 4 con la modificatorio No. 1:** ***"CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:*** *El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de ONCE (11) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.* *Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las Partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible."* **Propuesta de texto de la Cláusula 4 con la modificación:** ***"CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:*** *El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta el 20 de diciembre del 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.* *Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las Partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible."*
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS_____ VALOR EN SMMLV DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO
OTRA	No aplica

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Para la presente solicitud se diferencia expresamente entre el retraso observado y las causas que lo originaron. El retraso del cronograma no se invoca como causal autónoma para ampliar el plazo; constituye una consecuencia. La justificación se limita al tiempo efectivo adicional requerido para actividades de ajuste, revalidación, reproceso y cierre técnico derivadas de hechos documentados que incidieron en la ruta crítica, una vez descontados los períodos ya reconocidos mediante suspensiones y los tiempos concurrentes.

Asimismo, el hecho de que una circunstancia sea externa o provenga de un tercero no implica, por sí mismo, que deba trasladarse a la Entidad ni que configure fuerza mayor o caso fortuito. Por esta razón, los hechos se contrastan con la matriz de riesgos contractual y con el seguimiento de los mimos antes de ser considerados en la trazabilidad de la prórroga.

1. **Componente 2 - Debida Diligencia**

Durante el desarrollo del Componente 2 - Debida Diligencia se presentaron limitaciones relacionadas con la disponibilidad, oportunidad y organización de la información requerida para adelantar los análisis técnicos, administrativos y jurídicos previstos contractualmente para los tres aeropuertos objeto del contrato. Estas circunstancias estuvieron asociadas principalmente a la falta de disponibilidad inmediata de información consolidada por parte de las fuentes externas requeridas, situación que obligó a adelantar gestiones adicionales de solicitud, validación y contraste documental para garantizar la suficiencia y confiabilidad de los insumos utilizados en el desarrollo del componente.

Adicionalmente, un número significativo de solicitudes de información elevadas a las respectivas entidades no fueron atendidas de manera oportuna, lo que limitó el acceso completo y oportuno a los insumos requeridos para el desarrollo del componente. Por esta razón fue necesario realizar validaciones adicionales, reiterar solicitudes de información, efectuar cruces documentales y ajustar la metodología inicialmente prevista, con el fin de garantizar la confiabilidad y consistencia de los insumos.

Las actividades adicionales de solicitud, validación, depuración y contraste documental derivadas de la disponibilidad limitada y entrega no oportuna de información externa generaron una afectación sobre la secuencia inicialmente prevista para el desarrollo del componente. Dicha afectación no corresponde a una demora atribuible a la planeación o ejecución de la Consultoría, sino al tiempo adicional requerido para obtener y validar los insumos indispensables para garantizar la calidad técnica del análisis. Como consecuencia de esta situación, se presentó una desviación frente al cronograma inicialmente previsto, cuya incidencia fue evaluada dentro del análisis integral de la ruta crítica del proyecto.

2. **Componentes 6, 15, 18 y 29.1 - Levantamiento topográfico y estudios asociados**

En el marco de las actividades de levantamiento topográfico se presentaron situaciones de orden público que comprometieron la seguridad del personal técnico en campo. Durante las labores en los aeropuertos objeto del contrato, el equipo fue objeto de amenazas por parte de propietarios de predios aledaños, incluyendo intimidaciones con armas. Adicionalmente, un individuo que manifestó pertenecer al Ejército Nacional, sin portar identificación oficial, abordó al equipo ofreciendo acompañamiento, circunstancia que generó un escenario de riesgo e incertidumbre. Ambas situaciones se presentaron en el municipio de Plato.

De manera paralela, el contexto regional evidenciaba alteraciones del orden público que incrementaban la probabilidad de incidentes. Ante la materialización de riesgos concretos para la integridad física del personal, se adoptó la decisión preventiva de suspender temporalmente las actividades en campo y retirar al equipo técnico, priorizando la seguridad humana. Como medida de mitigación, se avanzó en la digitación, modelación y procesamiento de la información previamente recolectada; sin embargo, para culminar adecuadamente los Componentes 15 y 18 resultó indispensable realizar una nueva salida a campo para completar la información faltante.

Estas circunstancias generaron una afectación aproximada de dos (2) meses en el desarrollo de los componentes mencionados. No obstante, la presente sustentación no pretende volver a cargar en su totalidad afectaciones ya consideradas dentro de la Reprogramación del Cronograma No. 1 aprobada mediante comunicado INTERPMA-166 del 15 de enero de 2026. Lo que se pone de presente es el remanente de afectación no absorbido por dicha reformulación, particularmente en lo relacionado con el cierre material y técnico de actividades necesarias para consolidar adecuadamente

componentes posteriores.

En este sentido, el levantamiento topográfico, la georreferenciación, la validación y el ajuste de información en campo no constituyen actividades aisladas, sino insumos base para la modelación, la validación de capacidades instaladas, el análisis de expansión, la definición de alternativas y la estructuración técnica de escenarios de planificación. Por ello, aun cuando parte de sus efectos fue absorbida por la reprogramación aprobada, persiste una afectación remanente asociada al cierre técnico integral de los componentes posteriores, particularmente aquellos asociados a las Etapas III y IV.

La afectación remanente asociada a la suspensión de actividades de campo y a la necesidad de reanudar y culminar el levantamiento topográfico corresponde a cuatro (4) semanas, equivalentes a veintiocho (28) días calendario, como plazo técnico necesario para completar georreferenciación, validación y ajuste en campo de los insumos requeridos.

3. Componente 9 - Diagnóstico preliminar / levantamiento de información

En el marco del levantamiento de información primaria en campo requerido para complementar el análisis desarrollado en el componente correspondiente, se evidenció que la población manifestó una marcada reserva frente al suministro de la información solicitada. Esta situación dificultó el desarrollo fluido del proceso y limitó la obtención oportuna de datos precisos y verificables, indispensables para sustentar técnicamente el estudio.

Dicha circunstancia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes mediante los comunicados 2026-IN023-0517, 2026-IN023-0518, 2026-IN023-0520 y 2026-IN023-0521, con el fin de solicitar el acompañamiento institucional necesario para facilitar el acceso a la información y garantizar la adecuada ejecución de las actividades en territorio.

Esta Consultoría no pretende sustentar la prórroga como si este componente, por sí solo, configurara una afectación autónoma equivalente al total del plazo solicitado. Si bien la Interventoría indicó que este componente no hace parte de la ruta crítica y que cuenta con holguras para absorber determinadas desviaciones, también reconoció que el producto aprobado del componente configura una relación de dependencia para el inicio de componentes posteriores como el 11, 12 y 13.

En consecuencia, la incidencia del Componente 9 debe entenderse como una afectación concurrente relacionada con las dificultades en la obtención y validación oportuna de información primaria, lo que obligó a realizar actividades adicionales de verificación, contraste, depuración y armonización entre fuentes primarias y secundarias oficiales. Su relevancia no radica en una autonomía plena dentro de la ruta crítica, sino en su contribución al retraso concurrente que incidió en la secuencia lógica del proyecto.

4. Componente 7 (Prognosis), Componentes 11, 12

Para el desarrollo del Componente 7 (Prognosis) y del Componente 11 se realizó la instalación de equipos para aforo vehicular en puntos estratégicos definidos conforme a la metodología aprobada. No obstante, el periodo de captura coincidió con la contingencia asociada al paro armado en la zona, lo cual generó restricciones de movilidad y condiciones operativas adversas que impidieron ejecutar el desmontaje y la recolección de los equipos en las fechas inicialmente previstas. En consecuencia, las cámaras permanecieron instaladas en campo por un tiempo adicional, hasta que se restablecieron las condiciones mínimas de seguridad y acceso para el equipo técnico, afectando la consolidación y el procesamiento oportuno de la información.

Adicionalmente, la información operativa e histórica necesaria para la calibración integral del modelo de prognosis había sido solicitada inicialmente durante el desarrollo del Componente 2 mediante el comunicado 2025-IN023-3279; sin embargo, dicha información no fue suministrada en ese momento. Ante esta situación, la Consultoría optó por obtener insumos a través de otras fuentes disponibles, tales como el visor institucional y la información publicada en la página oficial de la Aerocivil, con el fin de no afectar el avance del componente.

Posteriormente, en reunión sostenida el 28 de enero de 2026 con la Aeronáutica Civil y con participación de SATENA, se recibieron precisiones relacionadas con configuración de rutas, tipología de aeronaves y restricciones operativas. Así mismo, en reunión posterior con el grupo de analítica de la Aeronáutica Civil se tuvo conocimiento de información adicional de carácter operativo e histórico que no había sido suministrada previamente, la cual fue finalmente recibida el 4 de febrero de

2026. En lo atinente a la información relacionada con la proyección y/o concepto operativo de SATENA para los aeropuertos objeto del contrato, esta había sido solicitada mediante el comunicado 2025-IN023-4162, reiterado a través del comunicado 2026-IN023-0176, sin que se recibiera respuesta formal en su oportunidad.

La incorporación de estos nuevos insumos implicó la realización de ajustes metodológicos, la recalibración del modelo y la ejecución de validaciones técnicas adicionales. Estas actividades generaron un reproceso en el análisis de la información y en el desarrollo de los Componentes 11 y 12, demandando tiempo técnico complementario para garantizar la calidad, coherencia y solidez de los resultados finales.

El Componente 7 sí hace parte de la ruta crítica del proyecto, en la medida en que constituye un insumo técnico estructural para el desarrollo secuencial de los análisis posteriores de capacidad, brecha y formulación de alternativas. Aunque el hito formal de entrega del componente se surtió dentro del cronograma, ello no significa que su desarrollo hubiera quedado técnica y materialmente cerrado desde su primera presentación. Por el contrario, la propia Interventoría reconoció que el Componente 7 se encuentra en control de versiones, actualmente en su tercera entrega, y que las proyecciones de demanda cambiaron de manera considerable frente a las versiones iniciales, modificando sustancialmente los análisis y cálculos de capacidad, así como el planteamiento de alternativas de la Etapa III.

En ese orden, resulta necesario precisar que el impacto del Componente 7 no se agotó en la actualización del entregable mismo, sino que se trasladó directamente a los Componentes 11 y 12, los cuales dependen necesariamente de la consistencia y robustez de la prognosis como variable de entrada esencial. Así, la afectación no puede valorarse únicamente desde la fecha de entrega formal del Componente 7, sino desde su incidencia real sobre la secuencia lógica del proyecto y sobre el desarrollo de los productos posteriores que dependen obligatoriamente de él.

5. Etapa 3

Con base en lo anterior, la formulación y evaluación de alternativas de desarrollo se vio afectada por los entregables de la Etapa 2 (cuya afectación fue inicialmente estimada en tres (3) meses), es decir, a los inconvenientes presentados para lograr cerrar los componentes, 6, 10,11 y 12 (demoras descritas, todas derivadas de causas no imputables al contratista) que han generado un impacto directo sobre la consecución de las fases subsiguientes, especialmente el inicio de la Etapa 3, correspondiente a la Fase de prefactibilidad; la cual incluye el desarrollo de los análisis a nivel de prefactibilidad, que se han convertido en el punto crítico del contrato. Dada la complejidad y el nivel de información a procesar, su correcta estructuración es vital para asegurar la calidad técnica, viabilidad y coherencia integral del Plan Maestro o Esquema de Planificación, lo cual requiere garantizar el cumplimiento de las rigurosas secuencias técnicas, revisiones y validaciones establecidas, además de un incremento en el recurso humano.

En diferentes mesas de trabajo surgieron observaciones, precisiones técnicas y elementos complementarios que deben ser evaluados de manera integral antes de definir y aprobar la alternativa que servirá de base para el desarrollo de las fases subsiguientes de prefactibilidad y factibilidad.

La Consultoría precisa que dichas observaciones y elementos de análisis hacen parte del desarrollo normal de esta fase del proyecto, en la medida en que la definición de la alternativa constituye una decisión técnica crítica que debe estar soportada en criterios operacionales, de capacidad, conectividad, sostenibilidad ambiental, impactos sociales, urbanos, prediales, financieros y de seguridad operacional. Por tanto, el cierre de esta actividad no corresponde a una actuación unilateral del consultor, sino a un proceso técnico de revisión y validación sucesiva con la Interventoría y la Aerocivil, orientado a garantizar que la alternativa finalmente seleccionada sea consistente con los objetivos del contrato y con los requerimientos de la Entidad.

Posterior a las mesas de trabajo adelantadas con la Interventoría y la Aerocivil, se ha continuado el proceso de revisión técnica, análisis, validación y concertación de las alternativas de desarrollo formuladas para los aeropuertos objeto de la consultoría. En consecuencia, mientras no se encuentre cerrada y aprobada la alternativa de desarrollo, no resulta técnicamente viable cerrar de manera definitiva los componentes dependientes de dicha decisión, ni avanzar al cierre integral de los estudios de prefactibilidad y factibilidad sin riesgo de afectar la consistencia metodológica y técnica de los productos finales

La ampliación solicitada se fundamenta, en la necesidad de culminar adecuadamente el proceso de revisión, validación y

aprobación de la alternativa de desarrollo, incorporando las observaciones formuladas por la Interventoría y la Aerocivil, consolidando los análisis complementarios requeridos y ajustando los insumos técnicos que soportan la matriz multicriterio y la selección de la alternativa. Esta situación es ajena al control exclusivo de la Consultoría, en tanto depende de la interacción técnica entre las partes intervinientes, de la revisión de observaciones especializadas y de la validación institucional de una decisión estructurante para el proyecto.

La Consultoría deja expresa constancia de que la presente solicitud no obedece a deficiencias en la planeación, organización o ejecución técnica de sus actividades, sino a la necesidad de atender de forma rigurosa un proceso técnico de revisión y concertación propio de la maduración de alternativas en proyectos de planificación aeroportuaria. La ampliación pretendida busca preservar la calidad, completitud, coherencia técnica y suficiencia analítica de los productos contractuales, evitando que se adopten decisiones prematuras sobre una alternativa que constituye el insumo principal para los componentes posteriores.

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Se efectuó el contraste entre los hechos expuestos y la Matriz Contractual de Riesgos, así como con los riesgos identificados durante la ejecución. El análisis se realiza para verificar tipificación, tratamiento y estado de materialización, sin reasignar riesgos pactados ni trasladar automáticamente a la Entidad las consecuencias de eventos previsibles.

- Riesgo contractual No. 8 (general, externo, social/político): contempla afectaciones de acceso del personal, equipos o insumos por bloqueos o manifestaciones y guarda relación con las restricciones de movilidad asociadas al paro armado. El tratamiento impone al Consultor acciones preventivas y planes de contingencia y prevé gestión gubernamental conjunta con Aerocivil. El Informe Mensual No. 11 lo reporta materializado en diciembre de 2025. En consecuencia, no se presenta como un riesgo íntegramente trasladado a la Entidad; solo se considera el efecto técnico remanente no absorbido por las medidas de contingencia, la reprogramación o las suspensiones.
- Riesgos contractuales Nos. 7 y 12: el No. 7 corresponde a retención forzada de personal y equipos y el No. 12 a oposición del gobierno local o grupos de interés. Ambos figuran como no materializados en el Informe Mensual No. 11. Por ello, las amenazas al personal y la reserva de la comunidad frente al suministro de información no se presentan como materialización de dichos riesgos; se utilizan únicamente como antecedentes fácticos y se valoran según su incidencia efectiva en el acceso, la seguridad y la obtención de información.
- Riesgo contractual No. 6: se refiere a demoras en avales, permisos y autorizaciones para realizar trabajos en el aeropuerto y se reporta como no materializado. No se equipará a las demoras de alcaldías o personerías en responder solicitudes de información. Estas últimas se soportan mediante la trazabilidad de requerimientos y por los reprocesos técnicos que generó la entrega posterior de información, no por una supuesta materialización del riesgo No. 6.
- Riesgo identificado No. 1 (falta de información secundaria): el seguimiento lo reporta controlado/mitigado mediante búsqueda en fuentes alternas y requerimientos formales. Por tanto, no se invoca como causal autónoma de prórroga; su relevancia consiste en explicar las verificaciones, depuraciones y recalibraciones adicionales que debieron realizarse cuando se recibió posteriormente información operativa e histórica.
- Riesgo identificado No. 4 (revalidación técnica y operativa): se reporta materializado y controlado mediante mesas técnicas, suspensión temporal y reestructuración del cronograma. Los días de suspensión utilizados como tratamiento no se contabilizan nuevamente. La prórroga considera exclusivamente el tiempo efectivo de trabajo necesario para incorporar las definiciones ya obtenidas y cerrar los componentes dependientes.
- En consecuencia, el análisis de riesgos no permite afirmar que todos los hechos narrados sean riesgos no asignados al Consultor ni que su materialización habilite automáticamente una prórroga. La cuantificación se depura para reconocer únicamente efectos técnicos remanentes demostrables sobre la ruta crítica, después de aplicar los tratamientos previstos.

INCIDENCIA DE LAS SUSPENSIONES CONTRACTUALES EN LA RUTA CRÍTICA

Como antecedente directo de las afectaciones descritas, durante la suspensión contractual iniciada el 22 de mayo de 2026 se evidenció la necesidad de culminar el proceso de revisión, ajuste y validación de las alternativas de desarrollo formuladas para los aeropuertos SKBC, SKMG y SKPL. Previamente, el 16 de abril de 2026 se había realizado la socialización de dichas alternativas, producto de la cual la Interventoría y la Supervisión formularon observaciones y requerimientos de

complementación que debían ser atendidos integralmente para garantizar que las propuestas contaran con soporte técnico, operacional, económico, social, predial, ambiental y de conectividad suficiente para su evaluación y viabilización. Lo anterior resultaba particularmente relevante para el Componente, toda vez que este exige la formulación de alternativas técnica, operacional y funcionalmente viables y su posterior evaluación por parte de la Aerocivil, constituyéndose su aprobación en un insumo indispensable para la continuidad de los componentes posteriores.

Adicionalmente, las alternativas formuladas debían ser armonizadas con los ajustes efectuados a la prognosis de demanda, derivados de la retroalimentación de SATENA y de la información suministrada por las dependencias competentes de la Aerocivil. Estos ajustes tenían incidencia directa en la determinación de las necesidades de infraestructura, capacidad aeroportuaria, condiciones operacionales, horizonte de planificación y priorización de intervenciones. En consecuencia, continuar con los componentes subsiguientes sin contar previamente con alternativas consolidadas y técnicamente validadas habría generado riesgo de reprocesos, inconsistencias metodológicas y afectaciones sobre la coherencia integral de los productos contractuales. Por esta razón, la suspensión tuvo como finalidad permitir que la Entidad contara con elementos técnicos objetivos, verificables y suficientemente estructurados para la selección de la alternativa de desarrollo y para la posterior continuidad del proyecto.

Posteriormente y dado que al vencimiento del periodo inicialmente previsto aún persistían actividades de revisión técnica, consolidación de ajustes y retroalimentación de SATENA y de las dependencias competentes de la Aerocivil, fue necesario prorrogar la suspensión hasta el 26 de julio de 2026. En esta etapa se mantuvo como aspecto crítico la consolidación y validación integral de las alternativas, en consideración a que estas constituyen un hito técnico habilitante para el desarrollo de los estudios de prefactibilidad de la Etapa III, de cuya definición dependen variables esenciales relacionadas con capacidad, operación, funcionalidad, infraestructura, costos, predios, aspectos ambientales, conectividad y horizonte de planificación. Por tanto, reanudar la ejecución sin contar previamente con dicha validación podía trasladar las incertidumbres existentes a los componentes posteriores y generar nuevos reprocesos técnicos.

Se precisa que finalizada la prórroga de la Suspensión No. 1 el 26 de julio de 2026, el contrato reanudó su ejecución a partir del 27 de julio de 2026, permaneciendo activo durante los días 27, 28, 29 y 30 de julio de 2026. Durante este período se desarrollaron actividades de seguimiento contractual, se realizó entrega de productos y se llevó a cabo el respectivo comité de seguimiento, en el cual se revisó el estado técnico del contrato y las condiciones requeridas para su continuidad. No obstante, al evidenciarse que se mantienen causas técnicas y operativas que no permiten continuar con el desarrollo de los entregables, se determinó la necesidad de suspender nuevamente la ejecución contractual. En consecuencia, a partir del 31 de julio de 2026 se hizo efectiva una nueva suspensión, la cual se extendió hasta el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, mediante la Prórroga de la Suspensión No. 2, se amplió el periodo de suspensión desde el 1 hasta el 20 de septiembre de 2026, por lo que la ejecución se reanuda una vez finalizado dicho periodo y la fecha de terminación resultante del contrato de Consultoría corresponde al 26 de septiembre de 2026.

La suspensión comprendida entre el 31 de julio y el 31 de agosto de 2026 respondió a la necesidad de resolver aspectos técnicos, normativos y operacionales adicionales que resultaban determinantes para el cierre de las alternativas. En particular, se encontraba pendiente el pronunciamiento de la Autoridad Aeronáutica respecto de la viabilidad de considerar una franja de pista de 110 metros, la categoría de referencia 2C y la operación de la aeronave ATR 72 en los tres aeropuertos, aspectos que debían ser armonizados con las disposiciones del RAC 14 y del Anexo 14 de la OACI. A ello se sumaron las recomendaciones obtenidas en la reunión técnica realizada con SATENA el 23 de julio de 2026, relacionadas con los requerimientos mínimos para la operación de aeronaves Twin Otter y ATR 42/72, incluyendo longitud, ancho y resistencia estructural de pista, obstáculos, distancias declaradas, seguridad operacional e infraestructura de lado tierra.

Estas definiciones inciden directamente sobre el Componente 12, que constituye la base para la evaluación y selección de la alternativa de desarrollo aeroportuario y por relación de dependencia, sobre los entregables posteriores de las Etapas III y IV. Su incorporación implica revisar y armonizar la aeronave crítica, las condiciones mínimas de operación, las necesidades de infraestructura, las actuaciones de corto y mediano plazo, los costos estimados, la demanda proyectada y la estrategia de reactivación de los aeropuertos. En consecuencia, una vez superadas las causas que dieron origen a las suspensiones, se requiere tiempo efectivo de ejecución contractual para incorporar dichas definiciones, ajustar y cerrar técnicamente los Componentes 11 y 12 y trasladar consistentemente sus resultados a los componentes dependientes.

En este contexto, las suspensiones no constituyen hechos aislados frente a la presente solicitud de prórroga, sino antecedentes técnicos que evidencian la afectación real de la secuencia metodológica y de la ruta crítica del proyecto. No

obstante, los periodos durante los cuales el contrato permaneció suspendido no se contabilizan nuevamente como tiempo de prórroga; su relevancia radica en demostrar que las definiciones técnicas que motivaron dichas suspensiones incidieron directamente en la maduración, ajuste y aprobación de las alternativas y una vez reanudada la ejecución, demandan un plazo efectivo adicional para culminar los reprocesos, validaciones, articulaciones interdisciplinarias y cierres técnicos requeridos. En consecuencia, estos antecedentes refuerzan técnica y causalmente la necesidad de la prórroga solicitada, orientada a garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la calidad, coherencia y suficiencia de los productos finales.

Para efectos de cuantificación específica, las afectaciones brutas identificadas corresponden a: i) veintiocho (28) días calendario asociados al remanente del levantamiento topográfico y actividades conexas; ii) veintiún (21) días calendario correspondientes al reproceso técnico, armonización, recalibración y validación del Componente 7; iii) cincuenta (50) días calendario de afectación trasladada a los Componentes 11 y 12, dada su dependencia crítica frente a la prognosis y a la incorporación de nueva información operativa e histórica; y iv) treinta (30) días calendario asociados al cierre, revisión y articulación de los Componentes 13, 14 y 16. En términos brutos, estas afectaciones representan ciento veintinueve (129) días calendario. No obstante, una parte de dichas actividades se desarrolla de manera concurrente dentro de la ruta crítica, por lo que veinticuatro (24) días corresponden a tiempos superpuestos que no deben contabilizarse de manera acumulativa. En consecuencia, la afectación neta técnicamente atribuible al cronograma corresponde a ciento cinco (105) días calendario.

TRAZABILIDAD SUSPENSIONES VS. TIEMPO DE PRÓRROGA

De acuerdo con lo requerido por la Entidad de mantener como fecha objetivo de terminación el 20 de diciembre de 2026, dado que los recursos del contrato corresponden a reserva presupuestal del proyecto, la Consultoría propone la optimización de las actividades y el fortalecimiento de su capacidad, con lo cual el plazo de ejecución adicional efectivo objeto de la presente solicitud corresponde a ochenta y cinco (85) días calendario, contados a partir del 27 de septiembre de 2026.

Para evitar doble valoración temporal, a continuación se presenta la trazabilidad de los plazos de ejecución, prórroga No. 1, suspensión:

- **Plazo inicial del proyecto:** Desde el 1 de julio de 2025 (acta de inicio) y hasta el 31 de diciembre de 2026. (6 meses)
- **Restitución de plazo**: se amplia plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para atender el plazo inicial estimado de 11 meses.

- **Suspensión No. 1 (22-may a 21-jun-2026):** 30 días. Hecho: revisión y validación integral de alternativas posteriores a la socialización del 16-abr-2026. Tratamiento: término contractual congelado mientras se adelantaba la revisión institucional. Días computados en la prórroga: 0.
- **Prórroga de la Suspensión No. 1 (22-jun a 26-jul-2026):** 34 días. Hecho: persistencia de revisión técnica, consolidación de ajustes y retroalimentación de SATENA y dependencias de Aerocivil. Tratamiento: continuidad de la suspensión. Días computados en la prórroga: 0.
- **Ejecución de actividades (27 al 30 de julio 2026):** 4 días. Hecho: se reactivó ejecución del contrato validando si las situaciones que se habían presentado para la suspensión se habían superado, concluyendo que estaban parcialmente atendidas y se requería volver a suspender. Días computados en la prórroga: 0.
- **Suspensión No. 2 (31-jul a 31-ago-2026):** 31 días. Hecho: definición de franja de pista de 110 m, categoría 2C, operación ATR 72 y recomendaciones de SATENA del 23-jul-2026. Tratamiento: término congelado durante la definición técnica, normativa y operacional. Días computados en la prórroga: 0.
- **Prórroga Suspensión No. 2 (1 al 20 septiembre 2026):** 20 días. Hecho: espera de los pronunciamientos técnicos que inciden en ejecución y trámite de modificación contractual. Días computados en la prórroga: 0.

Esta separación evidencia que los hechos que motivaron las suspensiones se utilizaron para detener el cómputo del plazo mientras se obtenían revisiones o definiciones institucionales, mientras que la prórroga solicitada corresponde al trabajo técnico que debe ejecutarse antes o después de dichos períodos.

ANÁLISIS ADICIONAL PARA CONSIDERAR

De acuerdo con lo expuesto, la ejecución del contrato se vio impactada por diversas circunstancias externas y ajenas al ámbito de gestión y control de la Consultoría, las cuales incidieron de manera directa en el desarrollo normal de las actividades y en el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido. Estas situaciones no obedecieron a deficiencias

en la planeación o ejecución técnica, sino a condiciones estructurales, operativas y de contexto que afectaron el ritmo previsto del proyecto.

Desde una perspectiva estructural, el contrato contempló desde la etapa precontractual el desarrollo simultáneo de tres (3) Esquemas de Planificación - SKBC, SKPL y SKMG - bajo un plazo contractual históricamente asignado a la formulación de un único Plan Maestro aeroportuario. Esta condición implicó asumir de manera paralela la estructuración técnica, operativa, normativa, financiera y territorial de tres aeropuertos con dinámicas y particularidades distintas, representando una exigencia sustancialmente mayor en términos de capacidad técnica, coordinación interdisciplinaria y despliegue logístico.

La ejecución concurrente de los tres instrumentos de planificación supuso la recopilación, depuración y análisis de volúmenes independientes de información para cada aeropuerto; la realización de campañas de campo diferenciadas; la instalación de equipos de medición y aforo; y la ejecución de levantamientos topográficos específicos para cada terminal aérea. Esta multiplicidad de frentes de trabajo incrementó la carga administrativa y técnica, así como la necesidad de sincronizar cronogramas, equipos y productos, generando mayores probabilidades de reprocesos derivados de ajustes en información, validaciones cruzadas y actualizaciones metodológicas.

Adicionalmente, el proyecto enfrentó limitaciones relevantes en la disponibilidad, calidad y completitud de la información histórica de tráfico aéreo y de las series estadísticas consolidadas, particularmente en lo relacionado con la aviación no regular y la operación militar. La ausencia de bases de datos completas, la entrega extemporánea de información o la necesidad de validar cifras provenientes de diferentes fuentes obligaron a la Consultoría a realizar solicitudes reiteradas, acudir a fuentes alternas y ejecutar procesos adicionales de depuración, verificación y recalibración del modelo de análisis.

En este contexto, se reitera que los Componentes 11 y 12 constituyen la base central del desarrollo del proyecto, por cuanto consolidan las proyecciones, estructuran los escenarios de planificación y soportan las decisiones técnicas y estratégicas del estudio. En consecuencia, cualquier ajuste, actualización o recalibración del modelo de prognosis generó impactos en cadena sobre dichos componentes, implicando reprocesos técnicos, revisión de escenarios, actualización de resultados y armonización de productos finales, con incidencia directa sobre el cronograma general.

En este punto resulta relevante señalar que el alcance contractual comprende la elaboración de los Esquemas de Planificación Aeroportuaria de los aeropuertos SKBC, SKMG y SKPL, así como el análisis de integración operacional, económica y de conectividad de la región, con estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad.

La ejecución simultánea de los Planes Maestros o Esquemas de Planificación genera una carga administrativa, de coordinación y de reprocesos por el triple de volumen de información y la naturaleza de todos los proyectos, lo que complejizó la gestión del cronograma con relación a proyectos de alcance unitario, dadas las circunstancias ajenas a la consultoría que impidieron cumplir con las fechas estimadas de los entregables, las cuales se encuentran debidamente explicadas en la solicitud realizada con fecha de 17 de abril. Por lo anterior nos vemos obligados a tramitar la solicitud de prórroga

SUSTENTO TÉCNICO DE LA AFECTACIÓN AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL

Las situaciones previamente descritas incidieron de manera directa en la secuencia metodológica prevista para el desarrollo del proyecto y en la ruta crítica del cronograma contractual, en la medida en que los componentes afectados no operan de forma aislada, sino que presentan una interdependencia funcional y técnica claramente estructurada. La lógica metodológica del contrato establece una cadena progresiva de actividades en la cual cada producto constituye insumo habilitante para el siguiente, por lo que cualquier alteración en las etapas iniciales genera impactos acumulativos en los desarrollos posteriores.

La presente solicitud no corresponde a una suma indiscriminada de tiempos brutos, sino al plazo neto razonablemente requerido para culminar adecuadamente las actividades pendientes y cerrar técnicamente los componentes impactados.

Adicionalmente, durante el término adicional solicitado, la Consultoría adelantará, entre otras, las siguientes actividades: i) cierre y trazabilidad de las observaciones formuladas en mesas de trabajo con Interventoría y Aerocivil; ii) consolidación de los análisis complementarios requeridos para las alternativas evaluadas; iii) ajuste, validación y cierre de la matriz multicriterio; iv) preparación de los insumos técnicos requeridos para la aprobación de la alternativa de desarrollo; v) articulación de los resultados con los componentes de prefactibilidad y factibilidad dependientes de dicha alternativa; y vi) avance de actividades de diseño asociadas a la alternativa en proceso de validación, las cuales requieren alta coordinación

interdisciplinaria, revisión de criterios técnicos, iteraciones sucesivas y consistencia entre los componentes lado aire, lado tierra, ambiental, social, predial, urbano, operacional, financiero y de conectividad.

La viabilidad de culminar el porcentaje restante de ejecución dentro de los ochenta y cinco (85) días solicitados se sustenta en el cronograma ajustado anexo, en el cual se encuentran identificadas las actividades pendientes, sus duraciones, relaciones de dependencia y actividades concurrentes. Adicionalmente, una parte de los componentes asociados al avance restante ya cuenta con desarrollo parcial, por lo que el plazo solicitado no corresponde al desarrollo integral de dichos productos desde su inicio, sino a su culminación, revisión, atención de observaciones y aprobación.

Hecho generador	Actividad/componente afectado	Incidencia sobre la ruta crítica	Afectación bruta
Suspensión y posterior culminación de actividades de campo por condiciones que comprometieron la seguridad del personal	C6, C15 y actividades asociadas	Afectó la disponibilidad y cierre de insumos topográficos requeridos por C11, C12 y componentes posteriores	28 días
Incorporación de información operativa e histórica recibida posteriormente y ajuste de la prognosis	C7	Obligó a recalibrar y validar la prognosis, insumo directo de C11 y C12	21 días
Reproceso, armonización y validación derivados de los ajustes de prognosis y definiciones operacionales	C11 y C12	Incidencia directa en la definición de capacidad y alternativas; constituyen insumos habilitantes para Etapa III	50 días
Cierre y articulación de alternativas y componentes dependientes	C13, C14 y C16	Su ejecución depende del cierre y validación de C12 y de la alternativa de desarrollo	30 días
Afectación bruta			129 días
Concurrencia entre actividades ejecutables de manera paralela		Tiempos superpuestos que no se contabilizan nuevamente	-24 días
Afectación neta de la ruta crítica			105 días

Los ciento veintinueve (129) días corresponden a la afectación bruta requerida sobre la ruta crítica y no incluyen los periodos durante los cuales el contrato permaneció suspendido. Los veinticuatro (24) días descontados corresponden a actividades cuya ejecución se superpone temporalmente, razón por la cual no son contabilizados de manera acumulativa, llegando a un total de ciento cinco (105) días. Como se indicó previamente, considerando la fecha objetivo de finalización fijada por la Entidad para el 20 de diciembre de 2026, dado que los recursos del contrato corresponden a reserva presupuestal del proyecto, el Consultor implementará medidas de optimización mediante la asignación de mayores recursos de personal, redistribución de actividades y fortalecimiento de los equipos técnicos destinados a la revisión, ajuste y consolidación de productos. Estas acciones permiten absorber parcialmente los tiempos inicialmente estimados, manteniendo la calidad técnica requerida y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. En consecuencia, el plazo requerido corresponde a ochenta y cinco (85) días calendario de ejecución efectiva, quedando la ampliación comprendida entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026.

En consecuencia, la prórroga solicitada de ochenta y cinco (85) días calendario, hasta el 20 de diciembre de 2026, corresponde al plazo estrictamente necesario para culminar el proceso de revisión, validación y aprobación de la alternativa de desarrollo, garantizar la adecuada articulación de los componentes dependientes y asegurar el cumplimiento integral del

objeto contractual bajo estándares de calidad técnica, suficiencia metodológica y utilidad para la toma de decisiones por parte de la Aerocivil, lo que se presenta en la actualización del plan de trabajo y la estructuración del cronograma ajustado.

JUSTIFICACIÓN LEGAL

PRECISIÓN SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PRÓRROGA

La referencia a la Cláusula 4 del contrato se mantiene para identificar la cláusula de plazo objeto de modificación. El inciso relativo a fuerza mayor o caso fortuito regula específicamente la suspensión del plazo y no se invoca como causal directa de la presente prórroga. Las suspensiones ya perfeccionadas fueron tramitadas bajo su propio fundamento y sus ciento quince (115) días no se contabilizan nuevamente dentro del término adicional solicitado.

La prórroga se solicita por mutuo acuerdo como modificación del plazo necesaria para culminar el objeto contractual, sustentada en la incidencia objetiva y documentada de circunstancias externas o de terceros, dependencias técnicas y reprocesos sobre la ruta crítica. Las demoras de terceros en suministrar información, la reserva de la comunidad y la incorporación posterior de información o precisiones de SATENA y Aerocivil no se califican automáticamente como fuerza mayor o caso fortuito; se valoran individualmente a partir de la trazabilidad documental, el análisis de riesgos y su efecto efectivo sobre las actividades pendientes.

En concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la justificación distingue los riesgos expresamente previstos y gestionados por el Consultor, aquellos con medidas concurrentes de gestión entre las partes y los hechos que no corresponden exactamente a las tipificaciones de la matriz. En consecuencia, no se pretende trasladar a la Entidad el alea ordinaria asumida por la Consultoría; el plazo adicional se limita a efectos técnicos remanentes no absorbidos por la gestión ordinaria, la reprogramación ni las suspensiones.

La justificación jurídica de la prórroga solicitada se sustenta en las siguientes consideraciones normativas y doctrinales, en armonía con lo expuesto previamente respecto de las circunstancias técnicas y operativas que afectaron la ejecución contractual.

En primer lugar, la Ley 80 de 1993 establece como eje rector de la contratación estatal el cumplimiento de los fines de la función administrativa y la garantía de la adecuada prestación de los servicios a cargo del Estado. En ese sentido, el numeral 1 del artículo 14 dispone que las entidades estatales tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato y, con el propósito exclusivo de evitar su paralización o una afectación grave del servicio público, pueden introducir las modificaciones necesarias a lo contratado. Esta facultad no constituye una excepción arbitraria, sino una herramienta jurídica prevista para salvaguardar el interés general cuando surgen circunstancias que inciden en la ejecución normal del contrato.

En segundo término, el numeral 2 del artículo 5 de la misma ley impone a los contratistas el deber de colaborar activamente con la entidad contratante para garantizar que el objeto contractual se cumpla en condiciones de calidad, eficiencia y oportunidad, actuando con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales y evitando dilaciones injustificadas. En ese marco, la solicitud de prórroga no responde a un incumplimiento atribuible a la Consultoría, sino al ejercicio responsable de su deber de advertir situaciones sobrevinientes que afectan la ruta crítica del proyecto y de proponer las medidas necesarias para asegurar resultados técnicamente sólidos.

Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la dinámica propia de la ejecución contractual impide prever de manera exhaustiva todas las situaciones que pueden presentarse, razón por la cual el ordenamiento jurídico admite un margen razonable de discrecionalidad para introducir ajustes contractuales cuando estos resulten necesarios para preservar la finalidad del contrato. La posibilidad de modificar plazos o condiciones, siempre que se mantenga incólume la esencia del negocio jurídico, constituye un mecanismo legítimo orientado a garantizar su adecuada ejecución.

Bajo este entendimiento, la prórroga solicitada no altera el objeto contractual ni transforma su naturaleza jurídica; por el contrario, permite optimizar su desarrollo al adecuar el plazo a las condiciones reales en que se ha venido ejecutando el proyecto. Lejos de desnaturalizar el contrato, la ampliación del término contribuye a asegurar que los productos se entreguen

con el rigor técnico, la debida calibración metodológica y la consistencia analítica exigida para este tipo de estudios de planificación aeroportuaria.

En consecuencia, la modificación del plazo contractual se configura como una medida razonable, proporcional y jurídicamente viable, orientada a evitar la afectación del interés público, prevenir eventuales incumplimientos derivados de factores externos y restablecer la trazabilidad técnica y cronológica del proyecto. De esta manera, la prórroga solicitada garantiza la continuidad del contrato en condiciones de eficiencia, calidad y coherencia con los fines de la contratación estatal, asegurando que el objeto contractual se cumpla de manera integral y conforme a los estándares esperados.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Para la presente modificación contractual no se presenta afectación presupuestal sobre el contrato de consultoría.

Finalmente, es preciso indicar que el Consultor ha expresado que no existen reclamaciones económicas pendientes ni solicitudes de reconocimiento adicionales derivadas de los hechos que sustentan la presente modificación contractual.

EVIDENCIAS APORTADAS

Comunicación de la Consultoría 2026-IN023-1120 del 17 de abril del 2026
Comunicación de la Consultoría 2026-IN023-1320 del 7 de mayo del 2026
Comunicación de la Consultoría 2026-IN023-2824 del 27 de agosto del 2026

Correo electrónico del Solicitud de prórroga del Consultor ajustada
Oficio 2026-IN023-3235 Cronograma de consultoría ajustado

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

ANÁLISIS TÉCNICO

La Consultoría remitió la solicitud de ampliación de plazo del contrato correspondiente a ochenta y cinco (85) días calendario bajo ciertas consideraciones que la Interventoría analiza cómo se detalla a continuación. Estos aspectos, se han revisado por parte de la Interventoría al nivel técnico de procedencia requerido conforme el marco contractual aplicable:

Consideraciones sobre el desarrollo del ETII-C6 (Levantamiento topográfico)

El Consultor indica que los efectos e impactos derivados de las dificultades presentadas en campo ajenos a su responsabilidad, han sido absorbidos de manera parcial por la reprogramación No. 001 viabilizada por la Interventoría a través del comunicado INTERPMA-166 del 21 de enero de 2026 y expone la necesidad que tuvo de continuar en campo, posterior a la reprogramación, lo que implicó contar con los insumos necesarios en un plazo mayor al estimado inicialmente.

De manera complementaria, la Consultoría indicó que:

> *"(…) se presentaron situaciones de orden público que comprometieron la seguridad del personal técnico en campo. Durante las labores en los aeropuertos objeto del contrato, el equipo fue objeto de amenazas por parte de propietarios de predios aledaños, incluyendo intimidaciones con armas. Adicionalmente, un individuo que manifestó pertenecer al Ejército Nacional, sin portar identificación oficial, abordó al equipo ofreciendo acompañamiento, circunstancia que generó un escenario de riesgo e incertidumbre, ambas situaciones se presentaron en el municipio de el Plato (…)"*

Lo anteriormente expuesto, fue remitido a la Interventoría a través del comunicado 2025-IN023-4220 del 22 de diciembre de 2025 y reiterado en el comunicado 2026-IN023-0527 del 25 de febrero de 2026.

La Interventoría informa que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha acompañado aleatoriamente las actividades por parte del Consultor y se encuentra enterada de ciertos sucesos que han impactado de manera considerable el desarrollo de la ejecución de la toma de muestras de suelo y pavimentos; materialización de puntos de control y aplicación de encuestas técnicas de Origen-Destino y preferencias declaradas en los tres aeropuertos, conforme al acompañamiento realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 en campo y ha instado al Consultor a seguir el enfoque planeado para la gestión del riesgo materializado.

1. En ese sentido, se identifica que si bien el desarrollo de los levantamientos topográficos (componentes 6 y 15), circunscritos a la ruta crítica del proyecto sufrieron una reprogramación de los tiempos definidos en la línea base aprobada, la demora en su ejecución originada por los hechos expuestos por el Consultor y fuera de su control, afectó las actividades sucesoras ligadas de manera obligatoria a la finalización a satisfacción de este entregable y por tal razón, una desviación en la ejecución de las Etapas III y IV que, a su vez, dependen estrictamente de la consecución de un hito clave y contractualmente definido, circunscrito a la *aprobación de la Aerocivil de la alternativa de desarrollo*, del componente 16.

   La Interventoría señala que este hito crítico para el desarrollo conforme, secuencial y modular del proyecto, se desplazó temporalmente debido a la afectación sustentada por el Consultor en las actividades de campo, lo que generó la imposibilidad de contar con entregables debidamente validados no solo por la Interventoría sino también por la Entidad.

   Se indica que, al no contar con el entregable topográfico conforme en las fechas establecidas, el insumo necesario para el cálculo de capacidad de la infraestructura aeroportuaria (componente 11) y la propuesta de las alternativas de desarrollo de los aeropuertos (componente 12) no se desarrollaron según las fechas inicialmente previstas.

   Dada la relación de dependencia obligatoria de los hitos clave y la ejecución de los entregables asociados a las alternativas de desarrollo incluidas en el Esquema de planificación, resultó técnicamente imposible aplicar técnicas de compresión de cronograma con el fin de lograr el cumplimiento de dicho suceso en los plazos inicialmente descritos, lo que generó una distorsión en la curva de avance del contrato de Consultoría.

Lo anterior deriva en que la solicitud planteada por el Consultor, responde a afectaciones que, si bien han sido gestionadas conforme al plan de riesgos contractualmente presentado y aprobado, resultan en un impacto a nivel de tiempo de ejecución que afecta la ruta crítica del contrato y los entregables que guardan una relación de dependencia obligatoria con el cierre del componente topográfico de la Etapa II y las etapas de factibilidad y prefactibilidad, generando una afectación real del contrato, considerando un impacto remanente que no ha sido absorbido por la reprogramación de actividades, y que origina igualmente los retrasos evidenciados en el cronograma.

Consideraciones sobre el desarrollo del ETII-C7 (Pronósticos de la demanda), C11 (Análisis de capacidad) y Etapa III del Contrato

La Consultoría sustenta que existieron afectaciones en la estructuración del componente 7 que impactaron de manera directa el desarrollo del componente 11 (Análisis de capacidad) debido a su relación directa entre el insumo aprobado de la actividad predecesora y la ejecución de su sucesora. Lo anterior, se expone a continuación.

El Consultor sustenta que

> *"(…) La información operativa e histórica necesaria para la calibración integral del modelo de prognosis había sido solicitada inicialmente por la Consultoría durante el desarrollo del Componente 2, mediante el comunicado 2025-IN023-3279; sin embargo, dicha información no fue suministrada en ese momento. Ante esta situación, la Consultoría optó por obtener insumos a través de otras fuentes disponibles, tales como el visor institucional y la información publicada en la página oficial de la Aerocivil, con el fin de no afectar el avance del componente.*
>
> *Posteriormente, en la reunión solicitada por el equipo supervisor con el área de Analítica de la Aerocivil, realizada con posterioridad a la entrega de la primera versión del componente, se tuvo conocimiento de la*

existencia de información adicional de carácter operativo e histórico que no había sido puesta a disposición previamente. En consecuencia, dicha información fue requerida formalmente mediante el oficio 2026-IN023-0246, con el propósito de contar con datos completos, actualizados y consistentes que permitieran calibrar integralmente el modelo de prognosis y fortalecer la robustez técnica del análisis. (…)"

Al respecto, la Interventoría reitera y comparte que las proyecciones de demanda cambiaron de manera significativa frente a las versiones inicialmente remitidas para el entregable C7, circunstancia que modificó sustancialmente los análisis y cálculos de capacidad, así como el desarrollo y planteamiento de alternativas de la Etapa III. Sin embargo, dicha afectación se mide en los componentes sucesores del C7, cuyo nivel de detalle técnico resulta considerablemente exigente, implicando la realización de cálculos y análisis de capacidades para las diferentes alternativas propuestas, que deben considerar dicho insumo.

Expuesto lo anterior, se señala que la mayor afectación en el desarrollo del contrato de Consultoría fue sustentada en las precisiones relacionadas con la configuración de rutas y proyecciones de operación, indicadas por la aerolínea "SATENA", y en específico su impacto se dio sobre los componentes 11, 12, 13 y posteriores.

En adición de lo anterior, la Interventoría encuentra que conforme a las mesas de trabajo desarrolladas y descritas por el Consultor en su comunicado 2026-IN023-1320 del 11 de mayo de 2026 y las lecciones aprendidas en contratos de Consultoría similares en otras regiones del país ejecutados por la Aerocivil, las decisiones tomadas por la Entidad y los aportes de los stakeholders, son fundamentales para evitar riesgos operativos y técnicos de reproceso en el desarrollo de los entregables cuyo alcance depende explícitamente de la ejecución de socializaciones del proyecto, una vez se haya decantado las alternativas con la Entidad y la Interventoría, y posteriormente la prefactibilidad y factibilidad exigen como requisito de entrada la aprobación de la alternativa de desarrollo por parte de la Entidad.

Entendiendo que proyectos de planificación Aeroportuaria en ejecución por parte de la Aerocivil, fueron estimados en su planeación inicial a doce (12) meses y han tomado cerca de quince (15) meses para lograr el cierre conforme de su objeto contractual, esto resulta en un referente del tiempo requerido para este tipo de proyectos dadas entre otras las condiciones regionales, donde se presenta falta y dificultades para la obtención de información primaria y secundaria, además que se requieren ciclos de revisión necesarios para la maduración de las alternativas acorde con los requisitos técnicos del pliego y las necesidades de conectividad de propias de cada región, según el mismo alcance requerido para el proyecto.

Finalmente, el desarrollo conforme de Esquemas de Planificación Aeroportuaria, radica en la consistencia metodológica de sus componentes y entregables circunscritos a cada una de sus etapas de ejecución y cualquier incongruencia en su contenido, análisis y cálculos presentados, podría resultar en un riesgo de reproceso cuyo impacto afectaría directamente la calidad de los productos estructurados, razón por la que los impactos descritos previamente, originados por cambios en las proyecciones inicialmente formuladas, justifican el sustento del plazo adicional requerido, en el sentido que se busca mantener esta calidad técnica y metodológica en la medida que se remitan entregables alineados con su alcance y calidad contractualmente definidos.

Por último, la Interventoría encuentra que aun cuando el formato 8 "Especificaciones técnicas del Consultor" permite la paralelización de actividades descritas para cada una de las Etapas del contrato, existe claramente en la estructuración de proyectos de Planificación aeroportuaria una relación de dependencia y secuencialidad de sus entregables, que no puede ser inalterada ni desconocida y debe ser ejecutada de manera armónica e integral en cada una de sus fases.

Lo anterior, resulta en que el orden lógico y secuencialmente estructurado del contrato, no pueden ser corregido a través de métodos de compresión de cronograma o aumento en la capacidad técnica del Consultor. Adicionalmente, el "Process groups: a practic guide" del PMI ® reconoce que: "(…) ***Incrementar el número de recursos al doble del número original no siempre reduce el tiempo a la mitad, ya que puede aumentar adicionalmente la duración debido al riesgo, y, en algún punto, añadir demasiados recursos a la actividad puede aumentar la duración debido a la transferencia de conocimiento, la curva de aprendizaje, la coordinación adicional y otros factores involucrados***.(…)" (PMI, 2023)

Y si bien es cierto, el Consultor puede añadir recursos para cumplir con el objeto contractual, su resultado, no sería realmente el esperado, concluyendo que existen actividades cuya naturaleza técnica y temporal resulta inalterable y que no puede ser

reducida sin comprometer la calidad, la confiabilidad y la validez de los resultados obtenidos, encontrando viable el análisis presentado.

Consideraciones sobre el desarrollo del ETII-C9 (Diagnóstico de infraestructura)

El Consultor también sustentó afectaciones al componente 9, describiendo el siguiente análisis:

2. La Consultoría expone en su comunicado 2026-IN023-0527, del 26 de febrero, que,

> *"(…) En el marco del levantamiento de información primaria en campo, requerido para complementar el análisis desarrollado en el componente correspondiente, se evidenció que, durante la ejecución de estas actividades, la población manifestó una marcada reserva frente al suministro de la información solicitada. Esta situación ha dificultado el desarrollo fluido del proceso y ha limitado la obtención oportuna de datos precisos y verificables, indispensables para sustentar técnicamente el estudio.*
>
> *Dicha circunstancia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes mediante los comunicados 2026-IN023-0517 (Alcaldía de El Banco – Informe Social), 2026-IN023-0518 (Alcaldía de Plato – Informe Social), 2026-IN023-0520 (Personería de El Banco – Informe Social)y 2026-IN023-0521 (Personería de Plato – Informe Social), con el fin de solicitar el acompañamiento institucional necesario para facilitar el acceso a la información y garantizar la adecuada ejecución de las actividades en territorio. (…)"*

La Interventoría señala que, el desarrollo a conformidad del componente 9, en atención de su alcance establecido en el contrato de Consultoría y sus anexos técnicos, efectivamente resulta en el insumo o la línea base para la construcción de entregables asociados a la etapa de prefactibilidad del proyecto. Las demoras en su ejecución, descritas por la Consultoría como *"(…) una afectación concurrente relacionada con las dificultades en la obtención y validación oportuna de información primaria, que obligaron a la Consultoría a realizar actividades adicionales de verificación, contraste, depuración y armonización entre fuentes primarias y secundarias oficiales (…)"* resultaron en un proceso inicialmente previsible cuya planeación y gestión partió de la metodología de trabajo presentada en el C1 del Consultor. Sin embargo, es preciso indicar que muchas respuestas de Entidades a solicitudes de información no dependen de manera directa de los procesos de ejecución a cargo de la Consultoría y que su ausencia y demora efectivamente ocasionó dificultades en el análisis de información existente, lo que resulta ajeno a la gestión del Consultor.

Lo previamente referenciado, se traduce en que, si bien el C9 no hace parte de la ruta crítica del contrato, su culminación a satisfacción fue una limitante para el desarrollo de los componentes 11 y 12 por sus relaciones obligatorias de dependencia, impactando las fechas de entrega de estos dos componentes. Bajo la misma línea, se indica que no solamente se genera una afectación a los tiempos de ejecución de estos entregables desarrollados por el Consultor, sino también a hitos fundamentales que pautan el desarrollo conforme del contrato, como el concepto de la Entidad sobre las alternativas formuladas y la misma selección de la alternativa, que se deberán desplazar temporalmente.

Efecto y condición de las suspensiones

Desde la perspectiva de la Interventoría, y con el propósito de garantizar la adecuada trazabilidad contractual y técnica de la solicitud de prórroga, resulta necesario precisar el estado de ejecución del contrato al momento de iniciarse la Suspensión No. 1, ocurrida el 22 de mayo de 2026, la prórroga y posterior Suspensión No. 2, diferenciando aquellas actividades que se encontraban pendientes con anterioridad a dicha fecha de aquellas situaciones posteriores que pudieron generar una afectación adicional sobre la ruta crítica del proyecto.

De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Interventoría, al momento de suscribirse la Suspensión No. 1 se encontraba pendiente la culminación del proceso de revisión, ajuste, validación y consolidación de las alternativas de desarrollo formuladas para los aeropuertos SKBC, SKMG y SKPL. Dichas actividades incluían la atención de las observaciones y requerimientos de complementación formulados por la Interventoría y la Supervisión durante la socialización realizada el 16

de abril de 2026, así como la consolidación de los soportes técnicos, operacionales, económicos, sociales, prediales, ambientales y de conectividad necesarios para la evaluación y viabilización de las alternativas propuestas.

En este sentido, la Interventoría precisa que las actividades anteriormente descritas correspondían a actividades pendientes de ejecución existentes antes del inicio de la Suspensión No. 1 y que fueron consideradas dentro de las circunstancias que motivaron dicha medida contractual. Por lo tanto, el tiempo asociado exclusivamente al periodo de suspensión no se contabiliza nuevamente como parte del plazo adicional solicitado, en la medida en que durante dicho periodo el contrato no se encontraba en ejecución y las actividades pendientes permanecieron temporalmente suspendidas mientras se adelantaban las gestiones técnicas requeridas para superar las condiciones que dieron origen a la suspensión.

Una vez finalizados los periodos de suspensión y reanudada la ejecución contractual a partir del 21 de septiembre de 2026, la Interventoría ha verificado que la Consultoría retomó las actividades asociadas al cierre técnico de las alternativas de desarrollo.

Desde el análisis efectuado por la Interventoría, resulta necesario distinguir entre: (i) el tiempo asociado a las actividades pendientes existentes antes del 22 de mayo de 2026, cuyo desarrollo fue interrumpido temporalmente durante las suspensiones del contrato de consultoría y posteriormente retomado una vez reanudado el contrato en julio y en septiembre de 2026; y (ii) el tiempo adicional requerido como consecuencia de hechos técnicos y operaciones esbozados en la presente solicitud, cuya incidencia modificó la secuencia inicialmente prevista y generó una afectación adicional sobre la ruta crítica.

En consecuencia, la Interventoría precisa que la cuantificación del plazo adicional solicitado no incluye nuevamente periodos asociados exclusivamente a las suspensiones ni pretende reconocer como nueva afectación el mismo remanente de ejecución existente antes del 22 de mayo de 2026. La evaluación del plazo adicional se limita al tiempo efectivo y técnicamente justificado requerido para atender las circunstancias expuestas, incorporar las nuevas definiciones técnicas, culminar los ajustes derivados de estas y garantizar la entrega integral de los productos contractuales con la calidad, consistencia metodológica y suficiencia requerida.

Consideraciones finales sobre el impacto a la ruta crítica del proyecto y la Etapa III del contrato

En atención al sustento presentado por la Consultoría sobre el plazo requerido para la culminación de actividades originado por los impactos descritos, la Interventoría emite concepto favorable a la solicitud de prórroga, bajo el entendido que el Consultor cuenta con la autonomía, experiencia y capacidad de administrar el proyecto y sus procesos gerenciales, técnicos y operativos frente a los recursos y esfuerzos que utiliza para cumplir con los objetivos del proyecto y generar valor para la Aerocivil. Es decir, los tiempos que define para el desarrollo de las actividades faltantes, responden a estimaciones propias que se originan en su conocimiento del contrato, alineado técnica y estructuralmente con el alcance requerido y la capacidad dispuesta para atenderlo.

Para efectos del análisis de los impactos reportados, la Interventoría realizó una validación detallada del cronograma presentado, donde en MsProject se introdujeron los tiempos de afectación, actualizándose las tareas respectivas en cada componente, validándose los impactos resultantes.

Por tanto:

- La Interventoría encuentra procedente la estimación asociada a las afectaciones en tiempo ocasionadas en el mes de diciembre 2025, sustentadas en la suspensión de actividades de campo, dada la ausencia de un producto aprobado (C6, C7, C11 -) perteneciente a la ruta crítica del proyecto, cuyo efecto constituye una limitante en el desarrollo de actividades de formulación y análisis técnico requerido para la Etapa III del proyecto. (veintiocho (28) días calendario asociados al remanente del levantamiento topográfico y actividades conexas)
- La Interventoría encuentra procedente los tiempos de afectación referenciados por el Consultor y ocasionados por reprocesos debido al acceso a información histórica y posibles proyecciones de operación de aerolíneas en los aeropuertos objeto de ejecución contractual, calculados considerando las fechas de presentación inicial del entregable C7, la realización de sesión con SATENA y obtención de información insumo para la prognosis, y la posterior entrega del C7 completamente reajustado, dejando la claridad de que desde el producto 2 “Debida diligencia” se remitieron formalmente las solicitudes de información a las Entidades y Operadores, cuyo proceso resultó completo y apropiado,

pues a la fecha, dicho producto contractual se encuentra aprobado. (veintiún (21) días calendario correspondientes al reproceso técnico, armonización, recalibración y validación del Componente 7)

- La Interventoría comparte los tiempos de afectación al desarrollo de los componentes C11 y C12 originados por la reformulación del C7 y sus proyecciones. (cincuenta (50) días calendario de afectación trasladada a los Componentes 11 y 12, dada su dependencia crítica frente a la prognosis y a la incorporación de nueva información operativa e histórica)
- La Interventoría encuentra razonable los tiempos requeridos para el desarrollo de los componentes C13 y C14, toda vez que los mismos dependen de la aprobación de las alternativas de desarrollo que se encuentran en procesos de aprobación conforme los ciclos de revisión y ajustes, acorde con la maduración de los entregables y la necesidad de llevar a cabo las socializaciones a los stakeholders, como insumos posteriores para la elaboración de la matriz multicriterio (C16) y la posterior selección de la alternativa por parte de la Entidad, actividades que se encuentran en curso de planeación y ejecución, conforme el cierre de los componentes de la Etapa 2. (treinta (30) días calendario asociados al cierre, revisión y articulación de los Componentes 13, 14 y 16).
- La interventoría evalúa que las circunstancias descritas en el desarrollo y avance obedecen a factores externos y ajenos al ámbito de gestión del consultor.

En términos brutos, estas afectaciones representan ciento veintinueve (129) días calendario. No obstante, una parte de dichas actividades (24 días) se desarrolla de manera concurrente dentro de la ruta crítica, así el impacto generado y las necesidades propias para el desarrollo de las fases de prefactibilidad y factibilidad pendiente de este contrato implica una afectación neta de ciento cinco días (105), de los cuales dada la fecha objetivo de finalización fijada por la Entidad para el 20 de diciembre de 2026, dado que los recursos del contrato corresponden a reserva presupuestal del proyecto, se restan 20 días para un total de ochenta y cinco (85) días calendario, por lo que acorde con lo expuesto por el Consultor según su experticia y capacidad asignada, se considera procedente la prórroga del plazo solicitado, toda vez que las razones expuestas configuran circunstancias no imputables al Consultor que, una vez contrastadas con la matriz de riesgos y descontados los tiempos absorbidos por gestión, reprogramación y suspensión, produjeron una afectación residual sobre la ruta crítica

Para efectos del trámite administrativo propuesto, la Interventoría conceptúa que el cronograma presentado como anexo cumple con los requisitos para el desarrollo lógico de la consultoría y contempla el plazo adicional solicitado de ochenta y cinco (85) días calendario. No obstante, se precisa que dicho cronograma corresponde al escenario asociado a la prórroga solicitada y, por tanto, su implementación y aprobación se encuentran condicionadas a la viabilización y aprobación de la solicitud de modificación contractual.

IMPACTO DE LA NO APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA

Mientras no se formalice la prórroga solicitada, continuará vigente el plazo contractual actualmente aprobado, cuya fecha de terminación, considerando la prórroga de la Suspensión No. 2, corresponde al 26 de septiembre de 2026. Sobre este aspecto, la Interventoría mediante comunicación INTERPMA-279 del 22 de julio de 2026 advirtió que dicho plazo resulta materialmente insuficiente para culminar las actividades técnicas pendientes y garantizar el cierre integral de los productos contractuales requeridos.

La no aprobación de la prórroga implicaría la imposibilidad material de culminar la totalidad de las actividades previstas dentro del alcance del contrato de consultoría, particularmente aquellas asociadas al cierre, validación y consolidación de los componentes técnicos que soportan la definición de los Esquemas de Planificación Aeroportuaria de los aeropuertos SKBC, SKMG y SKPL.

En consecuencia, la Entidad se vería abocada a recibir productos parciales derivados de una ejecución incompleta del contrato, sin contar con los instrumentos integrales de planificación aeroportuaria requeridos para la toma de decisiones técnicas, operacionales, financieras, ambientales, prediales y de conectividad. Esta situación afectaría directamente la finalidad pública perseguida con la contratación, dado que el objeto contractual no corresponde únicamente a la elaboración aislada de entregables individuales, sino a la estructuración integral de alternativas de desarrollo aeroportuario técnicamente validadas y articuladas entre sus diferentes componentes.

De esta manera, la terminación del contrato sin la ampliación requerida generaría una ruptura en la secuencia metodológica prevista, dado que los productos actualmente pendientes constituyen insumos habilitantes para consolidar la evaluación y selección de alternativas, así como para avanzar hacia las fases posteriores de planificación y toma de decisiones por parte de la Entidad. La ausencia de estos productos completos limitaría la utilidad técnica de la información generada y podría requerir la ejecución de actividades adicionales posteriores para complementar, actualizar o validar estudios que no alcanzarían su cierre dentro del plazo vigente.

Desde la perspectiva contractual y administrativa, la no aprobación de la prórroga no permitiría alcanzar la finalidad perseguida con la contratación, generando que la ejecución física y financiera del contrato resulte parcial respecto del alcance originalmente previsto. En dicho escenario, la Entidad tendría que adelantar las actuaciones contractuales correspondientes para recibir y evaluar exclusivamente los productos efectivamente ejecutados, sin que ello represente la obtención integral del objeto contratado ni garantice la disponibilidad de los insumos técnicos requeridos para soportar las decisiones futuras relacionadas con el desarrollo aeroportuario.

Adicionalmente, debe considerarse que la terminación del contrato en estas condiciones trasladaría a la Entidad los efectos derivados de circunstancias que afectaron la ruta crítica del proyecto y que fueron identificadas durante la ejecución contractual, incluyendo aquellas relacionadas con la disponibilidad posterior de información técnica, la necesidad de incorporar definiciones de entidades competentes y los ajustes requeridos para garantizar la consistencia de las alternativas formuladas. Por ello, la prórroga constituye la medida contractual orientada a permitir la culminación adecuada del objeto contratado, evitando que la Entidad reciba productos incompletos o técnicamente insuficientes frente a la finalidad pública que motivó la contratación.

Finalmente, una vez sea aprobada la prórroga, la Interventoría procederá con la aprobación del cronograma ajustado, verificando su consistencia con el plazo contractual autorizado, la programación de las actividades y productos pendientes, y la capacidad de seguimiento y revisión de estos dentro de los ochenta y cinco (85) días adicionales.

Es preciso indicar que en el numeral de Estado del Contrato se escribieron las actividades pendientes por cada componente y etapa, así como los entregables activos en ciclos de revisión.

Se indica que dicho cronograma entrará a regir como la línea base formalmente aprobada para la ejecución del plazo restante del contrato. Razón por la cual, reemplazará de manera inmediata una vez la Aerocivil viabilice la presente solicitud de modificación del contrato de Consultoría.

ANÁLISIS FINANCIERO

Conforme lo expuesto a nivel técnico y jurídico, la prórroga contractual solicitada no genera ningún impacto presupuestal en el contrato del Consultor, por cuanto no implica modificaciones del valor del contrato, ni afecta la ecuación económica o financiera del contrato de Consultoría 24001332 H3 DE 2024.

Acorde con el análisis integral del proyecto, y acorde con el principio de planeación, la prórroga solicitada para el contrato de consultoría 24001332 H3 de 2024 implica igualmente la ampliación del plazo del contrato de Interventoría No. 24001423 H3 de 2024, dada su conexidad y dependencia con el contrato de consultoría, garantizando así un adecuado desarrollo aeroportuario de los aeropuertos SKBC, SKMG y SKPL, que revisten un gran interés público para la conectividad del Atlántico.

Así, el contrato de interventoría presenta una relación de coligación funcional con el negocio jurídico objeto de verificación y seguimiento, en la medida en que su razón consiste, precisamente, en controlar, supervisar, vigilar y verificar la correcta ejecución del contrato principal. Esta conclusión encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ha reconocido que la interventoría es un contrato íntimamente relacionado con el contrato respecto del cual ejerce su actividad, y que su función natural no es autónoma ni independiente del objeto vigilado, sino instrumental frente a este.

Conforme lo expuesto por la Interventoría en comunicación INTERPMA-300 del 17 de septiembre de 2026, basada en los principios de colaboración armónica, buena fe contractual y satisfacción del interés general, la prórroga solicitada sobre el contrato vigilado y que se hace extensible al contrato de Interventoría, no genera ningún impacto presupuestal en el contrato de Interventoría 24001423 H3 DE 2024.

Finalmente, es preciso indicar que el Consultor ha expresado que no existen reclamaciones económicas pendientes ni solicitudes de reconocimiento adicionales derivadas de los hechos que sustentan la presente modificación contractual.

ANÁLISIS JURÍDICO

Desde el punto de vista jurídico, la prórroga del plazo contractual constituye una modalidad de modificación del contrato estatal que tiene por objeto ajustar el término de ejecución cuando concurren circunstancias técnicas, administrativas u operativas que impiden culminar oportunamente las actividades contratadas, sin que ello implique una alteración del objeto ni del valor inicialmente pactado. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que el plazo constituye un elemento accidental del contrato susceptible de modificación por acuerdo de las partes, siempre que exista una causa objetiva que justifique su ampliación y se garantice la correcta ejecución del objeto contractual.

En efecto, la Corte Constitucional ha reconocido que el plazo no constituye un elemento esencial del contrato estatal, razón por la cual puede ser ajustado mediante prórroga cuando las circunstancias de ejecución lo exijan, siempre que dicha modificación se encuentre debidamente motivada y respete los principios que orientan la contratación pública, particularmente los de planeación, economía y responsabilidad. Al respecto, la sentencia C - 416 de 2012, señaló:

> *"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal" (Corte Constitucional, Sentencia C-416, 2012)*

En ese orden de ideas, desde el punto de vista jurídico se advierte que la figura de la prórroga resulta viable como mecanismo de modificación contractual cuando las circunstancias de ejecución así lo exigen y siempre que su adopción se encuentre debidamente justificada y orientada a garantizar la adecuada culminación del objeto contractual. Así, la procedencia de dicha modificación exige que el plazo adicional solicitado se encuentre soportado en un análisis técnico que permita establecer con precisión la incidencia real de los eventos identificados en el cronograma del contrato, de manera que la ampliación del término corresponda estrictamente al tiempo necesario para superar las afectaciones presentadas durante su ejecución.

En el presente caso, revisados los antecedentes contractuales, se advierte que durante la ejecución del contrato se han presentado determinados eventos que han incidido en el desarrollo de algunas actividades y que pueden justificar la necesidad de ajustar el cronograma contractual. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico resulta procedente acudir a la figura de la prórroga como mecanismo para permitir la culminación adecuada de las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Respecto de lo anterior, es de mencionar que la Ley 80 de 1993, en su artículo 14, inciso segundo, reconoce a las entidades estatales la facultad discrecional de modificar los contratos cuando ello resulte necesario para garantizar la continua y adecuada prestación del servicio o la ejecución del objeto contractual, siempre que no se altere la esencia del vínculo ni se afecte el equilibrio económico pactado. No obstante, el Legislador no ha delimitado una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar un contrato, pues, en principio, la regla general es que los contratos deben ejecutarse conforme a las condiciones pactadas inicialmente. Sin perjuicio de lo anterior, no existe una restricción expresa para modificar los contratos estatales, pues se reconoce que, ante la necesidad de cumplimiento del contrato, resulta pertinente suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo.

Al respecto, se ha manifestado la Corte Constitucional mediante sentencia C - 416 de 2012, de la siguiente manera:

> *"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal"3 (Corte Constitucional, Sentencia C-416, 2012)*

Este pronunciamiento refuerza la idea de que la modificación contractual, lejos de ser una excepción caprichosa, responde a la naturaleza instrumental del contrato estatal como medio para cumplir los fines públicos. En ese sentido, la prórroga del plazo, cuando obedece a razones técnicas o administrativas ajenas al contratista, encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional como un mecanismo válido para preservar la eficacia y continuidad de la gestión contractual.

Por su parte, el Consejo de Estado ha enfatizado que esta potestad no se encuentra plenamente delimitada en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual ha sido la jurisprudencia la encargada de establecer sus límites, condiciones y requisitos de procedencia, al respecto se ha manifestado la Sala de Consulta y Servicio Civil de la siguiente manera:

> *"(...) no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatal. / Al no existir una regulación expresa sobre la modificación de los contratos estatales-en el ejercicio del "ius variandi" o surgido por mutuo acuerdo-, han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de la modificación que deben ser respetados por la entidad contratante, en especial cuando el contrato está precedido de un proceso de selección o de elegibilidad"*[1] (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2263, 2016)

Si bien la regla general es no modificar los contratos, la Sala procedió a fijar los siguientes límites para casos excepcionales en los que proceda la modificación:

Tipo	Clase	Desarrollo
Límites de orden temporal	Relacionados con la Vigencia del Contrato	Se limita la posibilidad de modificar la vigencia del contrato, pues no resulta viable jurídicamente realizarlo sobre un contrato con un plazo vencido.
	La prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas.	Se prohíben las prórrogas sucesivas, indefinidas, y las prórrogas automáticas, por ser contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia en procesos de Contratación estatal.
Límites de orden formal	La solemnidad del contrato de modificación	Toda modificación debe ser solemne. Se requiere que se eleve a escrito de acuerdo de voluntades.
	La motivación y justificación de la modificación.	Se deberán consignar las razones que hacen necesario afectar lo inicialmente pactado. Así mismo, se debe determinar su juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales, lo anterior como requisito de control de legalidad.

[1] **Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (2016, 4 de febrero).** *Concepto No. 2263 de 2016.* Bogotá, D.C., Colombia.

Límites de orden material	Límites cuantitativos	Se establece un límite del 50% del valor inicial del contrato, en caso de que la modificación implique una adición presupuestal. (art. 40 Ley 80 de 1993)
	La prohibición de fraccionamiento del contrato y del objeto.	El objeto no podrá ser dividido o fraccionado para realizar diversos contratos que tengan como finalidad evadir el proceso de selección. Lo anterior en aras de evitar una desviación de poder y en la pretermisión de los principios del proceso de selección, en especial, de igualdad, libertad de concurrencia y transparencia.
	Límites relacionados con la variación del objeto y con el contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones.	Solo es posible modificar un contrato dentro de los límites que respeten su objeto y contenido esencial. No es procedente alterar aspectos sustanciales del pliego de condiciones, pues ello vulnera los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia. Una modificación que cambie la esencia del objeto contractual equivale a celebrar un contrato distinto, afectando la legalidad del proceso. Por tanto, cualquier variación sustancial del objeto o de los términos de referencia puede dar lugar a la nulidad absoluta del contrato.

Tabla 1[2]

De todo lo anterior se desprende que, la modificación del contrato estatal constituye una herramienta jurídica excepcional que permite ajustar su ejecución a las condiciones reales del proceso, siempre dentro de los límites materiales, temporales y formales definidos por la ley y la jurisprudencia.

No obstante, entre las distintas modalidades de modificación, la prórroga del plazo adquiere una relevancia particular, por cuanto no altera el objeto ni el valor del contrato, sino que busca restablecer el tiempo necesario para su cumplimiento integral cuando concurren causas objetivas que impiden la ejecución en los términos inicialmente previstos. En ese marco, resulta pertinente analizar la prórroga como una figura autónoma, sustentada en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y la materialización del objeto contractual.

En materia de contratos estatales, la definición y características generales del plazo se derivan de las normas del Código Civil, las cuales se complementan con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993. La doctrina ha reconocido el plazo como una de las modalidades por las cuales las obligaciones dejan de ser puras y simples, haciendo que una obligación sea exigible o que los derechos se extingan.

Para lo que a la contratación pública compete, el plazo, por cuanto constituye un elemento esencial del contrato estatal, en la medida en que delimita temporalmente la ejecución de las prestaciones y condiciona la vigencia de las garantías, la disponibilidad presupuestal y la planeación institucional. En consecuencia, su determinación, ampliación o modificación debe responder a causas objetivas debidamente justificadas, pues el tiempo no solo incide en el cumplimiento del objeto contractual, sino también en la legalidad y eficacia del gasto público.[3]

---

[2] Síntesis elaborada a partir del *Concepto 2263 de 2016* emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se establecen los límites temporales, formales y materiales aplicables a la modificación de los contratos estatales, ante la ausencia de una regulación legal expresa sobre la materia.

[3] **Colombia Compra Eficiente. (2025, 10 de febrero).** *Concepto C-156 de 2025: Plazo del contrato – Concepto, exigibilidad de las obligaciones y cómputo de términos.* Radicado No. P20250210001178. Bogotá, D.C., Colombia.

En esa medida, la regulación del plazo en los contratos estatales no puede entenderse de manera rígida o inmutable, pues el desarrollo de la ejecución contractual suele estar sujeto a factores administrativos, presupuestales o técnicos que pueden modificar el escenario inicialmente previsto. De ahí que la doctrina y la jurisprudencia coincidan en reconocer que el plazo puede ajustarse, siempre que dicho ajuste esté debidamente motivado, se formalice mediante el acto o documento correspondiente y no suponga una alteración sustancial del contrato.

El Consejo de Estado, en Sentencia del 24 de agosto de 2005, define el plazo como un elemento accidental susceptible de ser delimitado por las partes, lo que se traduce en la facultad excepcional de modificarlo. Lo anterior, en los siguientes términos:

> *"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (...)"*[4] *(Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de agosto de 2005)*

Esta interpretación del Consejo de Estado consolida la idea de que el plazo no forma parte de la esencia ni de la naturaleza del contrato estatal, sino que constituye un elemento accesorio susceptible de ajuste cuando las circunstancias de ejecución lo exigen. Así, la prórroga aparece como una consecuencia lógica del principio de autonomía de la voluntad y de la necesidad de asegurar la adecuada ejecución del objeto contractual, siempre dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad que impone la Ley 80 de 1993.

Sobre la posibilidad de realizar modificaciones a la cláusula que fija el plazo en el contrato estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como entidad técnica encargada de orientar la gestión contractual del Estado, se ha pronunciado sobre la modificación y el plazo de los contratos estatales de la siguiente manera:

> *"En relación con la cláusula del plazo no hace parte de las cláusulas inmodificables, por lo tanto, la entidad estatal podrá modificarla de común acuerdo o de manera unilateral siempre y cuando exista una justa causa que evite la afectación grave del servicio público. En ese sentido se considera que los contratos estatales son susceptibles de prórroga, adicionalmente debe destacarse que la Ley no fijó criterios para determinar el alcance de la ampliación del plazo, de manera que, en principio, sucede lo mismo que con la configuración del plazo inicial, el cual solo se restringe a que sea «razonable» cumpliendo con el principio de planeación y anualidad presupuestal. Por lo anterior, es posible que un mismo contrato presente diferentes prórrogas, atendiendo igualmente a que sean convenientes y razonables en su determinación, lo que en algunos casos afecta el principio de anualidad de la vigencia fiscal, pero argumentando las necesidades de realizar la prórroga la entidad estatal la tramita mediante un contrato modificatorio el cual debe atender a unas solemnidades."* (Colombia Compra Eficiente, Concepto C-303, 2024)

De este pronunciamiento se desprende que, la prórroga, más que una alteración contractual, constituye un instrumento de gestión temporal que permite a la entidad mantener la continuidad de la ejecución y salvaguardar el interés público. Su procedencia exige, sin embargo, que exista una causa real, objetiva y documentada, que justifique la necesidad de extender el plazo, en armonía con los principios de planeación, transparencia y economía.

Así las cosas, conforme lo sustentado por el Consultor, se han presentado circunstancias concretas que han afectado la ejecución del contrato y derivan en la necesidad real de ajustar el cronograma para culminar las actividades pendientes en un plazo de ochenta y cinco (85) días calendario. En ese sentido, la prórroga solicitada por el Consultor se orienta a permitir

[4] Consejo de Estado. Sección Quinta. sentencia del 24 de agosto de 2005. exp. 3171A. C.P. Darío Quiñones Pinilla.

la adecuada culminación del objeto contractual, y su alcance corresponde estrictamente al impacto real generado por los eventos identificados, de manera que el tiempo adicional otorgado guarda una relación proporcional con las afectaciones efectivamente presentadas durante la ejecución del contrato.

En atención a la totalidad de las consideraciones expuestas, **la Interventoría eleva a la Entidad su concepto frente a la procedencia justificada de la modificación contractual por parte de la Consultoría.**



Nombre: MONICA LUCIA TORRES MATÍZ

Cargo: Representante Legal

Outlook

Formato 69_Prorroga al 20 de diciembre

Desde Consorcio PMA Atlántico <pma.atlantico@incoplansa.com>
Fecha Lun 2026-09-21 08:56
Para Valezka Quintero <valezka.quintero@cmconsultores.com.co>; Luis Heiner González <luis.gonzalez@cmconsultores.com.co>; Luna Rozo <luna.rozo@cmconsultores.com.co>; Correspondencia Consorcio INTERPMA <correspondencia@consorciointerpma.com.co>
CC Javier Castillo <j.castillo@incoplan-proyectos.com>; Nicole Martínez <n.martinez@incoplansa.com>

1 archivo adjunto (264 KB)
FORMATO_69_PMA_Atlantico_Prorroga_20_Dic_2026_21_09_26.docx;

Cordial saludo

Remito el Formato 69 ajustado conforme al plazo establecido hasta el 20 de diciembre de 2026 para revisión. Los cambios efectuados en el documento están resaltados en color amarillo.

Quedamos pendientes para continuar con el trámite.

Muchas gracias

--

INCOPLAN
incoplansa.com

PMA ATLÁNTICO
Consorcio PMA Atlántico
Tel: 601-3179250 **Ext:** 108
Dir: Calle 70 Bis 4-60 Bogotá

Bogotá, 18 de septiembre de 2026 **2026-IN023-3235**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOs DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO".

Asunto: Plan de trabajo V3

Cordial saludo,

El "Consorcio PMA Atlántico" actualmente desarrolla el Contrato 24001332 H3 DE 2024 celebrado para realizar la Consultoría para la Elaboración del EPA de los ATOs de SKBC, SKMG y SKPL a nivel de Factibilidad; Análisis de Integración Operacional, Económica y Conectividad de Atlántico.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de prórroga del contrato (**E**l cronograma establecido en la solicitud de prórroga mantiene correspondencia con los avances alcanzados a la fecha y en este no se presenta atraso respecto de la programación proyectada), se hace necesario establecer el marco de programación asociado a la continuidad de las actividades previstas, en concordancia con los tiempos y condiciones contemplados en dicha solicitud.

El presente Plan de Trabajo se formula en respuesta y alineación directa con la solicitud de prórroga presentada para el contrato. En consecuencia, la planificación operativa, la asignación de recursos, la secuencia modular de los entregables y la estimación de tiempos de ejecución descritos a continuación toman como base oficial el cronograma de actividades proyectado en dicha solicitud de prórroga.

Este plan tiene como finalidad garantizar la continuidad técnica, la recuperación de los frentes de trabajo y el cierre a satisfacción de cada uno de los componentes y etapas del proyecto dentro del nuevo horizonte temporal propuesto.

1 ESTADO Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ETAPA II: DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO

En el marco de la ejecución de la Etapa II: Diagnóstico del Aeropuerto, y en concordancia con el cronograma soportado en la solicitud de prórroga, se presenta el avance y la programación de cierre de sus componentes:

1.1 Componentes Aprobados (C6 a C10)

A la fecha, la Consultoría ha alcanzado la aprobación formal por parte de la Interventoría de los componentes del 6 al 10, habiendo cumplido satisfactoriamente con los requerimientos técnicos y metodológicos en las siguientes fechas oficiales de cierre:

- **Componente 6** – Levantamiento topográfico mediante tecnología tradicional e inspecciones: Aprobado el 01/09/2026.
- **Componente 7** – Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico: Aprobado el 08/04/2026.
- **Componente 8** – Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria: Aprobado el 06/04/2026.
- **Componente 9** – Estudio de Diagnóstico: Aprobado el 06/04/2026.
- **Componente 10** – Estudios Operacionales: Aprobado el 27/07/2026.

1.2 Componentes en Proceso de Cierre y Estrategia de Entrega (C11 y C12)

Actualmente, la Consultoría se encuentra concentrada en la etapa final de subsanación, articulación y cierre formal de los **Componentes 11 y 12**, los cuales tienen como fecha límite oficial de aprobación en cronograma el **29/09/2026** (Fecha de aprobación e hito de cierre de los Componentes 11 y 12 y Concepto por parte de la Aerocivil).

Sin perjuicio de la fecha final consolidada de aprobación, y aplicando la estrategia de **entregas parciales y paralelización de actividades**, se han registrado y proyectado los siguientes avances para acelerar la dinámica de revisión:

- Componente 11 (Cálculo de la Capacidad Vs. Demanda):
  - **Aeropuerto Banco (SKBC):** Avance en la entrega realizado el 02 de septiembre de 2026.
  - **Aeropuertos Magangué (SKMG) y Plato (SKPL):** Radicación programada en el transcurso de la semana del 18 de septiembre de 2026.
- Componente 12 (Requisitos de las Instalaciones y Análisis de Alternativas):
  - **Atención Integral por Aeropuerto (SKBC, SKMG, SKPL):** Radicación simultánea proyectada para los tres aeropuertos en el transcurso de la semana del **18 de septiembre de 2026**.

2 ESTADO Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ETAPA III: ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

En concordancia con el cronograma soportado en la solicitud de prórroga y aplicando la metodología de avance continuo y entregas modulares, la Etapa III: Estudios de Prefactibilidad presenta el siguiente estado de avance y ruta de entregas:

2.1 Componentes Aprobados y en Proceso Final de Aprobación

- Componente 22 (Estudios Geotécnicos y Geomorfológicos): Aprobado formalmente.
- Componente 15 (Levantamiento Topográfico de Alternativas de Desarrollo): Proceso de revisión finalizado, próximo a contar con la aprobación formal por parte de la Interventoría.

2.2 Componentes Radicados (Primera Versión) y Estado de Revisión

Se cumplió con la radicación de la primera versión de los siguientes componentes en las fechas establecidas en el flujo de trabajo:

- Componente 13 (Alternativas de Desarrollo e Impactos de las Alternativas): Radicada 1.ª versión el 28/07/2026.
- Componente 16 (Estrategias de Desarrollo CAME-DOFA y AHP): Radicada 1.ª versión el 29/07/2026.
- Componente 18 (Desarrollo de Alternativa Seleccionada y Estudios Operacionales ATM/CNS): Radicada 1.ª versión el 01/09/2026.
- Componente 19 (Análisis Económico y Social del Sector Transportador): Radicada 1.ª versión el 27/07/2026.
- Componente 20 (Análisis de Impacto Urbano, Social y Conectividad Multimodal): Radicada 1.ª versión el 01/09/2026.
- Componente 21 (Propuesta Técnica y Jurídica para Infraestructuras Logísticas): Radicada 2.ª versión el 03/09/2026 formalmente para el aeropuerto de Plato.

2.3 Programación de Radicación de Segundas Versiones y Nuevos Productos

- Semana del 21 de septiembre de 2026:
  - Entrega de la segunda versión de los Componentes 13, 19 y 21 para los aeropuertos de Magangué y Banco , incorporando las observaciones atendidas en mesas técnicas.
- En evaluación por la Interventoría:
  - Los Componentes 18 y 20 se encuentran actualmente en poder de la Interventoría para emisión de conceptos y revisión de subsanaciones.

- Semana del 28 de septiembre de 2026:
  - Radicación de la segunda versión del Componente 16.
  - Radicación de la primera versión de los Componentes 17 (Requisitos operacionales) y 25 (Modelos de simulación de escenarios).

2.4 Componentes Secuenciales de Cierre (C26, C27, C28 y C14)

- Componentes 26, 27 y 28:
  - Componente 26 (Renders y Video Institucional), Componente 27 (Socialización) y Componente 28 (Documento Final y Publicación): Se proyecta su radicación entre finales de noviembre de 2026.

- Componente 14 (Presentación y Socialización de Alternativas):
  - La fecha tentativa de ejecución está prevista entre el 12 y el 23 de octubre de 2026. No obstante, la realización efectiva de estas jornadas de socialización queda sujeta a la agenda y fechas oficiales que defina la Entidad para la convocatoria de dichas reuniones.

3 ARTICULACIÓN Y PARALELIZACIÓN OPERATIVA ENTRE LAS ETAPAS III Y IV

Con el objetivo de optimizar la ruta crítica de ejecución y cumplir estrictamente con los plazos establecidos en el cronogrma de la solicitud de prórroga, la Consultoría implementará un esquema de ejecución paralela y coordinada entre la fase final de la Etapa III (Estudios de Prefactibilidad y Cierre del Plan Maestro) y el inicio de la Etapa IV (Estudios a Nivel de Factibilidad).

Esta estrategia operativa se fundamenta en los siguientes aspectos clave:

- **Aprovechamiento de Insumos Consolidados:** A medida que se obtienen los cierres técnicos y aprobaciones progresivas de los componentes de la Etapa III (tales como la caracterización de infraestructura, topografía de alternativas, estudios operacionales y definición de alternativas), estos insumos alimentan de manera inmediata las especialidades requeridas para los estudios y diseños a nivel de factibilidad (componente 29).

- **Desarrollo Concurrente:** Mientras se avanza en las actividades finales de prefactibilidad, los modelos de simulación y la consolidación del documento final y publicación (Componente 28) y las jornadas de socialización de los productos de la consultoría (Componentes 14 y 27), el equipo interdisciplinario ejecutará de manera simultánea los subcomponentes del Componente 29 (Topografía, Geología y Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, Diseños de Estructuras e Infraestructura Aeronáutica, Diseño Geométrico, Pavimentos, Redes Húmedas y Secas, Gestión Ambiental, Predial, Social, Tráfico Aeronáutico y la Integración de Modelos BIM, entre otros).

- **Mitigación de Cuellos de Botella:** La paralelización evita tiempos de espera improductivos entre la culminación de los Estudios de Prefactibilidad y el arranque formal de la Factibilidad, garantizando que el flujo de revisión de la Interventoría se mantenga activo y continuo en ambos frentes sin alterar la secuencia metodológica del contrato.

4 PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE LA ETAPA IV: FACTIBILIDAD CLAVE 3C INTERVENCIONES PAL 0-1

En estricta coherencia con la estrategia de paralelización descrita, la Etapa IV: Factibilidad Clave 3C Intervenciones PAL 0-1 se desarrollará optimizando los tiempos de respuesta e insumos procedentes de la Etapa III.

Dado que los trabajos en relación con el Componente 29 (Estudios y Diseños a Nivel de Factibilidad) se activarán de manera progresiva y coordinada con el avance del cierre del Plan Maestro, la Consultoría ratifica su compromiso de ejecutar cada uno de los subcomponentes técnicos en estricto apego a los plazos, secuencias y fechas límites estipuladas en el cronograma oficial de la solicitud de prórroga:

- **Inicio y Despliegue de Factibilidad:** Programado a partir del 30 de Julio de 2026, tras el hito de consolidación del concepto y alternativas de la Etapa II y demás insumos de la Etapa III.

- **Ejecución Interdisciplinaria Integral (Componente 29):** Desarrollo secuencial y traslapado de los 22 subcomponentes técnicos (que abarcan desde la Topografía, Geología, Hidrología, Diseños de Estructuras, Pavimentos, Redes, Gestión Ambiental, Predial y Social, hasta los Estudios de Tráfico, la Integración BIM y la Estructuración del Proceso Contractual), asegurando que las radicaciones se realicen según la ventana temporal prevista entre octubre y diciembre de 2026.

- **Hito Final de Entrega y Cierre de la Etapa IV:** Culminación y radicación de los productos de factibilidad antes del 14 de diciembre de 2026 (fecha de radicación de la Entrega COM 29), garantizando los tiempos requeridos para la revisión, observaciones y concepto final por parte de la Interventoría.

5 ESTADO Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ETAPA V: VIABILIDAD FINANCIERA Y ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA

Para la Etapa V: Viabilidad Financiera (enmarcada en el Componente 30 – Productos Financieros y Jurídicos), la Consultoría avanza conforme al esquema metodológico de estructuración legal y económica del proyecto:

5.1 Estado de Aprobaciones a la Fecha

A la fecha, se ha alcanzado la aprobación formal de dos (2) de los cinco (5) productos/entregables configurados para esta etapa, tanto en su componente jurídico como financiero:

- Producto 1 (Plan de Trabajo Jurídico y Financiero): Aprobado formalmente.

- Producto 2 (Debida Diligencia Jurídica y Financiera): Aprobado formalmente.

5.2 Estrategia de Desarrollo de los Entregables Restantes (Productos 3, 4 y 5)

Los tres (3) productos pendientes de consolidación en el frente técnico/legal y financiero correspondientes a:

- **Producto 3:** Presentación de alternativas de transacción / consultoría financiera.
- **Producto 4:** Avance de la estructuración legal y financiera.
- **Producto 5:** Estructuración legal final y conclusiones de la consultoría financiera.

Se desarrollarán bajo una estrategia de realimentación continua y ejecución conjunta con la Etapa IV.

Esta dinámica operativa se sostiene en los siguientes criterios:

- **Insumos de Productos Previos:** El desarrollo de las alternativas de transacción y la estructuración legal/financiera tomará como cimiento directo los insumos técnicos, diagnósticos y matrices ya validados en los Productos 1 y 2 (Planes de trabajo y Debidas diligencias).
- **Nutrición Multidisciplinaria desde la Factibilidad (Etapa IV):** A medida que la Etapa IV (Componente 29) genere los resultados definitivos en materia de costos, presupuestos, especificaciones, análisis prediales, ambientales, riesgos y modelos operacionales, estos datos alimentarán de manera inmediata las corridas del modelo financiero y las cláusulas de la estructuración jurídica en la Etapa V.
- **Ejecución Simultánea y Cierre Contractual:** La elaboración de los Productos 3, 4 y 5 se llevará a cabo en paralelo con los avances de la Etapa IV, garantizando que la versión final del Componente 30 se radique oportunamente (con hito en cronograma para radicación y revisión hacia diciembre de 2026) para lograr la aprobación e hito de cierre definitivo dentro del plazo contractual de la prórroga.

6 CIERRE Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El presente Plan de Trabajo ratifica el firme compromiso de la Consultoría para dar cumplimiento riguroso a la totalidad de las actividades, entregables, metodologías y dinámicas de articulación presentadas a lo largo de este documento.

Para asegurar el éxito de este proceso, la Consultoría continuará trabajando de la mano y en estrecha coordinación con la Interventoría a través de la realización constante de mesas de trabajo, reuniones técnicas de alineación y todos aquellos espacios de concertación que se consideren necesarios; esto con el propósito fundamental de sumar esfuerzos, responder oportunamente a cada requerimiento y culminar el contrato bajo los más altos estándares de calidad técnica y en pleno cumplimiento del alcance establecido

La implementación continua de las medidas de optimización (mesas técnicas de trabajo, control previo de calidad, entregas parciales por aeropuerto y desarrollo en paralelo de los componentes de las Etapas III, IV y V) garantiza que la revisión, entrega y subsanación de los productos se ejecuten de manera fluida y sin cuellos de botella técnicos.

De esta manera, la Consultoría asegura la entrega de todos los entregables establecidos en el anexo técnico de los tres aeropuertos (SKBC, SKMG y SKPL), dando cumplimiento estricto al horizonte temporal proyectado, sin atrasos en la programación, para la fecha de cierre contractual establecida al **20 de diciembre de 2026.**

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal

Anexos: 26.09.21 Cronograma de Trabajo (Solicitud de prorroga)

CC. AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Bogotá, 18 de septiembre de 2026 **2026-IN023-3235**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOs DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO".

Asunto: Plan de trabajo V3

Cordial saludo,

El "Consorcio PMA Atlántico" actualmente desarrolla el Contrato 24001332 H3 DE 2024 celebrado para realizar la Consultoría para la Elaboración del EPA de los ATOs de SKBC, SKMG y SKPL a nivel de Factibilidad; Análisis de Integración Operacional, Económica y Conectividad de Atlántico.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de prórroga del contrato (**E**l cronograma establecido en la solicitud de prórroga mantiene correspondencia con los avances alcanzados a la fecha y en este no se presenta atraso respecto de la programación proyectada), se hace necesario establecer el marco de programación asociado a la continuidad de las actividades previstas, en concordancia con los tiempos y condiciones contemplados en dicha solicitud.

El presente Plan de Trabajo se formula en respuesta y alineación directa con la solicitud de prórroga presentada para el contrato. En consecuencia, la planificación operativa, la asignación de recursos, la secuencia modular de los entregables y la estimación de tiempos de ejecución descritos a continuación toman como base oficial el cronograma de actividades proyectado en dicha solicitud de prórroga.

Este plan tiene como finalidad garantizar la continuidad técnica, la recuperación de los frentes de trabajo y el cierre a satisfacción de cada uno de los componentes y etapas del proyecto dentro del nuevo horizonte temporal propuesto.

1 ESTADO Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ETAPA II: DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO

En el marco de la ejecución de la Etapa II: Diagnóstico del Aeropuerto, y en concordancia con el cronograma soportado en la solicitud de prórroga, se presenta el avance y la programación de cierre de sus componentes:

1.1 Componentes Aprobados (C6 a C10)

A la fecha, la Consultoría ha alcanzado la aprobación formal por parte de la Interventoría de los componentes del 6 al 10, habiendo cumplido satisfactoriamente con los requerimientos técnicos y metodológicos en las siguientes fechas oficiales de cierre:

- **Componente 6** – Levantamiento topográfico mediante tecnología tradicional e inspecciones: Aprobado el 01/09/2026.
- **Componente 7** – Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico: Aprobado el 08/04/2026.
- **Componente 8** – Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria: Aprobado el 06/04/2026.
- **Componente 9** – Estudio de Diagnóstico: Aprobado el 06/04/2026.
- **Componente 10** – Estudios Operacionales: Aprobado el 27/07/2026.

1.2 Componentes en Proceso de Cierre y Estrategia de Entrega (C11 y C12)

Actualmente, la Consultoría se encuentra concentrada en la etapa final de subsanación, articulación y cierre formal de los **Componentes 11 y 12**, los cuales tienen como fecha límite oficial de aprobación en cronograma el **29/09/2026** (Fecha de aprobación e hito de cierre de los Componentes 11 y 12 y Concepto por parte de la Aerocivil).

Sin perjuicio de la fecha final consolidada de aprobación, y aplicando la estrategia de **entregas parciales y paralelización de actividades**, se han registrado y proyectado los siguientes avances para acelerar la dinámica de revisión:

- Componente 11 (Cálculo de la Capacidad Vs. Demanda):
  - **Aeropuerto Banco (SKBC):** Avance en la entrega realizado el 02 de septiembre de 2026.
  - **Aeropuertos Magangué (SKMG) y Plato (SKPL):** Radicación programada en el transcurso de la semana del 18 de septiembre de 2026.
- Componente 12 (Requisitos de las Instalaciones y Análisis de Alternativas):
  - **Atención Integral por Aeropuerto (SKBC, SKMG, SKPL):** Radicación simultánea proyectada para los tres aeropuertos en el transcurso de la semana del **18 de septiembre de 2026**.

2 ESTADO Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ETAPA III: ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

En concordancia con el cronograma soportado en la solicitud de prórroga y aplicando la metodología de avance continuo y entregas modulares, la Etapa III: Estudios de Prefactibilidad presenta el siguiente estado de avance y ruta de entregas:

2.1 Componentes Aprobados y en Proceso Final de Aprobación

- Componente 22 (Estudios Geotécnicos y Geomorfológicos): Aprobado formalmente.
- Componente 15 (Levantamiento Topográfico de Alternativas de Desarrollo): Proceso de revisión finalizado, próximo a contar con la aprobación formal por parte de la Interventoría.

2.2 Componentes Radicados (Primera Versión) y Estado de Revisión

Se cumplió con la radicación de la primera versión de los siguientes componentes en las fechas establecidas en el flujo de trabajo:

- Componente 13 (Alternativas de Desarrollo e Impactos de las Alternativas): Radicada 1.ª versión el 28/07/2026.
- Componente 16 (Estrategias de Desarrollo CAME-DOFA y AHP): Radicada 1.ª versión el 29/07/2026.
- Componente 18 (Desarrollo de Alternativa Seleccionada y Estudios Operacionales ATM/CNS): Radicada 1.ª versión el 01/09/2026.
- Componente 19 (Análisis Económico y Social del Sector Transportador): Radicada 1.ª versión el 27/07/2026.
- Componente 20 (Análisis de Impacto Urbano, Social y Conectividad Multimodal): Radicada 1.ª versión el 01/09/2026.
- Componente 21 (Propuesta Técnica y Jurídica para Infraestructuras Logísticas): Radicada 2.ª versión el 03/09/2026 formalmente para el aeropuerto de Plato.

2.3 Programación de Radicación de Segundas Versiones y Nuevos Productos

- Semana del 21 de septiembre de 2026:
  - Entrega de la segunda versión de los Componentes 13, 19 y 21 para los aeropuertos de Magangué y Banco , incorporando las observaciones atendidas en mesas técnicas.
- En evaluación por la Interventoría:
  - Los Componentes 18 y 20 se encuentran actualmente en poder de la Interventoría para emisión de conceptos y revisión de subsanaciones.

- Semana del 28 de septiembre de 2026:
  - Radicación de la segunda versión del Componente 16.
  - Radicación de la primera versión de los Componentes 17 (Requisitos operacionales) y 25 (Modelos de simulación de escenarios).

2.4 Componentes Secuenciales de Cierre (C26, C27, C28 y C14)

- Componentes 26, 27 y 28:
  - Componente 26 (Renders y Video Institucional), Componente 27 (Socialización) y Componente 28 (Documento Final y Publicación): Se proyecta su radicación entre finales de noviembre de 2026.

- Componente 14 (Presentación y Socialización de Alternativas):
  - La fecha tentativa de ejecución está prevista entre el 12 y el 23 de octubre de 2026. No obstante, la realización efectiva de estas jornadas de socialización queda sujeta a la agenda y fechas oficiales que defina la Entidad para la convocatoria de dichas reuniones.

3 ARTICULACIÓN Y PARALELIZACIÓN OPERATIVA ENTRE LAS ETAPAS III Y IV

Con el objetivo de optimizar la ruta crítica de ejecución y cumplir estrictamente con los plazos establecidos en el cronogrma de la solicitud de prórroga, la Consultoría implementará un esquema de ejecución paralela y coordinada entre la fase final de la Etapa III (Estudios de Prefactibilidad y Cierre del Plan Maestro) y el inicio de la Etapa IV (Estudios a Nivel de Factibilidad).

Esta estrategia operativa se fundamenta en los siguientes aspectos clave:

- **Aprovechamiento de Insumos Consolidados:** A medida que se obtienen los cierres técnicos y aprobaciones progresivas de los componentes de la Etapa III (tales como la caracterización de infraestructura, topografía de alternativas, estudios operacionales y definición de alternativas), estos insumos alimentan de manera inmediata las especialidades requeridas para los estudios y diseños a nivel de factibilidad (componente 29).

- **Desarrollo Concurrente:** Mientras se avanza en las actividades finales de prefactibilidad, los modelos de simulación y la consolidación del documento final y publicación (Componente 28) y las jornadas de socialización de los productos de la consultoría (Componentes 14 y 27), el equipo interdisciplinario ejecutará de manera simultánea los subcomponentes del Componente 29 (Topografía, Geología y Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, Diseños de Estructuras e Infraestructura Aeronáutica, Diseño Geométrico, Pavimentos, Redes Húmedas y Secas, Gestión Ambiental, Predial, Social, Tráfico Aeronáutico y la Integración de Modelos BIM, entre otros).

- **Mitigación de Cuellos de Botella:** La paralelización evita tiempos de espera improductivos entre la culminación de los Estudios de Prefactibilidad y el arranque formal de la Factibilidad, garantizando que el flujo de revisión de la Interventoría se mantenga activo y continuo en ambos frentes sin alterar la secuencia metodológica del contrato.

4 PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE LA ETAPA IV: FACTIBILIDAD CLAVE 3C INTERVENCIONES PAL 0-1

En estricta coherencia con la estrategia de paralelización descrita, la Etapa IV: Factibilidad Clave 3C Intervenciones PAL 0-1 se desarrollará optimizando los tiempos de respuesta e insumos procedentes de la Etapa III.

Dado que los trabajos en relación con el Componente 29 (Estudios y Diseños a Nivel de Factibilidad) se activarán de manera progresiva y coordinada con el avance del cierre del Plan Maestro, la Consultoría ratifica su compromiso de ejecutar cada uno de los subcomponentes técnicos en estricto apego a los plazos, secuencias y fechas límites estipuladas en el cronograma oficial de la solicitud de prórroga:

- **Inicio y Despliegue de Factibilidad:** Programado a partir del 30 de Julio de 2026, tras el hito de consolidación del concepto y alternativas de la Etapa II y demás insumos de la Etapa III.

- **Ejecución Interdisciplinaria Integral (Componente 29):** Desarrollo secuencial y traslapado de los 22 subcomponentes técnicos (que abarcan desde la Topografía, Geología, Hidrología, Diseños de Estructuras, Pavimentos, Redes, Gestión Ambiental, Predial y Social, hasta los Estudios de Tráfico, la Integración BIM y la Estructuración del Proceso Contractual), asegurando que las radicaciones se realicen según la ventana temporal prevista entre octubre y diciembre de 2026.

- **Hito Final de Entrega y Cierre de la Etapa IV:** Culminación y radicación de los productos de factibilidad antes del 14 de diciembre de 2026 (fecha de radicación de la Entrega COM 29), garantizando los tiempos requeridos para la revisión, observaciones y concepto final por parte de la Interventoría.

5 ESTADO Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ETAPA V: VIABILIDAD FINANCIERA Y ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA

Para la Etapa V: Viabilidad Financiera (enmarcada en el Componente 30 – Productos Financieros y Jurídicos), la Consultoría avanza conforme al esquema metodológico de estructuración legal y económica del proyecto:

5.1 Estado de Aprobaciones a la Fecha

A la fecha, se ha alcanzado la aprobación formal de dos (2) de los cinco (5) productos/entregables configurados para esta etapa, tanto en su componente jurídico como financiero:

- Producto 1 (Plan de Trabajo Jurídico y Financiero): Aprobado formalmente.

- Producto 2 (Debida Diligencia Jurídica y Financiera): Aprobado formalmente.

5.2 Estrategia de Desarrollo de los Entregables Restantes (Productos 3, 4 y 5)

Los tres (3) productos pendientes de consolidación en el frente técnico/legal y financiero correspondientes a:

- **Producto 3:** Presentación de alternativas de transacción / consultoría financiera.
- **Producto 4:** Avance de la estructuración legal y financiera.
- **Producto 5:** Estructuración legal final y conclusiones de la consultoría financiera.

Se desarrollarán bajo una estrategia de realimentación continua y ejecución conjunta con la Etapa IV.

Esta dinámica operativa se sostiene en los siguientes criterios:

- **Insumos de Productos Previos:** El desarrollo de las alternativas de transacción y la estructuración legal/financiera tomará como cimiento directo los insumos técnicos, diagnósticos y matrices ya validados en los Productos 1 y 2 (Planes de trabajo y Debidas diligencias).
- **Nutrición Multidisciplinaria desde la Factibilidad (Etapa IV):** A medida que la Etapa IV (Componente 29) genere los resultados definitivos en materia de costos, presupuestos, especificaciones, análisis prediales, ambientales, riesgos y modelos operacionales, estos datos alimentarán de manera inmediata las corridas del modelo financiero y las cláusulas de la estructuración jurídica en la Etapa V.
- **Ejecución Simultánea y Cierre Contractual:** La elaboración de los Productos 3, 4 y 5 se llevará a cabo en paralelo con los avances de la Etapa IV, garantizando que la versión final del Componente 30 se radique oportunamente (con hito en cronograma para radicación y revisión hacia diciembre de 2026) para lograr la aprobación e hito de cierre definitivo dentro del plazo contractual de la prórroga.

6 CIERRE Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El presente Plan de Trabajo ratifica el firme compromiso de la Consultoría para dar cumplimiento riguroso a la totalidad de las actividades, entregables, metodologías y dinámicas de articulación presentadas a lo largo de este documento.

Para asegurar el éxito de este proceso, la Consultoría continuará trabajando de la mano y en estrecha coordinación con la Interventoría a través de la realización constante de mesas de trabajo, reuniones técnicas de alineación y todos aquellos espacios de concertación que se consideren necesarios; esto con el propósito fundamental de sumar esfuerzos, responder oportunamente a cada requerimiento y culminar el contrato bajo los más altos estándares de calidad técnica y en pleno cumplimiento del alcance establecido

La implementación continua de las medidas de optimización (mesas técnicas de trabajo, control previo de calidad, entregas parciales por aeropuerto y desarrollo en paralelo de los componentes de las Etapas III, IV y V) garantiza que la revisión, entrega y subsanación de los productos se ejecuten de manera fluida y sin cuellos de botella técnicos.

De esta manera, la Consultoría asegura la entrega de todos los entregables establecidos en el anexo técnico de los tres aeropuertos (SKBC, SKMG y SKPL), dando cumplimiento estricto al horizonte temporal proyectado, sin atrasos en la programación, para la fecha de cierre contractual establecida al **20 de diciembre de 2026.**

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal

Anexos: 26.09.21 Cronograma de Trabajo (Solicitud de prorroga)

CC. AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
0		**CONECTIVIDAD ATLÁNTICO NORTE.**	288 days	Tue 1/07/25	Fri 18/12/26			**71%**	
1		**1 Acta de Inicio**	**0 days**	**Tue 1/07/25**	**Tue 1/07/25**		**769;770;771;772SS+1 day;781;5;6;7;8SS+1**	**0%**	
2		**2 Aeropuerto Las Flores, Banco**	**288 days**	**Tue 1/07/25**	**Fri 18/12/26**			**71%**	
3		***2.1 ETAPA I. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA***	***135,5 days***	***Tue 1/07/25***	***Mon 19/01/26***			**100%**	
57		***2.2 ETAPA II. DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.***	***200 days***	***Tue 19/08/25***	***Fri 2/10/26***			**99%**	
58		2.2.1 Componente 6 - Levantamiento topográfico método tradicional, levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del aeropuerto y modelo digital del terreno. Análisis Tecnológico Actual Versus La Tecnología Requerida para optimizar la operación Aeroportuar	128,5 days	Tue 19/08/25	Tue 24/02/26			**100%**	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
74		2.2.2 Componente 7 – Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.	118 days	Tue 19/08/25	Mon 9/02/26			**100%**	
89		2.2.3 Componente 8 - Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.	40 days	Fri 14/11/25	Thu 15/01/26			**100%**	
95		2.2.4 Componente 9 - Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de Gestión de	101 days	Tue 19/08/25	Thu 15/01/26			**100%**	
106		2.2.5 Componente 10 - Estudios Operacionales;	94 days	Tue 19/08/25	Mon 5/01/26			**100%**	
114		2.2.6 Componente 11 – Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.	65 days	Fri 14/11/25	Thu 19/02/26			**99%**	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
122		2.2.7 Componente 12 – Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas	37 days	Wed 10/12/25	Tue 3/02/26			**99%**	
130		**2.2.8 Componente 11 y 12**	**14 days**	**Thu 21/05/26**	**Fri 2/10/26**			**95%**	
135		***2.3 ETAPA III. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.***	***231 days***	***Tue 9/09/25***	***Mon 7/12/26***			**61%**	
253		***2.4 ETAPA IV. FACTIBILIDAD CLAVE "3C" - INTERVENCIONES PAL 0-1.***	***62 days***	***Thu 30/07/26***	***Mon 14/12/26***			**4%**	
254		2.4.1 Componente 29 - Estudios y diseños a nivel de Factibilidad. subcomponentes de acuerdo con el Anexo de Factibilidad	62 days	Thu 30/07/26	Mon 14/12/26			**4%**	
255		**2.4.1.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.**	62 days	Thu 30/07/26	Mon 14/12/26			**4%**	
256		**2.4.1.1.1 29.1 Topografía**	**21 days**	**Mon 5/10/26**	**Mon 2/11/26**			**25%**	
257		**2.4.1.1.1.1 29.1 Topografía**	11 days	Mon 5/10/26	Mon 19/10/26	**73;161;188FS-5 days**	**258**	25%	
258		**2.4.1.1.1.2 Entrega 29.1 Topografía**	**0 days**	**Mon 19/10/26**	**Mon 19/10/26**	**257**	**259FS+10 days;285FS-15**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
259		**2.4.1.1.1.3 Entrega - Aprobación 29.1**	**0 days**	**Mon 2/11/26**	**Mon 2/11/26**	**258FS+10 days**	**349**	0%	
260		***2.4.1.1.2 29.2 Análisis y Concepto Operacional***	**33 days**	**Wed 7/10/26**	**Fri 20/11/26**			**0%**	
261		**2.4.1.1.2.1 29.2 Análisis y Concepto Operacional**	23 days	Wed 7/10/26	Fri 6/11/26	***177FS-5 days;182;183;184;185***	**262**	0%	
262		**2.4.1.1.2.2 Entrega 29.2 Análisis y Concepto**	**0 days**	**Fri 6/11/26**	**Fri 6/11/26**	**261**	**263FS+10 days;325FS-10**	0%	
263		**2.4.1.1.2.3 Entrega - Aprobación 29.2 Análisis y Concepto Operacional**	**0 days**	**Fri 20/11/26**	**Fri 20/11/26**	**262FS+10 days**	**349**	0%	
264		**2.4.1.1.3 29.3 Estudios Prediales u Juridicos, Diligencias Prediales**	**25 days**	**Wed 7/10/26**	**Tue 10/11/26**			**0%**	
265		**2.4.1.1.3.1 29.3 Estudios Prediales u Juridicos, Diligencias Prediales**	15 days	Wed 7/10/26	Tue 27/10/26	**176FS-5 days;199FS-6 days**	**266**	0%	
266		**2.4.1.1.3.2 Entrega 29.3 Estudios Prediales u Juridicos, Diligencias**	**0 days**	**Tue 27/10/26**	**Tue 27/10/26**	**265**	**325FS-10 days;346FS-5 days;267FS+10 days**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
267		**2.4.1.1.3.3 Entrega - Aprobación 29.3 Estudios Prediales u Juridicos, Diligencias Prediales**	**0 days**	**Tue 10/11/26**	**Tue 10/11/26**	**266FS+10 days**	**349**	0%	
268		**2.4.1.1.4 29.4 Viabilidad Urbana, Diseño Urbano, Paisajismo y Arquitectura**	**37 days**	**Thu 1/10/26**	**Fri 20/11/26**			**0%**	
269		**2.4.1.1.4.1 29.4 Viabilidad Urbana, Diseño Urbano, Paisajismo y Arquitectura**	27 days	Thu 1/10/26	Fri 6/11/26	**177FS-9 days;193;200FS-9 days**	**270**	0%	
270		**2.4.1.1.4.2 Entrega 29.4 Viabilidad Urbana, Diseño Urbano, Paisajismo y**	**0 days**	**Fri 6/11/26**	**Fri 6/11/26**	**269**	**271FS+10 days;285FS-15 days;305FS-15**	0%	
271		**2.4.1.1.4.3 Entrega - Aprobación 29.4 Viabilidad Urbana, Diseño Urbano, Paisajismo y**	**0 days**	**Fri 20/11/26**	**Fri 20/11/26**	**270FS+10 days**	**349**	0%	
272		**2.4.1.1.5 29.5 Geología y Geotecnia**	**25 days**	**Mon 5/10/26**	**Fri 6/11/26**			**25%**	
273		2.4.1.1.5.1 29.5 Geología y Geotecnia	15 days	Mon 5/10/26	Fri 23/10/26	177FS-7 days;216	**274**	25%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
274		**2.4.1.1.5.2 Entrega 29.5 Geología y Geotecnia**	**0 days**	**Fri 23/10/26**	**Fri 23/10/26**	**273**	**275FS+10 days;285FS-15**	0%	
275		**2.4.1.1.5.3 Entrega - Aprobación 29.5 Geología**	**0 days**	**Fri 6/11/26**	**Fri 6/11/26**	**274FS+10 days**	**349**	0%	
276		**2.4.1.1.6 29.6 Meteorología**	**25 days**	**Mon 5/10/26**	**Fri 6/11/26**			**0%**	
277		**2.4.1.1.6.1 29.6 Meteorología**	15 days	Mon 5/10/26	Fri 23/10/26	***107;177FS-7 days;182;183;184;185***	**278**	0%	
278		**2.4.1.1.6.2 Entrega 29.6 Meteorología**	**0 days**	**Fri 23/10/26**	**Fri 23/10/26**	**277**	**279FS+10 days;325FS-10**	0%	
279		**2.4.1.1.6.3 Entrega - Aprobación 29.6**	**0 days**	**Fri 6/11/26**	**Fri 6/11/26**	**278FS+10 days**	**349**	0%	
280		**2.4.1.1.7 29.7 Hidrología, Hidráulica, Hidrogeología y Socavación**	**36 days**	**Mon 5/10/26**	**Mon 23/11/26**			**0%**	
281		**2.4.1.1.7.1 29.7 Hidrología, Hidráulica, Hidrogeología y**	26 days	Mon 5/10/26	Mon 9/11/26	**172FS-7 days;174FS-7 days;199FS-5 days**	**282**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
282		2.4.1.1.7.2 Entrega 29.6 29.7 Hidrología, Hidráulica, Hidrogeología y Socavación	0 days	Mon 9/11/26	Mon 9/11/26	281	283FS+10 days;325FS-10 days;346FS-5 days	0%	
283		2.4.1.1.7.3 Entrega - Aprobación 29.7 Hidrología, Hidráulica, Hidrogeología y	0 days	Mon 23/11/26	Mon 23/11/26	282FS+10 days	349	0%	
284		**2.4.1.1.8 29.8 Diseños de Estructuras e Infraestructura Aeronáutica**	**30 days**	**Mon 19/10/26**	**Fri 27/11/26**			**0%**	
285		**2.4.1.1.8.1 29.8 Diseños de Estructuras e Infraestructura Aeronáutica**	20 days	Mon 19/10/26	Fri 13/11/26	**258FS-15 days;270FS-15 days;274FS-15 days**	**286**	0%	
286		2.4.1.1.8.2 Entrega 29.6 29.8 Diseños de Estructuras e Infraestructura	0 days	Fri 13/11/26	Fri 13/11/26	285	287FS+10 days;325FS-20 days;346FS-15 days	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
287		**2.4.1.1.8.3 Entrega - Aprobación 29.8 Diseños de Estructuras e Infraestructura**	**0 days**	**Fri 27/11/26**	**Fri 27/11/26**	**286FS+10 days**	**349**	0%	
288		**2.4.1.1.9 29.9 Diseño geométrico**	**26 days**	**Tue 29/09/26**	**Tue 3/11/26**			**0%**	
289		**2.4.1.1.9.1 29.9 Diseño geométrico**	16 days	Tue 29/09/26	Tue 20/10/26	**258FS-15 days**	**290**	0%	
290		**2.4.1.1.9.2 Entrega 29.6 29.9 Diseño geométrico**	**0 days**	**Tue 20/10/26**	**Tue 20/10/26**	**289**	**291FS+10 days;325FS-20**	0%	
291		**2.4.1.1.9.3 Entrega - Aprobación 29.9 Diseño**	**0 days**	**Tue 3/11/26**	**Tue 3/11/26**	**290FS+10 days**	**349**	0%	
292		**2.4.1.1.10 29.10 Diseño de Pavimentos**	**33 days**	**Wed 21/10/26**	**Fri 4/12/26**			**25%**	
293		**2.4.1.1.10.1 29.10 Diseño de Pavimentos**	23 days	Wed 21/10/26	Fri 20/11/26	**290**	**294**	25%	
294		**2.4.1.1.10.2 Entrega 29.6 29.10 Diseño de**	**0 days**	**Fri 20/11/26**	**Fri 20/11/26**	**293**	**295FS+10 days;325FS-20**	0%	
295		**2.4.1.1.10.3 Entrega - Aprobación 29.10 Diseño de Pavimentos**	**0 days**	**Fri 4/12/26**	**Fri 4/12/26**	**294FS+10 days**	**349**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
296		**2.4.1.1.11 29.11 Diseño de Redes Húmedas**	**28 days**	**Mon 19/10/26**	**Wed 25/11/26**			**0%**	
297		**2.4.1.1.11.1 29.11 Diseño de Redes Húmedas**	18 days	Mon 19/10/26	Wed 11/11/26	**258FS-15 days;270FS-15**	**298**	0%	
298		**2.4.1.1.11.2 Entrega 29.11 Diseño de Redes Húmedas**	**0 days**	**Wed 11/11/26**	**Wed 11/11/26**	**297**	**299FS+10 days;325FS-20**	0%	
299		**2.4.1.1.11.3 Entrega - Aprobación 29.11 Diseño de Redes Húmedas**	**0 days**	**Wed 25/11/26**	**Wed 25/11/26**	**298FS+10 days**	**349**	0%	
300		**2.4.1.1.12 29.12 Diseño de Redes Secas**	**28 days**	**Mon 19/10/26**	**Wed 25/11/26**			**0%**	
301		**2.4.1.1.12.1 29.12 Diseño de Redes Secas**	18 days	Mon 19/10/26	Wed 11/11/26	**258FS-15 days;270FS-15 days**	**302**	0%	
302		**2.4.1.1.12.2 Entrega 29.6 29.12 Diseño de Redes**	**0 days**	**Wed 11/11/26**	**Wed 11/11/26**	**301**	**303FS+10 days;325FS-20**	0%	
303		**2.4.1.1.12.3 Entrega - Aprobación 29.12 Diseño de Redes Secas**	**0 days**	**Wed 25/11/26**	**Wed 25/11/26**	**302FS+10 days**	**349**	0%	
304		**2.4.1.1.13 29.13 Equipos Eléctrico y Electromecanicos**	**28 days**	**Mon 19/10/26**	**Wed 25/11/26**			**0%**	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
305		**2.4.1.1.13.1 29.13 Equipos Eléctrico y**	18 days	Mon 19/10/26	Wed 11/11/26	**258FS-15 days;270FS-15 days**	**306**	0%	
306		**2.4.1.1.13.2 Entrega 29.6 29.13 Equipos Eléctrico y Electromecanicos**	**0 days**	**Wed 11/11/26**	**Wed 11/11/26**	**305**	**307FS+10 days;325FS-20 days;346FS-15 days**	0%	
307		**2.4.1.1.13.3 Entrega - Aprobación 29.13 Equipos Eléctrico y**	**0 days**	**Wed 25/11/26**	**Wed 25/11/26**	**306FS+10 days**	**349**	0%	
308		**2.4.1.1.14 29. 14 Gestión Ambiental para estudios y**	**34 days**	**Wed 14/10/26**	**Mon 30/11/26**			**0%**	
309		**2.4.1.1.14.1 29. 14 Gestión Ambiental para estudios y diseños**	24 days	Wed 14/10/26	Mon 16/11/26	**174;199;216**	**310**	0%	
310		**2.4.1.1.14.2 Entrega 29.14 Gestión Ambiental para estudios y diseños**	**0 days**	**Mon 16/11/26**	**Mon 16/11/26**	**309**	**311FS+10 days;325FS-20 days;346FS-15 days**	0%	
311		**2.4.1.1.14.3 Entrega - Aprobación 29. 14 Gestión Ambiental para estudios y diseños**	**0 days**	**Mon 30/11/26**	**Mon 30/11/26**	**310FS+10 days**	**349**	0%	
312		**2.4.1.1.15 29.15 Seguridad y Salud en el Trabajo**	**20 days**	**Tue 20/10/26**	**Mon 16/11/26**			**0%**	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
313		**2.4.1.1.15.1 29.15 Seguridad y Salud en el**	10 days	Tue 20/10/26	Mon 2/11/26	**172;230**	**314**	0%	
314		**2.4.1.1.15.2 Entrega 29.14 29.15 Seguridad y Salud en el Trabajo**	**0 days**	**Mon 2/11/26**	**Mon 2/11/26**	**313**	**315FS+10 days;325FS-20 days;346FS-5 days**	0%	
315		**2.4.1.1.15.3 Entrega - Aprobación 29.15 Seguridad y Salud en el**	**0 days**	**Mon 16/11/26**	**Mon 16/11/26**	**314FS+10 days**	**349**	0%	
316		**2.4.1.1.16 29.16 Gestión Social**	**34 days**	**Wed 14/10/26**	**Mon 30/11/26**			**0%**	
317		**2.4.1.1.16.1 29.16 Gestión Social**	24 days	Wed 14/10/26	Mon 16/11/26	**175;193;199**	**318**	0%	
318		**2.4.1.1.16.2 Entrega 29.16 Gestión Social**	**0 days**	**Mon 16/11/26**	**Mon 16/11/26**	**317**	**319FS+10 days;325FS-20**	0%	
319		**2.4.1.1.16.3 Entrega - Aprobación 29.16 Gestión**	**0 days**	**Mon 30/11/26**	**Mon 30/11/26**	**318FS+10 days**	**349**	0%	
320		**2.4.1.1.17 29.17 Estudios de Tráfico Aeronáutico y Aeroportuario**	**38 days**	**Wed 14/10/26**	**Fri 4/12/26**			**0%**	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
321		**2.4.1.1.17.1 29.17 Estudios de Tráfico Aeronáutico y**	28 days	Wed 14/10/26	Fri 20/11/26	**177;182;183;184**	**322**	0%	
322		**2.4.1.1.17.2 Entrega 29.17 Estudios de Tráfico Aeronáutico y**	**0 days**	**Fri 20/11/26**	**Fri 20/11/26**	**321**	**323FS+10 days;325FS-20 days;346FS-15 days**	0%	
323		**2.4.1.1.17.3 Entrega - Aprobación 29.17 Estudios de Tráfico Aeronáutico y**	**0 days**	**Fri 4/12/26**	**Fri 4/12/26**	**322FS+10 days**	**349**	0%	
324		**2.4.1.1.18 29.18 Especificaciones, Cronograma, Programación y Presupuesto**	**25 days**	**Tue 27/10/26**	**Mon 30/11/26**			**0%**	
325		**2.4.1.1.18.1 29.18 Especificaciones, Cronograma, Programación y**	15 days	Tue 27/10/26	Mon 16/11/26	**258FS-10 days;262FS-10 days;266FS-10 days;270FS-10**	**326**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
326		**2.4.1.1.18.2 Entrega 29.18 Especificaciones, Cronograma, Programación y Presupuesto**	**0 days**	**Mon 16/11/26**	**Mon 16/11/26**	**325**	**327FS+10 days**	0%	
327		**2.4.1.1.18.3 Entrega - Aprobación 29.18 Especificaciones, Cronograma, Programación y**	**0 days**	**Mon 30/11/26**	**Mon 30/11/26**	**326FS+10 days**	**349**	0%	
328		**2.4.1.1.19 29.19 Gestión de Riesgos**	**25 days**	**Tue 3/11/26**	**Mon 7/12/26**			**0%**	
329		**2.4.1.1.19.1 29.19 Gestión de Riesgos**	15 days	Tue 3/11/26	Mon 23/11/26	**172;230FS+10 days**	**330**	0%	
330		**2.4.1.1.19.2 Entrega 29.19 Gestión de Riesgos**	**0 days**	**Mon 23/11/26**	**Mon 23/11/26**	**329**	**331FS+10 days**	0%	
331		**2.4.1.1.19.3 Entrega - Aprobación 29.19 Gestión de Riesgos**	**0 days**	**Mon 7/12/26**	**Mon 7/12/26**	**330FS+10 days**	**349**	0%	
332		**2.4.1.1.20 29.20 Integración BIM**	**62 days**	**Thu 30/07/26**	**Mon 14/12/26**			**7%**	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
333		2.4.1.1.20.1 Modelo LOD 100 Condiciones Existentes	9 days	Thu 30/07/26	Wed 30/09/26	*158FS+3 days*	334	95%	
334		**2.4.1.1.20.2 Modelo LOD 100 Condiciones Existentes**	**0 days**	**Wed 30/09/26**	**Wed 30/09/26**	**333**		0%	
335		2.4.1.1.20.3 Modelos 3D a nivel de factibilidad	35 days	Tue 29/09/26	Mon 16/11/26	161		0%	
336		2.4.1.1.20.4 Modelo federado	35 days	Tue 29/09/26	Mon 16/11/26	161	337;340	0%	
337		**2.4.1.1.20.5 Entrega Modelos a nivel de factibilidad**	**0 days**	**Mon 16/11/26**	**Mon 16/11/26**	**336**		0%	
338		2.4.1.1.20.6 Simulación (unica versión a terminación del contrato)	50 days	Tue 29/09/26	Mon 7/12/26	161	340FS+5 days;339	0%	
339		**2.4.1.1.20.7 Simulación (unica versión a terminación del contrato)**	**0 days**	**Mon 7/12/26**	**Mon 7/12/26**	**338**		0%	
340		**2.4.1.1.20.8 Entrega - Aprobación 29.20**	**0 days**	**Mon 14/12/26**	**Mon 14/12/26**	**336;338FS+5 days**	**349**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

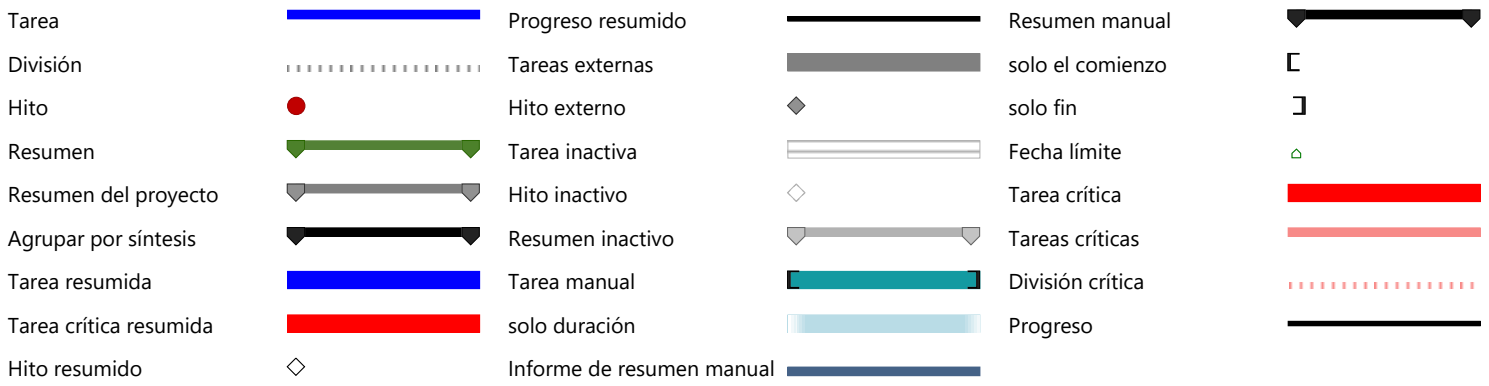

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
341		**2.4.1.1.21 29.21 Estructuración Integral del Proceso contractual**	**20 days**	**Tue 10/11/26**	**Mon 7/12/26**			**0%**	
342		**2.4.1.1.21.1 29.21 Estructuración Integral del Proceso contractual**	10 days	Tue 10/11/26	Mon 23/11/26	**249FS-15 days**	**343**	0%	
343		**2.4.1.1.21.2 Entrega 29.21 Estructuración Integral del Proceso contractual**	**0 days**	**Mon 23/11/26**	**Mon 23/11/26**	**342**	**344FS+10 days**	0%	
344		**2.4.1.1.21.3 Entrega - Aprobación 29.21 Estructuración Integral del Proceso contractual**	**0 days**	**Mon 7/12/26**	**Mon 7/12/26**	**343FS+10 days**	**349**	0%	
345		**2.4.1.1.22 29.22 Estudios y Diseños para la Seguridad de la Aviación Civil**	**18 days**	**Tue 3/11/26**	**Thu 26/11/26**			**0%**	
346		**2.4.1.1.22.1 29.22 Estudios y Diseños para la Seguridad de la Aviación Civil**	8 days	Tue 3/11/26	Thu 12/11/26	**258FS-5 days;262FS-5 days;266FS-5 days;270FS-5 days;274FS-5**	**347**	0%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
347		**2.4.1.1.22.2 Entrega 29.22 Estudios y Diseños para la Seguridad de la Aviación Civil**	**0 days**	**Thu 12/11/26**	**Thu 12/11/26**	**346**	**348FS+10 days**	0%	
348		**2.4.1.1.22.3 Entrega - Aprobación 29.22 Estudios y Diseños para la Seguridad de la Aviación Civil**	**0 days**	**Thu 26/11/26**	**Thu 26/11/26**	**347FS+10 days**	**349**	0%	
349		**2.4.1.2 Entrega - Aprobación COM 29**	**0 days**	**Mon 14/12/26**	**Mon 14/12/26**	***259;263;267;271;275;27***	**1148**	**0%**	
350		***2.5 ETAPA V. VIABILIDAD FINANCIERA***	***170 days***	***Mon 22/12/25***	***Fri 18/12/26***			**42%**	
351		2.5.1 Componente 30 Productos financieros y jurídicos.	170 days	Mon 22/12/25	Fri 18/12/26			**42%**	
352		**2.5.1.1 Componente Jurídico**	**166 days**	**Mon 22/12/25**	**Mon 14/12/26**			**42%**	
353		2.5.1.1.1 Producto 1. Plan de trabajo	17 days	Mon 22/12/25	Fri 16/01/26	26FS+27 days	354;364FS-15 days;382;383	100%	
354		2.5.1.1.2 Producto 2. Debida diligencia Jurídica	15 days	Mon 19/01/26	Fri 6/02/26	353	364FS-10 days;382;383	100%	

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
355		**2.5.1.1.3 Producto 3. Presentación de alternativas de transacción**	**34 days**	**Wed 14/10/26**	**Mon 30/11/26**			**0%**	
359		**2.5.1.1.4 Producto 4. Avance de la estructuración legal**	**20 days**	**Tue 17/11/26**	**Mon 14/12/26**			**0%**	
363		**2.5.1.1.5 Producto 5. Estructuración legal**	**20 days**	**Tue 17/11/26**	**Mon 14/12/26**			**0%**	
367		**2.5.1.2 Componente Financiero**	**166 days**	**Mon 22/12/25**	**Mon 14/12/26**			**42%**	
368		2.5.1.2.1 Producto 1. Plan de trabajo	17 days	Mon 22/12/25	Fri 16/01/26	26FS+27 days	356;369;371;379FS-15 days;382;383	100%	
369		2.5.1.2.2 Producto 2. Debida diligencia Financiera	15 days	Mon 19/01/26	Fri 6/02/26	368	356;371;379FS-10 days;382;383	100%	
370		*2.5.1.2.3 Producto 3. Presentación de alternativas de transacción*	**34 days**	**Wed 14/10/26**	**Mon 30/11/26**			0%	
374		**2.5.1.2.4 Producto 4. Avance de la consultoría**	**20 days**	**Tue 17/11/26**	**Mon 14/12/26**			**0%**	
378		**2.5.1.2.5 Producto 5. Conclusiones de la consultoría financiera**	**20 days**	**Tue 17/11/26**	**Mon 14/12/26**			**0%**	


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	% Complete	May
382		2.5.1.3 Entrega COM 30	0 days	Mon 30/11/26	Mon 30/11/26	353;354;357;361;365;3€		0%	
383		2.5.1.4 Entrega - Aprobación COM 30	0 days	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	353;354;358;362;366;3€ days	1148	0%	
384		**3 Aeropuerto Baracoa, Magangué**	**288 days**	**Tue 1/07/25**	**Fri 18/12/26**			**71%**	
766		**4 Aeropuerto Las Mercedes, Plato**	**288 days**	**Tue 1/07/25**	**Fri 18/12/26**			**71%**	
1148		5 Acta de Recibo Final	0 days	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	773;779;784;790;796;8(		0%	


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

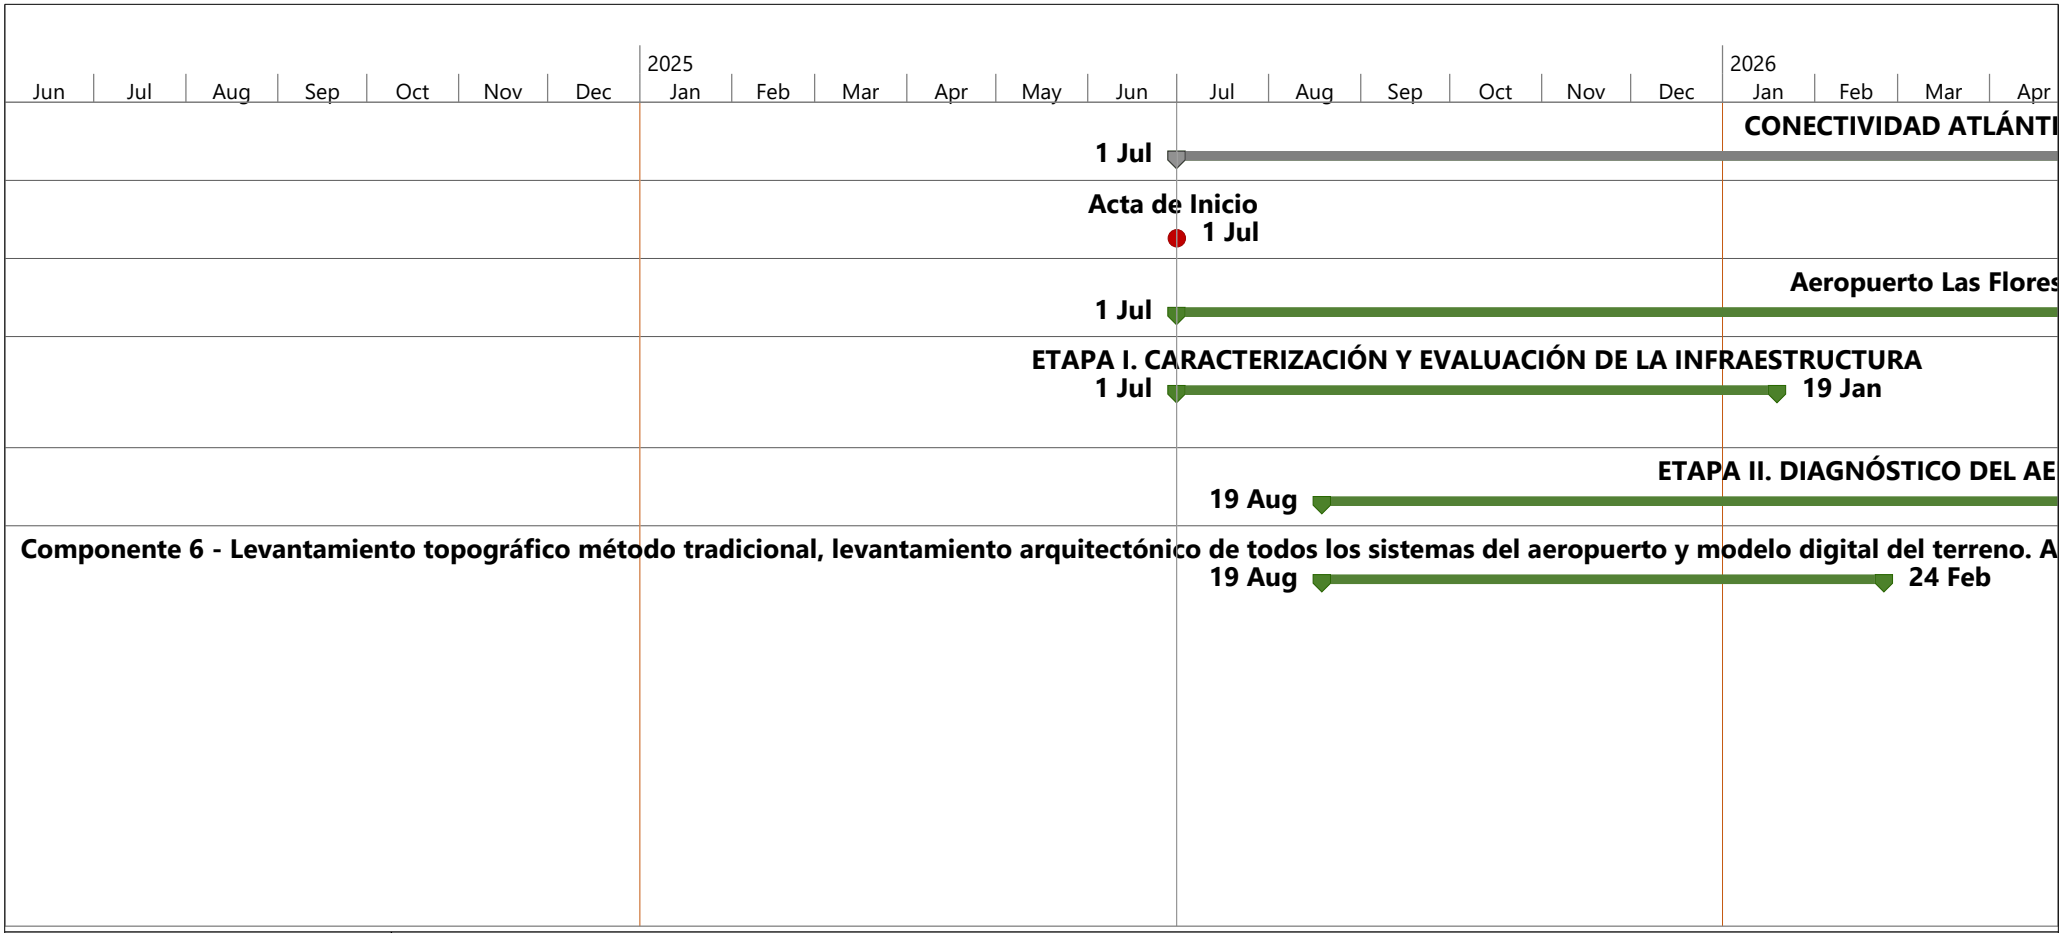


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

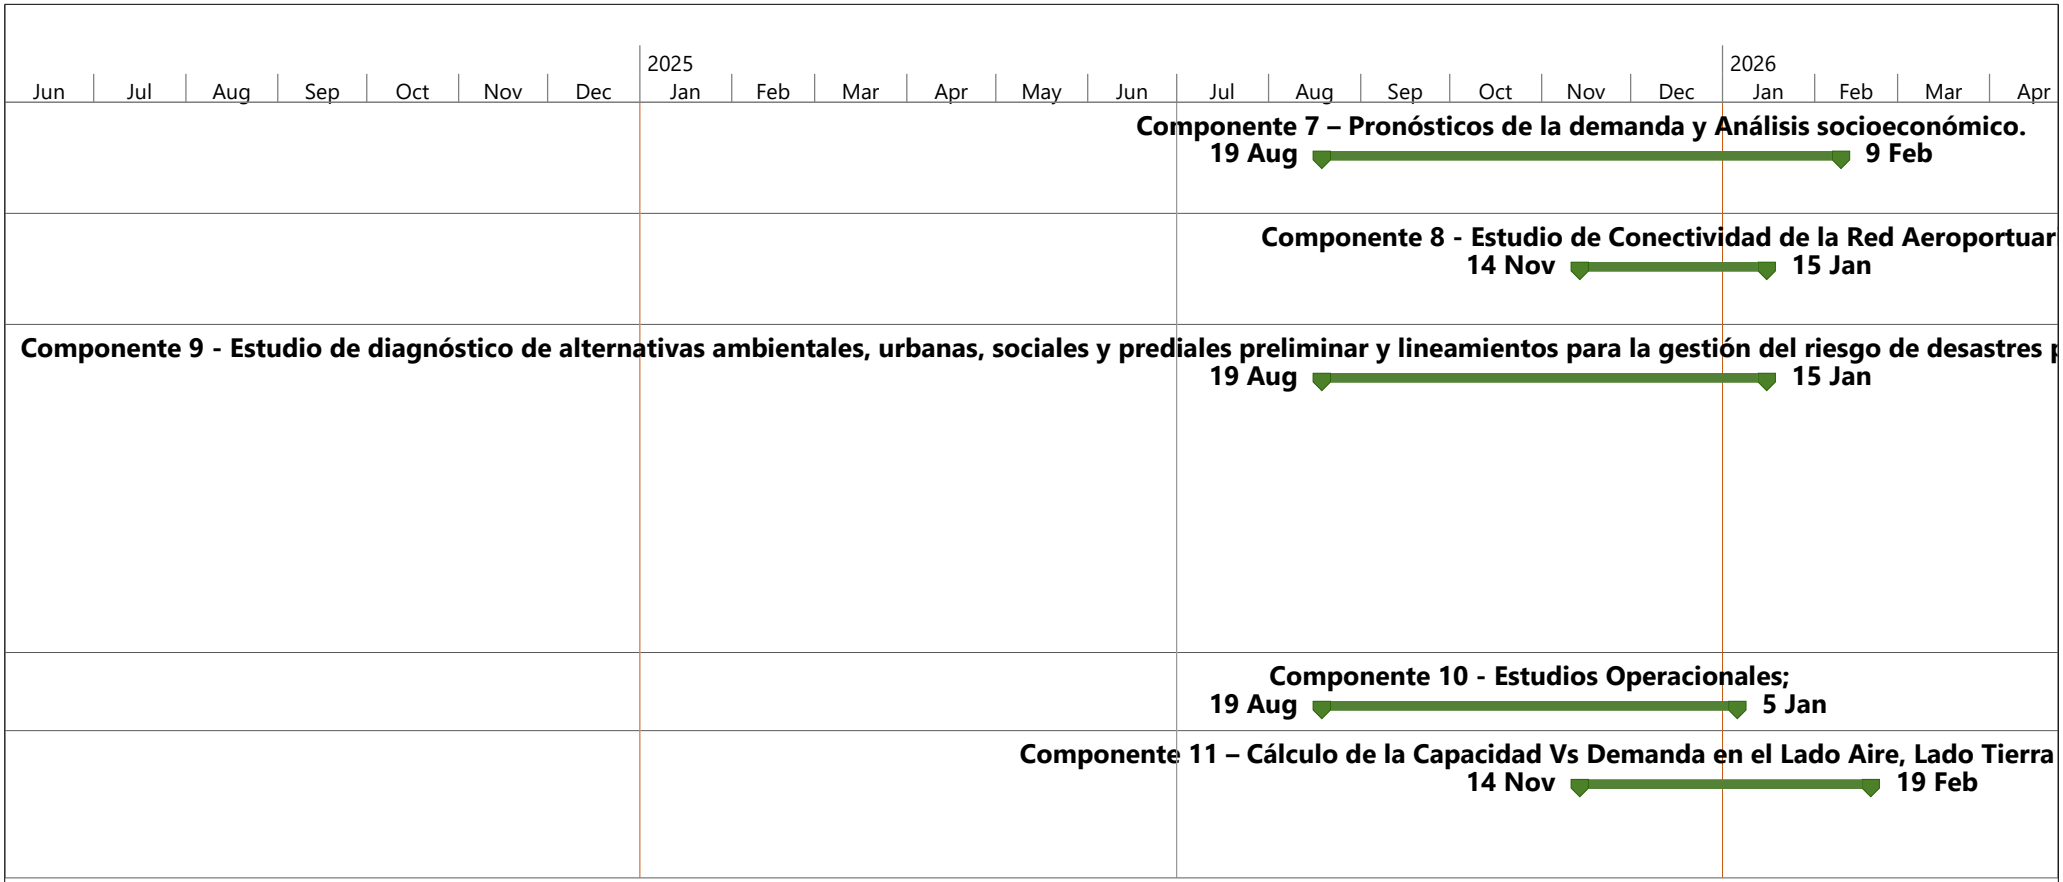


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

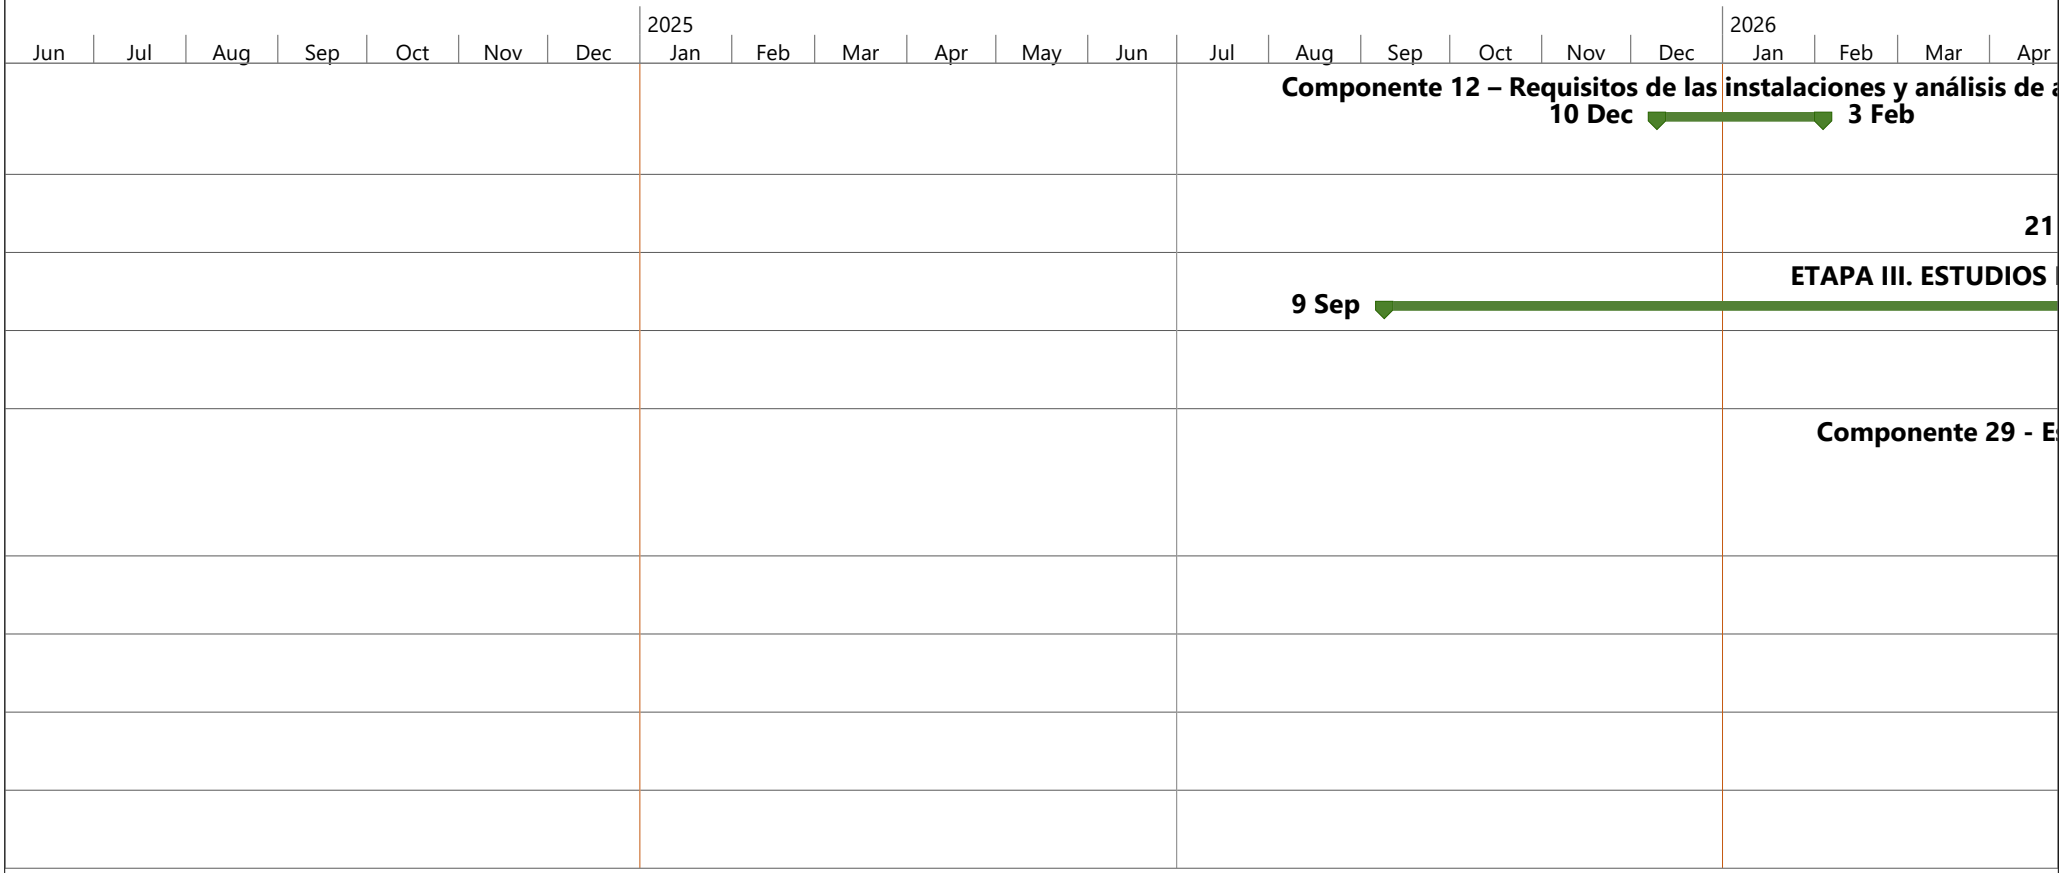


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

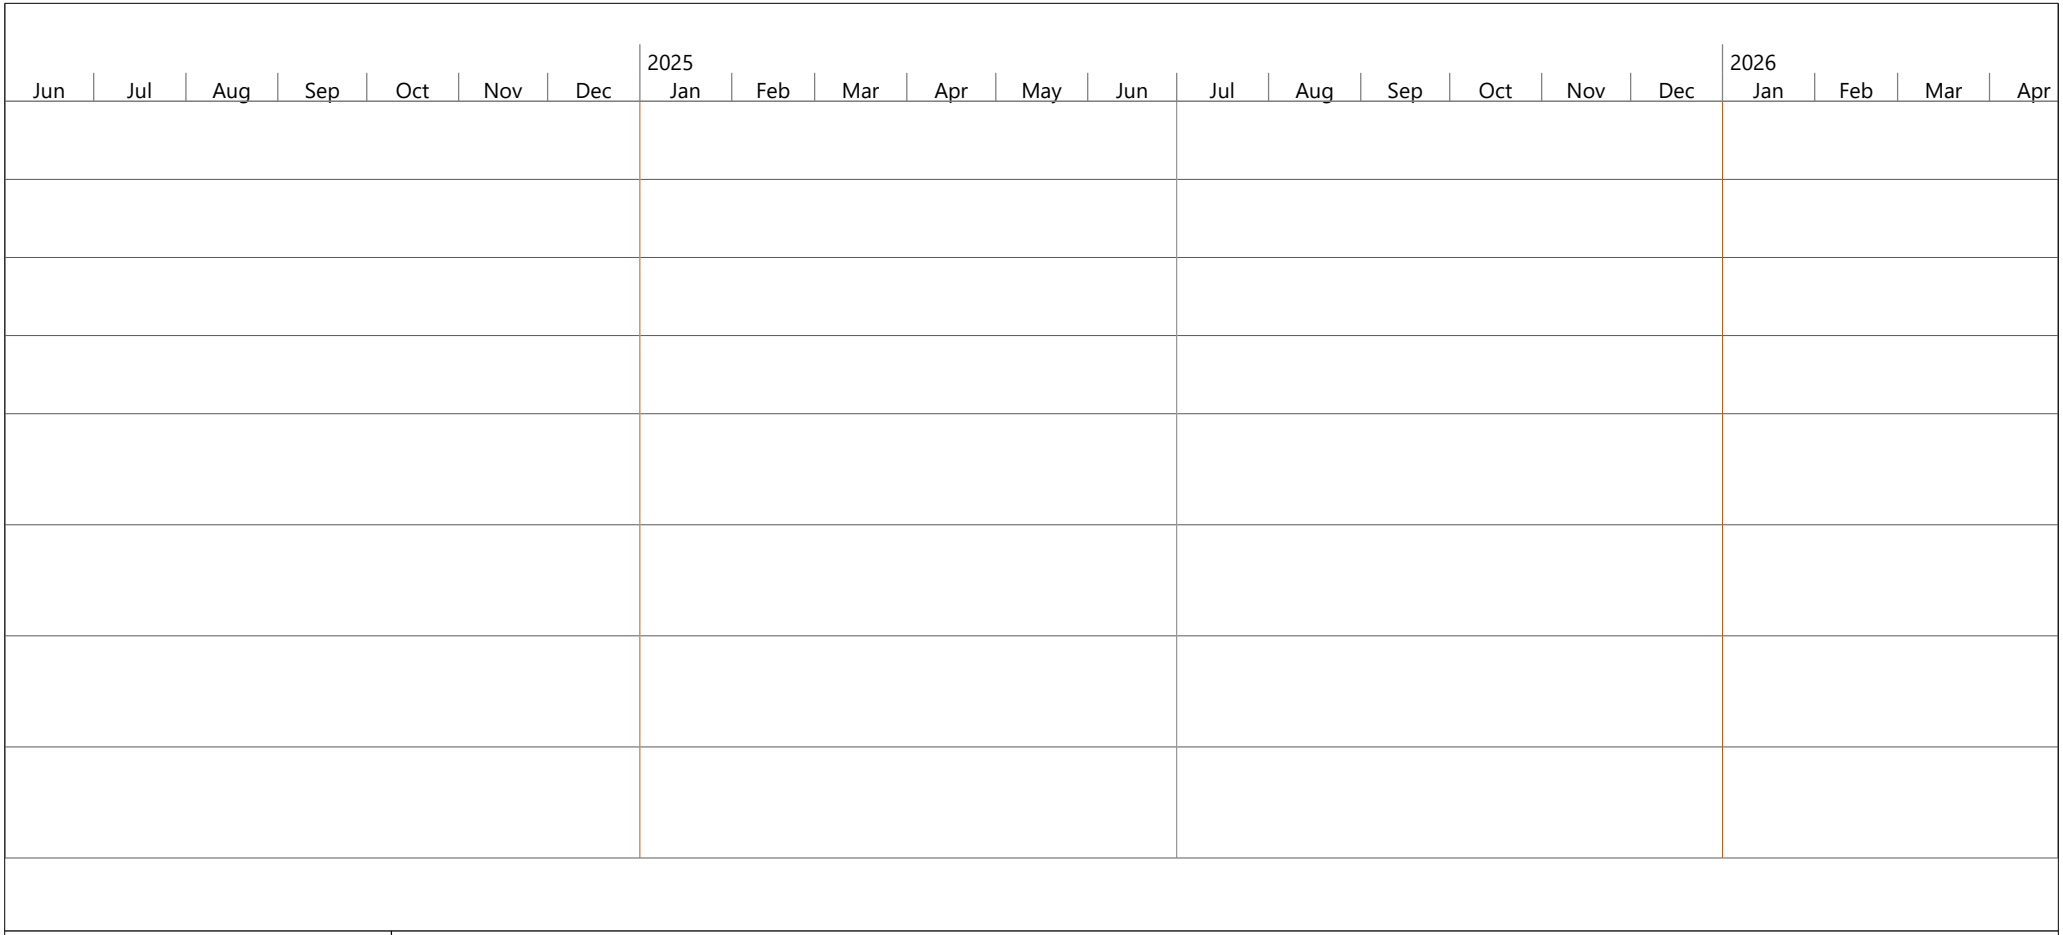

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

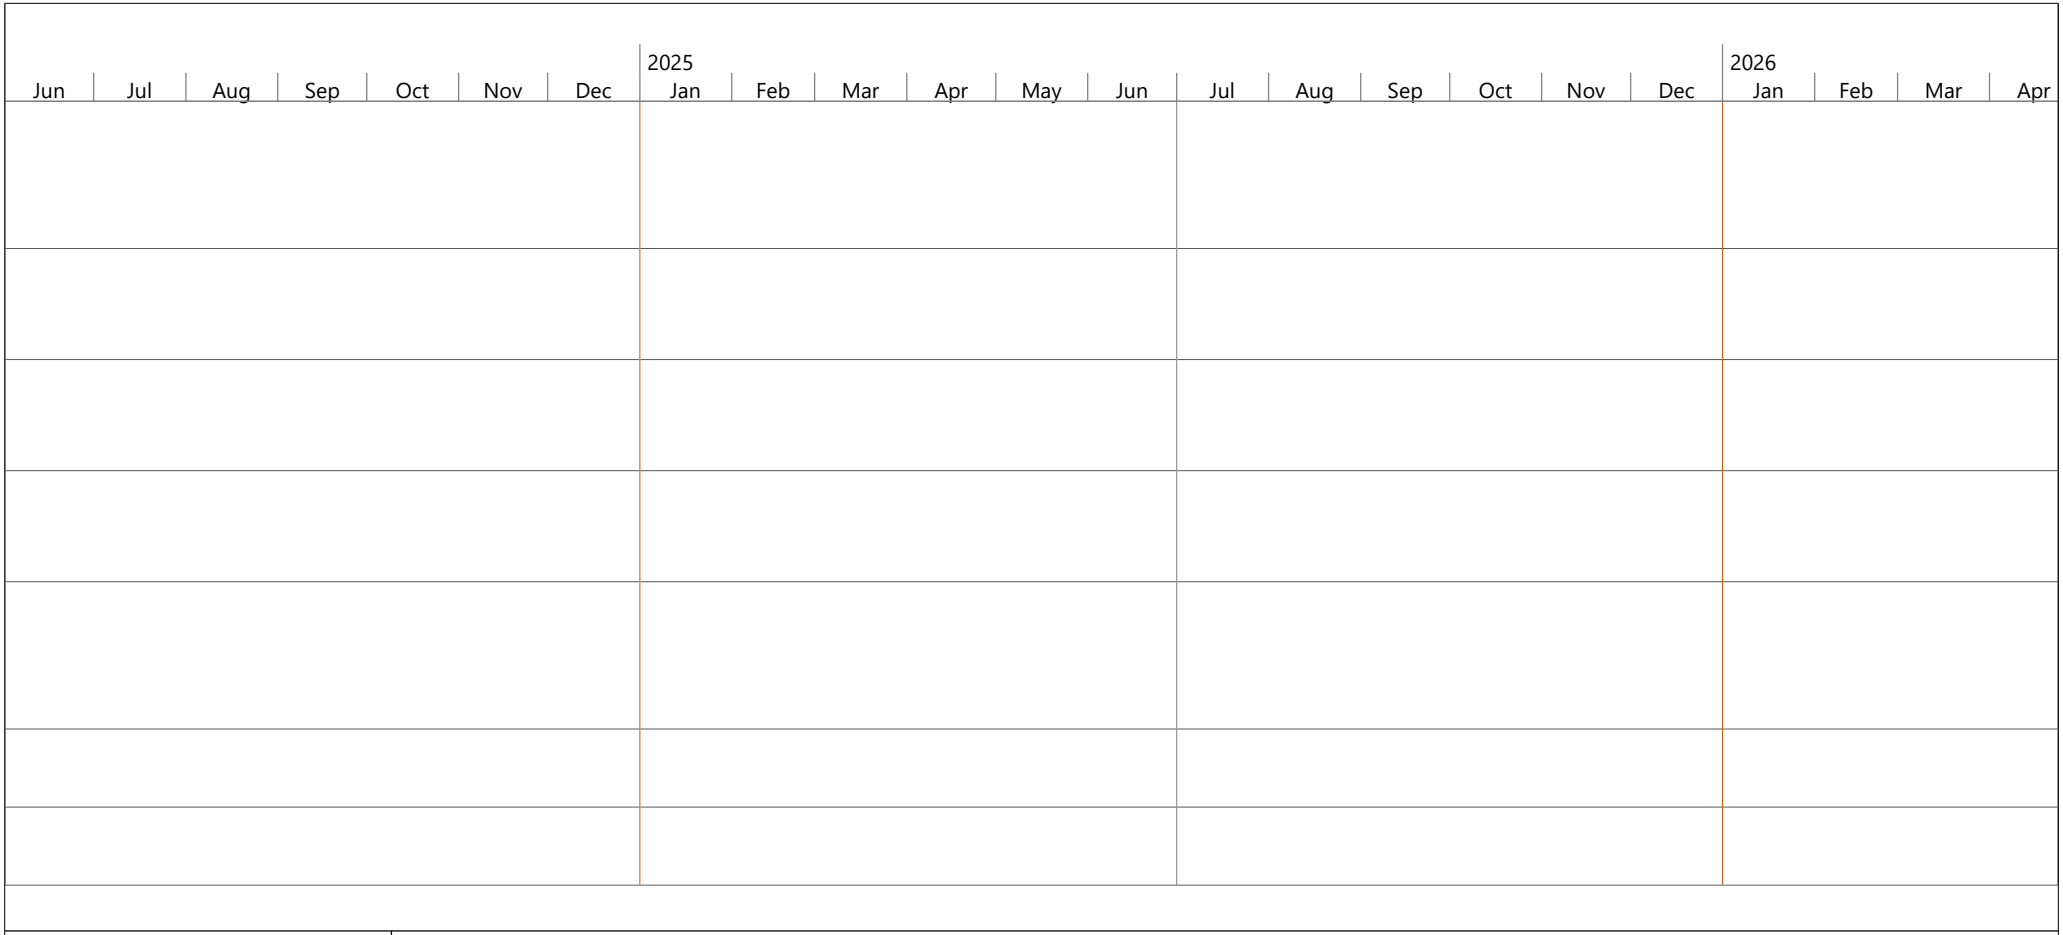

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			




Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			




Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

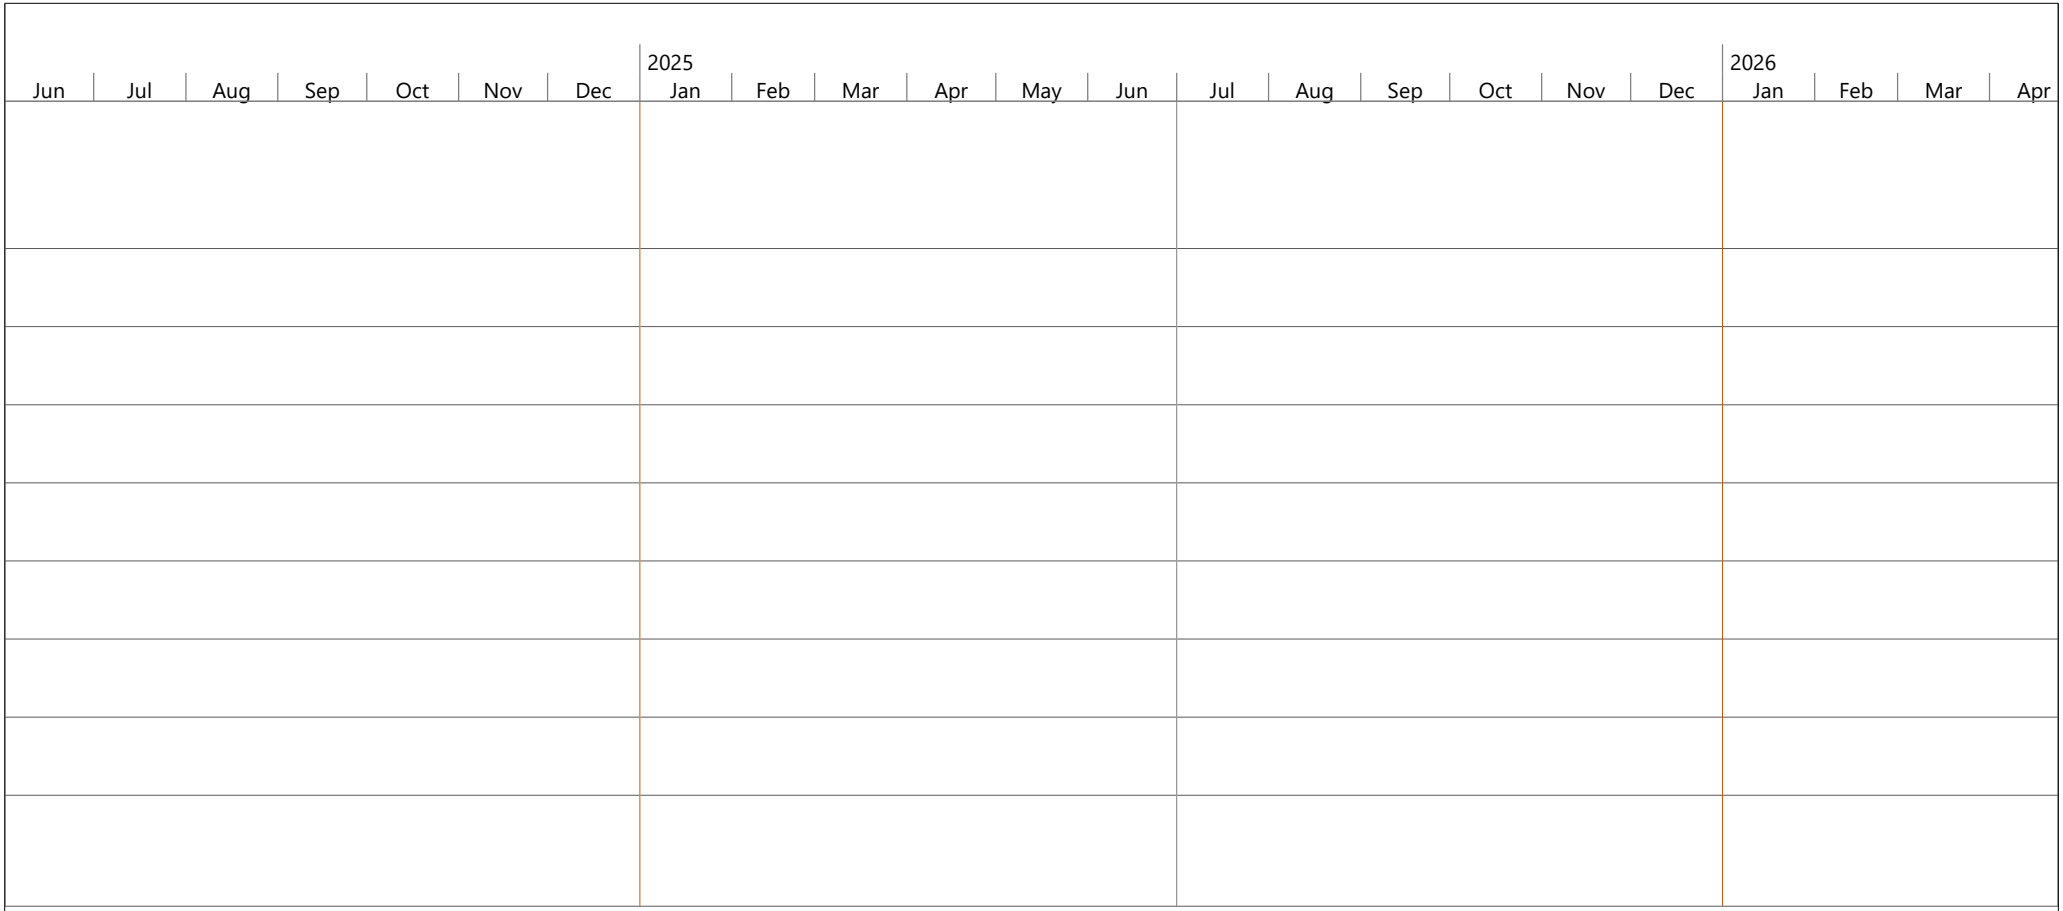


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

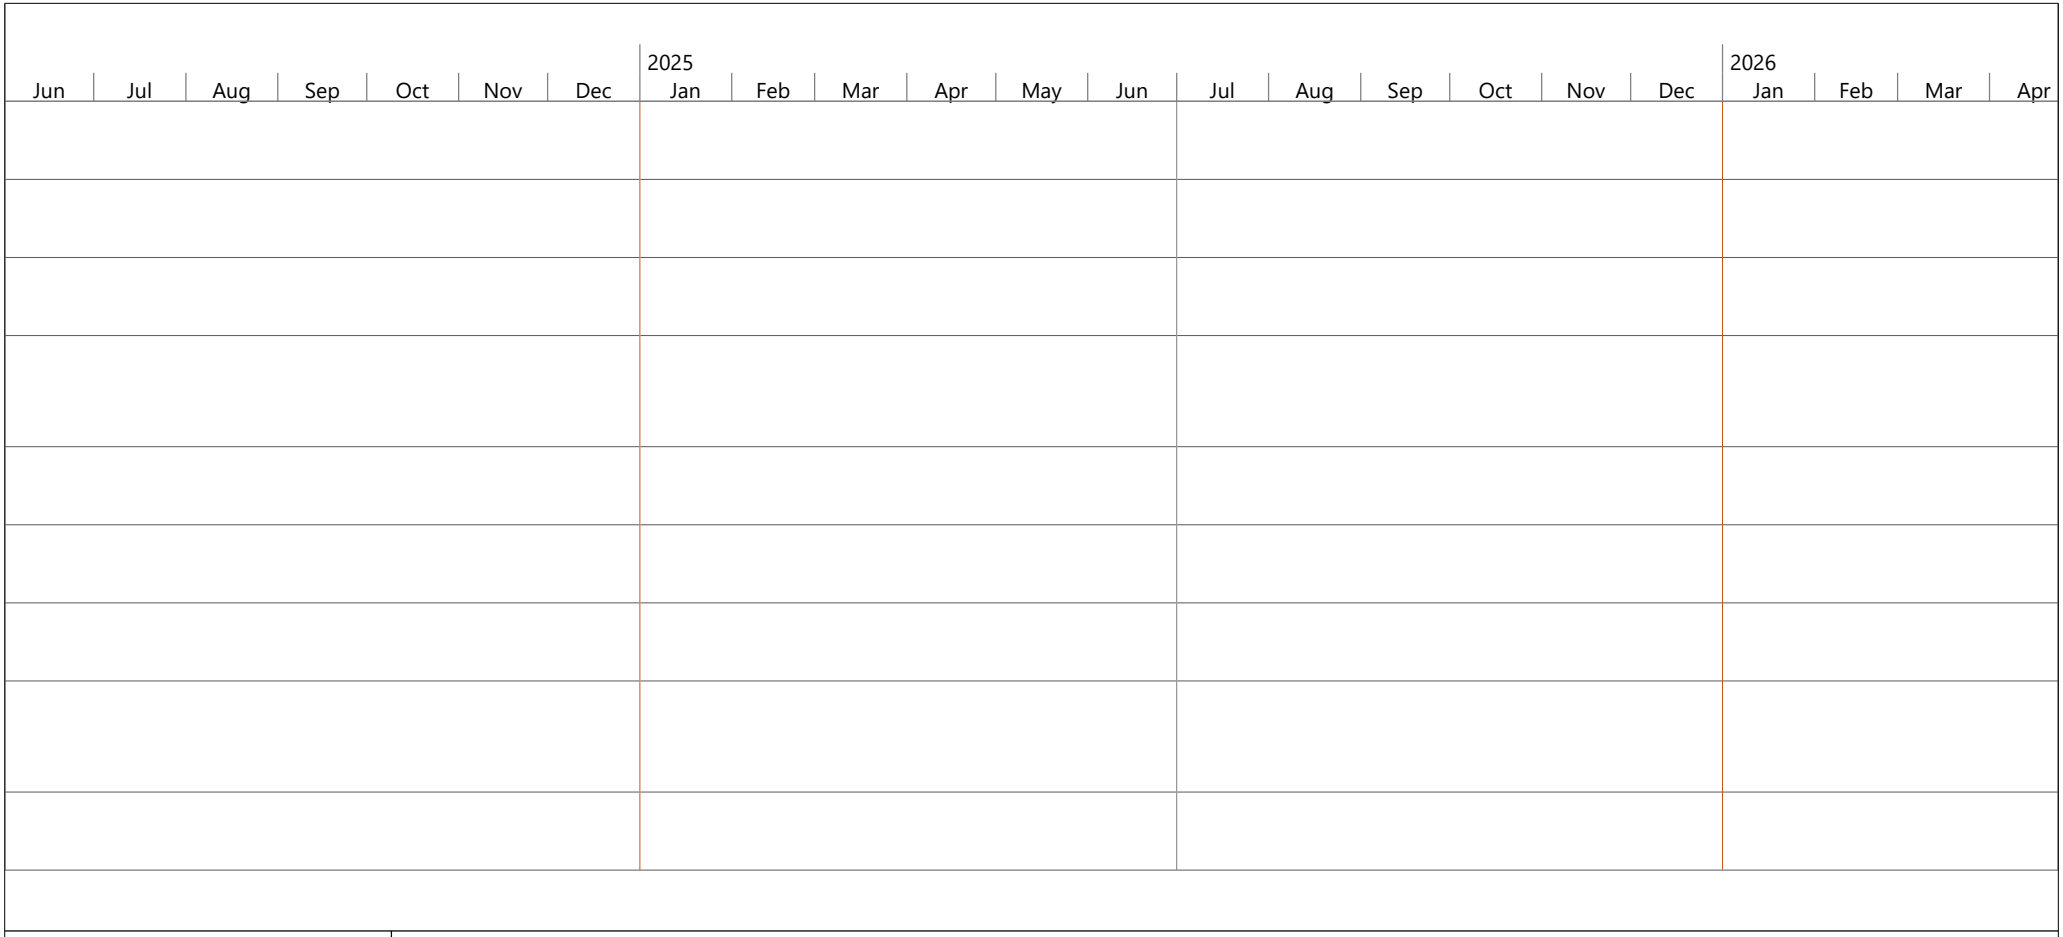

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

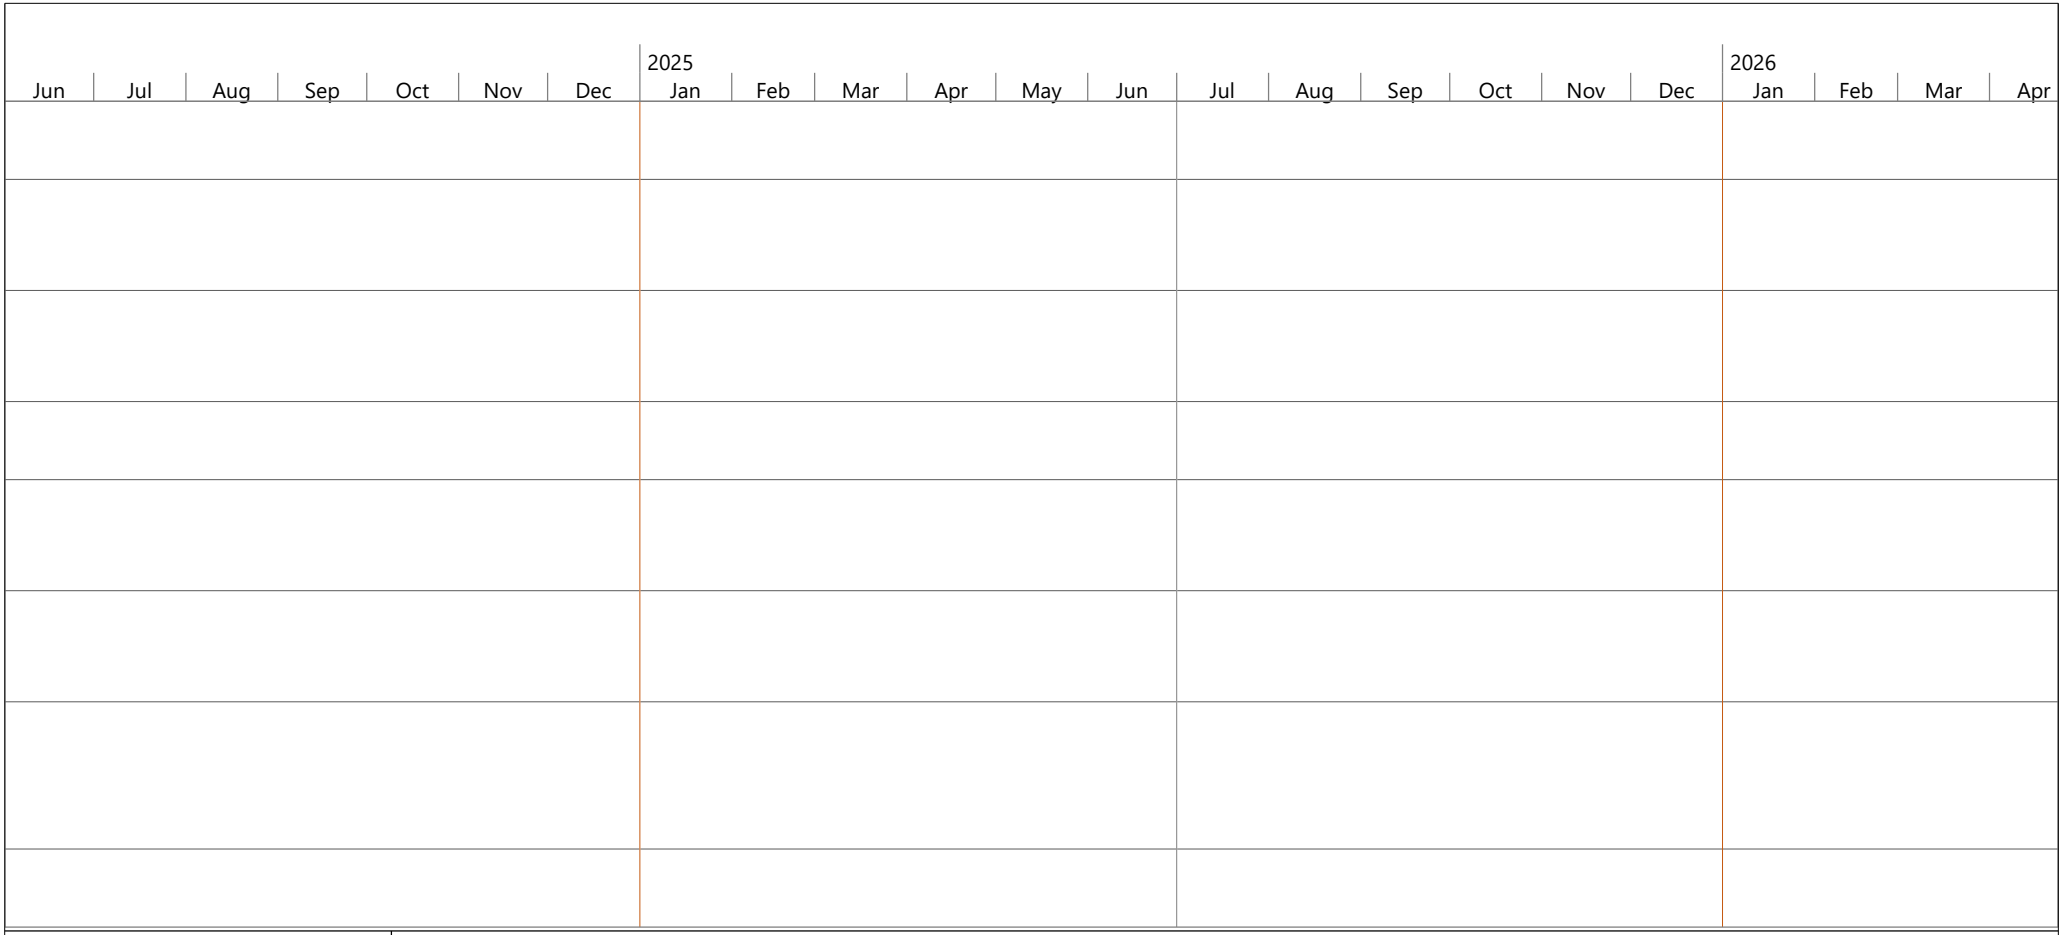


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			



Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

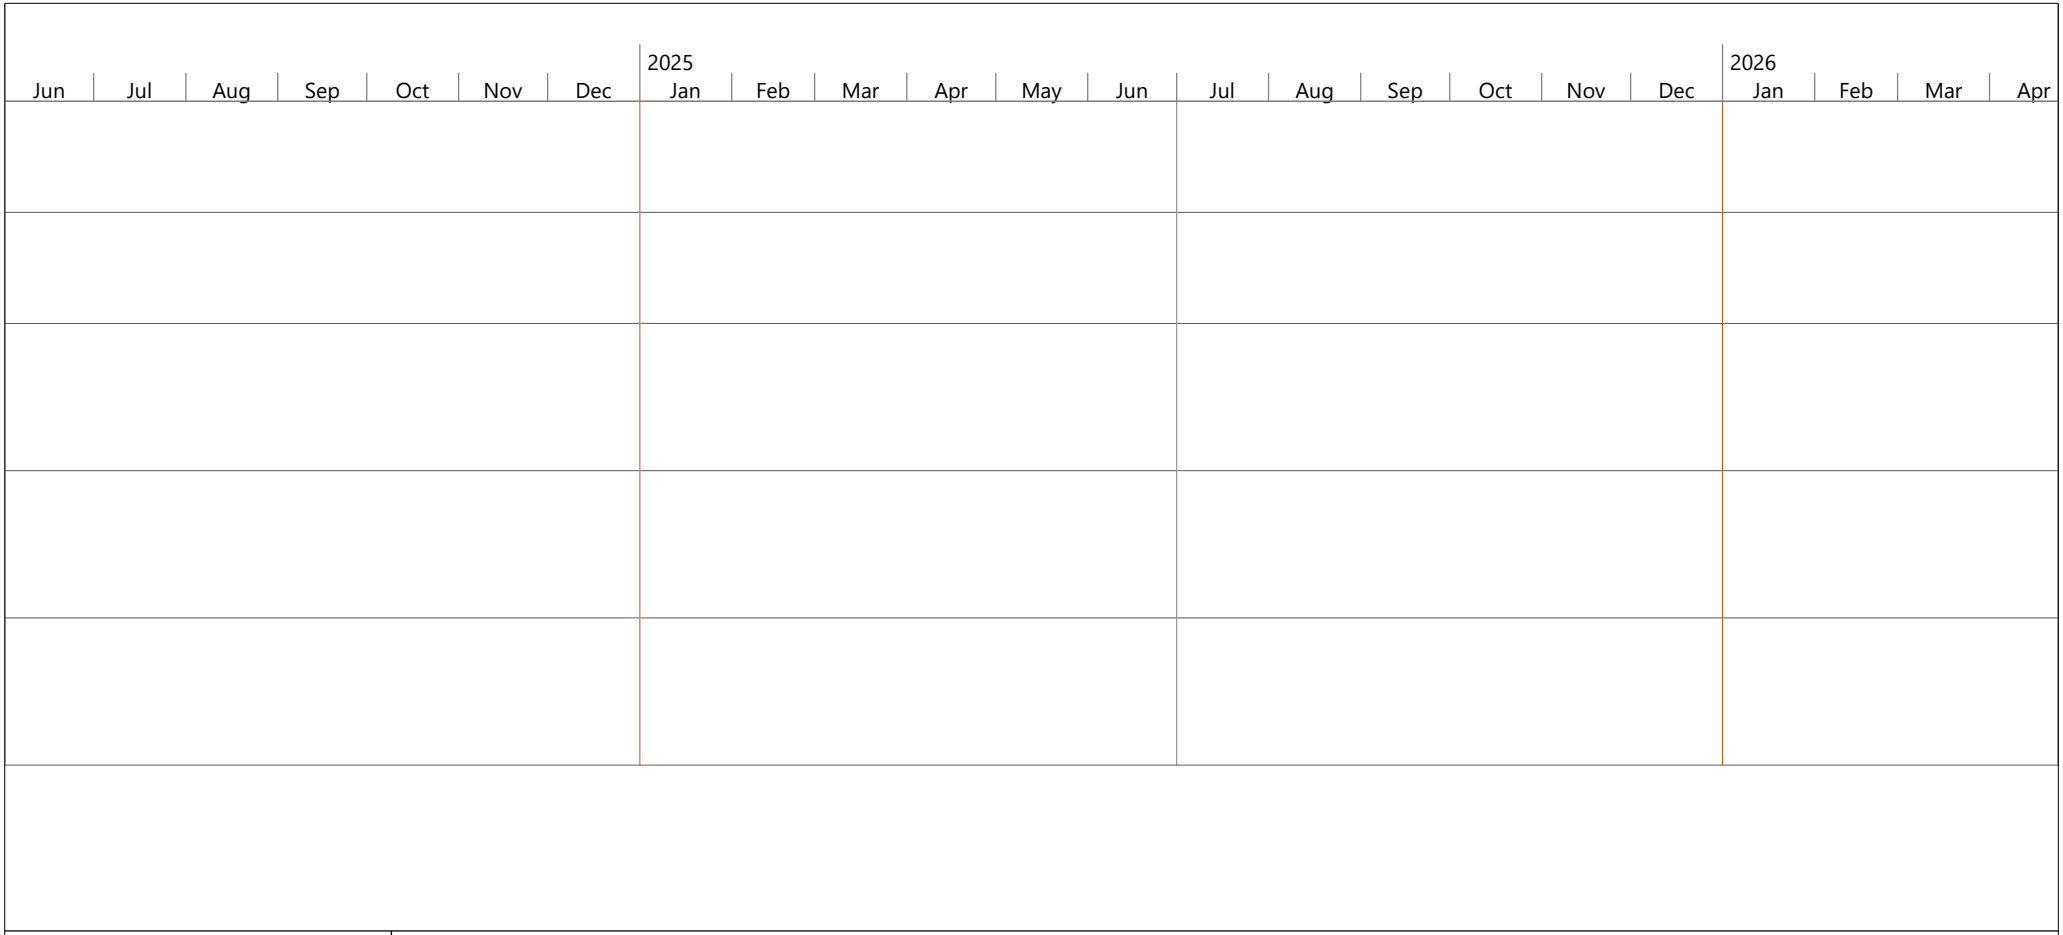


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			



Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

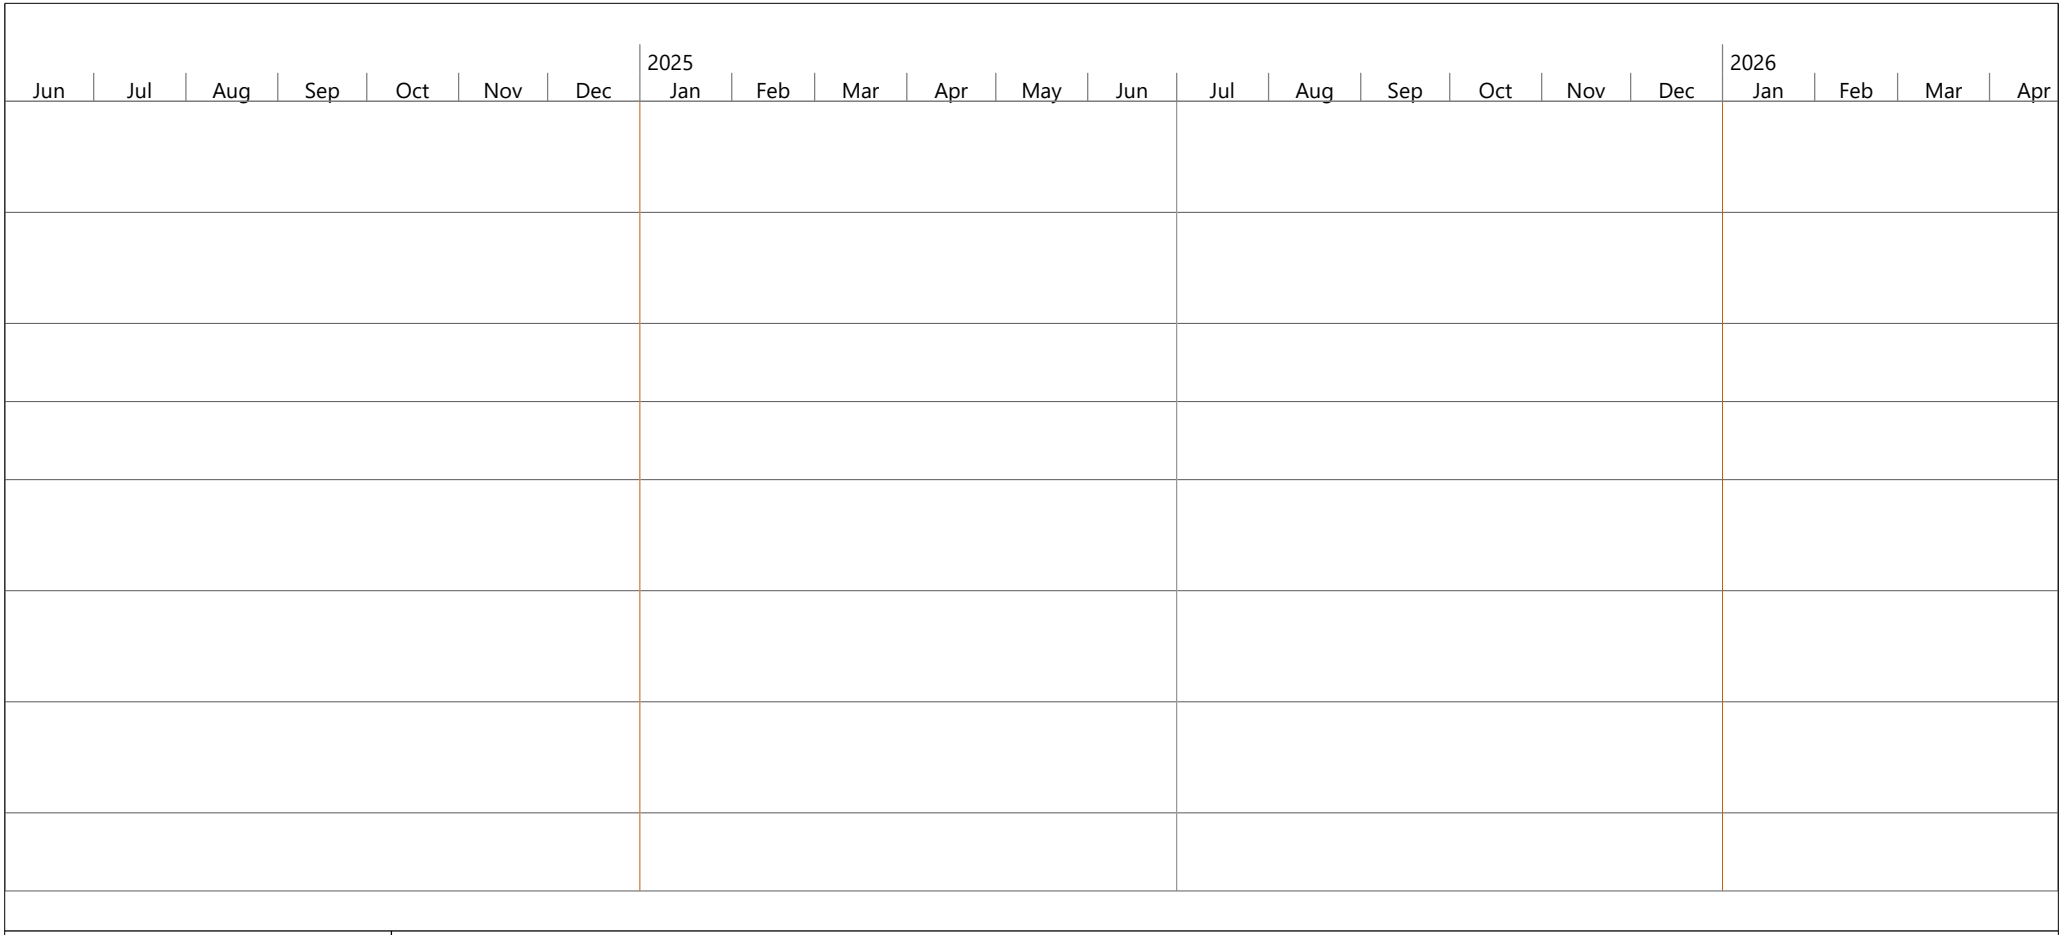


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			



Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

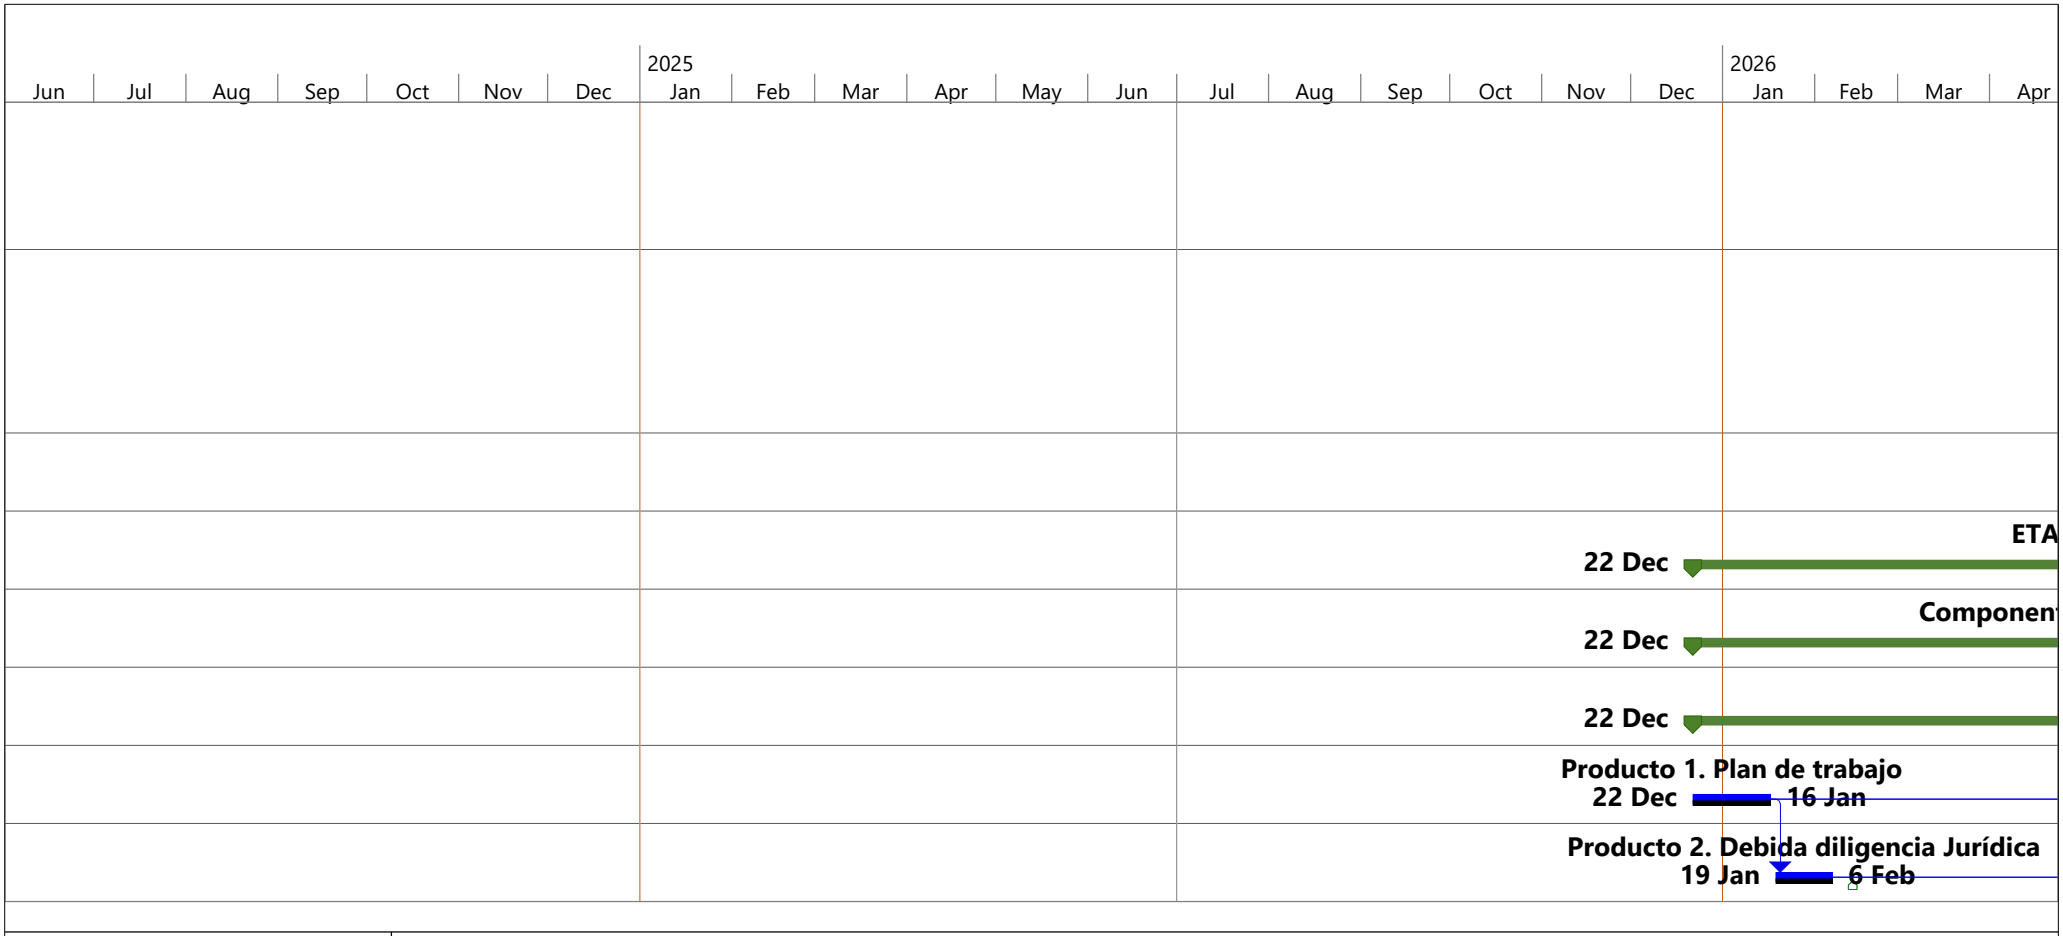


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			




Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

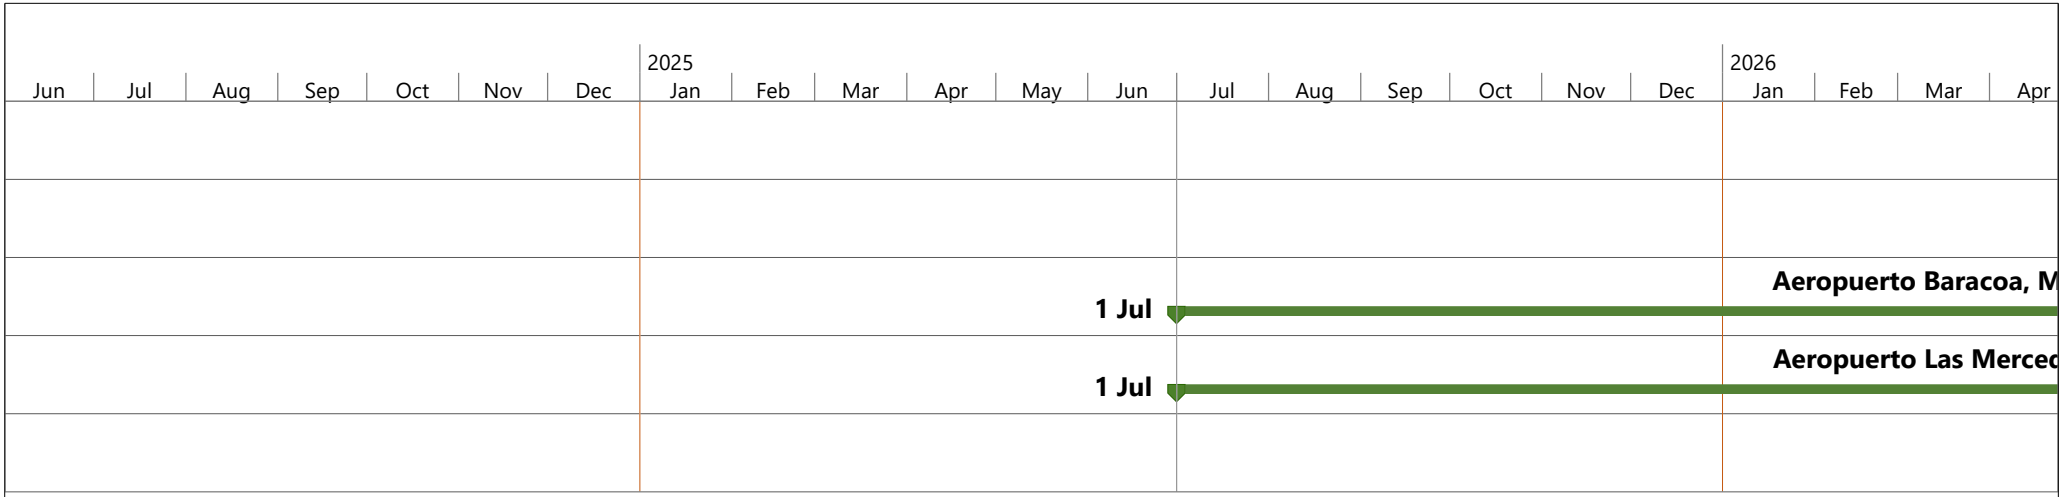


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

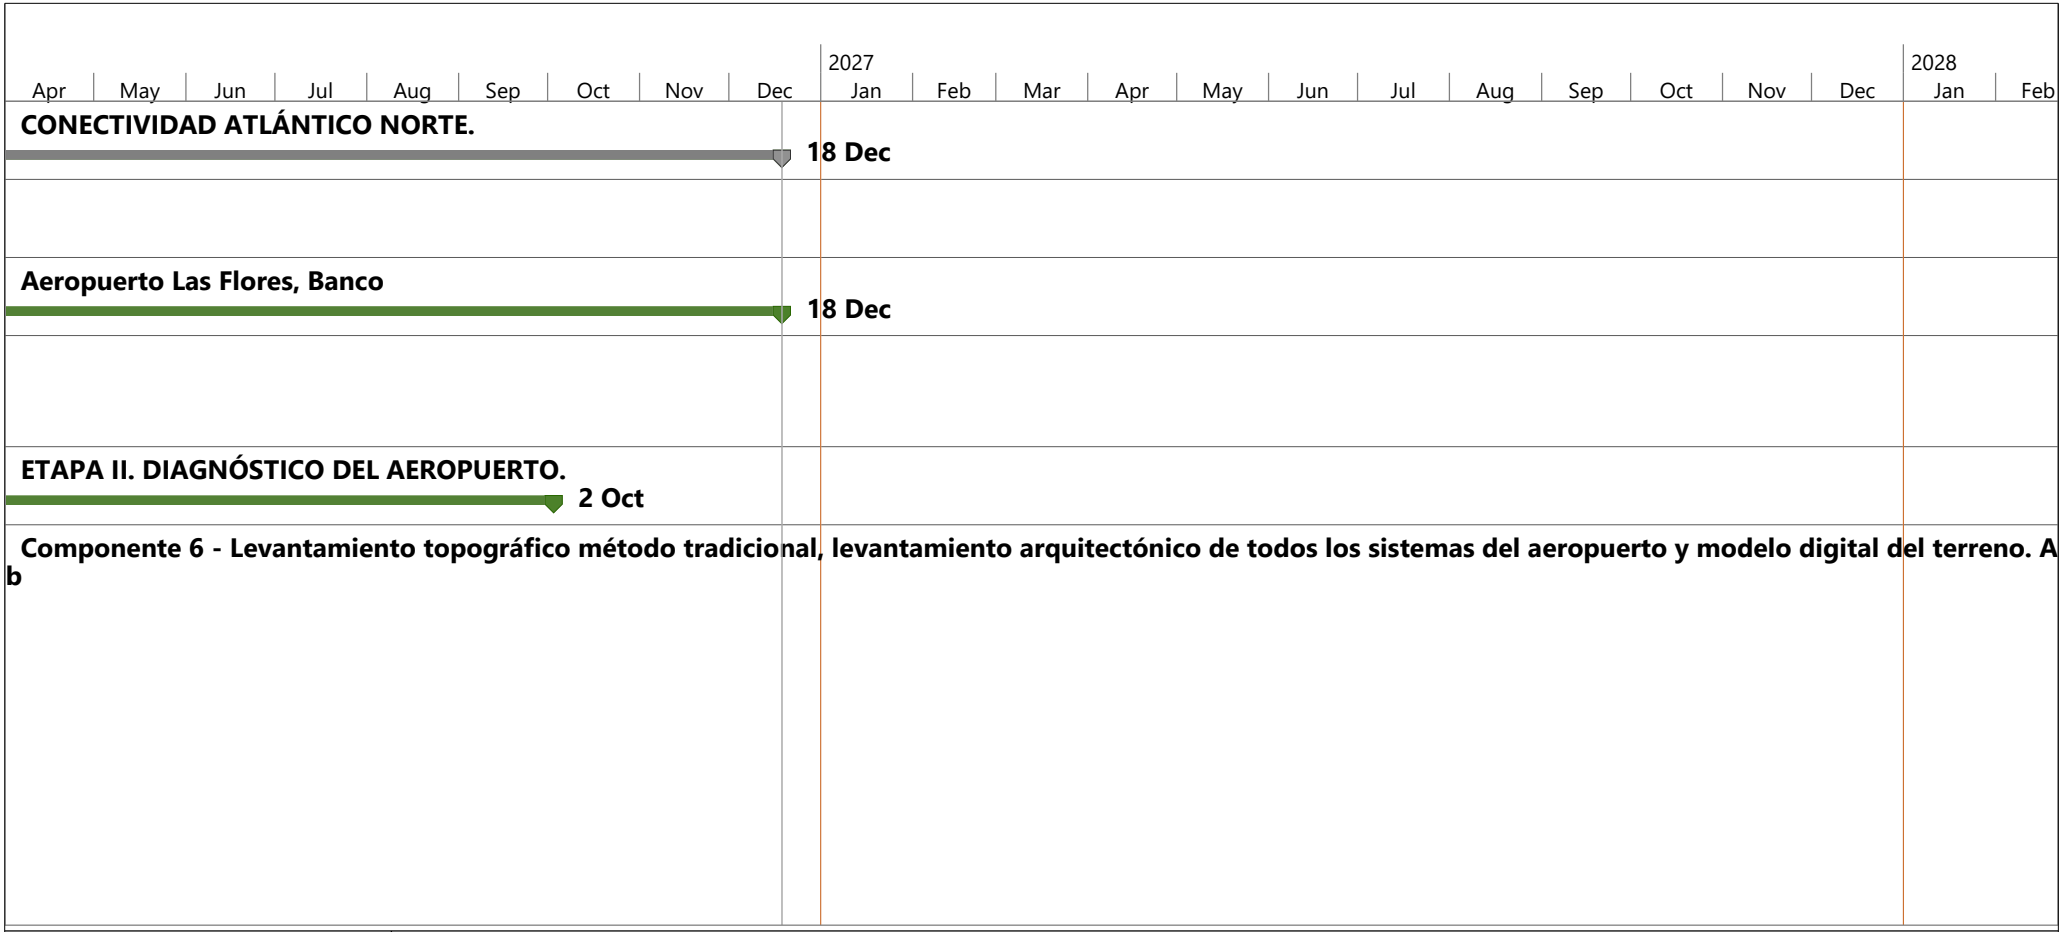


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

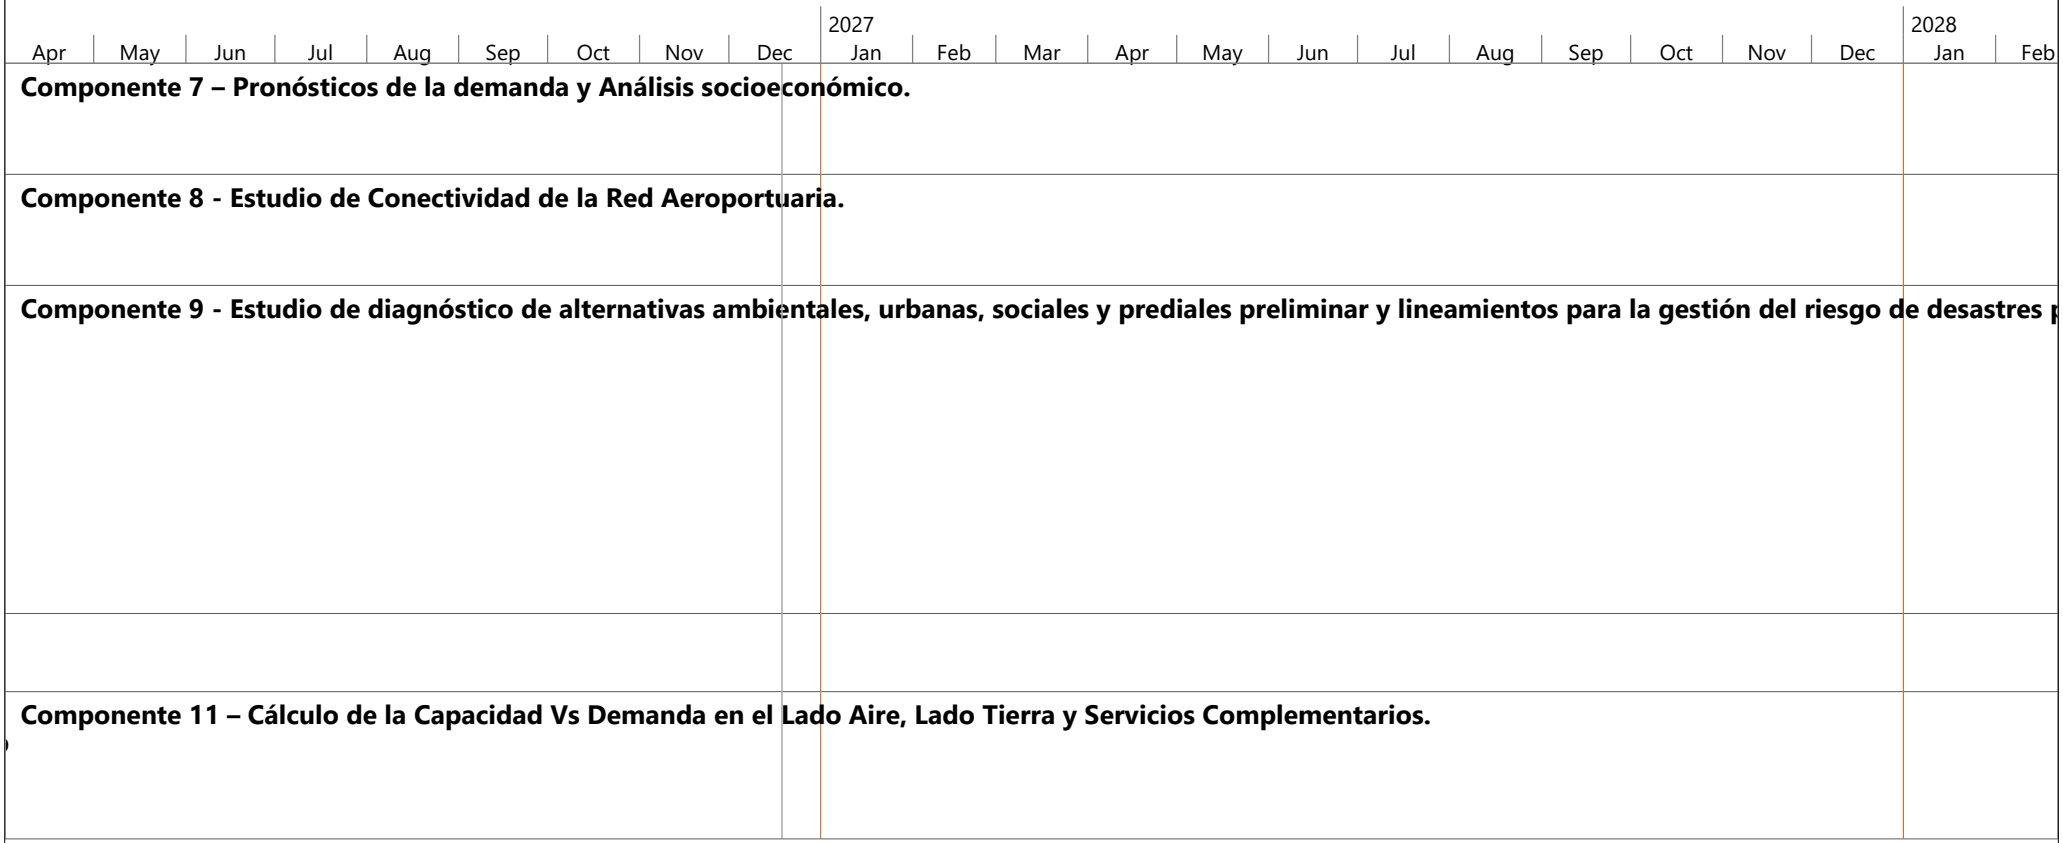


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

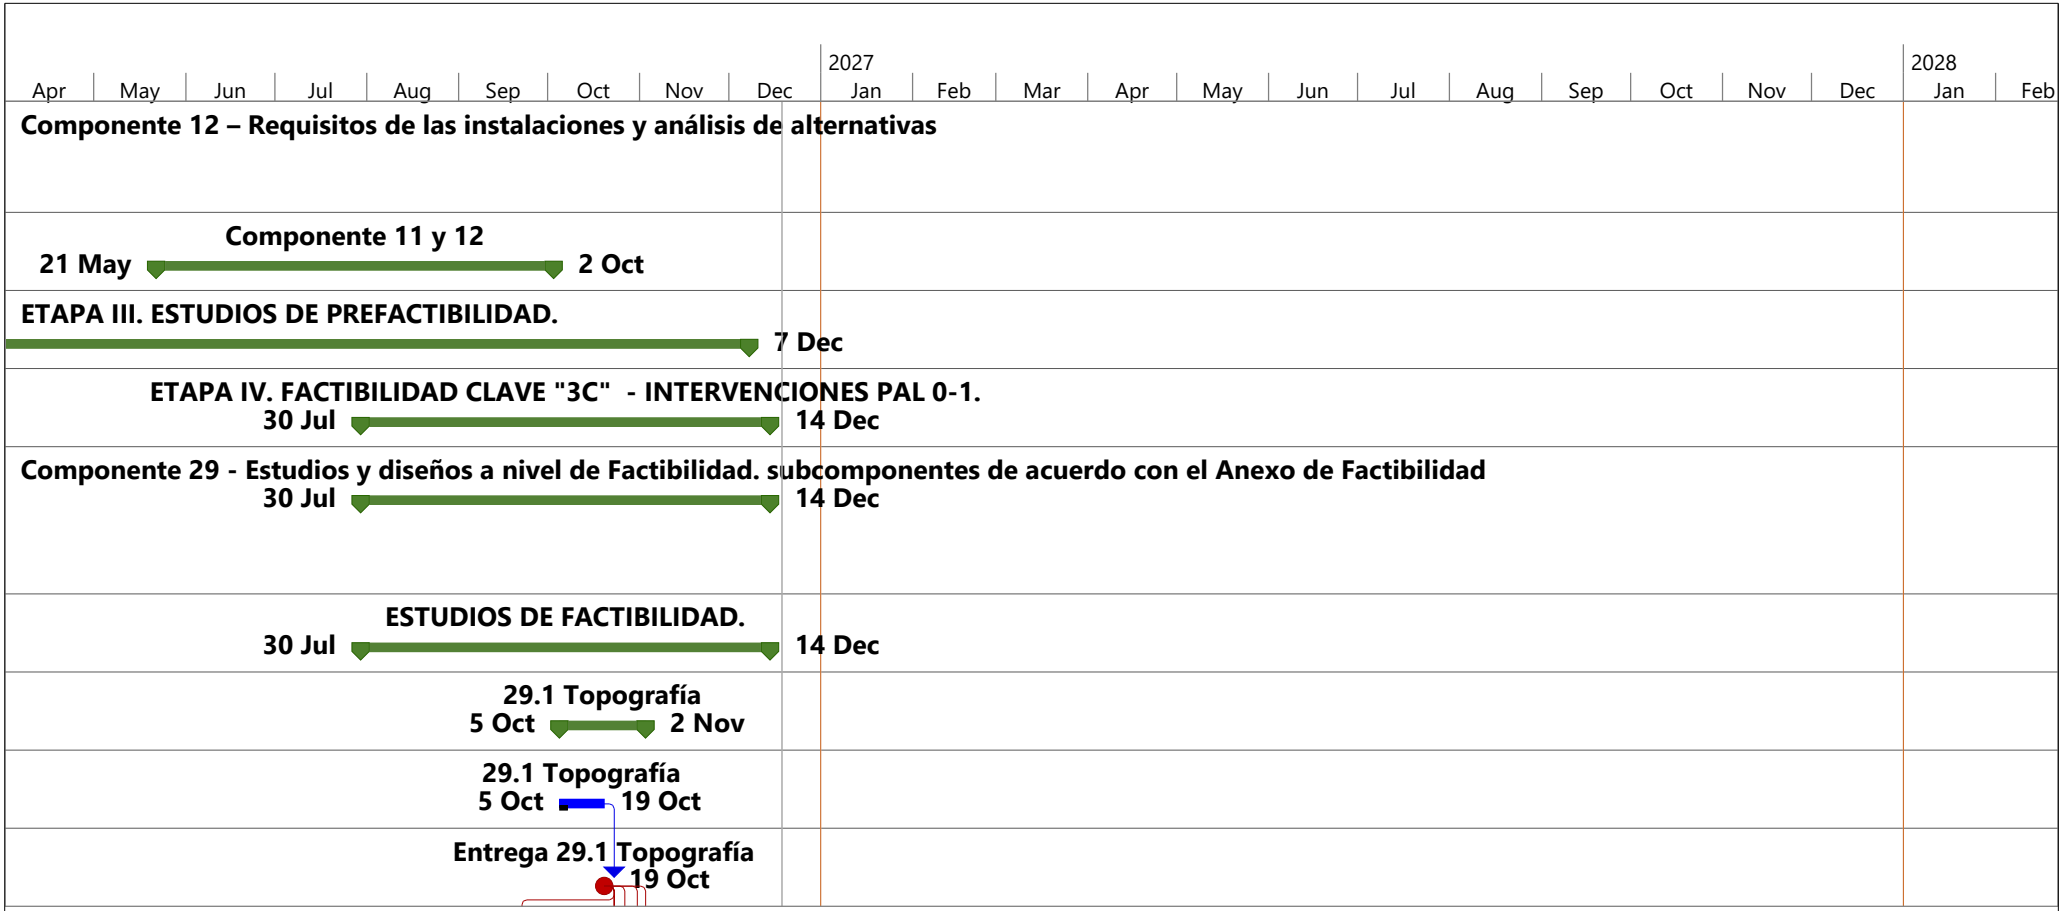


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

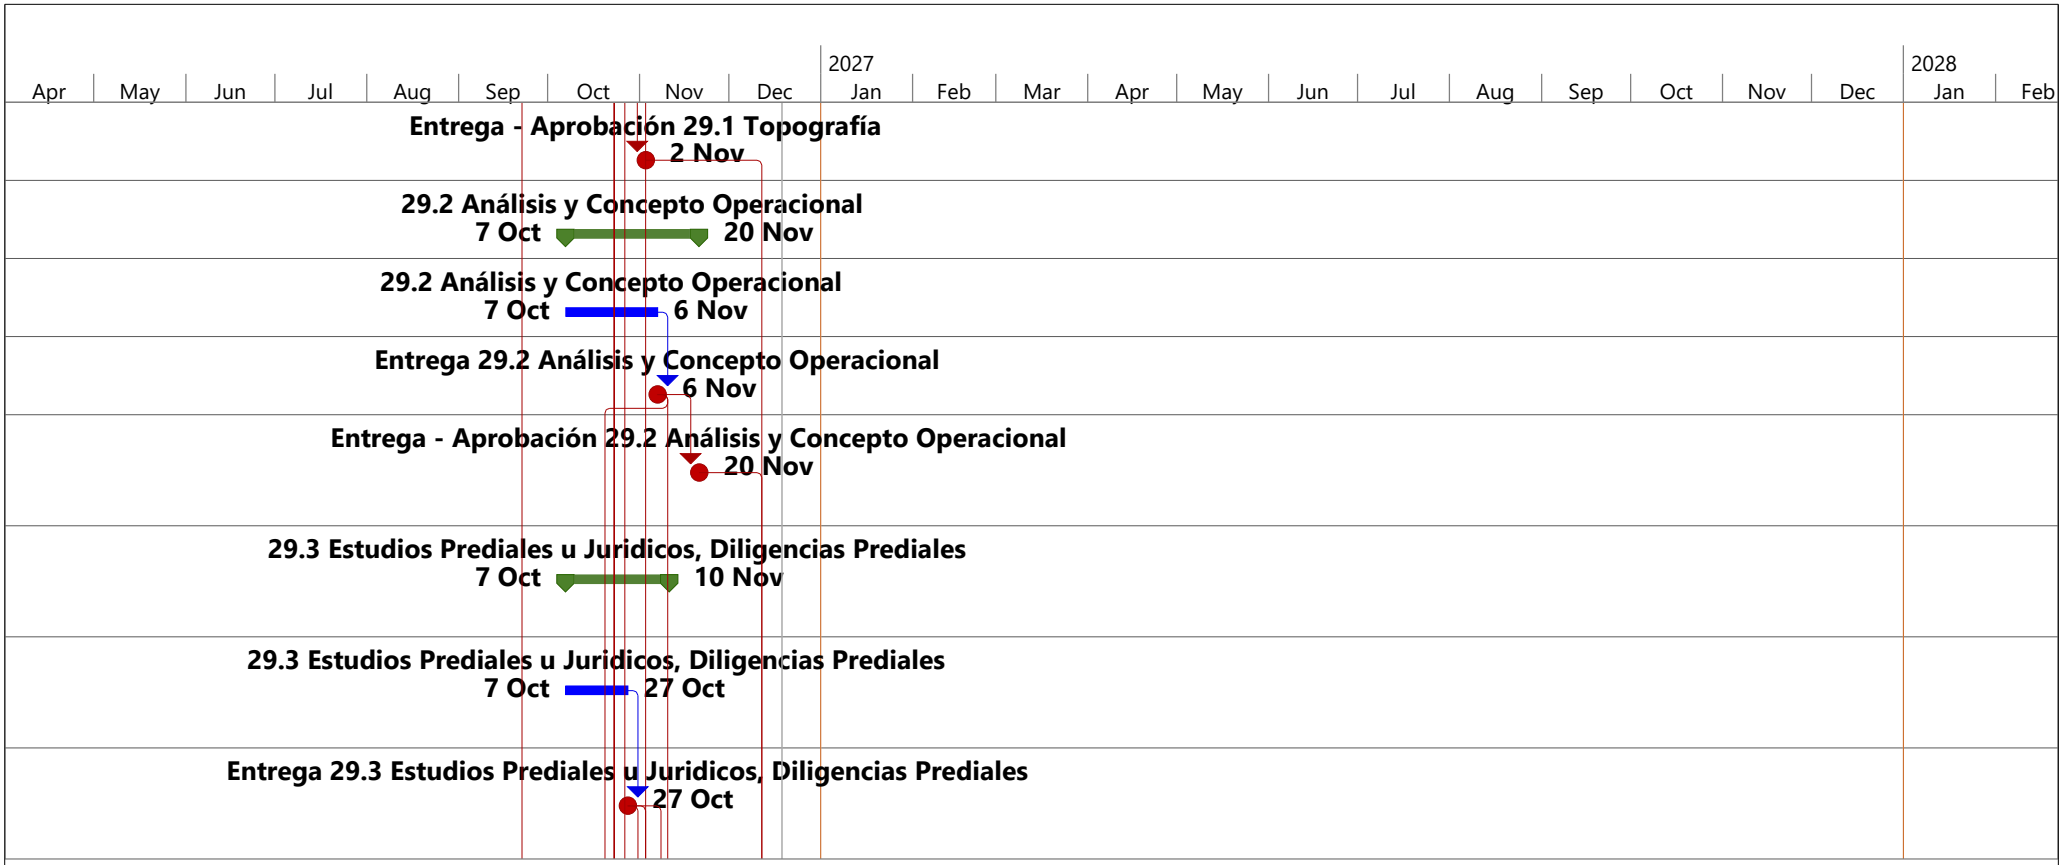


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

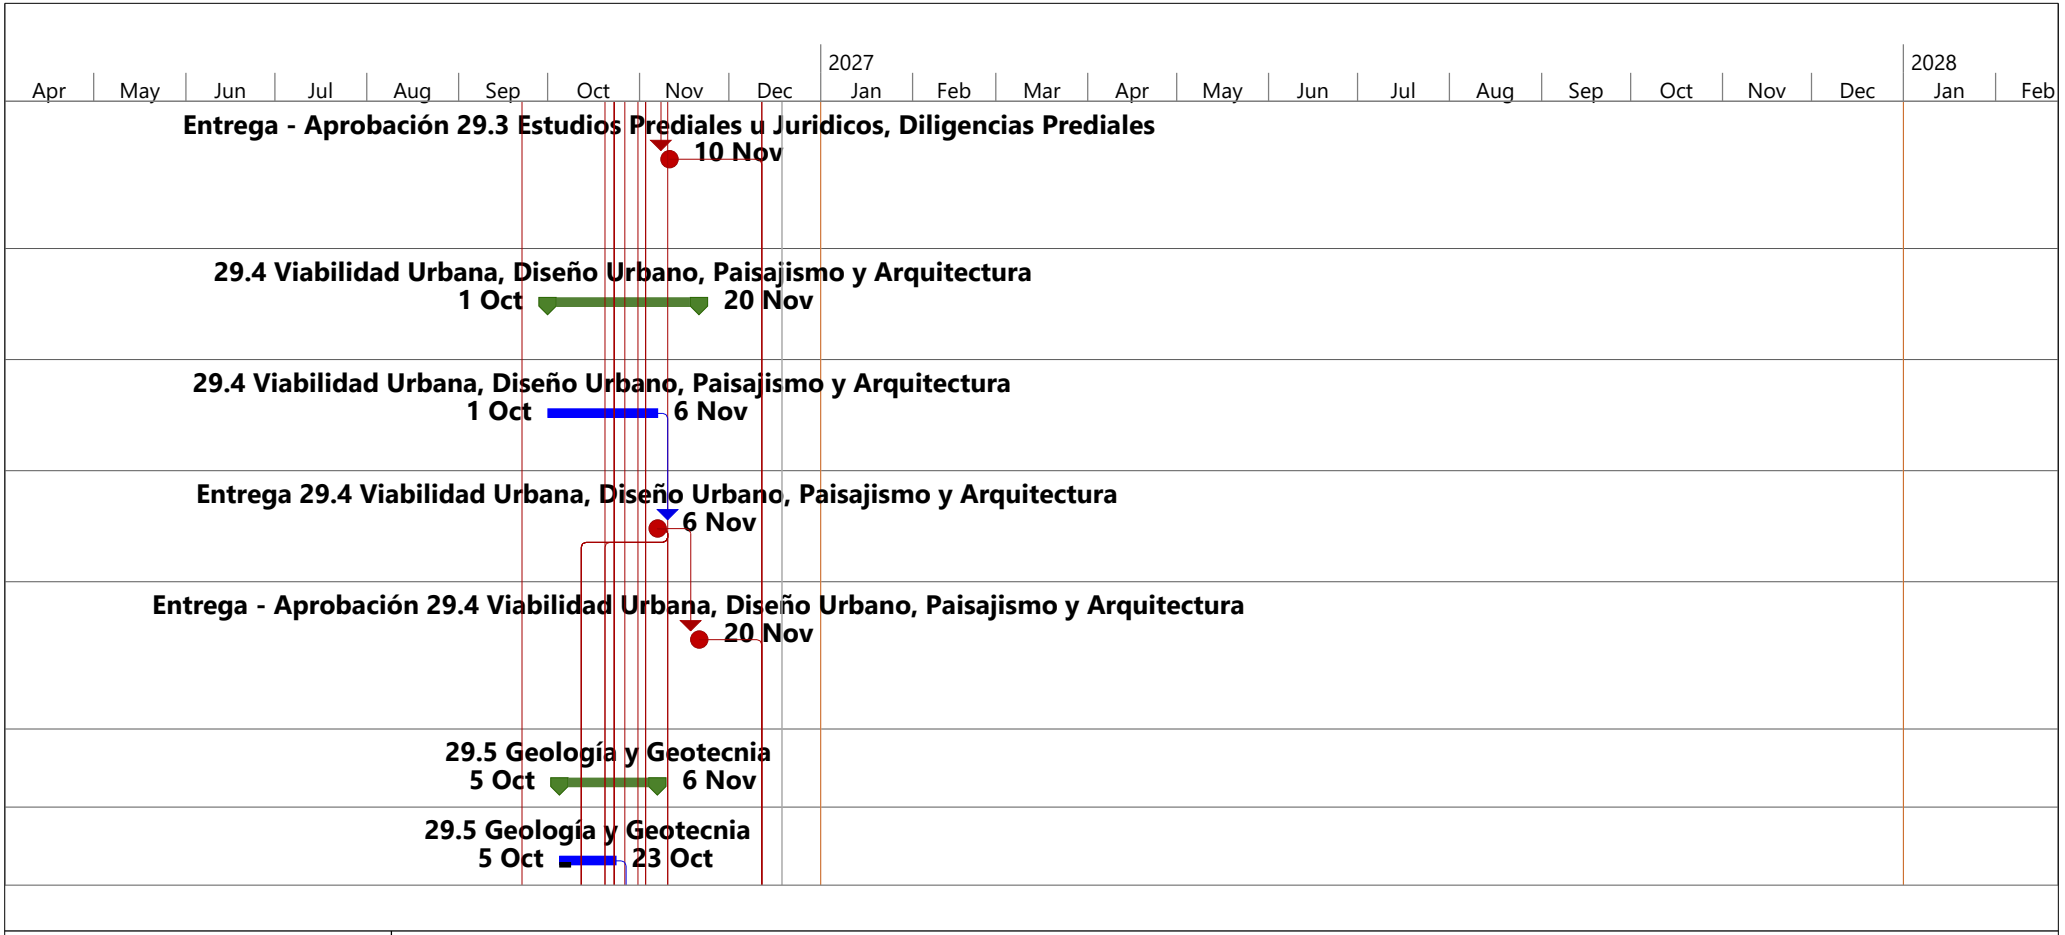


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

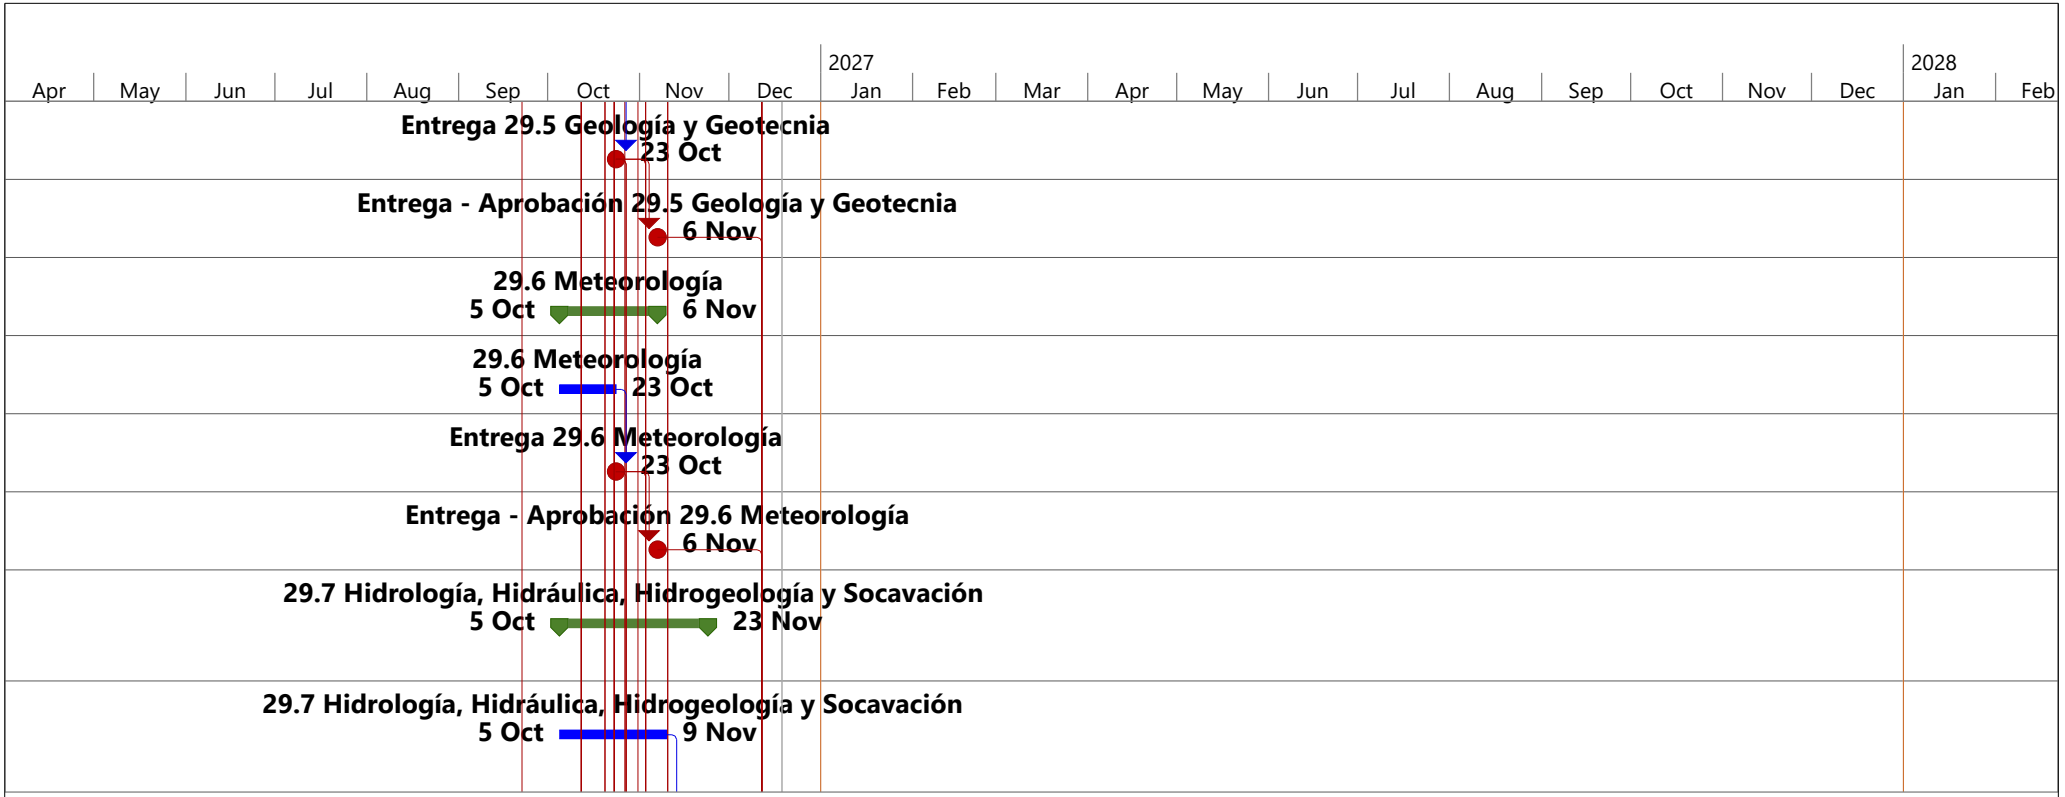


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

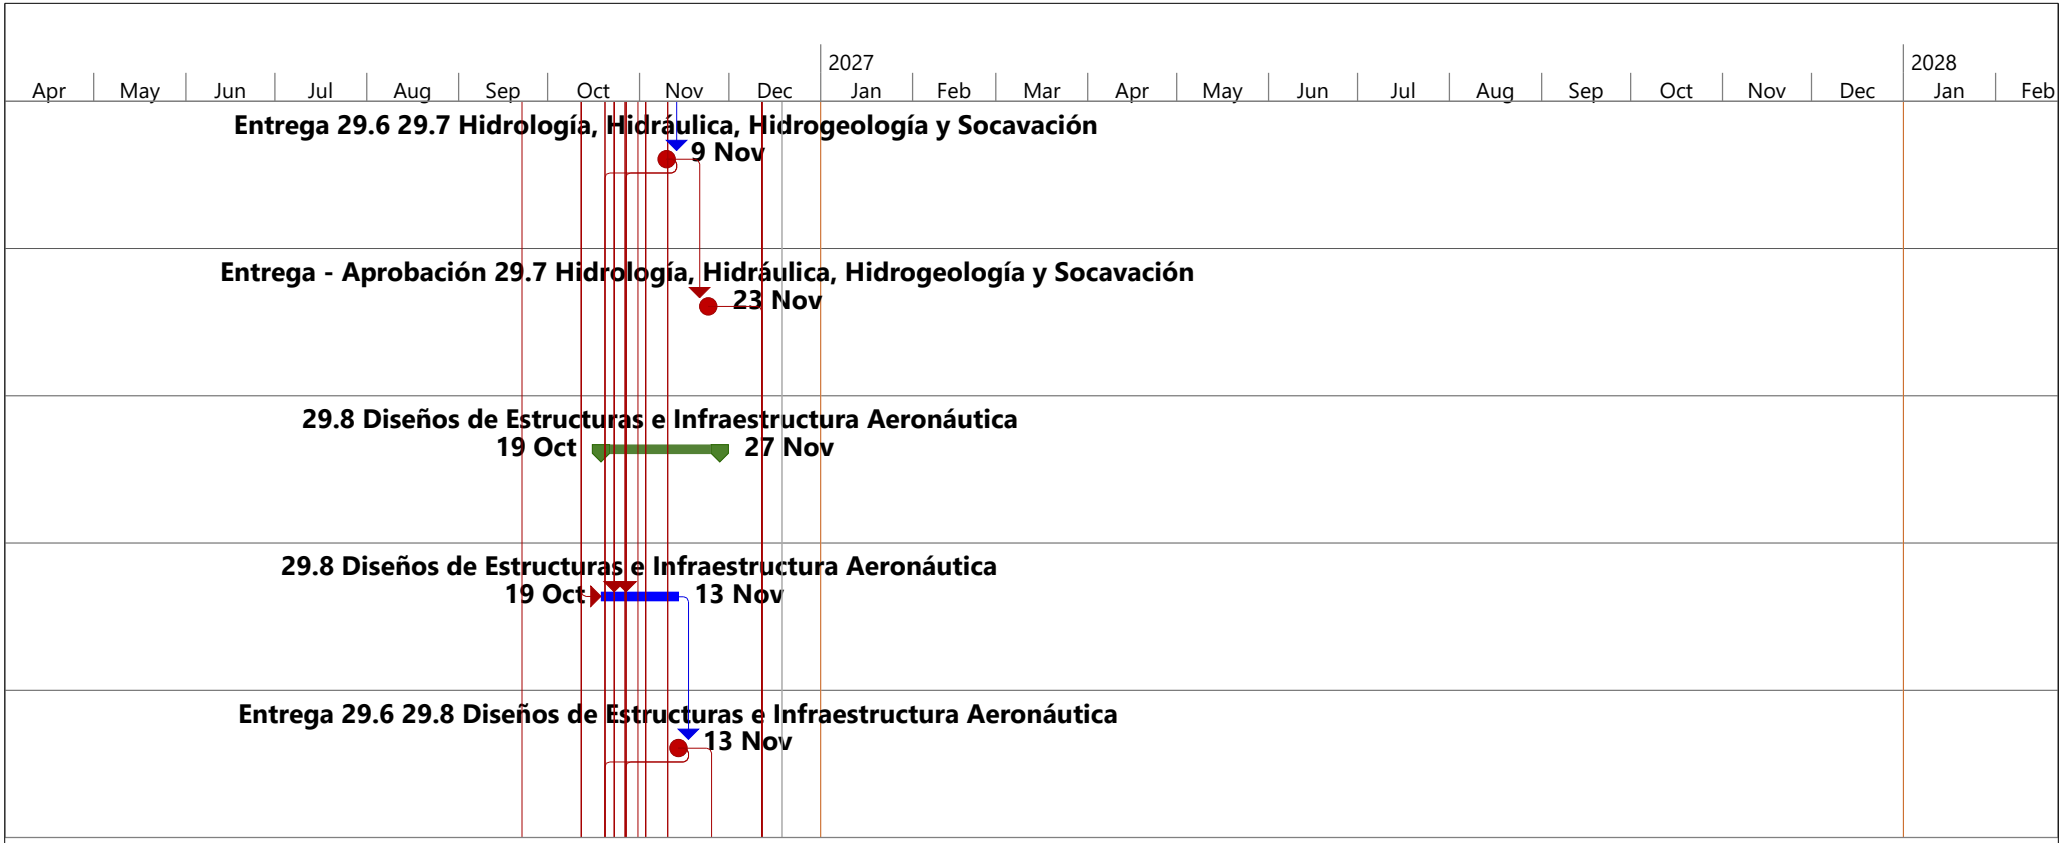


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

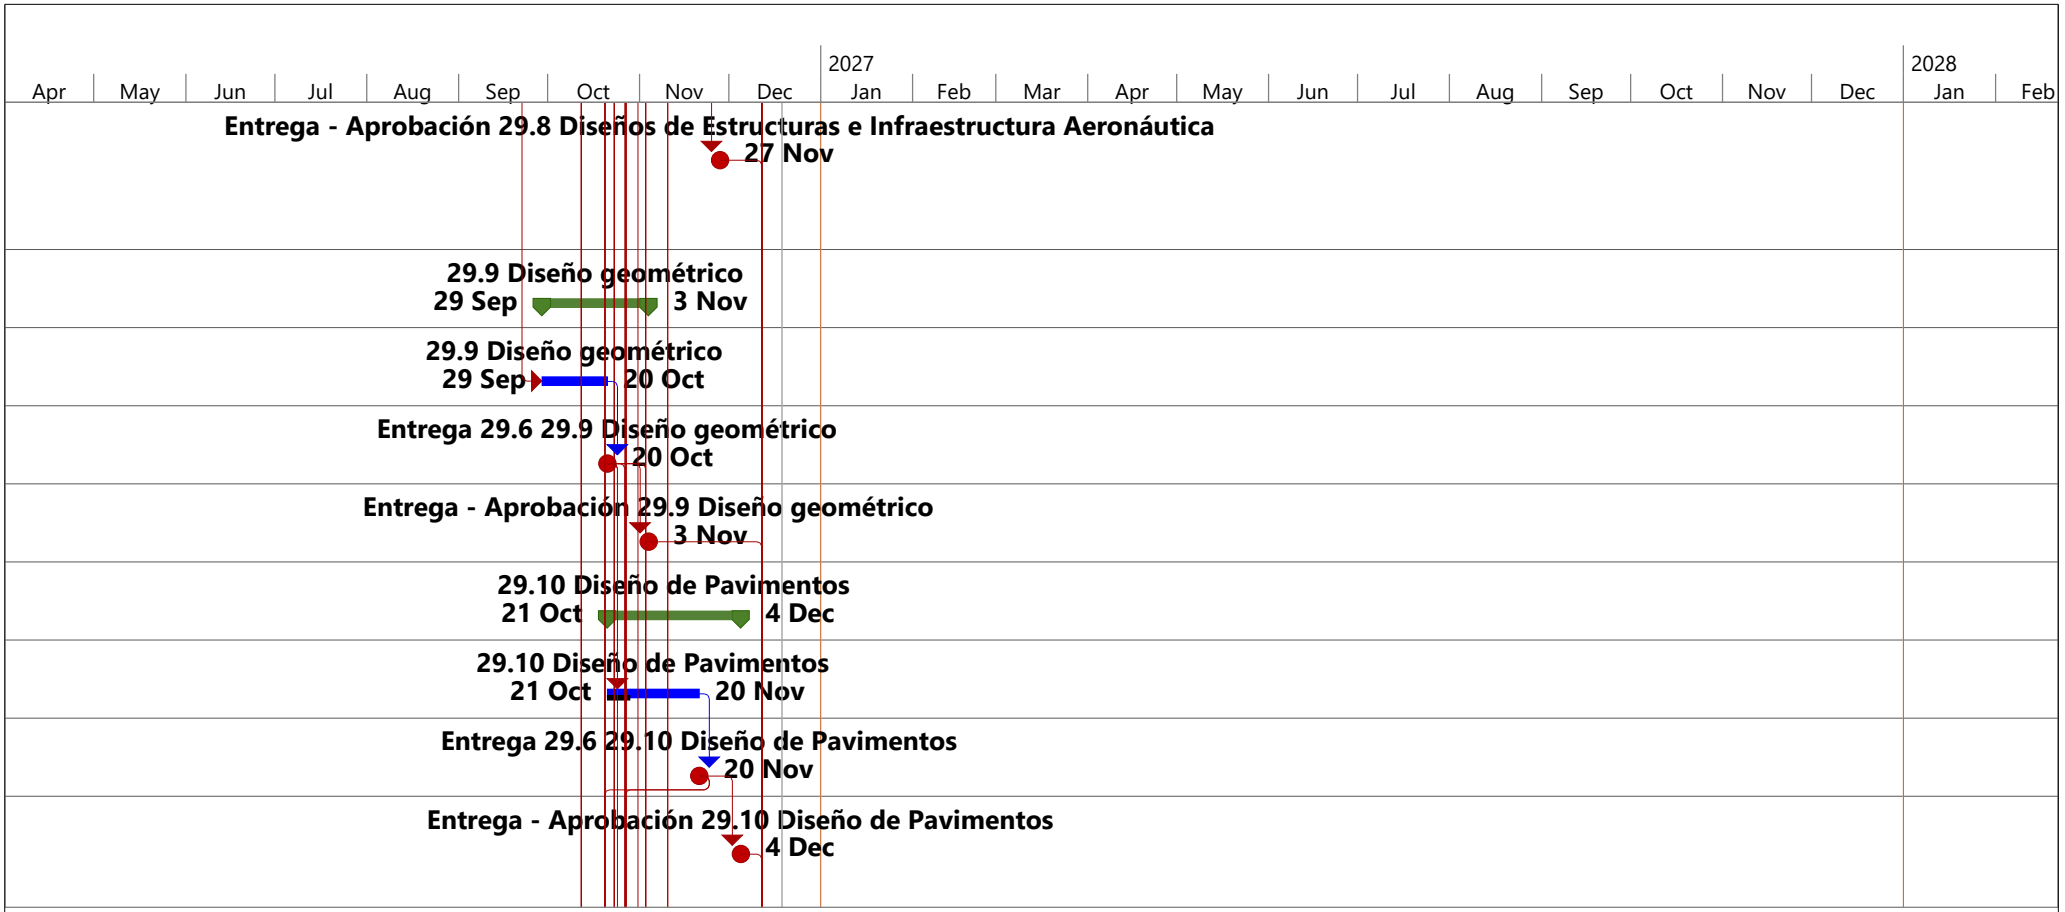


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

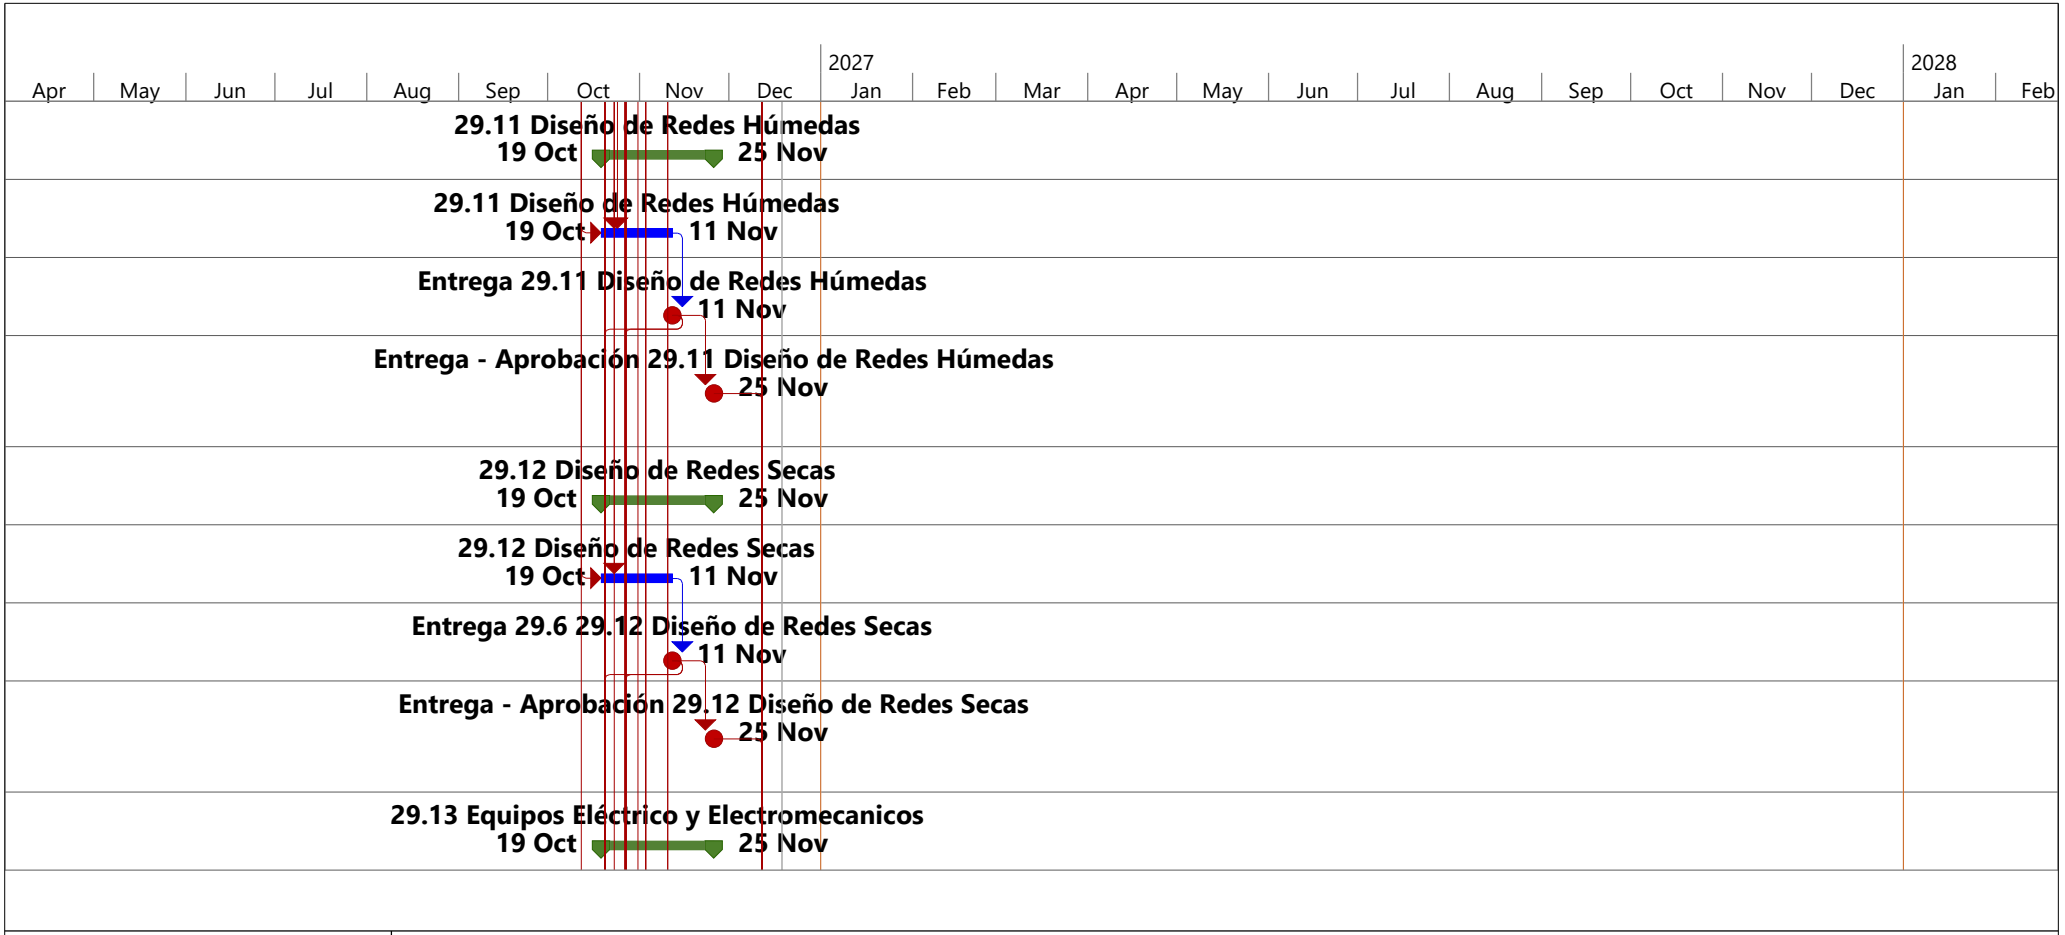


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

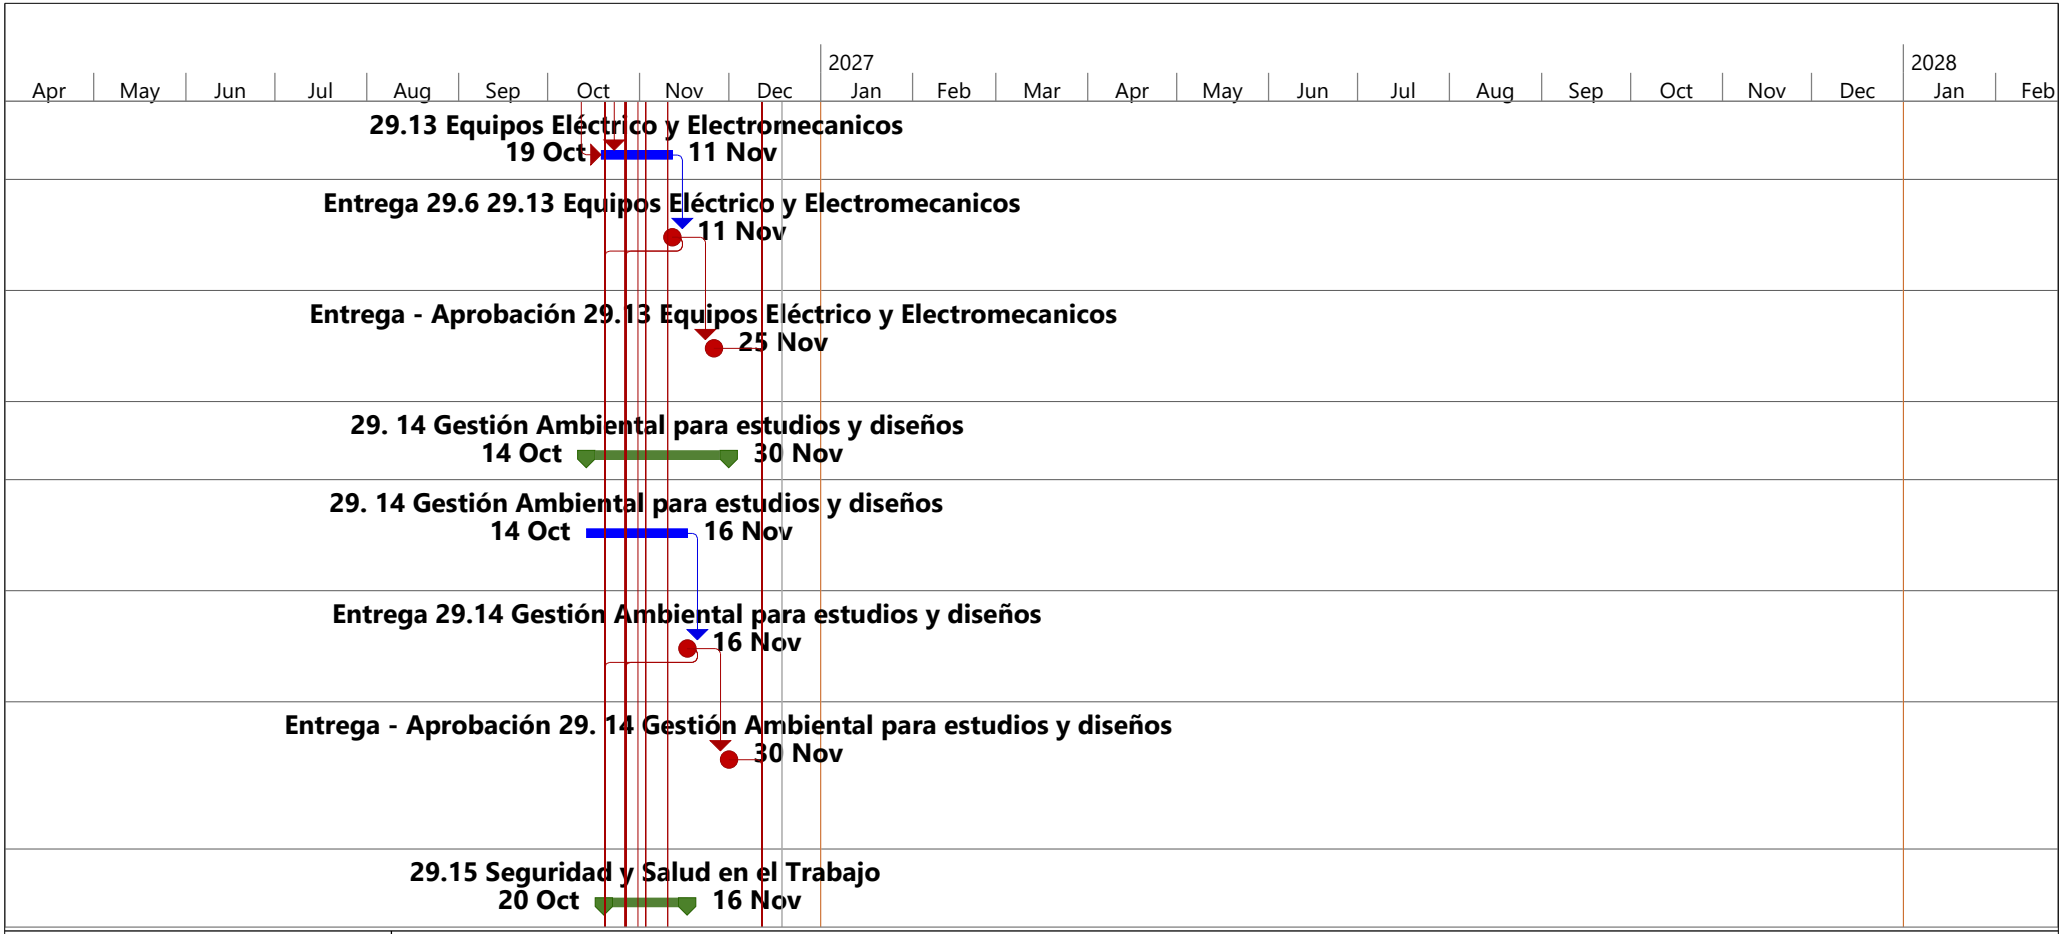


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

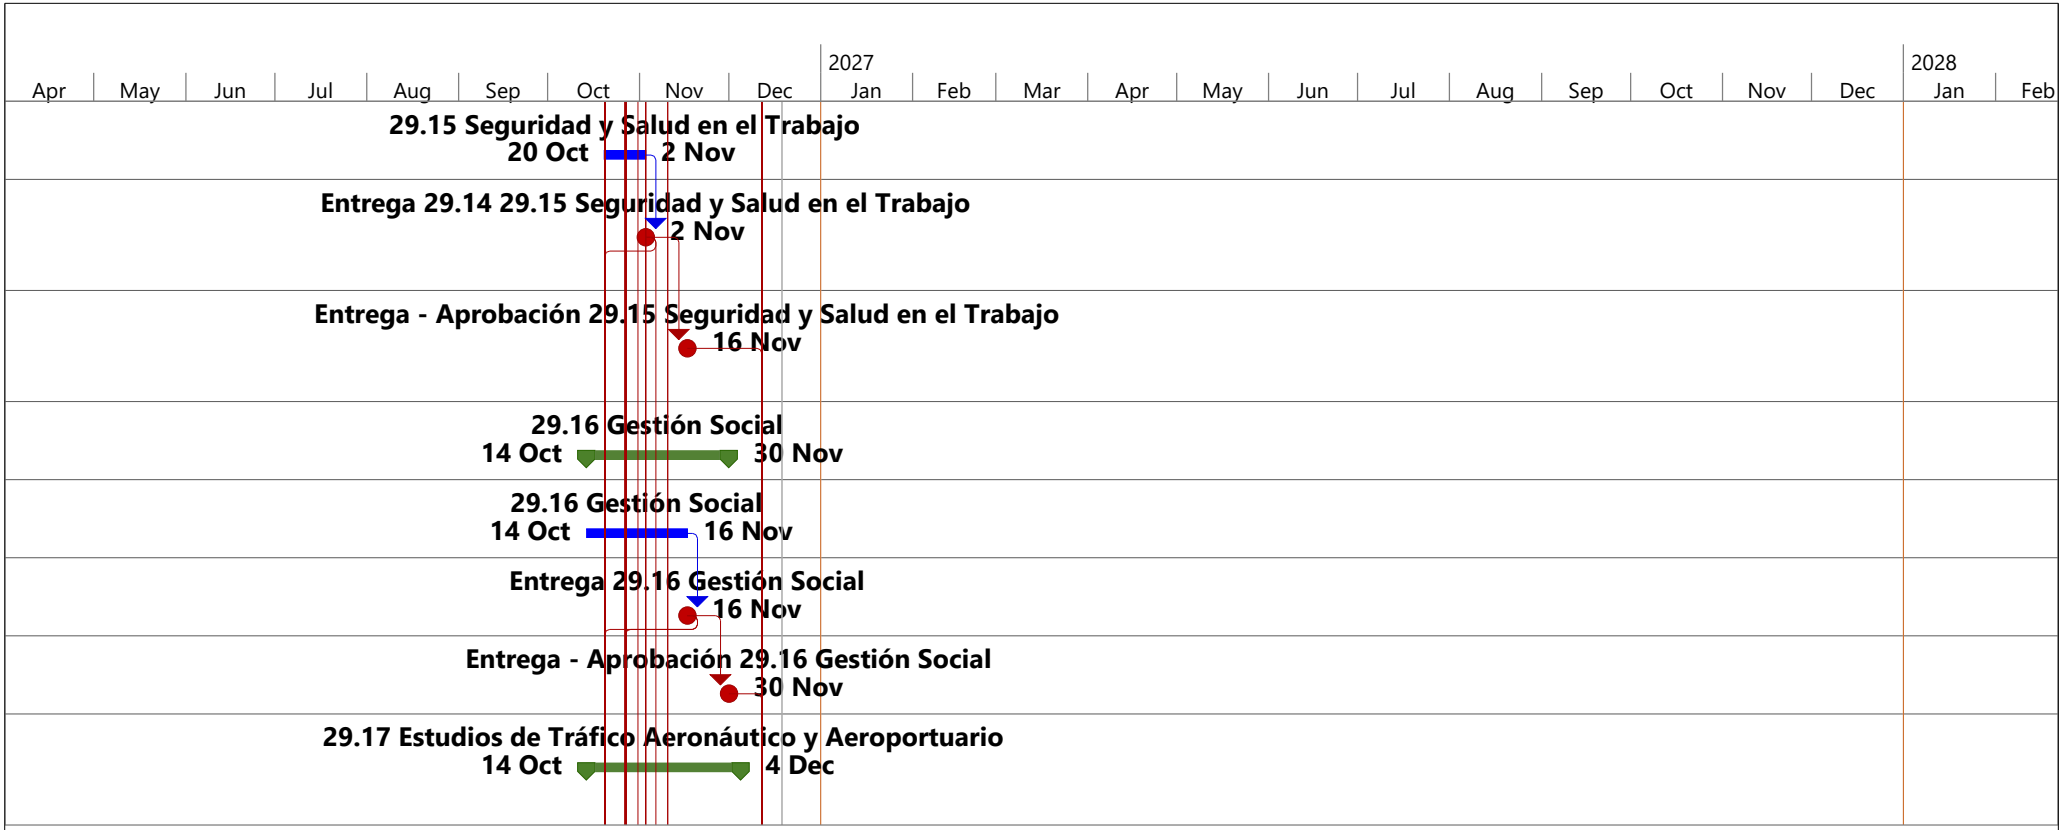


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea	Progreso resumido	Resumen manual
División	Tareas externas	solo el comienzo
Hito	Hito externo	solo fin
Resumen	Tarea inactiva	Fecha límite
Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Tareas críticas
Tarea resumida	Tarea manual	División crítica
Tarea crítica resumida	solo duración	Progreso
Hito resumido	Informe de resumen manual	

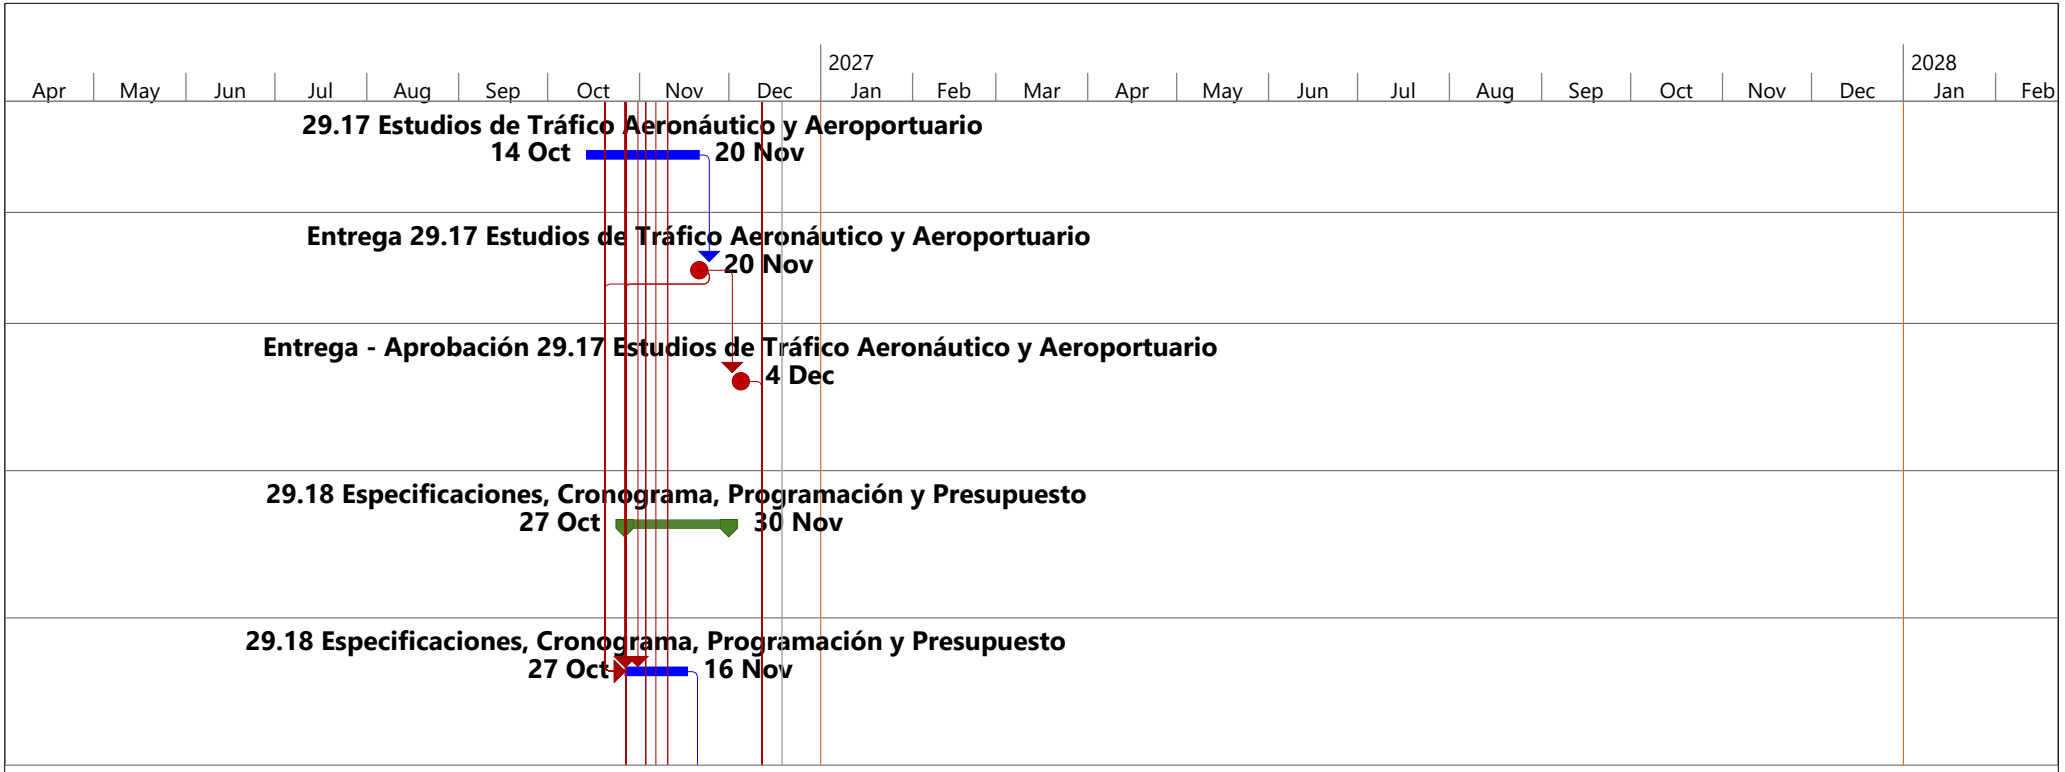


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

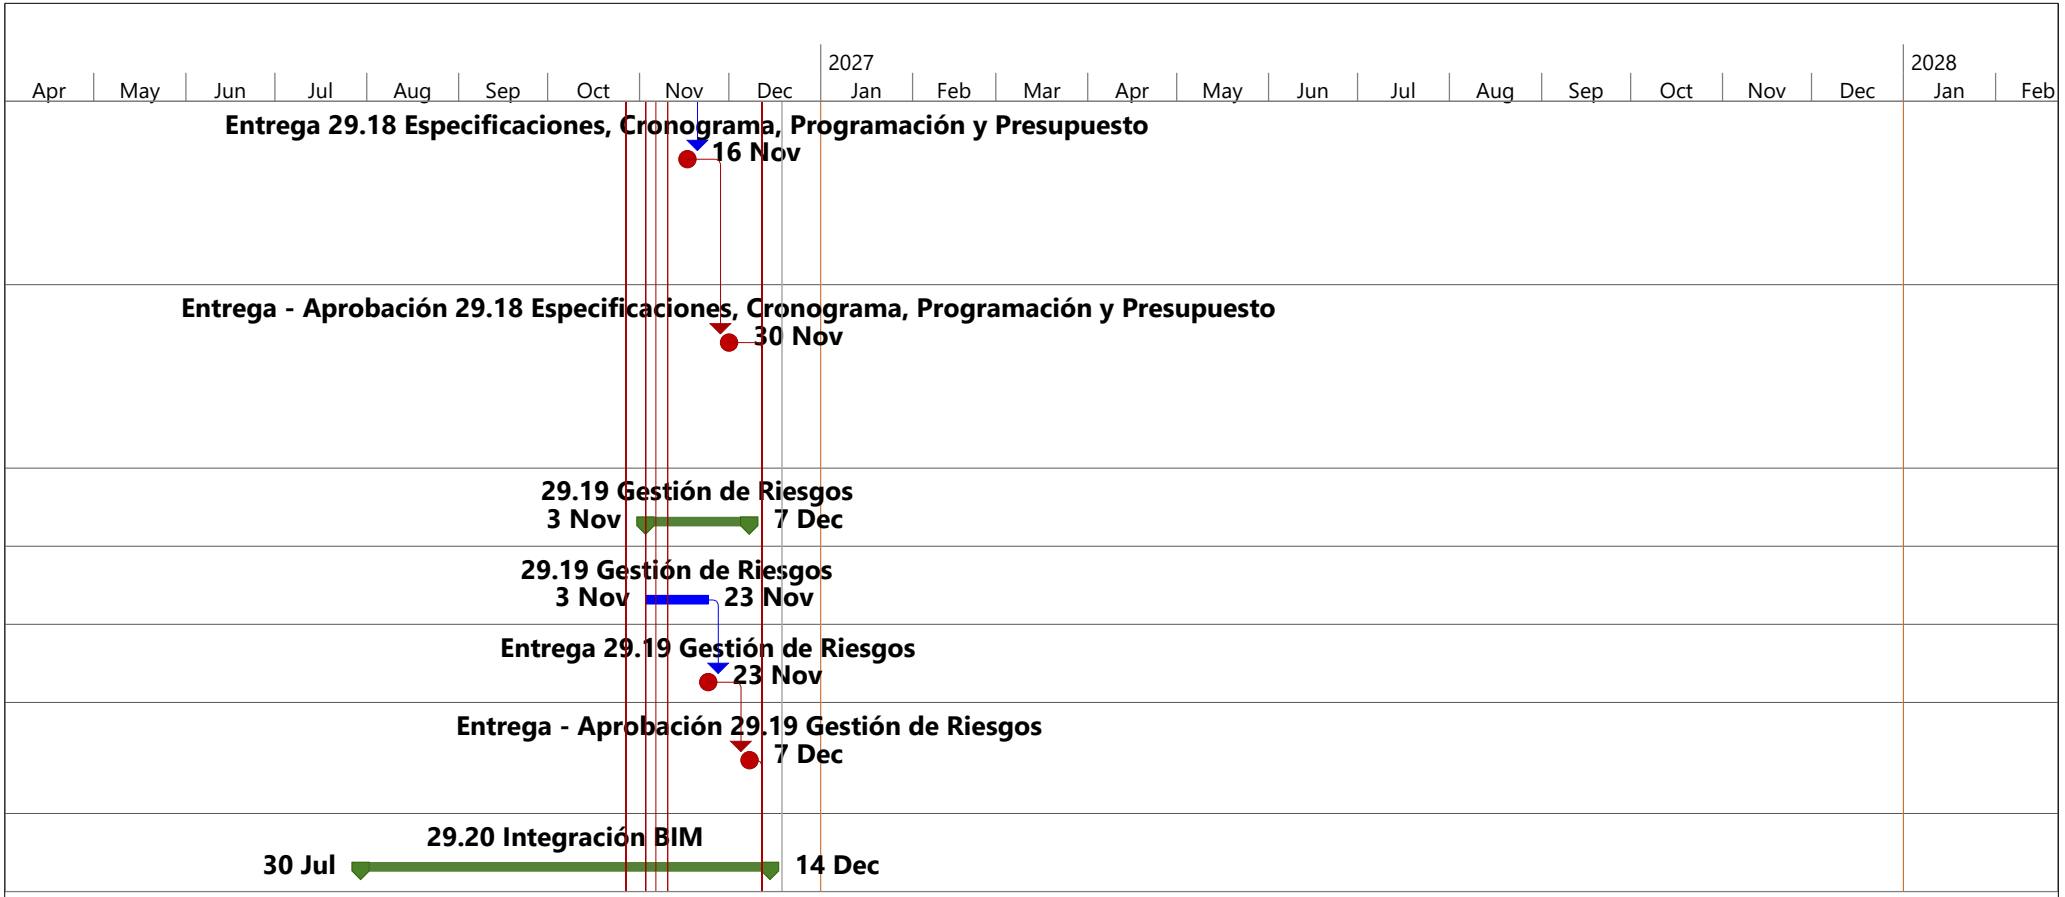


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

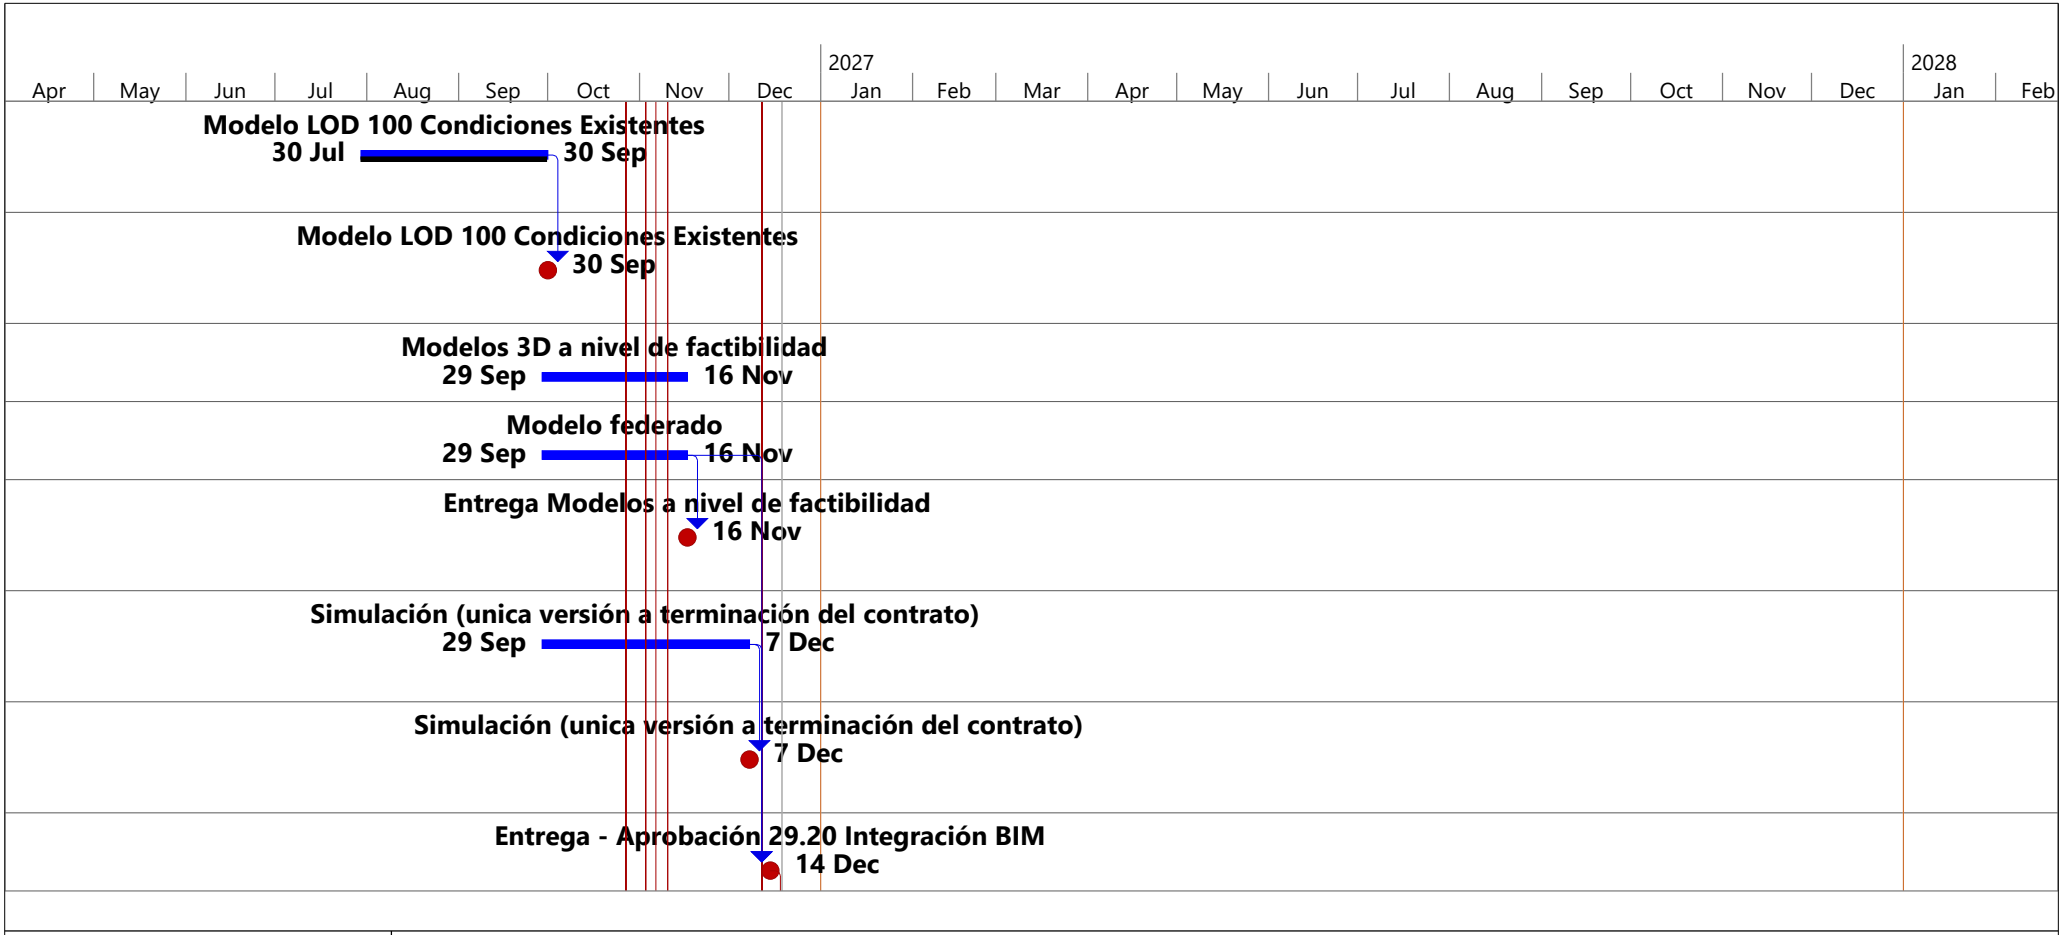


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

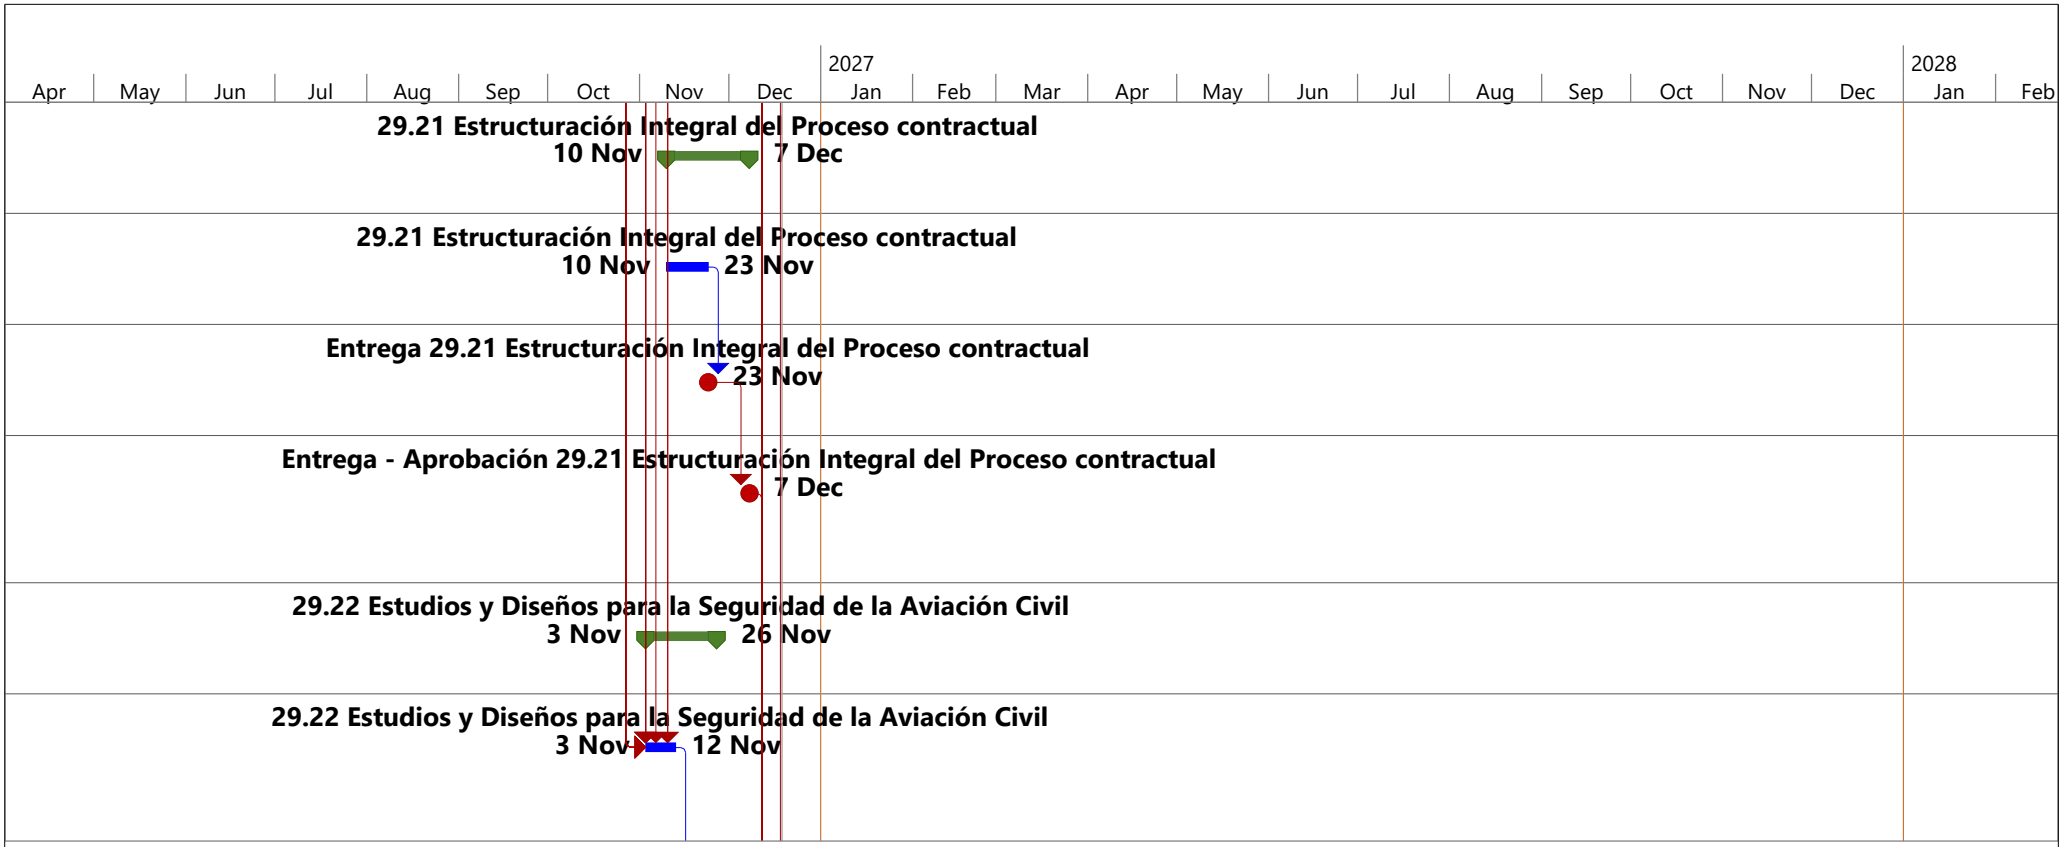


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

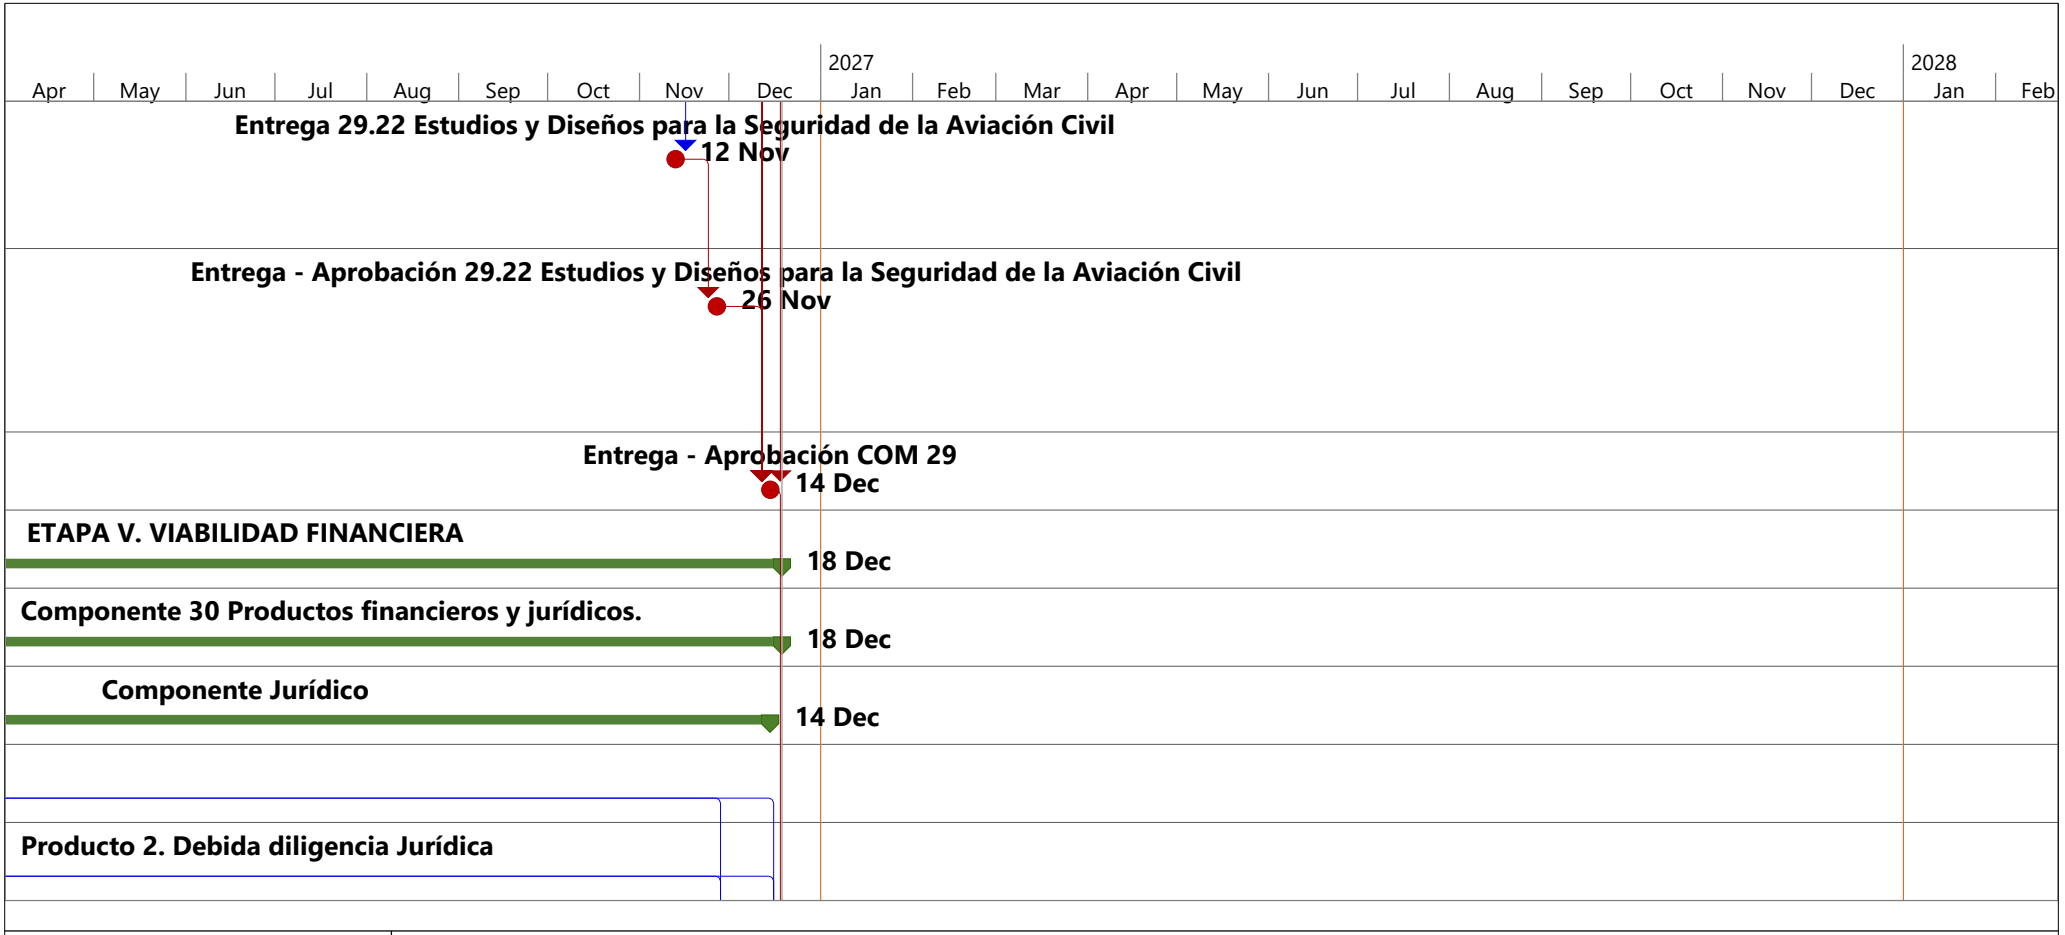


Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

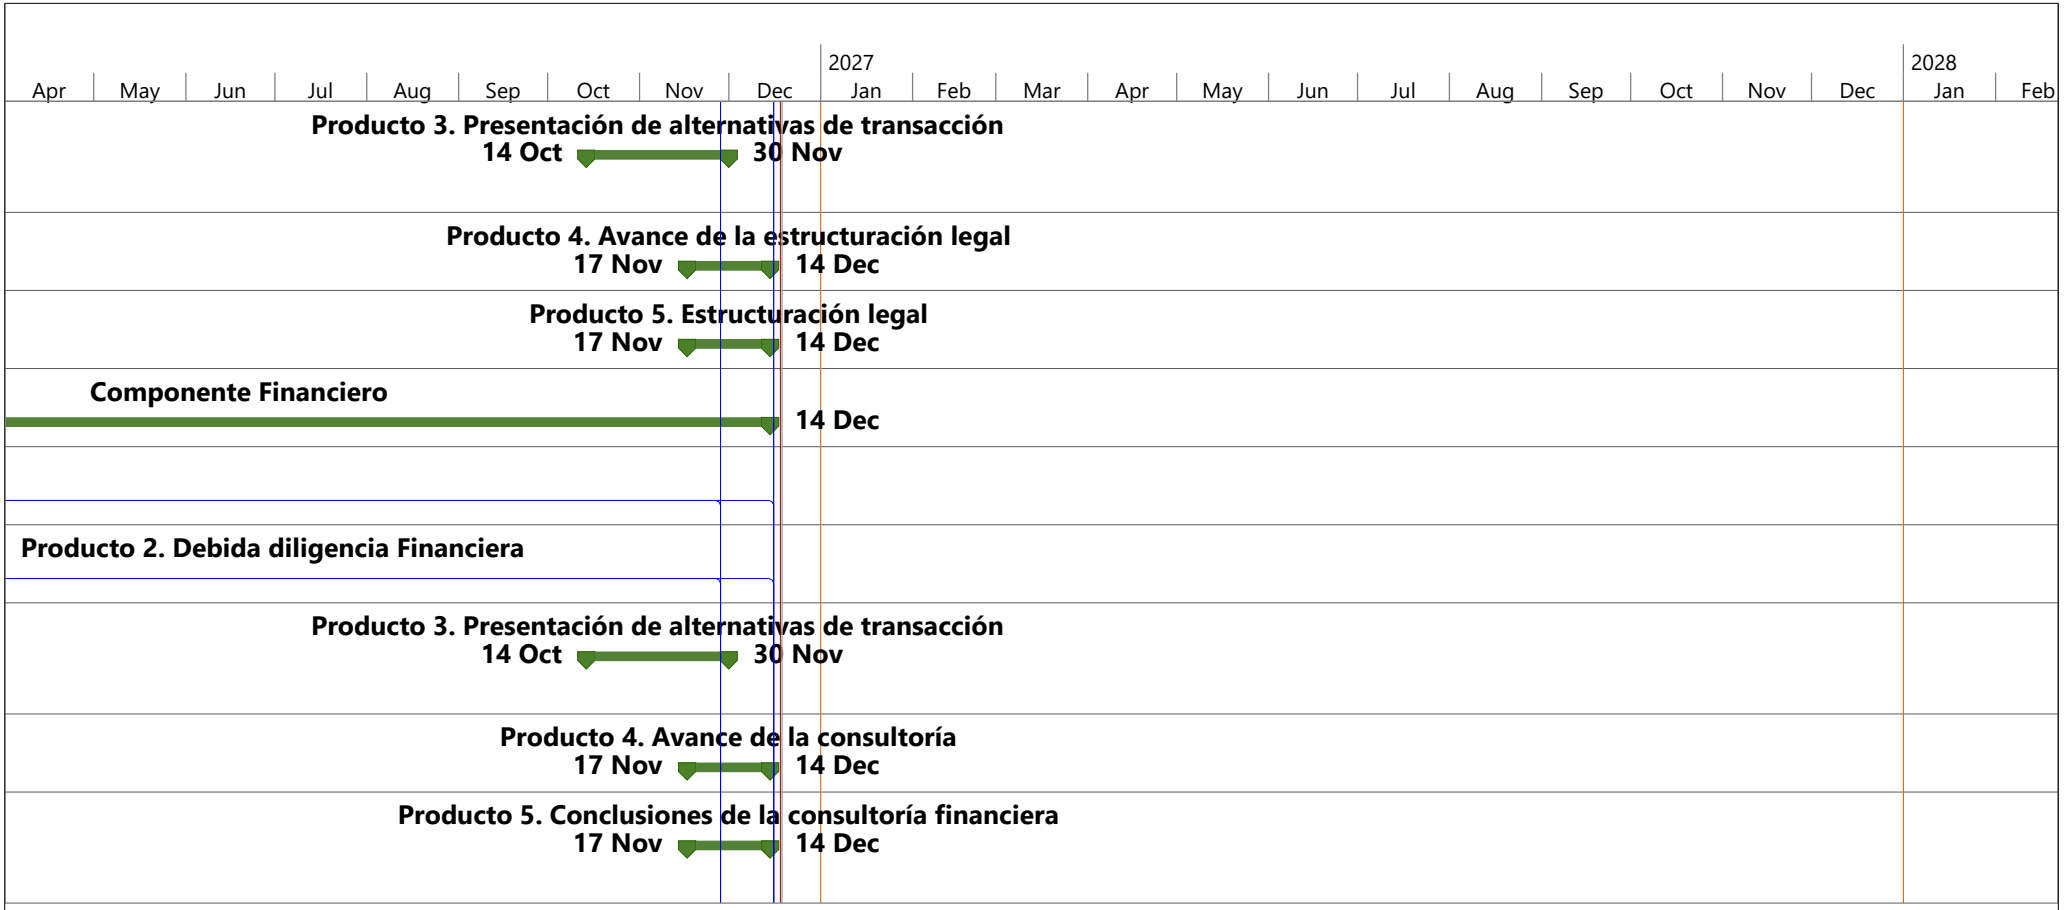

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

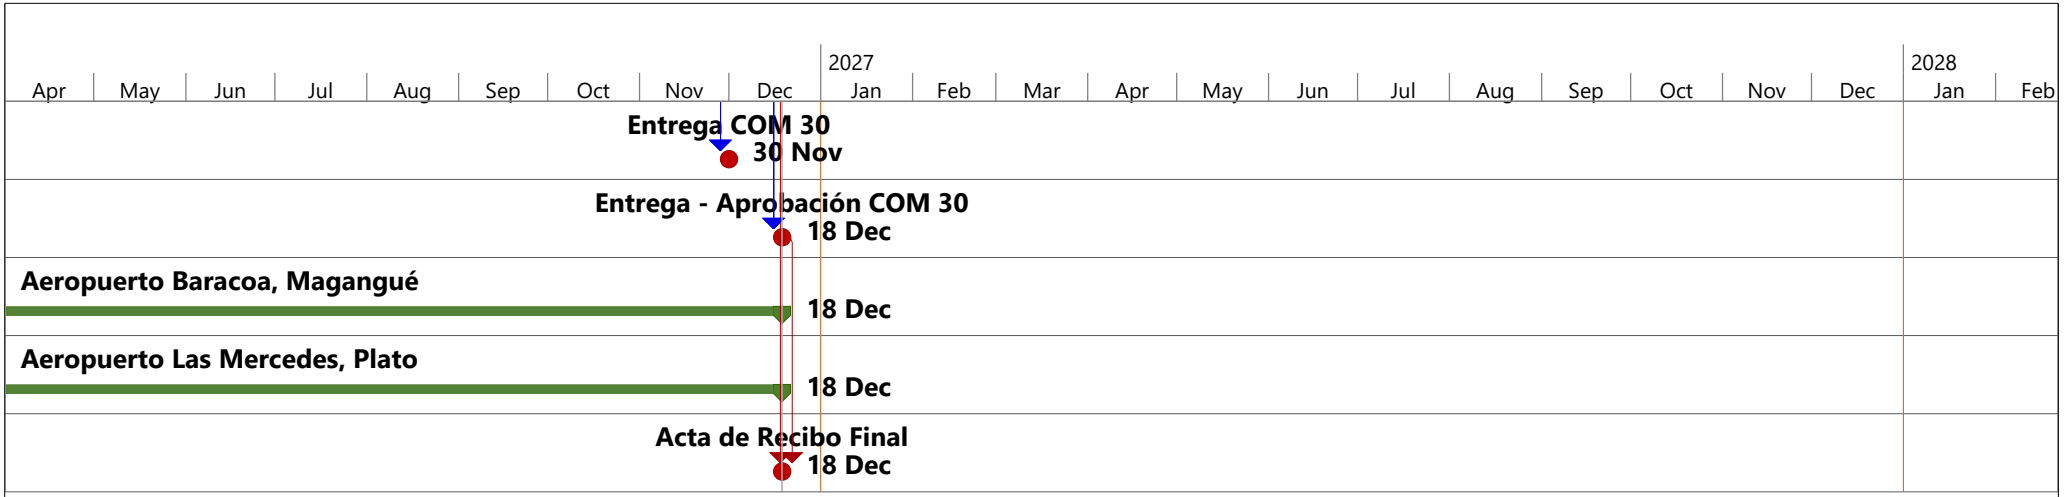

Proyecto: CONECTIVIDAD ATLÁ
Fecha: Wed 23/09/26

Tarea		Progreso resumido		Resumen manual	
División		Tareas externas		solo el comienzo	
Hito		Hito externo		solo fin	
Resumen		Tarea inactiva		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Resumen inactivo		Tareas críticas	
Tarea resumida		Tarea manual		División crítica	
Tarea crítica resumida		solo duración		Progreso	
Hito resumido		Informe de resumen manual			

Bogotá, 21 de enero de 2026 **2026-IN023-0130**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.

Asunto: Respuesta al comunicado INTERPMA-162. Requerimiento de Interventoría No. 002 de Interventoría y solicitud de plan de acción, conforme a los tiempos de desarrollo de los Entregables y la falta de aprobación.

Cordial saludo,

En atención al comunicado INTERPMA-162, mediante el cual la Interventoría emite concepto frente a la reprogramación del cronograma ajustado a once (11) meses (V4) y formula observaciones asociadas a la justificación técnica presentada por la Consultoría, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

1. **Sobre los mayores tiempos en la definición de actividades**

En relación con las observaciones formuladas por la Interventoría respecto a los mayores tiempos asociados a la definición de actividades del Componente 7, la Consultoría considera pertinente precisar que, si bien los procesos de revisión y aprobación de productos por parte de la Interventoría constituyen actividades previsibles dentro de la ejecución contractual, la ejecución integral del componente requiere necesariamente contar con una metodología previamente aprobada, en tanto esta define los lineamientos técnicos, el alcance de las actividades de campo y su adecuada articulación con los demás componentes del proyecto.

En este sentido, la referencia al proceso de aprobación de la metodología no tuvo como finalidad trasladar responsabilidades ni desconocer las obligaciones contractuales de la Consultoría, sino poner de manifiesto una condición técnica indispensable para el desarrollo ordenado del componente conforme a su alcance y niveles de calidad exigidos.

Así mismo, se informa que la Consultoría ya realizó la entrega del Componente 7 correspondiente al municipio de Magangué, lo cual evidencia que, una vez superadas las etapas metodológicas requeridas, las actividades se desarrollaron conforme a lo programado. En consecuencia, la Consultoría continuará implementando los mecanismos de gestión necesarios para garantizar la alineación de los entregables restantes con el plazo contractual vigente.

Adicionalmente, frente a lo indicado por la Interventoría respecto a que no se aceptan sustentos basados en los tiempos de aprobación, se precisa que, si bien la entrega oportuna de los productos

es responsabilidad de la Consultoría, los procesos de revisión, retroalimentación y aprobación corresponden a dinámicas iterativas propias de la ejecución contractual, que se desarrollan de manera coordinada entre la Consultoría y la Interventoría, con el objetivo de garantizar la calidad técnica de los entregables.

La Consultoría reitera su compromiso de fortalecer la calidad técnica de los productos en su versión inicial y de optimizar los tiempos de atención de observaciones, con el fin de asegurar la ejecución del proyecto conforme al cronograma aprobado.

2. **Sobre las evidencias relacionadas con aspectos de seguridad en actividades de campo.**

Frente a lo indicado por la Interventoría respecto a la no remisión de "evidencias de las acciones descritas sobre los aspectos de seguridad presentados", la Consultoría considera necesario precisar que la naturaleza de las situaciones de seguridad reportadas no siempre permite la generación de evidencias documentales formales, más allá de los registros operativos y técnicos propios del desarrollo de actividades de campo.

En este sentido, las situaciones de seguridad informadas por la Consultoría se encuentran debidamente consignadas en la Bitácora de actividades de topografía, así como en los informes de Oferta y Demanda de Transporte y en el informe de estudios geológicos–geotécnicos y de pavimentos, los cuales fueron remitidos como parte de la respuesta al correo "PMA. 2025-IN023-4220 | Etapa I. Componente 1 – Cronograma de Trabajo Versión 4", enviado el 26 de diciembre de 2025. Así mismo, estos aspectos han sido expuestos y discutidos de manera reiterada en los diferentes comités de seguimiento del proyecto, siendo de conocimiento de las partes.

Adicionalmente, se precisa que las actividades de campo asociadas al proyecto deberían ser desarrolladas con la presencia y acompañamiento de la Interventoría, razón por la cual dichas situaciones no solo fueron informadas oportunamente, sino que debieron ser conocidas y registradas por ambas partes, en el marco de sus funciones de seguimiento y control.

En consecuencia, si bien la Consultoría tiene la obligación de reportar este tipo de situaciones, no resulta procedente exigir evidencias adicionales distintas a los registros técnicos y operativos existentes, toda vez que el control y seguimiento de las actividades de campo es una responsabilidad compartida, en la que tanto la Consultoría como la Interventoría deben llevar su propio registro y control de lo acontecido en territorio.

3. **Sobre el impacto en el desarrollo de actividades**

En atención a las observaciones formuladas por la Interventoría respecto a los componentes 2, 5 y 8, la Consultoría adelanta un seguimiento específico orientado a optimizar los tiempos de atención de observaciones y garantizar la entrega oportuna de los productos pendientes conforme al cronograma vigente.

Particularmente, para el Componente 5 se realizará una revisión de los criterios de categorización de observaciones, con el fin de asegurar su correcta aplicación y reducir la recurrencia de ajustes. Así mismo, respecto al Componente 8, se priorizará la culminación de los entregables correspondientes a los aeropuertos pendientes.

Frente a lo indicado por la Interventoría respecto al impacto en el desarrollo de las actividades contractuales, la Consultoría considera pertinente precisar que las situaciones observadas en los Componentes 5 y 8 corresponden a ciclos completos de gestión de los entregables, los cuales incluyen procesos de elaboración, revisión, ajuste y retroalimentación técnica, propios de la complejidad de los productos y de la necesaria articulación entre especialidades.

En este sentido, los tiempos asociados a dichos componentes se encuentran vinculados a procesos iterativos propios de su alcance técnico y de la necesaria articulación entre especialidades, los cuales

han sido abordados de manera coordinada entre la Consultoría y la Interventoría, tal como ha sido expuesto en comunicaciones y respuestas previas.

Adicionalmente, la Consultoría manifiesta que validará técnicamente qué entregables pueden ser remitidos de manera anticipada, de acuerdo con la infraestructura existente de los aeródromos y el desarrollo modular del proyecto. No obstante, se precisa que la ejecución del proyecto se encuentra actualmente regida por un cronograma aprobado, el cual define la secuencia y los plazos de los diferentes componentes, razón por la cual la entrega anticipada de productos deberá realizarse únicamente cuando resulte técnica y contractualmente viable.

En particular, frente a las actividades asociadas a los levantamientos arquitectónicos y topográficos, así como a los estudios de suelos y de pavimentos, se precisa que la Consultoría ya ha venido adelantando acciones concretas orientadas a su desarrollo progresivo. En este marco, se cuenta con un Reporte de avances del levantamiento de información primaria, el cual consolida resultados preliminares obtenidos en campo, así como con la ejecución de una prueba piloto que permitió validar la metodología, los instrumentos de captura de información y los criterios técnicos aplicables a dichas actividades. Estos insumos constituyen avances verificables que soportan el enfoque modular del proyecto y permiten, en la medida en que resulte técnica y contractualmente viable, la remisión anticipada de productos o entregables parciales, sin perjuicio de los ajustes y complementaciones requeridas para la consolidación de las versiones finales conforme al cronograma aprobado.

En particular, respecto a los componentes de Metodología y Debida diligencia jurídica y financiera, se aclara que, si bien el cronograma contempla tiempos ajustados para su desarrollo, la Metodología jurídica y financiera fue entregada en la fecha prevista, evidenciando el cumplimiento de lo programado por parte de la Consultoría.

Así mismo, la Consultoría continuará implementando acciones orientadas a reducir los tiempos de atención de observaciones, fortalecer la calidad técnica de los entregables en su versión inicial, garantizar la articulación técnica entre las diferentes especialidades del proyecto y cumplir con las fechas establecidas en el cronograma aprobado.

Finalmente, la Consultoría reitera su compromiso de adoptar las medidas necesarias para evitar la materialización de impactos que afecten el desarrollo oportuno del proyecto, manteniendo el equilibrio entre el cumplimiento del cronograma, la calidad técnica de los productos y las condiciones contractuales vigentes.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal

Anexos: *N/A*

CC. *AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.*
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Bogotá, 23 de enero de 2026 **2026-IN023-0160**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.

Asunto: Entrega Etapa II. Componente 7. Prognosis de la demanda y análisis socioeconómico (Versión 1) - SKBC.

Cordial saludo,

En atención a lo requerido para para la Etapa II, numeral 3.2.1.2 Componente 7. Pronósticos de la demanda y análisis socioeconómico del Formato 8. Especificaciones Técnicas para el desarrollo de las actividades de la Consultoría, presentamos para su revisión y respectivo concepto la primera versión del aeropuerto SKBC, la cual fue debidamente cargada en el ACC y enviado al flujo correspondiente:

- SKBC_ET2_C7_ZZX_DYO_INF_00

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado
CESAR ALBERTO ROSADO
Representante Legal

Anexos: *N/A*

CC. *AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.*
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Bogotá, 17 de abril de 2026 **2026-IN023-1120**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.

Asunto: Alcance al comunicado 2026-IN023-1037 con el que se da respuesta al comunicado INTERPMA-242. Respuesta a solicitud de prorroga No. 2

Cordial saludo,

En atención al comunicado INTERPMA-242 del 7 de abril de 2026, mediante el cual la Interventoría emitió concepto frente a la solicitud de prórroga No. 2 presentada por esta Consultoría a través de los comunicados 2026-IN023-0527 y 2026-IN023-0867, se toma nota del concepto emitido, en el cual se reconoce la procedencia técnica de la ampliación del plazo contractual por el término de tres (3) meses, sujeta a la validación y viabilidad del cronograma ajustado.

En este sentido y atendiendo lo solicitado por la Interventoría, mediante el presente se remite el cronograma ajustado incorporando las observaciones señaladas en los comunicados INTERPMA-207 e INTERPMA-242, junto con la matriz de producto no conforme debidamente diligenciada y el Formato 69 requerido para el trámite correspondiente.

Finalmente, solicitamos respetuosamente a esa Interventoría emitir concepto favorable frente al término solicitado y dar el trámite correspondiente a la modificación contractual requerida, con fundamento en la precisión técnica presentada en los oficios 2026-IN023-0527 y 0867, en los soportes allegados con el comunicado 2026-IN023-0527 y en la trazabilidad expuesta.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado
CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal
Anexos: Cronograma de Trabajo (3 meses de prorroga), matriz de observaciones diligenciada

CC. *AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.*
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Bogotá, 11 de mayo de 2026 **2026-IN023-1320**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.

Asunto: Alcance al comunicado 2026-IN023-1120 "Solicitud de prórroga"

Dando alcance al comunicado 2026-IN023-1120, mediante el cual se presentó la solicitud de prórroga No. 2, la Consultoría se permite precisar el sustento técnico de la solicitud de ampliación del plazo contractual por un término de un (1) mes adicional para un total de cuatro (4) meses, sin adición al valor inicialmente pactado.

En este punto resulta relevante señalar que el alcance contractual comprende la elaboración de los Esquemas de Planificación Aeroportuaria de los aeropuertos SKBC, SKMG y SKPL, así como el análisis de integración operacional, económica y de conectividad de la región, con estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad.

La ejecución simultánea de los Planes Maestros o Esquemas de Planificación genera una carga administrativa, de coordinación y de reprocesos por el triple de volumen de información y la naturaleza de todos los proyectos, lo que complejizó la gestión del cronograma con relación a proyectos de alcance unitario, dadas las circunstancias ajenas a la consultoría que impidieron cumplir con las fechas estimadas de los entregables, las cuales se encuentran debidamente explicadas en la solicitud realizada con fecha de 17 de abril. Por lo anterior nos vemos obligados a tramitar la solicitud de prórroga.

Con base en lo anterior, la formulación y evaluación de alternativas de desarrollo, se vio afectada por los entregables de la Etapa 2 (los cuales se justifican dentro de la solicitud de los primeros 3 meses), es decir, a los inconvenientes presentados para lograr cerrar los componentes, 6, 10,11 y 12 (demoras descritas, todas derivadas de causas no imputables al contratista) que han generado un impacto directo sobre la consecución de las fases subsiguientes, especialmente el inicio de la Etapa 3, correspondiente a la Fase de prefactibilidad; la cual incluye el desarrollo de los análisis a nivel de prefactibilidad , que se han convertido en el punto crítico del contrato. Dada la complejidad y el nivel de información a procesar, su correcta estructuración es vital para asegurar la calidad técnica, viabilidad y coherencia integral del Plan Maestro o Esquema de Planificación, lo cual requiere garantizar el cumplimiento de las rigurosas secuencias técnicas, revisiones y validaciones establecidas, además de un incremento en el recurso humano.

En diferentes mesas de trabajo surgieron observaciones, precisiones técnicas y elementos complementarios que deben ser evaluados de manera integral antes de definir y aprobar la

alternativa que servirá de base para el desarrollo de las fases subsiguientes de prefactibilidad y factibilidad.

La Consultoría precisa que dichas observaciones y elementos de análisis hacen parte del desarrollo normal de esta fase del proyecto, en la medida en que la definición de la alternativa constituye una decisión técnica crítica que debe estar soportada en criterios operacionales, de capacidad, conectividad, sostenibilidad ambiental, impactos sociales, urbanos, prediales, financieros y de seguridad operacional. Por tanto, el cierre de esta actividad no corresponde a una actuación unilateral del consultor, sino a un proceso técnico de revisión y validación sucesiva con la Interventoría y la Aerocivil, orientado a garantizar que la alternativa finalmente seleccionada sea consistente con los objetivos del contrato y con los requerimientos de la Entidad.

Posterior a las mesas de trabajo adelantadas con la Interventoría y la Aerocivil, se ha continuado el proceso de revisión técnica, análisis, validación y concertación de las alternativas de desarrollo formuladas para los aeropuertos objeto de la consultoría. En consecuencia, mientras no se encuentre cerrada y aprobada la alternativa de desarrollo, no resulta técnicamente viable cerrar de manera definitiva los componentes dependientes de dicha decisión, ni avanzar al cierre integral de los estudios de prefactibilidad y factibilidad sin riesgo de afectar la consistencia metodológica y técnica de los productos finales

La ampliación solicitada se fundamenta, en la necesidad de culminar adecuadamente el proceso de revisión, validación y aprobación de la alternativa de desarrollo, incorporando las observaciones formuladas por la Interventoría y la Aerocivil, consolidando los análisis complementarios requeridos y ajustando los insumos técnicos que soportan la matriz multicriterio y la selección de la alternativa. Esta situación es ajena al control exclusivo de la Consultoría, en tanto depende de la interacción técnica entre las partes intervinientes, de la revisión de observaciones especializadas y de la validación institucional de una decisión estructurante para el proyecto.

La Consultoría deja expresa constancia de que la presente solicitud no obedece a deficiencias en la planeación, organización o ejecución técnica de sus actividades, sino a la necesidad de atender de forma rigurosa un proceso técnico de revisión y concertación propio de la maduración de alternativas en proyectos de planificación aeroportuaria. La ampliación pretendida busca preservar la calidad, completitud, coherencia técnica y suficiencia analítica de los productos contractuales, evitando que se adopten decisiones prematuras sobre una alternativa que constituye el insumo principal para los componentes posteriores.

Durante el término adicional solicitado, la Consultoría adelantará, entre otras, las siguientes actividades: i) cierre y trazabilidad de las observaciones formuladas en mesas de trabajo con Interventoría y Aerocivil; ii) consolidación de los análisis complementarios requeridos para las alternativas evaluadas; iii) ajuste, validación y cierre de la matriz multicriterio; iv) preparación de los insumos técnicos requeridos para la aprobación de la alternativa de desarrollo; v) articulación de los resultados con los componentes de prefactibilidad y factibilidad dependientes de dicha alternativa; y vi) avance de actividades de diseño asociadas a la alternativa en proceso de validación, las cuales requieren alta coordinación interdisciplinaria, revisión de criterios técnicos, iteraciones sucesivas y consistencia entre los componentes lado aire, lado tierra, ambiental, social, predial, urbano, operacional, financiero y de conectividad.

1. Con el fin de sustentar con mayor precisión el plazo requerido, la Consultoría se permite cuantificar el tiempo de afectación identificado en los componentes críticos del proyecto, precisando que la presente exposición distingue entre tiempos brutos de afectación y el plazo neto de prórroga solicitado, en consideración a que algunos eventos se desarrollaron de manera parcialmente concurrente dentro de la ruta crítica. Así mismo, se aclara que esta cuantificación no corresponde a una acumulación indiscriminada de todos los hechos reportados, sino a una trazabilidad técnica del impacto real que tuvo incidencia en la secuencia lógica del proyecto.

En adición a los tres (3) meses inicialmente solicitados mediante el comunicado 2026-IN023-1120, producto de la afectación a los Componentes 11 y 12, se debe considerar que el impacto también se trasladó indirectamente a los componentes que dependen de los Componentes 11 y 12, es decir a los Componentes de la Etapa 3 que dependen de estos dos últimos como soporte y base para sus respectivos análisis, como el caso de:

- Componente 13 (Análisis de impactos de las alternativas), el cual depende del aval de la Interventoría y Supervisión de las alternativas propuestas por la Consultoría, y con base en el comportamiento evidenciado durante la revisión y cierre de otros entregables del proyecto, se estima que dicho proceso, el cual aún se encuentra en desarrollo entre la Interventoría y la Consultoría, puede requerir de hasta quince (15) días para la consolidación y finalización de las actividades asociadas a este.
- Componentes 14 (Socialización de las alternativas) y 16 (Evaluación y selección de las alternativas) pues mientras las alternativas y sus respectivos impactos no se encuentren definidos y aprobados, no es posible adelantar adecuadamente los procesos de socialización, evaluación y selección de alternativas previstos, y considerando que el Componente 12 finaliza quince (15) días después del Componente 11, siguiendo la secuencia lógica de ejecución del proyecto, dicha diferencia en tiempo desplaza el desarrollo de los Componentes 14 y 16, toda vez que estos requieren como insumo previo la consolidación y definición de las alternativas correspondientes.

Esta afectación corresponde en total a treinta (30) días calendario adicionales a los tres (3) meses solicitados inicialmente, para un total de cuatro (4) meses.

La necesidad de este término adicional también debe valorarse frente a la naturaleza y complejidad del contrato. No se trata de la formulación de un único Plan Maestro Aeroportuario, sino de la elaboración de tres Esquemas de Planificación Aeroportuaria, articulados con estudios de conectividad e integración operacional y económica regional. Adicionalmente, los antecedentes de consultorías con características y alcances similares muestran que, por las dinámicas propias de revisión técnica, complejidad de los entregables, articulación entre componentes, aprobación de alternativas y maduración progresiva de los estudios, los plazos totales de ejecución han alcanzado hasta quince (15) meses. Bajo este referente, el plazo total solicitado para el presente contrato conserva proporcionalidad y razonabilidad, sin superar dicho parámetro y sin implicar adición presupuestal.


En consecuencia, la prórroga solicitada por un (1) mes adicional corresponde al plazo estrictamente necesario para culminar el proceso de revisión, validación y aprobación de la alternativa de desarrollo, garantizar la adecuada articulación de los componentes dependientes y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo estándares de calidad técnica, suficiencia metodológica y utilidad para la toma de decisiones por parte de la Aerocivil.

Como se aprecia a lo largo del documento, se han presentado dificultades puntuales en la ejecución del proyecto que conllevaron a un total corrido de 120 días de afectación al cronograma; dificultades que fueron paliadas mediante planes de acción y medidas de mitigación previamente concertadas con la Interventoría, que, si bien mitigaron en cierta medida los mayores plazos, los cierto es que, en algunos casos, los análisis de alternativas hicieron que el cronograma se desplazara en su totalidad, por lo que estos tiempos solo pueden ser recuperados con prórrogas o mayores plazos de ejecución, que restablezcan los tiempos según las estimaciones precontractuales.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a esa Interventoría emitir concepto favorable frente al término solicitado y dar el trámite correspondiente a la modificación contractual requerida, con fundamento en la presente precisión técnica, en la trazabilidad de las mesas de trabajo adelantadas, en las observaciones formuladas por la Interventoría y la Aerocivil, y en los soportes previamente allegados por la Consultoría.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,



CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal

Anexos: *26.05.07 Alcance al comunicado 2026-IN023-1120 Cronograma de Trabajo (4 meses de prórroga) y FORMATO 69_SOLICITUD CONTRACTUAL*

CC. *AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.*
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Bogotá, 27 de agosto de 2026 **2026-IN023-2824**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de Prórroga del Contrato de Consultoría No. 24001332 H3 de 2024.

La Consultoría se permite solicitar la ampliación del plazo contractual del Contrato de Consultoría No. 24001332 H3 de 2024 por un término de tres (3) meses y trece (13) días calendario, sin adición al valor inicialmente pactado, estableciendo como nueva fecha de terminación el 20 de diciembre de 2026.

La solicitud se sustenta en las afectaciones presentadas durante la ejecución contractual, asociadas principalmente a dificultades en actividades de campo, disponibilidad y oportunidad de información técnica y operacional, ajustes a las proyecciones de demanda, incorporación de precisiones suministradas por la Aerocivil y SATENA y los procesos de revisión y validación de las alternativas de desarrollo. Estas circunstancias incidieron directamente en la secuencia metodológica, la ruta crítica y el desarrollo de los componentes dependientes de las Etapas II, III y IV.

De igual manera, las suspensiones contractuales estuvieron relacionadas con la necesidad de consolidar las alternativas y resolver aspectos técnicos, normativos y operacionales determinantes para su cierre. Se precisa que dichos periodos no se contabilizan nuevamente dentro del plazo solicitado, sino que constituyen antecedentes de las definiciones que deben ser incorporadas y armonizadas durante la ejecución restante.

Conforme al análisis desarrollado en el Formato 69 Solicitud Modificación de Contrato, las afectaciones identificadas corresponden a ciento veintinueve (129) días calendario brutos; descontados veinticuatro (24) días de actividades concurrentes, la afectación neta asciende a ciento cinco (105) días calendario, equivalentes a tres (3) meses y trece (13) días.

Durante el término adicional, la Consultoría adelantará el cierre de las observaciones y ajustes pendientes, la consolidación de los componentes asociados a capacidad y alternativas, la validación y selección de las alternativas de desarrollo y la culminación de los productos dependientes de las Etapas III y IV. La prórroga no modifica el objeto contractual ni genera afectación presupuestal.

El detalle de las circunstancias, la cuantificación de las afectaciones, el estado de ejecución y las justificaciones técnica, jurídica y económica se encuentran contenidos en el Formato 69 que se adjunta. En consecuencia, solicitamos respetuosamente a esa Interventoría emitir concepto

favorable y dar traslado a la Aeronáutica Civil para continuar con el trámite de modificación contractual correspondiente.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado

CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal
Anexos: *FORMATO 69_SOLICITUD CONTRACTUAL*

CC. *AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.*



PMA ATLANTICO
CONSORCIO

Solicitud Prórroga Plazo Contractual

INCOPLAN

INGEPLAN.CO

ORDEN DEL DÍA

1. Contexto Del Contrato Consultoría e Interventoría
2. Estado Actual del Contrato (Etapas y Contexto)
3. Avance Componentes
4. Justificación Técnica Consultoría e Interventoría
5. Conclusiones Consultoría e Interventoría

CONTEXTO DEL CONTRATO

Contrato de Consultoría No. 24001332 H3 de 2024

Objeto: Realizar la consultoría para la elaboración del esquema de planificación aeroportuaria (EPA) de los aeródromos SKBC, SKMG Y SKPL a nivel de factibilidad, incorporando el análisis de integración operacional, económica y de conectividad del atlántico norte.

Contrato de Interventoría No. 24001423 H3 de 2024.

Objeto: Interventoría para la elaboración del epa de los ATOS de SKBC, SKMG y SKPL a nivel de factibilidad; análisis de integración operacional, económica y conectividad de atlántico.

CONSULTORÍA

Avance Físico		Avance Financiero	
Fecha de inicio	01/07/25	Valor inicial del contrato	$ 6,703,059,171,00
Fecha prorroga (aprobación)	23/12/25		
Fecha de finalización inicial	31/05/26	Adiciones	$ 0.00
Días Plazo	335	Ajustes	$ 0.00
Inicio suspensión 1	22/05/26	En trámite de pago	$ 0.00
Prorroga 1 suspensión 1	22/06/26	Saldo no ejecutado a liberar	$ 0.00
Prorroga 2 suspensión 1	31/07/26	Valor ejecutado	$ 1.449.681.617,99
Fin suspensión 1	31/08/26	Valor pendiente de pago al contratista	$ 5.253.377.553,01
Fecha de finalización final	06/09/26		

INTERVENTORÍA

Estado financiero			
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR ORDEN DE PAGO**
Valor inicial del contrato	$ 1,806,866,206.00	$ 806,310,509.00	$ 0.00
Adiciones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Ajustes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
En trámite de pago	$ 0.00	$ 0.00	$ 105,588,583.00
Saldo no ejecutado a liberar	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Valor pendiente de pago al contratista		$ 0.00	$ 894,967,114.00
Valor total contrato	**$ 1,806,866,206.00**	**$ 806.310.509,00**	**$ 1.000.555.697,00**

ETAPAS DEL CONTRATO



III – PREFACTIBILIDAD

Concluye el EPA, se ejecutan los estudios y diseños para horizonte de 30 años

Programado 100%
Ejecutado 62%

IV - FACTIBILIDAD

Desarrollo de estudios nivel factibilidad de alternativa seleccionada a PAL 0.

Programado 100%
Ejecutado 0%

II – DIAGNÓSTICO

Análisis del estado actual de todos los componentes y aspectos del aeropuerto

Programado 100%
Ejecutado 99%

V – VIABILIDAD

Estructuración jurídica y financiera

Programado 100%
Ejecutado 33%

I - CARACTERIZACIÓN


Planeación y evaluación

Programado 100%
Ejecutado 100%

CIERRE DEL PROYECTO

Programado 100%
Ejecutado 0%

CONTEXTO DEL CONTRATO

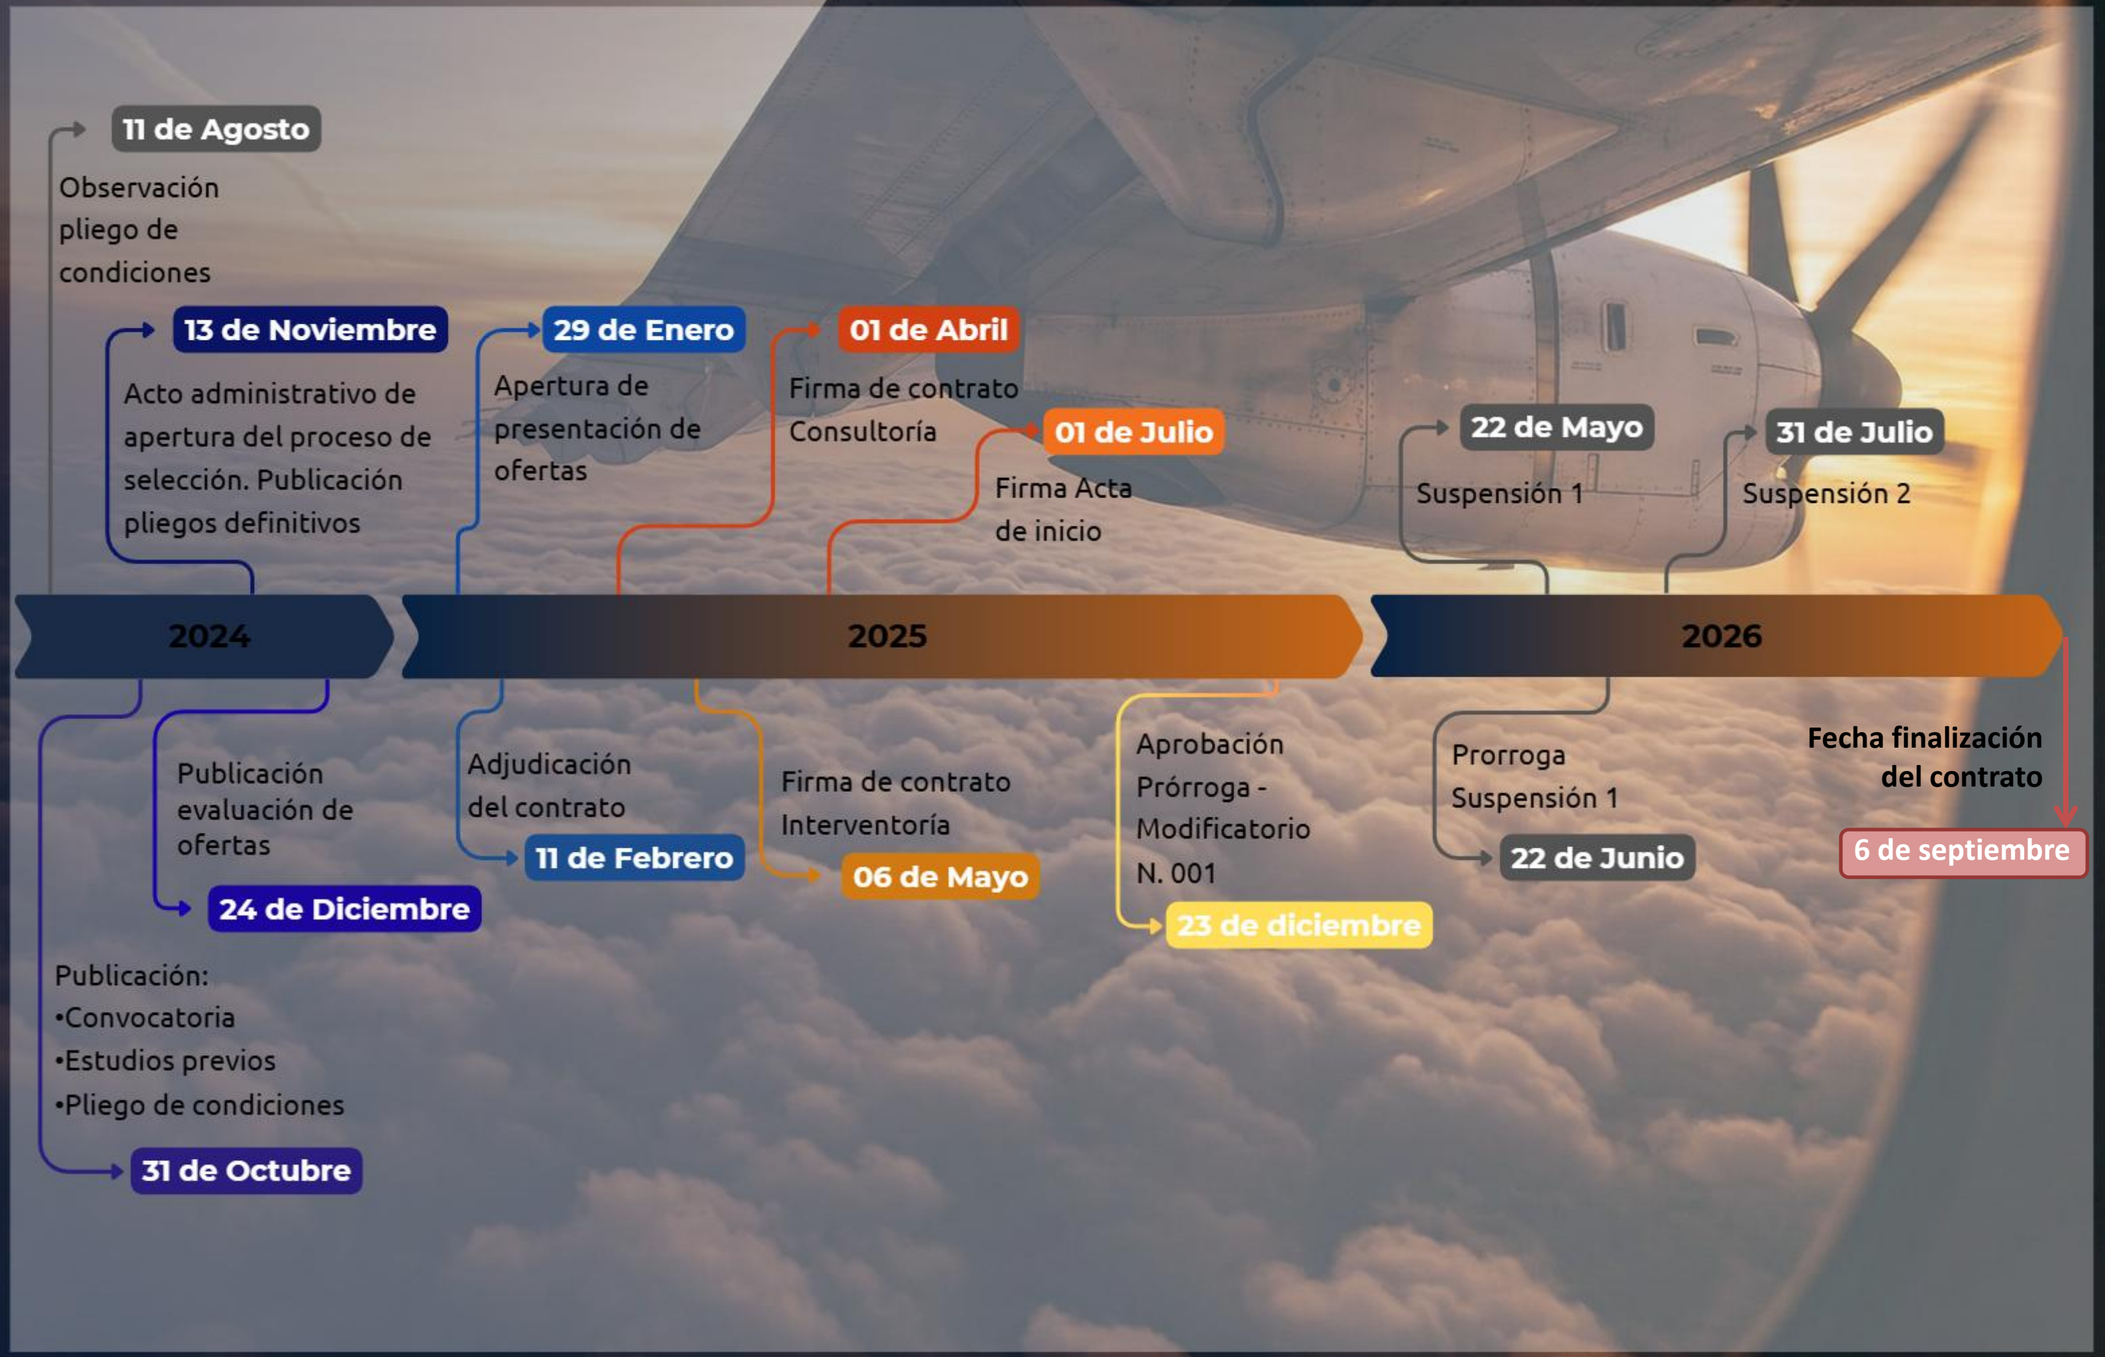

AVANCE EN ENTREGABLES

Componente	Avance (%)	Componente	Avance (%)
Componente 1	100%	Componente 11	99%
Componente 2	100%	Componente 12	98%
Componente 3	100%	Componente 13	90%
Componente 4	100%	Componente 14	8 %
Componente 5	100%	Componente 15	99%
Componente 6	100%	Componente 16	86%
Componente 7	100%	Componente 19	89%
Componente 8	100%	Componente 21	83%
Componente 9	100%	Componente 22	100%
Componente 10	100%	Componente 30	33%

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA CONSULTOR

1 **Riesgos De Seguridad En Banco Y Plato afectando el Componente 6**

- Amenazas directas e intimidaciones con arma de fuego
- Presencia de actores no identificados
- Contexto de paro armado

2 **Limitada Disponibilidad De Información**

- Fuerte reserva poblacional para suministrar datos en territorio
- Solicitudes de información institucionales sin respuesta y necesidad de uso de información secundaria.

3 **Recalibración del componente 7**

- La falta de información oportuna obligó a ejecutar procesos con información secundaria

4 **Interdependencia Funcional**

- Los cambios sustanciales en las proyecciones de demanda alteraron por completo los análisis de capacidad y el planteamiento de alternativas de expansión.

5 **Interdependencia Funcional**


- La afectación a los Componentes 11 y 12, impacto también a los Componentes de la Etapa 3, los cuales dependen de estos dos últimos como soporte y base para sus respectivos análisis.

Afectados por falta de insumos validados, retrasos en la información base y por dependencia entre componentes

- Directa: Componentes 11 y 12
- Funcional: Etapa III y Etapa IV

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA INTERVENTOR

PLAZO ACTUAL CONTRACTUAL: 11 MESES

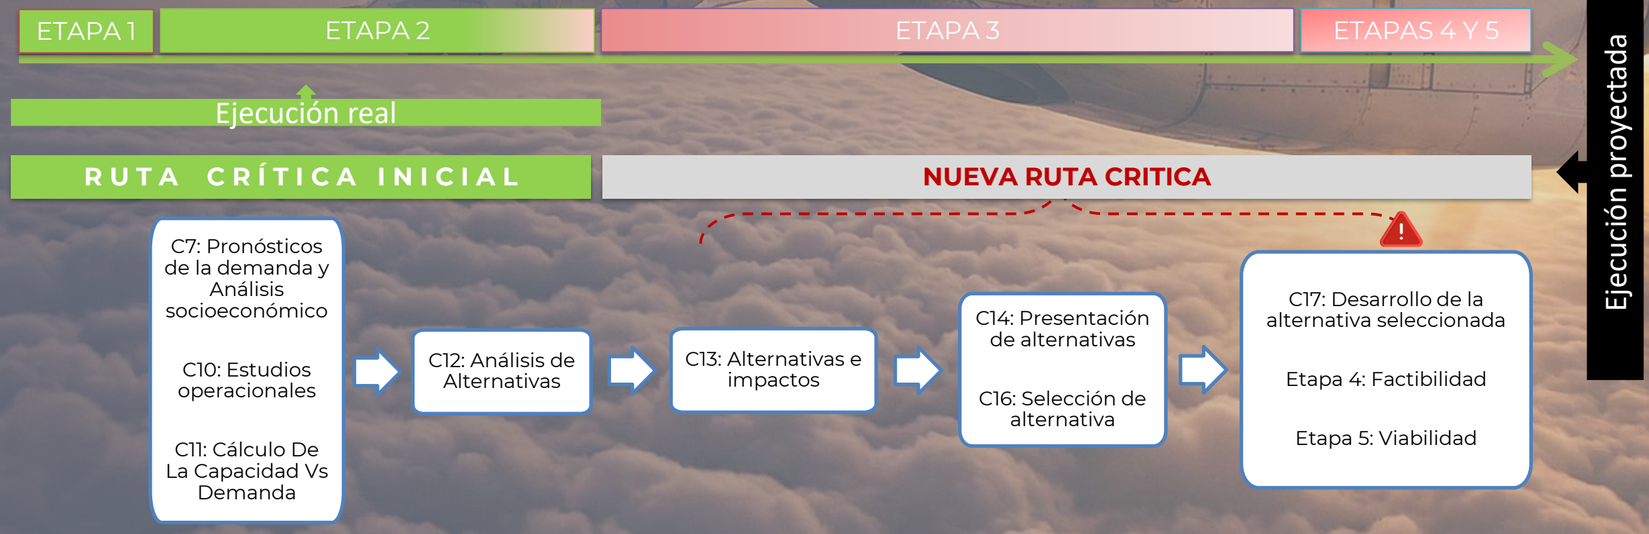

CONCLUSIONES

CONSULTORÍA

La extensión del plazo contractual por **85 días** calendarios, fijando como nueva fecha de finalización el **20 de diciembre de 2026**, es una medida necesaria para mitigar el impacto de factores externos y no imputables a la Consultoría, tales como alteraciones de orden público, demoras en la obtención de información oficial, reajuste de componentes, al plazo estrictamente necesario para culminar el proceso de revisión, validación y aprobación de la alternativa de desarrollo y garantizar la adecuada articulación de los componentes dependientes

Este ajuste al cronograma permitirá restablecer la secuencia metodológica del proyecto, asegurando que los componentes de diseño y planeación cuenten con los insumos técnicos y operativos debidamente validados.

La ampliación del plazo no implica una adición de valor al contrato; su finalidad es estrictamente técnica para garantizar que los productos finales cumplan con los estándares de calidad, consistencia y suficiencia analítica exigidos por la Aerocivil.

Con esta prórroga, el Consorcio reafirma su compromiso de entregar una planificación aeroportuaria sólida que sirva como herramienta efectiva para la toma de decisiones estratégicas en la región del Atlántico.

INTERVENTORÍA

Procedencia Técnica: La modificación es viable toda vez que las afectaciones ajenas a la responsabilidad del Consultor recaen sobre los componentes críticos e interdependientes C13, C14 y C17, lo cual desplaza la ruta crítica del proyecto y genera un impacto en cadena sobre la programación de los productos posteriores.

Fundamento Jurídico: La prórroga se sustenta en la accesibilidad y dependencia funcional del contrato de interventoría respecto al contrato vigilado. Lo anterior encuentra amparo legal en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual faculta a la Entidad para prorrogar la interventoría por el mismo término del contrato principal.

Procedencia Operativa: La prórroga del plazo es procedente debido a que la extensión de la vigencia contractual exige garantizar la permanencia del equipo profesional mínimo requerido para la continuidad de la supervisión. Se precisa que esta solicitud no modifica el objeto ni amplía el alcance técnico del contrato, limitándose al ajuste del cronograma necesario para asegurar las labores de seguimiento y control.

Conclusión y Recomendación: Se recomienda a la Entidad dar trámite a la prórroga contractual, previa verificación de los soportes de afectación y la aprobación del nuevo cronograma. Vale destacar que la ampliación del plazo resulta indispensable para garantizar la continuidad, calidad y oportunidad en el desarrollo de la supervisión.

PMA
ATLANTICO
CONSORCIO

GRACIAS

