
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE**	**24.81 sem.**	**lun 28/10/24**	**lun 28/04/25**
2	**OBRAS PRLIMINARES**	**1.18 sem.**	**lun 28/10/24**	**mar 05/11/24**
3	Localizacion y replanteo	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
4	Campamento de obra, incluye oficina y bodega	2 días	mar 29/10/24	mié 30/10/24
5	Cerramiento provisional de obra	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24
6	Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes	4 días	mié 30/10/24	mar 05/11/24
7	Baño movil	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
8	Traslado del Gallinero existente	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24
9	**CIMENTACIÓN**	**3.73 sem.**	**mar 05/11/24**	**lun 02/12/24**
10	Excavación manual de terreno para cimentación incluye acarreo de material sobrante.	5 días	mar 05/11/24	mar 12/11/24
11	Solados de limpieza e=0,03 m	4 días	mié 13/11/24	lun 18/11/24
12	Fundicion de viga de cimentación en concreto de 21 mpa	4 días	mié 27/11/24	lun 02/12/24
13	Zapatas en concreto de 21 mpa	4 días	jue 21/11/24	mar 26/11/24
14	Acero de refuerzo	9.5 días	vie 15/11/24	mié 27/11/24
15	**PISO BASE**	**1.09 sem.**	**mar 03/12/24**	**mar 10/12/24**
16	Base en rocamuerta compactada para placa de contrapiso e:0,3 m	3 días	mar 03/12/24	jue 05/12/24
17	Placa de contrapiso en cocnreto de 3000 psi e=0,10 m incluye malla electrosoldada	3 días	vie 06/12/24	mar 10/12/24
18	**ESTRUCTURA CONCRETO**	**1.82 sem.**	**mar 03/12/24**	**sáb 14/12/24**
19	Columnas en concreto de 21 mpa	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24
20	Acero de refuerzo columnas	7 días	mar 03/12/24	mié 11/12/24
21	Vigas en concreto de 21 mpa	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24
22	Acero de refuerzo vigas	7 días	mar 03/12/24	mié 11/12/24
23	**MAMPOSTERÍA**	**2.58 sem.**	**lun 16/12/24**	**sáb 04/01/25**
24	Bloque en concreto incluye dovelas.	14.2 días	lun 16/12/24	sáb 04/01/25
25	Calados redondos de 12 x 19 x 19 cms	7 días	sáb 21/12/24	mar 31/12/24
26	**CUBIERTA**	**2.85 sem.**	**sáb 04/01/25**	**sáb 25/01/25**
27	Teja Termoacustica Trapeizodal	5.7 días	sáb 18/01/25	sáb 25/01/25
28	Estructura metalica para cubierta - PERFIL PHR C 160X160	10 días	sáb 04/01/25	sáb 18/01/25
29	Estructura metalica para cubierta - ANGULO 1" 1/8	5 días	lun 13/01/25	sáb 18/01/25
30	**ACABADO DE MUROS**	**0.82 sem.**	**sáb 04/01/25**	**sáb 11/01/25**
31	Estuco y pintura interior en estuco plástico, con pintura vinilo color blanco	4.5 días	sáb 04/01/25	sáb 11/01/25
32	Enchape Pared Blanca Plana, 20 x 40 cm, Color Blanco Corona o equivalente	3 días	sáb 04/01/25	jue 09/01/25
33	**ACABADO DE PISO**	**2.07 sem.**	**sáb 25/01/25**	**lun 10/02/25**
34	Mortero de nivelación 1:3 e=0,05	3 días	sáb 25/01/25	mié 29/01/25
35	Enchape Piso baldosa grano 1 Alfa 30 x 3	6 días	mié 29/01/25	jue 06/02/25
36	Guardaescobas en Tableta de granito	2.4 días	jue 06/02/25	lun 10/02/25
37	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1.45 sem.**	**lun 10/02/25**	**mié 19/02/25**
38	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradu	4 días	lun 10/02/25	vie 14/02/25
39	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradu	5 días	lun 10/02/25	sáb 15/02/25
40	Ventana en vidrio laminado con marco en	8 días	lun 10/02/25	mié 19/02/25
41	Ventanas para baños	4 días	lun 10/02/25	vie 14/02/25
42	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**2.02 sem.**	**sáb 04/01/25**	**lun 20/01/25**
43	Suministro e instalación de Instalaciones e	11.1 días	sáb 04/01/25	lun 20/01/25
44	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS**	**8.89 sem.**	**vie 06/12/24**	**lun 10/02/25**
45	Suministro e instalación de Instalaciones H	4 días	vie 06/12/24	mié 11/12/24
46	Suministro e instalacion de Sanitario Ref: I	1 día	jue 06/02/25	vie 07/02/25
47	Suministro e instalacion de Lavamanos bla	1 día	jue 06/02/25	vie 07/02/25
48	Suministro e instalación de espejo de bord	1 día	vie 07/02/25	sáb 08/02/25
49	Juego de Accesorios en acero para baños	1 día	sáb 08/02/25	lun 10/02/25
50	**OBRAS EXTERIORES**	**8 sem.**	**mié 19/02/25**	**lun 21/04/25**
51	Fundición de rampa en concreto de 1.20 d	7 días	jue 06/03/25	sáb 15/03/25
52	Acero de refuerzo rampa	12 días	mié 19/02/25	jue 06/03/25
53	Cunetas perimetral para aguas lluvias en c	6 días	mié 19/02/25	jue 27/02/25
54	Baranda metálica rampa	5 días	sáb 15/03/25	vie 21/03/25
55	Bancas en concreto diametro 0.46 m Ref.	4 días	sáb 29/03/25	jue 03/04/25
56	Bancas en concreto fundido placa de 10 c	5 días	sáb 29/03/25	vie 04/04/25
57	Piso en adoquin	10 días	sáb 15/03/25	sáb 29/03/25
58	Bordillos de confinamiento rampa y plazole	7 días	sáb 15/03/25	mié 26/03/25
59	Jardines exteriores	7 días	vie 04/04/25	lun 14/04/25
60	Aseo General	3 días	lun 14/04/25	lun 21/04/25
61	**DOTACIÓN**	**4 días**	**lun 21/04/25**	**vie 25/04/25**
62	**PMT**	**136 días**	**lun 28/10/24**	**lun 28/04/25**

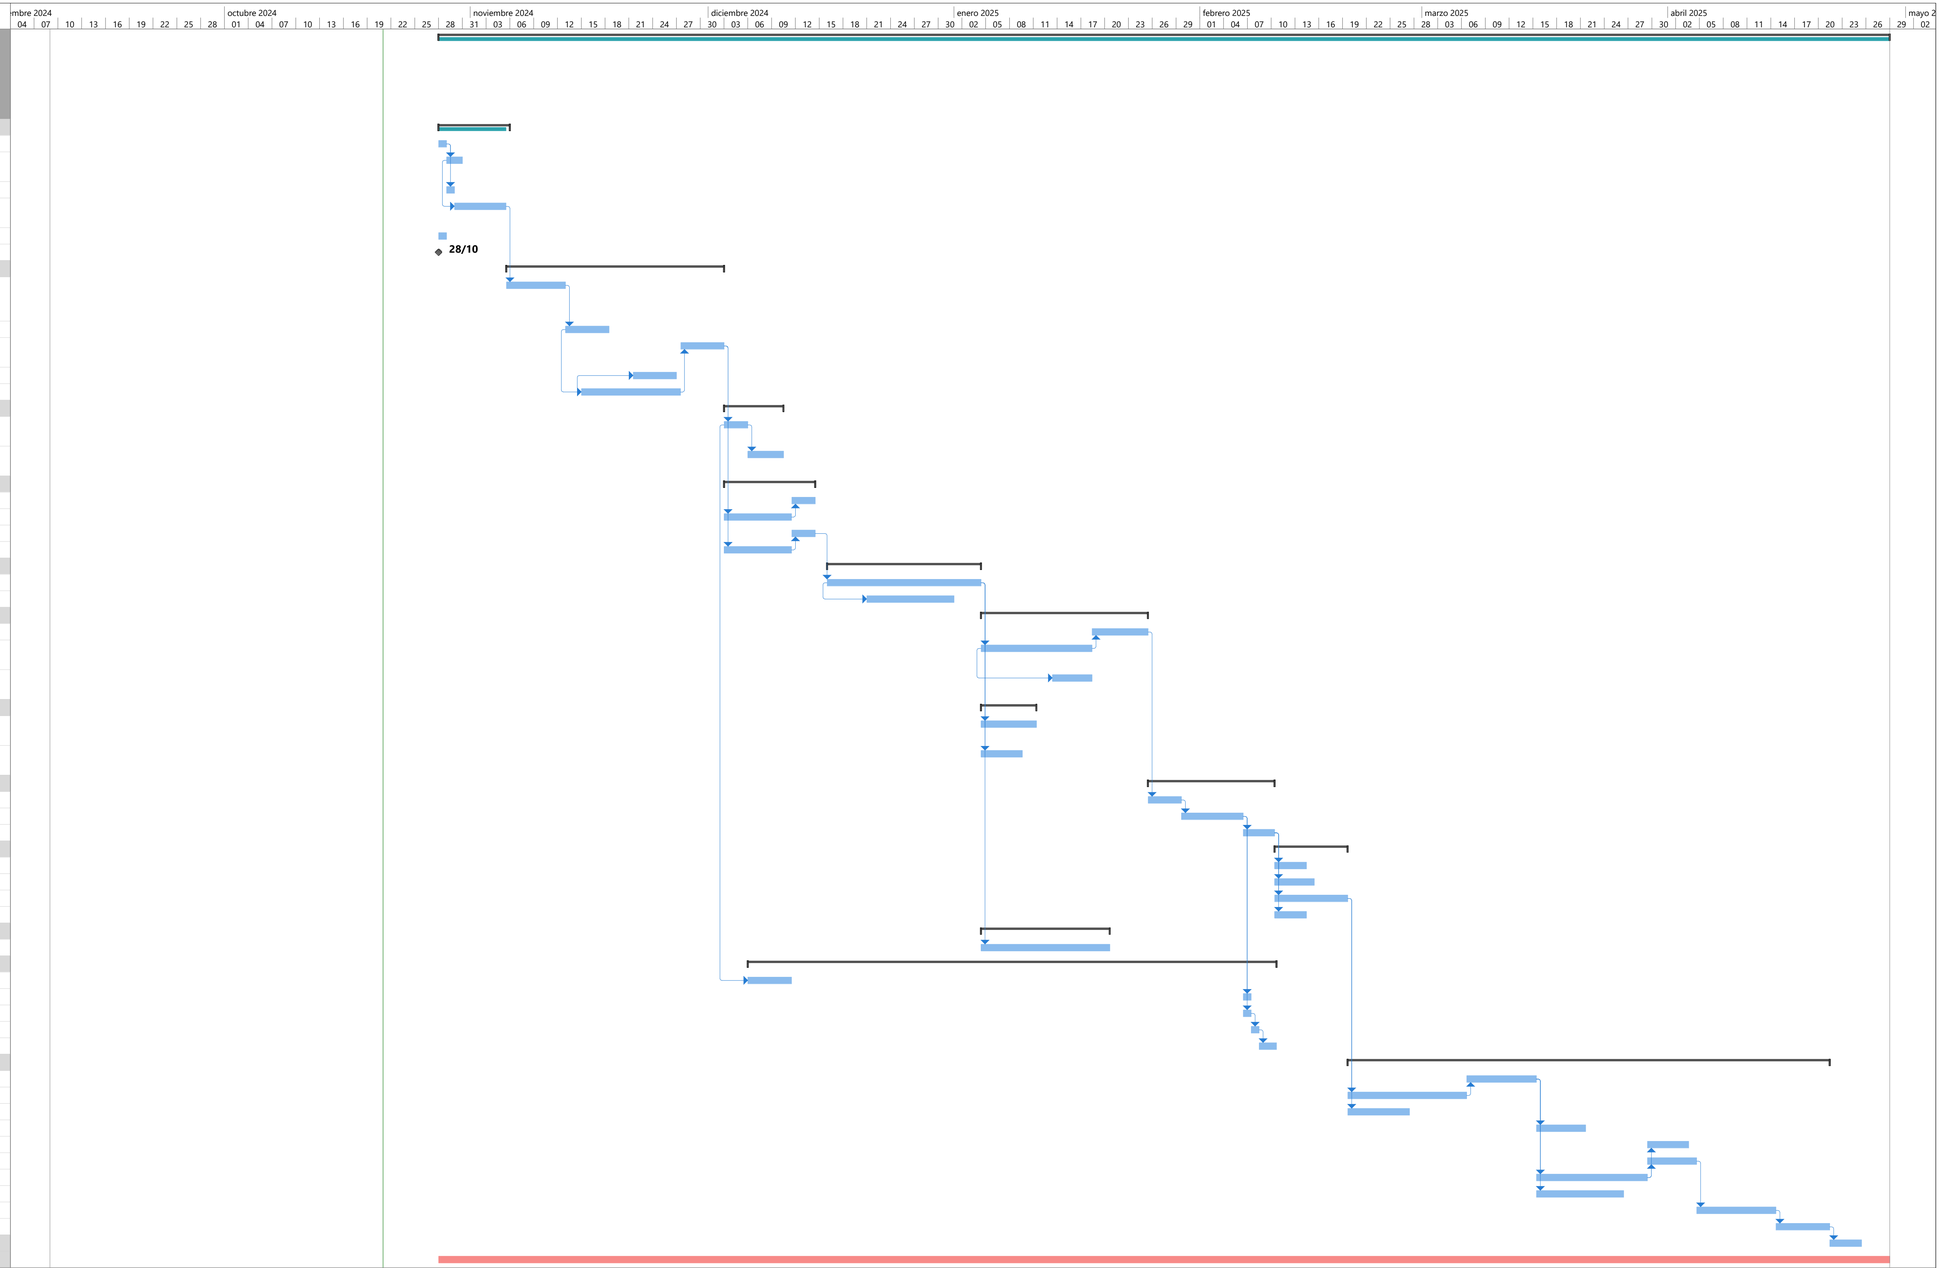


Proyecto: CRONOGRAMA OBR
Fecha: lun 21/10/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA ADQUISICIÓN SUMINISTROS																															
ACTIVIDAD	NOVIEMBRE					DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL				
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
Solicitud de cotizaciones																														
Recepcion ,revisión y valuación de los prototipos entregados por los proveedores en las respectivas cotizaciones																														
Analisis comparativos (precios, calidad y demas criterios que se requieran para la elección del proveedor																														
Evalución de propuestas																														
Selección del proveedor																														
Negociacion de terminos (pagos y entregas)																														
Generacion de orden de compra																														
Confirmacion de pedido																														
Entrega de suministros																														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS MUNICIPIO DE RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA.**	**24.81 sem.?**	**lun 28/10/24**	**lun 28/04/25**
2	**OBRAS PRLIMINARES**	**1.18 sem.**	**lun 28/10/24**	**mar 5/11/24**
3	Localizacion y replanteo	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
4	Campamento de obra, incluye oficina y bodega	2 días	mar 29/10/24	mié 30/10/24
5	Cerramiento provisional de obra	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24
6	Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes	4 días	mié 30/10/24	mar 5/11/24
7	Baño movil	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24
8	Traslado del Gallinero existente	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24
9	**CIMENTACIÓN**	**3.73 sem.**	**mar 5/11/24**	**lun 2/12/24**
10	Excavación manual de terreno para cimentación incluye acarreo de material sobrante.	5 días	mar 5/11/24	mar 12/11/24
11	Solados de limpieza e=0,03 m	4 días	mié 13/11/24	lun 18/11/24
12	Fundicion de viga de cimentación en concreto de 21 mpa	4 días	mié 27/11/24	lun 2/12/24
13	Zapatas en concreto de 21 mpa	4 días	jue 21/11/24	mar 26/11/24
14	Acero de refuerzo	9.5 días	vie 15/11/24	mié 27/11/24
15	**PISO BASE**	**1.09 sem.**	**mar 3/12/24**	**mar 10/12/24**
16	Base en rocamuerta compactada para placa de contrapiso e:0,3 m	3 días	mar 3/12/24	jue 5/12/24
17	Placa de contrapiso en cocnreto de 3000 psi e=0,10 m incluye malla electrosoldada	3 días	vie 6/12/24	mar 10/12/24
18	**ESTRUCTURA CONCRETO**	**1.82 sem.**	**mar 3/12/24**	**sáb 14/12/24**
19	Columnas en concreto de 21 mpa	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24
20	Acero de refuerzo columnas	7 días	mar 3/12/24	mié 11/12/24
21	Vigas en concreto de 21 mpa	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24
22	Acero de refuerzo vigas	7 días	mar 3/12/24	mié 11/12/24
23	**MAMPOSTERÍA**	**2.58 sem.**	**lun 16/12/24**	**sáb 4/01/25**
24	Bloque en concreto incluye dovelas.	14.2 días	lun 16/12/24	sáb 4/01/25
25	Calados redondos de 12 x 19 x 19 cms	7 días	sáb 21/12/24	mar 31/12/24
26	**CUBIERTA**	**2.85 sem.**	**sáb 4/01/25**	**sáb 25/01/25**
27	Teja Termoacustica Trapeizodal	5.7 días	sáb 18/01/25	sáb 25/01/25
28	Estructura metalica para cubierta - PERFIL PHR C 160X160	10 días	sáb 4/01/25	sáb 18/01/25
29	Estructura metalica para cubierta - ANGULO 1" 1/8	5 días	lun 13/01/25	sáb 18/01/25
30	**ACABADO DE MUROS**	**9 sem.**	**sáb 4/01/25**	**lun 10/03/25**
31	Estuco y pintura interior en estuco plástico, con pintura vinilo color blanco	4.5 días	mar 4/03/25	lun 10/03/25
32	Enchape Pared Blanca Plana, 20 x 40 cm, Color Blanco Corona o equivalente	0 días	sáb 4/01/25	sáb 4/01/25
33	**ACABADO DE PISO**	**2.16 sem.**	**lun 17/02/25**	**lun 3/03/25**
34	Mortero de nivelación 1:3 e=0,05	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25
35	Enchape Piso baldosa grano 1 Alfa 30 x 30 cm. Blanca	6 días	jue 20/02/25	jue 27/02/25
36	Guardaescobas en Tableta de granito	2.4 días	vie 28/02/25	lun 3/03/25
37	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1.09 sem.**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**
38	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradura y pintura electrostática) para puerta principal incluye mirillas	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25
39	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradura y pintura electrostática) para baños y depósito	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25
40	Ventana en vidrio laminado con marco en aluminio negro sobre fachada ppal	6 días	lun 17/02/25	lun 24/02/25
41	Ventanas para baños	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25
42	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**8.18 sem.**	**sáb 4/01/25**	**mar 4/03/25**
43	Suministro e instalación de Instalaciones eléctricas	45 días	sáb 4/01/25	mar 4/03/25
44	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS**	**12.09 sem.**	**vie 6/12/24**	**mar 4/03/25**
45	Suministro e instalación de Instalaciones Hidraúlicas	4 días	vie 6/12/24	mié 11/12/24
46	Suministro e instalacion de Sanitario Ref: Montecarlo Advance Corona	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25
47	Suministro e instalacion de Lavamanos blanco Corona.	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25
48	Suministro e instalación de espejo de borde pulido	1 día	sáb 1/03/25	lun 3/03/25
49	Juego de Accesorios en acero para baños- Incluye instalación	1 día	mar 4/03/25	mar 4/03/25
50	**OBRAS EXTERIORES**	**8 sem.**	**mié 19/02/25**	**mié 16/04/25**
51	Fundición de rampa en concreto de 1.20 de ancho e=15 cm. En concreto de 21 Mpa	7 días	jue 6/03/25	vie 14/03/25
52	Acero de refuerzo rampa	12 días	mié 19/02/25	mié 5/03/25
53	Cunetas perimetral para aguas lluvias en concreto de 21 Mpa de 0,2*0,1	6 días	mié 19/02/25	mié 26/02/25
54	Baranda metálica rampa	5 días	vie 14/03/25	jue 20/03/25
55	Bancas en concreto diametro 0.46 m Ref. Konkretus	4 días	vie 28/03/25	mié 2/04/25
56	Bancas en concreto fundido placa de 10 cms	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25
57	Piso en adoquin	10 días	vie 14/03/25	vie 28/03/25
58	Bordillos de confinamiento rampa y plazoleta	7 días	vie 14/03/25	mar 25/03/25
59	Jardines exteriores	7 días	vie 4/04/25	sáb 12/04/25
60	Aseo General	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25
61	**DOTACIÓN**	**4 días**	**sáb 19/04/25**	**jue 24/04/25**
62	**PMT**	**136 días**	**lun 28/10/24**	**lun 28/04/25**
63	**ITEMS NO PREVISTOS**	**22.73 sem.**	**mié 30/10/24**	**lun 14/04/25**
64	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	1 día	mar 3/12/24	mar 3/12/24
65	TUBERIA PVC 3 SANI.	0.5 días	mar 3/12/24	mar 3/12/24
66	Dovela con grouting 17.2 MPa para muros	14.2 días	lun 16/12/24	sáb 4/01/25
67	Escalerilla de hierro grafilado 1/4"	14.2 días	lun 16/12/24	sáb 4/01/25
68	Demolición de placa maciza/ losa en concreto e= 0.10 m	1.5 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24
69	Demolicion de pedestales gallinero	1.5 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24
70	Viga cinta 14x20 cm de 20.7 MPa (incl. refuerzo)	5 días	sáb 21/12/24	sáb 28/12/24
71	Sumin. e Instal. Platina de fijacion estructura metálica (incl. pintura)	5 días	sáb 4/01/25	lun 13/01/25
72	Trampa de grasas Tanque 250 LT Plastico	2 días	vie 4/04/25	lun 7/04/25
73	Acometida a Tablero T Iluminacion en 3x4 + 1x6 Cu en tuberia 1"	25 días	vie 24/01/25	mié 26/02/25
74	Red Sanitaria Adicional hasta acometida con pozo septico	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24
75	Anden en concreto 3000 Psi E=10cm	10 días	vie 14/03/25	vie 28/03/25
76	Estampado en concreto. Incluye molde+color+corte de juntas+sello+equipos	5 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25
77	Acero de refuerzo Anden estampado	3 días	mar 11/03/25	vie 14/03/25
78	Pantalla confinamiento rampa e=12cm (Incluye refuerzo)	10 días	jue 6/03/25	mar 18/03/25
79	Viga cimentacion 30x25 - Incluye refuerzo (Pantalla Rampa)	4 días	mar 4/03/25	vie 7/03/25
80	Relleno Listo Interior Muro	5 días	mié 26/02/25	mar 4/03/25
81	Caja de inspección 60x60x60 cm en concreto (Incluye excavacion)	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24
82	Filtro francés 0.5mx.030m (Incluye excavacion)	4 días	vie 4/04/25	mié 9/04/25
83	Tubería pvc sanitaria Ø= 4" drenaje de aguas lluvias (incl. accesorios + excava	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25
84	Tubería pvc sanitaria Ø= 4" perforada para filtro (incl. accesorios)	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25
85	Cabezal de entrega aguas lluvias	5 días	mar 8/04/25	lun 14/04/25
86	Canal pvc	3.5 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25
87	Bajante Pvc	1.5 días	vie 4/04/25	sáb 5/04/25
88	Pintura en gris basalto a= 40 cm	8 días	vie 4/04/25	lun 14/04/25
89	Enchape pared blanca 30x 60 cm	5 días	mié 19/02/25	mié 26/02/25

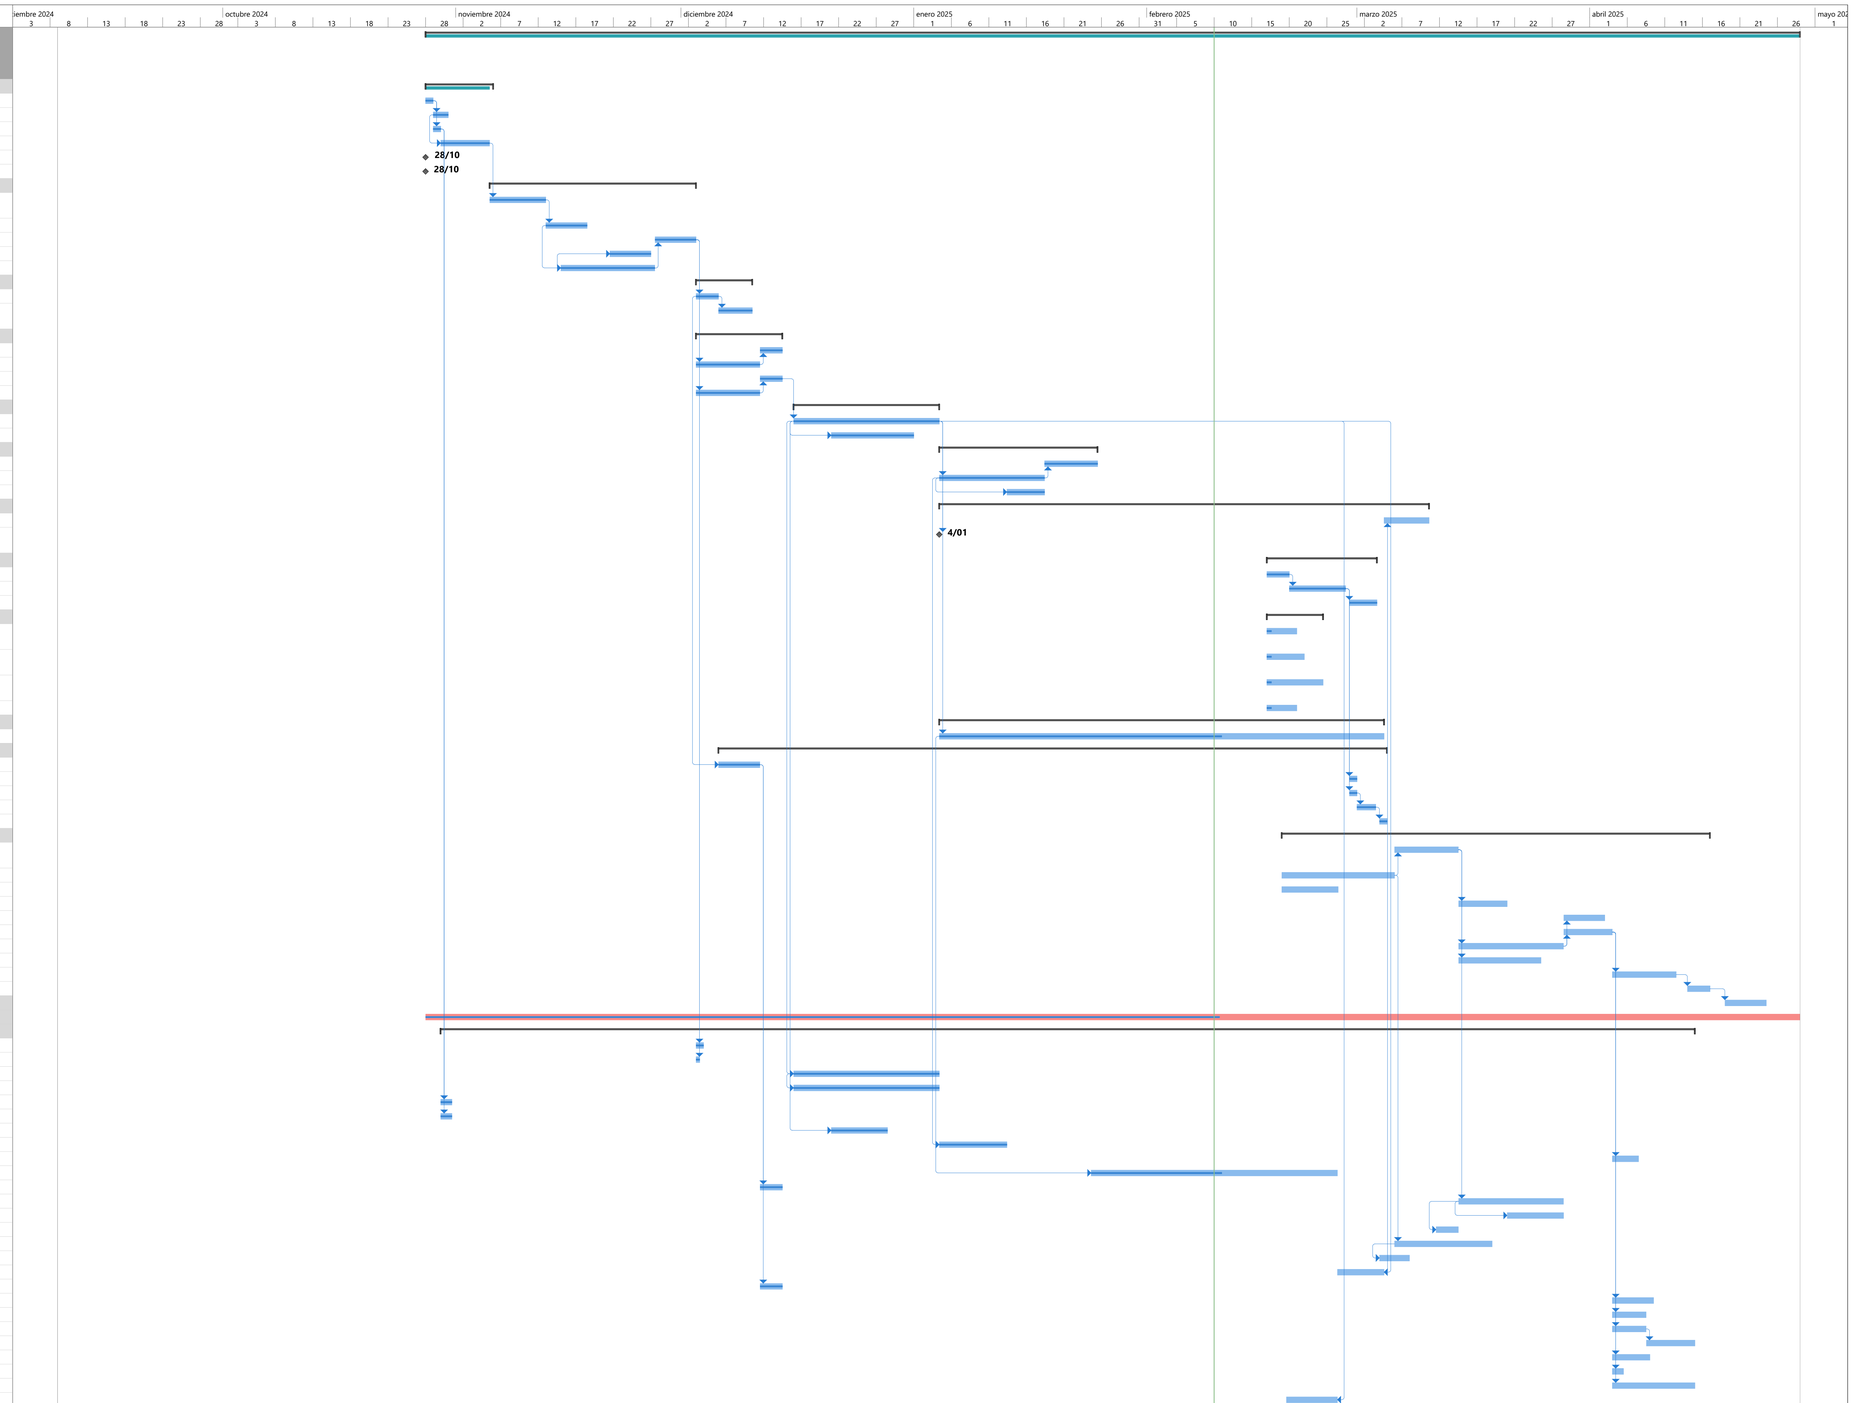

Proyecto: CRONOGRAMA OBR
Fecha: lun 10/02/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
1	**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO**	**24.81 wks?**	**Mon 10/28/24**	**Mon 4/28/25**
2	**OBRAS PRLIMINARES**	**1.18 wks**	**Mon 10/28/24**	**Tue 11/05/24**
3	Localizacion y replanteo	1 day	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
4	Campamento de obra, incluye oficina y bodega	2 days	Tue 10/29/24	Wed 10/30/24
5	Cerramiento provisional de obra	1 day	Tue 10/29/24	Tue 10/29/24
6	Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes	4 days	Wed 10/30/24	Tue 11/05/24
7	Baño movil	0 days	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
8	Traslado del Gallinero existente	0 days	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
9	**CIMENTACIÓN**	**3.73 wks**	**Tue 11/05/24**	**Mon 12/02/24**
10	Excavación manual de terreno para cimentación incluye acarreo de material sobran	5 days	Tue 11/05/24	Tue 11/12/24
11	Solados de limpieza e=0,03 m	4 days	Wed 11/13/24	Mon 11/18/24
12	Fundicion de viga de cimentación en concreto de 21 mpa	4 days	Wed 11/27/24	Mon 12/02/24
13	Zapatas en concreto de 21 mpa	4 days	Thu 11/21/24	Tue 11/26/24
14	Acero de refuerzo	9.5 days	Fri 11/15/24	Wed 11/27/24
15	**PISO BASE**	**1.09 wks**	**Tue 12/03/24**	**Tue 12/10/24**
16	Base en rocamuerta compactada para placa de contrapiso e:0,3 m	3 days	Tue 12/03/24	Thu 12/05/24
17	Placa de contrapiso en cocnreto de 3000 psi e=0,10 m incluye malla electrosoldada	3 days	Fri 12/06/24	Tue 12/10/24
18	**ESTRUCTURA CONCRETO**	**1.82 wks**	**Tue 12/03/24**	**Sat 12/14/24**
19	Columnas en concreto de 21 mpa	3 days	Wed 12/11/24	Sat 12/14/24
20	Acero de refuerzo columnas	7 days	Tue 12/03/24	Wed 12/11/24
21	Vigas en concreto de 21 mpa	3 days	Wed 12/11/24	Sat 12/14/24
22	Acero de refuerzo vigas	7 days	Tue 12/03/24	Wed 12/11/24
23	**MAMPOSTERÍA**	**2.58 wks**	**Mon 12/16/24**	**Sat 1/04/25**
24	Bloque en concreto incluye dovelas.	14.2 days	Mon 12/16/24	Sat 1/04/25
25	Calados redondos de 12 x 19 x 19 cms	7 days	Sat 12/21/24	Tue 12/31/24
26	**CUBIERTA**	**2.85 wks**	**Sat 1/04/25**	**Sat 1/25/25**
27	Teja Termoacustica Trapeizodal	5.7 days	Sat 1/18/25	Sat 1/25/25

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
28	Estructura metalica para cubierta - PERFIL PHR C 160X160	10 days	Sat 1/04/25	Sat 1/18/25
29	Estructura metalica para cubierta - ANGULO 1" 1/8	5 days	Mon 1/13/25	Sat 1/18/25
30	**ACABADO DE MUROS**	**9 wks**	**Sat 1/04/25**	**Mon 3/10/25**
31	Estuco y pintura interior en estuco plástico, con pintura vinilo color blanco	4.5 days	Tue 3/04/25	Mon 3/10/25
32	Enchape Pared Blanca Plana, 20 x 40 cm, Color Blanco Corona o equivalente	0 days	Sat 1/04/25	Sat 1/04/25
33	**ACABADO DE PISO**	**2.16 wks**	**Mon 2/17/25**	**Mon 3/03/25**
34	Mortero de nivelación 1:3 e=0,05	3 days	Mon 2/17/25	Wed 2/19/25
35	Enchape Piso baldosa grano 1 Alfa 30 x 30 cm. Blanca	6 days	Thu 2/20/25	Thu 2/27/25
36	Guardaescobas en Tableta de granito	2.4 days	Fri 2/28/25	Mon 3/03/25
37	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1.09 wks**	**Mon 2/17/25**	**Mon 2/24/25**
38	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradura y pintura electrostática) para puerta prin	4 days	Mon 2/17/25	Thu 2/20/25
39	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradura y pintura electrostática) para baños y d	5 days	Mon 2/17/25	Fri 2/21/25
40	Ventana en vidrio laminado con marco en aluminio negro sobre fachada ppal	6 days	Mon 2/17/25	Mon 2/24/25
41	Ventanas para baños	4 days	Mon 2/17/25	Thu 2/20/25
42	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**8.18 wks**	**Sat 1/04/25**	**Tue 3/04/25**
43	Suministro e instalación de Instalaciones eléctricas	45 days	Sat 1/04/25	Tue 3/04/25
44	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS**	**12.09 wks**	**Fri 12/06/24**	**Tue 3/04/25**
45	Suministro e instalación de Instalaciones Hidraúlicas	4 days	Fri 12/06/24	Wed 12/11/24
46	Suministro e instalacion de Sanitario Ref: Montecarlo Advance Corona	1 day	Fri 2/28/25	Fri 2/28/25
47	Suministro e instalacion de Lavamanos blanco Corona.	1 day	Fri 2/28/25	Fri 2/28/25
48	Suministro e instalación de espejo de borde pulido	1 day	Sat 3/01/25	Mon 3/03/25
49	Juego de Accesorios en acero para baños- Incluye instalación	1 day	Tue 3/04/25	Tue 3/04/25
50	**OBRAS EXTERIORES**	**8 wks**	**Wed 2/19/25**	**Wed 4/16/25**
51	Fundición de rampa en concreto de 1.20 de ancho e=15 cm. En concreto de 21 M	7 days	Thu 3/06/25	Fri 3/14/25
52	Acero de refuerzo rampa	12 days	Wed 2/19/25	Wed 3/05/25
53	Cunetas perimetral para aguas lluvias en concreto de 21 Mpa de 0,2*0,1	6 days	Wed 2/19/25	Wed 2/26/25
54	Baranda metálica rampa	5 days	Fri 3/14/25	Thu 3/20/25

4
2024
13 18

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
55	Bancas en concreto diametro 0.46 m Ref. Konkretus	4 days	Fri 3/28/25	Wed 4/02/25
56	Bancas en concreto fundido placa de 10 cms	5 days	Fri 3/28/25	Thu 4/03/25
57	Piso en adoquin	10 days	Fri 3/14/25	Fri 3/28/25
58	Bordillos de confinamiento rampa y plazoleta	7 days	Fri 3/14/25	Tue 3/25/25
59	Jardines exteriores	7 days	Fri 4/04/25	Sat 4/12/25
60	Aseo General	3 days	Mon 4/14/25	Wed 4/16/25
61	**DOTACIÓN**	**4 days**	**Sat 4/19/25**	**Thu 4/24/25**
62	**PMT**	**136 days**	**Mon 10/28/24**	**Mon 4/28/25**
63	**ITEMS NO PREVISTOS**	**22.73 wks**	**Wed 10/30/24**	**Mon 4/14/25**
64	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	1 day	Tue 12/03/24	Tue 12/03/24
65	TUBERIA PVC 3 SANI.	0.5 days	Tue 12/03/24	Tue 12/03/24
66	Dovela con grouting 17.2 MPa para muros	14.2 days	Mon 12/16/24	Sat 1/04/25
67	Escalerilla de hierro grafilado 1/4"	14.2 days	Mon 12/16/24	Sat 1/04/25
68	Demolición de placa maciza/ losa en concreto e= 0.10 m	1.5 days	Wed 10/30/24	Thu 10/31/24
69	Demolicion de pedestales gallinero	1.5 days	Wed 10/30/24	Thu 10/31/24
70	Viga cinta 14x20 cm de 20.7 MPa (incl. refuerzo)	5 days	Sat 12/21/24	Sat 12/28/24
71	Sumin. e Instal. Platina de fijacion estructura metálica (incl. pintura)	5 days	Sat 1/04/25	Mon 1/13/25
72	Trampa de grasas Tanque 250 LT Plastico	2 days	Fri 4/04/25	Mon 4/07/25
73	Acometida a Tablero T Iluminacion en 3x4 + 1x6 Cu en tuberia 1"	25 days	Fri 1/24/25	Wed 2/26/25
74	Red Sanitaria Adicional hasta acometida con pozo septico	3 days	Wed 12/11/24	Sat 12/14/24
75	Anden en concreto 3000 Psi E=10cm	10 days	Fri 3/14/25	Fri 3/28/25
76	Estampado en concreto. Incluye molde+color+corte de juntas+sello+equipos	5 days	Fri 3/21/25	Fri 3/28/25
77	Acero de refuerzo Anden estampado	3 days	Tue 3/11/25	Fri 3/14/25
78	Pantalla confinamiento rampa e=12cm (Incluye refuerzo)	10 days	Thu 3/06/25	Tue 3/18/25
79	Viga cimentacion 30x25 - Incluye refuerzo (Pantalla Rampa)	4 days	Tue 3/04/25	Fri 3/07/25
80	Relleno Listo Interior Muro	5 days	Wed 2/26/25	Tue 3/04/25
81	Caja de inspección 60x60x60 cm en concreto (Incluye excavacion)	3 days	Wed 12/11/24	Sat 12/14/24

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26


Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
82	Filtro francés 0.5mx.030m (Incluye excavacion)	4 days	Fri 4/04/25	Wed 4/09/25
83	Tubería pvc sanitaria Ø= 4" drenaje de aguas lluvias (incl. accesorios + excavacion	3 days	Fri 4/04/25	Tue 4/08/25
84	Tubería pvc sanitaria Ø= 4" perforada para filtro (incl. accesorios)	3 days	Fri 4/04/25	Tue 4/08/25
85	Cabezal de entrega aguas lluvias	5 days	Tue 4/08/25	Mon 4/14/25
86	Canal pvc	3.5 days	Fri 4/04/25	Tue 4/08/25
87	Bajante Pvc	1.5 days	Fri 4/04/25	Sat 4/05/25
88	Pintura en gris basalto a= 40 cm	8 days	Fri 4/04/25	Mon 4/14/25
89	Enchape pared blanca 30x 60 cm	5 days	Wed 2/19/25	Wed 2/26/25

4
2024
13 18


Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

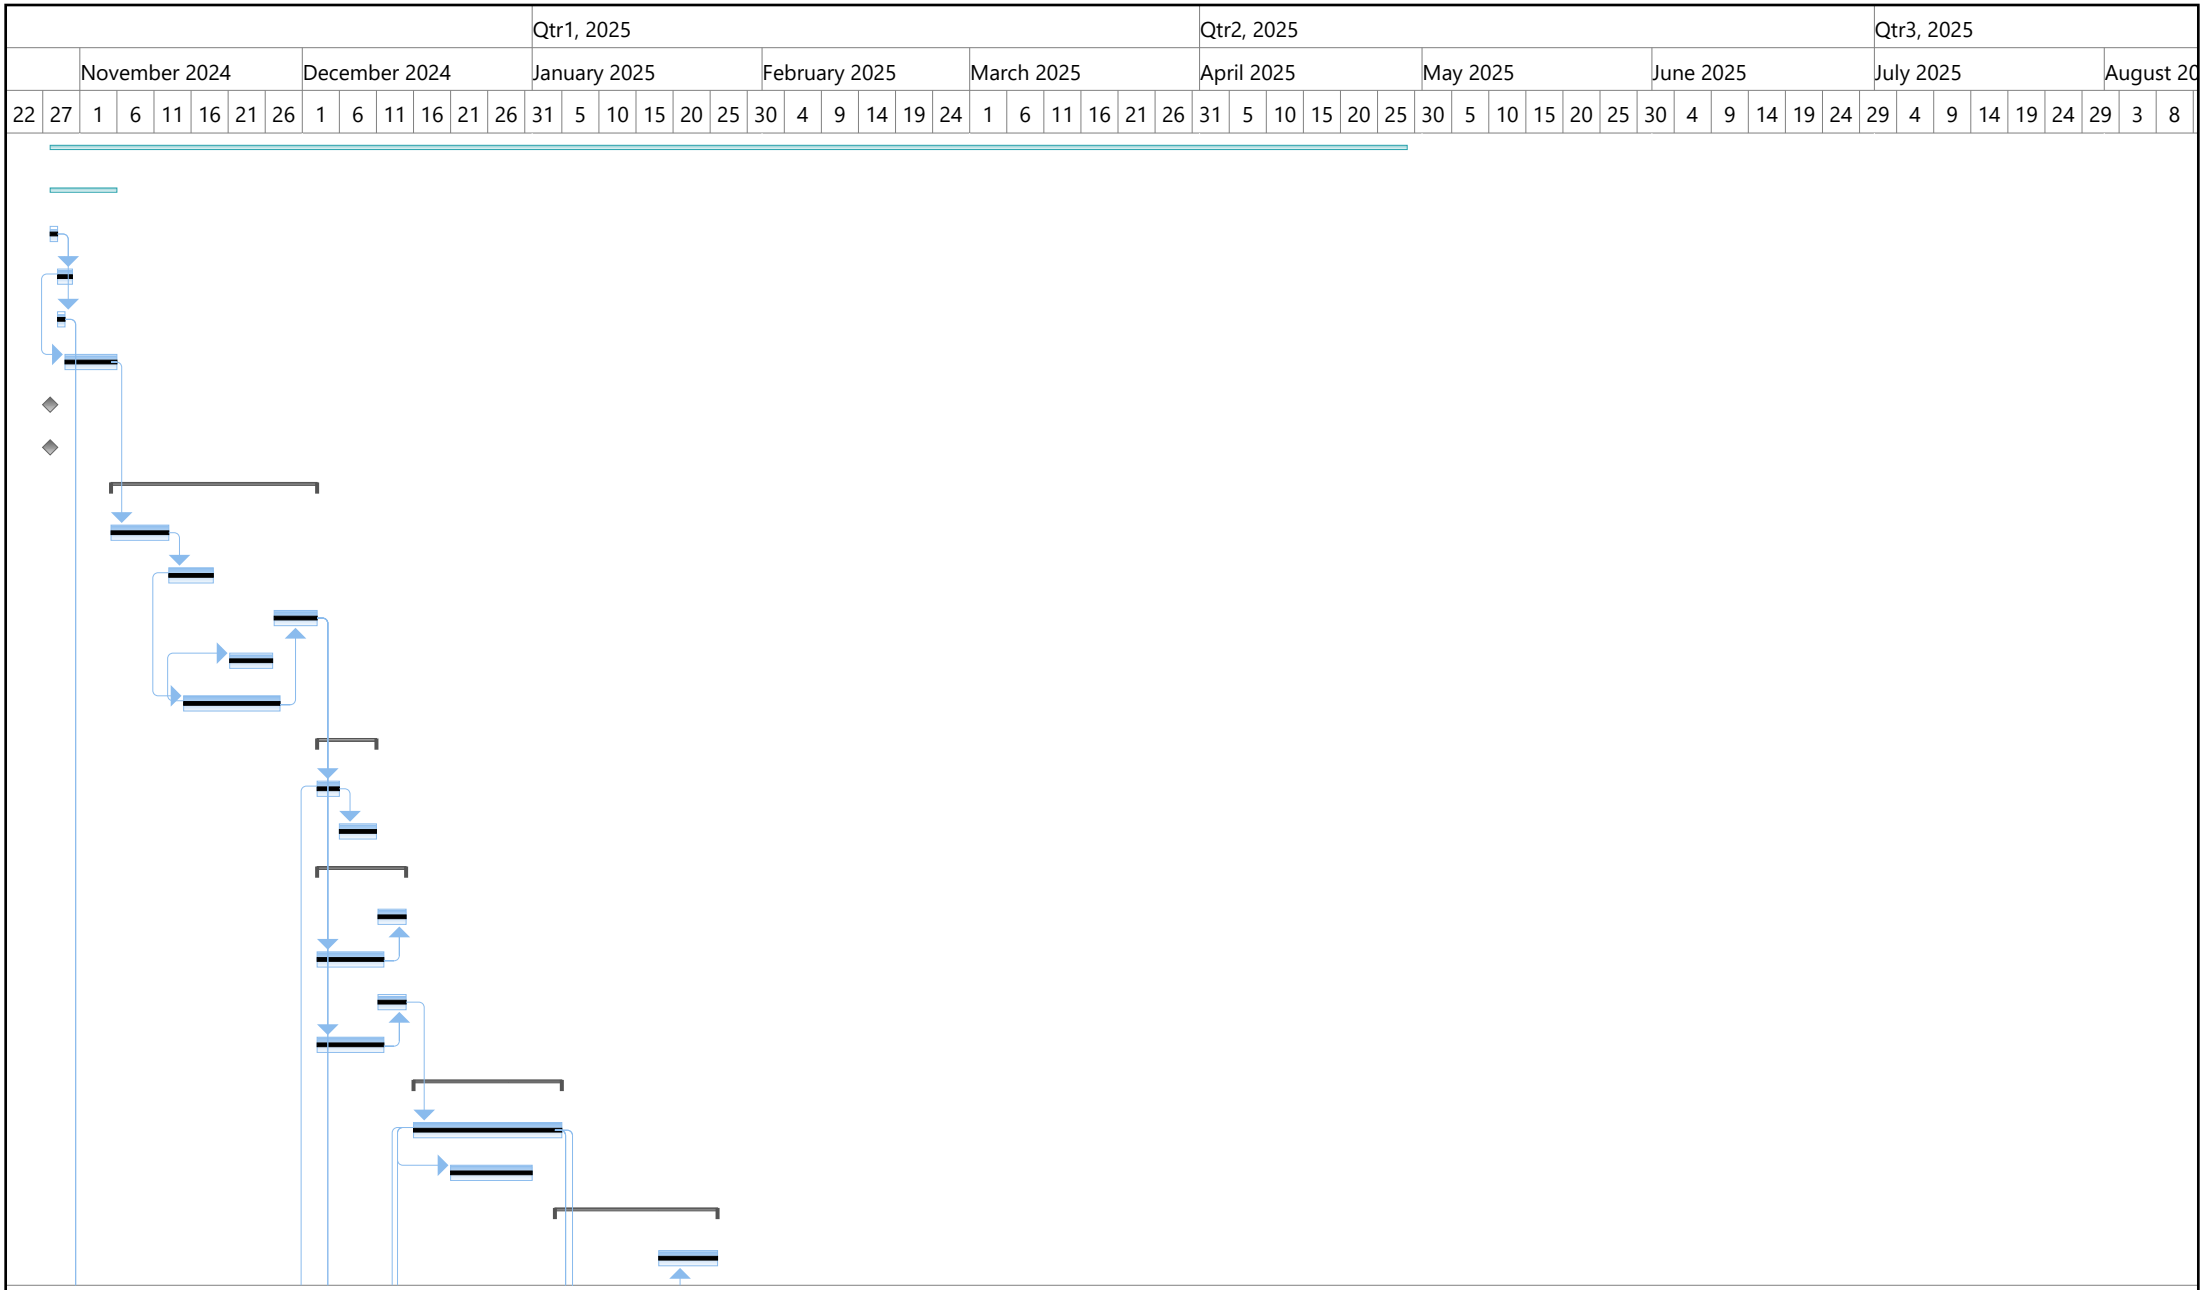


Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

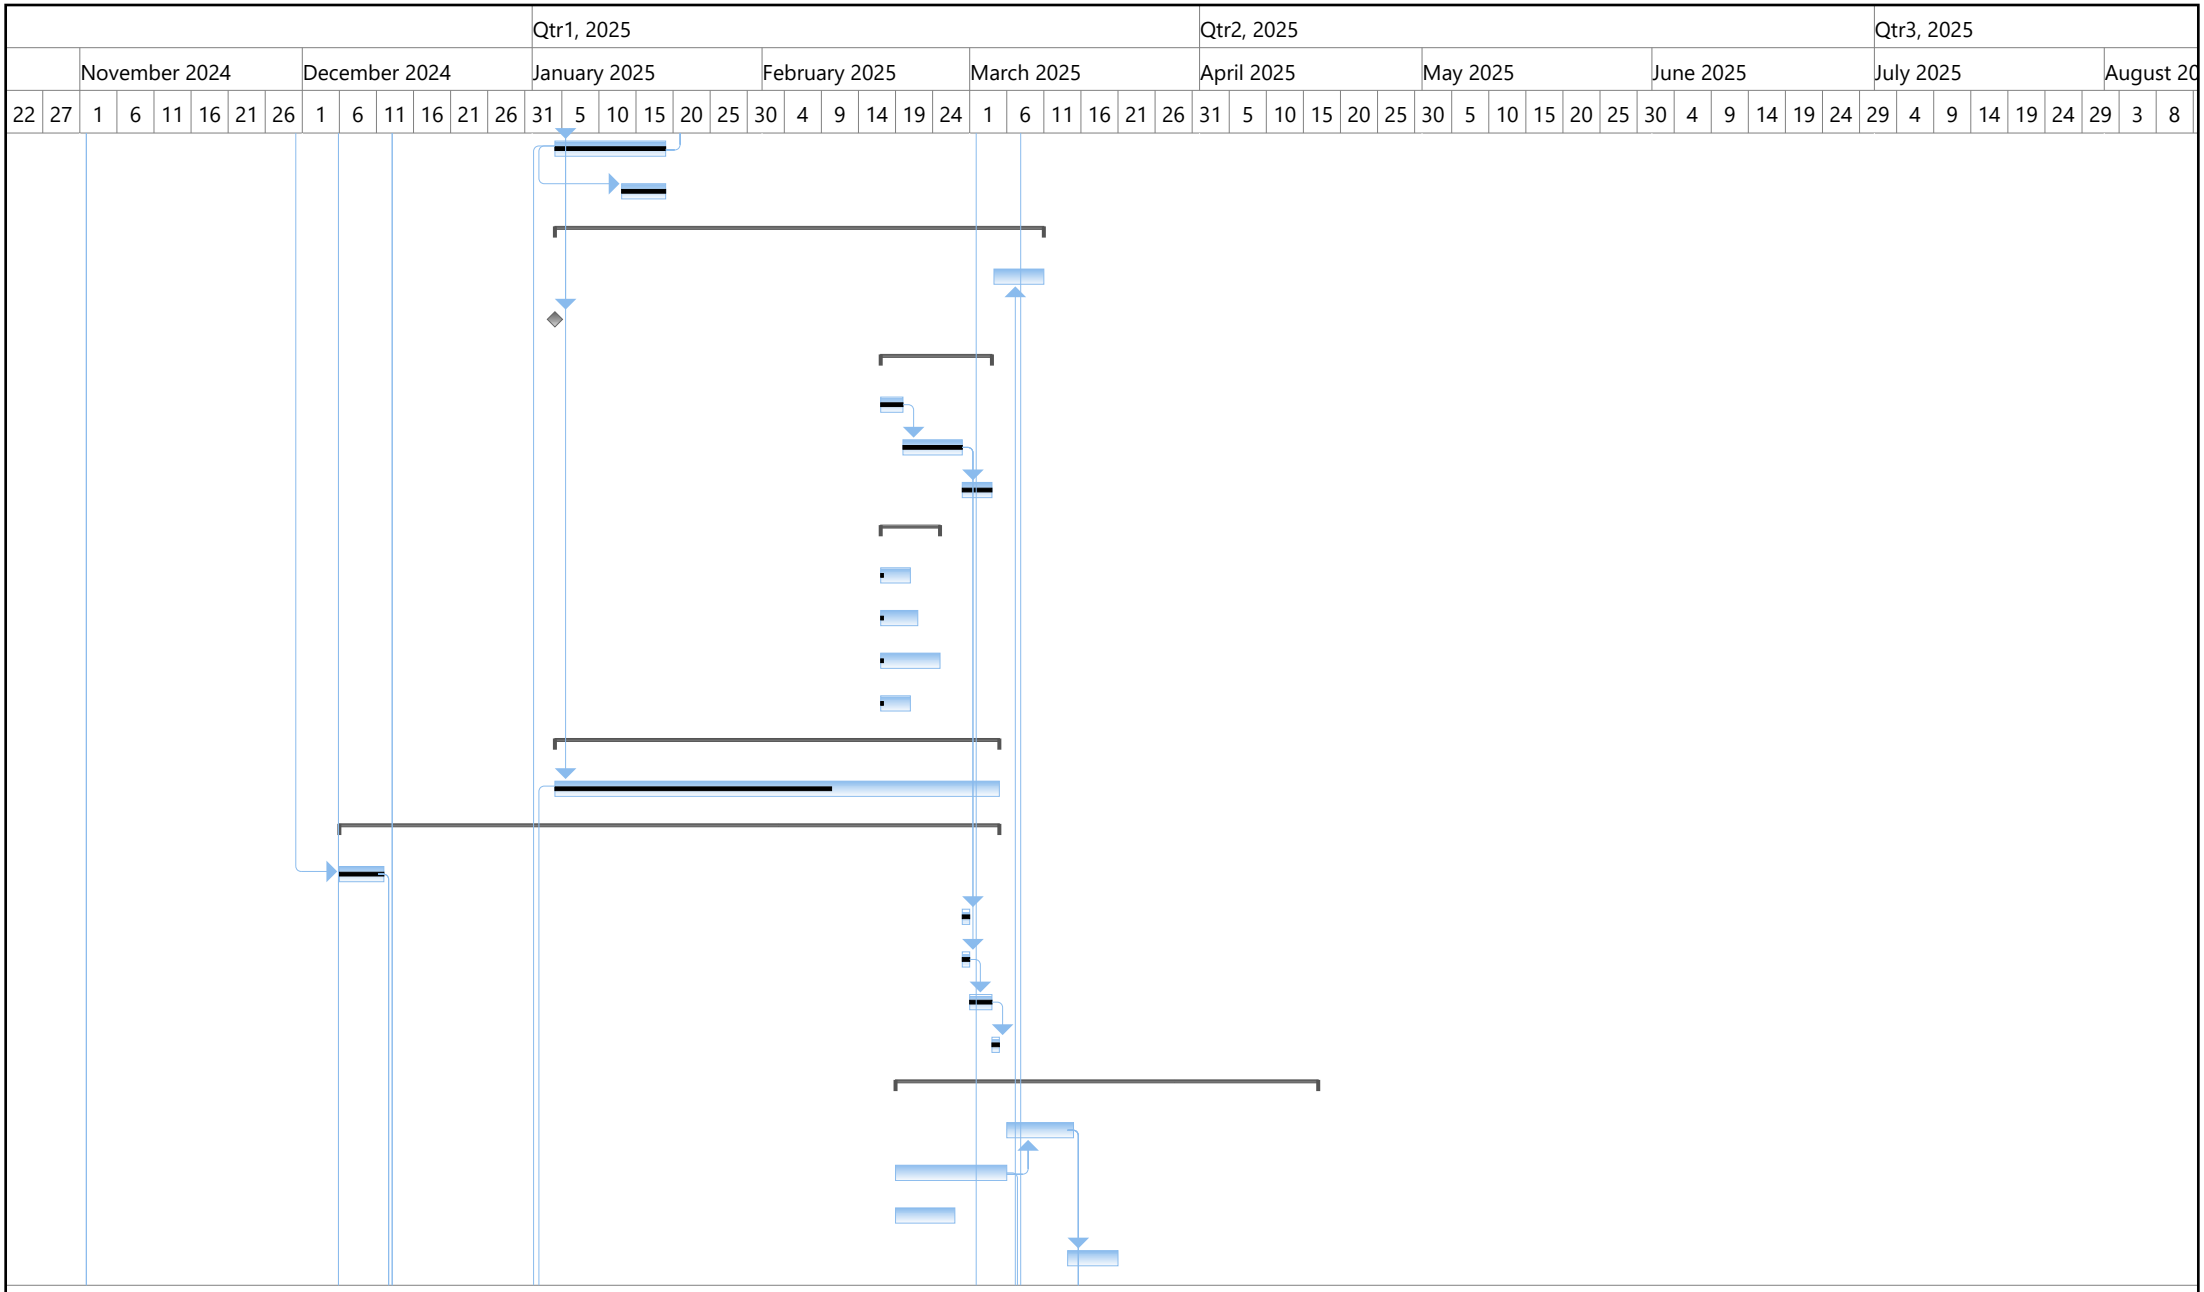


Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

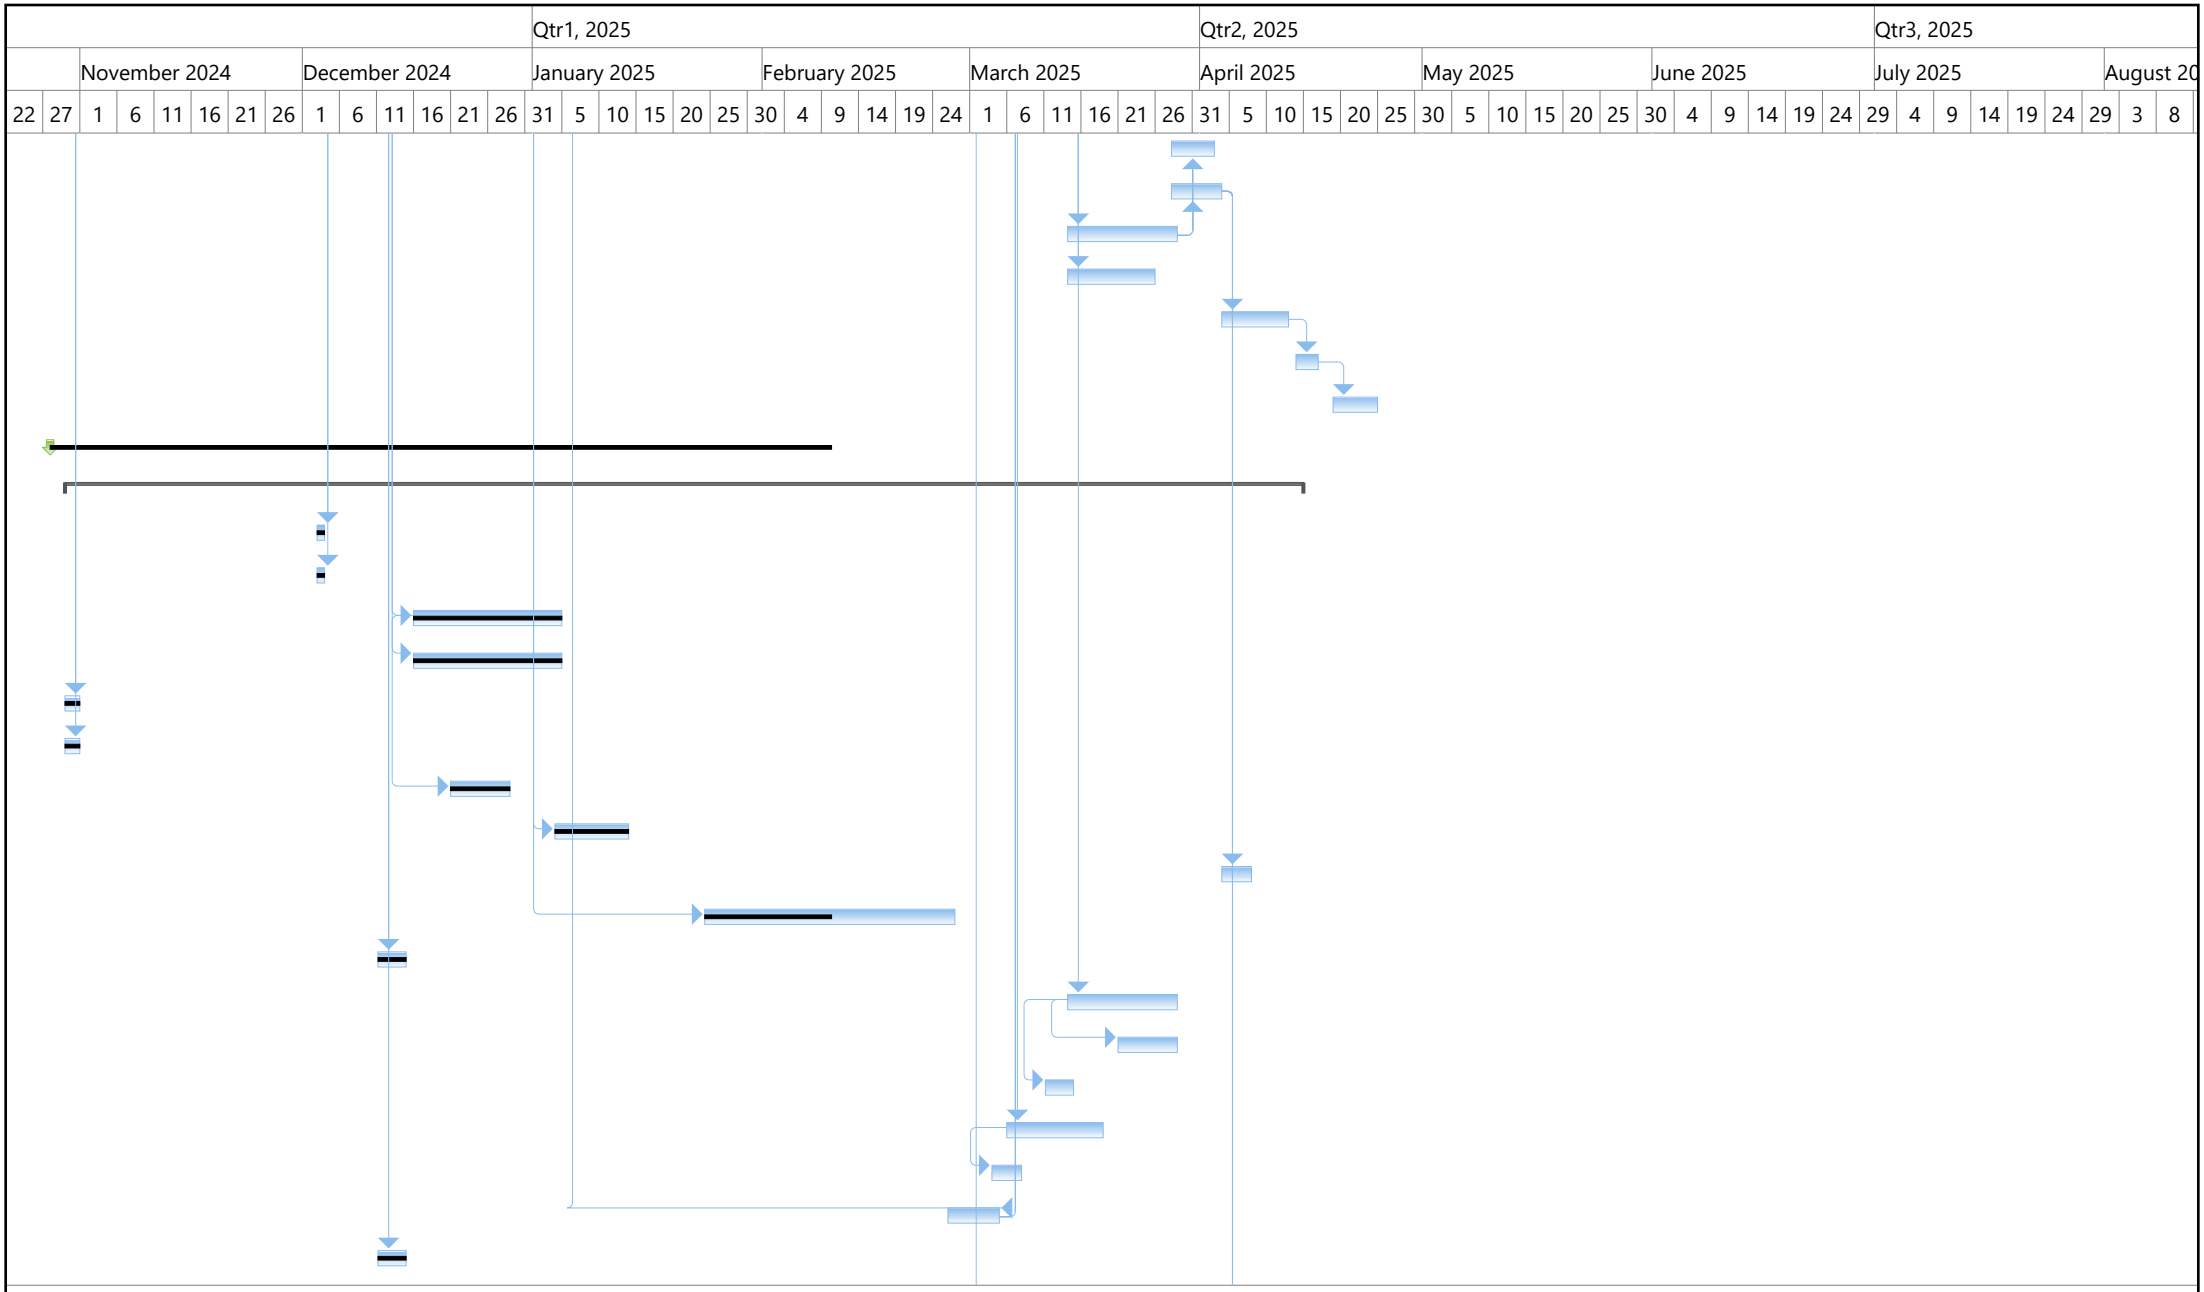

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26


Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

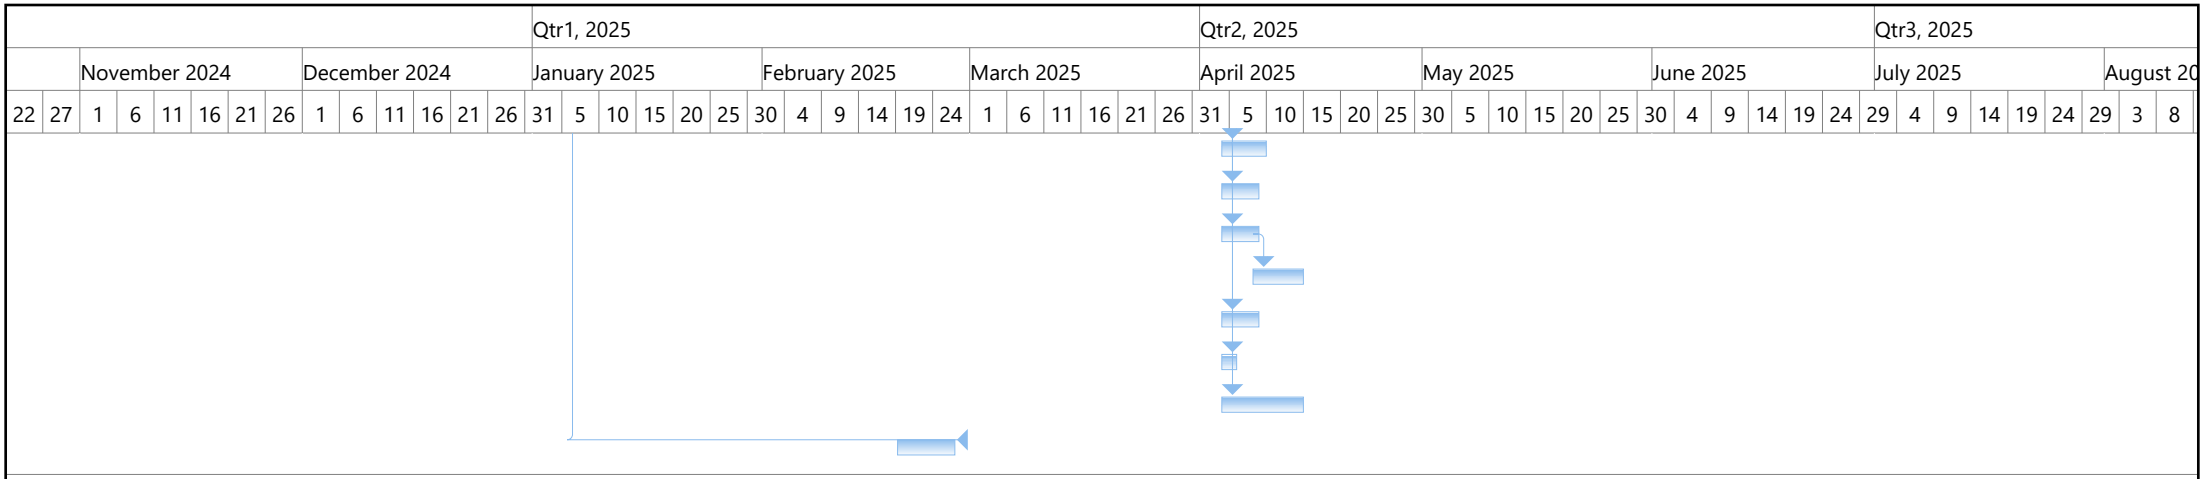

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC - REPROGRAMACIÓN NPS
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
1	**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	**24.81 wks**	**Mon 10/28/24**	**Mon 4/28/25**
2	**OBRAS PRLIMINARES**	**1.18 wks**	**Mon 10/28/24**	**Tue 11/05/24**
3	Localizacion y replanteo	1 day	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
4	Campamento de obra, incluye oficina y bodeg	2 days	Tue 10/29/24	Wed 10/30/24
5	Cerramiento provisional de obra	1 day	Tue 10/29/24	Tue 10/29/24
6	Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye	4 days	Wed 10/30/24	Tue 11/05/24
7	Baño movil	1 day	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
8	Traslado del Gallinero existente	0 days	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
9	**CIMENTACIÓN**	**3.73 wks**	**Tue 11/05/24**	**Mon 12/02/24**
10	Excavación manual de terreno para cimentació	5 days	Tue 11/05/24	Tue 11/12/24
11	Solados de limpieza e=0,03 m	4 days	Wed 11/13/24	Mon 11/18/24
12	Fundicion de viga de cimentación en concreto	4 days	Wed 11/27/24	Mon 12/02/24
13	Zapatas en concreto de 21 mpa	4 days	Thu 11/21/24	Tue 11/26/24
14	Acero de refuerzo	9.5 days	Fri 11/15/24	Wed 11/27/24
15	**PISO BASE**	**1.09 wks**	**Tue 12/03/24**	**Tue 12/10/24**
16	Base en rocamuerta compactada para placa d	3 days	Tue 12/03/24	Thu 12/05/24
17	Placa de contrapiso en cocnreto de 3000 psi e	3 days	Fri 12/06/24	Tue 12/10/24
18	**ESTRUCTURA CONCRETO**	**1.82 wks**	**Tue 12/03/24**	**Sat 12/14/24**
19	Columnas en concreto de 21 mpa	3 days	Wed 12/11/24	Sat 12/14/24
20	Acero de refuerzo columnas	7 days	Tue 12/03/24	Wed 12/11/24
21	Vigas en concreto de 21 mpa	3 days	Wed 12/11/24	Sat 12/14/24
22	Acero de refuerzo vigas	7 days	Tue 12/03/24	Wed 12/11/24
23	**MAMPOSTERÍA**	**2.58 wks**	**Mon 12/16/24**	**Sat 1/04/25**
24	Bloque en concreto incluye dovelas.	14.2 days	Mon 12/16/24	Sat 1/04/25
25	Calados redondos de 12 x 19 x 19 cms	7 days	Sat 12/21/24	Tue 12/31/24
26	**CUBIERTA**	**2.85 wks**	**Sat 1/04/25**	**Sat 1/25/25**
27	Teja Termoacustica Trapeizodal	5.7 days	Sat 1/18/25	Sat 1/25/25

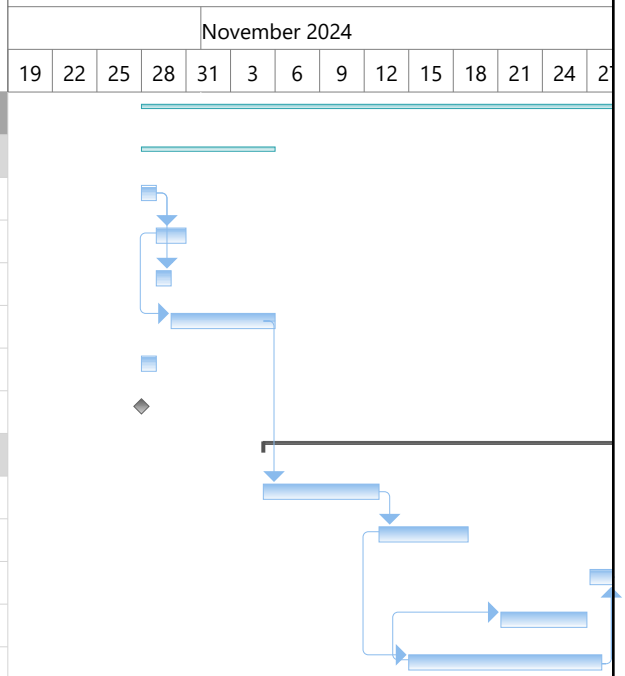

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
28	Estructura metalica para cubierta - PERFIL P	10 days	Sat 1/04/25	Sat 1/18/25
29	Estructura metalica para cubierta - ANGULO	5 days	Mon 1/13/25	Sat 1/18/25
30	**ACABADO DE MUROS**	**0.82 wks**	**Sat 1/04/25**	**Sat 1/11/25**
31	Estuco y pintura interior en estuco plástico, co	4.5 days	Sat 1/04/25	Sat 1/11/25
32	Enchape Pared Blanca Plana, 20 x 40 cm, C	3 days	Sat 1/04/25	Thu 1/09/25
33	**ACABADO DE PISO**	**2.07 wks**	**Sat 1/25/25**	**Mon 2/10/25**
34	Mortero de nivelación 1:3 e=0,05	3 days	Sat 1/25/25	Wed 1/29/25
35	Enchape Piso baldosa grano 1 Alfa 30 x 30 cm	6 days	Wed 1/29/25	Thu 2/06/25
36	Guardaescobas en Tableta de granito	2.4 days	Thu 2/06/25	Mon 2/10/25
37	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1.45 wks**	**Mon 2/10/25**	**Wed 2/19/25**
38	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradura y	4 days	Mon 2/10/25	Fri 2/14/25
39	Puerta Coll Rolled calibre 18 (incl. Cerradura y	5 days	Mon 2/10/25	Sat 2/15/25
40	Ventana en vidrio laminado con marco en alum	8 days	Mon 2/10/25	Wed 2/19/25
41	Ventanas para baños	4 days	Mon 2/10/25	Fri 2/14/25
42	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**2.02 wks**	**Sat 1/04/25**	**Mon 1/20/25**
43	Suministro e instalación de Instalaciones eléctr	11.1 days	Sat 1/04/25	Mon 1/20/25
44	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS**	**8.89 wks**	**Fri 12/06/24**	**Mon 2/10/25**
45	Suministro e instalación de Instalaciones Hidra	4 days	Fri 12/06/24	Wed 12/11/24
46	Suministro e instalacion de Sanitario Ref: Mon	1 day	Thu 2/06/25	Fri 2/07/25
47	Suministro e instalacion de Lavamanos blanco	1 day	Thu 2/06/25	Fri 2/07/25
48	Suministro e instalación de espejo de borde p	1 day	Fri 2/07/25	Sat 2/08/25
49	Juego de Accesorios en acero para baños- In	1 day	Sat 2/08/25	Mon 2/10/25
50	**OBRAS EXTERIORES**	**8 wks**	**Wed 2/19/25**	**Mon 4/21/25**
51	Fundición de rampa en concreto de 1.20 de a	7 days	Thu 3/06/25	Sat 3/15/25
52	Acero de refuerzo rampa	12 days	Wed 2/19/25	Thu 3/06/25
53	Cunetas perimetral para aguas lluvias en conc	6 days	Wed 2/19/25	Thu 2/27/25
54	Baranda metálica rampa	5 days	Sat 3/15/25	Fri 3/21/25



Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC
Fecha: Tue 5/19/26


Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary
External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary
Manual Task | Duration-only | Summary Rollup | Manual Summary | Start-only
Finish-only | Progress | Deadline

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
55	Bancas en concreto diametro 0.46 m Ref. Kon	4 days	Sat 3/29/25	Thu 4/03/25
56	Bancas en concreto fundido placa de 10 cms	5 days	Sat 3/29/25	Fri 4/04/25
57	Piso en adoquin	10 days	Sat 3/15/25	Sat 3/29/25
58	Bordillos de confinamiento rampa y plazoleta	7 days	Sat 3/15/25	Wed 3/26/25
59	Jardines exteriores	7 days	Fri 4/04/25	Mon 4/14/25
60	Aseo General	3 days	Mon 4/14/25	Mon 4/21/25
61	**DOTACIÓN**	**4 days**	**Mon 4/21/25**	**Fri 4/25/25**
62	**PMT**	**136 days**	**Mon 10/28/24**	**Mon 4/28/25**




Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

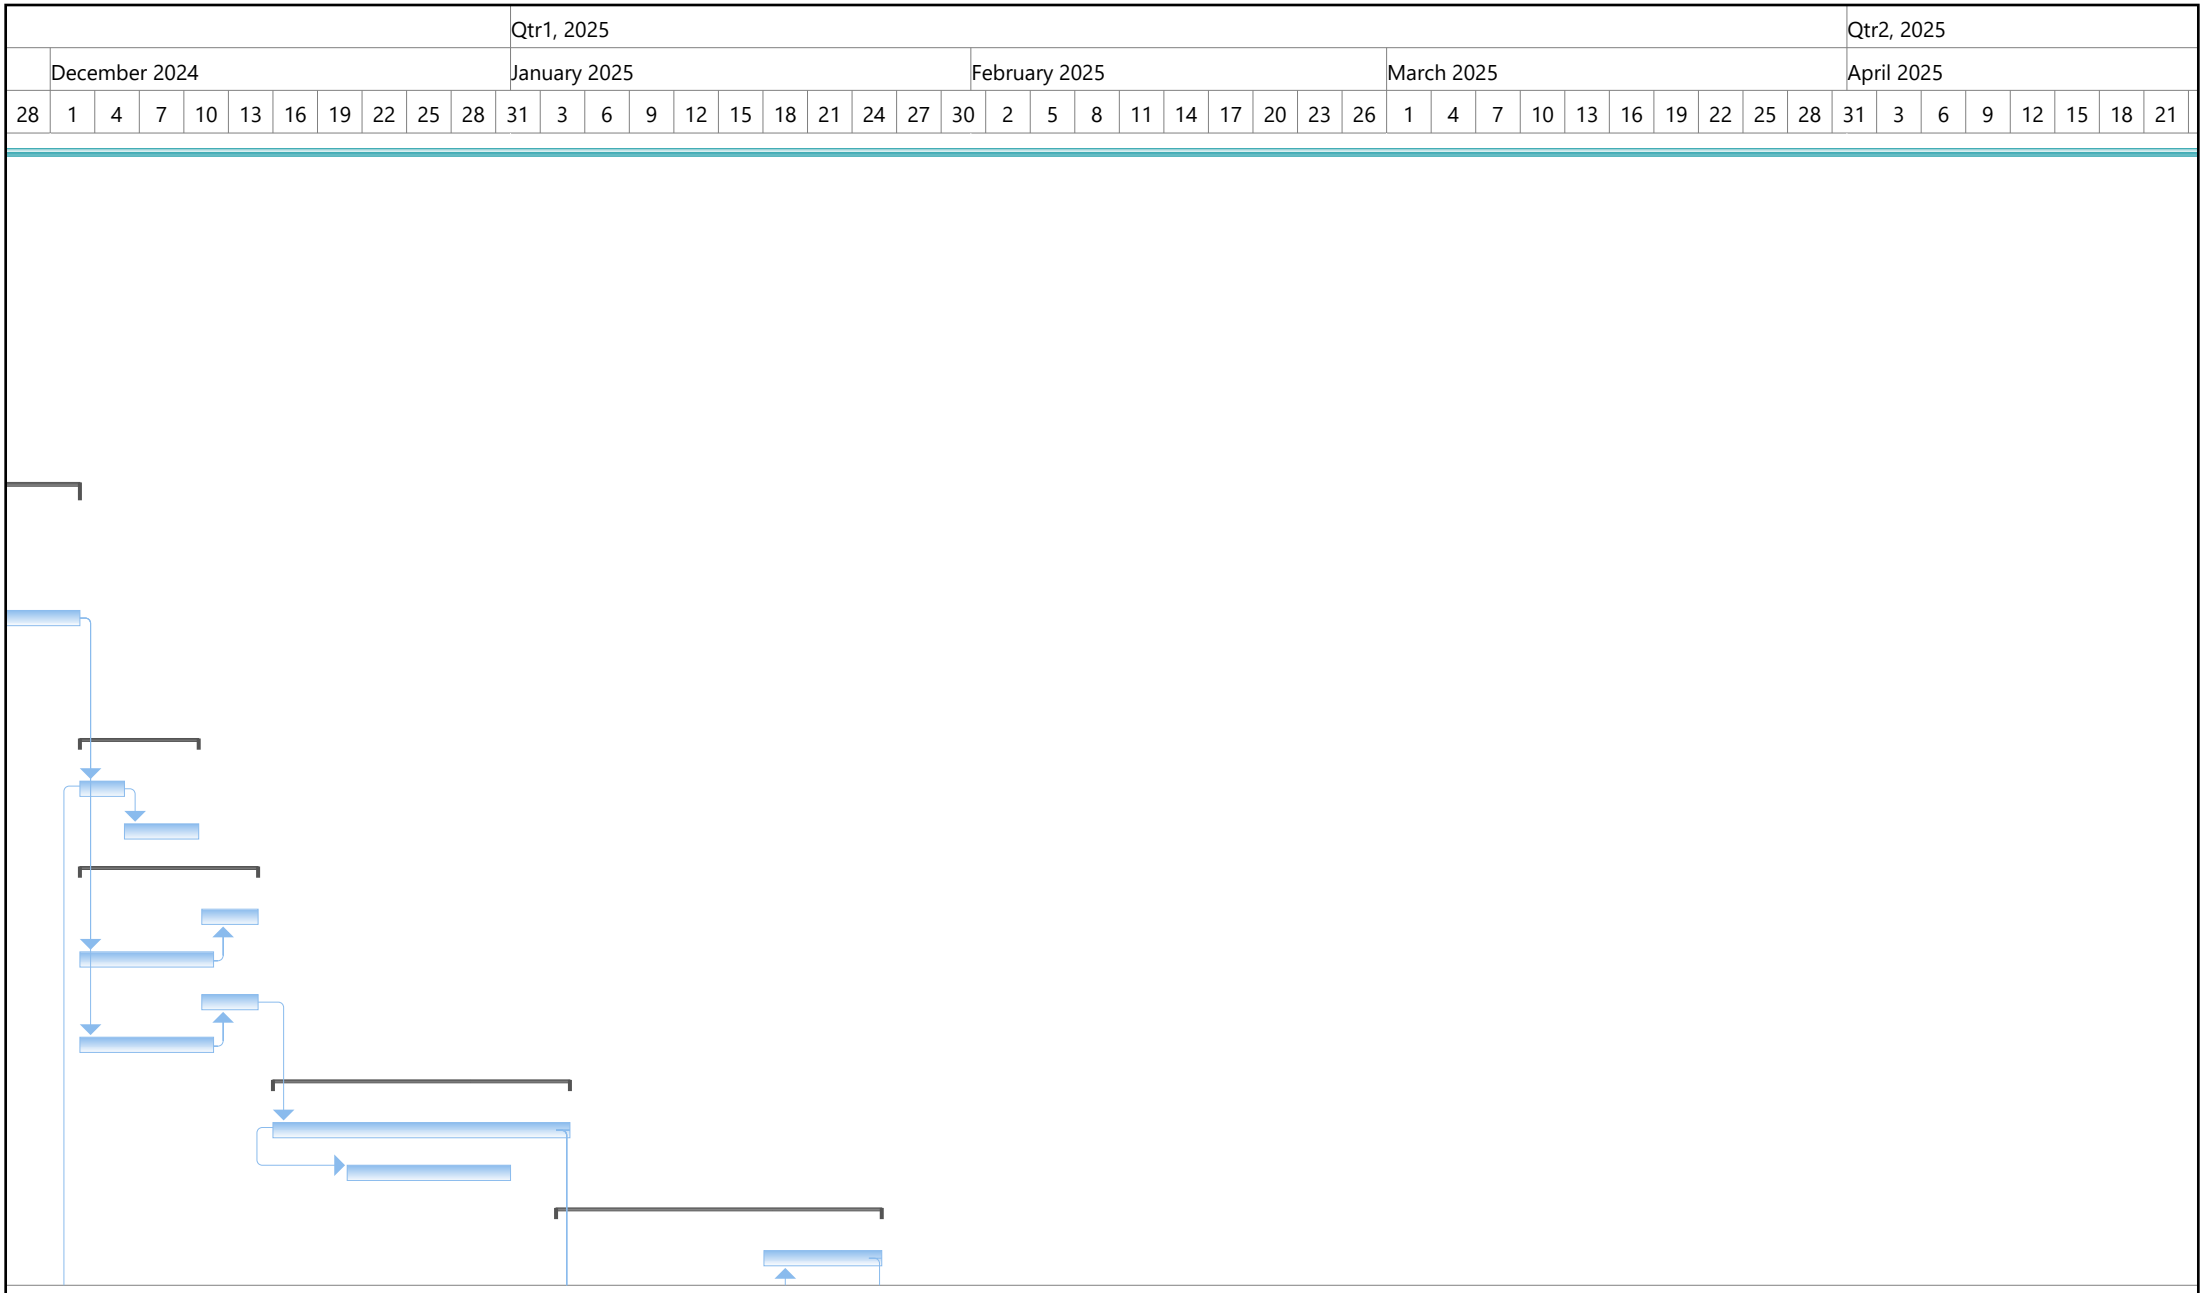


Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

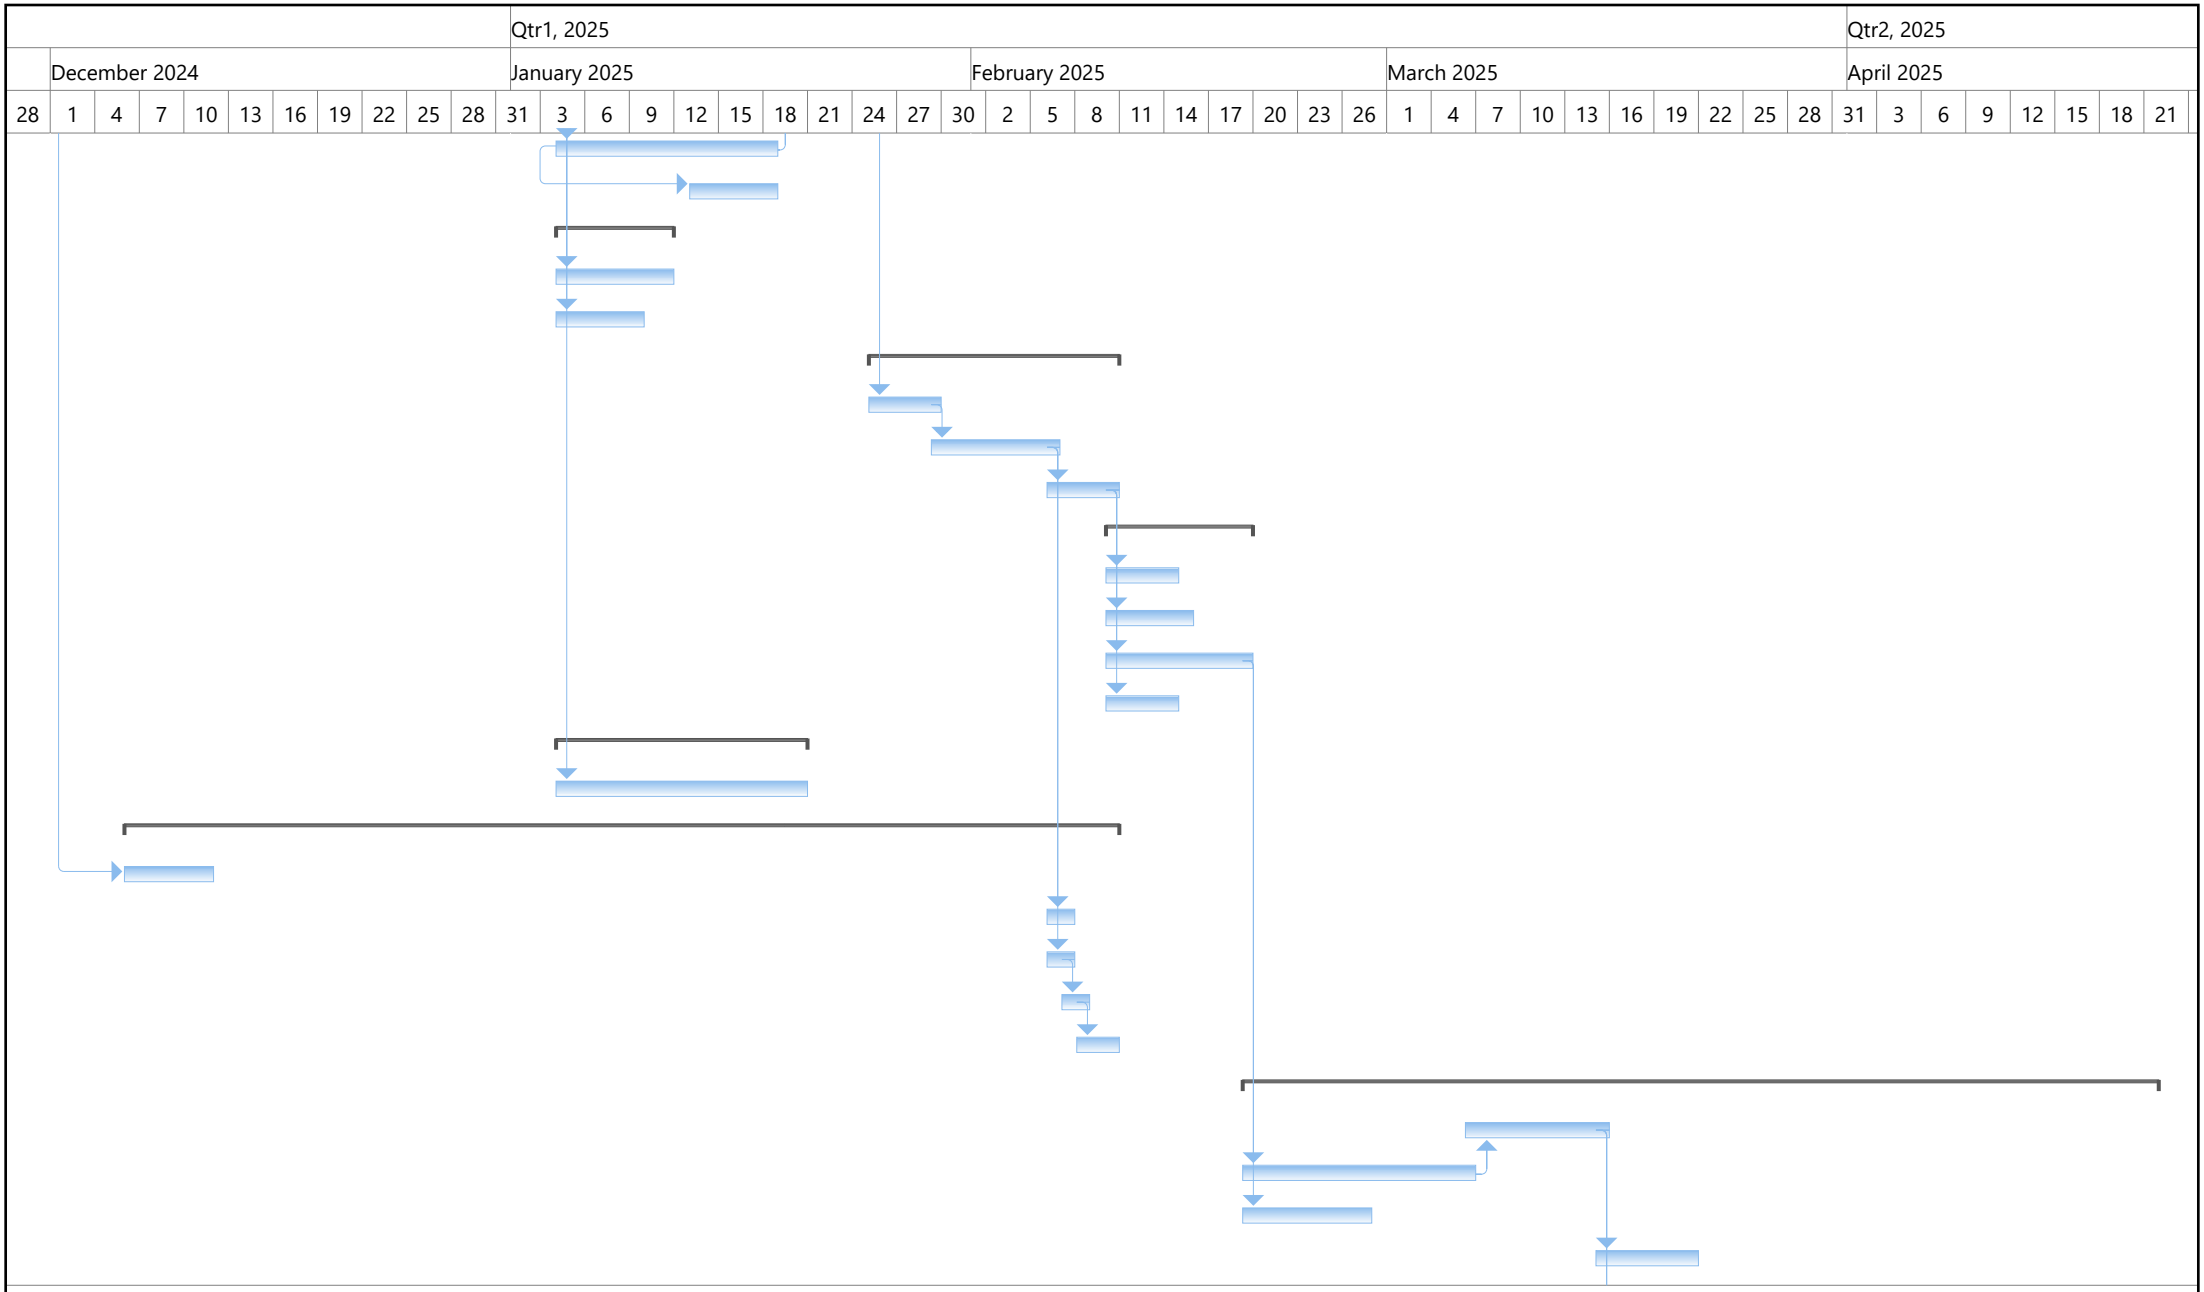

Proyecto: CRONOGRAMA OBRA SIC
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

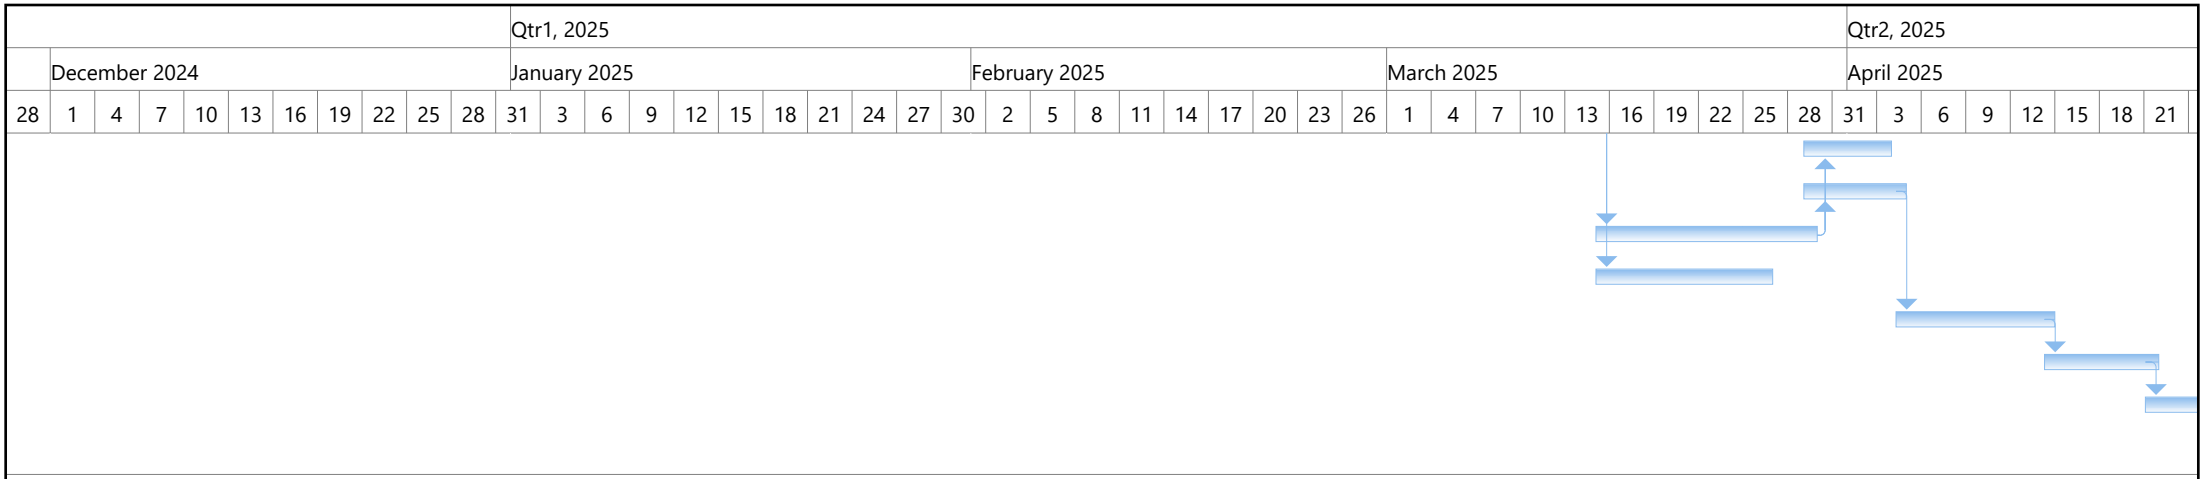

Proyecto: CRONOGRAMA
OBRA SIC
Fecha: Tue 5/19/26

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		
