

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
0	**Sí**	**0**		**LB5**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1496 días**
1	**Sí**	**1**		**CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRASPORTE MASIVO DE BOGOTÁ EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III. LOTE 1: CALLE 24 A CALLE 15**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1496 días**
2	No	2	UE420	ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	lun 16/05/22	lun 16/05/22	0 días
3	**Sí**	**3**		**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1496 días**
4	No	4		Entrega de Predios por parte de la EFR	lun 16/05/22	lun 16/05/22	0 días
5	No	5		Firma de acta de Inicio de la etapa de construcción	lun 16/05/22	lun 16/05/22	0 días
6	No	6		Inicio Etapa de Construcción	lun 16/05/22	lun 16/05/22	0 días
7	No	7		Reunión de Socialización	jue 2/06/22	jue 2/06/22	0 días
8	**Sí**	**8**		**HITOS**	**sáb 28/09/24**	**mar 12/01/27**	**700 días**
9	**Sí**	**9**		**HITOS antiguos**	**sáb 28/09/24**	**vie 20/06/25**	**224 días**
10	No	10		Demoras en la ejecución por parte de Maipore	sáb 28/09/24	sáb 28/09/24	0 días
11	No	11		Demolición y ejecución de cerramiento predio compra venta carros	vie 20/06/25	vie 20/06/25	0 días
12	**Sí**	**12**		**HITOS Vanti**	**mar 3/06/25**	**lun 1/12/25**	**154 días**
13	No	13		Desgasificación: Calle 25 (PVE 22) a Calle 12 (Sector San Humberto) Bogota - Girardot	mar 24/06/25	mar 24/06/25	0 días
14	No	14		Cruce Diag 30 sur	vie 20/06/25	vie 20/06/25	0 días
15	No	15		Desgasificación 4" soterrado -boxculvert	mié 23/07/25	mié 23/07/25	0 días
16	No	16		Fecha de firma de permiso de intervención	mar 3/06/25	mar 3/06/25	0 días
17	No	17		Entrega de permiso de intervención de Vanti	mar 3/06/25	mar 3/06/25	0 días
18	No	18		Elaboración de actas de Vecindad y activación de POC	lun 14/07/25	lun 14/07/25	0 días
19	No	19		Actividades preliminares para lanzamiento	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	0 días
20	No	20		Tramo 1 (Puente Ducales - Soterrado)	vie 4/07/25	vie 4/07/25	0 días
21	No	21		Tramo 2 (Santa Cecilia- Soterrado)	sáb 26/07/25	sáb 26/07/25	0 días
22	No	22		Tramo 3 (Santa cecilia a calle 12)	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	0 días
23	No	23		Cruce PPE 8 va Sur de EDS el Vaquero	mar 4/11/25	mar 4/11/25	0 días
24	No	24		Cruce PPE Ducales as EDS El retorno	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	0 días
25	No	25		Desgasificación 3M a Dig 30 Sur	sáb 4/10/25	sáb 18/10/25	11 días
26	No	26		Construcción caja válvula 4" (Apoyo occidental Ducales)	lun 1/12/25	lun 1/12/25	0 días
27	No	27		Construcción caja válvula 4" (Puente calle 8 sur)	lun 1/12/25	lun 1/12/25	0 días
28	No	28		Empalme de tubería 14" sector maderos (Humedal)	jue 20/11/25	jue 20/11/25	0 días
29	No	29		Excavación para operación de VANTI Calle 15 Sur	lun 1/12/25	lun 1/12/25	0 días
30	**Sí**	**30**		**Liberación predial: Demolición Puente existente San Humberto, ANI 3 predios**	**vie 20/06/25**	**vie 16/01/26**	**175 días**
31	No	31		Presentar PMT	vie 20/06/25	vie 20/06/25	0 días
32	No	32		Aprobación de PMT paso a nivel	mié 24/09/25	mié 24/09/25	0 días
33	No	33		Implementación de PMT con señalización	lun 6/10/25	lun 6/10/25	0 días
34	No	34		Aprobación de proceso constructivo de demolición	mar 7/10/25	mar 7/10/25	0 días
35	No	35		Demolición del puente san humberto actual	mar 7/10/25	vie 10/10/25	4 días
36	No	36		Liberacion predios de la ANI	lun 29/12/25	lun 29/12/25	0 días
37	No	37		Liberación Predios EFR (3 unidades)	lun 29/12/25	lun 29/12/25	0 días
38	No	38		Liberación predio 063 EFR (Sector San Humberto)	vie 16/01/26	vie 16/01/26	0 días
39	**Sí**	**39**		**Liberación predial: Santa Cecilia, Moteles, Talleres**	**mar 30/09/25**	**lun 29/12/25**	**75 días**
40	No	40		Santa cecilia	lun 29/12/25	lun 29/12/25	0 días
41	No	41		Predio Moteles	lun 29/12/25	lun 29/12/25	0 días
42	No	42		Predios talleres	mar 30/09/25	mar 30/09/25	0 días
43	**Sí**	**43**		**Permiso de ocupación de cauce Rio Soacha-CARC6**	**vie 30/05/25**	**sáb 6/12/25**	**160 días**
44	No	44		Pago del CVS para tramite de la car	vie 30/05/25	vie 30/05/25	0 días
45	No	45		Fase 1 Tramite de permiso de conexión de descarga	mié 1/10/25	mié 1/10/25	0 días
46	No	46		Fase 2 Tramite de permiso ante la alcaldía	mié 1/10/25	sáb 1/11/25	27 días
47	No	47		Fase 3 Notificación ante la CAR de la aprobación del permiso de la alcaldía	sáb 1/11/25	mar 4/11/25	1 día
48	No	48		Fase 4 Radicación de notificación de inicio de actividades (2 semanas previo al inicio	mar 4/11/25	mar 18/11/25	12 días
49	No	49		Fase 5 implementación de rebose (EAAB+CAR)	sáb 6/12/25	sáb 6/12/25	0 días
50	**Sí**	**50**		**Traslado de postes de alta tensión**	**vie 27/06/25**	**vie 19/09/25**	**72 días**
51	No	51		Retiro red circuito 34.5	mar 5/08/25	mar 5/08/25	0 días
52	No	52		Retiro circuito 11.4	vie 19/09/25	vie 19/09/25	0 días
53	No	53		Traslado de postes de alta tensión de ENEL	vie 27/06/25	vie 27/06/25	0 días
54	**Sí**	**54**	**EYD-TRI**	**Aprobación y asignación presupuesto del delta por mayores cantidades como consecuencia de ajuste EyD en las Estaciones Transmilenio**	**lun 31/03/25**	**lun 15/12/25**	**217 días**
55	No	55		Aprobación para inicio EYD de transmilenio	lun 31/03/25	lun 31/03/25	0 días
56	No	56		Aprobación de ajustes de diseños solicitados de transmilenio	mié 1/10/25	mié 1/10/25	0 días
57	No	57		Si Valor es menor a 3.400 MM no requiere proceso interno en la EFR, para obtención de recursos.	mié 1/10/25	mié 1/10/25	0 días
58	No	58		Si valor es mayor a 3.400 MM EFR requiere 2 meses de proceso interno en la EFR, para obtención de recursos.	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
59	No	59		Conexión desagüe Colector norte y sur - Empalme lote 2 (Concorcreto): Solución temporal a pozo de Colsubsidio	lun 30/03/26	lun 30/03/26	0 días
60	No	60	ANTC	Antena colocatión	mar 4/11/25	mar 4/11/25	0 días
61	**Sí**	**61**		**Entrega de puentes a cargo de la ANI**	**vie 16/01/26**	**vie 16/01/26**	**0 días**
62	No	62		Puente carrera 7	vie 16/01/26	vie 16/01/26	0 días
63	No	63		Puente el dorado	vie 16/01/26	vie 16/01/26	0 días
64	No	64		Puente san humberto	vie 16/01/26	vie 16/01/26	0 días
65	**Sí**	**65**		**PMT's**	**mar 30/09/25**	**lun 19/01/26**	**91 días**
66	No	66		Presentación PMT 66 con 2 carriles desde san Humberto hasta Ducales	mar 30/09/25	mar 30/09/25	0 días
67	No	67		Aprobación PMT66 con 2 carriles desde san Humberto hasta Ducal	mar 30/09/25	vie 31/10/25	27 días
68	No	68		Implementación PMT 66 con 2 carriles desde san Humberto hasta Ducales	vie 31/10/25	mar 18/11/25	13 días
69	No	69		Presentación PMT 64	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	0 días
70	No	70		Aprobación PMT64	sáb 4/10/25	mié 5/11/25	26 días
71	No	71		Implementación PMT 64	mié 5/11/25	jue 20/11/25	13 días
72	No	72		Presentación actualización PMT 56 (Paso peatonal)	mar 2/12/25	mar 2/12/25	0 días
73	No	73		Aprobación PMT 56 (Paso peatonal)	mar 2/12/25	vie 2/01/26	25 días
74	No	74		Implementación actualización PMT 56 (Paso peatonal)	vie 2/01/26	lun 19/01/26	13 días
75	No	75		Firma Convenio Alumbrado Público	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
76	No	76		Aprobación Solución técnica Auger Boring Predio Santa Cecilia	vie 2/01/26	vie 2/01/26	0 días
77	**Sí**	**77**		**HITOS OTROSI #12**	**lun 15/12/25**	**mar 12/01/27**	**327 días**
78	**Sí**	**78**		**SECTOR PUENTE CALLE 22**	**vie 9/01/26**	**vie 15/05/26**	**107 días**
79	No	79		(Hito 1) Desenergización red de alta tensión ENEL de las lineas Nueva Esperanza - Bosa 2 / Río- Techo a 115 kV, para el izaje de las vigas del puente vehicular calle 22 costado norte, de conformidad con las fechas solicitadas por el CVS a través del c	mié 4/03/26	mar 10/03/26	5.5 días
80	No	80		(Hito 2) Radicación del PMT para el cierre de la Calle 22 cumpliendo todos los requisitos establecidos en el decreto 285 del 30 de agosto de 2016 y con lo establecido en la circular 050 del 27 de septiembre del 2024 de la Alcaldía de Soacha.	vie 9/01/26	vie 9/01/26	0 días
81	No	81		(Hito 3) Una vez cumplido el hito anterior no objetado por el interventor del contrato, la Secretaría de Movilidad de Soacha tendrá 30 días hábiles para emitir la resolución de aprobación del PMT para el cierre de la Calle 22.	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
82	**Sí**	**82**		**DEFINICIONES A LA POSIBLE AFECTACIÓN A LA RED MATRIZ DE 36" SECTOR 6.**	**mié 7/01/26**	**vie 15/05/26**	**109 días**
83	No	83		(Hito 4) Solicitud de PMT para realizar los apiques e investigación de la red sobre la autopista Sur entre las calles 25 a la calle 22 acorde con la resolución 065 del 2022 de la Empresa	mié 7/01/26	mié 7/01/26	0 días
84	No	84		(Hito 5) Aprobación mediante resolución por parte de la EFR del PMT.	jue 8/01/26	jue 8/01/26	0 días
85	No	85		(Hito 6) Radicación por parte del CVS a la interventoría de un diagnóstico técnico integral (análisis de la profundidad y el alineamiento de esta red soportada con apiques y los perfiles longitudinales y transversales) con las posibles afectaciones a las	vie 20/02/26	vie 20/02/26	0 días
86	No	86		(Hito 7) Emisión de la No objeción de la propuesta de solución por parte de la interventoría de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos por cada área.	mar 31/03/26	mar 31/03/26	0 días
87	No	87		(Hito 8) Radicación del diseño de la Dirección de Red Matriz y Transporte Masivo del EAAB.	mié 25/03/26	mié 25/03/26	0 días
88	No	88		(Hito 9) Emisión de la aprobación de la propuesta de solución por parte de la Dirección de Red Matriz y Transporte Masivo del	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
89	**Sí**	**89**		**SECTOR 2 y 8.**	**lun 15/12/25**	**vie 15/05/26**	**128 días**
90	No	90		(Hito 10) Definición por parte de la ANI sobre la decisión de construcción o no construcción y consecuente descontratación del puente Peatonal San Humberto, del contrato de concesión bajo el esquema APP No. 04 de 2016. Entrega de puente PEATONAL San Humb	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
91	No	91		(Hito 11) Definición de la ANI respecto a las áreas de intervención de urbanismo y espacio público de plazoletas para los puentes peatonales puente peatonal El dorado y calle 8 Sur, que serán intervenidas con el contrato de concesión bajo el	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
92	No	92		(Hito 12) Suscripción del acta puesta a disposición y entrega de predios a cargo de la EFR (3 Predios – TM 2-064, TM 2-065 y, TM 2-066) (Sentido Bogotá - Girardot) al Contratista.	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
93	No	93		(Hito 13) Entrega de comunicado y planos georreferenciados anexos de la solicitud de compra del predio TM- 2-063 por parte del contratista y la interventoría, a la EFR, acompañada con el acta predial firmada, los cuales deberán cumplir todos los requisit	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
94	No	94		(Hito 14) Suscripción del acta puesta a disposición del Predio EFR (Predio- TM -2- 063) (Sentido Girardot - Bogotá) al	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
95	**Sí**	**95**		**CONVENIO ENEL- ALCALDÍA ALUMBRADO PÚBLICO**	**vie 15/05/26**	**vie 15/05/26**	**0 días**
96	No	96		(Hito 15) Suscripción de Convenio entre las partes ENEL - ALCALDÍA para la coexistencia de la infraestructura y el recibido del alumbrado público en función del marco normativo vigente.	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
97	**Sí**	**97**		**SECTOR 3**	**mié 17/12/25**	**vie 15/05/26**	**126 días**
98	**Sí**	**98**		**Definición revestimiento de tuberia de 16" (MANGA)**	**mié 17/12/25**	**lun 2/02/26**	**39 días**
99	No	99		(Hito 16) Radicación versión V2 por parte del CVS atendiendo las observaciones presentadas por la interventoría a través del comunicado EFR03-2244-2025 con respecto al l diseño de la selección de tecnología sin zanja para la rehabilitación de la	jue 18/12/25	jue 18/12/25	0 días
100	No	100		(Hito 17) Aprobación por parte de la interventoría el diseño para el revestimiento de la tubería de 16" dando cumplimiento con la norma SISTEC de la EAAB NS-189.	mié 17/12/25	mié 17/12/25	0 días
101	No	101		(Hito 18) Radicación del diseño no objetado por la interventoría para el revestimiento de la tubería a la EAAB bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma SISTEC de la EAAB NS-189.	jue 18/12/25	jue 18/12/25	0 días
102	No	102		(Hito 19) Aprobación por parte del EAAB con respecto al diseño presentado por el contratista y no objetado por la interventoría sobre el recubrimiento de la tubería de 16".	lun 2/02/26	lun 2/02/26	0 días
103	**Sí**	**103**		**Construcción de colector sanitario sin zanja sector Santa Cecilia.**	**jue 18/12/25**	**vie 30/01/26**	**35 días**
104	No	104		(Hito 20) Presentación por parte del contratista de la solución técnica y económica para la construcción del colector sanitario de 30" dando cumplimiento a los requisitos establecidos con la norma SISTEC de la EAAB NS-189.	jue 18/12/25	jue 18/12/25	0 días
105	No	105		(Hito 21) Aprobación de la interventoría de la solución técnica y económica presentada por el contratista una vez hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en la norma SISTEC de la EAAB NS-189.	lun 26/01/26	lun 26/01/26	0 días
106	No	106		(Hito 22) Aprobación por parte de la EFR una vez se encuentre no objetado el diseño y los items no previstos para la construcción del colector sanitario por parte de la	vie 30/01/26	vie 30/01/26	0 días
107	**Sí**	**107**		**BOX CULVERT**	**vie 19/12/25**	**vie 15/05/26**	**123 días**
108	**Sí**	**108**		**TRÁMITE PRÓRROGA POC PARA CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT**	**vie 19/12/25**	**vie 15/05/26**	**123 días**

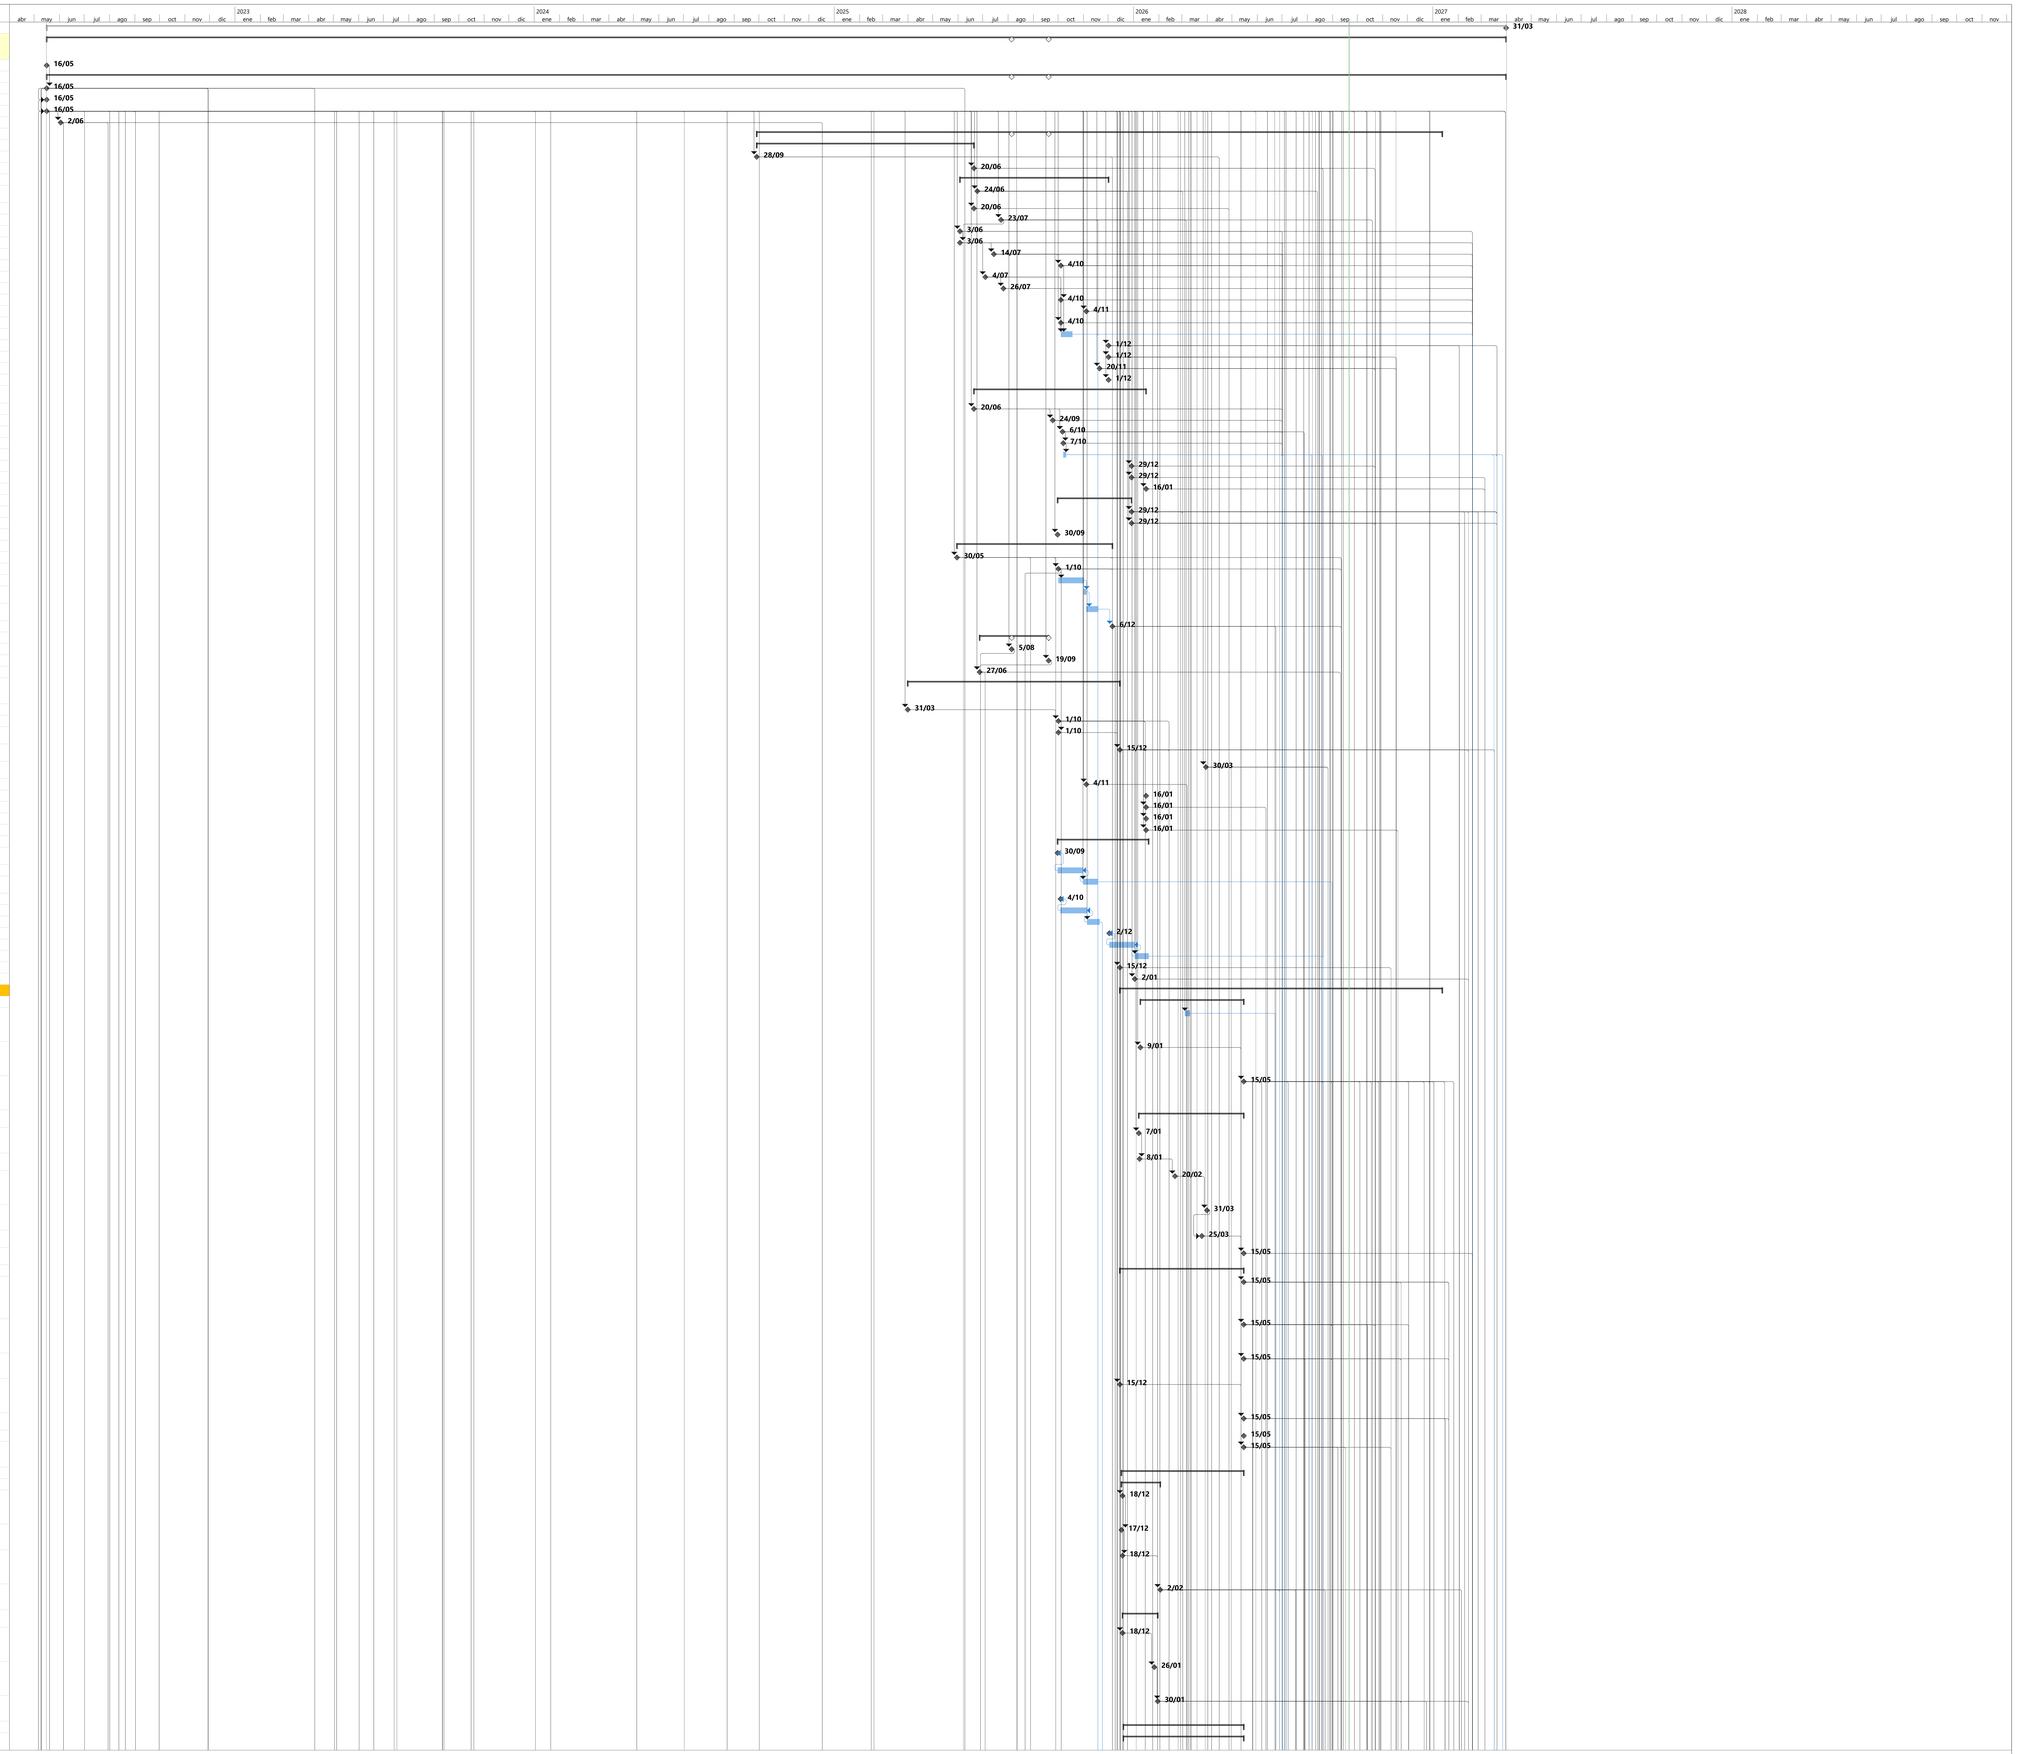

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
109	No	109		(Hito 23) Radicación solicitud de prórroga por parte del contratista cumpliendo con los requerimientos exigidos para la prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado por la CAR para la construcción del Box coulvert sobre el Río Soacha, según resolu	vie 19/12/25	vie 19/12/25	0 días
110	No	110		(Hito 24) Otorgamiento nueva prórroga del permiso de ocupación de cauce por parte de la CAR de conformidad al cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
111	**Sí**	**111**		**DISEÑO FINAL BOX CULVERT**	**lun 22/12/25**	**vie 15/05/26**	**121 días**
112	No	112		(Hito 25) Presentación del diseño estructural del Box Culvert alternativa prefabricada (Conceptos de especialistas Geotecnia, diseño geométrico y redes) por parte del contratista a la interventoría.	lun 22/12/25	lun 22/12/25	0 días
113	No	113		(Hito 26) Aprobación técnica de la interventoría al diseño estructural del Box Culvert alternativa prefabricada (Conceptos de especialistas Geotecnia, diseño geométrico y redes) con el cumplimiento de los requisitos técnicos.	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
114	**Sí**	**114**		**PASO SOTERRADO**	**mié 1/04/26**	**lun 4/05/26**	**25 días**
115	**Sí**	**115**		**CANALIZACIÓN Y CAJAS REDES DEFINITIVAS SECTOR 3M**	**mié 1/04/26**	**lun 4/05/26**	**25 días**
116	No	116		(Hito 27) Construcción de canalización y cajas redes definitivas sector 3m con el cumplimiento de requisitos y las especificaciones técnicas vigentes de ENEL CODENSA S.A. ESP para la Construcción de la obra civil necesaria para las	jue 30/04/26	jue 30/04/26	0 días
117	No	117		(Hito 28) Recibo de las obras definitivas entre la interventoría y ENEL previo cumplimiento de los requisitos establecidos por	lun 4/05/26	lun 4/05/26	0 días
118	No	118		(Hito 29) Solicitud a ENEL de maniobra definitiva de postes red media tensión (en el sector 3M para el traslado y protección de red de MT 34.5 kva 6 postes sector 3M) con el cumplimiento de requisitos descritos en el convenio de	mié 1/04/26	mié 1/04/26	0 días
119	**Sí**	**119**		**ARMONIZACIÓN REDES EN LA DIAGONAL 13 SUR POR INTERFERENCIA CON LA CAJA- VÁLVULA DE VANTI.**	**mié 7/01/26**	**lun 2/02/26**	**22 días**
120	No	120		(Hito 31) Presentación a la interventoría solución técnica reubicación de redes en la diagonal 13 sur con el cumplimiento de los requisitos descritos en el apéndice C del contrato de obra y en los Convenios con las ESP.	mié 7/01/26	mié 7/01/26	0 días
121	No	121		(Hito 32) Aprobación por parte de la interventoría de la solución técnica con respecto a la interferencia de las redes proyectadas con la caja válvula de VANTI, dando el aval para la presentación ante la EPS según lo indicado en el apéndice C y los conve	vie 9/01/26	vie 9/01/26	0 días
122	No	122		(Hito 33) Radicación o presentación ante las ESP de los ajustes a las redes en la calle 13 sur cumpliendo con los requisitos técnicos indicados en el apéndice C y en los convenios de cooperación de conformidad con la no objeción dada por la	vie 9/01/26	vie 9/01/26	0 días
123	No	123		(Hito 34) Aval a los ajustes de los diseños de la red ENEL en la calle 13 Sur mediante acta o comunicado.	lun 2/02/26	lun 2/02/26	0 días
124	No	124		(Hito 35) Aval a los ajustes de los diseños de la red de ETB en la calle 13 Sur, mediante acta o comunicado.	lun 2/02/26	lun 2/02/26	0 días
125	**Sí**	**125**		**INTERVENCIÓN DIAGONAL 30 SUR**	**lun 15/12/25**	**vie 15/05/26**	**128 días**
126	No	126		(Hito 36) Aprobación de la SMS del PMT 69 para el cierre diagonal 30 Sur cumpliendo todos los requisitos establecidos en el decreto 285 del 30 de agosto de 2016 y con lo establecido en la circular 050 del 27 de septiembre del 2024 de la alcaldía de	vie 15/05/26	vie 15/05/26	0 días
127	No	127		(Hito 37) Puesta en funcionamiento colector sur por parte del lote 2 para el funcionamiento del sistema pluvial construido por lote 1.	jue 9/04/26	jue 9/04/26	0 días
128	No	128		(Hito 38) Ejecución de la maniobra traslado postes red de media tensión de la esquina noroccidental de la diagonal 30 sur con autopista sur, donde la infraestructura fue recibida por parte de ENEL el 10 de diciembre del 2025, con observaciones.	jue 5/02/26	jue 5/02/26	0 días
129	No	129		(Hito 39) Ejecución de maniobra de traslado provisional del poste y redes a cargo de ETB, ubicado en la diagonal 30 Sur con Autopista sur, previa entrega de la canalización por parte del contratista que se realizada el 12 de diciembre del 2025.	lun 2/02/26	lun 2/02/26	0 días
130	No	130		(Hito 40) Terminación de obras civiles del traslado de redes de alta presión de acero 10" y la construcción de la red de 14" sobre el corredor principal de la autopista sur.	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
131	**Sí**	**131**		**Liberación Predio Moteles**	**vie 27/02/26**	**vie 27/02/26**	**0 días**
132	No	132		(Hito 42) Liberación Predio moteles para la construcción espacio público redes en espacio público	vie 27/02/26	vie 27/02/26	0 días
133	**Sí**	**133**		**Tramite permiso de ocupación espacio público C6**	**jue 18/12/25**	**mar 27/01/26**	**32 días**
134	No	134		(Hito 43) Radicación solicitud de permiso de ocupación del espacio público atendiendo las observaciones remitidas por la Alcaldía del Municipio de Soacha, para la construcción de la conexión del sistema pluvial de 3M al Río Soacha, de	jue 18/12/25	jue 18/12/25	0 días
135	No	135		(Hito 44) Otorgamiento del Permiso Ocupación espacio público por parte de la alcaldía de Soacha una vez el contratista cumpla con los requisitos establecidos por la Alcaldía	lun 19/01/26	lun 19/01/26	0 días
136	No	136		(Hito 45) Aprobación de diseño de descarga C6 por parte de EAAB una vez el contratista presenta la totalidad de los documentos técnicos y la subsanación de las observaciones	mar 27/01/26	mar 27/01/26	0 días
137	**Sí**	**137**		**SITUACIONES NUEVAS QUE AFECTAN EL PROYECTO**	**lun 2/03/26**	**lun 6/04/26**	**27 días**
138	No	138		Culminacion del sistema del monopolo en el sector 7	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26	0 días
139	No	139		Verificacion de la desgasificacion de tuberia de 4" costado oriental de calle 15 Sur hasta calle 11 sur.	jue 12/03/26	jue 12/03/26	0 días
140	No	140		Aprobación de la SMS del PMT 75 para el cierre del costado oriental (sentido Girardot - Bogotá) contemplando la no objeción de la interventoría. Donde el trámite inicial se radicó el 04 de noviembre del 2025.	lun 2/03/26	lun 2/03/26	0 días
141	No	141		Afectaciones por la implementación de carril pivote por motivos del plan éxodo y plan retorno durante semana con dia feriado "Puentes festivos"	jue 19/03/26	lun 6/04/26	12 días
142	No	142		Solicitud de PMT86 para realizar los cierres parciales y lograr intervenir la autopista sur sobre Calle 15 sur	mar 2/06/26	mar 2/06/26	0 días
143	No	143		Visto bueno del PMT86 por parte de interventoría para remitir a EFF	vie 19/06/26	vie 19/06/26	0 días
144	No	144		Aprobación mediante resolución por parte de la EFR del PMT86	vie 3/07/26	vie 3/07/26	0 días
145	**Sí**	**145**		**HITOS OTROSÍ #13**	**jue 25/06/26**	**mar 12/01/27**	**166 días**
146	No	146		Aprobación por parte de la SMS del PMT 69, para el cierre diagonal 30 Sur cumpliendo todos los requisitos establecidos en el decreto 285 del 30 de agosto de 2016, y con lo establecido en la circular 050 del 27 de septiembre del 2024 de la alcaldía de	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
147	No	147		Terminación de actividades de alta presión de Vanti y obra civil sobre la diagonal 30 sur, red de acero 4".	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días
148	No	148		Suscripción del acta puesta a disposición y entrega de predios a cargo de la EFR (3 Predios – TM 2-064, TM 2-065 y, TM 2-066) (Sentido Bogotá - Girardot) al Contratista. (Sector 2)	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días
149	No	149		Suscripción del acta puesta a disposición del Predio EFR (Predio- TM -2- 063) (Sentido Girardot - Bogotá)Lal contratista	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días
150	No	150		Definición por parte de la ANI sobre la decisión de construcción o no del puente Peatonal San Humberto, del contrato de concesión bajo el esquema APP No. 04 de 2016. (Sector 2 y 7)	sáb 31/10/26	sáb 31/10/26	0 días
151	No	151		RED MATRIZ 36" Sector 6 - Aprobación por parte del la EAAB de la construcción de cárcamo de protección sobre la red matriz como solución a interferencia	mar 15/09/26	mar 15/09/26	0 días
152	No	152		Aprobación por parte de la EFR del PMT 56 cumpliendo todos los requisitos establecidos en el decreto 285 del 30 de agosto de 2016, y con lo establecido en la circular 050 del 27 de septiembre del 2024 de la alcaldía de Soacha	vie 4/09/26	vie 4/09/26	0 días
153	No	153		Aprobación por parte de la SMS del PMT 56 cumpliendo todos los requisitos establecidos en el decreto 285 del 30 de agosto de 2016, y con lo establecido en la circular 050 del 27 de septiembre del 2024 de la alcaldía de Soacha	vie 16/10/26	vie 16/10/26	0 días
154	No	154		Radicación a Interventoría de un PMT94 nuevo para el cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector puente humedal hasta Moteles (Sector 4)	vie 4/09/26	vie 4/09/26	0 días
155	No	155		Aprobación de la Interventoría del PMT94 nuevo para cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector puente humedal hasta Moteles.	vie 11/09/26	vie 11/09/26	0 días
156	No	156		Aprobación mediante resolución por parte de la EFR del de un PMT94 nuevo para el cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector puente humedal hasta Moteles (Sector 4)	vie 18/09/26	vie 18/09/26	0 días
157	No	157		Aprobación mediante resolución por parte de la EFR de un PMT 92 nuevo para realizar cierre calzada Girardot - Bogotá Sector calle 6 costado oriental (Sector 9)	vie 18/09/26	vie 18/09/26	0 días
158	No	158		Aprobación mediante resolución por parte de la SMS de un PMT 92 nuevo para realizar cierre calzada Girardot - Bogotá Sector calle 6 costado oriental (Sector 9)	mar 22/09/26	mar 22/09/26	0 días
159	No	159		Radicación de PMT para realizar actividades de espacio público en Calle 7 (Sector 9)	vie 20/11/26	vie 20/11/26	0 días
160	No	160		Aprobación de la Interventoría de un PMT nuevo para realizar actividades de espacio público en Calle 7 (Sector 9)	mar 24/11/26	mar 24/11/26	0 días
161	No	161		Aprobación mediante resolución por parte de la SMS del PMT para realizar actividades de espacio público en Calle 7 (Sector 9)	mar 12/01/27	mar 12/01/27	0 días
162	No	162		Suscripción de acuerdo entre ENEL - ALCALDÍA para la coexistencia de la infraestructura y el recibido del alumbrado público en función del marco normativo vigente	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
163	No	163		Presentación de NP necesarios por ajustes a diseños de los diseños de acuerdo con la actualización de la normativa RETIE-RETILAP 2024	mar 8/09/26	mar 8/09/26	0 días
164	No	164		Traslado definitivo de poste con conexión informal ubicado en medio de cimentación Estación Ducales	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días
165	No	165		Presentación a Interventoría de un PMT nuevo para el cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector 3M paraejecución de módulo 3 de Soterrado.	jue 17/09/26	jue 17/09/26	0 días
166	No	166		Aprobación de la Interventoría del PMT nuevo para el cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector 3M paraejecución de módulo 3 de Soterrado.	mar 22/09/26	mar 22/09/26	0 días
167	No	167		Aprobación mediante resolución por parte de la EFR del PMT nuevo para el cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector 3M para ejecución de módulo 3 de Soterrado.	sáb 10/10/26	sáb 10/10/26	0 días
168	No	168		Aprobación mediante resolución por parte de la SMS del PMT nuevo para el cierre de calzada Bogotá - Girardot Sector 3M para ejecución de módulo 3 de Soterrado.	mié 25/11/26	mié 25/11/26	0 días
169	No	169		Radicación a Interventoría del PMT 82 para el cierre de calzada Girardot - Bogotá Sector 8 para ejecución de BRT sector 2	lun 31/08/26	lun 31/08/26	0 días
170	No	170		Aprobación de la Interventoría del PMT 82 para el cierre de calzada Girardot - Bogotá Sector 8 para ejecución de BRT sector	vie 4/09/26	vie 4/09/26	0 días
171	No	171		Aprobación mediante resolución por parte del PMT 82 para el cierre de calzada Girardot - Bogotá Sector 8 para ejecución de BRT sector 2	vie 18/09/26	vie 18/09/26	0 días
172	No	172		Retiro de Redes ETB QUE AFECTA CONSTRUCCIÓN DE MIXTO ENTRE CALLES 12 Y CALLE 13	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
173	**Sí**	**173**		**HITOS NO CONTRACTUALES**	**jue 25/06/26**	**jue 15/10/26**	**93 días**
174	No	174		Construcción de canalización y obra civil para el traslado de redes sector puente ducales.	mar 21/07/26	mar 21/07/26	0 días
175	No	175		Ejecución de maniobra provisional de traslado de redes de media tensión sector puente Ducales para izaje de vigas.	mié 22/07/26	mié 22/07/26	0 días
176	No	176		Radicación de planos taller viga metálica de rampa El Dorado	jue 25/06/26	jue 25/06/26	0 días
177	No	177		Aprobación por parte de Interventoría de planos taller viga metálica de rampa El Dorado	mié 8/07/26	mié 8/07/26	0 días
178	No	178		Aprobación de diseños y colores de fachada microperforada para edificio sur y edificio norte	lun 10/08/26	lun 10/08/26	0 días
179	No	179		PMT 78 -Aprobación por SMS del alcance PMT-78, presentado por el CVS mediante comunicación D0000009677 del 17 de junio (Sector 6)	jue 6/08/26	jue 6/08/26	0 días
180	No	180		Presentación a Interventoría de un PMT 92 nuevo para realizar cierre calzada Girardot - Bogotá Sector calle 6 costado oriental (Sector 9)	jue 9/07/26	jue 9/07/26	0 días
181	No	181		Aprobación de la Interventoría de un PMT 92 nuevo para realizar cierre calzada Girardot - Bogotá Sector calle 6 costado oriental costado oriental (Sector 9)	mié 5/08/26	mié 5/08/26	0 días
182	No	182		Radicación de atención a observaciones a modificaciones de planos taller estructura metálica paso elevado	mar 7/07/26	mar 7/07/26	0 días
183	No	183		Aprobación por parte de Interventoría de modificaciones de planos taller estructura metálica paso elevado	mar 11/08/26	mar 11/08/26	0 días
184	No	184		Habilitación de rampa peatonal provisional en puente peatonal para permitir la demolición de rampa existente puente acceso estación Carrera 7	vie 14/08/26	vie 14/08/26	0 días
185	No	185		Traslado provisional de poste con conexión informal ubicado en medio de cimentación Estación Ducales	mar 18/08/26	mar 18/08/26	0 días

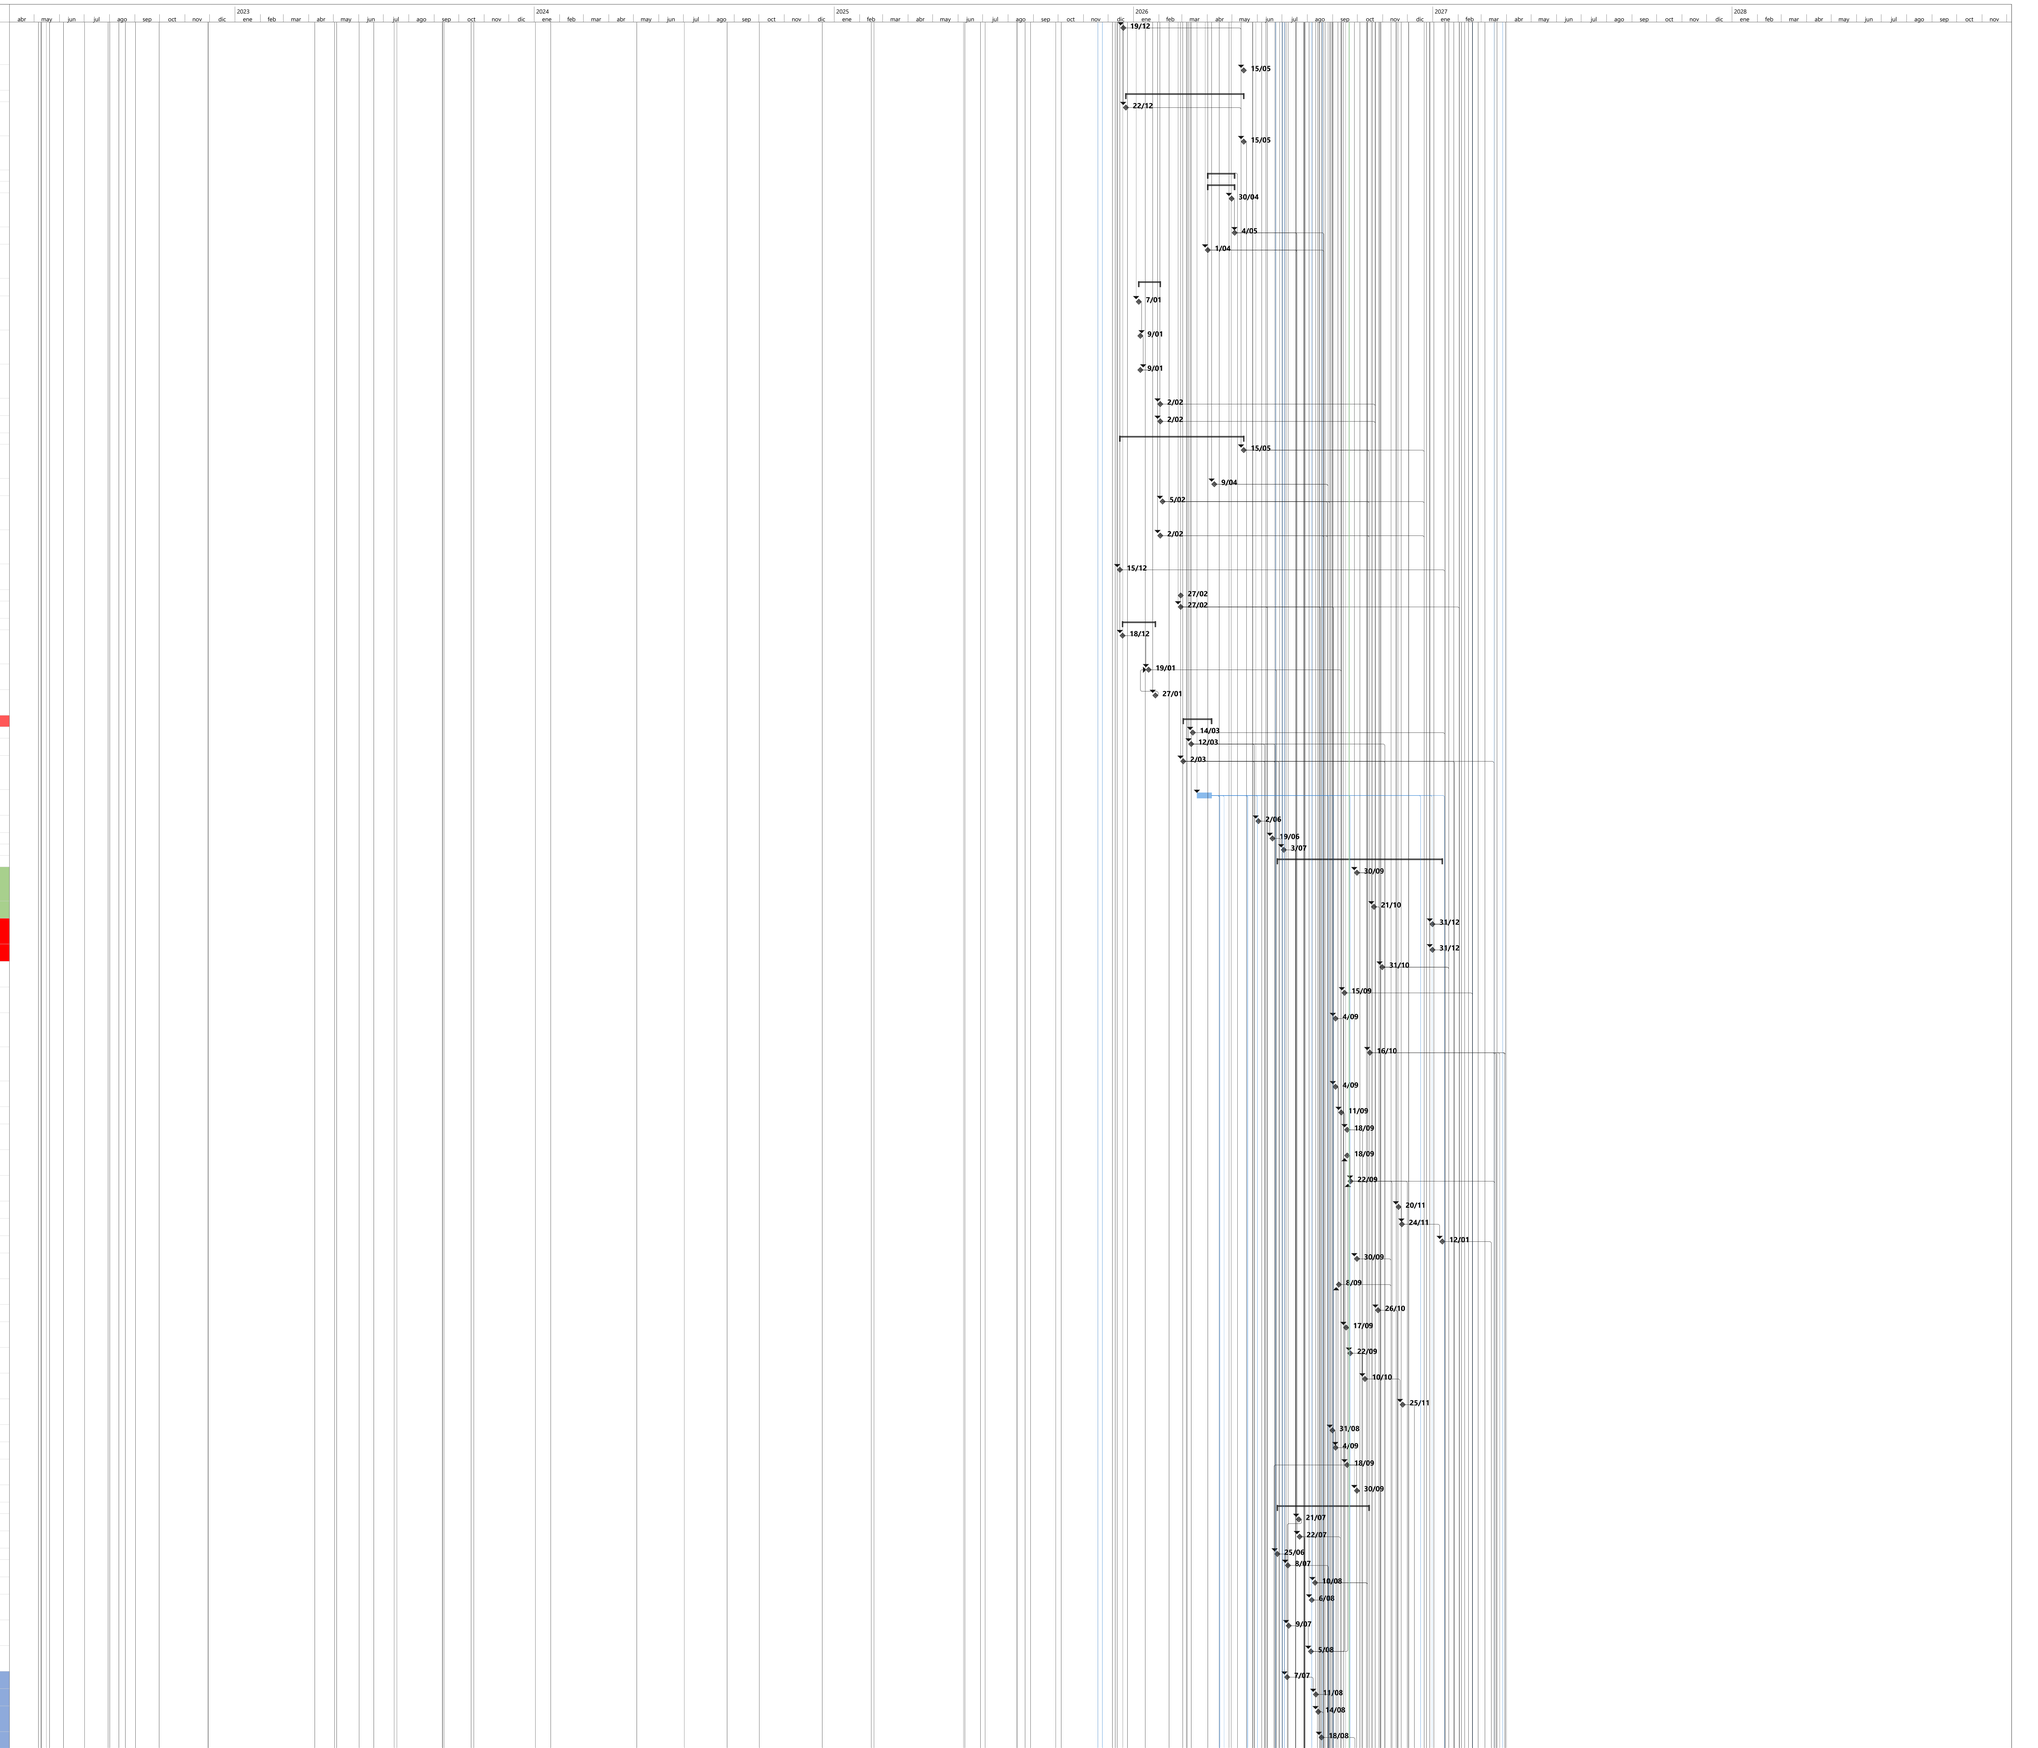

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
186	No	186		Ejecución de la maniobra traslado 6 postes media tensión con el cumplimiento de requisitos descritos en el convenio de cooperación No 001 del 2022. (Sector 9)	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días
187	No	187		Aprobación al ajuste de los diseños de acuerdo con la actualización de la normativa RETIE-RETILAP 2024	mar 1/09/26	mar 1/09/26	0 días
188	No	188		Radicación por parte del contratista al ente designado por parte de la alcaldía municipal de Soacha	mar 1/09/26	mar 1/09/26	0 días
189	No	189		Aprobación por parte del ente designado por la alcaldía municipal de soacha del ajuste a los diseños de acuerdo con la actualización de la normativa RETIE-RETILAP 204	mar 1/09/26	mar 1/09/26	0 días
190	No	190		Aprobación de planos taller cubierta ligera edificios norte y sur	vie 4/09/26	vie 4/09/26	0 días
191	No	191		Ajustes de diseños de cimentación de rampa puente Carrera 7	lun 27/07/26	vie 11/09/26	39 días
192	No	192		Aprobación por parte de interventoría de ajuste de diseños de cimentación de rampa puente Carrera 7	mar 22/09/26	mar 22/09/26	0 días
193	No	193		Radicación a Interventoría de un PMT nuevo para cerrar la intersección de la Calle 8 sur (Puente peatonal ANI) y construir las calzadas Mixtas y BRT (Sectores 4 y 10)	vie 21/08/26	vie 21/08/26	0 días
194	No	194		Aprobación de la Interventoría de un PMT nuevo para cerrar la intersección de la Calle 8 sur (Puente peatonal ANI) y construir las calzadas Mixtas y BRT (Sectores 4 y 10)	mar 25/08/26	mar 25/08/26	0 días
195	No	195		Aprobación mediante resolución por parte de la EFR de un PMT nuevo para cerrar la intersección de la Calle 8 sur (Puente peatonal ANI) y construir las calzadas Mixtas y BRT	jue 3/09/26	jue 3/09/26	0 días
196	No	196		Aprobación por parte de ENEL de la conexión de estaciones y taquillas una vez se hayan realizado la gestión previa para dicha aprobación.	jue 15/10/26	jue 15/10/26	0 días
197	**Sí**	**197**	**VD**	**Vía de desvío**	**vie 3/06/22**	**sáb 11/01/25**	**801 días**
198	No	198		Preliminares Vía de desvío	vie 3/06/22	lun 19/09/22	90 días
199	**Sí**	**199**		**Adecuación y construcción de vía de desvío - (Etapa 1 - Calle 22 - Diag. 9)EJECUTADO**	**mié 27/07/22**	**sáb 29/04/23**	**237 días**
200	No	200		Inicio Etapa 1	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
201	**Sí**	**201**		**Construcción vía: Calle 16 hasta la Calle 12 Abs(K0+845 al K1+259), No incluye (K1+000 al K1+065)**	**mié 27/07/22**	**sáb 29/04/23**	**237 días**
202	No	202		Inicio Etapa 1C	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
203	**Sí**	**203**		**Construcción vía**	**mié 27/07/22**	**sáb 29/04/23**	**237 días**
204	No	204		Preliminares y Excavaciones	mié 27/07/22	mar 8/11/22	90 días
205	No	205		Capas Granulares	mar 7/02/23	sáb 29/04/23	70 días
206	No	206		Carpeta Asfáltica	mar 21/02/23	sáb 29/04/23	57 días
207	**Sí**	**207**		**Red Pluvial**	**sáb 21/01/23**	**sáb 29/04/23**	**84 días**
208	No	208		Excavaciones y entibados	sáb 21/01/23	mar 25/04/23	80 días
209	No	209		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	lun 30/01/23	jue 27/04/23	75 días
210	No	210		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	mar 7/02/23	sáb 29/04/23	70 días
211	No	211		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	lun 30/01/23	mar 31/01/23	1 día
212	**Sí**	**212**		**Adecuación de vía de desvío - (Etapa 2 - Diag. 9 -Calle 15 s) EJECUTADO**	**mié 27/07/22**	**mié 10/01/24**	**449 días**
213	No	213		Inicio Etapa 2	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
214	**Sí**	**214**		**Construcción vía: Diagonal 9 hasta la calle 5 bis (K1+685 al K2+215)**	**vie 26/08/22**	**vie 4/08/23**	**290 días**
215	No	215		Inicio Etapa 2A	vie 26/08/22	vie 26/08/22	0 días
216	**Sí**	**216**		**Construcción vía**	**vie 26/08/22**	**vie 4/08/23**	**290 días**
217	No	217		Preliminares y Excavaciones	vie 26/08/22	mar 18/04/23	200 días
218	No	218		Capas Granulares	mié 28/12/22	vie 4/08/23	185 días
219	No	219		Carpeta Asfáltica	jue 23/02/23	vie 23/06/23	100 días
220	**Sí**	**220**		**Adecuación vía**	**sáb 14/01/23**	**mié 1/03/23**	**40 días**
221	No	221		Sello de fisuras	sáb 14/01/23	lun 6/02/23	20 días
222	No	222		Carpeta Asfáltica	mar 7/02/23	mié 1/03/23	20 días
223	**Sí**	**223**		**Red Pluvial**	**jue 29/09/22**	**sáb 11/03/23**	**140 días**
224	No	224		Excavaciones y entibados	jue 29/09/22	vie 17/02/23	120 días
225	No	225		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	jue 10/11/22	lun 6/03/23	100 días
226	No	226		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	lun 5/12/22	sáb 11/03/23	85 días
227	No	227		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	jue 3/11/22	mié 1/03/23	100 días
228	**Sí**	**228**		**Construcción vía: transversal 12 A calle 11 sur (k2+800 al K3+545 Bocacalles y empalme carril mixto**	**mié 27/07/22**	**vie 25/11/22**	**104 días**
229	No	229		Inicio Etapa 2E	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
230	**Sí**	**230**		**Construcción vía**	**mié 27/07/22**	**vie 25/11/22**	**104 días**
231	No	231		Preliminares y Excavaciones	mié 27/07/22	mar 8/11/22	90 días
232	No	232		Capas Granulares	lun 5/09/22	vie 25/11/22	70 días
233	No	233		Carpeta Asfáltica	lun 19/09/22	vie 25/11/22	57 días
234	**Sí**	**234**		**Red Pluvial**	**vie 19/08/22**	**vie 25/11/22**	**84 días**
235	No	235		Excavaciones y entibados	vie 19/08/22	lun 21/11/22	80 días
236	No	236		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	vie 26/08/22	mié 23/11/22	75 días
237	No	237		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	lun 5/09/22	vie 25/11/22	70 días
238	No	238		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	vie 26/08/22	vie 25/11/22	77 días
239	**Sí**	**239**		**Construcción vía: Diagonal 9 hasta la calle 5 bis (K1+685 al K2+215) Empalme diag. 9**	**mié 27/07/22**	**mar 30/08/22**	**30 días**
240	No	240		Inicio Etapa 2A	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
241	**Sí**	**241**		**Construcción vía**	**mié 27/07/22**	**mar 30/08/22**	**30 días**
242	No	242		Preliminares y Excavaciones	mié 27/07/22	vie 12/08/22	15 días
243	No	243		Capas Granulares	sáb 6/08/22	jue 25/08/22	15 días
244	No	244		Carpeta Asfáltica	vie 12/08/22	mar 30/08/22	15 días
245	**Sí**	**245**		**Construcción vía: transversal 12 A calle 11 sur (k2+800 al K3+545) Bocacalles y empalme carril mixto**	**jue 14/09/23**	**mié 10/01/24**	**98 días**
246	No	246		Inicio Etapa 2E	jue 14/09/23	jue 14/09/23	0 días
247	**Sí**	**247**		**Construcción vía**	**jue 14/09/23**	**mié 10/01/24**	**98 días**
248	No	248		Preliminares y Excavaciones	jue 14/09/23	lun 18/12/23	80 días
249	No	249		Capas Granulares	lun 23/10/23	jue 4/01/24	60 días
250	No	250		Carpeta Asfáltica	jue 9/11/23	mié 10/01/24	50 días
251	**Sí**	**251**		**Red Pluvial**	**mar 26/09/23**	**lun 11/12/23**	**64 días**
252	No	252		Excavaciones y entibados	mar 26/09/23	vie 24/11/23	50 días
253	No	253		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	mar 3/10/23	vie 1/12/23	50 días
254	No	254		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	mié 11/10/23	lun 11/12/23	50 días
255	No	255		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	mar 3/10/23	vie 1/12/23	50 días
256	**Sí**	**256**		**Señalización Etapa 2**	**vie 1/12/23**	**mié 10/01/24**	**31 días**
257	No	257		Señalización horizontal	vie 1/12/23	jue 7/12/23	5 días
258	No	258		Señalización vertical	vie 1/12/23	jue 7/12/23	5 días
259	No	259		Semaforización	vie 1/12/23	jue 7/12/23	5 días
260	No	260		Obras complementarias	vie 1/12/23	jue 7/12/23	5 días
261	No	261		Fin Etapa 2 - Pendientes	mié 10/01/24	mié 10/01/24	0 días
262	**Sí**	**262**		**Adecuación y construcción de vía de desvío - (Etapa 1 - Calle 22 - Diag. 9) POR EJECUTAR**	**lun 8/05/23**	**sáb 11/01/25**	**515 días**
263	No	263		Inicio Etapa 1- pendientes	lun 8/05/23	lun 8/05/23	0 días
264	**Sí**	**264**		**Construcción vía: Calle 16 hasta la Calle 12 Abs(K1+000 al K1+065) y empalme con carril mixto**	**jue 19/10/23**	**mar 12/03/24**	**123 días**
265	No	265		Inicio Etapa 1C	jue 19/10/23	jue 19/10/23	0 días
266	**Sí**	**266**		**Construcción vía**	**jue 19/10/23**	**mar 12/03/24**	**123 días**
267	No	267		Preliminares y Excavaciones	jue 19/10/23	vie 29/12/23	60 días
268	No	268		Capas Granulares	mar 5/12/23	vie 2/02/24	50 días
269	No	269		Carpeta Asfáltica	sáb 27/01/24	mar 12/03/24	40 días
270	**Sí**	**270**		**Red Pluvial**	**jue 19/10/23**	**mié 27/12/23**	**57 días**
271	No	271		Excavaciones y entibados	jue 19/10/23	lun 18/12/23	50 días
272	No	272		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	jue 26/10/23	mié 27/12/23	50 días
273	No	273		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	vie 3/11/23	vie 22/12/23	40 días
274	No	274		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	jue 26/10/23	jue 14/12/23	40 días
275	**Sí**	**275**		**Construcción vía: Calle 12 hasta la Calle 11 Abs (K1+259 al K1+385)**	**sáb 16/09/23**	**mié 20/12/23**	**80 días**
276	No	276		Inicio Etapa 1D	sáb 16/09/23	sáb 16/09/23	0 días
277	**Sí**	**277**		**Construcción vía**	**sáb 16/09/23**	**mié 20/12/23**	**80 días**
278	No	278		Preliminares y Excavaciones	sáb 16/09/23	mié 20/12/23	80 días
279	No	279		Capas Granulares	lun 9/10/23	mié 20/12/23	60 días
280	No	280		Carpeta Asfáltica	sáb 21/10/23	mié 20/12/23	50 días
281	**Sí**	**281**		**Red Pluvial**	**vie 22/09/23**	**sáb 16/12/23**	**72 días**
282	No	282		Excavaciones y entibados	vie 22/09/23	jue 14/12/23	70 días
283	No	283		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	vie 29/09/23	sáb 16/12/23	65 días
284	No	284		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	sáb 7/10/23	mié 13/12/23	55 días
285	No	285		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	vie 29/09/23	lun 11/12/23	60 días
286	**Sí**	**286**		**Construcción vía Calle 11 hasta Puente metálico (K1+385 al K1+525) incluye aproche del puente**	**jue 22/06/23**	**lun 30/10/23**	**110 días**
287	No	287		Inicio Etapa 1E	jue 22/06/23	jue 22/06/23	0 días
288	**Sí**	**288**		**Construcción vía**	**jue 22/06/23**	**lun 30/10/23**	**110 días**
289	No	289		Preliminares y Excavaciones	jue 22/06/23	mar 26/09/23	80 días
290	No	290		Capas Granulares	jue 14/09/23	jue 19/10/23	30 días
291	No	291		Carpeta Asfáltica	lun 2/10/23	lun 30/10/23	25 días
292	**Sí**	**292**		**Red Pluvial**	**lun 17/07/23**	**mié 25/10/23**	**85 días**
293	No	293		Excavaciones y entibados	lun 17/07/23	sáb 2/09/23	40 días
294	No	294		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	jue 3/08/23	sáb 30/09/23	50 días
295	No	295		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	mar 29/08/23	mié 25/10/23	50 días
296	No	296		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	mié 26/07/23	jue 21/09/23	50 días
297	**Sí**	**297**		**Estructuras - Construcción Puente metálico (Río Soacha - Carrera 9a)**	**lun 17/07/23**	**sáb 4/01/25**	**452 días**
298	No	298		INICIO	lun 17/07/23	lun 17/07/23	0 días
299	No	299		EMPATE DE TUBERIA	lun 31/07/23	mar 1/08/23	1 día
300	No	300		CONSTRUCCION PLAFON - DEMOLICION - ARMADO Y FIGURADO - REALCE Y FUNDIDA DE CAMARA	lun 17/07/23	vie 8/09/23	45 días
301	No	301		CONSTRUCCION PILOTE # 3 - COSTADO NORTE	mié 9/08/23	jue 10/08/23	1 día
302	No	302		CONSTRUCCION PILOTE # 4 - COSTADO NORTE	vie 11/08/23	sáb 12/08/23	1 día
303	No	303		CONSTRUCCION PILOTE # 7 - COSTADO SUR	sáb 19/08/23	mar 22/08/23	1 día
304	No	304		CONSTRUCCION PILOTE # 5 - COSTADO SUR	mié 23/08/23	jue 24/08/23	1 día
305	No	305		CONSTRUCCION PILOTE # 6 - COSTADO SUR	jue 24/08/23	jue 24/08/23	1 día
306	No	306		DESCABECE DE PILOTES	vie 25/08/23	jue 7/09/23	12 días
307	No	307		PRUEBAS PIT	vie 25/08/23	lun 28/08/23	1 día
308	No	308		ARMADO ACERO Y FUNDIDA DE ESTRIBO COSTADO NORTE	lun 28/08/23	mié 30/08/23	3 días
309	No	309		ARMADO ACERO DE PILOTES DE 60CM	mié 4/10/23	lun 9/10/23	4 días
310	No	310		PILOTE 1 DE 60CM	vie 6/10/23	sáb 7/10/23	1 día
311	No	311		PILOTE 2 DE 60CM	sáb 7/10/23	lun 9/10/23	1 día
312	No	312		DESCABECE DE PILOTES	jue 12/10/23	vie 13/10/23	1 día
313	No	313		ARMADO ACERO Y FUNDIDA DE ESTRIBO COSTADO SUR	vie 13/10/23	jue 19/10/23	4 días
314	No	314		LLEGADA DE SUPER ESTRUCTURA	lun 30/10/23	lun 30/10/23	1 día
315	No	315		MONTAJE DE SUPER ESTRUCTURA	mar 31/10/23	mar 31/10/23	1 día
316	No	316		ARMADO Y FUNDIDA DE TABLERO DE PUENTE	mié 1/11/23	mar 7/11/23	4 días
317	No	317		ARMADO Y FUNDIDA DE PLACAS DE APROXIMACIÓN NORTE	lun 4/09/23	lun 11/09/23	7 días
318	No	318		ARMADO Y FUNDIDA DE PLACAS DE APROXIMACIÓN SUR	lun 23/12/24	mar 31/12/24	7 días
319	No	319		ESPALDAR DEL PUENTE	mar 7/11/23	vie 10/11/23	3 días
320	**Sí**	**320**		**CONSTRUCCIÓN ZONA 1 VÍA DE DESVIO**	**mié 16/08/23**	**mié 22/11/23**	**83 días**
321	No	321		Excavación y Mejoramiento	mié 16/08/23	vie 25/08/23	8 días
322	No	322		Granulares (subbase y base)	jue 31/08/23	mar 12/09/23	10 días

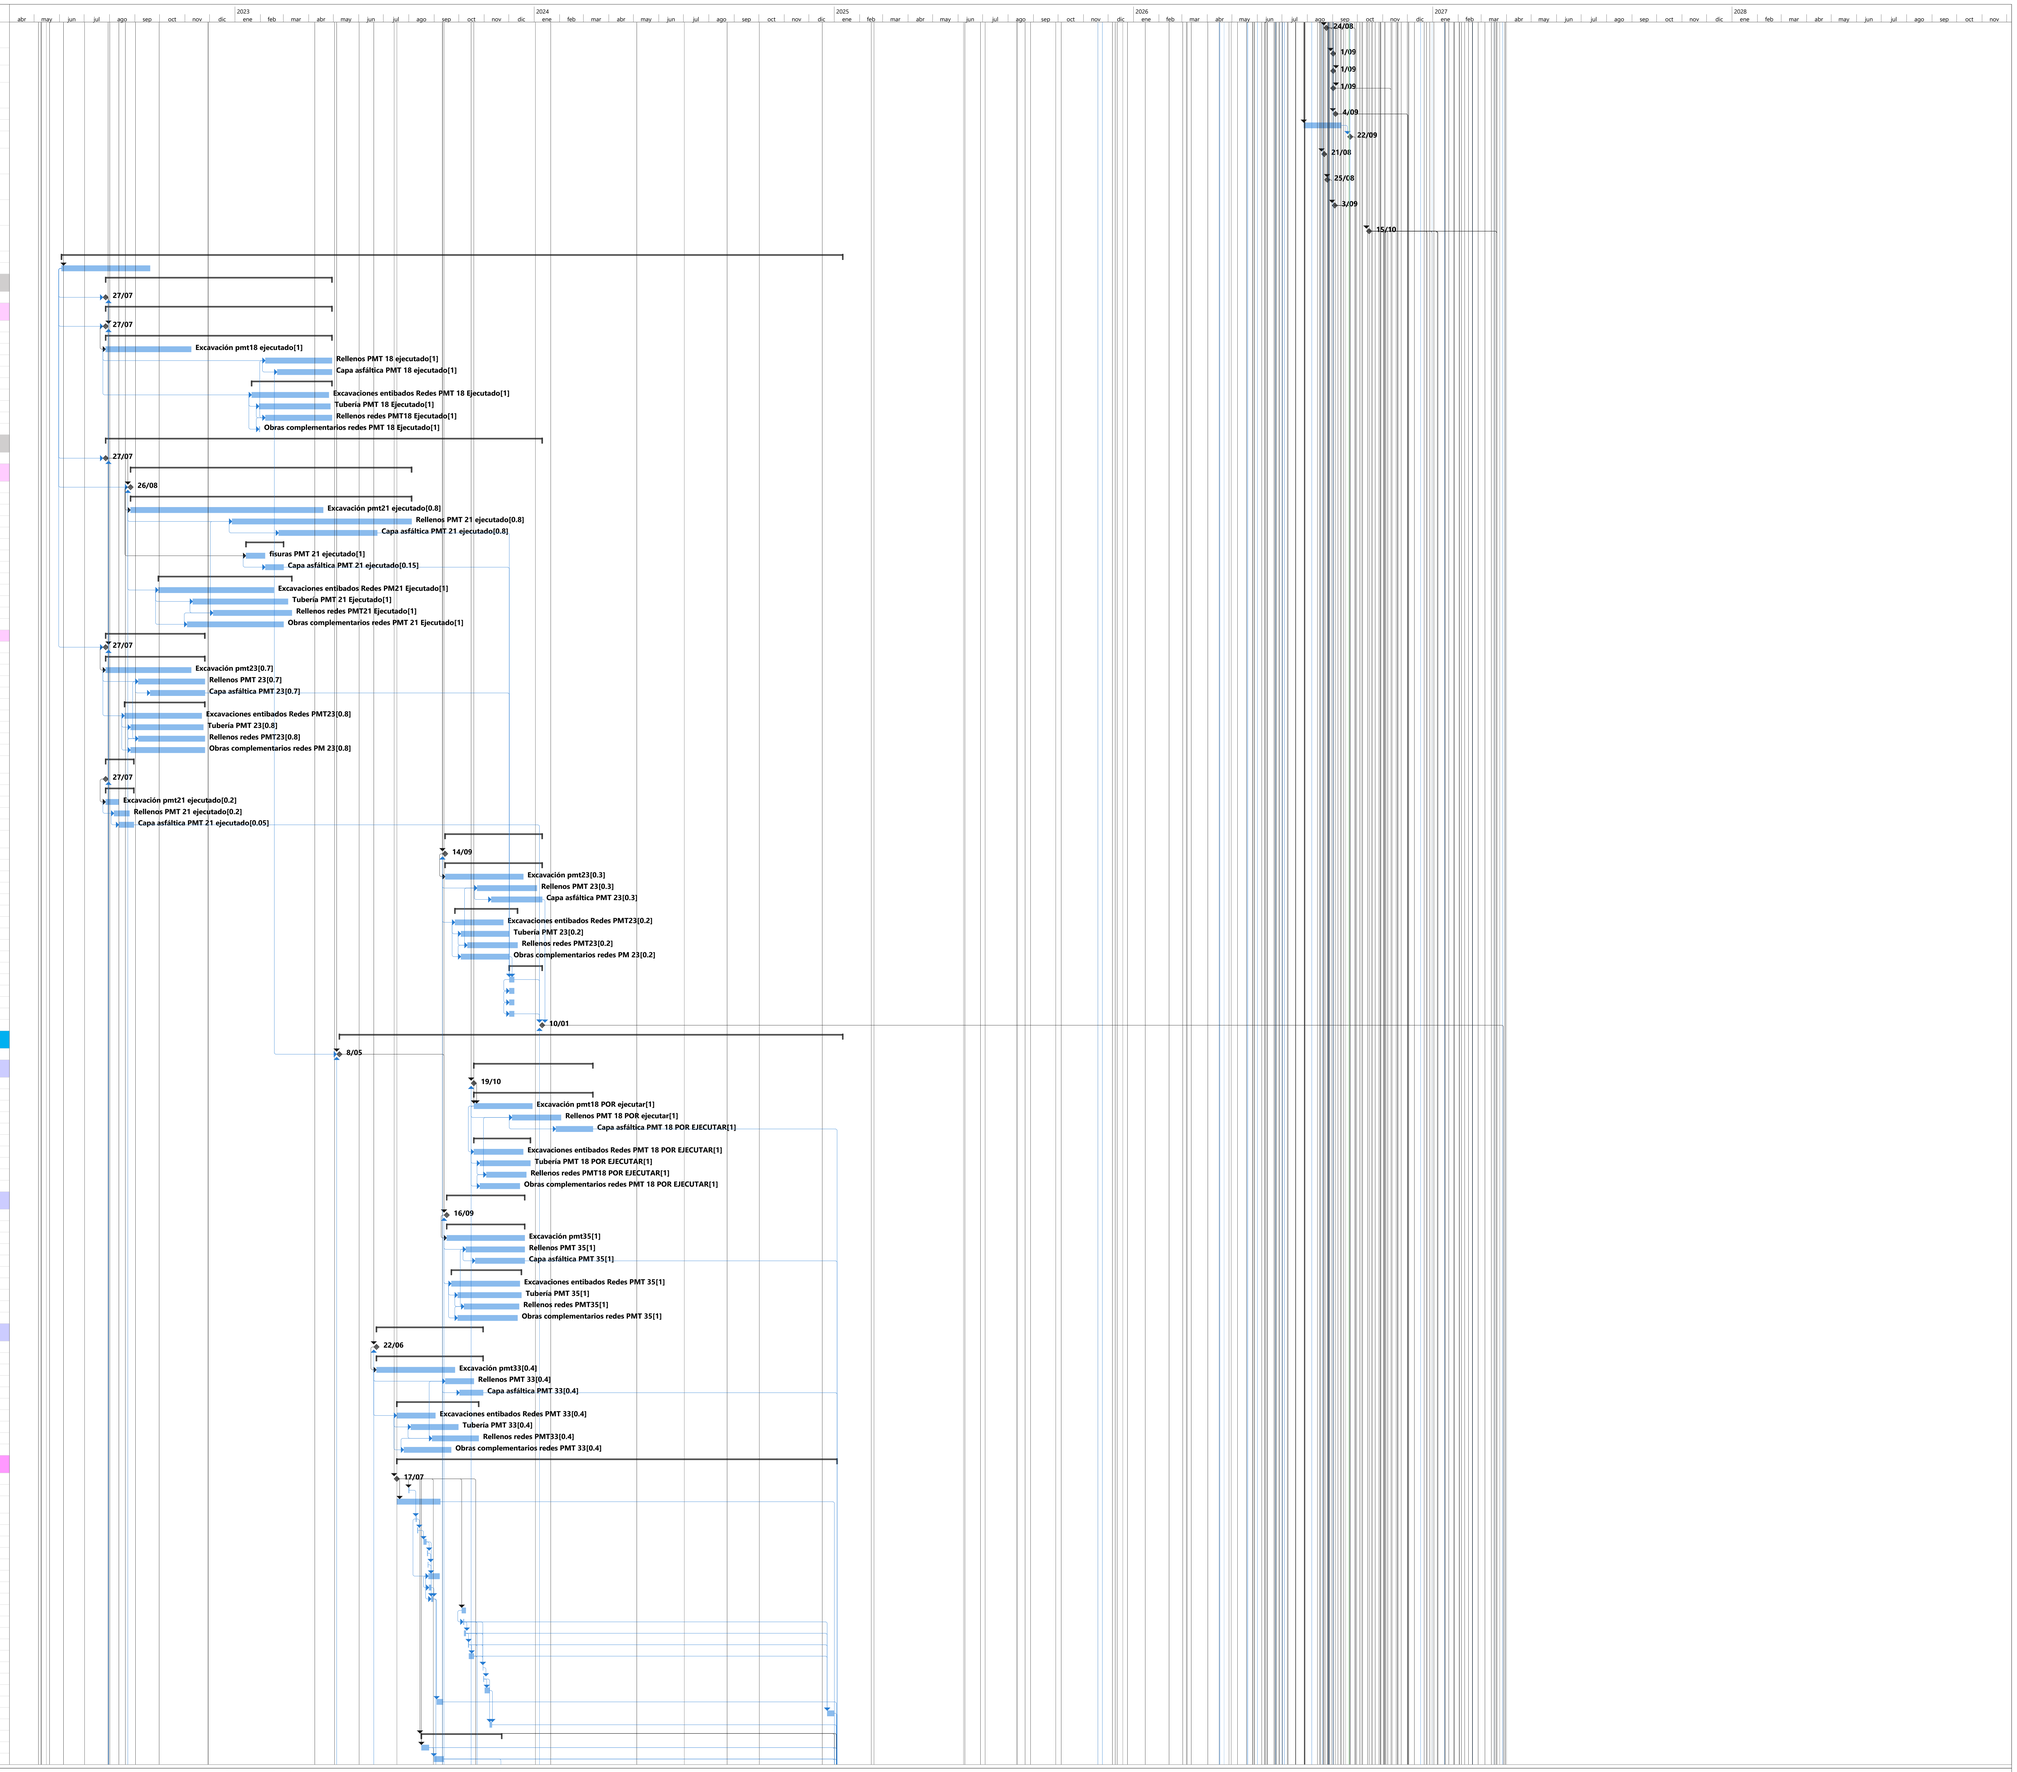

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
323	No	323		MDC 19	mar 21/11/23	mié 22/11/23	1 día
324	**Sí**	**324**		**CONSTRUCCIÓN ZONA 2 VÍA DE DESVIO**	**vie 1/09/23**	**mié 22/11/23**	**69 días**
325	No	325		Excavación y Mejoramiento	vie 1/09/23	lun 11/09/23	8 días
326	No	326		Granulares (subbase y base)	sáb 16/09/23	mié 27/09/23	10 días
327	No	327		MDC 19	mar 21/11/23	mié 22/11/23	1 día
328	**Sí**	**328**		**CONSTRUCCIÓN ZONA 3 VÍA DE DESVIO**	**lun 23/10/23**	**mar 21/11/23**	**24 días**
329	No	329		Excavación y Mejoramiento	lun 23/10/23	mar 31/10/23	8 días
330	No	330		Granulares (subbase y base)	mar 7/11/23	lun 20/11/23	10 días
331	No	331		MDC 19	lun 20/11/23	mar 21/11/23	1 día
332	No	332		DEMARCACION Y SEÑALIZACION	vie 3/01/25	sáb 4/01/25	1 día
333	No	333		FIN	sáb 4/01/25	sáb 4/01/25	0 días
334	**Sí**	**334**		**Señalización etapa 1**	**sáb 4/01/25**	**sáb 11/01/25**	**5 días**
335	No	335		Señalización horizontal	sáb 4/01/25	sáb 11/01/25	5 días
336	No	336		Señalización vertical	sáb 4/01/25	sáb 11/01/25	5 días
337	No	337		Semaforización	sáb 4/01/25	sáb 11/01/25	5 días
338	No	338		Obras complementarias	sáb 4/01/25	sáb 11/01/25	5 días
339	**No**	**339**		**Fin Etapa 1 - pendientes**	**sáb 11/01/25**	**sáb 11/01/25**	**0 días**
340	**Sí**	**340**	**VD**	**Construcción vial de la carrera 9 PMT 32**	**jue 14/09/23**	**jue 18/01/24**	**105 días**
341	No	341		Inicio Etapa 4	jue 14/09/23	jue 14/09/23	0 días
342	**Sí**	**342**		**Construcción vía**	**jue 14/09/23**	**vie 12/01/24**	**100 días**
343	No	343		Preliminares y Excavaciones	jue 14/09/23	lun 30/10/23	40 días
344	No	344		Capas Granulares	mar 31/10/23	lun 18/12/23	40 días
345	No	345		Carpeta Asfáltica	lun 18/12/23	vie 12/01/24	20 días
346	**Sí**	**346**		**Red Pluvial**	**jue 14/09/23**	**jue 18/01/24**	**105 días**
347	No	347		Excavaciones y entibados	jue 14/09/23	mié 20/09/23	5 días
348	No	348		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	lun 2/10/23	vie 6/10/23	5 días
349	No	349		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	lun 9/10/23	sáb 14/10/23	5 días
350	No	350		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	sáb 30/12/23	jue 18/01/24	15 días
351	**Sí**	**351**	**VD**	**Construcción vial de la calle 7 PMT 34**	**mié 24/01/24**	**vie 23/05/25**	**410 días**
352	No	352		Inicio Etapa 4	mié 24/01/24	mié 24/01/24	0 días
353	**Sí**	**353**		**Construcción vía**	**mar 18/02/25**	**vie 23/05/25**	**90 días**
354	No	354		SOLUCIÓN DE INTERFERENCIA CON CON RED DE POLIETILENO DE VANTI 2", TUBERIA DE 4 " DE ACUEDUCTO E	mar 18/02/25	mar 18/02/25	0 días
355	No	355		Preliminares y Excavaciones	mar 18/02/25	mar 25/03/25	30 días
356	No	356		Capas Granulares	mar 25/03/25	mié 30/04/25	30 días
357	No	357		Carpeta Asfáltica	mié 30/04/25	vie 23/05/25	20 días
358	**Sí**	**358**		**Red Pluvial**	**mar 18/02/25**	**mar 6/05/25**	**65 días**
359	No	359		Excavaciones y entibados	mar 18/02/25	jue 10/04/25	45 días
360	No	360		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	vie 28/02/25	mié 12/03/25	10 días
361	No	361		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	sáb 8/03/25	sáb 12/04/25	30 días
362	No	362		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	mié 30/04/25	mar 6/05/25	5 días
363	**Sí**	**363**		**CONSTRUCCIÓN VÍA DE DESVÍO (TRAMO ENTRE PUENTE HUMEDAL A CALLE 13 SUR)**	**jue 29/10/26**	**jue 31/12/26**	**52 días**
364	**Sí**	**364**		**PRELIMINARES**	**jue 29/10/26**	**lun 9/11/26**	**8 días**
365	No	365		Ajuste de diseño vial de tramo vía de desvío	jue 29/10/26	lun 9/11/26	8 días
366	No	366		Ajuste de diseños de redes para vía de desvío	jue 29/10/26	lun 9/11/26	8 días
367	**Sí**	**367**		**REVISIÓN Y NO OBJECIÓN**	**lun 9/11/26**	**mar 24/11/26**	**12 días**
368	No	368		No objeción por parte de interventoría de ajustes a diseños de componente vial	lun 9/11/26	mar 24/11/26	12 días
369	No	369		No objeción por parte de interventoría a los ajustes de diseños de componente de redes	lun 9/11/26	mar 24/11/26	12 días
370	**Sí**	**370**	**VD**	**CONTRUCCIÓN**	**mar 24/11/26**	**jue 31/12/26**	**32 días**
371	**Sí**	**371**		**Red Pluvial**	**mar 24/11/26**	**jue 31/12/26**	**32 días**
372	No	372		Excavaciones y entibados	mar 24/11/26	lun 7/12/26	12 días
373	No	373		Instalación de tuberías alcantarillado pluvial	mié 25/11/26	mié 9/12/26	12 días
374	No	374		Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	jue 26/11/26	jue 17/12/26	18 días
375	No	375		Estructuras complementarias (Pozos, sumideros)	jue 17/12/26	jue 31/12/26	12 días
376	**Sí**	**376**		**Construcción vía**	**mar 24/11/26**	**lun 28/12/26**	**28 días**
377	No	377		Preliminares y Excavaciones	mar 24/11/26	mar 22/12/26	24 días
378	No	378		Capas Granulares	jue 26/11/26	jue 24/12/26	24 días
379	No	379		Carpeta Asfáltica	vie 27/11/26	lun 28/12/26	24 días
380	No	380	VD	VALOR A FAVOR DEL CONTRATO	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
381	**Sí**	**381**	**VD**	**AMIGABLE COMPONEDOR**	**lun 16/05/22**	**mié 3/02/27**	**1449 días**
382	**Sí**	**382**		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**lun 16/05/22**	**mar 17/05/22**	**1 día**
383	No	383		TRAMITE DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES LA AUTORIDAD	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
384	No	384		TALA DE ARBOLES CATEGORIA PGIRS I	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
385	No	385		TALA DE ARBOLES CATEGORIA PGIRS II	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
386	No	386		ESTABLECIMIENTO A	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
387	No	387		CERRAMIENTO	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
388	No	388		MANTENIMIENTO	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
389	No	389		INFORMES/DOCUMENTOS Implementación, seguimiento y entrega de plantación registrada	lun 16/05/22	mar 17/05/22	1 día
390	**Sí**	**390**		**COMPONENTE ARQUEOLOGÍA**	**vie 1/07/22**	**mié 3/02/27**	**1410 días**
391	**Sí**	**391**		**CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL**	**vie 1/07/22**	**mié 3/02/27**	**1410 días**
392	No	392		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR JULIO 2022	vie 1/07/22	lun 1/08/22	24 días
393	No	393		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR AGOSTO 2022	lun 1/08/22	mar 30/08/22	25 días
394	No	394		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR SEPTIEMBRE 2022	jue 1/09/22	vie 30/09/22	26 días
395	No	395		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR OCTUBRE 2022	vie 30/09/22	lun 31/10/22	26 días
396	No	396		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR MAYO 2023	mar 2/05/23	mié 31/05/23	25 días
397	No	397		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR JUNIO 2023	jue 1/06/23	vie 30/06/23	24 días
398	No	398		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR ENERO 2024	mar 2/01/24	mié 31/01/24	25 días
399	No	399		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR JULIO 2024	mar 2/07/24	mar 30/07/24	25 días
400	No	400		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL SUR OCTUBRE 2024	mar 1/10/24	jue 31/10/24	26 días
401	No	401		CONSERVACIÓN, REENTERRAMIENTO DE RIELES Y MATERIAL ASOCIADO CON LA ANTIGUA LÍNEA FERREA DEL	lun 4/01/27	mié 3/02/27	26 días
402	No	402		IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN EL ÁREA DEL DESVÍO RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO ESTABLECIDOS EN 2023	vie 12/08/22	mar 24/12/24	730 días
403	**Sí**	**403**		**VIA DE DESVÍO**	**lun 16/05/22**	**vie 30/09/22**	**117 días**
404	No	404		DETECCIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN CON EQUIPOS GPR (RADARES DE PENETRACIÓN TERRESTRE) Y DE DETECCIÓN EM DE TUBERÍAS DE TUBERIAS ENTERRADAS BAJO	jue 1/09/22	vie 30/09/22	26 días
405	No	405		ESTUDIOS Y DISEÑOS VÍA DE DESVÍO	lun 16/05/22	mar 31/05/22	13 días
406	**Sí**	**406**		**CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES POR SECTOR**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1496 días**
407	No	407	FOND-C	Fondo de compensación	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
408	No	408	RED-DIS	Inclusión ajuste componente de redes otrosí 13	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
409	No	409	EP-DISP	Estimado Espacio Público	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
410	**Sí**	**410**		**SECTORES BOGOTÁ - GIRARDOT (OCCIDENTAL)**	**lun 16/05/22**	**mar 23/03/27**	**1491 días**
411	No	411		Inicio Sectores Bogotá - Girardot (Occidental)	lun 16/05/22	lun 16/05/22	0 días
412	**Sí**	**412**		**Sector 1 CALLE 22 a CALLE 14 (K0+240 - K0+840)**	**mar 2/08/22**	**vie 12/06/26**	**1189 días**
413	No	413		Entrega de Predios por parte de la EFR	mar 2/08/22	mar 2/08/22	0 días
414	No	414		Inicio Sector 1	mar 2/08/22	mar 2/08/22	0 días
415	**Sí**	**415**		**PRELIMINARES**	**mar 2/08/22**	**mar 17/01/23**	**143 días**
416	No	416	DEMOL	Demolición de Cimentaciones	mar 2/08/22	mar 17/01/23	143 días
417	**Sí**	**417**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**sáb 16/12/23**	**mar 26/05/26**	**750 días**
418	No	418		Inicio Instalación y traslado de redes	sáb 16/12/23	sáb 16/12/23	0 días
419	**Sí**	**419**		**REDES SECAS**	**mar 16/12/25**	**mar 26/05/26**	**135 días**
420	No	420	RS-S1	Inicio Redes Secas	mar 16/12/25	mar 16/12/25	0 días
421	No	421	RSEN-S	Red ENEL	sáb 3/01/26	mar 26/05/26	120 días
422	No	422	RSET-S'	Red ETB	sáb 3/01/26	mar 26/05/26	120 días
423	No	423	RSGA-S	Red Gas (acero)	mar 26/05/26	mar 26/05/26	0 días
424	No	424	RSGP-S	Red Gas (Polietileno)	mar 26/05/26	mar 26/05/26	0 días
425	No	425	RSM-S1	Red de Movistar	lun 29/12/25	mié 20/05/26	120 días
426	No	426	RS-S1	Fin Redes Secas	mar 26/05/26	mar 26/05/26	0 días
427	**Sí**	**427**		**REDES HUMEDAS**	**vie 14/06/24**	**mié 13/05/26**	**590 días**
428	No	428	RH-S1	Inicio Redes Húmedas	vie 14/06/24	vie 14/06/24	0 días
429	No	429	RHA-S1	Red Acueducto	vie 16/01/26	mié 13/05/26	100 días
430	No	430	RHP-S1	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 30/08/24	mar 24/12/24	100 días
431	No	431	RH-S1	Fin de Redes Húmedas	mié 13/05/26	mié 13/05/26	0 días
432	No	432	RH-S1	Fin Instalación y traslado de redes	mar 26/05/26	mar 26/05/26	0 días
433	**Sí**	**433**		**CORREDORES - S1**	**lun 26/08/24**	**mié 21/01/26**	**433 días**
434	No	434		Inicio de Corredores	sáb 26/10/24	sáb 26/10/24	0 días
435	**Sí**	**435**		**CORREDOR (k0+240 - k0+360)**	**lun 26/08/24**	**mié 30/04/25**	**211 días**
436	**Sí**	**436**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (k0+240 - k0+**	**sáb 26/10/24**	**mié 30/04/25**	**157 días**
437	No	437		Inicio de Calzada	sáb 26/10/24	sáb 26/10/24	0 días
438	Sí	438	UE7	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 1/11/24	vie 31/01/25	76 días
439	No	439		Excavación	vie 1/11/24	mar 24/12/24	45 días
440	No	440		Mejoramiento con Rajón	mié 27/11/24	jue 2/01/25	30 días
441	No	441		Subbase Granular SBG-A	jue 26/12/24	vie 31/01/25	30 días
442	No	442	UE8	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 6/02/25	mié 12/03/25	30 días
443	No	443	UE9	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 13/03/25	mié 30/04/25	40 días
444	No	444		Fin de Calzada	mié 30/04/25	mié 30/04/25	0 días
445	**Sí**	**445**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (k0+240 - k0+360)**	**lun 26/08/24**	**mié 12/02/25**	**145 días**
446	No	446		APROBACIÓN PMT 48	lun 26/08/24	lun 26/08/24	0 días
447	No	447		Inicio de Calzada	mar 22/10/24	mar 22/10/24	0 días

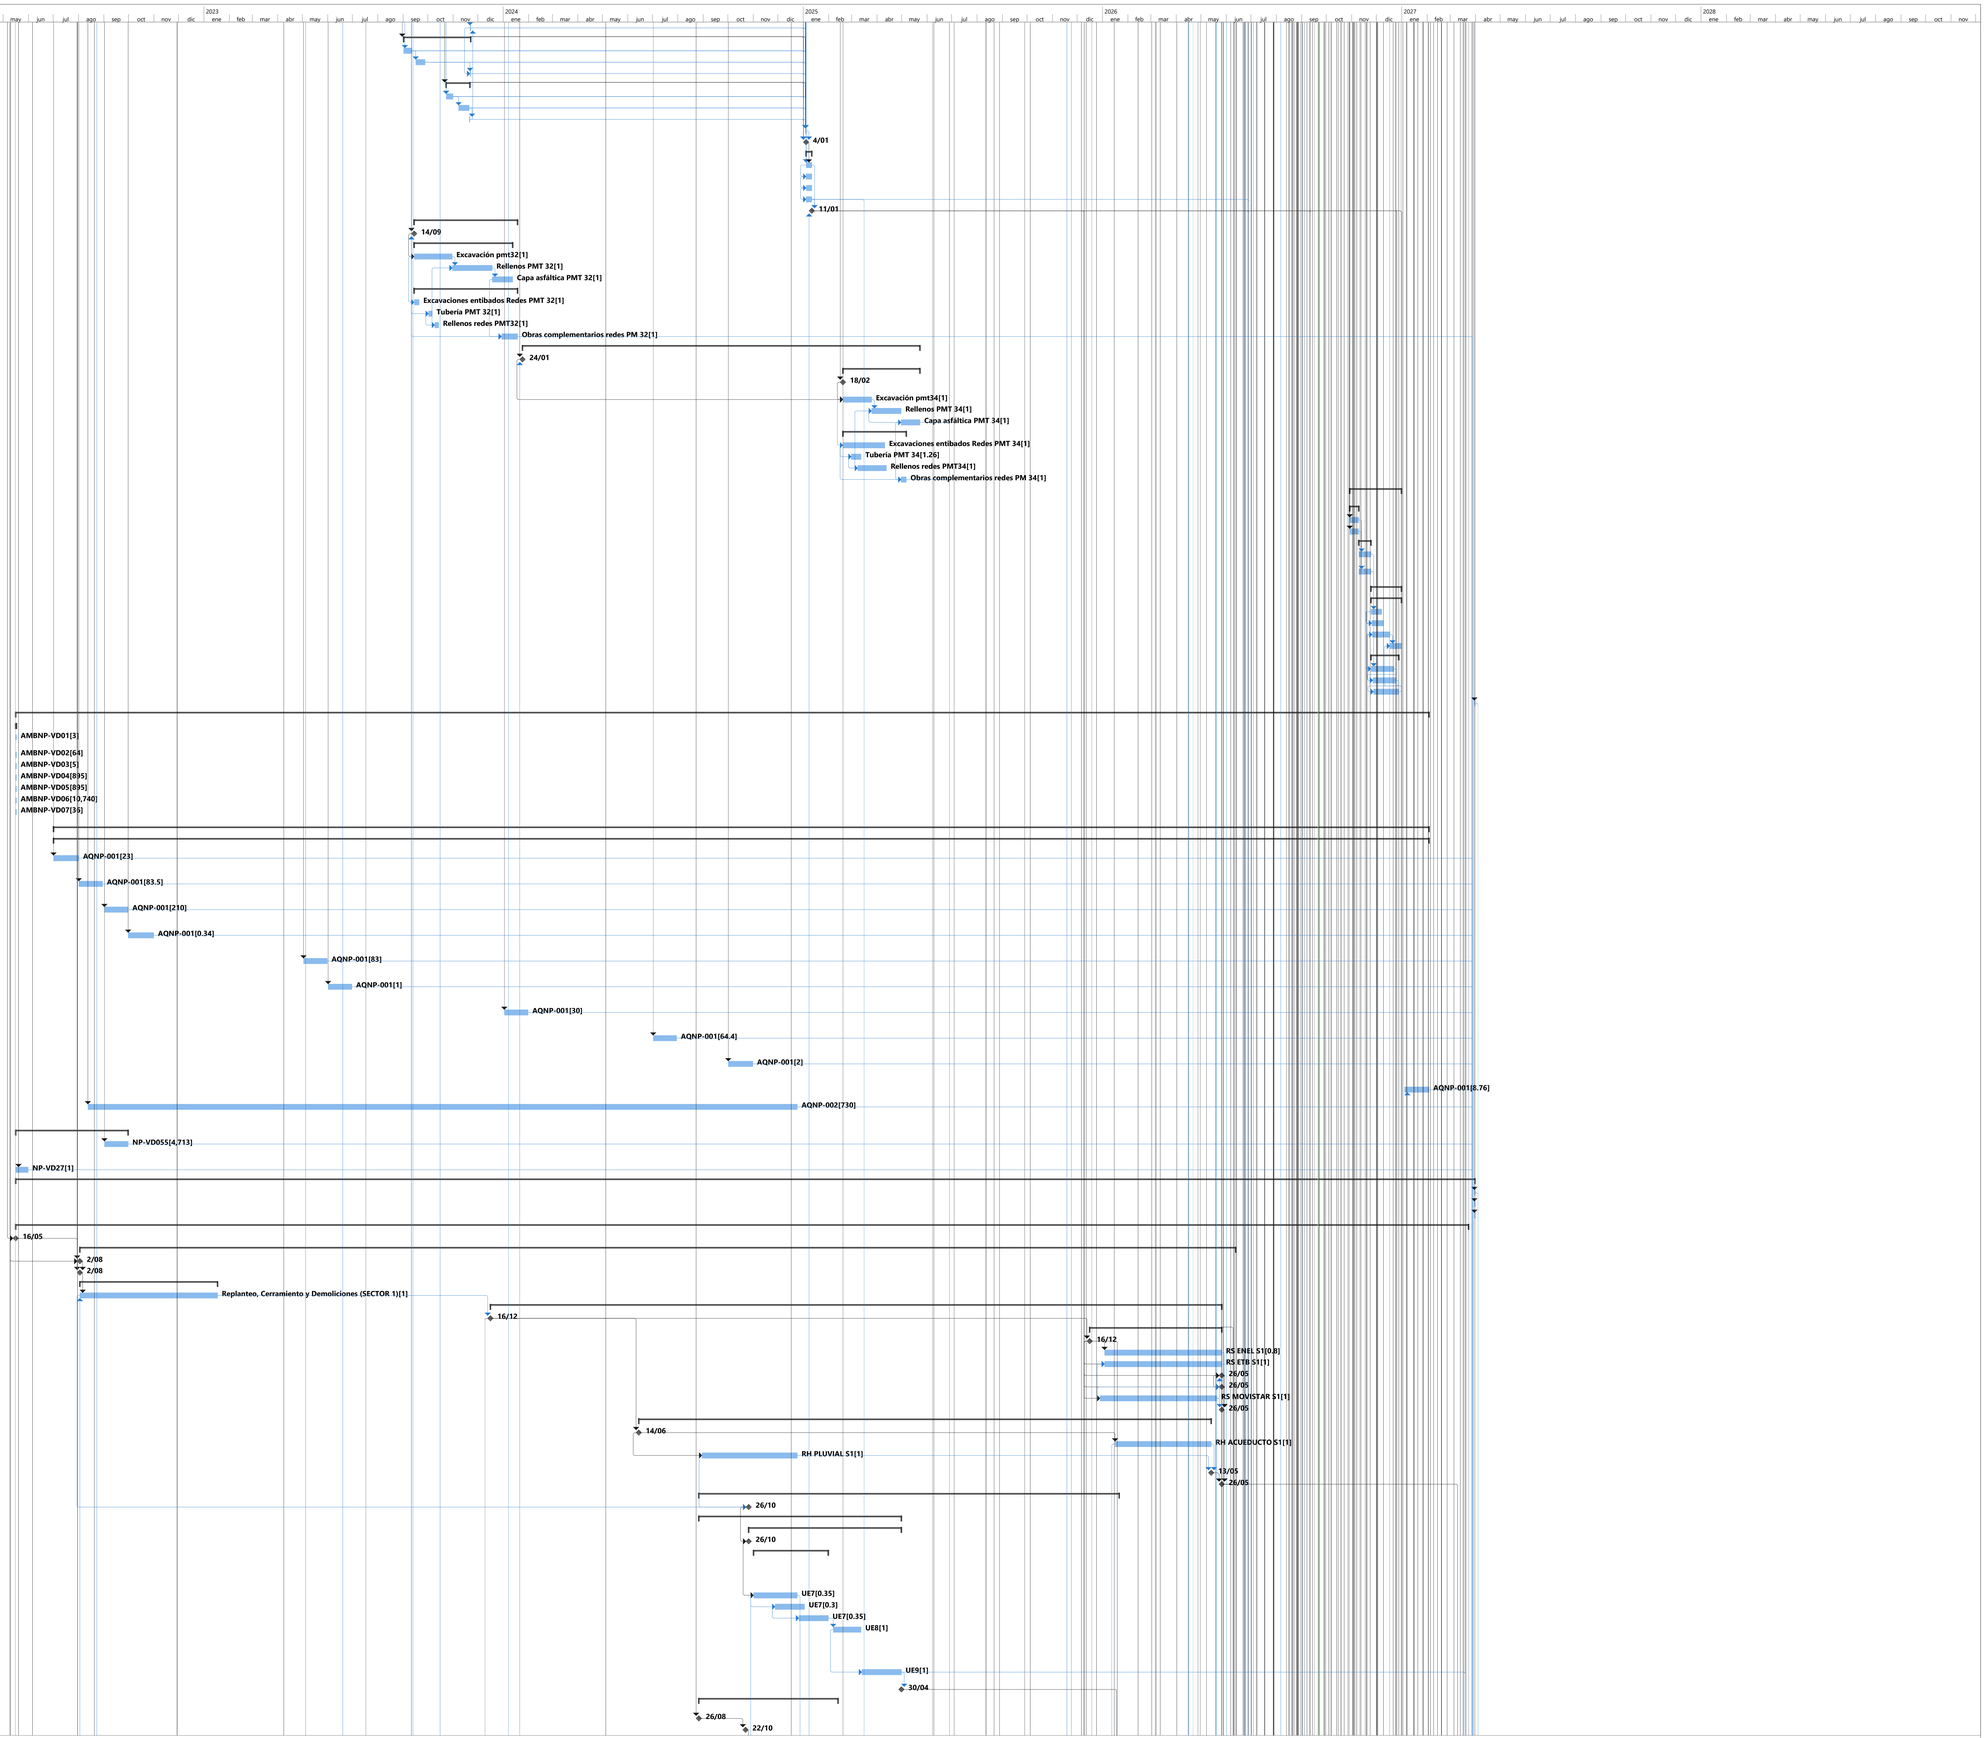


Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
448	Sí	448	UE187A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 22/10/24	vie 13/12/24	45 días
449	No	449		Fresado	mar 22/10/24	vie 25/10/24	3 días
450	No	450		Mejoramiento con Rajón	sáb 26/10/24	mié 20/11/24	20 días
451	No	451		Subbase Granular SBG-A	jue 21/11/24	vie 13/12/24	20 días
452	No	452	UE188A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 14/12/24	jue 9/01/25	20 días
453	No	453	UE189A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 26/12/24	mié 12/02/25	40 días
454	No	454		Fin de Calzada	mié 12/02/25	mié 12/02/25	0 días
455	**Sí**	**455**		**CORREDOR (k0+360 - k0+480)**	**mié 18/12/24**	**mar 9/12/25**	**299 días**
456	**Sí**	**456**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (k0+360 - k0+**	**mié 18/12/24**	**lun 12/05/25**	**121 días**
457	No	457		Inicio de Calzada	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días
458	Sí	458	UE10	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 19/12/24	jue 27/02/25	60 días
459	No	459		Excavación	jue 19/12/24	mar 11/02/25	45 días
460	No	460		Mejoramiento con Rajón	mar 31/12/24	mié 5/02/25	30 días
461	No	461		Subbase Granular SBG-A	vie 24/01/25	jue 27/02/25	30 días
462	No	462	UE11	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 27/02/25	vie 21/03/25	20 días
463	No	463	UE12	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 25/03/25	lun 12/05/25	40 días
464	No	464		Fin de Calzada	lun 12/05/25	lun 12/05/25	0 días
465	**Sí**	**465**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (k0+360 - k0+480)**	**vie 5/09/25**	**mar 9/12/25**	**79 días**
466	No	466		Inicio de Calzada	vie 5/09/25	vie 5/09/25	0 días
467	Sí	467	UE190A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 6/09/25	mié 15/10/25	34 días
468	No	468		fresado	sáb 6/09/25	mié 10/09/25	3 días
469	No	469		Mejoramiento con Rajón	jue 11/09/25	vie 3/10/25	20 días
470	No	470		Subbase Granular SBG-A	lun 22/09/25	mié 15/10/25	20 días
471	No	471	UE191A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 15/10/25	vie 7/11/25	20 días
472	No	472	UE192A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 21/10/25	mar 9/12/25	40 días
473	No	473		Fin de Calzada	mar 9/12/25	mar 9/12/25	0 días
474	**Sí**	**474**		**CORREDOR (k0+480 - k0+600)**	**vie 24/01/25**	**sáb 27/12/25**	**285 días**
475	**Sí**	**475**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (k0+480 - k0+**	**vie 24/01/25**	**mié 9/07/25**	**140 días**
476	No	476		Inicio de Calzada	vie 24/01/25	vie 24/01/25	0 días
477	Sí	477	UE13	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 24/01/25	mar 29/04/25	80 días
478	No	478		Excavación	vie 24/01/25	vie 21/03/25	50 días
479	No	479		Mejoramiento con Rajón	lun 17/02/25	mar 15/04/25	50 días
480	No	480		Subbase Granular SBG-A	mié 5/03/25	mar 29/04/25	45 días
481	No	481	UE14	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 29/04/25	jue 22/05/25	20 días
482	No	482	UE15	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 22/05/25	mié 9/07/25	40 días
483	No	483		Fin de Calzada	mié 9/07/25	mié 9/07/25	0 días
484	**Sí**	**484**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (k0+480 - k0+600)**	**mié 17/09/25**	**sáb 27/12/25**	**85 días**
485	No	485		Inicio de Calzada	mié 17/09/25	mié 17/09/25	0 días
486	Sí	486	UE193A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 17/09/25	lun 10/11/25	45 días
487	No	487		fresado	mié 17/09/25	sáb 20/09/25	3 días
488	No	488		Mejoramiento con Rajón	lun 22/09/25	mié 15/10/25	20 días
489	No	489		Subbase Granular SBG-A	jue 16/10/25	lun 10/11/25	20 días
490	No	490	UE194A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 28/10/25	vie 21/11/25	20 días
491	No	491	UE195A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 10/11/25	sáb 27/12/25	40 días
492	No	492		Fin de Calzada	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	0 días
493	**Sí**	**493**		**CORREDOR (k0+600 - k0+720)**	**mar 11/02/25**	**mié 21/01/26**	**289 días**
494	**Sí**	**494**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (k0+600 - k0+**	**mar 11/02/25**	**lun 29/09/25**	**195 días**
495	No	495		Inicio de Calzada	mar 11/02/25	mar 11/02/25	0 días
496	Sí	496	UE16	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 11/02/25	mar 26/08/25	165 días
497	No	497		Excavación	mar 11/02/25	mié 9/04/25	50 días
498	No	498		Mejoramiento con Rajón	vie 21/03/25	vie 4/07/25	85 días
499	No	499		Subbase Granular SBG-A	jue 22/05/25	mar 26/08/25	80 días
500	No	500	UE17	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 21/07/25	mar 26/08/25	30 días
501	No	501	UE18	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 13/08/25	lun 29/09/25	40 días
502	No	502		Fin de Calzada	lun 29/09/25	lun 29/09/25	0 días
503	**Sí**	**503**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (k0+600 - k0+720)**	**jue 9/10/25**	**mié 21/01/26**	**84 días**
504	No	504		Inicio de Calzada	jue 9/10/25	jue 9/10/25	0 días
505	Sí	505	UE196A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 9/10/25	jue 13/11/25	29 días
506	No	506		fresado	jue 9/10/25	mar 14/10/25	3 días
507	No	507		Mejoramiento con Rajón	mié 15/10/25	vie 7/11/25	20 días
508	No	508		Subbase Granular SBG-A	mar 21/10/25	jue 13/11/25	20 días
509	No	509	UE197A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 13/11/25	mar 9/12/25	20 días
510	No	510	UE198A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 2/12/25	mié 21/01/26	40 días
511	No	511		Fin de Calzada	mié 21/01/26	mié 21/01/26	0 días
512	**Sí**	**512**		**CORREDOR (k0+720 - k0+840)**	**mié 9/04/25**	**mar 20/01/26**	**238 días**
513	**Sí**	**513**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (k0+720 - k0+**	**mié 9/04/25**	**mié 13/08/25**	**105 días**
514	No	514		Inicio de Calzada	mié 9/04/25	mié 9/04/25	0 días
515	Sí	515	UE19	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 9/04/25	lun 9/06/25	50 días
516	No	516		Excavación	mié 9/04/25	vie 16/05/25	30 días
517	No	517		Mejoramiento con Rajón	mar 6/05/25	mié 28/05/25	20 días
518	No	518		Subbase Granular SBG-A	vie 16/05/25	lun 9/06/25	20 días
519	No	519	UE20	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 10/06/25	mar 15/07/25	30 días
520	No	520	UE21	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 27/06/25	mié 13/08/25	40 días
521	No	521		Fin de Calzada	mié 13/08/25	mié 13/08/25	0 días
522	**Sí**	**522**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (k0+720 - k0+840)**	**mar 4/11/25**	**mar 20/01/26**	**63 días**
523	No	523		Inicio de Calzada	mar 4/11/25	mar 4/11/25	0 días
524	Sí	524	UE199A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 4/11/25	sáb 29/11/25	22 días
525	No	525		fresado	mar 4/11/25	vie 7/11/25	3 días
526	No	526		Mejoramiento con Rajón	mié 5/11/25	vie 28/11/25	20 días
527	No	527		Subbase Granular SBG-A	jue 6/11/25	sáb 29/11/25	20 días
528	No	528	UE200A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 7/11/25	lun 1/12/25	20 días
529	No	529	UE201A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 1/12/25	mar 20/01/26	40 días
530	No	530		Fin de Calzada	mar 20/01/26	mar 20/01/26	0 días
531	No	531		Fin de Corredores	mié 21/01/26	mié 21/01/26	0 días
532	**Sí**	**532**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**jue 22/01/26**	**vie 12/06/26**	**120 días**
533	No	533		Inicio Espacio Publico	jue 22/01/26	jue 22/01/26	0 días
534	**Sí**	**534**		**Espacio Publico CALLE 22 - CALLE 18**	**lun 2/02/26**	**jue 7/05/26**	**80 días**
535	No	535	UE279	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 2/02/26	jue 7/05/26	80 días
536	No	536	UE280	TERMINACIÓN Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 13/02/26	jue 7/05/26	70 días
537	**Sí**	**537**		**Espacio Publico CALLE 18 - CALLE 16**	**vie 13/02/26**	**mié 20/05/26**	**80 días**
538	No	538	UE281	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	vie 13/02/26	mié 20/05/26	80 días
539	No	539	UE282	TERMINACIÓN Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mié 25/02/26	mié 20/05/26	70 días
540	**Sí**	**540**		**Espacio Publico CALLE 16 - CALLE 15**	**mié 25/02/26**	**lun 1/06/26**	**80 días**
541	No	541	UE283	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 25/02/26	lun 1/06/26	80 días

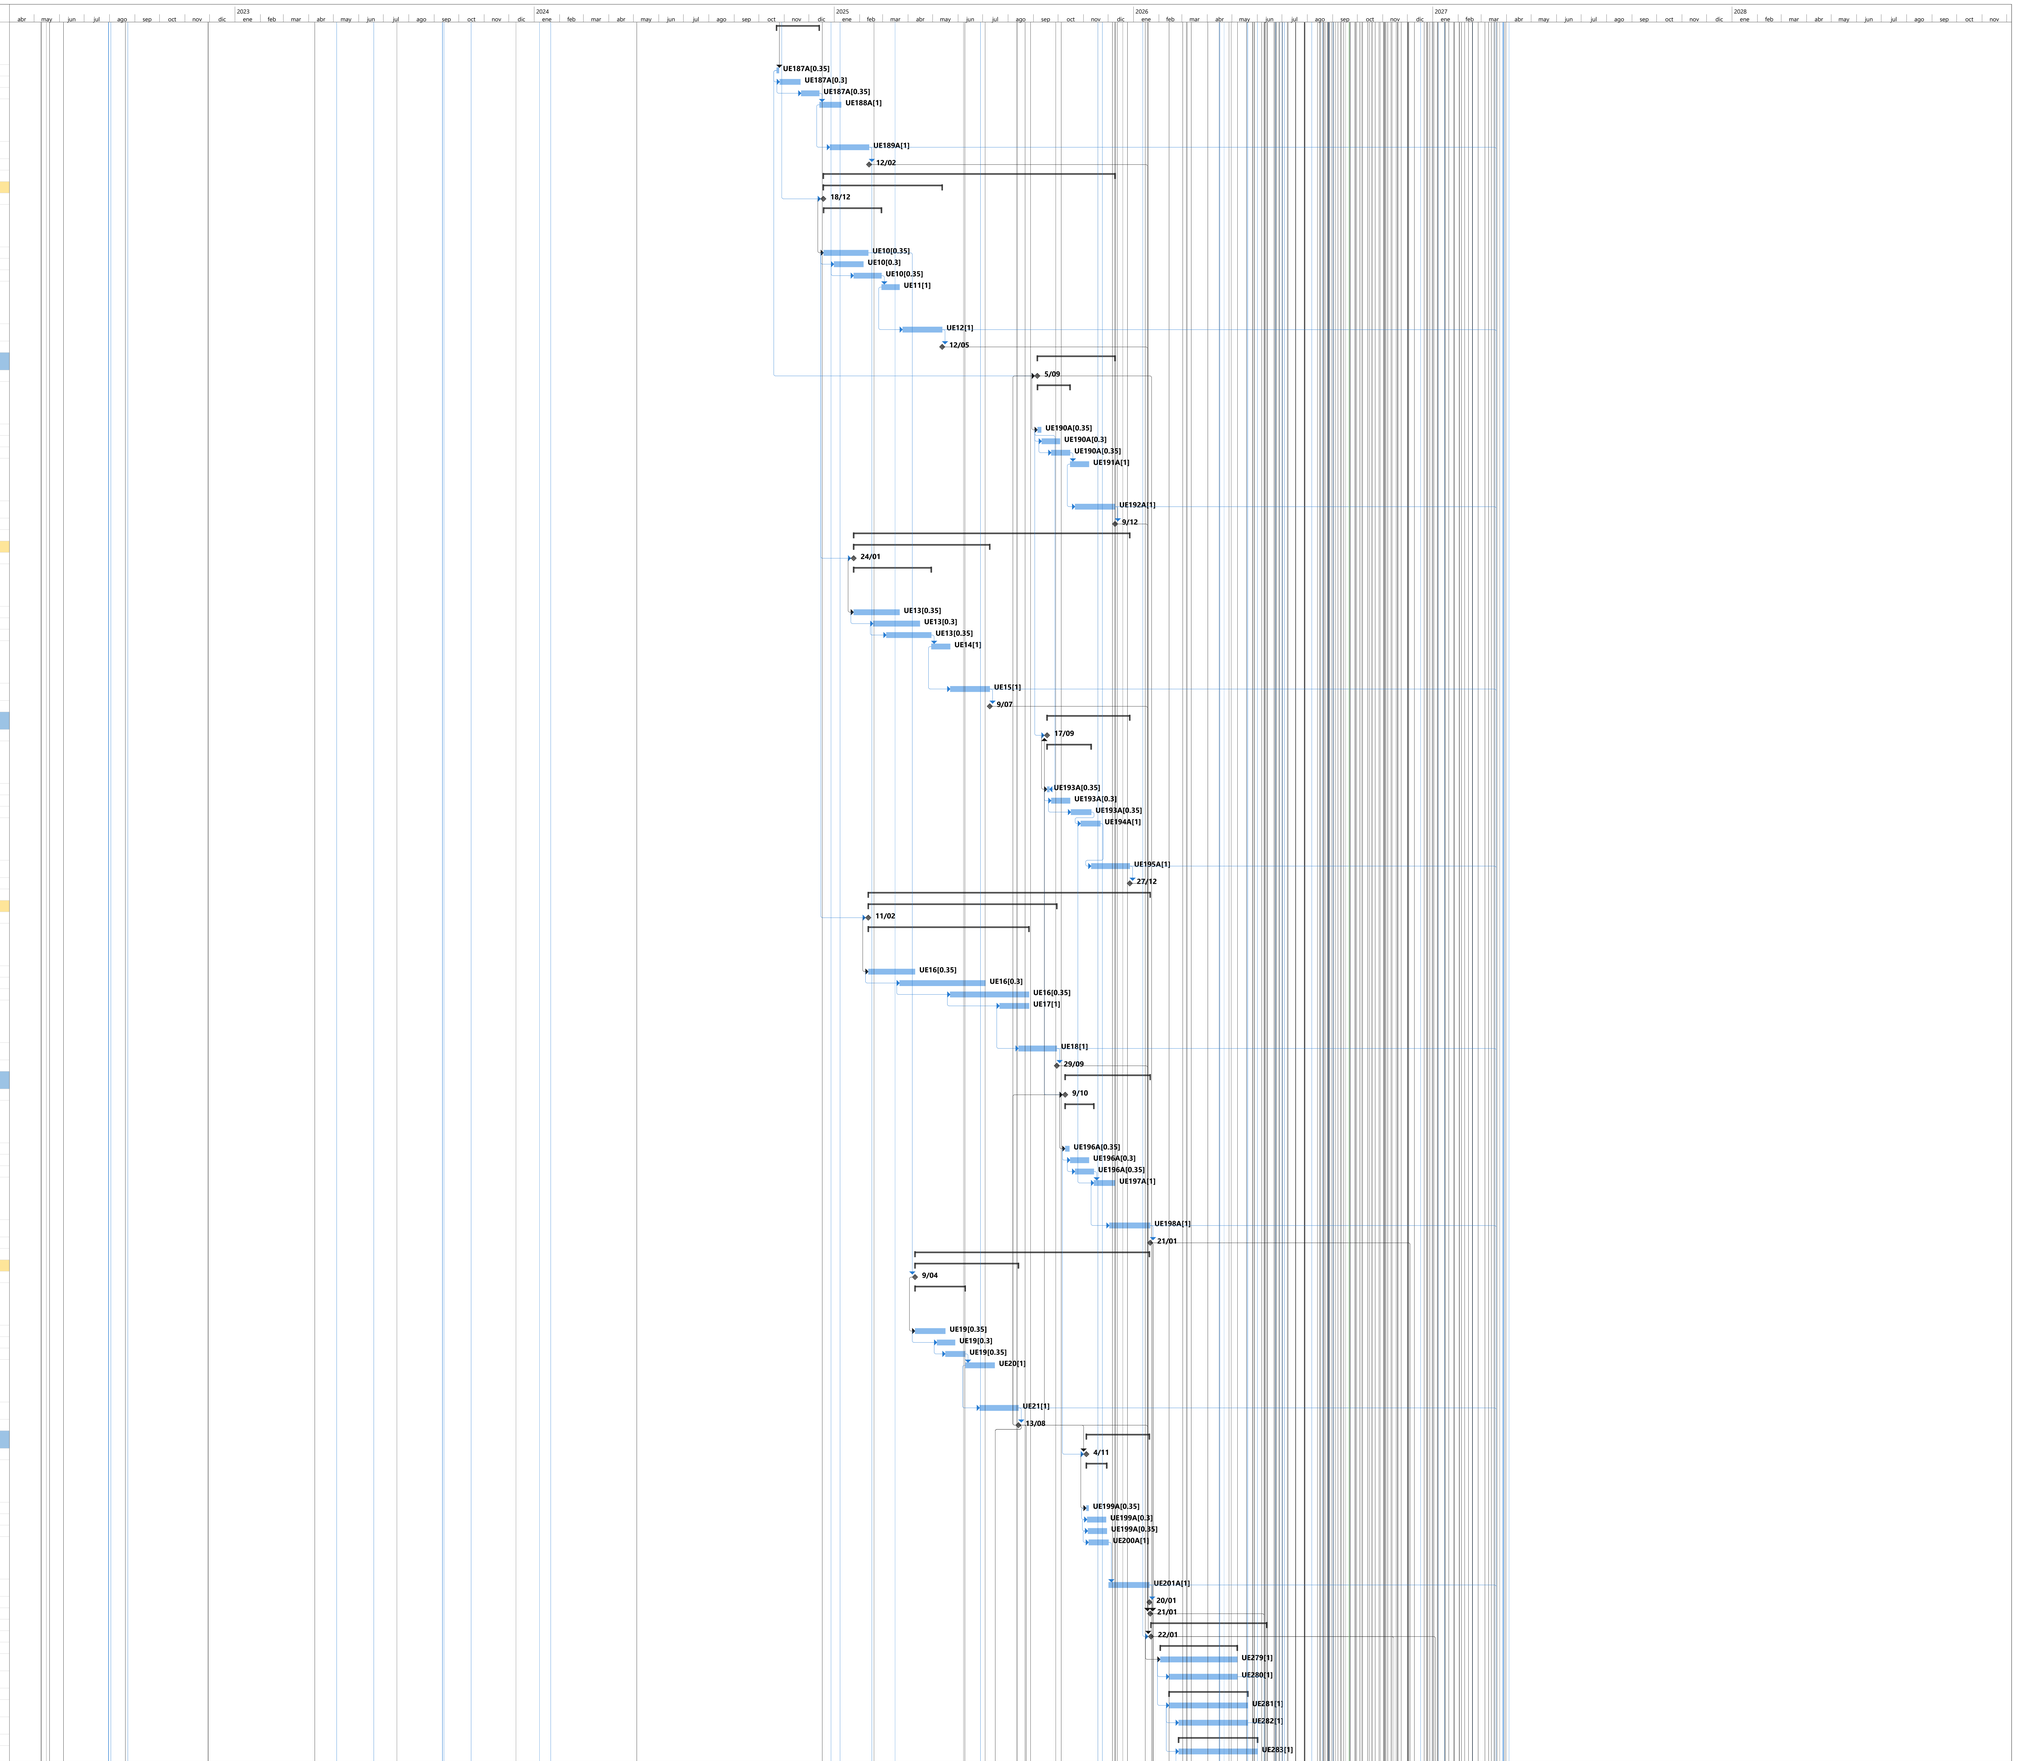


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
542	No	542	UE284	TERMINACIÓN Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 7/03/26	lun 1/06/26	70 días
543	**Sí**	**543**		**Espacio Publico CALLE 15 - CALLE 14**	**sáb 7/03/26**	**vie 12/06/26**	**80 días**
544	No	544	UE285	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 7/03/26	vie 12/06/26	80 días
545	No	545	UE286	TERMINACIÓN Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 19/03/26	vie 12/06/26	70 días
546	No	546		Fin Espacio Publico	vie 12/06/26	vie 12/06/26	0 días
547	No	547		Fin Sector 1	vie 12/06/26	vie 12/06/26	0 días
548	**Sí**	**548**		**Sector 2 CALLE 14 a CALLE 10 Rio Soacha (K0+840 - K1+320)**	**sáb 26/07/25**	**sáb 20/03/27**	**506 días**
549	No	549		Inicio Sector 2	sáb 26/07/25	sáb 26/07/25	0 días
550	No	550		Entrega de Predios por parte de la EFR	sáb 26/07/25	sáb 26/07/25	0 días
551	**Sí**	**551**		**PRELIMINARES**	**mié 13/08/25**	**vie 5/09/25**	**20 días**
552	No	552	DEMOL	Demolición espacio publico y vía	mié 13/08/25	vie 5/09/25	20 días
553	**Sí**	**553**		**INSTALACION DE REDES**	**vie 12/12/25**	**sáb 13/03/27**	**382 días**
554	**No**	**554**		**Inicio Instalación y traslado de redes**	**vie 12/12/25**	**vie 12/12/25**	**0 días**
555	**Sí**	**555**		**REDES SECAS**	**sáb 1/08/26**	**sáb 13/03/27**	**190 días**
556	No	556	RS-S2	Inicio Redes Secas	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26	0 días
557	No	557	RSEN-S2	Red ENEL	sáb 26/12/26	sáb 13/03/27	67 días
558	No	558	RSET-S2	Red ETB	lun 18/01/27	sáb 13/03/27	49 días
559	No	559	RSGA-S2	Red Gas (acero)	vie 16/10/26	vie 16/10/26	0 días
560	No	560	RSGP-S2	Red Gas (polietileno)	vie 16/10/26	vie 16/10/26	0 días
561	No	561	RSM-S2	Red de Movistar	lun 18/01/27	sáb 13/03/27	49 días
562	No	562	RSGA-S2	Red Gas	sáb 26/12/26	sáb 13/03/27	67 días
563	No	563	RS-S2	Fin Redes Secas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
564	**Sí**	**564**		**REDES HUMEDAS**	**mié 1/04/26**	**sáb 13/03/27**	**289 días**
565	No	565	RH-S2	Inicio Redes Húmedas	jue 26/11/26	jue 26/11/26	0 días
566	No	566	RHA-S2	Red Acueducto	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	91 días
567	No	567	RHP-S2	Red de Alcantarillado Pluvial	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	91 días
568	**Sí**	**568**		**Colector Pipe Jacking Santa Cecilia**	**mié 1/04/26**	**jue 24/12/26**	**222 días**
569	No	569	RH-S2	Aprobación de PMT82	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 días
570	No	570	RH-S2	Implementación de PMT82	mar 16/06/26	jue 2/07/26	13 días
571	No	571	RH-S2	Diseño de pozos	mié 1/04/26	mar 5/05/26	27 días
572	No	572	RH-S2	Aprobación de diseños de pozos	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	0 días
573	No	573	RH-S2	Instalación de instrumentación	mar 14/07/26	jue 30/07/26	14 días
574	No	574	RH-S2	Adecuación de plataforma de trabajo	lun 6/07/26	jue 16/07/26	9 días
575	No	575	RH-S2	Mejoramiento de suelo de pozo de lanzamiento	lun 27/07/26	mar 18/08/26	18 días
576	No	576	RH-S2	Mejoramiento de suelo de pozo de salida	mar 18/08/26	lun 7/09/26	18 días
577	No	577	RH-S2	Construcción de pozo de lanzamiento	mar 18/08/26	jue 1/10/26	40 días
578	No	578	RH-S2	Construcción de pozo de salida	lun 7/09/26	jue 22/10/26	40 días
579	No	579	RH-S2	Hincado de tubería	jue 1/10/26	vie 6/11/26	30 días
580	No	580	RH-S2	Conexión a pozos existentes y actividades adicionales	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días
581	No	581	RH-S2	Adecuaciones de cámaras definitivas	mar 1/12/26	mar 15/12/26	12 días
582	No	582	RH-S2	Limpieza, inspección y prueba	mar 15/12/26	jue 24/12/26	9 días
583	No	583	RH-S2	Fin Colector Pipe Jacking Santa Cecilia	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días
584	No	584	RH-S2	Fin de Redes Húmedas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
585	No	585	RH-S2	Fin Instalación y traslado de redes	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
586	**Sí**	**586**		**CORREDORES - S2**	**vie 12/12/25**	**sáb 13/02/27**	**357 días**
587	No	587		Inicio de Corredores	vie 12/12/25	vie 12/12/25	0 días
588	**Sí**	**588**		**CORREDORES (K0+840 - K0+960)**	**mié 1/07/26**	**vie 18/12/26**	**143 días**
589	**Sí**	**589**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K0+840 - K0+960)**	**vie 31/07/26**	**vie 18/12/26**	**118 días**
590	No	590		Inicio de Calzada (Carril 1)	vie 31/07/26	vie 31/07/26	0 días
591	Sí	591	UE22	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 31/07/26	jue 27/08/26	22 días
592	No	592		Excavación	vie 31/07/26	mié 19/08/26	14 días
593	No	593		Mejoramiento con Rajón	jue 13/08/26	vie 21/08/26	7 días
594	No	594		Subbase Granular SBG-A	jue 20/08/26	jue 27/08/26	7 días
595	No	595	UE23	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 25/08/26	mar 1/09/26	7 días
596	No	596	UE24	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 27/08/26	sáb 12/09/26	14 días
597	No	597		Fin de Calzada (Carril 1)	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	0 días
598	No	598		Inicio de Calzada (Carril 2-3)	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26	0 días
599	**Sí**	**599**	**UE22**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**sáb 3/10/26**	**vie 20/11/26**	**40 días**
600	No	600		Excavación	sáb 3/10/26	mié 4/11/26	26 días
601	No	601		Mejoramiento con Rajón	mar 27/10/26	jue 12/11/26	13 días
602	No	602		Subbase Granular SBG-A	jue 5/11/26	vie 20/11/26	13 días
603	No	603	UE23	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 11/11/26	jue 26/11/26	13 días
604	No	604	UE24	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 18/11/26	vie 18/12/26	26 días
605	No	605		Fin de Calzada (Carril 2-3)	vie 18/12/26	vie 18/12/26	0 días
606	**Sí**	**606**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K0+840 - K0+960)**	**mié 1/07/26**	**mié 30/09/26**	**77 días**
607	No	607		Inicio de Calzada	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
608	Sí	608	UE202A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 1/07/26	lun 31/08/26	50 días
609	No	609		Excavación	mié 1/07/26	jue 20/08/26	40 días
610	No	610		Mejoramiento con Rajón	vie 31/07/26	mar 25/08/26	20 días
611	No	611		Subbase Granular SBG-A	jue 6/08/26	lun 31/08/26	20 días
612	No	612	UE203A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 13/08/26	sáb 5/09/26	20 días
613	No	613	UE204A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
614	No	614		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
615	**Sí**	**615**		**CORREDORES (K0+960 - K1+080)**	**jue 9/07/26**	**jue 24/12/26**	**140 días**
616	**Sí**	**616**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K0+960 - K1+080)**	**sáb 8/08/26**	**jue 24/12/26**	**117 días**
617	No	617		Inicio de Calzada (Carril 1)	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	0 días
618	Sí	618	UE25	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 8/08/26	jue 3/09/26	22 días
619	No	619		Excavación	sáb 8/08/26	mar 25/08/26	14 días
620	No	620		Mejoramiento con Rajón	vie 21/08/26	vie 28/08/26	7 días
621	No	621		Subbase Granular SBG-A	mié 26/08/26	jue 3/09/26	7 días
622	No	622	UE26	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 31/08/26	mar 8/09/26	7 días
623	No	623	UE27	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 15/09/26	mié 30/09/26	14 días
624	No	624		Fin de Calzada (Carril 1)	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
625	No	625		Inicio de Calzada (Carril 2-3)	vie 9/10/26	vie 9/10/26	0 días
626	**Sí**	**626**	**UE25**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**vie 9/10/26**	**jue 26/11/26**	**40 días**
627	No	627		Excavación	vie 9/10/26	mar 10/11/26	26 días
628	No	628		Mejoramiento con Rajón	mar 3/11/26	jue 19/11/26	13 días
629	No	629		Subbase Granular SBG-A	mié 11/11/26	jue 26/11/26	13 días
630	No	630	UE26	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 18/11/26	mié 2/12/26	13 días
631	No	631	UE27	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 24/11/26	jue 24/12/26	26 días
632	No	632		Fin de Calzada (Carril 2-3)	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días
633	**Sí**	**633**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K0+960 - K1+080)**	**jue 9/07/26**	**jue 24/09/26**	**64 días**
634	No	634		Inicio de Calzada	jue 9/07/26	jue 9/07/26	0 días
635	Sí	635	UE205A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 10/07/26	sáb 29/08/26	41 días
636	No	636		Excavación	vie 10/07/26	lun 24/08/26	35 días
637	No	637		Mejoramiento con Rajón	mar 4/08/26	mié 26/08/26	18 días
638	No	638		Subbase Granular SBG-A	sáb 8/08/26	sáb 29/08/26	18 días
639	No	639	UE206A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 12/08/26	mié 2/09/26	18 días
640	No	640	UE207A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	jue 24/09/26	35 días
641	No	641		Fin de Calzada	jue 24/09/26	jue 24/09/26	0 días
642	**Sí**	**642**		**CORREDORES (K1+080 - K1+200)**	**mar 21/07/26**	**mar 29/12/26**	**136 días**
643	**Sí**	**643**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+080 - K1+200)**	**vie 14/08/26**	**mar 29/12/26**	**114 días**
644	No	644		Inicio de Calzada (Carril 1)	vie 14/08/26	vie 14/08/26	0 días
645	Sí	645	UE28	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	jue 10/09/26	22 días
646	No	646		Excavación	sáb 15/08/26	mar 1/09/26	14 días
647	No	647		Mejoramiento con Rajón	jue 27/08/26	vie 4/09/26	7 días
648	No	648		Subbase Granular SBG-A	mié 2/09/26	jue 10/09/26	7 días

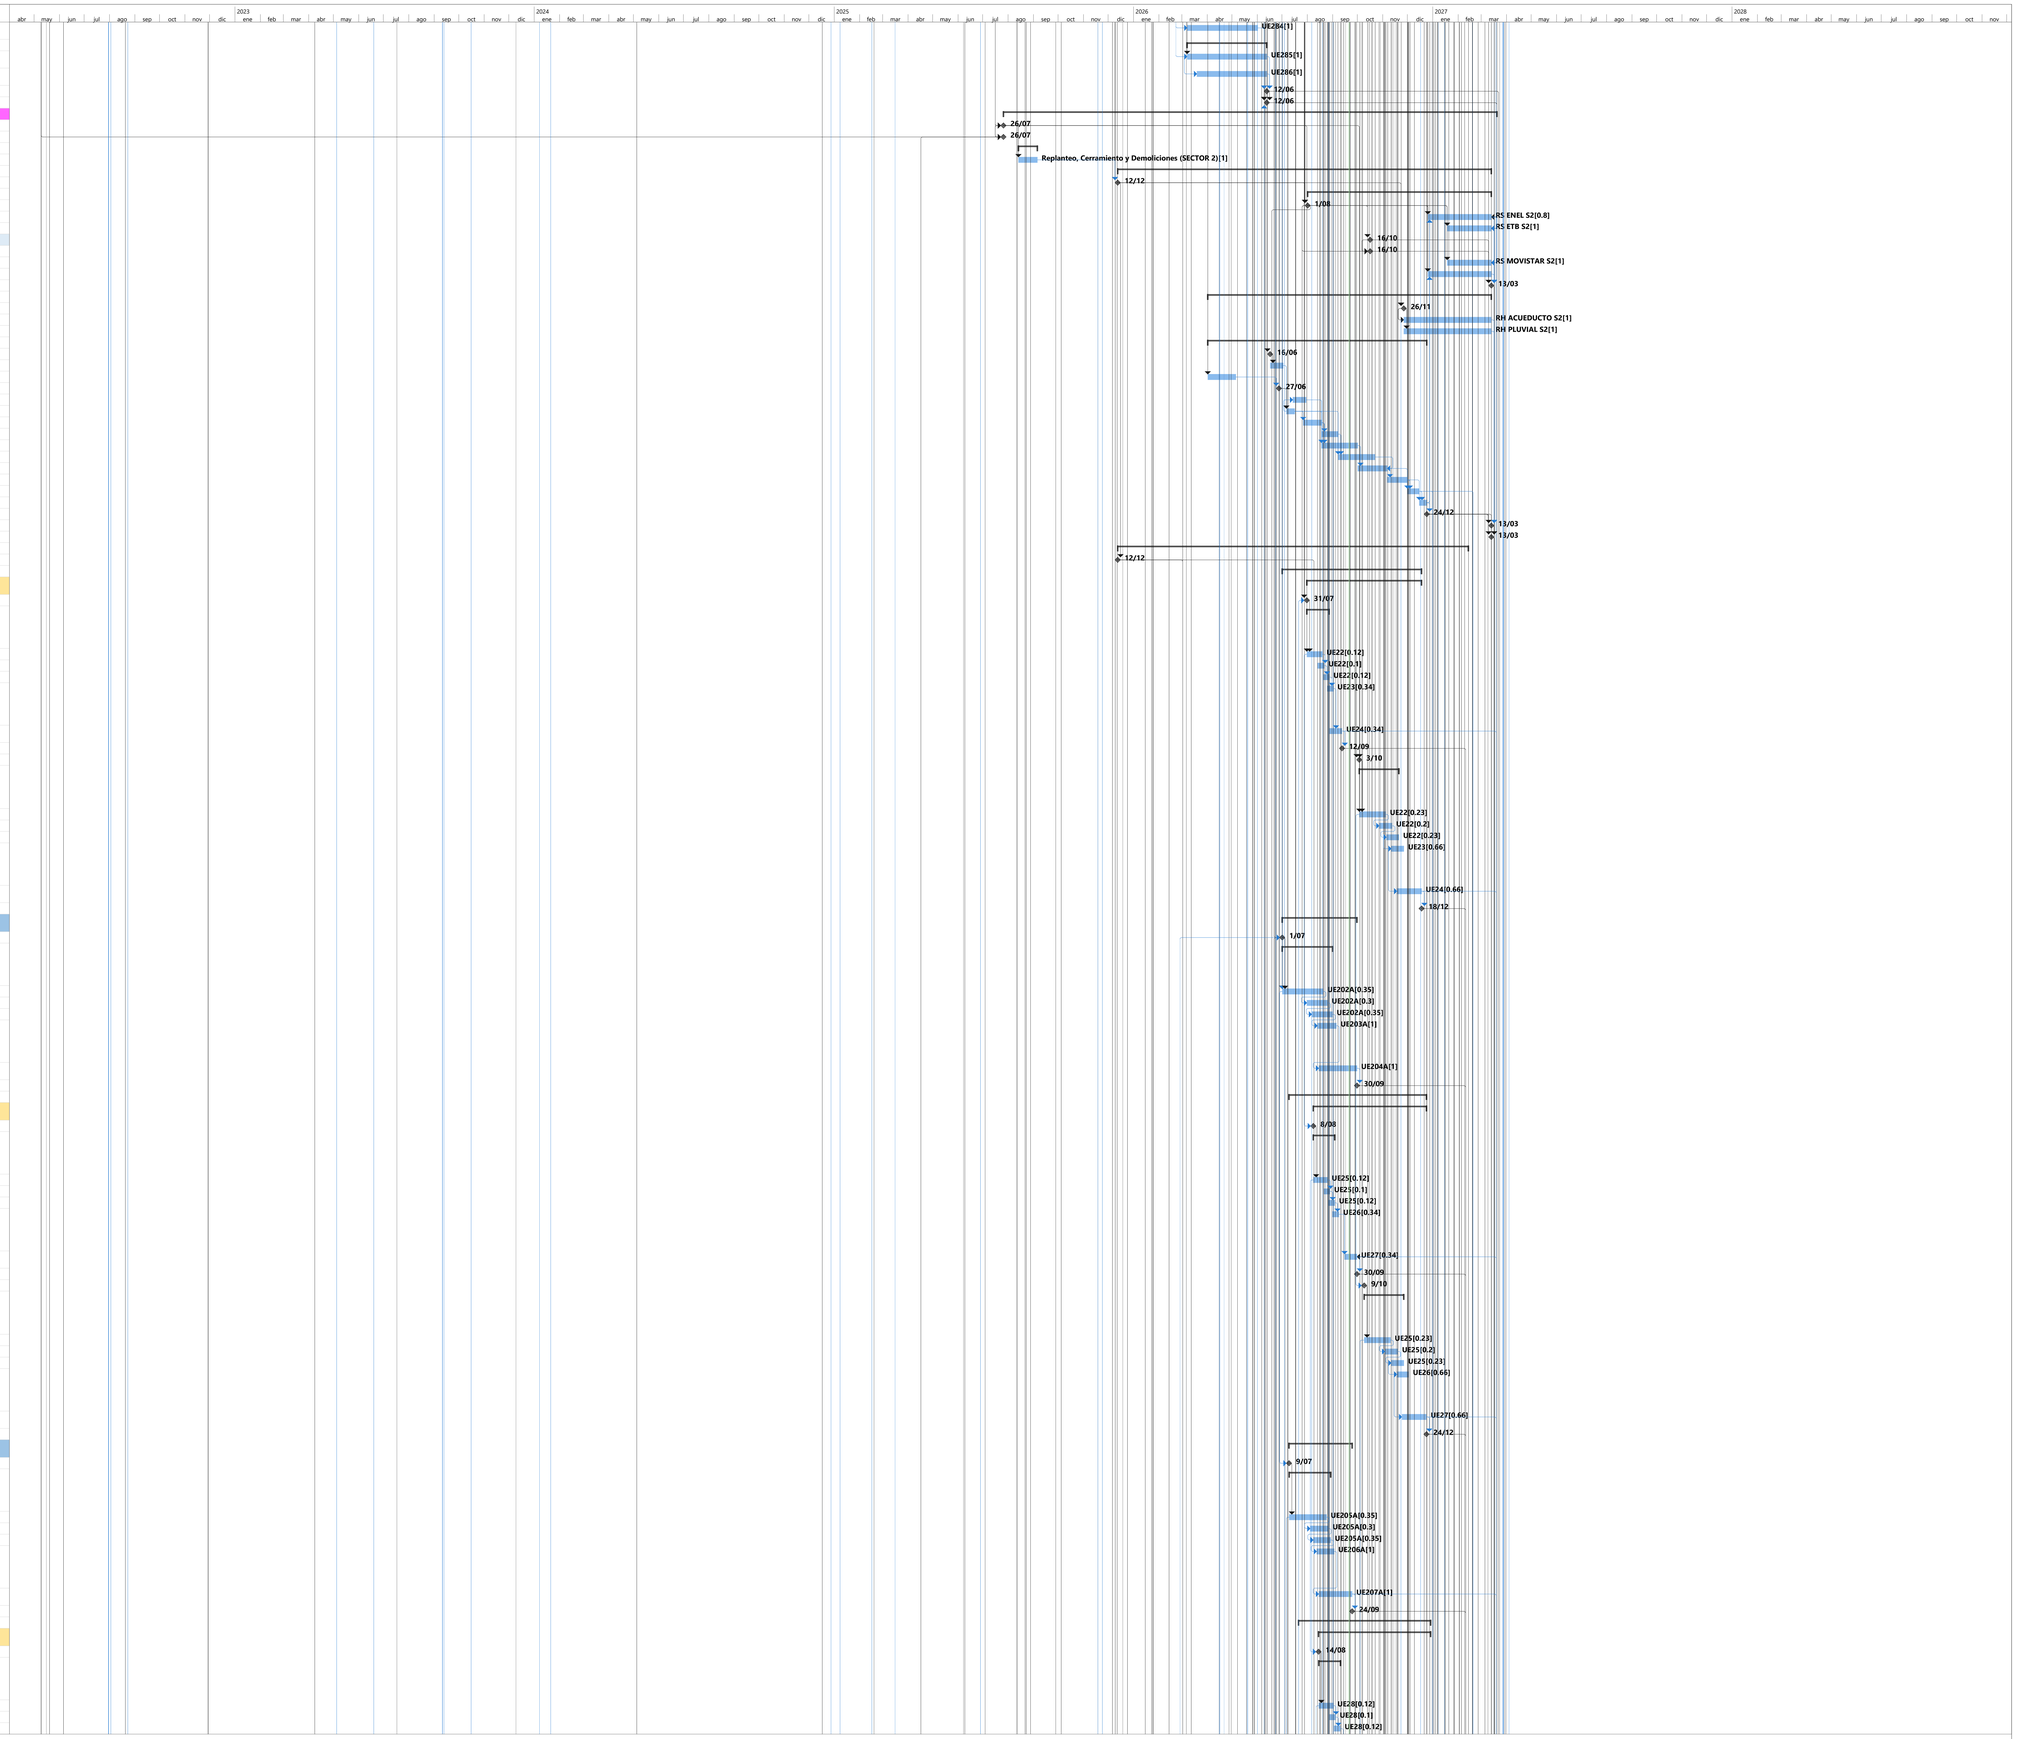

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
649	No	649	UE29	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 7/09/26	mar 15/09/26	7 días
650	No	650	UE30	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 15/09/26	mié 30/09/26	14 días
651	No	651		Fin de Calzada (Carril 1)	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
652	No	652		Inicio de Calzada (Carril 2-3)	mié 14/10/26	mié 14/10/26	0 días
653	**Sí**	**653**	**UE28**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mié 14/10/26**	**lun 30/11/26**	**40 días**
654	No	654		Excavación	mié 14/10/26	vie 13/11/26	26 días
655	No	655		Mejoramiento con Rajón	vie 6/11/26	lun 23/11/26	13 días
656	No	656		Subbase Granular SBG-A	sáb 14/11/26	lun 30/11/26	13 días
657	No	657	UE29	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 21/11/26	sáb 5/12/26	13 días
658	No	658	UE30	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 26/11/26	mar 29/12/26	26 días
659	No	659		Fin de Calzada (Carril 2-3)	mar 29/12/26	mar 29/12/26	0 días
660	**Sí**	**660**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+080 -K1+200)**	**mar 21/07/26**	**vie 2/10/26**	**64 días**
661	No	661		Inicio de Calzada	mar 21/07/26	mar 21/07/26	0 días
662	Sí	662	UE208A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 21/07/26	lun 7/09/26	41 días
663	No	663		Excavación	mar 21/07/26	lun 31/08/26	35 días
664	No	664		Mejoramiento con Rajón	jue 13/08/26	jue 3/09/26	18 días
665	No	665		Subbase Granular SBG-A	mar 18/08/26	lun 7/09/26	18 días
666	No	666	UE209A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 21/08/26	jue 10/09/26	18 días
667	No	667	UE210A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 25/08/26	vie 2/10/26	35 días
668	No	668		Fin de Calzada	vie 2/10/26	vie 2/10/26	0 días
669	**Sí**	**669**		**CORREDORES (K1+200 - K1+320)**	**mié 26/08/26**	**sáb 13/02/27**	**146 días**
670	**Sí**	**670**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+200 - K1+320)**	**vie 16/10/26**	**sáb 13/02/27**	**100 días**
671	No	671		Inicio de Calzada (Carril 1)	lun 4/01/27	lun 4/01/27	0 días
672	Sí	672	UE31	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 4/01/27	vie 29/01/27	22 días
673	No	673		Excavación	lun 4/01/27	mié 20/01/27	14 días
674	No	674		Mejoramiento con Rajón	vie 15/01/27	sáb 23/01/27	7 días
675	No	675		Subbase Granular SBG-A	jue 21/01/27	vie 29/01/27	7 días
676	No	676	UE32	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 26/01/27	mié 3/02/27	7 días
677	No	677	UE33	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 29/01/27	sáb 13/02/27	14 días
678	No	678		Fin de Calzada (Carril 1)	sáb 13/02/27	sáb 13/02/27	0 días
679	No	679		Inicio de Calzada (Carril 2-3)	vie 16/10/26	vie 16/10/26	0 días
680	**Sí**	**680**	**UE31**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**sáb 17/10/26**	**jue 3/12/26**	**40 días**
681	No	681		Excavación	sáb 17/10/26	mié 18/11/26	26 días
682	No	682		Mejoramiento con Rajón	mar 10/11/26	mié 25/11/26	13 días
683	No	683		Subbase Granular SBG-A	jue 19/11/26	jue 3/12/26	13 días
684	No	684	UE32	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 25/11/26	jue 10/12/26	13 días
685	No	685	UE33	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 1/12/26	jue 31/12/26	26 días
686	No	686		Fin de Calzada (Carril 2-3)	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días
687	**Sí**	**687**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+200 - K1+320)**	**mié 26/08/26**	**vie 2/10/26**	**34 días**
688	No	688		Inicio de Calzada	mié 26/08/26	mié 26/08/26	0 días
689	Sí	689	UE211A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 26/08/26	mié 23/09/26	26 días
690	No	690		Excavación	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
691	No	691		Mejoramiento con Rajón	lun 31/08/26	lun 21/09/26	18 días
692	No	692		Subbase Granular SBG-A	jue 3/09/26	mié 23/09/26	18 días
693	No	693	UE212A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 7/09/26	sáb 26/09/26	18 días
694	No	694	UE213A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 10/09/26	vie 2/10/26	20 días
695	No	695		Fin de Calzada	vie 2/10/26	vie 2/10/26	0 días
696	No	696		Fin de Corredores	sáb 13/02/27	sáb 13/02/27	0 días
697	**Sí**	**697**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**jue 25/06/26**	**sáb 20/03/27**	**226 días**
698	No	698		Inicio Espacio Público	lun 21/12/26	lun 21/12/26	0 días
699	**Sí**	**699**		**Espacio Público CALLE 14 - CALLE 13**	**mié 20/01/27**	**mar 16/03/27**	**49 días**
700	No	700	UE287	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 20/01/27	sáb 13/03/27	47 días
701	No	701	UE288	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 1/02/27	sáb 13/03/27	37 días
702	**Sí**	**702**		**Bocacalle Calle 13 Costado occidental**	**sáb 13/03/27**	**mar 16/03/27**	**2 días**
703	No	703	UE287	Capas Granulares	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
704	No	704	UE288	Carpeta Asfáltica	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
705	**Sí**	**705**		**Espacio Público CALLE 13 - CALLE 12**	**jue 25/06/26**	**jue 18/03/27**	**224 días**
706	No	706	UE289	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 25/06/26	mar 29/09/26	80 días
707	No	707	UE290	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mié 8/07/26	mar 29/09/26	70 días
708	**Sí**	**708**		**Bocacalle Calle 12 Costado occidental**	**mar 16/03/27**	**jue 18/03/27**	**2 días**
709	No	709	UE289	Capas Granulares	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
710	No	710	UE290	Carpeta Asfáltica	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
711	**Sí**	**711**		**Espacio Público CALLE 12 - CALLE 11**	**jue 24/12/26**	**sáb 20/03/27**	**74 días**
712	No	712	UE291	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 24/12/26	sáb 13/03/27	68 días
713	No	713	UE292	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mié 6/01/27	sáb 13/03/27	58 días
714	**Sí**	**714**		**Bocacalle Calle 11 Costado occidental**	**jue 18/03/27**	**sáb 20/03/27**	**2 días**
715	No	715	UE291	Capas Granulares	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
716	No	716	UE292	Carpeta Asfáltica	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
717	**Sí**	**717**		**Espacio Público CALLE 11 - CALLE 10**	**sáb 13/02/27**	**sáb 13/03/27**	**25 días**
718	No	718	UE293	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 13/02/27	sáb 13/03/27	25 días
719	No	719	UE294	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 25/02/27	sáb 13/03/27	15 días
720	No	720		Fin Espacio Público	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
721	No	721		Fin Sector 2	sáb 20/03/27	sáb 20/03/27	0 días
722	**Sí**	**722**		**Sector 3 CALLE 10 a CALLE 6 (K1+320 - K1+680)**	**mar 7/10/25**	**mar 23/03/27**	**445 días**
723	No	723		Entrega de Predios por parte de la EFR	lun 4/01/27	lun 4/01/27	0 días
724	No	724		Inicio Sector 3	lun 4/01/27	lun 4/01/27	0 días
725	**Sí**	**725**		**PRELIMINARES**	**mié 6/01/27**	**sáb 23/01/27**	**15 días**
726	No	726	DEMOL	Demolición de Cimentaciones	mié 6/01/27	sáb 23/01/27	15 días
727	**Sí**	**727**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**lun 4/01/27**	**sáb 13/03/27**	**61 días**
728	No	728		Inicio Instalación y traslado de redes	vie 8/01/27	vie 8/01/27	0 días
729	**Sí**	**729**		**REDES SECAS**	**vie 8/01/27**	**sáb 13/03/27**	**56 días**
730	No	730	RS-S3	Inicio Redes Secas	vie 8/01/27	vie 8/01/27	0 días
731	No	731	RSGA-S	Red Gas (Acero)	mié 27/01/27	mié 27/01/27	0 días
732	No	732	RSGP-S	Red Gas (Polietileno)	mié 27/01/27	sáb 13/03/27	41 días
733	No	733	RSGA-S	Red Gas	mié 27/01/27	sáb 13/03/27	41 días
734	No	734	RSEN-S	Red ENEL	mié 27/01/27	sáb 13/03/27	41 días
735	No	735	RSET-S	Red ETB	mié 27/01/27	sáb 13/03/27	41 días
736	No	736	RSM-S3	Red de Movistar	mié 27/01/27	sáb 13/03/27	41 días
737	No	737	RS-S3	Fin Redes Secas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
738	**Sí**	**738**		**REDES HUMEDAS**	**lun 4/01/27**	**sáb 13/03/27**	**61 días**
739	No	739	RH-S3	Inicio Redes Húmedas	lun 4/01/27	lun 4/01/27	0 días
740	No	740	RHA-S3	Red Acueducto	lun 4/01/27	sáb 13/03/27	61 días
741	No	741	RHP-S3	Red de Alcantarillado Pluvial	lun 4/01/27	sáb 13/03/27	61 días
742	No	742	RHS-S3	Red de Alcantarillado Sanitario	lun 4/01/27	sáb 13/03/27	61 días
743	No	743	RH-S3	Fin de Redes Húmedas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
744	No	744	RH-S3	Fin Instalación y traslado de redes	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
745	**Sí**	**745**		**CORREDORES - S3**	**sáb 23/01/27**	**jue 18/03/27**	**48 días**
746	No	746		Inicio de Corredores	sáb 23/01/27	sáb 23/01/27	0 días
747	**Sí**	**747**		**CORREDORES (K1+320 - K1+440)**	**lun 8/02/27**	**jue 18/03/27**	**35 días**
748	**Sí**	**748**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+320 - K1+440)**	**vie 12/03/27**	**jue 18/03/27**	**5 días**
749	No	749		Inicio de Calzada	vie 12/03/27	vie 12/03/27	0 días
750	Sí	750	UE34	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 12/03/27	mar 16/03/27	3 días
751	No	751		Excavación- Rellenos	vie 12/03/27	sáb 13/03/27	1 día
752	No	752		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
753	No	753		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
754	No	754	UE35	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día

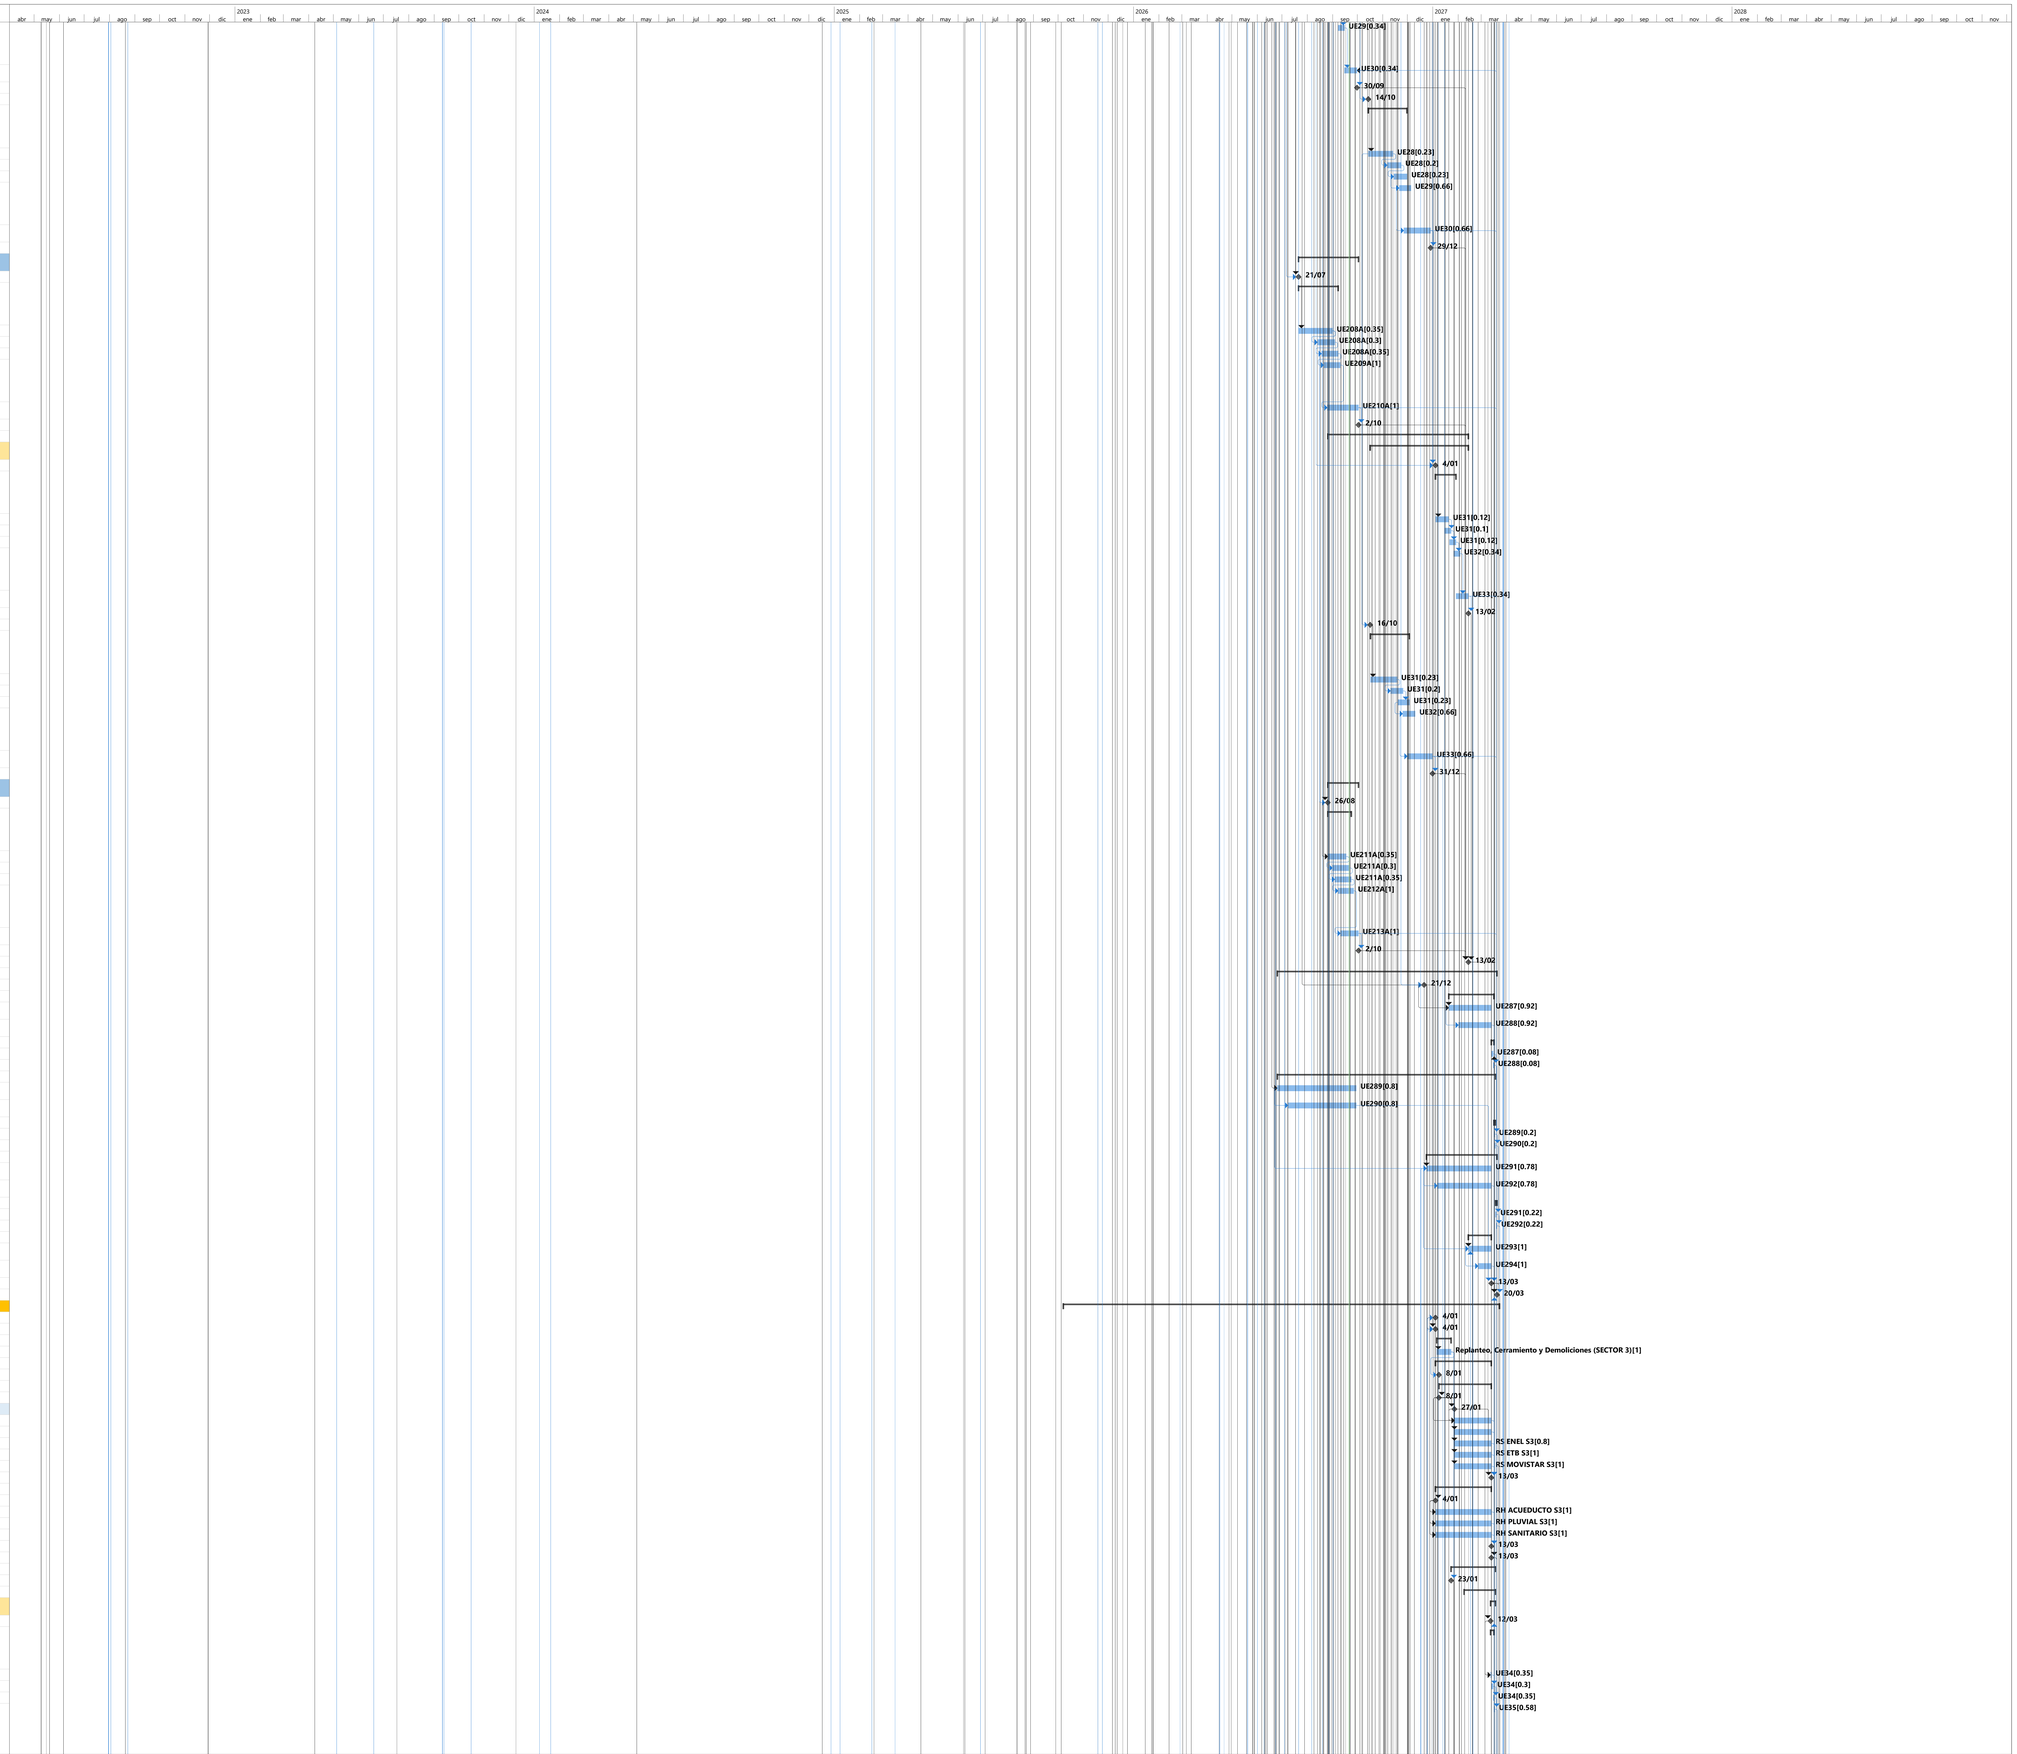

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
755	No	755	UE36	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
756	No	756	UE35	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
757	No	757	UE36	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
758	No	758		Fin de Calzada	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
759	**Sí**	**759**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+320 - K1+440)**	**lun 8/02/27**	**jue 18/03/27**	**35 días**
760	No	760		Inicio de Calzada	lun 8/02/27	lun 8/02/27	0 días
761	Sí	761	UE214A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 8/02/27	sáb 13/03/27	31 días
762	No	762		Excavación- Rellenos	lun 8/02/27	sáb 13/03/27	31 días
763	No	763		Mejoramiento con Rajón	mar 16/02/27	mié 10/03/27	20 días
764	No	764		Subbase Granular SBG-A	jue 25/02/27	sáb 13/03/27	15 días
765	No	765	UE215A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
766	No	766	UE216A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
767	No	767	UE215A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
768	No	768	UE216A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
769	No	769		Fin de Calzada	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
770	**Sí**	**770**		**CORREDORES (K1+440 - K1+560)**	**lun 8/02/27**	**jue 18/03/27**	**35 días**
771	**Sí**	**771**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+440 - K1+560)**	**mié 24/02/27**	**jue 18/03/27**	**20 días**
772	No	772		Inicio de Calzada	mié 24/02/27	mié 24/02/27	0 días
773	Sí	773	UE37	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 24/02/27	mar 16/03/27	18 días
774	No	774		Excavación	mié 24/02/27	sáb 13/03/27	16 días
775	No	775		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
776	No	776		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
777	No	777	UE38	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
778	No	778	UE39	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
779	No	779		Fin de Calzada	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
780	**Sí**	**780**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+440 - K1+560)**	**lun 8/02/27**	**mié 17/03/27**	**34 días**
781	No	781		Inicio de Calzada	lun 8/02/27	lun 8/02/27	0 días
782	Sí	782	UE217A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 8/02/27	lun 15/03/27	32 días
783	No	783		Excavación- Rellenos	lun 8/02/27	sáb 13/03/27	31 días
784	No	784		Mejoramiento con Rajón	mié 3/03/27	sáb 13/03/27	10 días
785	No	785		Subbase Granular SBG-A	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
786	No	786	UE218A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
787	No	787	UE219A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
788	No	788		Fin de Calzada	mié 17/03/27	mié 17/03/27	0 días
789	**Sí**	**789**		**CORREDORES (K1+560 - K1+680)**	**mié 27/01/27**	**mié 17/03/27**	**44 días**
790	**Sí**	**790**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+560 - K1+680)**	**mié 27/01/27**	**mié 17/03/27**	**44 días**
791	No	791		Inicio de Calzada	vie 12/03/27	vie 12/03/27	0 días
792	Sí	792	UE40	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 27/01/27	mié 17/03/27	44 días
793	No	793		Excavación- Rellenos	mié 27/01/27	vie 12/03/27	40 días
794	No	794		Mejoramiento con Rajón	vie 12/03/27	mar 16/03/27	3 días
795	No	795		Subbase Granular SBG-A	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
796	No	796	UE41	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
797	No	797	UE42	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
798	No	798		Fin de Calzada	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
799	**Sí**	**799**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+560 - K1+680)**	**mié 27/01/27**	**mié 17/03/27**	**44 días**
800	No	800		Inicio de Calzada	vie 12/03/27	vie 12/03/27	0 días
801	Sí	801	UE220A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 27/01/27	mié 17/03/27	44 días
802	No	802		Excavación- Rellenos	mié 27/01/27	vie 12/03/27	40 días
803	No	803		Mejoramiento con Rajón	vie 12/03/27	mar 16/03/27	3 días
804	No	804		Subbase Granular SBG-A	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
805	No	805	UE221A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
806	No	806	UE222A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
807	No	807		Fin de Calzada	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
808	No	808		Fin de Corredores	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
809	**Sí**	**809**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**mar 7/10/25**	**mar 23/03/27**	**445 días**
810	No	810		Inicio Espacio Público	jue 21/01/27	jue 21/01/27	0 días
811	**Sí**	**811**		**Espacio Público CALLE 10 - CALLE 9**	**jue 21/01/27**	**lun 15/03/27**	**47 días**
812	No	812	UE295	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 21/01/27	sáb 13/03/27	46 días
813	No	813	UE296	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
814	**Sí**	**814**		**Espacio Público CARRERA 4 3M - GLORIETA CALLE 9**	**mar 2/02/27**	**sáb 13/03/27**	**36 días**
815	No	815	UE297	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 2/02/27	sáb 13/03/27	36 días
816	No	816	UE298	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 12/02/27	sáb 13/03/27	26 días
817	**Sí**	**817**		**Espacio Público GLORIETA CALLE 9 - ESTACION SERVICIO TERPEL**	**mar 7/10/25**	**mar 23/03/27**	**445 días**
818	No	818	UE299	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 2/02/27	sáb 13/03/27	36 días
819	No	819	UE300	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
820	**Sí**	**820**		**Espacio Público GLORIETA CALLE 9 - ESTACION SERVICIO TERPEL (Plazoleta occidental puente**	**sáb 22/08/26**	**vie 30/10/26**	**60 días**
821	No	821	UE299	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 22/08/26	vie 25/09/26	30 días
822	No	822	UE300	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 25/09/26	vie 30/10/26	30 días
823	**Sí**	**823**		**Espacio Público GLORIETA CALLE 9 - ESTACION SERVICIO TERPEL(Plazoleta occidental puente El**	**mar 7/10/25**	**mié 17/12/25**	**60 días**
824	No	824	UE299	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 7/10/25	mié 12/11/25	30 días
825	No	825	UE300	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mié 12/11/25	mié 17/12/25	30 días
826	No	826		Fin Espacio Público	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
827	No	827		Fin Sector 3	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
828	**Sí**	**828**		**Sector 4 CALLE 6 a Diag. 7s PTE.HUMEDAL (K1+680 - K3+120)**	**sáb 24/05/25**	**vie 19/03/27**	**588 días**
829	No	829		Inicio Sector 4	mar 17/06/25	mar 17/06/25	0 días
830	**Sí**	**830**		**PRELIMINARES**	**mié 18/06/25**	**mar 8/07/25**	**15 días**
831	No	831	DEMOL	Demolición de Cimentaciones	mié 18/06/25	mar 8/07/25	15 días
832	**Sí**	**832**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**mar 16/06/26**	**sáb 13/03/27**	**228 días**
833	No	833		Inicio Instalación y traslado de redes	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 días
834	**Sí**	**834**		**REDES SECAS**	**mar 16/06/26**	**sáb 13/03/27**	**228 días**
835	No	835	RS-S4	Inicio Redes Secas	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 días
836	No	836	RSGA-S	Red Gas (Acero)	mar 30/06/26	mar 30/06/26	0 días
837	No	837	RSGP-S	Red Gas (Polietileno)	mar 30/06/26	jue 24/12/26	150 días
838	No	838	RSEN-S	Red ENEL	mar 14/07/26	vie 8/01/27	150 días
839	No	839	RSET-S/	Red ETB	lun 27/07/26	vie 22/01/27	150 días
840	No	840	RSM-S4	Red de Movistar	lun 15/02/27	sáb 13/03/27	24 días
841	No	841	RS-S4	Fin Redes Secas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
842	**Sí**	**842**		**REDES HUMEDAS**	**mar 16/06/26**	**sáb 13/03/27**	**228 días**
843	No	843	RH-S4	Inicio Redes Húmedas	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 días
844	No	844	RHA-S4	Red Acueducto	mié 17/06/26	jue 24/12/26	160 días
845	No	845	RHP-S4	Red de Alcantarillado Pluvial	sáb 26/12/26	sáb 13/03/27	67 días
846	**Sí**	**846**		**Colector Norte**	**mié 7/10/26**	**lun 23/11/26**	**38 días**
847	No	847	RHP-S4	Tramo 1 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE76-UE77-UE78)	mié 7/10/26	lun 26/10/26	16 días
848	No	848	RHP-S4	Tramo 2 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE73-UE74-UE75)	jue 15/10/26	sáb 7/11/26	20 días
849	No	849	RHP-S4	Tramo 3 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE70-UE71-UE72)	jue 22/10/26	sáb 14/11/26	20 días
850	No	850	RHP-S4	Tramo 4 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE67-UE68-UE69)	mié 28/10/26	lun 23/11/26	20 días
851	No	851	RHP-S4	Tramo 5 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE64-UE65-UE66)	mié 28/10/26	lun 23/11/26	20 días
852	No	852	RHP-S4	Tramo 6 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE 61-UE62-UE63)	jue 22/10/26	sáb 14/11/26	20 días

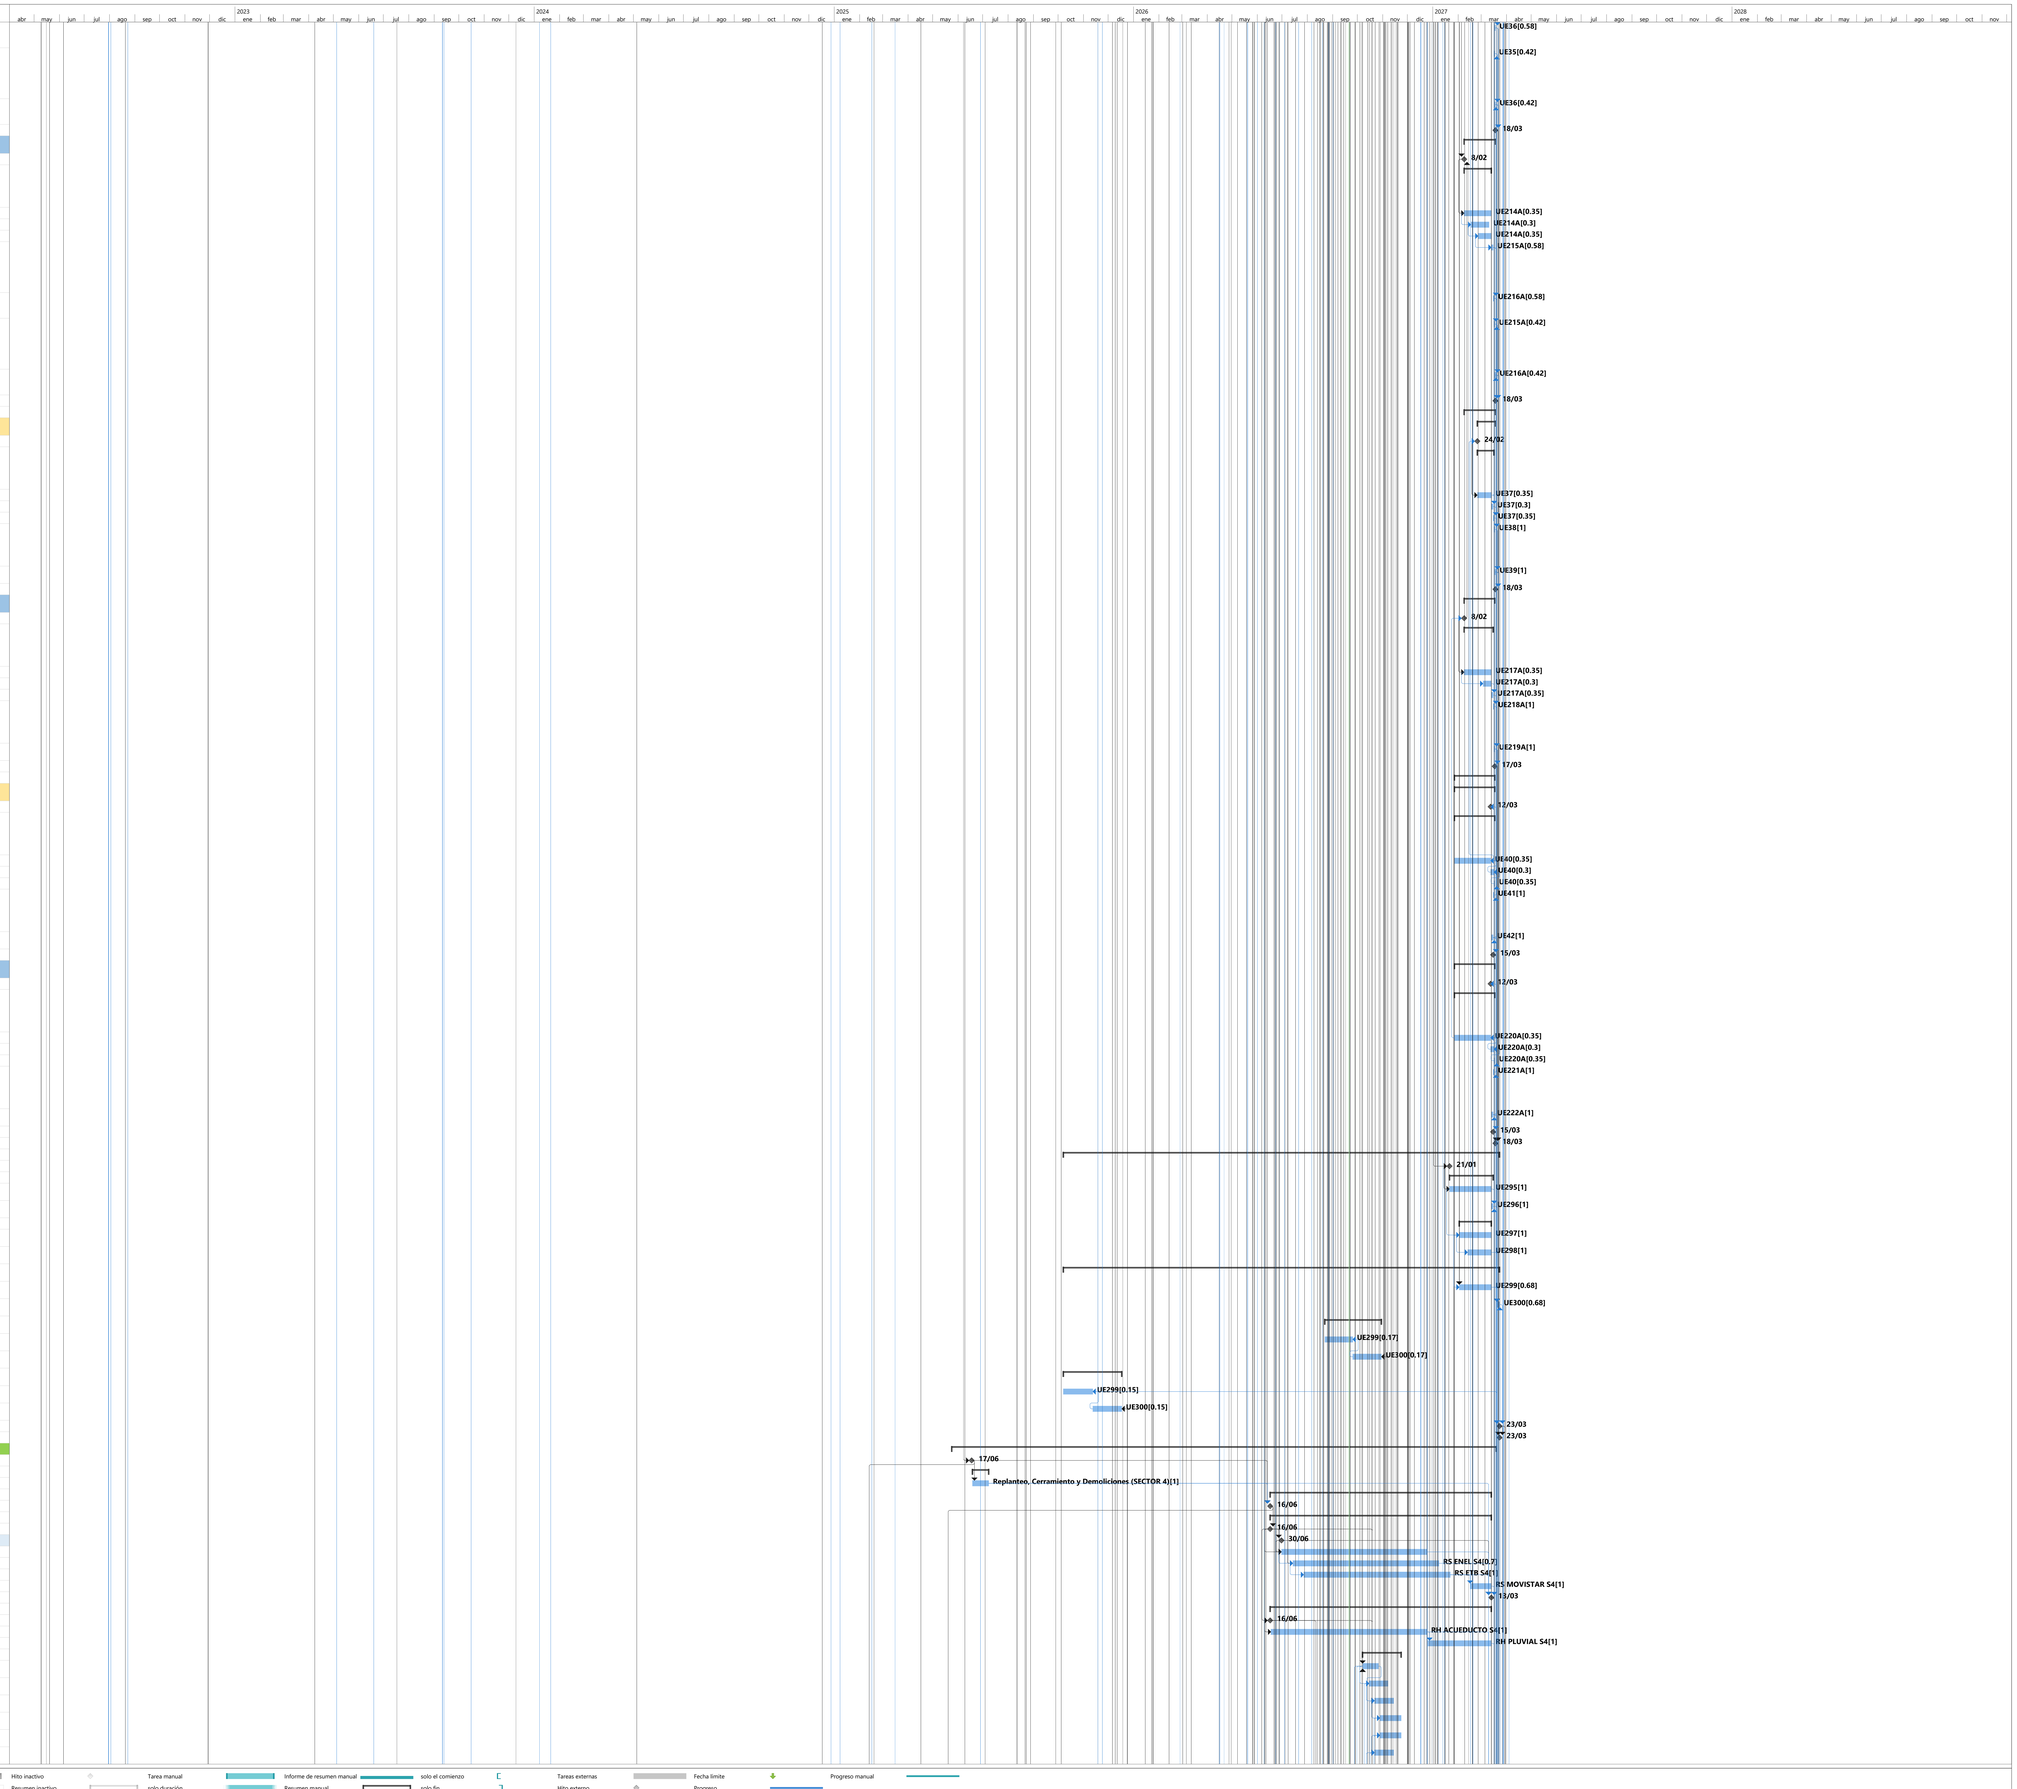

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
853	No	853	RHIP-S4	Tramo 7 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE58-UE59-UE60)	jue 15/10/26	sáb 7/11/26	20 días
854	No	854	RHIP-S4	Tramo 8 colector norte (Sentido Sur-Norte) (UE 55-UE56-UE57)	mié 7/10/26	vie 30/10/26	20 días
855	No	855	RHS-S4	Red de Alcantarillado Sanitario	mar 11/08/26	mar 16/02/27	160 días
856	No	856	RH-S4	Fin de Redes Húmedas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
857	No	857	RH-S4	Fin Instalación y traslado de redes	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
858	**Sí**	**858**		**CORREDORES - S4**	**sáb 24/05/25**	**mié 30/12/26**	**490 días**
859	No	859		Inicio de Corredores	vie 30/05/25	vie 30/05/25	0 días
860	**Sí**	**860**		**CORREDORES (K1+680 - K1+800)**	**vie 30/05/25**	**mar 9/06/26**	**314 días**
861	**Sí**	**861**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+680 - K1+800)**	**vie 30/05/25**	**jue 2/10/25**	**106 días**
862	No	862		Inicio de Calzada	vie 30/05/25	vie 30/05/25	0 días
863	Sí	863	UE43	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 30/05/25	mar 12/08/25	61 días
864	No	864		Excavación	vie 30/05/25	jue 17/07/25	40 días
865	No	865		Mejoramiento con Rajón	mié 25/06/25	vie 18/07/25	20 días
866	No	866		Subbase Granular SBG-A	vie 18/07/25	mar 12/08/25	20 días
867	No	867	UE44	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 12/08/25	jue 4/09/25	20 días
868	No	868	UE45	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 19/08/25	jue 2/10/25	40 días
869	No	869		Fin de Calzada	jue 2/10/25	jue 2/10/25	0 días
870	**Sí**	**870**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+680 - K1+800)**	**mié 28/01/26**	**mar 9/06/26**	**110 días**
871	No	871		Inicio de Calzada	mié 28/01/26	mié 28/01/26	0 días
872	Sí	872	UE223A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 28/01/26	jue 26/03/26	50 días
873	No	873		Excavación	mié 28/01/26	sáb 14/03/26	40 días
874	No	874		Mejoramiento con Rajón	mié 25/02/26	jue 19/03/26	20 días
875	No	875		Subbase Granular SBG-A	mar 3/03/26	jue 26/03/26	20 días
876	No	876	UE224A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 26/03/26	mar 21/04/26	20 días
877	No	877	UE225A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 21/04/26	mar 9/06/26	40 días
878	No	878		Fin de Calzada	mar 9/06/26	mar 9/06/26	0 días
879	**Sí**	**879**		**CORREDORES (K1+800 - K1+920)**	**mié 11/06/25**	**vie 22/05/26**	**290 días**
880	**Sí**	**880**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+800 - K1+920)**	**mié 11/06/25**	**jue 2/10/25**	**96 días**
881	No	881		Inicio de Calzada	mié 11/06/25	mié 11/06/25	0 días
882	Sí	882	UE46	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 11/06/25	sáb 23/08/25	61 días
883	No	883		Excavación	mié 11/06/25	mar 29/07/25	40 días
884	No	884		Mejoramiento con Rajón	mar 8/07/25	mié 30/07/25	20 días
885	No	885		Subbase Granular SBG-A	mié 30/07/25	sáb 23/08/25	20 días
886	No	886	UE47	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 12/08/25	jue 4/09/25	20 días
887	No	887	UE48	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 19/08/25	jue 2/10/25	40 días
888	No	888		Fin de Calzada	jue 2/10/25	jue 2/10/25	0 días
889	**Sí**	**889**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+800 - K1+920)**	**mié 28/01/26**	**vie 22/05/26**	**96 días**
890	No	890		Inicio de Calzada	mié 28/01/26	mié 28/01/26	0 días
891	Sí	891	UE226A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 28/01/26	mié 1/04/26	55 días
892	No	892		Excavación	mié 28/01/26	sáb 14/03/26	40 días
893	No	893		Mejoramiento con Rajón	mié 25/02/26	jue 19/03/26	20 días
894	No	894		Subbase Granular SBG-A	lun 9/03/26	mié 1/04/26	20 días
895	No	895	UE227A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 10/03/26	lun 6/04/26	20 días
896	No	896	UE228A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 6/04/26	vie 22/05/26	40 días
897	No	897		Fin de Calzada	vie 22/05/26	vie 22/05/26	0 días
898	**Sí**	**898**		**CORREDORES (K1+920 - K2+040)**	**sáb 24/05/25**	**mar 17/11/26**	**453 días**
899	**Sí**	**899**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K1+920 - K2+040)**	**sáb 24/05/25**	**mar 17/11/26**	**453 días**
900	No	900		Inicio de Calzada	sáb 24/05/25	sáb 24/05/25	0 días
901	Sí	901	UE49	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 24/05/25	jue 17/07/25	45 días
902	No	902		Excavación	sáb 24/05/25	mar 24/06/25	25 días
903	No	903		Mejoramiento con Rajón	mar 24/06/25	lun 7/07/25	10 días
904	No	904		Subbase Granular SBG-A	lun 7/07/25	jue 17/07/25	10 días
905	No	905	UE50	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 17/07/25	jue 28/08/25	35 días
906	No	906	UE51	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 28/08/25	mar 14/10/25	40 días
907	No	907		Fin de Calzada	mar 14/10/25	mar 14/10/25	0 días
908	No	908		Inicio de Calzada	jue 20/08/26	jue 20/08/26	0 días
909	Sí	909	UE49	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 20/08/26	mar 22/09/26	29 días
910	No	910		Excavación	jue 20/08/26	vie 11/09/26	20 días
911	No	911		Mejoramiento con Rajón	lun 7/09/26	mié 16/09/26	8 días
912	No	912		Subbase Granular SBG-A	sáb 12/09/26	mar 22/09/26	8 días
913	No	913	UE50	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 18/09/26	mié 21/10/26	28 días
914	No	914	UE51	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 8/10/26	mar 17/11/26	32 días
915	No	915		Fin de Calzada	mar 17/11/26	mar 17/11/26	0 días
916	**Sí**	**916**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K1+920 - K2+040)**	**mié 28/01/26**	**mié 2/09/26**	**180 días**
917	No	917		Inicio de Calzada	mié 28/01/26	mié 28/01/26	0 días
918	Sí	918	UE229A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 28/01/26	mié 27/05/26	100 días
919	No	919		Excavación	mié 28/01/26	sáb 14/03/26	40 días
920	No	920		Mejoramiento con Rajón	jue 26/03/26	mar 21/04/26	20 días
921	No	921		Subbase Granular SBG-A	lun 4/05/26	mié 27/05/26	20 días
922	No	922	UE230A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 9/06/26	vie 3/07/26	20 días
923	No	923	UE231A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 16/07/26	mié 2/09/26	40 días
924	No	924		Fin de Calzada	mié 2/09/26	mié 2/09/26	0 días
925	**Sí**	**925**		**CORREDORES (K2+040 - K2+160)**	**jue 9/04/26**	**mié 30/12/26**	**221 días**
926	**Sí**	**926**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+040 - K2+160)**	**sáb 5/09/26**	**mié 30/12/26**	**98 días**
927	No	927		Inicio de Calzada	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	0 días
928	Sí	928	UE52	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 5/09/26	lun 9/11/26	55 días
929	No	929		Excavación	sáb 5/09/26	mié 21/10/26	40 días
930	No	930		Mejoramiento con Rajón	sáb 3/10/26	mar 27/10/26	20 días
931	No	931		Subbase Granular SBG-A	vie 16/10/26	lun 9/11/26	20 días
932	No	932	UE53	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 27/10/26	vie 20/11/26	20 días
933	No	933	UE54	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 12/11/26	mié 30/12/26	40 días
934	No	934		Fin de Calzada	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días
935	**Sí**	**935**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+040 - K2+160)**	**jue 9/04/26**	**jue 24/09/26**	**140 días**
936	No	936		Inicio de Calzada	jue 9/04/26	jue 9/04/26	0 días
937	Sí	937	UE232A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 9/04/26	vie 28/08/26	116 días
938	No	938		Excavación	jue 9/04/26	mié 27/05/26	40 días
939	No	939		Mejoramiento con Rajón	mar 4/08/26	vie 28/08/26	20 días
940	No	940		Subbase Granular SBG-A	mar 4/08/26	vie 28/08/26	20 días
941	No	941	UE233A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 6/08/26	lun 31/08/26	20 días
942	No	942	UE234A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 10/08/26	jue 24/09/26	40 días
943	No	943		Fin de Calzada	jue 24/09/26	jue 24/09/26	0 días
944	**Sí**	**944**		**CORREDORES (K2+160 - K2+280)**	**lun 22/06/26**	**mié 9/12/26**	**142 días**
945	**Sí**	**945**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+160 - K2+280)**	**mié 7/10/26**	**mié 9/12/26**	**52 días**

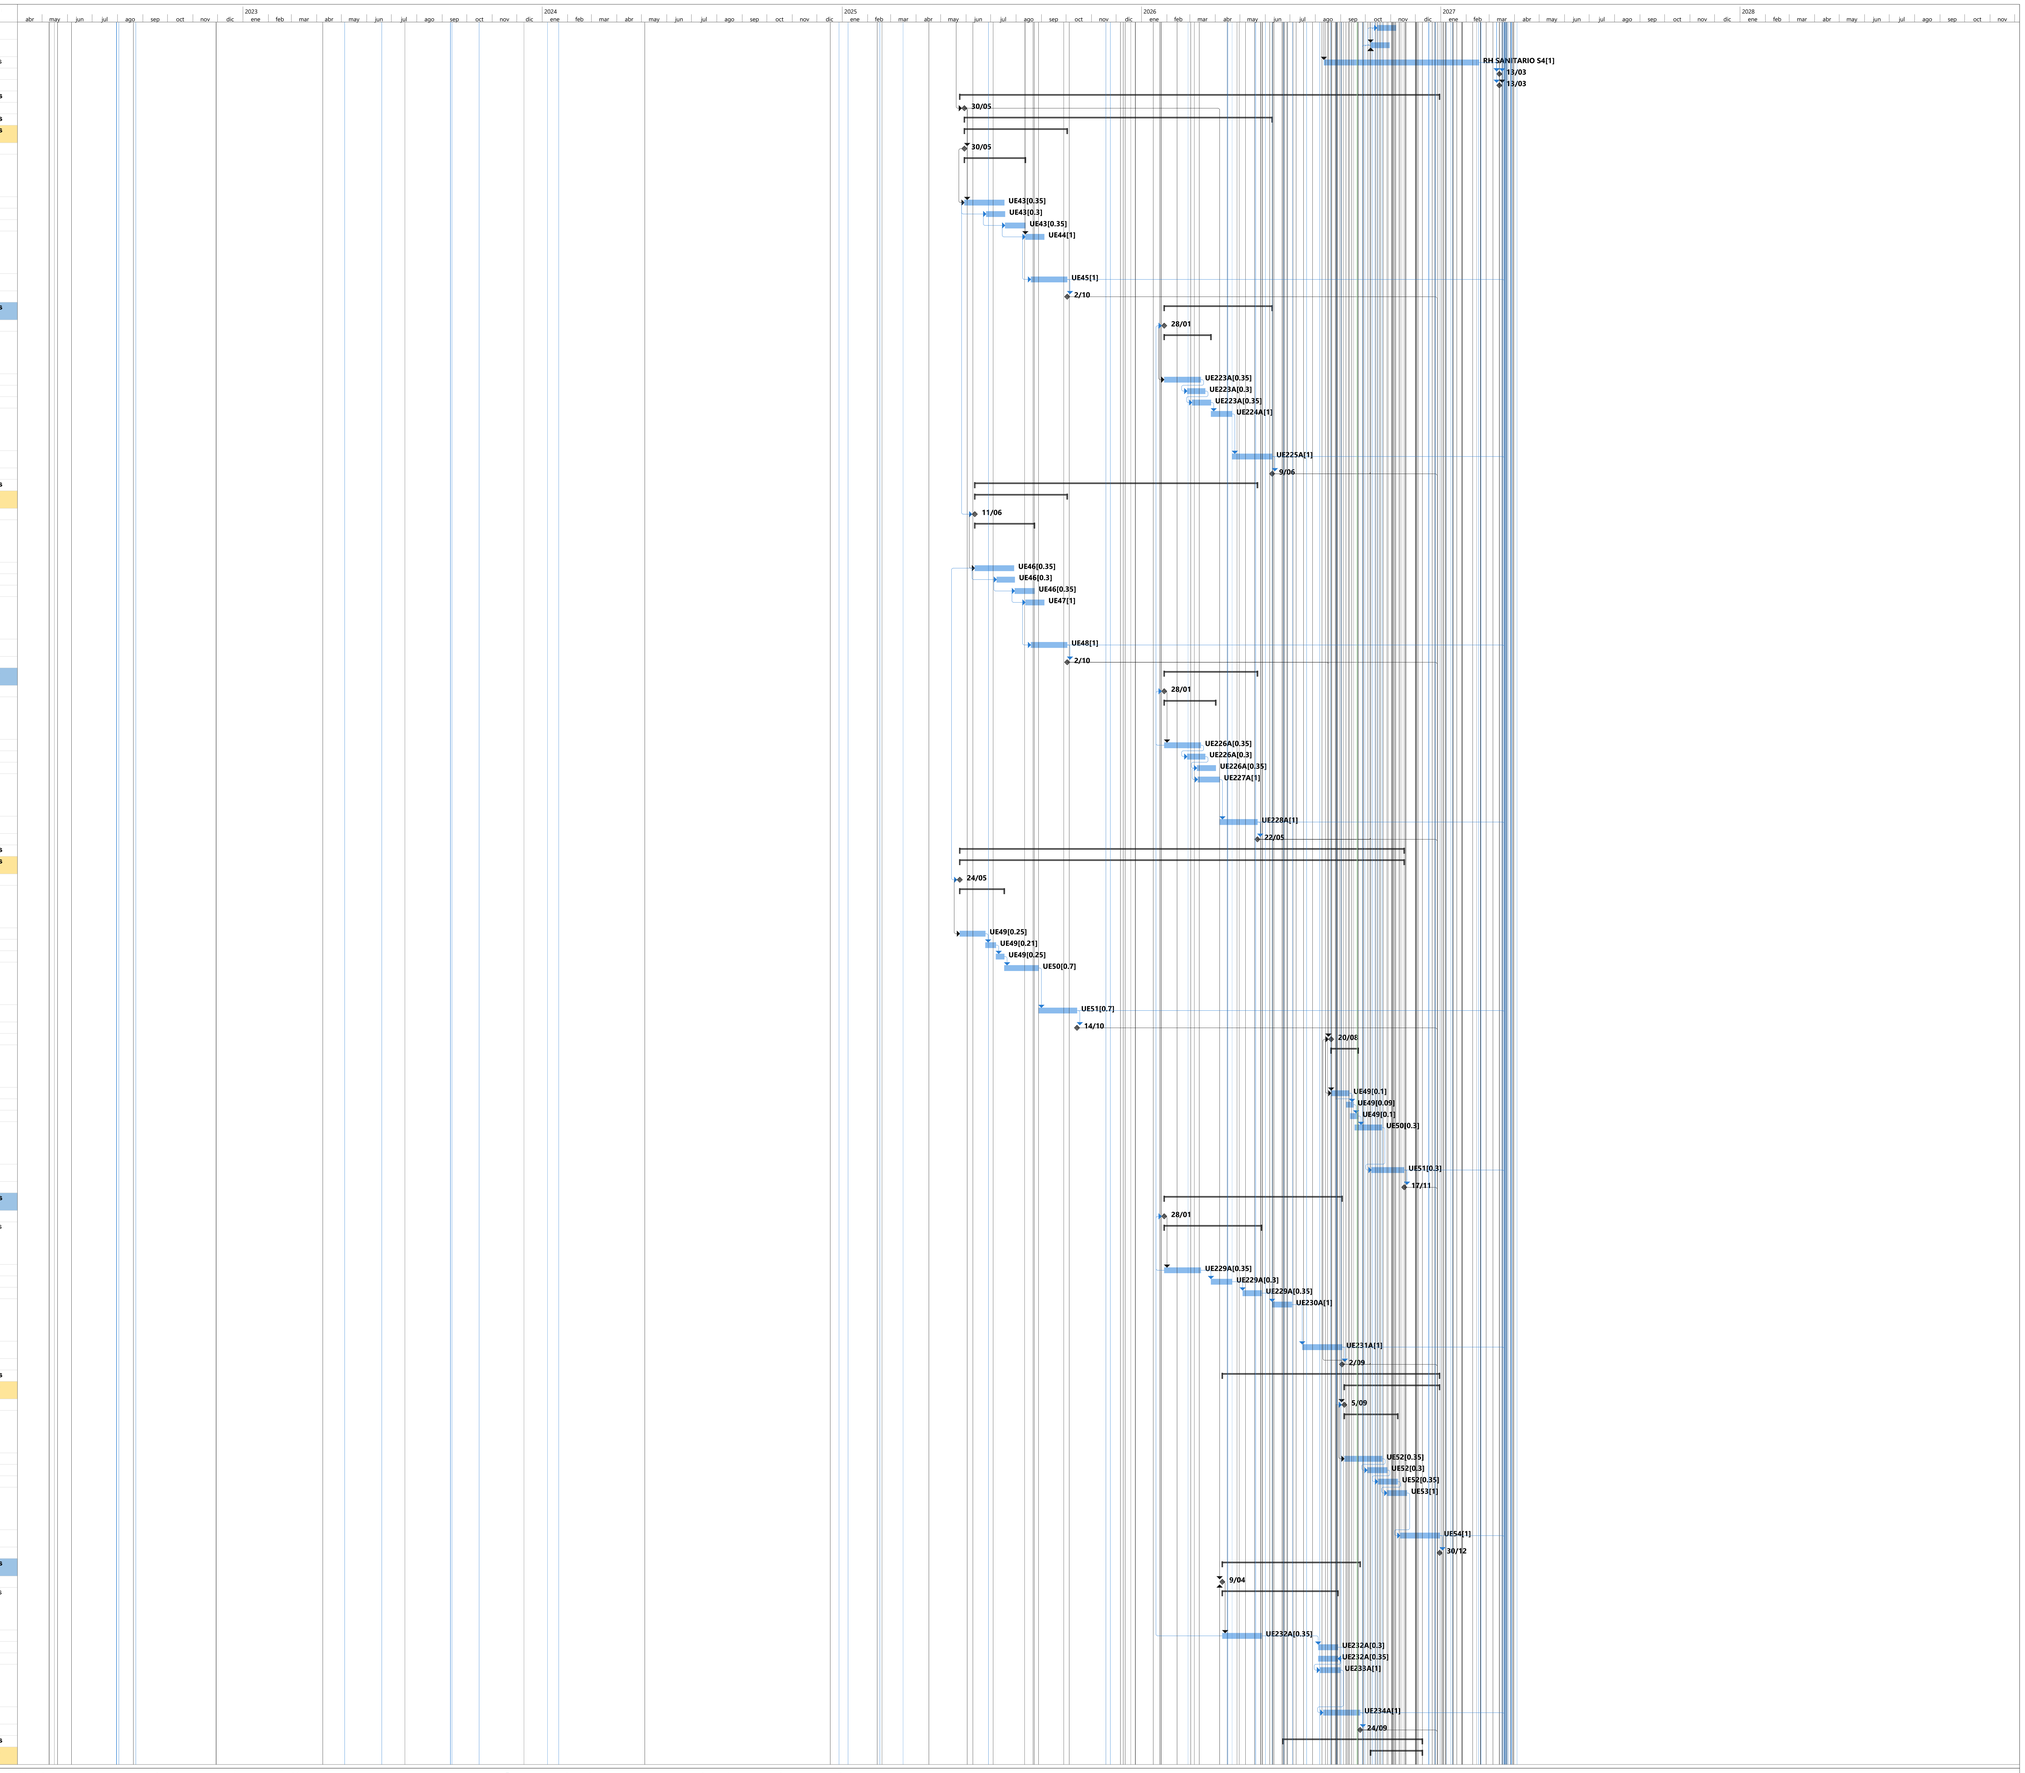

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
946	No	946		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	sáb 10/10/26	sáb 10/10/26	0 días
947	Sí	947	UE55	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 10/10/26	sáb 14/11/26	29 días
948	No	948		Excavación	sáb 10/10/26	mar 10/11/26	25 días
949	No	949		Mejoramiento con Rajón	mar 27/10/26	mié 11/11/26	13 días
950	No	950		Subbase Granular SBG-A	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	13 días
951	No	951	UE56	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 3/11/26	jue 19/11/26	13 días
952	No	952	UE57	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 6/11/26	mié 9/12/26	27 días
953	No	953		Fin de Calzada	mié 9/12/26	mié 9/12/26	0 días
954	No	954		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	mié 7/10/26	mié 7/10/26	0 días
955	Sí	955	UE55	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 7/10/26	mié 4/11/26	23 días
956	No	956		Excavación	mié 7/10/26	lun 26/10/26	15 días
957	No	957		Mejoramiento con Rajón	vie 16/10/26	jue 29/10/26	12 días
958	No	958		Subbase Granular SBG-A	mié 21/10/26	mié 4/11/26	12 días
959	No	959	UE56	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 27/10/26	mié 11/11/26	12 días
960	No	960	UE57	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 4/11/26	lun 23/11/26	15 días
961	No	961		Fin de Calzada	lun 23/11/26	lun 23/11/26	0 días
962	**Sí**	**962**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+160 - K2+280)**	**lun 22/06/26**	**mié 30/09/26**	**84 días**
963	No	963		Inicio de Calzada	lun 22/06/26	lun 22/06/26	0 días
964	Sí	964	UE235A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 22/06/26	mié 19/08/26	46 días
965	No	965		Excavación	lun 22/06/26	mar 11/08/26	40 días
966	No	966		Mejoramiento con Rajón	mié 22/07/26	vie 14/08/26	20 días
967	No	967		Subbase Granular SBG-A	vie 24/07/26	mié 19/08/26	20 días
968	No	968	UE236A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 28/07/26	vie 21/08/26	20 días
969	No	969	UE237A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
970	No	970		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
971	**Sí**	**971**		**CORREDORES (K2+280 - K2+400)**	**mar 16/06/26**	**mié 16/12/26**	**153 días**
972	**Sí**	**972**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+280 - K2+400)**	**jue 15/10/26**	**mié 16/12/26**	**52 días**
973	No	973		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días
974	Sí	974	UE58	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 19/10/26	lun 23/11/26	29 días
975	No	975		Excavación	lun 19/10/26	mié 18/11/26	25 días
976	No	976		Mejoramiento con Rajón	mar 3/11/26	jue 19/11/26	13 días
977	No	977		Subbase Granular SBG-A	vie 6/11/26	lun 23/11/26	13 días
978	No	978	UE59	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 10/11/26	mié 25/11/26	13 días
979	No	979	UE60	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 13/11/26	mié 16/12/26	27 días
980	No	980		Fin de Calzada	mié 16/12/26	mié 16/12/26	0 días
981	No	981		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	jue 15/10/26	jue 15/10/26	0 días
982	Sí	982	UE58	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 15/10/26	mié 11/11/26	23 días
983	No	983		Excavación	jue 15/10/26	sáb 31/10/26	15 días
984	No	984		Mejoramiento con Rajón	jue 22/10/26	vie 6/11/26	12 días
985	No	985		Subbase Granular SBG-A	mar 27/10/26	mié 11/11/26	12 días
986	No	986	UE59	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 4/11/26	jue 19/11/26	12 días
987	No	987	UE60	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 11/11/26	lun 30/11/26	15 días
988	No	988		Fin de Calzada	lun 30/11/26	lun 30/11/26	0 días
989	**Sí**	**989**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+280 - K2+400)**	**mar 16/06/26**	**vie 25/09/26**	**85 días**
990	No	990		Inicio de Calzada	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 días
991	Sí	991	UE238A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 16/06/26	lun 24/08/26	55 días
992	No	992		Excavación	mar 16/06/26	mar 4/08/26	40 días
993	No	993		Mejoramiento con Rajón	jue 16/07/26	mar 11/08/26	20 días
994	No	994		Subbase Granular SBG-A	mié 29/07/26	lun 24/08/26	20 días
995	No	995	UE239A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 4/08/26	vie 28/08/26	20 días
996	No	996	UE240A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 11/08/26	vie 25/09/26	40 días
997	No	997		Fin de Calzada	vie 25/09/26	vie 25/09/26	0 días
998	**Sí**	**998**		**CORREDORES (K2+400 - K2+520)**	**mié 3/06/26**	**mié 23/12/26**	**169 días**
999	**Sí**	**999**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+400 - K2+520)**	**mié 21/10/26**	**mié 23/12/26**	**52 días**
1000	No	1000		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días
1001	Sí	1001	UE61	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 26/10/26	lun 30/11/26	29 días
1002	No	1002		Excavación	lun 26/10/26	mié 25/11/26	25 días
1003	No	1003		Mejoramiento con Rajón	mar 10/11/26	mié 25/11/26	13 días
1004	No	1004		Subbase Granular SBG-A	vie 13/11/26	lun 30/11/26	13 días
1005	No	1005	UE62	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 18/11/26	mié 2/12/26	13 días
1006	No	1006	UE63	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 21/11/26	mié 23/12/26	27 días
1007	No	1007		Fin de Calzada	mié 23/12/26	mié 23/12/26	0 días
1008	No	1008		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días
1009	Sí	1009	UE61	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 22/10/26	jue 19/11/26	23 días
1010	No	1010		Excavación	jue 22/10/26	lun 9/11/26	15 días
1011	No	1011		Mejoramiento con Rajón	jue 29/10/26	vie 13/11/26	12 días
1012	No	1012		Subbase Granular SBG-A	mié 4/11/26	jue 19/11/26	12 días
1013	No	1013	UE62	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 11/11/26	mié 25/11/26	12 días
1014	No	1014	UE63	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 19/11/26	sáb 5/12/26	15 días
1015	No	1015		Fin de Calzada	sáb 5/12/26	sáb 5/12/26	0 días
1016	**Sí**	**1016**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+400 - K2+520)**	**mié 3/06/26**	**mié 30/09/26**	**99 días**
1017	No	1017		Inicio de Calzada	mié 3/06/26	mié 3/06/26	0 días
1018	Sí	1018	UE241A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 3/06/26	mar 11/08/26	55 días
1019	No	1019		Excavación	mié 3/06/26	jue 23/07/26	40 días
1020	No	1020		Mejoramiento con Rajón	sáb 4/07/26	mié 29/07/26	20 días
1021	No	1021		Subbase Granular SBG-A	jue 16/07/26	mar 11/08/26	20 días
1022	No	1022	UE242A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 23/07/26	mar 18/08/26	20 días
1023	No	1023	UE243A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
1024	No	1024		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1025	**Sí**	**1025**		**CORREDORES (K2+520 - K2+640)**	**mié 3/06/26**	**mié 30/12/26**	**175 días**
1026	**Sí**	**1026**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+520 - K2+640)**	**mié 28/10/26**	**mié 30/12/26**	**52 días**
1027	No	1027		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	sáb 31/10/26	sáb 31/10/26	0 días
1028	Sí	1028	UE64	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 31/10/26	sáb 5/12/26	29 días
1029	No	1029		Excavación	sáb 31/10/26	mar 1/12/26	25 días
1030	No	1030		Mejoramiento con Rajón	mié 18/11/26	mié 2/12/26	13 días
1031	No	1031		Subbase Granular SBG-A	sáb 21/11/26	sáb 5/12/26	13 días

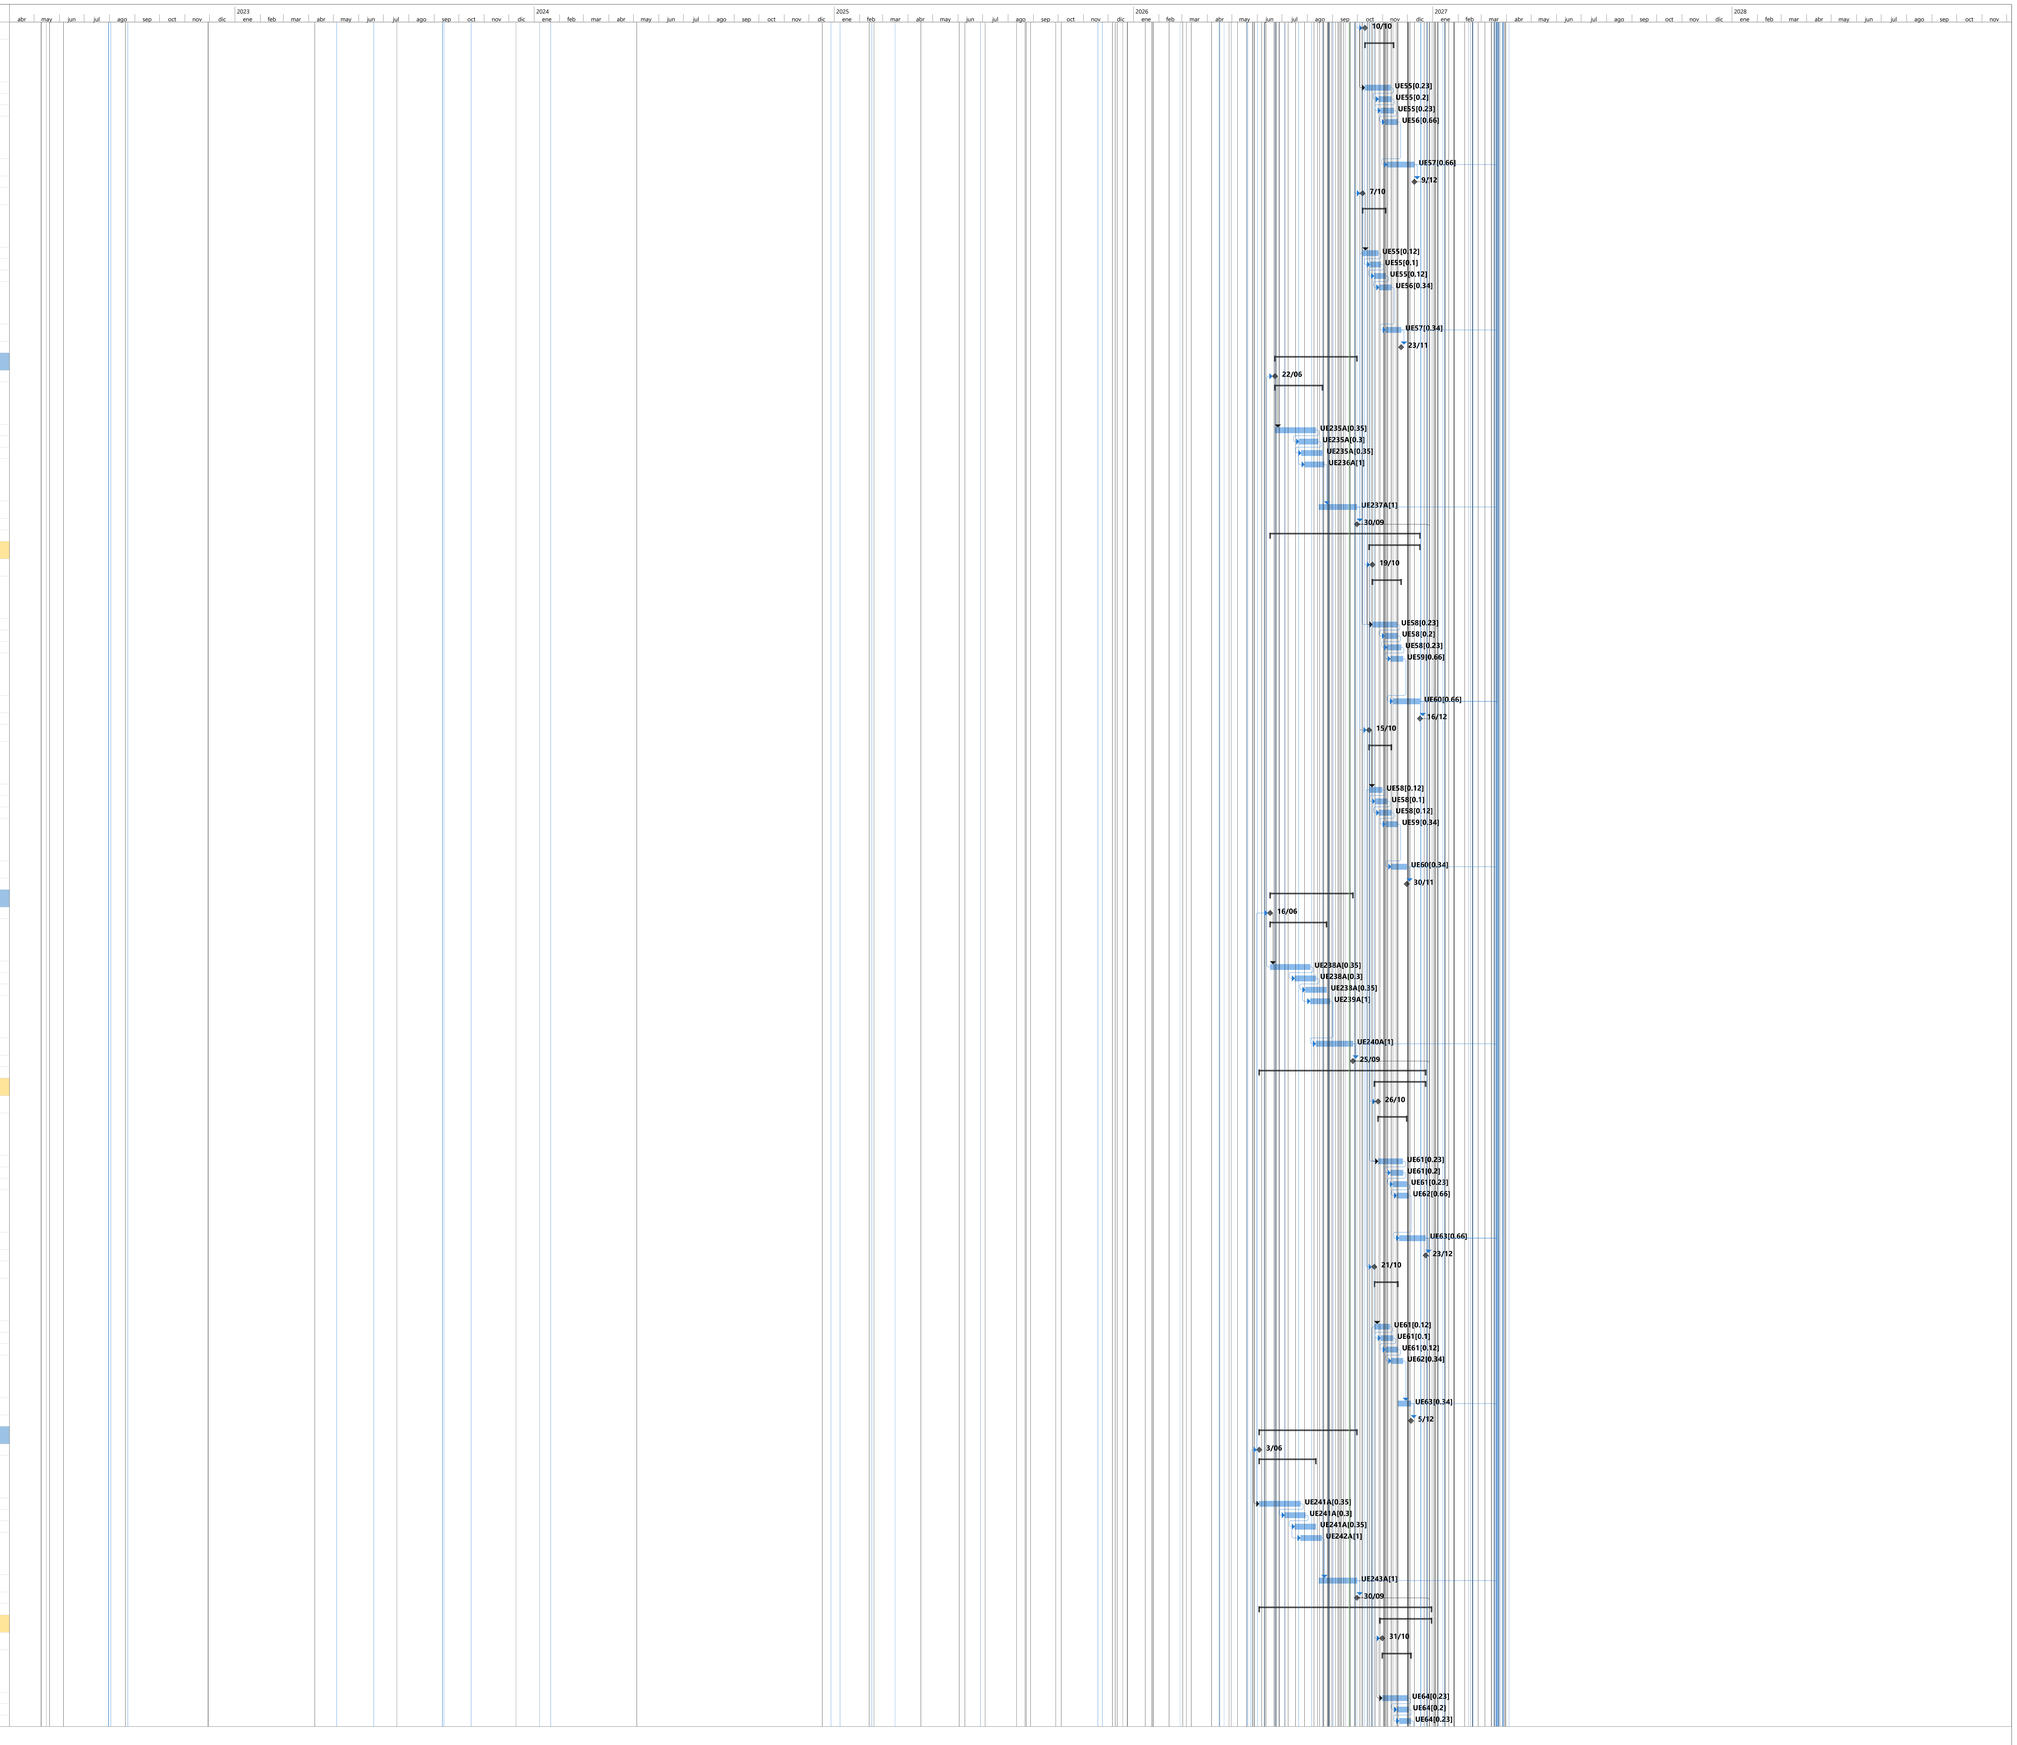

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1032	No	1032	UE65	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 25/11/26	jue 10/12/26	13 días
1033	No	1033	UE66	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 27/11/26	mié 30/12/26	27 días
1034	No	1034		Fin de Calzada	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días
1035	No	1035		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	mié 28/10/26	mié 28/10/26	0 días
1036	Sí	1036	UE64	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 28/10/26	mié 25/11/26	23 días
1037	No	1037		Excavación	mié 28/10/26	mar 17/11/26	15 días
1038	No	1038		Mejoramiento con Rajón	vie 6/11/26	vie 20/11/26	12 días
1039	No	1039		Subbase Granular SBG-A	mié 11/11/26	mié 25/11/26	12 días
1040	No	1040	UE65	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 19/11/26	mié 2/12/26	12 días
1041	No	1041	UE66	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 26/11/26	lun 14/12/26	15 días
1042	No	1042		Fin de Calzada	lun 14/12/26	lun 14/12/26	0 días
1043	**Sí**	**1043**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+920 - K2+640)**	**mié 3/06/26**	**mié 30/09/26**	**99 días**
1044	No	1044		Inicio de Calzada	mié 3/06/26	mié 3/06/26	0 días
1045	Sí	1045	UE244A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 3/06/26	mar 11/08/26	55 días
1046	No	1046		Excavación	mié 3/06/26	jue 23/07/26	40 días
1047	No	1047		Mejoramiento con Rajón	sáb 4/07/26	mié 29/07/26	20 días
1048	No	1048		Subbase Granular SBG-A	jue 16/07/26	mar 11/08/26	20 días
1049	No	1049	UE245A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 23/07/26	mar 18/08/26	20 días
1050	No	1050	UE246A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
1051	No	1051		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1052	**Sí**	**1052**		**CORREDORES (K2+640 - K2+760)**	**mié 29/07/26**	**mié 30/12/26**	**130 días**
1053	**Sí**	**1053**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+640 - K2+760)**	**mié 28/10/26**	**mié 30/12/26**	**52 días**
1054	No	1054		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	sáb 31/10/26	sáb 31/10/26	0 días
1055	Sí	1055	UE67	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 31/10/26	sáb 5/12/26	29 días
1056	No	1056		Excavación	sáb 31/10/26	mar 1/12/26	25 días
1057	No	1057		Mejoramiento con Rajón	mié 18/11/26	mié 2/12/26	13 días
1058	No	1058		Subbase Granular SBG-A	sáb 21/11/26	sáb 5/12/26	13 días
1059	No	1059	UE68	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 25/11/26	jue 10/12/26	13 días
1060	No	1060	UE69	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 27/11/26	mié 30/12/26	27 días
1061	No	1061		Fin de Calzada	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días
1062	No	1062		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	mié 28/10/26	mié 28/10/26	0 días
1063	Sí	1063	UE67	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 28/10/26	mié 25/11/26	23 días
1064	No	1064		Excavación	mié 28/10/26	mar 17/11/26	15 días
1065	No	1065		Mejoramiento con Rajón	vie 6/11/26	vie 20/11/26	12 días
1066	No	1066		Subbase Granular SBG-A	mié 11/11/26	mié 25/11/26	12 días
1067	No	1067	UE68	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 19/11/26	mié 2/12/26	12 días
1068	No	1068	UE69	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 26/11/26	lun 14/12/26	15 días
1069	No	1069		Fin de Calzada	lun 14/12/26	lun 14/12/26	0 días
1070	**Sí**	**1070**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+640 - K2+760)**	**mié 29/07/26**	**mié 30/09/26**	**54 días**
1071	No	1071		Inicio de Calzada	mié 29/07/26	mié 29/07/26	0 días
1072	Sí	1072	UE247A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 29/07/26	jue 17/09/26	42 días
1073	No	1073		Excavación	mié 29/07/26	mar 15/09/26	40 días
1074	No	1074		Mejoramiento con Rajón	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
1075	No	1075		Subbase Granular SBG-A	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
1076	No	1076	UE248A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
1077	No	1077	UE249A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 26/08/26	mié 30/09/26	32 días
1078	No	1078		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1079	**Sí**	**1079**		**CORREDORES (K2+760 - K2+880)**	**lun 6/04/26**	**mié 23/12/26**	**219 días**
1080	**Sí**	**1080**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+760 - K2+880)**	**mié 21/10/26**	**mié 23/12/26**	**52 días**
1081	No	1081		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días
1082	Sí	1082	UE70	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 26/10/26	lun 30/11/26	29 días
1083	No	1083		Excavación	lun 26/10/26	mié 25/11/26	25 días
1084	No	1084		Mejoramiento con Rajón	mar 10/11/26	mié 25/11/26	13 días
1085	No	1085		Subbase Granular SBG-A	vie 13/11/26	lun 30/11/26	13 días
1086	No	1086	UE71	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 18/11/26	mié 2/12/26	13 días
1087	No	1087	UE72	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 21/11/26	mié 23/12/26	27 días
1088	No	1088		Fin de Calzada	mié 23/12/26	mié 23/12/26	0 días
1089	No	1089		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días
1090	Sí	1090	UE70	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 22/10/26	jue 19/11/26	23 días
1091	No	1091		Excavación	jue 22/10/26	lun 9/11/26	15 días
1092	No	1092		Mejoramiento con Rajón	jue 29/10/26	vie 13/11/26	12 días
1093	No	1093		Subbase Granular SBG-A	mié 4/11/26	jue 19/11/26	12 días
1094	No	1094	UE71	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 6/11/26	vie 20/11/26	12 días
1095	No	1095	UE72	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 13/11/26	mar 1/12/26	15 días
1096	No	1096		Fin de Calzada	mar 1/12/26	mar 1/12/26	0 días
1097	**Sí**	**1097**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+760 - K2+880)**	**lun 6/04/26**	**mié 30/09/26**	**149 días**
1098	No	1098		Inicio de Calzada	lun 6/04/26	lun 6/04/26	0 días
1099	Sí	1099	UE250A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 29/07/26	jue 17/09/26	42 días
1100	No	1100		Excavación	mié 29/07/26	mar 15/09/26	40 días
1101	No	1101		Mejoramiento con Rajón	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
1102	No	1102		Subbase Granular SBG-A	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
1103	No	1103	UE251A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
1104	No	1104	UE252A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 26/08/26	mié 30/09/26	32 días
1105	No	1105		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1106	**Sí**	**1106**		**CORREDORES (K2+880 - K3+000)**	**vie 20/03/26**	**mié 16/12/26**	**223 días**
1107	**Sí**	**1107**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K2+880 - K3+000)**	**jue 15/10/26**	**mié 16/12/26**	**52 días**
1108	No	1108		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días
1109	Sí	1109	UE73	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 19/10/26	lun 23/11/26	29 días
1110	No	1110		Excavación	lun 19/10/26	mié 18/11/26	25 días
1111	No	1111		Mejoramiento con Rajón	mar 3/11/26	jue 19/11/26	13 días
1112	No	1112		Subbase Granular SBG-A	vie 6/11/26	lun 23/11/26	13 días
1113	No	1113	UE74	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 10/11/26	mié 25/11/26	13 días
1114	No	1114	UE75	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 13/11/26	mié 16/12/26	27 días
1115	No	1115		Fin de Calzada	mié 16/12/26	mié 16/12/26	0 días
1116	No	1116		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	jue 15/10/26	jue 15/10/26	0 días
1117	Sí	1117	UE73	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 15/10/26	mié 11/11/26	23 días



Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1118	No	1118		Excavación	jue 15/10/26	sáb 31/10/26	15 días
1119	No	1119		Mejoramiento con Rajón	jue 22/10/26	vie 6/11/26	12 días
1120	No	1120		Subbase Granular SBG-A	mar 27/10/26	mié 11/11/26	12 días
1121	No	1121	UE74	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 4/11/26	jue 19/11/26	12 días
1122	No	1122	UE75	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 11/11/26	lun 30/11/26	15 días
1123	No	1123		Fin de Calzada	lun 30/11/26	lun 30/11/26	0 días
1124	**Sí**	**1124**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K2+880 - K3+000)**	**vie 20/03/26**	**jue 23/07/26**	**100 días**
1125	No	1125		Inicio de Calzada	vie 20/03/26	vie 20/03/26	0 días
1126	Sí	1126	UE253A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 20/03/26	jue 28/05/26	55 días
1127	No	1127		Excavación	vie 20/03/26	sáb 9/05/26	40 días
1128	No	1128		Mejoramiento con Rajón	mié 22/04/26	vie 15/05/26	20 días
1129	No	1129		Subbase Granular SBG-A	mar 5/05/26	jue 28/05/26	20 días
1130	No	1130	UE254A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 11/05/26	mié 3/06/26	20 días
1131	No	1131	UE255A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 3/06/26	jue 23/07/26	40 días
1132	No	1132		Fin de Calzada	jue 23/07/26	jue 23/07/26	0 días
1133	**Sí**	**1133**		**CORREDORES (K3+000 - K3+120)**	**mar 10/03/26**	**lun 30/11/26**	**220 días**
1134	**Sí**	**1134**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K3+000 - K3+120)**	**lun 4/05/26**	**lun 30/11/26**	**176 días**
1135	No	1135		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector norte)	sáb 10/10/26	sáb 10/10/26	0 días
1136	SÍ	1136	UE76	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 10/10/26	sáb 14/11/26	29 días
1137	No	1137		Excavación	sáb 10/10/26	mar 10/11/26	25 días
1138	No	1138		Mejoramiento con Rajón	mar 27/10/26	mié 11/11/26	13 días
1139	No	1139		Subbase Granular SBG-A	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	13 días
1140	No	1140	UE77	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 3/11/26	jue 19/11/26	13 días
1141	No	1141	UE78	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 6/11/26	lun 30/11/26	20 días
1142	No	1142		Fin de Calzada	lun 30/11/26	lun 30/11/26	0 días
1143	No	1143		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector norte)	mié 7/10/26	mié 7/10/26	0 días
1144	SÍ	1144	UE76	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 7/10/26	mié 4/11/26	23 días
1145	No	1145		Excavación	mié 7/10/26	lun 26/10/26	15 días
1146	No	1146		Mejoramiento con Rajón	vie 16/10/26	jue 29/10/26	12 días
1147	No	1147		Subbase Granular SBG-A	mié 21/10/26	mié 4/11/26	12 días
1148	No	1148	UE77	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 27/10/26	mié 11/11/26	12 días
1149	No	1149	UE78	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 4/11/26	lun 23/11/26	15 días
1150	No	1150		Fin de Calzada	lun 4/05/26	lun 4/05/26	0 días
1151	**Sí**	**1151**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K3+000 - K3+120)**	**mar 10/03/26**	**jue 9/07/26**	**100 días**
1152	No	1152		Inicio de Calzada	mar 10/03/26	mar 10/03/26	0 días
1153	SÍ	1153	UE256A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 10/03/26	vie 15/05/26	55 días
1154	No	1154		Excavación	mar 10/03/26	mar 28/04/26	40 días
1155	No	1155		Mejoramiento con Rajón	vie 10/04/26	mar 5/05/26	20 días
1156	No	1156		Subbase Granular SBG-A	mié 22/04/26	vie 15/05/26	20 días
1157	No	1157	UE257A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 28/04/26	vie 22/05/26	20 días
1158	No	1158	UE258A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 22/05/26	jue 9/07/26	40 días
1159	No	1159		Fin de Calzada	jue 9/07/26	jue 9/07/26	0 días
1160	No	1160		Fin de Corredores	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días
1161	**Sí**	**1161**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**mar 21/07/26**	**vie 19/03/27**	**206 días**
1162	No	1162		Inicio Espacio Público	jue 22/10/26	jue 22/10/26	0 días
1163	**Sí**	**1163**		**Espacio Publico ESTACION SERVICIO TERPEL - CALLE 8**	**jue 22/10/26**	**vie 19/03/27**	**125 días**
1164	No	1164	UE301	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 22/10/26	lun 8/02/27	90 días
1165	No	1165	UE302	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 10/12/26	sáb 13/03/27	80 días
1166	**Sí**	**1166**		**Bocacalle Transversal 11C Costado occidental**	**mié 17/03/27**	**vie 19/03/27**	**2 días**
1167	No	1167	UE301	Capas Granulares	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
1168	No	1168	UE302	Carpeta Asfáltica	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
1169	**Sí**	**1169**		**Bocacalle Calle 8 Sur Costado occidental**	**lun 15/03/27**	**mié 17/03/27**	**2 días**
1170	No	1170	UE301	Capas Granulares	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1171	No	1171	UE302	Carpeta Asfáltica	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
1172	**Sí**	**1172**		**Espacio Publico CALLE 8 SUR - CALLE 12 SUR**	**mar 21/07/26**	**jue 18/03/27**	**205 días**
1173	No	1173	UE303	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 22/10/26	sáb 13/03/27	120 días
1174	No	1174	UE304	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 17/11/26	sáb 13/03/27	100 días
1175	**Sí**	**1175**		**Espacio Publico CALLE 8 SUR - CALLE 12 SUR (Plazoleta puente Humedal)**	**mar 21/07/26**	**lun 28/09/26**	**60 días**
1176	No	1176	UE303	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 21/07/26	mié 26/08/26	30 días
1177	No	1177	UE304	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mié 26/08/26	lun 28/09/26	30 días
1178	**Sí**	**1178**		**Bocacalle Calle 11 Sur Costado occidental**	**mar 16/03/27**	**jue 18/03/27**	**2 días**
1179	No	1179	UE303	Capas Granulares	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
1180	No	1180	UE304	Carpeta Asfáltica	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
1181	**Sí**	**1181**		**Bocacalle Calle 12 Sur Costado occidental**	**sáb 13/03/27**	**mar 16/03/27**	**2 días**
1182	No	1182	UE303	Capas Granulares	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1183	No	1183	UE304	Carpeta Asfáltica	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1184	No	1184		Fin Espacio Público	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1185	No	1185		Fin Sector 4	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
1186	**Sí**	**1186**		**Sector 5 PTE.HUMEDAL a CALLE 15S (K3+120 - K3+660)**	**vie 2/12/22**	**mar 16/03/27**	**1316 días**
1187	No	1187		Entrega de Predios por parte de la EFR	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0 días
1188	No	1188		Inicio Sector 5	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0 días
1189	**Sí**	**1189**		**PRELIMINARES**	**jue 15/12/22**	**lun 2/01/23**	**15 días**
1190	No	1190	DEMOL	Demolición de Cimentaciones	jue 15/12/22	lun 2/01/23	15 días
1191	**Sí**	**1191**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**jue 11/01/24**	**vie 21/08/26**	**801 días**
1192	No	1192		Inicio Instalación y traslado de redes	jue 11/01/24	jue 11/01/24	0 días
1193	**Sí**	**1193**		**REDES SECAS**	**lun 15/01/24**	**vie 21/08/26**	**798 días**
1194	No	1194	RS-S5	Inicio Redes Secas	lun 15/01/24	lun 15/01/24	0 días
1195	No	1195	RSEN-S5	Red ENEL	mar 18/11/25	vie 21/08/26	230 días
1196	No	1196	RSET-S5	Red ETB	lun 10/11/25	vie 14/08/26	230 días
1197	No	1197	RSM-S5	Red de Movistar	mar 14/10/25	jue 16/07/26	230 días
1198	No	1198	RSGA-S5	Red Gas (Acero)	jue 16/07/26	jue 16/07/26	0 días
1199	No	1199	RSGP-S5	Red Gas (Polietileno)	mar 14/10/25	jue 16/07/26	230 días
1200	No	1200	RS-S5	Fin Redes Secas	vie 21/08/26	vie 21/08/26	0 días
1201	**Sí**	**1201**		**REDES HUMEDAS**	**jue 11/01/24**	**jue 16/07/26**	**772 días**
1202	No	1202	RH-S5	Inicio Redes Húmedas	jue 11/01/24	jue 11/01/24	0 días
1203	No	1203	RHA-S5	Red Acueducto	mar 14/10/25	jue 16/07/26	230 días
1204	No	1204	RHP-S5	Red de Alcantarillado Pluvial	mié 13/08/25	jue 16/07/26	282 días
1205	No	1205	RHS-S5	Red de Alcantarillado Sanitario	mar 14/10/25	jue 16/07/26	230 días
1206	No	1206	RH-S5	Fin de Redes Húmedas	jue 16/07/26	jue 16/07/26	0 días
1207	No	1207	RH-S5	Fin Instalación y traslado de redes	vie 21/08/26	vie 21/08/26	0 días
1208	**Sí**	**1208**		**CORREDORES S5**	**jue 16/02/23**	**jue 26/11/26**	**1158 días**
1209	No	1209		Inicio de corredores	jue 16/02/23	jue 16/02/23	0 días
1210	**Sí**	**1210**		**CORREDORES BOGOTA -GIRARDOT (K3+120 - K3+240)**	**vie 31/05/24**	**jue 26/11/26**	**764 días**
1211	**Sí**	**1211**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K3+120 - K3+240)**	**vie 31/05/24**	**jue 26/11/26**	**764 días**
1212	No	1212		Inicio de Calzada	vie 31/05/24	vie 31/05/24	0 días
1213	SÍ	1213	UE79	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 12/02/25	mié 16/07/25	130 días
1214	No	1214		Excavación	mié 12/02/25	vie 27/06/25	114 días
1215	No	1215		Mejoramiento con Rajón	mar 10/06/25	jue 10/07/25	25 días
1216	No	1216		Subbase Granular SBG-A	lun 16/06/25	mié 16/07/25	25 días
1217	No	1217	UE80	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 14/08/25	lun 8/09/25	20 días
1218	No	1218	UE81	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 8/09/25	jue 23/10/25	40 días
1219	No	1219		Fin de Calzada	jue 23/10/25	jue 23/10/25	0 días
1220	No	1220		Inicio de Calzada	jue 16/07/26	jue 16/07/26	0 días
1221	Sí	1221	UE79	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 16/07/26	mar 20/10/26	80 días
1222	No	1222		Excavación	jue 16/07/26	jue 3/09/26	40 días
1223	No	1223		Mejoramiento con Rajón	jue 3/09/26	vie 25/09/26	20 días
1224	No	1224		Subbase Granular SBG-A	vie 25/09/26	mar 20/10/26	20 días

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1225	No	1225	UE80	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 20/10/26	sáb 7/11/26	16 días
1226	No	1226	UE81	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 7/11/26	jue 26/11/26	16 días
1227	No	1227		Fin de Calzada	jue 26/11/26	jue 26/11/26	0 días
1228	**Sí**	**1228**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K3+120 - K3+240)**	**lun 22/09/25**	**mié 11/02/26**	**119 días**
1229	No	1229		Inicio de Calzada	lun 22/09/25	lun 22/09/25	0 días
1230	Sí	1230	UE259A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 22/09/25	lun 1/12/25	59 días
1231	No	1231		Excavación	lun 22/09/25	vie 7/11/25	40 días
1232	No	1232		Mejoramiento con Rajón	mié 15/10/25	vie 7/11/25	20 días
1233	No	1233		Subbase Granular SBG-A	vie 7/11/25	lun 1/12/25	20 días
1234	No	1234	UE260A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 1/12/25	mié 24/12/25	20 días
1235	No	1235	UE261A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 24/12/25	mié 11/02/26	40 días
1236	No	1236		Fin de Calzada	mié 11/02/26	mié 11/02/26	0 días
1237	**Sí**	**1237**		**CORREDORES BOGOTA -GIRARDOT (K3+240- K3+360)**	**mié 10/09/25**	**sáb 26/09/26**	**319 días**
1238	**Sí**	**1238**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K3+240- K3+**	**jue 23/04/26**	**sáb 26/09/26**	**130 días**
1239	No	1239		Inicio de Calzada	jue 23/04/26	jue 23/04/26	0 días
1240	Sí	1240	UE82	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 23/04/26	mié 12/08/26	90 días
1241	No	1241		Excavación	jue 23/04/26	mar 23/06/26	50 días
1242	No	1242		Mejoramiento con Rajón	mié 10/06/26	lun 6/07/26	20 días
1243	No	1243		Subbase Granular SBG-A	mar 23/06/26	mié 12/08/26	40 días
1244	No	1244	UE83	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 17/07/26	mié 12/08/26	20 días
1245	No	1245	UE84	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 12/08/26	sáb 26/09/26	40 días
1246	No	1246		Fin de Calzada	sáb 26/09/26	sáb 26/09/26	0 días
1247	**Sí**	**1247**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K3+240- K3+360)**	**mié 10/09/25**	**sáb 26/09/26**	**319 días**
1248	No	1248		Inicio de Calzada	mié 10/09/25	mié 10/09/25	0 días
1249	Sí	1249	UE262A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 11/09/25	vie 21/11/25	61 días
1250	No	1250		Excavación	jue 11/09/25	lun 27/10/25	40 días
1251	No	1251		Mejoramiento con Rajón	sáb 4/10/25	mar 28/10/25	20 días
1252	No	1252		Subbase Granular SBG-A	mar 28/10/25	vie 21/11/25	20 días
1253	No	1253	UE263A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 21/11/25	mar 16/12/25	20 días
1254	No	1254	UE264A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 16/12/25	lun 2/02/26	40 días
1255	No	1255		Fin de Calzada	sáb 26/09/26	sáb 26/09/26	0 días
1256	**Sí**	**1256**		**CORREDORES BOGOTA -GIRARDOT (K3+360- K3+480)**	**sáb 30/08/25**	**mié 16/09/26**	**319 días**
1257	**Sí**	**1257**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K3+360- K3+**	**jue 23/04/26**	**mié 16/09/26**	**120 días**
1258	No	1258		Inicio de Calzada	jue 23/04/26	jue 23/04/26	0 días
1259	Sí	1259	UE85	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 23/04/26	jue 30/07/26	80 días
1260	No	1260		Excavación	jue 23/04/26	mié 10/06/26	40 días
1261	No	1261		Mejoramiento con Rajón	sáb 16/05/26	mié 10/06/26	20 días
1262	No	1262		Subbase Granular SBG-A	mié 10/06/26	jue 30/07/26	40 días
1263	No	1263	UE86	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 6/07/26	jue 30/07/26	20 días
1264	No	1264	UE87	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 30/07/26	mié 16/09/26	40 días
1265	No	1265		Fin de Calzada	mié 16/09/26	mié 16/09/26	0 días
1266	**Sí**	**1266**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K3+360- K3+480)**	**sáb 30/08/25**	**jue 22/01/26**	**121 días**
1267	No	1267		Inicio de Calzada	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	0 días
1268	Sí	1268	UE265A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 30/08/25	lun 10/11/25	61 días
1269	No	1269		Excavación	sáb 30/08/25	mié 15/10/25	40 días
1270	No	1270		Mejoramiento con Rajón	mar 23/09/25	jue 16/10/25	20 días
1271	No	1271		Subbase Granular SBG-A	jue 16/10/25	lun 10/11/25	20 días
1272	No	1272	UE266A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 10/11/25	mié 3/12/25	20 días
1273	No	1273	UE267A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 3/12/25	jue 22/01/26	40 días
1274	No	1274		Fin de Calzada	jue 22/01/26	jue 22/01/26	0 días
1275	**Sí**	**1275**		**CORREDORES BOGOTA -GIRARDOT (K3+480- K3+660)**	**mar 19/08/25**	**mar 3/11/26**	**370 días**
1276	**Sí**	**1276**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K3+480- K3+**	**sáb 11/04/26**	**mar 3/11/26**	**171 días**
1277	No	1277		Inicio de Calzada	jue 23/04/26	jue 23/04/26	0 días
1278	Sí	1278	UE88	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA EL LIMITE DE	sáb 11/04/26	mié 10/06/26	50 días
1279	No	1279		Excavación	jue 23/04/26	mié 10/06/26	40 días
1280	No	1280		Mejoramiento con Rajón	mié 29/04/26	sáb 23/05/26	20 días
1281	No	1281		Subbase Granular SBG-A	sáb 11/04/26	mar 5/05/26	20 días
1282	No	1282	UE89	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO O HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	mié 6/05/26	vie 29/05/26	20 días
1283	No	1283	UE90	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN.	vie 29/05/26	vie 17/07/26	40 días
1284	No	1284		Fin de Calzada	vie 17/07/26	vie 17/07/26	0 días
1285	No	1285		Inicio de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1286	Sí	1286	UE88	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA EL LIMITE DE	lun 28/09/26	lun 19/10/26	17 días
1287	No	1287		Excavación	mié 30/09/26	mar 13/10/26	10 días
1288	No	1288		Mejoramiento con Rajón	lun 28/09/26	jue 15/10/26	14 días
1289	No	1289		Subbase Granular SBG-A	mié 30/09/26	lun 19/10/26	15 días
1290	No	1290	UE89	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO O HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	sáb 3/10/26	mar 27/10/26	20 días
1291	No	1291	UE90	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN.	vie 9/10/26	mar 3/11/26	20 días
1292	No	1292		Fin de Calzada	mar 3/11/26	mar 3/11/26	0 días
1293	**Sí**	**1293**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K3+480- K3+660)**	**mar 19/08/25**	**mié 30/09/26**	**342 días**
1294	No	1294		Inicio de Calzada	mar 19/08/25	mar 19/08/25	0 días
1295	Sí	1295	UE268A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA LIMITE DE	mar 19/08/25	jue 8/01/26	120 días
1296	No	1296		Excavación	mar 19/08/25	vie 26/12/25	110 días
1297	No	1297		Mejoramiento con Rajón	mar 9/12/25	vie 2/01/26	20 días
1298	No	1298		Subbase Granular SBG-A	lun 15/12/25	jue 8/01/26	20 días
1299	No	1299	UE269A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO O HASTA LIMITE DE INTERVENCIÓN.	vie 19/12/25	jue 15/01/26	20 días
1300	No	1300	UE270A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA LIMITE DE INTERVENCIÓN.	jue 15/01/26	sáb 28/02/26	40 días
1301	No	1301		Fin de Calzada	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	0 días
1302	**Sí**	**1302**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K3+480- K3+660) (Afectado por colector sur**	**sáb 29/08/26**	**mié 30/09/26**	**28 días**
1303	No	1303		Inicio de Calzada	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	0 días
1304	Sí	1304	UE268A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
1305	No	1305		Excavación	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
1306	No	1306		Mejoramiento con Rajón	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
1307	No	1307		Subbase Granular SBG-A	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
1308	No	1308	UE269A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO O HASTA LIMITE DE	mié 2/09/26	jue 24/09/26	20 días
1309	No	1309	UE270A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML O HASTA LIMITE DE INTERVENCIÓN.	mar 8/09/26	mié 30/09/26	20 días
1310	No	1310		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1311	No	1311		Fin de corredores	mar 3/11/26	mar 3/11/26	0 días

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1312	**Sí**	**1312**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**mié 15/04/26**	**mar 16/03/27**	**281 días**
1313	No	1313		Inicio Espacio Público	mié 15/04/26	mié 15/04/26	0 días
1314	**Sí**	**1314**		**Espacio Publico CALLE 12 SUR - CALLE 15 SUR**	**mié 15/04/26**	**mar 16/03/27**	**281 días**
1315	No	1315	UE305	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 15/04/26	vie 18/09/26	130 días
1316	No	1316	UE306	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 27/04/26	mié 30/09/26	130 días
1317	**Sí**	**1317**		**Bocacalle Calle 13 Sur Costado occidental**	**sáb 13/03/27**	**mar 16/03/27**	**2 días**
1318	No	1318	UE305	Capas Granulares	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1319	No	1319	UE306	Carpeta Asfáltica	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1320	**Sí**	**1320**	**UE306**	**Espacio Publico sobre calle 15 Sur sentido de entrada a Soacha**	**jue 15/10/26**	**jue 18/02/27**	**106 días**
1321	**Sí**	**1321**		**Redes**	**jue 15/10/26**	**lun 21/12/26**	**56 días**
1322	No	1322	UE305	Excavaciones y entibados	jue 15/10/26	mar 3/11/26	16 días
1323	No	1323	UE305	Instalación de tuberías	mié 28/10/26	mié 18/11/26	16 días
1324	No	1324	UE305	Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	jue 12/11/26	sáb 5/12/26	20 días
1325	No	1325	UE305	Estructuras complementarias	mar 1/12/26	lun 21/12/26	16 días
1326	**Sí**	**1326**		**Espacio público**	**jue 26/11/26**	**lun 4/01/27**	**30 días**
1327	No	1327	UE305	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 26/11/26	lun 21/12/26	20 días
1328	No	1328	UE306	TERMINACION Y ACABADOS espacio público	mié 9/12/26	lun 4/01/27	20 días
1329	**Sí**	**1329**		**Construcción via**	**lun 21/12/26**	**jue 18/02/27**	**50 días**
1330	No	1330	UE305	Preliminares y Excavaciones	lun 21/12/26	vie 15/01/27	20 días
1331	No	1331	UE305	Capas Granulares	vie 8/01/27	mar 2/02/27	20 días
1332	No	1332	UE306	Carpeta Asfáltica	mié 27/01/27	jue 18/02/27	20 días
1333	**Sí**	**1333**	**UE305**	**Espacio Publico sobre calle 15 Sur sentido de Salida a Soacha**	**lun 21/12/26**	**sáb 13/03/27**	**71 días**
1334	**Sí**	**1334**		**Redes**	**lun 21/12/26**	**jue 25/02/27**	**56 días**
1335	No	1335	UE305	Excavaciones y entibados	lun 21/12/26	sáb 9/01/27	16 días
1336	No	1336	UE305	Instalación de tuberías	mié 6/01/27	lun 25/01/27	16 días
1337	No	1337	UE305	Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	mié 20/01/27	jue 11/02/27	20 días
1338	No	1338	UE305	Estructuras complementarias	lun 8/02/27	jue 25/02/27	16 días
1339	**Sí**	**1339**		**Espacio público**	**mié 27/01/27**	**mar 2/03/27**	**30 días**
1340	No	1340	UE305	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 27/01/27	jue 18/02/27	20 días
1341	No	1341	UE306	TERMINACION Y ACABADOS espacio público	lun 8/02/27	mar 2/03/27	20 días
1342	**Sí**	**1342**		**Construcción via**	**jue 18/02/27**	**sáb 13/03/27**	**21 días**
1343	No	1343	UE305	Preliminares y Excavaciones	jue 18/02/27	mié 10/03/27	18 días
1344	No	1344	UE305	Capas Granulares	sáb 27/02/27	sáb 13/03/27	13 días
1345	No	1345	UE306	Carpeta Asfáltica	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	4 días
1346	No	1346		Fin de Espacio Público	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1347	No	1347		Fin Sector 5	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
1348	**Sí**	**1348**		**Sector 6 CALLE 22 a CALLE 24 conectante KR 7 (K0+000 - K0+240)**	**mar 16/09/25**	**lun 15/03/27**	**457 días**
1349	No	1349		Entrega de Predios por parte de la EFR	mar 16/09/25	mar 16/09/25	0 días
1350	No	1350		Inicio Sector 6	mar 16/09/25	mar 16/09/25	0 días
1351	**Sí**	**1351**		**PRELIMINARES**	**mié 17/09/25**	**vie 3/10/25**	**15 días**
1352	No	1352	DEMOL	Demoliciones de cimentación	mié 17/09/25	vie 3/10/25	15 días
1353	**Sí**	**1353**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**vie 10/07/26**	**sáb 13/03/27**	**207 días**
1354	No	1354		Inicio Instalación y traslado de redes	vie 10/07/26	vie 10/07/26	0 días
1355	**Sí**	**1355**		**REDES SECAS**	**mié 7/10/26**	**lun 22/02/27**	**115 días**
1356	No	1356	RS-S6	Inicio Redes Secas	mié 7/10/26	mié 7/10/26	0 días
1357	No	1357	RSGA-S	Red Gas(Acero)	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días
1358	No	1358	RSGP-S	Red Gas (Polietileno)	lun 26/10/26	lun 22/02/27	100 días
1359	No	1359	RSEN-S	Red ENEL	lun 26/10/26	lun 22/02/27	100 días
1360	No	1360	RSET-S6	Red ETB	lun 26/10/26	lun 22/02/27	100 días
1361	No	1361	RSM-S6	Red de Movistar	lun 26/10/26	lun 22/02/27	100 días
1362	No	1362	RS-S6	Fin Redes Secas	lun 22/02/27	lun 22/02/27	0 días
1363	**Sí**	**1363**		**REDES HUMEDAS**	**mié 21/10/26**	**sáb 13/03/27**	**122 días**
1364	No	1364	RH-S6	Inicio Redes Húmedas	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días
1365	No	1365	RHA-S6	Red Acueducto	mié 21/10/26	sáb 13/03/27	122 días
1366	No	1366	RHP-S6	Red de Alcantarillado Pluvial	mié 21/10/26	sáb 13/03/27	122 días
1367	No	1367	RHS-S6	Red de Alcantarillado Sanitario	mié 21/10/26	sáb 13/03/27	122 días
1368	No	1368	RH-S6	Fin de Redes Húmedas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1369	No	1369	RH-S6	Fin Instalación y traslado de redes	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1370	**Sí**	**1370**		**CORREDORES - S6**	**vie 30/01/26**	**sáb 13/03/27**	**342 días**
1371	No	1371		Inicio de corredores	vie 30/01/26	vie 30/01/26	0 días
1372	**Sí**	**1372**		**CORREDORES BOGOTA -GIRARDOT (K0+000 - K0+120)**	**vie 29/05/26**	**sáb 13/03/27**	**241 días**
1373	**Sí**	**1373**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K0+000 - K0+120)**	**vie 29/05/26**	**sáb 13/03/27**	**241 días**
1374	No	1374		Inicio de Calzada (No afectada por red matriz 36") - Carril	vie 29/05/26	vie 29/05/26	0 días
1375	Sí	1375	UE1	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 30/05/26	vie 3/07/26	27 días
1376	No	1376		Excavación	sáb 30/05/26	mar 16/06/26	13 días
1377	No	1377		Mejoramiento con Rajón	mar 16/06/26	mié 24/06/26	7 días
1378	No	1378		Subbase Granular SBG-A	mié 24/06/26	vie 3/07/26	7 días
1379	No	1379	UE2	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 3/07/26	vie 10/07/26	7 días
1380	No	1380	UE3	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 10/07/26	mar 28/07/26	13 días
1381	No	1381		Fin de Calzada (No afectada por red matriz 36")	mar 28/07/26	mar 28/07/26	0 días
1382	No	1382		Inicio de Calzada (Afectada por red matriz 36") - Carril 2-2	mar 5/01/27	mar 5/01/27	0 días
1383	Sí	1383	UE1	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 6/01/27	mié 17/02/27	37 días
1384	No	1384		Excavación	mié 6/01/27	vie 5/02/27	27 días
1385	No	1385		Mejoramiento con Rajón	jue 28/01/27	jue 11/02/27	13 días
1386	No	1386		Subbase Granular SBG-A	mié 3/02/27	mié 17/02/27	13 días
1387	No	1387	UE2	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 9/02/27	mar 23/02/27	13 días
1388	No	1388	UE3	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 11/02/27	sáb 13/03/27	27 días
1389	No	1389		Fin de Calzada (Afectada por red matriz 36")	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1390	**Sí**	**1390**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K0+000 - K0+120)**	**mié 19/08/26**	**sáb 13/03/27**	**177 días**
1391	No	1391		Inicio de Calzada (No Afectada por red matriz 36")	mié 19/08/26	mié 19/08/26	0 días
1392	Sí	1392	UE181A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 19/08/26	mar 15/09/26	24 días
1393	No	1393		Excavación	mié 19/08/26	jue 10/09/26	20 días
1394	No	1394		Mejoramiento con Rajón	mar 1/09/26	sáb 12/09/26	10 días
1395	No	1395		Subbase Granular SBG-A	jue 3/09/26	mar 15/09/26	10 días
1396	No	1396	UE182A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 5/09/26	jue 17/09/26	10 días
1397	No	1397	UE183A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 8/09/26	mié 30/09/26	20 días
1398	No	1398		Fin de Calzada (No Afectada por red matriz 36")	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1399	No	1399		Inicio de Calzada (Afectada por red matriz 36")	sáb 30/01/27	sáb 30/01/27	0 días
1400	**Sí**	**1400**	**UE181A**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**sáb 30/01/27**	**vie 26/02/27**	**24 días**
1401	No	1401		Excavación	sáb 30/01/27	lun 22/02/27	20 días
1402	No	1402		Mejoramiento con Rajón	vie 12/02/27	mié 24/02/27	10 días
1403	No	1403		Subbase Granular SBG-A	lun 15/02/27	vie 26/02/27	10 días
1404	No	1404	UE182A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 17/02/27	lun 1/03/27	10 días
1405	No	1405	UE183A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 19/02/27	sáb 13/03/27	20 días
1406	No	1406		Fin de Calzada (Afectada por red matriz 36")	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1407	**Sí**	**1407**		**CORREDORES BOGOTA -GIRARDOT (K0+120 - K0+240)**	**mié 17/06/26**	**mié 10/03/27**	**224 días**
1408	**Sí**	**1408**		**CORREDOR MIXTO BOGOTA -GIRARDOT (K0+120 - K0+240)**	**mié 17/06/26**	**mié 10/03/27**	**224 días**
1409	No	1409		Inicio de Calzada (No afectada por red matriz 36") - Carril	mié 17/06/26	mié 17/06/26	0 días
1410	Sí	1410	UE4	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 17/06/26	mar 21/07/26	27 días
1411	No	1411		Excavación	mié 17/06/26	vie 3/07/26	13 días
1412	No	1412		Mejoramiento con Rajón	vie 3/07/26	vie 10/07/26	7 días
1413	No	1413		Subbase Granular SBG-A	vie 10/07/26	mar 21/07/26	7 días
1414	No	1414	UE5	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 22/07/26	mié 29/07/26	7 días
1415	No	1415	UE6	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 29/07/26	vie 14/08/26	13 días
1416	No	1416		Fin de Calzada (No afectada por red matriz 36")	vie 14/08/26	vie 14/08/26	0 días
1417	No	1417		Inicio de Calzada (Afectada por red matriz 36") - Carril 2-2	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días
1418	SÍ	1418	UE4	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 31/12/26	sáb 13/02/27	37 días
1419	No	1419		Excavación	jue 31/12/26	mié 3/02/27	27 días
1420	No	1420		Mejoramiento con Rajón	lun 25/01/27	lun 8/02/27	13 días
1421	No	1421		Subbase Granular SBG-A	sáb 30/01/27	sáb 13/02/27	13 días
1422	No	1422	UE5	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 4/02/27	vie 19/02/27	13 días

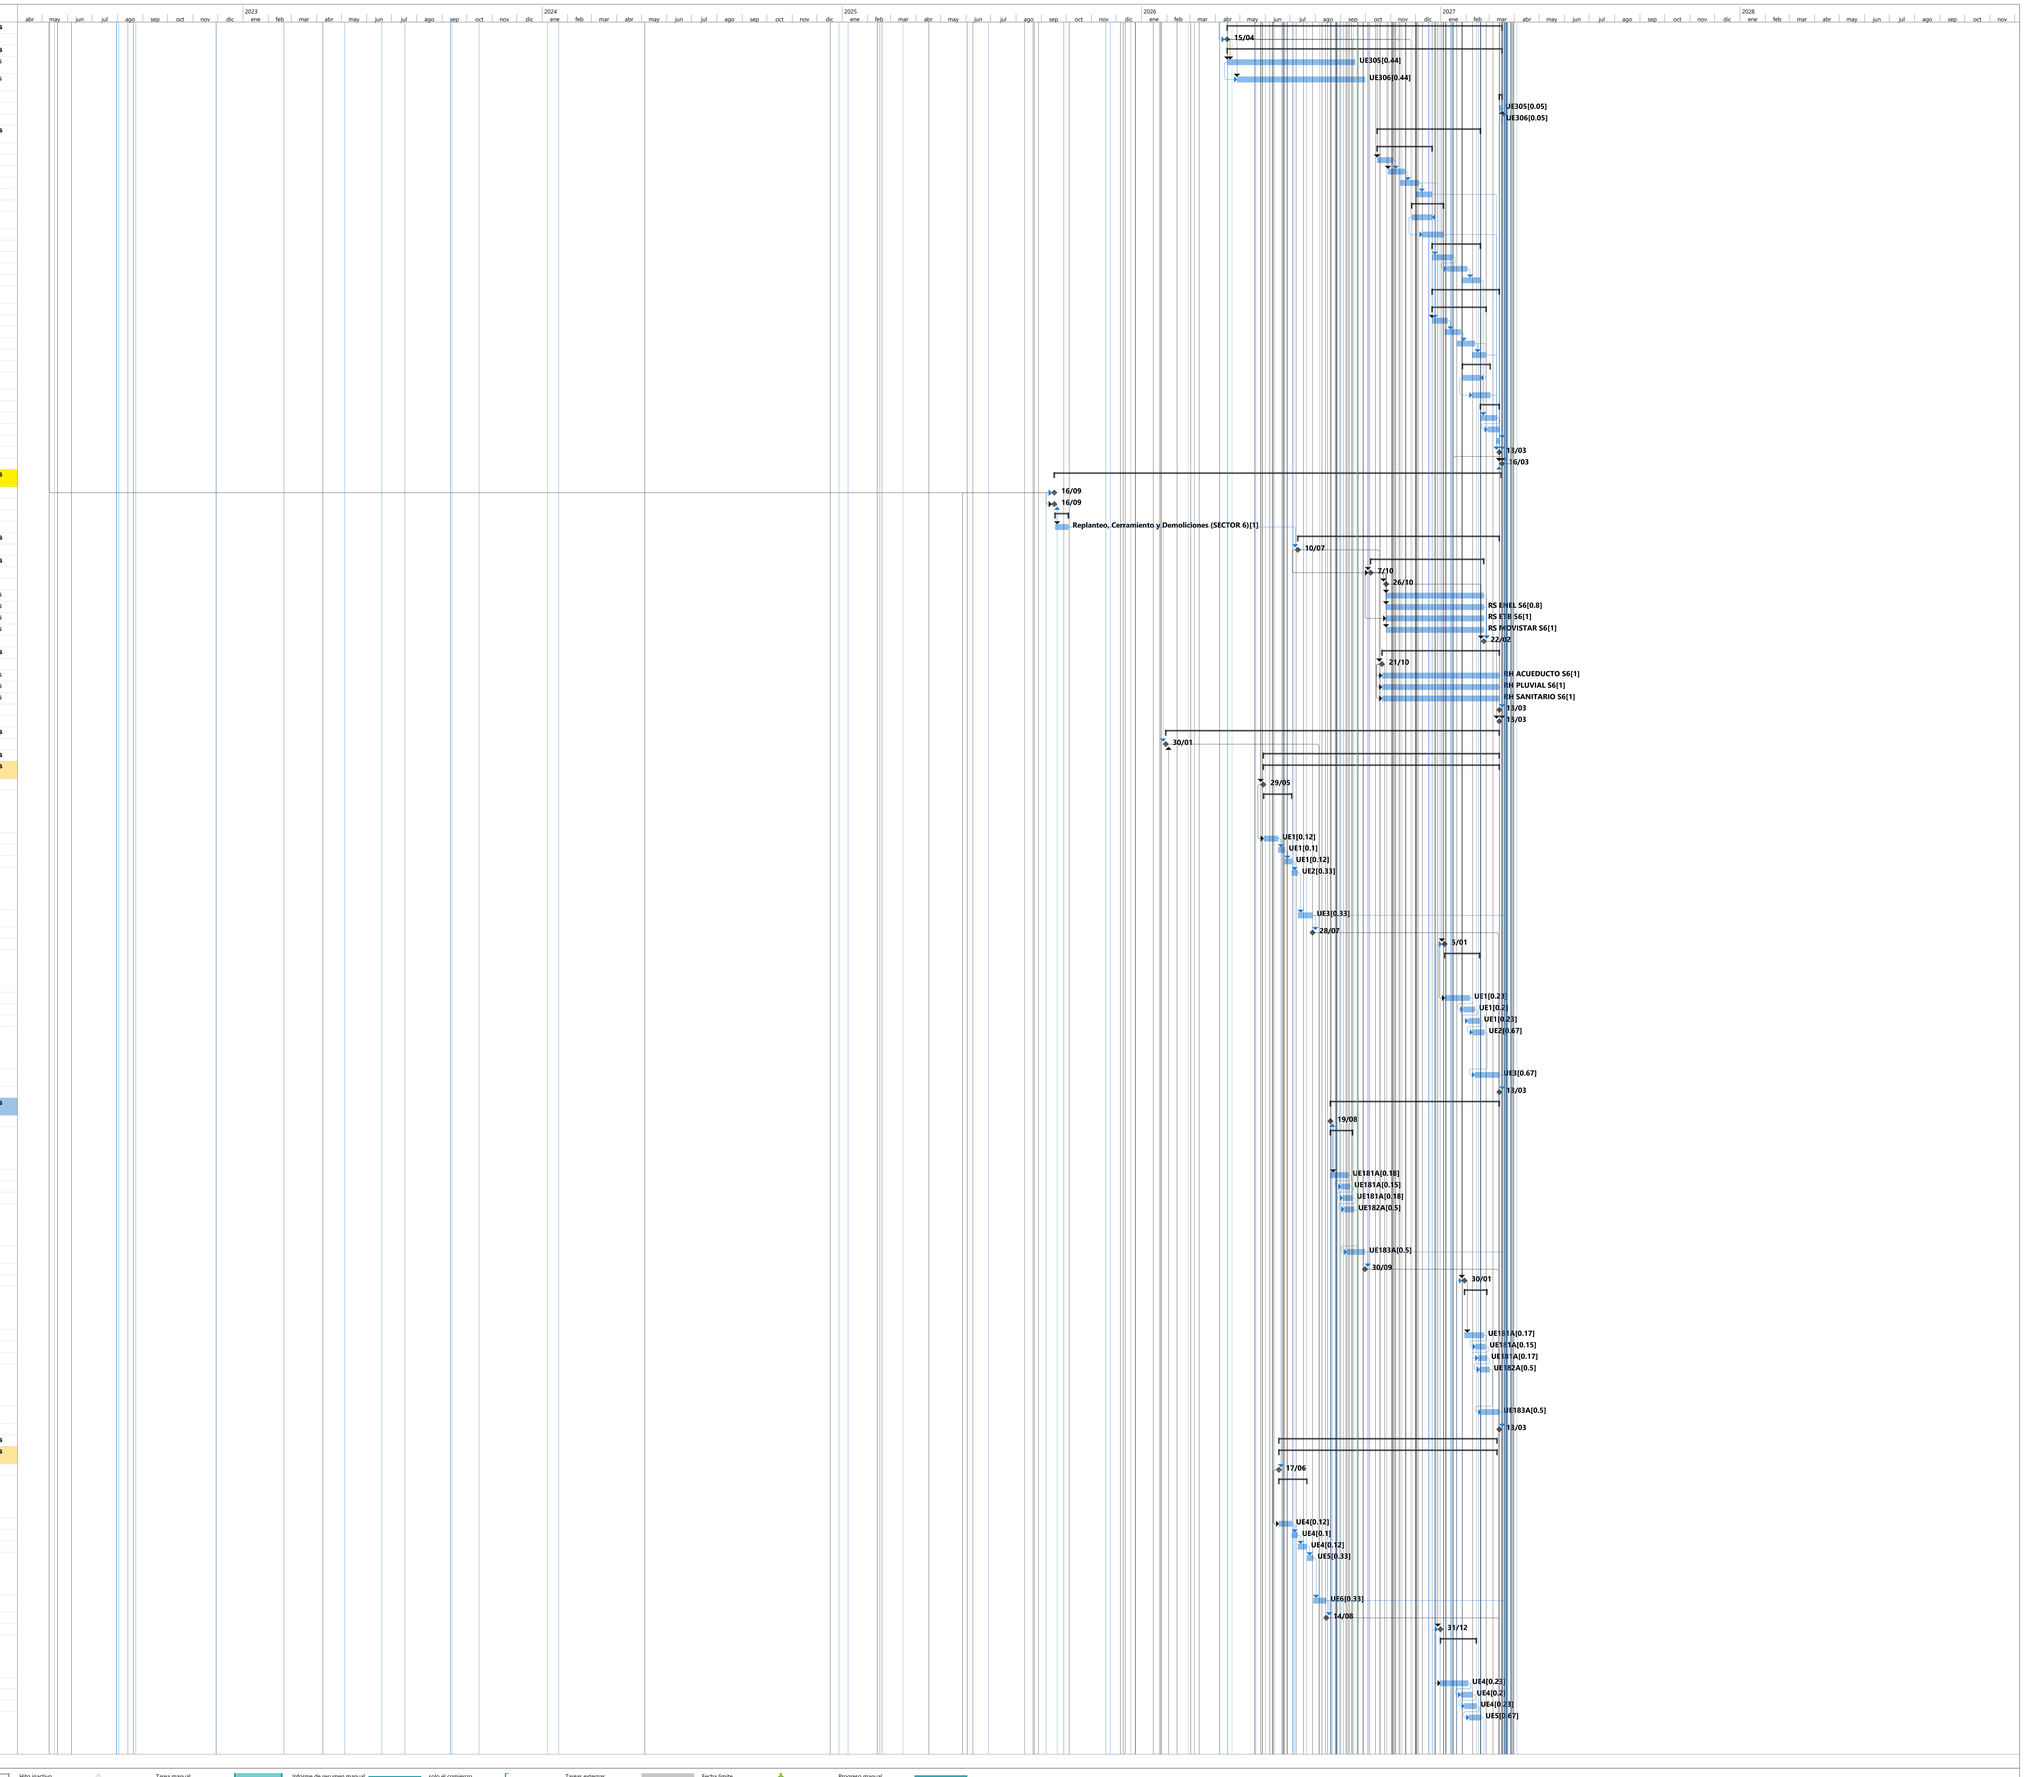

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1423	No	1423	UE6	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/02/27	mié 10/03/27	27 días
1424	No	1424		Fin de Calzada (Afectada por red matriz 36")	mié 10/03/27	mié 10/03/27	0 días
1425	**Sí**	**1425**		**CORREDOR TRANSMILENIO BOGOTA -GIRARDOT (K0+120 - K0+240)**	**mié 1/07/26**	**jue 25/02/27**	**201 días**
1426	No	1426		Inicio de Calzada (Sin afectación por rede matriz 36")	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
1427	Sí	1427	UE184A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 1/07/26	mié 26/08/26	46 días
1428	No	1428		Excavación	mié 1/07/26	jue 6/08/26	30 días
1429	No	1429		Mejoramiento con Rajón	mié 29/07/26	mar 18/08/26	15 días
1430	No	1430		Subbase Granular SBG-A	sáb 8/08/26	mié 26/08/26	15 días
1431	No	1431	UE185A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 19/08/26	vie 4/09/26	15 días
1432	No	1432	UE186A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 27/08/26	mié 30/09/26	30 días
1433	No	1433		Fin de Calzada (Sin afectación por rede matriz 36")	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1434	No	1434		Inicio de Calzada (Afectada por red matriz 36")	sáb 30/01/27	sáb 30/01/27	0 días
1435	Sí	1435	UE184A	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 30/01/27	lun 15/02/27	14 días
1436	No	1436		Excavación	sáb 30/01/27	mié 10/02/27	10 días
1437	No	1437		Mejoramiento con Rajón	lun 8/02/27	vie 12/02/27	5 días
1438	No	1438		Subbase Granular SBG-A	mar 9/02/27	lun 15/02/27	5 días
1439	No	1439	UE185A	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 11/02/27	mié 17/02/27	5 días
1440	No	1440	UE186A	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 13/02/27	jue 25/02/27	10 días
1441	No	1441		Fin de Calzada (Afectada por red matriz 36")	jue 25/02/27	jue 25/02/27	0 días
1442	No	1442		Fin de corredores	jue 25/02/27	jue 25/02/27	0 días
1443	**Sí**	**1443**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**mié 21/10/26**	**lun 15/03/27**	**123 días**
1444	No	1444		Inicio Espacio Público	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días
1445	**Sí**	**1445**		**Espacio Publico CALLE 25 - CALLE 24**	**mar 2/03/27**	**lun 15/03/27**	**12 días**
1446	No	1446	UE271	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 2/03/27	sáb 13/03/27	11 días
1447	No	1447	UE272	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1448	**Sí**	**1448**		**Espacio Publico CALLE 24 - CALLE 23**	**lun 8/02/27**	**sáb 13/03/27**	**31 días**
1449	No	1449	UE273	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 8/02/27	sáb 13/03/27	31 días
1450	No	1450	UE274	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 2/03/27	sáb 13/03/27	11 días
1451	**Sí**	**1451**		**Espacio Publico CALLE 23 - CALLE 22A (Costado occidental de puente Calle 22)**	**sáb 31/10/26**	**sáb 13/03/27**	**112 días**
1452	No	1452	UE275	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	vie 15/01/27	sáb 13/03/27	51 días
1453	No	1453	UE276	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 8/02/27	sáb 13/03/27	31 días
1454	**Sí**	**1454**		**Espacio Publico CALLE 23 - CALLE 22A (Costado oriental de puente Calle 22)**	**mié 30/12/26**	**mié 24/02/27**	**48 días**
1455	No	1455	UE275	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 30/12/26	jue 28/01/27	24 días
1456	No	1456	UE276	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 28/01/27	mié 24/02/27	24 días
1457	**Sí**	**1457**		**Espacio Publico CALLE 23 - CALLE 22A (Via de incorporación autosur sentido GIR-BOG)**	**sáb 31/10/26**	**mar 15/12/26**	**36 días**
1458	No	1458	UE275	Capas Granulares	sáb 31/10/26	mar 24/11/26	18 días
1459	No	1459	UE276	Carpeta Asfáltica	mar 24/11/26	mar 15/12/26	18 días
1460	**Sí**	**1460**		**Espacio Publico CALLE 22A - CALLE 22 VIA SOACHA (Costado occidental de puente Calle 22)**	**sáb 31/10/26**	**vie 12/03/27**	**111 días**
1461	No	1461	UE277	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 21/12/26	mar 2/03/27	60 días
1462	No	1462	UE278	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 15/01/27	vie 12/03/27	50 días
1463	**Sí**	**1463**		**Espacio Publico CALLE 22A - CALLE 22 VIA SOACHA (Costado oriental de puente Calle 22)**	**sáb 31/10/26**	**mar 15/12/26**	**36 días**
1464	No	1464	UE277	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 31/10/26	mar 24/11/26	18 días
1465	No	1465	UE278	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 24/11/26	mar 15/12/26	18 días
1466	**Sí**	**1466**		**Espacio Publico CALLE 22A - CALLE 22 VIA SOACHA (Via de incorporación a puente de Calle 22)**	**mar 3/11/26**	**mar 15/12/26**	**35 días**
1467	No	1467	UE277	Capas Granulares	mar 3/11/26	mié 2/12/26	25 días
1468	No	1468	UE278	Carpeta Asfáltica	sáb 14/11/26	mar 15/12/26	25 días
1469	No	1469		Fin Espacio Público	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
1470	No	1470		Fin de Sector 6	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
1471	No	1471		Fin Sectores Bogotá - Girardot (Occidental)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
1472	**Sí**	**1472**		**SECTORES GIRARDOT - BOGOTÁ (ORIENTAL)**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1496 días**
1473	No	1473		Inicio Sectores Girardot - Bogotá (Oriental)	mié 21/01/26	mié 21/01/26	0 días
1474	**Sí**	**1474**		**Sector 7 CALLE 24 a CALLE 14 (K2+760 -k3+660)**	**mié 12/02/25**	**mié 31/03/27**	**651 días**
1475	No	1475		Inicio Sector 7	mar 26/08/25	mar 26/08/25	0 días
1476	**Sí**	**1476**		**PRELIMINARES**	**lun 29/09/25**	**jue 16/10/25**	**15 días**
1477	No	1477	DEMOL	Cerramiento y traslado de maquinaria	lun 29/09/25	jue 16/10/25	15 días
1478	**Sí**	**1478**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**vie 13/03/26**	**sáb 13/03/27**	**305 días**
1479	No	1479		Inicio Instalación y traslado de redes	vie 13/03/26	vie 13/03/26	0 días
1480	**Sí**	**1480**		**REDES HUMEDAS**	**mar 14/04/26**	**sáb 13/03/27**	**280 días**
1481	No	1481	RH-S7	Inicio Redes Húmedas	mar 14/04/26	mar 14/04/26	0 días
1482	No	1482	RHA-S7	Red Acueducto	mar 14/04/26	jue 10/12/26	200 días
1483	No	1483	RHP-S7	Red de Alcantarillado Pluvial	vie 21/08/26	sáb 13/03/27	175 días
1484	No	1484	RHS-S7	Red de Alcantarillado Sanitario	vie 21/08/26	sáb 13/03/27	175 días
1485	No	1485	RH-S7	Fin de Redes Húmedas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1486	**Sí**	**1486**		**REDES SECAS**	**sáb 8/08/26**	**sáb 13/03/27**	**185 días**
1487	No	1487	RS-S7	Inicio Redes Secas	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	0 días
1488	No	1488	RSGA-S	Red Gas (acero)	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	0 días
1489	No	1489	RSGP-S	Red Gas (polietileno)	sáb 8/08/26	lun 8/03/27	180 días
1490	No	1490	RSEN-S	Red ENEL	sáb 8/08/26	jue 3/12/26	100 días
1491	No	1491	RSET-S7	Red ETB	sáb 8/08/26	jue 25/02/27	170 días
1492	No	1492	RSM-S7	Red de Movistar	mié 26/08/26	lun 8/03/27	165 días
1493	No	1493	RS-S7	Fin Redes Secas	lun 8/03/27	lun 8/03/27	0 días
1494	No	1494	RS-S7	Fin Instalación y traslado de redes	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1495	**Sí**	**1495**		**CORREDORES - S7**	**mié 12/02/25**	**sáb 13/03/27**	**639 días**
1496	No	1496		Inicio de Corredores	mié 21/01/26	mié 21/01/26	0 días
1497	**Sí**	**1497**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+480 -k3+660)**	**mar 9/06/26**	**sáb 13/03/27**	**233 días**
1498	**Sí**	**1498**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+000-K0+120)**	**mar 9/06/26**	**mié 30/09/26**	**94 días**
1499	No	1499		Inicio de Calzada	mar 9/06/26	mar 9/06/26	0 días
1500	Sí	1500	UE181B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 10/06/26	mar 4/08/26	45 días
1501	No	1501		Excavación	mié 10/06/26	mié 29/07/26	40 días
1502	No	1502		Mejoramiento con Rajón	sáb 4/07/26	mié 29/07/26	20 días
1503	No	1503		Subbase Granular SBG-A	vie 10/07/26	mar 4/08/26	20 días
1504	No	1504	UE182B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 23/07/26	mar 18/08/26	20 días
1505	No	1505	UE183B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Acabados Separador).	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
1506	No	1506		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1507	**Sí**	**1507**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+480 -k3+**	**mar 22/12/26**	**sáb 13/03/27**	**70 días**
1508	No	1508		Inicio de Calzada	mar 22/12/26	mar 22/12/26	0 días
1509	Sí	1509	UE178	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML Ó HASTA EL LIMITE DE	mar 22/12/26	jue 25/02/27	55 días
1510	No	1510		Excavación	mar 22/12/26	lun 8/02/27	40 días
1511	No	1511		Mejoramiento con Rajón	vie 22/01/27	sáb 13/02/27	20 días
1512	No	1512		Subbase Granular SBG-A	mié 3/02/27	jue 25/02/27	20 días
1513	No	1513	UE179	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	sáb 13/02/27	lun 8/03/27	20 días
1514	No	1514	UE180	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	jue 25/02/27	sáb 13/03/27	15 días
1515	No	1515		Fin de Calzada	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1516	**Sí**	**1516**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+360 -k3+480)**	**mié 13/05/26**	**sáb 20/02/27**	**236 días**
1517	**Sí**	**1517**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+120 -k0+240)**	**sáb 20/06/26**	**mié 30/09/26**	**65 días**
1518	No	1518		Inicio de Calzada	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	0 días
1519	Sí	1519	UE184B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	sáb 20/06/26	mar 8/09/26	65 días
1520	No	1520		Excavación	sáb 20/06/26	mar 8/09/26	65 días
1521	No	1521		Mejoramiento con Rajón	vie 3/07/26	vie 21/08/26	40 días
1522	No	1522		Subbase Granular SBG-A	jue 16/07/26	mié 2/09/26	40 días
1523	No	1523	UE185B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 28/07/26	lun 14/09/26	40 días
1524	No	1524	UE186B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Acabados Separador).	vie 21/08/26	mié 30/09/26	35 días
1525	No	1525		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1526	**Sí**	**1526**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+360 -k3+**	**mié 13/05/26**	**sáb 20/02/27**	**236 días**
1527	No	1527		Inicio de Calzada (Carril 3)	mié 13/05/26	mié 13/05/26	0 días

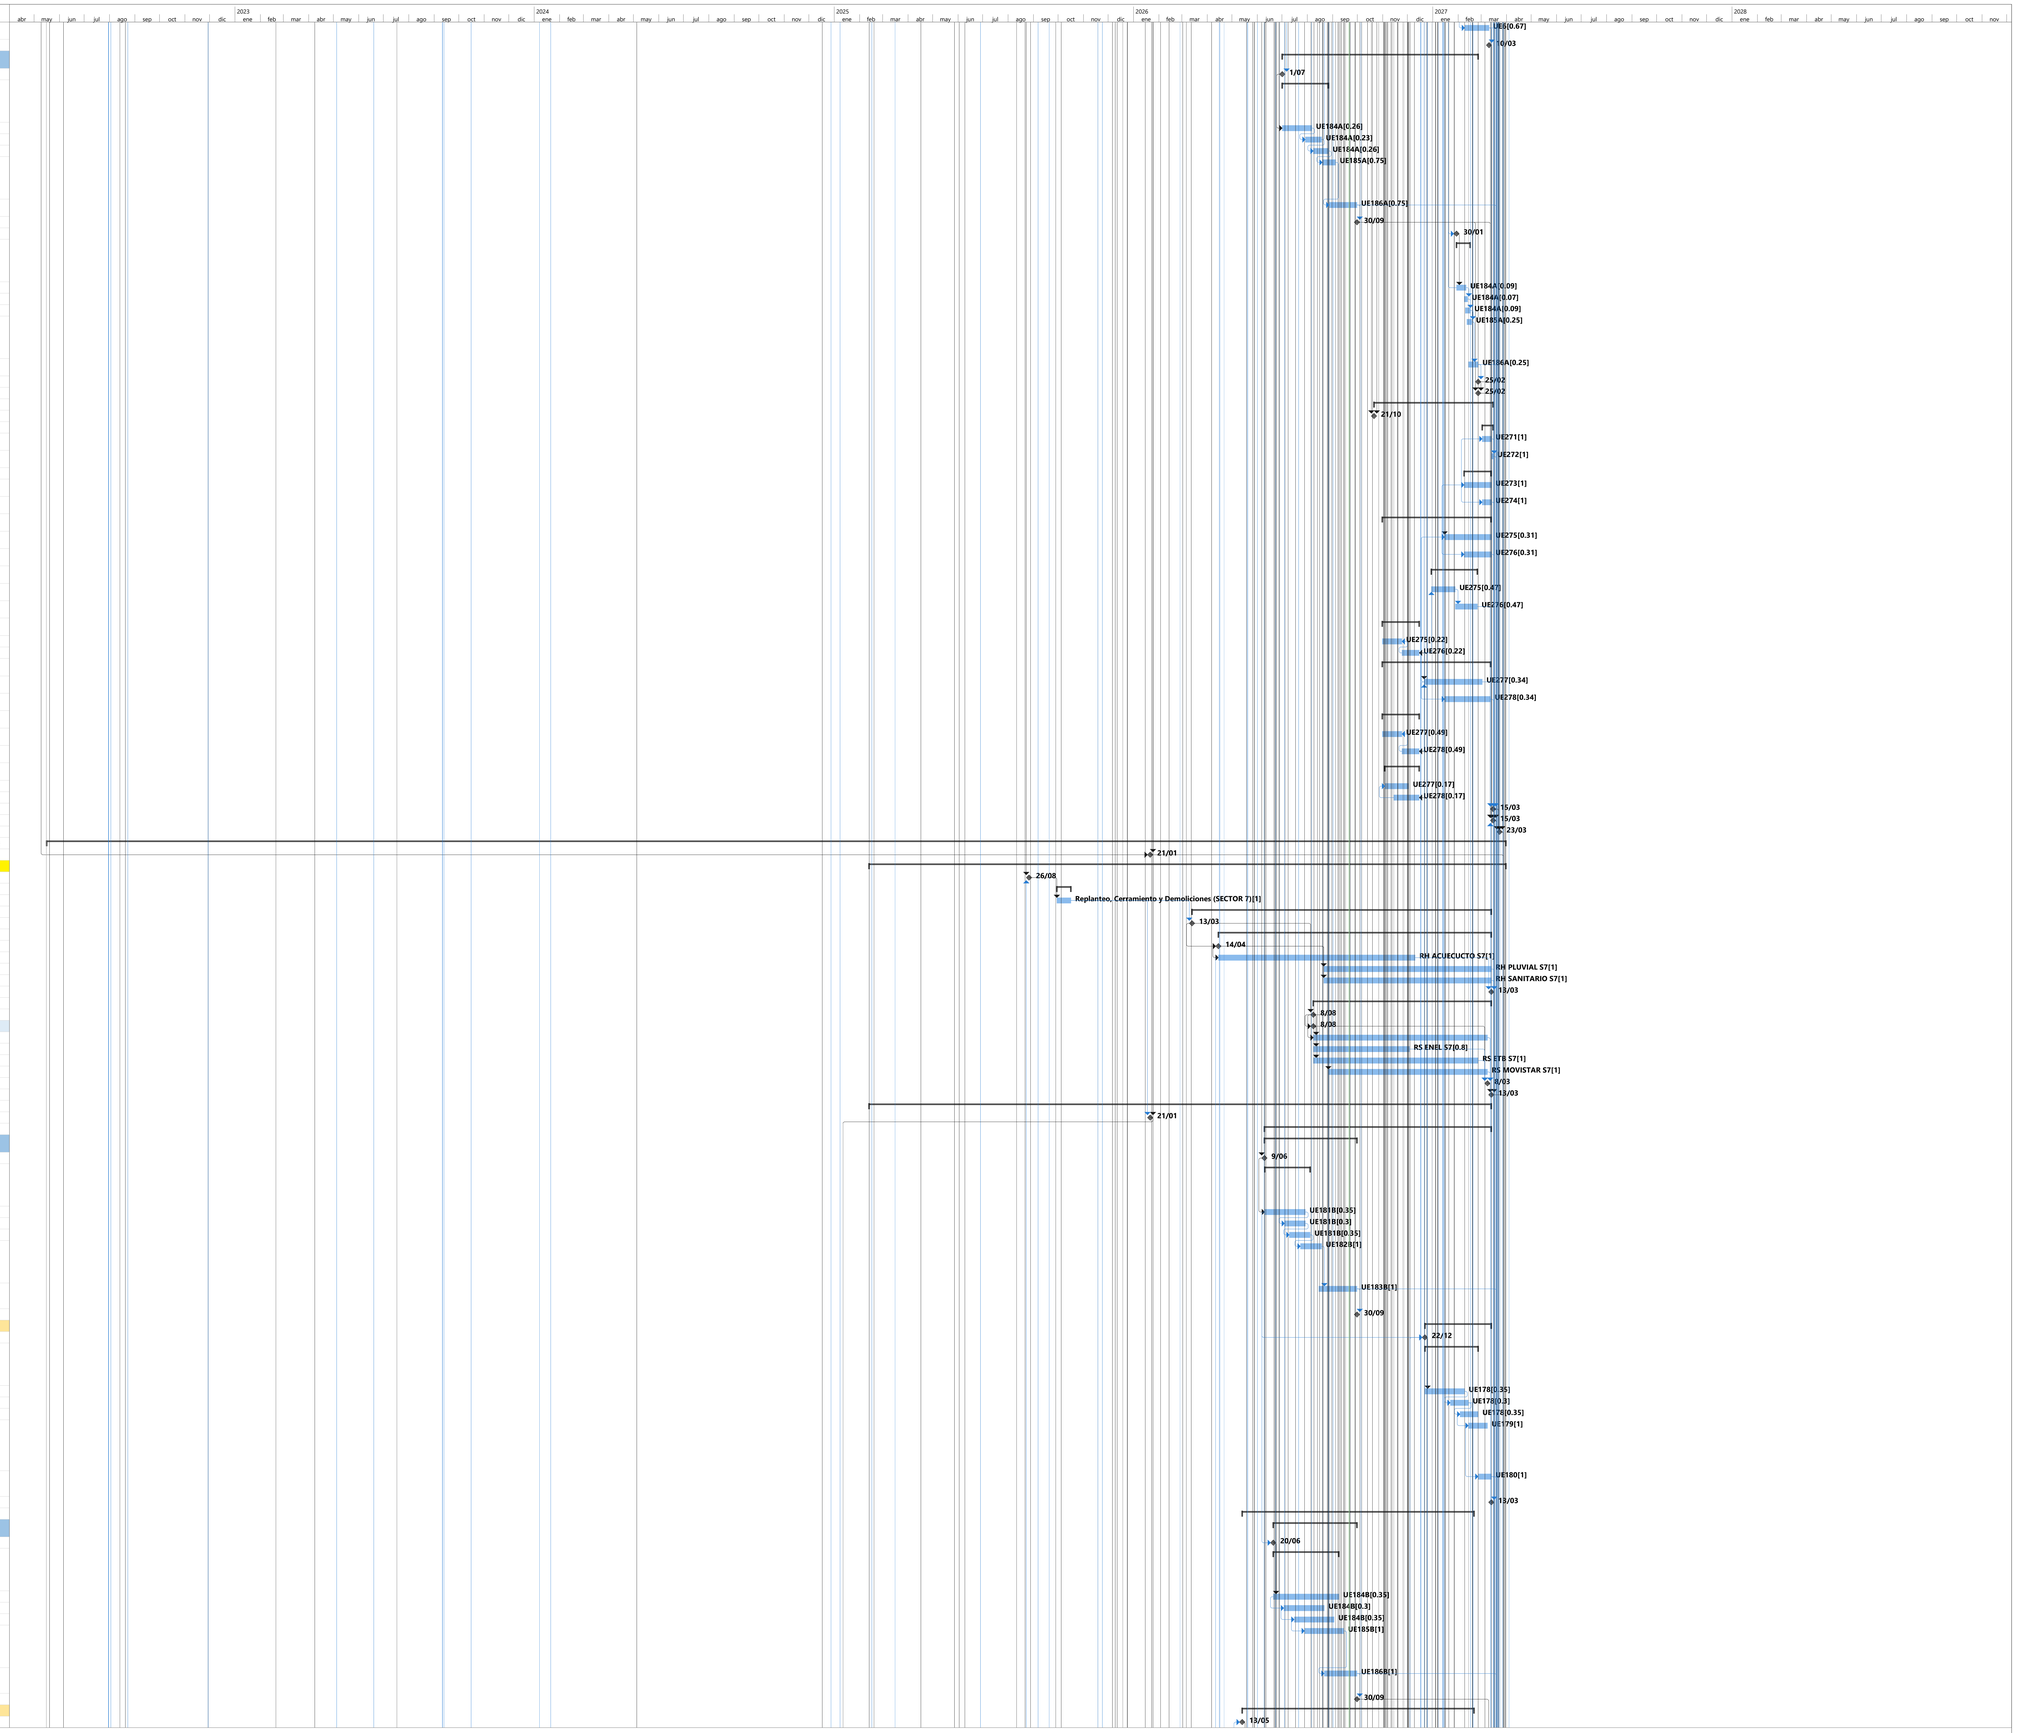

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Resumen	Id	UE TIOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1528	SI	1528	UE175	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	mié 13/05/26	mar 10/09/26	90 días
1529	No	1529		Excavación	mié 13/05/26	jue 20/08/26	79 días
1530	No	1530		Mejoramiento con Rajón	mar 26/05/26	jue 20/08/26	69 días
1531	No	1531		Subbase Granular SBG-A	ve 5/06/26	mar 10/09/26	70 días
1532	No	1532	UE176	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	mar 26/05/26	mar 29/09/26	97 días
1533	No	1533	UE177	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 9/09/26	lun 28/09/26	17 días
1534	No	1534		Fin de Calzada (Carril 2)	lun 28/09/26	lun 28/09/26	0 días
1535	No	1535		Fin de Calzada (Carril 1-2)	mar 29/09/26	mar 29/09/26	0 días
1536	SI	1536	**UE175**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	lun 7/12/26	**26/01/27**	**40 días**
1537	No	1537		Excavación	lun 7/12/26	vie 8/01/27	26 días
1538	No	1538		Mejoramiento con Rajón	jue 31/12/26	lun 18/01/27	13 días
1539	No	1539		Subbase Granular SBG-A	mar 12/01/27	mar 26/01/27	13 días
1540	No	1540	UE176	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	sab 16/01/27	lun 1/02/27	13 días
1541	No	1541	UE177	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 22/01/27	sáb 20/02/27	26 días
1542	No	1542		Fin de Calzada (Carril 1-2)	sáb 20/02/27	sáb 20/02/27	0 días
1543	SI	1543		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+340 A3+360)**	**mié 12/02/25**	**lun 7/07/25**	**121 días**
1544	SI	1544		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+340 A3+360)**	**mié 12/02/25**	**lun 7/07/25**	**121 días**
1545	No	1545		Inicio de Calzada	mié 12/02/25	mié 12/02/25	0 días
1546	SI	1546	UE1878	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye separado)	mié 12/02/25	vie 25/04/25	61 días
1547	No	1547		Excavación	mié 12/02/25	lun 31/03/25	40 días
1548	No	1548		Mejoramiento con Rajón	vie 7/03/25	lun 31/03/25	20 días
1549	No	1549		Subbase Granular SBG-A	mar 25/03/25	vie 25/04/25	25 días
1550	No	1550	UE1888	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	ve 25/04/25	lun 19/05/25	20 días
1551	No	1551	UE1889	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Fin de Calzada)	lun 19/05/25	lun 7/07/25	40 días
1552	No	1552		Fin de Calzada	lun 7/07/25	lun 7/07/25	0 días
1553	SI	1553		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+240 A3+ jue 7/08/26**	**jue 7/08/26**	**lun 8/02/27**	**229 días**
1554	No	1554		Inicio de Calzada (Carril 3)	jue 7/08/26	jue 7/08/26	0 días
1555	SI	1555	UE172	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 7/08/26	mié 3/08/26	22 días
1556	No	1556		Excavación	jue 7/08/26	jue 25/08/26	14 días
1557	No	1557		Mejoramiento con Rajón	jue 27/08/26	mar 1/09/26	5 días
1558	No	1558		Subbase Granular SBG-A	mar 25/08/26	mié 2/09/26	7 días
1559	No	1559	UE173	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	lun 1/06/26	mar 9/06/26	7 días
1560	No	1560	UE174	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 5/06/26	mié 24/06/26	14 días
1561	No	1561		Fin de Calzada (Carril 1-2)	mié 24/06/26	mié 24/06/26	0 días
1562	No	1562		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	mar 24/11/26	mar 24/11/26	0 días
1563	SI	1563	**UE172**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 24/11/26**	**mar 12/01/27**	**40 días**
1564	No	1564		Excavación	mar 24/11/26	jue 24/12/26	26 días
1565	No	1565		Mejoramiento con Rajón	jue 17/12/26	lun 4/01/27	13 días
1566	No	1566		Subbase Granular SBG-A	sáb 26/12/26	mar 12/01/27	13 días
1567	No	1567	UE173	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 31/12/26	lun 18/01/27	13 días
1568	No	1568	UE174	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 7/01/27	lun 8/02/27	26 días
1569	No	1569		Fin de Calzada (Carril 1-2)	lun 8/02/27	lun 8/02/27	0 días
1570	SI	1570		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+120 A3+240)**	**jue 6/03/25**	**lun 25/01/27**	**516 días**
1571	SI	1571		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+360 A3+480)**	**jue 6/03/25**	**lun 25/01/27**	**516 días**
1572	No	1572		Inicio de Calzada	jue 6/03/25	jue 6/03/25	0 días
1573	SI	1573	UE1908	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 6/03/25	lun 19/05/25	61 días
1574	No	1574		Excavación	jue 6/03/25	jue 24/04/25	40 días
1575	No	1575		Mejoramiento con Rajón	mar 22/04/25	vie 25/04/25	4 días
1576	No	1576		Subbase Granular SBG-A	ve 25/04/25	lun 19/05/25	20 días
1577	No	1577	UE1918	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	lun 19/05/25	mié 11/06/25	20 días
1578	No	1578	UE1929	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 11/06/25	mar 29/07/25	40 días
1579	No	1579		Fin de Calzada (Carril 1-2)	mar 29/07/25	mar 29/07/25	0 días
1580	SI	1580		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+120 A3+ mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**	**lun 25/01/27**	**284 días**
1581	No	1581		Inicio de Calzada (Carril 3)	mar 17/02/26	mar 17/02/26	0 días
1582	SI	1582	UE169	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 26/02/26	vie 29/05/26	77 días
1583	No	1583		Excavación	jue 26/02/26	mié 13/05/26	63 días
1584	No	1584		Mejoramiento con Rajón	ve 20/03/26	mar 19/05/26	47 días
1585	No	1585		Subbase Granular SBG-A	mié 6/05/26	vie 29/05/26	18 días
1586	No	1586	UE170	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	mar 19/05/26	mar 9/06/26	18 días
1587	No	1587	UE171	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 28/05/26	vie 19/06/26	18 días
1588	No	1588		Fin de Calzada (Carril 1-2)	vie 19/06/26	vie 19/06/26	0 días
1589	No	1589		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	lun 9/11/26	lun 9/11/26	0 días
1590	SI	1590	UE169	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**lun 9/11/26**	**mié 28/12/26**	**40 días**
1591	No	1591		Excavación	lun 9/11/26	jue 10/12/26	26 días
1592	No	1592		Mejoramiento con Rajón	mié 21/12/26	vie 18/12/26	13 días
1593	No	1593		Subbase Granular SBG-A	ve 11/12/26	sáb 26/12/26	13 días
1594	No	1594	UE170	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	jue 17/12/26	lun 4/01/27	13 días
1595	No	1595	UE171	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 23/12/26	lun 25/01/27	26 días
1596	No	1596		Fin de Calzada (Carril 1-2)	lun 25/01/27	lun 25/01/27	0 días
1597	SI	1597		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+000 A3+120)**	**lun 31/03/25**	**sáb 9/01/27**	**544 días**
1598	SI	1598		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+000 A3+120)**	**lun 31/03/25**	**vie 12/06/26**	**140 días**
1599	No	1599		Inicio de Calzada	lun 31/03/25	lun 31/03/25	0 días
1600	SI	1600	UE1938	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye separado)	lun 31/03/25	vie 4/07/25	80 días
1601	No	1601		Excavación	lun 31/03/25	sáb 17/05/25	40 días
1602	No	1602		Mejoramiento con Rajón	sáb 17/05/25	mié 10/06/25	20 días
1603	No	1603		Subbase Granular SBG-A	mié 10/06/25	vie 4/07/25	20 días
1604	No	1604	UE1948	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	sáb 5/07/25	lun 28/07/25	20 días
1605	No	1605	UE1958	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Fin de Calzada)	lun 28/07/25	vie 12/09/25	40 días
1606	No	1606		Fin de Calzada	vie 12/09/25	vie 12/09/25	0 días
1607	SI	1607		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+000 A3+ mar 3/02/26**	**sáb 9/01/27**	**284 días**
1608	No	1608		Inicio de Calzada (Carril 3)	mar 3/02/26	mar 3/02/26	0 días
1609	SI	1609	UE166	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>5 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 3/02/26	mié 28/04/26	71 días
1610	No	1610		Excavación	mar 3/02/26	sáb 18/04/26	63 días
1611	No	1611		Mejoramiento con Rajón	mié 25/02/26	jue 23/04/26	47 días
1612	No	1612		Subbase Granular SBG-A	mar 3/03/26	mié 28/04/26	46 días
1613	No	1613	UE167	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPAM, RESPETANDO COTA	mar 14/04/26	mar 5/05/26	18 días
1614	No	1614	UE168	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 21/04/26	mar 12/05/26	18 días
1615	No	1615		Fin de Calzada (Carril 1-2)	mar 12/05/26	mar 12/05/26	0 días
1616	No	1616		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días

Proyecto: LBS
Fecha: lun 21/09/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
sólo el comienzo
sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1617	**Sí**	**1617**	**UE166**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**lun 26/10/26**	**sáb 12/12/26**	**40 días**
1618	No	1618		Excavación	lun 26/10/26	mié 25/11/26	26 días
1619	No	1619		Mejoramiento con Rajón	jue 19/11/26	jue 3/12/26	13 días
1620	No	1620		Subbase Granular SBG-A	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	13 días
1621	No	1621	UE167	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 2/12/26	vie 18/12/26	13 días
1622	No	1622	UE168	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 9/12/26	sáb 9/01/27	26 días
1623	No	1623		Fin de Calzada (Carril 1-2)	sáb 9/01/27	sáb 9/01/27	0 días
1624	**Sí**	**1624**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+880-k3+000)**	**jue 24/04/25**	**jue 24/12/26**	**512 días**
1625	**Sí**	**1625**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+600-K0+720)**	**jue 24/04/25**	**lun 15/09/25**	**121 días**
1626	No	1626		Inicio de Calzada	jue 24/04/25	jue 24/04/25	0 días
1627	Sí	1627	UE196B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	jue 24/04/25	lun 7/07/25	61 días
1628	No	1628		Excavación	jue 24/04/25	mar 10/06/25	40 días
1629	No	1629		Mejoramiento con Rajón	lun 19/05/25	mié 11/06/25	20 días
1630	No	1630		Subbase Granular SBG-A	mié 11/06/25	lun 7/07/25	20 días
1631	No	1631	UE197B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 7/07/25	mar 29/07/25	20 días
1632	No	1632	UE198B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 29/07/25	lun 15/09/25	40 días
1633	No	1633		Fin de Calzada	lun 15/09/25	lun 15/09/25	0 días
1634	**Sí**	**1634**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+880-k3+(**	**mié 21/01/26**	**jue 24/12/26**	**284 días**
1635	No	1635		Inicio de Calzada (Carril 3)	mié 21/01/26	mié 21/01/26	0 días
1636	Sí	1636	UE163	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 21/01/26	mié 29/04/26	84 días
1637	No	1637		Excavación	mié 21/01/26	mié 15/04/26	72 días
1638	No	1638		Mejoramiento con Rajón	lun 2/02/26	jue 23/04/26	69 días
1639	No	1639		Subbase Granular SBG-A	jue 12/02/26	mié 29/04/26	64 días
1640	No	1640	UE164	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 24/02/26	lun 11/05/26	64 días
1641	No	1641	UE165	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 6/03/26	vie 22/05/26	63 días
1642	No	1642		Fin de Calzada (Carril 3)	vie 22/05/26	vie 22/05/26	0 días
1643	No	1643		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	sáb 10/10/26	sáb 10/10/26	0 días
1644	**Sí**	**1644**	**UE163**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**sáb 10/10/26**	**vie 27/11/26**	**40 días**
1645	No	1645		Excavación	sáb 10/10/26	mié 11/11/26	26 días
1646	No	1646		Mejoramiento con Rajón	mié 4/11/26	vie 20/11/26	13 días
1647	No	1647		Subbase Granular SBG-A	jue 12/11/26	vie 27/11/26	13 días
1648	No	1648	UE164	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 19/11/26	jue 3/12/26	13 días
1649	No	1649	UE165	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 25/11/26	jue 24/12/26	26 días
1650	No	1650		Fin de Calzada (Carril 1-2)	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días
1651	**Sí**	**1651**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+760-k2+880)**	**sáb 17/05/25**	**vie 11/12/26**	**480 días**
1652	**Sí**	**1652**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+720-K0+840)**	**sáb 17/05/25**	**jue 25/09/25**	**111 días**
1653	No	1653		Inicio de Calzada	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	0 días
1654	Sí	1654	UE199B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	sáb 17/05/25	mar 29/07/25	61 días
1655	No	1655		Excavación	sáb 17/05/25	vie 4/07/25	40 días
1656	No	1656		Mejoramiento con Rajón	mié 11/06/25	lun 7/07/25	20 días
1657	No	1657		Subbase Granular SBG-A	lun 7/07/25	mar 29/07/25	20 días
1658	No	1658	UE200B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 29/07/25	vie 22/08/25	20 días
1659	No	1659	UE201B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	lun 11/08/25	jue 25/09/25	40 días
1660	No	1660		Fin de Calzada	jue 25/09/25	jue 25/09/25	0 días
1661	**Sí**	**1661**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+760-k2+(**	**jue 17/09/26**	**vie 11/12/26**	**71 días**
1662	No	1662		Inicio de Calzada (Carril 3)	jue 17/09/26	jue 17/09/26	0 días
1663	Sí	1663	UE160	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 18/09/26	vie 16/10/26	24 días
1664	No	1664		Excavación	vie 18/09/26	sáb 3/10/26	14 días
1665	No	1665		Mejoramiento con Rajón	jue 1/10/26	vie 9/10/26	7 días
1666	No	1666		Subbase Granular SBG-A	mié 7/10/26	vie 16/10/26	7 días
1667	No	1667	UE161	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 14/10/26	mié 21/10/26	7 días
1668	No	1668	UE162	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 20/10/26	jue 5/11/26	14 días
1669	No	1669		Fin de Calzada (Carril 3)	jue 5/11/26	jue 5/11/26	0 días
1670	No	1670		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	sáb 26/09/26	sáb 26/09/26	0 días
1671	**Sí**	**1671**	**UE160**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**lun 28/09/26**	**vie 13/11/26**	**40 días**
1672	No	1672		Excavación	lun 28/09/26	mar 27/10/26	26 días
1673	No	1673		Mejoramiento con Rajón	mié 21/10/26	jue 5/11/26	13 días
1674	No	1674		Subbase Granular SBG-A	mié 28/10/26	vie 13/11/26	13 días
1675	No	1675	UE161	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 4/11/26	vie 20/11/26	13 días
1676	No	1676	UE162	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 10/11/26	vie 11/12/26	26 días
1677	No	1677		Fin de Calzada (Carril 1-2)	vie 11/12/26	vie 11/12/26	0 días
1678	No	1678		Fin de Corredores	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1679	**Sí**	**1679**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**mié 15/07/26**	**mié 31/03/27**	**217 días**
1680	No	1680		Inicio de Espacio Público	mié 15/07/26	mié 15/07/26	0 días
1681	**Sí**	**1681**		**Espacio Público CALLE 25 - CALLE 23**	**vie 15/01/27**	**sáb 13/03/27**	**51 días**
1682	No	1682	UE311	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	vie 15/01/27	sáb 13/03/27	51 días
1683	No	1683	UE312	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 8/02/27	sáb 13/03/27	31 días
1684	**Sí**	**1684**		**Espacio Público CALLE 23 - CALLE 22**	**jue 26/11/26**	**vie 12/02/27**	**65 días**
1685	No	1685	UE313	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 26/11/26	vie 12/02/27	65 días
1686	No	1686	UE314	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 15/12/26	vie 12/02/27	50 días
1687	**Sí**	**1687**		**Espacio Público CALLE 22 - CALLE 21**	**mié 2/12/26**	**vie 19/03/27**	**91 días**
1688	No	1688	UE315	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 2/12/26	jue 18/02/27	65 días
1689	No	1689	UE316	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 21/12/26	jue 18/02/27	50 días
1690	**Sí**	**1690**		**Bocacalle Calle 22 Costado oriental**	**mié 17/03/27**	**vie 19/03/27**	**2 días**
1691	No	1691	UE315	Capas Granulares	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
1692	No	1692	UE316	Carpeta Asfáltica	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
1693	**Sí**	**1693**		**Espacio Público CALLE 21 - CALLE 20**	**mié 24/02/27**	**lun 15/03/27**	**17 días**
1694	No	1694	UE317	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 24/02/27	sáb 13/03/27	16 días
1695	No	1695	UE318	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1696	**Sí**	**1696**		**Espacio Público CALLE 20 - CALLE 19**	**lun 8/03/27**	**mar 23/03/27**	**13 días**
1697	No	1697	UE319	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 8/03/27	sáb 13/03/27	6 días
1698	No	1698	UE320	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1699	**Sí**	**1699**		**Bocacalle Calle 20 Costado oriental**	**vie 19/03/27**	**mar 23/03/27**	**2 días**
1700	No	1700	UE319	Capas Granulares	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
1701	No	1701	UE320	Carpeta Asfáltica	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
1702	**Sí**	**1702**		**Espacio Público CALLE 19 - CALLE 18**	**mié 2/12/26**	**sáb 27/03/27**	**95 días**
1703	No	1703	UE321	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 2/12/26	jue 18/02/27	65 días
1704	No	1704	UE322	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 21/12/26	jue 18/02/27	50 días
1705	**Sí**	**1705**		**Bocacalle Calle 19 Costado oriental**	**mar 23/03/27**	**sáb 27/03/27**	**2 días**
1706	No	1706	UE321	Capas Granulares	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
1707	No	1707	UE322	Carpeta Asfáltica	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1708	**Sí**	**1708**		**Espacio Público CALLE 18 - CALLE 16A**	**sáb 13/03/27**	**mar 30/03/27**	**11 días**
1709	No	1709	UE323	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1710	No	1710	UE324	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1711	**Sí**	**1711**		**Bocacalle Calle 18 Costado oriental**	**sáb 27/03/27**	**lun 29/03/27**	**1 día**
1712	No	1712	UE323	Capas Granulares	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1713	No	1713	UE324	Carpeta Asfáltica	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1714	**Sí**	**1714**		**Bocacalle Calle 17 Costado oriental**	**lun 29/03/27**	**mar 30/03/27**	**1 día**
1715	No	1715	UE323	Capas Granulares	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
1716	No	1716	UE324	Carpeta Asfáltica	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
1717	**Sí**	**1717**		**Espacio Público CALLE 16A - CALLE 14**	**lun 15/03/27**	**mié 31/03/27**	**11 días**

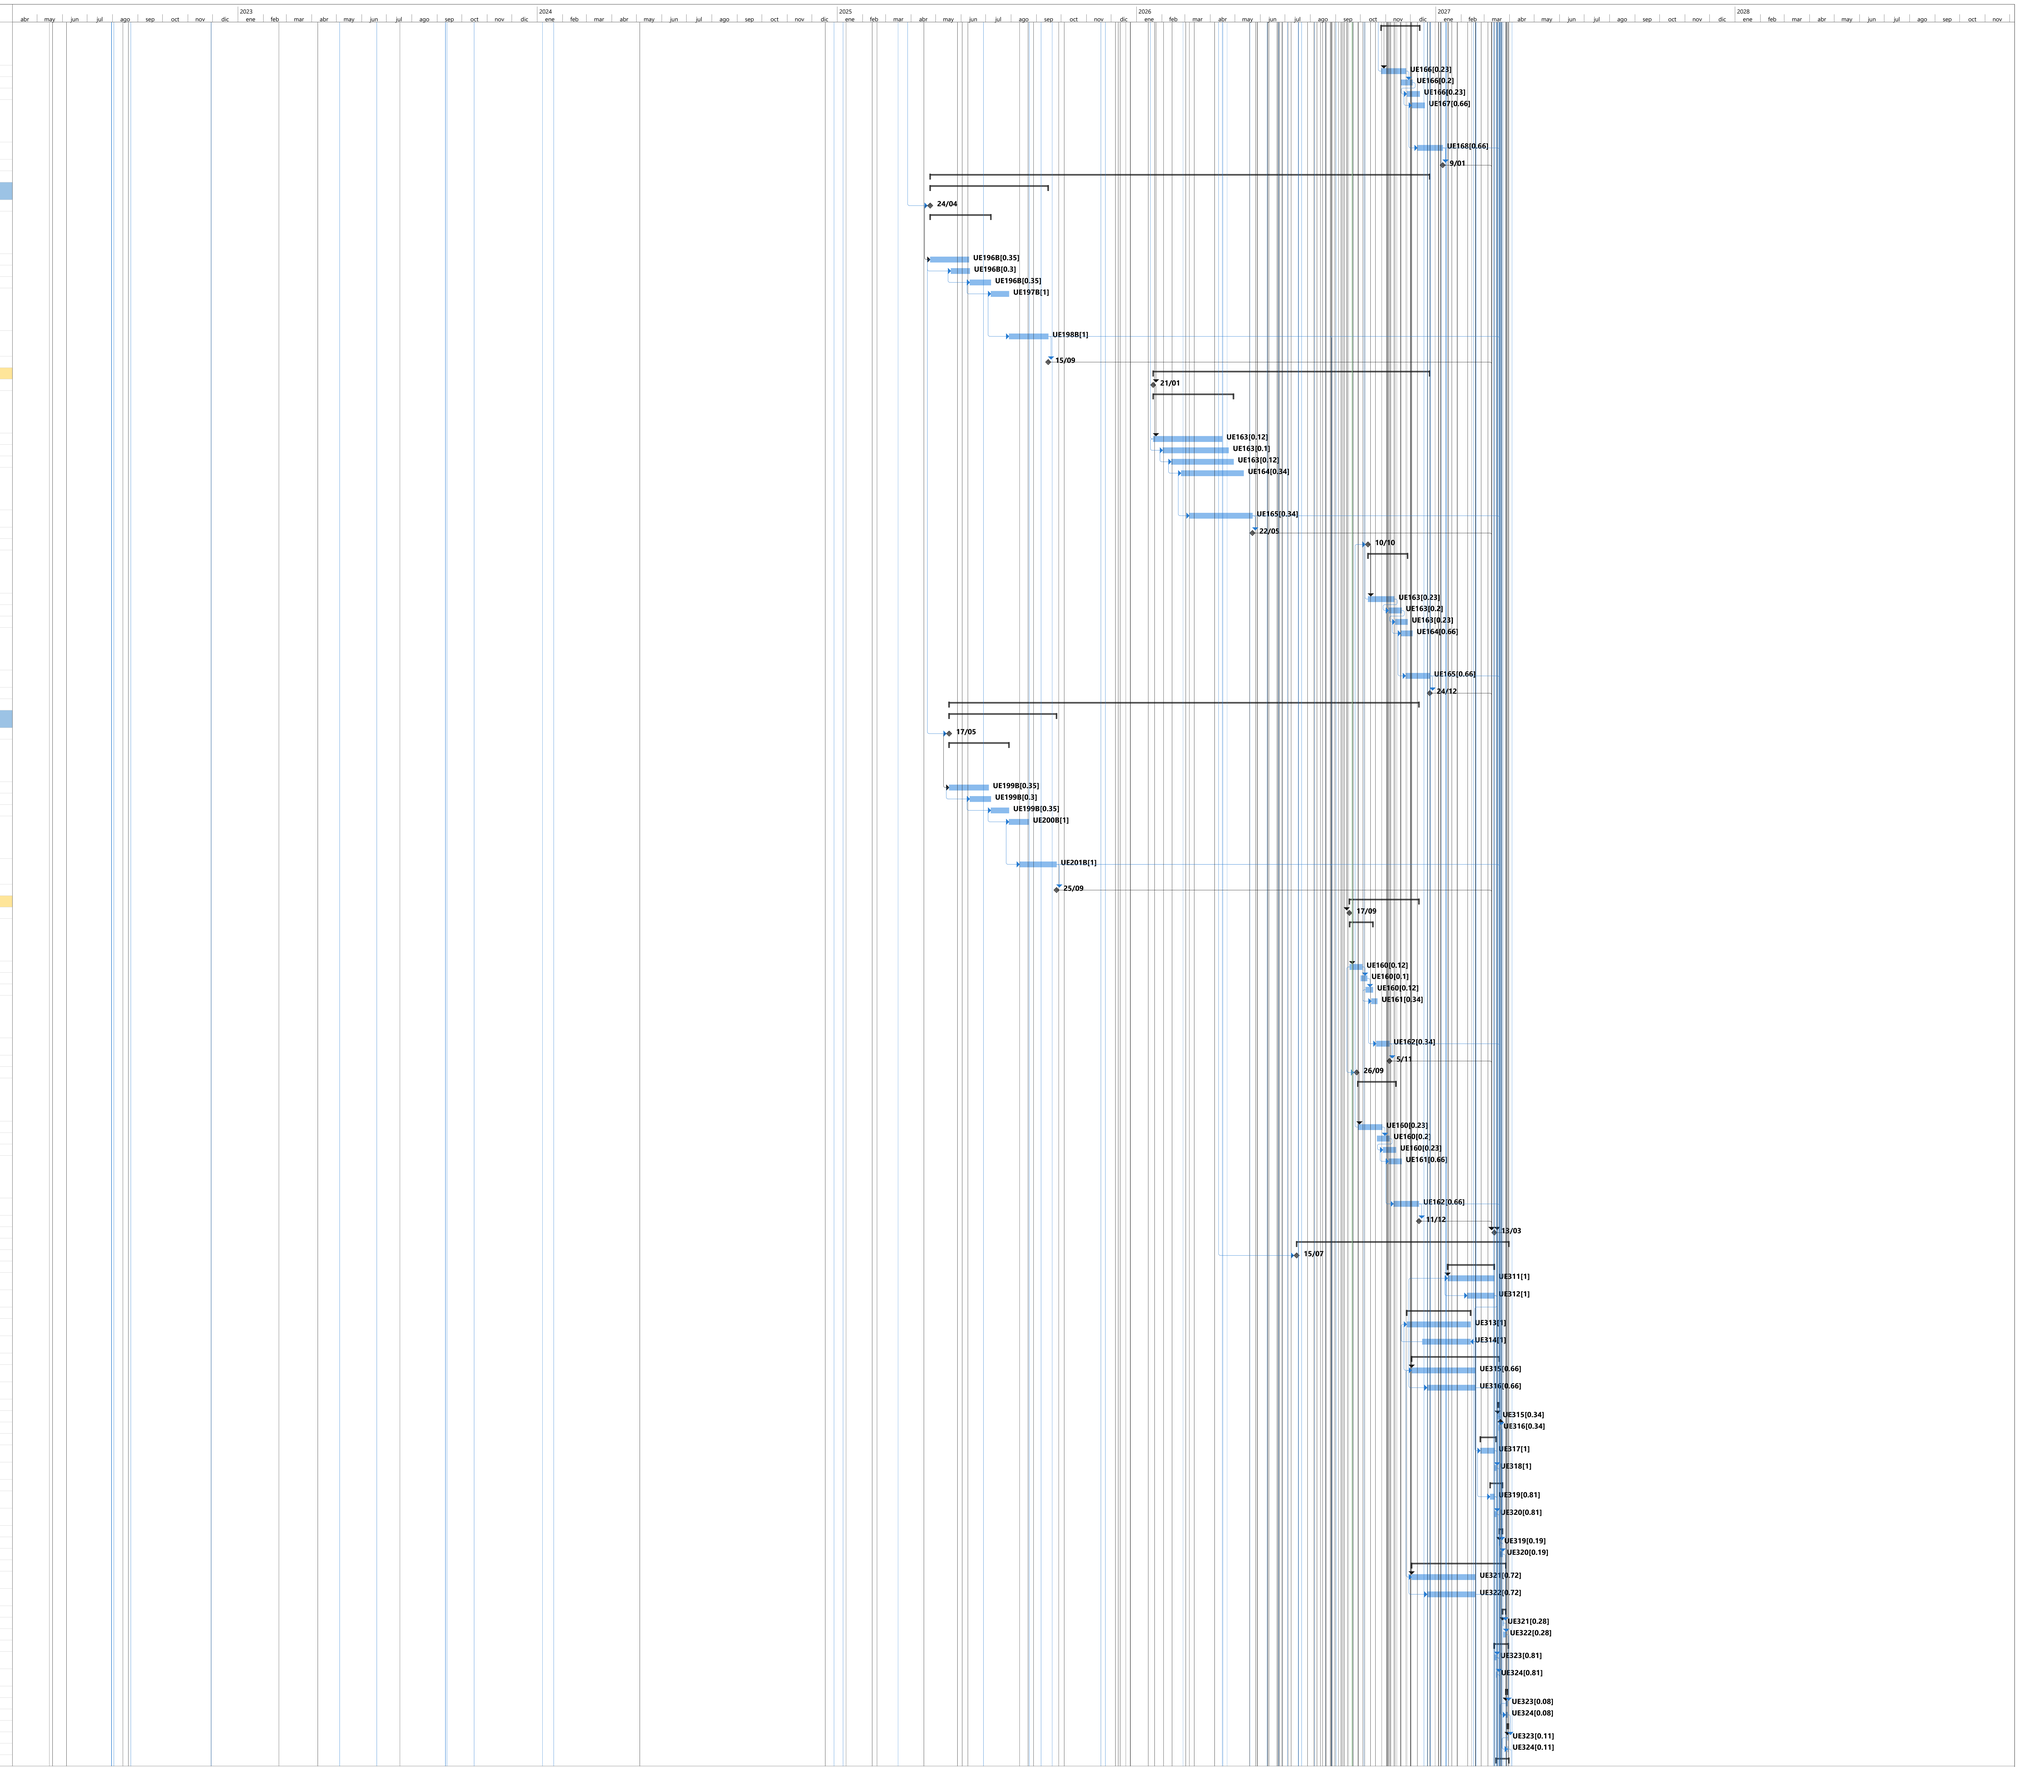

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1718	No	1718	UE325	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1719	No	1719	UE326	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
1720	**Sí**	**1720**		**Bocacalle Calle 15 Costado oriental**	**mar 30/03/27**	**mié 31/03/27**	**1 día**
1721	No	1721	UE325	Capas Granulares	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
1722	No	1722	UE326	Carpeta Asfáltica	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
1723	No	1723		Fin de Espacio Público	mié 17/03/27	mié 17/03/27	0 días
1724	No	1724		Fin Sector 7	mié 31/03/27	mié 31/03/27	0 días
1725	**Sí**	**1725**		**Sector 8 CALLE 14 a CALLE 10 Rio Soacha (K2+280-K2+760)**	**lun 16/05/22**	**mar 30/03/27**	**1495 días**
1726	No	1726		Inicio Sector 8	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
1727	**Sí**	**1727**		**PRELIMINARES**	**vie 11/09/26**	**mié 25/11/26**	**64 días**
1728	No	1728	DEMOL	Demoliciones de cimentaciones	vie 11/09/26	mié 25/11/26	64 días
1729	**Sí**	**1729**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**mié 12/08/26**	**mié 24/03/27**	**190 días**
1730	No	1730		Inicio Instalación y traslado de redes	mié 25/11/26	mié 25/11/26	0 días
1731	**Sí**	**1731**		**REDES SECAS**	**mié 25/11/26**	**sáb 13/03/27**	**92 días**
1732	No	1732	RS-S8	Inicio Redes Secas	mié 25/11/26	mié 25/11/26	0 días
1733	No	1733	RSGA-S	Red Gas (Acero)	mié 25/11/26	mié 25/11/26	0 días
1734	No	1734	RSGP-S	Red Gas (polietileno)	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	92 días
1735	No	1735	RSEN-S	Red ENEL	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	92 días
1736	No	1736	RSET-S	Red ETB	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	92 días
1737	No	1737	RSM-S8	Red de Movistar	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	92 días
1738	No	1738	RS-S8	Fin Redes Secas	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1739	**Sí**	**1739**		**REDES HUMEDAS**	**mié 12/08/26**	**mié 24/03/27**	**190 días**
1740	No	1740	RH-S8	Inicio Redes Húmedas	mié 12/08/26	mié 12/08/26	0 días
1741	No	1741	RHA-S8	Red Acueducto	mié 12/08/26	jue 14/01/27	130 días
1742	No	1742	RHP-S8	Red de Alcantarillado Pluvial	mié 12/08/26	jue 14/01/27	130 días
1743	No	1743	RHS-S8	Red de Alcantarillado Sanitario	mié 12/08/26	jue 14/01/27	130 días
1744	**Sí**	**1744**		**Colector Sanitario sector 8**	**jue 18/03/27**	**mié 24/03/27**	**4 días**
1745	No	1745	RHS-S8	Red sanitaria costado oriental (UE148- UE150)	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
1746	No	1746	RHS-S8	Red sanitaria costado oriental (UE151- UE153)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
1747	No	1747	RHS-S8	Red sanitaria costado oriental (UE154- UE156)	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
1748	No	1748	RHS-S8	Red sanitaria costado oriental (UE157- UE159)	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
1749	No	1749	RH-S8	Fin de Redes Húmedas	jue 14/01/27	jue 14/01/27	0 días
1750	No	1750	RH-S8	Fin Instalación y traslado de redes	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1751	**Sí**	**1751**		**CORREDORES - S8**	**lun 16/05/22**	**mar 30/03/27**	**1495 días**
1752	No	1752		inicio de corredor	mié 19/03/25	mié 19/03/25	0 días
1753	**Sí**	**1753**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+640-K2+760)**	**lun 16/05/22**	**lun 29/03/27**	**1494 días**
1754	**Sí**	**1754**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+840-K0+960)**	**lun 16/05/22**	**vie 2/10/26**	**1347 días**
1755	No	1755		Inicio de Calzada	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
1756	Sí	1756	UE202B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 1/07/26	vie 14/08/26	37 días
1757	No	1757		Excavación	mié 1/07/26	vie 31/07/26	25 días
1758	No	1758		Mejoramiento con Rajón	vie 24/07/26	sáb 8/08/26	12 días
1759	No	1759		Subbase Granular SBG-A	vie 31/07/26	vie 14/08/26	12 días
1760	No	1760	UE203B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 6/08/26	sáb 5/09/26	25 días
1761	No	1761	UE204B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mié 19/08/26	vie 2/10/26	40 días
1762	No	1762		Fin de Calzada	lun 16/05/22	lun 16/05/22	0 días
1763	**Sí**	**1763**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+640-K2+**	**lun 8/03/27**	**lun 29/03/27**	**15 días**
1764	No	1764		Inicio de Calzada (Carril 3)	lun 8/03/27	lun 8/03/27	0 días
1765	Sí	1765	UE157	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/03/27	mar 16/03/27	7 días
1766	No	1766		Excavación	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	5 días
1767	No	1767		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1768	No	1768		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1769	No	1769	UE158	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
1770	No	1770	UE159	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
1771	No	1771		Fin de Calzada (Carril 3)	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
1772	No	1772		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	mié 24/03/27	mié 24/03/27	0 días
1773	**Sí**	**1773**	**UE157**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mié 24/03/27**	**sáb 27/03/27**	**1 día**
1774	No	1774		Excavación	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1775	No	1775		Mejoramiento con Rajón	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1776	No	1776		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1777	No	1777	UE158	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1778	No	1778	UE159	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1779	No	1779		Fin de Calzada (Carril 1-2)	lun 29/03/27	lun 29/03/27	0 días
1780	**Sí**	**1780**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+520-K2+640)**	**mar 7/07/26**	**mar 30/03/27**	**222 días**
1781	**Sí**	**1781**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+960-K1+080)**	**mar 7/07/26**	**vie 25/09/26**	**68 días**
1782	No	1782		Inicio de Calzada	mar 7/07/26	mar 7/07/26	0 días
1783	Sí	1783	UE205B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mar 7/07/26	sáb 29/08/26	44 días
1784	No	1784		Excavación	mar 7/07/26	mar 25/08/26	40 días
1785	No	1785		Mejoramiento con Rajón	lun 3/08/26	jue 27/08/26	20 días
1786	No	1786		Subbase Granular SBG-A	mié 5/08/26	sáb 29/08/26	20 días
1787	No	1787	UE206B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 8/08/26	mar 1/09/26	20 días
1788	No	1788	UE207B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 11/08/26	vie 25/09/26	40 días
1789	No	1789		Fin de Calzada	vie 25/09/26	vie 25/09/26	0 días
1790	**Sí**	**1790**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+520-K2+**	**vie 19/02/27**	**mar 30/03/27**	**31 días**
1791	No	1791		Inicio de Calzada (Carril 3)	vie 19/02/27	vie 19/02/27	0 días
1792	Sí	1792	UE154	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 19/02/27	sáb 13/03/27	20 días
1793	No	1793		Excavación	vie 19/02/27	lun 8/03/27	14 días
1794	No	1794		Mejoramiento con Rajón	jue 4/03/27	vie 12/03/27	7 días
1795	No	1795		Subbase Granular SBG-A	mié 10/03/27	sáb 13/03/27	3 días
1796	No	1796	UE155	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1797	No	1797	UE156	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1798	No	1798		Fin de Calzada (Carril 3)	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
1799	No	1799		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
1800	**Sí**	**1800**	**UE154**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 23/03/27**	**sáb 27/03/27**	**2 días**
1801	No	1801		Excavación	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
1802	No	1802		Mejoramiento con Rajón	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
1803	No	1803		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1804	No	1804	UE155	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1805	No	1805	UE156	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
1806	No	1806		Fin de Calzada (Carril 1-2)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
1807	**Sí**	**1807**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+400-K2+520)**	**jue 9/07/26**	**mar 30/03/27**	**220 días**
1808	**Sí**	**1808**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+080-K1+200)**	**jue 9/07/26**	**lun 28/09/26**	**68 días**
1809	No	1809		Inicio de Calzada	jue 9/07/26	jue 9/07/26	0 días
1810	Sí	1810	UE208B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	jue 9/07/26	mar 1/09/26	44 días
1811	No	1811		Excavación	jue 9/07/26	jue 27/08/26	40 días
1812	No	1812		Mejoramiento con Rajón	mié 5/08/26	sáb 29/08/26	20 días
1813	No	1813		Subbase Granular SBG-A	sáb 8/08/26	mar 1/09/26	20 días
1814	No	1814	UE209B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 11/08/26	jue 3/09/26	20 días
1815	No	1815	UE210B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	jue 13/08/26	lun 28/09/26	40 días
1816	No	1816		Fin de Calzada	lun 28/09/26	lun 28/09/26	0 días
1817	**Sí**	**1817**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+400-K2+**	**mié 3/02/27**	**mar 30/03/27**	**46 días**
1818	No	1818		Inicio de Calzada (Carril 3)	mié 3/02/27	mié 3/02/27	0 días
1819	Sí	1819	UE151	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 3/02/27	mar 2/03/27	24 días
1820	No	1820		Excavación	mié 3/02/27	jue 18/02/27	14 días

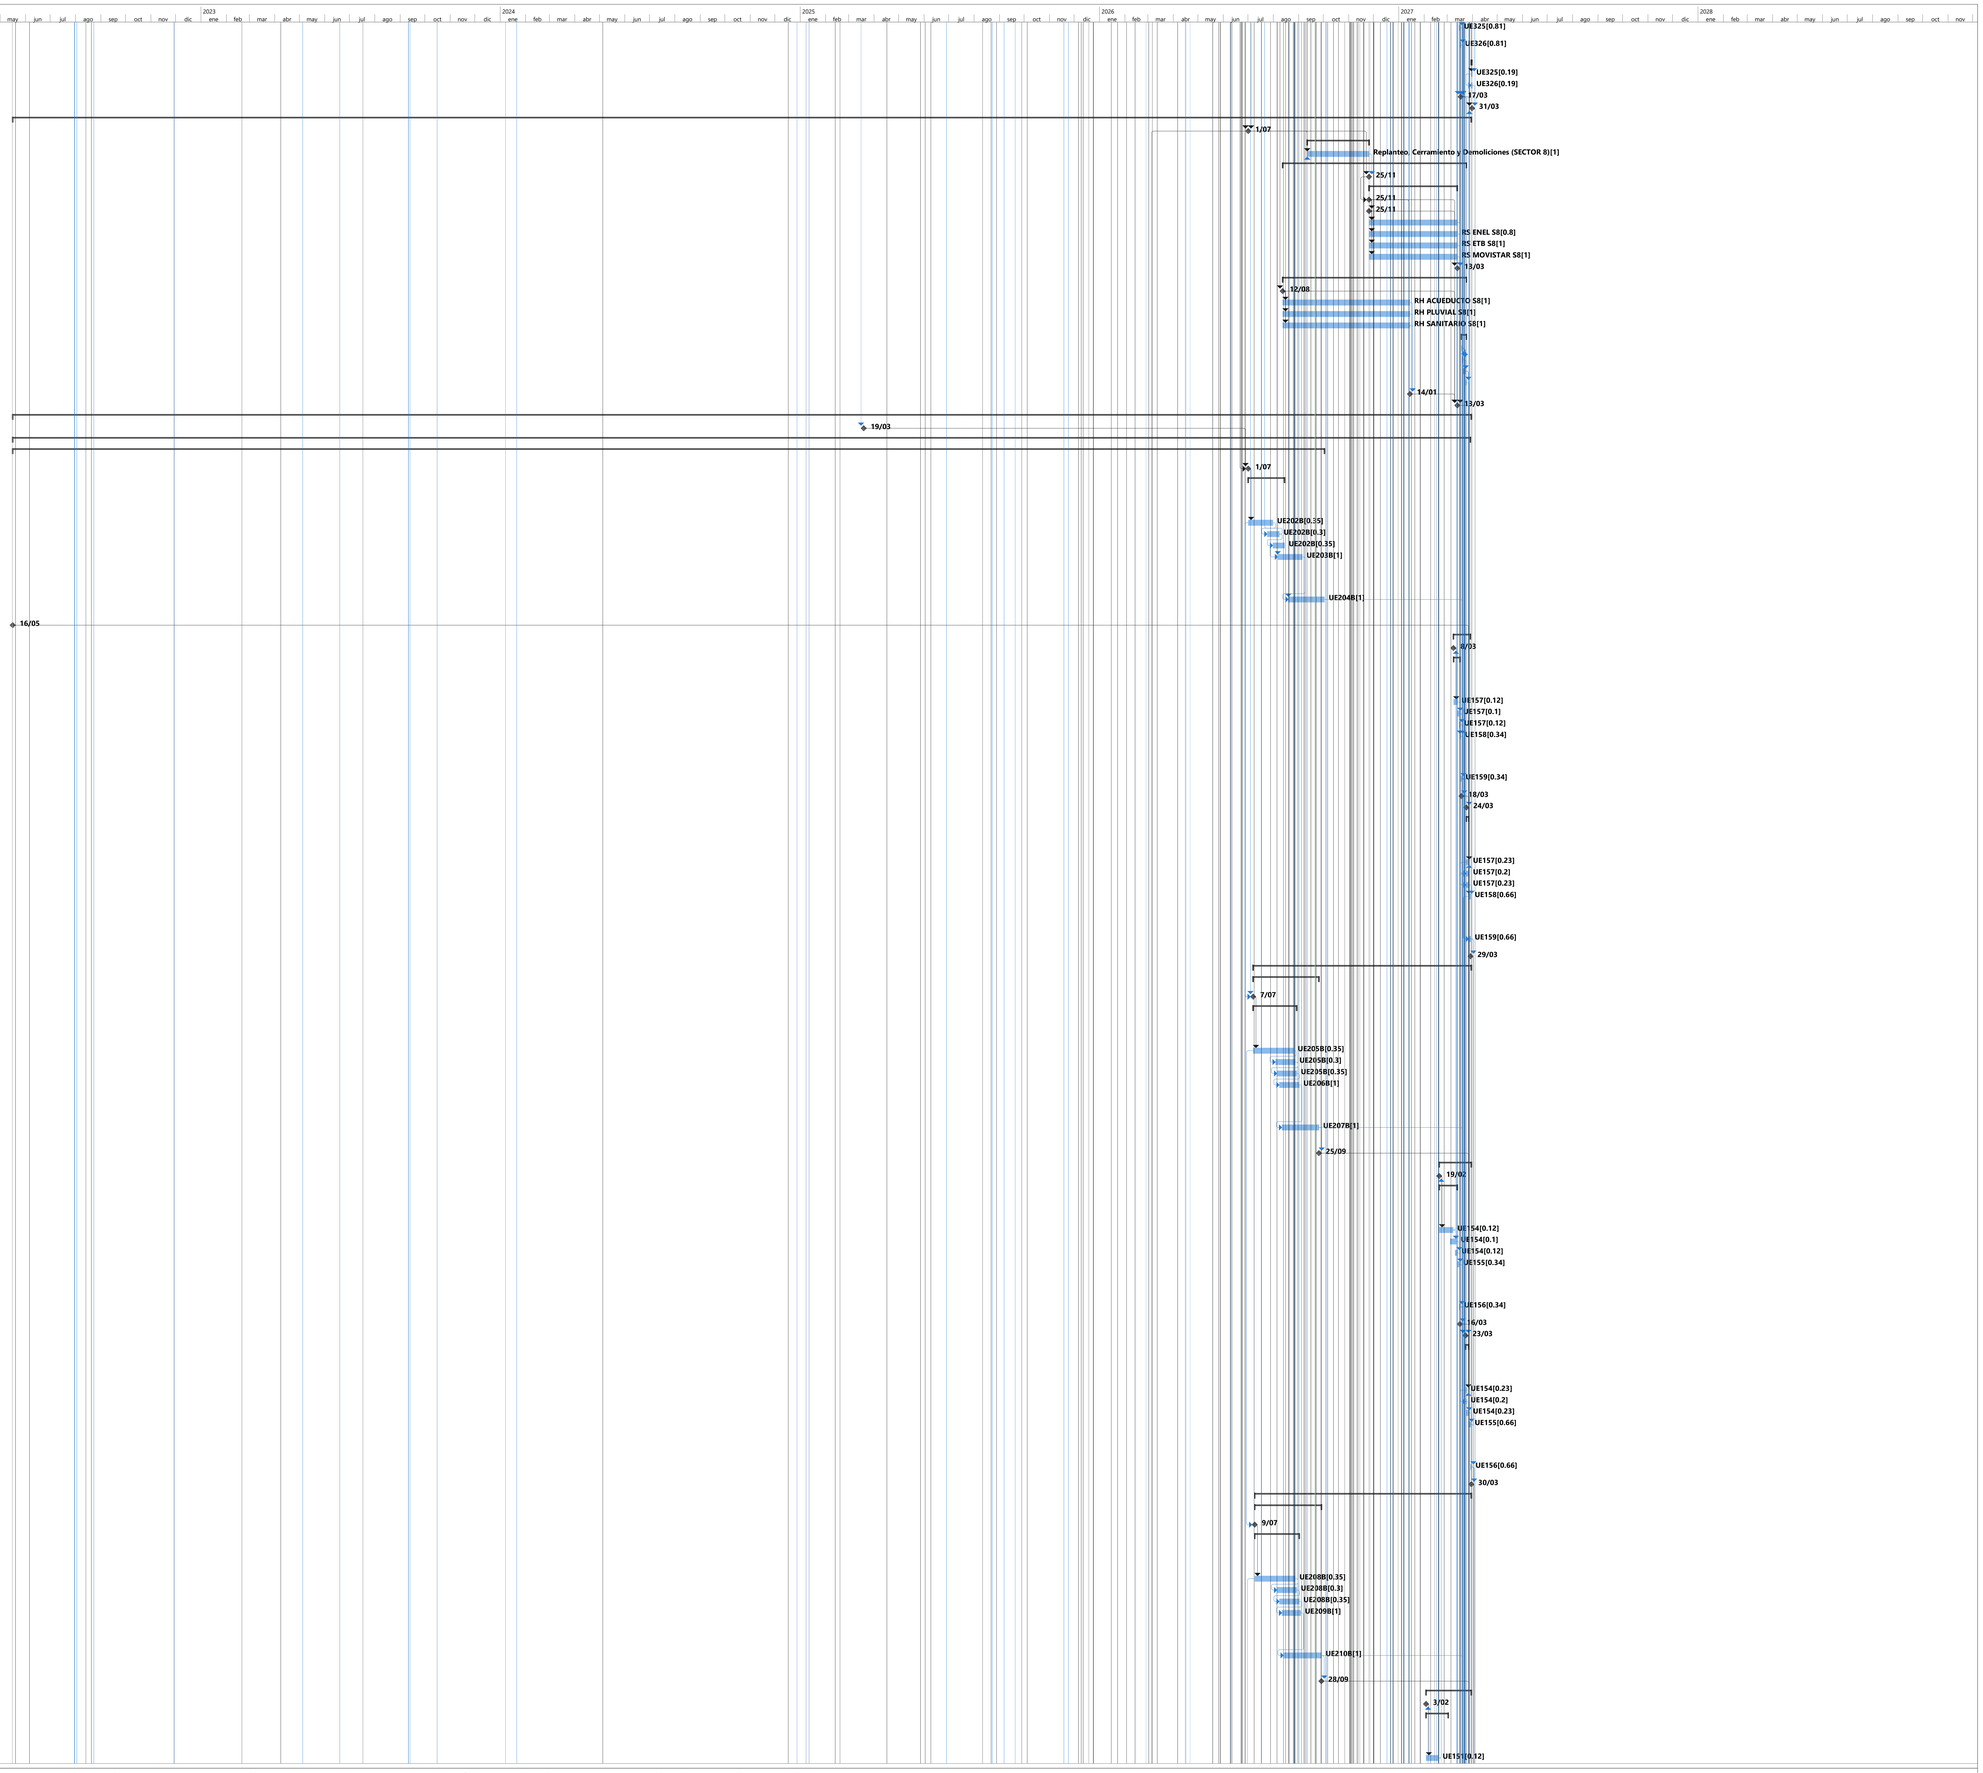


Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1821	No	1821		Mejoramiento con Rajón	mar 16/02/27	mié 24/02/27	7 días
1822	No	1822		Subbase Granular SBG-A	lun 22/02/27	mar 2/03/27	7 días
1823	No	1823	UE152	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/02/27	lun 8/03/27	7 días
1824	No	1824	UE153	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 3/03/27	sáb 13/03/27	10 días
1825	No	1825		Fin de Calzada (Carril 3)	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1826	No	1826		Inicio de Calzada (Carril 1-2)	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
1827	**Sí**	**1827**	**UE151**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**sáb 20/03/27**	**sáb 27/03/27**	**3 días**
1828	No	1828		Excavación	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
1829	No	1829		Mejoramiento con Rajón	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
1830	No	1830		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1831	No	1831	UE152	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1832	No	1832	UE153	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
1833	No	1833		Fin de Calzada (Carril 1-2)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
1834	**Sí**	**1834**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+280-K2+400)**	**vie 10/07/26**	**lun 29/03/27**	**217 días**
1835	**Sí**	**1835**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+200-K1+320)**	**vie 10/07/26**	**mié 30/09/26**	**68 días**
1836	No	1836		Inicio de Calzada	vie 10/07/26	vie 10/07/26	0 días
1837	Sí	1837	UE211B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 10/07/26	jue 3/09/26	44 días
1838	No	1838		Excavación	vie 10/07/26	sáb 29/08/26	40 días
1839	No	1839		Mejoramiento con Rajón	sáb 8/08/26	mar 1/09/26	20 días
1840	No	1840		Subbase Granular SBG-A	mar 11/08/26	jue 3/09/26	20 días
1841	No	1841	UE212B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 13/08/26	sáb 5/09/26	20 días
1842	No	1842	UE213B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
1843	No	1843		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
1844	**Sí**	**1844**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+280-K2+**	**sáb 16/01/27**	**lun 29/03/27**	**60 días**
1845	No	1845		Inicio de Calzada (Carril 3)	sáb 16/01/27	sáb 16/01/27	0 días
1846	Sí	1846	UE148	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 16/01/27	vie 12/02/27	24 días
1847	No	1847		Excavación	sáb 16/01/27	mar 2/02/27	14 días
1848	No	1848		Mejoramiento con Rajón	sáb 30/01/27	lun 8/02/27	7 días
1849	No	1849		Subbase Granular SBG-A	jue 4/02/27	vie 12/02/27	7 días
1850	No	1850	UE149	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 10/02/27	jue 18/02/27	7 días
1851	No	1851	UE150	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 13/02/27	mar 2/03/27	14 días
1852	No	1852		Fin de Calzada (Carril 3)	mar 2/03/27	mar 2/03/27	0 días
1853	No	1853		Inicio de Calzada(Carril 1-2)	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
1854	**Sí**	**1854**	**UE148**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**vie 19/03/27**	**mié 24/03/27**	**3 días**
1855	No	1855		Excavación	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
1856	No	1856		Mejoramiento con Rajón	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
1857	No	1857		Subbase Granular SBG-A	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
1858	No	1858	UE149	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
1859	No	1859	UE150	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
1860	No	1860		Fin de Calzada (Carril 1-2)	lun 29/03/27	lun 29/03/27	0 días
1861	No	1861		Fin de corredores	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
1862	**Sí**	**1862**		**URBANISMO GIRARDOT-BOGOTA**	**sáb 16/01/27**	**sáb 20/03/27**	**56 días**
1863	No	1863		Inicio de Espacio Público	sáb 16/01/27	sáb 16/01/27	0 días
1864	**Sí**	**1864**		**Espacio Público CALLE 14 - CALLE 13**	**sáb 16/01/27**	**sáb 13/03/27**	**50 días**
1865	No	1865	UE327	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 16/01/27	sáb 13/03/27	50 días
1866	No	1866	UE328	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 28/01/27	sáb 13/03/27	40 días
1867	**Sí**	**1867**		**Espacio Público CALLE 13 - CALLE 12**	**jue 28/01/27**	**mar 16/03/27**	**42 días**
1868	No	1868	UE329	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 28/01/27	sáb 13/03/27	40 días
1869	No	1869	UE330	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 9/02/27	sáb 13/03/27	30 días
1870	**Sí**	**1870**		**Bocacalle Calle 13 Costado oriental**	**sáb 13/03/27**	**mar 16/03/27**	**2 días**
1871	No	1871	UE329	Capas Granulares	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
1872	No	1872	UE330	Carpeta Asfáltica	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1873	**Sí**	**1873**		**Espacio Público CALLE 12 - CALLE 11**	**jue 28/01/27**	**jue 18/03/27**	**44 días**
1874	No	1874	UE331	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 28/01/27	sáb 13/03/27	40 días
1875	No	1875	UE332	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 13/02/27	sáb 13/03/27	25 días
1876	**Sí**	**1876**		**Bocacalle Calle 12 Costado oriental**	**mar 16/03/27**	**jue 18/03/27**	**2 días**
1877	No	1877	UE331	Capas Granulares	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
1878	No	1878	UE332	Carpeta Asfáltica	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
1879	**Sí**	**1879**		**Espacio Público CALLE 11 - CALLE 10**	**mar 9/02/27**	**sáb 20/03/27**	**36 días**
1880	No	1880	UE333	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 9/02/27	sáb 13/03/27	30 días
1881	No	1881	UE334	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 25/02/27	sáb 13/03/27	15 días
1882	**Sí**	**1882**		**Bocacalle Calle 11 Costado oriental**	**jue 18/03/27**	**sáb 20/03/27**	**2 días**
1883	No	1883	UE333	Capas Granulares	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
1884	No	1884	UE334	Carpeta Asfáltica	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
1885	No	1885		Fin de Espacio Público	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
1886	No	1886		Fin Sector 8	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
1887	**Sí**	**1887**		**Construcción colector Sur sector**	**mié 8/05/24**	**sáb 29/08/26**	**708 días**
1888	No	1888		HITO DE CONTROL: Solución Contractual "Colector Sur" Alcantarillado Pluvial	mié 8/05/24	mié 8/05/24	0 días
1889	No	1889		APROBACIÓN DE PMT DE ALTO IMPACTO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SUR.	mar 25/06/24	mar 25/06/24	0 días
1890	No	1890		conciliación y aprobación de Precios no previstos del pipe Jacking por parte del CVS, EFR e interventoría.	mar 25/06/24	mar 25/06/24	0 días
1891	**Sí**	**1891**		**COLECTOR SUR**	**mar 25/06/24**	**sáb 29/08/26**	**668 días**
1892	No	1892		APROBACIÓN DE ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA Y SUBSIDENCIA	mar 25/06/24	mar 25/06/24	0 días
1893	No	1893		SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD	mié 26/06/24	lun 15/07/24	16 días
1894	No	1894		PRELIMINARES (TENER APROBADO EL PMT Y TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS)	jue 17/10/24	mar 5/11/24	16 días
1895	No	1895		SONDEOS Y GEORRADAR	mar 5/11/24	vie 15/11/24	8 días
1896	No	1896		APROBACIÓN DEL PMT 55	lun 16/12/24	lun 16/12/24	0 días
1897	No	1897		apiques de las redes	lun 16/12/24	mar 24/12/24	8 días
1898	No	1898		protección de las redes	jue 16/01/25	mié 22/01/25	5 días
1899	No	1899		Excavación y mejoramiento	jue 2/01/25	jue 9/01/25	5 días
1900	No	1900		instalación de granulares	mié 22/01/25	vie 31/01/25	9 días
1901	No	1901		instalación de asfalto	vie 31/01/25	lun 3/02/25	2 días
1902	No	1902		demolición de separador	jue 6/02/25	mié 12/02/25	5 días
1903	No	1903		protecciónde red de media de ENEL	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 día
1904	**Sí**	**1904**	**REDCOL**	**PIPE JACKING**	**vie 3/01/25**	**jue 26/03/26**	**379 días**
1905	No	1905		INICIO DE CONSTRUCCIÓN	vie 3/01/25	vie 3/01/25	0 días
1906	No	1906		MEJORAMIENTO DEL PL105 RECIBO	vie 17/01/25	sáb 15/02/25	26 días
1907	No	1907		CONSTRUCCIÓN DEL PL105 RECIBO	mar 29/04/25	lun 9/06/25	35 días
1908	No	1908		PRELIMINARES DEL POZO 114 (ADECUACIÓN PMT 55 Y DEMOLICIÓN DE SEPARADOR	vie 3/01/25	mié 12/02/25	34 días
1909	No	1909		CONSTRUCCIÓN DEL PL 114 LANZAMIENTO	lun 17/02/25	mar 29/04/25	60 días
1910	No	1910		INSTALACIÓN DE TUNELADORA Y ACCESORIOS	mar 29/04/25	mié 21/05/25	19 días
1911	No	1911		CONSTRUCCIÓN DEL PL 121 RECIBO	mar 10/06/25	sáb 19/07/25	34 días
1912	No	1912		LANZAMIENTO DE TUBERIA DESDE EL PL114 al PL105	mar 10/06/25	vie 1/08/25	45 días
1913	No	1913		RETORNAR LA TUNELADORA	mié 20/08/25	lun 1/09/25	10 días
1914	No	1914		LANZAMIENTO DE TUBERIA DESDE EL PL 114 AL PL 121	sáb 6/09/25	mié 10/12/25	80 días
1915	No	1915		POZO INTERMEDIO PL108	lun 23/02/26	jue 26/03/26	28 días
1916	No	1916		POZO INTERMEDIO PL111	lun 29/12/25	vie 30/01/26	28 días
1917	No	1917		POZO INTERMEDIO PL 115	mar 17/02/26	jue 19/03/26	28 días
1918	No	1918		POZO INTERMEDIO PL 116	sáb 3/01/26	jue 5/02/26	28 días
1919	No	1919		POZO INTERMEDIO PL 121	jue 5/02/26	lun 9/03/26	28 días
1920	**Sí**	**1920**		**ZANJA ABIERTA**	**vie 27/06/25**	**sáb 29/08/26**	**358 días**
1921	**Sí**	**1921**		**INICIO DE CONSTRUCCIÓN**	**vie 27/06/25**	**sáb 29/08/26**	**358 días**
1922	No	1922	REDCOL	EXCAVACIÓN DE ZANJA PÁRA TUBERIA DE 60"	jue 10/07/25	mar 14/04/26	235 días
1923	No	1923	REDCOL	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 60"	mar 15/07/25	lun 20/04/26	235 días
1924	No	1924	REDCOL	INSTALACIÓN DE LLENOS PARA TUBERIA DE 60"	vie 18/07/25	jue 23/04/26	235 días
1925	No	1925	REDCOL	EXCAVACIÓN DE ZANJA PÁRA TUBERIA DE 64"	vie 17/07/26	mié 19/08/26	25 días
1926	No	1926	REDCOL	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 64"	vie 24/07/26	mar 25/08/26	25 días
1927	No	1927	REDCOL	INSTALACIÓN DE LLENOS PARA TUBERIA DE 64"	jue 30/07/26	sáb 29/08/26	25 días
1928	No	1928	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 045(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 15/04/26	sáb 18/04/26	3 días
1929	No	1929	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 150(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	vie 27/06/25	mié 2/07/25	3 días
1930	No	1930	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 149(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	jue 11/09/25	lun 15/09/25	3 días
1931	No	1931	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 148(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 1/10/25	vie 3/10/25	3 días
1932	No	1932	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 147(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	lun 27/10/25	jue 30/10/25	3 días
1933	No	1933	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 146(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	lun 24/11/25	mié 26/11/25	3 días
1934	No	1934	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 145(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	jue 18/12/25	lun 22/12/25	3 días

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1935	No	1935	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 144(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	vie 16/01/26	mar 20/01/26	3 días
1936	No	1936	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 143(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 3/02/26	vie 6/02/26	3 días
1937	No	1937	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 142(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	vie 20/02/26	mar 24/02/26	3 días
1938	No	1938	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 141(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 10/03/26	vie 13/03/26	3 días
1939	No	1939	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 140(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 17/03/26	jue 19/03/26	3 días
1940	No	1940	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 139(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 7/04/26	jue 9/04/26	3 días
1941	No	1941	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 138(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	lun 13/04/26	jue 16/04/26	3 días
1942	No	1942	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 244(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	sáb 18/04/26	mié 22/04/26	3 días
1943	No	1943	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 137(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	vie 24/04/26	mar 28/04/26	3 días
1944	No	1944	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 136(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	jue 30/04/26	mar 5/05/26	3 días
1945	No	1945	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 135(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 6/05/26	sáb 9/05/26	3 días
1946	No	1946	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 134(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 12/05/26	vie 15/05/26	3 días
1947	No	1947	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 133(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 19/05/26	vie 22/05/26	3 días
1948	No	1948	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 132(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	lun 25/05/26	jue 28/05/26	3 días
1949	No	1949	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 247(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	3 días
1950	No	1950	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 131(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	jue 4/06/26	mar 9/06/26	3 días
1951	No	1951	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 130(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	jue 11/06/26	mar 16/06/26	3 días
1952	No	1952	REDCOL	EXCAVACIÓN DE ZANJA PÁRA TUBERIA DE 54"	vie 26/09/25	sáb 27/12/25	77 días
1953	No	1953	REDCOL	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 54"	lun 29/09/25	mar 30/12/25	77 días
1954	No	1954	REDCOL	INSTALACIÓN DE LLENOS PARA TUBERIA DE 54"	jue 2/10/25	sáb 3/01/26	77 días
1955	No	1955	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 129(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 5/11/25	vie 7/11/25	3 días
1956	No	1956	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 128(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 12/11/25	vie 14/11/25	3 días
1957	No	1957	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 127(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	3 días
1958	No	1958	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 126(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 10/12/25	vie 12/12/25	3 días
1959	No	1959	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 125(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 17/12/25	vie 19/12/25	3 días
1960	No	1960	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 124(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	3 días
1961	No	1961	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 123(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	mié 31/12/25	lun 5/01/26	3 días
1962	No	1962	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 122(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	jue 8/01/26	mar 13/01/26	3 días
1963	No	1963	REDCOL	INSTALACIÓN DEL PL 243(SOLADO E INSTALACIÓN DE PL)	vie 16/01/26	mar 20/01/26	3 días
1964	No	1964	REDCOL	EXCAVACIÓN DE ZANJA PÁRA TUBERIA DE 48"	jue 20/11/25	mar 12/05/26	145 días
1965	No	1965	REDCOL	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 48"	jue 20/11/25	mar 12/05/26	145 días
1966	No	1966	REDCOL	INSTALACIÓN DE LLENOS PARA TUBERIA DE 48"	lun 24/11/25	vie 15/05/26	145 días
1967	No	1967	REDCOL	EXCAVACIÓN DE ZANJA PÁRA TUBERIA DE 48"	sáb 8/11/25	lun 5/01/26	47 días
1968	No	1968	REDCOL	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 48"	sáb 8/11/25	lun 5/01/26	47 días
1969	No	1969	REDCOL	INSTALACIÓN DE LLENOS PARA TUBERIA DE 48"	mié 12/11/25	jue 8/01/26	47 días
1970	No	1970	REDCOL	FIN	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 días
1971	**Sí**	**1971**		**Sector 9 CALLE 10 Rio Soacha a CALLE 3 (K1+680 - K2+280)**	**jue 12/06/25**	**mar 30/03/27**	**548 días**
1972	No	1972		Entrega de Predios por parte de la EFR	jue 12/06/25	jue 12/06/25	0 días
1973	No	1973		Inicio Sector 9	lun 26/01/26	lun 26/01/26	0 días
1974	**Sí**	**1974**		**PRELIMINARES**	**vie 30/01/26**	**mar 17/02/26**	**15 días**
1975	No	1975	DEMOL	Demolición de Cimentaciones	vie 30/01/26	mar 17/02/26	15 días
1976	**Sí**	**1976**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**mié 17/06/26**	**mié 17/03/27**	**230 días**
1977	No	1977		Inicio Instalación y traslado de redes	mié 17/06/26	mié 17/06/26	0 días
1978	**Sí**	**1978**		**REDES SECAS**	**mié 12/08/26**	**lun 7/12/26**	**100 días**
1979	No	1979	RS-S9	Inicio Redes Secas	mié 12/08/26	mié 12/08/26	0 días
1980	No	1980	RSGA-S	Red Gas (Acero)	mié 12/08/26	mié 12/08/26	0 días
1981	No	1981	RSGP-S	Red Gas (polietileno)	mié 12/08/26	lun 7/12/26	100 días
1982	No	1982	RSEN-S	Red ENEL	mié 12/08/26	lun 7/12/26	100 días
1983	No	1983	RSET-S	Red ETB	mié 12/08/26	lun 7/12/26	100 días
1984	No	1984	RSM-S9	Red de Movistar	mié 12/08/26	lun 7/12/26	100 días
1985	No	1985	RS-S9	Fin Redes Secas	lun 7/12/26	lun 7/12/26	0 días
1986	**Sí**	**1986**		**REDES HUMEDAS**	**jue 23/07/26**	**mié 17/03/27**	**201 días**
1987	No	1987	RH-S9	Inicio Redes Húmedas	jue 23/07/26	jue 23/07/26	0 días
1988	No	1988	RHA-S9	Red Acueducto	jue 23/07/26	jue 24/12/26	130 días
1989	No	1989	RHP-S9	Red de Alcantarillado Pluvial	mar 11/08/26	mié 13/01/27	130 días
1990	**Sí**	**1990**	**RHS-S9**	**Red de Alcantarillado Sanitario**	**mié 29/07/26**	**mié 17/03/27**	**196 días**
1991	No	1991	RHS-S9	Red sanitaria costado oriental (UE133-UE135)	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
1992	No	1992	RHS-S9	Red sanitaria costado oriental (UE136-UE138)	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
1993	No	1993	RHS-S9	Red sanitaria costado oriental (UE139-UE141)	mié 29/07/26	vie 28/08/26	25 días
1994	No	1994	RH-S9	Fin de Redes Húmedas	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
1995	No	1995	RH-S9	Fin Instalación y traslado de redes	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
1996	**Sí**	**1996**		**CORREDORES - S9**	**jue 18/12/25**	**mar 30/03/27**	**388 días**
1997	No	1997		Inicio de Corredores	jue 18/12/25	jue 18/12/25	0 días
1998	**Sí**	**1998**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+160-K2+280)**	**mié 1/07/26**	**vie 19/03/27**	**221 días**
1999	**Sí**	**1999**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+160-K2+**	**vie 17/07/26**	**vie 26/02/27**	**189 días**
2000	No	2000		Inicio de Calzada	vie 17/07/26	vie 17/07/26	0 días
2001	Sí	2001	UE145	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 17/07/26	vie 4/09/26	40 días
2002	No	2002		Excavación- Rellenos	vie 17/07/26	vie 4/09/26	40 días
2003	No	2003		Mejoramiento con Rajón	jue 30/07/26	mar 25/08/26	20 días
2004	No	2004		Subbase Granular SBG-A	mié 12/08/26	vie 4/09/26	20 días
2005	No	2005	UE146	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO (Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	mar 25/08/26	lun 7/09/26	12 días
2006	No	2006	UE147	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	vie 4/09/26	mié 30/09/26	23 días
2007	No	2007	UE146	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	jue 1/10/26	sáb 10/10/26	8 días
2008	No	2008	UE147	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. (Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	mar 9/02/27	vie 26/02/27	17 días
2009	No	2009		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2010	**Sí**	**2010**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+320-K1+440)**	**mié 1/07/26**	**vie 19/03/27**	**221 días**
2011	No	2011		Inicio de Calzada	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
2012	Sí	2012	UE214B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 1/07/26	mar 1/09/26	51 días
2013	No	2013		Excavación	mié 1/07/26	jue 20/08/26	40 días
2014	No	2014		Mejoramiento con Rajón	jue 6/08/26	lun 31/08/26	20 días
2015	No	2015		Subbase Granular SBG-A	sáb 8/08/26	mar 1/09/26	20 días
2016	No	2016	UE215B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 1 no afectada asentamientos BOX)	vie 21/08/26	jue 3/09/26	12 días
2017	No	2017	UE216B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).(Etapa 1 no afectada	vie 21/08/26	jue 17/09/26	23 días
2018	No	2018	UE215B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO(Etapa 2 AFECTADA asentamientos BOX)	jue 21/01/27	vie 29/01/27	8 días
2019	No	2019	UE216B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).(Etapa 2 AFECTADA	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2020	No	2020		Fin de Calzada	jue 17/09/26	jue 17/09/26	0 días
2021	**Sí**	**2021**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+040-K2+160)**	**jue 18/06/26**	**mar 29/09/26**	**86 días**
2022	**Sí**	**2022**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+040-K2+**	**mié 15/07/26**	**mar 29/09/26**	**65 días**
2023	No	2023		Inicio de Calzada	mié 15/07/26	mié 15/07/26	0 días
2024	Sí	2024	UE142	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 15/07/26	mar 1/09/26	40 días
2025	No	2025		Excavación- Rellenos	mié 15/07/26	mar 1/09/26	40 días
2026	No	2026		Mejoramiento con Rajón	lun 27/07/26	jue 20/08/26	20 días
2027	No	2027		Subbase Granular SBG-A	sáb 1/08/26	mié 26/08/26	20 días
2028	No	2028	UE143	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 8/08/26	mar 1/09/26	20 días
2029	No	2029	UE144	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 14/08/26	mar 29/09/26	40 días
2030	No	2030		Fin de Calzada	mar 29/09/26	mar 29/09/26	0 días
2031	**Sí**	**2031**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+440-K1+560)**	**jue 18/06/26**	**mié 23/09/26**	**81 días**
2032	No	2032		Inicio de Calzada	jue 18/06/26	jue 18/06/26	0 días
2033	Sí	2033	UE217B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	jue 18/06/26	mar 25/08/26	54 días
2034	No	2034		Excavación- Rellenos	jue 18/06/26	jue 6/08/26	40 días
2035	No	2035		Mejoramiento con Rajón	jue 23/07/26	mar 18/08/26	20 días
2036	No	2036		Subbase Granular SBG-A	jue 30/07/26	mar 25/08/26	20 días

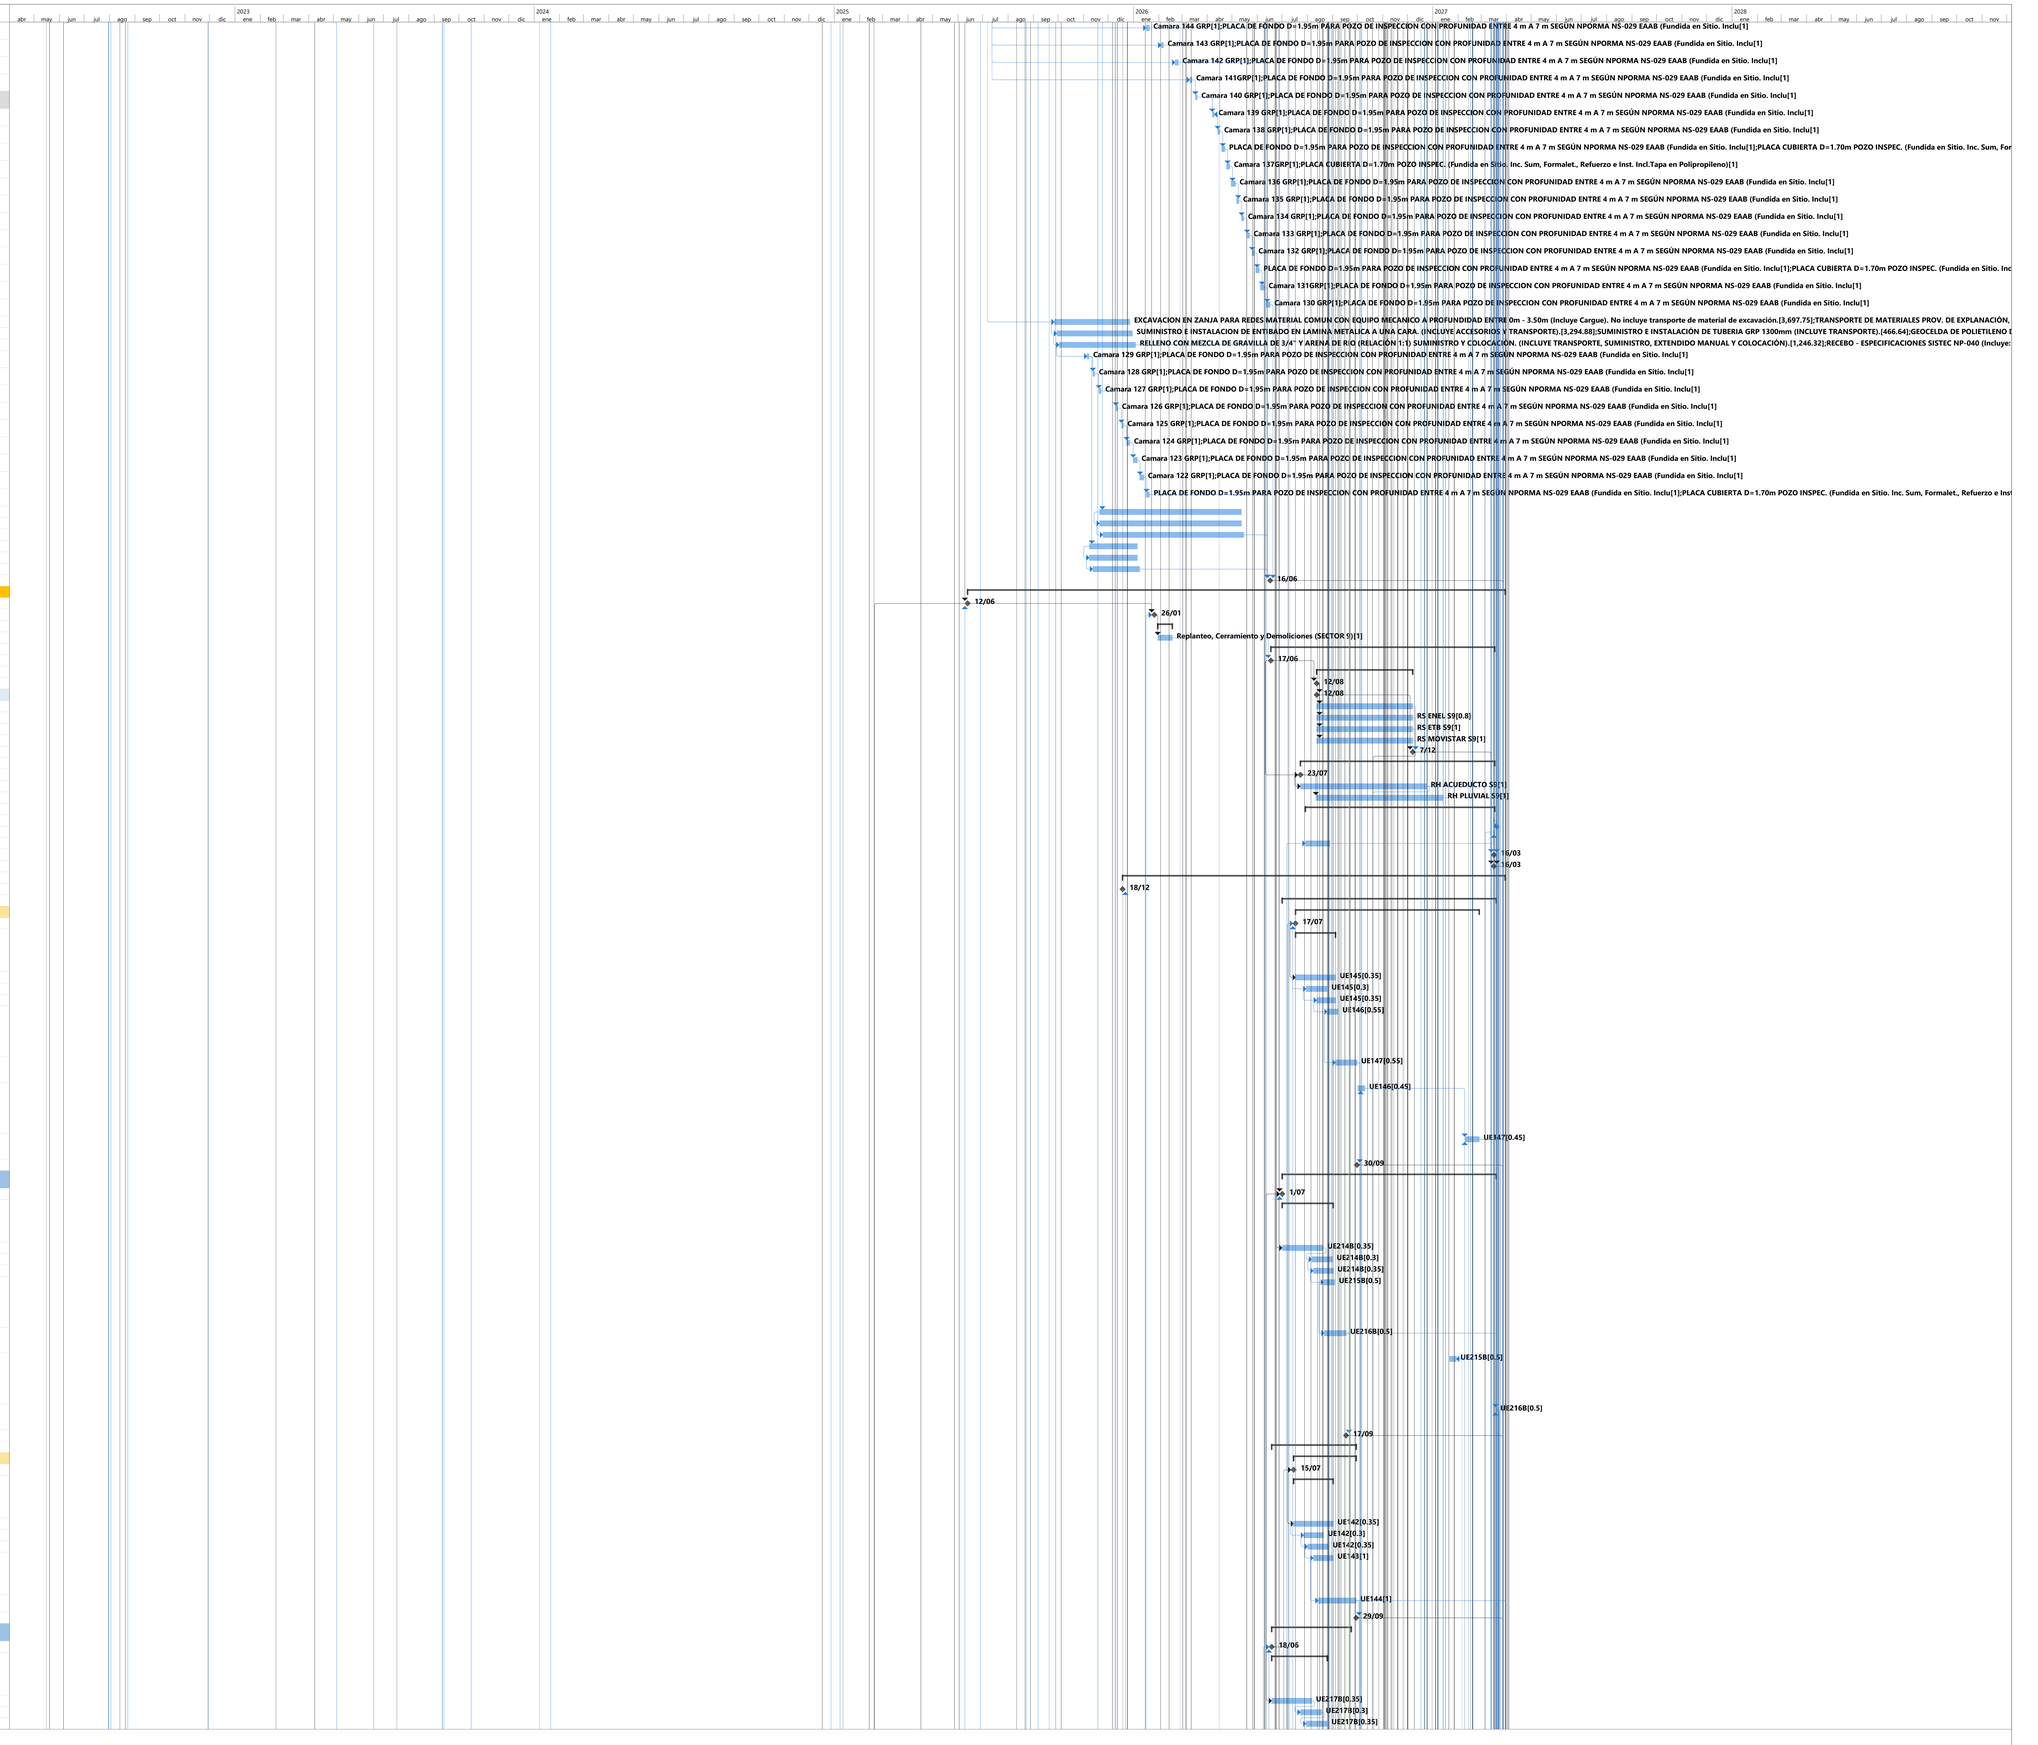

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	Id TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2037	No	2037	UE218B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>80 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 5/08/26	sáb 29/08/26	20 días
2038	No	2038	UE218B	Inicio de Calzada PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Acabados Separado)	sáb 8/08/26	mié 2/09/26	40 días
2039	No	2039		Fin de Calzada	mié 23/09/26	mié 23/09/26	0 días
2040	Sí	2040		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+925-K2+040)**	**jue 11/06/26**	**mar 29/09/26**	**91 días**
2041	Sí	2041		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+925-K1+960)**	**jue 11/06/26**	**jue 3/09/26**	**58 días**
2042	No	2042		Inicio de Calzada	vie 10/07/26	vie 10/07/26	0 días
2043	Sí	2043	UE139	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye separado)	vie 10/07/26	mié 2/09/26	44 días
2044	No	2044		Excavación- Rellenos	vie 10/07/26	sáb 29/08/26	40 días
2045	No	2045		Mejoramiento con Rajón	jue 6/08/26	lun 31/08/26	20 días
2046	No	2046		Subbase Granular SBG-A	lun 10/08/26	mié 2/09/26	20 días
2047	No	2047	UE140	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 12/08/26	mié 4/09/26	20 días
2048	No	2048	UE141	Fin de Calzada PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML	vie 14/08/26	mar 29/09/26	40 días
2049	No	2049		Fin de Calzada	mar 29/09/26	mar 29/09/26	0 días
2050	Sí	2050		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+960-K2+040)**	**jue 11/06/26**	**jue 3/09/26**	**68 días**
2051	No	2051		Inicio de Calzada	vie 31/07/26	vie 31/07/26	0 días
2052	Sí	2052	UE220B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye separado)	jue 11/06/26	mié 5/08/26	44 días
2053	No	2053		Excavación- Rellenos	jue 11/06/26	vie 31/07/26	40 días
2054	No	2054		Mejoramiento con Rajón	jue 9/07/26	lun 3/08/26	20 días
2055	No	2055		Subbase Granular SBG-A	lun 13/07/26	mié 5/08/26	20 días
2056	No	2056	UE221B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 15/07/26	sáb 8/08/26	20 días
2057	No	2057	UE222B	Fin de Calzada PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Acabados Separado)	jue 16/07/26	jue 3/09/26	40 días
2058	No	2058		Fin de Calzada	jue 3/09/26	jue 3/09/26	0 días
2059	Sí	2059		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+800-K1+920)**	**vie 10/07/26**	**mar 30/03/27**	**218 días**
2060	Sí	2060		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+800-K1+960 mar 16/03/27**	**mar 16/03/27**	**mar 30/03/27**	**9 días**
2061	No	2061		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
2062	Sí	2062	UE136	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML	mar 16/03/27	vie 19/03/27	3 días
2063	No	2063		Excavación- Rellenos	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2064	No	2064		Mejoramiento con Rajón	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2065	No	2065		Subbase Granular SBG-A	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2066	No	2066	UE137	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2067	No	2067	UE138	Fin de Calzada PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	0 días
2068	No	2068		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	sáb 20/03/27	sáb 20/03/27	0 días
2069	No	2069		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
2070	Sí	2070	UE136	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mié 24/03/27**	**sáb 27/03/27**	**1 día**
2071	No	2071		Excavación- Rellenos	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2072	No	2072		Mejoramiento con Rajón	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2073	No	2073		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2074	No	2074	UE137	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 24/03/27	lun 29/03/27	1 día
2075	No	2075	UE138	Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	lun 29/03/27	mar 30/03/27	0 días
2076	No	2076		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2077	Sí	2077		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+960-K1+800)**	**vie 10/07/26**	**mié 21/10/26**	**86 días**
2078	No	2078		Inicio de Calzada	vie 10/07/26	vie 10/07/26	0 días
2079	Sí	2079	UE223B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye separado)	vie 10/07/26	mié 23/09/26	62 días
2080	No	2080		Excavación- Rellenos	vie 10/07/26	sáb 29/08/26	40 días
2081	No	2081		Mejoramiento con Rajón	lun 31/08/26	mié 23/09/26	20 días
2082	No	2082		Subbase Granular SBG-A	mar 1/09/26	mié 23/09/26	20 días
2083	No	2083	UE224B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 3/09/26	vie 25/09/26	20 días
2084	No	2084	UE225B	Fin de Calzada PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Acabados Separado)	sáb 5/09/26	mié 21/10/26	40 días
2085	No	2085		Fin de Calzada	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días
2086	Sí	2086		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+680-K1+800)**	**vie 10/07/26**	**sáb 27/03/27**	**216 días**
2087	Sí	2087		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+680-K1+960 mar 16/03/27**	**sáb 27/03/27**		**216 días**
2088	No	2088		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
2089	Sí	2089	UE133	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML	mar 16/03/27	vie 19/03/27	3 días
2090	No	2090		Excavación- Rellenos	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2091	No	2091		Mejoramiento con Rajón	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2092	No	2092		Subbase Granular SBG-A	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2093	No	2093	UE134	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2094	No	2094	UE135	Fin de Calzada PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	3 días
2095	No	2095		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
2096	No	2096		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
2097	Sí	2097	UE133	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mié 24/03/27**	**sáb 27/03/27**	**1 día**
2098	No	2098		Inicio de Calzada	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	0 días
2099	No	2099		Excavación- Rellenos	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2100	No	2100		Mejoramiento con Rajón	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2101	No	2101	UE194	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2102	No	2102	UE195	Subbase Granular SBG-A PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2103	No	2103		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	sáb 27/03/27	sáb 27/03/27	0 días
2104	Sí	2104		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+680-K1+920)**	**vie 10/07/26**	**mié 30/09/26**	**58 días**
2105	No	2105		Inicio de Calzada	vie 10/07/26	vie 10/07/26	0 días
2106	Sí	2106	UE226B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye separado)	vie 10/07/26	sáb 3/09/26	44 días
2107	No	2107		Excavación- Rellenos	vie 10/07/26	sáb 29/08/26	40 días
2108	No	2108		Mejoramiento con Rajón	lun 31/08/26	mié 23/09/26	20 días
2109	No	2109		Subbase Granular SBG-A	mar 1/09/26	jue 3/09/26	20 días
2110	No	2110	UE227B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVÍAS INV455 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML. EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>30 MPAM, RESPETANDO COTA GEOMÉTRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 13/08/26	sáb 5/09/26	20 días
2111	No	2111	UE228B	PLACA EN CONCRETO RÍGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML (Incluye Terminación y Acabados Separado)	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
2112	No	2112		Fin de Comedores	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2113	No	2113		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2114	Sí	2114		**UNIDAD FUNCIONAL 2 - GIRARDOT**	**vie 30/10/26**	**vie 23/04/27**	**127 días**
2115	Sí	2115		Inicio Espacio Público	vie 30/10/26	vie 30/10/26	0 días
2116	Sí	2116		**Espacio Público CALLE 10 - CALLE 7 (Etapa 1 - Plazoleta edificio sur)**	**mié 24/06/26**	**lun 29/03/27**	**231 días**
2117	No	2117	UE335	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 24/06/26	mié 29/07/26	28 días
2118	No	2118	UE336	MANZANA FUNCIONALIZADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 16/07/26	mié 30/09/26	65 días
2119	Sí	2119		**Espacio Público CALLE 10 - CALLE 7 (Etapa 2 - Espacio mid-block)**	**vie 6/01/27**	**sáb 13/03/27**	**59 días**
2120	No	2120	UE335	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 6/01/27	vie 12/03/27	58 días
2121	No	2121	UE336	MANZANA FUNCIONALIZADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 18/01/27	sáb 13/03/27	49 días
2122	Sí	2122		**Espacio Público CALLE 10 - CALLE 7 (Etapa 3 - Zonas Bancarias)**	**mié 30/12/26**	**sáb 13/03/27**	**64 días**
2123	No	2123	UE335	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 30/12/26	lun 8/03/27	59 días
2124	No	2124	UE336	TERMINACIÓN Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 25/02/27	sáb 13/03/27	15 días

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

División
Resumen

Tarea
Hito
Tarea inactiva

Resumen del proyecto
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
sólo duración

Informe de resumen manual
Resumen manual


sólo el comienzo
sólo fin

Tareas externas
Hito externo

Fecha límite
Progreso

Progreso manual


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2125	**Sí**	**2125**		**Espacio Público CALLE 10 - CALLE 7 (Etapa 4 - Zonas duras río Soacha)**	**vie 18/09/26**	**lun 22/02/27**	**131 días**
2126	No	2126	UE335	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	vie 18/09/26	sáb 23/01/27	105 días
2127	No	2127	UE336	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 12/01/27	lun 22/02/27	36 días
2128	**Sí**	**2128**		**Bocacalle Calle 10 Costado oriental**	**sáb 27/03/27**	**lun 29/03/27**	**1 día**
2129	No	2129	UE335	Capas Granulares	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2130	No	2130	UE336	Carpeta Asfáltica	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2131	**Sí**	**2131**		**Espacio Público CALLE 7- CALLE 6A (Sector de escaleras)**	**mar 15/12/26**	**mar 16/03/27**	**78 días**
2132	No	2132	UE337	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 15/12/26	lun 8/02/27	46 días
2133	No	2133	UE338	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 9/02/27	sáb 13/03/27	30 días
2134	**Sí**	**2134**		**Espacio Público CALLE 7- CALLE 6A (Sector de actual vía Calle 7)**	**sáb 13/03/27**	**mar 16/03/27**	**2 días**
2135	No	2135	UE337	Capas Granulares	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2136	No	2136	UE338	Carpeta Asfáltica	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2137	**Sí**	**2137**		**Espacio Público CALLE 6A - CALLE 6**	**mar 1/12/26**	**jue 4/03/27**	**80 días**
2138	No	2138	UE339	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 1/12/26	jue 4/03/27	80 días
2139	No	2139	UE340	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 12/12/26	jue 4/03/27	70 días
2140	**Sí**	**2140**		**Espacio Público CALLE 6 - CALLE 5**	**sáb 22/08/26**	**sáb 27/03/27**	**182.5 días**
2141	No	2141	UE341	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 12/11/26	mar 16/02/27	80 días
2142	No	2142	UE342	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2143	**Sí**	**2143**		**Espacio Público CALLE 6 - CALLE 5 (Plazoleta costado oriental puente Ducales)**	**sáb 22/08/26**	**vie 30/10/26**	**60 días**
2144	No	2144	UE341	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 22/08/26	vie 25/09/26	30 días
2145	No	2145	UE342	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 25/09/26	vie 30/10/26	30 días
2146	**Sí**	**2146**		**Bocacalle Calle 6 Costado oriental**	**mié 24/03/27**	**sáb 27/03/27**	**1 día**
2147	No	2147	UE341	Capas Granulares	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2148	No	2148	UE342	Carpeta Asfáltica	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2149	**Sí**	**2149**		**Espacio Público CALLE 5 - CALLE 4**	**vie 30/10/26**	**mié 24/03/27**	**121 días**
2150	No	2150	UE343	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	vie 30/10/26	jue 4/02/27	80 días
2151	No	2151	UE344	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
2152	**Sí**	**2152**		**Bocacalle Calle 5 Costado oriental**	**mar 23/03/27**	**mié 24/03/27**	**1 día**
2153	No	2153	UE343	Capas Granulares	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2154	No	2154	UE344	Carpeta Asfáltica	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2155	No	2155		FIN DE ESPACIO PUBLICO	mié 24/03/27	mié 24/03/27	0 días
2156	No	2156		Fin Sector 9	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2157	**Sí**	**2157**		**Sector 10 CALLE 3 a CALLE 9 SUR (K0+600 - K1+680)**	**vie 19/09/25**	**mié 31/03/27**	**465 días**
2158	No	2158		Inicio Sector 10	mar 30/09/25	mar 30/09/25	0 días
2159	**Sí**	**2159**		**PRELIMINARES**	**jue 2/10/25**	**lun 20/10/25**	**15 días**
2160	No	2160	DEMOL	Demolición de Cimentaciones	jue 2/10/25	lun 20/10/25	15 días
2161	**Sí**	**2161**		**INSTALACIÓN DE REDES**	**mar 24/02/26**	**lun 15/03/27**	**321 días**
2162	No	2162		Inicio Instalación y traslado de redes	mar 24/02/26	mar 24/02/26	0 días
2163	**Sí**	**2163**		**REDES SECAS**	**vie 24/04/26**	**mar 5/01/27**	**210 días**
2164	No	2164	RS-S10	Inicio Redes Secas	vie 24/04/26	vie 24/04/26	0 días
2165	No	2165	RSEN-S	Red ENEL	jue 7/05/26	mar 5/01/27	200 días
2166	No	2166	RSET-S'	Red ETB	jue 7/05/26	mar 5/01/27	200 días
2167	No	2167	RSM-S1(	Red de Movistar	jue 7/05/26	mar 5/01/27	200 días
2168	No	2168	RSGA-S	Red Gas (Acero)	mié 10/06/26	mié 10/06/26	0 días
2169	No	2169	RSGP-S	Red Gas (polietleno)	mié 10/06/26	mié 23/09/26	87 días
2170	No	2170	RS-S10	Fin Redes Secas	mar 5/01/27	mar 5/01/27	0 días
2171	**Sí**	**2171**		**REDES HUMEDAS**	**vie 13/03/26**	**lun 15/03/27**	**306 días**
2172	No	2172	RH-S10	Inicio Redes Húmedas	vie 13/03/26	vie 13/03/26	0 días
2173	No	2173	RHA-S1(	Red Acueducto	vie 13/03/26	mar 29/09/26	165 días
2174	No	2174	RHP-S1(	Red de Alcantarillado Pluvial	vie 19/06/26	mar 5/01/27	165 días
2175	**Sí**	**2175**	**RHP-S1(**	**Red de Alcantarillado Sanitario**	**mié 13/01/27**	**lun 15/03/27**	**54 días**
2176	No	2176	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE106-UE108)	mié 13/01/27	lun 8/02/27	22 días
2177	No	2177	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE109-UE111)	lun 25/01/27	jue 18/02/27	22 días
2178	No	2178	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE112-UE114)	jue 4/02/27	jue 4/03/27	25 días
2179	No	2179	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE115-UE117)	mié 13/01/27	mié 10/02/27	25 días
2180	No	2180	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE118-UE120)	mié 27/01/27	mié 24/02/27	25 días
2181	No	2181	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE121-UE123)	mar 9/02/27	mar 9/03/27	25 días
2182	No	2182	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE124-UE126)	mar 23/02/27	sáb 13/03/27	17 días
2183	No	2183	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE127-UE129)	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	5 días
2184	No	2184	RHP-S1(	Red sanitaria costado oriental (UE130-UE132)	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2185	No	2185	RH-S10	Fin de Redes Húmedas	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
2186	No	2186	RH-S10	Fin Instalación y traslado de redes	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
2187	**Sí**	**2187**		**CORREDORES - S10**	**mié 25/03/26**	**mar 30/03/27**	**307 días**
2188	No	2188		Inicio de Corredores	sáb 4/07/26	sáb 4/07/26	0 días
2189	**Sí**	**2189**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+560-K1+680)**	**mar 12/05/26**	**mar 30/03/27**	**267 días**
2190	**Sí**	**2190**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+560-K1+680)**	**lun 15/03/27**	**mar 30/03/27**	**10 días**
2191	No	2191		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
2192	Sí	2192	UE130	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 15/03/27	jue 18/03/27	3 días
2193	No	2193		Excavación	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2194	No	2194		Mejoramiento con Rajón	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2195	No	2195		Subbase Granular SBG-A	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2196	No	2196	UE131	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2197	No	2197	UE132	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2198	No	2198		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	sáb 20/03/27	sáb 20/03/27	0 días
2199	No	2199		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
2200	**Sí**	**2200**	**UE130**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 23/03/27**	**sáb 27/03/27**	**2 días**
2201	No	2201		Excavación	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2202	No	2202		Mejoramiento con Rajón	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2203	No	2203		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2204	No	2204	UE131	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2205	No	2205	UE132	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2206	No	2206		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2207	**Sí**	**2207**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+920-K2+040)**	**mar 12/05/26**	**jue 17/09/26**	**106 días**
2208	No	2208		Inicio de Calzada	mar 12/05/26	mar 12/05/26	0 días
2209	Sí	2209	UE229B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	vie 12/06/26	vie 14/08/26	50 días
2210	No	2210		Excavación	vie 12/06/26	sáb 1/08/26	40 días
2211	No	2211		Mejoramiento con Rajón	mié 15/07/26	sáb 8/08/26	20 días
2212	No	2212		Subbase Granular SBG-A	mié 22/07/26	vie 14/08/26	20 días
2213	No	2213	UE230B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 27/07/26	jue 20/08/26	20 días
2214	No	2214	UE231B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	sáb 1/08/26	jue 17/09/26	40 días
2215	No	2215		Fin de Calzada	jue 17/09/26	jue 17/09/26	0 días
2216	**Sí**	**2216**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+440 - K1+560)**	**mié 6/05/26**	**mar 30/03/27**	**272 días**
2217	**Sí**	**2217**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+440 - K1+560)**	**sáb 13/03/27**	**mar 30/03/27**	**11 días**
2218	No	2218		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2219	Sí	2219	UE127	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 13/03/27	mar 16/03/27	2 días
2220	No	2220		Excavación	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2221	No	2221		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2222	No	2222		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2223	No	2223	UE128	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2224	No	2224	UE129	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2225	No	2225		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mié 17/03/27	mié 17/03/27	0 días
2226	No	2226		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	sáb 20/03/27	sáb 20/03/27	0 días
2227	**Sí**	**2227**	**UE127**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 23/03/27**	**lun 29/03/27**	**3 días**
2228	No	2228		Excavación	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2229	No	2229		Mejoramiento con Rajón	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2230	No	2230		Subbase Granular SBG-A	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2231	No	2231	UE128	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2232	No	2232	UE129	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2233	No	2233		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días

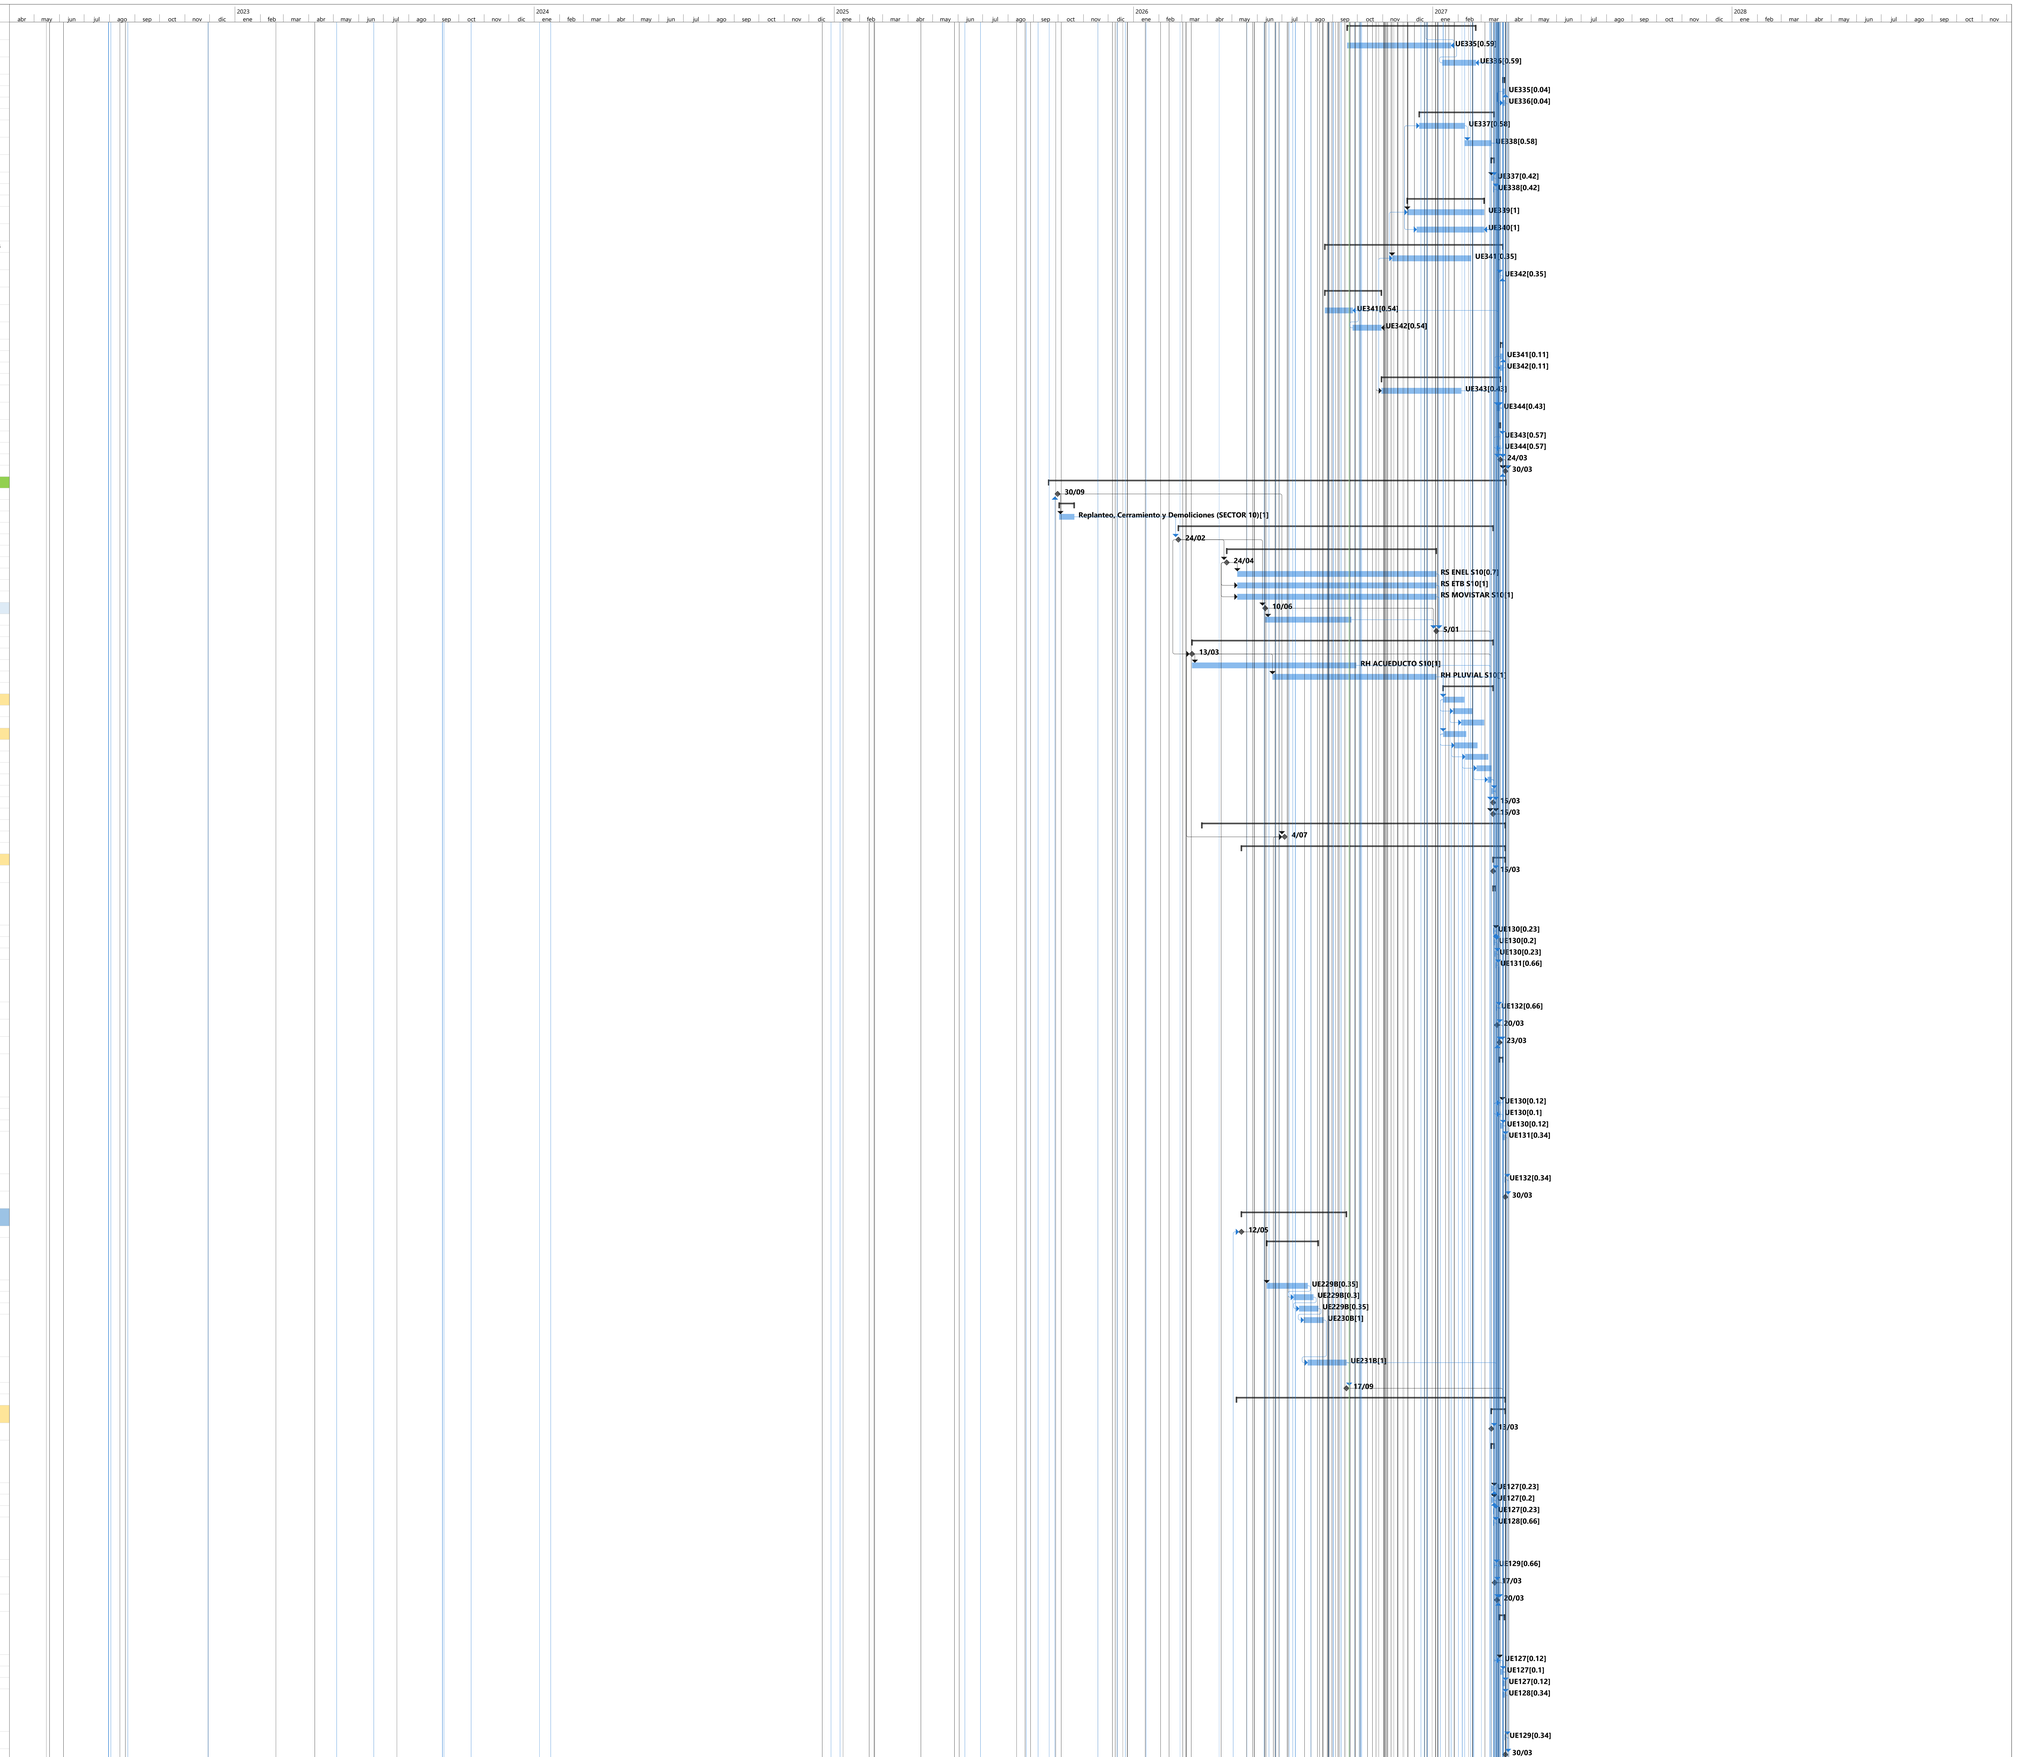

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2234	**Sí**	**2234**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+040 - K2+160)**	**mié 6/05/26**	**sáb 12/09/26**	**106 días**
2235	No	2235		Inicio de Calzada	mié 6/05/26	mié 6/05/26	0 días
2236	Sí	2236	UE232B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 6/05/26	sáb 8/08/26	76 días
2237	No	2237		Excavación	mié 6/05/26	mié 24/06/26	40 días
2238	No	2238		Mejoramiento con Rajón	mié 8/07/26	sáb 1/08/26	20 días
2239	No	2239		Subbase Granular SBG-A	mié 15/07/26	sáb 8/08/26	20 días
2240	No	2240	UE233B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 22/07/26	vie 14/08/26	20 días
2241	No	2241	UE234B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	lun 27/07/26	sáb 12/09/26	40 días
2242	No	2242		Fin de Calzada	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	0 días
2243	**Sí**	**2243**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+320-K1+440)**	**mié 29/04/26**	**mar 30/03/27**	**277 días**
2244	**Sí**	**2244**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+320-K1+**	**lun 8/03/27**	**mar 30/03/27**	**16 días**
2245	No	2245		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	lun 8/03/27	lun 8/03/27	0 días
2246	Sí	2246	UE124	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/03/27	mar 16/03/27	7 días
2247	No	2247		Excavación	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	5 días
2248	No	2248		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2249	No	2249		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2250	No	2250	UE125	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2251	No	2251	UE126	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2252	No	2252		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
2253	No	2253		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
2254	**Sí**	**2254**	**UE124**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 23/03/27**	**sáb 27/03/27**	**2 días**
2255	No	2255		Excavación	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2256	No	2256		Mejoramiento con Rajón	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2257	No	2257		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2258	No	2258	UE125	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2259	No	2259	UE126	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2260	No	2260		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2261	**Sí**	**2261**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+160-K2+280)**	**mié 29/04/26**	**sáb 5/09/26**	**105 días**
2262	No	2262		Inicio de Calzada	mié 29/04/26	mié 29/04/26	0 días
2263	Sí	2263	UE235B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	jue 30/04/26	mar 14/07/26	60 días
2264	No	2264		Excavación	jue 30/04/26	jue 18/06/26	40 días
2265	No	2265		Mejoramiento con Rajón	jue 4/06/26	mié 1/07/26	20 días
2266	No	2266		Subbase Granular SBG-A	jue 18/06/26	mar 14/07/26	20 días
2267	No	2267	UE236B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 24/06/26	mar 21/07/26	20 días
2268	No	2268	UE237B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 21/07/26	sáb 5/09/26	40 días
2269	No	2269		Fin de Calzada	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	0 días
2270	**Sí**	**2270**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+200-K1+320)**	**vie 24/04/26**	**mar 30/03/27**	**282 días**
2271	**Sí**	**2271**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+200-K1+**	**mar 23/02/27**	**mar 30/03/27**	**28 días**
2272	No	2272		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 23/02/27	mar 23/02/27	0 días
2273	Sí	2273	UE121	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 23/02/27	mar 16/03/27	19 días
2274	No	2274		Excavación	mar 23/02/27	sáb 13/03/27	17 días
2275	No	2275		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2276	No	2276		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2277	No	2277	UE122	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2278	No	2278	UE123	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2279	No	2279		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
2280	No	2280		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
2281	**Sí**	**2281**	**UE121**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 23/03/27**	**sáb 27/03/27**	**2 días**
2282	No	2282		Excavación	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2283	No	2283		Mejoramiento con Rajón	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2284	No	2284		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2285	No	2285	UE122	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2286	No	2286	UE123	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2287	No	2287		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2288	**Sí**	**2288**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+280-K2+400)**	**vie 24/04/26**	**mié 30/09/26**	**132 días**
2289	No	2289		Inicio de Calzada	vie 24/04/26	vie 24/04/26	0 días
2290	Sí	2290	UE238B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	vie 24/04/26	jue 6/08/26	85 días
2291	No	2291		Excavación	vie 24/04/26	jue 11/06/26	40 días
2292	No	2292		Mejoramiento con Rajón	mié 24/06/26	mar 21/07/26	20 días
2293	No	2293		Subbase Granular SBG-A	mar 14/07/26	jue 6/08/26	20 días
2294	No	2294	UE239B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 31/07/26	mar 25/08/26	20 días
2295	No	2295	UE240B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
2296	No	2296		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2297	**Sí**	**2297**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+080-K1+200)**	**sáb 18/04/26**	**mar 30/03/27**	**287 días**
2298	**Sí**	**2298**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT-BOGOTA GIRARDOT - BOGOTÁ (K1+080-K1+200)**	**mar 9/02/27**	**mar 30/03/27**	**40 días**
2299	No	2299		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 9/02/27	mar 9/02/27	0 días
2300	Sí	2300	UE118	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/02/27	sáb 13/03/27	29 días
2301	No	2301		Excavación	mar 9/02/27	mié 10/03/27	26 días
2302	No	2302		Mejoramiento con Rajón	jue 4/03/27	sáb 13/03/27	9 días
2303	No	2303		Subbase Granular SBG-A	jue 11/03/27	sáb 13/03/27	2 días
2304	No	2304	UE119	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2305	No	2305	UE120	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2306	No	2306		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
2307	No	2307		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	vie 19/03/27	vie 19/03/27	0 días
2308	**Sí**	**2308**	**UE118**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**sáb 20/03/27**	**sáb 27/03/27**	**3 días**
2309	No	2309		Excavación	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
2310	No	2310		Mejoramiento con Rajón	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2311	No	2311		Subbase Granular SBG-A	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2312	No	2312	UE119	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2313	No	2313	UE120	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2314	No	2314		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2315	**Sí**	**2315**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+400-K2+2520)**	**sáb 18/04/26**	**mar 25/08/26**	**105 días**
2316	No	2316		Inicio de Calzada	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	0 días
2317	Sí	2317	UE241B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	sáb 18/04/26	mié 1/07/26	60 días
2318	No	2318		Excavación	sáb 18/04/26	jue 4/06/26	40 días

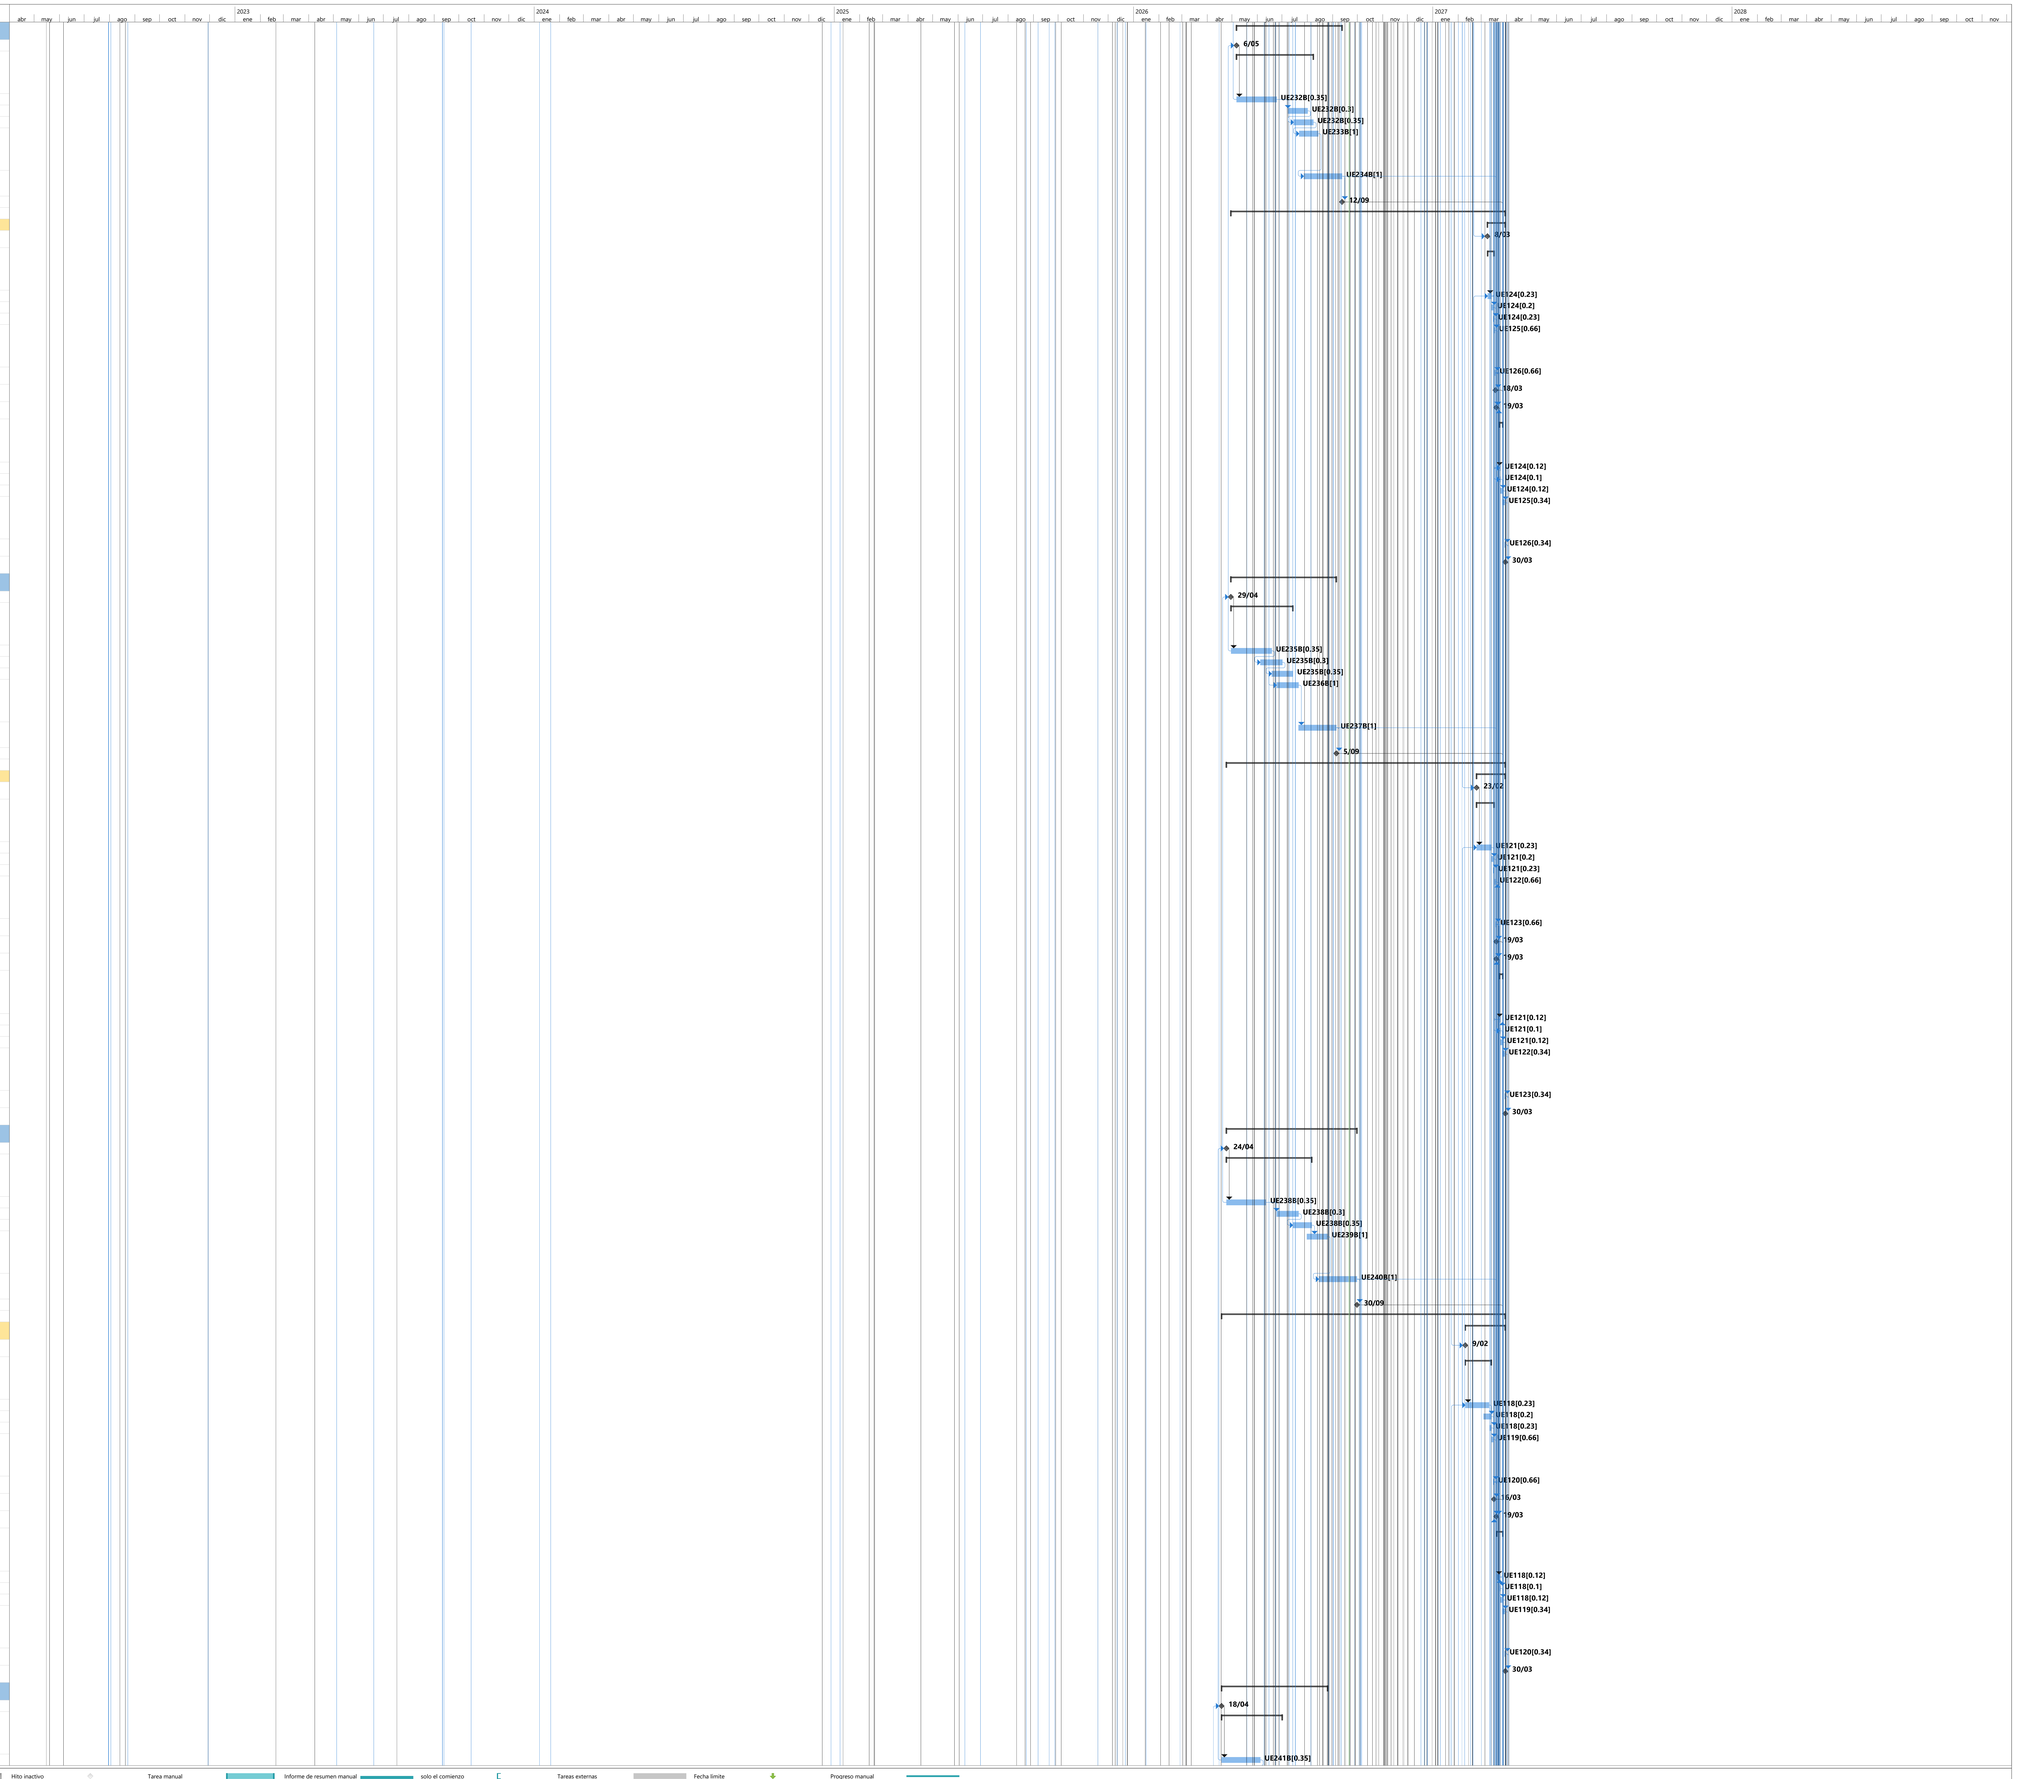

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2319	No	2319		Mejoramiento con Rajón	lun 25/05/26	jue 18/06/26	20 días
2320	No	2320		Subbase Granular SBG-A	jue 4/06/26	mié 1/07/26	20 días
2321	No	2321	UE242B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 11/06/26	mar 7/07/26	20 días
2322	No	2322	UE243B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 7/07/26	mar 25/08/26	40 días
2323	No	2323		Fin de Calzada	mar 25/08/26	mar 25/08/26	0 días
2324	**Sí**	**2324**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+960-K1+080)**	**lun 13/04/26**	**lun 29/03/27**	**291 días**
2325	**Sí**	**2325**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+960-K1+**	**mié 27/01/27**	**lun 29/03/27**	**51 días**
2326	No	2326		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mié 27/01/27	mié 27/01/27	0 días
2327	Sí	2327	UE115	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 27/01/27	vie 12/03/27	40 días
2328	No	2328		Excavación	mié 27/01/27	jue 25/02/27	26 días
2329	No	2329		Mejoramiento con Rajón	jue 18/02/27	jue 4/03/27	13 días
2330	No	2330		Subbase Granular SBG-A	vie 26/02/27	vie 12/03/27	13 días
2331	No	2331	UE116	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 4/03/27	sáb 13/03/27	9 días
2332	No	2332	UE117	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	4 días
2333	No	2333		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2334	No	2334		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
2335	**Sí**	**2335**	**UE115**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**vie 19/03/27**	**mié 24/03/27**	**3 días**
2336	No	2336		Excavación	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2337	No	2337		Mejoramiento con Rajón	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
2338	No	2338		Subbase Granular SBG-A	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2339	No	2339	UE116	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2340	No	2340	UE117	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2341	No	2341		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	lun 29/03/27	lun 29/03/27	0 días
2342	**Sí**	**2342**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+520-K2+640)**	**lun 13/04/26**	**jue 20/08/26**	**105 días**
2343	No	2343		Inicio de Calzada	lun 13/04/26	lun 13/04/26	0 días
2344	Sí	2344	UE244B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	lun 13/04/26	mié 24/06/26	60 días
2345	No	2345		Excavación	lun 13/04/26	vie 29/05/26	40 días
2346	No	2346		Mejoramiento con Rajón	mar 19/05/26	jue 11/06/26	20 días
2347	No	2347		Subbase Granular SBG-A	sáb 30/05/26	mié 24/06/26	20 días
2348	No	2348	UE245B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 4/06/26	mié 1/07/26	20 días
2349	No	2349	UE246B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mié 1/07/26	jue 20/08/26	40 días
2350	No	2350		Fin de Calzada	jue 20/08/26	jue 20/08/26	0 días
2351	**Sí**	**2351**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+840-K0+960)**	**mar 7/04/26**	**sáb 27/03/27**	**295 días**
2352	**Sí**	**2352**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+840-K0+**	**jue 18/02/27**	**sáb 27/03/27**	**30 días**
2353	No	2353		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	jue 18/02/27	jue 18/02/27	0 días
2354	Sí	2354	UE112	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 23/02/27	mar 16/03/27	19 días
2355	No	2355		Excavación	mar 23/02/27	sáb 13/03/27	17 días
2356	No	2356		Mejoramiento con Rajón	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2357	No	2357		Subbase Granular SBG-A	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2358	No	2358	UE113	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2359	No	2359	UE114	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2360	No	2360		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
2361	No	2361		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
2362	**Sí**	**2362**	**UE112**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**jue 18/03/27**	**mar 23/03/27**	**3 días**
2363	No	2363		Excavación	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2364	No	2364		Mejoramiento con Rajón	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2365	No	2365		Subbase Granular SBG-A	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
2366	No	2366	UE113	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2367	No	2367	UE114	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2368	No	2368		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	sáb 27/03/27	sáb 27/03/27	0 días
2369	**Sí**	**2369**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+640-K2+760)**	**mar 7/04/26**	**mié 30/09/26**	**147 días**
2370	No	2370		Inicio de Calzada	mar 7/04/26	mar 7/04/26	0 días
2371	Sí	2371	UE247B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 29/07/26	jue 17/09/26	42 días
2372	No	2372		Excavación	mié 29/07/26	mar 15/09/26	40 días
2373	No	2373		Mejoramiento con Rajón	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
2374	No	2374		Subbase Granular SBG-A	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
2375	No	2375	UE248B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
2376	No	2376	UE249B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mié 26/08/26	mié 30/09/26	32 días
2377	No	2377		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2378	**Sí**	**2378**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+720-K0+840)**	**lun 30/03/26**	**sáb 27/03/27**	**300 días**
2379	**Sí**	**2379**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+720-K0+**	**lun 8/02/27**	**sáb 27/03/27**	**40 días**
2380	No	2380		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	lun 8/02/27	lun 8/02/27	0 días
2381	Sí	2381	UE109	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/02/27	sáb 13/03/27	29 días
2382	No	2382		Excavación	mar 9/02/27	mié 10/03/27	26 días
2383	No	2383		Mejoramiento con Rajón	jue 4/03/27	sáb 13/03/27	9 días
2384	No	2384		Subbase Granular SBG-A	jue 11/03/27	sáb 13/03/27	2 días
2385	No	2385	UE110	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2386	No	2386	UE111	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2387	No	2387		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
2388	No	2388		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días
2389	**Sí**	**2389**	**UE109**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**jue 18/03/27**	**mar 23/03/27**	**3 días**
2390	No	2390		Excavación	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2391	No	2391		Mejoramiento con Rajón	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2392	No	2392		Subbase Granular SBG-A	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
2393	No	2393	UE110	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2394	No	2394	UE111	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2395	No	2395		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	sáb 27/03/27	sáb 27/03/27	0 días
2396	**Sí**	**2396**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+760-K2+880)**	**lun 30/03/26**	**mié 30/09/26**	**152 días**
2397	No	2397		Inicio de Calzada	lun 30/03/26	lun 30/03/26	0 días
2398	Sí	2398	UE250B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 29/07/26	jue 17/09/26	42 días
2399	No	2399		Excavación	mié 29/07/26	mar 15/09/26	40 días
2400	No	2400		Mejoramiento con Rajón	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
2401	No	2401		Subbase Granular SBG-A	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
2402	No	2402	UE251B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 26/08/26	jue 17/09/26	20 días
2403	No	2403	UE252B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mié 26/08/26	mié 30/09/26	32 días

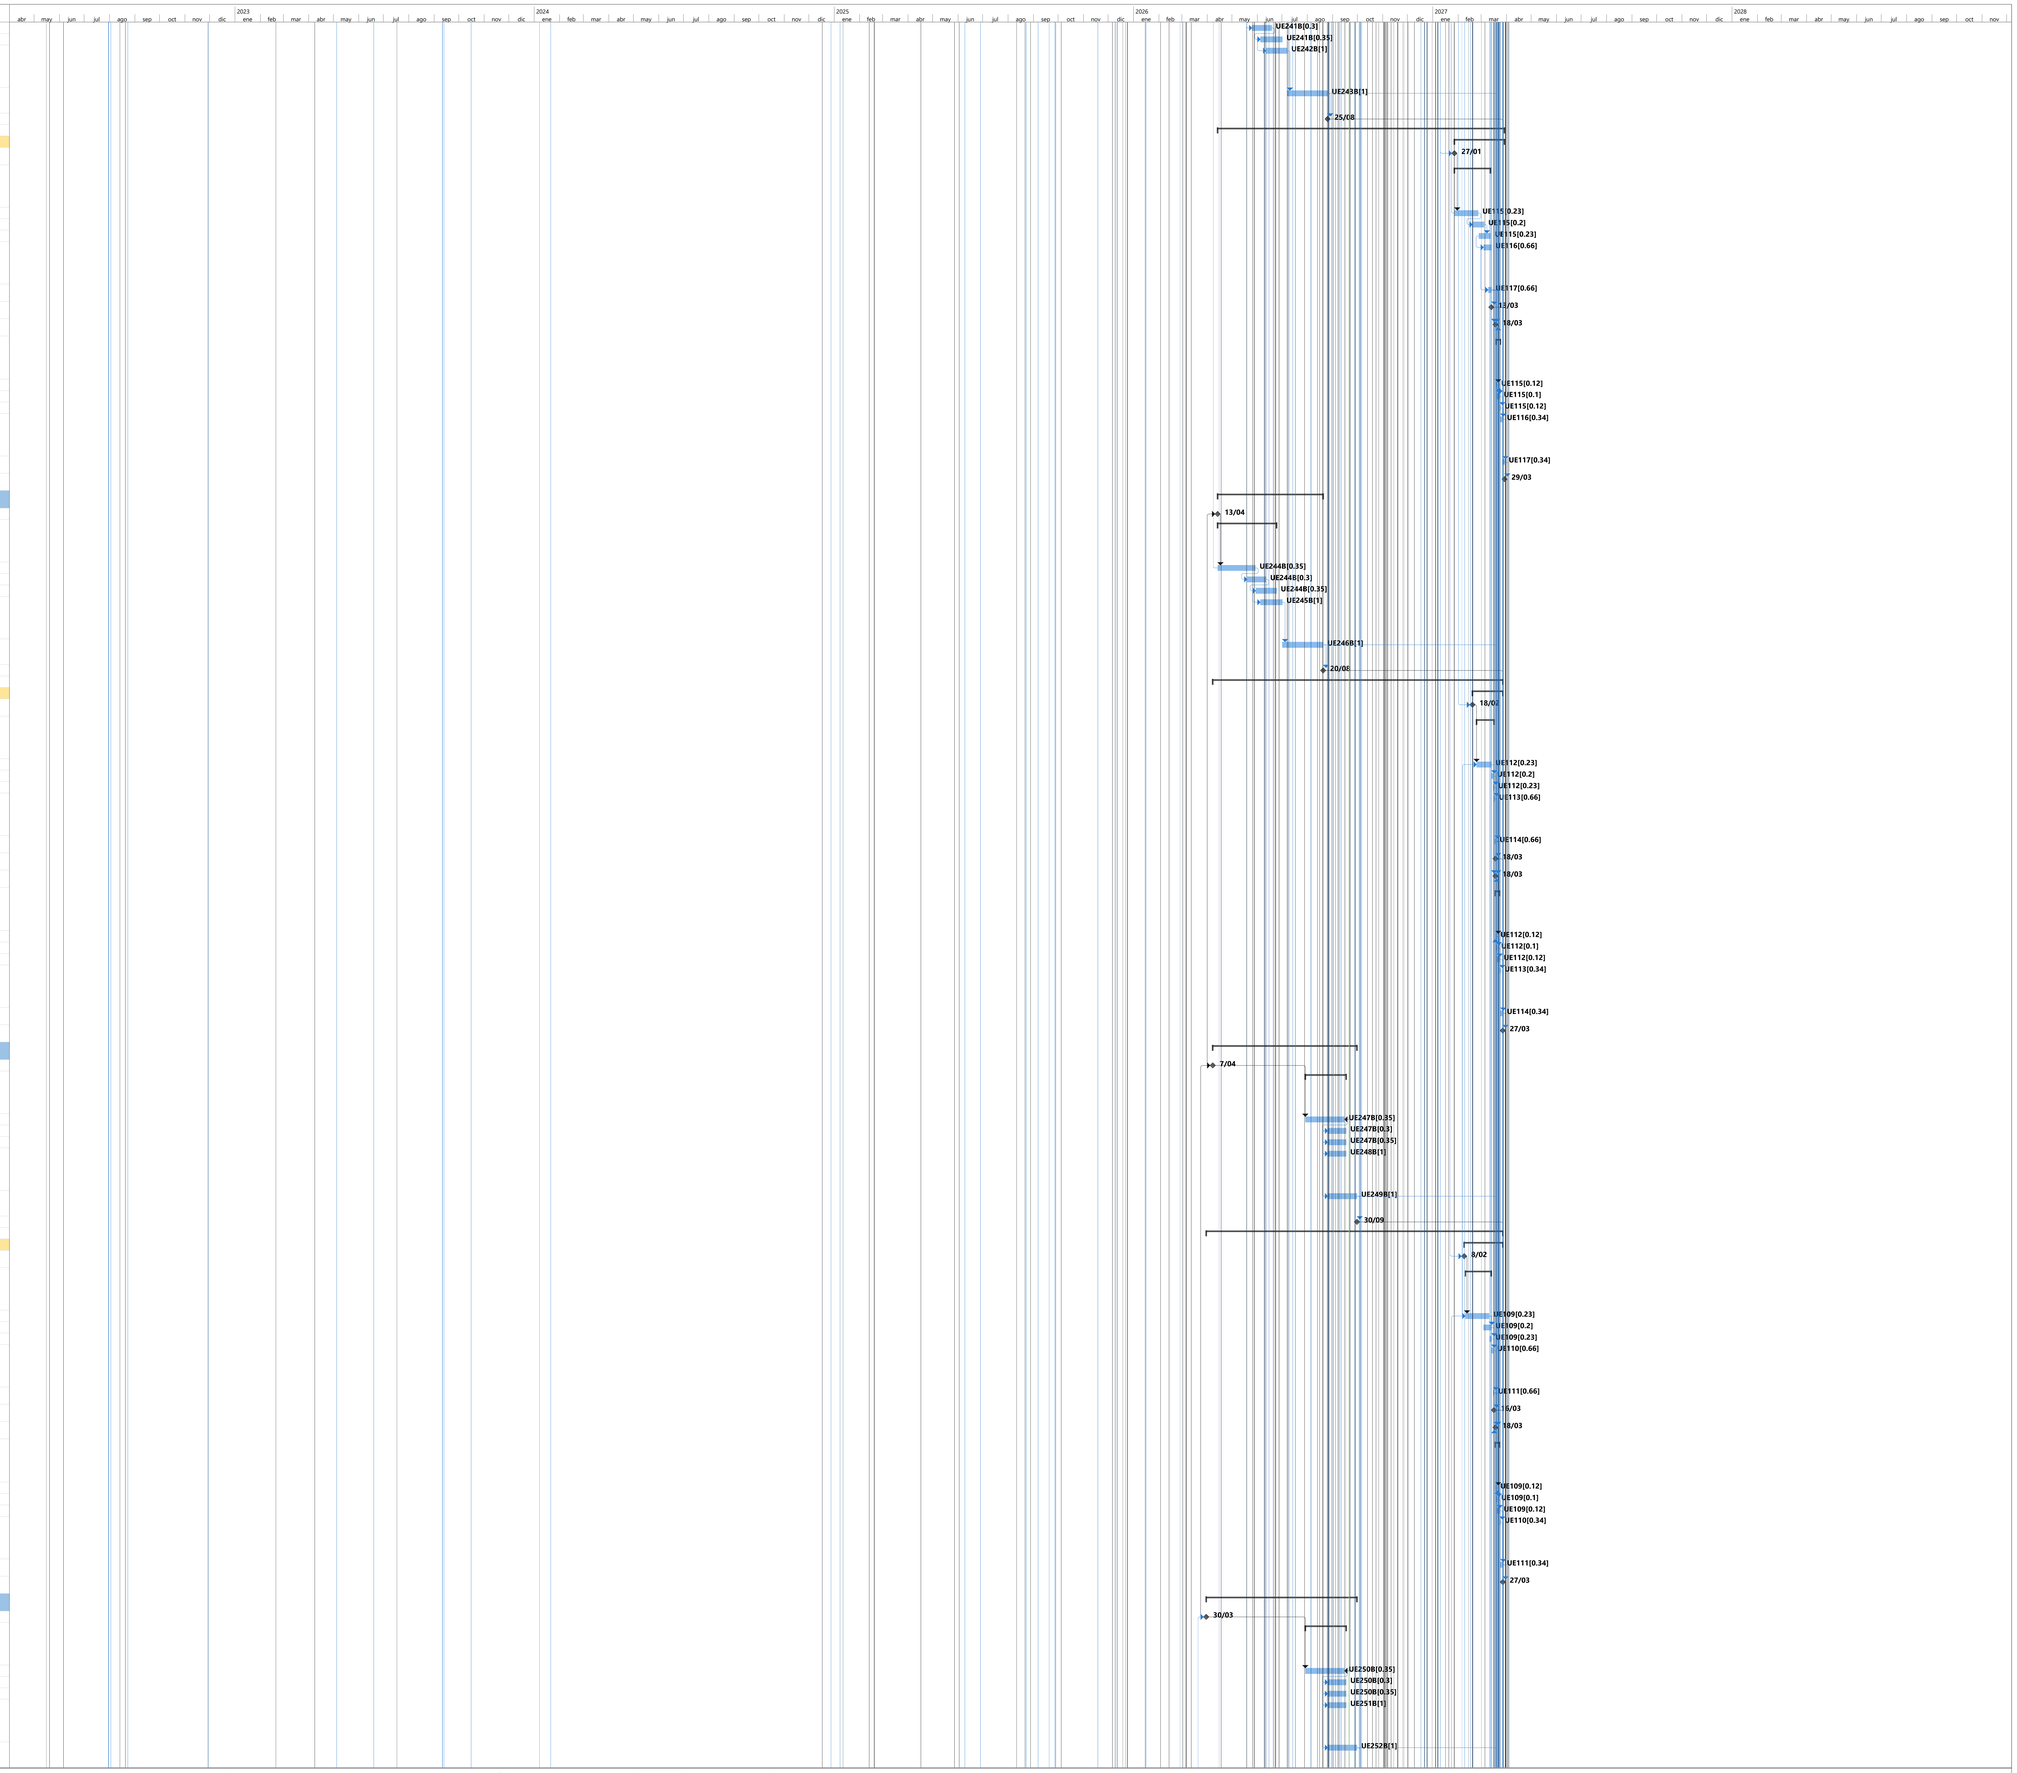

Proyecto: LBS
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2404	No	2404		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2405	**Sí**	**2405**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+600-K0+720)**	**mié 25/03/26**	**mar 23/03/27**	**303 días**
2406	**Sí**	**2406**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+600-K0+**	**mié 27/01/27**	**mar 23/03/27**	**48 días**
2407	No	2407		Inicio de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	mié 27/01/27	mié 27/01/27	0 días
2408	Sí	2408	UE106	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 27/01/27	vie 12/03/27	40 días
2409	No	2409		Excavación	mié 27/01/27	jue 25/02/27	26 días
2410	No	2410		Mejoramiento con Rajón	jue 18/02/27	jue 4/03/27	13 días
2411	No	2411		Subbase Granular SBG-A	vie 26/02/27	vie 12/03/27	13 días
2412	No	2412	UE107	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 4/03/27	sáb 13/03/27	9 días
2413	No	2413	UE108	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	4 días
2414	No	2414		Fin de Calzada (Afectada por construcción de colector sanitario)	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2415	No	2415		Inicio de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 16/03/27	mar 16/03/27	0 días
2416	**Sí**	**2416**	**UE106**	**EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.**	**mar 16/03/27**	**vie 19/03/27**	**3 días**
2417	No	2417		Excavación	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2418	No	2418		Mejoramiento con Rajón	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
2419	No	2419		Subbase Granular SBG-A	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2420	No	2420	UE107	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2421	No	2421	UE108	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
2422	No	2422		Fin de Calzada (Sin afectación por construcción de colector sanitario)	mar 23/03/27	mar 23/03/27	0 días
2423	**Sí**	**2423**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K2+880-K3+000)**	**mié 25/03/26**	**mié 23/09/26**	**151 días**
2424	No	2424		Inicio de Calzada	mié 25/03/26	mié 25/03/26	0 días
2425	Sí	2425	UE253B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	mié 25/03/26	jue 27/08/26	127 días
2426	No	2426		Excavación	mié 25/03/26	mar 12/05/26	40 días
2427	No	2427		Mejoramiento con Rajón	vie 31/07/26	mar 25/08/26	20 días
2428	No	2428		Subbase Granular SBG-A	lun 3/08/26	jue 27/08/26	20 días
2429	No	2429	UE254B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 5/08/26	sáb 29/08/26	20 días
2430	No	2430	UE255B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	sáb 8/08/26	mié 23/09/26	40 días
2431	No	2431		Fin de Calzada	mié 23/09/26	mié 23/09/26	0 días
2432	No	2432		Fin de Corredores	mar 30/03/27	mar 30/03/27	0 días
2433	**Sí**	**2433**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**vie 19/09/25**	**mié 31/03/27**	**465 días**
2434	No	2434		Inicio de Espacio Público	lun 5/10/26	lun 5/10/26	0 días
2435	**Sí**	**2435**		**Espacio Público CALLE 4 - CARRERA 3 SUR**	**mié 18/11/26**	**mié 31/03/27**	**111 días**
2436	No	2436	UE345	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 18/11/26	sáb 20/02/27	80 días
2437	No	2437	UE346	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 23/03/27	mié 24/03/27	1 día
2438	**Sí**	**2438**		**Bocacalle Calle 4 Costado oriental**	**mar 30/03/27**	**mié 31/03/27**	**1 día**
2439	No	2439	UE345	Capas Granulares	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
2440	No	2440	UE346	Carpeta Asfáltica	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
2441	**Sí**	**2441**		**Bocacalle Carrera 3 Costado oriental**	**lun 29/03/27**	**mar 30/03/27**	**1 día**
2442	No	2442	UE345	Capas Granulares	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2443	No	2443	UE346	Carpeta Asfáltica	lun 29/03/27	mar 30/03/27	1 día
2444	**Sí**	**2444**		**Espacio Público CARRERA 3 SUR - CALLE 7 SUR**	**vie 19/09/25**	**lun 29/03/27**	**463 días**
2445	No	2445	UE347	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	jue 5/11/26	mar 9/02/27	80 días
2446	No	2446	UE348	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
2447	**Sí**	**2447**		**Espacio Público CARRERA 3 SUR - CALLE 7 SUR (Plazoleta costado oriental puente El Altico)**	**vie 19/09/25**	**sáb 29/11/25**	**60 días**
2448	No	2448	UE347	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	vie 19/09/25	vie 24/10/25	30 días
2449	No	2449	UE348	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 24/10/25	sáb 29/11/25	30 días
2450	**Sí**	**2450**		**Bocacalle Carrera 3 Costado oriental**	**sáb 27/03/27**	**lun 29/03/27**	**1 día**
2451	No	2451	UE347	Capas Granulares	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2452	No	2452	UE348	Carpeta Asfáltica	sáb 27/03/27	lun 29/03/27	1 día
2453	**Sí**	**2453**		**Bocacalle Calle 7A Sur Costado oriental**	**mié 24/03/27**	**sáb 27/03/27**	**1 día**
2454	No	2454	UE347	Capas Granulares	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2455	No	2455	UE348	Carpeta Asfáltica	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
2456	**Sí**	**2456**		**Espacio Público CALLE 7 SUR - EDS PETROBRAS**	**mar 13/10/26**	**vie 19/03/27**	**134 días**
2457	No	2457	UE349	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mar 13/10/26	lun 18/01/27	80 días
2458	No	2458	UE350	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
2459	No	2459		Fin de Espacio Público	mié 24/03/27	mié 24/03/27	0 días
2460	No	2460		Fin Sector 10	mié 31/03/27	mié 31/03/27	0 días
2461	**Sí**	**2461**		**Sector 11 CALLE 9s a CALLE 15 SUR (K0+000 - K0+600)**	**jue 14/08/25**	**sáb 13/03/27**	**484 días**
2462	No	2462		Entrega de Predios por parte de la EFR	jue 14/08/25	jue 14/08/25	0 días
2463	No	2463		Inicio Sector 11	jue 14/08/25	jue 14/08/25	0 días
2464	**Sí**	**2464**		**PRELIMINARES**	**jue 14/08/25**	**mar 2/09/25**	**15 días**
2465	No	2465	DEMOL	Demolición de cimentaciones	jue 14/08/25	mar 2/09/25	15 días
2466	**Sí**	**2466**		**INSTALACIÓN Y TRASLADO DE REDES**	**mar 2/09/25**	**lun 26/10/26**	**352 días**
2467	No	2467		Inicio Instalación y traslado de redes	mar 2/09/25	mar 2/09/25	0 días
2468	**Sí**	**2468**		**REDES SECAS**	**vie 7/11/25**	**jue 23/04/26**	**140 días**
2469	No	2469	RS-S11	Inicio Redes Secas	vie 7/11/25	vie 7/11/25	0 días
2470	No	2470	RSGA-S	Red Gas (Acero)	mié 12/11/25	mié 12/11/25	0 días
2471	No	2471	RSEN-S	Red ENEL	jue 13/11/25	jue 23/04/26	135 días
2472	No	2472	RSET-S'	Red ETB	jue 13/11/25	mié 11/03/26	100 días
2473	No	2473	RSM-S1'	Red de Movistar	jue 13/11/25	mié 11/03/26	100 días
2474	No	2474	RS-S11	Fin Redes Secas	jue 23/04/26	jue 23/04/26	0 días
2475	**Sí**	**2475**		**REDES HUMEDAS**	**vie 7/11/25**	**lun 26/10/26**	**295 días**
2476	No	2476	RH-S11	Inicio Redes Húmedas	vie 7/11/25	vie 7/11/25	0 días
2477	No	2477	RHA-S1'	Red Acueducto	vie 7/11/25	mié 3/06/26	175 días
2478	No	2478	RH-S11	Colector de entrega 15 SUR (Actividades fuera del área de intervención)	vie 7/11/25	vie 7/11/25	0 días
2479	No	2479	RHP-S1'	Red de Alcantarillado Pluvial	mié 19/11/25	lun 26/10/26	285 días
2480	No	2480	RHS-S1'	Red de Alcantarillado Sanitario	mié 19/11/25	lun 26/10/26	285 días
2481	No	2481	RH-S11	Fin de Redes Húmedas	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días
2482	No	2482	RH-S11	Fin Instalación y traslado de redes	lun 26/10/26	lun 26/10/26	0 días
2483	**Sí**	**2483**		**CORREDORES - S11**	**jue 14/08/25**	**mié 17/02/27**	**462 días**
2484	No	2484		Inicio de Corredores	jue 14/08/25	jue 14/08/25	0 días
2485	**Sí**	**2485**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+480-K0+600)**	**mar 7/04/26**	**mié 30/09/26**	**147 días**
2486	**Sí**	**2486**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+000-K3+120)**	**mar 7/04/26**	**jue 24/09/26**	**142 días**
2487	No	2487		Inicio de Calzada	mar 7/04/26	mar 7/04/26	0 días
2488	Sí	2488	UE256B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	sáb 4/07/26	jue 27/08/26	44 días
2489	No	2489		Excavación	sáb 4/07/26	lun 24/08/26	40 días
2490	No	2490		Mejoramiento con Rajón	vie 31/07/26	mar 25/08/26	20 días
2491	No	2491		Subbase Granular SBG-A	lun 3/08/26	jue 27/08/26	20 días
2492	No	2492	UE257B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 6/08/26	lun 31/08/26	20 días
2493	No	2493	UE258B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	lun 10/08/26	jue 24/09/26	40 días
2494	No	2494		Fin de Calzada	jue 24/09/26	jue 24/09/26	0 días
2495	**Sí**	**2495**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+480-K0+**	**sáb 27/06/26**	**mié 30/09/26**	**79 días**
2496	No	2496		Inicio de Calzada	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	0 días
2497	Sí	2497	UE103	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 27/06/26	jue 27/08/26	49 días
2498	No	2498		Excavación	sáb 27/06/26	mar 18/08/26	40 días
2499	No	2499		Mejoramiento con Rajón	mar 28/07/26	vie 21/08/26	20 días
2500	No	2500		Subbase Granular SBG-A	lun 3/08/26	jue 27/08/26	20 días
2501	No	2501	UE104	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 10/08/26	mié 2/09/26	20 días
2502	No	2502	UE105	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
2503	No	2503		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2504	**Sí**	**2504**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+360-K0+480)**	**vie 6/03/26**	**mié 30/09/26**	**172 días**
2505	**Sí**	**2505**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+120-K3+240)**	**vie 6/03/26**	**mié 1/07/26**	**95 días**
2506	No	2506		Inicio de Calzada	vie 6/03/26	vie 6/03/26	0 días
2507	Sí	2507	UE259B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	vie 6/03/26	mar 12/05/26	55 días
2508	No	2508		Excavación	vie 6/03/26	vie 24/04/26	40 días
2509	No	2509		Mejoramiento con Rajón	mar 7/04/26	mié 29/04/26	20 días
2510	No	2510		Subbase Granular SBG-A	sáb 18/04/26	mar 12/05/26	20 días

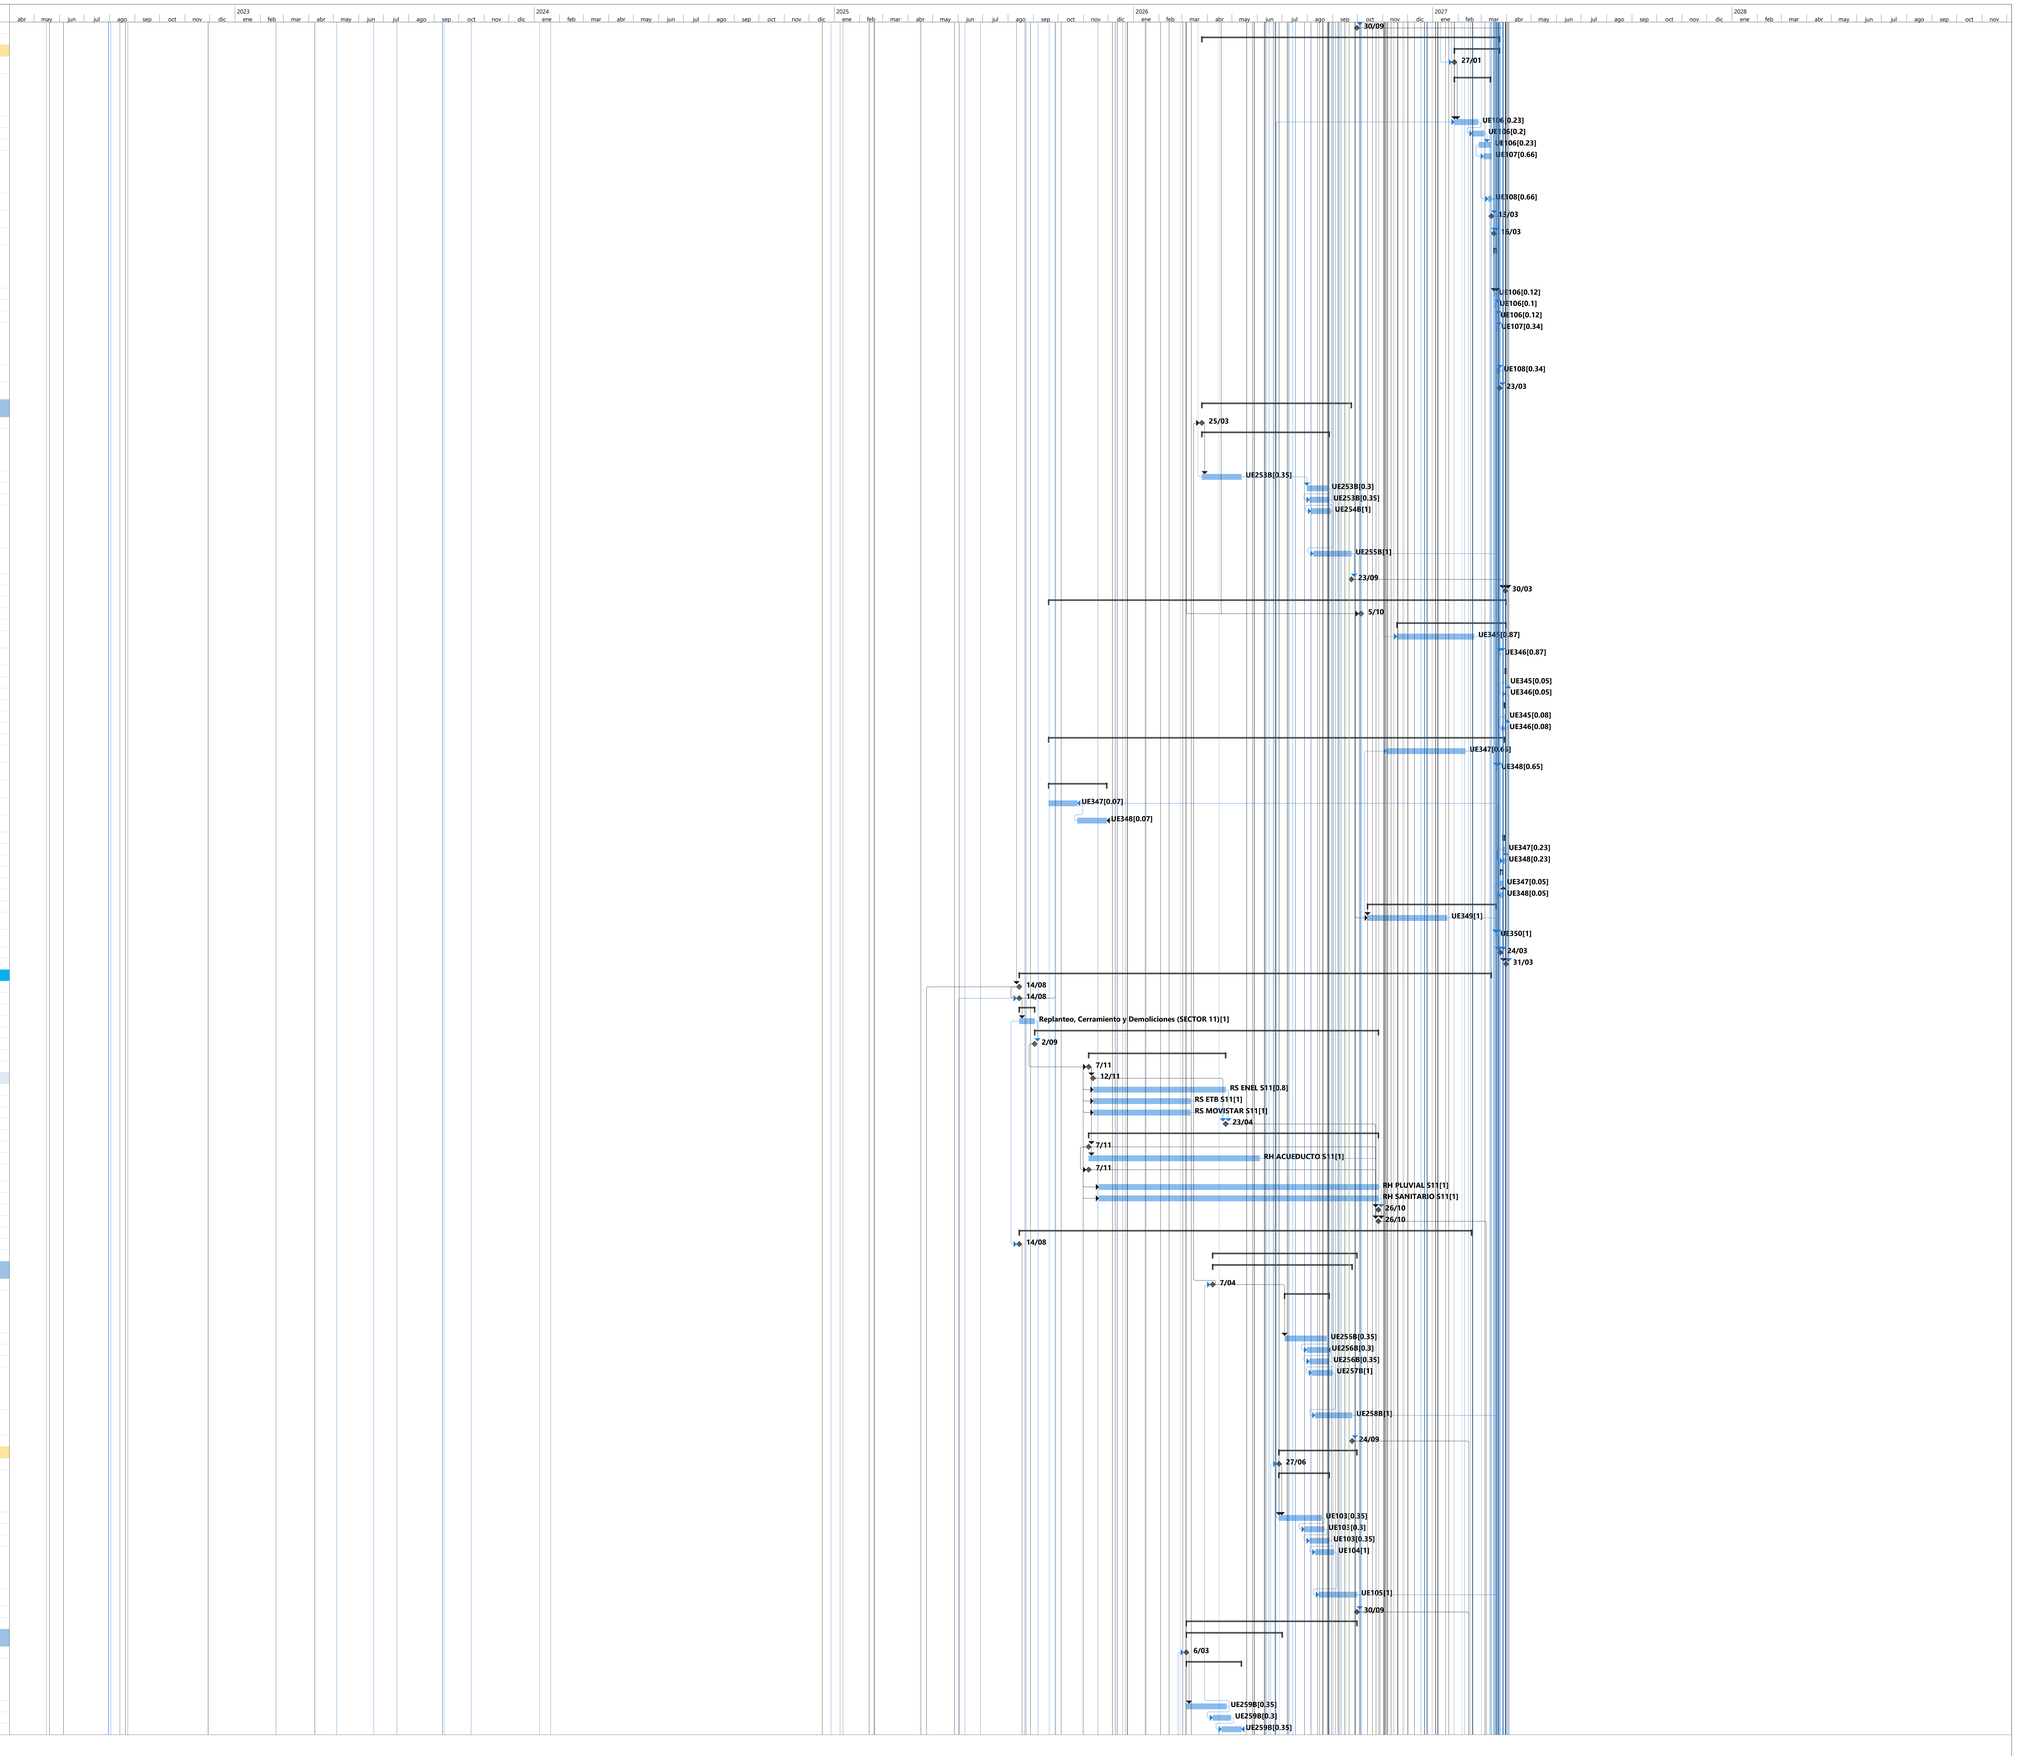

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2511	No	2511	UE260B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	vie 24/04/26	mar 19/05/26	20 días
2512	No	2512	UE261B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 12/05/26	mié 1/07/26	40 días
2513	No	2513		Fin de Calzada	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
2514	**Sí**	**2514**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+360-K0+**	**lun 22/06/26**	**mié 30/09/26**	**84 días**
2515	No	2515		Inicio de Calzada	lun 22/06/26	lun 22/06/26	0 días
2516	Sí	2516	UE100	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	lun 22/06/26	mar 18/08/26	45 días
2517	No	2517		Excavación	lun 22/06/26	mar 11/08/26	40 días
2518	No	2518		Mejoramiento con Rajón	jue 16/07/26	mar 11/08/26	20 días
2519	No	2519		Subbase Granular SBG-A	jue 23/07/26	mar 18/08/26	20 días
2520	No	2520	UE101	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	lun 3/08/26	jue 27/08/26	20 días
2521	No	2521	UE102	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
2522	No	2522		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2523	**Sí**	**2523**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+240-K0+360)**	**lun 2/02/26**	**mié 30/09/26**	**202 días**
2524	**Sí**	**2524**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+240-K3+380)**	**lun 2/02/26**	**mar 26/05/26**	**96 días**
2525	No	2525		Inicio de Calzada	lun 2/02/26	lun 2/02/26	0 días
2526	Sí	2526	UE262B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	lun 2/02/26	mié 8/04/26	56 días
2527	No	2527		Excavación	lun 2/02/26	mié 18/03/26	40 días
2528	No	2528		Mejoramiento con Rajón	lun 2/03/26	mié 25/03/26	20 días
2529	No	2529		Subbase Granular SBG-A	vie 13/03/26	mié 8/04/26	20 días
2530	No	2530	UE263B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 19/03/26	mar 14/04/26	20 días
2531	No	2531	UE264B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mié 8/04/26	mar 26/05/26	40 días
2532	No	2532		Fin de Calzada	mar 26/05/26	mar 26/05/26	0 días
2533	**Sí**	**2533**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+240-K0+**	**mar 9/06/26**	**mié 30/09/26**	**94 días**
2534	No	2534		Inicio de Calzada	mar 9/06/26	mar 9/06/26	0 días
2535	Sí	2535	UE97	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	mié 10/06/26	mar 11/08/26	50 días
2536	No	2536		Excavación	mié 10/06/26	mié 29/07/26	40 días
2537	No	2537		Mejoramiento con Rajón	sáb 4/07/26	mié 29/07/26	20 días
2538	No	2538		Subbase Granular SBG-A	jue 16/07/26	mar 11/08/26	20 días
2539	No	2539	UE98	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	mié 29/07/26	lun 24/08/26	20 días
2540	No	2540	UE99	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	40 días
2541	No	2541		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2542	**Sí**	**2542**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+120-K0+240)**	**vie 2/01/26**	**vie 25/09/26**	**223 días**
2543	**Sí**	**2543**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+360-K3+480)**	**vie 2/01/26**	**mar 19/05/26**	**115 días**
2544	No	2544		Inicio de Calzada	vie 2/01/26	vie 2/01/26	0 días
2545	Sí	2545	UE265B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye separador)	vie 2/01/26	vie 6/03/26	55 días
2546	No	2546		Excavación	vie 2/01/26	mié 18/02/26	40 días
2547	No	2547		Mejoramiento con Rajón	lun 2/02/26	mar 24/02/26	20 días
2548	No	2548		Subbase Granular SBG-A	jue 12/02/26	vie 6/03/26	20 días
2549	No	2549	UE266B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 12/03/26	mar 7/04/26	20 días
2550	No	2550	UE267B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 31/03/26	mar 19/05/26	40 días
2551	No	2551		Fin de Calzada	mar 19/05/26	mar 19/05/26	0 días
2552	**Sí**	**2552**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+120-K0+**	**jue 28/05/26**	**vie 25/09/26**	**100 días**
2553	No	2553		Inicio de Calzada	jue 28/05/26	jue 28/05/26	0 días
2554	Sí	2554	UE94	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 120 ML.	jue 28/05/26	mié 29/07/26	50 días
2555	No	2555		Excavación	jue 28/05/26	jue 16/07/26	40 días
2556	No	2556		Mejoramiento con Rajón	lun 22/06/26	jue 16/07/26	20 días
2557	No	2557		Subbase Granular SBG-A	sáb 4/07/26	mié 29/07/26	20 días
2558	No	2558	UE95	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO	jue 23/07/26	mar 18/08/26	20 días
2559	No	2559	UE96	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 120 ML.	mar 11/08/26	vie 25/09/26	40 días
2560	No	2560		Fin de Calzada	vie 25/09/26	vie 25/09/26	0 días
2561	**Sí**	**2561**		**CORREDORES GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+000-K0+120)**	**jue 14/08/25**	**mié 17/02/27**	**462 días**
2562	**Sí**	**2562**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+480-K3+660)**	**lun 15/12/25**	**lun 25/05/26**	**135 días**
2563	No	2563		Inicio de Calzada	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
2564	Sí	2564	UE268B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN.(incluye separador)	lun 15/12/25	jue 12/03/26	75 días
2565	No	2565		Excavación	lun 15/12/25	mié 21/01/26	30 días
2566	No	2566		Mejoramiento con Rajón	vie 2/01/26	jue 12/02/26	35 días
2567	No	2567		Subbase Granular SBG-A	lun 2/02/26	jue 12/03/26	35 días
2568	No	2568	UE269B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	vie 6/02/26	mié 25/03/26	40 días
2569	No	2569	UE270B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mié 18/03/26	lun 25/05/26	55 días
2570	No	2570		Fin de Calzada	lun 25/05/26	lun 25/05/26	0 días
2571	**Sí**	**2571**		**CORREDOR TRANSMILENIO GIRARDOT - BOGOTÁ (K3+480-K3+660) Afectado por la instalación del**	**sáb 29/08/26**	**mié 30/09/26**	**28 días**
2572	No	2572		Inicio de Calzada	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	0 días
2573	Sí	2573	UE268B	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN.(incluye separador)	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
2574	No	2574		Excavación	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
2575	No	2575		Mejoramiento con Rajón	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
2576	No	2576		Subbase Granular SBG-A	lun 31/08/26	mié 16/09/26	15 días
2577	No	2577	UE269B	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	mié 2/09/26	jue 24/09/26	20 días
2578	No	2578	UE270B	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML.(Incluye Terminación y Acabados Separador).	mar 8/09/26	mié 30/09/26	20 días
2579	No	2579		Fin de Calzada	mié 30/09/26	mié 30/09/26	0 días
2580	**Sí**	**2580**		**CORREDOR MIXTO GIRARDOT - BOGOTÁ (K0+000-K0+**	**jue 14/08/25**	**mié 17/02/27**	**462 días**
2581	No	2581		Inicio de Calzada	jue 14/08/25	jue 14/08/25	0 días
2582	Sí	2582	UE91	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML. Ó HASTA EL LIMITE DE	vie 15/05/26	mié 29/07/26	60 días
2583	No	2583		Excavación	vie 15/05/26	sáb 4/07/26	40 días
2584	No	2584		Mejoramiento con Rajón	lun 22/06/26	jue 16/07/26	20 días
2585	No	2585		Subbase Granular SBG-A	sáb 4/07/26	mié 29/07/26	20 días
2586	No	2586	UE92	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	jue 16/07/26	mar 11/08/26	20 días
2587	No	2587	UE93	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML. Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	jue 23/07/26	mié 9/09/26	40 días
2588	No	2588		Fin de Calzada	mié 9/09/26	mié 9/09/26	0 días
2589	No	2589		Inicio de Calzada	mar 3/11/26	mar 3/11/26	0 días
2590	Sí	2590	UE91	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EL CUAL COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO PARA ANCHO DE CALZADA DE TRES CARRILES POR 180 ML. Ó HASTA EL LIMITE DE	mar 3/11/26	sáb 9/01/27	56 días
2591	No	2591		Excavación	mar 3/11/26	lun 21/12/26	40 días
2592	No	2592		Mejoramiento con Rajón	sáb 5/12/26	mié 30/12/26	20 días
2593	No	2593		Subbase Granular SBG-A	mié 16/12/26	sáb 9/01/27	20 días
2594	No	2594	UE92	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML EN TODO CASO DEBE GARANTIZAR A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	sáb 26/12/26	mié 20/01/27	20 días

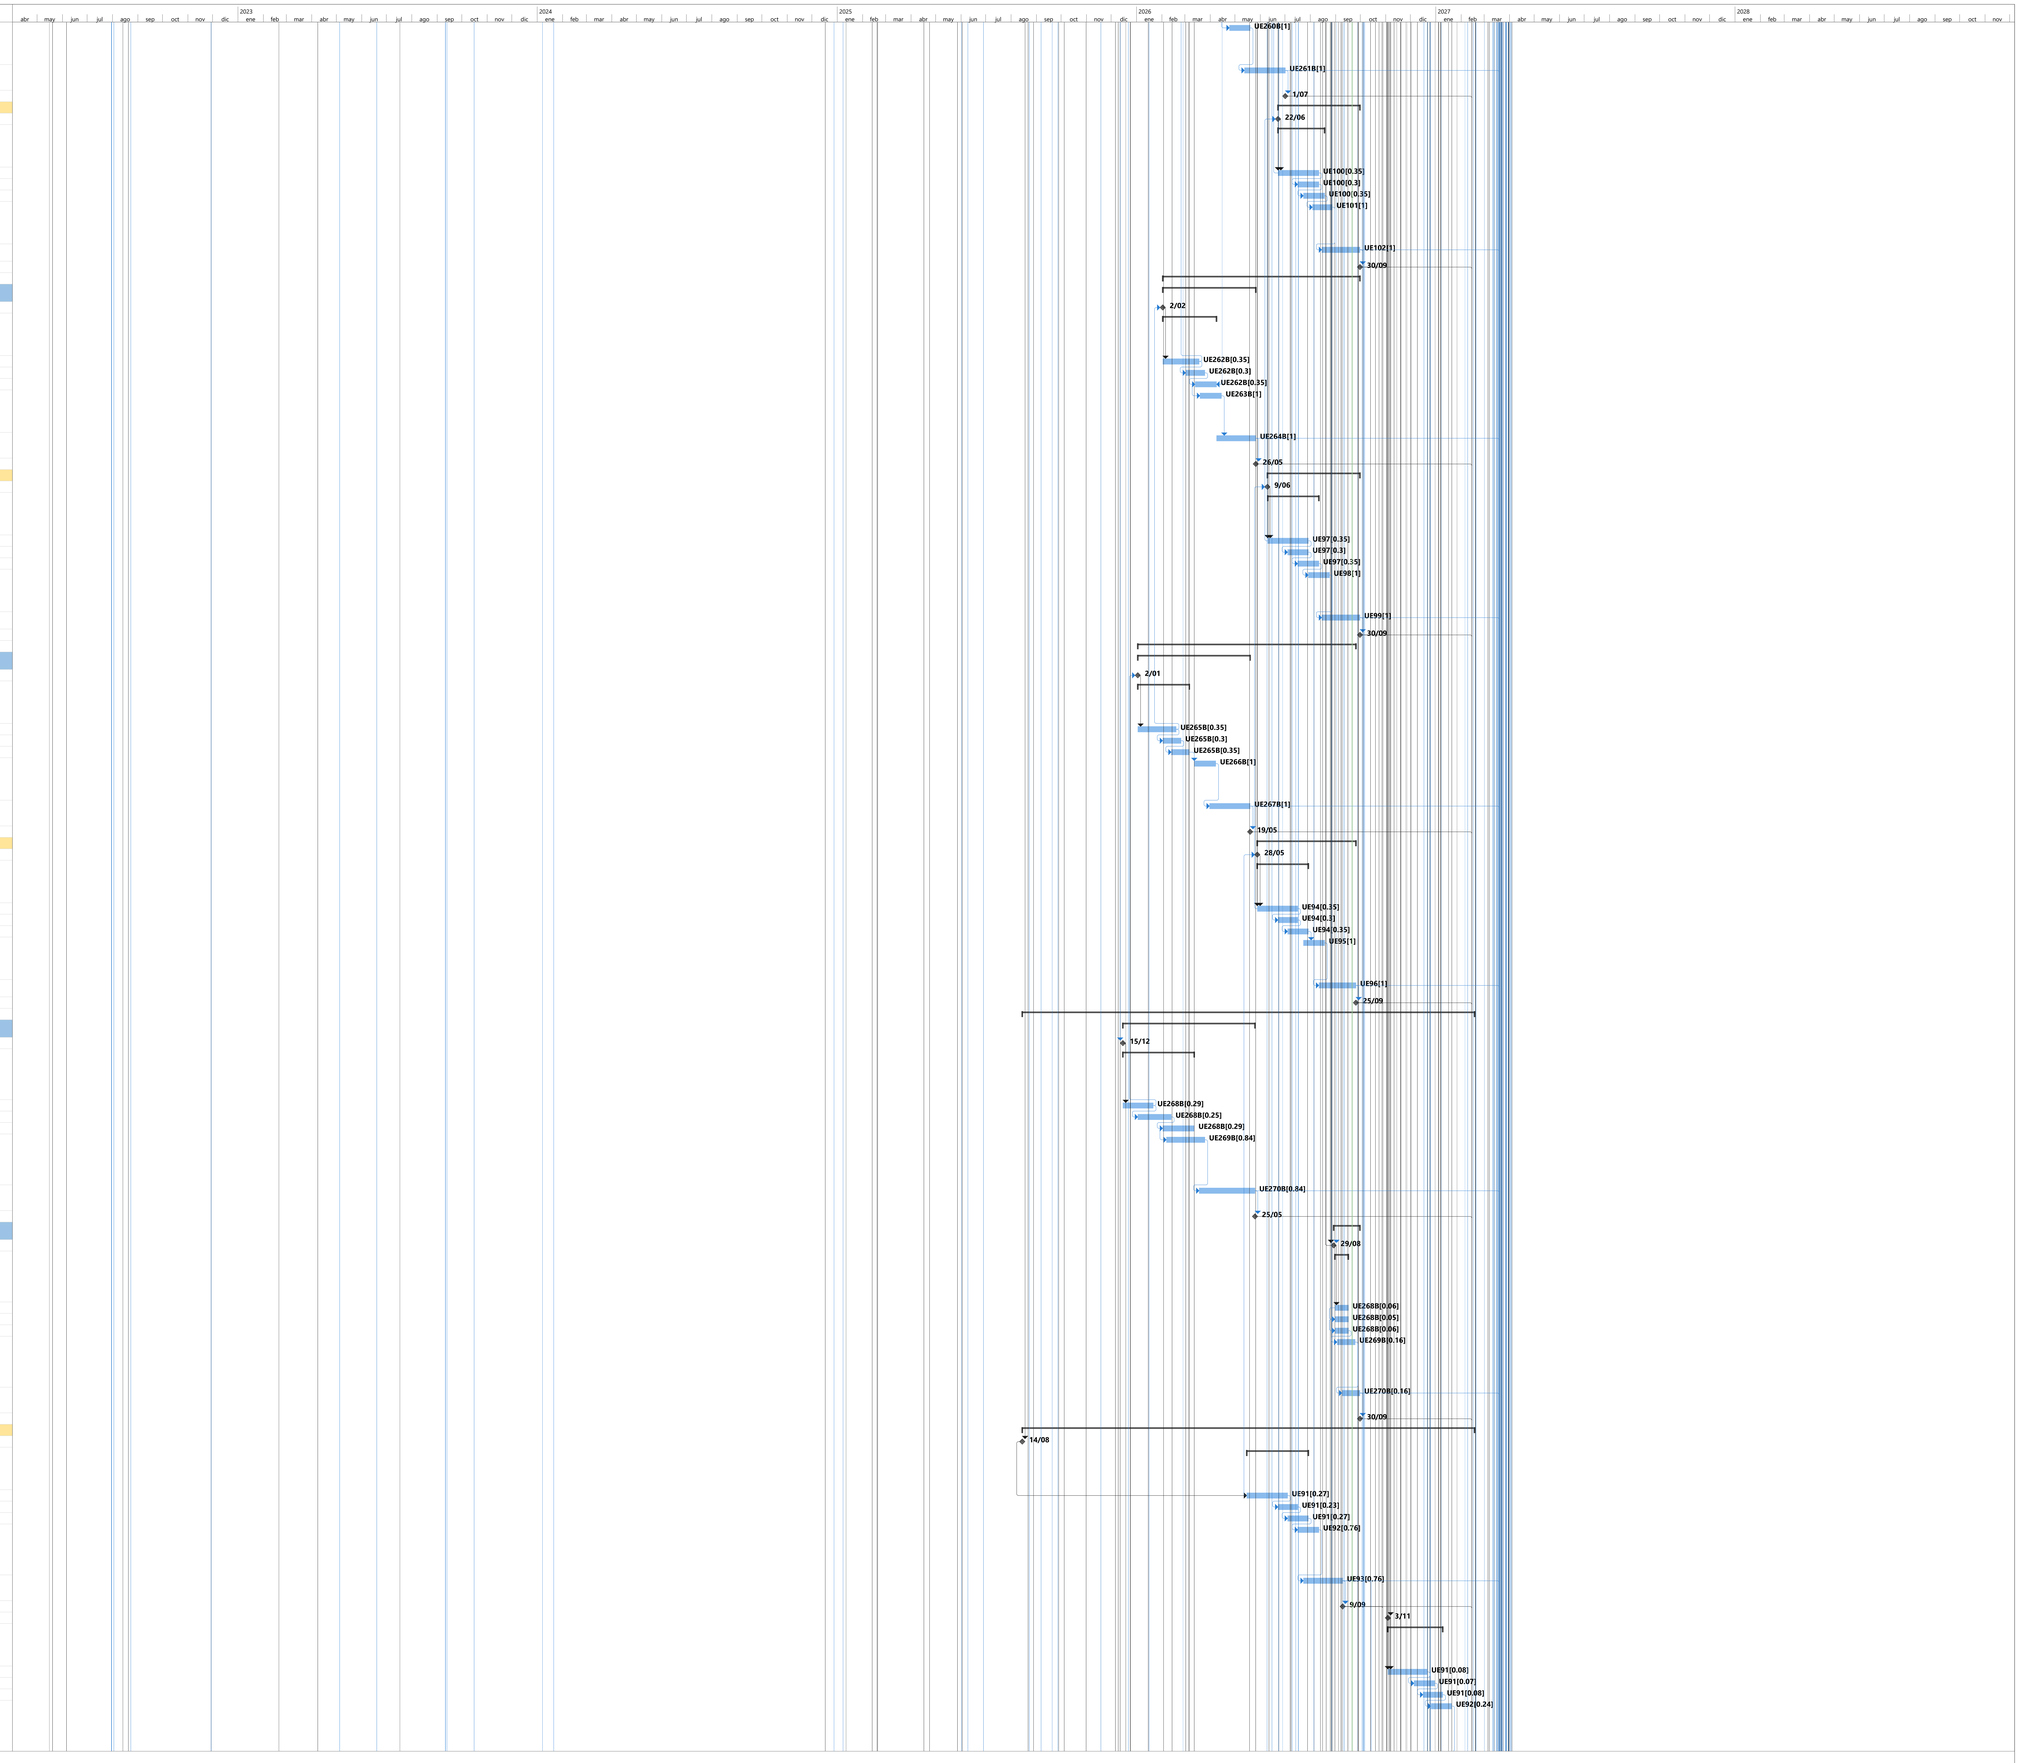

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2595	No	2595	UE93	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA TRES CARRILES POR 180 ML. Ó HASTA EL LIMITE DE INTERVENCIÓN	jue 31/12/26	mié 17/02/27	40 días
2596	No	2596		Fin de Calzada	mié 17/02/27	mié 17/02/27	0 días
2597	No	2597		Fin de Corredores	mié 17/02/27	mié 17/02/27	0 días
2598	**Sí**	**2598**		**URBANISMO BOGOTÁ - GIRARDOT**	**sáb 6/12/25**	**sáb 13/03/27**	**387 días**
2599	No	2599		Inicio Espacio Público - Urbanismo - Paisajismo	sáb 6/12/25	sáb 6/12/25	0 días
2600	**Sí**	**2600**		**Espacio Público EDS PETROBRAS - CALLE 15 SUR (Etapa 1 Desde EDS Humedal hasta Estación compartir)**	**sáb 6/12/25**	**sáb 7/11/26**	**280 días**
2601	No	2601	UE351	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	sáb 6/12/25	sáb 23/05/26	140 días
2602	No	2602	UE352	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	lun 26/01/26	mar 30/06/26	130 días
2603	No	2603	UE352	Construcción de abordador en espacio público	mié 23/09/26	mié 21/10/26	25 días
2604	**Sí**	**2604**		**Espacio Público EDS PETROBRAS - CALLE 15 SUR (Plazoleta puente humedal)**	**lun 31/08/26**	**sáb 7/11/26**	**60 días**
2605	No	2605	UE351	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 31/08/26	vie 2/10/26	30 días
2606	No	2606	UE352	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	vie 2/10/26	sáb 7/11/26	30 días
2607	**Sí**	**2607**		**Espacio Público EDS PETROBRAS - CALLE 15 SUR (Etapa 2 Desde Estación compartir hasta Calle 15 Sur)**	**lun 24/08/26**	**mié 7/10/26**	**40 días**
2608	No	2608	UE351	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	lun 24/08/26	mar 15/09/26	20 días
2609	No	2609	UE352	TERMINACION Y ACABADOS SEGÚN APENDICE A, POR MANZANA FUNCIONAL	mar 15/09/26	mié 7/10/26	20 días
2610	**Sí**	**2610**		**Espacio Público EDS PETROBRAS - CALLE 15 SUR (Etapa 3 Bocacalle de incorporación a autosur)**	**lun 30/11/26**	**mié 10/03/27**	**86 días**
2611	**Sí**	**2611**		**Redes**	**lun 30/11/26**	**jue 31/12/26**	**27 días**
2612	No	2612	UE351	Excavaciones y entibados	lun 30/11/26	mié 9/12/26	8 días
2613	No	2613	UE351	Instalación de tuberías	vie 4/12/26	mar 15/12/26	8 días
2614	No	2614	UE351	Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	vie 11/12/26	jue 24/12/26	12 días
2615	No	2615	UE351	Estructuras complementarias	mar 22/12/26	jue 31/12/26	8 días
2616	**Sí**	**2616**		**Espacio público**	**mié 16/12/26**	**vie 15/01/27**	**24 días**
2617	No	2617	UE351	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 16/12/26	mar 5/01/27	16 días
2618	No	2618	UE352	TERMINACION Y ACABADOS espacio público	sáb 26/12/26	vie 15/01/27	16 días
2619	**Sí**	**2619**		**Construcción vía**	**mié 6/01/27**	**mié 10/03/27**	**56 días**
2620	No	2620	UE351	Preliminares y Excavaciones	mié 6/01/27	lun 1/02/27	22 días
2621	No	2621	UE351	Capas Granulares	mar 26/01/27	vie 19/02/27	22 días
2622	No	2622	UE352	Carpeta Asfáltica	sáb 13/02/27	mié 10/03/27	22 días
2623	**Sí**	**2623**		**Espacio Público EDS PETROBRAS - CALLE 15 SUR (Etapa 4 Desde Autosur hasta límite de intervención)**	**mié 6/01/27**	**sáb 13/03/27**	**59 días**
2624	**Sí**	**2624**		**Redes**	**mié 6/01/27**	**mié 3/02/27**	**24 días**
2625	No	2625	UE351	Excavaciones y entibados	mié 6/01/27	vie 15/01/27	8 días
2626	No	2626	UE351	Instalación de tuberías	mar 12/01/27	mié 20/01/27	8 días
2627	No	2627	UE351	Rellenos (Triturados y Material Seleccionado)	vie 15/01/27	vie 29/01/27	12 días
2628	No	2628	UE351	Estructuras complementarias	lun 25/01/27	mié 3/02/27	8 días
2629	**Sí**	**2629**		**Espacio público**	**mié 13/01/27**	**mar 16/02/27**	**30 días**
2630	No	2630	UE351	Excavación, Nivelación y compactación de subrasante, estabilización de subrasante	mié 13/01/27	jue 4/02/27	20 días
2631	No	2631	UE352	TERMINACION Y ACABADOS espacio público	lun 25/01/27	mar 16/02/27	20 días
2632	**Sí**	**2632**		**Construcción vía**	**jue 4/03/27**	**sáb 13/03/27**	**9 días**
2633	No	2633	UE351	Preliminares y Excavaciones	jue 4/03/27	sáb 13/03/27	9 días
2634	No	2634	UE351	Capas Granulares	lun 8/03/27	sáb 13/03/27	6 días
2635	No	2635	UE352	Carpeta Asfáltica	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	4 días
2636	No	2636		Fin Espacio Público	mié 10/03/27	mié 10/03/27	0 días
2637	No	2637		Fin Sector 11	mié 10/03/27	mié 10/03/27	0 días
2638	No	2638		Fin Sectores Girardot - Bogotá (Oriental)	mié 31/03/27	mié 31/03/27	0 días
2639	**Sí**	**2639**		**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS (SINGULARES)**	**sáb 4/06/22**	**mar 23/03/27**	**1474 días**
2640	**Sí**	**2640**		**PUENTES Y RAMPAS**	**sáb 4/06/22**	**lun 15/03/27**	**1468 días**
2641	No	2641		Inicio Puentes y Rampas	sáb 4/06/22	sáb 4/06/22	0 días
2642	**Sí**	**2642**		**Construcción de Puentes**	**sáb 4/06/22**	**mar 15/12/26**	**1391 días**
2643	**Sí**	**2643**		**Puente Vehicular Calle 22**	**sáb 4/06/22**	**mar 15/12/26**	**1391 días**
2644	No	2644		Entrega de Predios por parte de la EFR	sáb 4/06/22	sáb 4/06/22	0 días
2645	No	2645		Inicio	lun 6/06/22	lun 6/06/22	0 días
2646	No	2646		Cerramiento y traslado de maquinaria	sáb 11/06/22	jue 30/06/22	15 días
2647	No	2647		Replanteo	vie 1/07/22	jue 14/07/22	10 días
2648	**Sí**	**2648**	**UE357**	**CIMENTACIÓN PUENTE CALLE 22**	**jue 28/07/22**	**vie 30/01/26**	**1082 días**
2649	**Sí**	**2649**		**Cimentación Profunda**	**jue 28/07/22**	**vie 30/01/26**	**1082 días**
2650	No	2650		Apoyo 3	jue 28/07/22	mié 31/08/22	30 días
2651	No	2651		Solución a la interferencia de la red matriz	mar 18/02/25	vie 7/03/25	16 días
2652	No	2652		Apoyo C	vie 7/03/25	vie 30/01/26	276 días
2653	No	2653		Apoyo 3'	vie 7/03/25	vie 30/01/26	276 días
2654	No	2654		Apoyo 2	mié 3/09/25	mié 1/10/25	25 días
2655	No	2655		Apoyo 1	mié 1/10/25	lun 19/01/26	90 días
2656	No	2656		Apoyo B	mié 15/10/25	vie 30/01/26	90 días
2657	No	2657		Apoyo A	mié 24/12/25	vie 30/01/26	30 días
2658	No	2658		Fin cimentación profunda	vie 30/01/26	vie 30/01/26	0 días
2659	**Sí**	**2659**	**UE358**	**ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PUENTE CALLE 22**	**jue 28/08/25**	**jue 3/12/26**	**387.5 días**
2660	No	2660		Zapatas	mié 1/10/25	vie 27/03/26	150 días
2661	No	2661		Pilas	sáb 25/10/25	mar 12/05/26	166 días
2662	**Sí**	**2662**		**VIGAS Y TABLERO**	**jue 28/08/25**	**jue 3/12/26**	**387.5 días**
2663	**Sí**	**2663**		**Viga cajón metálica**	**vie 30/01/26**	**mar 28/07/26**	**148 días**
2664	No	2664		Suministro, fabricación y puesta en obra de Estructura metálica	vie 30/01/26	mar 23/06/26	120 días
2665	No	2665		Montaje estructura metálica	mar 23/06/26	mar 28/07/26	28 días
2666	**Sí**	**2666**		**Tablero**	**jue 28/08/25**	**jue 3/12/26**	**387.5 días**
2667	No	2667		Losa aligerada sector Occidental	mié 8/07/26	lun 10/08/26	25 días
2668	No	2668		Losa aligerada sector Oriental	mié 22/07/26	vie 21/08/26	25 días
2669	No	2669		Tablero	mar 28/07/26	mié 2/09/26	30 días
2670	No	2670		Aproche occidental (muros mecánicamente estabilizados) ET1 (Impactado por demolición de	vie 28/08/26	mié 25/11/26	76 días
2671	No	2671		Aproche occidental (muros mecánicamente estabilizados) ET2 (No impactado por demolición de	jue 16/07/26	mié 2/09/26	39 días
2672	No	2672		Aproche oriental	jue 28/08/25	mar 15/09/26	320 días
2673	No	2673		New Jersey ET1 (No impactado por demolición de puente peatonal)	mar 18/08/26	mié 9/09/26	20 días
2674	No	2674		New Jersey ET2 (Impactado por demolición de puente peatonal)	mar 10/11/26	jue 3/12/26	20 días
2675	**Sí**	**2675**	**UE359**	**ACABADOS Y PRUEBA DE CARGA PUENTE CALLE 22**	**mié 9/09/26**	**mar 15/12/26**	**81.5 días**
2676	No	2676		Acabados puente Calle 22 ET 1 (No impactado por demolición de puente peatonal)	mié 9/09/26	mié 30/09/26	18 días
2677	No	2677		Acabados puente Calle 22 ET 2 (Impactado por demolición de puente peatonal)	mar 1/12/26	mar 15/12/26	12 días
2678	No	2678		PRUEBA DE CARGA PUENTE CALLE 22	mié 7/10/26	vie 9/10/26	3 días
2679	No	2679		Fin puente calle 22	mar 15/12/26	mar 15/12/26	0 días
2680	**Sí**	**2680**		**Puente Peatonal Ducales**	**sáb 4/06/22**	**mar 27/10/26**	**1350.5 días**
2681	No	2681		Entrega de Predios por parte de la EFR	sáb 4/06/22	sáb 4/06/22	0 días
2682	No	2682		Inicio	sáb 4/06/22	sáb 4/06/22	0 días
2683	No	2683		Cerramiento y traslado de maquinaria	sáb 11/06/22	jue 30/06/22	15 días
2684	No	2684		Replanteo	jue 30/06/22	mar 5/07/22	3 días
2685	**Sí**	**2685**	**UE363**	**CIMENTACIÓN PUENTE PEATONAL DUCALES (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**lun 19/09/22**	**sáb 14/02/26**	**1049.5 días**
2686	**Sí**	**2686**		**Cimentación Profunda**	**lun 19/09/22**	**sáb 14/02/26**	**1049.5 días**
2687	No	2687		Pilotes costado Oriental	lun 19/09/22	sáb 19/11/22	52 días
2688	No	2688		Pilotes costado Occidental	jue 3/11/22	mié 4/01/23	52 días
2689	No	2689		Pilotes sector Central (puente y rampa)	mar 18/11/25	sáb 14/02/26	75 días
2690	**Sí**	**2690**	**UE364**	**ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PUENTE DUCALES (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**vie 26/12/25**	**mar 22/09/26**	**225 días**
2691	No	2691		Zapatas (puente y rampa)	vie 26/12/25	lun 13/04/26	90 días
2692	No	2692		PILAS (puente y rampa)	mié 14/01/26	lun 25/05/26	110 días
2693	**Sí**	**2693**		**VIGA**	**vie 2/01/26**	**lun 3/08/26**	**177.5 días**
2694	No	2694		Construcción de Vigas de Concreto	vie 2/01/26	jue 23/04/26	95 días
2695	No	2695		Montaje vigas de concreto	mar 28/07/26	lun 3/08/26	5 días
2696	No	2696		RAMPAS DE ACCESO	jue 23/04/26	lun 6/07/26	60 días
2697	No	2697		RAMPAS DE ACCESO TRANSMILENIO	mié 1/07/26	mar 22/09/26	70 días
2698	**No**	**2698**	**UE365**	**ACABADOS Y PRUEBA DE CARGA PUENTE PEATONAL DUCALES (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**mié 16/09/26**	**mar 27/10/26**	**35 días**
2699	No	2699		fin	mar 27/10/26	mar 27/10/26	0 días
2700	**Sí**	**2700**		**Puente Peatonal El Altico**	**vie 2/12/22**	**sáb 29/11/25**	**921 días**
2701	No	2701		Entrega de Predios por parte de la EFR	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0 días
2702	No	2702		Inicio	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0 días
2703	No	2703		Cerramiento y traslado de maquinaria	vie 2/12/22	jue 15/12/22	10 días
2704	No	2704		replanteo	jue 15/12/22	sáb 24/12/22	8 días
2705	**Sí**	**2705**	**UE360**	**CIMENTACIÓN PUENTE PEATONAL EL ALTICO (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**lun 26/12/22**	**sáb 30/11/24**	**594 días**
2706	**Sí**	**2706**		**cimentación profunda**	**lun 26/12/22**	**sáb 30/11/24**	**594 días**
2707	No	2707		Pilotes costado Oriental	lun 26/12/22	jue 23/02/23	52 días
2708	No	2708		Pilotes costado Occidental	jue 30/03/23	jue 8/06/23	58 días
2709	No	2709		Pilotes sector Central (puente y rampa)	mié 9/10/24	sáb 30/11/24	44 días
2710	**Sí**	**2710**	**UE361**	**ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PUENTE PEATONAL EL ALTICO (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**vie 1/11/24**	**mar 7/10/25**	**287 días**
2711	No	2711		Zapatas (puente y rampa)	vie 1/11/24	sáb 7/12/24	30 días
2712	No	2712		PILAS (puente y rampa)	mar 24/12/24	mar 25/02/25	52 días
2713	**Sí**	**2713**		**VIGA**	**vie 8/11/24**	**jue 10/07/25**	**206 días**
2714	No	2714		Construcción de Vigas de Concreto	vie 8/11/24	mié 5/02/25	75 días
2715	No	2715		Montaje vigas de concreto	sáb 5/07/25	jue 10/07/25	5 días
2716	No	2716		RAMPAS DE ACCESO	sáb 24/05/25	vie 22/08/25	75 días
2717	No	2717		RAMPAS DE ACCESO TRANSMILENIO	vie 22/08/25	mar 7/10/25	40 días
2718	No	2718	UE362	ACABADOS Y PRUEBA DE CARGA PUENTE PEATONAL EL ALTICO (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)	mié 8/10/25	sáb 29/11/25	44 días
2719	No	2719		Fin	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	0 días
2720	**Sí**	**2720**		**Puente Peatonal Humedal Compartir**	**mar 11/04/23**	**lun 31/08/26**	**1038 días**
2721	No	2721		Entrega de Predios por parte de la EFR	mar 11/04/23	mar 11/04/23	0 días
2722	No	2722		Inicio	jue 8/06/23	jue 8/06/23	0 días
2723	No	2723		Cerramiento y traslado de maquinaria	jue 8/06/23	mié 21/06/23	10 días
2724	No	2724		replanteo	vie 9/06/23	mar 20/06/23	8 días
2725	**Sí**	**2725**	**UE366**	**CIMENTACIÓN PUENTE PEATONAL HUMEDAL (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**jue 22/06/23**	**jue 20/02/25**	**512 días**
2726	**Sí**	**2726**		**cimentación profunda**	**jue 22/06/23**	**jue 20/02/25**	**512 días**

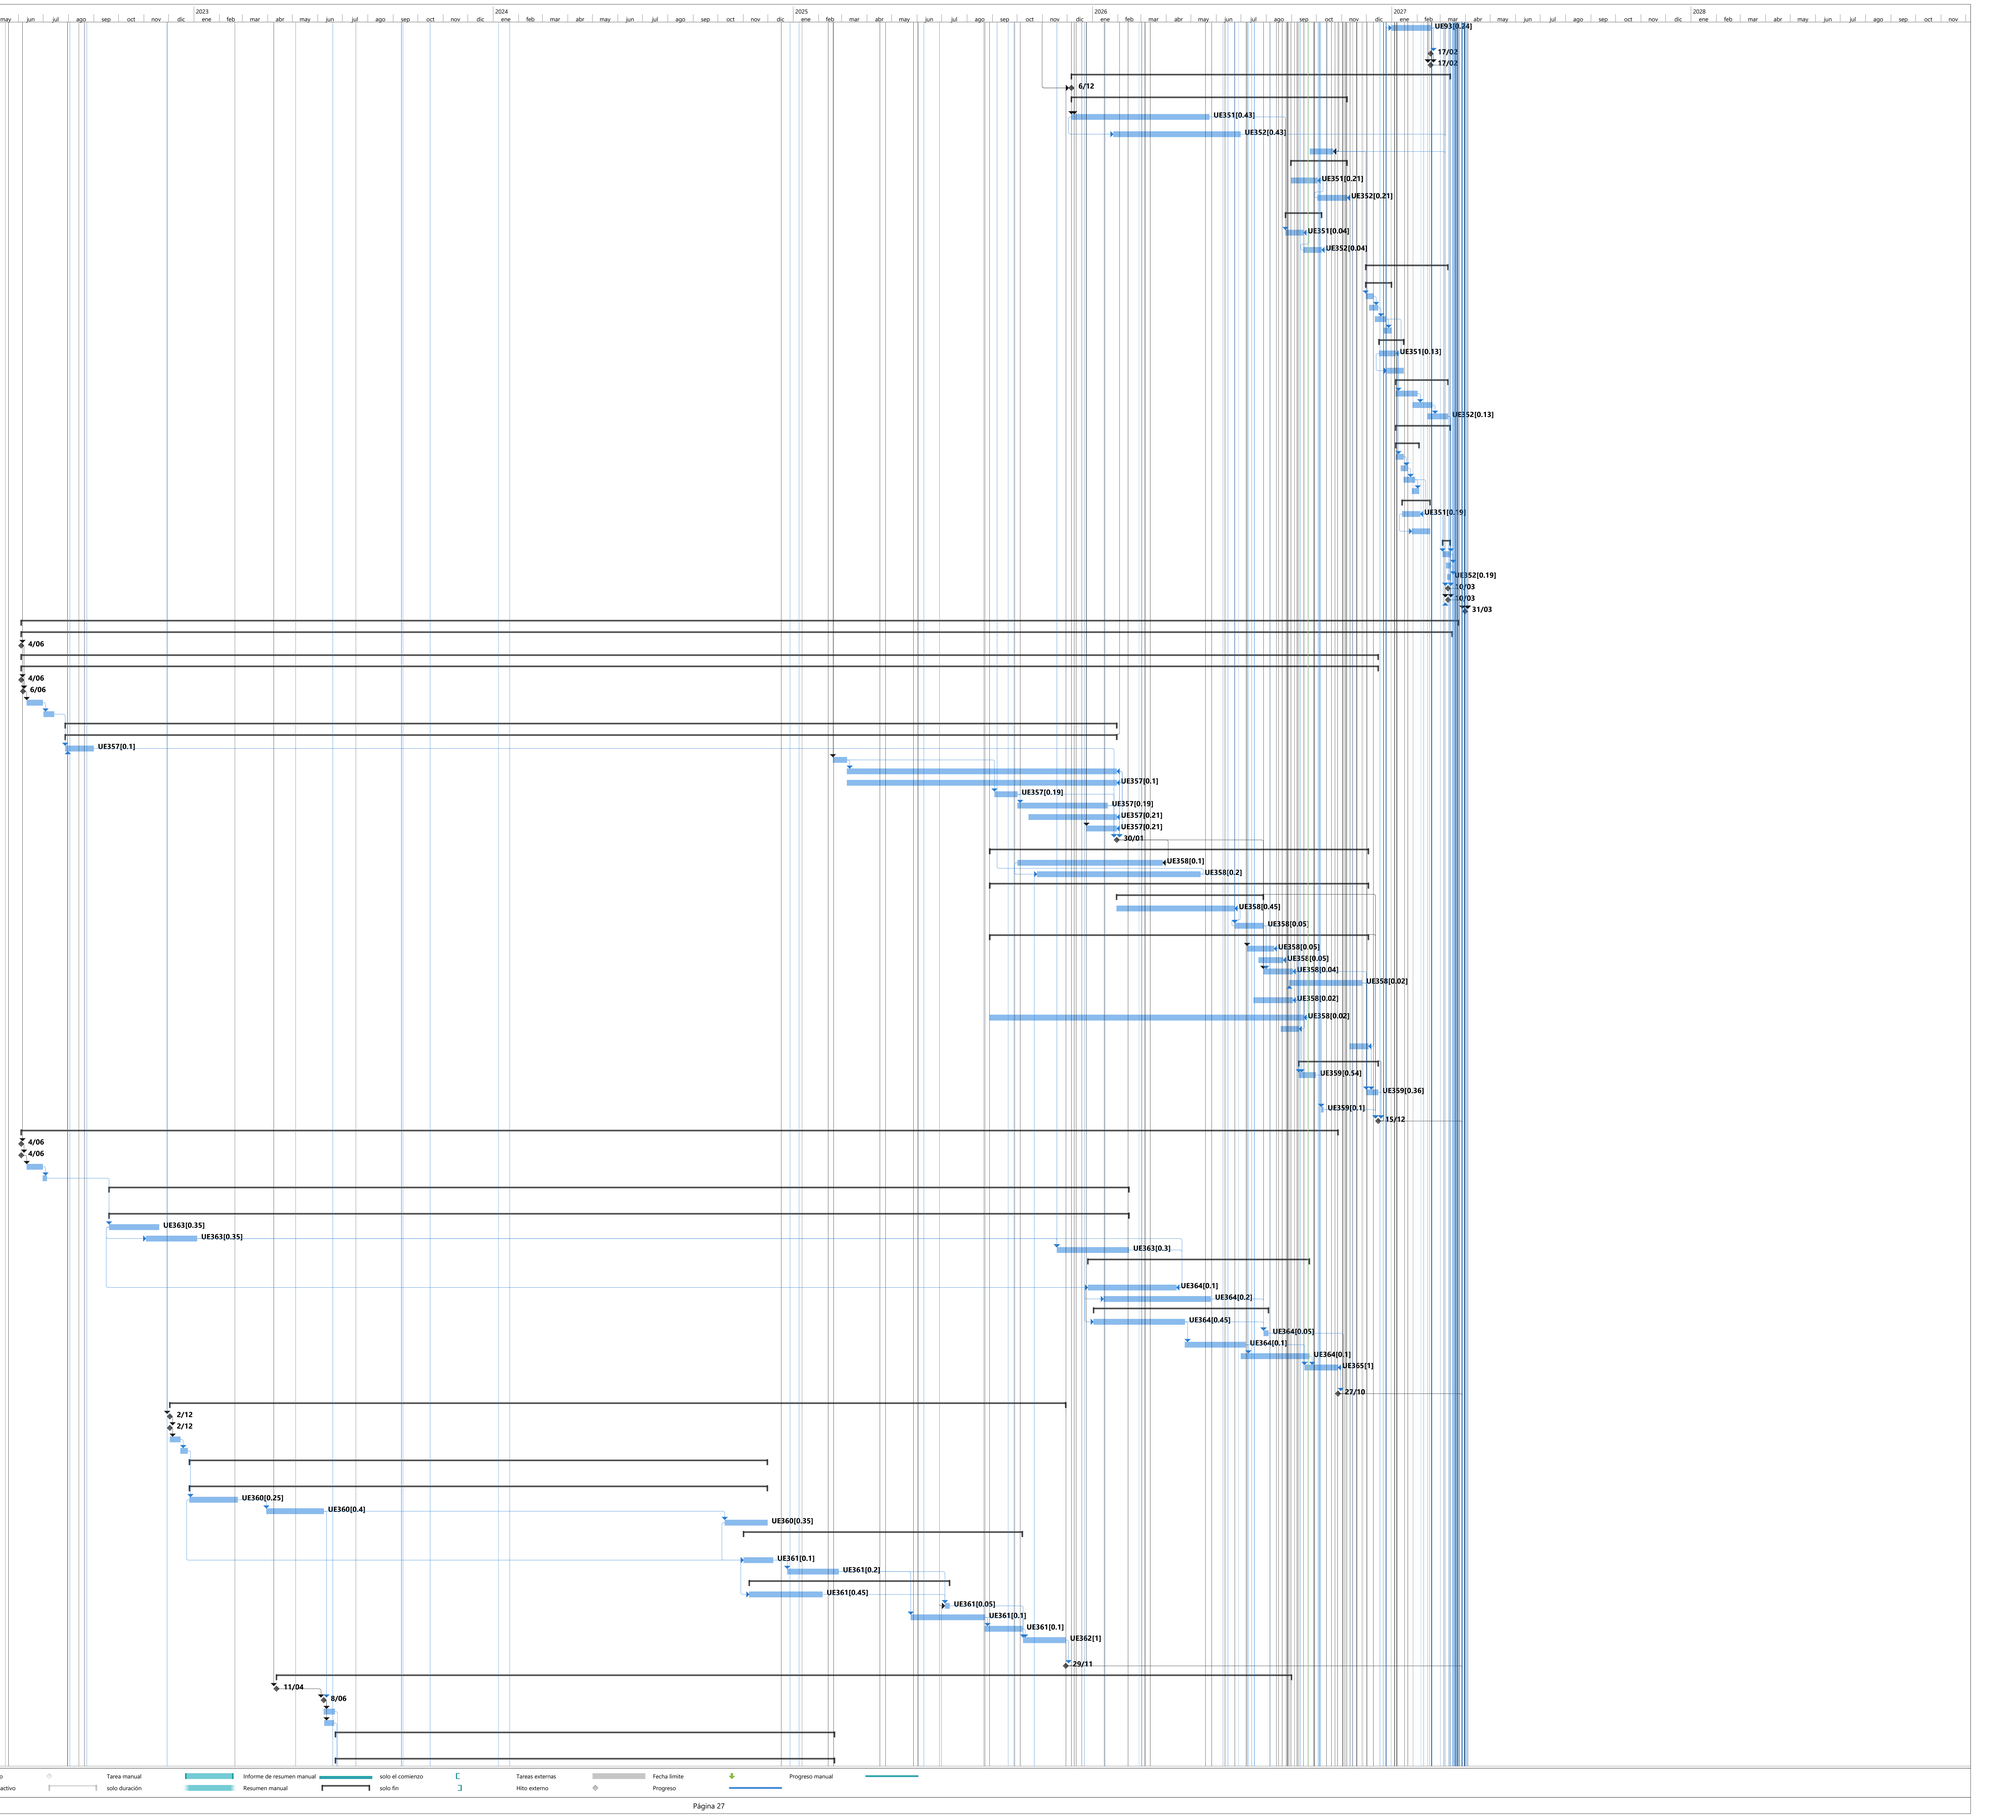

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2727	No	2727		Pilotes costado Oriental	jue 22/06/23	jue 24/08/23	52 días
2728	No	2728		Pilotes costado Occidental	vie 25/08/23	mar 24/10/23	52 días
2729	No	2729		Pilotes sector Central (puente y rampa)	vie 13/12/24	jue 20/02/25	58 días
2730	**Sí**	**2730**	**UE367**	**ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PUENTE PEATONAL HUMEDAL (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)**	**jue 19/12/24**	**jue 26/02/26**	**367 días**
2731	No	2731		Zapatas (puente y rampa)	jue 19/12/24	vie 24/01/25	30 días
2732	No	2732		PILAS (puente y rampa)	mié 8/01/25	vie 7/03/25	52 días
2733	**Sí**	**2733**		**Viga**	**vie 24/01/25**	**vie 11/07/25**	**142 días**
2734	No	2734		Construcción de Vigas de Concreto	vie 24/01/25	mié 23/04/25	75 días
2735	No	2735		Montaje vigas de concreto	lun 7/07/25	vie 11/07/25	5 días
2736	No	2736		RAMPAS DE ACCESO	mié 23/07/25	mié 1/10/25	60 días
2737	No	2737		RAMPAS DE ACCESO TRANSMILENIO	mar 14/10/25	jue 26/02/26	115 días
2738	No	2738	UE368	ACABADOS Y PRUEBA DE CARGA PUENTE PEATONAL HUMEDAL (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y RAMPA ACCESO ESTACION TRANSMILENIO)	mar 7/04/26	lun 31/08/26	120 días
2739	No	2739		Fin	lun 31/08/26	lun 31/08/26	0 días
2740	**Sí**	**2740**		**Construcción de Rampas de acceso a estaciones Transmilenio**	**vie 29/05/26**	**lun 15/03/27**	**242 días**
2741	No	2741		Demolición rampa norte puente carrera 7 existente	jue 20/08/26	mar 25/08/26	5 días
2742	No	2742		Inicio	vie 29/05/26	vie 29/05/26	0 días
2743	**Sí**	**2743**	**UE370**	**RAMPAS ACCESO PUENTE PEATONAL CARRERA 7 (INCLUYE CIMENTACIÓN, EMPALME CON TABLERO**	**jue 11/06/26**	**mié 30/12/26**	**168 días**
2744	No	2744		Cimentación Norte	jue 13/08/26	lun 28/09/26	40 días
2745	No	2745		Estructura de concreto norte	sáb 5/09/26	sáb 14/11/26	60 días
2746	No	2746		Baranda metálica y acabados norte	vie 30/10/26	mié 30/12/26	50 días
2747	No	2747		Cimentación rampa de acceso a Transmilenio ET 1	jue 11/06/26	mar 7/07/26	20 días
2748	No	2748		Cimentación rampa de acceso a Transmilenio ET 2 (Posterior aprobación a la modificación de los diseños)	lun 28/09/26	mié 21/10/26	20 días
2749	No	2749		Estructura de concreto Transmilenio	mar 13/10/26	mié 23/12/26	60 días
2750	No	2750		Baranda metálica y acabados Transmilenio	vie 23/10/26	mié 30/12/26	56 días
2751	**Sí**	**2751**	**UE371**	**RAMPAS ACCESO PUENTE EL DORADO (INCLUYE CIMENTACIÓN, EMPALME CON TABLERO PUENTE)**	**vie 3/07/26**	**jue 17/12/26**	**140 días**
2752	No	2752		Cimentación	vie 3/07/26	vie 21/08/26	40 días
2753	No	2753		Columnas en concreto	vie 21/08/26	jue 24/09/26	30 días
2754	No	2754		Fabricación viga metálica rampa estación Carrera 7	mié 26/08/26	mié 23/09/26	25 días
2755	No	2755		Fabricación viga metálica rampa estación San Humberto	mié 23/09/26	vie 16/10/26	20 días
2756	No	2756		Transporte y montaje viga metálica viga metalica rampa estación Carrera 7	lun 28/09/26	lun 5/10/26	6 días
2757	No	2757		Transporte y montaje viga metálica viga metalica rampa estación San Humberto	jue 22/10/26	mié 28/10/26	6 días
2758	No	2758		Construcción tablero rampa estación Carrera 7	sáb 17/10/26	mar 3/11/26	14 días
2759	No	2759		Construcción tablero rampa estación San Humberto	mar 10/11/26	mié 25/11/26	13 días
2760	No	2760		Baranda metálica y acabados rampa estación Carrera 7	mar 10/11/26	vie 27/11/26	15 días
2761	No	2761		Baranda metálica y acabados rampa estación San Humberto	mié 2/12/26	jue 17/12/26	12 días
2762	**Sí**	**2762**	**UE372**	**RAMPAS ACCESO PUENTE SAN HUMBERTO (INCLUYE CIMENTACIÓN, EMPALME CON TABLERO PUENTE)**	**jue 19/11/26**	**lun 15/03/27**	**99 días**
2763	No	2763		Cimentación	jue 19/11/26	mié 6/01/27	40 días
2764	No	2764		Estructura de concreto	mié 6/01/27	sáb 13/03/27	58 días
2765	No	2765		Baranda metálica y acabados	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2766	No	2766		Fin	lun 15/03/27	lun 15/03/27	0 días
2767	**Sí**	**2767**		**Construcción de Muros de Contención**	**jue 16/02/23**	**sáb 13/03/27**	**1249 días**
2768	**Sí**	**2768**		**Construcción de Muros de Contención**	**jue 16/02/23**	**sáb 13/03/27**	**1249 días**
2769	No	2769	UE369A	Muros de contención BGO-GRT (K0+240-K0+840)	mar 24/12/24	sáb 27/12/25	310 días
2770	No	2770	UE369B	Muros de contención BGO-GRT (K0+840-K1+320)	lun 2/03/26	vie 12/02/27	290 días
2771	No	2771	UE369C	Muros de contención BGO-GRT (K1+320-K1+680)	sáb 23/01/27	sáb 13/03/27	44 días
2772	No	2772	UE369D	Muros de contención BGO-GRT (K1+680-K3+120) Etapa 1	vie 30/05/25	sáb 27/09/26	330 días
2773	No	2773	UE369D	Muros de contención BGO-GRT (K1+680-K3+120) Etapa 2	sáb 5/09/26	sáb 13/03/27	161 días
2774	No	2774	UE369E	Muros de contenciónBGO-GRT (K3+120-K3+660)	jue 16/02/23	sáb 18/04/26	973 días
2775	No	2775	UE369F	Muros de contención BGO-GRT (K0+000-k0+240)	mié 5/08/26	jue 11/02/27	160 días
2776	No	2776	UE369G	Muros de contención GRT -BGO (k2+820-k3+660)	sáb 18/01/25	jue 15/05/25	100 días
2777	No	2777	UE369H	Muros de contención GRT-BGO (K2+040-k2+480)	mar 7/07/26	sáb 13/03/27	161 días
2778	No	2778	UE369I	Muros de contención GRT-BGO(K0+000-k0+660)	lun 15/12/25	jue 18/02/27	360 días
2779	No	2779		Fin Puentes, Rampas y Muros Contención	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2780	**Sí**	**2780**		**ESTACIÓNES SENCILLAS TRANSMILENIO**	**sáb 8/11/25**	**sáb 13/03/27**	**411 días**
2781	No	2781		Inicio de Estaciones	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
2782	**Sí**	**2782**		**ESTACIÓN SENCILLA TRANSMILENIO CARRERA SÉPTIMA**	**jue 20/11/25**	**jue 31/12/26**	**339 días**
2783	No	2783		Inicio	jue 20/11/25	jue 20/11/25	0 días
2784	**Sí**	**2784**		**CIMENTACIÓN**	**jue 5/02/26**	**vie 20/11/26**	**240 días**
2785	No	2785	UE373A	CIMENTACIÓN ESTACIÓN	jue 5/02/26	vie 10/07/26	130 días
2786	**Sí**	**2786**	**UE373B**	**CIMENTACIÓN TAQUILLAS**	**lun 31/08/26**	**vie 20/11/26**	**70 días**
2787	No	2787		Cimentación Taquilla PTE KR7 Sur	lun 31/08/26	mar 22/09/26	20 días
2788	No	2788		Cimentación Taquilla PTE KR7 Norte	mar 27/10/26	vie 20/11/26	20 días
2789	**Sí**	**2789**		**MONTAJE**	**mié 27/05/26**	**lun 7/12/26**	**162 días**
2790	No	2790	UE374A	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN SUMINISTRO (EN TALLER).	mié 27/05/26	mar 2/06/26	5 días
2791	No	2791	UE374B	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN FABRICADA (EN TALLER).	mar 2/06/26	mar 28/07/26	45 días
2792	No	2792	UE374C	TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN	vie 26/06/26	mar 8/09/26	60 días
2793	**Sí**	**2793**	**UE374D**	**ESTRUCTURA METALICA TAQUILLAS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PUESTA EN OBRA Y MONTAJE)**	**mar 22/09/26**	**lun 7/12/26**	**65 días**
2794	No	2794		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE KR7 Sur	mar 22/09/26	jue 8/10/26	15 días
2795	No	2795		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE KR7 Norte	vie 20/11/26	lun 7/12/26	15 días
2796	**Sí**	**2796**		**VESTIDA (INCLUYE REDES INTERNAS)**	**mié 19/08/26**	**jue 31/12/26**	**115 días**
2797	No	2797	UE375A	CUBIERTA ESTACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	sáb 12/09/26	sáb 10/10/26	25 días
2798	No	2798	UE375B	PISO DE ESTACIÓN EN GRC (SUMINISTRO E INSTALAC	vie 2/10/26	vie 23/10/26	16 días
2799	No	2799	UE375C	ACABADOS DE ESTACIÓN INCLUYE REDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 25/09/26	lun 26/10/26	25 días
2800	No	2800	UE375D	SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS (SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER)	mié 19/08/26	lun 26/10/26	60 días
2801	No	2801	UE375E	SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS (TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE)	jue 15/10/26	sáb 31/10/26	15 días
2802	**Sí**	**2802**	**UE375F**	**ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLAS**	**jue 8/10/26**	**jue 31/12/26**	**70 días**
2803	No	2803		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE KR7 Sur	jue 8/10/26	sáb 31/10/26	20 días
2804	No	2804		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE KR7 Norte	lun 7/12/26	jue 31/12/26	20 días
2805	No	2805		Fin	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días
2806	**Sí**	**2806**		**ESTACIÓN SENCILLA TRANSMILENIO SAN HUMBERTO**	**lun 15/12/25**	**sáb 13/03/27**	**381 días**
2807	No	2807		Inicio	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
2808	**Sí**	**2808**		**CIMENTACIÓN**	**jue 4/06/26**	**jue 11/02/27**	**209 días**
2809	No	2809	UE376A	CIMENTACIÓN ESTACIÓN	jue 4/06/26	jue 20/08/26	60 días
2810	**Sí**	**2810**	**UE376B**	**CIMENTACIÓN TAQUILLAS**	**lun 31/08/26**	**jue 11/02/27**	**140 días**
2811	No	2811		Cimentación Taquilla PTE EL DORADO Sur	lun 31/08/26	mar 22/09/26	20 días
2812	No	2812		Cimentación Taquilla PTE EL DORADO Norte	lun 31/08/26	mar 22/09/26	20 días
2813	No	2813		Cimentación Taquilla PTE SAN HUMBERTO Sur	mié 20/01/27	jue 11/02/27	20 días
2814	No	2814		Cimentación Taquilla PTE SAN HUMBERTO Norte	mié 20/01/27	jue 11/02/27	20 días
2815	**Sí**	**2815**		**MONTAJE**	**mar 30/06/26**	**vie 5/03/27**	**210 días**
2816	No	2816	UE377A	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN SUMINISTRO (EN TALLER).	mar 30/06/26	lun 6/07/26	5 días
2817	No	2817	UE377B	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN FABRICADA (EN TALLER).	lun 6/07/26	sáb 29/08/26	45 días
2818	No	2818	UE377C	TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN	mié 5/08/26	jue 15/10/26	60 días
2819	**Sí**	**2819**	**UE377D**	**ESTRUCTURA METALICA TAQUILLAS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PUESTA EN OBRA Y MONTAJE)**	**mar 22/09/26**	**vie 5/03/27**	**140 días**
2820	No	2820		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE EL DORADO Su	mar 22/09/26	jue 15/10/26	20 días
2821	No	2821		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE EL DORADO Nc	mar 22/09/26	jue 15/10/26	20 días
2822	No	2822		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE SAN HUMBERT	jue 11/02/27	vie 5/03/27	20 días
2823	No	2823		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE SAN HUMBERTO Norte	jue 11/02/27	vie 5/03/27	20 días
2824	**Sí**	**2824**		**VESTIDA (INCLUYE REDES INTERNAS)**	**jue 8/10/26**	**sáb 13/03/27**	**132 días**
2825	No	2825	UE378A	CUBIERTA ESTACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar 20/10/26	jue 19/11/26	25 días
2826	No	2826	UE378B	PISO DE ESTACIÓN EN GRC (SUMINISTRO E INSTALAC	mié 11/11/26	vie 4/12/26	20 días
2827	No	2827	UE378C	ACABADOS DE ESTACIÓN INCLUYE REDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	jue 12/11/26	vie 18/12/26	30 días
2828	No	2828	UE378D	SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS (SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER)	mié 14/10/26	jue 24/12/26	60 días
2829	No	2829	UE378E	SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS (TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE)	sáb 12/12/26	mié 30/12/26	15 días
2830	**Sí**	**2830**	**UE378F**	**ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLAS**	**jue 8/10/26**	**sáb 13/03/27**	**132 días**
2831	No	2831		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE EL DORADO Sur	jue 8/10/26	sáb 31/10/26	20 días
2832	No	2832		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE EL DORADO Norte	jue 8/10/26	sáb 31/10/26	20 días
2833	No	2833		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE SAN HUMBERTO Sur	vie 5/03/27	sáb 13/03/27	7 días
2834	No	2834		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE SAN HUMBERTO Norte	vie 5/03/27	sáb 13/03/27	7 días
2835	No	2835		Fin	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2836	**Sí**	**2836**		**ESTACIÓN SENCILLA TRANSMILENIO DUCALES**	**lun 15/12/25**	**jue 31/12/26**	**319 días**
2837	No	2837		Inicio	lun 15/12/25	lun 15/12/25	0 días
2838	**Sí**	**2838**		**CIMENTACIÓN**	**vie 10/07/26**	**jue 12/11/26**	**105 días**
2839	No	2839	UE379A	CIMENTACIÓN ESTACIÓN	vie 10/07/26	lun 21/09/26	60 días
2840	**Sí**	**2840**	**UE379B**	**CIMENTACIÓN TAQUILLAS**	**mar 20/10/26**	**jue 12/11/26**	**20 días**
2841	No	2841		Cimentación Taquilla PTE DUCALES Sur	mar 20/10/26	jue 12/11/26	20 días
2842	No	2842		Cimentación Taquilla PTE DUCALES Norte	mar 20/10/26	jue 12/11/26	20 días
2843	No	2843		Cimentación Taquilla PTE ALTICO Sur	mar 20/10/26	jue 12/11/26	20 días
2844	No	2844		Cimentación Taquilla PTE ALTICO Norte	mar 20/10/26	jue 12/11/26	20 días
2845	**Sí**	**2845**		**MONTAJE**	**mar 4/08/26**	**sáb 5/12/26**	**105 días**
2846	No	2846	UE380A	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN SUMINISTRO (EN TALLER).	mar 4/08/26	mar 11/08/26	5 días
2847	No	2847	UE380B	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN FABRICADA (EN TALLER).	mar 11/08/26	jue 1/10/26	45 días
2848	No	2848	UE380C	TRANSPORTE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN	jue 3/09/26	jue 12/11/26	60 días
2849	**Sí**	**2849**	**UE380D**	**ESTRUCTURA METALICA TAQUILLAS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PUESTA EN OBRA Y MONTAJE)**	**jue 12/11/26**	**sáb 5/12/26**	**20 días**
2850	No	2850		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE DUCALES Sur	jue 12/11/26	sáb 5/12/26	20 días
2851	No	2851		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE DUCALES Norte	jue 12/11/26	sáb 5/12/26	20 días
2852	No	2852		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE ALTICO Sur	jue 12/11/26	sáb 5/12/26	20 días
2853	No	2853		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE ALTICO Norte	jue 12/11/26	sáb 5/12/26	20 días
2854	**Sí**	**2854**		**VESTIDA (INCLUYE REDES INTERNAS)**	**jue 15/10/26**	**jue 31/12/26**	**65 días**
2855	No	2855	UE381A	CUBIERTA ESTACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 30/10/26	lun 30/11/26	25 días
2856	No	2856	UE381B	PISO DE ESTACIÓN EN GRC (SUMINISTRO E INSTALAC	jue 26/11/26	lun 21/12/26	20 días
2857	No	2857	UE381C	ACABADOS DE ESTACIÓN INCLUYE REDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	jue 19/11/26	jue 24/12/26	30 días
2858	No	2858	UE381D	SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS (SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER)	jue 15/10/26	jue 24/12/26	60 días

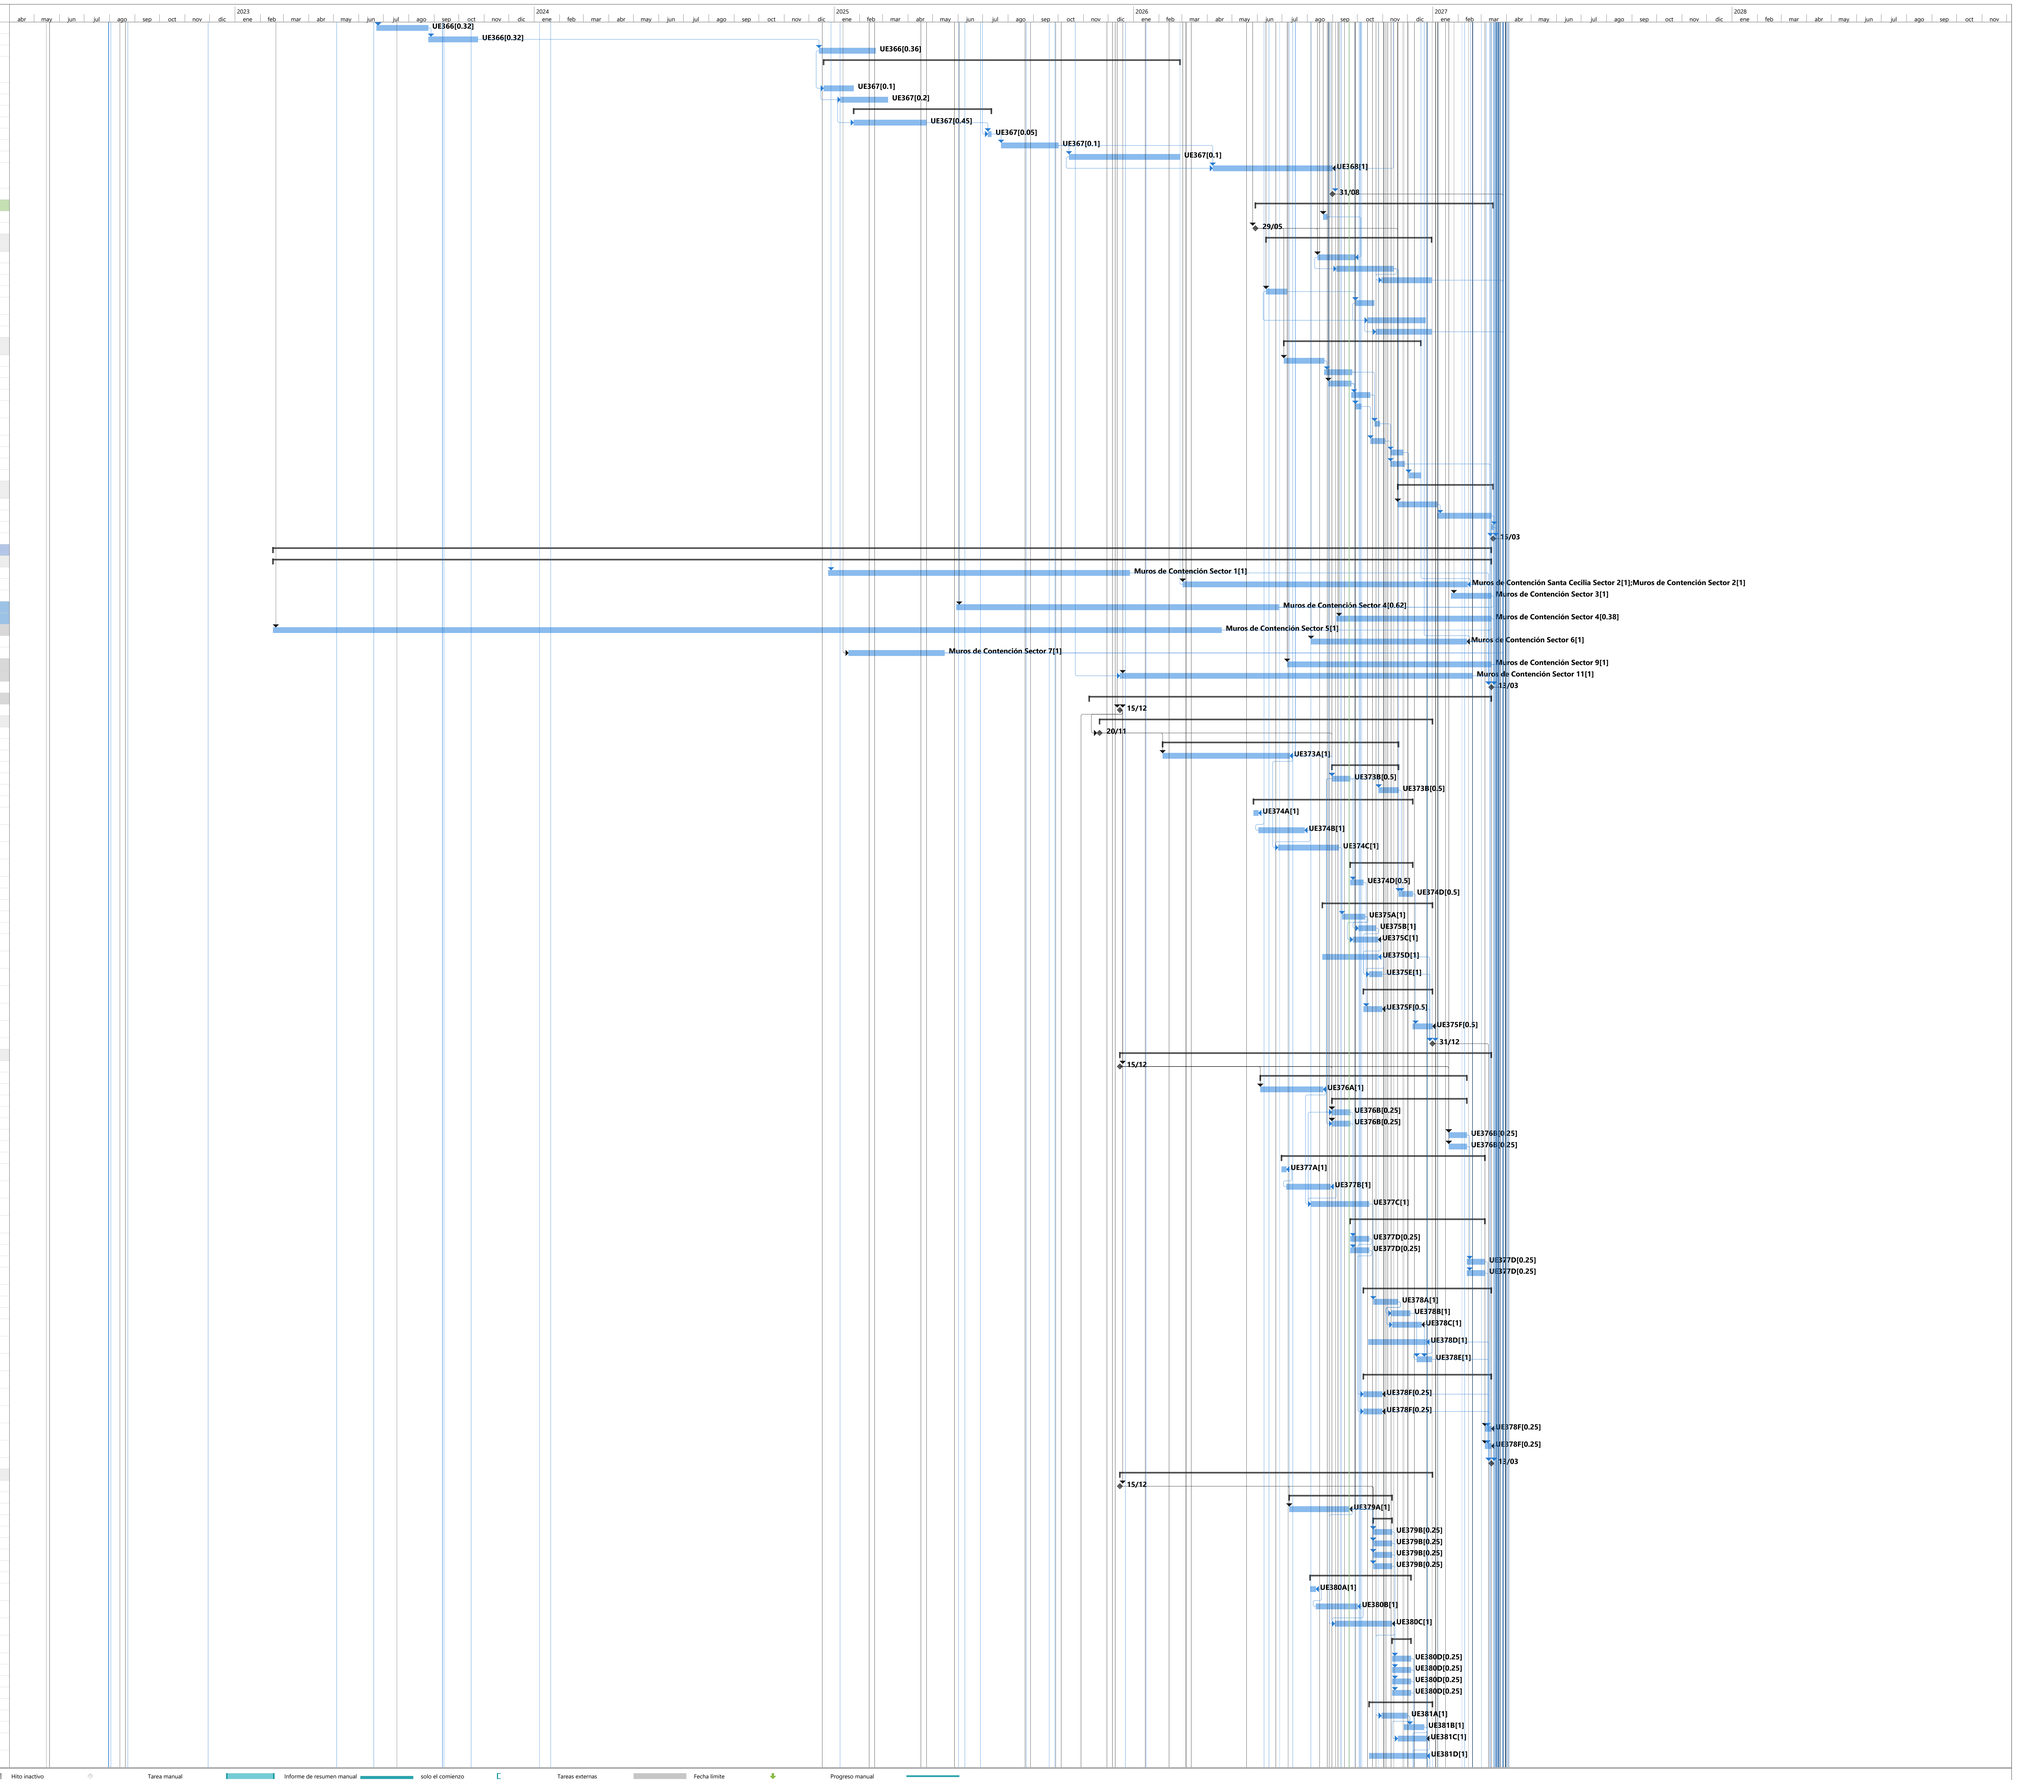

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Resumen	Id	UE TCOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2859	No	2859	UE381E	SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS	lun 14/12/26	jue 31/12/26	15 días
2860	Sí	2860	UE381F	**ESTACIÓN SENCILLA TRANSMILENIO COMPARTIR (HUMED**	**sáb 8/11/25**	**mié 30/12/26**	**416 días**
				ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLAS	**sáb 5/12/26**	**mié 30/12/26**	**20 días**
2861	No	2861		ESTRUCTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE DUCALES Sur	sáb 5/12/26	mié 30/12/26	20 días
2862	No	2862		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE DUCALES Norte	sáb 5/12/26	mié 30/12/26	20 días
2863	No	2863		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE HUMEDAL Sur	sáb 5/12/26	mié 30/12/26	20 días
2864	No	2864		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE HUMEDAL Norte	sáb 5/12/26	mié 30/12/26	20 días
2865	No	2865		Fin	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días
2866	Sí	2866		**ESTACIÓN SENCILLA TRANSMILENIO COMPARTIR (HUMED**	**sáb 8/11/25**	**mié 30/12/26**	**346 días**
2867	No	2867		Inicio	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	0 días
2868	Sí	2868		**CIMENTACIÓN**	**jue 5/02/26**	**jue 19/11/26**	**239 días**
2869	No	2869	UE382A	CIMENTACIÓN ESTACIÓN	jue 5/02/26	vie 13/07/26	120 días
2870	Sí	2870	UE382B	**CIMENTACIÓN ESTRUCTURA METALICA**	**mié 29/07/26**	**mié 19/11/26**	**74 días**
2871	No	2871		Cimentación Taquilla PTE HUMEDAL Sur	mié 29/07/26	jue 17/09/26	20 días
2872	No	2872		Cimentación Taquilla PTE HUMEDAL Norte	jue 27/08/26	vie 18/09/26	20 días
2873	No	2873		Cimentación Taquilla CALLE 15S Sur	lun 26/10/26	jue 19/11/26	20 días
2874	No	2874		Cimentación Taquilla CALLE 15S Norte	mar 23/08/26	mié 16/09/26	20 días
2875	Sí	2875		Fin	jue 19/11/26	jue 19/11/26	0 días
2876	Sí	2876	UE383A	**MONTAJE**	**jue 21/05/26**	**sáb 5/12/26**	**166 días**
2877	No	2877	UE383B	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN SUMINISTRO (EN TALLER)	jue 21/05/26	mié 22/07/26	45 días
2878	No	2878	UE383C	ESTRUCTURA METALICA ESTACIÓN FABRICADA (EN TALLER)	mié 27/05/26	mié 22/07/26	45 días
2879	Sí	2879	UE383D	TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA **ESTRUCTURA METALICA TAQUILLAS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PUESTA EN OBRA Y MONTAJE)**	vie 25/06/26	mié 8/09/26	60 días
2880	No	2880		ESTRUCTURA METALICA TAQUILLA PTE HUMEDAL Sur	vie 18/09/26	lun 5/10/26	15 días
2881	No	2881		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla PTE HUMEDAL Norte	vie 18/09/26	mar 6/10/26	15 días
2882	No	2882		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla CALLE 15S Sur	jue 19/11/26	sáb 5/12/26	15 días
2883	No	2883		ESTRUCTURA METÁLICA Taquilla CALLE 15S Norte	mié 18/09/26	vie 2/10/26	15 días
2884	Sí	2884		**VESTIBUL (INCLUYE REDES INTERNAS)**	**vie 28/08/26**	**mié 30/12/26**	**105 días**
2885	No	2885	UE384A	CIMENTACIÓN VESTIBULO (INCLUYE INSTALACIÓN)	jue 27/08/26	mié 23/09/26	20 días
2886	No	2886	UE384B	PISO DE ESTACIÓN EN GRC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	jue 27/08/26	lun 19/10/26	18 días
2887	No	2887	UE384C	ACABADOS DE ESTACIÓN INCLUYE REDES	lun 21/09/26	lun 26/10/26	30 días
2888	No	2888	UE384D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS (SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER)	vie 28/08/26	lun 26/10/26	50 días
2889	No	2889	UE384E	ESTRUCTURA METALICA PUERTAS (TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE)	mié 14/10/26	vie 30/10/26	15 días
2890	Sí	2890	UE384F	**ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLAS**	**vie 2/10/26**	**mié 30/12/26**	**74 días**
2891	No	2891		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE HUMEDAL Sur	lun 5/10/26	mié 28/10/26	20 días
2892	No	2892		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA PTE HUMEDAL Norte	mar 6/10/26	jue 29/10/26	20 días
2893	No	2893		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA CALLE 15S Sur	sáb 5/12/26	mié 30/12/26	20 días
2894	No	2894		ARQUITECTURA, REDES, PISOS Y CUBIERTA DE TAQUILLA CALLE 15S Norte	vie 2/10/26	lun 26/10/26	20 días
2895	No	2895		Fin	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días
2896	No	2896		Fin de Estaciones	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2897	Sí	2897		**ESTACIÓN INTERMEDIA SIN E INTERSECCIÓN A DESNIVEL**	**lun 1/12/25**	**mar 22/02/27**	**1151 días**
2898	Sí	2898		**PASO SUBTERRANEO NORTE (NO SACACA) (Box Culvert)**	**lun 1/12/25**	**mar 16/02/27**	**1054 días**
2899	No	2899		Cerramiento y traslado de maquinaria	sáb 6/12/25	jue 18/12/25	10 días
2900	No	2900		Replanteo	jue 18/12/25	lun 29/12/25	8 días
2901	Sí	2901	UE385	**BOX CULVERT ETAPA 1 - FASE 1**	**vie 15/05/26**	**vie 27/11/26**	**163 días**
2902	No	2902		Manejo de aguas	mié 20/05/26	mié 3/06/26	12 días
2903	No	2903		Excavación	mié 20/05/26	mié 3/06/26	12 días
2904	No	2904		Capa de mejoramiento con concreto ciclópeo	vie 15/07/26	mié 29/07/26	15 días
2905	No	2905		Fabricación de módulos prefabricados Etapa 1 - Fase 1 (Mod 1-18)	vie 15/05/26	mar 4/08/26	65 días
2906	No	2906		Instalación de módulos prefabricados Etapa 1 - Fase 1 (Mod 1-18)	vie 15/05/26	mar 11/08/26	60 días
2907	No	2907		Rellenos laterales (Aporche) Box culvert Etapa 1 - Fase 1 (Mod 1-18)	mié 29/07/26	jue 1/10/26	55 días
2908	No	2908		Adecuación de tránsito para habilitar zonas de trabajo aubacuerdos	mié 14/10/26	mié 14/10/26	0 días
2909	No	2909		Demolición Box culvert Etapa 1	mar 18/08/26	lun 31/08/26	12 días
2910	No	2910		Manejo de aguas	mar 18/08/26	mar 1/09/26	12 días
2911	No	2911		Excavación	mié 9/09/26	jue 1/10/26	20 días
2912	No	2912		Capa de mejoramiento con concreto ciclópeo	vie 2/10/26	mié 21/10/26	15 días
2913	No	2913		Fabricación de módulos prefabricados Etapa 1 - Fase 1 (Mod 19-37)	mar 4/08/26	mar 18/08/26	10 días
2914	No	2914		Instalación de módulos prefabricados Etapa 1 - Fase 1 (Mod 19-37)	jue 8/10/26	sáb 31/10/26	20 días
2915	No	2915		Rellenos laterales (Aporche) Box culvert Etapa 1 - Fase 1 (Mod 19-37)	sáb 31/10/26	vie 27/11/26	22 días
2916	Sí	2916	UE385	**BOX CULVERT ETAPA 1 - FASE 2**	**mar 18/08/26**	**vie 29/01/27**	**140 días**
2917	No	2917		Demolición Box culvert Etapa 2	mar 18/08/26	mié 2/09/26	6 días
2918	No	2918		Manejo de aguas	mié 11/11/26	jue 19/11/26	6 días
2919	No	2919		Excavación	vie 20/11/26	mar 1/12/26	10 días
2920	No	2920		Capa de mejoramiento con concreto ciclópeo	mié 2/12/26	lun 21/12/26	15 días
2921	No	2921		Fabricación de módulos prefabricados Etapa 1 - Fase 2 (Mod 37-54)	mar 18/08/26	sáb 10/10/26	48 días
2922	No	2922		Instalación de módulos prefabricados Etapa 1 - Fase 2 (Mod 37-54)	mié 9/12/26	lun 4/01/27	20 días
2923	No	2923		Rellenos laterales (Aporche) Box culvert Etapa 1 - Fase 2 (Mod 37-37)	mar 5/01/27	vie 29/01/27	22 días
2924	Sí	2924	UE385	**BOX CULVERT ETAPA 2 - FASE 1**	**sáb 10/10/26**	**mar 16/02/27**	**132 días**
2925	No	2925		Demolición Box culvert Etapa 3	sáb 23/01/27	vie 12/02/27	18 días
2926	No	2926		Manejo de aguas	sáb 13/02/27	sáb 20/02/27	6 días
2927	No	2927		Excavación	lun 22/02/27	lun 8/03/27	12 días
2928	No	2928		Capa de mejoramiento con concreto ciclópeo	mar 9/03/27	sáb 13/03/27	5 días
2929	No	2929		Fabricación de módulos prefabricados Etapa 2 - Fase 1 (Mod 54-82)	sáb 10/10/26	sáb 12/12/26	52 días
2930	No	2930		Instalación de módulos prefabricados Etapa 2 - Fase 1 (Mod 54-82)	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2931	No	2931		Rellenos laterales (Aporche) Box culvert Etapa 2 - Fase 1 (Mod 54-82)	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2932	Sí	2932	UE385	**ALETA BOX CULVERT COSTADO ORIENTAL (GIRARDOT - BOGOTA)**	**mar 6/06/26**	**lun 7/12/26**	**146 días**
2933	No	2933		Demolición	mar 6/06/26	lun 22/06/26	5 días
2934	No	2934		Capa de mejoramiento con concreto ciclópeo	mié 29/07/26	mié 4/08/26	5 días
2935	No	2935		Construcción de aleta de Box Culvert	sáb 31/10/26	lun 7/12/26	30 días
2936	Sí	2936	UE385	**ALETA BOX CULVERT COSTADO OCCIDENTAL (BOGOTA - GIRARDOT)**	**sáb 27/02/27**	**mar 6/04/27**	**15 días**
2937	No	2937		Demolición	sáb 27/02/27	jue 4/03/27	5 días
2938	No	2938		Capa de mejoramiento con concreto ciclópeo	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2939	No	2939		Construcción de aleta de Box Culvert	lun 15/03/27	mar 6/04/27	15 días
2940	Sí	2940		**PASO SOTERRADO 3M**	**sáb 28/08/25**	**sáb 13/02/27**	**524 días**
2941	No	2941		Preliminares	sáb 28/08/25	mié 3/09/25	7 días
2942	No	2942		Cerramiento y traslado de maquinaria	sáb 28/08/25	mié 3/09/25	7 días
2943	No	2943		Replanteo	mié 8/07/25	lun 14/07/25	4 días
2944	No	2944		Excavación	lun 14/07/25	sáb 16/08/25	30 días
2945	Sí	2945		**SOTERRADO COSTADO ORIENTAL (modulo 1)**	**jue 28/08/25**	**sáb 27/06/26**	**255 días**
2946	No	2946	UE389	EXCAVACIÓN EN PASO SUBTERRANEO VEHICULAR SECTOR 3M	jue 28/08/25	sáb 20/12/25	100 días
2947	No	2947	UE390	ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PASO SUBTERRANEO VEHICULAR SECTOR 3M	mar 30/12/25	sáb 27/06/26	150 días
2948	No	2948		**Habilitación tránsito por carriles sector 9**	**mié 30/09/26**	**mié 30/09/26**	**0 días**
2949	Sí	2949		**SOTERRADO CENTRAL (modulo 2)**	**mar 4/08/26**	**vie 29/01/27**	**149 días**
2950	No	2950		Excavación	mar 4/08/26	vie 28/08/26	20 días
2951	No	2951	UE389	EXCAVACIÓN EN PASO SUBTERRANEO VEHICULAR SECTOR 3M	lun 31/08/26	vie 4/12/26	63 días
2952	No	2952	UE390	ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PASO SUBTERRANEO VEHICULAR SECTOR 3M	lun 18/10/26	vie 29/01/27	85 días
2953	Sí	2953		**SOTERRADO COSTADO OCCIDENTAL (modulo 3)**	**mié 9/12/26**	**sáb 13/03/27**	**81 días**
2954	No	2954		Excavación	mié 9/12/26	lun 4/01/27	20 días
2955	No	2955	UE389	EXCAVACIÓN EN PASO SUBTERRANEO VEHICULAR SECTOR 3M	lun 4/01/27	sáb 13/03/27	61 días
2956	No	2956	UE390	ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PASO SUBTERRANEO VEHICULAR SECTOR 3M	jue 18/02/27	sáb 13/03/27	21 días
2957	No	2957		FIN	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
2958	Sí	2958		**PASO ELEVADO PEATONAL ENTRE PLATAFORMA DE ALIMENTADORES Y PLATAFORMA CENTRAL (PEATONAL SECTOR 3M)**	**mar 1/06/26**	**sáb 13/03/27**	**178 días**
2959	Sí	2959		**Paso elevado peatonal entre plataforma de alimentadores y plataforma central (peatonal)**	**mar 1/06/26**	**sáb 13/03/27**	**178 días**
2960	No	2960		PILOTAJE PASO ELEVADO PEATONAL	lun 23/09/26	vie 16/10/26	15 días
2961	No	2961		DADOS DE CIMENTACIÓN APOYO CENTRAL PASO ELEVA	vie 16/10/26	lun 26/10/26	8 días
2962	No	2962		COLUMNAS DE APOYO CENTRAL PASO ELEVADO	mar 20/10/26	sáb 7/11/26	16 días
2963	No	2963		ESTRUCTURA METALICA PASO ELEVADO	mar 27/10/26	sáb 21/11/26	20 días
2964	No	2964	UE389A	ESTRUCTURA METALICA DE EDF NORTE- PLATAFORMA CENTRAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	sáb 7/11/26	sáb 19/12/26	35 días
2965	No	2965	UE389B	ESTRUCTURA METALICA EDF SUR- PLATAFORMA CENTRAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	sáb 7/11/26	sáb 19/12/26	35 días
2966	No	2966	UE389C	ESTRUCTURA METALICA EDF SUR- PLATAFORMA DE ALIMENTADORES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	sáb 19/12/26	lun 1/02/27	35 días
2967	Sí	2967		**ASCENSOR DE PASO ELEVADO**	**mar 18/08/26**	**sáb 13/03/27**	**178 días**
2968	No	2968	UE386D	ASCENSOR de paso inicio de tramo de imposte	mar 18/08/26	jue 20/08/26	3 días
2969	No	2969	UE386D	ASCENSOR DE PASO ELEVADO Y PLATAFORMA DE ALIMENTADORES	sáb 13/02/27	sáb 13/03/27	25 días
2970	Sí	2970	UE387	**INSTALACIONES INTERNAS E ILUMINACIÓN**	**vie 20/11/26**	**jue 25/02/27**	**82 días**
2971	No	2971		INSTALACIONES INTERNAS E ILUMINACIÓN DE EDF NORTE- PLATAFORMA CENTRAL	vie 20/11/26	jue 31/12/26	35 días
2972	No	2972		INSTALACIONES INTERNAS E ILUMINACIÓN PLATAFORMA CENTRAL EDF SUR	vie 20/11/26	jue 31/12/26	35 días
2973	No	2973		INSTALACIONES INTERNAS E ILUMINACIÓN EDF SUR - PLATAFORMA DE ALIMENTADORES	mar 19/01/27	jue 25/02/27	33 días
2974	Sí	2974	UE388	**ACABADOS, PISOS Y BARANDAS**	**lun 7/12/26**	**sáb 20/02/27**	**63 días**
2975	No	2975		ACABADOS, PISOS Y BARANDAS DE EDF NORTE- PLATAFORMA CENTRAL	lun 7/12/26	jue 31/12/26	20 días
2976	No	2976		ACABADOS, PISOS Y BARANDAS PLATAFORMA CENTRAL	lun 7/12/26	jue 31/12/26	20 días
2977	No	2977		ACABADOS, PISOS Y BARANDAS EDF SUR - PLATAFORMA DE ALIMENTADORES	vie 29/01/27	sáb 20/02/27	20 días
2978	Sí	2978	UE391	**MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR 3M**	**lun 28/09/26**	**lun 1/02/27**	**143 días**
2979	No	2979		MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR 3M E.E 8	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2980	No	2980		MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR 3M E.E 10	lun 28/09/26	jue 31/12/26	80 días
2981	No	2981	UE392	**MUROS EN TIERRA ARMADA SECTOR 3M**	**jue 1/01/27**	**sáb 13/03/27**	**21 días**
2982	No	2982		**PLATAFORMA CENTRAL**	**mar 17/12/24**	**mar 23/03/27**	**684 días**

Proyecto: L85
Fecha: lun 21/09/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

Promeo manual


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
2983	**Sí**	**2983**		**PLATAFORMA CENTRAL ARTICULADOS TRANSMILENIO 3M (LLENOS)**	**mar 17/12/24**	**mar 2/03/27**	**676 días**
2984	No	2984		Cerramiento y traslado de maquinaria interno	mar 17/12/24	jue 20/02/25	55 días
2985	No	2985		Replanteo y Descapote interno	sáb 11/01/25	jue 20/03/25	60 días
2986	No	2986	UE393A	EXCAVACIONES Y RELLENOS	jue 20/03/25	vie 27/02/26	290 días
2987	No	2987	UE393B	PILOTAJE	lun 28/09/26	vie 15/01/27	90 días
2988	No	2988	UE393C	DADOS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	vie 16/10/26	mar 2/03/27	115 días
2989	**Sí**	**2989**		**ESTRUCTURA Y CUBIERTA ARTICULADOS PLATAFORMA CENTRAL TRANSMILENIO 3M**	**jue 30/07/26**	**mié 17/03/27**	**195 días**
2990	No	2990		Replanteo y descapote	jue 30/07/26	mié 12/08/26	10 días
2991	No	2991	UE394A	ESTRUCTURA EN CONCRETO (Fuera del área de influencia del Soterrado módulo 2)	mar 2/02/27	sáb 13/03/27	36 días
2992	No	2992	UE394A	ESTRUCTURA EN CONCRETO (Dentro del área de influencia del Soterrado módulo 2)	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2993	No	2993	UE394B	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA FABRICADA (EN TALLER)	mar 3/11/26	lun 15/03/27	112 días
2994	No	2994	UE394C	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA PUESTA EN OBRA	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2995	No	2995	UE394D	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Fuera del área de influencia del Soterrado módulo 2)	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2996	No	2996	UE394D	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Dentro del área de influencia del Soterrado módulo 2)	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
2997	No	2997	UE394E	MAMPOSTERIA	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
2998	No	2998	UE394F	CUBIERTA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
2999	**No**	**2999**	**UE395**	**INSTALACIONES INTERNAS PLATAFORMA CENTRAL TRANSMILENIO 3M**	**mié 17/03/27**	**jue 18/03/27**	**1 día**
3000	No	3000	UE396A	CIELO RASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3001	No	3001	UE396B	OBRA BLANCA (PAÑETES, ENCHAPES, ESTUCO, AFINADO DE PISOS Y PINTURA, APARATOS SANITARIOS, SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA)	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
3002	No	3002	UE396C	CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS, REJILLAS DIVISIONES DE BAÑO)	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
3003	**Sí**	**3003**		**PLATAFORMA ALIMENTADORES TRANSMILENIO 3M**	**jue 20/03/25**	**mar 29/09/26**	**467 días**
3004	**Sí**	**3004**	**UE397**	**PLATAFORMA ALIMENTADORES TRANSMILENIO 3M**	**jue 20/03/25**	**vie 18/07/25**	**100 días**
3005	No	3005		Cimentación estructura plataforma	jue 20/03/25	vie 30/05/25	60 días
3006	No	3006		EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE	vie 30/05/25	mar 8/07/25	30 días
3007	No	3007		LOSA ENTREPISO.	mié 25/06/25	vie 18/07/25	20 días
3008	**Sí**	**3008**	**UE398**	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA ALIMENTADORES TRANSMILENIO 3M (INCLUYE INSTALACIONES INTERNAS, ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, TELEMATICAS)**	**lun 20/10/25**	**mié 25/02/26**	**108 días**
3009	**Sí**	**3009**		**Estructura Metálica**	**lun 20/10/25**	**sáb 3/01/26**	**62 días**
3010	No	3010		Suministro, fabricación y puesta en obra de Estructura metal	lun 20/10/25	vie 12/12/25	45 días
3011	No	3011		Montaje estructura metálica y cubierta	jue 27/11/25	sáb 3/01/26	30 días
3012	No	3012		Estructura (Columnas) y Instalaciones Internas	sáb 3/01/26	mié 25/02/26	46 días
3013	**No**	**3013**	**UE399**	**INSTALACIONES INTERNAS PLATAFORMA ALIMENTADORES TRANSMILENIO 3M**	**vie 13/02/26**	**mié 26/08/26**	**160 días**
3014	No	3014	UE400A	CIELO RASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mié 8/07/26	mié 23/09/26	65 días
3015	No	3015	UE400B	OBRA BLANCA (PAÑETES, ENCHAPES, ESTUCO, AFINADO DE PISOS Y PINTURA, APARATOS SANITARIOS Y SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA)	jue 25/06/26	jue 17/09/26	70 días
3016	No	3016	UE400C	CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS, REJILLAS DIVISIONES DE BAÑO)	jue 2/07/26	mar 29/09/26	75 días
3017	**Sí**	**3017**		**INSTALACIÓN Y TRASLADO DE REDES 3M**	**mié 1/10/25**	**mar 26/01/27**	**401 días**
3018	No	3018		Inicio Instalación y traslado de redes	mié 1/10/25	mié 1/10/25	0 días
3019	**Sí**	**3019**		**REDES SECAS**	**mié 1/10/25**	**lun 24/08/26**	**270 días**
3020	No	3020	RS-S3M	Inicio Redes Secas	mié 1/10/25	mié 1/10/25	0 días
3021	No	3021	RSGA-S:	Red Gas	vie 12/12/25	lun 24/08/26	210 días
3022	No	3022	RSEN-S:	Red ENEL	vie 12/12/25	lun 24/08/26	210 días
3023	No	3023	RSET-S:	Red ETB	vie 12/12/25	lun 24/08/26	210 días
3024	No	3024	RSM-S3I	Red de Movistar	vie 12/12/25	lun 24/08/26	210 días
3025	No	3025	RS-S3M	Fin Redes Secas	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días
3026	**Si**	**3026**		**REDES HUMEDAS**	**mié 1/10/25**	**mar 26/01/27**	**401 días**
3027	No	3027		Inicio Redes Húmedas	mié 1/10/25	mié 1/10/25	0 días
3028	No	3028	RHA-S3I	Red Acueducto	mié 1/10/25	lun 19/01/26	90 días
3029	No	3029	RHP-S3I	Red de Alcantarillado Pluvial zona sur sector 3M a descarga C	mié 1/10/25	mar 15/09/26	290 días
3030	**Si**	**3030**		**Red de Alcantarillado Pluvial norte sector 3M**	**mar 23/06/26**	**mar 26/01/27**	**180 días**
3031	No	3031	RHP-S3I	Red pluvial a descarga C3 (Desde límite de intervención norte hasta zona de descarga)	mar 23/06/26	mié 16/09/26	70 días
3032	No	3032	RHP-S3I	Red pluvial a descarga C3(Desde límite de intervención norte hasta autopista sur)	mié 16/09/26	mar 26/01/27	110 días
3033	No	3033	RHS-S3I	Red de Alcantarillado Sanitario zona sur sector 3M	mié 1/10/25	mar 15/09/26	290 días
3034	**Si**	**3034**		**Red de Alcantarillado Sanitario sector norte 3M**	**mar 23/06/26**	**mar 26/01/27**	**180 días**
3035	No	3035	RHS-S3I	Red sanitaria sector norte 3M (Desde límite de intervención norte hasta zona de descarga)	mar 23/06/26	mié 16/09/26	70 días
3036	No	3036	RHS-S3I	Red sanitaria sector norte 3M (Desde límite de intervención norte hasta autopista sur)	mié 16/09/26	mar 26/01/27	110 días
3037	No	3037		Fin de Redes Húmedas	mar 15/09/26	mar 15/09/26	0 días
3038	No	3038		Fin Instalación y traslado de redes	mié 16/09/26	mié 16/09/26	0 días
3039	**Si**	**3039**		**CONECTANTES 3M NORTE**	**vie 10/07/26**	**mar 23/03/27**	**214 días**
3040	**Si**	**3040**		**GLORIETA SECTOR NORTE ORIENTE 3M**	**lun 28/09/26**	**jue 18/03/27**	**146 días**
3041	**Si**	**3041**		**Glorieta Sector norte (Etapa 1)**	**lun 28/09/26**	**sáb 19/12/26**	**70 días**
3042	No	3042	UE401	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA GLORIETA SECTOR	lun 28/09/26	lun 26/10/26	25 días
3043	No	3043	UE402	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, GLORIETA SECTOR NORTE ORIENTE 3M	mar 27/10/26	vie 20/11/26	20 días
3044	No	3044	UE403	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA GLORIETA SECTOR NORTE 3M	vie 20/11/26	sáb 19/12/26	25 días
3045	**Si**	**3045**		**Glorieta Sector norte (Etapa 2)**	**lun 15/03/27**	**jue 18/03/27**	**3 días**
3046	No	3046	UE401	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA GLORIETA SECTOR	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
3047	No	3047	UE402	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, GLORIETA SECTOR NORTE ORIENTE 3M	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
3048	No	3048	UE403	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA GLORIETA SECTOR NORTE 3M	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
3049	**Si**	**3049**		**VIAS SECTOR NORTE 3M**	**vie 10/07/26**	**mar 23/03/27**	**214 días**
3050	**Si**	**3050**		**ZONA NORTE (Etapa 1)**	**vie 10/07/26**	**vie 20/11/26**	**110 días**
3051	No	3051	UE404	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR NORTE	vie 10/07/26	jue 10/09/26	50 días
3052	No	3052	UE405	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR NORTE 3M	lun 31/08/26	jue 15/10/26	40 días
3053	No	3053	UE406	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR NORTE 3M	vie 2/10/26	vie 20/11/26	40 días
3054	**Si**	**3054**		**ZONA NORTE (Etapa 2)**	**sáb 13/03/27**	**mié 17/03/27**	**3 días**
3055	No	3055	UE404	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR NORTE	sáb 13/03/27	lun 15/03/27	1 día
3056	No	3056	UE405	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR NORTE 3M	lun 15/03/27	mar 16/03/27	1 día
3057	No	3057	UE406	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR NORTE 3M	mar 16/03/27	mié 17/03/27	1 día
3058	**Si**	**3058**		**ZONA SUR (Etapa 1 Eje 6)**	**mié 7/10/26**	**mié 6/01/27**	**75 días**
3059	No	3059	UE404	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR NORTE	mié 7/10/26	mié 25/11/26	40 días
3060	No	3060	UE405	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR NORTE 3M	jue 12/11/26	sáb 12/12/26	25 días
3061	No	3061	UE406	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR NORTE 3M	mar 1/12/26	mié 6/01/27	30 días
3062	**Si**	**3062**		**ZONA SUR (Etapa 2 Eje 7)**	**mié 6/01/27**	**sáb 13/03/27**	**58 días**
3063	No	3063	UE404	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR NORTE	mié 6/01/27	lun 22/02/27	40 días
3064	No	3064	UE405	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR NORTE 3M	mié 10/02/27	mié 10/03/27	25 días
3065	No	3065	UE406	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR NORTE 3M	sáb 27/02/27	sáb 13/03/27	13 días
3066	**Si**	**3066**		**ZONA SUR (Etapa 3 Eje 8)**	**mié 17/03/27**	**sáb 20/03/27**	**3 días**
3067	No	3067	UE404	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR NORTE	mié 17/03/27	jue 18/03/27	1 día
3068	No	3068	UE405	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR NORTE 3M	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
3069	No	3069	UE406	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR NORTE 3M	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3070	**Si**	**3070**		**ZONA SUR (Etapa 4 Eje 9)**	**jue 18/03/27**	**mar 23/03/27**	**3 días**
3071	No	3071	UE404	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR NORTE	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
3072	No	3072	UE405	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M. RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR NORTE 3M	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3073	No	3073	UE406	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR NORTE 3M	sáb 20/03/27	mar 23/03/27	1 día
3074	**Si**	**3074**		**CONECTANTES 3M SUR**	**mié 19/08/26**	**jue 4/02/27**	**144 días**
3075	No	3075		Entrega de predios por parte de la EFR	mié 19/08/26	mié 19/08/26	0 días
3076	No	3076		Cerramiento y traslado de maquinaria	mié 19/08/26	sáb 29/08/26	10 días
3077	No	3077		REPLANTEO	lun 31/08/26	mié 9/09/26	8 días
3078	No	3078		DEMOLICION DE CIMENTACIONES	lun 31/08/26	vie 11/09/26	10 días
3079	**Si**	**3079**		**VIAS SECTOR SUR 3M**	**vie 11/09/26**	**lun 28/12/26**	**90 días**

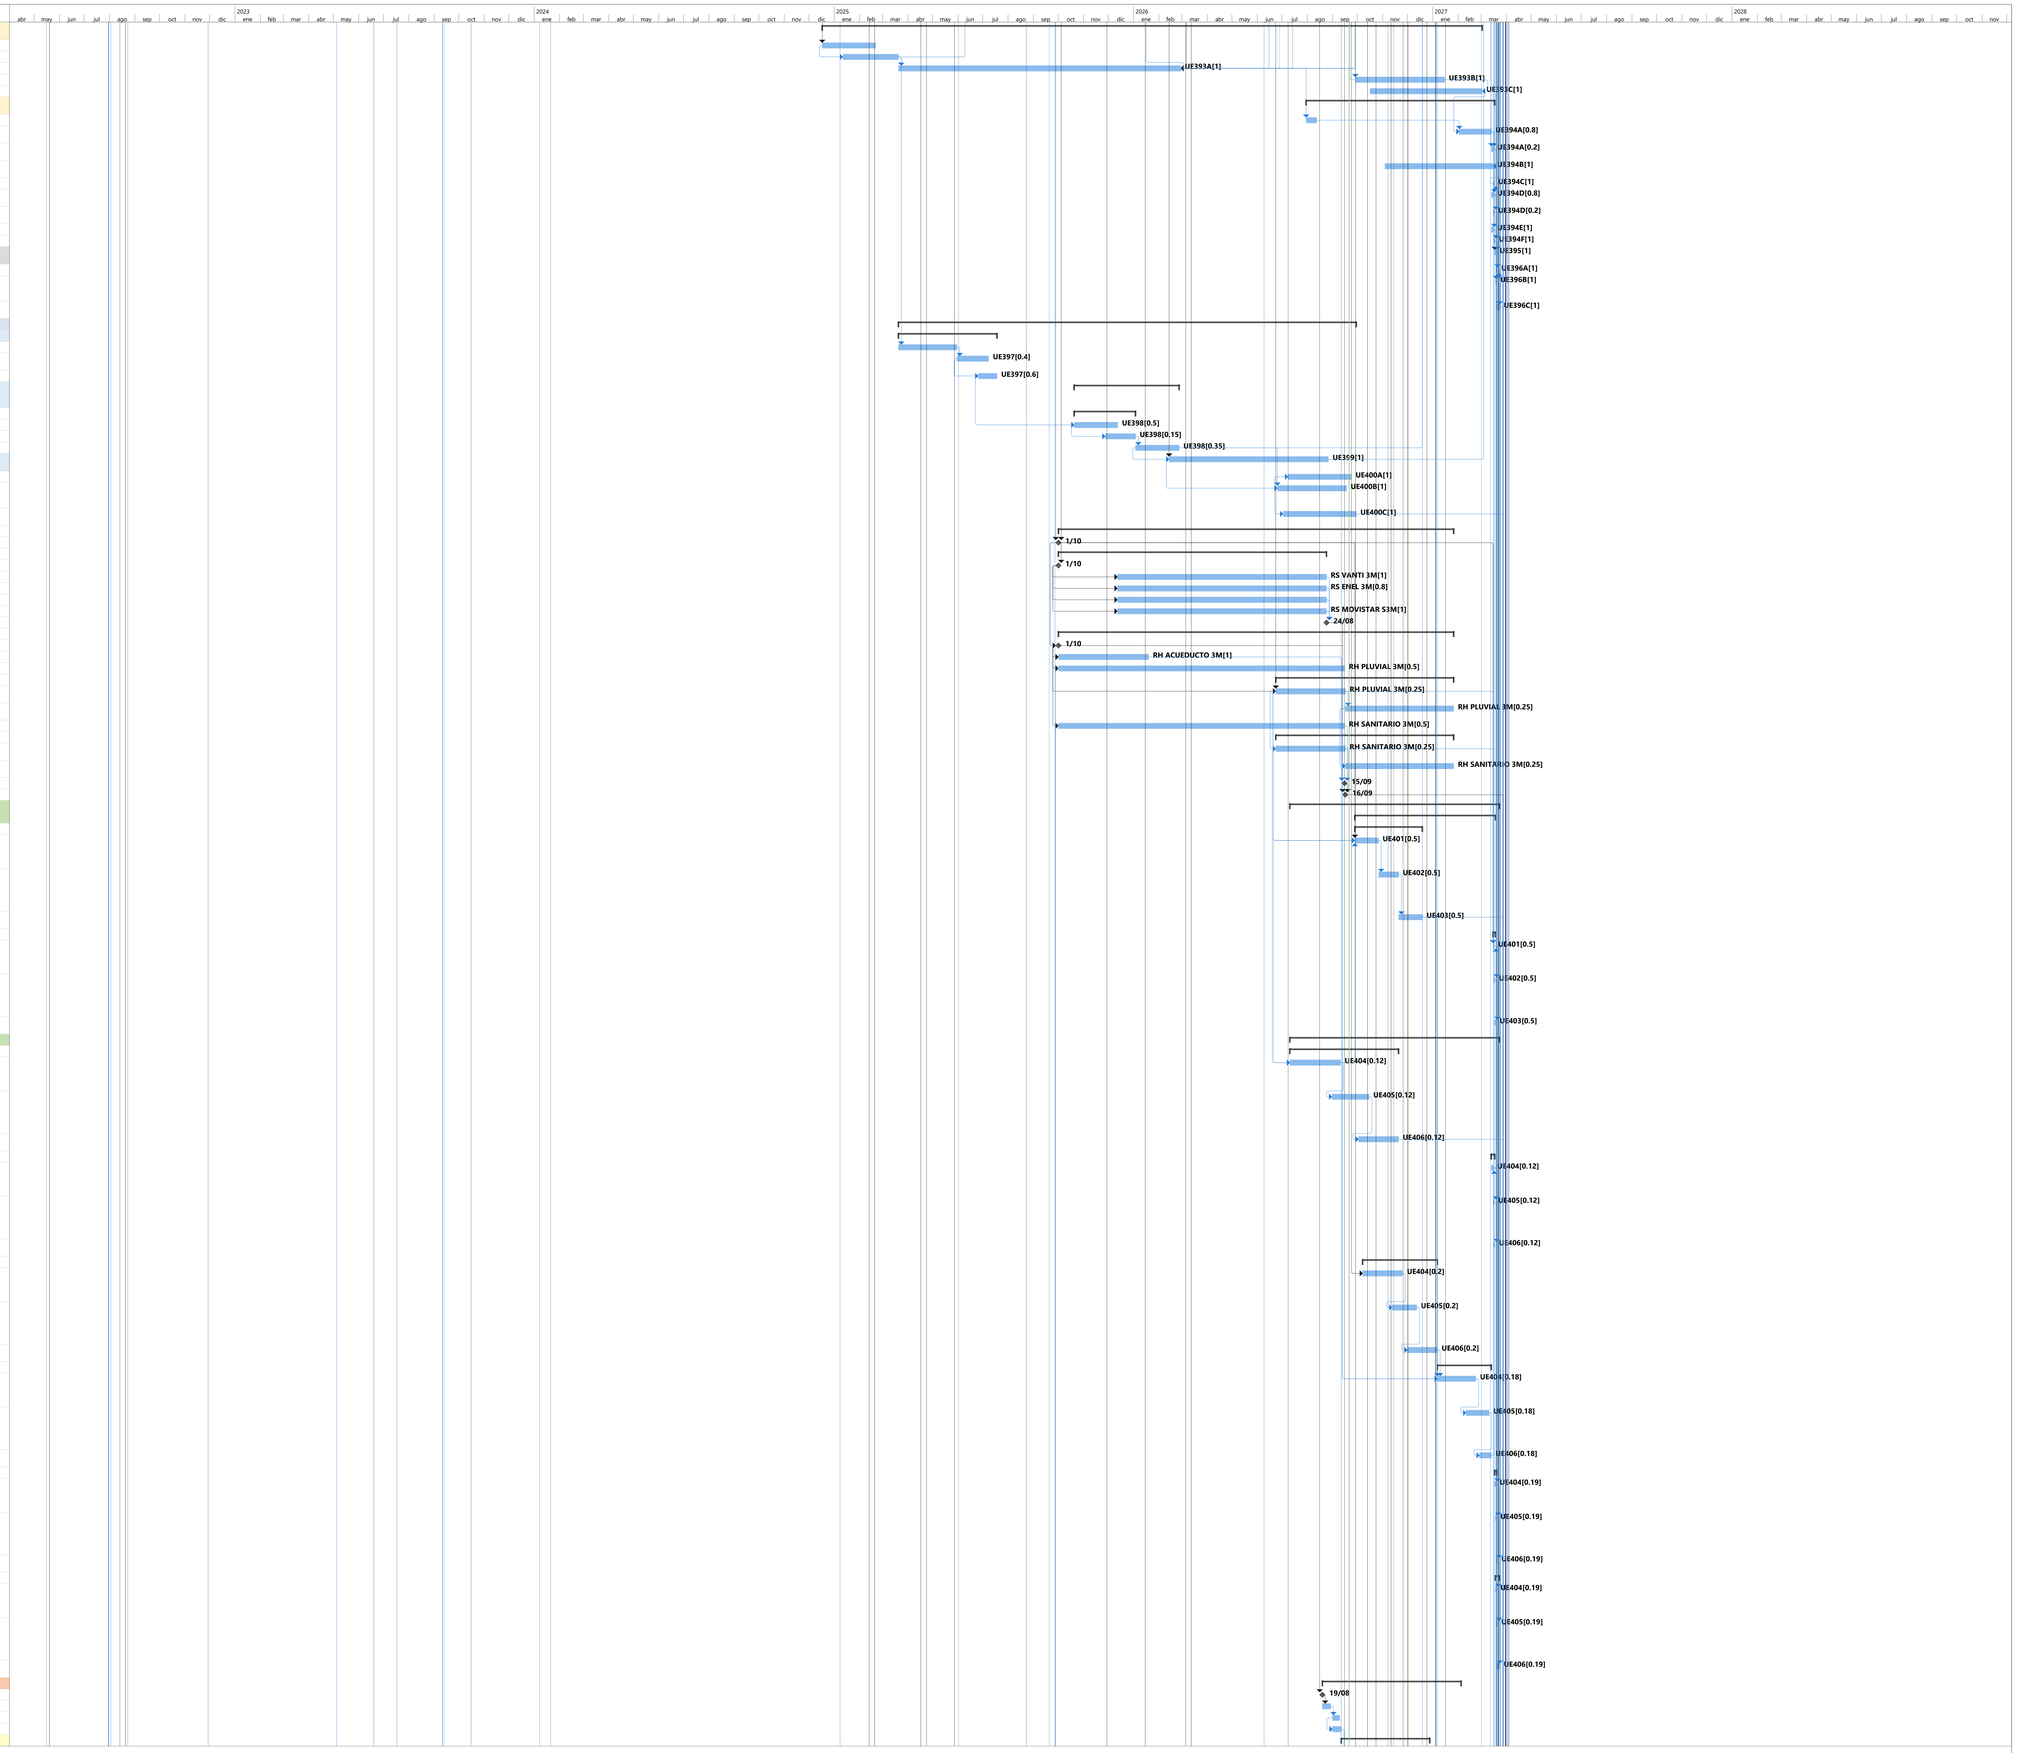

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
3080	No	3080	UE413	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA VIAS SECTOR SUR 3M	vie 11/09/26	vie 16/10/26	30 días
3081	No	3081	UE414	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, VIAS SECTOR SUR 3M	vie 16/10/26	lun 9/11/26	20 días
3082	No	3082	UE415	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA VIAS SECTOR SUR 3M	lun 9/11/26	lun 28/12/26	40 días
3083	No	3083		FIN VIAS SECTOR SUR 3M	lun 28/12/26	lun 28/12/26	0 días
3084	**Sí**	**3084**		**GLORIETA 2 SECTOR SUR 3M**	**vie 16/10/26**	**mar 2/02/27**	**90 días**
3085	No	3085	UE410	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA GLORIETA 2 SECTOR SUR 3M	vie 16/10/26	vie 20/11/26	30 días
3086	No	3086	UE411	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, GLORIETA 2 SECTOR SUR 3M	sáb 21/11/26	mar 15/12/26	20 días
3087	No	3087	UE412	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA GLORIETA 2 SECTOR SUR 3M	mar 15/12/26	mar 2/02/27	40 días
3088	No	3088		FIN GLORIETA 2	mar 2/02/27	mar 2/02/27	0 días
3089	**Sí**	**3089**		**GLORIETA 1 SECTOR SUR 3M**	**mar 20/10/26**	**jue 4/02/27**	**90 días**
3090	No	3090	UE407	EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, COMO MINIMO DEBE CUMPLIR K APOYO>30 MPA RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, ANCHO VARIABLE PARA GLORIETA 1 SECTOR SUR OCCIDENTE	mar 20/10/26	mié 25/11/26	30 días
3091	No	3091	UE408	MEZCLA DENSA CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN INVIAS INV450 PARA CALZADA ANCHO VARIABLE, DEBE GARANTIZARSE A ESTE NIVEL K APOYO>90 MPA/M, RESPETANDO COTA GEOMETRICA SUPERIOR DE DISEÑO, GLORIETA 1 SECTOR SUR 3M	mié 25/11/26	vie 18/12/26	20 días
3092	No	3092	UE409	PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA CALZADA GLORIETA 1 SECTOR SUR 3M	vie 18/12/26	jue 4/02/27	40 días
3093	**Sí**	**3093**		**CONSTRUCCION EDIFICIO 3M**	**lun 17/07/23**	**jue 7/01/27**	**1067 días**
3094	**Sí**	**3094**		**EDIFICIO SUR 3M**	**lun 17/07/23**	**jue 7/01/27**	**1067 días**
3095	No	3095		PRELIMINARES	lun 17/07/23	vie 28/07/23	10 días
3096	No	3096	UE417	CIMENTACIÓN	vie 28/07/23	mar 5/12/23	110 días
3097	No	3097	UE418	ESTRUCTURAS	mié 20/11/24	jue 8/01/26	350 días
3098	No	3098	UE419A	CUBIERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar 1/12/26	jue 7/01/27	30 días
3099	No	3099	UE419C	MAMPOSTERÍA PARA MUROS DIVISORIOS Y MUROS FACHADA EDIFICIO SUR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 23/01/26	mié 27/05/26	85 días
3100	No	3100	UE419E	REDES HUMEDAS EDIFICIO SUR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 8/05/26	mié 30/09/26	120 días
3101	No	3101	UE419G	REDES SECAS INCLUYE ILUMINACIÓN EDIFICIO SUR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 8/05/26	mié 30/09/26	120 días
3102	No	3102	UE419H	FACHADA EN LAMINA MICROPERFORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar 13/10/26	mié 18/11/26	30 días
3103	No	3103	UE419J	CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS, REJILLAS DIVISIONES DE BAÑO) EDIFICIO SUR	mar 22/09/26	jue 7/01/27	90 días
3104	No	3104	UE419L	ET.1 PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPE DE PARED Y PISO INCLUIDOS ZÓCALOS, SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA EDIFICIO SUR (SUMINISTRO E	vie 8/05/26	mié 30/09/26	120 días
3105	No	3105	UE419L	ET.2 PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPE DE PARED Y PISO INCLUIDOS ZÓCALOS, SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA EDIFICIO SUR (SUMINISTRO E	jue 29/10/26	mié 30/12/26	50 días
3106	**Sí**	**3106**		**EDIFICIO NORTE 3M**	**jue 14/09/23**	**jue 7/01/27**	**1017 días**
3107	No	3107		PRELIMINARES	jue 14/09/23	mar 26/09/23	10 días
3108	No	3108	UE417	CIMENTACIÓN	jue 19/10/23	vie 3/05/24	165 días
3109	No	3109	UE418	ESTRUCTURAS	mar 24/12/24	jue 8/01/26	320 días
3110	No	3110	UE419A	CUBIERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar 1/12/26	jue 7/01/27	30 días
3111	No	3111	UE419B	MAMPOSTERÍA PARA MUROS DIVISORIOS Y MUROS FACHADA EDIFICIO NORTE (SUMINISTRO E	vie 23/01/26	mié 27/05/26	105 días
3112	No	3112	UE419D	REDES HUMEDAS EDIFICIO NORTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 8/05/26	mié 30/09/26	120 días
3113	No	3113	UE419F	REDES SECAS INCLUYE ILUMINACIÓN EDIFICIO NORTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	vie 8/05/26	mié 30/09/26	120 días
3114	No	3114	UE419H	FACHADA EN LAMINA MICROPERFORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar 13/10/26	mié 18/11/26	30 días
3115	No	3115	UE419I	CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS, REJILLAS DIVISIONES DE BAÑO) EDIFICIO NORTE	lun 28/09/26	jue 7/01/27	85 días
3116	No	3116	UE419K	ET. 1 PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPE DE PARED Y PISO INCLUIDOS ZÓCALOS, SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA EDIFICIO NORTE (SUMINISTRO E	vie 8/05/26	mié 30/09/26	120 días
3117	No	3117	UE419K	ET.2 PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPE DE PARED Y PISO INCLUIDOS ZÓCALOS, SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA EDIFICIO NORTE (SUMINISTRO E	jue 29/10/26	mié 30/12/26	50 días
3118	**Sí**	**3118**		**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**jue 18/03/27**	**mié 31/03/27**	**8 días**
3119	No	3119	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 1 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3120	No	3120	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 1 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3121	No	3121	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 2 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3122	No	3122	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 2 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3123	No	3123	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 3 (BRT)	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
3124	No	3124	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 3 (MIXTO)	jue 18/03/27	vie 19/03/27	1 día
3125	No	3125	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 4 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3126	No	3126	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 4 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3127	No	3127	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 5 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3128	No	3128	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 5 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3129	No	3129	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 6 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3130	No	3130	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 6 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3131	No	3131	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 7 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3132	No	3132	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 7 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3133	No	3133	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 8 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3134	No	3134	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 8 (MIXTO)	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
3135	No	3135	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 9 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3136	No	3136	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 9 (MIXTO)	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
3137	No	3137	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 10 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3138	No	3138	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 10 (MIXTO)	mar 30/03/27	mié 31/03/27	1 día
3139	No	3139	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 11 (BRT)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3140	No	3140	UE416	SEÑALIZACIÓN SECTOR 11 (MIXTO)	vie 19/03/27	sáb 20/03/27	1 día
3141	**Sí**	**3141**		**MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO**	**vie 18/09/26**	**sáb 27/03/27**	**158 días**
3142	No	3142		Inicio de Mobiliario Urbanístico y Paisajístico	vie 18/09/26	vie 18/09/26	0 días
3143	No	3143	UE307	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Bogotá - Girardot (K0+000-K1+000)	mié 2/12/26	lun 15/03/27	87 días
3144	No	3144	UE308	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Bogotá - Girardot(k1+000-k2+000)	sáb 27/02/27	mar 23/03/27	20 días
3145	No	3145	UE309	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Bogotá - Girardot(K2+000-K3+000)	lun 28/12/26	sáb 13/03/27	66 días
3146	No	3146	UE310	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Bogotá - Girardot(K3+000-k3+660)	sáb 23/01/27	sáb 13/03/27	44 días
3147	No	3147	UE353	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Girardot - Bogotá (K0+000-K1+000)	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
3148	No	3148	UE354	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Girardot - Bogotá (K1+000-K2+000)	mié 24/03/27	sáb 27/03/27	1 día
3149	No	3149	UE355	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Girardot - Bogotá (K2+000-K3+000)	vie 26/02/27	mié 24/03/27	22 días
3150	No	3150	UE356	MOBILIARIO URBANISTICO Y PAISAJISTICO POR KM Girardot - Bogotá (K3+000-K3+660)	mié 10/02/27	mié 17/03/27	31 días
3151	No	3151		Fin de Mobiliario Urbanístico y Paisajístico	sáb 27/03/27	sáb 27/03/27	0 días
3152	**Sí**	**3152**		**INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO**	**sáb 14/11/26**	**sáb 13/03/27**	**101 días**
3153	No	3153		Inicio de instalación de alumbrado publico	sáb 14/11/26	sáb 14/11/26	0 días
3154	No	3154		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ÁREA DEL SISTEMA TRANSMILEN	lun 4/01/27	sáb 13/03/27	61 días
3155	No	3155	RS-APG	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Bogotá - Girardot (K0+000-K1+000)	sáb 14/11/26	sáb 13/03/27	101 días
3156	No	3156	RS-APG	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Bogotá - Girardot(k1+000-k2+000)	lun 21/12/26	sáb 13/03/27	71 días
3157	No	3157	RS-APG	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Bogotá - Girardot(K2+000-K3+000)	jue 26/11/26	sáb 13/03/27	91 días
3158	No	3158	RS-APG	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Bogotá - Girardot(K3+000-k3+660)	mié 25/11/26	mar 16/02/27	70 días
3159	No	3159	RS-APB	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Girardot - Bogotá (K0+000-K1+000)	sáb 21/11/26	mié 24/02/27	80 días
3160	No	3160	RS-APB	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Girardot - Bogotá (K1+000-K2+000)	sáb 21/11/26	mié 24/02/27	80 días
3161	No	3161	RS-APB	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Girardot - Bogotá (K2+000-K3+000)	sáb 14/11/26	sáb 13/03/27	101 días
3162	No	3162	RS-APB	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR KM Girardot - Bogotá (K3+000-K3+660)	sáb 21/11/26	sáb 13/03/27	96 días
3163	No	3163		Fin de Mobiliario Urbanístico y Paisajístico	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27	0 días
3164	**Sí**	**3164**		**COMPONENTES Y PROGRAMAS PMA, SST, PGS Y PMT**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.88 días**
3165	**Sí**	**3165**		**Elaboración, trámite, aprobación e implementación PIPMA**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.88 días**
3166	No	3166		Elaboración y Entrega PIPMA	lun 16/05/22	vie 15/07/22	50 días
3167	No	3167		Aprobación del PIPMA - INTERVENTORIA	vie 15/07/22	vie 22/07/22	5 días
3168	No	3168		Aprobación del PIPMA - EFR	vie 22/07/22	mié 3/08/22	11 días
3169	**Sí**	**3169**		**Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.5 días**
3170	No	3170	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 1	lun 16/05/22	jue 30/06/22	38 días
3171	No	3171	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 2	vie 1/07/22	sáb 30/07/22	24 días
3172	No	3172	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 3	mié 3/08/22	sáb 3/09/22	27 días
3173	No	3173	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 4	lun 5/09/22	mar 4/10/22	27 días
3174	No	3174	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 5	mar 4/10/22	mié 2/11/22	25 días
3175	No	3175	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 6	mié 2/11/22	vie 2/12/22	25 días
3176	No	3176	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 7	vie 2/12/22	mar 3/01/23	26 días
3177	No	3177	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 8	mar 3/01/23	mié 1/02/23	26 días
3178	No	3178	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 9	jue 2/02/23	mié 1/03/23	25 días
3179	No	3179	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 10	jue 2/03/23	lun 3/04/23	27 días
3180	No	3180	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 11	lun 3/04/23	mar 2/05/23	23 días
3181	No	3181	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 12	mar 2/05/23	jue 1/06/23	26 días
3182	No	3182	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 13	jue 1/06/23	sáb 1/07/23	25 días
3183	No	3183	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 14	sáb 1/07/23	sáb 29/07/23	23 días
3184	No	3184	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 15	mar 1/08/23	jue 31/08/23	26 días
3185	No	3185	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 16	vie 1/09/23	sáb 30/09/23	26 días
3186	No	3186	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 17	lun 2/10/23	mar 31/10/23	26 días
3187	No	3187	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 18	mié 1/11/23	jue 30/11/23	25 días

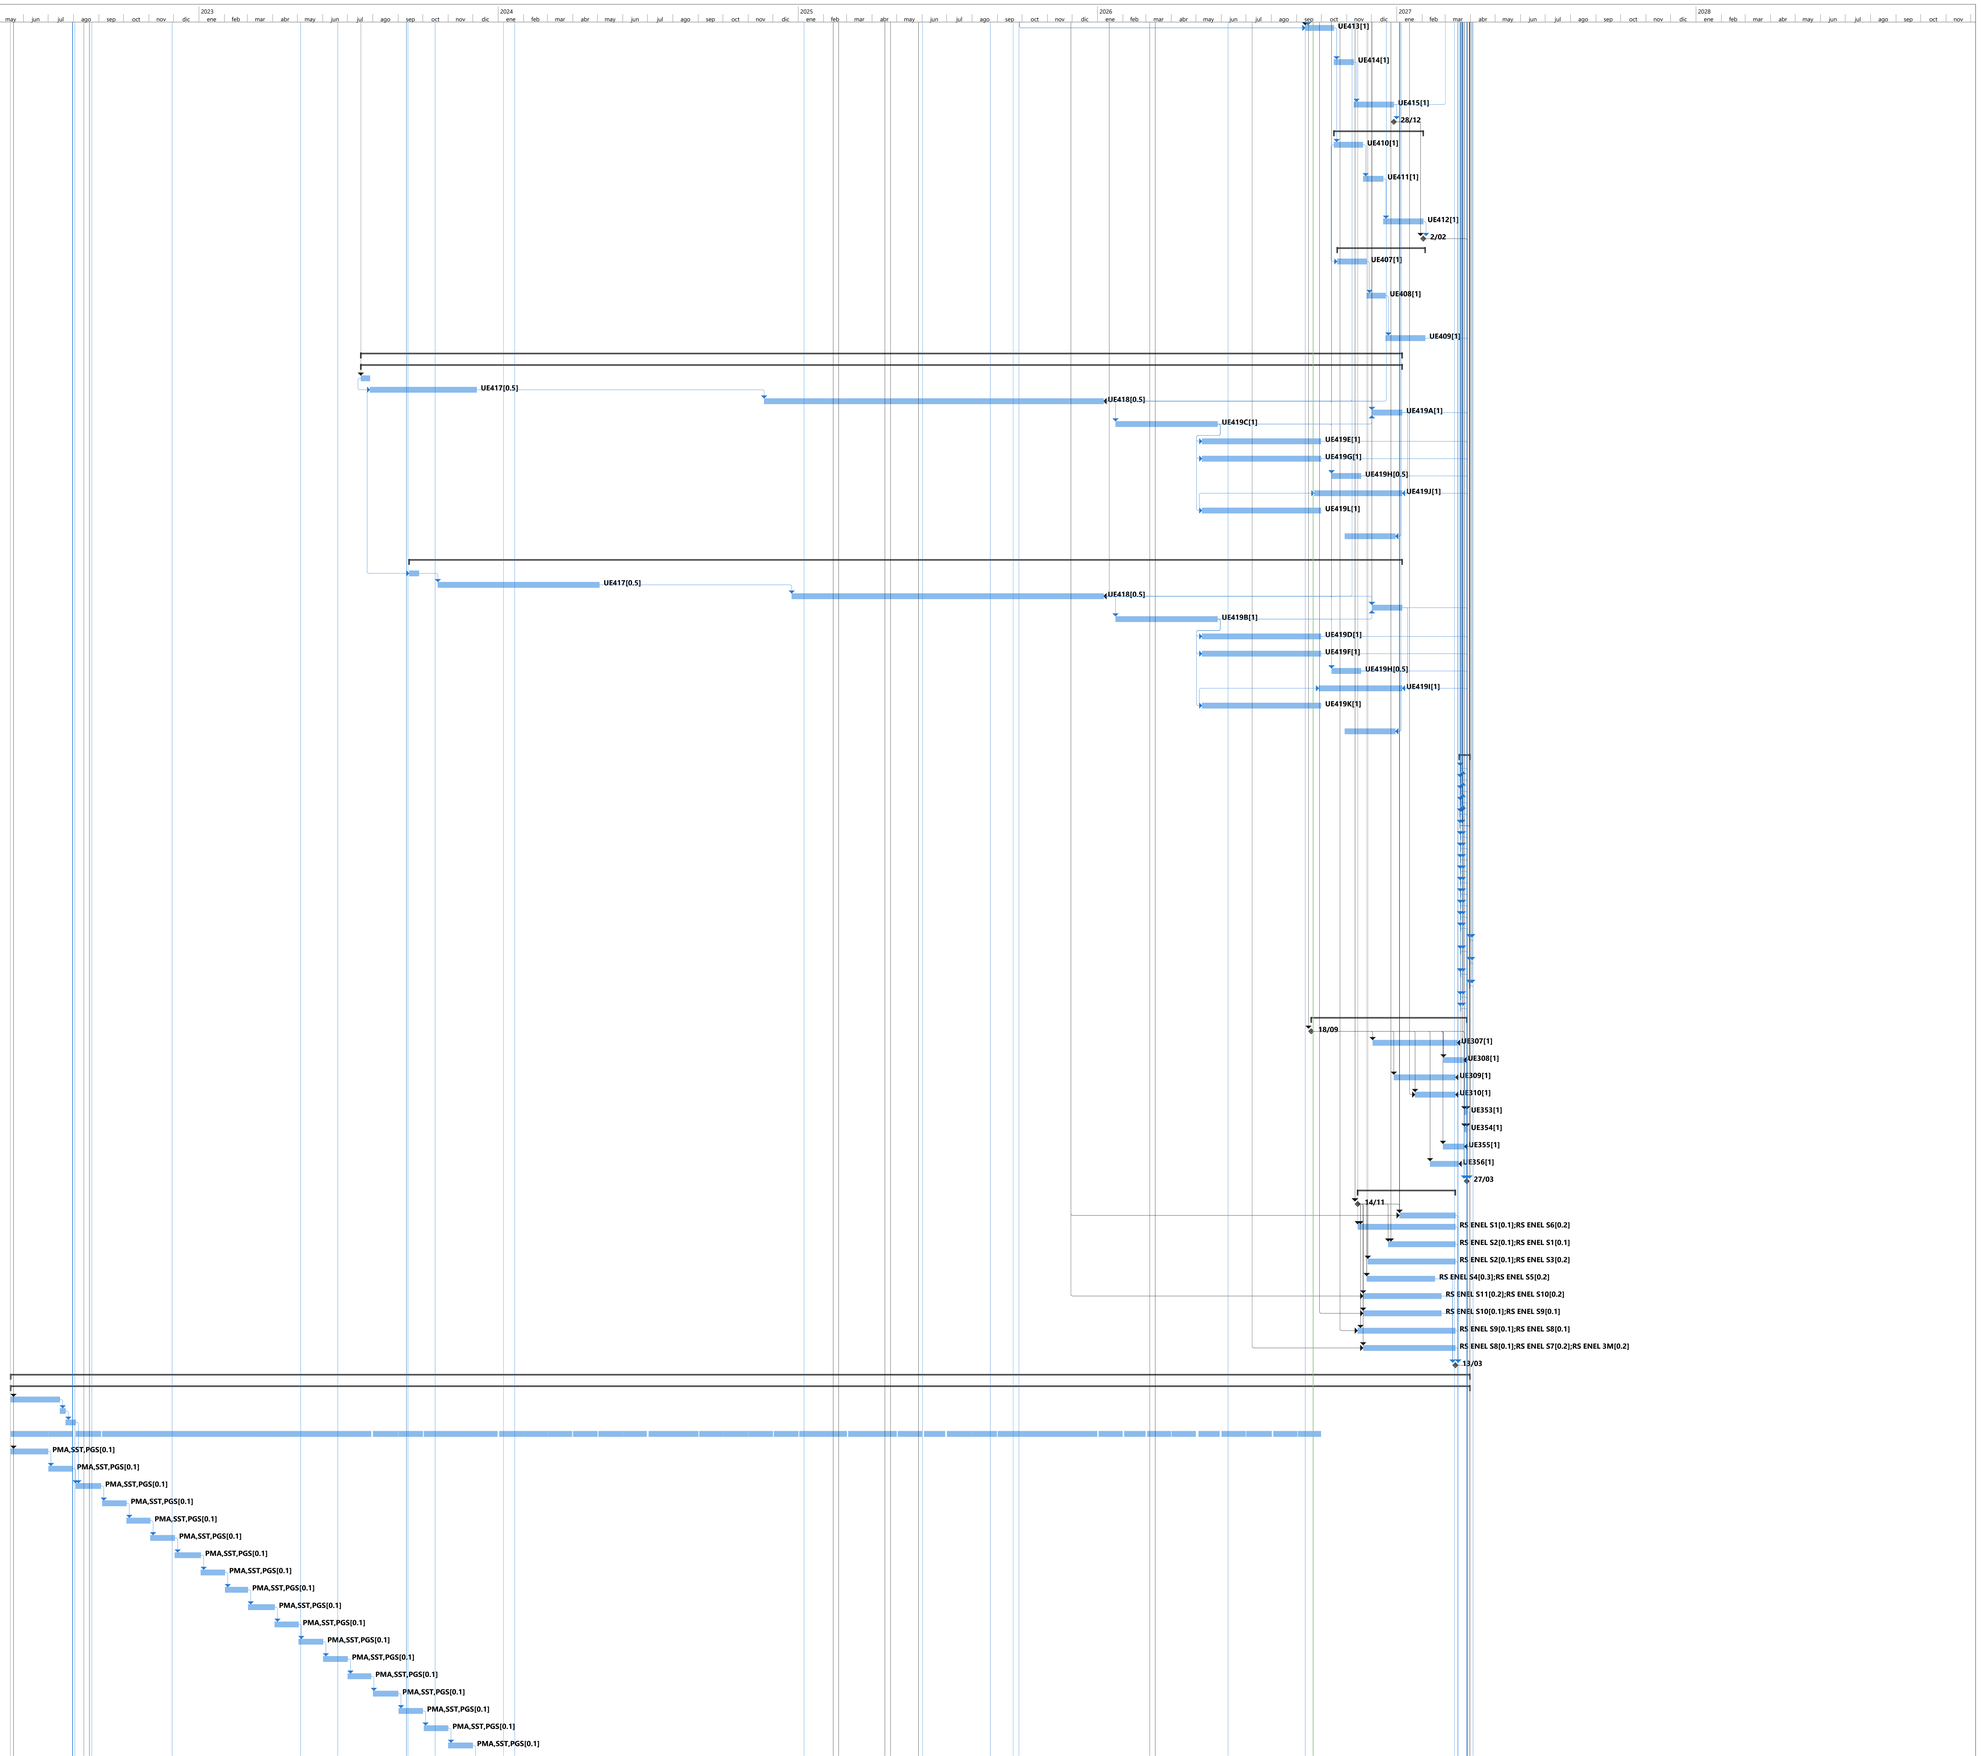


Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
3188	No	3188	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 19	vie 1/12/23	sáb 30/12/23	24 días
3189	No	3189	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 20	mar 2/01/24	mié 31/01/24	26 días
3190	No	3190	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 21	jue 1/02/24	jue 29/02/24	26 días
3191	No	3191	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 22	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	23 días
3192	No	3192	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 23	lun 1/04/24	mar 30/04/24	27 días
3193	No	3193	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 24	jue 2/05/24	vie 31/05/24	26 días
3194	No	3194	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 25	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	23 días
3195	No	3195	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 26	mar 2/07/24	mié 31/07/24	26 días
3196	No	3196	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 27	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	25 días
3197	No	3197	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 28	lun 2/09/24	lun 30/09/24	26 días
3198	No	3198	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 29	mar 1/10/24	jue 31/10/24	27 días
3199	No	3199	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 30	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	24 días
3200	No	3200	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 31	lun 2/12/24	mar 31/12/24	26 días
3201	No	3201	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 32	jue 2/01/25	vie 31/01/25	26 días
3202	No	3202	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 33	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	25 días
3203	No	3203	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 34	lun 3/03/25	lun 31/03/25	25 días
3204	No	3204	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 35	mar 1/04/25	mié 30/04/25	25 días
3205	No	3205	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 36	vie 2/05/25	sáb 31/05/25	26 días
3206	No	3206	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 37	mar 3/06/25	sáb 28/06/25	22 días
3207	No	3207	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 38	mar 1/07/25	jue 31/07/25	28 días
3208	No	3208	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 39	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	24 días
3209	No	3209	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 40	lun 1/09/25	mar 30/09/25	27 días
3210	No	3210	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 41	mié 1/10/25	vie 31/10/25	27 días
3211	No	3211	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 42	sáb 1/11/25	mar 2/12/25	25 días
3212	No	3212	PMA-SS	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 43	mar 2/12/25	mié 31/12/25	24 días
3213	No	3213	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 44	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	25 días
3214	No	3214	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 45	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	24 días
3215	No	3215	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 46	lun 2/03/26	mar 31/03/26	25 días
3216	No	3216	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 47	mié 1/04/26	jue 30/04/26	24 días
3217	No	3217	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 48	lun 4/05/26	vie 29/05/26	23 días
3218	No	3218	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 49	lun 1/06/26	mar 30/06/26	23 días
3219	No	3219	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 50	mié 1/07/26	sáb 1/08/26	26 días
3220	No	3220	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 51	lun 3/08/26	mar 1/09/26	24 días
3221	No	3221	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 52	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días
3222	No	3222	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 53	jue 1/10/26	sáb 31/10/26	26 días
3223	No	3223	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 54	mar 3/11/26	lun 30/11/26	23 días
3224	No	3224	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 55	mar 1/12/26	jue 31/12/26	25 días
3225	No	3225	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 56	lun 4/01/27	lun 1/02/27	24 días
3226	No	3226	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 57	mar 2/02/27	lun 1/03/27	24 días
3227	No	3227	PMA-SS ET2	Implementación Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 58	mar 2/03/27	mié 31/03/27	23 días
3228	Sí	3228		**Implementación Plan de Gestión Social en Obra**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.5 días**
3229	No	3229	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 1	lun 16/05/22	jue 30/06/22	38 días
3230	No	3230	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 2	vie 1/07/22	sáb 30/07/22	24 días
3231	No	3231	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 3	lun 1/08/22	mié 31/08/22	27 días
3232	No	3232	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 4	jue 1/09/22	vie 30/09/22	27 días
3233	No	3233	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 5	lun 3/10/22	lun 31/10/22	25 días
3234	No	3234	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 6	mar 1/11/22	mié 30/11/22	25 días
3235	No	3235	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 7	jue 1/12/22	sáb 31/12/22	26 días
3236	No	3236	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 8	lun 2/01/23	mar 31/01/23	26 días
3237	No	3237	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 9	mié 1/02/23	mar 28/02/23	25 días
3238	No	3238	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 10	mié 1/03/23	vie 31/03/23	27 días
3239	No	3239	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 11	sáb 1/04/23	sáb 29/04/23	23 días
3240	No	3240	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 12	mar 2/05/23	mié 31/05/23	26 días
3241	No	3241	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 13	jue 1/06/23	vie 30/06/23	25 días
3242	No	3242	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 14	sáb 1/07/23	sáb 29/07/23	23 días
3243	No	3243	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 15	mar 1/08/23	jue 31/08/23	26 días
3244	No	3244	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 16	vie 1/09/23	sáb 30/09/23	26 días
3245	No	3245	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 17	lun 2/10/23	mar 31/10/23	26 días
3246	No	3246	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 18	mié 1/11/23	jue 30/11/23	25 días
3247	No	3247	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 19	vie 1/12/23	sáb 30/12/23	24 días
3248	No	3248	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 20	mar 2/01/24	mié 31/01/24	26 días
3249	No	3249	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 21	jue 1/02/24	jue 29/02/24	26 días
3250	No	3250	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 22	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	23 días
3251	No	3251	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 23	lun 1/04/24	mar 30/04/24	27 días
3252	No	3252	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 24	jue 2/05/24	vie 31/05/24	26 días
3253	No	3253	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 25	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	23 días
3254	No	3254	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 26	mar 2/07/24	mié 31/07/24	26 días
3255	No	3255	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 27	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	25 días
3256	No	3256	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 28	lun 2/09/24	lun 30/09/24	26 días
3257	No	3257	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 29	mar 1/10/24	jue 31/10/24	27 días
3258	No	3258	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 30	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	24 días
3259	No	3259	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 31	lun 2/12/24	mar 31/12/24	26 días
3260	No	3260	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 32	jue 2/01/25	vie 31/01/25	26 días
3261	No	3261	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 33	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	25 días
3262	No	3262	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 34	lun 3/03/25	lun 31/03/25	25 días
3263	No	3263	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 35	mar 1/04/25	mié 30/04/25	25 días
3264	No	3264	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 36	vie 2/05/25	sáb 31/05/25	26 días
3265	No	3265	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 37	mar 3/06/25	sáb 28/06/25	22 días
3266	No	3266	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 38	mar 1/07/25	jue 31/07/25	28 días
3267	No	3267	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 39	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	24 días
3268	No	3268	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 40	lun 1/09/25	mar 30/09/25	27 días
3269	No	3269	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 41	mié 1/10/25	vie 31/10/25	27 días
3270	No	3270	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 42	sáb 1/11/25	mar 2/12/25	25 días
3271	No	3271	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 43	mar 2/12/25	mié 31/12/25	24 días
3272	No	3272	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 44	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	25 días
3273	No	3273	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 45	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	24 días
3274	No	3274	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 46	lun 2/03/26	mar 31/03/26	25 días
3275	No	3275	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 47	mié 1/04/26	jue 30/04/26	24 días
3276	No	3276	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 48	lun 4/05/26	vie 29/05/26	23 días
3277	No	3277	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 49	lun 1/06/26	mar 30/06/26	23 días
3278	No	3278	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 50	mié 1/07/26	sáb 1/08/26	26 días
3279	No	3279	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 51	lun 3/08/26	mar 1/09/26	24 días
3280	No	3280	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 52	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días
3281	No	3281	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 53	jue 1/10/26	sáb 31/10/26	26 días
3282	No	3282	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 54	mar 3/11/26	lun 30/11/26	23 días
3283	No	3283	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 55	mar 1/12/26	jue 31/12/26	25 días
3284	No	3284	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 56	lun 4/01/27	lun 1/02/27	24 días
3285	No	3285	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 57	mar 2/02/27	lun 1/03/27	24 días
3286	No	3286	PMA-SS	Implementación Plan de Gestión Social en Obra 58	mar 2/03/27	mié 31/03/27	23 días
3287	Sí	3287		**Implementación plan Manejo de Componente Biótico**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.5 días**
3288	No	3288	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 1	lun 16/05/22	jue 30/06/22	38 días
3289	No	3289	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 2	vie 1/07/22	sáb 30/07/22	24 días
3290	No	3290	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 3	lun 1/08/22	mié 31/08/22	27 días
3291	No	3291	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 4	jue 1/09/22	vie 30/09/22	27 días
3292	No	3292	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 5	lun 3/10/22	lun 31/10/22	25 días
3293	No	3293	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 6	mar 1/11/22	mié 30/11/22	25 días
3294	No	3294	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 7	jue 1/12/22	sáb 31/12/22	26 días
3295	No	3295	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 8	lun 2/01/23	mar 31/01/23	26 días
3296	No	3296	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 9	mié 1/02/23	mar 28/02/23	25 días
3297	No	3297	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 10	mié 1/03/23	vie 31/03/23	27 días
3298	No	3298	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 11	sáb 1/04/23	sáb 29/04/23	23 días
3299	No	3299	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 12	mar 2/05/23	mié 31/05/23	26 días
3300	No	3300	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 13	jue 1/06/23	vie 30/06/23	25 días
3301	No	3301	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 14	sáb 1/07/23	sáb 29/07/23	23 días
3302	No	3302	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 15	mar 1/08/23	jue 31/08/23	26 días
3303	No	3303	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 16	vie 1/09/23	sáb 30/09/23	26 días
3304	No	3304	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 17	lun 2/10/23	mar 31/10/23	26 días
3305	No	3305	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 18	mié 1/11/23	jue 30/11/23	25 días
3306	No	3306	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 19	vie 1/12/23	sáb 30/12/23	24 días
3307	No	3307	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 20	mar 2/01/24	mié 31/01/24	26 días
3308	No	3308	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 21	jue 1/02/24	jue 29/02/24	26 días
3309	No	3309	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 22	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	23 días
3310	No	3310	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 23	lun 1/04/24	mar 30/04/24	27 días
3311	No	3311	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 24	jue 2/05/24	vie 31/05/24	26 días
3312	No	3312	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 25	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	23 días
3313	No	3313	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 26	mar 2/07/24	mié 31/07/24	26 días
3314	No	3314	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 27	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	25 días
3315	No	3315	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 28	lun 2/09/24	lun 30/09/24	26 días
3316	No	3316	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 29	mar 1/10/24	jue 31/10/24	27 días
3317	No	3317	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 30	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	24 días
3318	No	3318	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 31	lun 2/12/24	mar 31/12/24	26 días
3319	No	3319	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 32	jue 2/01/25	vie 31/01/25	26 días


Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
3320	No	3320	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 33	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	25 días
3321	No	3321	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 34	lun 3/03/25	lun 31/03/25	25 días
3322	No	3322	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 35	mar 1/04/25	mié 30/04/25	25 días
3323	No	3323	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 36	vie 2/05/25	sáb 31/05/25	26 días
3324	No	3324	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 37	mar 3/06/25	sáb 28/06/25	22 días
3325	No	3325	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 38	mar 1/07/25	jue 31/07/25	28 días
3326	No	3326	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 39	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	24 días
3327	No	3327	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 40	lun 1/09/25	mar 30/09/25	27 días
3328	No	3328	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 41	mié 1/10/25	vie 31/10/25	27 días
3329	No	3329	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 42	sáb 1/11/25	mar 2/12/25	25 días
3330	No	3330	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 43	mar 2/12/25	mié 31/12/25	24 días
3331	No	3331	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 44	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	25 días
3332	No	3332	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 45	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	24 días
3333	No	3333	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 46	lun 2/03/26	mar 31/03/26	25 días
3334	No	3334	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 47	mié 1/04/26	jue 30/04/26	24 días
3335	No	3335	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 48	lun 4/05/26	vie 29/05/26	23 días
3336	No	3336	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 49	lun 1/06/26	mar 30/06/26	23 días
3337	No	3337	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 50	mié 1/07/26	sáb 1/08/26	26 días
3338	No	3338	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 51	lun 3/08/26	mar 1/09/26	24 días
3339	No	3339	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 52	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días
3340	No	3340	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 53	jue 1/10/26	sáb 31/10/26	26 días
3341	No	3341	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 54	mar 3/11/26	lun 30/11/26	23 días
3342	No	3342	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 55	mar 1/12/26	jue 31/12/26	25 días
3343	No	3343	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 56	lun 4/01/27	lun 1/02/27	24 días
3344	No	3344	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 57	mar 2/02/27	lun 1/03/27	24 días
3345	No	3345	PMA-SS	Implementación plan Manejo de Componente Biótico 58	mar 2/03/27	mié 31/03/27	25 días
3346	**Sí**	**3346**		**Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.5 días**
3347	No	3347	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 1	lun 16/05/22	jue 30/06/22	38 días
3348	No	3348	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 2	vie 1/07/22	sáb 30/07/22	24 días
3349	No	3349	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 3	lun 1/08/22	mié 31/08/22	27 días
3350	No	3350	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 4	jue 1/09/22	vie 30/09/22	27 días
3351	No	3351	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 5	lun 3/10/22	lun 31/10/22	25 días
3352	No	3352	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 6	mar 1/11/22	mié 30/11/22	25 días
3353	No	3353	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 7	jue 1/12/22	sáb 31/12/22	26 días
3354	No	3354	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 8	lun 2/01/23	mar 31/01/23	26 días
3355	No	3355	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 9	mié 1/02/23	mar 28/02/23	25 días
3356	No	3356	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 10	mié 1/03/23	vie 31/03/23	27 días
3357	No	3357	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 11	sáb 1/04/23	sáb 29/04/23	23 días
3358	No	3358	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 12	mar 2/05/23	mié 31/05/23	26 días
3359	No	3359	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 13	jue 1/06/23	vie 30/06/23	25 días
3360	No	3360	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 14	sáb 1/07/23	sáb 29/07/23	23 días
3361	No	3361	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 15	mar 1/08/23	jue 31/08/23	26 días
3362	No	3362	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 16	vie 1/09/23	sáb 30/09/23	26 días
3363	No	3363	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 17	lun 2/10/23	mar 31/10/23	26 días
3364	No	3364	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 18	mié 1/11/23	jue 30/11/23	25 días
3365	No	3365	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 19	vie 1/12/23	sáb 30/12/23	24 días
3366	No	3366	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 20	mar 2/01/24	mié 31/01/24	26 días
3367	No	3367	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 21	jue 1/02/24	jue 29/02/24	26 días
3368	No	3368	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 22	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	23 días
3369	No	3369	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 23	lun 1/04/24	mar 30/04/24	27 días
3370	No	3370	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 24	jue 2/05/24	vie 31/05/24	26 días
3371	No	3371	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 25	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	23 días
3372	No	3372	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 26	mar 2/07/24	mié 31/07/24	26 días
3373	No	3373	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 27	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	25 días
3374	No	3374	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 28	lun 2/09/24	lun 30/09/24	26 días
3375	No	3375	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 29	mar 1/10/24	jue 31/10/24	27 días
3376	No	3376	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 30	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	24 días
3377	No	3377	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 31	lun 2/12/24	mar 31/12/24	26 días
3378	No	3378	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 32	jue 2/01/25	vie 31/01/25	26 días
3379	No	3379	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 33	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	25 días
3380	No	3380	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 34	lun 3/03/25	lun 31/03/25	25 días
3381	No	3381	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 35	mar 1/04/25	mié 30/04/25	25 días
3382	No	3382	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 36	vie 2/05/25	sáb 31/05/25	26 días
3383	No	3383	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 37	mar 3/06/25	sáb 28/06/25	22 días
3384	No	3384	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 38	mar 1/07/25	jue 31/07/25	28 días
3385	No	3385	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 39	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	24 días
3386	No	3386	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 40	lun 1/09/25	mar 30/09/25	27 días
3387	No	3387	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 41	mié 1/10/25	vie 31/10/25	27 días
3388	No	3388	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 42	sáb 1/11/25	mar 2/12/25	25 días
3389	No	3389	PMA-SS	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 43	mar 2/12/25	mié 31/12/25	24 días
3390	No	3390	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 44	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	25 días
3391	No	3391	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 45	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	24 días
3392	No	3392	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 46	lun 2/03/26	mar 31/03/26	25 días
3393	No	3393	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 47	mié 1/04/26	jue 30/04/26	24 días
3394	No	3394	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 48	lun 4/05/26	vie 29/05/26	23 días
3395	No	3395	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 49	lun 1/06/26	mar 30/06/26	23 días
3396	No	3396	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 50	mié 1/07/26	sáb 1/08/26	26 días
3397	No	3397	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 51	lun 3/08/26	mar 1/09/26	24 días
3398	No	3398	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 52	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días
3399	No	3399	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 53	jue 1/10/26	sáb 31/10/26	26 días
3400	No	3400	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 54	mar 3/11/26	lun 30/11/26	23 días
3401	No	3401	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 55	mar 1/12/26	jue 31/12/26	25 días
3402	No	3402	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 56	lun 4/01/27	lun 1/02/27	24 días
3403	No	3403	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 57	mar 2/02/27	lun 1/03/27	24 días
3404	No	3404	PMA-SS ET2	Implementación Gestión Ambiental en las actividades de construcción 58	mar 2/03/27	mié 31/03/27	23 días
3405	**Sí**	**3405**		**Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo**	**lun 16/05/22**	**mié 31/03/27**	**1495.5 días**
3406	No	3406	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 1	lun 16/05/22	jue 30/06/22	38 días
3407	No	3407	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 2	vie 1/07/22	sáb 30/07/22	24 días
3408	No	3408	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 3	lun 1/08/22	mié 31/08/22	27 días
3409	No	3409	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 4	jue 1/09/22	vie 30/09/22	27 días
3410	No	3410	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 5	lun 3/10/22	lun 31/10/22	25 días
3411	No	3411	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 6	mar 1/11/22	mié 30/11/22	25 días
3412	No	3412	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 7	jue 1/12/22	sáb 31/12/22	26 días
3413	No	3413	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 8	lun 2/01/23	mar 31/01/23	26 días
3414	No	3414	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 9	mié 1/02/23	mar 28/02/23	25 días
3415	No	3415	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 10	mié 1/03/23	vie 31/03/23	27 días
3416	No	3416	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 11	sáb 1/04/23	sáb 29/04/23	23 días
3417	No	3417	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 12	mar 2/05/23	mié 31/05/23	26 días
3418	No	3418	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 13	jue 1/06/23	vie 30/06/23	25 días
3419	No	3419	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 14	sáb 1/07/23	sáb 29/07/23	23 días
3420	No	3420	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 15	mar 1/08/23	jue 31/08/23	26 días
3421	No	3421	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 16	vie 1/09/23	sáb 30/09/23	26 días
3422	No	3422	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 17	lun 2/10/23	mar 31/10/23	26 días
3423	No	3423	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 18	mié 1/11/23	jue 30/11/23	25 días
3424	No	3424	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 19	vie 1/12/23	sáb 30/12/23	24 días
3425	No	3425	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 20	mar 2/01/24	mié 31/01/24	26 días
3426	No	3426	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 21	jue 1/02/24	jue 29/02/24	26 días
3427	No	3427	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 22	vie 1/03/24	sáb 30/03/24	23 días
3428	No	3428	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 23	lun 1/04/24	mar 30/04/24	27 días
3429	No	3429	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 24	jue 2/05/24	vie 31/05/24	26 días
3430	No	3430	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 25	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	23 días
3431	No	3431	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 26	mar 2/07/24	mié 31/07/24	26 días
3432	No	3432	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 27	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	25 días
3433	No	3433	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 28	lun 2/09/24	lun 30/09/24	26 días
3434	No	3434	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 29	mar 1/10/24	jue 31/10/24	27 días
3435	No	3435	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 30	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	24 días
3436	No	3436	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 31	lun 2/12/24	mar 31/12/24	26 días
3437	No	3437	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 32	jue 2/01/25	vie 31/01/25	26 días
3438	No	3438	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 33	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	25 días
3439	No	3439	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 34	lun 3/03/25	lun 31/03/25	25 días
3440	No	3440	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 35	mar 1/04/25	mié 30/04/25	25 días
3441	No	3441	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 36	vie 2/05/25	sáb 31/05/25	26 días

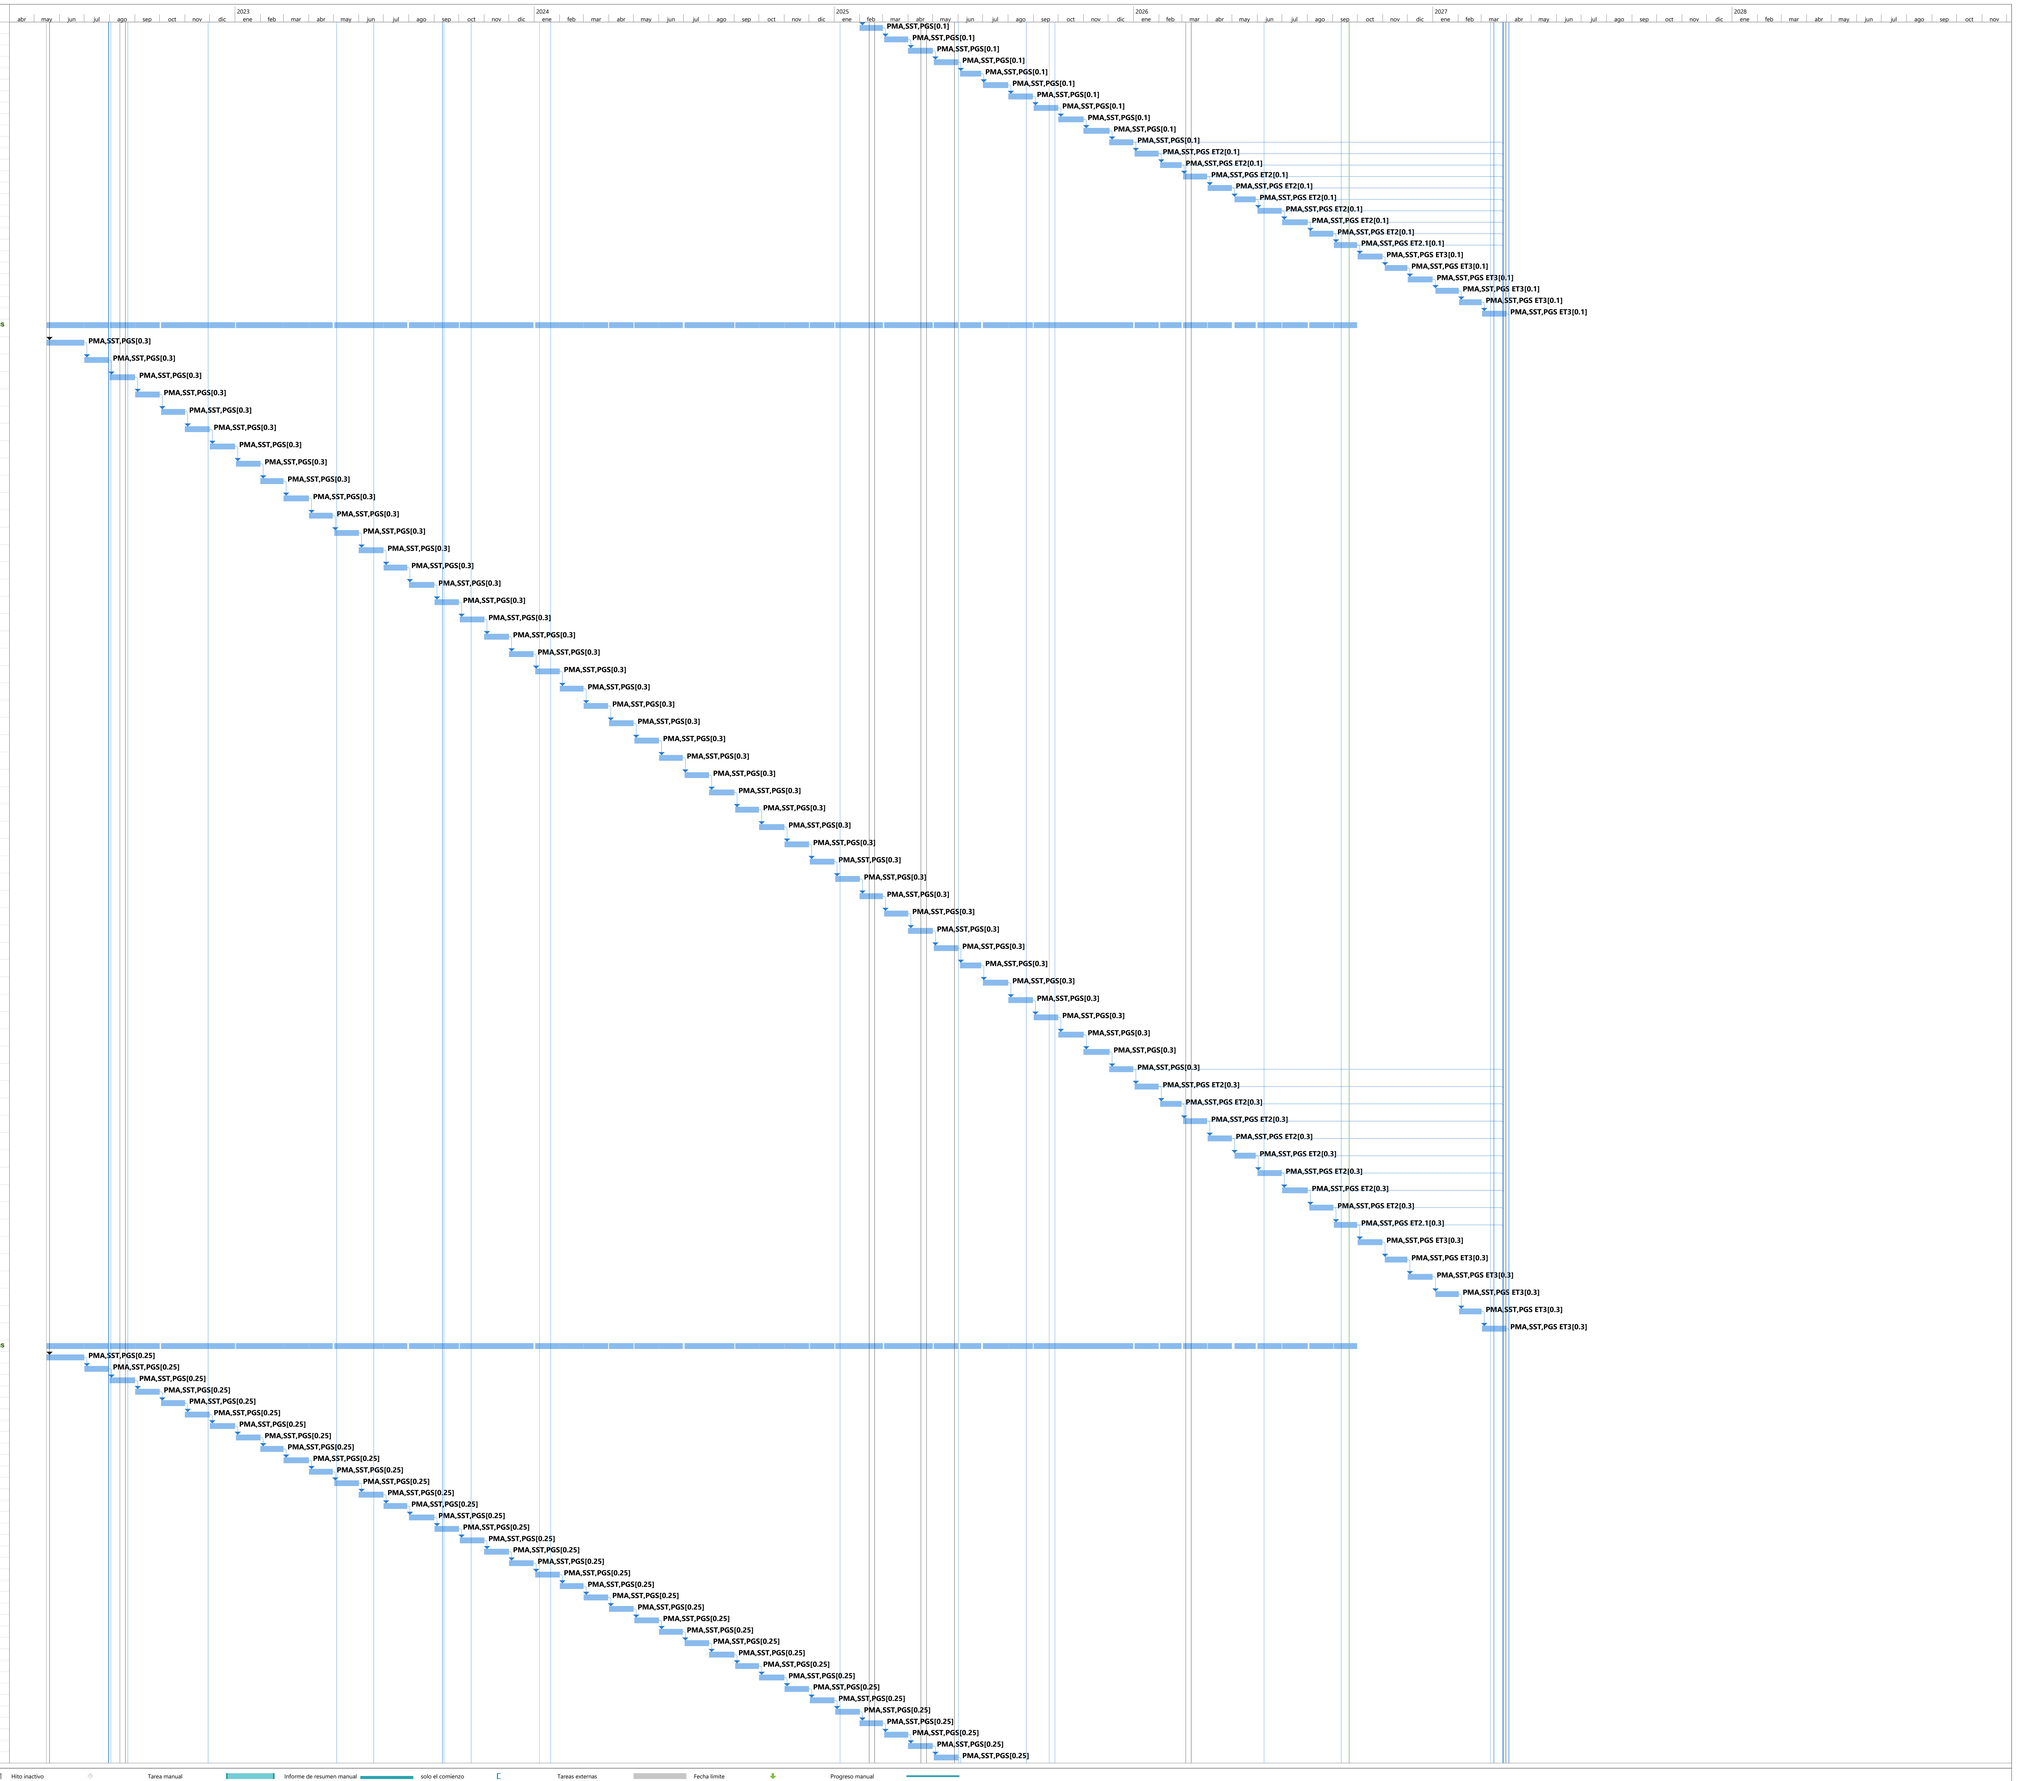

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Resumen	Id	UE TSOA	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
3442	No	3442	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 37	mar 3/06/25	sáb 28/06/25	22 días
3443	No	3443	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 38	mar 1/07/25	jue 31/07/25	28 días
3444	No	3444	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 39	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	24 días
3445	No	3445	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 40	lun 1/09/25	mar 30/09/25	27 días
3446	No	3446	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 41	mié 1/10/25	vie 31/10/25	27 días
3447	No	3447	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 42	sáb 1/11/25	mar 2/12/25	25 días
3448	No	3448	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 43	mar 2/12/25	mié 31/12/25	24 días
3449	No	3449	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 44	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	25 días
3450	No	3450	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 45	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	24 días
3451	No	3451	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 46	lun 2/03/26	mar 31/03/26	25 días
3452	No	3452	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 47	mié 1/04/26	jue 30/04/26	24 días
3453	No	3453	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 48	lun 4/05/26	vie 29/05/26	23 días
3454	No	3454	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 49	lun 1/06/26	mar 30/06/26	23 días
3455	No	3455	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 50	mié 1/07/26	sáb 1/08/26	26 días
3456	No	3456	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 51	lun 3/08/26	mar 1/09/26	24 días
3457	No	3457	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 52	mié 2/09/26	mié 30/09/26	25 días
3458	No	3458	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 53	jue 1/10/26	sáb 31/10/26	26 días
3459	No	3459	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 54	mar 3/11/26	lun 30/11/26	23 días
3460	No	3460	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 55	mar 1/12/26	jue 31/12/26	25 días
3461	No	3461	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 56	lun 4/01/27	lun 1/02/27	24 días
3462	No	3462	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 57	mar 2/02/27	lun 1/03/27	24 días
3463	No	3463	PMA-SS	Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo 58	mar 2/03/27	mié 31/03/27	23 días
3464	**Sí**	**3464**		**Elaboración, trámite, aprobación e implementación PMT**	**lun 16/05/22**	**sáb 13/03/27**	**1484 días**
3465	**Sí**	**3465**		**PMT- VIA DESVÍO**	**lun 16/05/22**	**jue 9/02/23**	**229 días**
3466	No	3466		Elaboración y Entrega PMT	lun 16/05/22	vie 20/05/22	5 días
3467	No	3467		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	vie 20/05/22	mié 1/06/22	9 días
3468	No	3468		Aprobación PMT por parte de SMS	mié 1/06/22	vie 8/07/22	30 días
3469	No	3469		Aprobación PMT por parte de EFR	vie 8/07/22	mié 27/07/22	15 días
3470	No	3470		Aprobación PMT por parte de EFR (RENOVACIONES)	mié 27/07/22	lun 3/10/22	60 días
3471	No	3471		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	lun 3/10/22	lun 3/10/22	0 días
3472	No	3472	PMT	Implementación PMT	lun 3/10/22	jue 9/02/23	110 días
3473	**Sí**	**3473**		**PMT- SECTOR 1**	**lun 16/05/22**	**jue 16/03/23**	**260 días**
3474	No	3474		Elaboración y Entrega PMT	lun 16/05/22	vie 20/05/22	5 días
3475	No	3475		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	vie 20/05/22	mié 8/06/22	15 días
3476	No	3476		Aprobación PMT por parte de SMS	mié 8/06/22	vie 15/07/22	30 días
3477	No	3477		Aprobación PMT por parte de EFR	vie 15/07/22	mié 27/07/22	10 días
3478	No	3478		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
3479	No	3479	PMT	Implementación PMT	jue 28/07/22	jue 16/03/23	200 días
3480	**Sí**	**3480**		**PMT- SECTOR 2**	**mié 23/04/25**	**mié 26/08/26**	**410 días**
3481	No	3481		Elaboración y Entrega PMT	mié 23/04/25	mié 28/05/25	30 días
3482	No	3482		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mié 28/05/25	sáb 14/06/25	15 días
3483	No	3483		Aprobación PMT por parte de SMS	sáb 14/06/25	mié 9/07/25	20 días
3484	No	3484		Aprobación PMT por parte de EFR	jue 10/07/25	sáb 26/07/25	15 días
3485	No	3485		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	sáb 26/07/25	sáb 26/07/25	0 días
3486	No	3486	PMT	Implementación PMT	sáb 26/07/25	mié 26/08/26	330 días
3487	**Sí**	**3487**		**PMT- SECTOR 3**	**lun 16/05/22**	**mié 22/02/23**	**240 días**
3488	No	3488		Elaboración y Entrega PMT	lun 16/05/22	mar 21/06/22	30 días
3489	No	3489		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mar 21/06/22	sáb 9/07/22	15 días
3490	No	3490		Aprobación PMT por parte de SMS	sáb 9/07/22	sáb 13/08/22	30 días
3491	No	3491		Aprobación PMT por parte de EFR	sáb 13/08/22	mié 31/08/22	15 días
3492	No	3492		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mié 31/08/22	mié 31/08/22	0 días
3493	No	3493	PMT	Implementación PMT	mié 31/08/22	mié 22/02/23	150 días
3494	**Sí**	**3494**		**PMT- SECTOR 4**	**mié 19/02/25**	**vie 20/02/26**	**310 días**
3495	No	3495		Elaboración y Entrega PMT	mié 19/02/25	mié 26/03/25	30 días
3496	No	3496		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mié 26/03/25	vie 11/04/25	15 días
3497	No	3497		Aprobación PMT por parte de SMS	vie 11/04/25	lun 19/05/25	30 días
3498	No	3498		Aprobación PMT por parte de EFR	lun 19/05/25	jue 5/06/25	15 días
3499	No	3499		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	jue 5/06/25	jue 5/06/25	0 días
3500	No	3500	PMT	Implementación PMT	jue 5/06/25	vie 20/02/26	220 días
3501	**Sí**	**3501**		**PMT- SECTOR 5**	**sáb 20/08/22**	**sáb 20/01/24**	**437 días**
3502	No	3502		Elaboración y Entrega PMT	sáb 20/08/22	mar 30/08/22	9 días
3503	No	3503		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mié 31/08/22	vie 16/09/22	15 días
3504	No	3504		Aprobación PMT por parte de SMS	vie 16/09/22	vie 21/10/22	30 días
3505	No	3505		Aprobación PMT por parte de EFR	vie 21/10/22	mié 26/10/22	5 días
3506	No	3506		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mié 26/10/22	mié 26/10/22	0 días
3507	No	3507	PMT	Implementación PMT	jue 27/10/22	sáb 20/01/24	378 días
3508	**Sí**	**3508**		**PMT- SECTOR 6**	**mar 3/06/25**	**mar 14/07/26**	**340 días**
3509	No	3509		Elaboración y Entrega PMT	mar 3/06/25	mié 9/07/25	30 días
3510	No	3510		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mié 9/07/25	vie 25/07/25	15 días
3511	No	3511		Aprobación PMT por parte de SMS	vie 25/07/25	sáb 30/08/25	30 días
3512	No	3512		Aprobación PMT por parte de EFR	sáb 30/08/25	mar 16/09/25	15 días
3513	No	3513	PMT	Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mar 16/09/25	mar 16/09/25	0 días
3514	No	3514		Implementación PMT	mar 16/09/25	mar 14/07/26	250 días
3515	**Sí**	**3515**		**PMT- SECTOR 7**	**lun 16/05/22**	**vie 28/07/23**	**370 días**
3516	No	3516		Elaboración y Entrega PMT	lun 16/05/22	mar 21/06/22	30 días
3517	No	3517		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mar 21/06/22	sáb 9/07/22	15 días
3518	No	3518		Aprobación PMT por parte de SMS	sáb 9/07/22	sáb 13/08/22	30 días
3519	No	3519		Aprobación PMT por parte de EFR	sáb 13/08/22	mié 31/08/22	15 días
3520	No	3520		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mié 31/08/22	mié 31/08/22	0 días
3521	No	3521	PMT	Implementación PMT	mié 31/08/22	vie 28/07/23	280 días
3522	**Sí**	**3522**		**PMT- SECTOR 8**	**jue 12/03/26**	**sáb 13/03/27**	**306 días**
3523	No	3523		Elaboración y Entrega PMT	jue 12/03/26	sáb 18/04/26	30 días
3524	No	3524		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	sáb 18/04/26	mié 6/05/26	15 días
3525	No	3525		Aprobación PMT por parte de SMS	mié 6/05/26	jue 11/06/26	30 días
3526	No	3526		Aprobación PMT por parte de EFR	jue 11/06/26	mié 1/07/26	15 días
3527	No	3527		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mié 1/07/26	mié 1/07/26	0 días
3528	No	3528	PMT	Implementación PMT	mié 1/07/26	sáb 13/03/27	216 días
3529	**Sí**	**3529**		**PMT- SECTOR 9**	**mié 26/02/25**	**jue 5/02/26**	**290 días**
3530	No	3530		Elaboración y Entrega PMT	mié 26/02/25	mar 1/04/25	30 días
3531	No	3531		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mar 1/04/25	lun 21/04/25	15 días
3532	No	3532		Aprobación PMT por parte de SMS	lun 21/04/25	lun 26/05/25	30 días
3533	No	3533		Aprobación PMT por parte de EFR	lun 26/05/25	jue 12/06/25	15 días
3534	No	3534		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	jue 12/06/25	jue 12/06/25	0 días
3535	No	3535	PMT	Implementación PMT	jue 12/06/25	jue 5/02/26	200 días
3536	**Sí**	**3536**		**PMT- SECTOR 10**	**lun 16/05/22**	**mié 14/02/24**	**539 días**
3537	No	3537		Elaboración y Entrega PMT	lun 16/05/22	mié 25/05/22	9 días
3538	No	3538		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	mié 25/05/22	lun 13/06/22	15 días
3539	No	3539		Aprobación PMT por parte de SMS	lun 13/06/22	jue 21/07/22	30 días
3540	No	3540		Aprobación PMT por parte de EFR	jue 21/07/22	mié 27/07/22	5 días
3541	No	3541		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	mié 27/07/22	mié 27/07/22	0 días
3542	No	3542	PMT	Implementación PMT	mié 27/07/22	mié 14/02/24	480 días
3543	**Sí**	**3543**		**PMT- SECTOR 11**	**mié 30/04/25**	**mar 14/07/26**	**368 días**
3544	No	3544		Elaboración y Entrega PMT	mié 30/04/25	mié 4/06/25	30 días
3545	No	3545		Aprobación por parte de Interventoría (PMT) y radicación a SMS	jue 5/06/25	sáb 21/06/25	15 días
3546	No	3546		Aprobación PMT por parte de SMS	sáb 21/06/25	lun 28/07/25	30 días
3547	No	3547		Aprobación PMT por parte de EFR	lun 28/07/25	jue 14/08/25	15 días
3548	No	3548		Aprobación para ingreso de Personal y Maquinaria por Interventoría	jue 14/08/25	jue 14/08/25	0 días
3549	No	3549	PMT	Implementación PMT	jue 5/06/25	mar 14/07/26	338 días
3550	No	3550		Firma de acta de Finalización	mié 31/03/27	mié 31/03/27	0 días
3551	No	3551		Fin Etapa de Construcción	mié 31/03/27	mié 31/03/27	0 días

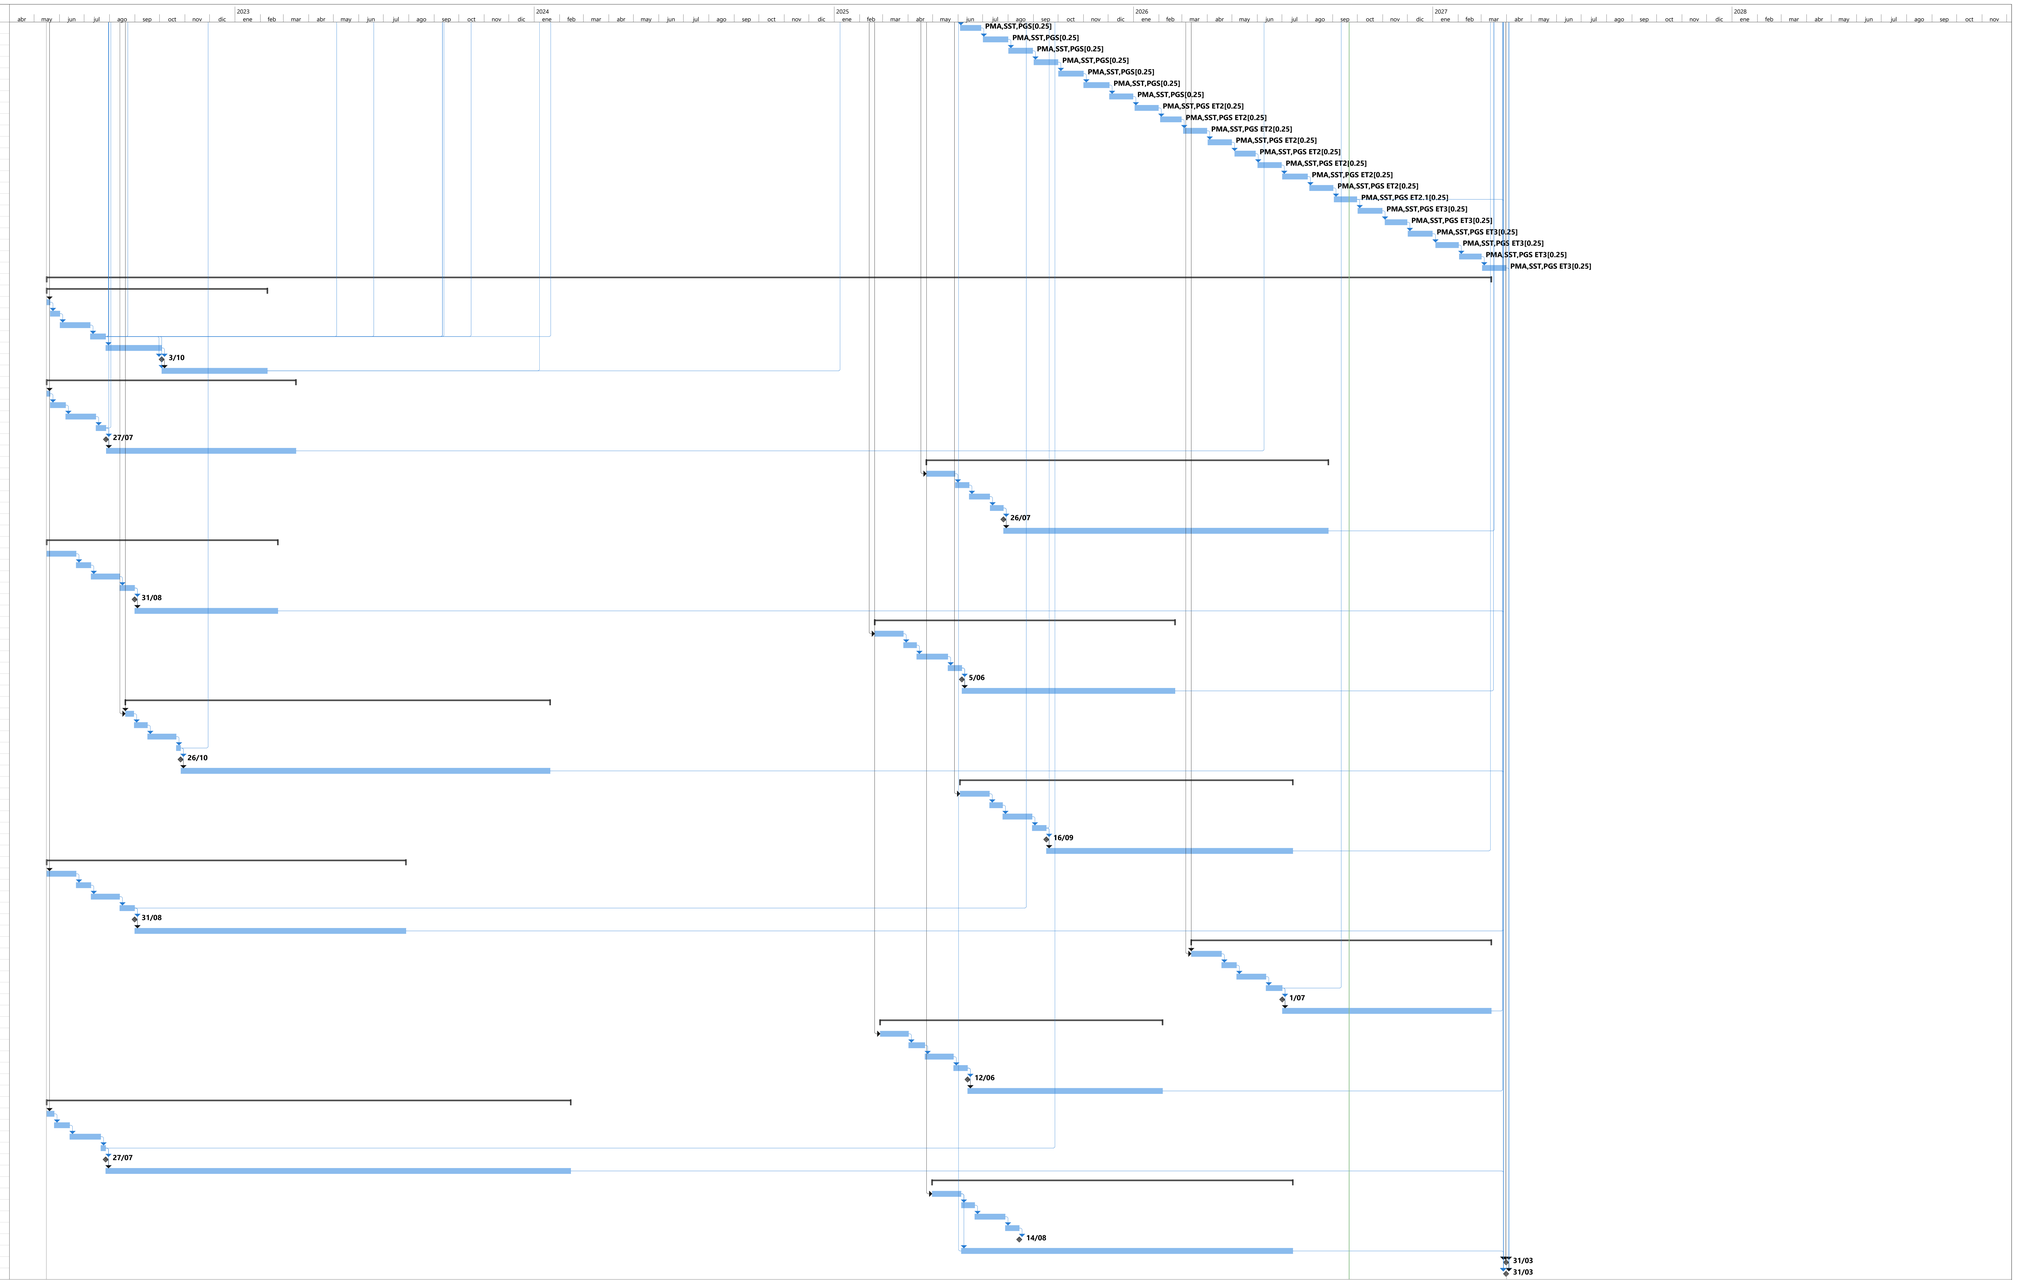

Proyecto: LB5
Fecha: lun 21/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
