MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 506470

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24070 De 28/08/2023 Por 1.196.954.198,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 12 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA No.: 20345 **de 28/08/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS **C.C o Nit** 901517172

CONTRATO ADICIONAL No 4812 de 28/07/2023 Por 16.000.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130

VALOR A PAGAR Mil Ciento Noventa Y Seis Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Noventa Y Ocho Pesos M/Cte. **1.196.954.198,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		16.000.000.000,00	1,50	240.000.000,00	**1.144.328.861,00**
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		16.000.000.000,00	2,00	320.000.000,00	
RETEFUENTE	512	1.744.358.872,00	2,00	34.887.177,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	1.744.358.872,00	0,55	9.593.974,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		1.196.954.198,00	5,00	59.847.710,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		16.000.000.000,00	1,00	160.000.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		16.000.000.000,00	2,00	320.000.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **52.625.337,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7087 **Fecha.** 31/07/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	428 Excedentes Financieros	1.196.954.198,00

Total obligación **1.196.954.198,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	1.744.358.872,	0,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	9.593.974,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
243626001	Contratos de obra	0,	34.887.177,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	52.625.337,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
243690001	Retencion por contribucion ley 418	0,	59.847.710,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	160.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	240.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	320.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	320.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	547.404.674,	Acta de recibo PARCIAL 399534 CONTRATO ADICIONAL

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 506470

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24070 De 28/08/2023 Por 1.196.954.198,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 12 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA No.: 20345 de 28/08/2023 C. Pago TESORERIA CXP: NO

Sumas Iguales	**1.744.358.872**	**1.744.358.872**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MILTON HURTADO GARCIA

02460185152740-3065022-006728427

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :399534

Impreso en: 16-ABR-24 10:41 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20345

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 4812

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con identificación 901517172 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	28/07/2023	**Valor orden gasto**	16.000.000.000
Fecha iniciación	01/08/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	6.400.000.000
Fecha Terminación	30/11/2023	**Valor acta**	1.196.954.198
Duración	Ciento veintidós (122) días	**Saldo pendiente**	8.403.045.802

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 12 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTER	1.744.358.872	0
Total:		**1.744.358.872**	**0**

Total recibido	1.744.358.872
- Amortización de anticipo	547.404.674
	1.196.954.198

Valor Mil Ciento Noventa Y Seis Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	6.400.000.000
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	6.400.000.000

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 28/08/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20345

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 4812

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con identificación 901517172 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



CONSORCIO CABA INTERVIAS

02460185152454-3065007-006728409

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 7087

Fecha expedición 31/07/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **16.000.000.000,00**

Son: Dieciseis Mil Millones Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130

Observaciones ESTE PROYECTO ESTA RESPALDADO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL A TRAVES DEL ACUERDO Nº 7 DE 2021 VALOR DEL CONTRATO $31.861.895.281, PARA EL 2021 $ 19.903.410.130, PARA EL 2022 $ 11.958.485.151
SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMIOSO No 48 EL 01/01/2023, POR VALOR DE $ 11.958.485.151
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 4812 EL 31/07/2023

Tercero 901517172 CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS - JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL

103589

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 4812 Fecha 28/07/2023 Nro. Int.

Duración Ciento veintidós (122) días Fecha fin 30/11/2023

Forma pago CON UN ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL PAGO DEL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO AL CONTRATISTA MEDIANTE EL PAGO DE ACTAS PERIÓDICAS. EL PAGO DEL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO AL CONTRATISTA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 6273

Valor 16.000.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construcción y servicios de la construcción**
C. Costo 1107 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo 428 **Excedentes Financieros**
Proyecto 2020660010089 **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Disponibilidad 6273
Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402113 **Vía urbana construida**


Código CPC	Descripción	Valor
54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	16.000.000.000,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 428 C. Costo 1107

Mes 8	12.400.000.000,00	Mes 9	3.600.000.000,00

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
02460157155345-3002354-006602654

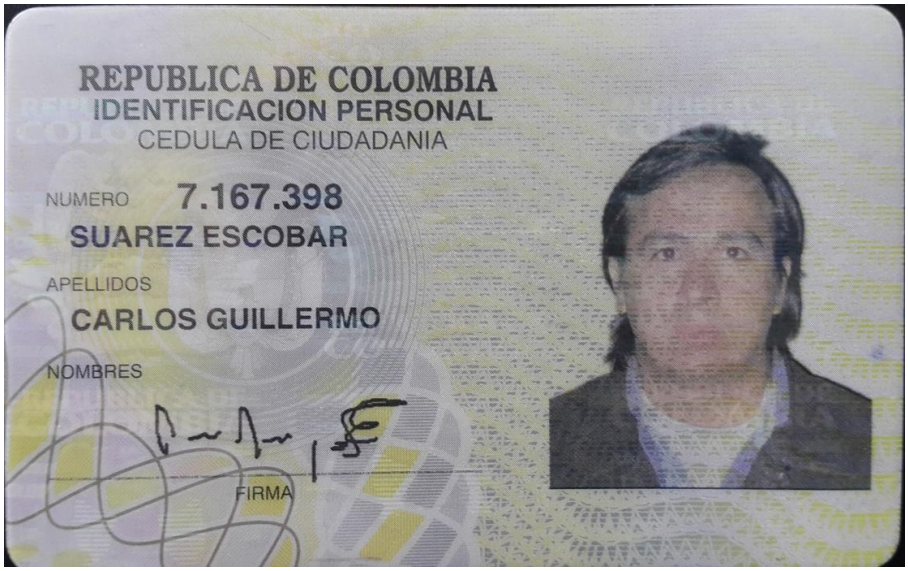
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.167.398
SUAREZ ESCOBAR
APELLIDOS
CARLOS GUILLERMO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1973
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00113682-M-0007167398-20081028
0004942850A 1
1200017409

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 7.167.398 de Tunja, en mi condición de Representante Legal (S) de CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS. Identificada con Nit 901.517.172-7.

CERTIFICO QUE

EL CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS ha cumplido durante el tiempo de ejecución del Contrato de obra N° 4812 de 2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el Periodo de 01 de junio de 2023 a 30 de junio de 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Pereira, Risaralda a los (08) días del mes de agosto de 2023.

CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
C.C. 7.167.398 DE TUNJA
Representante Legal (S)

Pereira, julio de 2023

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA Nº4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS".**

Asunto: Justificación solicitud de **PRÓRROGA No.3 Y ADICIÓN No.1** al contrato de obra No.4812-2021.

Respetado Alcalde.

De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto1082 de 2015 y demás normas reglamentarias del Estatuto General de la contratación, que disponen que toda obligación contractual en la que haga parte una entidad debe estar precedida de un estudio, en el que se materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y las apropiaciones presupuestales correspondientes, el equipo técnico de la Secretaria de Infraestructura , se permiten presentar el presente estudio técnico, jurídico y financiero que justifica la necesidad de efectuar una prórroga y adición al contrato de obra denominado "**CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"**, en los siguientes términos:

1- ANTECEDENTES

- Se suscribió contrato por el término de 540 días**,** con fecha de inicio del 11 de octubre de 2021 y fecha de terminación sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
- El día 31 de diciembre de 2022 se suscribió acta de suspensión.
- El día 04 de enero de 2023 se suscribió acta de reinicio.

- El día 04 de enero de 2023 se suscribió prórroga No.1 hasta complementar el término de 540 días, iniciando el 05 de enero de 2023 y con fecha de terminación el 07 de abril de 2023.
- El día 21 de enero de 2023 se suscribió acta de suspensión No.2.
- El día 23 de febrero de 2023 se suscribió acta de reinicio No.2, quedando como fecha de terminación el 10 de mayo de 2023.
- El día 10 de mayo se suscribió la prórroga No. 2 hasta el 31 de julio de 2023.

2. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

Clase de Contrato:	OBRA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS - R.L.JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL.
Interventor y/o Supervisor:	CONSORCIO CONDINA JJAI - R.L. ALVARO HERNANDO VERA AYALA.
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Valor del Contrato:	Treinta y un mil ochocientos sesenta y un mil millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y un pesos m/cte ($31.861.895.281).
Duración:	464 días
Plazo de Ejecución:	464 días
Fecha De Inicio:	11/10/2021
Fecha Terminación:	31/12/2022
Fecha de suspensión:	31/12/2022
Fecha de reinicio:	04/01/2023
Fecha de terminación real:	04/01/2023
Modificación o prórroga 1:	Hasta completar 540 días
Fecha de terminación real:	07/04/2023
Fecha de suspensión 2:	21/01/2023
Fecha de reinicio:	23/02/2023
Fecha de terminación real:	10/05/2023
Prórroga No.2	Ochenta y dos (82) días
Inicio:	11/05/2023
Fecha de terminación:	31/07/2023

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Clase de Contrato:	INTERVENTORÍA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	CONSORCIO CONDINA JJAI - R.L. ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Interventor y/o Supervisor:	MILTON HURTADO GARCÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Valor del Contrato:	Dos mil ochocientos quince millones novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte ($2.815.970.447) iva incluído.
Duración:	CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS. Sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Plazo de Ejecución:	CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS. Sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Fecha De Inicio:	11/10/2021
Fecha Terminación:	24/12/2022
Prórroga 1:	SIETE (07) DÍAS
Inicio:	25/12/2022
Fecha de terminación real:	31/12/2022
Prórroga 2:	CIEN (100) DÍAS
Inicio:	01/01/2023
Fecha de terminación real:	10/04/2023
Prórroga 3:	TREINTA (30) DÍAS
Inicio:	11/04/2023
Fecha de terminación real:	10/05/2023
Adición 1:	$152.624.331
Valor total:	$2.968.594.778
Prórroga 4:	NOVENTA (90) DÍAS
Inicio:	11/05/2023
Fecha de terminación real:	08/08/2023
Cesión:	11/05/2023
Adición 2:	$325.596.132
Valor total:	$3.294.190.910

4. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

4.1 Necesidad: Prorrogar y adicionar el contrato de obra cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"**.

4.2 Descripción de la necesidad: El contratista **CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS,** envió oficio No. CPVC-660-23 del 18 de julio de 2023, a la entidad, con el fin de solicitar la prórroga No.3 y adición No.1 al contrato de Obra No.4812 de 2021, con base en las siguientes consideraciones:

"Las razones que justifican suscribir una modificación del contrato, adicionando su valor y extendiendo su tiempo de ejecución, se soportan en los siguientes argumentos:

- *Ajuste de localización glorieta **K1+350**: Una vez se efectuó la revisión de los diseños iniciales entregados por la entidad contratante, se dio inicio a la localización en campo según lo indicaban estos. Como resultado se detectó que era inconveniente para los accesos del Colegio Liceo INGLES, dado el gran número de vehículos que acceden en los horarios de entrada y salida acorde con la jornada Escolar. Así mismo presentaba inconvenientes el empalme con la vía de acceso Antiguo Idema, por efectos de la diferencia de Niveles entre el corredor vial en construcción y la mencionada Vía al momento de interactuar con el tráfico de la avenida, una vez estuviera en servicio, con este ajuste se logra la incorporación de la vía mencionada de manera directa a la glorieta.*

  *Como solución a los inconvenientes anteriormente descritos, se determinó que se trasladase la Glorieta al Kilometro **K1+250** logrando conectar de manera directa con la vía de acceso al antiguo Idema, dejando a su vez una distancia libre de salida para la incorporación del flujo vehicular proveniente del colegio Liceo Ingles. Este ajuste implico variaciones notables en la configuración de los ítems de Explanaciones y Terraplenes, al pasar de una sección de la calzada en cajón a una sección típica de terraplén, aumentando este último en gran medida. Lo anterior a su vez obligó a efectuar la construcción de muros de contención sobre la margen derecha de la banca.*

  Las siguientes imágenes ilustran la situación descrita.

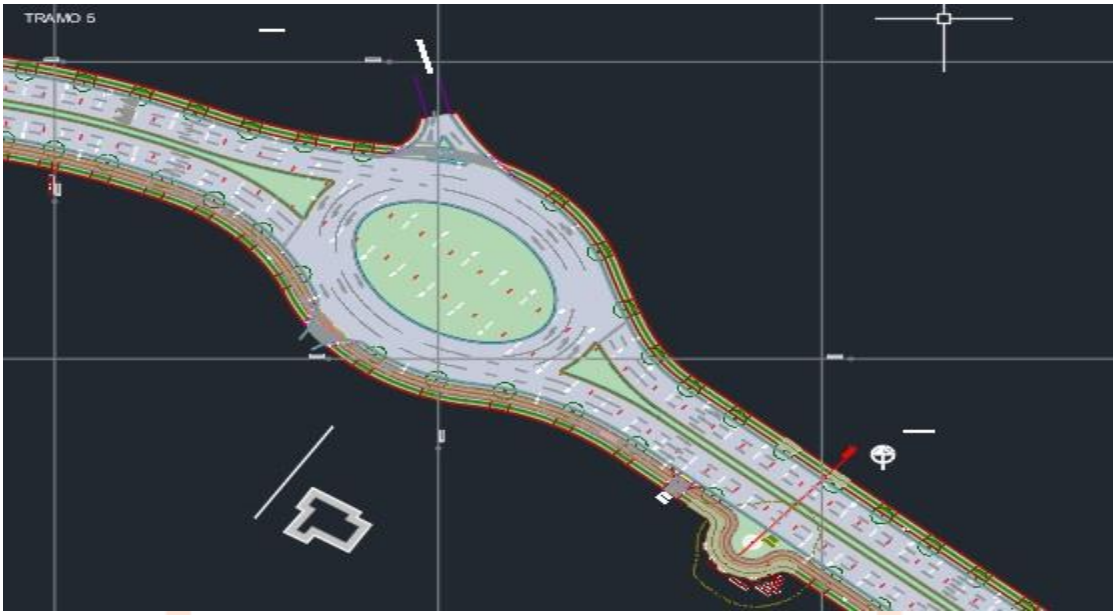



IMAGEN 1: Ajuste a Glorita K1+250

- ***Ajuste en la tipología de muros de Contención para Terraplenes****: Debido a que el Departamento de Risaralda se encuentra Geográficamente ubicado en la región Andina de Colombia, en la que predomina épocas de lluvias intensas, el proyecto a su vez se ve afectado por la incidencia de éstas con el tipo de suelo disponible para construcción de muros mecánicamente estabilizados. En los diseños iniciales se planteó la construcción de estos con suelos Tipo Ceniza Volcánica (Originados a partir de materiales piroclásticos y que contienen una alta proporción de minerales con gran afinidad por las moléculas de agua). Lo cual significa que son de fácil saturación.*

  Técnicamente se vio necesario ajustar la tipología pasando de muros mecánicamente estabilizados a muros en concreto reforzado, ya que con los muros previstos inicialmente no se garantizaba la estabilidad de la Banca dadas las condiciones particulares de la zona y a las razones antes mencionadas. Asimismo, sus características no cumplían las necesidades estructurales que permitieran la contención de los terraplenes. En la siguiente tabla se especifica la ubicación de muros en concreto a lo largo del corredor vial.

ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CALZADA
k0+465	k0+530	CD
K0+790	K0+844	CD
K0+900	K0+920	CI
K1+003	K1+048	CI
k1+020	K1+090	CD
k1+140	k1+260	CD
K1+270	K1+410	CD
K2+780	K2+880	CD
K2+900	K2+950	CD
K2+990	K3+030	CI
K3+020	K3+110	CI
K3+280	K3+230	CI

Sección típica muro en concreto reforzado

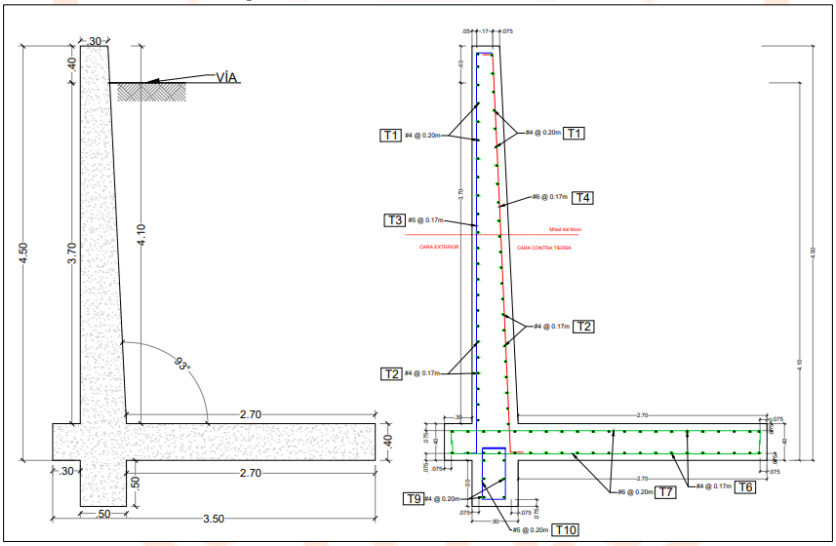

- ***Ajuste en Configuración de Redes Eléctricas:*** *Con el objetivo de cumplir lo dispuesto en el POT 2020-2023, para la zona de expansión urbanística occidental de la Ciudad de Pereira, y teniendo en cuenta a su vez criterios urbanísticos que se acoplen al entorno paisajístico del sector de influencia del proyecto, se dio la necesidad de prescindir de la construcción de redes de media tensión elevadas, ya que se cuenta con un gran número de árboles de mediano y gran porte que podrían generar contactos indebidos con el cableado poniendo en riesgo la integridad física de transeúntes y habitantes del sector. Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y de armonía con el entorno se optó por efectuar la construcción de redes eléctricas soterradas garantizando de esta manera la*

seguridad tanto de personas como de la infraestructura construida, esto último por efectos del vandalismo.

Se toma la decisión de construir de la manera descrita las redes eléctricas, se realizan los ajustes pertinentes acorde con lo dispuesto en la normatividad vigente de la Empresa de Energía de Pereira EPP, y con el acompañamiento técnico de los profesionales adscritos a esta entidad.

- ***Justificación forestal salvamento vegetal (rescate, reubicación de epífitas vasculares del grupo de las orquídeas) - (Rescate, reubicación y reposición de helechos arborescentes).***

  En base al avance actual del aprovechamiento forestal aproximado al 50% de la totalidad de individuos forestales a ser talados, es necesario precisar que se deben seguir dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo Tercero de la Resolución N° 2513 del 20 de mayo de 2022, correspondientes a la ejecución de las medidas de manejo de rescate, reubicación y reposición silviculturas de plantas protegidas de la flora silvestre según la Resolución N° 0801 del 24 de junio de 1977 y Resolución 0213 del 01 de febrero de 1977.

  Como precedente de la alta importancia cita el acta de visita de control y seguimiento a la ejecución del aprovechamiento único forestal (CARDER ACTA N° 69344) en la cual establece entre recomendaciones y/o medidas preventivas "continuar con el rescate, traslado y reubicación de flora epífita vascular que se encuentran en los árboles a talar".

  En este contexto y en base a la necesidad de avance de adecuación preconstructiva de la obra sobre el sector del K3+000 al K3+400, el cual corresponde a coberturas definidas en los estudios de Línea base correspondiente a la caracterización de coberturas de la tierra y conectividad paisajística como áreas en Bosques Fragmentados y bosque riparios y/o de galerías, los cuales corresponden a los ecosistemas de mayor fragilidad e importancia.

  Vale la pena recordar que el sector del K3+000 al K3+400 corresponde al tramo donde existe la mayor abundancia poblacional de las especies de plantas vasculares y no vasculares correspondientes respectivamente a los grupos de Bromelias, Orquídeas, Helechos arborescentes, Líquenes y Briófitos (musgos, hepáticas y antoceros) sobre las cuales se debe de trabajar en la proliferación y recuperación de sus poblaciones en la comunidad vegetal de la estructura ecológica principal del municipio de Pereira.

De igual forma será de alta importancia Realizar acciones de salvamento vegetal en sobre el área del K0+000 al K0´+280 en cual es un sector de alta concurrencia de la comunidad la cual espera un trato óptimo de la vegetación y cuenta con ideales generalmente ambientalista y de conservación.

De no poder seguir adelantando dichas obligaciones y medidas de manejo ambiental entidad contratante Titular del permiso de aprovechamiento forestal ciertamente incurrirá El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones, previstos
en los actos administrativos dará lugar al inicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. Art Quinto Res 2513 de 2022

- ***Inclusión de red hidráulica potable:*** *Conforme a la red hidráulica de agua potable del corredor vial existente, se pudo establecer que no existían planos récord que permitieran conocer la localización aproximada de dicha red, razón por la cual no era posible evitar el impacto y/o afectación sobre la misma durante la construcción de la nueva vía.*

  Dada la necesidad de garantizar la red hidráulica potable a los usuarios del área de influencia se planteó la construcción basada en un diseño actualizado en el área de espacio público del presente proyecto, una nueva red en tubería PVC presión de 6" RDE 21, debido a que la red existente en tubería PEAD de 6", atravesaba el nuevo trazado geométrico hasta el K1+260, de igual manera entre la abscisa K1+260 hasta el K3+400 del proyecto se atravesaba existente de 8" en gres, la cual impedía la construcción de las calzadas de la nueva avenida. En razón de lo anterior, fue necesario suministrar e instalar una nueva red hidráulica en tubería PVC presión 8" RDE21, en el área destinada al urbanismo del proyecto, con el fin de garantizar el suministro de agua potable a los usuarios de este sector de la ciudad, por medio de una tubería que ofrece mejores condiciones salubres, en comparación con la gres, el cual sufre abrasiones por la fuerza tractiva del flujo, este desprendimiento de partículas se van depositando y transportando en los diferentes elementos de la tubería, hasta llegar al cuerpo humano a través del consumo del líquido.

  En cuanto al suministro e instalación de tuberías PVC presión de 4, 3 y 2 RDE 21, son necesarias para articular la nueva red hidráulica, que se conectaría desde la tubería PVC presión 8" RDE 21 hasta los diferentes empalmes de los usuarios existentes dentro del corredor vial del proyecto.

A continuación, se refleja las condiciones actualizadas del presupuesto y el porcentaje variaciones para gran partida de pago.

JUSTIFICACIÓN JURIDICA

*El plazo del contrato se encuentra discriminado en la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SESICIENTOS VEINTIDOS DOS (622) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*

*El valor del contrato se encuentra discriminado en la **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO** El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($31.861.895.281) IVA INCLUIDO, equivalentes a 35.069 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2021.*

Principalmente, es preciso señalar, que modificar el contrato no es una decisión que pueda adoptarse de un método absolutamente discrecional o arbitrario por una entidad pública, pues como bien se sabe, las consideraciones que se puedan tener para acceder o no a dicha solicitud, deben estar dirigidas a la primacía del interés general y el principio de conservación del contrato en la persecución de los fines de la contratación estatal, en virtud del artículo 3º de la Ley 80 de 1993, que señala:

> ***"…ARTÍCULO 3°.**- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*
> *Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones…"*

En efecto, la entidad ante cualquier circunstancia presentada en la ejecución del contrato, que pueda afectar el desarrollo normal del mismo, deberá darle preponderancia a la conservación del contrato y velar porque con este se cumplan los fines del Estado, pues las partes deben mantener el interés de seguir con el Contrato y mantener su vigencia; ya que lo contrario, supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, lo que conllevaría a la afectación del interés público.
En relación con lo anterior, se trae a colación el numeral 8º del artículo 4º y el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993:

*"…**ARTCULO 4°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.** Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*
(…)
***8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios,** acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.*
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.
(…)"
***"ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.** Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:*
(…)
***2°.** Colaborarán con las entidades **contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla** y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse..."*

Con base en lo anteriormente mencionado, resulta comprensible la posibilidad y viabilidad que se tiene para adicionar el contrato, puesto que, al momento mismo de la ejecución de este, pueden advertirse circunstancias ajenas al control de las partes que justifiquen variar las condiciones de su desarrollo, dando lugar a la modificación del contrato mediante la adición en valor y en plazo.

Con fundamento en lo expuesto, se puede concluir que, en aras de mantener el cumplimiento del objeto contractual, cuyo desarrollo ha afectado el valor inicialmente pactado por causas no imputables al Contratista, al igual que el tiempo de ejecución, las partes deben proveer por acoger e implementar los mecanismos jurídicos adecuados para salvaguardar los efectos del mismo, toda vez que como se ha sustentado ampliamente, se deben adicionar recursos económicos para llevar a buen término la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS., ya que lo dispuesto inicialmente no es suficiente para la ejecución de las actividades comprendidas en su objeto y alcance, situación que debe ser observada en el contexto

de que el Contratista siempre ha dispuesto todos los recursos requeridos para la ejecución de las obras.

Así mismo, debe prorrogarse el tiempo de la ejecución del contrato motivado por los cambios en eldiseño, mayores cantidades de obra y obras No previstas identificadas a la fecha, con la finalidad dellevar a término el alcance de la obra y dar cumplimiento al objeto contractual.

En conclusión, y como quiera que se encuentran justificadas que las causas que generan un incremento en los recursos económicos y prórroga del plazo para la ejecución del Contrato 4812 - 2021, solicitamos se proceda, en comunión con la entidad, avalar la adición No.1 por un valor de $16.000.000.000 y la prórroga No.3 por el término de 122 días, iniciando el 01 de agosto de 2023 y con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2023.

Adicionalmente, se aclara que, a la fecha, la entidad se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones contractuales".

5- ANALISIS TECNICO DE LA SOLICITUD:

5.1. Concepto técnico interventoría:

"El equipo técnico de la interventoría se permite indicar, que efectivamente como lo señala el contratista de obra en su oficio, se debe adicionar en valor el presente contrato, por las obras y/o actividades adicionales a ejecutar en el proyecto de la referencia, teniendo en cuenta que durante la ejecución del proyecto se han presentado algunos ajustes al diseño inicial; generando un número de actividades en obra que no se habían pactado en el proyecto.

Las consideraciones expuestas por el contratista en su oficio de solicitud son ajustadas a la realidad de la ejecución contractual, por tal motivo la interventoría considera viable y pertinente otorgar al contratista adición en valor solicitada, y prórroga ajustada al 30 de noviembre de 2023, con el fin de terminar las obras en adecuadas condiciones de funcionamiento y dando cumplimiento al objeto contractual. Teniendo en cuenta lo anterior, esta interventoría AVALA la prórroga No.3 por el término de 122 días, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2023 y la adición No.1 por un valor de dieciséis mil millones de pesos m/cte ($16.000.000.000)".

5.2. Concepto técnico Secretaría de Infraestructura

El equipo técnico de la secretaria de infraestructura permite indicar, que efectivamente como lo señala el contratista en su oficio, se debe dar continuidad a la obra objeto del contrato 4812-2021 con base en la necesidad que se generó para realizar el ajuste a los diseños iniciales y que dichos ajustes dieron origen a ítems o actividades no previstas al momento de suscribir el contrato, tales como la reubicación de la glorieta del k+350 al k+250, modificación en la tipología de muros de contención para terraplenes, ajuste en configuración de redes eléctricas y la inclusión de red hidráulica potable.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la entidad AVALA la prórroga No. 3 por el término de 122 días y la adición No.1 por la suma de dieciséis mil millones de pesos m/cte ($16.000.000.000).

6- PRÓRROGA SOLICITADA: para la continuación de la ejecución de la obra se requiere una prórroga No.3 por el término de ciento veintidós (122) días, contados a partir del 01 de agosto de 2023 con fecha de terminación el 30 de noviembre de 2023.

7-ADICIÓN SOLICITADA: para la continuación de la ejecución de la obra se requiere la adición No.1 por un valor de dieciséis mil millones de pesos ($16.000.000.000).

8- EXIGENCIA DE GARANTIAS:

Una vez se suscriba la respectiva prórroga y adición, el contratista debe ajustar las garantías constituidas para garantizar el contrato de obra principal Nº 4812 de 2021, en los términos a que haya lugar correspondiente al tiempo prorrogado y valor adicionado.

9- NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.


Clase de Contrato:	OBRA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS - R.L.JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL.
Interventor y/o Supervisor:	CONSORCIO CONDINA JJAI - R.L. ALVARO HERNANDO VERA AYALA.
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Valor del Contrato:	Treinta y un mil ochocientos sesenta y un mil millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y un pesos m/cte ($31.861.895.281).
Duración:	464 días
Plazo de Ejecución:	464 días
Fecha De Inicio:	11/10/2021
Fecha Terminación:	31/12/2022
Fecha de suspensión:	31/12/2022
Fecha de reinicio:	04/01/2023
Fecha de terminación real:	04/01/2023
Modificación o prórroga 1:	Hasta completar 540 días
Fecha de terminación real:	07/04/2023
Fecha de suspensión 2:	21/01/2023
Fecha de reinicio:	23/02/2023
Fecha de terminación real:	10/05/2023
Prórroga No.2	Ochenta y dos (82) días
Inicio:	11/05/2023
Fecha de terminación:	31/07/2023
Prórroga No.3	Ciento veintidós (122) días
Inicio:	01/08/2023
Fecha de terminación:	30/11/2023
Adición No.1	$16.000.000.000
Valor total:	$47.861.895.281

10- RECOMENDACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente análisis, queda justificada la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato principal de Obra **Nº4812 DE 2021**, para cumplir con la finalidad de la contratación, razón por la que se recomienda al representante legal del Municipio de Pereira, celebrar la presente prórroga y adición al contrato correspondiente, con el contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS.

Atentamente,



MILTON HURTADO GARCÍA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Daniela Robledo Giraldo
Abogada contratista – Secretaría de Infraestructura.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal

Volver | Imprimir | Modificar

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2825109
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/09/2021 8:47:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

7 Ejecución del Contrato
8
Modificaciones del Contrato 9
Incumplimientos

Número del contrato	4812-2021
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	744 Días
Fecha de inicio de contrato	11/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	122 días
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Pereira

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2021 10:09:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2021 12:51:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2825109_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2825109_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SMI-LP-047 -2021
Título de la oferta	PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Volver Imprimir Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ◉ Sí ○ No

9 Incumplimientos

Fecha de notificación de prorrogación 25/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 11/10/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11/10/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

◉ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ % del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 20/09/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 7:32:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12104011	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.593.094.765,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12104106	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	25.489.516.224,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.7660280	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	19.117.137.168,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.7660285	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.593.094.765,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle
CO1.WRT.7503703	Seriedad de la oferta	-	3.240.594.480,00 COP	-	2/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	30 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2825109
Proveedor	CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Cr 7 No. 18-55
Ubicación	CO-RIS-66001 - Pereira
País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Dirección	Cr 7 No. 18-55
Código postal	66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 7 #18-55	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Impr

Bienes y servicios

1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	In
48.405.944.779,00	

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	In
1	72141001	PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	32.405.944.779,00	31.861.895.281,00	32.405.944.779,00	
1	72141001	ADICIÓN 1	1,00	UN	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	

Volver

Impr

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MILTON HURTADO GARCI	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	10271356	Guardar y n
Supervisor	MILTON HURTADO GARCI	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	10271356	Guardar y n

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	17/09/2021 12:51:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS R
Supervisor	MILTON HURTADO GARCIA	17/09/2021 12:51:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS R

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	47.861.895.281
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	47.861.895.281

Código BPIN 2020660010089 **Año de vigencia** 2023 Consultar

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunid
☐	**4508**	**CDP**	**No validado**	**19.903.410.130 COP**	**19.903.410.130 COP**	**00-00-000-0000**
☐	**7-2021**	**Vigencia futura ordinaria**	**No validado**	**14.275.558.637 COP**	**11.958.485.151 COP**	**00-00-000-0000**
☐	**6273**	**CDP**	**No validado**	**16.000.000.000 COP**	**16.000.000.000 COP**	**00-00-00-000**

Saldo de CDP 35.903.410.130 COP
Saldo de vigencias futuras 14.275.558.637 COP
Saldo total a comprometer 47.861.895.281 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición d
☐	**7142**	**Presupuestal (CDP)**	**-**	**No validado**	**19.903.410.130 COP**	**19.903.410.130 COP**	**-**	**-**

Saldo de compromisos CDP 19.903.410.130 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.903.410.130 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 129
UTC -5 6:55:26
MUNICIPIO DE PERE...
Subasta electrónic | Directorio SECOP | Procesos | Contratos | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos →

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.12021907
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2825109
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	5 minutos de tiempo transcurrido *(31/07/2023 6:49:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Teniendo en cuenta la justificación aportada por el contratista y que la misma fue avalada por la interventoría, la entidad procede a modificar el plazo y valor del presente contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN.pdf	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN.pdf	(detalle)
AVAL INTERVENTORÍA.pdf	AVAL INTERVENTORÍA.pdf	(detalle)
Oficio a Alcalde PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 1..pdf	Oficio a Alcalde PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 1..pdf	(detalle)
CDP 6273 CONVENIENCIA 6457 ADICION PRORROGA AV CERRITOS.pdf	CDP 6273 CONVENIENCIA 6457 ADICION PRORROGA AV CERRITOS.pdf	(detalle)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Vol… rimir Modificar < >

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.12021907	Modificar el contrato	28/07/2023 11:21 AM *(UTC -5 horas)*	31/07/2023 6:49 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.11134240	Modificar el contrato	9/05/2023 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	10/05/2023 9:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10613231	Modificar el contrato	23/02/2023 9:23 PM *(UTC -5 horas)*	23/02/2023 10:39 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10531301	Reactivar el contrato	13/02/2023 7:43 AM *(UTC -5 horas)*	23/02/2023 9:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10391606	Suspender el contrato	21/01/2023 11:46 AM *(UTC -5 horas)*	21/01/2023 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10386137	Modificar el contrato	20/01/2023 1:04 PM *(UTC -5 horas)*	20/01/2023 1:09 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	

Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 129
UTC -5 6:55:49
MUNICIPIO DE PERE...
Subasta electrónic | Directorio SECOP | Procesos | Contratos | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos →

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 5 horas para terminar *(31/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 28/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 25/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - ADICIÓN 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN 1.

Campo 1 - ADICIÓN 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - ADICIÓN 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - ADICIÓN 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 16.000.000.000,00.

Campo 1 - ADICIÓN 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 16.000.000.000,00.

El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 31.861.895.281,00 hasta 47.861.895.281,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 31.861.895.281,00 hasta 47.861.895.281,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 19903410130.000000 hasta 35903410130.000000

Reconocido por el proveedor *JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL 28-07-2023 19:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Daniela Robledo Giraldo 28-07-2023 11:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

MILTON HURTADO GARCIA 28-07-2023 15:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volv | rimir | Modificar | < | >

Modifi

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.12021907	Modificar el contrato	28/07/2023 11:21 AM *(UTC -5 horas)*	31/07/2023 6:49 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.11134240	Modificar el contrato	9/05/2023 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	10/05/2023 9:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10613231	Modificar el contrato	23/02/2023 9:23 PM *(UTC -5 horas)*	23/02/2023 10:39 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10531301	Reactivar el contrato	13/02/2023 7:43 AM *(UTC -5 horas)*	23/02/2023 9:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10391606	Suspender el contrato	21/01/2023 11:46 AM *(UTC -5 horas)*	21/01/2023 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10386137	Modificar el contrato	20/01/2023 1:04 PM *(UTC -5 horas)*	20/01/2023 1:09 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Pereira, 28 de Agosto de 2023
Ingeniero:
Milton Hurtado

Secretario de Infraestructura Pereira

REFERENCIA: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental al contrato de construcción de la primera fase de la conexión avenida Las Américas, zona de expansión occidental cerritos, desde la intersección Condina Km 0+00 (Av. Las Américas) hasta el Km 3+400 (sector El Tigre) y obras complementarias". Contrato de Interventoría N°5116 de 2021

ASUNTO: Autorización nueva cuenta Consorcio Prosperidad vial Cerritos.

Cordial saludo,

Me permito informar que el Consorcio Prosperidad Vial Cerritos, por intermedio de su representante legal ingeniero **CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR**, contratista contrato de obra Nº 4812 de 2021, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", ha presentado, solicitud de cambio de cuenta para el pago de sus respectivas actas a la cuenta corriente del banco Caja Social No 21004227835 perteneciente al consorcio Prosperidad Vial cerritos con Nit No 901.517.172-7.

En virtud de lo anterior esta interventoría autoriza el pago de las respectivas actas en dicha cuenta.
Adjunto a la presente comunicación: - oficio solicitud remitido por el contratista.

Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal
Representante Legal, Director de Interventoría
CONSORCIO CABA INTERVÍAS
Contrato de Interventoría N°5116 de 2021

Anexo 1:	Verificación de compromisos al 30 de junio (6 folios).

Original 1:	Archivo Central Dirección Técnica
Copia Controlada 1:	Alcaldía, Contratista
Copia Controlada 2:	Archivo de Calidad Interventoría.

Para contactarnos email: ccabaintervias.intv.51162021@gmail.com

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Pereira, Risaralda 26 de agosto de 2023

CPVC-702-23

Señores:
CONSORCIO CABA INTERVIAS
Atn: Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal
Director de Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 4812 de 2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS".

Asunto: **SOLICITUD CAMBIO DE CUENTA PARA PAGO DE FACTURAS DEL ACTA N°12.**

Respetado Señor:

Por medio de la presente realizamos solicitud de aprobación, de que el pago de las facturas FVE-24, FVE-25 y FVE-27 pertenecientes al acta de obra 12 del contrato de la referencia, sea realizado a la cuenta corriente del Banco Caja Social número 21004227835 perteneciente a CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con NIT 901.517.172-7, como aparece en el certificado adjunto.

Cordialmente,

Carlos Guillermo Suarez Escobar
Representante legal (S)
Consorcio Prosperidad Vial Cerritos

Elaboró:
Revisó: Gerente Técnica (MC)
Aprobó: Representante legal (CSE)
Folios: 53
Anexos: Documentos relacionados

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS *Identificado con* *NI9015171727*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0039 AVENIDA CHILE, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21004227835*
Fecha de Apertura	:	*25 de agosto de 2023*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN CORRESPONDA
Realizada en la oficina 0039 AVENIDA CHILE de la ciudad de BOGOTA, el dia viernes, 25 de agosto de 2023.

Cordialmente,

Efectuado por:
L2O3N9R3 - LAURA ORTIZ

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

Noviembre 2013 Ver 2.00

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023			ACTA No 12			ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial				Cant.	Vr. Parcial
			EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES											
1.1			Demolición de pavimento flexible	m2	4000	$ 13,181.00	$ 52,724,000.00	1020.71	$ 13,454,019.00				623.91	$ 8,223,757.71
1.2			Demolición manual de andenes	m2	150	$ 10,964.00	$ 1,644,600.00	20.00	$ 219,280.00				10.40	$ 114,025.60
1.3			Demolición de viviendas- Inc cargue + retiro + mat sob	m2	2000	$ 60,059.00	$ 120,118,000.00	1818.04	$ 109,189,658.00	151.07	$	9,073,113.13	1,126.02	$ 67,627,635.18
1.4			Demol estructuras varias de concreto reforzado	m3	15	$ 274,092.00	$ 4,111,380.00	59.64	$ 16,347,011.00	2.44	$	668,510.39	37.02	$ 10,146,145.79
1.5			Demol cuerpo cámara de inspección Ø=1.2 m	m3	10	$ 274,092.00	$ 2,740,920.00	0.00	$ -				0.00	$ -
1.6			Demol cerramiento malla y muro	m	461	$ 11,381.00	$ 5,246,641.00	474.54	$ 5,400,688.00				216.55	$ 2,464,555.55
1.7			Desmonte de cerramiento Swinglea y cerco	m	2680	$ 7,113.00	$ 19,062,840.00	0.00	$ -				0.00	$ -
1.8			Demolicion de portadas	Un	6	$ 71,134.00	$ 426,804.00	7.05	$ 501,494.00	3.00	$	213,402.00	5.00	$ 355,670.00
1.9			Campamento (tabla +teja Ac+ piso)	m2	210	$ 179,181.00	$ 37,628,010.00	437.10	$ 78,320,015.00				210.00	$ 37,628,010.00
1.10			Red provisional de agua	m	500	$ 19,335.00	$ 9,667,500.00	12.69	$ 245,362.00				9.00	$ 174,015.00
1.11			Red provisional eléctrica	m	500	$ 13,128.00	$ 6,564,000.00	2615.23	$ 34,332,682.00				1,854.77	$ 24,349,420.56
1.12			Valla informativa instalada	m2	32	$ 127,161.00	$ 4,069,152.00	61.73	$ 7,849,623.00				43.78	$ 5,567,109.00
1.13			Cerramiento provisional con tela verde	m	500	$ 11,416.00	$ 5,708,000.00	3132.46	$ 35,760,117.00				1,221.60	$ 13,945,785.20
1.14			Corte mecánico placas y pavimentos de concreto asfatic	m	100	$ 9,527.00	$ 952,700.00	118.02	$ 1,124,347.00				33.70	$ 321,059.90
1.15			Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Descapote)	m3	55620	$ 9,190.00	$ 511,147,800.00	122260.02	$ 1,123,569,588.00	16987.95	$	156,119,260.50	119,677.75	$ 1,099,838,522.50
			SUBTOTAL				**$ 781,812,347.00**	0.00	**$ 1,426,313,884.00**		**$**	**166,074,286.02**	0.00	**$ 1,270,755,711.99**
			AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES					**0.00**					0.00	$ -
2.1			Afirmado	m3	112	$ 79,091.00	$ 8,858,192.00	390.80	$ 30,908,762.00				0.00	$ -
2.2			Subbase granular tipo INVIAS	m3	24602	$ 140,414.00	$ 3,454,465,228.00	18190.01	$ 2,554,132,345.00	986.32	$	138,493,136.48	13,198.72	$ 1,853,285,069.88
2.3			Base granular tipo INVIAS	m3	8201	$ 163,432.00	$ 1,340,305,832.00	14834.74	$ 2,424,471,065.00	500.00	$	81,716,000.00	8,629.60	$ 1,410,352,787.20
2.4			Mejoramiento de la subrasante con afirmado	m3	2100	$ 84,646.00	$ 177,756,600.00	12900.19	$ 1,091,949,416.00	1130.62	$	95,702,460.52	11,913.98	$ 1,008,470,751.68
			SUBTOTAL				**$ 4,981,385,852.00**	0.00	**$ 6,101,461,588.00**		**$**	**315,911,597.00**	0.00	**$ 4,272,108,608.76**
			PAVIMENTOS ASFALTICOS					**0.00**					0.00	$ -
3.1			Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	53682	$ 2,627.00	$ 141,022,614.00	64958.00	$ 170,644,666.00		$	-	18,928.50	$ 49,725,169.50
3.2			Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte) (m3)	m3	4551	$ 800,014.00	$ 3,640,863,714.00	3548.97	$ 2,839,223,126.00	500.00	$	400,007,000.00	1,549.50	$ 1,239,621,693.00
			SUBTOTAL				**$ 3,781,886,328.00**	0.00	**$ 3,009,867,792.00**		**$**	**400,007,000.00**	0.00	**$ 1,289,346,862.50**
			MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS					**0.00**					0.00	$ -
4.1			Excavación sin clasificar de la explanación y canales mec	m3	116574	$ 9,190.00	$ 1,071,315,060.00	202947.70	$ 1,865,089,364.00	16299.20	$	149,789,648.00	114,699.62	$ 1,054,089,508.00
4.2			Muro mecánicamente establizado con material del sitio	m3	24551	$ 48,544.00	$ 1,191,803,744.00	168.84	$ 8,196,170.00		$	-	168.84	$ 8,196,168.96
4.3			Muro mecánicamente establizado con material tranportado	m3	6138	$ 84,180.00	$ 516,696,840.00	10166.85	$ 855,845,205.00	1543.00	$	129,889,740.00	7,896.30	$ 664,710,534.00
4.4			Lleno material común mec	m3	67706	$ 13,050.00	$ 883,563,300.00	149591.79	$ 1,952,172,859.00	12197.41	$	159,176,200.50	148,989.20	$ 1,944,309,032.50
4.5			Instal Geotextil TR3000 o similar	m2	76045	$ 6,285.00	$ 477,942,825.00	11894.00	$ 74,753,790.00	905.40	$	5,690,439.00	3,951.22	$ 24,833,417.70
4.6			Instal Geotextil T2400 o similar	m2	77419	$ 3,142.00	$ 243,250,498.00	1250.00	$ 3,927,500.00	163.40	$	513,402.80	1,211.22	$ 3,805,653.24
4.7			Geodrén Vial o similar	m	1937	$ 49,779.00	$ 96,421,923.00	698.25	$ 34,758,187.00	40.00	$	1,991,160.00	438.25	$ 21,815,646.75
4.8			Geodrén Planar H:1.0m (Espaldón) o similar	m	3882	$ 52,563.00	$ 204,049,566.00	3067.75	$ 161,250,144.00		$	-	668.00	$ 35,112,084.00
4.9			Geodrén Planar H:0.5m (lloraderos) o similar	m	18438	$ 30,991.00	$ 571,412,058.00	2219.00	$ 68,769,028.00	31.00	$	960,721.00	367.20	$ 11,379,895.20
4.10			Manto permanente TRM500 o similar	m2	5210	$ 24,899.00	$ 129,723,790.00	777.00	$ 19,346,523.00		$	-	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 5,386,179,604.00**	0.00	**$ 5,044,108,770.00**		**$**	**448,011,311.30**	0.00	**$ 3,768,251,940.35**
			ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS					**0.00**					0.00	$ -
5.1			Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	350	$ 8,197.00	$ 2,868,950.00	159748.48	$ 1,309,458,291.00	35130.35	$	287,963,478.95	124,736.83	$ 1,022,467,795.51
			SUBTOTAL				**$ 2,868,950.00**	0.00	**$ 1,309,458,291.00**		**$**	**287,963,478.95**	0.00	**$ 1,022,467,795.51**
			DRENAJES Y OBRAS DE ARTE					**0.00**					0.00	$ -
6.1			Excavación manual en tierra de 0 a 2 m	m3	703	$ 26,104.00	$ 18,351,112.00	19186.68	$ 500,849,047.00	1024.94	$	26,755,033.76	12,875.01	$ 336,089,344.19
6.2			Excavación manual en tierra de 2 a 4 m	m3	5	$ 34,262.00	$ 171,310.00	2044.73	$ 70,056,388.00	148.18	$	5,076,943.16	1,244.64	$ 42,643,855.80
6.3			Excavacion manual en conglomerado de 0-2 m	m3	445	$ 39,157.00	$ 17,424,865.00	0.00	$ -		$	-	0.00	$ -
6.4			Excavación manual en conglomerado bajo agua 0-2	m3	24	$ 65,760.00	$ 1,578,240.00	0.00	$ 1.00		$	-	0.00	$ -
6.5			Excavacion manual en conglomerado bajo agua de 2-4 m	m3	3	$ 74,979.00	$ 224,937.00	0.00	$ -		$	-	0.00	$ -
6.6			Entibado para excavaciones profundidad mayor a 1.5 m.	m2	149	$ 66,450.00	$ 9,901,050.00	0.00	$ 1.00		$	-	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
6.7			Trincho permanente para conformacion de terreno	m2	6	$ 67,442.00	$ 404,652.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.8			Lleno compactado manual con material del sitio	m3	3303	$ 35,711.00	$ 117,953,433.00	18190.75	$ 649,609,874.00	246.80	$ 8,813,474.80	7,806.05	$ 278,761,851.85
6.9			Lleno en piedra filtro y geotextil para lecho filtrante en cimentacion de tuberia, no incluye transporte	m3	260	$ 153,743.00	$ 39,973,180.00	792.11	$ 121,781,337.00	-1370.08	$ (210,640,209.44)	596.10	$ 91,646,202.80
6.10			Lleno con arena	m3	356	$ 132,067.00	$ 47,015,852.00	1339.50	$ 176,903,746.00	20.40	$ 2,694,166.80	839.56	$ 110,878,170.62
6.11			Lleno con triturado de combia Ø=3/4" para soporte de tuberia PVC	m3	426	$ 103,443.00	$ 44,066,718.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.12			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 250 mm, exterior corrugado. S8	m	1060	$ 101,409.00	$ 107,493,540.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.13			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 315 mm, exterior corrugado. S8	m	1122	$ 144,003.00	$ 161,571,366.00	2931.38	$ 422,126,923.00	58.25	$ 8,388,174.75	1,288.95	$ 185,612,666.45
6.14			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 355 mm, exterior corrugado. S8	m	378	$ 200,432.00	$ 75,763,296.00	520.26	$ 104,277,113.00	35.00	$ 7,015,120.00	348.60	$ 69,870,595.20
6.15			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 400 mm, exterior corrugado. S8	m	313	$ 245,911.00	$ 76,970,143.00	168.50	$ 41,434,773.00		$ -	0.00	$ -
6.16			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 450 mm, exterior corrugado. S8	m	201	$ 313,380.00	$ 62,989,380.00	138.16	$ 43,295,954.00	40.20	$ 12,597,876.00	124.00	$ 38,859,120.00
6.17			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 500 mm, exterior corrugado. S8	m	255	$ 403,433.00	$ 102,875,415.00	310.23	$ 125,156,293.00		$ -	122.80	$ 49,541,572.40
6.18			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 600 mm, exterior corrugado. S8	m	81	$ 614,116.00	$ 49,743,396.00	664.11	$ 407,840,576.00	166.00	$ 101,943,256.00	637.00	$ 391,191,892.40
6.19			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 675 mm, exterior corrugado	m	16	$ 698,384.00	$ 11,174,144.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.20			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 825 mm, exterior corrugado	m	75	$ 1,243,900.00	$ 93,292,500.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.21			Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	37	$ 424,830.00	$ 15,718,710.00	32.43	$ 13,777,236.00	2.00	$ 849,660.00	13.00	$ 5,522,790.00
6.22			Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	3	$ 873,155.00	$ 2,619,465.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.23			Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	2	$ 1,027,332.00	$ 2,054,664.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.24			Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	m	93	$ 571,215.00	$ 53,122,995.00	97.29	$ 55,573,506.00	22.00	$ 12,566,730.00	46.40	$ 26,504,376.00
6.25			Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	11	$ 862,446.00	$ 9,486,906.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.26			Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	8	$ 963,232.00	$ 7,705,856.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.27			Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	37	$ 850,059.00	$ 31,452,183.00	52.17	$ 44,347,578.00		$ -	0.00	$ -
6.28			Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	3	$ 1,066,247.00	$ 3,198,741.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.29			Losa para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	2	$ 1,247,556.00	$ 2,495,112.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.30			Suministro e instalacion tapa en Hierro fundido tipo Jota gallo o similar	Un	38	$ 920,715.00	$ 34,987,170.00	81.78	$ 75,296,072.00		$ -	0.00	$ -
6.31			Pasos de acero de refuerzo 3/4" Fy=420 Mpa incluye anticorrosivo	Un	296	$ 24,062.00	$ 7,122,352.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.32			Sumidero doble, incluye rejas y acero de refuerzo	Un	57	$ 2,418,180.00	$ 137,836,260.00	49.07	$ 118,655,255.00		$ -	0.00	$ -
6.33			Sumidero vertical o de ventana apertura L=1.5 m	Un	18	$ 1,429,781.00	$ 25,736,058.00	32.71	$ 46,770,995.00		$ -	0.00	$ -
6.34			Cunetas en ccto C20.7 Mpa. Desarrollo L=1,3 Esp.=0,10 m Incl. Malla electrosoldada 15*15 Ø=5mm.	m	500	$ 135,645.00	$ 67,822,500.00	141.00	$ 19,125,945.00		$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
6.35			Cuneta en geomembrana en geotextil+reforzado con polimero B=0.35 m; incluye eexcavacion y perfilado de terreno y anclaje de la geomembrana	m	154	$ 53,675.00	$ 8,265,950.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.36			Concreto de 24,5 MPa para cabezote en concreto reforzado. No incluye acero de refuerzo	m3	7	$ 858,065.00	$ 6,006,455.00	6.35	$ 5,444,422.00		$ -	0.00	$ -
6.37			Concreto C20.7 Mpa para recubrimiento de gaviones e=0,10 m	m3	2	$ 550,306.00	$ 1,100,612.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.38			Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena	m3	4	$ 191,137.00	$ 764,548.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.39			Control/manejo de aguas quebrada tablestacado madera	m2	2	$ 132,895.00	$ 265,790.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.40			Filtro tipo frances 0.60x0.60 con tuberia de drenaje de Ø=100 mm	m	329	$ 106,151.00	$ 34,923,679.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.41			Filtro tipo frances 0.40x0.40 con tuberia de drenaje de Ø=65 mm	m	56	$ 77,741.00	$ 4,353,496.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 1,495,978,031.00**	0.00	**$ 3,042,323,040.00**		**$ (23,939,774.17)**	0.00	**$ 1,627,122,437.71**
			REDES ELECTRICAS					**0.00**			**$ -**	0.00	$ -
7.1			Apoyo Primario SDCC2 - Suspension Doble Cruceta al Centro 13.2 kv, Poste de 14 m x 1050 kg	Un	2	$ 4,020,885.00	$ 8,041,770.00	4.00	$ 16,083,540.00		$ -	0.00	$ -
7.2			Apoyo Primario Red Compacta TDCC2 - Terminal Doble Cruceta al Centro 13.2 kv, Poste 12 m x 750 kg	Un	1	$ 2,937,004.00	$ 2,937,004.00	2.00	$ 5,874,008.00		$ -	0.00	$ -
7.3			Apoyo Primario SDCC2 - Suspension Doble Cruceta al Centro 13.2 kv, Sin Poste	Un	2	$ 1,312,522.00	$ 2,625,044.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.4			Apoyo Primario TDCC2 - Terminal Doble Cruceta al Centro 13.2 kv	Un	2	$ 1,542,118.00	$ 3,084,236.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.5			Barraje de Puesta a Tierra en Camaras. Barra de Cobre 3/8"x1.1/2"x0.5m	JG	2	$ 305,298.00	$ 610,596.00	20.00	$ 6,105,960.00		$ -	0.00	$ -
7.6			Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión, Norma EEP	Un	2	$ 3,195,418.00	$ 6,390,836.00	22.00	$ 70,299,196.00		$ -	20.70	$ 66,145,152.20
7.7			Barraje Elastomerico 15 kv - 200 A Cable - 4 Vias	JG	1	$ 5,707,824.00	$ 5,707,824.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.8			Canalizacion Ducto Conduit PVC 2ø4" TDP en Tierra	m	60	$ 140,128.00	$ 8,407,680.00	30.00	$ 4,203,840.00		$ -	0.00	$ -
7.9			Punto Transformador 2ø En Collarin - 13.2 kv	Un	3	$ 1,815,544.00	$ 5,446,632.00	2.00	$ 3,631,088.00		$ -	0.00	$ -
7.10			Red Aerea 3x1/0 ACSR Semiaislado (Ecologico) 13.2 kv	m	350	$ 53,382.00	$ 18,683,700.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.11			Terminal Premoldeado Exterior 15 Kv, Tipo QT-III Cable 2 a 4/0 AWG, Pantalla de Cinta de Cobre	JG	2	$ 2,153,226.00	$ 4,306,452.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.12			Transformador 1ø 15 Kva, 13.2 kv-240/120 v, Inmerso en aceite	Un	3	$ 3,955,528.00	$ 11,866,584.00	2.00	$ 7,911,056.00		$ -	0.00	$ -
7.13			Crucero Portacajas 3ø Centrado (Partidor 3ø)- CPC2 - 13.2 kv	Un	3	$ 1,203,088.00	$ 3,609,264.00	20.00	$ 24,061,760.00	1.00	$ 1,203,088.00	11.00	$ 13,233,968.00
7.14			Templete Directo a Tierra 13.2 kV- T2	Un	6	$ 366,956.00	$ 2,201,736.00	23.00	$ 8,439,988.00	2.00	$ 733,912.00	11.00	$ 4,036,516.00
7.15			Acometida 3 x XLP No. 1/0 AWG, 15 kv 133% Sin Ducto	m	85	$ 212,925.00	$ 18,098,625.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.16			Gabinete Instalacion de Medidor de Energia Lectura Directa. Instalacion es Poste. Medidor AP	Un	3	$ 888,965.00	$ 2,666,895.00	3.00	$ 2,666,895.00		$ -	0.00	$ -
7.17			Medidor Electronico 2ø, 220/120 v/20-80 A, Lectura Directa	Un	3	$ 344,025.00	$ 1,032,075.00	3.00	$ 1,032,075.00		$ -	0.00	$ -
7.18			Ducto Conduit PVC 2ø2" DB, Enterrado a Profundidad de 0.80 m.	m	7400	$ 46,534.00	$ 344,351,600.00	5604.87	$ 260,817,020.00	220.00	$ 10,237,480.00	1,535.87	$ 71,470,175.00
7.19			Acometida 2xNo.4(F)+1xNo. 4(T) Aluminio Serie 8000, Sin Ducto	m	30	$ 15,394.00	$ 461,820.00	30.00	$ 461,820.00		$ -	0.00	$ -
7.20			Acometida Alumnio Serie 8000 2xNo.2(F)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	m	7050	$ 29,257.00	$ 206,261,850.00	3500.00	$ 102,399,500.00		$ -	43.00	$ 1,258,051.00
7.21			Bajante Galvanizado 2" x 6 m.	Un	3	$ 279,771.00	$ 839,313.00	3.00	$ 839,313.00		$ -	0.00	$ -

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
7.22			Camara en Concreto 40x40x50 Cm libre En Prado y Tapa en Concreto con Marco en Angulo	Un	163	$ 343,593.00	$ 56,005,659.00	162.00	$ 55,662,066.00	2.00	$ 687,186.00	17.00	$ 5,841,081.00
7.23			Base de Concreto y Anclajes Para Poste Metalico de 12 m. Incluye los Pernos de Anclaje	Un	163	$ 374,942.00	$ 61,115,546.00	162.00	$ 60,740,604.00		$ -	0.00	$ -
7.24			Puesta a Tierra de Postes y Mastiles Metalicos. Cable de Cobre No. 6 a Liena de Tierra de la Red de AP	Un	163	$ 20,044.00	$ 3,267,172.00	28.00	$ 561,232.00		$ -	0.00	$ -
7.25			Instal Poste Metalico 12 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 1 Brazo de 2.5 m x 2"	Un	90	$ 187,388.00	$ 16,864,920.00	75.00	$ 14,054,100.00		$ -	0.00	$ -
7.26			Instal Poste Metalico 13 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 2 Brazo de 2.5 m x 2"	Un	73	$ 187,388.00	$ 13,679,324.00	75.00	$ 14,054,100.00		$ -	0.00	$ -
7.27			Instal Luminaria Avento 1 (Schreder), 192 Leds, 141 W, 233 mA, 18673 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Stan	Un	81	$ 250,870.00	$ 20,320,470.00	75.00	$ 18,815,250.00		$ -	0.00	$ -
7.28			Instal Luminaria Avento 1 (Schreder), 144 Leds, 106 W, 233 mA, 14000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Un	82	$ 250,870.00	$ 20,571,340.00	75.00	$ 18,815,250.00		$ -	0.00	$ -
7.29			Instal Luminaria Avento 1 (Schreder), 96 Leds, 71 W, 233 mA, 9000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Un	73	$ 250,870.00	$ 18,313,510.00	75.00	$ 18,815,250.00		$ -	0.00	$ -
7.30			Conector Para Empalme de Derivación GEL Marca TYCO GHFC1-90	Un	780	$ 47,040.00	$ 36,691,200.00	600.00	$ 28,224,000.00		$ -	0.00	$ -
7.31			Mástil de 14 m Tres cuerpos, en acero inoxidable en caliente, incluye canastilla redonda para 9 reflectores, escalerilla de ascenso y guaya para instalación de línea de vida a partir de 8 m	Un	3	$ 16,776,983.00	$ 50,330,949.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.32			Reflector Induflood 3 (Schreder) 88 leds 60 mA 250 W	Un	24	$ 2,662,028.00	$ 63,888,672.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.33			Construcción base concreto de 1x1x 2m 3000PSI (para el mástil de 14 m con canastilla, según estudio de suelos). Incluye los Pernos de Anclaje	Un	2	$ 2,327,643.00	$ 4,655,286.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.34			Sistema de Tele Gestion - Owlet IoT -INCLUYE: Se Puede Acceder desde cualquier parte del mundo y desde cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil conectado a Internet.	Un	260	$ 1,305,546.00	$ 339,441,960.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.35			Desmonte Estructura Primaria Completa. Incluye Postes y Entrega a E.E.P. en Lugar que Esta lo Indique. No incluye Poste	Un	8	$ 599,829.00	$ 4,798,632.00	14.00	$ 8,397,606.00		$ -	0.00	$ -
7.36			Desmonte Retenida Tipo Templete T2, T3	Un	9	$ 72,656.00	$ 653,904.00	28.00	$ 2,034,368.00	5.00	$ 363,280.00	14.00	$ 1,017,184.00
7.37			Desmonte de Poste de Concreto 10 - 14 M Y entrega a la EEPP donde esta lo Indique	Un	8	$ 679,534.00	$ 5,436,272.00	20.00	$ 13,590,680.00		$ -	5.00	$ 3,397,670.00
7.38			Desmonte Red Aerea 3ø ACSR No. 1/0 AWG. Se entrega a la EEPP	m	350	$ 9,674.00	$ 3,385,900.00	2285.00	$ 22,105,090.00		$ -	35.00	$ 338,590.00
7.39			Traslado de redes domiciliarias acometidas electricas	m	500	$ 14,839.00	$ 7,419,500.00	450.00	$ 6,677,550.00		$ -	0.00	$ -
7.40			Derechos en Favor de la EEPP Por Suspensiones de Energia	Un	1	$ 2,211,863.00	$ 2,211,863.00	14.00	$ 30,966,082.00		$ -	6.00	$ 13,271,178.00
7.41			Derechos Inspeccion con Fines de Certificacion RETIE	Un	1	$ 4,915,251.00	$ 4,915,251.00	2.00	$ 9,830,502.00		$ -	0.00	$ -
7.42			Derechos Inspeccion Con Fines de Certificacion RETILAP	Un	1	$ 4,915,251.00	$ 4,915,251.00	2.00	$ 9,830,502.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 1,396,514,117.00**	0.00	**$ 848,001,291.00**		**$ 13,224,946.00**	0.00	**$ 180,009,565.20**
			SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					0.00			**$ -**	0.00	$ -
8.1			Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	31697	$ 5,451.00	$ 172,780,347.00	21808.63	$ 118,878,842.00		$ -	0.00	$ -

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
8.2			Pintura tráfico cruces y marcas viales	m2	4284	$ 52,207.00	$ 223,654,788.00	2102.00	$ 109,739,113.00		$ -	0.00	$ -
8.3			Señal reglamentaria reflectivo Tipo XI D=0.75 m	Un	114	$ 346,703.00	$ 39,524,142.00	160.74	$ 55,729,040.00		$ -	0.00	$ -
8.4			Señal preventiva reflectivo Tipo XI D=0.75 m	Un	50	$ 346,703.00	$ 17,335,150.00	70.50	$ 24,442,561.00		$ -	0.00	$ -
8.5			Señal informativa	Un	42	$ 346,703.00	$ 14,561,526.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
8.6			Baranda de proteccion tipo 1 (6 hilos)	m	500	$ 671,724.00	$ 335,862,000.00	132.00	$ 88,667,568.00		$ -	0.00	$ -
8.7			Defensa metalica	m	1000	$ 153,702.00	$ 153,702,000.00	564.00	$ 86,687,928.00		$ -	0.00	$ -
8.8			Seccion final	Un	50	$ 67,659.00	$ 3,382,950.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
8.9			Pasacalle tela 6.00 m X 0.90 m	Un	4	$ 601,223.00	$ 2,404,892.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.10			Tachas reflectivas para ciclobanda	Un	1272	$ 18,625.00	$ 23,691,000.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
8.11			Señal luminosa intermitente (flasher)	Un	200	$ 594,299.00	$ 118,859,800.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
8.12			Barricada seguridad Desmontab L=3 m	Un	100	$ 517,474.00	$ 51,747,400.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.13			Cono vial tipo INVÍAS	Un	300	$ 62,563.00	$ 18,768,900.00	12.69	$ 793,925.00		$ -	9.00	$ 563,067.00
8.14			Cinta plastica seguridad cal 6	m	20000	$ 360.00	$ 7,200,000.00	2703.99	$ 973,435.00		$ -	1,917.72	$ 690,379.00
8.15			Señal preventiva reflectiva L=0.6 m	Un	70	$ 330,316.00	$ 23,122,120.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.16			Malla reflectiva color naranja h=1.0m	m	1000	$ 8,525.00	$ 8,525,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.17			Delineador tubular entre 1-1.4 m	Un	2115	$ 45,119.00	$ 95,426,685.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.18			Personal pare y siga vial	mes	48	$ 2,055,684.00	$ 98,672,832.00	5.09	$ 10,463,638.00		$ -	3.61	$ 7,421,020.00
8.19			Controlador de tránsito (dos personas)	mes	24	$ 4,644,912.00	$ 111,477,888.00	38.56	$ 179,124,063.00	3.00	$ 13,934,736.00	29.35	$ 136,328,167.20
			SUBTOTAL				**$ 1,520,699,420.00**	0.00	**$ 675,500,117.00**		**$ 13,934,736.00**	0.00	**$ 145,002,633.20**
			OBRAS VARIAS					**0.00**					$ -
9.1			Paso aereo Fauna	m	123	$ 1,254,491.00	$ 154,302,393.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9.2			Gavión con Malla triple torsión C13 ojo 9X9	m3	16	$ 263,938.00	$ 4,223,008.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9.3			Enrocado/Pedraplen concreto f'c 24 Mpa (3.000 psi), Piedra 60% Ø 0,20-,30 m,	m3	3	$ 335,539.00	$ 1,006,617.00	1.00	$ 335,539.00		$ -	0.00	$ -
9.4			Sardinel prefabricado 80x45x15 cm	m	14202	$ 87,619.00	$ 1,244,365,038.00	12640.00	$ 1,107,504,160.00	3306.35	$ 289,699,080.65	6,591.65	$ 577,553,781.35
9.5			Vena bordillo dilatac c21.7 Mpa piso 15x10 cm	m	9160	$ 50,922.00	$ 466,445,520.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.6			Anden en concreto e=10cm	m2	17216	$ 63,063.00	$ 1,085,692,608.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.7			Concreto estampado para andenes colores variados	m2	5262	$ 104,426.00	$ 549,489,612.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9.8			Señales podotáctiles (losetas linea guia)	m	6440	$ 25,448.00	$ 163,885,120.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9.9			Señales podotáctiles (losetas linea alerta)	m	207	$ 40,024.00	$ 8,284,968.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.10			Rampa en concreto 20.7 mpa acceso cebras	m2	545	$ 82,140.00	$ 44,766,300.00	190.35	$ 15,635,350.00		$ -	0.00	$ -
9.11			Sum e instal de rebajes (Pañoletas) prefabricadas tipo Titan A-105, incluye mortero 5 cm	Un	184	$ 52,200.00	$ 9,604,800.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9.12			Paradero - Mogador	Un	10	$ 11,161,952.00	$ 111,619,520.00	8.00	$ 89,295,616.00		$ -	0.00	$ -
9.13			Basurero urbano en acero inoxidable	m	34	$ 732,259.00	$ 24,896,806.00	25.00	$ 18,306,474.00		$ -	0.00	$ -
9.14			Bolardo en hierro fundido tipo M-63	Un	58	$ 434,887.00	$ 25,223,446.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.15			Contenedor de raiz + alcorque	Un	49	$ 2,402,101.00	$ 117,702,949.00	0.00	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.16			Contenedor de raiz oculto sin alcorque	Un	336	$ 1,234,729.00	$ 414,868,944.00	53.67	$ 66,267,905.00		$ -	0.00	$ -
9.17			Empradización pasto tipo trenza	m2	35000	$ 9,694.00	$ 339,290,000.00	6768.00	$ 65,608,992.00		$ -	0.00	$ -
9.18			Siembra especies arbustivas jardinera	m2	3217	$ 14,745.00	$ 47,434,665.00	3217.00	$ 47,434,664.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 4,813,102,314.00**	0.00	**$ 1,410,388,705.00**		**$ 289,699,080.65**	0.00	**$ 577,553,781.35**
			TRANSPORTE					**0.00**					$ -
10.1			Transp mat de patio urbano 1 Km< distancia < 5 km	m3-km	688760	$ 1,323.00	$ 911,229,480.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
10.2			Transporte de materiales provenientes de la excavación	m3-km	309363	$ 1,402.00	$ 433,726,926.00	55405.81	$ 77,678,945.00		$ -	9,294.90	$ 13,031,449.80
10.3			Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3	720	$ 44,251.00	$ 31,860,720.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
10.4			Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3	1080	$ 42,200.00	$ 45,576,000.00	147831.73	$ 6,238,499,006.00	22084.34	$ 931,959,148.00	134,885.24	$ 5,692,157,128.00
			SUBTOTAL				**$ 1,422,393,126.00**	0.00	**$ 6,316,177,951.00**		**$ 931,959,148.00**	0.00	**$ 5,705,188,577.80**
			OBRAS COMPLEMENTARIAS (PUENTE ACCESO AL TIGRE)					**0.00**				0.00	$ -
			EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES				**$ -**	**0.00**				0.00	$ -
11.1			Descapote y limpieza manual (Incluye retiro)	m2	1200	$ 13,958.00	$ 16,749,600.00	0.00	$ -			0.00	$ -
11.2			Localización y replanteo para vías	m2	1200	$ 4,310.00	$ 5,172,000.00	0.00	$ 1.00			0.00	$ -
11.3			Localización y replanteo línea	m	400	$ 2,359.00	$ 943,600.00	0.00	$ -			0.00	$ -
11.4			Descapote a máquina hasta 30 cm (Incluye retiro)	m2	1500	$ 8,094.00	$ 12,141,000.00	0.00	$ -			0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 35,006,200.00**	0.00	**$ 1.00**			0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023			ACTA No 12			ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial					Cant.	Vr. Parcial
			PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ -**		**0.00**						0.00	$ -
12.1			Imprimante para demarcación vial	m2	1050	$ 11,652.00	$ 12,234,600.00		0.00	$ -					0.00	$ -
12.2			Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte) (m3)	m3	79	$ 800,014.00	$ 63,201,106.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 75,435,706.00**		0.00	**$ 1.00**					0.00	$ -
			EXCAVACIONES PARA CIMENTACION PROFUNDA						**0.00**						0.00	$ -
13.1			Cuña hidraulica	Un	20	$ 58,465.00	$ 1,169,300.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
13.2			Entibado continuo en madera	m2	250	$ 44,540.00	$ 11,135,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -
13.3			Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5	m2	250	$ 1,911.00	$ 477,750.00		0.00	$ -					0.00	$ -
13.4			Excavación caisson material común h> 12 m	m3	111	$ 323,138.00	$ 35,868,318.00		0.00	$ -					0.00	$ -
13.5			Excavación caisson material común rigido h> 12 m	m3	13	$ 323,138.00	$ 4,200,794.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
13.6			Excavación en roca para pila/caisson	m3	34	$ 371,810.00	$ 12,641,540.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
13.7			Excavación en roca bajo agua para pila/caisson	m3	22	$ 509,871.00	$ 11,217,162.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 76,709,864.00**		0.00	**$ 4.00**					0.00	$ -
			ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS						**0.00**						0.00	$ -
14.1			Conc C28 MPa estribos premezclado (Incluye viga de am	m3	118	$ 1,025,881.00	$ 121,053,958.00		0.00	$ -					0.00	$ -
14.2			Conc C24 MPa premezclado pilotes y caissons	m3	180	$ 444,706.00	$ 80,047,080.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.3			Viga en concreto de 28 MPa	m3	90	$ 919,712.00	$ 82,774,080.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.4			Concreto para vigas postensadas. f'c = 35MPa	m3	120	$ 1,040,868.00	$ 124,904,160.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.5			Placa maciza C20,7 prem puente	m3	60	$ 767,604.00	$ 46,056,240.00		0.00	$ -					0.00	$ -
14.6			Concreto barrera de proteccion vehicular f'c = 28MPa	m3	50	$ 1,038,617.00	$ 51,930,850.00		0.00	$ -					0.00	$ -
14.7			Concreto muro de acompañamiento f'c = 28MPa	m3	105	$ 949,001.00	$ 99,645,105.00		0.00	$ -					0.00	$ -
14.8			Anillo pila/caisson concreto 20.7 MPa Ø= 1.50 m y ref.	m	236	$ 441,205.00	$ 104,124,380.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.9			Apoyos elastoméricos reforzados 350x400x90. Dureza 60.	Un	4	$ 1,619,095.00	$ 6,476,380.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.10			Junta vehicular T-330	m	20	$ 2,530,277.00	$ 50,605,540.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.11			Rejillas	Un	6	$ 355,279.00	$ 2,131,674.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
14.12			Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	50000	$ 8,197.00	$ 409,850,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -
14.13			Acero Estructural ASTM A-588 GRADO E. fy= 350 MPa	kg	10000	$ 13,964.00	$ 139,640,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -
14.14			Acero de postensado de baja retraccion. Fpu=1860MPa	kg	12000	$ 9,290.00	$ 111,480,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 1,430,719,447.00**		0.00	**$ 7.00**					0.00	$ -
			SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**0.00**						0.00	$ -
15.1			Baranda de proteccion tipo 1 (6 hilos)	m	60	$ 671,724.00	$ 40,303,440.00		0.00	$ 1.00					0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 40,303,440.00**		0.00	**$ 1.00**					0.00	$ -
			TRANSPORTE				**$ -**		**0.00**						0.00	$ -
16.1			Transporte de materiales provenientes de la excavación	m3-km	180	$ 1,402.00	$ 252,360.00		0.00	$ -					0.00	$ -
16.2			Trans y disposición de basuras en relleno sanitario	m3-km	500	$ 1,712.00	$ 856,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -
16.3			Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3	250	$ 44,251.00	$ 11,062,750.00		0.00	$ -					0.00	$ -
16.4			Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3	500	$ 42,200.00	$ 21,100,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -
							$ 33,271,110.00		0.00	**$ -**					0.00	$ -
			OBRA NO PREVISTA				**$ -**		**0.00**						0.00	$ -
17.1			Limpieza y roceria de superficies	m2		$ 1,217.00	$ -		36323.15	$ 44,205,275.00					25,761.10	$ 31,351,259.00
17.2			Recuperación de la transitabilidad en vías de acceso y conformación de cunetas (No incluye suministro y transporte de material adicionado o sobrante)	m2		$ 4,337.00	$ -		182281.50	$ 790,554,864.00	3645.00	$	15,808,365.00		153,726.50	$ 666,711,830.90
17.5			Ortofotomosaico con resolución espacial centimétrica	Und		$ 26,045,828.00	$ -		1.00	$ 26,045,828.00		$	-		1.00	$ 26,045,828.00

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.6			Desmonte y reubicación de Poste de Concreto 10 - 16 M.	Un		$ 1,136,574.00	$ -	14.00	$ 15,912,036.00		$ -	8.00	$ 9,092,592.00
17.7			Desmonte,traslado y reconexión de transformador existente tipo poste 15kVA - 45kVA	Un		$ 1,638,067.00	$ -	7.00	$ 11,466,469.00		$ -	4.00	$ 6,552,268.00
17.8			Desmonte de conjunto existente en poste con herrajería según norma EEP.Entrega a la EEP donde ésta lo Indique	Un		$ 948,031.00	$ -	42.00	$ 39,817,302.00	11.00	$ 10,428,341.00	32.00	$ 30,336,992.00
17.9			Suministro e instalacion Terminal premoldeado 15KV, tipo exterior 250kcmil	Jgo		$ 885,501.00	$ -	21.00	$ 18,595,521.00		$ -	11.00	$ 9,740,511.00
17.10			Suministro e instalacion tuberia PVC, DB, 4 vias x Ø4" (No incluye excavación y lleno)	ml		$ 406,997.00	$ -	1304.70	$ 531,008,986.00	2.00	$ 813,994.00	266.70	$ 108,546,100.00
17.11			Suministro e Instalacion Afloramiento M.T, 15KV, tubo IMC 4' 'x 6m, sin cable, incluye bota termoencogible 3 salidas	Un		$ 2,226,661.00	$ -	21.00	$ 46,759,881.00		$ -	11.00	$ 24,493,271.00
17.12			Suministro e Instalacion Adaptador de tierra para conexión a terminal tipo codo, 600A, 15KV	Un		$ 1,382,456.00	$ -	222.00	$ 306,905,232.00		$ -	93.00	$ 128,568,408.00
17.13			Suministro e Instalacion de cable XLPE, #250kcmil Aluminio, 15KV, 133%	ml		$ 399,849.00	$ -	8400.00	$ 3,358,731,599.00		$ -	7,441.78	$ 2,975,588,291.45
17.14			Suministro y construccion Camara para barraje en anden, en concreto de 1,6x3,10x2,0 m con tapa de seguridad norma EEP y 2 tapas alfajor de 0,6x1,0 cal 1/4" cada una(incluye brechado y acabado) (segundetalle y norma EEP)	Un		$ 15,893,550.00	$ -	38.00	$ 603,954,900.00		$ -	17.70	$ 281,315,835.00
17.15			Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 15kV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, según norma EEP	Un		$ 12,025,180.00	$ -	26.00	$ 312,654,681.00	3.00	$ 36,075,540.00	13.00	$ 156,327,340.00
17.16			Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	Un		$ 1,512,288.00	$ -	29.00	$ 43,856,353.00		$ -	13.00	$ 19,659,744.00
17.17			Pruebas VLF	Un		$ 2,550,963.00	$ -	17.00	$ 43,366,372.00	3.00	$ 7,652,889.00	17.00	$ 43,366,371.00
17.18			Suministro e instalación de seccionadores monopolares 600 A, 15 kV tipo cuchilla.	Un		$ 2,417,253.00	$ -	6.00	$ 14,503,518.00		$ -	3.00	$ 7,251,759.00
17.19			Pruebas de resistencia de puesta a tierra tanto para los transformadores, como para las cámaras de barrajes.	Un		$ 487,773.00	$ -	7.00	$ 3,414,412.00	1.00	$ 487,773.00	3.00	$ 1,463,319.00
17.20			Instalación tubería PVC, TDP, 2 vías x Ø4" sistema de comunicaciones (No incluye excavación y lleno).	ml		$ 178,401.00	$ -	3600.00	$ 642,243,599.00	24.00	$ 4,281,624.00	945.50	$ 168,678,145.60
17.21			Suministro e instalación tuberia pvc, tdp, 4 vias x Ø4" (No incluye escavación y lleno)	ml		$ 361,671.00	$ -	2144.80	$ 775,711,962.00	224.30	$ 81,122,805.30	1,695.80	$ 613,321,682.40
17.23			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental) - alturas ≤ 5 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 295,503.00		80.37	$ 23,749,577.00		$ -	60.00	$ 17,730,180.00
17.24			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambietal) alturas 5,1 ≤ 10 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 583,508.00		372.24	$ 217,205,018.00		$ -	291.00	$ 169,800,828.00
17.25			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambietal) alturas 10,1 ≤ 15 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 1,079,794.00		132.54	$ 143,115,897.00		$ -	127.00	$ 137,133,838.00
17.26			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambietal) alturas ≥ 15 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 1,520,018.00		57.00	$ 86,641,026.00		$ -	48.00	$ 72,960,864.00

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.27			Tala guadua (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental). Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 17,759.00		1716.00	$ 30,474,444.00		$ -	1,220.00	$ 21,665,980.00
17.28			Destaconado individuos con clase diamétrica entre 10 y 30 cm	Un		$ 415,277.00		268.00	$ 111,294,236.00		$ -	268.50	$ 111,501,874.50
17.29			Destaconado individuos con clase diamétrica mayor que 30 y hasta 60cm	Un		$ 758,353.00		121.00	$ 91,760,713.00		$ -	100.00	$ 75,835,300.00
17.30			Destaconado individuos con clase diamétrica mayor que 60 y hasta 90cm	Un		$ 1,164,124.00		27.00	$ 31,431,348.00		$ -	23.00	$ 26,774,852.00
17.31			Destaconado individuos con clase diamétrica mayor que 90cm	Un		$ 2,374,740.00		9.00	$ 21,372,660.00		$ -	7.00	$ 16,623,180.00
17.32			Destaconado (retiro de rizomas) - incluye repicado, transporte y disposición final de residuos vegetales en sitios autorizados por la autoridad ambiental	Un		$ 39,955.00		1514.00	$ 60,491,871.00		$ -	1,182.00	$ 47,226,810.00
17.33			Erradicación de cerca viva con alturas entre 0.5 y 8m, incluye chipeado, transporte y dispisición de residuos vegetales en sitios autorizados por la autoridad ambiental	ml		$ 27,430.00		1240.00	$ 34,013,200.00		$ -	924.00	$ 25,345,320.00
17.34			Desmonte de rastrojos, pastizales y herradicación de vegetación dap menor a 10cm sobre 2.37 hectareas - incluye transporte y disposición de residuos vegetales en sitios autorizados por la autoridad ambiental	Ha		$ 6,521,037.00		2.29	$ 14,944,912.00		$ -	1.70	$ 11,073,372.99
17.35			Compensación - siembra de arboles a distancia de 3x3, altura 0.6 m.	Un		$ 34,973.00		0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.36			Rescate, traslado y reubicación de epifitas vasculares (en 249 individuos forestales) incluye informe cumplimiento carder	Un		$ 129,037.00		2820.00	$ 363,884,340.00		$ -	700.00	$ 90,325,900.00
17.37			Compensación por epifitas no vasculares - siembra de arboles a distancia de 3x3 m, altura 0,6 m - .	Un		$ 34,910.00		0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.38			Rescate, traslado y reubicación de helechos alturas ≤ 1,5 m -	Un		$ 134,922.00		402.50	$ 54,306,104.00		$ -	285.50	$ 38,520,231.00
17.39			Reposición helechos.	Un		$ 132,898.00		203.00	$ 26,978,294.00		$ -	0.00	$ -
17.40			Monitoreo, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre durante aprovechamiento forestal y destoconado -	Dia		$ 705,994.00		75.00	$ 52,949,550.00		$ -	50.00	$ 35,299,700.00
17.41			Tala guadilla, bambú y caña brava (incluye repicado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental). Incluye informe de cumplimiento carder	m2		$ 25,385.00		1006.00	$ 25,537,310.00		$ -	726.00	$ 18,429,510.00
17.45			Cerramiento provisional con tela verde y 8 líneas de alambre de púas	m		$ 29,086.00		691.70	$ 20,118,788.00		$ -	681.70	$ 19,827,926.00
17.46			Cerramiento provisional con malla eslabonada	m		$ 70,094.00		276.00	$ 19,345,944.00		$ -	196.00	$ 13,738,424.00
17.47			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 8 pulgadas rde 21	m		$ 287,842.00		2708.55	$ 779,634,449.00		$ -	1,338.55	$ 385,290,909.10
17.48			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 6 pulgadas rde 21	m		$ 186,541.00		290.76	$ 54,238,662.00		$ -	248.24	$ 46,306,937.84
17.49			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 4 pulgadas rde 21	m		$ 116,312.00		0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.50			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 3 pulgadas rde 21	m		$ 75,337.00		20.00	$ 1,506,740.00		$ -	12.00	$ 904,044.00
17.51			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 2 pulgadas rde 21	m		$ 40,475.00		50.00	$ 2,023,750.00		$ -	35.20	$ 1,424,720.00
17.52			Zapata para muros en concreto F'c 28 Mpa	m3		$ 1,192,495.00		817.56	$ 974,936,212.00	179.19	$ 213,683,179.05	746.09	$ 889,708,594.55
17.53			Muro en concreto F'c 28 Mpa H= 0M a 3 M espesor de > 30 cm	m3		$ 1,365,547.00		587.32	$ 802,011,698.00	70.08	$ 95,701,630.40	425.64	$ 581,234,156.17
17.54			Bombeo para concretos con autobomba	m3		$ 76,030.00		449.60	$ 34,183,088.00	130.92	$ 9,953,847.60	424.32	$ 32,261,049.60
17.55			Acelerado para concretos de 28 MPa alos 7 dias	m3		$ 131,128.00		0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.56			Reposición e instalación de pozo Septico	Und		$ 28,528,361.00		0.00	$ 28,528,361.00		$ -	1.00	$ 28,528,361.00
17.64			Geomalla Fortgrid UX-050 o similar	m2		$ 23,990.00		4801.00	$ 115,175,990.00	2182.50	$ 52,358,175.00	4,475.00	$ 111,233,102.50

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.65			Geomalla Fortgrid UX-100 o similar	m2		$ 34,991.00		1833.00	$ 64,138,503.00		$ -	1,562.40	$ 53,865,895.20
17.66			Geotextil FORTEX BX 30 o similar	m2		$ 20,425.00		1072.00	$ 21,895,600.00	324.00	$ 6,617,700.00	772.90	$ 15,824,442.50
17.67			Tubería Perforada Pipedrain o similar de 4.0 in	m		$ 28,017.00		330.00	$ 9,245,610.00	92.00	$ 2,577,564.00	315.00	$ 4,757,830.00
17.68			BOLSAS PROPYBAG	und		$ 4,774.00		6382.00	$ 30,467,668.00	1750.00	$ 8,354,500.00	4,836.60	$ 25,355,712.40
17.69			GEOTEXTIL FORTEX BX760	m2		$ 27,989.00		1021.00	$ 28,576,769.00		$ -	531.92	$ 22,442,164.96
17.71			Solado concreto F'c 14 Mpa	m3		$ 767,153.00		101.76	$ 78,065,489.00	20.99	$ 16,104,842.93	66.20	$ 50,787,830.06
17.72			Suministro y construccion Cámara para barraje en anden, en concreto de 1x1x1,0 m con tapa de seguridad norma EEP	Un		$ 15,540,203.00		11.00	$ 170,942,233.00		$ -	0.00	$ -
17.73			Suministro e instalación de Poste de Concreto 16 M x 1050 Kg.	Un		$ 7,445,580.00		0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.74			Hincado de poste en concreto de 16 metros con grúa tipo PH	Día		$ 19,221,158.00		0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.75			Apoyo Primario TSA2 - Terminal Sencilla Cruceta al Centro 13.2 kv	Un		$ 2,047,012.00		6.00	$ 12,282,072.00	6.00	$ 12,282,072.00	6.00	$ 12,282,072.00
17.76			Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión, Norma EEP. Incluye muros en concreto y pasos para ingreso	Un		$ 9,351,289.00		38.00	$ 355,348,982.00		$ -	0.00	$ -
17.77			Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Baja tensión GPRT 500, 5 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, Alumbrado público.	Un		$ 1,066,731.00		10.00	$ 10,667,310.00		$ -	0.00	$ -
17.78			Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Baja tensión GPRT 500, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, Alumbrado público.	Un		$ 934,449.00		2.00	$ 1,868,898.00	1.00	$ 934,449.00	1.00	$ 934,449.00
17.79			Acometida Alumnio Serie 8000 2xNo.1/0(F)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 92,913.00		4700.00	$ 436,691,100.00		$ -	0.00	$ -
17.80			Acometida Alumnio Serie 8000 2xNo.2/0(F)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 113,897.00		600.00	$ 68,338,200.00		$ -	0.00	$ -
17.81			Equipotencialización sistema de puesta a tierra entre cajas (cada 200 metros). Incluye varilla de cobre de 5/8"x1,80 mts, conector de varilla a cable y 5 metros de cable no.6 AWG desnudo.	Un		$ 1,732,880.00		6.00	$ 10,397,280.00		$ -	0.00	$ -
17.82			Sistema de puesta a tierra transformador. varilla de cobre de 5/8"x2,40 mts, conector de varilla a cable y 15 metros de cable no. 2/0 AWG desnudo.	Un		$ 5,481,497.00		3.00	$ 16,444,491.00		$ -	0.00	$ -
17.83			Conector GHFC-MW	Un		$ 124,113.00		38.00	$ 4,716,294.00	7.00	$ 868,791.00	7.00	$ 868,791.00
17.84			Desmonte de cable 3no2(F) + 1no2(N) AL serie 8000	M		$ 16,099.00		400.00	$ 6,439,600.00	28.00	$ 450,772.00	28.00	$ 450,772.00
17.85			Desmonte de cable 1no4(F) + 1no4(N) AL serie 8000	M		$ 10,625.00		200.00	$ 2,125,000.00	52.00	$ 552,500.00	52.00	$ 552,500.00
17.86			Acometida Alumnio Serie 8000 3xNo.1/0(F)+1xNo.1/0(N)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 137,763.00		250.00	$ 34,440,750.00		$ -	0.00	$ -
17.87			Acometida Alumnio Serie 8000 3xNo.2/0(F)+1xNo.2/0(N)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 94,173.00		50.00	$ 4,708,650.00	50.00	$ 4,708,650.00	50.00	$ 4,708,650.00
17.88			Acometida Alumnio Serie 8000 3xNo.2/0(F)+1xNo.2/0(N)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 157,519.00		24.00	$ 3,780,456.00		$ -	0.00	$ -
17.89			Afloramiento en baja tensión. Incluye curva pvc DB de 2"	Un		$ 747,074.00		8.00	$ 5,976,592.00	4.00	$ 2,988,296.00	4.00	$ 2,988,296.00
17.90			Desmonte y reinstalación medidor para usuario final	Un		$ 397,374.00		14.00	$ 5,563,236.00	4.00	$ 1,589,496.00	4.00	$ 1,589,496.00
17.91			Adecuación tuberías para reubicación de medidores en cable 1no4(F) + 1no4(N) AL serie 8000, Ducto Conduit PVC 2ø2" DB, Enterrado a Profundidad de 0.80 m.	M		$ 40,949.00		380.00	$ 15,560,620.00		$ -	0.00	$ -
17.92			Desmonte y reinstalación de afloramiento en baja tensión	Un		$ 397,374.00		11.00	$ 4,371,114.00		$ -	0.00	$ -
17.93			Pedraplen	m3		$ 198,367.00		4109.00	$ 814,891,636.00	4107.89	$ 814,869,815.63	4,107.89	$ 814,869,815.63
											$ -		
											$ -	0.00	$ -

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023		ACTA No 12		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
		SUBTOTAL							**$ 14,069,507,125.00**		**$ 1,401,267,611.91**	0.00	**$ 9,347,396,229.36**
		AJUSTE AL PESO							$ 478.00			0.00	
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 27,274,265,856.00**			**$ 43,253,109,046.00**		**$ 4,244,113,422.00**		**$ 29,205,204,143.73**
		GESTIÓN PREDIAL				**$ 711,690,924.00**			**$ 711,690,924.00**		**$ 199,627,913.86**		**$ 711,690,924.000**
		VALOR TOTAL				**$ 27,985,956,780.00**			**$ 43,964,799,970.00**		**$ 4,443,741,335.86**		**$ 29,916,895,067.73**
												0.00	
		COSTOS INDIRECTOS										0.00	
SC 1		Pólizas	Según Factura			$ 145,456,133.00		49.00	$ 185,952,544.00			49.00	$ 144,952,641.00
SC 2		Equipos para dotación de oficina (Campamento), consumibles oficina (papelería y útiles), servicios públicos oficina, comunicaciones, expedición de identificaciones	Según Factura			$ 10,800,000.00			$ 10,799,998.40			0.00	$ 10,799,255.00
SC 3		Gastos financieros y similares (fiducia + 4x1000)	Según Factura			$ 6,486,876.00			$ 48,558,667.00			0.00	$ 48,558,667.00
SC 4		Comisión de topografía con servicio de escolta	Dia	360	$ 555,380.00	$ 199,936,800.00		1300.00	$ 721,994,000.00	93.00	$ 51,650,340.00	1,089.00	$ 587,592,040.00
SC 5		CUADRILLA AMBIENTAL (Cuadrilla E 4 Ay (jornal + prestaciones)	mes	12	$ 6,131,074.00	$ 73,572,888.00		12.00	$ 97,870,335.00	0.52	$ 3,188,158.48	10.03	$ 58,551,757.70
SC 6		APROPIACIÓN PMT	Según Factura	1	$ 3,932,800.00	$ 3,932,800.00		1.00	$ 11,235,955.00			1.00	$ 11,235,955.00
SC 7		IMPLEMENTACIÓN PMT (SEÑALIZACIÓN)	Según Factura	1	$ 162,844,842.00	$ 162,844,842.00		1.00	$ 106,213,070.00		$ 135,660.00	1.00	$ 59,990,280.00
SC 8		Baño portatil (2 aseos semanalas)	Según Factura	133	$ 371,484.00	$ 49,407,372.00		117.00	$ 39,140,000.00		$ 2,519,937.25	1.00	$ 23,638,456.85
SC 9		Sum Poste Metalico 12 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 1 Brazo de 2.5 m x 2"	Según Factura	90	$ 2,870,168.00	$ 258,315,120.00		90.00	$ 307,063,047.00			90.00	$ 307,063,047.00
SC 10		Sum Poste Metalico 13 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 2 Brazo de 2.5 m x 2"	Según Factura	73	$ 3,032,396.00	$ 221,364,908.00		73.00	$ 264,465,579.00			73.00	$ 264,465,579.00
SC 11		Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 192 Leds, 141 W, 233 mA, 18673 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Stan	Según Factura	81	$ 1,635,731.00	$ 132,494,211.00		81.00	$ 163,798,680.00			81.00	$ 163,798,680.00
SC 12		Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 144 Leds, 106 W, 233 mA, 14000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Según Factura	82	$ 1,404,524.00	$ 115,170,968.00		82.00	$ 142,575,520.00			82.00	$ 142,575,520.00
SC 13		Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 96 Leds, 71 W, 233 mA, 9000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Según Factura	73	$ 1,344,444.00	$ 98,144,412.00		73.00	$ 126,598,515.00			73.00	$ 126,598,515.00
SC 14		Sum Geotextil TR3000 o similar	Según Factura	76045	$ 11,042.00	$ 839,688,890.00		34127.80	$ 56,839,168.00		$ 6,055,123.30	0.00	$ 26,424,922.10
SC 15		Sum-Geotextil T2400 o similar	Según Factura	77419	$ 8,366.00	$ 647,687,354.00		3934.33	$ 17,914,605.00		$ 767,087.50	0.00	$ 5,686,118.40
SC 16		MONITOREO ARQUEOLOGICO AL 100%	Según Factura		$ -	$ 64,000,000.00			$ 80,000,000.00		$ 2,600,000.00	0.00	$ 38,772,001.20
SC 17		Servicios de Vigilancia privada (24 horas-noche) Con Arma, incluye supervisión	Según Factura	12	$ 8,354,381.00	$ 100,252,572.00		11.29	$ 420,070,889.66		$ 31,620,312.00	0.00	$ 315,401,078.00

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 23 de Agosto DE 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 12,744,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023

PERIODO: 1 JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

Prorroga 3 fecha de terminación actual : 30 de Noviembre de 2023

ACTA DE OBRA No.12

Valor:
$ 4,571,955,155.00

	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	ACTA No 12	Cant.	Vr. Parcial
				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.8 FECHA: 15/08/2023			ACUMULADO	
SC 18			Ensayos de Laboratorio	Según Factura	11	$ 6,390,800.00	$ 70,298,800.00	11.00	$ 70,298,800.00	$ 14,040,271.00	0.00	$ 38,642,244.00
SC 19			Protocolo bioseguridad	Según Factura			$ 100,000,000.00		$ 8,644,600.00		0.00	$ 8,644,600.00
SC 20			Ajuste a estudios y diseños obras complementarias	Según Factura			$ 95,874,926.00		$ 169,675,734.00		0.00	$ 169,675,734.00
SC 21			Derechos de disposición de basuras en Relleno Sanitario	Según Factura			$ 7,500,000		$ 7,500,000.00		0.00	$ -
SC 22			Inventario forestal e inventario de construcciones en las áreas de los predios a intervenir en la ejecución de las obras objeto del contrato 4812 de 2021.	Unidad		$ 1,100,000.00		63.00	$ 62,700,000.00		57.00	$ 62,700,000.00
SC23			Certificación RETIE red completa de media tensión (3.4km) a 13.2kV	Un		$ 8,267,091		1.00	$ 8,267,091.00		0.00	$ -
SC24			Comisión de topografía con servicio de escolta para gestion predial	Dia		$ 555,380.00		337.00	$ 170,501,660.00		311.00	$ 170,501,660.00
SC25			Comisión de topografía con servicio de escolta para gestion ambiental	Dia		$ 555,380.00		183.00	$ 93,303,840.00		183.00	$ 93,303,840.00
SC26			Diseño Sistema de Alumbrado Público	Según Factura		$ 29,824,104.00		1.00	$ 29,824,104.00		1.00	$ 29,824,104.00
			SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			**(D)**	**$ 3,403,229,872.00**		**$ 3,421,806,402.00**	**$ 112,576,889.53**		**$ 2,909,396,695.25**
			CARGA TRIBUITARIA (%)		**13.89%**	**(E)**	**$ 472,708,629.00**		**$ 475,288,909.24**	**$ 15,636,930.00**		**$ 404,115,202.00**
			VALOR COSTOS INDIRECTOS			**(F) = (D+E)**	**$ 3,875,938,501.00**		**$ 3,897,095,311.24**	**$ 128,213,819.53**		**$ 3,313,511,897.25**
			VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 31,861,895,281.00**		**$ 47,861,895,281.00**	**$ 4,571,955,155.00**		**$ 33,230,406,965.00**
									VALOR TOTAL			$ 33,230,406,965
							$ 16,000,000.00		**(-) Amortización anticipo obra ejecutada**	**$ 1,828,782,062.00**		
							$ 31,877,895,281.00		**(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada**			
									Neto acta	**$ 2,743,173,093.0**		

Son: **CUATRO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS**

BALANCE ANTICIPO

	ANTICIPO INICIAL		ANTICIPO ADICIÓN 01		
VALOR ANTICIPO	$ 12,744,758,112		$ 6,400,000,000.00	**Vr. contrato**	$ 47,861,895,281
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ 11,463,380,724		$ -	**Vr. actas anteriores**	$ 28,658,451,810
Vr. amortización presente acta	$ 1,281,377,388		$ 547,404,674.00	**Vr. presente acta**	$ 4,571,955,155
Saldo	$ -		$ 5,852,595,326.00	**Saldo**	$ 14,631,488,316
Sumas iguales	$ 12,744,758,112	$ 12,744,758,112	$ 6,400,000,000	$ 6,400,000,000 **Sumas iguales**	$ 47,861,895,281 $ 47,861,895,281

BALANCE CONTRATO

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
CONSORCIO CABA INTERVIAS
Interventor

CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
Representante Legal Suplente del Contratista o su Apoderado
CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
Contratista

MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Municipio de Pereira

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
NIT 901.517.172-7
CRA 68D 95 47
Tel: (601) 3002214
Bogotá - Colombia
cagisue@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 28

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(601) 3248000
Dirección	CR 7 18 56	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2023, 14:57
Expedición	28/08/2023, 15:12
Vencimiento	28/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA No 12 Correspondiente del 1 de Julio de 2023 hasta el 23 de Agosto de 2023. CONTRATO DE OBRA No 4812 de 2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.00	0.00
2	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AU)	1.00	1,616,145,052.67
3	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	1.00	112,576,889.53
4	CARGA TRIBUTARIA COSTOS INDIRECTOS (13,89%)	1.00	15,636,930.00

Total items: 4

Valor en Letras: Mil ciento noventa y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	1,744,358,872.20
Copago / Anticipo	547,404,674.00
Total a Pagar	**1,196,954,198.20**

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 1,196,954,198.20

Observaciones: Porcentaje de participación:
50% CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR C.C. 7.167.398
40% VINCOL CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900.200.048
10% JOSE GABRIEL VARGAS NIT: 79.399.273

facturacioninfraestructura@pereria.gov.co
Favor consignar a la cuenta Corriente No 450869993292 del Banco Davivienda a nombre del CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS NIT: 901.517.172-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038059791 aprobado en 20221019 prefijo FE desde el número 8 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: fec6aa21af47b750be6d31c8e3b237ab4d1ebaa40c7bfe9efb3f75ce7672f638f2f340484b15bbaf7aeddc948b04f012

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
