INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 491 DE 2026 CUYO OBJETO ES: "Suministro e instalación de carpintería en madera, muebles en acero inoxidable y señalética para la puesta en funcionamiento de la Unidad Materno Infantil de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja"

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad documentar el avance de ejecución del Contrato de Suministro No. 491 de 2026, tomando como soporte específico la Memoria de Seguimiento de Actividad y los registros de cantidades contenidos en la documentación aportada. El análisis se circunscribe exclusivamente a la evidencia de las actividades ejecutadas, su localización y estado.

2. IDENTIFICACIÓN Y PERIODO DE SEGUIMIENTO

Concepto	Información
Contrato	Suministro No. 491 de 2026
Contratista	ARIKA INGENIERIA S.A.S.
Objeto	Suministro e instalación de carpintería en madera, muebles en acero inoxidable y señalética para la puesta en funcionamiento de la Unidad Materno Infantil de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.
Valor inicial	$1.341.594.766
Fecha de inicio indicada para el seguimiento	12 de agosto de 2026
Fecha de corte	25 de septiembre de 2026
Periodo analizado	12 de agosto de 2026 – 25 de septiembre de 2026
Avance acumulado objeto del informe	78 % aproximadamente

3. CRITERIO PARA DETERMINAR EL AVANCE

Para efectos del presente informe, el avance acumulado del 78 % se presenta como el nivel de ejecución registrado al corte del 25 de septiembre de 2026, tomando como referencia el valor ejecutado y las evidencias contenidas en las Memorias de Seguimiento de Actividad.

Valor ejecutado de $1.053.620.337 frente a un valor contractual de $1.341.594.766. Esta relación corresponde aproximadamente al 78,54 %, que para efectos de presentación del avance se expresa como 78 %.

Indicador	Valor
Valor contractual	$1.341.594.766
Valor ejecutado reportado	$1.053.620.337
Porcentaje calculado	78,54 %
Avance presentado	78 % aprox.
Saldo frente al valor contractual	$287.974.429

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

4. EVIDENCIA DE EJECUCIÓN – MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

La documentación contiene registros de cantidades y estados de ejecución por actividad y localización. En dichos registros se identifican elementos instalados y, para algunos casos, pendiente lo que permite establecer la evidencia de avance físico de las actividades documentadas.

4.1. Carpintería en acero inoxidable

Se evidencian actividades ejecutadas en diferentes ambientes de la Unidad Materno Infantil, incluyendo mesones, pozuelos, vertederos, lavamanos quirúrgicos, pocetas dobles quirúrgicas, pasamanos, rodamanos, lavaojos y trampa de yesos.

Actividad	Cantidad registrada en memoria	Evidencia de estado
1.01 Mesón acero inoxidable para soportar sobre mueble	30,52 ml	Instalado con actividades pendientes
1.02 Mesón acero inoxidable con soporte y entrepaño	39,79 ml	Instalado con actividades pendientes
1.03 Pozuelos en acero inoxidable	3 und	isntalado
1.04 Vertedero en acero inoxidable	5 und	instalado
1.05 Lavamanos quirúrgicos	29 und	Instalado con actividades pendientes
1.06 Poceta doble quirúrgica	8 und	instalado
1.07 Pasamanos acero inoxidable y vidrio	84,82 ml	instalado
1.08 Rodamanos doble acero inoxidable	64,11 ml	instalado
1.09 Lavaojos	1 und	instalado
1.10 Trampa de yesos	1 und	instalado
1.11 Bebedero con estación de llenado	0 und	Pendiente

Se realizo verificación en sitio de la ejecución en varios pisos y ambientes, incluyendo áreas de hospitalización, UCI, recuperación, salas de procedimientos, laboratorio, farmacia y otros espacios. También se identifican localizaciones pendientes, principalmente en algunos ambientes de los pisos 1 y 2 y en el sótano.

4.2. Carpintería en madera

En recorrido físicos se evidencia la instalación de diferentes elementos de carpintería en madera melamínica RH, incluyendo muebles aéreos, módulos de almacenamiento, enchapes de muro, superficies de trabajo, módulos inferiores, repisas y puertas.

Actividad	Cantidad registrada en memoria	Evidencia de estado
2.01 Mueble aéreo en madera melamínica RH	89 und	Registrados en diferentes áreas y pisos
2.02 Módulo de almacenamiento	150,464 m²	Registros de cantidades por localización
2.03 Enchape para muro	450,89 m²	Predomina estado INSTALADO; se identifican pendientes puntuales
2.04 Superficie de trabajo flotante	137,33 ml	Registros de ejecución por localización
2.06 Módulo inferior para mueble	30,41 ml	Predomina estado INSTALADO; se

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

acero inoxidable		registran pendientes puntuales
2.07 Repisa flotante	185,72 ml	Registrada por localización
2.10 Puerta maciza doble hoja	2 und	Registradas como INSTALADO

Se identifican en los enchapes y elementos de carpintería actividades instaladas en los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en otros espacios de la Unidad Materno Infantil. También se registran algunas actividades pendientes, las cuales deberán ser consideradas para el cierre integral del alcance.

4.3. Señalética

En el capítulo de señalética contempla placas de señalización institucional, placas para rutas de evacuación, señalización de rutas de residuos hospitalarios y vinilos. Para el corte documentado no se registra valor ejecutado para este capítulo.

Por lo anterior, el avance del 78 % no debe interpretarse como ejecución total del objeto contractual, sino como avance acumulado al corte, permaneciendo actividades pendientes para la culminación integral.

5. AVANCE DEL CONTRATO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Componente	Valor contractual	Valor ejecutado reportado	Avance
Carpintería en acero inoxidable	$496.232.782	$484.439.660	97,62 %
Carpintería en madera	$425.627.778	$400.955.581	94,20 %
Señalética	$205.530.000	$0	0,00 %
Total costos directos	$1.127.390.560	$885.395.241	78,54 %
IVA 19 %	$214.204.206	$168.225.096	—
Total contrato	$1.341.594.766	$1.053.620.337	78,54 %

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERIODO

Con base en las Memorias de Seguimiento de Actividad, durante el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2026 y el 25 de septiembre de 2026 se evidencia la ejecución y/o instalación de elementos correspondientes principalmente a los capítulos de carpintería en acero inoxidable y carpintería en madera.

La evidencia documental y física registra cantidades ejecutadas y su respectiva localización dentro de la Unidad Materno Infantil. Los registros permiten identificar actividades culminadas, así como actividades que permanecen pendientes.

Al corte del 25 de septiembre de 2026, el avance acumulado reportado corresponde aproximadamente al 78 % del valor contractual, equivalente a $1.053.620.337 de un valor inicial de $1.341.594.766.

7. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

1. La documentación aportada contiene Memorias de Seguimiento de Actividad con registros de cantidades, localización y estado de los elementos suministrados e instalados.
2. Se evidencia ejecución de actividades de carpintería en acero inoxidable y carpintería en madera en diferentes áreas de la Unidad Materno Infantil.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

3. En los registros se identifican actividades con estado "OK" e "INSTALADO", que constituyen evidencia documental del avance de las actividades reportadas, las cuales fueron verificadas en el sitio por parte de la supervisión.
4. También se identifican actividades con estado "PENDIENTE", por lo cual el avance del 78 % corresponde a un avance acumulado y no a la terminación integral del objeto contractual, las cuales fueron verificadas en el sitio por parte de la supervisión
5. El capítulo de señalética aun esta sin ejecutar, debido a que aún no hay definición técnica de la señalética, por lo que deberá ser objeto de seguimiento para la culminación del objeto.
6. Las cantidades reportadas en las Memorias de Seguimiento deben mantenerse conciliadas con los registros contractuales y con las actas de pago correspondientes.

8. CONCLUSIÓN

De acuerdo con la documentación revisada, y específicamente con las Memorias de Seguimiento de Actividad que contienen los registros de cantidades, localizaciones y estados de ejecución, se evidencia un avance significativo de las actividades correspondientes al suministro e instalación de carpintería en acero inoxidable y carpintería en madera.

Tomando como fecha de inicio del periodo de seguimiento el 12 de agosto de 2026 y como fecha de corte el 25 de septiembre de 2026, se establece para efectos del presente informe un avance acumulado del 78 % aproximadamente, sustentado en el valor ejecutado reportado de $1.053.620.337 frente al valor contractual de $1.341.594.766, equivalente matemáticamente al 78,54 %.

La evidencia documental permite constatar que durante el periodo se desarrollaron actividades en diferentes ambientes y pisos de la Unidad Materno Infantil. No obstante, se mantienen actividades pendientes, por lo que el avance reportado no representa la culminación integral del objeto contractual.

En consecuencia, deberá continuarse con el seguimiento a las actividades pendientes hasta completar el suministro e instalación de los elementos contemplados en el alcance contractual y contar con los registros que permitan acreditar su entrega y ejecución.

Anexos:

- Memoria de seguimiento de actividad. (21 folios)

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSRT
Supervisor Contrato de Suministro No. 491 de 2026

Elaboró: Arq. Melissa Bermudez Guarin/ Profesional de apoyo SAF
Revisó: Arq. Alexis Fabian Moreno/ Profesional de apoyo SAF

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTAR SOBRE MUEBLE EN MADERO O PIEAMIGO	UNIDAD		METRO LINEAL


REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 4 PISO	N/A	N/A	1,6	1	1,60	ML	OK	4 PISO
2	PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	1,3	1	1,30	ML	OK	4 PISO
3	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 3 PISO	N/A	N/A	1,6		0,00	ML	PENDIENTE	3 PISO
4	PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	1,3	1	1,30	ML	OK	3 PISO
5	TRABAJO LIMPIO UCI PEDIATRICA	N/A	N/A	2,47	1	2,47	ML	OK	3 PISO
5	ESTACION DE CAFÉ DESCANSO ENFERMERIA	N/A	N/A	1,56	1	1,56	ML	OK	3 PISO
6	MATERIALES E INSUMOS UCI ARO	N/A	N/A	1,33	1	1,33	ML	OK	2 PISO
7	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 2 PISO UCI ARO	N/A	N/A	2,01	1	2,01	ML	OK	2 PISO
8	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 2 PISO RECUPERACION SALA DE PARTOS	N/A	N/A	2,3	1	2,30	ML	OK	2 PISO
9	TRABAJO LIMPIO FRENTE A CENTRAL DE ENFERMERIA 2 PISO RECUPERACION SALA DE PARTOS	N/A	N/A	1,13	1	1,13	ML	OK	2 PISO
10	SALA DE PARTOS	N/A	N/A	1,265	1	1,27	ML	OK	2 PISO
11	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 2 PISO UCI NEONATAL	N/A	N/A	2,32	1	2,32	ML	OK	2 PISO
12	TRABAJO LIMPIO FRENTE CENTRAL DE ENFERMERIA 2 PISO UCI NEONATAL	N/A	N/A	1,33	1	1,33	ML	OK	2PISO
13	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA	N/A	N/A	3,06	1	3,06	ML	OK	2 PISO
14	TRABAJO LIMPIO RECUPERACION QUIRURGICA	N/A	N/A	1,99	1	1,99	ML	OK	2 PISO
15	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRICA	N/A	N/A	1,75		0,00	ML	PENDIENTE	1 PISO
16	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS 2	N/A	N/A	1,65	1	1,65	ML	OK	1 PISO
17	PROCEDIMIENTOS TRABAJO LIMPIO CARDIOLOGIA	N/A	N/A	1,06	1	1,06	ML	OK	1 PISO
17	LABORATORIO ENTRE COMPUTADORES Y MICROSCOPIOS	N/A	N/A	1,34	1	1,34	ML	OK	1 PISO
18	PERSONAL ASISTENCIAL DESCANSO URGENCIAS	N/A	N/A	1,5	1	1,50	ML	OK	2 PISO
19									

TOTAL	30,52	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA







MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON ACERO INOXIDABLE CON SOPORTE EN TUBERIA Y ENTREPAÑO	UNIDAD		METRO LINEAL

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA	N/A	N/A	1,6	1	1,60	ML	OK	4 PISO
2	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA	N/A	N/A	1,6	1	1,60	ML	OK	3 PISO
3	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA	N/A	N/A	2,47	1	2,47	ML	OK	3 PISO
4	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA UCI ARO	N/A	N/A	1,33	1	1,33	ML	OK	2 PISO
5	TRABAJO SUCIO FRENTE A CENTRAL DE ENFERMERIA 2 PISO RECUPERACION SALA DE PARTOS	N/A	N/A	1,63	1	1,63	ML	OK	2 PISO
6	INACTIVACION Y PRELAVADO DE INSTRUMENTAL	N/A	N/A	1,39	1	1,39	ML	OK	2 PISO
7	PRELAVADO AUTOCLAVE	N/A	N/A	3,31	1	3,31	ML	OK	2 PISO
8	TRABAJO SUCIO RECUPERACION QUIRURGICA	N/A	N/A	1,99	1	1,99	ML	OK	2 PISO
9	TRABAJO SUCIO CONTIGUO A TERAPIA RESPIRATORIA	N/A	N/A	1,72	1	1,72	ML	OK	2 PISO
10	TRABAJO SUCIO UCI NEONATAL	N/A	N/A	3,6	1	3,60	ML	OK	2 PISO
11	LAVADO DE INCUBADORAS	N/A	N/A	1,33	1	1,33	ML	OK	2 PISO
12	LACTARIO	N/A	N/A	2,51	1	2,51	ML	OK	2 PISO
13	ECOGRAFO	N/A	N/A	1,2	1	1,20	ML	OK	1 PISO
14	PROCEDIMIENTOS TRABAJO SUCIO CARDIOLOGIA	N/A	N/A	0,88	1	0,88	ML	OK	1 PISO
15	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRICA	N/A	N/A	1,43	0	0,00	ML	PENDIENTE	1 PISO
16	SALA EDA	N/A	N/A	1,25	1	1,25	ML	OK	1 PISO
17	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS 1	N/A	N/A	1,3	1	1,30	ML	OK	1 PISO
18	SALA DE YESOS	N/A	N/A	3,5	1	3,50	ML	OK	1 PISO
19	SALA ERA	N/A	N/A	1,49	1	1,49	ML	OK	1 PISO
20	REANIMACION POCETA DOBLE	N/A	N/A	2,09	1	2,09	ML	OK	1 PISO
21	REANIMACION POCETA SENCILLA	N/A	N/A	1,2	1	1,20	ML	OK	1 PISO
22	MONITOREO GINECOBSTETRICIA	N/A	N/A	1,2	2	2,40	ML	OK	1 PISO
23	LAVADO DE LOZA	N/A	N/A	1,72	0	0,00	ML	PENDIENTE	SOTANO
24	LAVADO DE OLLAS	N/A	N/A	4,12	0	0,00	ML	PENDIENTE	SOTANO
25	MESON LINEA CALIENTE	N/A	N/A	3,767	0	0,00	ML	PENDIENTE	SOTANO
26	MORGUE	N/A	N/A	1,6	0	0,00	ML	PENDIENTE	SOTANO
27	ESTACION ENFERMERIA	N/A	N/A	1,6		0,00	ML	PENDIENTE	2 PISO
28	PREPARACION DE FORMULAS	N/A	N/A	6,8		0,00	ML	PENDIENTE	2 PISO
29	ENSAMBLE	N/A	N/A	4		0,00	ML	PENDIENTE	SOTANO
30	ISLAS COCINA	N/A	N/A	6		0,00	ML	PENDIENTE	SOTANO
31	CAFETERIA	N/A	N/A	4,2		0,00	ML	PENDIENTE	1 PISO
32	AUTOCLAVE	N/A	N/A	3,2		0,00	ML	PENDIENTE	2 PISO
	TOTAL					39,79	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA








MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO:	**1**	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD:	**1.03**	SUMINSTRO E INSTALACION POZUELOS EN ACERO INOXIDABLE	**UNIDAD**		UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	LABORATORIO EQUIPOS AGITADORES Y EQUIPOS CENTRIFUGADOS	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	OK	1 PISO
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						3	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

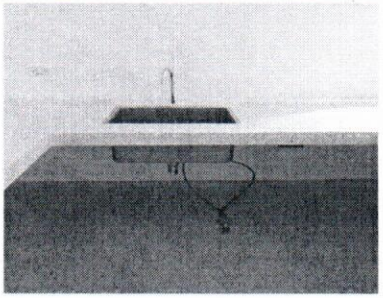

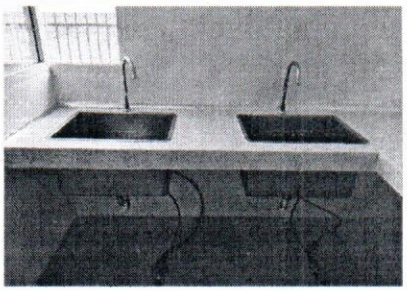


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.03	SUMINSTRO E INSTALACION POZUELOS EN ACERO INOXIDABLE	**UNIDAD**		UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	LABORATORIO EQUIPOS AGITADORES Y EQUIPOS CENTRIFUGADOS	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	OK	1 PISO
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						3	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

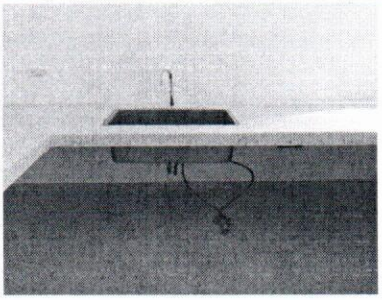

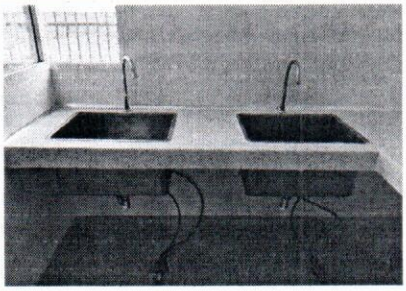


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.04	SUMINSTRO E INSTALACION VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE	**UNIDAD**		UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 4 PISO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	OK	4 PISO
2	TRABAJO SUCIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA 3 PISO				1	1	UND	OK	3 PISO
3	TRABAJO SUCIO UCI PEDIATRICA				1	1	UND	OK	3 PISO
4	TRABAJO SUCIO RECUPERACION QUIRURGICA				1	1	UND	OK	2 PISO
5	TRABAJO SUCIO OBSERVACION PEDIATRICA				1	1	UND	OK	1 PISO
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						5	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

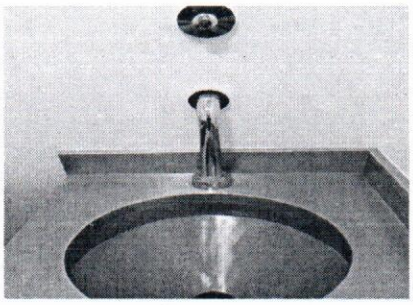

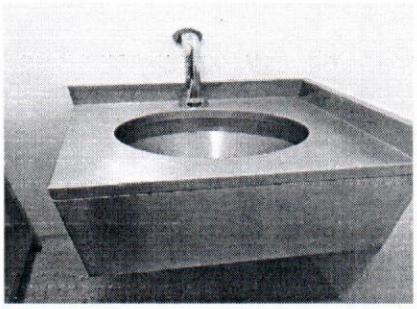


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.05	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	**UNIDAD**		UNIDAD


REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	HABITACION CUARTO AISLADO	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	OK	4 PISO
2	HABITACION CUARTO AISLADO	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	OK	3 PISO
3	CADA HABITACION UCI PEDIATRICA Y PASILLO	N/A	N/A	N/A	12	12	UND	OK	2 PISO
4	UCI AISLADOS, FILTRO FAMILIAR Y OTROS AMBIENTES	N/A	N/A	N/A	7	7	UND	OK	2 PISO
5	2 EN FILTRO , 2 EN PASILLOS Y 1 EN AISLADO	N/A	N/A	N/A	5	5	UND	OK	1 PISO
6	AUTO CLAVE	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	OK	2 PISO
7	UCI P	N/A	N/A	N/A	1		UND	PENDIENTE	3 PISO
8	UCI P	N/A	N/A	N/A	1		UND	PENDIENTE	
9	PREPARACION FORMULAS	N/A	N/A	N/A	1		UND	PENDIENTE	
10	CARDIOLOGIA	N/A	N/A	N/A	1		UND	PENDIENTE	
TOTAL						29	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

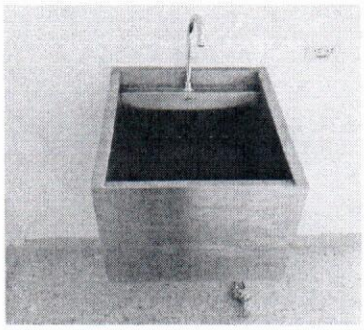

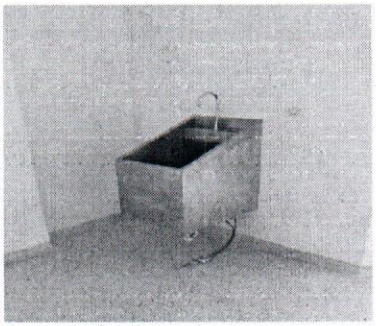

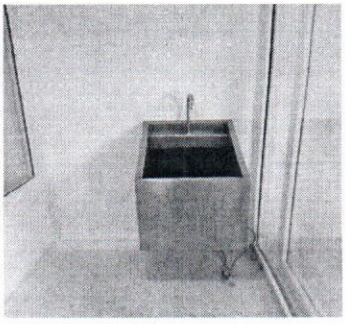


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO:	1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD:	1.06	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DOBLE QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD		UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	1 EN VESTIER HOMBRES, 1 FRENTE A QUIROFANO II, 1 EN ACCESO FAMILIAR, 1 NO SE HA UBICADO EL SITIO	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	OK	2 PISO
2	1 EN VESTIER MUJERES, 1 FRENTE A QUIROFANO II, 1 EN ACCESO FAMILIAR, 1 NO SE HA UBICADO EL SITIO	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	OK	2 PISO
3	1 AL INGRESO DE SALA RECUPERACION PARTO Y 1 FRENTE QUIROFANO I	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	OK	2 PISO
4	1 AL INGRESO DE SALA RECUPERACION PARTO Y 1 FRENTE QUIROFANO 3	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	OK	2 PISO
5	UCI PEDIATRICA	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	OK	2 PISO
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						8	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

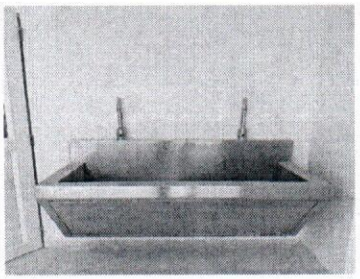

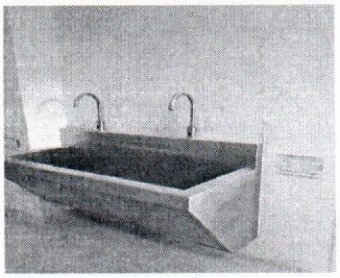




MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5+5	UNIDAD		METRO LINEAL

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	Rampa farmacia LADO DERECHO	N/A	N/A	8,06	1	8,06	ML	OK	1 PISO
2	Rampa auditorio	N/A	N/A	3,14	1	3,14	ML	OK	1 PISO
3	Hall piso 2, OK	N/A	N/A	6,44	1	6,44	ML	OK	PISO 2
4	De sotano a piso 1	N/A	N/A	5,58	1	5,58	ML	OK	PISO1
5	De sotano a piso 1	N/A	N/A	1,12	1	1,12	ML	OK	PISO1
6	De piso 1 a piso 2	N/A	N/A	6,56	1	6,56	ML	OK	PISO1
7	De piso 1 a piso 2	N/A	N/A	0,46	1	0,46	ML	OK	PISO 2
8	De piso 2 a piso 3	N/A	N/A	6,6	1	6,60	ML	OK	PISO 3
9	De piso 2 a piso 3	N/A	N/A	6,6	1	6,60	ML	OK	PISO 3
10	De piso 3 a piso 4	N/A	N/A	6,45	1	6,45	ML	OK	PISO 3
11	De piso 3 a piso 4	N/A	N/A	0,35	1	0,35	ML	OK	PISO 3
12	De piso 4 a terraza	N/A	N/A	6,7	1	6,70	ML	OK	PISO 4
13	De piso 4 a terraza	N/A	N/A	-0,55	1	-0,55	ML	OK	PISO 4
14	Pasamanos deck salida principal	N/A	N/A	11,02	1	11,02	ML	OK	PISO 1
15	Pasamanos rampa salida principal	N/A	N/A	12,17	1	12,17	ML	OK	PISO 1
16	RAMPA SALIDA COCINA	N/A	N/A	4,12	1	4,12	ML	OK	SOTANO
TOTAL						84,82	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

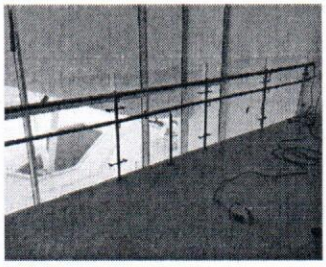
MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMANOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE 304	**UNIDAD**		METRO LINEAL


REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	De sotano a piso 1	N/A	N/A	10,17	1	10,17	ML	OK	1 PISO
2	de piso 1 a piso 2	N/A	N/A	10,3	1	10,30	ML	OK	1 PISO
3	de piso 2 a piso 3	N/A	N/A	10,14	1	10,14	ML	OK	PISO 2
4	de piso 3 a piso 4	N/A	N/A	10,05	1	10,05	ML	OK	PISO 3
5	de piso 4 a terraza	N/A	N/A	9,98	1	9,98	ML	OK	PISO4
6	RAMPA SALIDA PRINCIPAL LADO IZQUIERDO	N/A	N/A	13,47	1	13,47	ML	OK	PISO1
TOTAL						64,11	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

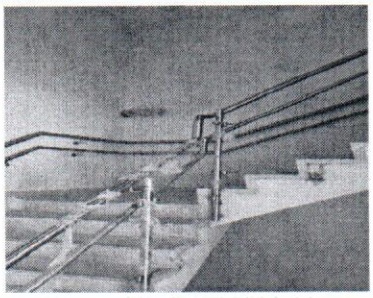

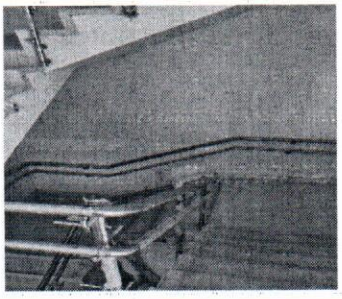

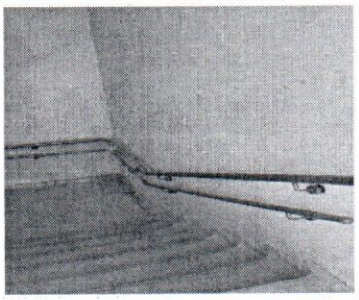


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAOJOS	**UNIDAD**		UNIDAD


REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	LABORATORIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	OK	1 PISO
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						1	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

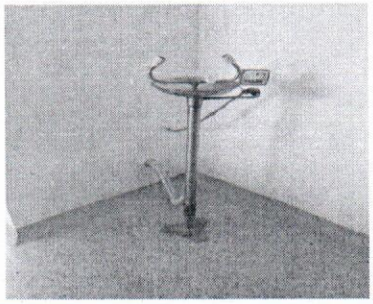



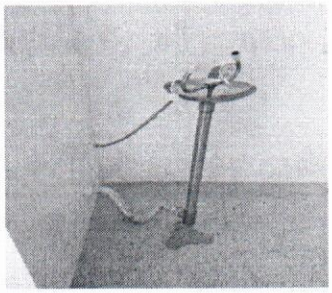


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE YESOS	**UNIDAD**		UNIDAD


REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	SALA DE YESOS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	OK	1 PISO
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						1	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

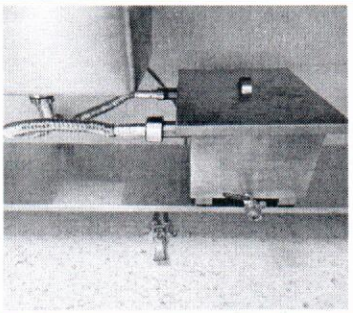

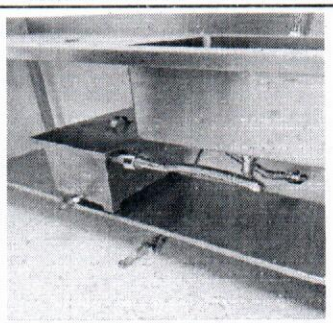

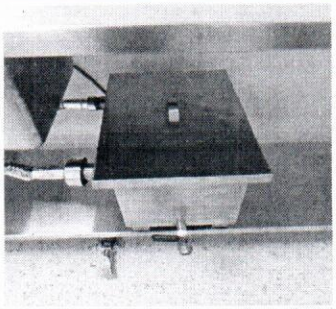

MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	**FECHA**		ago-26
CAPITULO: 1	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE			
ACTIVIDAD: 1.11	SUMINSTRO E INSTALACION DE BEBEDERO CON ESTACION DE LLENADO DE BOTELLAS EN ACERO INOXIDABLE.	**UNIDAD**		UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	SALA DE ESPERA ADULTOS	N/A	N/A	N/A	1		UND	PENDIENTE	1 PISO
2	CAFETERIA				1		UND	PENDIENTE	1 PISO
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						0	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA



MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA	ago-26
CAPITULO: 2	CARPINTERIA EN MADERA		
ACTIVIDAD: 2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AEREO EN MADERA MELAIMINICA RH DIMENSIONES 100x40x35 (COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN) INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES.	UNIDAD	UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	UBICACIÓN
1	IAMI COORDINACION	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 4
2	HOSPITALIZACION. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	PISO 4
3	HOSPITALIZACION. PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 4
4	HOSPITALIZACION. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 4
5	HOSPITALIZACION. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	PISO 3
6	HOSPITALIZACION. PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 3
7	HOSPITALIZACION. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 3
8	INFORMACION FAMILIARES. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 3
9	INFORMACION FAMILIARES. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 3
10	PREPARACION FORMULAS	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 3
11	UCI NEO. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
12	TERAPIA RESPIRATORIA. INSUMOS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
13	COORDINACION UCI NEO	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	PISO 2
14	UCI NEO. TRABAJO LIMPIO CENTRAL ENF.	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
15	UCI ARO. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
16	UNI NEO. ASEO LAVADO INCUBADORAS	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 2
17	UCI ARO. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
18	RECUPERACION PASILLO ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
19	RECUPERACION PARTOS. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
20	FARMACIA	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 2
21	QUIROFANOS. DESCANSO TV	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 2
22	QUIROFANOS. DESCANSO PERSONAL	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
23	QUIROFANOS. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
24	RECUPERACION QUIROFANOS . TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
25	PREPARACION PACIENTE	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 2
26	FARMACION ADMINISTRACION	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
27	LABORATORIO. OFICINA	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
28	MUESTRAS GINECOLOGICAS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
29	ECOGRAFO. CONSULTORIO	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 1
30	PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
31	LECTURA IMAGENOLOGIA	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 1
32	OFICINA RADIOLOGIA	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	PISO 1
33	CONTROL IMAGENOLOGIA	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 1
34	CONSULTORIO ECOGRAFO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
35	PROCEDIMIENTOS. TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
36	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 1
37	PASILLO RX. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
38	OBSERVACION, TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
39	DIRECCION URGENCIAS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
40	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
41	SALA EDA	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
42	CUARTO DIGITACION	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 1
43	SALA ERA	N/A	N/A	N/A	2	2	UND	PISO 1
44	MONITOREO GINECOLOGICO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
45	CONSULTORIOS	N/A	N/A	N/A	5	5	UND	PISO 1
46	CONSULTORIOS. ASEO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
47	REANIMACION	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	PISO 1
48	ADMISIONES	N/A	N/A	N/A	6	6	UND	PISO 1
49	TRIAGE 1	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
50	TRIAGE 2	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	PISO 1
51	FACTURACION INTERNOS	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	PISO 1
52	CONSULTORIO DIETAS	N/A	N/A	N/A	3	3	UND	SOTANO
53	DEPARTAMENTO BIOMEDICO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	SOTANO
54	MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	SOTANO
55								
56								
	TOTAL					89	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA



MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA	ago-26
CAPITULO: 2	CARPINTERIA EN MADERA		
ACTIVIDAD: 2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN (INCLUYE HERRAJES, MANIJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION)	UNIDAD	METRO CUADRADO

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m2)	UNID DE MEDIDA	UBICACIÓN
1	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 4
2	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 3
3	CENTRAL DE ENFERMERIA SATELITE	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 2
4	CENTRAL DE ENFERMERIA ARO	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 2
5	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION PARTOS	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 2
6	AUTORIZACIONES	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 1
7	CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION	0,9	0,75	N/A	1	0,675	M2	PISO 1
8	CUBICULOS UCI ARO	0,9	0,75	N/A	9	6,075	M2	PISO 2
9	HOSPITALIZACION. DESCANSO Y VESTIER	0,35	2	N/A	3	2,1	M2	PISO 4
10	HOSPITALIZACION. DESCANSO Y VESTIER	0,35	2	N/A	3	2,1	M2	PISO 3
11	UCIP . VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL	0,35	2	N/A	3	2,1	M2	PISO 3
12	UCIP. VESTIER FAMILIARES	0,35	2	N/A	3	2,1	M2	PISO 3
13	CIRUGIA. PREPARACION PACIENTES	0,35	2	N/A	3	2,1	M2	PISO 2
14	UCI ARO. FILTRO FAMILIARES	0,35	2	N/A	2	1,4	M2	PISO 2
15	UCI NEO. FILTRO VISITANTES	0,35	2	N/A	3	2,1	M2	PISO 2
16	UCI NEO. VESTIER PERSONAL	0,35	2	N/A	8	5,6	M2	PISO 2
17	URGENCIAS. DESCCANSO PERSONAL	0,35	2	N/A	5	3,5	M2	PISO 1
18	RAYOS X VESTIER	0,35	2	N/A	1	0,7	M2	PISO 1
19	CARDIOLOGIA PEDIATRICA VESTIER PACIENTE	0,35	2	N/A	2	1,4	M2	PISO 1
20	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS	0,35	2	N/A	1	0,7	M2	PISO 1
21	LABORATORIO. DESCANSO	0,35	2	N/A	2	1,4	M2	PISO 1
22	VESTIER PERSONAL Y DESCANSO	0,35	2	N/A	6	4,2	M2	SOTANO
23	PASILLO DE PROCEDIMIENTOS -FRENTE ASCENSOR	2,1	2,1	N/A	2	8,82	M2	PISO 4
24	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL	1,3	2,4	N/A	1	3,12	M2	PISO 2
25	PREPARACION DE PACIENTES. ROPA LIMPIA	1,3	2,4	N/A	1	3,12	M2	PISO 2
26	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS	1	2,4	N/A	2	4,8	M2	PISO 1
27	SALA DE YESOS	1	2,4	N/A	2	4,8	M2	PISO 1
28	OFICINA RADIOLOGIA INSUMOS	1,2	2,4	N/A	1	2,88	M2	PISO 1
29	CARDIOLOGIA. ADMISIONES	1,56	2,4	N/A	1	3,744	M2	PISO 1
30	CONSULTORIO DE DIETAS	1,2	2,4	N/A	1	2,88	M2	SOTANO
31	CLOSET HABITACIONES PISO 3	0,74	2	N/A	25	37	M2	PISO 3
32	CLOSET HABITACIONES PISO 4	0,74	2	N/A	25	37	M2	PISO 4
	TOTAL					150,464	N/A	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA


MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO: 2	CARPINTERIA EN MADERA			
ACTIVIDAD: 2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MURO EN MADERA MELAIMINICA RH	UNIDAD		METRO CUADRADO



REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m2)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	AUDITORIO MURO A TRAPECIO	0,748	2,42	0,25	2	2,42	M2	INSTALADO	PISO 1
	AUDITORIO MURO A RECTANGULO	0,8	2,47	N/A	2	2,47	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO A RECTANGULO	1,778	2,42	N/A	1	4,30	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,94	1	1,784	1	1,86	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	0,45	1	0,606	1	0,53	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,77	2,13	1,44	1	3,42	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	0,62	2,13	0,85	1	1,67	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	0,97	0,92	1,11	1	0,96	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,42	0,92	1,28	1	1,24	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,15	0,84	1,02	1	0,91	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,24	0,84	1,37	1	1,10	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1	2,13	0,67	1	1,76	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,39	2,13	1,72	1	3,31	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	0,66	1	0,5	1	0,58	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO B TRAPECIO	1,73	1	1,9	1	1,82	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO C RECTANGULO	0,8	2,42	N/A	3	3,63	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO C RECTANGULO	1	2,42	N/A	1	2,42	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	0,48	1	0,64	1	0,56	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,91	1	1,75	1	1,83	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	0,65	1,8	0,93	1	1,42	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,74	1,8	1,46	1	2,88	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO C RECTANGULO	0,86	0,82	N/A	1	0,71	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO C RECTANGULO	0,82	0,82	N/A	1	0,67	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO C RECTANGULO	0,67	0,82	N/A	1	0,55	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,1	0,82	1,22	1	0,95	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,3	0,82	1,17	1	1,01	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,22	2,13	1,56	1	2,96	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,167	2,13	0,83	1	2,12	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	1,58	1	1,74	1	1,66	M2	INSTALADO	
	AUDITORIO MURO D TRAPECIO	0,81	1	0,654	1	0,73	M2	INSTALADO	
	TAPAS COLUMNAS							PENDIENTE	
	TAPAS COLUMNAS							PENDIENTE	
	ENCHAPE PUERTAS PISO 4								
2	HABITACION 401-403 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	PISO 4
3	HABITACION 401-403 VERTICAL	0,775	2,22	N/A	1	1,72	M2	INSTALADO	
4	HABITACION 402-404 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
5	HABITACION 402-404 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
6	HABITACION 406-408 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
7	HABITACION 406-408 VERTICAL	0,79	2,22	N/A	1	1,75	M2	INSTALADO	
8	HABITACION 405-407 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
9	HABITACION 405-407 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
10	HABITACION 409-410 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
11	HABITACION 409-410 VERTICAL	0,8	2,22	N/A	1	1,78	M2	INSTALADO	
12	HABITACION 411-412 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
13	HABITACION 411-412 VERTICAL	0,745	2,22	N/A	1	1,65	M2	INSTALADO	
14	HABITACION 413 VERTICAL	0,4	2,22	N/A	1	0,89	M2	INSTALADO	
15	HABITACION 413 HORIZONTAL	1,165	0,22	N/A	1	0,26	M2	INSTALADO	
16	HABITACION 414-416 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
17	HABITACION 414-416 VERTICAL	0,74	2,22	N/A	1	1,64	M2	INSTALADO	
18	HABITACION 415-417 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
19	HABITACION 415-417 VERTICAL	0,78	2,22	N/A	1	1,73	M2	INSTALADO	
20	HABITACION 418-420 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
21	HABITACION 418-420 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
22	HABITACION 419-421 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
23	HABITACION 419-421 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
24	HABITACION 422-424 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
25	HABITACION 422-424 VERTICAL	0,755	2,22	N/A	1	1,68	M2	INSTALADO	
26	HABITACION 423-425 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
27	HABITACION 423-425 VERTICAL	0,79	2,22	N/A	1	1,75	M2	INSTALADO	
	ENCHAPE PUERTAS PISO 3								
28	HABITACION 301-303 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	PISO 3
29	HABITACION 301-303 VERTICAL	0,775	2,22	N/A	1	1,72	M2	INSTALADO	
30	HABITACION 302-304 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
31	HABITACION 302-304 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
32	HABITACION 306-308 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
33	HABITACION 306-308 VERTICAL	0,79	2,22	N/A	1	1,75	M2	INSTALADO	
34	HABITACION 305-307 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
35	HABITACION 305-307 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
36	HABITACION 309-310 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
37	HABITACION 309-310 VERTICAL	0,8	2,22	N/A	1	1,78	M2	INSTALADO	
38	HABITACION 311-312 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
39	HABITACION 311-312 VERTICAL	0,745	2,22	N/A	1	1,65	M2	INSTALADO	
40	HABITACION 313 VERTICAL	0,4	2,22	N/A	1	0,89	M2	INSTALADO	
41	HABITACION 313 HORIZONTAL	1,165	0,22	N/A	1	0,26	M2	INSTALADO	
42	HABITACION 314-316 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
43	HABITACION 314-316 VERTICAL	0,74	2,22	N/A	1	1,64	M2	INSTALADO	
44	HABITACION 315-317 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	




45	HABITACION 315-317 VERTICAL	0,78	2,22	N/A	1	1,73	M2	INSTALADO	
46	HABITACION 318-320 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
47	HABITACION 318-320 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
48	HABITACION 319-321 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
49	HABITACION 319-321 VERTICAL	0,77	2,22	N/A	1	1,71	M2	INSTALADO	
50	HABITACION 322-324 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
51	HABITACION 322-324 VERTICAL	0,755	2,22	N/A	1	1,68	M2	INSTALADO	
52	HABITACION 323-325 HORIZONTAL	0,517	0,22	N/A	1	0,52	M2	INSTALADO	
53	HABITACION 323-325 VERTICAL	0,78	2,22	N/A	1	1,75	M2	INSTALADO	
	ENCHAPE CLOSETS 4 PISO								
54	HABITACION 401 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
55	HABITACION 401 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
56	HABITACION 402 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
57	HABITACION 402 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
58	HABITACION 403 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
59	HABITACION 403 VERTICAL	0,35	2,28	N/A	1	0,80	M2	INSTALADO	
60	HABITACION 404 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
61	HABITACION 404 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
62	HABITACION 405 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
63	HABITACION 405 VERTICAL	0,35	2,28	N/A	1	0,80	M2	INSTALADO	
64	HABITACION 406 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
65	HABITACION 406 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
66	HABITACION 407 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
67	HABITACION 407 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
68	HABITACION 408 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
69	HABITACION 408 VERTICAL	0,35	2,28	N/A	1	0,80	M2	INSTALADO	
70	HABITACION 409 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
71	HABITACION 409 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
72	HABITACION 410 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
73	HABITACION 410 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
74	HABITACION 411 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
75	HABITACION 411 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
76	HABITACION 412 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
77	HABITACION 412 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
78	HABITACION 413 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
79	HABITACION 413 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	PISO 4
80	HABITACION 414 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
81	HABITACION 414 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
82	HABITACION 415 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
83	HABITACION 415 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
84	HABITACION 416 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
85	HABITACION 416 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
86	HABITACION 417 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
87	HABITACION 417 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
88	HABITACION 418 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
89	HABITACION 418 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
90	HABITACION 419 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
91	HABITACION 419 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
92	HABITACION 420 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
93	HABITACION 420 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
94	HABITACION 421 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
95	HABITACION 421 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
96	HABITACION 422 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
97	HABITACION 422 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
98	HABITACION 423 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
99	HABITACION 423 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
100	HABITACION 424 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
101	HABITACION 424 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
102	HABITACION 425 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
103	HABITACION 425 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
	ENCHAPE CLOSETS 3 PISO								
104	HABITACION 301 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
105	HABITACION 301 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
106	HABITACION 302 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
107	HABITACION 302 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
108	HABITACION 303 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
109	HABITACION 303 VERTICAL	0,35	2,28	N/A	1	0,80	M2	INSTALADO	
110	HABITACION 304 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
111	HABITACION 304 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
112	HABITACION 305 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
113	HABITACION 305 VERTICAL	0,35	2,28	N/A	1	0,80	M2	INSTALADO	
114	HABITACION 306 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
115	HABITACION 306 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
116	HABITACION 307 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
117	HABITACION 307 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
118	HABITACION 308 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
119	HABITACION 308 VERTICAL	0,35	2,28	N/A	1	0,80	M2	INSTALADO	
120	HABITACION 309 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
121	HABITACION 309 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
122	HABITACION 310 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
123	HABITACION 310 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
124	HABITACION 311 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
125	HABITACION 311 VERTICAL	0,34	2,28	N/A	1	0,78	M2	INSTALADO	
126	HABITACION 312 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
127	HABITACION 312 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
128	HABITACION 313 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
129	HABITACION 313 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	PISO 3
130	HABITACION 314 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
131	HABITACION 314 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
132	HABITACION 315 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
133	HABITACION 315 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
134	HABITACION 316 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
135	HABITACION 316 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
136	HABITACION 317 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	

137	HABITACION 317 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
138	HABITACION 318 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
139	HABITACION 318 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
140	HABITACION 319 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
141	HABITACION 319 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
142	HABITACION 320 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
143	HABITACION 320 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
144	HABITACION 321 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
145	HABITACION 321 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
146	HABITACION 322 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
147	HABITACION 322 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
148	HABITACION 323 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
149	HABITACION 323 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
150	HABITACION 324 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
151	HABITACION 324 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
152	HABITACION 325 HORIZONTAL	1,62	0,29	N/A	1	0,47	M2	INSTALADO	
153	HABITACION 325 VERTICAL	0,33	2,28	N/A	1	0,75	M2	INSTALADO	
	LACTANCIA								
154	LACTANCIA	1,42	2,39	N/A	2	6,79	M2	INSTALADO	PISO 3
155	LACTANCIA			N/A	0	0,00	M2	PENDIENTE	PISO 2
	CENTRALES DE ENFERMERIA								
156	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL 4 PISO	6,04	0,97	N/A	5,86	34,34	M2	INSTALADO	PISO 4
157	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL 3 PISO	6,04	0,97	N/A	5,86	34,34	M2	INSTALADO	PISO 3
158	CENTRAL DE ENFERMERIA LUDOTECA	4,13	0,77	N/A	4,01	12,76	M2	INSTALADO	PISO 3
159	PUESTO TRABAJO PRINCIPAL UCIP	1,85	0,77	N/A	1,79	2,54	M2	INSTALADO	PISO 3
160	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL UCI NEONATAL	5,39	0,77	N/A	5,23	21,71	M2	INSTALADO	PISO 2
161	PUESTOS DE ENFERMERIA MODULOS UCI NEONATAL	7,20	0,77	N/A	6,98	38,67	M2	INSTALADO	PISO 2
162	CENTRAL DE ENFERMERIA SATELITE UCI ARO	2,09	0,77	N/A	2,03	3,27	M2	INSTALADO	PISO 2
163	CENTRAL DE ENFERMEREIA UCI ARO	2,97	0,77	N/A	2,88	6,58	M2	INSTALADO	PISO 2
164	PUESTO ENFERMERIA SATELITE HALL -SALA DE ESPERA	0,79	0,77	N/A	0,77	0,47	M2	INSTALADO	PISO 2
165	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION PARTOS	4,30	0,77	N/A	4,17	13,80	M2	INSTALADO	PISO 2
166	PUESTO DE ENFEREMERIA SATELITE RECUPERACION PARTOS	3,65	0,77	N/A	3,54	8,95	M2	INSTALADO	PISO 2
167	PUESTO ENFERMERIA. RECUPERACION QUIROFANOS	4,93	0,77	N/A	4,78	18,14	M2	INSTALADO	PISO 2
168	CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRIA	9,40	0,77	N/A	9,12	66,03	M2	INSTALADO	PISO 1
169	CONTROL PRINCIPAL INGRESO TOMA MUESTRAS	3,49	0,97	N/A	3,39	11,49	M2	INSTALADO	PISO 1
	ENCHAPES MUROS PISO 1								
169	PUERTAS BAÑOS SALA ESPERA IMAGENOLOGIA			N/A	0	0,00	M2	PENDIENTE	
20	PUERTAS RACK PISO 1			N/A	0	0,00	M2	PENDIENTE	
21	PUERTA CORREDIZA CARDIOLOGIA			N/A	0	0,00	M2	PENDIENTE	
29									
30									
	TOTAL					450,89	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA





MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

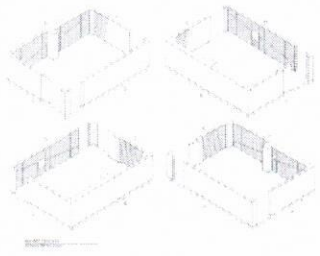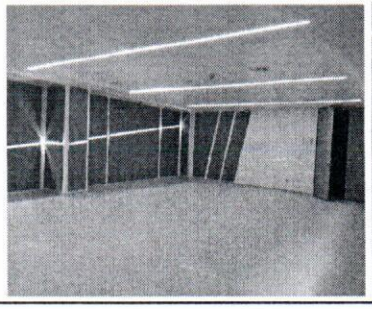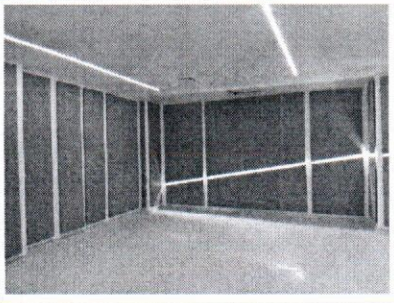OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA	ago-26
CAPITULO: 2	CARPINTERIA EN MADERA		
ACTIVIDAD: 2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE TRABAJO FLOTANTE EN MADERA MELAIMINICA RH ANCHO 50 CM CON PIEAMIGO (COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN) INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES.	UNIDAD	METRO LINEAL

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	UBICACIÓN
1	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL	N/A	N/A	6,05	1	6,05	ML	PISO 4
2	PUESTO ENFERMERIA SATELITE BALCON NORTE	N/A	N/A	7,03	1	7,03	ML	PISO 4
3	IAMMI COORDINACION	N/A	N/A	5,18	1	5,18	ML	PISO 4
4	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL	N/A	N/A	6,05	1	6,05	ML	PISO 3
5	PUESTO ENFERMERIA SATELITE BALCON NORTE	N/A	N/A	7,03	1	7,03	ML	PISO 3
6	CENTRAL DE ENFERMERIA LUDOTECA	N/A	N/A	4,14	1	4,14	ML	PISO 3
7	PUESTO TRABAJO PRINCIPAL UCIP	N/A	N/A	1,85	1	1,85	ML	PISO 3
8	PUESTOS DE TRABAJO X MUDULOS UCIP	N/A	N/A	8,2	1	8,2	ML	PISO 3
9	CENTRAL DE ENFERMERIA PRINCIPAL UCI NEONATAL	N/A	N/A	5,4	1	5,4	ML	PISO 2
10	PUESTOS DE ENFERMERIA MODULOS UCI NEONATAL	N/A	N/A	7,2	1	7,2	ML	PISO 2
11	CENTRAL DE ENFERMERIA SATELITE UCI ARO	N/A	N/A	2,1	1	2,1	ML	PISO 2
12	CENTRAL DE ENFERMEREIA UCI ARO	N/A	N/A	2,97	1	2,97	ML	PISO 2
13	PUESTO ENFERMERIA SATELITE HALL -SALA DE ESPERA	N/A	N/A	0,8	1	0,8	ML	PISO 2
14	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION PARTOS	N/A	N/A	4,3	1	4,3	ML	PISO 2
15	PUESTO DE ENFEREMERIA SATELITE RECUPERACION PARTOS	N/A	N/A	3,65	1	3,65	ML	PISO 2
16	QUIROFANOS DESCANSO PERSONAL	N/A	N/A	4,07	1	4,07	ML	PISO 2
17	FARMACIA	N/A	N/A	4,85	1	4,85	ML	PISO 2
18	PUESTO ENFERMERIA. RECUPERACION QUIROFANOS	N/A	N/A	4,93	1	4,93	ML	PISO 2
19	PREPARACION PACIENTES	N/A	N/A	2,1	1	2,1	ML	PISO 2
20	LABORATORIO DESCANSO PERSONAL	N/A	N/A	1,6	1	1,6	ML	PISO 1
21	CONTROL PRINCIPAL INGRESO TOMA MUESTRAS	N/A	N/A	3,5	1	3,5	ML	PISO 1
22	FARMCIA RECEPCION PRINCIPAL	N/A	N/A	2,82	1	2,82	ML	PISO 1
23	FARMACIA DESCANSO PERSONAL	N/A	N/A	1,6	1	1,6	ML	PISO 1
24	SALA DE LECTURA RADIOLOGIA	N/A	N/A	5,14	1	5,14	ML	PISO 1
25	CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRIA	N/A	N/A	9,41	1	9,41	ML	PISO 1
26	REANIMACION	N/A	N/A	3,24	1	3,24	ML	PISO 1
27	ADMISION URGENCIAS	N/A	N/A	7,3	1	7,3	ML	PISO 1
28	ADMISION URGENCIAS, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	N/A	N/A	3	1	3	ML	PISO 1
29	CENTRAL DE OPERACIONES, SONIDO	N/A	N/A	2,38	1	2,38	ML	PISO 1
30	FACTURACION Y ADMISIONES PRINCIPAL	N/A	N/A	4,4	1	4,4	ML	PISO 1
31	DETRÁS FACTURACION Y ADMISIONES PRINCIPAL	N/A	N/A	5,04	1	5,04	ML	PISO 1
32								
TOTAL						137,33	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA





MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO: 2	CARPINTERIA EN MADERA			
ACTIVIDAD: 2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO INFERIOR EN MADERA MELAIMINICA RH PARA MUEBLE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES ANCHO HASTA 60 CM X ALTO 60 CM X LARGO VARIABLE. INCLUYE REPISA INTERMEDIA DONDE NO VA POZUELO,	UNIDAD		METRO LINEAL

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	ESTACION DE CAFÉ DESCANSO ENFERMERIA	N/A	N/A	1,51	1	1,51	ML	INSTALADO	PISO 1
2	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA	N/A	N/A	3,64	1	3,64	ML	INSTALADO	PISO 1
3	PERSONAL AISTENCIAL DESCANSO	N/A	N/A	1,5	1	1,5	ML	INSTALADO	PISO 1
4	CARDIOLOGIA PROCEDIMIENTOS TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	1,06	1	1,06	ML	INSTALADO	PISO 1
5	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS	N/A	N/A	1,65	1	1,65	ML	INSTALADO	PISO 1
6	OBSERVACION PEDIATRICA TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	1,75	1	1,75	ML	INSTALADO	PISO 1
7	LABORATORIO ENTRE COMPUTADORES Y MICROSCOPIO	N/A	N/A	1,35	1	1,35	ML	INSTALADO	PISO 1
8	TRABAJO LIMPIO FRENTE CENTRAL ENFERMERIA	N/A	N/A	1,13	1	1,13	ML	INSTALADO	PISO 1
9	TRABAJO LIMPIO TRABAJO DE PARTOS	N/A	N/A	2,28	1	2,28	ML	INSTALADO	PISO 2
10	TRABAJO LIMPIO UCI NEANOTAL 1	N/A	N/A	1,33	1	1,33	ML	INSTALADO	PISO 2
11	FILTRO FAMILIARES	N/A	N/A	1,94	0	0	ML	PENDIENTE	PISO 2
12	TRABAJO LIMPIO UCI NEANOTAL 2	N/A	N/A	2,32	1	2,32	ML	INSTALADO	PISO 2
13	TRABAJO DE PARTOS	N/A	N/A	1,99	1	1,99	ML	INSTALADO	PISO 2
14	TRABAJO LIMPIO UCI ARO	N/A	N/A	2,01	1	2,01	ML	INSTALADO	PISO 2
15	TRABAJO LIMPIO UCI PEDIATRICA	N/A	N/A	2,47	1	2,47	ML	INSTALADO	PISO 3
16	PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	1,22	1	1,22	ML	INSTALADO	PISO 3
17	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA	N/A	N/A	1,6	1	1,6	ML	PENDIENTE	PISO 3
18	PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	1,22	0	0	ML	INSTALADO	PISO 4
19	TRABAJO LIMPIO TRAS CENTRAL DE ENFERMERIA	N/A	N/A	1,6	1	1,6	ML	INSTALADO	PISO 4
29									
30									
	TOTAL					30,41	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA



MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.


OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO: 2	CARPINTERIA EN MADERA			
ACTIVIDAD: 2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA FLOTANTE EN MADERA MELAIMINICA RH DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO CON PIEGAMIGO (COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN) INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES.	UNIDAD		METRO LINEAL

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	HOSPITALIZACION. ROPA LIMPIA	N/A	N/A	0,9	4	3,6	ML	INSTALADO	PISO 4
2	HOSPITALIZACION. CUARTO DE EQUIPOS	N/A	N/A	1,8	2	3,6	ML	INSTALADO	PISO 4
3	HOSPITALIZACION DEPOSITO INSUMOS	N/A	N/A	1,8	4	7,2	ML	INSTALADO	PISO 3
4	HOSPITALIZACION. CUARTO DE EQUIPOS	N/A	N/A	0,9	4	3,6	ML	INSTALADO	PISO 3
5	HOSPITALIZACION. ROPA LIMPIA	N/A	N/A	0,9	4	3,6	ML	INSTALADO	PISO 3
6	UCIP. CUARTO EQUIPOS	N/A	N/A	4,69	2	9,38	ML	INSTALADO	PISO 3
7	UCIP. ROPA LIMPIA	N/A	N/A	4,16	4	16,64	ML	INSTALADO	PISO 3
8	UCIP. CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO INSUMOS	N/A	N/A	2,58	4	10,32	ML	INSTALADO	PISO 3
9	PREPARACION FORMULAS. DEPOSITO INSUMOS	N/A	N/A	3,34	4	13,36	ML	INSTALADO	PISO 3
10	LUDOTECA .BODEGA	N/A	N/A	1,7	4	6,8	ML	INSTALADO	PISO 3
11	SALA DE CIRUGIA. BODEGA	N/A	N/A	2,62	4	10,48	ML	INSTALADO	PISO 2
12	SALA DE CIRUGIA. CUARTO EQUIPOS	N/A	N/A	5,88	2	11,76	ML	INSTALADO	PISO 2
13	UCI ARO. DEPOSITO INSUMOS	N/A	N/A	1,1	4	4,4	ML	INSTALADO	PISO 2
14	UCI ARO. CUARTO EQUIPOS	N/A	N/A	5,32	2	10,64	ML	INSTALADO	PISO 2
15	LACTARIO. BODEGA	N/A	N/A	2,55	4	10,2	ML	INSTALADO	PISO 2
16	COORDINACION UCI NEONATAL. INSUMOS	N/A	N/A	1,725	4	6,9	ML	INSTALADO	PISO 2
17	COORDINACION UCI NEONATAL. ROPA SUCIA	N/A	N/A	1,34	4	5,36	ML	INSTALADO	PISO 2
18	COORDINACION UCI NEONATAL. ROPA LIMPIA	N/A	N/A	1,85	4	7,4	ML	INSTALADO	PISO 2
19	UCI NEONATAL. CUARTO EQUIPOS	N/A	N/A	4,55	2	9,1	ML	INSTALADO	PISO 2
20	AUTOCLAVE. ASEO	N/A	N/A	0,95	4	3,8	ML	INSTALADO	PISO 2
21	RECUPERACION PARTOS. ROPA LIMPIA BODEGA	N/A	N/A	1,5	4	6	ML	INSTALADO	PISO 2
22	DIGITACION. CUARTO DE EQUIPOS	N/A	N/A	2,81	2	5,62	ML	INSTALADO	PISO 1
23	DIGITACION. INSUMOS	N/A	N/A	1,41	4	5,64	ML	INSTALADO	PISO 1
24	CARDIOLOGIA. ROPA LIMPIA	N/A	N/A	0,88	4	3,52	ML	INSTALADO	PISO 1
25	CARDIOLOGIA PROCEDIMIENTOS. INSUMOS	N/A	N/A	1,2	4	4,8	ML	INSTALADO	PISO 1
26	LABORATORIO INSUMOS	N/A	N/A	0,5	4	2	ML	INSTALADO	
	TOTAL					185,72	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA



MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD.

OBRA:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA		ago-26
CAPITULO:	2	CARPINTERIA EN MADERA			
ACTIVIDAD:	2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MACIZA DOBLE HOJA DE 36MM EN MADERA MELAIMINICA RH (COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN) INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES.	UNIDAD		UNIDAD

REGISTRO DE CANTIDADES

No.	LOCALIZACION	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL (m)	UNID DE MEDIDA	ESTADO	UBICACIÓN
1	AUDITORIO SALIDA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	INSTALADO	PISO 4
2	AUDITORIO SALIDA CAFETERIA	N/A	N/A	N/A	1	1	UND	INSTALADO	PISO 4
3									
4									
5									
6									
TOTAL						2	UND		

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD REALIZADA

