

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Und.	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**1**	**OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES DEL CACOM 5**			**$ 245,730,408.00**	**70 días**	**27/07/26**	**27/10/26**	
2		1.1	ACTA DE INICIO			$ 0.00	0 días	27/07/26	27/07/26	
3		1.2	Trabajo administrativo			$ 0.00	10 días	27/07/26	7/08/26	2
4		**1**	**PRELIMINARES**			**$ 6,228,454.00**	**47 días**	**8/08/26**	**9/10/26**	
5		1.1	ROTURA DE PAVIMENTO Y ADECUACIÓN NUEVAMENTE DEL TERRENO	ML	4.00	$ 2,794,212.00	1 día	8/10/26	9/10/26	24FF
6		1.2	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	un	8.00	$ 902,664.00	10 días	26/09/26	9/10/26	25FF;26FF;24FF
7		1.3	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	ml	426.63	$ 1,135,689.00	10 días	8/08/26	21/08/26	3
8		1.4	ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES)	m²	48.60	$ 1,395,889.00	10 días	21/09/26	2/10/26	24CC;25CC
9		**2**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**			**$ 6,639,706.00**	**13 días**	**9/10/26**	**27/10/26**	
10		2.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	75.38	$ 3,537,960.00	5 días	9/10/26	16/10/26	30
11		2.2	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	885.96	$ 3,101,746.00	8 días	16/10/26	27/10/26	16;10
12		**3**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			**$ 23,765,655.00**	**37 días**	**21/08/26**	**9/10/26**	
13		3.1	EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	m³	714.83	$ 21,617,889.00	30 días	21/08/26	30/09/26	7
14		3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO	m³	41.65	$ 2,147,766.00	2 días	7/10/26	9/10/26	13FC+5 días
15		**4**	**CIMENTACIÓN**			**$ 45,522,751.00**	**62 días**	**27/07/26**	**16/10/26**	
16		4.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	156.59	$ 18,535,558.00	20 días	21/09/26	16/10/26	24CC;25CC

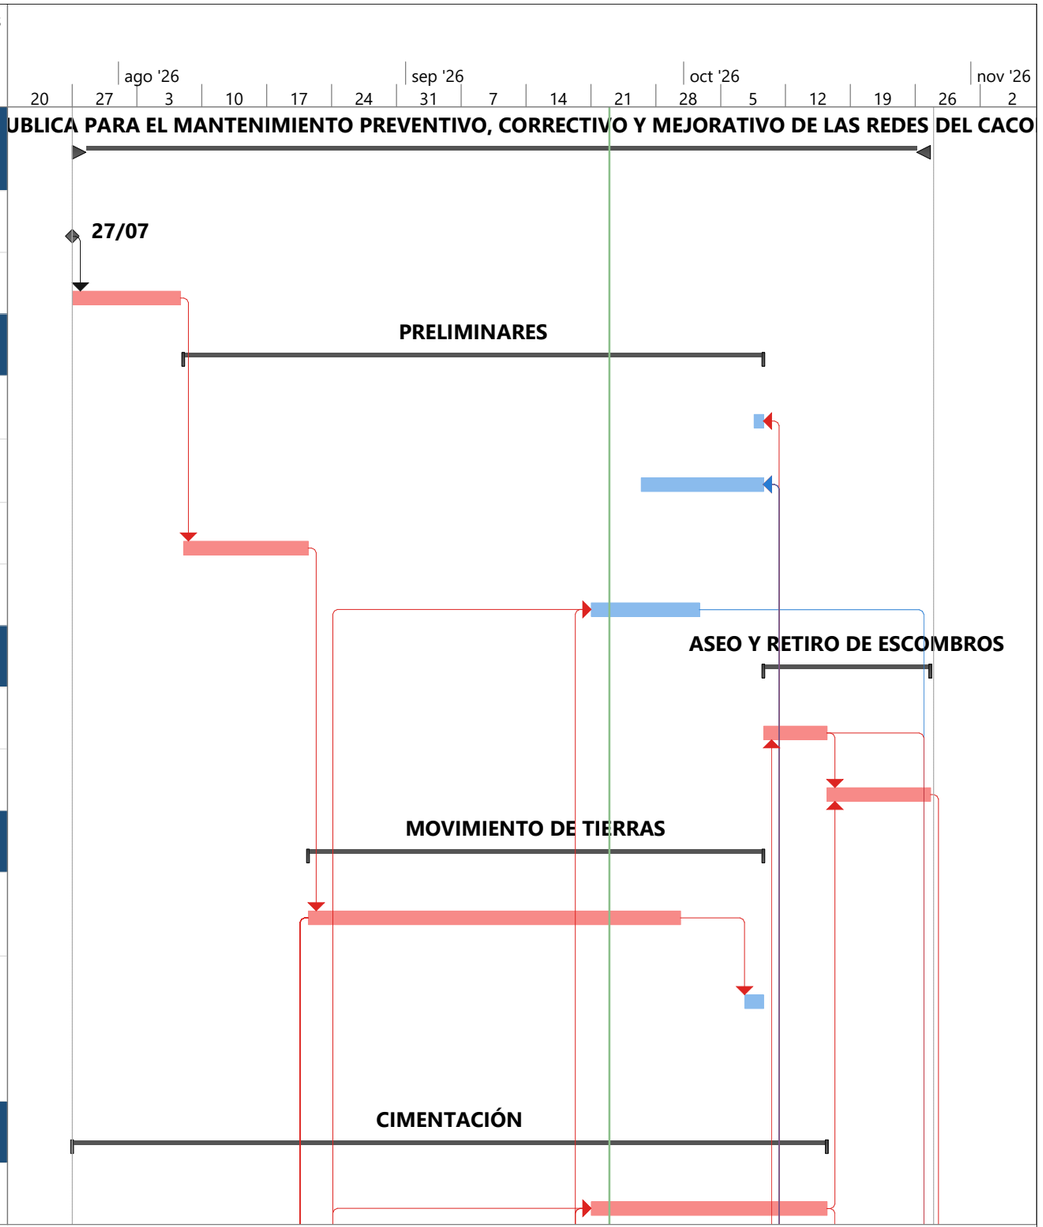

Proyecto: Programacion de Ob
Fecha: 23/09/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Mo de tare	EDT	Nombre de tarea	Und.	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
17		4.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	m³	568.87	$ 26,987,193.00	20 días	21/09/26	16/10/26	16CC
18		4.3	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	ML	-	$ 0.00	0 días	27/07/26	27/07/26	
19		1.6.4	FIN CAP. 4			$ 0.00	0 días	16/10/26	16/10/26	16;17
20		**5**	**INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS**			**$ 100,593,818.00**	**62 días**	**27/07/26**	**16/10/26**	
21		5.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO	un	3.00	$ 1,226,697.00	8 días	6/10/26	16/10/26	24FF+5 días
22		5.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	un	-	$ 0.00	0 días	27/07/26	27/07/26	
23		5.3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	204.00	$ 14,363,844.00	5 días	9/10/26	16/10/26	24
24		5.4	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	188.84	$ 21,261,307.00	15 días	21/09/26	9/10/26	25
25		5.5	TUBERÍA NOVAFORT 10" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	128.60	$ 19,264,923.00	20 días	25/08/26	19/09/26	13CC+2 días
26		5.6	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,50 H = 0 - 4,50 M. INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm	un	4.00	$ 28,678,272.00	8 días	21/09/26	30/09/26	25
27		5.7	POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20M H=1.00M-1.50M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm	un	5.00	$ 15,798,775.00	12 días	21/09/26	6/10/26	26CC
28		1.7.8	FIN INSTALACIONES			$ 0.00	0 días	16/10/26	16/10/26	21;22;23;25;26;2
29		**6**	**OBRAS GENERALES**			**$ 36,514,459.00**	**18 días**	**3/10/26**	**27/10/26**	
30		6.1	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	1,259.89	$ 36,514,459.00	5 días	3/10/26	9/10/26	28FC-10 días
31		1.8.2	FIN DEL PROYECTO			$ 0.00	0 días	27/10/26	27/10/26	8;11;30;19;10

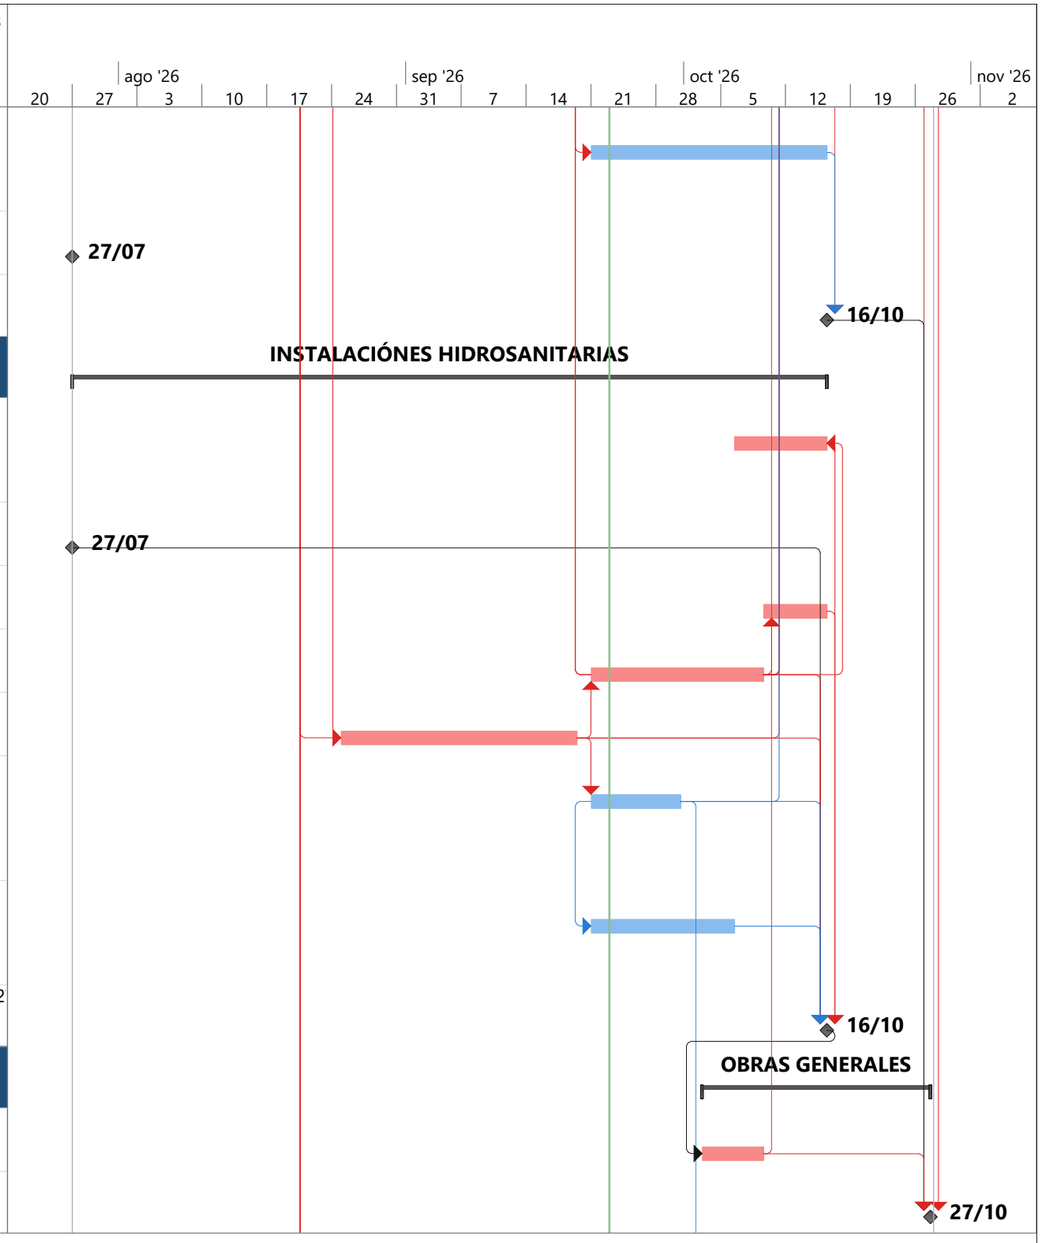

Proyecto: Programacion de Ob
Fecha: 23/09/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Und.	Cant.	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32		**OE**	**OBRAS EXTRAS**			**$ 26,465,565.00**	**30 días**	**28/08/26**	**7/10/26**	
33		OE1	Demolicion de cajas de inspección	M3	4.00	$ 204,764.00	2 días	3/09/26	7/09/26	13CC+10 días
34		OE2	Suministro, transporte, colocación de cama en triturado de 3/4" para cimentación de tubería	M3	79.78	$ 19,473,979.00	30 días	28/08/26	7/10/26	13CC+5 días
35		OE3	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración)	KG	866.10	$ 6,041,048.00	5 días	24/09/26	30/09/26	26FF
36		OE4	Acometida domiciliaria 4" (Incluye silla yee 250 mm, semicodo, y hasta 2 m de tuberia)	UND	1.00	$ 368,732.00	1 día	10/09/26	11/09/26	13CC+15 días
37		OE5	Acometida domiciliaria 6" (Incluye silla yee 250 mm, UNION, y hasta 2 m de tuberia)	UND	1.00	$ 377,042.00	1 día	11/09/26	14/09/26	13CC+16 días

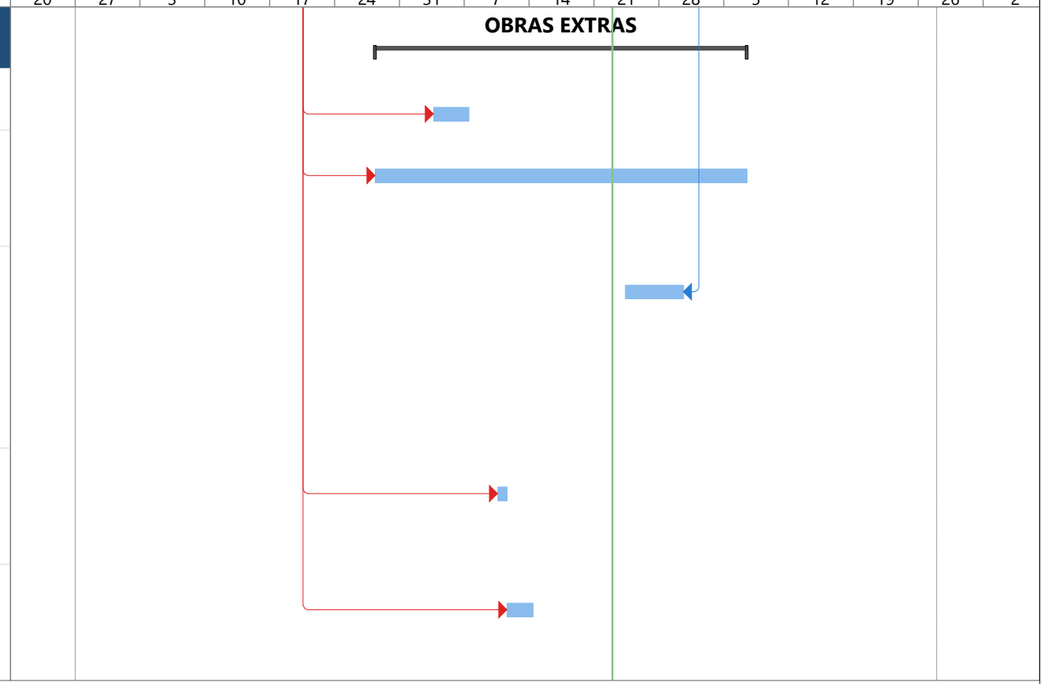

Proyecto: Programacion de Ob
Fecha: 23/09/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
