

Contenido:

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 09
(01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020)



ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONTRATO Nº No. CIN-405-2019
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Revisó y Aprobó : ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO Director y Rep. Legal Interventoría.

TOMO 5 DE 11

TERRATEST SAS

ONAC

Fecha: 2019-08-11
Versión N°: 10

INFORME DE ENSAYO: RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
(ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN Y ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)


FT- 07

Norma Técnica de Referencia Aplicada			Procedimiento de Ensayo	Orden de Ensayo No.
INV E-141-13	INV. E-142-13	E	DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS	241-20

CLIENTE:	CONSTRITURAR S.A.S		
PROYECTO:	877UPLANTA CONSTRITURAR		
DIRECCIÓN:	CALLE 72 No. 10-70		
LOCALIZACIÓN:	N.A	APIQUE N°: N.A	PROFUNDIDAD (m): N.A / N.A
DESCRIPCIÓN:	ARENA ARCILLOSA HABANA CON GRAVA	MUESTRA N°: 3	
FECHA DE RECEPCIÓN:	2020-06-16	TIPO DE MATERIAL: BASE	
FECHA DE ENSAYO:	2020-06-17	PROCEDENCIA: CONSTRITURAR	
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA:	VÍA HÚMEDA: X VÍA SECA:	TIPO DE MARTILLO: MANUAL	

PRUEBA	1	2	3	4	5
N°. de capas	5	5	5	5	5
N°. de golpes	56	56	56	56	56
Contenido de Humedad de la muestra, %	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Humedad adicional, %	0,1	2,2	4,4	6,6	8,1
Masa muestra humeda, g	6000	6000	6000	6000	6000
Masa muestra seca, g	5786	5786	5786	5786	5786
Agua adicional, cm³	6,0	132,0	264,0	408,0	486,4
Masa muestra húmeda + molde, g	7180	7433	7614	7825	7923
Masa molde, g	2736	2736	2736	2736	2736
Masa muestra humeda, g	4452	4697	4878	4829	4787
% humedad (horno)	3,8	5,9	8,1	10,5	11,8
Masa muestra seca, g	4289	4435	4512	4370	4281
Volumen del molde, cm³	2133	2133	2133	2133	2133
Densidad humeda, kg/m³	2087,2	2202,1	2286,9	2263,9	2244,3
Densidad Suelo Humedo, kN/m³	20,5	21,6	22,4	22,2	22,0
Densidad seca, kg/m³	2011	2079	2116	2049	2007
Peso Unitario seco, kN/m³	19,72	20,39	20,75	20,09	19,68
Peso Unitario seco, lbf/ft³	125,5	129,8	132,1	127,9	125,3
Humedad de saturación, %	11,9	10,2	9,4	11,0	12,0
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Recipiente N°	41	108	111	107	42
P_1 Masa recipiente + suelo húmedo (g)	2897,91	2871,75	2902,87	2843,21	2854,92
P_2 Masa recipiente + suelo seco (g)	2792,63	2717,48	2682,80	2582,66	2563,97
P_3 Masa recipiente, (g)	104,22	102,87	101,43	106,65	103,96
Humedad w, en %	3,8	5,9	8,1	10,5	11,8

Curva de compactación y saturación

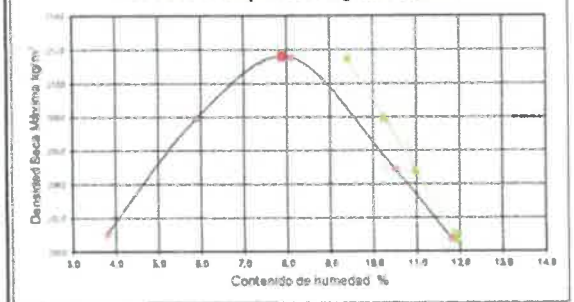

RESULTADOS

Método	C	
Humedad Optima	7,9	%
Densidad seca maxima	2116	kg/m³
Densidad seca maxima	20,75	kN/m³
Densidad seca maxima	132,1	lbf/ft³
Porcentaje de fraccion gruesa	15	% P_{19}
Porcentaje de fraccion de ensayo	85	% P_{19}
Humedad optima Corregida	8,9	%
Densidad Seca Máxima Corregida	2177	kg/m³
Densidad Seca Máxima Corregida	21,35	kN/m³
Densidad Seca Máxima Corregida	133,9	lbf/ft³
Gravedad Especifica Promedio Gs	2,65	
Gravedad Especifica de la Fraccion Gruesa G_{ps}	2,60	
Humedad de los sobre tamaños	3,1	%

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K=2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%	Dens. Max Seca	+/- 0,36	kN/m3
	Humedad optima	+/- 0,17	%

REVISÓ JEFE DE LABORATORIO: ING. PABLO ANDRES CORONEL VIVAS

OBSERVACIONES: NINGUNA

ESTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST S.A.S
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

GEOPAV LTDA. LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE UNA SOLUCION DE SULFATOS DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ) INV E-220-2013	CÓDIGO LAB-11-06	OT N° N/A	REGISTRO N/A

Procedencia: PARQUE 19 - 039
Compañía: CONSORCIO OPORTO
Material: SUB BASE GRANULAR (SBG) TIPO IDU ET

Ingeniero: LEONARDO
Fecha: 16-oct-20

ENSAYO REALIZADO AL AGREGADO GRUESO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO

FRACCIÓN No.	CONTENIDO ENTRE TAMICES	No. CICLOS	PESO INICIAL gr	PESO FINAL gr	% DE PÉRDIDA	GRAD. MUESTRA ORIGINAL %	PERDIDA CORREGIDA %
1	3"-2 1/2"	5					
2	2 "- 1 1/2 "	5					
3	1 1/2 " - 1 "	5	1050,0	890,0	15,2	91,9	14,0038
4	1 "- 3/4 "	5	1000,0	990,0	1,0	75,3	0,7530
5	3/4 " - 3/8 "	5	1000,0	991,0	0,9	60,0	0,5400
6	3/8" - N° 4	5	1000,0	993,0	0,7	44,3	0,3101
						% PERDIDA COREGIDO	15,6

OBSERVACIONES:

4. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

4.1 Producto conforme: SI ☐ NO ☐

4.2 Disposición producto no conforme: a. Reprocesar ☐ c. Aceptar por derogación (con o sin reparación) ☐
b. Reclasificar ☐ d. Rechazar

JOHNNY PIRACOCA	EDGAR PIRACOCA	FABIO PIRACOCA
Realizo	**Reviso**	**Aprobó**



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Superresistente

Fecha de Emisión: 29-oct-20
Número de Reporte: STR-UG-42-2020
Km 14 Vía Bogotá -La Calera, Cundinamarca, Colombia
Planta Santa Rosa

Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha inicial* 12-oct-20 ..... Fecha final* 18-oct-20

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	9.0 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	15.4 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	20.3 MPa	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	30.2 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	0.3 %
Superficie Especifica Blaine	NTC 33	658 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	224 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 152 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)




Resultado: En proceso
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 6.1%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.009%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior

Kelly Tatiana Cadavid
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

GEOTEXTIL TEJIDO

Geosistemas PAVCO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
GEOTEXTIL TEJIDO 2100 PAVCO
LOTE 20724

MEXICHEM COLOMBIA SAS (GEOSISTEMAS PAVCO), *certifica que el geotextil cumple con los valores de las propiedades abajo mencionadas y ha sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas Colombia Ltda.*

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Método Grab			
Resistencia a la tensión	ASTM D 4632	N (lb)	1140 (257)
Elongación		%	15
Método Tira Ancha	ASTM D 4595		
Sentido longitudinal		kN/m (lb/ft)	34 (2330)
Elongación		%	21
Sentido Transversal		kN/m (lb/ft)	34 (2330)
Elongación		%	16
Método CBR	ASTM D 6241	kN (lb)	4,8 (1079)
Resistencia al Punzonamiento			
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N (lb)	400 (90)
Método Mullen Burst *Resistencia al Estallido*	ASTM D 3786	kPa (psi)	3689 (535)

PROPIEDADES HIDRAULICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Tamaño de abertura aparente[2]	ASTM D 4751	mm (No tamiz)	0,425 (40)
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	0,57
Permeabilidad	ASTM D 4491	cm/s	$4,6 \times 10^{-2}$
Tasa de flujo	ASTM D 4491	l/min/m² (gal/min/ft²)	1665(41)

PROPIEDADES FISICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Espesor	ASTM D 5199	mm	0,8
Resistencia UV @ 500 horas	ASTM D 4355	% resistencia retenida	>70
Rollo Ancho	Medido	m	3,85
Rollo Largo			140
Rollo Area	Calculado	m^2	539

Fecha emisión: **jul-20**

1. Valor Mínimo Promedio por Rollo. corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de los valores de la producción

Nota: Mexichem Colombia SAS (Geosistemas Pavco) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web www.pavco.com.co link Geosistemas

Mexichem Geosynthetics

Mexichem Colombia SAS
Bogotá, Colombia: Autopista Sur No. 71 - 75 Telefono (571) 7825100
Servicio al cliente: Ext 3301 - 3302 - 3303 - 3304 - 3305
e-mail: servicio_geosistemas@pavco.com.co

SIG Sistema Integrado de Gestión
UN SELLO DE CONFIANZA

01B 074 2019.doc

Bogotá, Octubre 11 de 2019

PREFABRICADOS CONCRETARTE SAS
NIT 830.087.188-0

CERTIFICA QUE:

La empresa PREFABRICADOS Y **CONSTRUCCIONES PREFACON SAS** identificada con NIT 830.103.395-8, pertenece al mismo grupo económico y objeto social al que pertenece PREFABRICADOS CONCRETARTE SAS.

Así mismo certificamos que la planta de producción la comparten entre las dos empresas formando vínculo comercial desde hace 15 años, en la producción y comercialización de prefabricados en concreto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Octubre de 2019.

Este documento se expide única y exclusivamente con fines informativos, a solicitud del interesado y no constituye obligación alguna para ***PREFABRICADOS CONCRETARTE SAS.***

Para verificar esta información comunicarse al 3230353 Ext. 103

MARIA HELENA RUIZ
Líder Administrativa y Financiera

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

ACREDITADO ONAC

Laboratorio de Control de Calidad

Dirección: Carrera 29C No. 71A – 30
Teléfonos: 2255814 – 6304515 - 2315608
Bogotá, D.C. - Colombia


CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

INFORME DE ENSAYO
MÉTODO DE ENSAYO A FLEXIÓN DE LAS UNIDADES PREFABRICADAS, PARA DETERMINAR SU MÓDULO DE ROTURA

Norma	Control de documentos	Revisión No.	08
NTC 4109:2019 numeral 7	EIE-F-03-71	Fecha de emisión:	2020-07-25

Compañía:	PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON		**INFORME-20/1112**
Obra:	1596	**Orden de trabajo No.**	23807/ 5578
Material:	Bordillo A-80	**Fecha de entrada:**	2020-11-28
Procedencia:	Planta	**Fecha de ensayo:**	2020-12-03

BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO

Muestra No.	Espécimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga máxima	Dimensiones			Ixx (mm^4)	M. Rotura (MPa)		%	Gráfica del espécimen
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
8	1	Bordillo Fecha de Toma: 2020-11-05	A-80	4,0	58420	747,2	348,1	200,3	223255492	4,9	4,8	121	
	2	Bordillo Fecha de Toma: 2020-11-05			56450	748,1	347,3	201,0	224559711	4,7			
	3	Bordillo Fecha de Toma: 2020-11-05			58100	747,0	348,2	200,1	222244620	4,9			

CONDICIONES AMBIENTALES	20,6°C 45,3%HR

Observaciones: Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual ≥ 3,5 MPa y Promedio ≥ 4,0 Mpa.

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	
2020-12-04	Danilo Monroy	Ing. Gerardo Bravo Plata	
	Auxiliar de Ingeniería	Gerente Técnico	

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quién aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

ACREDITADO ONAC

Laboratorio de Control de Calidad

Dirección: Carrera 29C No. 71A – 30
Teléfonos: 2255814 – 6304515 - 2315608
Bogotá, D.C. - Colombia


CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

INFORME DE ENSAYO
MÉTODO DE ENSAYO A FLEXIÓN DE LAS UNIDADES PREFABRICADAS, PARA DETERMINAR SU MÓDULO DE ROTURA

Norma	Control de documentos	Revisión No.	08
NTC 4109:2019 numeral 7	EIE-F-03-71	Fecha de emisión:	2020-07-25

Compañía:	PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON		**INFORME-20/1112**
Obra:	1596	**Orden de trabajo No.**	23807/ 5577
Material:	Sardinel A-10	**Fecha de entrada:**	2020-11-28
Procedencia:	Planta	**Fecha de ensayo:**	2020-12-03

BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO

Muestra No.	Espécimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga máxima	Dimensiones			bx (mm⁴)	M. Rotura (MPa)		%	Gráfica del espécimen
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
93	1	Sardinel Fecha de Toma: 2020-11-05	A-10	4,0	64400	740,3	499,2	199,1	295392247	4,0	4,1	101	
	2	Sardinel Fecha de Toma: 2020-11-05			65370	742,1	498,3	199,5	296510233	4,1			
	3	Sardinel Fecha de Toma: 2020-11-05			65350	739,0	498,1	199,3	295048594	4,1			

CONDICIONES AMBIENTALES	20,6°C 45,3%HR

Observaciones: Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual ≥ 3,5 MPa y Promedio ≥ 4,0 Mpa.

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	
2020-12-04	Danilo Monroy	Ing. Gerardo Bravo Plata	
	Auxiliar de Ingeniería	Gerente Técnico	

Este folio no debera reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.	Laboratorio de Control de Calidad	*CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA*	
INFORME: Carta Remisión de Resultados EIE-INF/LAB -020-0984			**Página 1 de 1**
Fecha de Edición: 2015/10/15	**Revisión No. 11**	Control de documentos	**EIE-F-02-08**

Bogotá D.C., diciembre 04 de 2020

Señores
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON
Atn: Ing. Nelly Nivia
Obra: **"1596"**
Ciudad

Estimados Señores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe oficial con los resultados obtenidos del ensayo de Flexión efectuado sobre tres (3) muestras de Bordillo A-80 y Sardinel A-10, remitidas y tomadas por ustedes a nuestro laboratorio.

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos descritos en la norma NTC 4109:2019

En el formato anexo se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.

NOTA: **EIE ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS, conservará muestras testigo de ensayos o contramuestras que lo permitan, por un periodo máximo de 30 días calendario, luego de la emisión del informe.**

Cordialmente,



GENIERIA Y ENSAYOS SAS.

ING. GERARDO BRAVO PLATA
GERENTE TECNICO
El Informe EIE-INF/LAB-020-1112, contiene 02 folios.

SA 643

Cliente CONSORCIO OPORTO

Item CRA 73H N 62A - 04 SUR GALICIA

Transortador HANS TORRES

Placa XXX

Fecha 8/01/2021

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de medida
	BLOQUE DE CEMENTO A - 80 SUPERIOR	1	UND
	BLOQUE DE CEMETO A 80 ALIGERADO	1	UND
	BLOQUE DE CEMENTO A - 10 SUPERIOR	1	UND
	BLOQUE DE CEMENTO A - 10 ALIGERADO	1	UND
Total			

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido

GEOPAV LTDA.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

RELACIONES DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS. PROCTOR MODIFICADO
I.N.V 146

CODIGO:	PM-13-01
VERSION:	13-01
O.T.N°:	N/A
REF:	16 -118

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL.

1.1 Fecha de Ensayo:	lunes, 14 de septiembre de 2020
1.2 Tipo de Capa:	SUB BASE GRANULAR TIPO IDU
1.3 Obra:	19-039
1.4 Proyecto:	CONSORCIO OPORTO

2. ENSAYO DE COMPACTACION.


2.1 Caracteristicas del Martillo.

Dimensiones	
Peso	10 lbs
Altura de Caida	1,5 pies

PRUEBA:	1	2	3	4	5
Humedad Natural [%]:					
Numero de Golpes por Capa:	56	56	56		
Numero de Capas:	5	5	5		
Peso de la Muestra Humeda + Molde [gr]:	6871	7128	7042		
Peso del Molde [gr]:	2713	2718	2718		
Peso de la Muestra Humeda [gr]:	4158	4410	4324		
Volumen del Molde [cm3]:	2125	2125	2125		
Densidad Humeda del Material [gr/cm3]:	1,957	2,075	2,035		
Humedad [%]:	7,10	9,84	11,19		
Densidad Seca del Material [gr/cm3]:	1,827	1,889	1,830		

PRUEBA DE HUMEDAD DE HORNO

Peso capsula + suelo humedo (gr):	301,60	351,00	395,90		
Peso capsula + suelo seco (gr):	284,20	323,30	359,30		
Peso capsula (gr):	39,20	41,80	32,30		
Humedad [%]:	7,1	9,8	11,2		

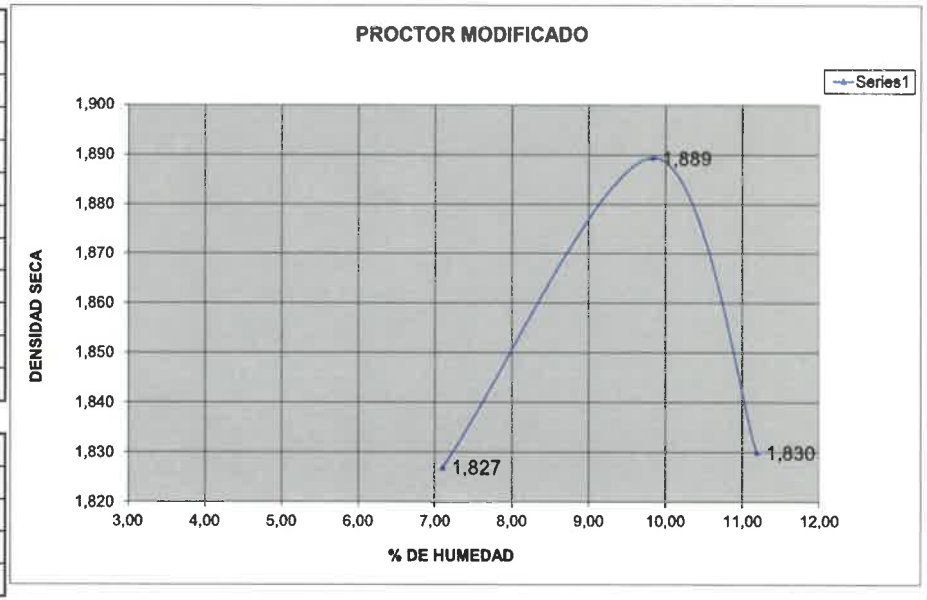

3. RESULTADOS.

Densidad Seca Maxima [gr/cm³]:	1,889
Contenido Optimo de Humedad [%]:	9,8

4. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

4.1 Producto conforme: SI ☐ NO ☐

4.2 Disposición producto no conforme:
a. Reprocesar ☐ c. Aceptar por derogación (con o sin reparación) ☐
b. Reclasificar ☐ d. Rechazar ☐

4.3 Observaciones:

JHONNY PIRACOCA Realizo	JAMES MUÑOZ PARDO APROBO

Dirección: Carrera 129 No.23-48 - Teléfono: 2988838 - 2679240 - cel: 3105552531 - 3112812370 - 3212551846 - e-mail: geopavltda@gmail.com - geopavltdadirecciontecnica@gmail.com - Bogotá D.C.- Colombia.

GEOPAV LTDA.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

RELACIONES DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS. PROCTOR MODIFICADO
I.N.V 146

CODIGO:	PM-13-01
VERSION:	13-01
O.T.N°:	N/A
REF:	16 -118

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL.

1.1 Fecha de Ensayo	lunes, 26 de octubre de 2020
1.2 Tipo de Capa:	BASE GRANULAR TIPO IDU
1.3 Obra	19-039
1.4 Proyecto	CONSORCIO OPORTO

2. ENSAYO DE COMPACTACION.


2.1 Caracteristicas del Martillo.

Dimensiones	
Peso	10 lbs
Altura de Caida	1,5 pies

PRUEBA	1	2	3	4	5
Humedad Natural [%]					
Número de Golpes por Capa	56	56	56		
Numero de Capas	5	5	5		
Peso de la Muestra Humeda + Molde [gr]	7012	7550	7212		
Peso del Molde [gr]	2713	2718	2718		
Peso de la Muestra Humeda [gr]	4299	4832	4494		
Volumen del Molde [cm3]	2125	2125	2125		
Densidad Humeda del Material [gr/cm3]	2,023	2,274	2,115		
Humedad [%]	12,57	15,09	18,33		
Densidad Seca del Material [gr/cm3]	1,797	1,976	1,787		

PRUEBA DE HUMEDAD DE HORNO

Peso capsula + suelo humedo (gr)	393,50	301,20	469,00		
Peso capsula + suelo seco (gr)	353,10	266,20	401,30		
Peso capsula (gr)	31,70	34,20	32,00		
Humedad [%]	12,6	15,1	18,3		

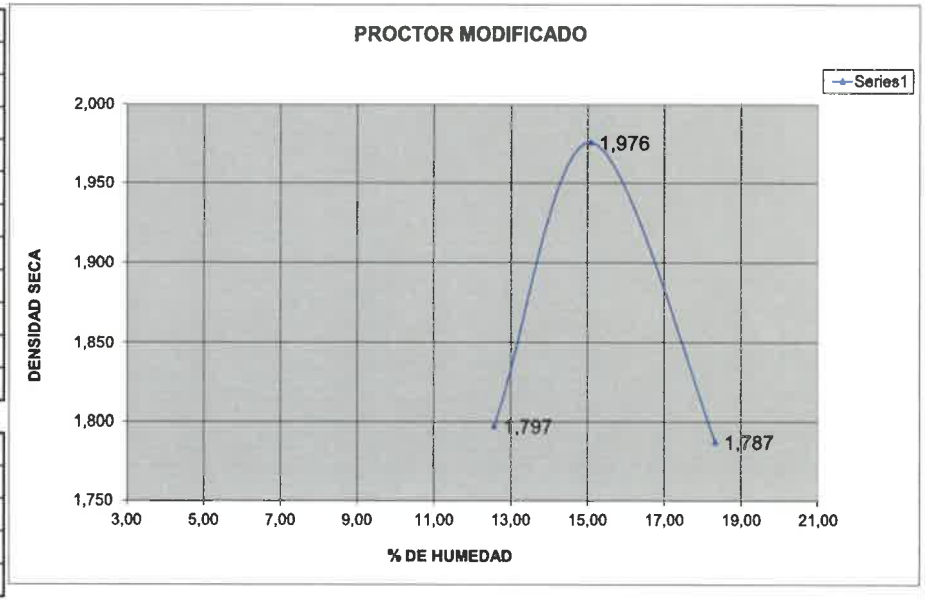

3. RESULTADOS.

Densidad Seca Máxima [gr/cm³].	1,976
Contenido Optimo de Humedad [%].	15,1

4. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

4.1 Producto conforme: SI ☐ NO ☐

4.2 Disposición producto no conforme:
a. Reprocesar ☐ c. Aceptar por derogación (con o sin reparación) ☐
b. Reclasificar ☐ d. Rechazar ☐

4.3 Observaciones:

JHONNY PIRACOCA Realizo	FABIO PIRACOCA APROBO

Dirección: Carrera 129 No.23-48 - Teléfono: 2988838 - 2679240 - cel: 3105552531 - 3112812370 - 3212551846 - e-mail: geopavltda@gmail.com - geopavltdadirecciontecnica@gmail.com - Bogotá D.C.- Colombia.

GEOPAV LTDA.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

RELACIONES DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS. PROCTOR MODIFICADO
I.N.V 146

CODIGO:	PM-13-01
VERSION:	13-01
O.T.Nº:	N/A
REF:	16 -118

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL.

1.1 Fecha de Ensayo:	lunes, 14 de diciembre de 2020
1.2 Tipo de Capa:	SUELO CMENTO
1.3 Obra:	CONSORCIO OPORTO
1.4 Proyecto:	CIUDAD BOLIVAR

2. ENSAYO DE COMPACTACION.


2.1 Caracteristicas del Martillo.

Dimensiones	
Peso	10 lbs
Altura de Caida	1,5 pies

PRUEBA	1	2	3	4	5
Humedad Natural (%):					
Numero de Golpes por Capa:	56	56	56		
Numero de Capas:	5	5	5		
Peso de la Muestra Humeda + Molde (gr):	6935	7114	7061		
Peso del Molde (gr):	2713	2718	2718		
Peso de la Muestra Humeda (gr):	4222	4396	4343		
Volumen del Molde (cm3):	2125	2125	2125		
Densidad Humeda del Material (gr/cm3):	1,987	2,069	2,044		
Humedad (%):	10,36	13,97	16,20		
Densidad Seca del Material (gr/cm3):	1,800	1,815	1,759		

PRUEBA DE HUMEDAD DE HORNO

Peso capsula + suelo humedo (gr):	322,10	341,60	417,90		
Peso capsula + suelo seco (gr):	295,10	303,30	363,90		
Peso capsula (gr):	34,56	29,20	30,50		
Humedad (%):	10,4	14,0	16,2		

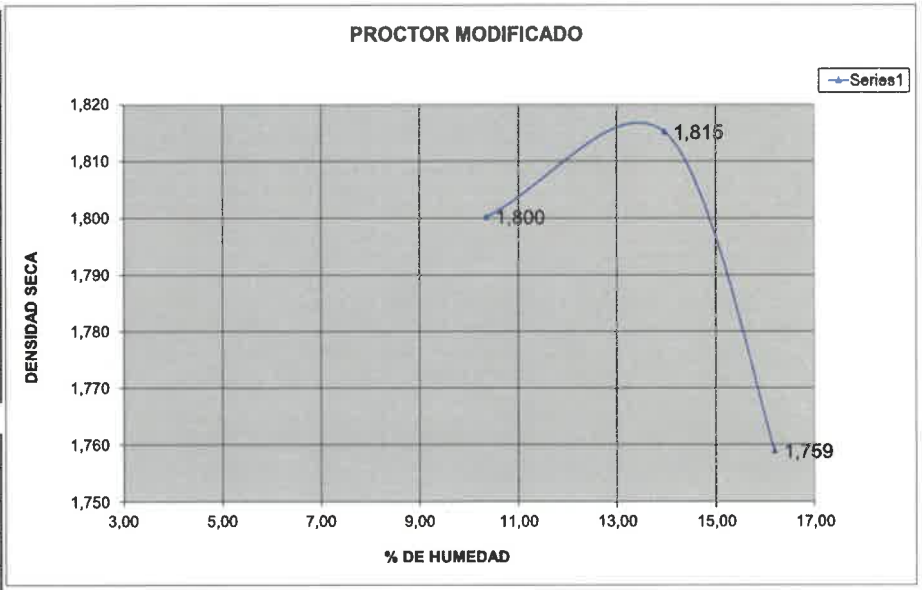

3. RESULTADOS.

Densidad Seca Máxima [gr/cm³]:	1,815
Contenido Optimo de Humedad [%]:	14,0

4. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

4.1 Producto conforme: SI ☐ NO ☐

4.2 Disposición producto no conforme:
a. Reprocesar ☐ c. Aceptar por derogación (con o sin reparación) ☐
b. Reclasificar ☐ d. Rechazar ☐

4.3 Observaciones:

JHONNY PIRACOCA	FABIO PIRACOCA
Realizo	APROBO

Dirección: Carrera 129 No.23-48 - Teléfono: 2988838 - 2679240 - cel: 3105552531 - 3112812370 - 3212551846 - e-mail: geopavltda@gmail.com - geopavltdadirecciontecnica@gmail.com - Bogotá D.C.- Colombia.

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
f.electronica@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 443

Cliente	CONSORCIO OPORTO		
NIT	901,351,629 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2572887
Dirección	CL 86 D 30 38	**Vendedor**	MORENO BARCO WENDY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	informacion@americanacorp.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-11-12	11:36:38
Expedición	2020-11-12	11:39:39
Vencimiento	2020-11-15	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0020001002000	VARILLA CORRUGADA 1/2 x 6 mts	52	17,600.00	0	915,200.00
2	0020001001400	VARILLA CORRUGADA 3/8 (9mm) x 6 mts	44	9,750.00	0	429,000.00
3	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	1	4,800.00	0	4,800.00
4	0020025000600	KLS VARILLA EN CHIPA 3/8	100	2,920.00	0	292,000.00

Total Bruto	1,641,000.00
IVA 19%	311,790.00
Total a Pagar	**$ 1.952.790,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Anticipo Clientes	Efectivo	1.232.939,94	Cuota 1 Vence el 2020-11-11
Credito	Factura Por Cobrar	Acuerdo Mutuo	719.850,06	Cuota 2 Vence el 2020-11-15

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR ENTREGAR EN CALLE 18 SUR # 29 D - 12 ANDINA JUEGOS RECIBE LUIS SEGRERA 3142891714 CONTADO 06/03

Elaborado e Impreso Electronicamente por Siigo SAS

Firma Elaborado por : VENTAS PRINCIPA **Firma Recibido**

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006770717 **aprobado en** 2020-11-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE :84cd2e467dc0eb3b06bd413af4441ff2db179c1f7af8d319b73420f508bf0c7b0bbb8b5e57b2fc5cc653d83f16f8cc20

814.

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
f.electronica@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO OPORTO		
NIT	901,351,629 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2572887
Dirección	CL 86 D 30 38	**Vendedor**	MORENO BARCO WENDY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	informacion@americanacorp.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 443

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-11-12	11:36:38
Expedición	2020-11-12	11:39:39
Vencimiento	2020-11-15	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0020001002000	VARILLA CORRUGADA 1/2 x 6 mts	52	17,600.00	0	915,200.00
2	0020001001400	VARILLA CORRUGADA 3/8 (9mm) x 6 mts	44	9,750.00	0	429,000.00
3	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	1	4,800.00	0	4,800.00
4	0020025000600	KLS VARILLA EN CHIPA 3/8	100	2,920.00	0	292,000.00

Total Bruto	1,641,000.00
IVA 19%	311,790.00
Total a Pagar	**$ 1.952.790,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Anticipo Clientes	Efectivo	1.232.939,94	Cuota 1 Vence el 2020-11-11
Credito	Factura Por Cobrar	Acuerdo Mutuo	719.850,06	Cuota 2 Vence el 2020-11-15

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR ENTREGAR EN CALLE 18 SUR # 29 D - 12 ANDINA JUEGOS RECIBE LUIS SEGRERA 3142891714 CONTADO 06/03

Elaborado e Impreso Electronicamente por Siigo SAS

Firma Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006770717 **aprobado en** 2020-11-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE :84cd2e467dc0eb3b06bd413af4441ff2db179c1f7af8d319b73420f508bf0c7b0bbb8b5e57b2fc5cc653d83f16f8cc20

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
f.electronica@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO OPORTO		
NIT	901,351,629 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2572887
Dirección	CL 86 D 30 38	**Vendedor**	MORENO BARCO WENDY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	informacion@americanacorp.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 443

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-11-12	11:36:38
Expedición	2020-11-12	11:39:39
Vencimiento	2020-11-15	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0020001002000	VARILLA CORRUGADA 1/2 x 6 mts	52	17,600.00	0	915,200.00
2	0020001001400	VARILLA CORRUGADA 3/8 (9mm) x 6 mts	44	9,750.00	0	429,000.00
3	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	1	4,800.00	0	4,800.00
4	0020025000600	KLS VARILLA EN CHIPA 3/8	100	2,920.00	0	292,000.00

Total Bruto	1,641,000.00
IVA 19%	311,790.00
Total a Pagar	**$ 1.952.790,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Anticipo Clientes	Efectivo	1.232.939,94	Cuota 1 Vence el 2020-11-11
Credito	Factura Por Cobrar	Acuerdo Mutuo	719.850,06	Cuota 2 Vence el 2020-11-15

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR ENTREGAR EN CALLE 18 SUR # 29 D - 12 ANDINA JUEGOS RECIBE LUIS SEGRERA
3142891714 CONTADO 06/03

Elaborado e Impreso Electronicamente por Siigo SAS

Firma Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006770717 **aprobado en** 2020-11-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE :84cd2e467dc0eb3b06bd413af4441ff2db179c1f7af8d319b73420f508bf0c7b0bbb8b5e57b2fc5cc653d83f16f8cc20

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-021

INFORME DE ENSAYO DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES NTC 98/2012: NTC 93/2013

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: RAJON

Fecha de toma: 2020-10-29 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-10-30 **No. de muestra:** 4587
Fecha de ensayo: 2020-11-12

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Prueba	1	2	3	4	5
Gradación usada	E				
No. de esferas	12				
No. de revoluciones	1000				
Peso muestra seca antes del ensayo (g)	10002				
Peso muestra seca despues del ensayo (g)	5538				
Pérdida (g)	4464.0				
% de desgaste	45				
Especificación : % menor que	5O				

RESUMEN DE TABLAS NTC 93/1995 Y 98/2006 Datos sobre gradación, carga abrasiva y revoluciones.

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (g)						
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
3"	2½"					2500		
2½"	2"					2500		
2"	1½"					5000	5000	
1½"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4"	1250						5000
3/4"	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8"	1250	2500					
3/8"	1/4"			2500				
1/4"	#4			2500				
#4	#8				5000			
No. de esferas		12	11	8	6	12	12	12
No. de revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-21/1
FIRMA: Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: _____ FECHA: _____	Inf N: 811991 Fecha: 2020-11-17

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-021

INFORME DE ENSAYO DE LIMITES NTC 4630/1999

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: B-200


Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4638
Fecha de ensayo: 2020-12-09

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

LÍMITES DE CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO:			
N° de golpes			
Vidrio N°.	NL-NP		
Masa humeda (g):			
Masa seca (g):			
Masa del recipiente (g)			
Masa Seca (g)			
Masa Agua (g)			
% Humedad			

LÍMITE PLÁSTICO:			
N° de vaso			
Masa humeda (g):			
Masa seca(g):			
Masa recipientes(g):			
Masa Seco (g)			
Masa Agua (g)			
% Humedad			

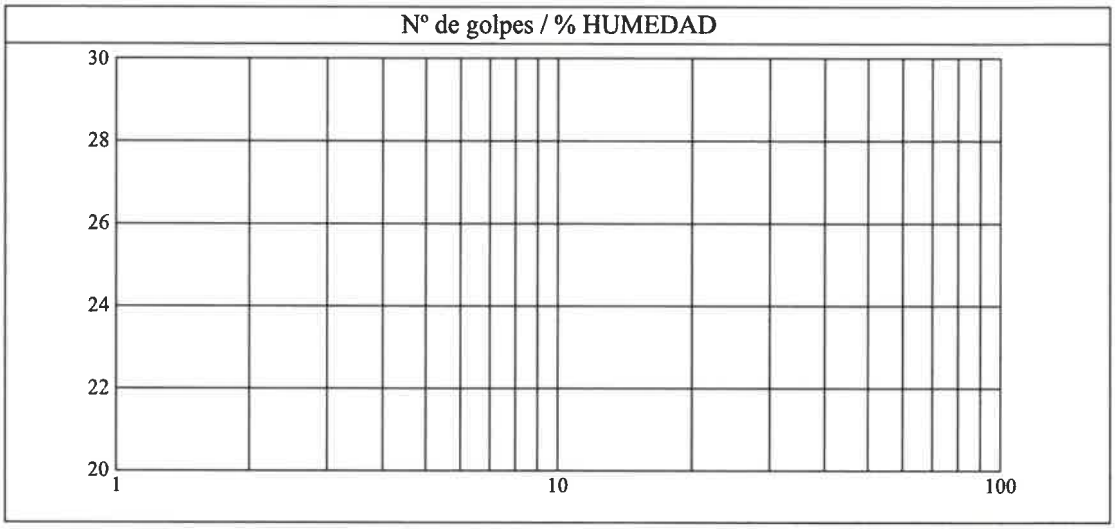

RESULTADOS	
LÍMITE LÍQUIDO (%)	0
LÍMITE PLÁSTICO (%)	0
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	0
HUMEDAD NATURAL (%)	5.08
GRAVAS (%)	58.95
ARENAS (%)	25.66
FINOS (%)	15.39

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA:	FIRMA:	Código: FL049/00
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Inf N: 818351 Fecha: 2020-12-11

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-023

INFORME DE ENSAYO DE GRANULOMETRIA POR TAMIZADO NTC 77:2018

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: B-200

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4638
Fecha de ensayo: 2020-12-09


Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO NTC 77/2018

Masa antes de lavado(g):	4918	Masa después de lavado(g):	4161

Tamiz (Pulg)	Tamiz (mm)	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
4"	101.60				
3 ½"	88.90				
3"	76.20				
2 ½"	63.50	0.0	0.0	0.0	100.0
2"	50.80	978.0	19.9	19.9	80.1
1 ½"	38.10	497.0	10.1	30.0	70.0
1"	25.40	406.0	8.3	38.2	61.8
3/4"	19.10	263.0	5.3	43.6	56.4
1/2"	12.70	312.0	6.3	49.9	50.1
3/8"	9.53	179.0	3.6	53.6	46.4
#4	4.76	264.0	5.4	58.9	41.1
#10	2.00	206.0	4.2	63.1	36.9
#40	0.42	160.0	3.3	66.4	33.6
#100	0.15	688.0	14.0	80.4	19.6
#200	0.07	208.0	4.2	84.6	15.4
Fondo		757.0	15.4	100.0	0.0

SIN ESPECIFICACION - Índice Máximo de Plasticidad:

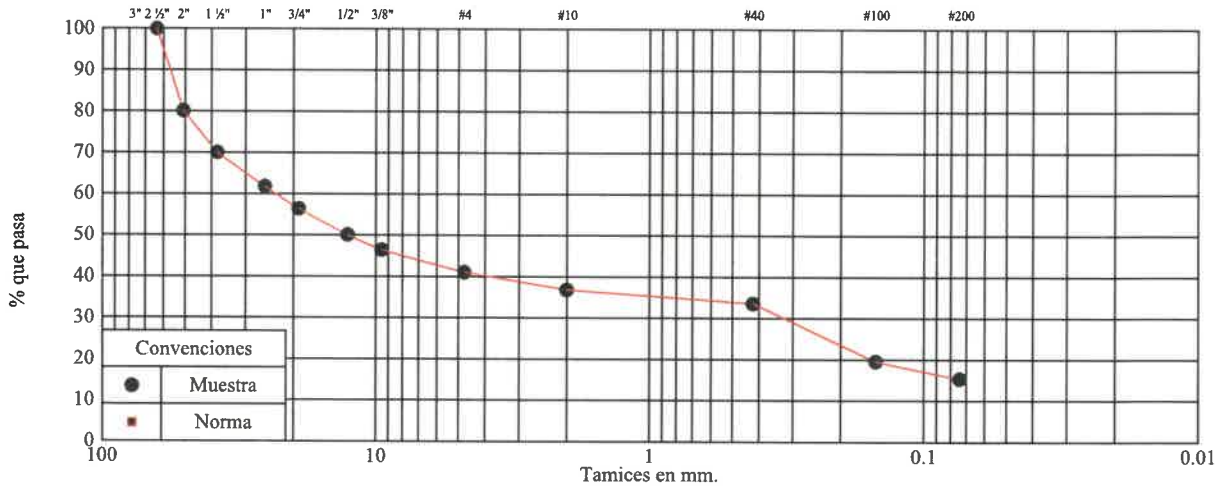

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Fernando Rodríguez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: _____ FECHA: _____	Código: FL049/00 Inf N: 818351 Fecha: 2020-12-11

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-021

INFORME DE ENSAYO RELACION HUMEDAD-MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION INVE 142-2013


Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: B-200

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4638
Fecha de ensayo: 2020-12-01

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

PRUEBA	1	2	3	4	5
N° de golpes	56	56	56	56	
Molde N°	MO363	MO363	MO363	MO363	
Humedad natural muestra (%)	4	4	4	4	
Humedad adicional (%)	2	4	6	8	
Peso muestra húmeda (g)	6000	6000	6000	6000	
Peso muestra seca (g)	5770	5770	5770	5770	
Agua adicional (%)	120	240	360	480	
Peso muestra húmeda + molde (g)	7092	7350	7360	7200	
Peso molde (g)	2680	2680	2680	2680	
Peso muestra húmeda (g)	4412	4670	4680	4520	
Humedad horno (%)	6.0	7.4	9.9	11.9	
Peso muestra seca (g)	4162.9	4346.6	4258.8	4037.8	
Volumen del molde (cm³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad muestra seca (g/cm³)	1.97	2.05	2.01	1.91	

HUMEDAD DE MOLDEO vs DENSIDAD

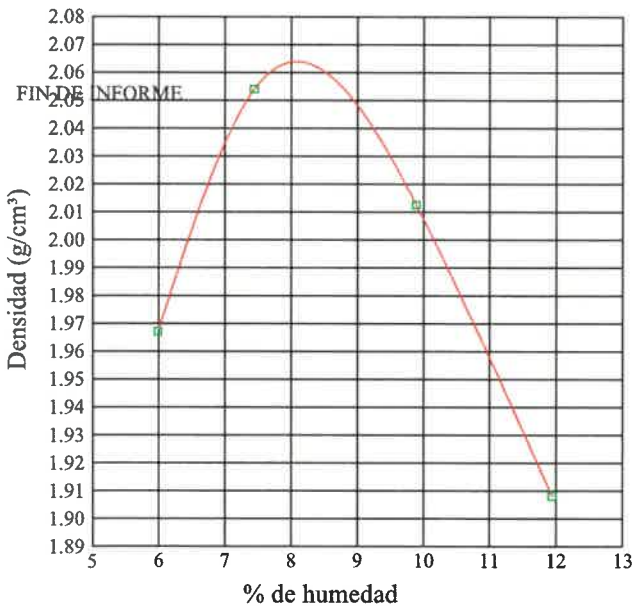

FIN DE INFORME

Densidad máxima (g/cm³)	2.064
Humedad óptima (%)	8.1
Material retenido tamiz 3/4" (g)	
Tipo de cara del pisón	PLANA

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA:	FIRMA:	Código: F-EM-04/8
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Inf N: 818355 Fecha: 2020-12-07

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

REMISIÓN
29819

RE29819

Cliente: CONSORCIO OPROTO

Item: parque 19-079 SIERRA MORENA Entre Transversal 73d,Transversal 73d bis Y Diagonal 70 Sur -- ING NELSON 310 878 22 37

Transportador: RODOLFO ACOSTA

Placa: WDJ548

Fecha: 12/01/2021

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de medida
	BLOQUE DE CEMENTO A - 80 ALIGERADOS	88	UND

20-01-2021

Nelson Huerta — Residente Obra

Nombre: 1018459532 Cargo: Obra

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfacción, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.

PREFABRICADOS CONCRETARTE

NIT.: 830087188-0

VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO

Tel: 3230353

REMISIÓN
29821

REMISION

Numero: 001-RE-029821

Fecha : 2021-ENE-20

Cliente : CONSORCIO OPROTO

Contacto :

N o C.C.: 901351629-6 Codigo: 901351629

Direccion : CALLE 185F N 240 12

Ciudad : BOGOTA D.C.

Telefono : 8054012 Fax :

Transportador: Placa: Guia: Valor: 0

Vendedor: 021 LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 027001.3 OV.Nro : 004820

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	119.00	90.00	29.00	8,730

Peso Total..... 8,730.00

Observaciones: ESTANCIA 19-016 DG 75 F Y DG 75 I BIS CON CL 62 H SUR COTADO NORTE

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Nelson Huerta

Nombre: C.C 1018459532 Cargo: Residente Obra

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F003	22/01/2021	189183721
CALLE 57Z #7605 AUTOPITA SUR DETRAS DE PROTABACO		F0030000115848

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50990441	66925358	CONSORCIO OPORTO	ATS REFA 1497289 DESARROLLO ARBORIZADORA

PEDIDO	DIRECCION OBRA	TELEFONO
8010774038	DG 73 B BIS CON CR 42 COSTADO SUR OCCIDENTAL	

M3	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
6,750	1-210-5-28-13	CARGA INCOMPLETA COLOCACION CARGO DE SOSTENIBILIDAD	6,750
SELLOS / CODIGO			ASENTAMIENTO
183486 / 20018265	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DIAS AS13cm(5")		ASENTAMIENTO 13 CM (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1714	1403190	NELSON ENRIQUE PAEZ

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
09:20:00	11:00:00	10:37		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

_____
Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño. Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

Nelson Prieto 22-01-2021 CC 1018459532

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F003	28/01/2021	189438539
CALLE 57Z #7605 AUTOPITA SUR DETRAS DE PROTABACO		F0030000116046

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50990441	66933936	CONSORCIO OPORTO	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19 255	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8010798569		ENTRE CL 59 A SUR DG 64B SUR CR 38		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
5.500		1-210-5-28-13	CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	5,500
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
183032	20018265	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DIAS AS13cm(5")		ASENTAMIENTO 13 CM (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1687	1410918	WILMAR ANDRES PULIDO

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:35:00	09:00:00			

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

C.C. 1018495934
Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

REMISION / CARTA

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA	FOLIO
12.01.2021	188709398

EXPEDIDA EN:

CO-PLANTA SANTA ROSA
KM 14 VIA BOGOTA CALERA
CP: 11001000 CALERA CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:

CONSORCIO OPORTO 50990441
CL 86 D 30 38
BOGOTÁ, D.C. 11
9013516296

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

7460 - CEMEX COLOMBIA S.A.

ENVIADO A:

BODEGA OPORTO 66897626
CR 73 H 62 A 04 SUR BRR GALICIA BOGOTA

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

CONDUCTOR: CASTELLANOS DIAZ
VEHICULO : SPL181
VIAJE : 60136608
RANGO DE SELLOS: DE 0000000000 **A** 0000000000
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

PEDIDO	PRODUCTO	NUM.SACOS	CANTIDAD
188634524 ZTA 000010	CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	100,000	5,000 TN
OC:	Contrato:		100.000 Sacos de 50 Kg
188634524 ZTA 000020	Cemex a su medida Sacos	5,000	5,000 EA
OC:	Contrato:		

Recibido: Nelson Huerta
12-01-2021
15:40

CEMEX
12 ENE 2021
SANTA ROSA

NOTAS
El Transportista acepta que ha recibido el producto con la cantidad descrita en el presente documento.
El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia	12.01.2021		
Fecha y Hora llegada	12 01 21 1:45		
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 12.01.2021
Hora: 12:00:33
LMOLANOMN LAURA ALEJANDRA MOLANO

CLIENTE
1 / 1
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

CEMEX
ORIGINAL

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.069.377-5

VALE No 385317

CIUDAD Y FECHA				PLACA
CLIENTE				OBRA
M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS	HORA DE SALIDA AM PM
	B-200			
	B-400			NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR
	B-600			
	TRITURADO			NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR
	PIEDRA			
	RAJON ZARANDA			FIRMA CONDUCTOR
	INVIAS	BG		
		SBG		FIRMA Y SELLO OBRA
	IDU	BG		
		SBG		NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 660 55 55 BTA.

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.069.377-5

VALE No 385354

CIUDAD Y FECHA				PLACA
CLIENTE				OBRA
M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS	HORA DE SALIDA AM PM
	B-200			
	B-400			NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR
	B-600			
	TRITURADO			NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR
	PIEDRA			
	RAJON ZARANDA			FIRMA CONDUCTOR
	INVIAS	BG		
		SBG		FIRMA Y SELLO OBRA
	IDU	BG		
		SBG		NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 660 55 55 BTA

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385356

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 87/A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385379

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 87/A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385396

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 87A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385388

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 87A.

827

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-6

VALE No 385397

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARUMA TEL. 560 55 55 97A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-6

VALE No 385482

CIUDAD Y FECHA

PLACA 255

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARUMA TEL. 560 55 55 97A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385452

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 87A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385430

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 87A

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385492

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385534

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385573

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 STA.

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385545

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 STA.

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385565

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARUANA TEL. 569 55 55 BTA

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385585

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA.

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385591

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385588

CIUDAD Y FECHA

CLIENTE

PLACA

OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA.

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385587

CIUDAD Y FECHA

CLIENTE

PLACA

OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-6

VALE No 385604

CIUDAD Y FECHA		PLACA	
CLIENTE		OBRA	

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 STA.

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Remisión RS Nº 7648

Fecha: 22 Ene 2021

Forma de pago: Anticipado | Contado | ~~Crédito~~

Cliente: Servitransportes Ruiz Faz S.A.S. Destino: Sierra Morena

NIT: 901095494-4 Ciudad: Bogotá

Teléfono: Elaborado por: E.J

Conductor: Orlando Moreno Placa: USC-745

No. Vale Cliente:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	B-400	M³	6

Firma de Despacho:

RECICLADOS INDUSTRIALES
NIT 900360954-1

Recibido a satisfacción:

CLIENTE

Celular: 318 215 3129 / 310 234 9840 · Teléfono: 875 9047
e-mail: comercial.planta@recicladosindustriales.co / info@recicladosindustriales.co

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 87678

FECHA: _____

OBRA: _____ REX INGENIERIA S.A.

HORA DE CARGUE: _____ PMRRA EL CEDRO

HORA DESCARGUE: _____ DESPACHO

PLACA: _____

MATERIAL: ARENA DE RIO M³ 6

Nombre de quien Despacha: TATIANA

Nombre de quien Recibe: _____

FIRMA _____

FIRMA _____

OBRA

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 87659

FECHA: _____

OBRA: _____ REX INGENIERIA S.A.

HORA DE CARGUE: _____ PMRRA EL CEDRO

HORA DESCARGUE: _____ DESPACHO

PLACA: _____

MATERIAL: GRAVA DE RIO M³ _____

Nombre de quien Despacha: TATIANA

Nombre de quien Recibe: _____

FIRMA _____

FIRMA _____

OBRA

PARQUE 19-316

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385289

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 BTA.

19-393

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385326

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 BTA.

PARQUE 79-316

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385261

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 568 55 55 BTA

PARQUE 79-316

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385294

CIUDAD Y FECHA	PLACA
CLIENTE	OBRA

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
	B-200	
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 568 55 55 BTA

PARQUE 19-316

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385259

CIUDAD Y FECHA

CLIENTE

PLACA

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA

19-016

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385260

CIUDAD Y FECHA

CLIENTE

PLACA

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA

FI-016

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385204

CIUDAD Y FECHA

CLIENTE

PLACA

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 BTA.

FI-016

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385217

CIUDAD Y FECHA

CLIENTE

PLACA

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 580 55 55 BTA.

19-984

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385198

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA.

19-016

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

VALE No 385231

CIUDAD Y FECHA

PLACA

CLIENTE

OBRA

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

TRANSPORTADOR

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA.

ANEXO No. 6
CONTROL DEL CLIMA

	ARQUITECTURA URBANA LTDA			
VIGENCIA A PARTIR DE	VERSION	CONVENCIONES		Dominical
05.04.2016	1			Dia festivo

CONTROL DEL CLIMA

INFORMACION GENERAL

MES DE ENERO DEL 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO OPORTO	CONTRATO No .COP 403 - 2019
INTERVENTORIA: ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONTRATO No. CIN 405 - 2019


CLIMA DIAS - PAEQUES CIUDAD BOLIVAR

CONDICIONES CLIMATICAS	ene.21																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAÑANA																															
SOLEADO		5		5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5		5					5		5	5	5	5	5		
DESPEJADO																			5	5	5	5								5	
NUBLADO																															
LLUVIA LEVE																															
LLUVIA FUERTE																															
TARDE																															
SOLEADO				4	4	4	4					4	4	4	4			4							4	4	4	4	4		
DESPEJADO																			4	4	4	4									
NUBLADO																															
LLUVIA LEVE								4																							
LLUVIA FUERTE																															

TOTALES

PORCENTAJE			
SOLEADO	77%	151	HRS
DESPEJADO	21%	41	HRS
NUBLADO	0%	0	HRS
LLUVIA LEVE	2%	4	HRS
LLUVIA FUERTE	0%	0	HRS
	100%		

GRAFICA DEL CLIMA

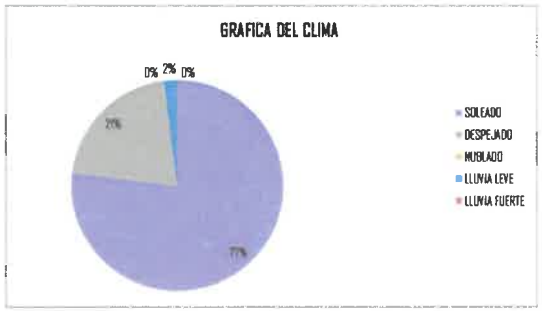

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

ANEXO No. 7
REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MES DE ENERO 2021

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CIN-405-2019 **ARQUITECTURA URBANA LTDA** **CONTRATO DE OBRA No. COP-403-2019** **CONSORCIO OPORTO**	**FECHA: 31 DE ENERO DE 2021**

PARQUES PRIMERA ETAPA

- **PARQUE 19-038 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**



FOTO No 1. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el respectivo cerramiento y mantenga las zonas intervenidas aseadas.



FOTO No 2. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** no continua con la ejecución de actividades de obra de acuerdo al presupuesto presentando atrasos de acuerdo a la programación de obra.

- **PARQUE 19-039 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**

	
FOTO No 3. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el respectivo cerramiento y mantenga las zonas intervenidas aseadas.	**FOTO No 4.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** no continua con la ejecución de actividades de obra de acuerdo al presupuesto presentando atrasos de acuerdo a la programación de obra.

- **PARQUE 19-149 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**

	
FOTO No 5. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica los niveles de fondo de excavación según la nueva estructura del suelo 37 cm de excavación tomando un VM de 50 cm (30 cm de mejoramiento y 7 cm de carpeta asfáltica).	**FOTO No 6.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que la cancha de microfútbol sea retirada y acopiada en el lugar autorizado para luego ser retirada por el proveedor autorizado.



FOTO No 7. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica los niveles de excavación para realizar la respectiva compactación al fondo de excavación por parte del contratista CONSORCIO OPORTO.



FOTO No 8. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica dimensiones e instalación de Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst).



FOTO No 9. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el traslapo del de Geotextil geoST300 y/o T2100 sea mayor a 30 cm, se maneja traslapo de 50cm.



FOTO No 10. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que la dosificación del suelo cemento sea la propuesta por el estudio geotécnico (1.5 bultos de cemento/ 1 m3 de material granular).

	
FOTO No 11. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que las capas de material mejorado (suelo cemento) extendido sean de 15 cm MAX, cumpliendo con las especificaciones técnicas de instalación de suelo cemento.	**FOTO No 12.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la instalación de material granular (suelo cemento) capa de 15 cm, según estudio geotécnico aprobado.
	
FOTO No 13. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la dosificación (suelo cemento), 1.5 bultos de cemento/1, según estudio geotécnico aprobado	**FOTO No 14.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el desmonte de juegos.



FOTO N 15. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el seriado y compactación del material granular (suelo cemento).



FOTO No 16. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el seriado y compactación del material granular (suelo cemento).



FOTO No 17. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica los niveles de capa de suelo estabilizado (suelo cemento).



FOTO No 18. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el amarre y figurado de acero 3/8" y ", para la cimentación de viga malla contra impacto, cumpliendo con las especificaciones técnicas del IDRD.

- **PARQUE 19-150 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**



FOTO No 19. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista CONSORCIO OPORTO realice el respectivo cerramiento de las zonas intervenidas y el estado de la losa en concreto.



FOTO No 20. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** mantenga las zonas intervenidas en óptimas condiciones (aseo).



FOTO No 21. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** no continua con la ejecución de actividades de obra de acuerdo a la programación presentando atrasos.



FOTO No 22. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de parales Ø= 2" que conforman la baranda cerramiento M-80.

	
FOTO No 23. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el calibre de parales Ø= 2" que conforman la baranda cerramiento M-80. Cumpliendo con las especificaciones técnicas del IDRD.	**FOTO No 24.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la verticalidad de parales Ø= 2" que conforman la baranda cerramiento M-80. Cumpliendo con las especificaciones técnicas del IDRD.

- **PARQUE 19-479 URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA**

	
FOTO No 25. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** no continua con la ejecución de actividades de obra de acuerdo a la programación presentando atrasos.	**FOTO No 26.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de parales Ø= 2" que conforman la baranda cerramiento M-80.

PARQUES SEGUNDA ETAPA

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-255**



FOTO No 27. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica las dimensiones e instalación de base granular B-600 con un espesor de 15 cm.



FOTO No 28. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la toma de densidades al material granular B-400 (subbase reciclada) Resultados: 1) 95.1%. Cumpliendo con la densidad optima >= 95%, establecido en la norma INV 147-7.



FOTO No 29. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la compactación de material granular base B-600.



FOTO No 30. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica los niveles de la estructura del suelo, cumpliendo con los espesores de placa e=0.10 m y piso caucho de e=.0.07 cm.



FOTO No 31. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** realizó en conjunto con el contratista **CONSORCIO OPORTO** la toma de especímenes cilíndricos en concreto.



FOTO No 32. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi para placa de contra piso.



FOTO N°33 Durante el presente mes se realizó la actividad de obra Corte, Dilataciones en Concreto con Pulidora., con una cantidad ejecutada de 58,60 ml

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA 19-368**



FOTO No 34. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la dosificación del suelo cemento (1.5 bultos de cemento/1 m3 de material), para luego tomar densidades superiores al 95% exigidas en las especificaciones técnicas.



FOTO No 35. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que se realice la respectiva escarificación de material estabilizado con cemento para re compactación.



FOTO No. 36. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área de adoquín desmontada por el contratista **CONSORCIO OPORTO.**



FOTO No 37. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área de relleno Recebo Cemento Compactado al 4% con Material Existente.



FOTO No 38. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área de instalación y las dimensiones de la malla electrosoldada D= 5.0mm 0.15mx0.15m.



FOTO No 39. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área de vaciado de concreto de 3000 PSI con su respectivo espesor de 10 centímetros de acuerdo a lo solicitado en el estudio geotécnico.



FOTO No 40. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico las respectivas dilataciones al concreto con una profundidad de e=2 cm.

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA 19-475**



FOTO No 41. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual para la zona de juegos infantiles.



FOTO No. 42. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el área excavación manual realizada de acuerdo a localización, replanteo y niveles tomados con nivel topográfico.



FOTO No 43. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** la instalación de geotextil T2100 y tendido de material granular B400, e= 20 cm.



FOTO No 44. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual para la zona de juegos infantiles.

- **PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 19-079**



FOTO No 45. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la respectiva localización y replanteo de la zona de juegos a instalar.



FOTO No 46. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área descapote manual y retiro (e= 10-15cm).



FOTO No. 47. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico la excavación y niveles realizados de acuerdo a localización y replanteo.



FOTO No 48. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área de excavación mecánica para una estructura de 70 cm.



FOTO No. 49. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico los niveles del área de excavación de acuerdo a lo exigido en especificaciones técnicas y estudio geotécnicos.



FOTO No. 50. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el área de ejecución de la actividad de obra Relleno rajón y suavizado con afirmado de acuerdo a lo exigido en especificaciones técnicas y estudio geotécnicos.



FOTO No. 51. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico los niveles del área en ejecución de la actividad de obra Relleno rajón y suavizado con afirmado de acuerdo a lo exigido en especificaciones técnicas y estudio geotécnicos.

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-022**



FOTO No 52. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica las dimensiones de la Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-con Atraque



FOTO No 53. Se evidencia la ubicación del parque desarrollo arborizado abaja 19-022 de acuerdo a la implantación con su respectivo avance de ejecución de actividades de obra .



FOTO No 54. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** no continua con la ejecución de actividades de obra de acuerdo al presupuesto presentando atrasos de acuerdo a la programación de obra.

- **PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 19-325**



FOTO No 55. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la localización y replanteo de la zona de juegos.



FOTO No 56. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual para la zona de juegos.



FOTO No 57. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual para la zona de juegos.

- **PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 19-316**



FOTO No 58. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el retiro de material proveniente de excavación manual.



FOTO No 59. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el retiro de material proveniente de excavación manual al proveedor autorizado y prueba de carga.



FOTO No 60. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el retiro de material proveniente de excavaciones, al proveedor autorizado.



FOTO No 61. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico la instalación del geotextil T 2100 y traslapo Min. 0.30 cm.



FOTO N. 62. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico la instalación de subbse granular B400 con un espesor de e: 20 cm.



FOTO No 63. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de bordillo A-80.

PARQUES SEGUNDA TERCERA

- **PARQUE URBANIZACION LAS QUINTAS 19-394**



FOTO No 64. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** ejecute la actividad de obra Localización y replanteo con equipo.



FOTO No 65. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** ejecute el desmonte de juego de madera existente.

	
FOTO No 66. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica la excavación mecánica (cargue +trasporte+disp.) de acuerdo a la implantación y estudio geotécnico.	**FOTO No 67.** La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica la excavación mecánica (cargue +trasporte+disp.) de acuerdo a la implantación y estudio geotécnico.

- **PARQUE DESARROLLO RINCON DE GALICIA Y URBANIZACION LA ESTANCIA 19-016**

	
FOTO No 68. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista realice el respectivo desmote de juego infantil en madera existente.	**FOTO No 69.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista realice el desmonte de banca existente M-3I y disponga con el proveedor autorizado.



FOTO No 70. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la ejecución del descapote manual por parte del contratista **CONSORCIO OPORTO.**



FOTO No 71. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la ejecución del descapote manual por parte del contratista **CONSORCIO OPORTO.**



FOTO No 72. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la actividad de excavación mecánica de acuerdo a la localización, replanteo y niveles topográficos.



FOTO No 73. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la ejecución de la actividad de obra compactación fondo de excavación con equipos liviano de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto de obra.



FOTO No 74. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice el suministro de piedra rajón de acuerdo a lo exigido en el estudio geotécnico piedra de diámetro igual o mayor 15 centímetros(15cm) para conformar la estructura de la rasante.



FOTO No 75. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice el suministro de piedra rajón de acuerdo a lo exigido en el estudio geotécnico piedra de diámetro igual o mayores 15 centímetros (15 cm) para conformar la estructura de la rasante.



FOTO No 76. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico el relleno en material de afirmado subbase granular B200 de acuerdo al estudio geotécnico.

- **PARQUE URBANIZACION MADELENA III Y IV SECTOR 19-144**



FOTO No 77. Interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica localización y replanteo cumplan con esquemas aprobados.



FOTO No 78. Interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** ejecute la actividad de descapote manual.



FOTO No 79. Interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** ejecute la actividad de descapote manual.



FOTO No 80. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación mecánica para la zona de juegos.



FOTO No 81. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación mecánica para la zona de juegos.



FOTO N. 82. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico la instalación del geotextil T 2100 y traslapo Min. 0.30 cm.



FOTO N. 83. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** ejecute la actividad de relleno con material granular Subbase B400.

- **PARQUE URBANIZACION MADELENA III Y IV SECTOR 19-393**



FOTO No 84. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la ejecución de las actividades de descapote manual y excavación manual.



FOTO No 85. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la ejecución de las actividades de descapote manual y excavación manual.



FOTO No 86. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica que las densidades tomadas por el contratista **CONSORCIO OPORTO** cumplan con la norma NTC 396, mayores o iguales al 95%.

- **PARQUE URBANIZACION MADELENA III Y IV SECTOR 19-401**



FOTO No 87. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica la ejecución de la actividad de Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro).



FOTO No 88. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica la excavación mecánica (cargue +trasporte+disp.).



FOTO No 89. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica la excavación mecánica (cargue +trasporte+disp.).



FOTO No 90. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico la instalación del geotextil T 2100 y traslapo Min. 0.30 cm.

	
FOTO No 91. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la ejecución de la actividad de obra compactación fondo de excavación con equipos liviano de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto de obra.	**FOTO No 92.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que la dosificación del suelo cemento sea la propuesta por el estudio geotécnico (1.5 bultos de cemento/ 1 m3 de material granular).
	
FOTO No 93. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la ejecución de la actividad de obra compactación fondo de excavación con equipos liviano de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto de obra.	**FOTO No 94.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica el seriado y compactación de la primera capa 015 m del material granular (suelo cemento).



FOTO No 95. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica que las densidades tomadas por el contratista **CONSORCIO OPORTO** cumplan con la norma NTC 396, mayores o iguales al 95%.



FOTO No 96. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** realiza toma de probetas de suelo cemento para obtener la resistencia a compresión del terreno.

- **PARQUE URBANIZACION LA ESTANCIA 19-484**



FOTO No 97. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica localización y replanteo cumplan con esquemas aprobados.



FOTO No 98. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación.



FOTO No 99. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPÓRTO** realice la actividades de obra tales como: excavación mecánica, geotextil geo ST300 Y/O T2100 y Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD.



FOTO No 100. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la compactación del material relleno compactado Subbase granular tipo IDRD.



FOTO No 101. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica la instalación del Bordillo prefabricadoA-80



FOTO No 102. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la compactación del material relleno compactado Base granular tipo IDRD.

	
FOTO No 103. La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica que las densidades tomadas por el contratista **CONSORCIO OPORTO** cumplan con la norma NTC 396, mayores o iguales al 95%.	**FOTO No 104.** La interventoría **ARQUITECTURA URBVANA LTDA** revisa y verifica que las densidades tomadas por el contratista **CONSORCIO OPORTO** cumplan con la norma NTC 396, mayores o iguales al 95%.

ANEXO No. 8
BITACORA DE OBRA

Se realiza recorrido de obra donde se revisó y verifico:

1) El corte horizontal en concreto con pulidora no cumple la profundidad de e=2cm, se le solicita al contratista rectificar y corregir esta profundidad.
2) El atraque en bordillos se debe realizar con recebo y encapsularlo con geotextil a la altura del bordillo A-80 (Atraque min. 30cm).
3) Se le solicita al contratista hacer la entrega de los resultados de compresion de cilindros de concreto a 7 dias ya que se cumplian el 26/12/2020.

Jueves 31/12/2020
Clima: Mañana: Soleado. Tarde=
Personal del contratista= Ninguno.
Personal de Interventoria= 1 Inspector de obra
Personal operativo= Ninguno.
La interventoria realiza recorrido a obra y evidencia que no existe Personal de obra.
• Se le solicita al contratista de manera inmediata hacer la entrega de resultados a compresion de cilindros de concreto a los 7 dias.

Sabado 02/01/2021
Clima: Mañana: Soleado
Personal del contratista= Ninguno.
Personal de Interventoria =Ninguno
Personal Operativo = Ninguno
Actividades en ejecucion = Parque 19-479, Ninguna Actividad en ejecucion.

Lunes 04/01/2020
Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Soleado.
Personal del contatista: 1 residente, 1 director de obra y

1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 Inspector de obra
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: Ninguna

Martes 05/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 director y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria: 1 residente y 1 inspector, 1 apoyo sst.
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: Se evidencia que en el parque no se estan realizando Actividades y se evidencia ausencia de personal operativo
• Se le solicita al contatista hacer entrega inmediata de los resultados de compresion de cilindros de concreto a las edades de 7 y 14 dias, ya que se cumplieron el dia:
Edad 7 dias: Se cumplio el 26/12/2020.
Edad 14 dias: Se cumplio el 02/01/2021.
• Se evidencia que el parque 19-979 se encuentra en condiciones no optimas (material granular sobrante extendido por cancha de microfutbol, bordillos prefabricados mal acopiados, no hay aseo en general).

Miercoles 06/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: 1 sst y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria: 2 inspectores de obra
Personal operativo: Ninguno
Actividades en ejecucion: Ninguna.

|| || || ||

Jueves 07/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores.
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.

Viernes 08/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: lluvioso.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: Ninguna.

Sabado 09/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: No se evidenciaron actividades en ejecucion.

Martes 12/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente. y 2 inspectores
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.

Miercoles 13/01/2021

la actividad ejecutada no corresponde con las especificaciones tecnicas requeridas por I.D.R.D, por lo tanto la interventoria sugiere utilizar la actividad de enbozollado de juntas con tracc "Sika Fick" cio 10901, se debe entregar valoracion por parte del contratista de obra consorcio oborto.

el dia de hoy no se evidencio personal en obra, se le recomienda al contratista disponer de personal idoneo para atacar las actividades atrazadas.

14-01-2021 Se realiza recorrido al parque 19479 se solicita al contratista operto realizar mantenimiento al cerramiento y realizar aseo al parque en general. Ins SST Interventoria Juan Carlos Bitte

14-01-2021
Clima = Mañana: Soleado Tarde Soleado
Personal de contratista: 1 residente, 1 inspector y apoyo SST
1 residente sst, 1 apoyo social
Persond de interventoria = 1 residente de Obra, 2 inspectores de obra
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN:
19-(479) = No se realizan actividades en lo presente fecha.

Viernes 15/01/2021
Clima: Mañana; Soleado: Tarde:
Personal del contratista = 1 inspector, 1 apoyo sst.
Personal de interventoria = 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion - No se realizan actividades.
Se le solicita al contratista realizar la entrega de los resultados de compresion de cilindros de concreto:

1) Edad a 7 dias, 26/12/2020.
2) Edad a 14 dias, 02/01/2020.
Se le recuerda al contratista CONSORCIO OPORTO que los resultados a 28 dias se cumplen el 16/01/2021.

Sabado 16/01/2021.
clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de Interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: NO se evidencian actividades en ejecucion
- Se le recuerda al Contratista CONSORCIO OPORTO la entrega de resultados a compresion de los cilindros en concreto a los 28 dias de edad, ya que se cumplen el 16/01/2021.

Lunes 18/01/2021
clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista = 1 inspector, 1 social, 1 apoyo social y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria = 1 residente, 2 inspectores y 1 SST.
Actividades en ejecucion = NO se evidencion actividades en ejecucion.
- Se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO hacer entrega de los resultados a compresion de cilindros de concreto a la edad de 28 dias, ya que se cumplio el 16/01/2020.
- La interventoria le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO incluir las dilataciones del concreto a 2cm de profundidad y aplicar el respectivo sello de junta en SIKAFLEX.

Bolge 19-479.

Lunes 18 Enero 2021. Profesional ambiental y SST: Se realiza recorrido de obra donde no se evidencio personal, sin embargo se evidencia persistencia de falta de orden y aseo, mantenimiento de cerramiento perimetral. Otras culorales y ~~fa~~.

Martes 19/Enero/2021
Clima: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Ninguna
Se evidencia que el parque se encuentra en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad con la ejecucion de las actividades de obra: Sello junta sikaFlex, piso caucho, Baranda M-80 Canecas, juegos infantiles, Señal civica.

Miercoles 20/Enero/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo SST
Personal de Interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: Ninguna.
Se evidencia que el parque se encuentra en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Sello junta sikaflex e:2cm, piso caucho, Baranda M-80, canecas, juegos infantiles, señales civicas.

Jueves 21/Enero/2021.
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspecto y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Ninguna
Se evidencia que el parque se encuentra en estado

de abandono se le solicita al contratista ejecutar actividades de obra: junta sikaflex e:2cm, baranda M-80, juegos infantiles, piso en caucho, canecas, señales civicas.

Viernes 22/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: Ninguna.
Se evidencia que el parque se encuentra en estado de abandono se le solicita al contratista OPORTO dar celeridad a la programacion de obra entregada y aprobada; junta sikaflex e:2cm, baranda M-80, juegos infantiles, piso en caucho, canecas, señales civicas.

Sabado 23/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 1 inspectores
Actividades en ejecucion: Ninguna
Se evidencia que el parque se encuentra en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad con la ejecucion de actividades de obra: junta sikaflex e:2cm, piso caucho, baranda M-80, juegos infantiles, canecas, señales civicas.

Lunes 25/01/2021
Clima: Mañana: Lluvia; Tarde: Nublado.
Personal del contratista: 1 inspector, 1 residente y 1 apoyo sgt.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: Ninguna.

Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIOOPORTO dar celeridad en la ejecucion de actividades de obra: punta sikaflex e:2 cm; piso caucho, juegos infantiles, baranda π-80, canecas, señales civicas.

Martes 26/01/2021
Clima: Mañana, Soleado Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Instalacion de tuberia estructural galvanizada de 2" para paral de baranda π-80 y Fundida de dados en concreto 3000 Psi.
Personal operativo: 1 oficial y 2 ayudantes

De acuerdo con la solicitud realizada por la comunidad a la trabajadora social via mensaje whatsapp, para modificar tanto el tipo de cerramiento, como amplitud de las zonas de intervención. Se realizara la modificación del mismo con los rollizos y triple cinta peligro, y se realizara cerramiento en las zonas de intervención y se despejara la concha de voleibol.

Andrea G.
P. SSTMA

Miercoles 27/01/2021
clima: soleado
Personal del contratista: 1 Inspector y 1 Apoyo SST
Personal de interventoria: 1 residente y 2 Inspectores
Actividades de ejecucion de obra: el dia de hoy no se evidencio personal operativo ni ejecucion de actividades de obra, se le recomienda al solicita al contratista incrementar personal de obra para adelantar actividades de obra atrazadas por ausencia de personal de obra tales como: emboquillado de bintas y piso caucho recicl. 3m

(33 x 0,20 x 0,80m) Baranda cerramiento PM-83 esuntiis) / suego muelle pared lateral.

Jueves 27/01/2021

clima: Soleado

Personal del contratista: 1 Inspector de interventoria y 1 apoyo SST.

personal de interventoria: 1 residente de interventoria, 2 Inspectores de interventoria.

personal operativo: NO se evidencia personal en obra, N. ejecucion de ~~obra~~ actividades de obra, se le solicita al contratista de obra aumentar cuadrillas de obra para adelantar actividades de obra atrasadas segun la programacion de obra tales como: piso en caucho, barandas y señalizacion. las cuales presentan atrazos mayor a 30 dias.

Jueves 28/01/2021

Clima: Soleado

Personal del contratista: 1 Inspector de ~~obra~~ y 1 apoyo SST.

personal de interventoria: 1 Residente de Interventoria, 2 Inspectores

Personal operativo: NO se evidencia personal en obra, N. ejecucion de actividades de obra, se le solicita al contratista de obra aumentar cuadrillas de obra para adelantar actividades de obra atrazadas segun la programacion de obra tales como: piso en caucho barandas y señalizacion las cuales presentan atrazos mayor a 30 dias.

Viernes 29/01/2021

clima: soleado

personal del contratista: 1 Inspector de obra, 1 apoyo SST.

personal de interventoria: 1 residente de interventoria, 2 Inspectores

Personal operativo: NO se evidencia personal en obra, N. ejecucion de actividades de obra, se le solicita al contratista de obra aumentar cuadrillas de obra para adelantar actividades de obra

esuntias),

sin y 1 apoyo

intoria, 2

n. ejecucion
ntratista de obra
vidades de obra
o como: piso
n atrazos

oyo SST.
ón, 2 Inspectores
obra, n. ejecuc.
ntrista de obra
os de obra
: piso en caucho,
o mayor a 30

SST.
12 Inspectores
n. ejecucion
a de obra
dades de obra

tales como: piso en caucho, barandas y señalizacion las cuales presentan atrazos mayor a 30 dias.

Sabado 30/01/2021
clima: Soleado

Personal del contratista: 1 Inspector de obra, 1 apoyo SST
Personal de interventoria: 1 residente de Interventoria, 2 Inspect.
Personal operativo: NO se evidencia personal en obra, ni ejecuc.
de actividades de obra, se le solicita al contratista de obra aumentar cuadrillas de obra para adelantar actividades de obra.

Lunes 01/02/2021
clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 Inspector y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria. 2 Inspectores
Actividades en ejecucion.

parque 19-483=
1) Se le solicita al contratista de Forma inmediata realizar el respectivo sellamiento en Adoquin de arcilla (Sello de arena).
31/12/2020 - Jueves
Clima= Mañana = Soleado ; Tarde =
Personal del contratista = Ninguno
Personal de Interventoria= 1 inspector de obra
la interventoria realiza recorrido a obra se evidencia Falta de personal en los parques 19-149, 19-150.
Durante recorrido la interventoria revisa y verifica los elementos instalados en el parque 19-150 (modulos complementarios baranda) donde se evidencio el no cumplimiento de las especificaciones tecnicas del IDRD, donde dice que los modulos estan compuestos por los siguientes materiales:
1) Angulo H.R. De 1 1/2" x 1/8"
2) Platina H.R. De 3/4" x 1/8"
3) Malla Sol. de 2"1/1" cal 10 galvanizada
La estructura de baranda exixtente es M-80, por lo tanto sus medidas son:
1) Tubo estructural galvanizado de ϕ-3" cal 2.5mm
2) Pard tubo redondo galvanizado de ϕ-2" cal 2.5mm
Se solicita retirar elementos instalados, ya que no complen
Sabado 02/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: Ninguno
Personal de Interventoria: Ninguno.
Personal operativo: Ninguno
Actividades en ejecucion: Ninguna.

Lunes 04/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleada
Personal del contratista 1 residente, 1 director, 1 apoyo SST.

Personal operativo: 1 Ayodante.
Actividades en ejecucion: Aseo general parques 19-15
y 19-147
Se le solicita al contratista de forma inmediata
retirar modulos complementarios de baranda, ya
que no cumplen con los insumos requeridos en las
especificaciones tecnicas del IDRD, Se evidencia que la
baranda existente corresponde a una baranda M-8
con especificaciones:
1) Baranda tuberia redonda estructural galvanizada de
$\phi = 3"$ cal 2.5mm
2) Patal tuberia redonda galvanizada $\phi = 2"$ cal 2.5m,
por lo tanto, los modulos a instalar deben tener
las siguientes especificaciones:
1) Angulo H.R. De 1 1/2" x 1/8"
2) Platina H.R. De 3/4" x 1/8"
3) Malla Esl. de 2 1/4" cal 10. galvanizada

5-02-2021 Se revisa y verifica el cumplimiento del
protocolo de Bioseguridad Covid 19 del contratista y
la Interventoria Arquitectura Urbana en la toma de
temperatura, desinfeccion de las manos y la entrega
del reporte de condiciones de Salud y ninguno presenta
condiciones de Salud Para Covid-19, Se realiza
recorrido en los parques 19-150 y 19-149 se
solicita realizar mantenimiento al cerramiento y
cumplir con el programa de orden y aseo, no hay
presencia de personal. Las Interventoria 957

Martes 05/01/2021
Clima: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 director y 1 apoyo
SST
Personal de interventoria: 1 residente y 1 inspector, 1
apoyo SST.
Personal operativo: Ninguno.

Actividades en ejecucion: Se evidencia que en estos parques no se estan realizando actividad.
La interventoria realiza recorrido y evidencia que el contratista no a realizado la solicitud de realizar el sello de arena al adoquin en arcilla del parque 19-453, Se le solicita al contratista de forma inmediata atender esta solicitud. y dar terminacion a estas observaciones.
A la Fecha de hoy se evidencia que los modulos complemento de baranda instalados en el parque 19-150 no han sido retirados ya que no cumplen con las especificaciones tecnicas de IDRD, lo cual fue notificado por esta interventoria con anotacion en bitacora Folio No. 38 del dia 31/12/2020 y Folio No. 39 del dia 04/01/2021 se le Solicita al contratista desinstalarlos e instalar los correspondientes.

Miercoles 06/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: 1 SST y 1 apoyo SST
Personal de Interventoria = 2 inspectores
Personal operativo = Ninguno
Actividades en ejecucion = Ninguna
Se le solicita al contratista iniciar y/o retomar las actividades programados y dadas en la programacion de obra, ya que en recorrido realizado se evidencia abando en los parques, material granular sin proteccion, Cerramientos en mal estado y actividades sin terminar.
Parque 19-150 = La interventoria en recorrido evidencia que la pintura de los componentes del modulo 17-3 se encuentra en mal estado (rayones, pintura escurrida y deficiencia en el acabado).

|| || || ||

Jueves 07/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores
Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante, 1 operario de retroexcavadora y 1 operario mini compactador.
Actividades en ejecucion:
- Parque 19-150 y 19-984 = No se evidencia actividades en ejecucion.
- Parque 19-199 = Se evidencia que el contratista esta ejecutando las actividades de: Desmonte marcas de cancha microfutbol, compactacion de fondo de excavacion y nivelacion del terreno, dosificacion para suelo cemento al 4% (1.5 bultos de cemento / 1 m³ de material granular), una vez terminada la compactacion y nivelacion la Interventoria revisa y verifica niveles de fondo de excavacion (37cm) de la nueva estructura del suelo. La interventoria le recomienda al contratista proteger el material mezclado con plastico ya que se encuentra a la interperie, si el material se llega a mojar, se le solicitara al contratista retirarlo y suministrar material nuevo.

Viernes 08/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Personal operativa: 1 oficial, 1 ayudante, 1 operario de retroexcavadora y 1 operario minicargador.
Actividades en ejecucion:
- Parque 19-150 = No se evidencian actividades en ejecucion
- Parque 19-984 = Se realiza la localizacion y replanteo a la zona de juegos

- Parque 19-147.= Se evidencia que el contratista continua con la compactacion de fondo de excavacion suministro e instalacion de geotextil T2100 con traslapo ≥ 30 cm, dosificacion de suelo cemento al 4% (1.5 bultos de cemento / 1 m3 de material granular) y relleno con suelo cemento en capas de 0.15 cm de espesor.
- La interventoria realizara la liberacion de la capa de suelo cemento con espesor de 0.15 m con la toma de densidades mayores al 95%.
- La interventoria le solicita al contratista de obra realizar la toma de 3 probetas por tipo de ensayo para determinar la resistencia del material mejorado (suelo cemento), indicadas en las especificaciones tecnicas (capas de material granular estabilizado con cemento) de Instituto Desarrollo Urbano (IDU), que segun el numeral 420.3.3.1 El contratista debe realizar la preparacion de probetas = "para la determinacion de la resistencia se deben preparar 3 probetas por tipo de ensayo y por contenido de cemento: 3 para compresion inconfinada y 6 para traccion indirecta (3 para ensayo sin inmersion y 3 para ensayo con inmersion); se deben analizar al menos 3 contenidas de cemento, esto con el fin de obtener los siguientes resultados:
  1) Resistencia a la traccion indirecta a los 7 dias, sin sumergir.
  2) Resistencia a la traccion indirecta a los 7 dias, con inmersion
  3) Resistencia a la traccion indirecta a los 28 dias, sin sumergir.
  4) Resistencia a la traccion indirecta a los 28 dias, con inmersion.
  5) Modulo de rotura a los 28 dias.
  6) Modulo dinamico a los 28 dias.
  7) Curva de fatiga a los 28 dias segun norma Francesa

tratista
excavacion
2100
comanto
aterial
en capas
de la
0.15m
95%
de obra
de ensayo
del mejora
ificaciones
tado con
(CIDU),
ista debe
la deter-
mar 3
enido de
6 para.
sion y 3
ear al
el fin-
as, sin
con
dias, sin
8 dias, con
l. Francesa

CNFP 98-26-1).
Si el contratista no efectua la toma de las probetas y continua con la instalacion del material (suelo cemento), la interventoria les solicitara pruebas en campo y realizar la comprobacion de la resistencia por medio de nucleos. los reprocesos y sobrecostos correran a cuenta y riesgo del contratista, una vez la interventoria revise y verifique los resultados obtenidos de la resistencia y las densidades superiores al 95% se procedera a liberar esta actividad.

Sabado 09/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado, Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1. apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante, 1 operario de retroexcavadora y 1 operario minicompactador
Actividades en ejecucion:
- Parque 19-150 y 19-484 = No se evidencian actividades en ejecucion.
- Parque 19-149 = Se continuan las actividades de compactacion Fondo de excavacion, Suministro e instalacion de geotextil T2100 con traslapo >30cm, dosificacion de suelo cemento al 9% (1.5 bultos de cemento / 1 m3 de material granular) y relleno con suelo cemento en capas de 0.15m de espesor.

Martes 12/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista = 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo. sst.
Personal de Interventoria = 1 residente y 2 inspectores.
Personal operativo = 2 oficiales, 5 ayudante y 2 operarios.

Norma

- Parque 19-150: No se evidencian actividades en ejecucion.
- Parque 19-149: Continuan con relleno de suelo cemento y compactacion del mismo con capa de 0.15m Max, se evidencia que el material se encuentra seco, se le recomienda al contratista humedecer el material y compactar para cumplir con la densidad deseada 95%.
- Parque 19-484 = Se inician las actividades de descapote manual y excavacion mecanica (profundidad 45cm de nueva estructura del suelo).

Miercoles 13 de enero de 2021

→ Parque cod 19-149

clima: soleado

Personal administrativo contratista: 1 Inspector / 1 Maestro SST

Personal operativo del contratista: 1 maestro / 2 oficiales / 2 ayudantes

Personal de interventoria: 2 oficiales Inspectores / 1 residente

el dia de hoy se realizo la toma de 3 densidades a la primera capa de 15 cm del material suelo-cemento mezclado a la base estabilizada del parque cod 19-149 con una densidad de 99.6 / 104.8 / 102.2

→ Parque cod 19-150

La actividad ejecutada a ejecutar no corresponde con las especificaciones tecnicas requeridas por IDRD, por lo tanto la interventoria sugiere utilizar la actividad de emboquillado de juntas sello de juntas contraccion sika flex 1c o 10101, se debe entregar valoracion por parte del contratista consorcio oleoducto.

→ Parque cod 19-150

La actividad ejecutada a ejecutar no corresponde con las especificaciones tecnicas requeridas por

IDRD, Por lo tanto la interventoría sugiere utilizar la actividad de embacrillado de sello de juntas contrace Sika Flex "cio 1090li, se debe entregar Valoracion por parte del contratista consorcio aporto.

14-01-2022 Se realiza recorrido de obra en las parques 19-149, 19-150, 19-484. Se revisa y verifica el cumplimiento de Protocolo de Bioseguridad Covid-19 en la toma de Temperatura del personal, dotacion de prendas. y reporte de condiciones de Salud del personal. Se le recuerdo al contratista y personal SST de aparte el estricto cumplimiento de protocolo de Bioseguridad Covid-19, realizar inspecciones periodicas del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad. Se solicita realizar mantenimiento de las Cerramientos y mantener las obra en buenas condiciones de aseo y orden Ins SST Interventora Juan Carlo Bucar

Jueves 14-07-2022
Clima Soleado Mañana, Tarde Soleado
Personal de contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 residente sst 1 apoyo sst, 1 apoyo social
Personal de interventoria = 1 residente, 2 inspectores.
Actividades en ejecución

Parque 19-(484)
Personal en obra = 1 oficial, 3 ayudantes
Equipo Menor = Menor - 1 conguro
Se realizan actividades de compactación de fondo sobre Sub rasante, colocacion de geotextil para encapsulado de estructura y extendido de Sub base granular.
Se acordo en conjunto con interventoria que la viga encontrada en excavación no sera intervenida, simplemente se conformara estructura Sobre la misma.
Parque 19-(149)
Personal en obra = 1 encargado, 1 oficial, 3 ayudantes
1 pajarita, 1 vibro compactador de 2Ton

Se continuan actividades de mezcla de base y estabilizado con cemento sobre segunda capa de 0,15 m de espesor.
Parque 19 - (48B) = No Se realizan actividades en la presente fecha
Parque 19 (150) = No se realizan actividades en la presente fecha.

Viernes 15/01/2021
Clima. Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria = 1 residente y 2 inspectores.
// // //

Sabado 16/01/2021
- clima Soleado mañana
Personal de contratista: 1 residente, 1 residente apoyo, 1 inspector SST
Personal interventoria: 1 residente, 2 Inspectores
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Parque 19 - (149)
Herramiento menor: menor; Maquinaria: 1 vibro compactador de 2 TON, 1 pajarito 36
Se continua humectación y estabilización de base en segunda capa de 15 cm; Se realiza limpieza y aseo general en el frente de trabajo

Lunes 18/01/21.
Parque 19-149 Profesional Ambiental. Se realizo recorrido diario de obra donde se evidencio 1 oficial realizando actividades, 2 auxiliares y 1 operador en operación de minicargador. Se solicita al contratista realizar jornada de orden y aseo sobre los extremos de la cancha teniendo en cuenta que el material usado se acopia, así mismo se debera hacer el retiro y disposición de modulos abastalados. Drena colindes y [illegible].

Parque 19-180 No se evidencia personal operativo en el parque sin embargo se evidencia que en el parque, se debe realizar jornada de orden y aseo.

Se evidencio mantenimiento de cerramiento perimetral y retiro de material de obgosuán final. Obras colorales ✓

estado del clima: Soleado

Personal administrativo: 1 auxiliar SST 1 Inspector tecnico

Personal operativo: 1 oficial + 4 ayudantes + 2 operadores

Actividad en ejecucion: Extendido de material suelo-cemento al 4% y compactacion del mismo.

Parque 19-149.-

la interventoria solicita el retiro del material que se esta extendiendo a dia de hoy no cumple con las caracteristicas mecanicas que el estudio de geotecnia solicita para conformar la estructura de la capa de rodadura.

Parque 19-150, Parque 19-484 = NO se evidencia actividades en ejecucion.

19-01-2021 Se realiza recorrido de obra con la Auxiliar SST de aporte Angela Gutierrez en los parques 19-149 y 19-484 donde se revisa, y verifica el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad en la actividades de prevencion toma de temperatura y reporte de condiciones de salud. se solicita mejorar con aseo general de los parques y realizar mantenimiento del cerramiento. el contratista Aporta por intermedio de la profesional SST Andre Giraldo informa que el dia 19-01-2021 se realizara la charla con del cumplimiento de Aporte Insp. SST Interventoria Juan Carlos Bilbeño

20. ENERO 2021

PARQUE 19-149.

PERSONAL OBRA: 2 OPERADORES / EQUIPO EXCAVADORA - VIBRO. COMPACTADOR RODILLO) 3 AYUDANTES 1 OFICIAL.

LA INTERVENTORIA SOLICITA. AL CONSORCIO APORTE NIVELACIÓN RESTANTE MATERIAL BIAXIAL Y JUEGO. CEMENTO. Y RESPECTIVA COMPACTACIÓN.

SE HACE RETIRO DE JUEGO MADERA.

PARQUE 19 - 484.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE.

OBRA

PARQUE 19- 150.

NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA, SE SOLICITA INSTALACIÓN PISOS EN CAUCHO, BARANDAS, MODULOS BARANDAS, BARANDA N 83 , MOBILIARIO URBANO. JUEGOS IMPORTADOS)) SEÑALIZACION, ENTRE OTROS; SE SOLICITA IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIAS

21 ENERO 2021

PARQUE 19149 :

PERSONAL OBRA: 1 OPERADOR VIBRO COMPACTADOR
3 AYUDANTES 1 OFICIAL

ACTIVIDADES OBRA:

CONTINUA SECADO REMANENTE MATERIAL ESTABILIZADO
SE SOLICITA AL CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO.
LA ENTREGA DE PRUEBAS ELABORADAS AL MATERIAL
SUELO CEMENTO, SE INFORMA AL CONSORCIO OPORTO
SE HARA PRUEBA DENSIDADES EL 21 ENERO 2021.

PARQUE - 19 - 484.

PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD DE OBRA.

INICIA INSTALACION BORDILLO A 80.

PARQUE 19- 150


NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA, SE SOLICITA INSTALACIÓN PISOS EN CAUCHO, BARANDAS, MODULOS BARANDAS BARANDA N- 83, MOBILIARIO URBANO, JUEGOS IMPORTADOS
SEÑALIZACIÓN

22 ENERO 2021

- PARQUE 19 - 149

PERSONAL OBRA: 1 INSPECTOR OBRA - 1 OFICIAL.

SE TOMA NIVELES CONJUNTAMENTE ENTRE CONTRATISTA OBRA CONSORCIO OPORTO E INTERVENTORIA. ARQUITECTURA URBANA LTDA.

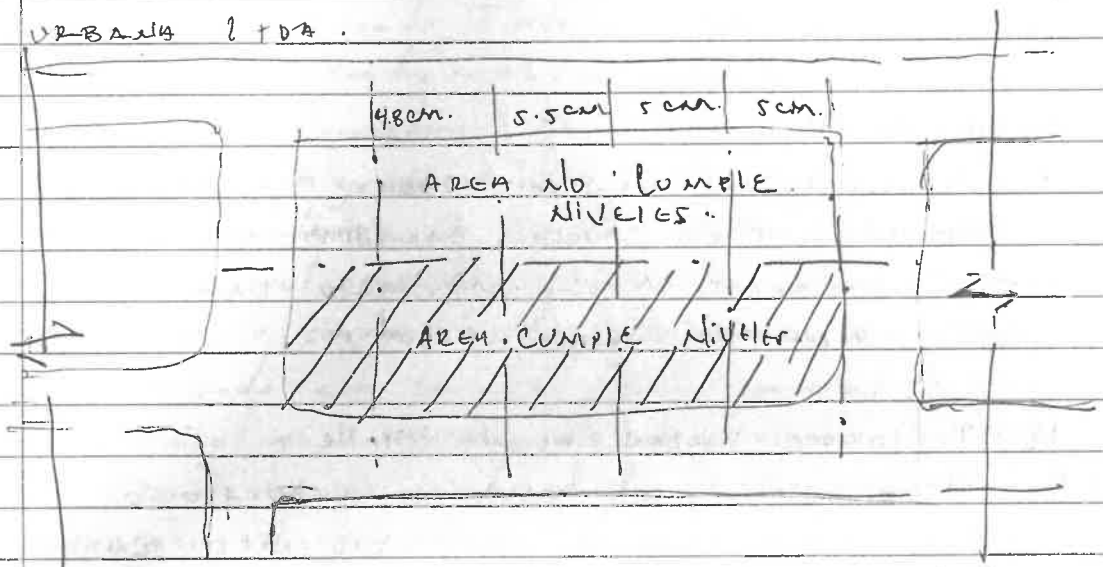

FINALMENTE COMO SE INFORMA EN GRAFICA EL COSTADO NOR-ESTE NO CUMPLE CON LOS NIVELES SOLICITADOS. SE SOLICITA AL CONSORCIO OPORTO TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS DE NIVELES. Y HACER LA ENTREGA DEFINITIVA DEL AREA DE INTERVENCION EL DIA LUNES 25 ENERO 2021, SE RESALTA QUE EL PARQUE PRESENTA ATRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

(*) LOSA DURA ASFALTICA, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO ESTRUCTURA MICROFUTBOL, REDES. ARCOS, RAYAS CANCHAS. BARQUETAS, SEÑALES. ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO Y SON IMPUTABLES AL CONSORCIO OPORTO. NUEVAMENTE SE SOLICITA ENSAYOS Y/O PRUEBAS BASES ESTABILIZADAS.

- PARQUE. 19 - 484:

PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD OBRA.

(1) CONTINUA INSTALACION DE BORDILLO A-80.


(2) SE HACE PRUEBA DENSIDADES SUB-BASE GRANULAR B-400, DE LIBERA CAPA GRANULAR POR PARTE DE INTERVENTORIA, SE HACE CLARIDAD. QUE LA INTERVENTORIA INFORMO AL CONTRATISTA OBRA.

SE TOMARAN MUESTRAS DE EL MATERIAL GRANULAR B-600 y B-700 y B-6000, EN ESTE SENTIDO EN CASO DE QUE EL MATERIAL NO CUMPLA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. LOS REPROCESOS DEBERAN SER ASUMIDOS POR EL CONSORCIO OPORTO.

PARQUE 19-150.

NO SE EVIDENCIA PERSONAL OBRA. SE SOLICITA INSTALACION BAÑOS EN CAUCHO, BARANDAS METALICAS y MODULOS BARANDAS M-85, MOBILIARIO URBANO JUEGOS IMPORTADOS y SEÑALIZACION.

19-149. PARQUE URBANIZACIÓN ESTANCIA. LA INTERVENTORIA y POR MEDIO DE LABORATORIO CONCRETOS. HACE TOMA DE LAS SIGUIENTES DENSIDADES.

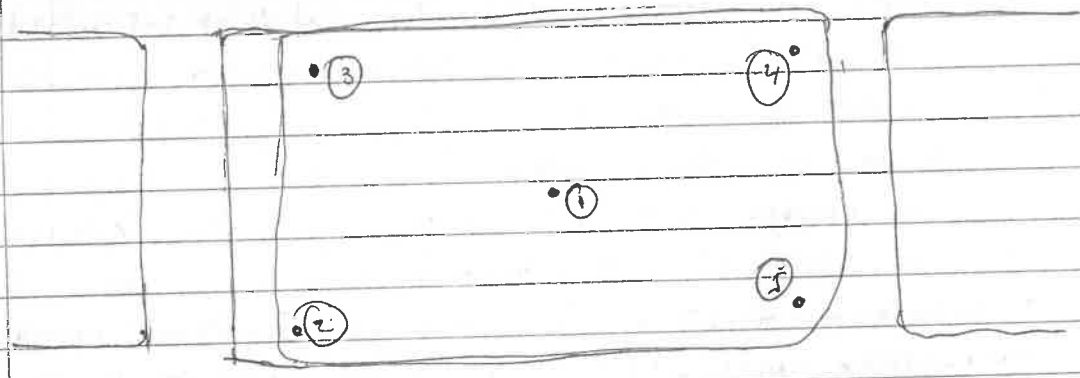

RESULTADOS

* DENSIDAD Nº 1 : 95.2 % | PROCEDENTE.
* DENSIDAD Nº 2 : 90.0 % | NO PROCEDENTE
* DENSIDAD Nº 3 : 93.9 % | NO PROCEDENTE
* DENSIDAD Nº 4 : 91.1 % | NO PROCEDENTE
* DENSIDAD Nº 5 : 96.7 % | PROCEDENTE.


FINALMENTE LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONSORCIO OPORTO TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS: MEJORAMIENTO CAPACIDAD PORTANTE BASE ESTABILIZADA. SE DEBE HACER CONTRAMUESTRA

Norma

19-484
19-149
19-150
19-150
19-191
19-484
19-150

5!

DE TOMA DENSIDADES PARA LIBERACION DE NIVELES FINALES.



23/01/2021 – Sabado

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.

Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst

Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

Actividades en ejecucion:

19-484 Continua instalacion de bordillo A-80 y emboquillado del mismo. Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante.

19-149 Continua la compactacion y nivelacion de base granular estabilizado con cemento (suelo cemento) Personal operativo 1 oficial y 1 operario de vibrocompactador

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion y presenta ausencia de personal.

25/01/2021 – Lunes

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.

Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.

Actividades en ejecucion:

19-150 Inicia actividade de instalacion de parales Ø 2", tuberia estructural galvanizada cal. 2.5mm. Para baranda A-80

19-191. Compactacion y nivelacion de material granular, se resalta que este parque presenta atrasos: Rodadura asfaltica, cerramiento contra impacto, estructura microfutbol, redes cancha, redes arcos, señales civicas.

19-484 No se evidencian actividades en ejecucion.

26/01/2021 – Martes

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleada

Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.

Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

Actividades en ejecucion:

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion.

19-149 Inicia actividad de malla contra impacto h= 5m, excavacion manual, Figurado de acerro para cimientos de la malla. Personal operativo: 1 oficial y 2 Ayudantes.

19-484 No se evidencian actividades en ejecucion.

Miercoles 27/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista = 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria= 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-149 Figurado y amarre de acero para pilotines y viga de cimentacion para malla contra impacto.

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra. Baranda TT-80, Modulos complementarios, Piso caucho, juegos infantiles entre otros.

Jueves 28/01/2021
clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-149 No se evidencian actividades en ejecucion, se le Solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Malla contra impacto h=5m, redes de microfutbol, cancha de baloncesto, cancha de baloncesto, entre otras.

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion, se le Solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Baranda TT-80, juegos infantiles, piso caucho, entre otros

// // // //

Normie

Viernes 29/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

19-199 Se realiza imprimacion en emulsion asfaltica de rompimiento rapido.

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Baranda M-80, Modulos complementarios, piso caucho, juegos infantiles, entre otras.

Sabado 30/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde;
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Ninguna.

19-199 No se evidencion actividades en ejecucion.

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion.

Lunes 01/02/2021
Clima: Mañana: Nublado: Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 2 Inspectores
Actividades en ejecucion.

19-199 Se realiza solado para viga de cimentacion de malla contra impacto

19-150 Se reliza la instalacion de modulos complementarios baranda M-80.

Sabado 02/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: Ninguno.
Personal de Interventoria: Ninguno
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: Ninguna.

Lunes 04/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 director y un apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 inspector
Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades en ejecucion: Instalacion de bordillor A-80 y retiro de base granular (B-600)
Se le solicita de forma reiterada al contratista retirar los bordillos A-80 que presentan imperfecciones (desportillamiento en filos), la interventoria no autoriza que sea extendido el material granular B-600 (Base granular) ya que el material suministrado e instalado B-900 (Subbase reciclada) no se encuentra autorizado por lo tanto esta actividad no se encuentra liberada, hasta no contar con los resultados del proctor por parte del laboratorio de la interventoria, Parques: 19-022 y 19-B325; no se encuentran ejecutando ninguna actividad.

Martes 05/01/2021
Clima: mañana: Soleado: Tarde: Soleado
personal del contratista: 1 residente, 1 Director y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.

Personal operativo= 3 Ayudantes y 2 Oficiales.
Actividades en ejecucion=
Parque 19-325: Se evidencia que el contratista esta realizando las actividades de descapote y excavacion manual.
Parque 19-022: A la Fecha de hoy se evidencia que el contratista no ha retirado los elementos prefabricados (Bordillo A-80) que presentan imperfecciones (desportillamientos), lo cual fue notificado por esta interventoria. mediante anotacion en bitacora. Folio No. 17 del dia 29/12/2020, Folio No. 18 del dia 31/12/2020 y Folio No. 19 del dia 09/01/2021, se le solicita al contratista retirar los elementos defectuosos de manera inmediata e instalar material de calidad.
Parque 19-255= Se le solicita al contratista retirar el material granular (Base B-600), ya que esta interventoria no ha liberado la actividad subbase granular (Material reciclado) ya que presenta inconsistencias en los resultados de laboratorio presentados por el proveedor, se le recomienda al contratista presentar programacion detallada de actividad a ejecutar para realizar un mejor acompañamiento al proceso constructivo.

Miercoles 06/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde=
Personal del contratista: 1 SST y un apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores
Personal operativo= 2 Ayudantes
Actividades en ejecucion:
Parque 19-325: Se evidencia que el contratista esta realizando las actividades de descapote y excavacion manual.

...les.
...tista esta
...y excavaci-
...dencia
...elementos
...mperfeccio-
...cado por
...en bitacora
...18 del die
...2021, se
...mentos
...ar material
...sta retirar
...esta
...subbase
...a inconsis-
...presentados
...ratista
...dad a
...amiento de.
...sst.
...la esta
...excavaci-

Parques 19-022 y 19-255: Se evidencia ausencia de personal, tambien se evidencian actividades incompletas como lo son: Ataque a elementos prefabricados (Bordillos) y. encapsulado de, ataque con geotextil, Esta interventoria le solicita al contratista iniciar y terminar estas actividades de forma inmediata.

Parque 19-255: La interventoria en recorrido evidencia que el contratista esta acopiando material granular B-600 sobre material contaminado proveniente de otro parque el cual se les solicito fuera retirado. Este material ya 'NO' se puede utilizar ya que se encuentra contaminado, si el contratista la utiliza no sera reconocido por la interventoria.

Jueves 07/01/2021
Clima. Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria = 2 inspectores
Personal operativo = Ninguno
Actividades en ejecucion: Ninguna.

Viernes 08/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: lluvia
Personal del contratista. 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Personal operativo: 1 Topografo.
Actividades en ejecucion:
- Parque 19-325 - Se realiza nuevo replanteo y localizacion en la zona de juegos y sendero peatonal (Plazoleta).

Sabado 09/01/2021
Clima: Mañana: Soleado ; Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectore
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion = No se evidencian activi-dades en ejecucion.

Martes 12 de enero 2021

Clima: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector 1 apoyo SST
Personal de interventoria: 1 residente + 2 Inspectores
Personal operativo: 1 oficial + 1 ayudante

=> Parque 19-022:

1 oficial + 1 ayudante realizan excavacion manual incluye retiro para bordillo tarda, se le recomienda al contratista de obra incrementar el personal operativo en este parque para evitar retrasos o atrazos de acuerdo a la programacion.

-> Parque 19-255

No se evidencia personal operativo en este parque, se evidencia material de sobrante granular sin compactar la cual puede afectar las propiedades mecanicas del suelo material granular. la interventoria solicita ser la debida compactacion del material.

=> Parque 19-325

No se evidencia personal operativo realizando ejecucion

de actividades de obra, lo cual se evidencia un atraso de las actividades de obra afectando la programacion de obra. La interventoria solicita entregar un incrementar mas personal operativo para adelantar los retrocesos.

-> Parque 19-022 / Parque 19-255 / Parque 19-325

En los anteriores 3 parques la actividad no corresponde con las especificaciones tecnicas requeridas por el IDRD por lo tanto la interventoria sugiere utilizar la actividad de embolsillado de sellado de juntas contraccion tipo flexocio 10101", se debe entregar valoracion por parte del contratista Consorcio obrito.

14-01-2021. Se realiza recorrido de obra por los parques 19-325, se revisa y verifica el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad covid., se verifica la toma de temperatura reporte de condiciones de salud entrega de tapabocas, desinfectante de prendas. no reporta ningun caso sospechoso de covid. Se solicita al personal SST del contratista Consorcio realizar inspecciones periodicas del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad al personal obra con la permanencia del tapa bocas y guardar el distanciamiento para realizar las respectivas labores de obra. Insp SST Interventoria Juan Carlos Bilcen

Jueves 14-01-2020

Clima: Mañana soleado, tarde Soleado

Personal de contratista: 1 residente, 1 inspector, y apoyo sst, 1 residente sst

Personal interventoria: 1 residente, 2 inspectores

Actividades en ejecución

Parque (19-255) = Se realiza compactación a nivel de base para toma de densidades

Parque 19-(022) : Se finaliza la excavación del bordillo zarpa para la conformacion de los aceros y encofrado

Parque 19-(025) : Se programa replanteo de implantacion para el dia 15-07-2020 de acuerdo a la ultima aprobacion por parte de interventoria

Viernes 15/01/2021
Clima: Mañana: Soleado, tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

Sabado 16/01/2021
clima: Mañana: Soleado: Tarde.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: La interventoria realiza recorrido en obra y no evidencian actividades en ejecucion.

- Parque 19-022: Se evidencian excavaciones expuestos a la interperie, se le solicita al CONTRASTISTA CONSORCIO OPORTO, proteger estas zonas con policitileno de alta densidad.
- Parque 10-255: Se le solicita al contratista consorcio OPORTO retirar los elementos prefabricados que se encuentren en malas condiciones. (desportillados).

Parque 19-022 Lunes 08/enero/21. Profesional Ambiental y SST: Se realizo recorrido de obra, donde no se evidencia personal, donde persisten las observaciones de falta de orden y aseo.

Parque 19-255

PARQUE 19-022

PARQUE 10-255

retiro de material. el cual deberá ejecutarse de manera inmediata, no se evidencia personal.

Parque 19-255 — Prof Amb y SST: se realizo recorrido de obra, donde no se evidencia personal, se evidencia persistencia de observaciones frente orden y aseo, retiro de material acopiado. Buena entorales y .

Lunes 18/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista = 1 inspector, 1 social, 1 apoyo social y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria = 1 residente, 2 inspectores y 1 sst.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion. FRENTES DE TRABAJO. 19-022, 19-255, 19.325..

19 ENERO 2021.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: NO SE EVIDENCIA PERSONAL OBRA.
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: NO SE EVIDENCIAN.
PARQUE 19-022 — SE OBSERVA EL PARQUE 19-022 EN ABANDONADO. CON CAPAS GRANULARES DESPROTEGIDAS Y A LA INTERPERIE, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CLARIDAD A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA. PLACA CONTRAPISO, 3000 PSI, ADOQUIN. ARCILLA. BASE B-200, BARANDA M-80 A, JUEGOS INFANTILES, BANCAS, SEÑALES, ENTRE OTRAS.

PARQUE 19-255 — Se observa el parque 19-255 en abandono, con capas granulares desprotegidas y a la interperie, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar claridad a la ejecucion de actividades de obra: Placa Contrapiso 3000psi, Acero refuerzo, Adoquin Arcilla, baranda M-80

piso Caucho e instalacion de juegos varios, entre otras.

Parque 19-325 Se observa el parque 19-325 en abandono, la interventoria le solicita al contratista dar celeridad a las actividades que se encuentran atrasadas segun la programacion de obra entregada.: Excavacion manual, Rellenos con material granular, Placa de concreto, Acero de refuerzo, Geotextil, canecas INOX, Baranda H-80, Bancas, entre otras.

Parque 19-022

20/Enero/2021

Clima: Mañana : Soleado

Personal: No se evidencia personal de obra.

Actividades en ejecucion: No se evidencian.

Parque 19-022 Se observa el parque 19-022 en estado de abandono, la interventoria solicita iniciar actividades segun la programacion de obra entregada, ya que se evidencian capas granulares desprotegidas y a la interperie, se solicita dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Placa contrapiso 3000psi Adoquin Arcilla, Base B-600 Baranda H-80A, juegos infantiles, bancas, señales, entre otras.

Parque 19-022

Parque 19-255 Se observa el parque 19-022 en estado de abandono, con capas granulares desprotegidas y a la interperie, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Placa contrapiso 3000 psi, Acero refuerzo Mallaelectrosoldada, Adoquin en arcilla, Baranda H-80A, piso caucho, juegos infantiles, entre otras.

Parque 19-255

Parque 19-325 Se observa el parque en estado de abandono, la interventoria solicita al contratista dar inicio a actividades programadas: Excavacion manual, Rellenos con material granular, Placa en concreto 3000psi, Acero de refuerzo, Geotextil, canecas inox, Baranda

Parque 19-325

	M-80, Bancos, entre otras.
	21/Enero/2021
	Clima: Soleado.
	Personal: No se evidencia personal
	Actividades en ejecucion: No se evidencian.
Parque 19-022	Se observa el parque en abandono, con excavaciones expuestas y sin proteccion, materiales granulares sin proteccion y a la interperie, se solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: placa de contrapiso 3000psi, Adoquin en Arcilla, Base B-600, Baranda M-80A, juegos infantiles, bancas, Señales,
	22/Enero/2021
	Clima: Soleado
	Personal: No se evidencia personal de obra.
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion: Ninguna
Parque 19-022	Se observa el parque en estado de abandono, la interventoria le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Base B600, Acero refuerzo, placa contrapiso 3000psi, adoquin arcilla, Baranda M-80, juegos infantiles, bancas, señales civicas, entre otras, se evidencian capas granulares desprotejidas y a la interperie.
Parque 19-255	Se evidencia el parque en estado de abandono, la interventoria le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Placa contrapiso 300 psi, Acero malla refuerzo, adoquin arcilla, Baranda M-80, piso caucho, juegos infantiles, entre otras
Parque 19-325	Se observa el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad a las actividades.

Excavacion manual, rellenos con material granular, placa concreto 3000psi, malla refuerzo, geotextil, bancas, canecas inox, baranda M-80, entre otras.

23/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras
Actividades en ejecucion: Ninguna

19-022 Se evidencia el parque en estado de abandono con excavaciones y material granular sin proteccion y expuestas. Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Bordillo zarpa (Actividad aprobada), Placa contrapiso 3000psi, malla refuerzo, Base B600, Baranda M-80, Juegos infantiles, bancas, señales, entre otras.

19-255 Se evidencia el parque en estado de abandono, con material granular desprotegido y a la interperie. Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Placa contrapiso 3000psi, Acero refuerzo mallaelectrosoldada, Adoquin en arcilla, Baranda M-80, piso caucho, juegos infantiles, entre otras.

19-325 Se evidencia el parque en estado de abandono, con excavaciones expuestas, se le solicita al contratista dar celeridad con la ejecucion de actividades de obra: Excavaciones manuales, rellenos con material granular, placa de concreto 3000psi, malla de refuerzo geotextil, bancas, canecas inox, baranda M-80, entre otras.

25/01/2021
Clima: Mañana: Lluvia suave; Tarde: Nublado
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras

19-022
19-255
19-325
19-022

	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Actividades en ejecucion: Ninguna
19-022	Se evidencia el parque en estado de abandono, con excavaciones abiertas, material granular desprotegido y a la interperie. Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: bordillo zarpa, placa contrapiso 2000 psi, malla refuerzo, Base B600, Baranda M-80, juegos infantiles, Lancas, señales civicas, Adoquin en arcilla, entre otras.
19-255	Se evidencia el parque en estado de abandono, con excavaciones abiertas, material granular desprotegido y a la interperie. se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Placa contrapiso 3000psi, Acero refuerzo mallaelectrosoldada, Adoquin en arcilla, Baranda M-80, piso caucho, juegos infantiles, entre otros.
19-325	Se evidencia el parque en estado de abandono, con excavaciones abiertas y desprotegidos, se le solicita al contratista dar celeridad ala ejecucion de actividades de obra: Excavaciones manuales, rellenos con material granular, placa de concreto 3000psi, malla refuerzo, geotextil, Lancas, canecas inox, Baranda M-80, entre otros.
	26/01/2021
	Clima: Mañana. Soleado; Tarde:
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion = Descapote y excavacion mecanica en el parque 19-325.
19-022	Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista iniciar actividades segun la programacion presentada y aprobada por la

	interventoria, y dar celeridad a la ejecucion de activ-
	dades de obra: Bordillo zarpa, placa contra piso
	3000psi base granular B600, Baranda M-80, juegos
	infantiles, bancas, señales civicas entre otras.
19-255.	Se evidencia el parque en estado de abandono,
	se evidencia material granular desprotegidos y a la
	interpelle, se le solicita al contratista dar celeri-
	dad a la ejecucion de actividades en obra:
	Placa contrapiso 3000psi, Acero refuerzo, Adoquin arcilla
	Baranda M-80, piso caucho, juegos infantiles, entre
	otros.
19-325	Se inician actividades de excavacion manual.
	La interventoria no autoriza la ejecucion de actividades
	en el parque 19-325, hasta tanto no se cuente
	con la aprobacion de esquemas y diagnosticos por
	parte del area social y por parte de la comunidad,
	cualquier reproceso y sobre costo sera asumido por
	el contratista CONSORCIO OPORTO.
	Miercoles 27/01/2021
	Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 inspector y (2) 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-022	Figurado de acero para bordillo zarpa
19-255	se realiza imprimacion con emulsion asfaltica en la zona
	de juegos
19-325	continua con la excavacion manual de la zona de
	juegos y plazoleta peatonal.
	Jueves 28/01/2021
	clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 residente y 1 apoyo SST.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

	A
19-022	I
	P
19-255	7
	P
19-325	C
	/
	T
	V
	C
	P
	Pa
	A
19-022	C
19-255	I
	C
19-325	C
	J
	S
	C
	T
	P
	A
19-022	T
	T
19-255	I
19-325	C
	J
	T

	Actividades en ejecucion:
19-022	Inicia la instalacion de solado para bordillo zarpa.
	Personal operativo: 1 oficial y 2 ayudantes
19-255	Fundida de concreto 3000psi, para zona de juegos
	Personal operativo: 1 oficial y 2 ayudantes.
19-325	continua la excavacion manual para la zona de juegos.
	Personal operativo: 2 oficiales y 3 ayudantes.
	Viernes 29/01/2020
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-022	continua Figurado de acero para bordillo zarpa.
19-255	Inicia la actividad de corte para juntas de dilatacion en losa de concreto 3000psi e=2cm.
19-325	Continua la excavacion manual para la zona de juegos y plazoleta peatonal.
	Sabado 30/01/2020
	clima: Mañana: Soleado; Tarde:
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-022	Figurado y amarre de acero para bordillo zarpa
	Personal operativo: 2 oficiales y 2 ayudantes.
19-255	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-325	Continua la excavacion manual de la zona de juegos y sendero peatonal.
	Personal operativo: 2 oficiales y 3 ayudantes
	// // // //

Lunes 01/02/2021

Clima: Mañana: Nublado. Tarde:

Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.

Personal de interventoria: 2 inspectores.

Actividades en ejecucion:

Martes 29 de Diciembre
Clima: Soleado.
Personal de contratista: 1 Apoyo técnico, 1 Apoyo SST.
Personal de Interventoría: 1 Inspector, 1 Apoyo SST.
Actividades en Ejecución:
19-038 Aseo y Limpieza
19-039 Aseo y Limpieza.
Se realiza recorrido de obra donde se revisa y verifica= Parque 19-038 =
1) Se debe realizar el atraque con recebo y encapsular en geotextil a la altura del bordillo A-80 (Atraque min 30cm)
2) Se deben inducir las dilataciones en la losa de concreto en el area del sendero peatonal, e min= 2cm.

31/12/2020 - Jueves.
Clima= Mañana= Soleado. Tarde=
Personal del contratista = Ninguno.
Personal de interventoria = 1 inspector de obra.
la interventoria realiza recorrido a obra y se evidencia que no existe personal de obra en los parques 19-038 y 19-039.

~~Jueves~~ 02/01/2021 Sabado.
Clima= Mañana: Soleado: Tarde.
Personal del contratista: Ninguno
Personal de Interventoria: Ninguno
Personal operativo: Ninguno
Actividades en ejecución: Ninguna.

lunes 04/01/2021
Clima: Mañana: Soleado: Tarde: Soleada
Personal del contratista: 1 residente, 1 director y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 inspector
Personal operativo: 1 ayudante.
Actividades en ejecucion: Aseo general en el parque 19-038.

05-01-2021 Se realiza recorrido en los parques 19-038 y 19-039. Se solicita cumplir con el programa de orden y aseo y cumplir con el mantenimiento y/ cerramiento las SST Interventoria

Martes 05/01/2021
Clima: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado.
Personal del contratista= 1 residente, 1 director y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria= 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal operativo = 1 Ayudante.
Actividades en ejecucion:
Parque 19-038 = Se realiza aseo general en las zonas intervenidas.
parque 19-039 y No se evidencia actividades en ejecucion.

Miercoles 06/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista= 1 sst y 1 apoyo sst
Personal de interventoria= 2 inspectores
Personal operativo= 1 ayudante.
Actividades en ejecucion= Aseo general en el parque 19-039.

Jueves 07/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 apoyo tecnico y 1. apoyo sst.
Personal de Interventoria: 2 inspectores de obra
Personal operativo = Ninguno.
Actividades en ejecucion = No se evidencia actividades en ejecucion y ningun trabajador operativo.

|| || || || ||

COPIA PLAC

Viernes 08/01/2021.
Clima: Mañana. Soleado; Tarde: Lluvia
Persona del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst, 1 Topografo.
Personal de Interventoria = 2 inspectores y 1 residente.
Personal Operativo = Ninguno.
Actividades en ejecucion: Se evidencia ausencia de personal operativo y no se evidencia actividades en ejecucion.

Sabado 09/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo. sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion = No se evidencian actividades en ejecucion.

Martes 12/01/2021
Clima: Mañana: Soleado, Tarde: Soleada
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Personal operativo = Ninguno.
Actividades en ejecucion = NO se evidencian actividades en ejecucion.

Miercoles 13/01/2021

->Clima: Mañana: soleado, tarde soleada
Personal del contratista: 1 residente, 1 Inspector y apoyo SST
personal de interventoria: 1 residente y 2 Inspectores
Personal operativo: ninguno
Actividades en ejecucion: no se evidencia ejecucion de actividades de obra.

Parque 19-038 / Parque 19-039

en los anteriores 2 parques la actividad no.

Jueves 14-01-2021

Clima: Mañana Soleado, Tarde Soleado
Personal de contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 apoyo Social 1 residente y apoyo SST
Personal interventoria: 1 residente de obra, 2 inspectores
personal operativo: 1 oficial
Actividades en ejecucion: No se realizan actividades en la presente fecha.

Viernes 15/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: NO se evidencian actividades en ejecucion.

Sabado 16/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; tarde.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: la interventoria realiza recorrido en obra y evidencia falta de personal operativo y ninguna actividad en ejecucion.

Lunes 18/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector, 1 social, 1 apoyo Social. y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 SST.

COPIA PLAC.

Activ
ejecu
Mart
Clima:
Person
Person
Activ
ejecu
19-038 Se o
al c
de a
n-80
19-039 Se de
al c
de ac
embar
Canec
Mierc
clima:
Person
Person
Activi
19-038 se c
al c
des
infra
19-039. Se
Solici
de
Junt
inox

Actividade en ejecucion.= No se evidencian actividades en ejecucion.

Martes 19/Enero/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.

9-038 Se observa el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Piso en caucho, Baranda Cerramiento M-80, Bancas, Juegos Infantiles, Señalizacion, entre otros.

19-039 Se observa el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra. Desmonte de señales civicas, embaquillado junta SIKAflexx, Piso en caucho, Baranda M-80, Canecas inox, bancas, juegos infantiles y Señales civicas.

Miercoles 20/Enero/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de Interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Ninguna.

19-038 se observa el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Piso caucho, baranda M-80, Bancas, juegos infantiles, senalizacion, entre otos.

19-039. Se observa el parque en estado de abandono, se les solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Desmonte señales civicas, juntas con SIKAflex, piso caucho, baranda M-80, canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas.

Jueves 21/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras
Actividades en ejecucion: Ninguna
19-038 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista consorcio oporto iniciar con las actividades de obra: Piso caucho, baranda M-80, Bancas, juegos infantiles, señalizacion, entre otras.
19-039 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO iniciar con las actividades de obra: Desmonte señal civica, juntas sikaflex, piso caucho baranda M-80, canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas.

Viernes 22/01/2021
Clima. Mañana: soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras
Actividades en ejecucion: Ninguna
19-038 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad con la programacion de obra aprobada: Piso en caucho, baranda M-80, Bancas, juegos infantiles, señales civicas, entre otras.
19-039 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad con la programacion de obra aprobada: Desmonte señales civicas, juntas sikaflex, piso caucho, baranda M-80, canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas

Sabado 23/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista. 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras
Actividades en ejecucion: Ninguna.

19-038 Se e
Solici
a la
M-8
en t
19-039 Se e
Solici
a la
seña
cane
civic
Lunes
Clima
Perso
apoy
Perso
Actu
19-038 Se e
Solic
a la
baran
otro
19-039 Se e
Solic
a la
desm
Canec
Mart
clima
Person
Perso
Actu
19-038 Se e
Solic

19-038 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar celeridad a las actividades de obra: Piso en caucho, baranda M-80, Bancas, juegos Infantiles, señales civicas, entre otros.

19-039 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le Solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar celeridad a las actividades de obra: Piso en caucho, desmonte señales civicas, juntas simaflex, baranda M-80, canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas.

Lunes 25/01/2021
Clima: Mañana: lluvia suave: Tarde: Nublado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1. apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Ninguna.

19-038 Se evidencia el parque en estado de abandono se le Solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Piso en caucho, baranda M-80, juegos infantiles, señales civicas, entre otros.

19-039 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar Celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Piso en caucho, desmonte señales civicas, juntas simaflex, baranda M-80, Canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas.

Martes 26/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: 1 inspecto y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: Ninguna.

19-038 Se evidencia el parque en estado de abandono se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion

de actividades de obra. Piso en caucho, baranda M-80 juegos infantiles, señales civicas entre otras

19-089 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO dar celeridad en la ejecucion de las actividades de obra: piso en caucho, junta sikaflex, desmonte señales civicas, baranda M-80, canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas.

Miercoles 27/01/2021

Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.

Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst

Personal de interventoria. 1 residente y 2 inspectores.

Actividades en ejecucion = Ninguna

19-038 se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad con la ejecucion de actividades de obra: piso en caucho, baranda M-80, juegos infantiles, señales civicas entre otras.

19-039 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad con la ejecucion de actividades de obra: piso caucho, junta sika flex, desmonte señales civicas, baranda M-80, canecas inox, bancas, juegos infantiles y señales civicas.

Jueves 28/01/2021

Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado.

Personal del contratista: 1 inspector y 2 ayudantes.

Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

Actividades en ejecucion. Instalacion de parantes de la baranda M-80.

19-038 Se evidencia el parque en estado de abandono, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: piso en caucho, baranda M-80 juegos infantiles y señales civicas entre otras

19-039 Se
de

Vieir
Clima:
Person
Person
inspe
Actu
baran

19-038 Se
de L

19-039 No

Saba
Clima
Person
Person
Actu

19-038 No
Solici
de a
da T
señal

19-038 No
al co
actu
M-8
Seña

Lune
Clima
Perso
Person

COPIA PIAC

19-039 Se evidencia la instalacion de parales ϕ=2" complemento de Baranda M-80, para la zona de juegos

Viernes 29/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 1 apoyo sst y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion = Instalacion de parales de la baranda M-80.

19-038 Se evidencia la instalacion de parales ϕ=2" complemento de baranda M-80 para la zona de juegos.

19-039 No se evidencian actividades en ejecucion.

Sabado 30/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: Ninguna.

19-038 No se evidencian actividades en ejecucion se le solicita al contratista dar celeridad a lo ejecucion de actividades de obra: Modulo complemento de baranda M-80, piso en caucho, juegos infantiles, bancas y señales civicas, entre otras.

19-038 No se evidencian actividades en ejecucion, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Modulo complemento de Baranda M-80, piso en caucho, juegos infantiles, bancas y señales civicas, entre otras.

Lunes 01/02/2021
Clima. Mañana: Soleado; Tarde: Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores

Hoy 7 de enero de 2021 se da inicio al presente libro de actas, que abarca los parques 19-394 URBANIZACION LAS QUINTAS; 19-144 URBANIZACION MADELENA III y IV SECTOR; Parque 19-393 URBANIZACION MADELENA III y IV SECTOR; porque 19-401 DESARROLLO MADELENA III y IV SECTOR; Parque 19-016 DESARROLLO RINCON DE GALICIA Y URBANIZACION LA CSTANCIA. Parque 19-4-PA URBANIZACION LA ESTANCIA. Las direcciones corresponden a los siguientes=

a) 19-394: Entre Carrera 16g y Carrera 17FBis con calle 71ASur
b) 19-144: Entre Carrera 70 y Carrera 69B con calle 61Sur.
c) 19-393: Calle 61 sur entre Carrera 67 y carrera 68.
d) 19-401: Entre Carrera 68A y Carrera 68C con transversal 70D
e) 19-016: Entre Carrera 75C y Carrera 75BBis con Calle 62HSur.
f) 19-484: Transversal 731 con Diagonal 57Z sur

En el presente libro se devarrollaran temas de indole. tecnico, administrativo, social ambientales y SST (seguridad y salud en el trabajo) del proceso del contrato de obra No. 403 de 2019 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PARQUE VECINALES y/o BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR"

Contrato de interventoria: No. 405 de 2019, y el objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST al contrato de obra publica que tendra por objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO y/o ADECUACION DE LOS PARQUES VECINALE y/o DE BOLSILLO POR EL CISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019"

Participaran en el presente libro de actas los profesionales del contratista CONSORCIO OPORTO y de la Interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA, que se encuentran

	vinculados Contractalmente.	19-483.
	Personal del contratista:	19-901
	Director de obra = Ernesto Diaz Herazo	
	Residente de obra = Cristian Diaz Gonzales	
	Apoyo tecnico =	
	Apoyo sst = Angela Julieth Gutierrez.	
	Personal de interventoria =	
	Residente de obra: Fernando Aguirre Medina	
	Inspectores de obra: Jose Abelino Vargas Tenjo y Daniel Felipe Gomez Aldana.	19-016
	Residente sst: Diana Catherine Morales.	
	Jueves 07/01/2021.	
	Clima. Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.	19-144
	Personal. del contratista = 1 residente; 1 inspector y 1 apoyo sst.	19-393. 19-901
	Personal de, interventoria = 1 residente y 2 inspectores.	19-394
	Actividades en ejecucion. =	19-989
19-016	inicia la actividad de localizacion y replanteo, cerramiento en polisombra.	
	Personal operativo: 1 oficial y 2 ayudantes.	
	No se evidencian actividades en ejecucion en los parques 19-144, 19-393, 19-401 y 19-484.	
	Viernes 08/01/2021	
	clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado	19-016
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 Topografo y 1 apoyo sst.	19-989
	Personal de interventoria. 1 residente y 2 inspectores.	19-144
	Actividades en ejecucion:	19-393
19-016	inicia la actividad de descapote manual e=10-15cm	19-401
	Personal operativo: 1 oficial y 3 ayudantes.	19-394
19-144	inicia la actividad de localizacion y replanteo	
19-393	inicia la actividad de localizacion y replanteo	

19-483.	Inicia actividad de localizacion y replanteo.
19-901	No se evidencian actividades en ejecucion.
	Sabado 09/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde; Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1. apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion.
19-016	Continua actividad de descapote manual e=10-15 cm, desmonte de juego en madera existente, desmonte de señales civicas.
	Personal operativo: 1 oficial y 3 ayudantes.
19-144	No se evidencian actividades en ejecucion
19-393	No se evidencian actividades en ejecucion
19-901	No se evidencian actividades en ejecucion
19-394	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-489	No se evidencian actividades en ejecucion
	Martes 12/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-016	Continua la actividad de descapote manual e=10-15 cm.
19-489	Inicia la actividad de excavacion mecanica para estructura nueva segun estudio geotecnico.
19-144	Inicia actividad de descapote manual e=10-15 cm
19-393	Inicia actividad de descapote manual e=10-15 cm
19-901	No se evidencian actividades en ejecucion
19-394	No se evidencian actividades en ejecucion

Miercoles 13/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspecto y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-394	NO se evidencian actividades en ejecucion.
19-144	Continua la actividad de descapote manual e=10-15 cm
19-393	Continua descapote manual e=10-15cm
19-016	Inicia excavacion mecanica para nueva estructura de suelo segun estudio geotecnico.
19-401	NO se evidencian actividades en ejecucion
19-484	Continua excavacion mecanica para nueva estructura del suelo.

Jueves 14/01/2021
Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion

19-016	Continua excavacion mecanica y retiro de material proveniente de la excavacion
19-144	continua la actividad de descapote manual e=10-15 cm
19-393	NO se evidencian actividades en ejecucion.
19-401	NO se evidencian actividades en ejecucion
19-394	NO se evidencian actividades en ejecucion.
19-484	Continua la excavacion mecanica.

Viernes 15/01/2021.
Clima. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Actividades en ejecucion,

19-016
19-394
19-144
19-393
19-401
19-484
19-016
19-394
19-144
19-393
19-401
19-484
19-394.
19-144
19-393
19-401
19-016
19-484

19-016	Continua la actividad de excavacion mecanica
19-394	Inicia la actividad de localizacion y replanteo.
19-144	No se realizan actividades
19-393	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-401	Inicia la actividad de demolicion de carpeta asfaltica.
19-484	Continua la excavacion mecanica, nivelacion. e instalacion de geotextil T2100.
	Sabado 16/01/2021
	Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
19-016	Continua excavacion mecanica y perfilacion de terreno
19-394	No se evidencian actividades en ejecucion
19-144	Continua la actividad de descapote e=10-15 cm
19-393	Continua la actividad de descapote e=10-15 cm
19-401	Continua actividad de demolicion de carpeta asfaltica
19-484	Instalacion de geotextil T2100 y extendido de material granular subbase B400.
	Lunes 18/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 inspecto y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-394.	Inicia demolicion de carpeta asfaltica.
19-144	Continua descapote manual e=10-15 cm.
19-393	Inicia la actividad de excavacion mecanica
19-401	Inicia actividad de excavacion manual.
19-016	Suministro e instalacion de rajon dimensiones:
	Min: 15cm y Max: 25cm.
19-484	Inicia la compactacion de material granular Subbase B-900.

	Martes 19/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-394	continua demolicion de carpeta asfaltica, desmonte de juegos en madera existente y excavacion mecanica.
19-144	No se evidencian actividades en ejecucion
19-393	continua la actividad de excavacion mecanica.
19-401	continua la actividad de excavacion manual
19-016	continua la instalacion de rejon
19-484	Se realizan tomas de densidades a material granular B-400 (Subbase) cumpliendo con la densidad mayor al 95%.
	Miercoles 20/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-394	continua la actividad de excavacion mecanica
19-144	Inicia actividad de excavacion mecanica.
19-393	Inicia actividad de excavacion mecanica
19-401	Continua la actividad de excavacion manual.
19-016	Continua instalacion de rejon
19-484	No se evidencian actividades en ejecucion
	Jueves 21/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion
19-394	continua actividad de excavacion mecanica

19-144
19-393
19-401
19-016
19-484
19-394
19-144
19-393
19-401
19-016
19-484
19-394
19-144
19-393
19-401
19-016
19-484

19-194	No se evidencian actividades en ejecucion
19-393	Continua la actividad de excavacion mecanica
19-401	Continua la actividad de excavacion manual
19-016	Continua la actividad de instalacion de rejon
19-484	Inicia la actividad de instalacion de bordillo A-80.
	Viana 22/01/2021.
	Clima. Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-394	continua la actividad de excavacion mecanica
19-144	Inicia la instalacion de geotextil T2100 y tendido de material granular ~~Subbase~~ B-400.
19-393	Inicia la compactacion de Fondo de excavacion.
19-401	continua la actividad de excavacion manual.
19-016	Inicia la instalacion de material granular B-200
19-484	Inicia la actividad de instalacion de bordillo A-80 y juntas en mortero.
	Sabado 23/01/2021
	Clima: Mañana. Soleado; Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:.
19-394	continua la actividad de excavaciones mecanica.
19-144	Compactacion de material granular subbase B-400.
19-393	Inicia instalacion de geotextil T2100 y extendido de material granular B-400.
19-401	Inicia estabilizacion de suelo (suelo cemento) al 9%.
19-016	continua la instalacion de material granular B-200
19-484	continua la instalacion de bordillo A-80.

Lunes 25/01/2021
Clima: Mañana: lluvioso, Tarde: Nublado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion.

19-394	continua excavacion mecanica y retiro de material proveniente de excavacion
19-144	compactacion de material granular B-400
19-393	inicia instalacion de bordillos A-80
19-401	continua estabilizacion de suelo (suelo cemento) al 4%.
19-016	continua la instalacion de material granular B-200
19-484	continua emboquillado de bordillo A-80.

Martes 26/01/2021
Clima: Mañana. Soleado, Tarde= Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal delnterventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-394	Continua excavacion mecanica para la zona de juegos
19-144	Inicia la instalacion de bordillo A-80
19-393	Continua la instalacion de bordillo A-80
19-401	continua la estabilizacion del suelo (suelo cemento) al 4%
19-016	Continua la instalacion de material granular B-200.
19-484	No se evidencian actividades en ejecucion.

19-394
19-144
19-393
19-401
19-016
19-484

Miercoles 27/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion.

19-394 Excavacion mecanica para la zona de juego y sendero peatonal.
19-144 No se evidencian actividades en ejecucion.
19-393 Continua la instalacion de bordillo A-80
19-401 Continua la estabilizacion del suelo (suelo cemento)
19-016 No se evidencian actividades en ejecucion.
19-484 Inicia la instalacion de base granular B-600

Jueves 28/01/2021
Clima, Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

19-394 Inicia la instalacion de geotextil T2100 con traslapo Min. 0.30 m, instalacion de material granular B-400 para la zona de juegos
19-144 Inicia la instalacion de bordillo A-80
19-393 Inicia la instalacion de base granular B-600
19-401 Continua la estabilizacion del suelo (suelo cemento)
~~19~~ Se le solicita al contratista presentar el estudio Financiero para la evacuacion de las aguas superficiales de la zona de juegos.
19-016 No se evidencia actividades en ejecucion
19-484 continua la instalacion de material granular B-600

Viernes 29/01/2021
Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

	Actividades en ejecucion:
19-394	continua la instalacion de material granular B-400 y excavacion mecanica.
19-114	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-393	Continua la instalacion de material granular B-600
19-401	Se realizan tomas de densidades y proctor modificado del suelo cemento.
19-016	Se realiza tomade niveles de material granular B-200.
19-484	Se realiza toma de densidades.
	Sabado 30/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-394	No se evidencian actividades en ejecucion
19-114	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-393	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-401	Continua. la dosificacion de suelo cemento al 4%.
19-016	No se evidencian actividades en ejecucion
19-484	Se realiza la imprimacion con emulsion asfaltica.
	Lunes 01/02/2021
	Clima: Mañana: Nublado. Tarde:
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
	Personal de interventoria: 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
	Miercoles 03/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde; Soleado.
	Personal de contratista: 1 residente, 1 residente apoyo, 1 inspector sst
	Personal de interventoria: 2 inspectores; 1 residente

Actividades en ejecución:

19-394: Se continua con la extendida de la Sub base granular y compactacion sobre las areas de la implantación dispuesta.

19-144: Se Continua con actividades de instalación de bordillo A-80 para la conformación de la estructura

19-393: El dia lunes Se tomaran densidades a nivel de base granular donde arrojaran resultados de 110,1% y 106,4% dando aval para fundir losa de concreto para el jueves 04-02-2021 El dia 03-02-2021 Se realizo la aplicacion de emulsión Sobre el area a fundir

19-401: Se finalizan actividades de estabilización de suelo Cemento en Segunda Capa dando paso a los densidades y excavación para la instalación de bordillo A-80

19-016: Se inicia con la extendida de geotextil para iniciar a aplicar capa de base granular

19-484: El dia lunes 01-02-2021 Se realiza fundido de concreto de 3000 psi con malla electrosoldada en area de bio Soluciones El dia martes Se ejecutan actividades de corte de placa para sello de juntas e instalacion de adoquin en Sendero peatonal

Parque 19-079=
1) Se licidita de forma inmediata al contratista inicial- actividades.
✓ Descapote manual y retiro
✓ Excavacion manual.

Jueves 31/12/2020.
Clima = Mañana: Soleado; Tarde=
Personal del contratista = Ninguno.
Personal de Interventoria = Inspector de obra.
Personal operativo = ~~Ninguno~~ 1 Ayudante.
La Interventoria realiza recorrido a obra, se evidencia que en los parques 19-495, 19-368 y 19-079 NO existe personal de obra
En el parque 19-316 se evidencia 1 ayudante realizando la actividad de Excavacion manual.

Sabado 2/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado; Tarde:
Personal del contratista: Ninguno
Personal de Interventoria: Ninguno
Personal operativo: Ninguno
Actividades en ejecucion: Ninguna.

Lunes 09/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde; Soleado.
Personal del contratista = 1 residente, 1 directo y 1. apoyo sst.
Personal de Interventoria = 1 Inspector de obra
Personal operativo = 1 oficial, 2 Ayudantes
Actividades en ejecucion=
Parques: 19-495, 19-368, 19-056 y 19-079, no se evidencia ninguna actividad en ejecucion.
Parque 19-316: Se realiza excavacion manual en la zona de juegos.

La interventoria no autoriza que el material granular B-400 (material reciclado) sea extendido ya que este material no se encuentra autorizado por parte de la interventoria se realizara la toma del proctor por parte del laboratorio de interventoria una vez validado este resultado se procedera a realizar la respectiva aprobacion y liberacion.
Se evidencia que en el Parque 19-316, se encuentra un material petreo mal acopiado y la reiteracion del incumplimiento de las medidad ambientales.

Martes 05/01/2021
Clima: Mañana; Soleado ; Tarde: Soleado
Personal del contratista= 1 residente, 1 director y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria= 1 residente, 1 inspector y un apoyo sst
Personal operativo= 2 Ayudantes.
Actividades en ejecucion=
Parque 19-368= Se evidencia trasiego de material para realizar el retiro del mismo.
Parque 19-475 = Se evidencia que el material reciclado (Subbase B-400) presenta contaminacion de material proveniente de excavacion,
Parque 19-316 y Parque 19-079, se evidencia falta de personal operativo y no se esta ejecutando ninguna actividad.

Miercoles 06/01/2021
Clima: Mañana= Soleado ; Tarde:
Personal del contratista = 1 sst y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria= 2 inspectores
personal operativo= 2 ayudantes y 1 oficial.

material.
ia extend
z autoriza
realizara
laboratorio
ente
la respectiva

, se encuentra
reiteracion
ambientales.

ctor y 1

ector y un

terial para

al reciclado
material.

alta de
ninguna

sst.

Actividades en ejecucion:
Parque 19-475: Se evidencia trasiego de material proveniente de excavacion, para su respectivo retiro por el proveedor autorizado.
Parques 19-368, 19-316, 19-075: No se evidencia actividades dadas en ejecucion.

Jueves 07/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y un apoyo sst.
Personal de Interventoria: 2 inspectores.
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.
· Parque 19-368: La interventoria le solicita al contratista escarificar el material compactado y recompactarlo para proceder con su liberacion.

Viernes 08/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Lluvia.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoy sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Personal operativo: Ninguno.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.

Sabado 09/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria.: 1 residente y 2 inspectores.
Personal operativo, Ninguno.

Actividades en ejecucion: No se cuidencian actividades en ejecucion.

Martes 12/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Personal operativo: 3 ayudantes, 1 oficial y 1 operario mincargador.
Actividades en ejecucion:
- Parque 19-475 = Se evidencia la ejecucion de la actividad de excavacion manual de la zona de juegos.
- Parque 19-368 = Se evidencia la ejecucion de la actuidad de escarificacion de suelo cemento, para realizar la recompactacion del mismo.
- Parque 11-326 = Se evidencia la ejecucion de la prueba de carga a la subrasante y retiro de material proveniente de excavacion.
- Parque 19-056 y 17-077 = NO se evidencia ejecucion de actividades.

Jueves 14/01/2021
Clima = Soleado mañana, Soleado tarde
Personal de Contratista: 1 residente, 1 inspector 1 apoyo SSt 1 residente ssta, 1 gestor Social
Personal interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Personal operativo: 1 encargado, 1 oficial, 3 ayudantes
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Parque 19 - (368)
((3,92 x 5,00) + (5,0m x 2,10m)) retiro y re instalacion de adoquin
Se hace diagnostico en compañia de interventoria para Serear y determinar el acabado del poño de adoquin en donde el contratista propone:

ctividades	
	realizar la excavación de 3m x 3m encontrando los desarrollo de la raíz para generar los cortes y en cuanto al tallo cortar a una profundidad de -0,3m del nivel de la rasante teniendo en cuenta que en el corte se hace un curado con cicatrizante ; la propuesta se hace en base de que
1 apoyo	el tallo posiblemente se encuentra a una profundidad
2 inspectores y 1	igual o mayor a 1,50 m ; profundidad que nos representa un riesgo de estabilidad en los predios al sacarlo por completo ademas de que puede estar interviniendo redes
de la	humedas o redes secas Sobre las raices ; Seguido de ello compactar una base de 0,2m para asi alistar el paño
a de juegos.	Continuo en adoquin
de la	Se procede con la compactación de la base y la aplicacion
to, para	de la emulción para alistar fundido en concreto de 3000psi.
de la	
etiro de	14-01-2021 Se realiza recorrido por los parques 19-475
	19-366 - 19-36 , 19-056 y 19-079 se revisa y verifica el
ejecucion	cumplimiento del protocolo de Bioseguridad- covid-19 en la toma de Temperatura desinfeccion de prendas- y reporte de condiciones
	de salud. no reporta ningun caso sospechoso. Se solicita al
	contratista apoyo y al personal de Seguridad y Salud del
	Trabajo de la empresa, realizar Inspecciones periodicas al
	personal de contratista para dar cumplimiento estricto
apoyo SSt	al protocolo de Bioseguridad Covid-19 cumpliendo con la
	permanencia del Tapa boca al personal de obra. Insp SST
	Interventoria Juan Carlos Barrios
lantes	
	Parque 19 (475) : Se continua con la excavación manual hasta
	nivel de Sub rasante para conformación de estructura
n de adoquin	
para	Parque 19-079 : Se realizo replanteo, cerramiento perimetral y
oquin	se inicia descapote en area de implantación

* Parque 19 (016) = Se realizan actividades de replanteo para nueva conformación de acuerdo a la implantación aprobada por interventoria
* Parque 19 -(056) = No Se realizan actividades.

Viernes 15/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 inspecto y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

Sabado 16/01/2021
Clima: Mañana, = Soleado Mañana, Tarde
personal de contratista 1 residente apoyo y 1 residente de obra, 1 inspector sst
Personal interventoria = 1 residente 2 inspectores
herramiento menor = menor
Actividades en ejecución

Parque (19 - 479) = Se continua con la excavación del terreno a nivel de Sub rasante y se replanteo modificar cerramiento de acuerdo a la aprobacion de la nueva implantación.

Parque. 19-435. Profesional Ambiental y SST - Lunes 18 de Enero 2021.
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia 1 oficial de obra realizando excavación manual, sin embargo se evidencia la persistencia de acopio de material que supera 3 m³, el cual debe estar dispuesta para escombrera de manera inmediata, Asi mismo se debe realizar de manera inmediata la jornada de orden y aseo en zona colindante (Canal). ya que allí se evidencia material. acopiado Dana c Morales y #.

Parque 19-368

Parque 19-316

Parque 19-099.

replanteo implantación

Parque 19-368 Profesional Amb y SST: No se evidencia personal de obra operativa. Sin embargo se evidencia de manera continua la acumulación de material el cual no esta señalizado ni cubierto, así mismo esta actividad deberá realizarse de manera inmediata. y jornada de orden y aseo. Diana Morales V

SST.

apoyo sst inspectores,

Parque 19-316 Profesional Amb y SST: Se realizo recorrido de obra donde se hace verificación de implementación de protocolo de bio seguridad (lavamanos portatil - canecas), así como uso permanente de elementos de protección personal (tapabocas) guantes, botas y casco. Así mismo se evidencio la correcta implementación de los preoperacionales en obra, siendo para el bobcat. se evidencio señalización de accesos temporales y mantenimiento de cerramiento peumetral. Diana Morales V Nota: 1 operador, 1 ofical 1 ayudante, 1 Boal y 1 vigilante.

to de obra,

Parque 19-059. Profesional Amb y SST: Se realizo recorrido de obra donde se evidencio 1 operador "Pajarita" - 1 ayudante - 1 ofical Se realizo verificación de cumplimiento de protocolo de bio seguridad (lavamanos portatil - jabón - canecas - señalización) así como uso permanente de tapabocas, se realiza verificación de preoperacional de maquinaria. Sin embargo se solicito al contratista de obra la limpieza y orden aseo de zona de llegada de maquinaria., así como cubrimiento de la zona de excavación. Diana Morales V

ción

ndo modificar la nueva

2021.

1 ofical de se evidencia era 3 m³, de manera inmanera inmediata ora colindante. acopiado

Lunes 18/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista = 1 inspector, 1 social, 1 apoyo social y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 SST.
Actividades en ejecucion=
• Parque 19-475.

Personal Operativo: 1 Ayudante
Se evidencia que el contratista Consorcio Oporto continua realizando la actividad de excavacion manual en el area del sendero peatonal.
Parque 19-316.:
Personal operativo = 1 Ayudante y 1 oficial
Se evidencia que el contratista esta ejecutando actividades sin ser aprobadas por la interventoria, ya que el consorcio Oporto presento una nueva implantacion, sin concepto tecnico del especialista geotecnico, se le solicita parar actividades de forma inmediata, ya que cualquier reproceso corre a cuenta propia del contratista consorcio oporto por no acatar las especificaciones de diseño.
Parque 19-079=
Personal operativo = 1 oficial, 4 ayudantes y 1 un operario de retro excavadora.
Se evidencia que el contratista Consorcio Oporto continua realizando la actividad de excavacion mecanica de 0,70 m de profundidad.
Parque 19-368 y Parque 19-056: No se evidencian actividades en ejecucion
19-01-2021 Se realiza recorrido de obra en el parque 19-079 se solicita el retiro del material de la excavacion - y se verifica el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en la desinfeccion de prendas y toma de temperatura y no se reporta estado de salud para reportar en este parque 19-079 hasp 351 Interventoria Arquitectura Urbana

Jueves 21 - 01 - 2021
Clima Soleado: Mañana: Soleado tarde

Personal de contratista : 1 residente apoyo, 1 inspector sst
Personal interventoria: 1 residente de Obra ; 2 inspectores de obra
herramienta menor : menor

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

PARQUE (19 - 079)

PERSONAL OPERATIVO : 1 Encargado, 1 oficial, 3 ayudantes

El dia 20 de enero se definieron unos cambios por parte del contratista y la interventoria con respecto a la ejecución de la implantación aprobada por motivos de la pendiente sobre el terreno natural plasmado en el grafico de folio N° 27 dode se defina una rampa con doble pendiente desde el nivel de rasante hasta el nivel de llegado a adoquin de concreto con una pendiente de 14% en una longitud de 3,05 ml se defino realizar al costado derecho una instalacion de bordillo A-80 doble para confinar areas independientes ; al igual en el acceso al sendero peatonal se defino cambiar el sardinel generando bajo rampas con dos hombros.

Detalle rampa acceso parque 19-079

Con respecto al avance de obra se finaliza la excavación mecanica la perfilación de la caja a nivel de sub rasante el dia al dia de hoy se inicia la actividad de conformación de nivel de rajon y se termina la actividad de compactación de fondo con canguro

19 -(368)

Se continua con las actividades de excavación manual encontrando la procedencia de las raices para la actividad de nivelación de pasos de adoquin donde el dia sabado 16 de enero se genera una ruptura de tuberia de 3/4" de gas natural donde se atendio y se subsano; se adjunta reporte en el folio N°28; el dia de hoy se ejecutan actividades de corte de raiz en parque para posteriormente conformar estructura.

vanti

Infor

Fecha: 18 | 01 | 2023 No. 186649

Solicitada y/o informada por: Cliente ☐ Entidades de apoyo ☐ CCAU ☐ Dependencias de GNF ☐ Terceros ☐ Prevención de daños ☐ Otros ☐

Pasos para estar segu


1. Antes de empezar a
de las redes de gas y p
previo al teléfono 164.
2. Tenga identificada la
manuales.

PARQUE 19-079 (DESARROLLO SIERRA MORENA)
SE OBSERVA ANOTACIÓN EN LIBRO DE OBRA REFERENTE A ACCESO PARQUE CODIGO 19-079. POR COSTADO SUR OCCIDENTAL. ELABORADA POR CONSORCIO OPORTO, LA INTERVENTORIA MANIFIESTA SE REUNIO CON EL INGENIERO NELSON HUERTAS. INSPECTOR OBRA CONSORCIO OPORTO, EN DONDE SE SOLICITO PROPUESTA ESQUEMA ACCESO A INTERVENCIÓN CON UNA RAMPA DE DOS PENDIENTES EN RAZON AL ENPALME DE LA VIA CON RESPECTO AL AREA DE INTERVENCION; PROPUESTA QUE FUE ENTREGADA Y ANEXADA A LIBRO DE OBRA EN FOLIO NUMERO VENTISIETE (27) Y LA CUAL NO CUMPLE LAS PENDIENTES REQUERIDAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ——— o ———
EN VISTA DE LO ANTERIOR SE SOLICITA AL CONSORCIO OPORTO LA ENTREGA DE PROPUESTA ACCESIBILIDAD (RAMPA) DEL PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA CODIGO 19-079 CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NTC 6047

FERNANDO AGUIRRE
RESIDENTE INTERVENTORIA

Parque 19-079 (Desarrollo Sierra morena)

Se aclara con residente de interventoria Fernando Aguirre que para que la rampa cumpla con el porcentaje minimo se ampliara la longitud de la pendiente de 3,05 a 4,0 ml Segun la propuesta implantada en el folio 027 costado Inferior.

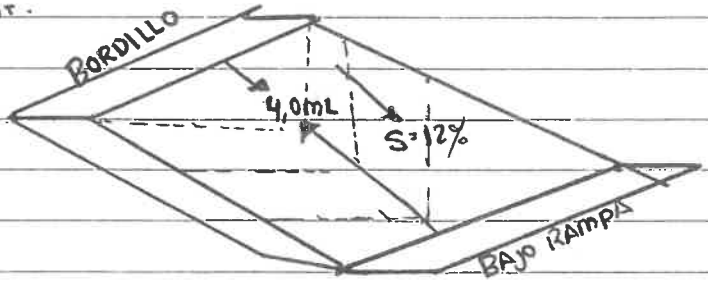

Ing. Res Obra.

	Viernes 22/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleada
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-475	continua excavacion manual
19-368	Se instala malla electrosoldada de 15x15 cal. 5mm y
	Se realizo fundida de placa contrapiso 3000psi
19-316	No se evidencian actividades en ejecucion
19-056	No se evidencian actividades en ejecucion
19-079	Relleno con piedra pajon
	Sabado 23/01/2021
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-475	Inicia compactacion de fondo de excavacion
19-368	Se realizan dilataciones al concreto e=2cm
19-316	Inician instalacion de bordillo A-80.
19-056	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-079	continuan con el relleno con piedra pajon
	Lunes 25/01/2021
	Clima: Mañana. lluvia leve; Tarde: Nublado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1
	apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-475	No se evidencian actividades en ejecucion
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion
19-316	Continua la instalacion de bordillo A-80
19-056	No se evidencian actividades en ejecucion
19-079	No se evidencian actividades en ejecucion

19-475
19-368
19-316
19-056
19-079

Martes 26/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo, sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-975 inicia instalacion de geotextil T2100 y relleno con material granular B-900.
19-368 No se evidencian actividades en ejecucion.
19-316 Continua la instalacion de Bordillo A-80.
19-056 No se evidencian actividades en ejecucion.
19-079 No se evidencian actividades en ejecucion.

Miercoles 27/01/2021.
Clima: Mañana: Soleado. Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 Topografo y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 Topografo
Actividades en ejecucion: // //

Jueves 28/01/2021
Clima: Mañana: Soleado, Tarde Soleado
Personal de contratista: 1 residente, 1 inspector, 1 inspectorsst
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores.
Actividades en ejecución
Parque 479: Se libera por parte de interventoria area de excavación a nivel de sub rasante; Se inicia extendido de geotextil y sub base granular.

Parque 19-316
1 oficial y 1 ayudante realiza relleno de material subbase granular (B400)
Se le recomienda al contratista de obra realizar el filtro en mallas

de acuerdo a la implantacion modificada de acuerdo a lo solicitado por la interventoria mediante oficio radicado (AU-interv-FDLCB-CIN-UO6-20[illegible] OF-457) y resolvido por el contratista de obras mediante OFICIO comunicado 2020-370.

Parque 475:
personal operativo: 1 oficial 2 ayudantes realizan instalacion de bordillo A-80.
se le recomienda al contratista realizar la implantacion de acuerdo al plano aprobado garantizando el area de seguridad de cada sitio.

Viernes 29/01/2021
Clima.: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-475 Se evidencia la instalacion de bordillo A-80
Personal operativo: 1 oficial y 2 Ayudantes
19-368 No se evidencian actividades en ejecucion.
19-316 Se evidencia excavacion manual para Filtro Frances instalacion de bordillo A-80 y relleno de material granular B-400 Se le recomienda al contratista realizar el filtro Frances en la ubicacion aprobada en la implantacion radicada en el comunicado 2020-370.
19-056 No se evidencian actividades en ejecucion
19-079 Se evidencia el tendido de material granular B-200.

Sabado 30/01/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

19-475
19-368
19-316
19-056
19-077

a lo solicitado		Actividades en ejecucion.
12CD-CIN-U06-2019	19-475	Continua la instalacion de bordillos A-80.
te OFICIO	19-368	No se evidencian actividades en ejecucion.
	19-316	Continua relleno de material granular B-900.
		Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante.
	19-056	No se evidencian actividades en ejecucion.
nstalacion	19-077	No se evidencian actividades en ejecucion.
ueron de		Lunes 01/02/2021
ridad de		Personal del contratista: 1 inspector y 1 Apoyo sst.
		Personal de interventoria: 2 inspectores
		Clima: Mañana: Nublado. Tarde:
		Actividades en ejecucion.
1 apoyo sst.		
2 inspectores		
A-80		
tes		
ion.		
Francos		
material		
contratista		
n aprobada		
unicado		
ejecucion		
anular		
apoyo sst.		
2 inspectores		

ANEXO No. 9
CONTROL Y SEGUIMIENTO A PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA /CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.405 DE 2019

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 405 DE 2019
FECHA: ENERO DEL 2021

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	PORCENTAJE DEDICACIÓN	EXAMEN OCUPACIONAL	FECHA ÚLTIMO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	Hernando Daza Berrio	18.939.069	Director de Interventoría	Positiva	Compensar	COLPENSIONES	50%	SI	23/01/2021
2	María Carolina Ruiz Sierra	20.739.707	Coordinadora de Interventoria	Positiva	Sanitas	colfondos	-	SI	17/01/2021
3	Fernando Aguirre Medina	7.182.768	Residente Tecnico de Interventoria	Positiva	Colpensiones	Colfondos	100%	SI	17/01/2021
4	Diana Catherine Morales Velásquez	1.026.572.178	Residente Seguridad y Salud en el Trabajo	Positiva	Famisanar	Porvenir	40%	SI	23/01/2021
5	Diana Catherine Morales Velásquez	1.026.572.178	Residente Ambiental	Positiva	Famisanar	Porvenir	30%	SI	23/01/2021
6	Liliana Celis Ruiz	52.386.191	Residente Social	Positiva	Compensar	Colfondos	50%	SI	23/01/2021
7	Juan Carlos Briceño	749.389.138	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Positiva	Salud Total	COLPENSIONES	-	SI	23/01/2021
8	Javier Antonio Millán López	79.345.746	Especialista Geotecnia	Colmena	Famisanar	Colfondos	30%	SI	20/01/2021
9	Jose Abelino Vargas Tenjo	1.057.463.178	Inspector	Positiva	Medimas	Colfondos	-	SI	17/01/2021
10	Katty Andrea Farfán Arias	1.031.146.000	Tópografo Inspector - Laboratorista Inspector	Positiva	Nueva EPS	COLPENSIONES	-	SI	23/01/2021
11	Carmen Alicia Valencia Sierra	49.691.881	Secretaria	Positiva	Aliansalud	COLPENSIONES	-	SI	17/01/2021
12	Carlos Domingo Perez	73.189.607	Contador	Colpatria	Sanitas	Protección	-	SI	17/01/2021
13	Luis Javier Rojas Jején	1.018.480.030	Especialista de transito	Sura	Sanitas	Porvenir	20%	SI	17/01/2021
14	Daniel Felipe Gomez Aldana	1.018.480.030	Inspector	Positiva	Famisanar	Porvenir	-	SI	17/01/2021

"Dentro de los procesos de licitación Pública y concursos de Méritos, tener un trato preferencial con las personas discapacitadas así: "En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema preferencial con personas con discapacidad, la entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal, de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificara el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el ministerio de trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección".

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, presenta la documentación del personal con discapacidad siendo: certificado de vinculación del trabajador con discapacidad, el formato de constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad emitida por la entidad MINISTERIO DE TRABAJO, y el soporte de seguridad social del trabajador con discapacidad: del señor HERNANDO DAZA BERRIO identificado con cedula de ciudadanía No. 18939069 de Agustín Codazzi.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901029778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AURBANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 38 B 12 OFICINA 301	TELÉFONO:	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7776940150	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/01/12	NUMERO AUTORIZACIÓN			858242884

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416,100	$ 0	$ 416,100
230301	230301-PORVENIR	2	$ 608,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608,000	$ 0	$ 608,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 828,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828,500	$ 0	$ 828,500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 594,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594,700	$ 0	$ 594,700
SUBTOTALES:										$ 2,447,300	$ 0	$ 2,447,300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124,100	$ 0	$ 0	$ 124,100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 238,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238,700	$ 0	$ 0	$ 238,700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154,000	$ 0	$ 0	$ 154,000
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 60,000
SUBTOTALES:													$ 612,000	$ 0	$ 0	$ 612,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 567,300	$ 567,300	$ 0	$ 0	$ 567,300
SUBTOTALES:									$ 567,300	$ 0	$ 0	$ 567,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	9	$ 582,300	$ 0	$ 582,300
SUBTOTALES:			$ 582,300	$ 0	$ 582,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA ING	NOVEDADES RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003038476	VALENCIA SOTO LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI																
2	CC 1015408024	CARDENAS MORENO DAYAN KARINE	DEPEND		$ 3,000,000	FIJO		SI											21-30					
3	CC 1015408024	CARDENAS MORENO DAYAN KARINE	DEPEND		$ 3,000,000	FIJO		SI																
4	CC 1018480030	GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO		SI																
5	CC 1019071786	GOYENECH E MOLINA ADRIANA	DEPEND		$ 1,500,000	FIJO		SI																
6	CC 1024557664	WILCHES CASTIBLANCO ANGIE TATIANA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 4,600	30	$ 877,803	CCF24-COMPENSAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	231001-COLFONDOS	10	$ 666,667	$ 106,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106,700	EPS017-FAMISANAR	10	$ 666,667	$ 26,700	$ 26,700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 666,667		$ 310	10	$ 666,667	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	231001-COLFONDOS	20	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS017-FAMISANAR	20	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 2,000,000		$ 139,200	20	$ 2,000,000	CCF24-COMPENSAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 72,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,800,000		$ 125,300	30	$ 1,800,000	CCF24-COMPENSAR	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000		$ 7,900	30	$ 1,500,000	CCF24-COMPENSAR	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	CCF24-COMPENSAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901022778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AURBANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLI 38 8 12 OFICINA 301	TELÉFONO:	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.	7776940150	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES enero AÑO 2021				
DÍAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).	2021/01/12	NUMERO AUTORIZACIÓN	858242884				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																				PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RESIDENTE	RESIDENTE EN ZONA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 17324571	BARRERO BENAVIDES NELSON MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI		24															25-14 COLPENSIONES	24	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 2.800.000		$ 24.194.900	24	$ 2.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 20739707	RUIZ SIERRA MARIA CAROLINA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI		09															231001-COLFONDOS	9	$ 1.050.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 42.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 1.050.000		$ 5.500	9	$ 1.050.000	CCF24-COMPENSAR	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 49691881	VALENCIA SIERRA CARMEN ALICIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80928100	ZAMBRANO PEREZ EYSON FERNANDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	28	$ 1.026.667	$ 164.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.300	EPS008-COMPENSAR	28	$ 1.026.667	$ 41.100	$ 0	$ 41.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.026.667		$ 7.150	28	$ 1.026.667	CCF24-COMPENSAR	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80928100	ZAMBRANO PEREZ EYSON FERNANDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI												15-16					230201-PROTECCION	2	$ 73.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.800	EPS008-COMPENSAR	2	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 73.334		$ 0	2	$ 73.334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 4.208.900**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830098495
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARQUITECTURA URBANA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 38 NO. 6-12 OFC. 301	TELÉFONO:	7053570
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7776967393	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero AÑO	2021
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/01/13	NUMERO AUTORIZACIÓN			859293808

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.288.000	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 2.375.000	$ 0	$ 2.375.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.000	$ 0	$ 672.000
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.201.100	$ 0	$ 1.201.100
SUBTOTALES:										$ 4.248.100	$ 0	$ 4.248.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 468.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.000	$ 0	$ 0	$ 468.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0	1	$ 0	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 268.300
SUBTOTALES:													$ 1.040.300	$ 0	$ 0	$ 1.040.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.053.600	$ 1.053.600	$ 0	$ 0	$ 1.053.600
SUBTOTALES:									$ 1.053.600	$ 0	$ 0	$ 1.053.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 927.200	$ 0	$ 927.200
SUBTOTALES:			$ 927.200	$ 0	$ 927.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																							PENSIÓN							SALUD																														
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1026572178	MORALES VELASQUEZ, DIANA CATHERINE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1031146000	FARFAN ARIAS KATY ANDREA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	1742101	$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1057463178	VARGAS TENJO JOSE ABELINO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI												22-23					231001-COLFONDOS	2	$ 120.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 19.200	EPS044-MEDIMÁS	2	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 4.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 120.000		$ 0	2	$ 120.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057463178	VARGAS TENJO JOSE ABELINO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	28	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800	EPS044-MEDIMÁS	28	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 67.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.680.000		$ 117.000	28	$ 1.680.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 18939069	DAZA BERRIO HERNANDO	DEPEND		$ 8.700.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.700.000	$ 1.392.000	$ 43.500	$ 43.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.479.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 8.700.000	$ 348.000	$ 0	$ 348.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.700.000		$ 605.800	30	$ 8.700.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 33379020	SILVA MARTINEZ NANCY FABIOLA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI		29											01-29				231001-COLFONDOS	29	$ 2.706.667	$ 433.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 433.100	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2.706.667	$ 108.300	$ 0	$ 108.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.706.667		$ 0	29	$ 2.706.667	SCCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Para mi Pc

SOI

953

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830058495
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARQUITECTURA URBANA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 38 NO. 8-12 OFC. 301	TELÉFONO:	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7776967393	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero AÑO	2021
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/01/13	NUMERO AUTORIZACIÓN			859293806

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 52386191	CELIS RUIZ LILIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 3,000,000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3,000,000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700			SCCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52796082	VALDERRAMA CARREÑO OLGA MARIA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,700,000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000		$ 8.900			SCCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 71827684	AGUIRRE MEDINA FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	1742101	$ 10.500			SCCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79388138	BRICEÑO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,600,000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400			SCCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 7.269.200**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

95A

44
955

ANEXO 2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

290
956

CONSORCIO OPORTO			CONTROL DE PERSONAL							
No	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	AFP	EPS	ARL	EMO		INGRESO
								FECHA	CONCEPTO	
NUEVOS										
1	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	LURDIS LISNAR LEAL GOMEZ	8,24322E+19	AYUDANTE	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA	19/01/2021	PISO	ENERO
2	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANSELMO MANUEL GOMEZ JIMENEZ	72312880	AYUDANTE	COLFONDOS	SALUD TOTAL	SURA	19/01/2021	PISO	ENERO
3	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	YERFREDI WILLIAM AMARANTO TABORDA	1013626891	OFICIAL	COLFONDOS	SALUD TOTAL	SURA	19/01/2021	PISO	ENERO
4	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	LEWIS ANDRES CONTRERAS ACOSTA	9,56773E+19	OFICIAL	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	19/01/2021	PISO	ENERO
5	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	RUBEN DARIO AMARANTO PRENTT	8748953	OFICIAL	PROTECCION	FAMISANAR	SURA	19/01/2021	PISO	ENERO
6	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	JOHAN ANDRES CABEZAS BATIOJA	1004636313	AYUDANTE	PROTECCION	FAMISANAR	SURA	19/01/2021	PISO	ENERO
7	MPG SOLUCIONES S.A.S	MILTON JAVIER RAMIREZ BUSTOS	1003777147	OPERARIO	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	27/07/2020	PISO	ENERO
8	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CRISTIAN CAMILO CAMACHO MARTINEZ	1.007.468.253	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	16/11/2020	PISO	ENERO
9	JACARD	JHONNY JAIME FINO VIVAS	13892073	OFICIAL	PROTECCION	NUEVA EPS	SURA	11/08/2020	PISO	ENERO
10	JACARD	WILLIAM CAVIEDEZ MUÑOZ	1.022.410.556	OFICIAL	COLFONDOS	COOMEVA	SURA	21/09/2020	PISO	ENERO
11	SERVITRANSPORTES	ORLANDO MURCIA PUGA	79.902.268	CONDUCTOR LISC745	PORVENIR	FAMISANAR	EQUIDAD	11/11/2020	PISO	ENERO
12	JOSE SANTOS	DIONICIO JOSE OTERO CONTRERAS	15044198	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	POSITIVA	04/01/2021	PISO	ENERO
13	JOSE SANTOS	FREDDYS MAVAS NAVARRO	1.022.296.714	AYUDANTE	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA	04/01/2021	PISO	ENERO
14	JOSE SANTOS	JEISON BEDOYA VILLADIEGO	1.085.038.745	OFICIAL	PORVENIR	FAMISANAR	POSITIVA	04/01/2021	PISO	ENERO
15	OPORTO	JINET MELISSA MEVA MELO	1.012.374.654	APOYO SOCIAL	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA	05/01/2021	PISO	ENERO
16	OPORTO	NELSON ENRIQUE HUERTAS RODRIGUEZ	1018459532	APOYO RESIDENCIA	PROTECCION	FAMISANAR	SURA	05/01/2021	PISO	ENERO
17	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	WENCESLAO RAMIREZ CUBILLOS	1024467915	OPERARIO	PROTECCION	FAMISANATR	POSITIVA	11/08/2020	PISO	ENERO
18	JACARD	JOSE HUMBERTO ROMERO MORENO	1.033797.762	AYUDANTE	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA	26/01/2020	PISO	ENERO
19	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	JAM KARLO ANGULO PENILLA	1099551662	AYUDANTE	PORVENIR	SANITAS	SURA	12/01/2021	PISO	ENERO
20	MANOS ALA OBRA JC S.A.S	HECTOR VELEZ GUTIERREZ	1117233931	AYUDANTE	PROTECCION	FAMISANAR	COLPATRIA	12/01/2021	PISO	ENERO
21	COMERCIO OPORTO	HEYBER JEFFERSON GUERRERO BOYACA	1026281608	BOAL	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	13/01/2021	PISO	ENERO
22	MANOS ALA OBRA JC S.A.S	JOSE HECTOR CALDERON ROMERO	93286647	OFICIAL	COLFONDOS	SANITAS	COLPATRIA	12/01/2021	PISO	ENERO
23	MANOS ALA OBRA JC S.A.S	JAMUARIO ALFONSO ARBOLEDA USUGA	1132794088	AYUDANTE	PROTECCION	FAMISANAR	COLPATRIA	12/01/2021	PISO	ENERO
24	MANOS ALA OBRA JC S.A.S	RODOLFO MENZA RODRIGUEZ	1075303318	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	COLPATRIA	12/01/2021	PISO	ENERO
25	MANOS ALA OBRA JC S.A.S	RODOLFO MENZA HERNANDEZ	7696144	AYUDANTE	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COLPATRIA	12/01/2021	PISO	ENERO
26	JACARD	HERNANDO SOTO	80.353853	AYUDANTE	PROTECCION	MEDIMAS EPS	SURA	30/09/2020	PISO	ENERO
27	JOSE SANTOS	JOSE DE LOS SANTOS URIETA MENDEZ	80353853	OFICIAL	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA	04/01/2021	PISO	ENERO
28	JOSE SANTOS	JAIME ALFONSO SANABRIA ROMERO	73433659	OFICIAL	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA	05/01/2021	PISO	ENERO
29	JOSE SANTOS	ROBERTO CARLOS SEGURA OJEDA	1.070.806.410	OFICIAL	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA	05/01/2021	PISO	ENERO
30	JOSE SANTOS	BENGLEIT CARDENALES MEDRANO	15029230	AYUDANTE	PROTECCION	FAMISANAR	POSITIVA	05/01/2021	PISO	ENERO
31	JOSE SANTOS	OSCAR ALVAREZ ROMAN	1103111411	AYUDANTE	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA	05/01/2021	PISO	ENERO
32	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	CARLOS AUGUSTO VARGAS SIERRA	1032494834	VIGILANCIA	COLFONDOS	SANITAS	COLPATRIA	25/01/2021	PISO	ENERO
33	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	ANDRES MANUEL CUADRADO	10879680	AYUDANTE	COLFONDOS	SALUD TOTAL	COLPATRIA	18/01/2020	PISO	ENERO
ANTIGUOS										
1	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	FAUSTINO SOLER ESPITIA	4290600	VIGILANCIA	COLPENSIONES	FAMISANAT	COLPATRIA	20/02/2020	PISO	DICIEMBRE
2	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	JOSUE ORLANDO HERRERA ACEVEDO	74183771	VIGILANCIA	PORVENIR	SANITAS	COLPATRIA	12/11/2020	PISO	DICIEMBRE
3	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	JUAN PABLO ORTIZ AYALA	1000083441	VIGILANCIA	PROTECCION	NUEVA EPS	COLPATRIA	12/11/2020	PISO	DICIEMBRE
4	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	NELSON HUGO OSMA	9229305	VIGILANCIA	COLPENSIONES	COMPENSAR	COLPATRIA	06/11/2020	PISO	DICIEMBRE
5	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	KEVIN EDUARDO DIAZ RIVEROS	1000137161	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	10/11/2020	PISO	DICIEMBRE
6	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	JUAN ALEXANDER VELEX PEREZ	7255355	AYUDANTE	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	28/11/2020	PISO	DICIEMBRE
7	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	NELSON RAFAEL GARCIA CASTELLANOS	7312115	VIBROCOMPACTADOR	COLPENSIONES	COMPENSAR	POSITIVA	19/02/2020	PISO	SEPTIEMBRE
8	OPORTO	ROBINSON GERMAN MOVA JEREZ	1054091050	ESP. GEOTECNIA	PORVENIR	SANITAS	SURA	23/10/2020	PISO	NOVIEMBRE
9	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	HERNAN DE JESUS RESTREPO CARDOZO	91132085	AYUDANTE	COLPENSIONES	FAMISANAR	POSITIVA	15/10/2020	PISO	NOVIEMBRE
10	JACARD	HIPOLITO FINO PACHECO	13615629	AYUDANTE	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	25/11/2020	PISO	NOVIEMBRE
11	SERVITRANSPORTES	RONALD ANDREY MUÑOZ ROJAS	1031159858	CONDUCTOR TFK516	COLPENSIONES	COMPENSAR	POSITIVA	05/10/2020	PISO	NOVIEMBRE
12	ANDINA JUEGOS Y PARQUES	SARA LILIANA RODRIGUEZ	52487763	SECRETARIA	COLPENSIONES	COMPENSAR	BOLIVAR	29/09/2020	PISO	OCTUBRE
13	OPORTO	MARYI ROCIO MORA CAMPOS	65753676	CONTADORA	COLPENSIONES	COMPENSAR	SURA	29/09/2020	PISO	OCTUBRE
14	OPORTO	CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS	1019108010	TOPOGRAFO	PROTECCION	FAMISANAR	SURA	23/01/2020	PISO	OCTUBRE
15	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	JIM ALEXANDER ANGULO SANCHEZ	91133109	OFICIAL	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA	10/07/2020	PISO	OCTUBRE
16	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	FRAYER JESUS MERCADO RONDON	8,13189E+14	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	POSITIVA	14/08/2020	PISO	OCTUBRE
17	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	OSNEIDER JAVIER HERRERA OLEA	1067945052	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	POSITIVA	26/11/2019	ALTURAS	OCTUBRE
18	LABORATORISTA	FABIO EDUARDO PIRACOCA MAÑO	80012679	LABORATORISTA	PROTECCION	FAMISANAR	EQUIDAD	09/10/2020	PISO	OCTUBRE
19	ANDINA JUEGOS Y PARQUES	SAMUEL DAVID SANTANA LOPEZ	1065870355	INSTALADOR	COLFONDOS	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	25/09/2020	PISO	SEPTIEMBRE
20	OPORTO	JAIRO ALBERTO CARDENAS CARDONA	70728180	INSPECTOR	PROTECCION	NUEVA EPS	SURA	21/09/2020	ALTURAS	SEPTIEMBRE
21	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	JAVIER ALEXANDER BELTRAN FLOREZ	79995587	OFICIAL	PROTECCION	FAMISANAR	SURA	28/09/2020	OFICIAL	SEPTIEMBRE
22	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	EVELIO RODRIGUEZ ARCHILA	91437461	OFICIAL	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	28/09/2020	PISO	SEPTIEMBRE
23	JACARD	LUIS HERNANDO CAVIEDEZ MUÑOZ	1005620183	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	28/09/2020	PISO	SEPTIEMBRE
24	JACARD	SAMUEL OLAYA TORRES	6019159	OFICIAL	PORVENIR	COMPENSAR	SURA	16/03/2020	PISO	SEPTIEMBRE
25	JACARD	LUIS EVELIO SANCHEZ CARDENAS	80878419	AYUDANTE	PROTECCION	COOMEVA	SURA	26/05/2020	ALTURAS	SEPTIEMBRE
26	JACARD	CELIMO FERNANDO CAVIEDES MUÑOZ	1117814376	AYUDANTE	PROTECCION	SALUD TOTAL	SURA	09/06/2020	PISO	SEPTIEMBRE
27	JACARD	JOSE FERNANDO DIAZ CUMDEZ	80434676	AYUDANTE	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA	02/07/2020	PISO	SEPTIEMBRE
28	OPORTO	CRISTIAN DAVID DIAZ GONZALEZ	1018460149	RESIDENTE DE OBRA	PROTECCION	SURA	SURA	22/02/2020	PISO	SEPTIEMBRE
29	OPORTO	ERNESTO RAFAEL DIAZ ERAZO	73155017	DIR. OBRA	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	2/26/2020	PISO	SEPTIEMBRE
30	OPORTO	LADY ANDREA GIRALDO ORTEGA	53049708	R. SISOMA	COLFONDOS	FAMISANAR	SURA	02/07/2020	PISO	SEPTIEMBRE
31	OPORTO	MONICA ROCIO MUÑOZ HERNANDEZ	52393006	SOCIAL	PORVENIR	SURA	POSITIVA	2/27/2020	PISO	SEPTIEMBRE
32	OPORTO	ANGELA JULIETH GUTIERREZ VARGAS	1069740197	APOYO SSTMA	COLPENSIONES	FAMISANAR	COLPATRIA	06/08/2020	PISO	SEPTIEMBRE
33	OPORTO	LEONARDO CONTRERAS ZARTHA	1013668833	APOY INGENIERIA	COLPENSIONES	SANITAS	POSITIVA	22/02/2020	PISO	SEPTIEMBRE
34	OPORTO	DAVID FELIPE CARDONA GALEANO	1012422954	CONDUCTOR	COLPENSIONES	COMPENSAR	SURA	14/09/2020	PISO	SEPTIEMBRE
35	ANDINA JUEGOS Y PARQUES	DIOGENES MORENO RUBIANO	80264478	AYUDANTE	PORVENIR	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	30/03/2020	PISO	SEPTIEMBRE
36	ANDINA JUEGOS Y PARQUES	HENRY SILVA PINZON	19376960	OPERARIO	PROTECCION	COMPENSAR	POSITIVA	26/11/2019	PISO	SEPTIEMBRE
37	ANDINA JUEGOS Y PARQUES	RONALDO RIVERA MALDONADO	1012450951	CADENEROS	PORVENIR	FAMISANAR	SEGUROS BOLIVAR	23/09/2019	ALTURAS	SEPTIEMBRE
38	ANDINA JUEGOS Y PARQUES	NEY SANTANA ARRIETA	73050088	OPERARIO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	23/06/2020	PISO	SEPTIEMBRE
RETIRADOS										
1	OPORTO	DANIELA LOPEZ GOMEZ	1010220138	APOY INGENIERIA	COLFONDOS	COMPENSAR	SURA	22/02/2020	PISO	SEPTIEMBRE
2	OPORTO	MARIBEL SUAREZ MORENO	10136441189	BOAL	PROTECCION	FAMISANAR	SURA	04/01/2021	PISO	ENERO
3	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	BRAYAN DAVITH BERDUGO BARRIOS	1065134947	VIGILANCIA	PROTECCION	FAMISANAR	COLPATRIA	12/11/2020	PISO	DICIEMBRE
4	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA	CARLOS ADUARDO FERNANDEZ ARIAS	8055083150219666	VIGILANCIA	PORVENIR	COMPENSAR	COLPATRIA	20/02/2020	PISO	DICIEMBRE
5	OPORTO	CARLOS ANDRES DIAZ GONZALES	1022949654	BOAL	COLFONDOS	SALUD TOTAL	SURA	30/12/2021	PISO	ENERO
6	RAMON VISAI	MARLON PEREZ ZABALETA	9154857	CONDUCTOR TLM255	COLPENSIONES	FAMISANAR	POSITIVA	10/06/2020	PISO	OCTUBRE
7	RAMON VISAI	MARCO AUGUSTO MORENO GARZON	79396968	CONDUCTOR SROS01	PORVENIR	COMPENSAR	POSITIVA	23/09/2020	PISO	OCTUBRE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19403069		QUINTERO CAICEDO RAMON VISAI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARROS	Cra 69C N 64 F - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2404160	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	873931754	9415480573	N	2021/01/19	2021/01/28	BANCOLOMBIA	9	$253,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vip	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARROS (2 Afiliados)																							$819,291	$131,100			$819,291	$32,800			$819,291	$32,800			$819,291	$57,000		$0	$0		$253,700
Centro de Trabajo: CARROS (2 Afiliados)																							$819,291	$131,100			$819,291	$32,800			$819,291	$32,800			$819,291	$57,000		$0	$0		$253,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$819,291	$131,100			$819,291	$32,800			$819,291	$32,800			$819,291	$57,000		$0	$0		$253,700
1	CC	79396968	MORENO MARCO	X							A										230301	12	($351,126)	($56,200)	EPS008	12	($351,126)	($14,100)	CCF24	12	($351,126)	($14,100)	14-23	12	($351,126)	($24,500)	12	$0	$0	SI	($108,900)
2	CC	79396968	MORENO MARCO								C										230301	30	$877,813	$140,500	EPS008	30	$877,813	$35,200	CCF24	30	$877,813	$35,200	14-23	30	$877,813	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
3	CC	9154857	PEREZ MARLON	X							A										25-14	5	($146,303)	($23,500)	EPS017	5	($146,303)	($5,900)	CCF24	5	($146,303)	($5,900)	14-23	5	($146,303)	($10,200)	5	$0	$0	SI	($45,500)
4	CC	9154857	PEREZ MARLON	X							C										25-14	15	$438,907	$70,300	EPS017	15	$438,907	$17,600	CCF24	15	$438,907	$17,600	14-23	15	$438,907	$30,600	15	$0	$0	SI	$136,100
Total Afiliados(2)																							$819,291	$131,100			$819,291	$32,800			$819,291	$32,800			$819,291	$57,000		$0	$0		$253,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19403069		QUINTERO CAICEDO RAMON VISAI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARROS	Cra 69C N 64 F - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2404160	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	873931754	9415480573	N	2021/01/19	2021/01/28	BANCOLOMBIA	9	$253,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$131,100	$0	$0	$131,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$46,800	$0	$0	$46,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$84,300	$0	$0	$84,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$57,000	$0	$0	$57,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$32,800	$0	$0	$32,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$32,800	$0	$0	$32,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$32,800	$0	$0	$32,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$21,100	$0	$0	$21,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$11,700	$0	$0	$11,700
TOTAL				2	$253,700	$0	$0	$253,700

2021/01/27 06:33 PM

951

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901058644	4	SOPORTEMASPORTTEL NUEVE FERNANDEZ SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 60 T 15 INT 1 AP 401	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4009477	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-12	2021-01	9[illegible]3	941495[illegible]	E	2021/01/16	2021/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$[illegible]

LIQUIDACION DIFTALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]																					
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$35,100			$877,803	$35,300			$877,803	$61,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$35,100			$877,803	$35,300			$877,803	$61,400		$0	$0
1	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$877,803	$140,500	[illegible]	30	$877,803	$35,100	[illegible]	30	$877,803	$35,300	[illegible]	30	$877,803	$61,400	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$877,803	$140,500			$877,803	$35,100			$877,803	$35,300			$877,803	$61,400		$0	$0

2021/01/22 03:00 PM

858

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901098484	4	SERVITRANSPORTES RUIZ PERMANDEZ SAS	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 80 S 25 INT 1 AP 401	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4057677	V

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	9210037210564841	941460850	E	2021-01-26	2021-01-22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$371,000

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	DIAS/HORAS	VALOR COTIZACION	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,100	$0	$0	$61,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$61,100	$0	$0	$61,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
CAFAM	CCF21	860.013.570	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				1	$371,000	$0	$0	$371,000

2021/01/22 03:00 PM

456

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901106731-0	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S&S SAS	CRA 45 No. 22 -05	3153390362	ccmjrsan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SAN CRISTOBAL / OBRA 3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	06/01/2021	47773744	$5.211.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	65.700	0		0		0	0	0	0	65.700	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	37.600	0		0		0	0	0	0	37.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	140.800	0		0		0	0	0	0	140.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	247.300	0		0		0	0	0	0	247.300	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	105.500	0		0		0	0	0	0	105.500	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	21.100	0		0		0	0	0	0	21.100	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	21.100	0		0		0	0	0	0	21.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	902.300	0	0	0	0	0	0		902.300	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.273.900	0	0	0	0	0	0		1.273.900	12
231001	Colfondos	800227940-6	9.400	0	0	0	0	0	0		9.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	505.900	0	0	0	0	0	0		505.900	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.170.900				1.170.900	0	0	1.170.900			11.709	1.170.900	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	674.300	0	0	674.300	26

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901106731-0	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S&S SAS	CRA 45 No. 22 -05	3153390362	ccmjrsan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SAN CRISTOBAL / OBRA 3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	06/01/2021	47773744	$5.211.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	674.300	674.300
Pensión	4	2.691.500	2.691.500
Riesgos Laborales	1	1.170.900	1.170.900
CCF	1	674.300	674.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	5.211.000	5.211.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901106731-0	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S&S SAS		CRA 45 No. 22 -05	3153390362	ccmjrsan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SAN CRISTOBAL	OBRA 3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	06/01/2021	47773744	$5,211,000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	IRO	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001606546	RODRIGUEZ BARROSO EUDER	1	0			S		X															230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
2	CC	1024467481	SILVA RODRIGUEZ EGIDIO	1	0			S		X															25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
3	CC	1033706128	LOPEZ CARDONA JULIAN ANDRES	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
4	CC	1033765495	PINTO CASTILLO FABIO ALEXANDER	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
5	CC	1063487102	ACOSTA PERALES WILIAN	1	0			S		X															231001	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
6	CC	1067945052	HERRERA OLEA OSNEIDER JAVIER	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
7	CC	91442568	ARCINIEGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
8	CC	91478416	SANCHEZ JOSE ROMAN	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
9	CC	80139221	LEON CARVAJAL JAIME ALONSO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
10	CC	80230185	CARDONA PEREZ YONIER ARIEL	1	0			S		X															230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
11	PE	813168903011 999	MERCADO RONDON FRAYER JESUS	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
12	PE	834773421081 990	BELIBARIO RENSO ALEJANDRO DE JESUS	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
13	CC	91132095	RESTREPO CARDOZO HERNAN DE JESUS	1	0			S		X															25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
14	CC	91133109	ANGULO SANCHEZ JIM ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.755.606	280.900	0	0	0	0	EPS037	1.755.606	70.300	14-11	1.755.606	5	122.200	CCF24	1.755.606	70.300	0	0	0	0	0
15	CC	17421280	MONJE MENSA ALEXANDER	1	0			S	X																230301	263.341	42.200	0	0	0	0	EPS017	263.341	10.600	14-11	263.341	5	18.400	CCF24	263.341	10.600	0	0	0	0	0
16	CC	7312115	GARCIA CASTELLANOS NELSON RAFAEL	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
17	CC	91539810	MELO CARREÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
18	CC	91555592	RAMIREZ ZUÑIGA EBER LUIS	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
19	CC	79647807	REYES GONZALEZ PLINIO ALBERTO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
20	CC	79918203	RAMIREZ GOMEZ JULIAN YECID	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
21	CC	79045695	TAFUR VILLANUEVA LUIS HERNANDO	1	0			S	X																25-14	526.682	84.300	0	0	0	0	ESSC24	526.682	21.100	14-11	526.682	5	36.700	CCF24	526.682	21.100	0	0	0	0	0
22	CC	79449120	NUÑEZ RUIZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																25-14	702.243	112.400	0	0	0	0	EPS002	702.243	28.100	14-11	702.243	5	48.900	CCF24	702.243	28.100	0	0	0	0	0
23	CC	85162982	BAENA FLOREZ WILMAN	1	0			S	X																230301	487.422	78.800	0	0	0	0	EPS017	487.422	18.900	14-11	487.422	5	34.700	CCF24	487.422	18.900	0	0	0	0	0
24	CC	85168549	BAENA VANEGAS YONETH	1	0			S		X															25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
25	CC	1098548487	MORALES BARRIOS JOHN JADERSON	1	0			S	X																230201	526.682	84.300	0	0	0	0	EPS042	526.682	21.100	14-11	526.682	5	36.700	CCF24	526.682	21.100	0	0	0	0	0
26	CC	1115564002	GONZALEZ VELANDIA KAREN YULIETH	1	0			S	X	X															230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.521	2.400	14-11	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	21/01/2021	48071887	$131.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	17.000	0		0		0	0	0	0	17.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	67.900	0	0	0	0	0	0		67.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	8909[illegible]03790-5	29.600				29.600	0	0	29.600			296	29.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	17.000	0	0	17.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	17.000	17.000
Pensión	1	67.900	67.900
Riesgos Laborales	1	29.600	29.600
CCF	1	17.000	17.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	131.500	131.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

963

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	21/01/2021	48071887	$131.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542614	RUBIO DUQUE CRISTHIAN CAMILO	1	0			S	X	X															230301	423.979	67.900	0	0	0	0	EPS037	423.979	17.000	14-11	423.979	5	28.800	CCF24	423.979	17.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

57

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consorcio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-12	Y	12/01/2021	47908328	$495.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	495.700				495.700	0	0	495.700			4.957	495.700	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	495.700	495.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	495.700	495.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

47908328

59
495

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO		cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-12	Y	12/01/2021	47908328	$495.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013668833	CONTRERAS ZARTHA LEONARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	887.803	5	61.600		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019108010	GAMBOA CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	887.803	5	61.600		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	52393006	MUÑOZ HERNANDEZ MONICA ROCIO	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	877.803	5	61.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	53049708	GIRALDO ORTEGA LADY ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.266.680	5	88.200		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	73155017	DIAZ HERAZO ERNEBTO RAFAEL	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	3.200.000	5	222.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

59
966

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	12/01/2021	47908312	$4.107.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.400	0		0		0	0	0	0	2.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.072.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.122.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1
231001	Colfondos	800227940-8	149.900	0	0	0	0	0	0		149.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	490.600	0	0	0	0	0	0		490.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	912.100				912.100	0	0	912.100			9.121	912.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	524.400	0	0	524.400	8

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

47908312

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	12/01/2021	47908312	$4.107.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	524.400	524.400
Pensión	4	2.146.500	2.146.500
Riesgos Laborales	1	912.100	912.100
CCF	1	524.400	524.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.107.400	4.107.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	12/01/2021	47908312	$4,107,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010220138	LOPEZ GOMEZ DANIELA	1	0			S	X																231001	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS008	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
2	CC	1012419076	HURTADO TIQUE DAIRO JULIAN	1	0			S	X																231001	58,521	9,400	0	0	0	0	EPS002	58,521	2,400	14-11	58,521	5	4,100	CCF24	58,521	2,400	0	0	0	0	0
3	CC	1012422854	CARDONA GALEANO DAVID FELIPE	1	0			S																	25-14	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS008	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
4	CC	1018460149	DIAZ GONZALEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	5,000,000	800,000	0	0	25,000	25,000	EPS010	5,000,000	200,000	14-11	5,000,000	5	348,000	CCF24	5,000,000	200,000	0	0	0	0	0
5	CC	1054091050	NOVA JEREZ ROBINSON GERMAN	1	0			S																	230301	2,400,000	384,000	0	0	0	0	EPS005	2,400,000	96,000	14-11	2,400,000	5	167,100	CCF24	2,400,000	96,000	0	0	0	0	0
6	CC	51942854	ARCILA VALENZUELA SANDRA	1	0			S	X																25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	5	90,500	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
7	CC	65753878	MORA CAMPOS MARYI ROCIO	1	0			S																	25-14	887,803	142,100	0	0	0	0	EPS008	887,803	35,600	14-11	887,803	5	61,800	CCF24	887,803	35,600	0	0	0	0	0
8	CC	70726180	CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO	1	0			S																	230201	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS037	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF24	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

62

07
970

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MONICA ROCIO MUNOZ
IDENTIFICACION:	CC-52393006
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-02-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-15
FECHA DE PAGO:	2021-01-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2020-12
NUMERO PLANILLA:	19454571
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19454571
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.100	$ 61.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.400	$ 311.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES SAS	CALLE 18 SUR No. 29 D - 12	7276707	info@parquesabaco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	03/02/2021	48386164	$581.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	130.800				130.800	0	0	130.800			1.308	130.800	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	75.200	0	0	75.200	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	75.200	75.200
Pensión	2	300.500	300.500
Riesgos Laborales	1	130.800	130.800
CCF	1	75.200	75.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	581.700	581.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES SAS	CALLE 18 SUR No. 29 D - 12	7276707	info@parquesabaco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-01	2020-12	E	03/02/2021	48386164	$581.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1193225149	PEREZ MALDONADO HEIDY MICHELLE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.800	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	19376960	SILVA PINZON HENRY	1	0			S																	230201	878.000	140.500	0	0	0	0	EPS008	878.000	35.200	14-23	878.000	5	61.200	CCF24	878.000	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093077	1	GEOPAV LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEOPAV LTDA	CRA 129 No 23-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	831694902	9412905710	E	2021/01/21	2021/01/18	BANCO AV VILLAS	0	$232.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: LABORATORIO (1 Afiliados)					$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0
1	CC 80012679	PIRACOCA FABIO	230201	30	$877.803	$140.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF21	30	[illegible]	$35.200	14-29	30	[illegible]	$21.400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0

2021/01/28 08:04 AM

96

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093077	1	GEOPAV LTDA	B MENOS DE 200 COTIZANTES	GEOPAV LTDA	CRA 129 No 23-48	BOGOTA BOGOTA D.E.	2988838	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	831694902	9412905710	E	2021/01/28	2021/01/18	BANCO AV VILLAS	0	$272.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140.500	$0	$0	$140.500
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$140.500	$0	$0	$140.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21.400	$0	$0	$21.400
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830.008.686	1	1	$21.400	$0	$0	$21.400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35.200	$0	$0	$35.200
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	1	$35.200	$0	$0	$35.200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35.200	$0	$0	$35.200
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$35.200	$0	$0	$35.200
TOTAL				4	$232.300	$0	$0	$232.300

2021/01/28 08:04 AM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19530547
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-01-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901017504	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 58 A NO 87 I 20 SUR	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	SOLUCIONESINTEGRAR@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7836568
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79995587	PRIMER APELLIDO	BELTRAN	SEGUNDO APELLIDO	FLOREZ
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	ALEXANDER		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 12	Año: 2021	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$5.413.128		19530547

64
945

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1024592451	01	No	No	No	11	1	Fijo	ARDILA QUIROGA BRAYAN ESTEBAN	$877.803
CC-79995587	01	No	No	No	11	1	Fijo	BELTRAN FLOREZ JAVIER ALEXANDER	$877.803
CC-1235248910	01	No	No	No	11	1	Fijo	BRACHO ROMERO JESUS UFRACIO	$877.803
CC-1127581667	01	No	No	No	11	1	Fijo	CABALLERO VALDES YAIR ENRIQUE	$877.803
CC-1007468259	01	No	No	No	11	1	Fijo	CAMACHO MARTINEZ CRISTIAN CAMILO	$877.803
CC-1000137161	01	No	No	No	11	1	Fijo	DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO	$877.803
CC-1051356412	01	No	No	No	11	1	Fijo	ESTRADA CANTILLO MAURICIO	$877.803
CC-79935795	01	No	No	No	11	1	Fijo	FIGUEROA NARVAEZ ALVARO	$877.803
CC-73563588	01	No	No	No	11	1	Fijo	JIMENEZ NIETO ROBEIRO	$877.803
CC-6465786	01	No	No	No	11	1	Fijo	LEMUS CANO HILDEBRANDO	$877.803
CC-14251174	01	No	No	No	11	1	Fijo	PANTOJA PINZON EDGAR MIGUEL	$877.803
CC-11036221	01	No	No	No	11	1	Fijo	PETRO TORRES LEONARDO RAMON	$877.803
CC-91437461	01	No	No	No	11	1	Fijo	RODRIGUEZ ARCHILA EVELIO	$877.803
CC-1003035260	01	No	No	No	11	1	Fijo	URANGO COGOLLO YAMITH	$877.803
CC-1151471731	01	No	No	No	11	1	Fijo	VALDIRIS MARQUEZ JEAN CARLOS	$877.803
CC-7255355	01	No	No	No	11	1	Fijo	VELEZ PEREZ JUAN ALEXANDER	$877.803

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1024592451	X	2020-12-17	X	2020-12-17																									0		
CC - 79995587																													0		
CC - 1235248910	X	2020-12-18																											0		
CC - 1127581667	X	2020-12-14	X	2020-12-14																									0		
CC - 1007468259	X	2020-12-18	X	2020-12-18																									0		
CC - 1000137161	X	2020-12-08																											0		
CC - 1051356412	X	2020-12-14	X	2020-12-14																									0		
CC - 79935795	X	2020-12-14																											0		
CC - 73563588			X	2020-12-01																									0		
CC - 6465786	X	2020-12-14																											0		
CC - 14251174	X	2020-12-14																											0		
CC - 11036221	X	2020-12-15	X	2020-12-15																									0		
CC - 91437461																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1003035260	X	2020-12-15	X	2020-12-15																								0		
CC - 1151471731	X	2020-12-17	X	2020-12-17																								0		
CC - 7255355																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1024592451	PROTECCION	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 79995587	PROTECCION	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1235248910	PORVENIR	13	$380.382	0.1600000	$60.900	$0	$0	$60.900	$0	$0	$0
CC - 1127581667	PORVENIR	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 1007468259	PORVENIR	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 1000137161	PORVENIR	23	$672.983	0.1600000	$107.700	$0	$0	$107.700	$0	$0	$0
CC - 1051356412	PORVENIR	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 79935795	PORVENIR	17	$497.422	0.1600000	$79.600	$0	$0	$79.600	$0	$0	$0
CC - 73563588	PROTECCION	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 6465786	PORVENIR	17	$497.422	0.1600000	$79.600	$0	$0	$79.600	$0	$0	$0
CC - 14251174	PROTECCION	17	$497.422	0.1600000	$79.600	$0	$0	$79.600	$0	$0	$0
CC - 11036221	COLFONDOS	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 91437461	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1003035260	PORVENIR	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 1151471731	PORVENIR	1	$29.261	0.1600000	$4.700	$0	$0	$4.700	$0	$0	$0
CC - 7255355	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1024592451	COMPENSAR-EPS	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 79995587	FAMISANAR	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	7020	0.0696000	$61.100
CC - 1235248910	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$380.382	0.0400000	$15.300	$0	0	$0	0	$0	13	$380.382	7020	0.0696000	$26.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1127581667	FAMISANAR	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 1007468259	FAMISANAR	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 1000137161	FAMISANAR	23	$672.983	0.0400000	$27.000	$0	0	$0	0	$0	23	$672.983	7020	0.0696000	$46.900
CC - 1051356412	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 79935795	EPS-S MUTUAL - MOV	17	$497.422	0.0400000	$19.900	$0	0	$0	0	$0	17	$497.422	7020	0.0696000	$34.700
CC - 73563588	FAMISANAR	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 6465786	FAMISANAR	17	$497.422	0.0400000	$19.900	$0	0	$0	0	$0	17	$497.422	7020	0.0696000	$34.700
CC - 14251174	EPS SURA	17	$497.422	0.0400000	$19.900	$0	0	$0	0	$0	17	$497.422	7020	0.0696000	$34.700
CC - 11036221	SALUD TOTAL	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 91437461	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	7020	0.0696000	$61.100
CC - 1003035260	FAMISANAR	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 1151471731	FAMISANAR	1	$29.261	0.0400000	$1.200	$0	0	$0	0	$0	1	$29.261	7020	0.0696000	$2.100
CC - 7255355	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	7020	0.0696000	$61.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1024592451	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79995587	COMPENSAR-CCF	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1235248910	COMPENSAR-CCF	13	$380.382	0.0400000	$15.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127581667	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007468259	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000137161	COMPENSAR-CCF	23	$672.983	0.0400000	$27.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1051356412	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79935795	COMPENSAR-CCF	17	$497.422	0.0400000	$19.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73563588	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6465786	COMPENSAR-CCF	17	$497.422	0.0400000	$19.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14251174	COMPENSAR-CCF	17	$497.422	0.0400000	$19.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11036221	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91437461	COMPENSAR-CCF	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003035260	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1151471731	COMPENSAR-CCF	1	$29.261	0.0400000	$1.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7255355	COMPENSAR-CCF	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$4.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$4.700
PORVENIR	11	$632.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$632.300
PROTECCION	4	$229.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$229.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$85.700	$0	0	$0	0	$0	$85.700	0	$0	$0	$85.700	$0	0	$0	$0	$85.700	$0	$0	$85.700
EPS SURA	1	$19.900	$0	0	$0	0	$0	$19.900	0	$0	$0	$19.900	$0	0	$0	$0	$19.900	$0	$0	$19.900
EPS-S MUTUAL - MOV	2	$21.100	$0	0	$0	0	$0	$21.100	0	$0	$0	$21.100	$0	0	$0	$0	$21.100	$0	$0	$21.100
COMPENSAR-EPS	1	$1.200	$0	0	$0	0	$0	$1.200	0	$0	$0	$1.200	$0	0	$0	$0	$1.200	$0	$0	$1.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$1.200	$0	0	$0	0	$0	$1.200	0	$0	$0	$1.200	$0	0	$0	$0	$1.200	$0	$0	$1.200
FAMISANAR	8	$88.100	$0	0	$0	0	$0	$88.100	0	$0	$0	$88.100	$0	0	$0	$0	$88.100	$0	$0	$88.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$377.600	0	$0	$0	$377.600	0	$0	$377.600	0	$0	$0	$377.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	16	$217.200	0	$0	$217.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$217.200
PENSIONES	3	$866.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$377.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$217.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.678.500

98

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405131	0	JACARD OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	calle 48 sur # 13 D -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3719524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	854402823	9414923474	E	2021/01/12	2021/01/07	BANCOLOMBIA	0	$5,836,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	fri	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	12531687	AGUDELO HERNANDEZ LUIS EDUARDO		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$4,500
2	PE	829132905091983	BASTIDAS PEREZ JOSE EDUARDO	X																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
3	CC	80112525	BOMBITA CHACON EDGAR MANUEL	X	X																230201	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
4	CC	10728180	CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
5	CC	80500048	CASTELLANOS LOPEZ JOSE ANGEL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
6	CC	1117814376	CAVIEDES MUÑOZ CELIMO FERNANDO																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
7	CC	17774991	CAVIEDES MUÑOZ JOSE ALFREDO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
8	CC	1005620183	CAVIEDES MUÑOS LUIS HERNANDO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
9	CC	1022410556	CAVIEDES MUÑOZ WILLIAM																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
10	CC	1042968818	CERA ORTIZ LARRY JOSE	X	X																230201	1	$29,261	$4,700	EPS008	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
11	CC	1022949654	DIAZ GONZALEZ CARLOS ANDRES		X																231001	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
12	CC	80434676	DIAZ CUBIDES JOSE FERNANDO																		15-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
13	CC	1087115026	ESTACIO EDINSON																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
14	CC	13615626	FINO PACHECO HIPOLITO	X																	230301	2	$58,521	$9,400	EPS037	2	$58,521	$2,400	CCF21	2	$58,521	$2,400	14-11	2	$58,521	$4,100	2	$0	$0	SI	$18,300
15	CC	13992073	FINO VIVAS JHONN JAIME																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
16	CC	8427749	GALLARDO OLAYA OLMEDO RICARDO		X																230201	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
17	CC	9301894	GARCES MONTIEL VICTOR MANUEL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
18	CC	1079389086	GUILLOMBO RAMIREZ JHON FREDY																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
19	CC	1023013715	HERRERA SANCHEZ KEVIN CAMILO		X																231001	1	$29,261	$4,700	EPS008	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
20	CC	1107536024	HURTADO CAICEDO DAVINSON ANDRES		X																230201	1	$29,261	$4,700	EPS037	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
21	CC	80560331	MELO RODRIGUEZ WIDIN ALEXIS	X	X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
22	CC	1107044909	MONTAÑO RAMOS CRISTIAN ANDRES	X	X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS008	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
23	CC	80463629	MORA PULIDO MANUEL FERNANDO		X																230201	1	$29,261	$4,700	EPS017	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
24	CC	1033718480	MORENO TIRIA RICARDO ANDRES																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
25	CC	12143538	MOSQUERA MUÑOZ BERMANG		X																15-14	1	$29,261	$4,700	EPS016	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
26	CC	1042970332	MURILLO RODADO EMERSON RAFAEL	X	X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS008	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	SI	$9,200
27	CC	4019159	OLAYA TORRES SAMUEL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
28	PE	954144305101991	PATINO PATINO YUNIOR MARINO																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
29	CC	1033797762	ROMERO MORENO JOSE HUMBERTO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405131	0	JACARD OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	calle 48 sur # 13 D -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3719524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	854402823	9414923474	E	2021/01/12	2021/01/07	BANCOLOMBIA	0	$5,836,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$3,011,600	$0	$0	$3,011,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$290,400	$0	$0	$290,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$145,200	$0	$0	$145,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$1,428,500	$0	$0	$1,428,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$1,147,500	$0	$0	$1,147,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$1,312,400	$0	$0	$1,312,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	34	$1,312,400	$0	$0	$1,312,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$756,000	$0	$0	$756,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	34	$756,000	$0	$0	$756,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				34	$756,000	$0	$0	$756,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$75,200	$0	$0	$75,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$71,600	$0	$0	$71,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$177,200	$0	$0	$177,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$105,600	$0	$0	$105,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$145,600	$0	$0	$145,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$145,600	$0	$0	$145,600
TOTAL				34	$5,836,000	$0	$0	$5,836,000

2021/01/07 03:43 PM

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 14 de enero de 2021 03:27:02 PM

Período del Informe: Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 14 de enero de 2021

Pagada 05/01/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA		
Documento	NI800093106	**Dirección**	CL 74 #22 - 23
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3125691
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PAEZ MONROY LUZ VIRGINIA	**Identificación**	CC41712296

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1065134947	BERDUGO BARRIOS BRAYAN DAVITH	1034660247	05/01/2021	202012	202101																		30	30	30	30	230201	EPS017	14-4	CCF26	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$168.300	$42.100	$45.800	$42.100	$0	$0	$0	$0	$298.300
PE 1055083150219966	FERNANDEZ ARIAS CARLOS EDUARDO	1034660247	05/01/2021	202012	202101																		30	30	30	30	230301	EPS006	14-4	CCF26	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$168.300	$42.100	$45.800	$42.100	$0	$0	$0	$0	$298.300
CC 74183771	HERRERA ACEVEDO JOSUE ORLANDO	1034660247	05/01/2021	202012	202101																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF26	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$168.300	$42.100	$45.800	$42.100	$0	$0	$0	$0	$298.300
CC 1000033441	ORTIZ AYALA JUAN PABLO	1034660247	05/01/2021	202012	202101																		30	30	30	30	230201	EPS041	14-4	CCF26	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$168.300	$42.100	$45.800	$42.100	$0	$0	$0	$0	$298.300
CC 4229305	OSMA NELSON HUGO	1034660247	05/01/2021	202012	202101																		30	30	30	30	25-14	EPS006	14-4	CCF26	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$168.300	$42.100	$45.800	$42.100	$0	$0	$0	$0	$298.300
CC 4290600	BOLER ESPITIA FAUSTINO	1034660247	05/01/2021	202012	202101																		30	30	30	30	25-14	EPS017	14-4	CCF26	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$1.051.657	$168.300	$42.100	$45.800	$42.100	$0	$0	$0	$0	$298.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 86 60 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73155017		DIAZ HERAZO ERNESTO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	FINCA LAS MERCEDES VEREDA EL HATO	LA CALERA-CUNDINAMARCA	8741125	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	858244052	9415041015	I	2021/01/07	2021/01/12	BANCOLOMBIA	5	$579,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,900,500	$304,100			$1,900,500	$237,600			$1,900,500	$38,100			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,900,500	$304,100			$1,900,500	$237,600			$1,900,500	$38,100			$0	$0		$0	$0
Ciudad: LA CALERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,900,500	$304,100			$1,900,500	$237,600			$1,900,500	$38,100			$0	$0		$0	$0
1	CC	73155017	DIAZ ERNESTO	230301	30	$1,900,500	$304,100	EPS017	30	$1,900,500	$237,600	CCF21	30	$1,900,500	$38,100		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,900,500	$304,100			$1,900,500	$237,600			$1,900,500	$38,100			$0	$0		$0	$0

2021/01/12 03:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73155017		DIAZ HERAZO ERNESTO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	FINCA LAS MERCEDES VEREDA EL HATO	LA CALERA-CUNDINAMARCA	8741125	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	858244052	9415041015	I	2021/01/07	2021/01/12	BANCOLOMBIA	5	$579,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,100	$0	$0	$304,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,100	$0	$0	$304,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,100	$0	$0	$38,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$38,100	$0	$0	$38,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,600	$0	$0	$237,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$237,600	$0	$0	$237,600
TOTAL				1	$579,800	$0	$0	$579,800

2021/01/12 03:52 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900150308-0	DIVERPARK F Y F LTDA	CALLE 5B SUR 81 A 17	4026596	diverparkfyf@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-12	Y	21/12/2020	47430402	$622.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	219.600	0		0		0	0	0	0	219.600	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	122.200				122.200	0	0	122.200			1.222	122.200	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	219.600	219.600
Pensión	2	281.000	281.000
Riesgos Laborales	1	122.200	122.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	622.800	622.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900150308-0	DIVERPARK F Y F LTDA	CALLE 5B SUR 81 A 17	4026598	diverparkfyf@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-12	Y	21/12/2020	47430402	$622,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007657825	HERNANDEZ ELLES JAVIER	59	0			N																	230301	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS002	877,803	109,800	14-11	877,803	5	61,100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	19758932	HERNANDEZ POLANCO RICARDO	59	0			N																	230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS002	877,803	109,800	14-11	877,803	5	61,100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900150308-0	DIVERPARK F Y F LTDA		CALLE 5B SUR 81 A 17	4026596	diverparkfyf@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	07/01/2021	47765078	$4.170.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	185.700	0		0		0	0	0	0	185.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	61.100	0		0		0	0	0	0	61.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	105.600	0		0		0	0	0	0	105.600	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	176.100	0		0		0	0	0	0	176.100	5
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	665.200	0	0	0	0	0	0		665.200	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.163.200	0	0	0	0	0	0		1.163.200	7
231001	Colfondos	800227940-8	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
25-14	Colpensiones	800336004-7	421.500	0	0	0	0	0	0		421.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	581.900				581.900	0	0	581.900			5.819	581.900	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	598.900	0	0	598.900	16

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900150308-0	DIVERPARK F Y F LTDA		CALLE 5B SUR 81 A 17	4026596	diverparkfyf@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	07/01/2021	47765078	$4,170,100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	598.900	598.900
Pensión	4	2.390.400	2.390.400
Riesgos Laborales	1	581.900	581.900
CCF	1	598.900	598.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.170.100	4.170.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900150308-0	DIVERPARK F Y F LTDA	CALLE 5B SUR 81 A 17	4026596	diverparkfyf@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	07/01/2021	47765078	$4,170,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			COF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007103346	GONZALEZ MADERA DILAN ALEXIS	1	0			S															7		230301	643,723	103,000	0	0	0	0	EPS010	643,723	25,800	14-11	643,723	3	15,700	CCF24	643,723	25,800	0	0	0	0	0
2	CC	1007103346	GONZALEZ MADERA DILAN ALEXIS	1	0			S															7		230301	204,821	32,800	0	0	0	0	EPS010	204,821	8,200	14-11	204,821	3	0	CCF24	204,821	8,200	0	0	0	0	0
3	CC	1007103346	GONZALEZ MADERA DILAN ALEXIS	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS010	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
4	CC	1022354277	VILLARRAGA MARTINEZ OSCAR HERNAN	1	0			S																	230201	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS017	848,543	34,000	14-11	848,543	3	20,700	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
5	CC	1022354277	VILLARRAGA MARTINEZ OSCAR HERNAN	1	0			S													X				230201	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS017	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
6	CC	1023002671	GIL OSPINA JOSE FERNANDO	1	0			S																	231001	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS018	848,543	34,000	14-11	848,543	5	59,100	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
7	CC	1023002671	GIL OSPINA JOSE FERNANDO	1	0			S													X				231001	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS018	29,261	1,200	14-11	29,261	5	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
8	CC	1030524819	MARTINEZ VILLARRAGA FABIO	1	0			S																	230201	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS002	848,543	34,000	14-11	848,543	3	20,700	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
9	CC	1030524819	MARTINEZ VILLARRAGA FABIO	1	0			S													X				230201	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS002	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
10	CC	1073525803	PEREZ MALDONADO YULIANA STEFANNY	1	0			S																	230301	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS002	848,543	34,000	14-11	848,543	3	20,700	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
11	CC	1073525803	PEREZ MALDONADO YULIANA STEFANNY	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS002	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
12	CC	1106453322	CONDE GAITAN CRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230201	702,243	112,400	0	0	0	0	EPS017	702,243	28,100	14-11	702,243	3	17,200	CCF24	702,243	28,100	0	0	0	0	0
13	CC	1106453322	CONDE GAITAN CRISTIAN FABIAN	1	0			S											X						230201	148,301	23,500	0	0	0	0	EPS017	148,301	5,900	14-11	148,301	3	0	CCF24	148,301	5,900	0	0	0	0	0
14	CC	1106453322	CONDE GAITAN CRISTIAN FABIAN	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS017	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
15	CC	80215314	MORENO CARVAJAL LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS010	848,543	34,000	14-11	848,543	5	59,100	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
16	CC	80215314	MORENO CARVAJAL LUIS ALEJANDRO	1	0			S													X				25-14	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS010	29,261	1,200	14-11	29,261	5	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
17	CC	93089837	PRECIADO LOAIZA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230201	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS002	848,543	34,000	14-11	848,543	3	20,700	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
18	CC	93089837	PRECIADO LOAIZA DIEGO FERNANDO	1	0			S													X				230201	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS002	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
19	CC	1131504153	ELLES ACOSTA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS017	848,543	34,000	14-11	848,543	5	59,100	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
20	CC	1131504153	ELLES ACOSTA LUIS FERNANDO	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS017	29,261	1,200	14-11	29,261	5	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
21	CC	14105522	GUARNIZO GAITAN VICENTE	1	0			S																	230301	790,023	126,500	0	0	0	0	EPS017	790,023	31,700	14-11	790,023	3	18,300	CCF24	790,023	31,700	0	0	0	0	0
22	CC	14105522	GUARNIZO GAITAN VICENTE	1	0			S											X						230301	58,521	9,400	0	0	0	0	EPS017	58,521	2,400	14-11	58,521	3	0	CCF24	58,521	2,400	0	0	0	0	0
23	CC	14105522	GUARNIZO GAITAN VICENTE	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS017	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
24	CC	3152379	VILLARRAGA CORTES JULIO FERNANDO	1	0			S																	25-14	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS017	848,543	34,000	14-11	848,543	5	59,100	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
25	CC	3152379	VILLARRAGA CORTES JULIO FERNANDO	1	0			S													X				25-14	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS017	29,261	1,200	14-11	29,261	5	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
26	CC	52095813	ZAMBRANO MESIAS MONICA NATALIA	1	0			S																	230301	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS010	848,543	34,000	14-11	848,543	3	20,700	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
27	CC	52095813	ZAMBRANO MESIAS MONICA NATALIA	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS010	29,261	1,200	14-11	29,261	3	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
28	CC	74183330	PEREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1,933,334	309,400	0	0	0	0	EPS002	1,933,334	77,400	14-11	1,933,334	3	47,100	CCF24	1,933,334	77,400	0	0	0	0	0
29	CC	74183330	PEREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1	0			S													X				230301	66,667	10,700	0	0	0	0	EPS002	66,667	2,700	14-11	66,667	3	0	CCF24	66,667	2,700	0	0	0	0	0
30	CC	79572922	GONZALEZ MOLINA JOSE MANUEL	1	0			S																	230301	848,543	135,800	0	0	0	0	MIN001	848,543	34,000	14-11	848,543	5	59,100	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
31	CC	79572922	GONZALEZ MOLINA JOSE MANUEL	1	0			S													X				230301	29,261	4,700	0	0	0	0	MIN001	29,261	1,200	14-11	29,261	5	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
32	CC	80008744	MARTINEZ VILLARRAGA ELGAR FREDY	1	0			S																	25-14	848,543	135,800	0	0	0	0	EPS005	848,543	34,000	14-11	848,543	5	59,100	CCF24	848,543	34,000	0	0	0	0	0
33	CC	80008744	MARTINEZ VILLARRAGA ELGAR FREDY	1	0			S													X				25-14	29,261	4,700	0	0	0	0	EPS005	29,261	1,200	14-11	29,261	5	0	CCF24	29,261	1,200	0	0	0	0	0
34	CC	80020532	MADRID REYES RICARDO ANDRES	1	0			S	X																230201	351,122	56,200	0	0	0	0	EPS005	351,122	14,100	14-11	351,122	5	24,500	CCF24	351,122	14,100	0	0	0	0	0
35	CC	80020532	MADRID REYES RICARDO ANDRES	1	0			S											X						230201	292,801	46,900	0	0	0	0	EPS005	292,801	11,800	14-11	292,801	5	0	CCF24	292,801	11,800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900750474	1	DELTA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	calle 2 n 5 67 casa 12b	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8935785	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	834380401	9414038676	E	2020/12/17	2020/12/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,623,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80182906	ABRIL ABRIL PABLO EMILIO																		5-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
2	CC	1005342076	ALARCON SAENZ JEISON FERNANDO																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
3	CC	1098676866	AREVALO GARCIA YUDY MAYERLY																		31001	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
4	CC	1005640494	ASCENCIO HOYOS JOSE FERNANDO																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
5	CC	80768540	AVILA ROMERO CESAR IGNACIO																		30301	30	$997,146	$159,600	EPS017	30	$997,146	$39,900	CCF24	30	$997,146	$39,900	14-4	30	$997,146	$69,500	30	$0	$0	SI	$308,900
6	CC	5117864	BELEÑO VIEIRA ALEXANDER		X																30301	23	$672,983	$107,700	EPS005	23	$672,983	$27,000	CCF24	23	$672,983	$27,000	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$208,600
7	CC	15029203	CARDALES MEDRANO BENGLEIT																		30201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
8	CC	4102867	CETINA BONZA SERGIO																		31001	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
9	CC	79860964	DIAZ LIZARAZO PEDRO GIOVANNI	X																	30201	6	$175,561	$28,100	EPS005	6	$175,561	$7,100	CCF24	6	$175,561	$7,100	14-4	6	$175,561	$12,300	6	$0	$0	SI	$54,600
10	CC	11449243	DIAZ ALFONSO WILMAR ANDRES																		30201	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
11	CC	1018426573	ESQUIVEL TIQUE JOSE SAUL																		30201	30	$897,147	$143,600	EPS044	30	$897,147	$35,900	CCF24	30	$897,147	$35,900	14-4	30	$897,147	$62,500	30	$0	$0	SI	$277,900
12	CC	1096950720	GALEANO ALVAREZ JORGE LEONARDO																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
13	CC	11519196	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO																		31001	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
14	CC	16077321	GONZALEZ GARCIA LEONARDO																		5-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
15	CC	1033684285	HOYOS SEGURA NESTOR LEONARDO	X																	30301	22	$643,723	$103,000	EPS008	22	$643,723	$25,800	CCF24	22	$643,723	$25,800	14-4	22	$643,723	$44,900	22	$0	$0	SI	$199,500
16	CC	1010193982	LUNA HERRERA EDWIN ALFREDO																		30201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
17	CC	1100085311	MEDRANO CAUSADO ROBER ALBERTO																		30201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
18	CC	91003651	MENDOZA VARGAS JOHN JAIRO																		30201	30	$877,803	$140,500	EPS001	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
19	CC	12599616	MENDOZA FIGUEROA MEDARDO DE JESUS																		31001	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$268,100
20	CC	80085081	MORENO GUTIERREZ DANIEL EDUARDO																		30201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
21	CC	9167740	NAVAS MARTINEZ FREDIS MANUEL																		30201	30	$877,803	$140,500	ESSC07	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
22	CC	1019137123	ORTIZ AVILA CARLOS ANDRES																			0	$0	$0	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$170,900
23	CC	73433659	SANABRIA ROMERO JAIME ALFONSO																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
24	CC	1070806410	SEGURA OJEDA ROBERTO CARLOS																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
25	CC	5110241	SERRANO LUNA ASDRUBAL																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS041	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
26	CC	80501653	VAS CHAPARRO NUMAEL																		31001	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
27	CC	79663519	ZAMBRANO LOPEZ WILSON JAVIER																		30301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
Total	Afiliados(27)																						$24,064,817	$3,851,500			$24,942,620	$1,074,300			$23,968,256	$960,600			$24,942,620	$1,736,600		$0	$0		$7,623,000

2020/12/17 09:59 AM

93

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900750474	1	DELTA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	calle 2 n 5 67 casa 12b	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8935785	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	834380401	9414038676	E	2020/12/17	2020/12/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,623,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,851,500	$0	$0	$3,851,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$850,000	$0	$0	$850,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$281,000	$0	$0	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,353,800	$0	$0	$1,353,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,366,700	$0	$0	$1,366,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,736,600	$0	$0	$1,736,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$1,736,600	$0	$0	$1,736,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$960,600	$0	$0	$960,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$960,600	$0	$0	$960,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				27	$1,074,300	$0	$0	$1,074,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$206,000	$0	$0	$206,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$70,400	$0	$0	$70,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$251,100	$0	$0	$251,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$35,900	$0	$0	$35,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$336,000	$0	$0	$336,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$104,500	$0	$0	$104,500
TOTAL				27	$7,623,000	$0	$0	$7,623,000

2020/12/17 09:59 AM

457
994

995

Señor(es):	CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS
Nit:	CC 1019108010
Dirección:	calle 157a #92-80 torre 2 apto 606
Teléfono:	4697580 **Fax:** 4697580
Ciudad:	BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	CRISTIAN CAMILO GAMBOA
Tipo y número de identificación	1019108010
Número de liquidación planilla	8347615435
Fecha de pago	12/28/2020
Número de autorización de pago	77890656
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Diciembre 2020
Periodo cotización pensión	Diciembre 2020
Periodo cotización caja	Diciembre 2020
Número de administradoras	2
Total Pagado	$250.300
Total interes mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
23020	Proteccion (ING + Proteccion)	$140.500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$109.800	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	DIAS INCAPACIDAD	DIAS LICENCIA	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1018106010	GAMBOA CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO	EPS017	230201																				877.803	877.803	0	0	0			140.800	0	0	100.800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069740197		GUTIERREZ VARGAS ANGELA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69B N 105-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8865487	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	870247381	9414934868	I	2021/01/26	2021/01/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$250,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vap	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$250,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$250,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$250,300
1	CC	1069740197	GUTIERREZ ANGELA																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$250,300
Total			**Afiliados(1)**																				$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$250,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069740197		GUTIERREZ VARGAS ANGELA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69B N 105-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8865487	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	870247381	9414934868	I	2021/01/26	2021/01/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$250,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$250,300	$0	$0	$250,300

Certificado de trabajador independiente

< Regresar

Tipo	Documento	Nombre	
CÉDULA DE CIUDADANÍ,	1069740197	ANGELA JULIETH GUTIERRI	Generar

Coberturas

NOTA: Las coberturas de retiro se deben generar por la opción de Certificado y camé de afiliación del HOME.

Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo Cotizante
04/01/2021	31/01/2021	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.

Para ubicar nuestras oficinas [redacted] (https://www.arlsura.com/index.php/oficinas-arl-sura)

Líneas de atención 01800 051 1414 ó 01800 094 1414
Medellín 4444578 - Bogotá 4055911 - Cali 3808938 - Pereira 3138400 - Manizales 8811280 - Bucaramanga 6917938 - Cartagena 6424938 - Barranquilla 3197938

Medellín, Antioquia, Colombia.
Se recomienda utilizar Chrome o Mozilla Firefox en una resolución de 1024 x 768 o superior.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830045483
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDINA JUEGOS PARQUES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 18 SUR N. 29 D 12	TELÉFONO:	8054802
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros productos de madera; fabrica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	77773378 22		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2020		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/15		NUMERO AUTORIZACIÓN:		861388932

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.101.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.500	$ 0	$ 1.101.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 420.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.500	$ 0	$ 420.500
SUBTOTALES:										$ 1.746.000	$ 0	$ 1.746.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 46.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 70.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 171.200
SUBTOTALES:													$ 436.800	$ 0	$ 0	$ 436.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 641.000	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 641.000
SUBTOTALES:									$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 641.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	$ 436.800	$ 0	$ 436.800
SUBTOTALES:			$ 436.800	$ 0	$ 436.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1012390541	KATHERINE VIRGINIA	DEPEND		$ 878.000	FIJO			61																
2	CC 1012450951	RIVERA MALDONADO RONALDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			61																
3	CC 1065870355	SANTANA LOPEZ SAMUEL DAVID	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			61	01															
4	CC 12487783	RODRIGUEZ BARA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			61																
5	CC 13050068	SANTANA HARISTA NEY	DEPEND		$ 877.803	FIJO			61																
6	CC 14183330	PEREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			61																
7	CC 1084478	MORENO RUBIANO DIOGENES	DEPEND		$ 878.000	FIJO			61																
8	CC 1087688947	LEAL RIVERA DANIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			61	23															
9	CC 12129294	GONZALEZ PORO ARNULFO	DEPEND		$ 878.000	FIJO			61	30															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN												SALUD						ARP					PARAFISCALES — CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	V. UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 878.000	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 878.000		$ 0	$ 35.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 878.000		$ 21.400	30	$ 878.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.100.000		$ 0	$ 44.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.000		$ 76.800	30	$ 1.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
231001-COLFONDOS	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.400.000		$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000		$ 87.500	30	$ 1.400.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.000		$ 0	$ 70.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.750.000		$ 42.700	30	$ 1.750.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803		$ 0	$ 35.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 877.803		$ 81.100	30	$ 877.803	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000		$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 878.000	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 878.000		$ 0	$ 35.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 878.000		$ 61.200	30	$ 878.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	23	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.000	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 1.150.000		$ 0	$ 46.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 1.150.000		$ 80.100	23	$ 1.150.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 878.000	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 878.000		$ 0	$ 35.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 878.000		$ 81.200	30	$ 878.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830045463
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDINA JUEGOS PARQUES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 18 SUR N. 29 D 12	TELÉFONO:	8054802
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros productos de madera; fabrica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:				7777337822	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2021/01/15	NUMERO AUTORIZACIÓN:				861 [illegible]932

TOTAL	$ 3.260.600
